AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	15/06/2024
Semana No	**1**	**DEL :**	6-jun-24	**AL:**	14-jun-24
Plazo Total	25 MESES (Hasta el 31 de julio de 2026)	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		8	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**1,02%**			
Nombre del Supervisor :	**Jorge Beltran**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

VANGUARDIA, AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,00%**	**0,00%**	**(%) Ejecutado**		**0,00%**
Valor programado ($)	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**0,00%**
				Valor Adelanto	**$ 0,00**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	**Contratista:**	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	**Contrato No:**	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	**Valor Inicial:**	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	**Plazo inicial:**	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES	**Plazo actualizado:**	25 MESES
Fecha de iniciación:	6-jun-24	**Fecha de iniciación:**	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	**Valor total actual del contrato:**	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se recibe cronograma preliminar de cumplimiento contractual de parte del contratista el cual se está revisando por parte de la interventoría, sin embargo el contratista en la fase de diagnóstico, debe entregar un cronograma acorde de necesidades del proyecto.

Actualmente en fase de diagnostico.

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

Se recibe el sitio dispuesto para la oficina de interventoría y de contratista, la cual cuenta con servicio de baño (con agua recargable en baldes), luz, aire acondicionado, seguridad, sin mobiliario.

Se realiza la dotación de elementos de oficina por parte de la interventoría, dejando establecido el sitio de trabajo para el proyecto

Se recibe de parte de la supervisora de la aeronáutica civil dra Luz Miriam Santiago el acta de reunión realizada el día 6/6/2024, junto con los siguientes documentos:

1. Circular, Requisitos para expedición del pase aeroportuario.
2. Circular: Requisitos PERSONA
3. Circular 04 - Manejo de documentación digital.
4. Circular - Requisitos generales para expedición del permiso para vehículos.
5. Listado de asistencia reunión lado tierra.
6. Manual Identidad Visual - AEROCIVIL.
7. Valores ingresos 2024

Se suscribió el acta de inicio el día 6/6/2024 los contratos de interventoría 23001280 H3 DE 2023 y obra 23001163 H4 de 2023.

El día 06 de junio de 2024 se realizó visita general para levantamiento de inventario inicial y validación de prioridades, las cuales formarán parte del desarrollo del diagnóstico inicial que debe presentar el contratista de obra treinta días después de la orden de inicio.

El día 06 de junio de 2024 se realiza visita de elementos electrógenos, validando las necesidades que expone la Entidad en las platas eléctricas ubicadas en la oficina regional y elementos ubicados en la torre de control, el contratista se compromete a generar el informe preliminar para mostrar el diagnóstico y necesidades de estos elementos de manera prioritaria.

Se realiza el procedimiento para solicitud de carnet, de parte del contratista y de la interventoría.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA DE OBRA

FAO-CTO-23001163-001-2023	PROGRAMACION AEROPUERTO VILLAVICENCIO VANGUARDIA – GRUPO FAO
FAO-CTO-23001163-002-2023	FAO-CTO-23001163-002-2024 - DOCUMENTACION PERSONAL MINIMO – GRUPO FAO SAS
FAO-CTO-23001163-003-2023	Notificación Cambio Representante Legal – GRUPO FAO SAS

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

CORRESPONDENCIA ENVIADA	
CO-FJ-1265-001-2024	ENTREGA DE PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA
CO-FJ-1265-002-2024	ENTREGA HOJAS DE VIDA PERSONAL CLAVE DE INTERVENTORÍA
CO-FJ-1265-003-2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CONTACTO DE CONTRATISTA DE OBRA
CO-FJ-1265-004-2024	SOLICITUD DE ENTREGA DOCUMENTAL AL CONTRATISTA DE OBRA
CO-FJ-1265-005-2024	ENTREGA HOJA DE VIDA INSPECTOR SISOMA DE INTERVENTORÍA
CO-FJ-1265-006-2024	CITACIÓN VISITA CONJUNTA AEROPUERTO VANGUARDIA-VILLAVICENCIO
CO-FJ-1265-007-2024	ENTREGA HOJAS DE VIDA PERSONAL CLAVE – CAMBIO DE RESIDENTE, ALCANCE A COMUNICACIÓN CO-FJ-1280-002-2024 DEL 17/06/2024
CO-FJ-1265-008-2024	REPROGRAMACIÓN DE VISITA DE INVENTARIOS
CO-FJ-1265-009-2024	URGENTE – SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A MANTENIMIENTO DE GRUPOS
CO-FJ-1265-010-2024	REITERACION SOLICITUD DE ENTREGA DOCUMENTAL AL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA


PERSONAL DE OBRA			
PERSONAL OPERATIVO		PERSONAL ADMINISTRATIVO	
MAESTRO	0	DIRECTOR DE OBRA	1
OFICIAL	0	RESIDENTE DE OBRA	1
AYUDANTE	0	PROFESIONAL SST	1
TOTAL	0	TOTAL	3


PERSONAL DE INTERVENTORIA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
PROFESIONAL SST	1
TOTAL	3

Personal de Interventoría	3
Personal del Contratista	3
Total Personal en Obra	6

EQUIPOS EN OBRA:	A la fecha no se cuentan con estos elementos en obra

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

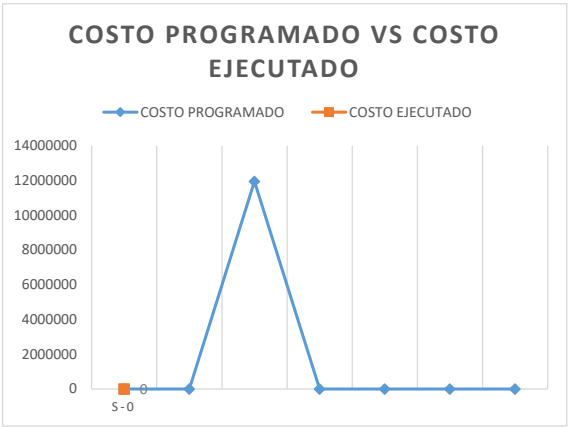



AVANCE FINANCIERO DE OBRA

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra no se presenta avance financiero

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de interventoría no se presenta avance financiero

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			
Descripción Foto 1.	Descripción Foto 2.	Descripción Foto 3.	Descripción Foto 4.
Revisión de equipos electrógenos, los cuales requieren mantenimiento inmediato, dadas las condiciones de fallas frecuentes en su funcionamiento	**Puertas de zona de sanidad, sin funcionamiento, en marco y puerta**	**Puntos de orinales con poca altura y sin funcionalidad**	**Techo con humedades en la mayor parte del aeropuerto**
			
Descripción Foto 5.	Descripción Foto 6.	Descripción Foto 7.	Descripción Foto 8.
Se requiere tapar el espacio del vidrio de la sala de abordaje ya que permite visibilidad de adentro hacia a fuera y hacia adentro y por seguridad de los usuarios es necesario eliminar la visibilidad	**Estado de pintura en mal estado en la mayor parte del aeropuerto**	**Realizar mantenimiento a tres puertas rígidas de acceso a áreas restringidas**	**Se requiere modernización del sistema eléctrico, tanto en controladores como en sistema de iluminación general**


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Quince	(15)	días del mes de	junio	de	2024
(Día en letras)	(Día en Números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

(Firma)

Sandra Yonaira Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ


			COSTO PROGRAMADO				EJECUTADO			
			PROGRAMADO							
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL	COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 11.956.808,00	0,61%	$ 11.956.808,00	0,61%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 11.956.808,00	0,61%		0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 11.956.808,00	0,61%		0,00%	$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 11.956.808,00	0,61%		0,00%	$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 11.956.808,00	0,61%		0,00%	$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 57.769.634,61	2,97%	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 116.504.027,71	5,98%	$ 58.734.393,10	3,02%	$ 187.656.630,00	0,00%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 175.238.420,81	9,00%	$ 58.734.393,10	3,02%		0,00%	$ 0,00	0,00%
9	S-9	11/08/2024	$ 233.972.813,91	12,01%	$ 58.734.393,10	3,02%		0,00%	$ 0,00	0,00%
10	S-10	18/08/2024	$ 279.938.165,99	14,37%	$ 45.965.352,08	2,36%		0,00%	$ 0,00	0,00%
11	S-11	25/08/2024	$ 293.068.841,16	15,05%	$ 13.130.675,17	0,67%		0,00%	$ 0,00	0,00%
12	S-12	1/09/2024	$ 306.199.516,33	15,72%	$ 13.130.675,17	0,67%		0,00%	$ 0,00	0,00%
13	S-13	8/09/2024	$ 319.330.191,50	16,40%	$ 13.130.675,17	0,67%		0,00%	$ 0,00	0,00%
14	S-14	15/09/2024	$ 332.460.866,67	17,07%	$ 13.130.675,17	0,67%		0,00%	$ 0,00	0,00%
15	S-15	22/09/2024	$ 348.296.192,58	17,88%	$ 15.835.325,91	0,81%		0,00%	$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	$ 364.894.368,70	18,74%	$ 16.598.176,12	0,85%		0,00%	$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	$ 386.203.836,83	19,83%	$ 21.309.468,13	1,09%		0,00%	$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	$ 413.127.313,98	21,21%	$ 26.923.477,15	1,38%		0,00%	$ 0,00	0,00%
19	S-19	20/10/2024	$ 440.050.791,13	22,59%	$ 26.923.477,15	1,38%		0,00%	$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	$ 466.974.268,28	23,98%	$ 26.923.477,15	1,38%				
21	S-21	3/11/2024	$ 493.897.745,43	25,36%	$ 26.923.477,15	1,38%				
22	S-22	10/11/2024	$ 520.727.686,31	26,74%	$ 26.829.940,88	1,38%				
23	S-23	17/11/2024	$ 547.489.894,04	28,11%	$ 26.762.207,73	1,37%				
24	S-24	24/11/2024	$ 574.252.101,77	29,49%	$ 26.762.207,73	1,37%				
25	S-25	1/12/2024	$ 601.014.309,50	30,86%	$ 26.762.207,73	1,37%				
26	S-26	8/12/2024	$ 625.918.544,22	32,14%	$ 24.904.234,72	1,28%				
27	S-27	15/12/2024	$ 646.169.024,92	33,18%	$ 20.250.480,70	1,04%				
28	S-28	22/12/2024	$ 662.029.752,39	33,99%	$ 15.860.727,47	0,81%				
29	S-29	29/12/2024	$ 675.639.122,47	34,69%	$ 13.609.370,08	0,70%				
30	S-30	5/01/2025	$ 685.575.225,22	35,20%	$ 9.936.102,75	0,51%				
31	S-31	12/01/2025	$ 695.511.327,97	35,71%	$ 9.936.102,75	0,51%				
32	S-32	19/01/2025	$ 705.447.430,72	36,22%	$ 9.936.102,75	0,51%				
33	S-33	26/01/2025	$ 715.723.124,78	36,75%	$ 10.275.694,06	0,53%				
34	S-34	2/02/2025	$ 726.094.601,00	37,28%	$ 10.371.476,22	0,53%				
35	S-35	9/02/2025	$ 736.222.614,04	37,80%	$ 10.128.013,04	0,52%				
36	S-36	16/02/2025	$ 743.550.800,49	38,18%	$ 7.328.186,45	0,38%				
37	S-37	23/02/2025	$ 750.878.986,94	38,55%	$ 7.328.186,45	0,38%				
38	S-38	2/03/2025	$ 769.937.778,75	39,53%	$ 19.058.791,81	0,98%				
39	S-39	9/03/2025	$ 808.135.979,30	41,49%	$ 38.198.200,55	1,96%				
40	S-40	16/03/2025	$ 847.810.571,56	43,53%	$ 39.674.592,26	2,04%				
41	S-41	23/03/2025	$ 888.554.275,07	45,62%	$ 40.743.703,51	2,09%				
42	S-42	30/03/2025	$ 929.297.978,58	47,72%	$ 40.743.703,51	2,09%				
43	S-43	6/04/2025	$ 943.326.188,59	48,44%	$ 14.028.210,01	0,72%				
44	S-44	13/04/2025	$ 953.744.457,20	48,97%	$ 10.418.268,61	0,53%				
45	S-45	20/04/2025	$ 964.163.400,93	49,51%	$ 10.418.943,73	0,53%				
46	S-46	27/04/2025	$ 974.799.742,88	50,05%	$ 10.636.341,95	0,55%				
47	S-47	4/05/2025	$ 984.581.074,23	50,55%	$ 9.781.331,35	0,50%				
48	S-48	11/05/2025	$ 992.055.296,48	50,94%	$ 7.474.222,25	0,38%				
49	S-49	18/05/2025	$ 1.006.879.302,90	51,70%	$ 14.824.006,42	0,76%				
50	S-50	25/05/2025	$ 1.027.025.566,81	52,73%	$ 20.146.263,91	1,03%				
51	S-51	1/06/2025	$ 1.047.171.830,72	53,77%	$ 20.146.263,91	1,03%				
52	S-52	8/06/2025	$ 1.067.318.094,63	54,80%	$ 20.146.263,91	1,03%				
53	S-53	15/06/2025	$ 1.087.464.358,54	55,84%	$ 20.146.263,91	1,03%				
54	S-54	22/06/2025	$ 1.107.340.177,94	56,86%	$ 19.875.819,40	1,02%				
55	S-55	29/06/2025	$ 1.125.983.972,38	57,81%	$ 18.643.794,44	0,96%				
56	S-56	6/07/2025	$ 1.144.627.766,82	58,77%	$ 18.643.794,44	0,96%				
57	S-57	13/07/2025	$ 1.163.271.561,26	59,73%	$ 18.643.794,44	0,96%				
58	S-58	20/07/2025	$ 1.183.238.290,43	60,75%	$ 19.966.729,17	1,03%				
59	S-59	27/07/2025	$ 1.204.163.006,82	61,83%	$ 20.924.716,39	1,07%				
60	S-60	3/08/2025	$ 1.221.591.291,11	62,72%	$ 17.428.284,29	0,89%				
61	S-61	10/08/2025	$ 1.238.033.402,25	63,57%	$ 16.442.111,14	0,84%				
62	S-62	17/08/2025	$ 1.245.671.121,88	63,96%	$ 7.637.719,63	0,39%				
63	S-63	24/08/2025	$ 1.253.129.160,05	64,34%	$ 7.458.038,17	0,38%				
64	S-64	31/08/2025	$ 1.260.322.442,36	64,71%	$ 7.193.282,31	0,37%				
65	S-65	7/09/2025	$ 1.266.834.923,87	65,05%	$ 6.512.481,51	0,33%				
66	S-66	14/09/2025	$ 1.273.347.405,38	65,38%	$ 6.512.481,51	0,33%				
67	S-67	21/09/2025	$ 1.279.690.247,63	65,71%	$ 6.342.842,25	0,33%				
68	S-68	28/09/2025	$ 1.285.910.247,66	66,03%	$ 6.220.000,03	0,32%				
69	S-69	5/10/2025	$ 1.292.130.247,69	66,35%	$ 6.220.000,03	0,32%				
70	S-70	12/10/2025	$ 1.298.350.247,72	66,66%	$ 6.220.000,03	0,32%				
71	S-71	19/10/2025	$ 1.337.850.685,29	68,69%	$ 39.500.437,57	2,03%				
72	S-72	26/10/2025	$ 1.378.030.315,47	70,76%	$ 40.179.630,18	2,06%				
73	S-73	2/11/2025	$ 1.418.209.945,65	72,82%	$ 40.179.630,18	2,06%				
74	S-74	9/11/2025	$ 1.458.389.575,83	74,88%	$ 40.179.630,18	2,06%				
75	S-75	16/11/2025	$ 1.485.208.954,74	76,26%	$ 26.819.378,91	1,38%				
76	S-76	23/11/2025	$ 1.497.830.921,84	76,91%	$ 12.621.967,10	0,65%				
77	S-77	30/11/2025	$ 1.510.652.891,31	77,57%	$ 12.821.969,47	0,66%				
78	S-78	7/12/2025	$ 1.523.474.860,78	78,22%	$ 12.821.969,47	0,66%				
79	S-79	14/12/2025	$ 1.536.296.830,25	78,88%	$ 12.821.969,47	0,66%				
80	S-80	21/12/2025	$ 1.545.045.412,89	79,33%	$ 8.748.582,64	0,45%				
81	S-81	28/12/2025	$ 1.553.305.899,56	79,76%	$ 8.260.486,67	0,42%				
82	S-82	4/01/2026	$ 1.559.721.542,78	80,09%	$ 6.415.643,22	0,33%				
83	S-83	11/01/2026	$ 1.566.137.186,00	80,41%	$ 6.415.643,22	0,33%				
84	S-84	18/01/2026	$ 1.573.104.127,89	80,77%	$ 6.966.941,89	0,36%				
85	S-85	25/01/2026	$ 1.580.996.581,60	81,18%	$ 7.892.453,71	0,41%				
86	S-86	1/02/2026	$ 1.589.126.749,22	81,60%	$ 8.130.167,62	0,42%				
87	S-87	8/02/2026	$ 1.597.022.945,73	82,00%	$ 7.896.196,51	0,41%				

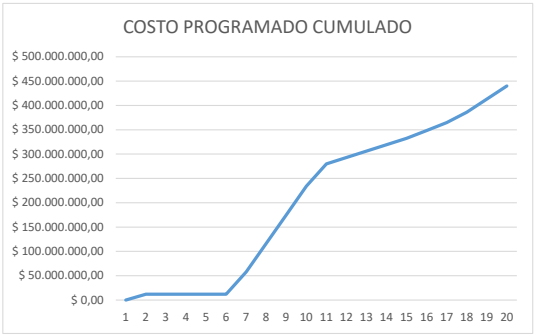





88	S-88	15/02/2026	$ 1.604.853.150,39	82,40%	$ 7.830.204,66	0,40%
89	S-89	22/02/2026	$ 1.612.696.885,38	82,81%	$ 7.843.734,99	0,40%
90	S-90	1/03/2026	$ 1.620.696.219,11	83,22%	$ 7.999.333,73	0,41%
91	S-91	8/03/2026	$ 1.628.489.554,82	83,62%	$ 7.793.335,71	0,40%
92	S-92	15/03/2026	$ 1.637.456.571,32	84,08%	$ 8.967.016,50	0,46%
93	S-93	22/03/2026	$ 1.649.455.457,21	84,69%	$ 11.998.885,89	0,62%
94	S-94	29/03/2026	$ 1.661.728.051,75	85,32%	$ 12.272.594,54	0,63%
95	S-95	5/04/2026	$ 1.676.530.241,63	86,08%	$ 14.802.189,88	0,76%
96	S-96	12/04/2026	$ 1.692.522.829,32	86,90%	$ 15.992.587,69	0,82%
97	S-97	19/04/2026	$ 1.708.515.417,01	87,73%	$ 15.992.587,69	0,82%
98	S-98	26/04/2026	$ 1.716.389.309,33	88,13%	$ 7.873.892,32	0,40%
99	S-99	3/05/2026	$ 1.724.097.513,99	88,53%	$ 7.708.204,66	0,40%
100	S-100	10/05/2026	$ 1.733.774.722,73	89,02%	$ 9.677.208,74	0,50%
101	S-101	17/05/2026	$ 1.748.515.084,80	89,78%	$ 14.740.362,07	0,76%
102	S-102	24/05/2026	$ 1.763.255.446,87	90,54%	$ 14.740.362,07	0,76%
103	S-103	31/05/2026	$ 1.777.995.808,94	91,29%	$ 14.740.362,07	0,76%
104	S-104	7/06/2026	$ 1.786.892.043,23	91,75%	$ 8.896.234,29	0,46%
105	S-105	14/06/2026	$ 1.793.038.099,74	92,07%	$ 6.146.056,51	0,32%
106	S-106	21/06/2026	$ 1.799.184.156,25	92,38%	$ 6.146.056,51	0,32%
107	S-107	28/06/2026	$ 1.805.330.212,76	92,70%	$ 6.146.056,51	0,32%
108	S-108	5/07/2026	$ 1.811.476.269,27	93,01%	$ 6.146.056,51	0,32%
109	S-109	12/07/2026	$ 1.817.622.325,78	93,33%	$ 6.146.056,51	0,32%
110	S-110	19/07/2026	$ 1.823.768.382,29	93,64%	$ 6.146.056,51	0,32%
111	S-111	26/07/2026	$ 1.829.914.438,80	93,96%	$ 6.146.056,51	0,32%
112	S-112	2/08/2026	$ 1.836.060.495,31	94,27%	$ 6.146.056,51	0,32%
113	S-113	9/08/2026	$ 1.842.206.551,82	94,59%	$ 6.146.056,51	0,32%
114	S-114	16/08/2026	$ 1.848.352.608,33	94,91%	$ 6.146.056,51	0,32%
115	S-115	23/08/2026	$ 1.854.498.664,84	95,22%	$ 6.146.056,51	0,32%
116	S-116	30/08/2026	$ 1.860.644.721,35	95,54%	$ 6.146.056,51	0,32%
117	S-117	6/09/2026	$ 1.866.790.777,86	95,85%	$ 6.146.056,51	0,32%
118	S-118	13/09/2026	$ 1.872.936.834,37	96,17%	$ 6.146.056,51	0,32%
119	S-119	20/09/2026	$ 1.879.082.890,88	96,48%	$ 6.146.056,51	0,32%
120	S-120	27/09/2026	$ 1.885.228.947,39	96,80%	$ 6.146.056,51	0,32%
121	S-121	4/10/2026	$ 1.891.046.732,30	97,10%	$ 5.817.784,91	0,30%
122	S-122	11/10/2026	$ 1.896.626.803,30	97,38%	$ 5.580.071,00	0,29%
123	S-123	18/10/2026	$ 1.902.206.874,30	97,67%	$ 5.580.071,00	0,29%
124	S-124	25/10/2026	$ 1.907.786.945,30	97,96%	$ 5.580.071,00	0,29%
125	S-125	1/11/2026	$ 1.913.367.016,30	98,24%	$ 5.580.071,00	0,29%
126	S-126	8/11/2026	$ 1.918.947.087,30	98,53%	$ 5.580.071,00	0,29%
127	S-127	15/11/2026	$ 1.924.527.158,30	98,82%	$ 5.580.071,00	0,29%
128	S-128	22/11/2026	$ 1.930.107.229,30	99,10%	$ 5.580.071,00	0,29%
129	S-129	29/11/2026	$ 1.935.687.300,30	99,39%	$ 5.580.071,00	0,29%
130	S-130	6/12/2026	$ 1.941.267.371,30	99,68%	$ 5.580.071,00	0,29%
131	S-131	13/12/2026	$ 1.946.847.442,30	99,96%	$ 5.580.071,00	0,29%
132	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 727.468,30	0,04%
					$ 1.947.574.910,60	100%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón
	Directora de Interventoría.
	CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ
