AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	22/06/2024
Semana No	**2**	**DEL :**	15-jun-24	**AL:**	21-jun-24
Plazo Total	25 MESES (Hasta el 31 de julio de 2026)	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		14	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**1,78%**			
Nombre del Supervisor :	**Jorge Beltran**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

VANGUARDIA, AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,00%**	**0,00%**	**(%) Ejecutado**		**0,00%**
Valor programado ($)	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**0,00%**
				Valor Adelanto	**$ 0,00**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	**Contratista:**	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	**Contrato No:**	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	**Valor Inicial:**	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	**Plazo inicial:**	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES	**Plazo actualizado:**	25 MESES
Fecha de iniciación:	6-jun-24	**Fecha de iniciación:**	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	**Valor total actual del contrato:**	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CRONOGRAMA GENERAL: Se solicita al contratista de obra mediante comunicado CO-FJ-1280-018-2024 del dia 20 de junio de 2024, realizar el ajuste al cronograma general presentado la comunicación FAO-CTO-2300116-001-2023 del 04 de junio de 2024, debido a que cuenta con fecha de inicio incorrecta.

AVANCE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA (FASE DE DIAGNOSTICO)

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
INICIO DEL CONTRATO	0 días	jue 6/06/24	jue 6/06/24	
FASE 1 PRELIMINARES	26 días	jue 6/06/24	jue 11/07/24	2
DIAGNOSTICO DE INSTALACIONES	5 días	jue 6/06/24	mié 12/06/24	
CONTRATACION DE PERSONAL	7 días	vie 12/07/24	lun 22/07/24	3
INFORMES DE DIAGNOSTICO	4 días	jue 13/06/24	mar 18/06/24	4
TRAMITES DE INGRESOS DE PERSONAL	7 días	lun 17/06/24	mar 25/06/24	4
ACTIVIDADES DE EMERGENCIA Y PRIORIZACION DE NECESIDADES (SE REALIZARON INSPECCIONES EN GRUPO ELECTROGENO, BAÑOS Y BANDA TRANSPORTADORA Y GABINETES CONTRAINCENDIOS)	624 días	mié 12/06/24	lun 2/11/26	4CC

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

El dia 18 de junio de 2024 se realizó de forma virtual el Comité de seguimiento obra No.1 con la participacion de la Entidad, contratista e interventoria.

Se elaboró el Acta de Comité de seguimiento de obra No.1, la cual se envió el dia 21 de junio de 2024 mediante correo electrónico a los participantes para su revisión y firma.

Se generaron las gestiones para la solicitud de permisos y de Carnet a la Entidad, para el ingreso del personal de obra a las áreas restringidas del Aeropuerto durante este periodo.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA DE OBRA

FAO-CTO-23001163-004-2024	ENTREGA DE DOCUMENTACION VICTOR BUSTOS – GRUPO FAO SAS
FAO-CTO-23001163-006-2024	INFORME REVISIÓN GRUPO ELECTROGENO
FAO-CTO-23001163-009-2024	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROFESIONALES VINCULADOS
FAO-CTO-23001163-010-2024	ENTREGA DE INFORME PRELIMINAR DIAGNOSTICO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA ENTIDAD

	Respuesta a sus comunicados CO-FJ-1280-002-2024 del 17-05-2024, COFJ-1280-005-2024 del 31-05-2024 y CO-FJ-1280-007-2024 del 11-06-2024. Aprobación hojas de vida personal interventoría.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

CORRESPONDENCIA ENVIADA	
CO-FJ-1280-011-2024	ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No.1
CO-FJ-1280-012-2024	SOLICITUD EXPEDICION DE CARNET
CO-FJ-1280-013-2024	ENTREGA DE INFORME PRELIMINAR DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS – COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-006-2024 DEL 13/06/2024
CO-FJ-1280-014-2024	SOLICITUD EXPEDICION DE CARNET
CO-FJ-1280-015-2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL – HOJAS DE VIDA
CO-FJ-1280-016-2024	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PERSONAL DE OBRA – SOLICITUD DE PERMISOS
CO-FJ-1280-017-2024	ENTREGA DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE INICIO.
CO-FJ-1280-018-2024	RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN FAO-CTO-2300116-001-2023 del 4/06/2024 – Programación aeropuerto Villavicencio Vanguardia – GRUPO FAO S.A.S.
CO-FJ-1280-019-2024	RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN FAO-CTO-2300116-009-2023 del 13/06/2024 – Informe preliminar diagnóstico
CO-FJ-1280-020-2024	RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN FAO-CTO-2300116-010-2023 del 18/06/2024 – Hojas de vida personal clave

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA


PERSONAL DE OBRA			
PERSONAL OPERATIVO		PERSONAL ADMINISTRATIVO	
MAESTRO	0	DIRECTOR DE OBRA	1
OFICIAL	0	RESIDENTE DE OBRA	1
AYUDANTE	0	PROFESIONAL SST	1
AYUDANTE	0	ESPECIALISTAS	3
TOTAL	0	TOTAL	6


PERSONAL DE INTERVENTORIA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
PROFESIONAL SST	1
TOTAL	3

Personal de Interventoría	3
Personal del Contratista	6
Total Personal en Obra	9

EQUIPOS EN OBRA:	A la fecha no se cuentan con estos elementos en obra

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

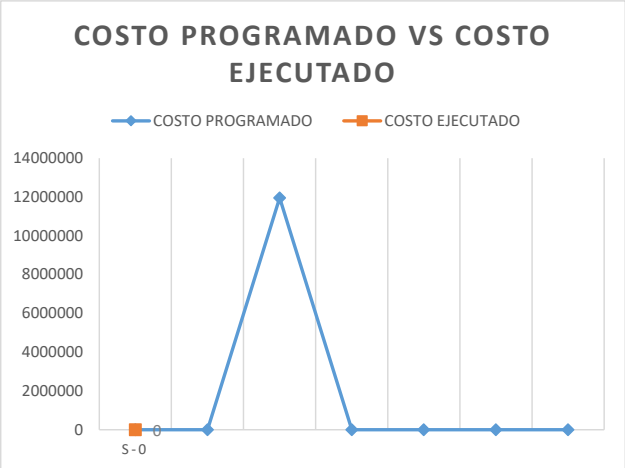

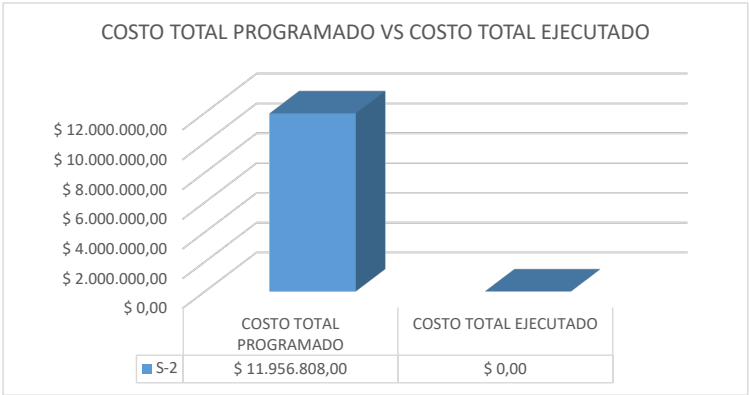

AVANCE FINANCIERO DE OBRA


NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra no se presenta avance financiero

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de interventoría no se presenta avance financiero

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

REGISTRO FOTOGRÁFICO

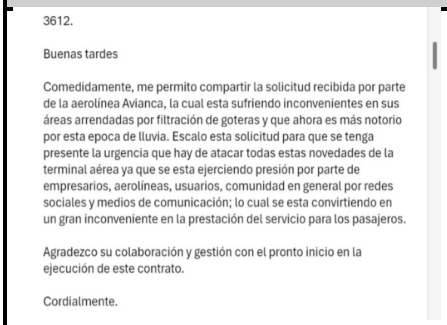


3612.

Buenas tardes

Comedidamente, me permito compartir la solicitud recibida por parte de la aerolínea Avianca, la cual esta sufriendo inconvenientes en sus áreas arrendadas por filtración de goteras y que ahora es más notorio por esta epoca de lluvia. Escalo esta solicitud para que se tenga presente la urgencia que hay de atacar todas estas novedades de la terminal aérea ya que se esta ejerciendo presión por parte de empresarios, aerolíneas, usuarios, comunidad en general por redes sociales y medios de comunicación; lo cual se esta convirtiendo en un gran inconveniente en la prestación del servicio para los pasajeros.

Agradezco su colaboración y gestión con el pronto inicio en la ejecución de este contrato.

Cordialmente.



NOMBRE: Alvaro Ocampo | IDENTIFICACIÓN: CC No. 16673[illegible]

CELULAR: 313871350 | CORREO ELECTRÓNICO: aocampo.han@gmail.com

POR FAVOR DILIGENCIE EN ESTE ESPACIO DE MANERA PRECISA Y DETALLADA LA SUGERENCIA, QUEJA O RECLAMO A REALIZAR.

El problema q.e 2 cornales de baño de Hombres, ellos donde hace mas ruido, & almacen sig. no entran en él!!

aeropuerto.

abandono?

Indiferencia?

Qué imagen me diplomática deja el aeropuerto hacia los visitantes extranjeros?



Descripción imagen 01	Descripción imagen 02	Descripción imagen 03
Se solicita al contratista la atencion prioritaria al iniico de trabajos de mantenimientos del aeropuerto, debido a que se presentan continuas quejas de los usuarios debido al estado actual del Aeropuerto, lo cual debe ser atendido de manera inmediata. Solicitud enviada por usuario.	Se solicita al contratista la atencion prioritaria al iniico de trabajos de mantenimientos del aeropuerto, debido a que se presentan continuas quejas de los usuarios debido al estado actual del Aeropuerto, lo cual debe ser atendido de manera inmediata. Solicitud enviada por usuario.	Se solicita al contratista la atencion prioritaria debido continuas quejas de los usuarios por el estado actual de las bandejas de elementos en las salas de abordaje, observación que forma parte de los hallazgos de contraloría y que afectan directamente a los usuarios durante su paso por el aeropuerto.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Veintidos	(22)	días del mes de	junio	de	2024
(Día en letras)	(Día en Números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

(Firma)

Sandra Yonaira Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

			COSTO PROGRAMADO				EJECUTADO			
			PROGRAMADO							
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL	COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 11.956.808,00	0,61%	$ 11.956.808,00	0,61%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 11.956.808,00	0,61%		0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 11.956.808,00	0,61%		0,00%	$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 11.956.808,00	0,61%		0,00%	$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 11.956.808,00	0,61%		0,00%	$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 57.769.634,61	2,97%	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 116.504.027,71	5,98%	$ 58.734.393,10	3,02%	$ 187.656.630,00	0,00%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 175.238.420,81	9,00%	$ 58.734.393,10	3,02%		0,00%	$ 0,00	0,00%
9	S-9	11/08/2024	$ 233.972.813,91	12,01%	$ 58.734.393,10	3,02%		0,00%	$ 0,00	0,00%
10	S-10	18/08/2024	$ 279.938.165,99	14,37%	$ 45.965.352,08	2,36%		0,00%	$ 0,00	0,00%
11	S-11	25/08/2024	$ 293.068.841,16	15,05%	$ 13.130.675,17	0,67%		0,00%	$ 0,00	0,00%
12	S-12	1/09/2024	$ 306.199.516,33	15,72%	$ 13.130.675,17	0,67%		0,00%	$ 0,00	0,00%
13	S-13	8/09/2024	$ 319.330.191,50	16,40%	$ 13.130.675,17	0,67%		0,00%	$ 0,00	0,00%
14	S-14	15/09/2024	$ 332.460.866,67	17,07%	$ 13.130.675,17	0,67%		0,00%	$ 0,00	0,00%
15	S-15	22/09/2024	$ 348.296.192,58	17,88%	$ 15.835.325,91	0,81%		0,00%	$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	$ 364.894.368,70	18,74%	$ 16.598.176,12	0,85%		0,00%	$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	$ 386.203.836,83	19,83%	$ 21.309.468,13	1,09%		0,00%	$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	$ 413.127.313,98	21,21%	$ 26.923.477,15	1,38%		0,00%	$ 0,00	0,00%
19	S-19	20/10/2024	$ 440.050.791,13	22,59%	$ 26.923.477,15	1,38%		0,00%	$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	$ 466.974.268,28	23,98%	$ 26.923.477,15	1,38%				
21	S-21	3/11/2024	$ 493.897.745,43	25,36%	$ 26.923.477,15	1,38%				
22	S-22	10/11/2024	$ 520.727.686,31	26,74%	$ 26.829.940,88	1,38%				
23	S-23	17/11/2024	$ 547.489.894,04	28,11%	$ 26.762.207,73	1,37%				
24	S-24	24/11/2024	$ 574.252.101,77	29,49%	$ 26.762.207,73	1,37%				
25	S-25	1/12/2024	$ 601.014.309,50	30,86%	$ 26.762.207,73	1,37%				
26	S-26	8/12/2024	$ 625.918.544,22	32,14%	$ 24.904.234,72	1,28%				
27	S-27	15/12/2024	$ 646.169.024,92	33,18%	$ 20.250.480,70	1,04%				
28	S-28	22/12/2024	$ 662.029.752,39	33,99%	$ 15.860.727,47	0,81%				
29	S-29	29/12/2024	$ 675.639.122,47	34,69%	$ 13.609.370,08	0,70%				
30	S-30	5/01/2025	$ 685.575.225,22	35,20%	$ 9.936.102,75	0,51%				
31	S-31	12/01/2025	$ 695.511.327,97	35,71%	$ 9.936.102,75	0,51%				
32	S-32	19/01/2025	$ 705.447.430,72	36,22%	$ 9.936.102,75	0,51%				
33	S-33	26/01/2025	$ 715.723.124,78	36,75%	$ 10.275.694,06	0,53%				
34	S-34	2/02/2025	$ 726.094.601,00	37,28%	$ 10.371.476,22	0,53%				
35	S-35	9/02/2025	$ 736.222.614,04	37,80%	$ 10.128.013,04	0,52%				
36	S-36	16/02/2025	$ 743.550.800,49	38,18%	$ 7.328.186,45	0,38%				
37	S-37	23/02/2025	$ 750.878.986,94	38,55%	$ 7.328.186,45	0,38%				
38	S-38	2/03/2025	$ 769.937.778,75	39,53%	$ 19.058.791,81	0,98%				
39	S-39	9/03/2025	$ 808.135.979,30	41,49%	$ 38.198.200,55	1,96%				
40	S-40	16/03/2025	$ 847.810.571,56	43,53%	$ 39.674.592,26	2,04%				
41	S-41	23/03/2025	$ 888.554.275,07	45,62%	$ 40.743.703,51	2,09%				
42	S-42	30/03/2025	$ 929.297.978,58	47,72%	$ 40.743.703,51	2,09%				
43	S-43	6/04/2025	$ 943.326.188,59	48,44%	$ 14.028.210,01	0,72%				
44	S-44	13/04/2025	$ 953.744.457,20	48,97%	$ 10.418.268,61	0,53%				
45	S-45	20/04/2025	$ 964.163.400,93	49,51%	$ 10.418.943,73	0,53%				
46	S-46	27/04/2025	$ 974.799.742,88	50,05%	$ 10.636.341,95	0,55%				
47	S-47	4/05/2025	$ 984.581.074,23	50,55%	$ 9.781.331,35	0,50%				
48	S-48	11/05/2025	$ 992.055.296,48	50,94%	$ 7.474.222,25	0,38%				
49	S-49	18/05/2025	$ 1.006.879.302,90	51,70%	$ 14.824.006,42	0,76%				
50	S-50	25/05/2025	$ 1.027.025.566,81	52,73%	$ 20.146.263,91	1,03%				
51	S-51	1/06/2025	$ 1.047.171.830,72	53,77%	$ 20.146.263,91	1,03%				
52	S-52	8/06/2025	$ 1.067.318.094,63	54,80%	$ 20.146.263,91	1,03%				
53	S-53	15/06/2025	$ 1.087.464.358,54	55,84%	$ 20.146.263,91	1,03%				
54	S-54	22/06/2025	$ 1.107.340.177,94	56,86%	$ 19.875.819,40	1,02%				
55	S-55	29/06/2025	$ 1.125.983.972,38	57,81%	$ 18.643.794,44	0,96%				
56	S-56	6/07/2025	$ 1.144.627.766,82	58,77%	$ 18.643.794,44	0,96%				
57	S-57	13/07/2025	$ 1.163.271.561,26	59,73%	$ 18.643.794,44	0,96%				
58	S-58	20/07/2025	$ 1.183.238.290,43	60,75%	$ 19.966.729,17	1,03%				
59	S-59	27/07/2025	$ 1.204.163.006,82	61,83%	$ 20.924.716,39	1,07%				
60	S-60	3/08/2025	$ 1.221.591.291,11	62,72%	$ 17.428.284,29	0,89%				
61	S-61	10/08/2025	$ 1.238.033.402,25	63,57%	$ 16.442.111,14	0,84%				
62	S-62	17/08/2025	$ 1.245.671.121,88	63,96%	$ 7.637.719,63	0,39%				
63	S-63	24/08/2025	$ 1.253.129.160,05	64,34%	$ 7.458.038,17	0,38%				
64	S-64	31/08/2025	$ 1.260.322.442,36	64,71%	$ 7.193.282,31	0,37%				
65	S-65	7/09/2025	$ 1.266.834.923,87	65,05%	$ 6.512.481,51	0,33%				
66	S-66	14/09/2025	$ 1.273.347.405,38	65,38%	$ 6.512.481,51	0,33%				
67	S-67	21/09/2025	$ 1.279.690.247,63	65,71%	$ 6.342.842,25	0,33%				
68	S-68	28/09/2025	$ 1.285.910.247,66	66,03%	$ 6.220.000,03	0,32%				
69	S-69	5/10/2025	$ 1.292.130.247,69	66,35%	$ 6.220.000,03	0,32%				
70	S-70	12/10/2025	$ 1.298.350.247,72	66,66%	$ 6.220.000,03	0,32%				
71	S-71	19/10/2025	$ 1.337.850.685,29	68,69%	$ 39.500.437,57	2,03%				
72	S-72	26/10/2025	$ 1.378.030.315,47	70,76%	$ 40.179.630,18	2,06%				
73	S-73	2/11/2025	$ 1.418.209.945,65	72,82%	$ 40.179.630,18	2,06%				
74	S-74	9/11/2025	$ 1.458.389.575,83	74,88%	$ 40.179.630,18	2,06%				
75	S-75	16/11/2025	$ 1.485.208.954,74	76,26%	$ 26.819.378,91	1,38%				
76	S-76	23/11/2025	$ 1.497.830.921,84	76,91%	$ 12.621.967,10	0,65%				
77	S-77	30/11/2025	$ 1.510.652.891,31	77,57%	$ 12.821.969,47	0,66%				
78	S-78	7/12/2025	$ 1.523.474.860,78	78,22%	$ 12.821.969,47	0,66%				
79	S-79	14/12/2025	$ 1.536.296.830,25	78,88%	$ 12.821.969,47	0,66%				
80	S-80	21/12/2025	$ 1.545.045.412,89	79,33%	$ 8.748.582,64	0,45%				
81	S-81	28/12/2025	$ 1.553.305.899,56	79,76%	$ 8.260.486,67	0,42%				
82	S-82	4/01/2026	$ 1.559.721.542,78	80,09%	$ 6.415.643,22	0,33%				
83	S-83	11/01/2026	$ 1.566.137.186,00	80,41%	$ 6.415.643,22	0,33%				
84	S-84	18/01/2026	$ 1.573.104.127,89	80,77%	$ 6.966.941,89	0,36%				
85	S-85	25/01/2026	$ 1.580.996.581,60	81,18%	$ 7.892.453,71	0,41%				
86	S-86	1/02/2026	$ 1.589.126.749,22	81,60%	$ 8.130.167,62	0,42%				
87	S-87	8/02/2026	$ 1.597.022.945,73	82,00%	$ 7.896.196,51	0,41%				

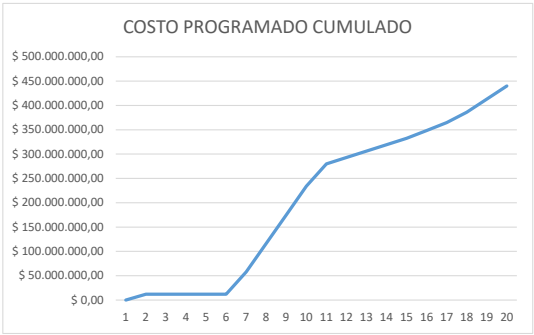





88	S-88	15/02/2026	$ 1.604.853.150,39	82,40%	$ 7.830.204,66	0,40%
89	S-89	22/02/2026	$ 1.612.696.885,38	82,81%	$ 7.843.734,99	0,40%
90	S-90	1/03/2026	$ 1.620.696.219,11	83,22%	$ 7.999.333,73	0,41%
91	S-91	8/03/2026	$ 1.628.489.554,82	83,62%	$ 7.793.335,71	0,40%
92	S-92	15/03/2026	$ 1.637.456.571,32	84,08%	$ 8.967.016,50	0,46%
93	S-93	22/03/2026	$ 1.649.455.457,21	84,69%	$ 11.998.885,89	0,62%
94	S-94	29/03/2026	$ 1.661.728.051,75	85,32%	$ 12.272.594,54	0,63%
95	S-95	5/04/2026	$ 1.676.530.241,63	86,08%	$ 14.802.189,88	0,76%
96	S-96	12/04/2026	$ 1.692.522.829,32	86,90%	$ 15.992.587,69	0,82%
97	S-97	19/04/2026	$ 1.708.515.417,01	87,73%	$ 15.992.587,69	0,82%
98	S-98	26/04/2026	$ 1.716.389.309,33	88,13%	$ 7.873.892,32	0,40%
99	S-99	3/05/2026	$ 1.724.097.513,99	88,53%	$ 7.708.204,66	0,40%
100	S-100	10/05/2026	$ 1.733.774.722,73	89,02%	$ 9.677.208,74	0,50%
101	S-101	17/05/2026	$ 1.748.515.084,80	89,78%	$ 14.740.362,07	0,76%
102	S-102	24/05/2026	$ 1.763.255.446,87	90,54%	$ 14.740.362,07	0,76%
103	S-103	31/05/2026	$ 1.777.995.808,94	91,29%	$ 14.740.362,07	0,76%
104	S-104	7/06/2026	$ 1.786.892.043,23	91,75%	$ 8.896.234,29	0,46%
105	S-105	14/06/2026	$ 1.793.038.099,74	92,07%	$ 6.146.056,51	0,32%
106	S-106	21/06/2026	$ 1.799.184.156,25	92,38%	$ 6.146.056,51	0,32%
107	S-107	28/06/2026	$ 1.805.330.212,76	92,70%	$ 6.146.056,51	0,32%
108	S-108	5/07/2026	$ 1.811.476.269,27	93,01%	$ 6.146.056,51	0,32%
109	S-109	12/07/2026	$ 1.817.622.325,78	93,33%	$ 6.146.056,51	0,32%
110	S-110	19/07/2026	$ 1.823.768.382,29	93,64%	$ 6.146.056,51	0,32%
111	S-111	26/07/2026	$ 1.829.914.438,80	93,96%	$ 6.146.056,51	0,32%
112	S-112	2/08/2026	$ 1.836.060.495,31	94,27%	$ 6.146.056,51	0,32%
113	S-113	9/08/2026	$ 1.842.206.551,82	94,59%	$ 6.146.056,51	0,32%
114	S-114	16/08/2026	$ 1.848.352.608,33	94,91%	$ 6.146.056,51	0,32%
115	S-115	23/08/2026	$ 1.854.498.664,84	95,22%	$ 6.146.056,51	0,32%
116	S-116	30/08/2026	$ 1.860.644.721,35	95,54%	$ 6.146.056,51	0,32%
117	S-117	6/09/2026	$ 1.866.790.777,86	95,85%	$ 6.146.056,51	0,32%
118	S-118	13/09/2026	$ 1.872.936.834,37	96,17%	$ 6.146.056,51	0,32%
119	S-119	20/09/2026	$ 1.879.082.890,88	96,48%	$ 6.146.056,51	0,32%
120	S-120	27/09/2026	$ 1.885.228.947,39	96,80%	$ 6.146.056,51	0,32%
121	S-121	4/10/2026	$ 1.891.046.732,30	97,10%	$ 5.817.784,91	0,30%
122	S-122	11/10/2026	$ 1.896.626.803,30	97,38%	$ 5.580.071,00	0,29%
123	S-123	18/10/2026	$ 1.902.206.874,30	97,67%	$ 5.580.071,00	0,29%
124	S-124	25/10/2026	$ 1.907.786.945,30	97,96%	$ 5.580.071,00	0,29%
125	S-125	1/11/2026	$ 1.913.367.016,30	98,24%	$ 5.580.071,00	0,29%
126	S-126	8/11/2026	$ 1.918.947.087,30	98,53%	$ 5.580.071,00	0,29%
127	S-127	15/11/2026	$ 1.924.527.158,30	98,82%	$ 5.580.071,00	0,29%
128	S-128	22/11/2026	$ 1.930.107.229,30	99,10%	$ 5.580.071,00	0,29%
129	S-129	29/11/2026	$ 1.935.687.300,30	99,39%	$ 5.580.071,00	0,29%
130	S-130	6/12/2026	$ 1.941.267.371,30	99,68%	$ 5.580.071,00	0,29%
131	S-131	13/12/2026	$ 1.946.847.442,30	99,96%	$ 5.580.071,00	0,29%
132	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 727.468,30	0,04%
					$ 1.947.574.910,60	100%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón
	Directora de Interventoría.
	CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ
