AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	29/06/2024
Semana No	**3**	**DEL :**	22-jun-24	**AL:**	28-jun-24
Plazo Total	25 MESES (Hasta el 31 de julio de 2026)	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		22	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**2,80%**			
Nombre del Supervisor :	**Jorge Beltran**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

VANGUARDIA, AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,00%**	**0,00%**	**(%) Ejecutado**		**0,00%**
Valor programado ($)	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**0,00%**
				Valor Adelanto	**$ 0,00**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	**Contratista:**	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	**Contrato No:**	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	**Valor Inicial:**	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	**Plazo inicial:**	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES	**Plazo actualizado:**	25 MESES
Fecha de iniciación:	6-jun-24	**Fecha de iniciación:**	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	**Valor total actual del contrato:**	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CRONOGRAMA GENERAL: Se solicita al contratista de obra mediante comunicado CO-FJ-1280-018-2024 del dia 20 de junio de 2024, realizar el ajuste al cronograma general presentado la comunicación FAO-CTO-2300116-001-2023 del 04 de junio de 2024.El dial 24 de del mes en curso, el contratista debio iniciar las actividades de los items 1.3.8.1 y 1.3.8.2 y en paralelo la atención de emergencias. Dicha gestión no fue atendida de conformidad en esta semana y por lo tanto se reporta un atraso de el 2%, respecto a la programación del tiempo.

AVANCE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA (FASE DE DIAGNOSTICO: En la semana 1 y 2 se realizó el recorrido a las instalaciones con participación del la Entidad, Contratista e interventoria. Aun esta pendiente por parte del contratista la entrega del diagnóstico con el cumplimiento de requisitos.

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

El día lunes 24/06/2024, se realizan gestiones para obtención de permisos de dos (2) trabajadores del contratista, quienes iniciarán trabajos nocturnos de mantenimiento en los baños del primer piso, este día se inician los trabajos y se realiza la señalización del sector, indicando a usuarios que se están realizando trabajos de mantenimiento.

El contratista de obra realiza el cerramiento del sector de gabinete contraincendios del primer piso, debido a que se requiere su intervención inmediata, dados los daños que presente la tubería la cual genera pemanente goteo de agua. Fecha: 24/06/2024.

El contratista de obra realiza visita el 24/06/2024, para verificación del estado y generar diagnóstico en equipos electromecánicos, los cuales requieren el mantenimiento a cotro plazo.

Se elaboró acta de seguimiento de obra #2, enviada el dia 29 de junio, día en el cual se realiza el segundo comité de seguimiento de obra.

El contratista adelanta las diligencias relacionadas con el cumplimiento de requisitos en SST para inciar la intervención de la reparación de la tubería del tanque depósito de agua del area de bomberos.

Se continuan realizando las gestiones para la solicitud de permisos y de Carnet a la Entidad, lo cual permita el ingreso del personal de obra opretativo, a las áreas restringidas del Aeropuerto, personal del contratista para aumento de cuadrillas para labores de mantenimiento en ejecución contractual.

Se instala señalización en la zona de trabajo de los baños del primer piso del área de la sala de espera exterior. Fecha: 24/06/2024.

Se hace recorrido de las intalaciones aeroportuarias con la participación de todas las partes, contratista, interventoría y administradora del aeropuerto, en acompañamiento de los residentes de obra y de la intervetoria. Fecha: 27 de junio de 2024, con el proposito de corroborar las áreas donde existe una necesidad de priorizar la intervencion de las obras de mantenimiento.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA DE OBRA	
FAO-CTO-23001163-014-2024	MINUTA BORRADOR CONTRATO FIDUCIARIO – GRUPO FAO SAS
FAO-CTO-23001163-014-2024	COTIZACION REPARACION TUBO TANQUE DE RESERVA AREA DE BOMBEROS
FAO-CTO-23001163-015-2024	SOLICITUD DE PLANOS ELECTRICOS, HIDRAULICOS Y DIAGRAMA UNIFILAR.
FAO-CTO-23001163-016-2024	NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA
FAO-CTO-23001163-017-2024	RESPUESTA CO-FJ-1280-018-2024 PROGRAMACION AEROPUERTO VILLAVICENCIO VANGUARDIA – GRUPO FAO SAS
FAO-CTO-23001163-018-2024	RESPUESTA CO-FJ-1280-013-2024 INFORME GRUPO ELECTRÓGENO.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA ENTIDAD	
2024262000020050*	Solicitud Perentorio por retraso ejecución de actividades contrato de mantenimiento No. 23001163 H4 de 2023 del Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio.
CORRESPONDENCIA ENVIADA	
CO-FJ-1280-021-2024	ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No.2
CO-FJ-1280-022-2024	ENTREGA PLAN DE CARGAS CONTRATO DE INTERVENTORIA
CO-FJ-1280-023-2024	RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN FAO-CTO-2300116-012-2023 del 21/06/2024 – Hojas de vida personal clave
CO-FJ-1280-024-2024	RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-014-2024 del 24062024 – MINUTA BORRADOR CONTRATO FIDUCIARIO – GRUPO FAO SAS
CO-FJ-1280-025-2024	CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL DE OBRA			
PERSONAL OPERATIVO		**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	
MAESTRO	2	DIRECTOR DE OBRA	1
OFICIAL	0	RESIDENTE DE OBRA	1
AYUDANTE	4	PROFESIONAL SST	1
AYUDANTE	4	ESPECIALISTAS	3
TOTAL	**10**	**TOTAL**	**6**

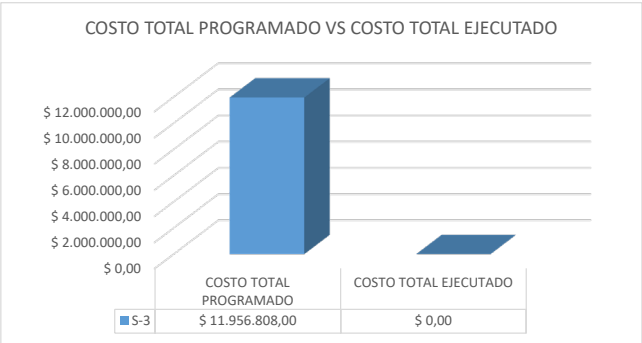
PERSONAL DE INTERVENTORIA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
PROFESIONAL SST	1
TOTAL	**3**

Personal de Interventoría	**3**
Personal del Contratista	**16**
Total Personal en Obra	**19**

EQUIPOS EN OBRA:	A la fecha no se cuentan con estos elementos en obra

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)



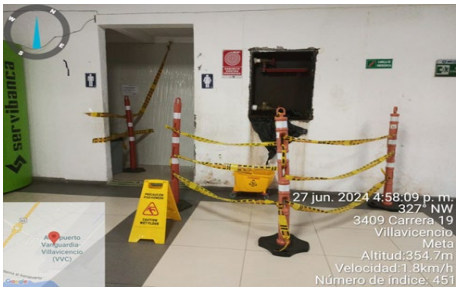
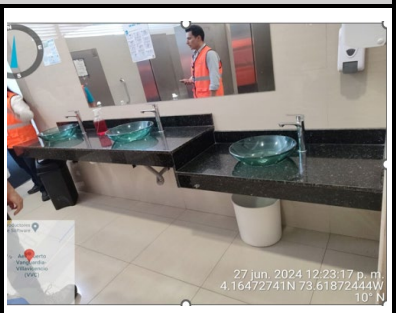

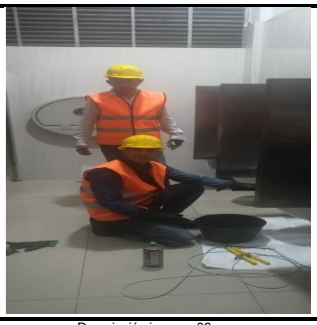
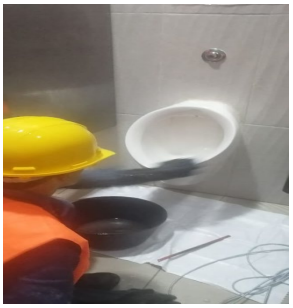


AVANCE FINANCIERO DE OBRA	
NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra no se presenta avance financiero

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA	
NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de interventoría no se presenta avance financiero

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Descripción imagen 01	Descripción imagen 02	Descripción imagen 03
Se solicita al contratista la atención de carácter urgente el mantenimiento correctivo de la tubería del tanque elevado, previo el cumplimiento de requisitos contractuales y legales para este tipo de actividades.	El contratista realiza la señalización de la zona donde se está ejecutando el inicio de mantenimiento de obra civil en el gabinete contraincendio y baños de primer piso (baños sala de espera exterior del primer piso).	El estado actual de los lavamanos de los baños en general, obligan a realizar el mantenimieto correctivo de elementos para que sean funcionales e higiénicos, los cuales presentan daños en tubería, fractura en mesón y pozetas.
		
Descripción imagen 04	Descripción imagen 05	Descripción imagen 06
Se observa la oficina de interventoría y contratista, durante el presente periodo ya se cuenta con la presencia del contratisa de obra en el sitio asignado por la Entidad. Fecha: 25/06/2024.	Se realizan trabajos de desmonte de orinales y láminas divisorias del baño de hombres del primer piso, con el fin de realizar mantenimiento correctivo y ubicación funcional de los mismos. Fecha: 24/06/2024.	Se realizan trabajos de desmonte, organización y limpieza en la zona de trabajo. Mantenimientos correctivos dado que no se contaba con funcionalidad de estos elementos. Fecha: 24/06/2024.
		
Descripción imagen 07	Descripción imagen 08	Descripción imagen 09
El contratista de obra realiza permanente limpieza y organización de escombros en lonas como cumplimiento a las obligaciones contractuales relacionadas con la disposición final de los mismos. Fecha: Desde el 24/06/2024 al 28/06/2024.	Personal del contratista debidamente carnetizado y con elementos de protección personal para el cumplimiento de los trabajos de obra. Fecha: Desde el 24/06/2024 al 28/06/2024.	El contratista de obra realiza trabajos de limpieza de orinales, verificando el estado físico de los mismos, encontrando tuberías tapadas, alturas bajas de estos orinales, dificultando su uso.. Fecha: 24/06/2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

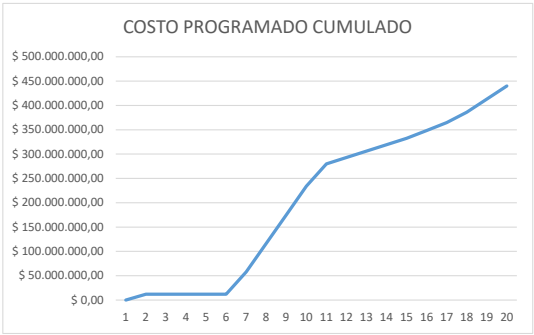
Veintinueve (29) días del mes de junio de 2024

(Día en letras) (Día en Números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

Sandra Yonaira Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ


			COSTO PROGRAMADO				EJECUTADO			
			PROGRAMADO							
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL	COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 11.956.808,00	0,61%	$ 11.956.808,00	0,61%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 11.956.808,00	0,61%		0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 11.956.808,00	0,61%		0,00%	$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 11.956.808,00	0,61%		0,00%	$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 11.956.808,00	0,61%		0,00%	$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 57.769.634,61	2,97%	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 116.504.027,71	5,98%	$ 58.734.393,10	3,02%	$ 187.656.630,00	0,00%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 175.238.420,81	9,00%	$ 58.734.393,10	3,02%		0,00%	$ 0,00	0,00%
9	S-9	11/08/2024	$ 233.972.813,91	12,01%	$ 58.734.393,10	3,02%		0,00%	$ 0,00	0,00%
10	S-10	18/08/2024	$ 279.938.165,99	14,37%	$ 45.965.352,08	2,36%		0,00%	$ 0,00	0,00%
11	S-11	25/08/2024	$ 293.068.841,16	15,05%	$ 13.130.675,17	0,67%		0,00%	$ 0,00	0,00%
12	S-12	1/09/2024	$ 306.199.516,33	15,72%	$ 13.130.675,17	0,67%		0,00%	$ 0,00	0,00%
13	S-13	8/09/2024	$ 319.330.191,50	16,40%	$ 13.130.675,17	0,67%		0,00%	$ 0,00	0,00%
14	S-14	15/09/2024	$ 332.460.866,67	17,07%	$ 13.130.675,17	0,67%		0,00%	$ 0,00	0,00%
15	S-15	22/09/2024	$ 348.296.192,58	17,88%	$ 15.835.325,91	0,81%		0,00%	$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	$ 364.894.368,70	18,74%	$ 16.598.176,12	0,85%		0,00%	$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	$ 386.203.836,83	19,83%	$ 21.309.468,13	1,09%		0,00%	$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	$ 413.127.313,98	21,21%	$ 26.923.477,15	1,38%		0,00%	$ 0,00	0,00%
19	S-19	20/10/2024	$ 440.050.791,13	22,59%	$ 26.923.477,15	1,38%		0,00%	$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	$ 466.974.268,28	23,98%	$ 26.923.477,15	1,38%				
21	S-21	3/11/2024	$ 493.897.745,43	25,36%	$ 26.923.477,15	1,38%				
22	S-22	10/11/2024	$ 520.727.686,31	26,74%	$ 26.829.940,88	1,38%				
23	S-23	17/11/2024	$ 547.489.894,04	28,11%	$ 26.762.207,73	1,37%				
24	S-24	24/11/2024	$ 574.252.101,77	29,49%	$ 26.762.207,73	1,37%				
25	S-25	1/12/2024	$ 601.014.309,50	30,86%	$ 26.762.207,73	1,37%				
26	S-26	8/12/2024	$ 625.918.544,22	32,14%	$ 24.904.234,72	1,28%				
27	S-27	15/12/2024	$ 646.169.024,92	33,18%	$ 20.250.480,70	1,04%				
28	S-28	22/12/2024	$ 662.029.752,39	33,99%	$ 15.860.727,47	0,81%				
29	S-29	29/12/2024	$ 675.639.122,47	34,69%	$ 13.609.370,08	0,70%				
30	S-30	5/01/2025	$ 685.575.225,22	35,20%	$ 9.936.102,75	0,51%				
31	S-31	12/01/2025	$ 695.511.327,97	35,71%	$ 9.936.102,75	0,51%				
32	S-32	19/01/2025	$ 705.447.430,72	36,22%	$ 9.936.102,75	0,51%				
33	S-33	26/01/2025	$ 715.723.124,78	36,75%	$ 10.275.694,06	0,53%				
34	S-34	2/02/2025	$ 726.094.601,00	37,28%	$ 10.371.476,22	0,53%				
35	S-35	9/02/2025	$ 736.222.614,04	37,80%	$ 10.128.013,04	0,52%				
36	S-36	16/02/2025	$ 743.550.800,49	38,18%	$ 7.328.186,45	0,38%				
37	S-37	23/02/2025	$ 750.878.986,94	38,55%	$ 7.328.186,45	0,38%				
38	S-38	2/03/2025	$ 769.937.778,75	39,53%	$ 19.058.791,81	0,98%				
39	S-39	9/03/2025	$ 808.135.979,30	41,49%	$ 38.198.200,55	1,96%				
40	S-40	16/03/2025	$ 847.810.571,56	43,53%	$ 39.674.592,26	2,04%				
41	S-41	23/03/2025	$ 888.554.275,07	45,62%	$ 40.743.703,51	2,09%				
42	S-42	30/03/2025	$ 929.297.978,58	47,72%	$ 40.743.703,51	2,09%				
43	S-43	6/04/2025	$ 943.326.188,59	48,44%	$ 14.028.210,01	0,72%				
44	S-44	13/04/2025	$ 953.744.457,20	48,97%	$ 10.418.268,61	0,53%				
45	S-45	20/04/2025	$ 964.163.400,93	49,51%	$ 10.418.943,73	0,53%				
46	S-46	27/04/2025	$ 974.799.742,88	50,05%	$ 10.636.341,95	0,55%				
47	S-47	4/05/2025	$ 984.581.074,23	50,55%	$ 9.781.331,35	0,50%				
48	S-48	11/05/2025	$ 992.055.296,48	50,94%	$ 7.474.222,25	0,38%				
49	S-49	18/05/2025	$ 1.006.879.302,90	51,70%	$ 14.824.006,42	0,76%				
50	S-50	25/05/2025	$ 1.027.025.566,81	52,73%	$ 20.146.263,91	1,03%				
51	S-51	1/06/2025	$ 1.047.171.830,72	53,77%	$ 20.146.263,91	1,03%				
52	S-52	8/06/2025	$ 1.067.318.094,63	54,80%	$ 20.146.263,91	1,03%				
53	S-53	15/06/2025	$ 1.087.464.358,54	55,84%	$ 20.146.263,91	1,03%				
54	S-54	22/06/2025	$ 1.107.340.177,94	56,86%	$ 19.875.819,40	1,02%				
55	S-55	29/06/2025	$ 1.125.983.972,38	57,81%	$ 18.643.794,44	0,96%				
56	S-56	6/07/2025	$ 1.144.627.766,82	58,77%	$ 18.643.794,44	0,96%				
57	S-57	13/07/2025	$ 1.163.271.561,26	59,73%	$ 18.643.794,44	0,96%				
58	S-58	20/07/2025	$ 1.183.238.290,43	60,75%	$ 19.966.729,17	1,03%				
59	S-59	27/07/2025	$ 1.204.163.006,82	61,83%	$ 20.924.716,39	1,07%				
60	S-60	3/08/2025	$ 1.221.591.291,11	62,72%	$ 17.428.284,29	0,89%				
61	S-61	10/08/2025	$ 1.238.033.402,25	63,57%	$ 16.442.111,14	0,84%				
62	S-62	17/08/2025	$ 1.245.671.121,88	63,96%	$ 7.637.719,63	0,39%				
63	S-63	24/08/2025	$ 1.253.129.160,05	64,34%	$ 7.458.038,17	0,38%				
64	S-64	31/08/2025	$ 1.260.322.442,36	64,71%	$ 7.193.282,31	0,37%				
65	S-65	7/09/2025	$ 1.266.834.923,87	65,05%	$ 6.512.481,51	0,33%				
66	S-66	14/09/2025	$ 1.273.347.405,38	65,38%	$ 6.512.481,51	0,33%				
67	S-67	21/09/2025	$ 1.279.690.247,63	65,71%	$ 6.342.842,25	0,33%				
68	S-68	28/09/2025	$ 1.285.910.247,66	66,03%	$ 6.220.000,03	0,32%				
69	S-69	5/10/2025	$ 1.292.130.247,69	66,35%	$ 6.220.000,03	0,32%				
70	S-70	12/10/2025	$ 1.298.350.247,72	66,66%	$ 6.220.000,03	0,32%				
71	S-71	19/10/2025	$ 1.337.850.685,29	68,69%	$ 39.500.437,57	2,03%				
72	S-72	26/10/2025	$ 1.378.030.315,47	70,76%	$ 40.179.630,18	2,06%				
73	S-73	2/11/2025	$ 1.418.209.945,65	72,82%	$ 40.179.630,18	2,06%				
74	S-74	9/11/2025	$ 1.458.389.575,83	74,88%	$ 40.179.630,18	2,06%				
75	S-75	16/11/2025	$ 1.485.208.954,74	76,26%	$ 26.819.378,91	1,38%				
76	S-76	23/11/2025	$ 1.497.830.921,84	76,91%	$ 12.621.967,10	0,65%				
77	S-77	30/11/2025	$ 1.510.652.891,31	77,57%	$ 12.821.969,47	0,66%				
78	S-78	7/12/2025	$ 1.523.474.860,78	78,22%	$ 12.821.969,47	0,66%				
79	S-79	14/12/2025	$ 1.536.296.830,25	78,88%	$ 12.821.969,47	0,66%				
80	S-80	21/12/2025	$ 1.545.045.412,89	79,33%	$ 8.748.582,64	0,45%				
81	S-81	28/12/2025	$ 1.553.305.899,56	79,76%	$ 8.260.486,67	0,42%				
82	S-82	4/01/2026	$ 1.559.721.542,78	80,09%	$ 6.415.643,22	0,33%				
83	S-83	11/01/2026	$ 1.566.137.186,00	80,41%	$ 6.415.643,22	0,33%				
84	S-84	18/01/2026	$ 1.573.104.127,89	80,77%	$ 6.966.941,89	0,36%				
85	S-85	25/01/2026	$ 1.580.996.581,60	81,18%	$ 7.892.453,71	0,41%				
86	S-86	1/02/2026	$ 1.589.126.749,22	81,60%	$ 8.130.167,62	0,42%				
87	S-87	8/02/2026	$ 1.597.022.945,73	82,00%	$ 7.896.196,51	0,41%				







88	S-88	15/02/2026	$ 1.604.853.150,39	82,40%	$ 7.830.204,66	0,40%
89	S-89	22/02/2026	$ 1.612.696.885,38	82,81%	$ 7.843.734,99	0,40%
90	S-90	1/03/2026	$ 1.620.696.219,11	83,22%	$ 7.999.333,73	0,41%
91	S-91	8/03/2026	$ 1.628.489.554,82	83,62%	$ 7.793.335,71	0,40%
92	S-92	15/03/2026	$ 1.637.456.571,32	84,08%	$ 8.967.016,50	0,46%
93	S-93	22/03/2026	$ 1.649.455.457,21	84,69%	$ 11.998.885,89	0,62%
94	S-94	29/03/2026	$ 1.661.728.051,75	85,32%	$ 12.272.594,54	0,63%
95	S-95	5/04/2026	$ 1.676.530.241,63	86,08%	$ 14.802.189,88	0,76%
96	S-96	12/04/2026	$ 1.692.522.829,32	86,90%	$ 15.992.587,69	0,82%
97	S-97	19/04/2026	$ 1.708.515.417,01	87,73%	$ 15.992.587,69	0,82%
98	S-98	26/04/2026	$ 1.716.389.309,33	88,13%	$ 7.873.892,32	0,40%
99	S-99	3/05/2026	$ 1.724.097.513,99	88,53%	$ 7.708.204,66	0,40%
100	S-100	10/05/2026	$ 1.733.774.722,73	89,02%	$ 9.677.208,74	0,50%
101	S-101	17/05/2026	$ 1.748.515.084,80	89,78%	$ 14.740.362,07	0,76%
102	S-102	24/05/2026	$ 1.763.255.446,87	90,54%	$ 14.740.362,07	0,76%
103	S-103	31/05/2026	$ 1.777.995.808,94	91,29%	$ 14.740.362,07	0,76%
104	S-104	7/06/2026	$ 1.786.892.043,23	91,75%	$ 8.896.234,29	0,46%
105	S-105	14/06/2026	$ 1.793.038.099,74	92,07%	$ 6.146.056,51	0,32%
106	S-106	21/06/2026	$ 1.799.184.156,25	92,38%	$ 6.146.056,51	0,32%
107	S-107	28/06/2026	$ 1.805.330.212,76	92,70%	$ 6.146.056,51	0,32%
108	S-108	5/07/2026	$ 1.811.476.269,27	93,01%	$ 6.146.056,51	0,32%
109	S-109	12/07/2026	$ 1.817.622.325,78	93,33%	$ 6.146.056,51	0,32%
110	S-110	19/07/2026	$ 1.823.768.382,29	93,64%	$ 6.146.056,51	0,32%
111	S-111	26/07/2026	$ 1.829.914.438,80	93,96%	$ 6.146.056,51	0,32%
112	S-112	2/08/2026	$ 1.836.060.495,31	94,27%	$ 6.146.056,51	0,32%
113	S-113	9/08/2026	$ 1.842.206.551,82	94,59%	$ 6.146.056,51	0,32%
114	S-114	16/08/2026	$ 1.848.352.608,33	94,91%	$ 6.146.056,51	0,32%
115	S-115	23/08/2026	$ 1.854.498.664,84	95,22%	$ 6.146.056,51	0,32%
116	S-116	30/08/2026	$ 1.860.644.721,35	95,54%	$ 6.146.056,51	0,32%
117	S-117	6/09/2026	$ 1.866.790.777,86	95,85%	$ 6.146.056,51	0,32%
118	S-118	13/09/2026	$ 1.872.936.834,37	96,17%	$ 6.146.056,51	0,32%
119	S-119	20/09/2026	$ 1.879.082.890,88	96,48%	$ 6.146.056,51	0,32%
120	S-120	27/09/2026	$ 1.885.228.947,39	96,80%	$ 6.146.056,51	0,32%
121	S-121	4/10/2026	$ 1.891.046.732,30	97,10%	$ 5.817.784,91	0,30%
122	S-122	11/10/2026	$ 1.896.626.803,30	97,38%	$ 5.580.071,00	0,29%
123	S-123	18/10/2026	$ 1.902.206.874,30	97,67%	$ 5.580.071,00	0,29%
124	S-124	25/10/2026	$ 1.907.786.945,30	97,96%	$ 5.580.071,00	0,29%
125	S-125	1/11/2026	$ 1.913.367.016,30	98,24%	$ 5.580.071,00	0,29%
126	S-126	8/11/2026	$ 1.918.947.087,30	98,53%	$ 5.580.071,00	0,29%
127	S-127	15/11/2026	$ 1.924.527.158,30	98,82%	$ 5.580.071,00	0,29%
128	S-128	22/11/2026	$ 1.930.107.229,30	99,10%	$ 5.580.071,00	0,29%
129	S-129	29/11/2026	$ 1.935.687.300,30	99,39%	$ 5.580.071,00	0,29%
130	S-130	6/12/2026	$ 1.941.267.371,30	99,68%	$ 5.580.071,00	0,29%
131	S-131	13/12/2026	$ 1.946.847.442,30	99,96%	$ 5.580.071,00	0,29%
132	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 727.468,30	0,04%
					$ 1.947.574.910,60	100%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón
	Directora de Interventoría.
	CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ
