AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	20/07/2024
Semana No	**5**	**DEL :**	6-jul-24	**AL:**	12-jul-24
Plazo Total	25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		37	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**4,71%**			
Nombre del Supervisor :	**Jorge Beltran**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

VANGUARDIA, AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,00%**	**0,00%**	**(%) Ejecutado**	**0,43%**	**0,74%**
Valor programado ($)	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 8.374.572,12**	**$ 14.426.535,12**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**0,74%**
				Valor Adelanto	**$ 14.426.535,12**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	**Contratista:**	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	**Contrato No:**	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	**Valor Inicial:**	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	**Plazo inicial:**	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES	**Plazo actualizado:**	25 MESES
Fecha de iniciación:	6-jun-24	**Fecha de iniciación:**	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	**Valor total actual del contrato:**	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realizó una reunión con la Dra. Luz Miryam Santiago, Ing. Ambiental Yolima Herrera. Arq. Mitchelle Angarita, Ing. Edgar Salinas, Ing. Pablo Ordoñez.

Temas tratados:
•La gerencia socita el mantenimiento en el baño de las mujeres también tiene que hacerse lo necesario para ponerlo en condiciones similares al baño de los hombres. Se informa que los días 14,15 y 16 de agosto se tendrá la visita de personajes distinguidos y que, en consideración a esto, se debe iniciar intervenciones por el área de salida de pasajeros; haciendo lo necesario en el mantenimiento que ser requiera a baños y fachadas. La ingeniera Ambiental expone los lineamientos que se deben tener en cuenta con lo estipulado en le PMA del aeropuerto. PS-GJ-1.1.2.6.19.3325 del 16 de diciembre de 2019. Las fichas que el contratista debe diligenciar son: PM-OC-02; PM-OC-03, PM-OC-05; PM-OC-07; PM-OC-08; PM-OC-13; PM-OC-16; PM-OC-19; PM-OC-21.

• Reunión con la Dra. Miriyam Santiago, para: presentar responsables del aeropuerto en temas relacionados con instalaciones eléctricas y equipos electrógenos; para socializar el alcance del proyecto y las prioridades que actualmente tiene el aeropuerto en relación con los mantenimientos en la red eléctrica. Participan los Ingenieros Jorge Antolínez, Ing. Julio, Ing. Gabriel.

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

•Se realiza mantenimiento en el baño del primer piso, se adelantaron las actividades de enchape de muro, arreglo de tuberías de orinales, limpieza de los canales y cubierta.
•Se realiza la limpieza de muros exteriores cuartos de sanidad, para su posterior estucado y pintura.
•Se realiza reparación de fuga de agua en la zona de bombero. Tubería de 1/2”
•Un especialista hidráulico hace visita en el sitio para la revisión de la tubería reparada del gabinete de la red contra incendios.
•El contratista hace una inspección a las vías de ingreso al aeropuerto, para documentar su estado.
•Se realiza el mantenimiento de dos (02) filtros a los equipos electrógenos.
•Se inicia al mantenimiento de aires acondicionados, empezando por el aire de la zona exterior a la oficina de gerencia.
•Inicio de actividades de mantenimiento en la sala de abordaje #1. Donde se realizan actividades de limpieza de pisos, pintura de elementos metálicos, limpieza de vidrios, reparación de humedades en los baños.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FAO-CTO-23001163-026-2024	INFORME SEMANAL 4
FAO-CTO-23001163-027-2024	PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA 5
FAO-CTO-23001163-027-2024	ENTREGA PLAN DE TRABAJO
FAO-CTO-23001163-028-2024	ENTREGA PLAN DE SEGURIDAD
FAO-CTO-23001163-030-2024	ENTREGA PLAN DE MANTENIMIENTO
FAO-CTO-23001163-031-2024	DOCUMENTOS RESIDENTE DE OBRA WILLIAM ANDRES CAVIEDES CAHUEÑO- GRUPO FAO SAS.
FAO-CTO-23001163-033-2024	PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO- GRUPO FAO SAS.
FAO-CTO-23001163-034-2024	PLAN DE GESTION SST
FAO-CTO-23001163-035-2024	PROGRAMA DE GERENCIA - GRUPO FAO SAS.
FAO-CTO-23001163-036-2024	MINUTA BORRADOR CONTRATO FIDUCIARIO – GRUPO FAO SAS
FAO-CTO-23001163-037-2024	COTIZACIÓN BAÑO DE HOMBRES - GRUPO FAO SAS
FAO-CTO-23001163-036-2024	PROPUESTA VALLA AEROPUERTO
FAO-CTO-23001163-037-2024	DIAGNOSTICO DE VIAS AEROPUERTO VANGUARDIA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

FAO-CTO-23001163-038-2024	COTIZACIÓN BAÑO DE HOMBRES - GRUPO FAO SAS.
FAO-CTO-23001163-039-2024	PROPUESTA VALLA AEROPUERTO
FAO-CTO-23001163-040-2024	COTIZACIÓN GRUPO ELECTROGENOS - GRUPO FAO SAS.
FAO-CTO-23001163-041-2024	DOCUMENTACION ESPECIALISTA ELECTRICO, ESPECIALISTA HIDRAULICO - GRUPO FAO SAS
FAO-CTO-23001163-042-2024	LISTA DE PROVEEDORES - GRUPO FAO SAS.
FAO-CTO-23001163-043-2024	PROPUESTA VALLA AEROPUERTO
FAO-CTO-23001163-044-2024	ANCLAJES DE CUBIERTA - GRUPO FAO SAS.
FAO-CTO-23001163-045-2024	FORMATO AUTORIZACION DE ACTIVIDADES

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CO-FJ-1280-037-2027	RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0027-2024 PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA 5.
CO-FJ-1280-038-2027	ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No.4
CO-FJ-1280-039-2027	ESPECIFICACIONES DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL CONTRATO
CO-FJ-1280-040-2027	RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-031-2024. DOCUMENTOS
CO-FJ-1280-041-2027	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SST PARA TRABAJO EN ALTURAS.
CO-FJ-1280-042-2027	RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0039-2024 - PROPUESTA VALLA AEROPUERTO, DEL 10 DE JULIO DE 2024.
CO-FJ-1280-043-2027	Respuesta a la comunicación FAO-CTO-23001163-040-2024. COTIZACIÓN GRUPO ELECTROGENOS - GRUPO FAO SAS; ESPECIFICACIONES DE ACTIVIDAD NO PREVISTAS EN EL CONTRATO.
CO-FJ-1280-044-2027	Respuesta a la comunicación FAO-CTO-23001163-023-2024. COTIZACIONESMANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL BAÑO - GRUPO FAO
CO-FJ-1280-045-2027	RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-2300116-036-2024 del 09/07/2024 – MINUTA BORRADOR CONTRATO FIDUCIARIO – GRUPO FAO SAS.
CO-FJ-1280-046-2027	ENTREGA PROPUESTA VALLA PUBLICITARIA VERSION 3.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL DE OBRA			
PERSONAL OPERATIVO		PERSONAL ADMINISTRATIVO	
MAESTRO	1	DIRECTOR DE OBRA	1
OFICIAL	2	RESIDENTE DE OBRA	1
AYUDANTE	5	PROFESIONAL SST	1
TOTAL	8	TOTAL	3


PERSONAL DE INTERVENTORIA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
PROFESIONAL SST	1
TOTAL	3

Personal de Interventoría	3
Personal del Contratista	11
Total Personal en Obra	14

EQUIPOS EN OBRA:	Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, herramienta menor

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)



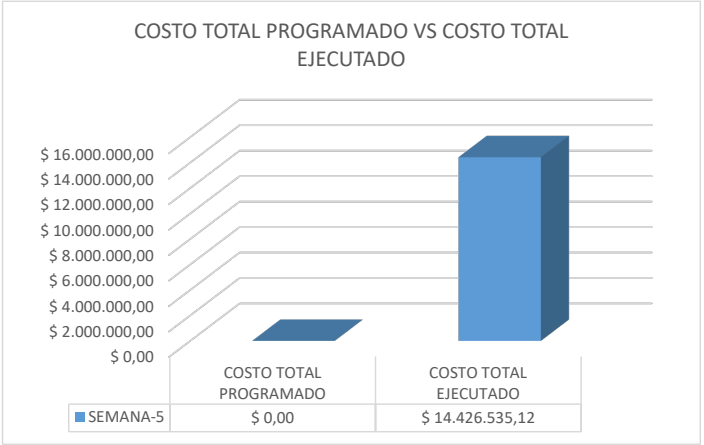

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra presenta un avance de $14.426.535,12

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de interventoría no se presenta avance financiero

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Descripción imagen 01	Descripción imagen 02	Descripción imagen 03
Revisión del sistema electrógeno	Revisión del sistema electrógeno, para evidenciar problemas presentados	Charla SST para el inicio de actividades
		
Descripción imagen 04	Descripción imagen 05	Descripción imagen 06
Charla de inicio indicaciones SST.	Mantenimiento y limpieza de estuco muro sala de espera No. 1.	Charla SST para inicio de actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Quince	(15)	días del mes de	julio	de	2024
(Día en letras)	(Día en Números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

(Firma)

Sandra Yonaira Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

			COSTO PROGRAMADO				EJECUTADO			
			PROGRAMADO							
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL	COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 45.812.826,61	2,35%				
7	S-7	28/07/2024	$ 104.547.219,71	5,37%	$ 58.734.393,10	3,02%				
8	S-8	4/08/2024	$ 163.281.612,81	8,38%	$ 58.734.393,10	3,02%				
9	S-9	11/08/2024	$ 222.016.005,91	11,40%	$ 58.734.393,10	3,02%				
10	S-10	18/08/2024	$ 267.981.357,99	13,76%	$ 45.965.352,08	2,36%				
11	S-11	25/08/2024	$ 281.112.033,16	14,43%	$ 13.130.675,17	0,67%				
12	S-12	1/09/2024	$ 294.242.708,33	15,11%	$ 13.130.675,17	0,67%	14%			
13	S-13	8/09/2024	$ 307.373.383,50	15,78%	$ 13.130.675,17	0,67%				
14	S-14	15/09/2024	$ 320.504.058,67	16,46%	$ 13.130.675,17	0,67%				
15	S-15	22/09/2024	$ 336.339.384,58	17,27%	$ 15.835.325,91	0,81%				
16	S-16	29/09/2024	$ 352.937.560,70	18,12%	$ 16.598.176,12	0,85%				
17	S-17	6/10/2024	$ 374.247.028,83	19,22%	$ 21.309.468,13	1,09%				
18	S-18	13/10/2024	$ 401.170.505,98	20,60%	$ 26.923.477,15	1,38%				
19	S-19	20/10/2024	$ 428.093.983,13	21,98%	$ 26.923.477,15	1,38%				
20	S-20	27/10/2024	$ 455.017.460,28	23,36%	$ 26.923.477,15	1,38%				
21	S-21	3/11/2024	$ 481.940.937,43	24,75%	$ 26.923.477,15	1,38%				
22	S-22	10/11/2024	$ 508.770.878,31	26,12%	$ 26.829.940,88	1,38%				
23	S-23	17/11/2024	$ 535.533.086,04	27,50%	$ 26.762.207,73	1,37%				
24	S-24	24/11/2024	$ 562.295.293,77	28,87%	$ 26.762.207,73	1,37%				
25	S-25	1/12/2024	$ 589.057.501,50	30,25%	$ 26.762.207,73	1,37%				
26	S-26	8/12/2024	$ 613.961.736,22	31,52%	$ 24.904.234,72	1,28%				
27	S-27	15/12/2024	$ 634.212.216,92	32,56%	$ 20.250.480,70	1,04%				
28	S-28	22/12/2024	$ 650.072.944,39	33,38%	$ 15.860.727,47	0,81%				
29	S-29	29/12/2024	$ 663.682.314,47	34,08%	$ 13.609.370,08	0,70%				
30	S-30	5/01/2025	$ 673.618.417,22	34,59%	$ 9.936.102,75	0,51%				
31	S-31	12/01/2025	$ 683.554.519,97	35,10%	$ 9.936.102,75	0,51%				
32	S-32	19/01/2025	$ 693.490.622,72	35,61%	$ 9.936.102,75	0,51%				
33	S-33	26/01/2025	$ 703.766.316,78	36,14%	$ 10.275.694,06	0,53%				
34	S-34	2/02/2025	$ 714.137.793,00	36,67%	$ 10.371.476,22	0,53%				
35	S-35	9/02/2025	$ 724.265.806,04	37,19%	$ 10.128.013,04	0,52%				
36	S-36	16/02/2025	$ 731.593.992,49	37,56%	$ 7.328.186,45	0,38%				
37	S-37	23/02/2025	$ 738.922.178,94	37,94%	$ 7.328.186,45	0,38%				
38	S-38	2/03/2025	$ 757.980.970,75	38,92%	$ 19.058.791,81	0,98%				
39	S-39	9/03/2025	$ 796.179.171,30	40,88%	$ 38.198.200,55	1,96%				
40	S-40	16/03/2025	$ 835.853.763,56	42,92%	$ 39.674.592,26	2,04%				
41	S-41	23/03/2025	$ 876.597.467,07	45,01%	$ 40.743.703,51	2,09%				
42	S-42	30/03/2025	$ 917.341.170,58	47,10%	$ 40.743.703,51	2,09%				
43	S-43	6/04/2025	$ 931.369.380,59	47,82%	$ 14.028.210,01	0,72%				
44	S-44	13/04/2025	$ 941.787.649,20	48,36%	$ 10.418.268,61	0,53%				
45	S-45	20/04/2025	$ 952.206.592,93	48,89%	$ 10.418.943,73	0,53%				
46	S-46	27/04/2025	$ 962.842.934,88	49,44%	$ 10.636.341,95	0,55%				
47	S-47	4/05/2025	$ 972.624.266,23	49,94%	$ 9.781.331,35	0,50%				
48	S-48	11/05/2025	$ 980.098.488,48	50,32%	$ 7.474.222,25	0,38%				
49	S-49	18/05/2025	$ 994.922.494,90	51,09%	$ 14.824.006,42	0,76%				
50	S-50	25/05/2025	$ 1.015.068.758,81	52,12%	$ 20.146.263,91	1,03%				
51	S-51	1/06/2025	$ 1.035.215.022,72	53,15%	$ 20.146.263,91	1,03%				
52	S-52	8/06/2025	$ 1.055.361.286,63	54,19%	$ 20.146.263,91	1,03%				
53	S-53	15/06/2025	$ 1.075.507.550,54	55,22%	$ 20.146.263,91	1,03%				
54	S-54	22/06/2025	$ 1.095.383.369,94	56,24%	$ 19.875.819,40	1,02%				
55	S-55	29/06/2025	$ 1.114.027.164,38	57,20%	$ 18.643.794,44	0,96%				
56	S-56	6/07/2025	$ 1.132.670.958,82	58,16%	$ 18.643.794,44	0,96%				
57	S-57	13/07/2025	$ 1.151.314.753,26	59,12%	$ 18.643.794,44	0,96%				
58	S-58	20/07/2025	$ 1.171.281.482,43	60,14%	$ 19.966.729,17	1,03%				
59	S-59	27/07/2025	$ 1.192.206.198,82	61,21%	$ 20.924.716,39	1,07%				
60	S-60	3/08/2025	$ 1.209.634.483,11	62,11%	$ 17.428.284,29	0,89%				
61	S-61	10/08/2025	$ 1.226.076.594,25	62,95%	$ 16.442.111,14	0,84%				
62	S-62	17/08/2025	$ 1.233.714.313,88	63,35%	$ 7.637.719,63	0,39%				
63	S-63	24/08/2025	$ 1.241.172.352,05	63,73%	$ 7.458.038,17	0,38%				
64	S-64	31/08/2025	$ 1.248.365.634,36	64,10%	$ 7.193.282,31	0,37%				
65	S-65	7/09/2025	$ 1.254.878.115,87	64,43%	$ 6.512.481,51	0,33%				
66	S-66	14/09/2025	$ 1.261.390.597,38	64,77%	$ 6.512.481,51	0,33%				
67	S-67	21/09/2025	$ 1.267.733.439,63	65,09%	$ 6.342.842,25	0,33%				
68	S-68	28/09/2025	$ 1.273.953.439,66	65,41%	$ 6.220.000,03	0,32%				
69	S-69	5/10/2025	$ 1.280.173.439,69	65,73%	$ 6.220.000,03	0,32%				
70	S-70	12/10/2025	$ 1.286.393.439,72	66,05%	$ 6.220.000,03	0,32%				
71	S-71	19/10/2025	$ 1.325.893.877,29	68,08%	$ 39.500.437,57	2,03%				
72	S-72	26/10/2025	$ 1.366.073.507,47	70,14%	$ 40.179.630,18	2,06%				
73	S-73	2/11/2025	$ 1.406.253.137,65	72,21%	$ 40.179.630,18	2,06%				
74	S-74	9/11/2025	$ 1.446.432.767,83	74,27%	$ 40.179.630,18	2,06%				
75	S-75	16/11/2025	$ 1.473.252.146,74	75,65%	$ 26.819.378,91	1,38%				
76	S-76	23/11/2025	$ 1.485.874.113,84	76,29%	$ 12.621.967,10	0,65%				
77	S-77	30/11/2025	$ 1.498.696.083,31	76,95%	$ 12.821.969,47	0,66%				

78	S-78	7/12/2025	$ 1.511.518.052,78	77,61%	$ 12.821.969,47	0,66%
79	S-79	14/12/2025	$ 1.524.340.022,25	78,27%	$ 12.821.969,47	0,66%
80	S-80	21/12/2025	$ 1.533.088.604,89	78,72%	$ 8.748.582,64	0,45%
81	S-81	28/12/2025	$ 1.541.349.091,56	79,14%	$ 8.260.486,67	0,42%
82	S-82	4/01/2026	$ 1.547.764.734,78	79,47%	$ 6.415.643,22	0,33%
83	S-83	11/01/2026	$ 1.554.180.378,00	79,80%	$ 6.415.643,22	0,33%
84	S-84	18/01/2026	$ 1.561.147.319,89	80,16%	$ 6.966.941,89	0,36%
85	S-85	25/01/2026	$ 1.569.039.773,60	80,56%	$ 7.892.453,71	0,41%
86	S-86	1/02/2026	$ 1.577.169.941,22	80,98%	$ 8.130.167,62	0,42%
87	S-87	8/02/2026	$ 1.585.066.137,73	81,39%	$ 7.896.196,51	0,41%
88	S-88	15/02/2026	$ 1.592.896.342,39	81,79%	$ 7.830.204,66	0,40%
89	S-89	22/02/2026	$ 1.600.740.077,38	82,19%	$ 7.843.734,99	0,40%
90	S-90	1/03/2026	$ 1.608.739.411,11	82,60%	$ 7.999.333,73	0,41%
91	S-91	8/03/2026	$ 1.616.532.746,82	83,00%	$ 7.793.335,71	0,40%
92	S-92	15/03/2026	$ 1.625.499.763,32	83,46%	$ 8.967.016,50	0,46%
93	S-93	22/03/2026	$ 1.637.498.649,21	84,08%	$ 11.998.885,89	0,62%
94	S-94	29/03/2026	$ 1.649.771.243,75	84,71%	$ 12.272.594,54	0,63%
95	S-95	5/04/2026	$ 1.664.573.433,63	85,47%	$ 14.802.189,88	0,76%
96	S-96	12/04/2026	$ 1.680.566.021,32	86,29%	$ 15.992.587,69	0,82%
97	S-97	19/04/2026	$ 1.696.558.609,01	87,11%	$ 15.992.587,69	0,82%
98	S-98	26/04/2026	$ 1.704.432.501,33	87,52%	$ 7.873.892,32	0,40%
99	S-99	3/05/2026	$ 1.712.140.705,99	87,91%	$ 7.708.204,66	0,40%
100	S-100	10/05/2026	$ 1.721.817.914,73	88,41%	$ 9.677.208,74	0,50%
101	S-101	17/05/2026	$ 1.736.558.276,80	89,17%	$ 14.740.362,07	0,76%
102	S-102	24/05/2026	$ 1.751.298.638,87	89,92%	$ 14.740.362,07	0,76%
103	S-103	31/05/2026	$ 1.766.039.000,94	90,68%	$ 14.740.362,07	0,76%
104	S-104	7/06/2026	$ 1.774.935.235,23	91,14%	$ 8.896.234,29	0,46%
105	S-105	14/06/2026	$ 1.781.081.291,74	91,45%	$ 6.146.056,51	0,32%
106	S-106	21/06/2026	$ 1.787.227.348,25	91,77%	$ 6.146.056,51	0,32%
107	S-107	28/06/2026	$ 1.793.373.404,76	92,08%	$ 6.146.056,51	0,32%
108	S-108	5/07/2026	$ 1.799.519.461,27	92,40%	$ 6.146.056,51	0,32%
109	S-109	12/07/2026	$ 1.805.665.517,78	92,71%	$ 6.146.056,51	0,32%
110	S-110	19/07/2026	$ 1.811.811.574,29	93,03%	$ 6.146.056,51	0,32%
111	S-111	26/07/2026	$ 1.817.957.630,80	93,34%	$ 6.146.056,51	0,32%
112	S-112	2/08/2026	$ 1.824.103.687,31	93,66%	$ 6.146.056,51	0,32%
113	S-113	9/08/2026	$ 1.830.249.743,82	93,98%	$ 6.146.056,51	0,32%
114	S-114	16/08/2026	$ 1.836.395.800,33	94,29%	$ 6.146.056,51	0,32%
115	S-115	23/08/2026	$ 1.842.541.856,84	94,61%	$ 6.146.056,51	0,32%
116	S-116	30/08/2026	$ 1.848.687.913,35	94,92%	$ 6.146.056,51	0,32%
117	S-117	6/09/2026	$ 1.854.833.969,86	95,24%	$ 6.146.056,51	0,32%
118	S-118	13/09/2026	$ 1.860.980.026,37	95,55%	$ 6.146.056,51	0,32%
119	S-119	20/09/2026	$ 1.867.126.082,88	95,87%	$ 6.146.056,51	0,32%
120	S-120	27/09/2026	$ 1.873.272.139,39	96,18%	$ 6.146.056,51	0,32%
121	S-121	4/10/2026	$ 1.879.089.924,30	96,48%	$ 5.817.784,91	0,30%
122	S-122	11/10/2026	$ 1.884.669.995,30	96,77%	$ 5.580.071,00	0,29%
123	S-123	18/10/2026	$ 1.890.250.066,30	97,06%	$ 5.580.071,00	0,29%
124	S-124	25/10/2026	$ 1.895.830.137,30	97,34%	$ 5.580.071,00	0,29%
125	S-125	1/11/2026	$ 1.901.410.208,30	97,63%	$ 5.580.071,00	0,29%
126	S-126	8/11/2026	$ 1.906.990.279,30	97,92%	$ 5.580.071,00	0,29%
127	S-127	15/11/2026	$ 1.912.570.350,30	98,20%	$ 5.580.071,00	0,29%
128	S-128	22/11/2026	$ 1.918.150.421,30	98,49%	$ 5.580.071,00	0,29%
129	S-129	29/11/2026	$ 1.923.730.492,30	98,78%	$ 5.580.071,00	0,29%
130	S-130	6/12/2026	$ 1.929.310.563,30	99,06%	$ 5.580.071,00	0,29%
131	S-131	13/12/2026	$ 1.934.890.634,30	99,35%	$ 5.580.071,00	0,29%
132	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 12.684.276,30	0,65%
					$ 1.947.574.910,60	100%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón Directora de Interventoría. CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ
