AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	22/07/2024
Semana No	**6**	**DEL :**	14-jul-24	**AL:**	20-jul-24
Plazo Total	25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		45	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**5,73%**			
Nombre del Supervisor :	**Jorge Beltran**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

VANGUARDIA, AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**2,35%**	**2,35%**	**(%) Ejecutado**	**0,95%**	**1,69%**
Valor programado ($)	**$ 45.812.826,61**	**$ 57.769.634,61**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 18.512.248,96**	**$ 32.938.784,08**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**-0,66%**
				Valor Adelanto	**-$ 24.830.850,53**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	**Contratista:**	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	**Contrato No:**	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	**Valor Inicial:**	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	**Plazo inicial:**	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DIAS	**Plazo actualizado:**	25 MESES Y 25 DIAS
Fecha de iniciación:	6-jun-24	**Fecha de iniciación:**	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	**Valor total actual del contrato:**	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

•Se realiza comité de obra con la participación de la supervisión de la Aeronáutica Civil. Ingeniero Jorge Beltrán, Catalina Cañas (ing. de apoyo).
•El día 17 de julio, se hace comité de obra presencial y se realiza un recorrido al avance de las actividades ejecutadas por el contratista.
TEMAS TRATADOS:
•Se realizan las recomendaciones sobre el desarrollo del contrato según lineamientos contractuales.
•Se realizan recomendaciones sobre el sistema de comunicaciones entre interventoría, contratista y Entidad para lograr mayor eficiencia y eficacia en los procesos contractuales.
•Limpieza de canales y techos
•Se manifiesta por parte de la interventoría que se requiere análisis de limpiezas de canaletas.
•Por parte de la interventoría se manifiesta que se requiere hoja de vida por todos los elementos electrógenos, la cual debe ser alimentada cada vez que se generen mantenimientos.
•Se manifiesta por parte de la interventoría que se debe realizar la terminación de obras iniciadas baños, aprobados baños, mesón, el contratista manifiesta que se realizara este proceso antes de 4 o 5 días. También se solicita de manera urgente el arreglo de puertas que son de ornamentación.
•Se manifiesta por parte de la interventoría que se debe realizar el ajuste del diagnóstico inicial plasmando los elementos identificados adicionales como son los temas de tubería de bomberos.
•Se requiere la atención urgente de las bandejas y las urnas de vidrio, son 24 bandejas.
•Se requiere el arreglo de la parte exterior de los baños de hombres del primer piso, Señalización con puertas incluyendo señalización (concertina), incluyendo todo, el contratista el viernes 19 entregará las cotizaciones necesarias para los arreglos.
•Arreglo urgente de las puertas, mantenimiento con ornamentación.
•Mantenimiento urgente de la estructura y cubierta del parqueadero de las ambulancias.

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

Actividades realizadas en obra del (14 al 20 de julio del 2024)

•Se ejecutan actividades de mantenimiento y resane de muros para corregir humedades en el área de sanidad.
•Lavado de muro de la fachada oriental, puerta 8.
•Raspado de muros para corregir humedades en la sala de abordaje #1.
•Estuco en la sala de abordaje #1, para corrección de humedades.
•Impermeabilización de la placa sobre los baños de la sala de abordaje #1, se utiliza manto asfáltico con película de aluminio.
•Se realiza el mantenimiento y lavado de tejas en la terminal aérea
•Se adecúa la tubería para la instalación de los push en orinales del baño de hombres de la sala de espera del piso 1.
•Lavado de fachada costado oriental (costado izquierdo en el sentido de ingreso al aeropuerto).
•Revisión del circuito eléctrico y puesta en funcionamiento de tomas en la sala de abordaje #2.
•Mantenimiento preventivo de aires acondicionados. 2 en la oficina de seguridad; 3 en la sala del grupo de inspección de seguridad operacional. El mantenimiento incluye: lavado de motor, lavado de la unidad principal, desarme y limpieza general.
•Se hace una muestra del lavado de las divisiones en aluminio del baño del primer piso.
•Se termina de instalar el manto asfaltico, en la placa superior de los baños de la sala de abordaje #1. Para corregir las filtraciones que están ocasionando la humedad en el baño del primer piso.
•Se coloca el pañete en los muros que previamente han sido limpiados en la sala de abordaje #1, por el costado del ventanal. Se estucan los muros exteriores e interiores del baño de la sala de abordaje #1.
•Revisión de circuitos eléctricos de la sala de abordaje #1.
•Se hace una muestra de limpieza de las partes en aluminio de la sala de abordaje #1.
•En el baño del primer piso se enchapa en el sector de los orinales (6 tabletas de 60cm*30 cm).
•Se instalan 3 lámparas en los cuartos de las oficinas de servicio de búsqueda y rescate.
•Se realiza adecuación del cuarto que será habilitado como oficina para el grupo de peligro aviario y ambiental. No se hacen regatas para puntos eléctricos, según lo programado.
•Se realiza lavado de fachadas en la parte frontal de la edificación del aeropuerto, costado izquierdo.
•Se hace estucado de baños de la sala de abordaje #1 y limpieza y rectificación del emboquillado.
•Lavado de la fachada frontal costado izquierdo de la entrada al aeropuerto (lavado de persianas),
•Trabajos en la sala de abordaje #1. Se remplaza drywall en mal estado por PVC, de cielo raso.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

ACTIVIDADES DESARROLLADAS SST

LUNES: Se hacen la una capacitación sobre Separar en la Fuente, se verifica el personal ingresado, se distribuyen las actividades y las cuadrillas, se inspecciona EEP y Herramienta. Sin novedad alguna.
MARTES: Se realiza charla Higiene Postural, se verifica el personal ingresado, se distribuyen las actividades y las cuadrillas se procede a hacer inspección y todos los colaboradores y cuentan con los respectivos EEP dependiendo la actividad, en la actividad de lavado de teja no se cumple con la normatividad SST, ya que la persona no está anclada ni cuenta con línea de vida.
MIERCOLES: Se realiza charla diaria sobre autocuidado y se deja registro, se verifica el personal ingresado, se distribuyen las actividades y las cuadrillas se inspecciona EEP y se reemplazan los desgastados y dañados.
JUEVES: Se realiza charla diaria Manejo y almacenamiento de Residuos Peligrosos y se deja registro, se verifica el personal ingresado, se distribuyen las actividades y las cuadrillas se todos los colaboradores cuentas con los EEP.
VIERNES: Se realiza charla diaria, Riesgo Eléctrico y se deja registro, se verifica el personal ingresado, se distribuyen las actividades y las cuadrillas se todos los colaboradores cuentas

RESUMEN EJECUTIVO

Durante la semana se realizaron actividades de mantenimiento en diferentes zonas del lado tierra, tales como: Lavado de fachadas, mantenimiento de paredes y baños en la sala de abordaje #1, mantenimiento de aires acondicionados, limpieza de canales en el techo de la edificación principal, se inicia adecuación de una oficina para los temas ambientales, se cambian lámparas fundidas en diferentes salas, se hace inspección de riesgos eléctricos.
El dia 17 de julio, se hace comité de obra presencial y se realiza un recorrido al avance de las actividades ejectudas por el contratista.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FAO-CTO-23001163-0046-2024	INFORME SEMANA 5 Y PROGRAMACION SEMANA 6.
FAO-CTO-23001163-0047-2024	RESPUESTA COMUNICACIÓN CO-FJ-1280-051-2024 - GRUPO FAO SAS
FAO-CTO-23001163-0048-2024	PRESENTACION COORDINADOR TECNICO – GRUPO FAO SAS
FAO-CTO-23001163-0048-2024	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CO-FJ-1280-054-2024
FAO-CTO-23001163-0051-2024	PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES MANTENIMIENTO BAÑO DE HOMBRES, INSTALACIÓN DE MANTO AUTOADHESIVO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO 3.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CO-FJ-1280-050-2027	RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-042-2024. LISTA DE PROVEEDORES. PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA 5.
CO-FJ-1280-051-2027	RESPUESTA A FAO-CTO-23001163-035-2023 PROGRAMA DE GERENCIA-GRUPO FAO SAS
CO-FJ-1280-052-2027	RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-041-2024. HOJAS DE VIDA ESPECIALISTA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO. SE APRUEBA EL REEMPLAZO DE LOS INICIALMENTE PRESENTADOS.
CO-FJ-1280-053-2027	ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO.5
CO-FJ-1280-054-2027	RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-030-2023 - PLAN DE MANTENIMIENTO
CO-FJ-1280-055-2027	RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-047-2024
CO-FJ-1280-056-2027	ENTREGA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO.1
CO-FJ-1280-057-2027	RESPUESTA AL COMUNICADO - FAO-CTO-23001163-048-2023 - RESPUESTA A COMUNICACIÓN CO-FJ-1280-054-2024. PLAN DE MANTENIMIENTO.
CO-FJ-1280-058-2027	ENTREGA DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO.
CO-FJ-1280-059-2027	CONTROL Y ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS.
CO-FJ-1280-060-2027	RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-017-2024. PROGRAMACIÓN AEROPUERTO VILLAVICENCIO VANGUARDIA.
CO-FJ-1280-062-2027	APROBACION BALANCE PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL DE OBRA			
PERSONAL OPERATIVO		PERSONAL ADMINISTRATIVO	
INSPECTOR DE OBRA	1	DIRECTOR DE OBRA	1
OFICIAL	5	RESIDENTE DE OBRA	1
AYUDANTE	11	PROFESIONAL SST	1
TOTAL	17	TOTAL	3

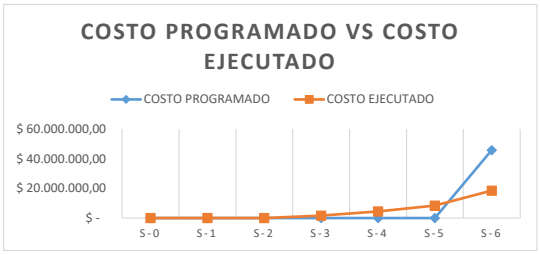
PERSONAL DE INTERVENTORIA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
PROFESIONAL SST	1
TOTAL	3

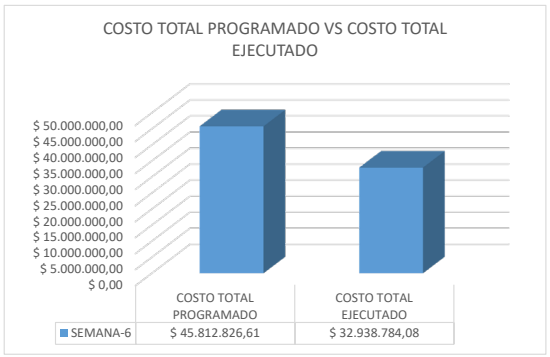
Personal de Interventoría	**3**
Personal del Contratista	**20**
Total Personal en Obra	**23**

EQUIPOS EN OBRA:	Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, herramienta menor

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)





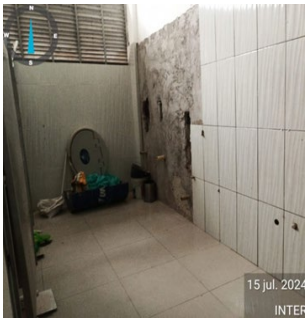
AVANCE FINANCIERO DE OBRA

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra presenta un avance de $32.938.784,08

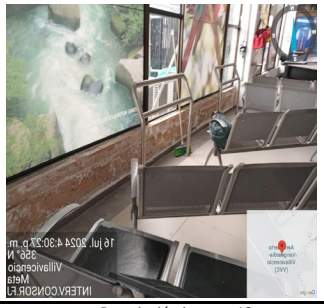
AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de interventoría no se presenta avance financiero

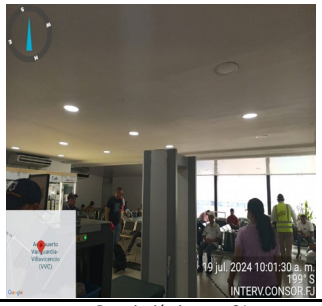
REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Descripción imagen 01	Descripción imagen 02	Descripción imagen 03
Mantenimiento de orinales en el baño primer piso	Mantenimiento de enchape de muro en el baño primer piso	Lavado de puertas y divisiones de los baños del primer piso.
		
Descripción imagen 04	Descripción imagen 05	Descripción imagen 06
Inspección de mantenimiento general por parte de la interventoría de baños.	Limpieza de canales y techos en el area de la edificación principal.	Limpieza con hidrolabadora de fachada principal

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

		
Descripción imagen 07	Descripción imagen 08	Descripción imagen 09
Limpieza de fachada principal lado frontal.	Lavado y resanes de humedades en el exterior de la sala de abordaje #3	Limpieza de muros en sala de abordaje para atender corrección de humedades.
		
Descripción imagen 10	Descripción imagen 11	Descripción imagen 12
Inspección de caja de breaker en la sala de abordaje #1	Estucado de muros exteriores de los baños, para corregir humedades. Sala de abordaje #1	Retiro de pañete dañado por la humedad, en la sala de abordaje #1
		
Descripción imagen 16	Descripción imagen 17	Descripción imagen 18
Emulsión asfáltica utilizada para imprimar la superficie donde se instalará el manto asfáltico con película de aluminio.	Aplicación de emulsión asfáltica, para impermeabilizar la placa sobre los baños que está generando humedades a la sala de abordaje #1.	Instalación de manto asfáltico con película de aluminio para impermeabilizar la placa que está ocasionando las humedades de las paredes de los baños de la sala de espera.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

		
Descripción imagen 19	Descripción imagen 20	Descripción imagen 21
Mantenimiento de humedades, Estucado de baños de la sala de abordaje #1.	Arreglo de toma eléctrico en la oficina de interventoría.	Inspección de lámparas quemadas en la sala de abordaje #1.
GESTIÓN SST		
		
Descripción imagen 22	Descripción imagen 23	Descripción imagen 24
Charla preoperacional de autocuidado.	Inspección de puntos de trabajo en temas de SST.	Inspección de riesgos eléctricos en las instalaciones del aeropuerto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Veintidós	(22)	días del mes de	julio	de	2024
(Día en letras)	(Día en Números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

(Firma)

Sandra Yonaira Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3

Código: CCE-EICP-FM-14 Versión: 3

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO CON MAYORES Y MENORES

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CAT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						+	-		
	1			**MAMPOSTERIA**								
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	$ 38.916,00	$ 2.334.960,00	0	-20	$ 40,00	$1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	$ 30.706,00	$ 1.842.360,00	0	0	$ 60,00	$1.842.360,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	$ 26.258,00	$ 3.938.700,00	0	0	$ 150,00	$3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	$ 38.490,00	$ 76.306.425,00	0	0	$ 1.982,50	$76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	$ 29.591,00	$ 29.324.681,00	0	0	$ 991,00	$29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	$ 15.640,00	$ 37.536.000,00	0	0	$ 2.400,00	$37.536.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	$ 66.017,00	$ 3.895.003,00	0		$ 59,00	$3.895.003,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	$ 33.550,00	$ 1.342.000,00	0		$ 40,00	$1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	$ 1.841,00	$ 736.400,00	0	0	$ 400,00	$736.400,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	$ 27.292,00	$ 42.657.298,00	0	0	$ 1.563,00	$42.657.297,75
Subtotal								**$ 199.913.827,00**				**$ 199.135.506,75**
	2			**PISOS**								
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	$ 20.128,00	$ 14.089.600,00	0	-300	$ 400,00	$8.051.200,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	$ 86.865,00	$ 9.989.475,00	0		$ 115,00	$9.989.475,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO)	M2	38,00	$ 175.568,00	$ 6.671.584,00	0	-37	$ 1,00	$175.568,00
Subtotal								**$ 30.750.659,00**				**$ 18.216.243,00**
	3			**CUBIERTA Y CIELORASO**								
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO;NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	$ 480.205,00	$ 11.524.920,00	0	0	$ 24,00	$11.524.920,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	$ 89.881,00	$ 44.041.690,00	0	0	$ 490,00	$44.041.690,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	$ 140.472,00	$ 68.831.280,00	0	-300	$ 190,00	$26.689.680,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	$ 89.781,00	$ 33.039.408,00	0		$ 368,00	$33.039.408,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	$ 28.249,00	$ 2.824.900,00	0	0	$ 100,00	$2.824.900,00
Subtotal								**$ 160.262.198,00**				**$ 118.120.598,00**
	4			**CARPINTERIA METÁLICA**								
19	4.1		4.1	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	$ 451.209,00	$ 2.256.045,00	0		$ 5,00	$2.256.045,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSINAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	$ 17.857,00	$ 5.357.100,00	200	0	$ 500,00	$8.928.500,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	$ 22.736,00	$ 4.547.200,00	0	0	$ 200,00	$4.547.200,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACREO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	$ 83.129,00	$ 6.816.578,00	0	0	$ 82,00	$6.816.578,00
Subtotal								**$ 18.976.923,00**				**$ 22.548.323,00**
	5			**CARPINTERIA MADERA**								
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	$ 476.557,00	$ 3.335.899,00		-5	$ 2,00	$953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	$ 12.995,00	$ 2.011.626,00	0		$ 154,80	$2.011.626,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	$ 38.231,00	$ 2.959.079,00	0		$ 77,40	$2.959.079,40
Subtotal								**$ 8.306.604,00**				**$ 5.923.819,40**
	6			**CRISTALERIA**								
26	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/0 PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	$ 289.652,00	$ 14.482.600,00		-30	$ 20,00	$5.793.040,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	$ 84.356,00	$ 4.217.800,00		-50	$ -	$0,00
Subtotal								**$ 18.700.400,00**				**$ 5.793.040,00**

	7			**CANALETAS Y PORTACABLES**									
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	$ 61.879,00	$ 30.939.500,00		250	$ 750,00	$46.409.250,00
Subtotal								**$ 30.939.500,00**				**$ 46.409.250,00**
	8			**LIMPIEZA PROFUNDA**									
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	$ 9.054,00	$ 82.391.400,00	0		$ 9.100,00	$82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	$ 14.260,00	$ 87.342.500,00	0		$ 6.125,00	$87.342.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	$ 7.870,00	$ 11.805.000,00	0		$ 1.500,00	$11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	$ 627.943,00	$ 100.470.880,00	0		$ 160,00	$100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	$ 30.741,00	$ 293.365.667,00		-1000	$ 8.543,14	$262.624.666,74
Subtotal								**$ 575.375.447,00**				**$ 544.634.446,74**
	9			**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**									
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 61.126.435,00	$ 61.126.435,00	0		$ 1,00	$61.126.435,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	$ 22.193.560,00	$ 22.193.560,00	0		$ 1,00	$22.193.560,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 72.618.205,00	$ 72.618.205,00	0		$ 1,00	$72.618.205,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	$ 589.218,00	$ 14.141.232,00	0	-24	$ -	$0,00
Subtotal								**$ 170.079.432,00**				**$ 155.938.200,00**
	10			**MANO DE OBRA**									
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	$ 11.766.194,00	$ 352.985.820,00	0	0	$ 30,00	$352.985.820,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	$ 39.080,00	$ 18.758.400,00	200	0	$ 680,00	$26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	$ 36.074,00	$ 25.973.280,00	200	0	$ 920,00	$33.188.080,00
							SUBTOTAL	**$ 397.717.500,00**				**$ 412.748.300,00**
							SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO	**$ 1.611.022.490,00**				**$ 1.529.467.726,89**

IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 11.956.808,00		$ 0,19	$ 11.351.518,00
SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)		**$ 1.622.979.298,00**			**$ 1.540.819.244,89**

	11			**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**									
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	$ 324.595.613,00	$ 324.595.613,00				$ 406.755.666,11
								TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**$ 324.595.613,00**				$ 406.755.666,11

VALOR TOTAL		**$ 1.947.574.911,00**			**$ 1.947.574.911,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	3%
NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.	**UTILIDAD**	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	28%

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA
Director de obra
GRUPO FAO SAS

SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
Directora de interventoría
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	DE

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/07/2024 **Y EL** 20/07/2024 **PLAZO:** 785 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING.JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

		FECHA	JUNIO 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO											
NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
PABLO ORDOÑEZ	12.981.089	SISOMA INTERVETORIA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
DIANA CRISTINA REYES DIAZ	65.707.341	RESIDENTE INTERVENTORIA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0

	JULIO 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																														
NOMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1									
PABLO ORDOÑEZ	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1									
DIANA CRISTINA REYES DIAZ	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1									
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	AGOSTO DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																		
NOMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON																			
PABLO ORDOÑEZ																			
DIANA CRISTINA REYES DIAZ																			
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón Directora de Interventoría. **CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA	VERSIÓN	1
AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial		PÁGINA	1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	14/07/2024	**Y EL**	20/07/2024	**PLAZO:**	785	**DÍAS**
SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL	ING. JORGE BELTRAN					
FRENTE	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META					

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

FECHA — JUNIO 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO

NOMBRE	CARGO	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
ORLANDO ORDOÑEZ	DIRECTOR DE OBRA						1	1	1	1	1	1	0
MICHELL ANGARITA	INGENIERO RESIDENTE						1	1	1	1	1	1	
LOREDANA PERDOMO	PROFESIONAL SST AMBIENTAL							1	1	1	1	1	
WILIAM CAVIEDES	INGENIERO RESIDENTE												
EDGAR SALINAS	INSPECTOR						1	1	1	1	1	1	
JHON JAIRO GUTIERREZ	MAESTRO												
CESAR RODRIGUEZ	OFICIAL												
ALEXANDER FLOREZ	OFICIAL												
JAVIER ANDRES VALENCIA	ELECTRICO												
JHON JAMES ORTIZ	AYUDANTE						1	1	1	1	1	1	
JHON JAIRO CUESTA	AYUDANTE						1	1	1	1	1	1	
JUAN CAMILO RAMIREZ	AYUDANTE						1	1	1	1	1	1	
JUAN CARLOS CUELLAR	AYUDANTE						1	1	1	1	1	1	
ALVARO MACIAS	AYUDANTE												
NICOLAS FARID SALINAS CARRILLO	AUX UNGENIERIA												
HERTOR HERNANDEZ	MAESTRO												
REINALDO GUZMAN GIRALDO	OFICIAL												
JUAN ESTEBAN LOPEZ FONSECA	AYUDANTE												
GUILLERO ALEJANDRO GONZALES BERNAL	AYUDANTE												
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA		0	0	0	0	0	7	8	8	8	8	8	0

JULIO 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO

NOMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
ORLANDO ORDOÑEZ	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1			1									
MICHELL ANGARITA	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1														
LOREDANA PERDOMO	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1									
WILIAM CAVIEDES								1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1									
EDGAR SALINAS	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1									
JHON JAIRO GUTIERREZ	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1									
CESAR RODRIGUEZ	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1									1									
ALEXANDER FLOREZ	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1									
JAVIER ANDRES VALENCIA								1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1									
JHON JAMES ORTIZ	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1									
JHON JAIRO CUESTA	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1									
JUAN CAMILO RAMIREZ	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1											
JUAN CARLOS CUELLAR	1	1																													
ALVARO MACIAS								1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1									
NICOLAS FARID SALINAS CARRILLO								1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1									
HERTOR HERNANDEZ								1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1											
REINALDO GUZMAN GIRALDO																				1		1									
JUAN ESTEBAN LOPEZ FONSECA																						1									
GUILLERO ALEJANDRO GONZALES BERNAL																						1									
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA	11	11	10	10	10	1	0	15	15	15	15	15	15	0	12	14	14	13	13	12	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AGOSTO DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO

NOMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
ORLANDO ORDOÑEZ																			
MICHELL ANGARITA																			
LOREDANA PERDOMO																			
WILIAM CAVIEDES																			
EDGAR SALINAS																			
JHON JAIRO GUTIERREZ																			
CESAR RODRIGUEZ																			
ALEXANDER FLOREZ																			
JAVIER ANDRES VALENCIA																			
JHON JAMES ORTIZ																			
JHON JAIRO CUESTA																			
JUAN CAMILO RAMIREZ																			
JUAN CARLOS CUELLAR																			
ALVARO MACIAS																			
NICOLAS FARID SALINAS CARRILLO																			
HERTOR HERNANDEZ																			
REINALDO GUZMAN GIRALDO																			
JUAN ESTEBAN LOPEZ FONSECA																			
GUILLERO ALEJANDRO GONZALES BERNAL																			
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	(firma)
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón
	Directora de Interventoría.
	CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

			COSTO PROGRAMADO				EJECUTADO			
			PROGRAMADO							
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL	COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 104.547.219,71	5,37%	$ 58.734.393,10	3,02%				
8	S-8	4/08/2024	$ 163.281.612,81	8,38%	$ 58.734.393,10	3,02%				
9	S-9	11/08/2024	$ 222.016.005,91	11,40%	$ 58.734.393,10	3,02%				
10	S-10	18/08/2024	$ 267.981.357,99	13,76%	$ 45.965.352,08	2,36%				
11	S-11	25/08/2024	$ 281.112.033,16	14,43%	$ 13.130.675,17	0,67%				
12	S-12	1/09/2024	$ 294.242.708,33	15,11%	$ 13.130.675,17	0,67%	14%			
13	S-13	8/09/2024	$ 307.373.383,50	15,78%	$ 13.130.675,17	0,67%				
14	S-14	15/09/2024	$ 320.504.058,67	16,46%	$ 13.130.675,17	0,67%				
15	S-15	22/09/2024	$ 336.339.384,58	17,27%	$ 15.835.325,91	0,81%				
16	S-16	29/09/2024	$ 352.937.560,70	18,12%	$ 16.598.176,12	0,85%				
17	S-17	6/10/2024	$ 374.247.028,83	19,22%	$ 21.309.468,13	1,09%				
18	S-18	13/10/2024	$ 401.170.505,98	20,60%	$ 26.923.477,15	1,38%				
19	S-19	20/10/2024	$ 428.093.983,13	21,98%	$ 26.923.477,15	1,38%				
20	S-20	27/10/2024	$ 455.017.460,28	23,36%	$ 26.923.477,15	1,38%				
21	S-21	3/11/2024	$ 481.940.937,43	24,75%	$ 26.923.477,15	1,38%				
22	S-22	10/11/2024	$ 508.770.878,31	26,12%	$ 26.829.940,88	1,38%				
23	S-23	17/11/2024	$ 535.533.086,04	27,50%	$ 26.762.207,73	1,37%				
24	S-24	24/11/2024	$ 562.295.293,77	28,87%	$ 26.762.207,73	1,37%				
25	S-25	1/12/2024	$ 589.057.501,50	30,25%	$ 26.762.207,73	1,37%				
26	S-26	8/12/2024	$ 613.961.736,22	31,52%	$ 24.904.234,72	1,28%				
27	S-27	15/12/2024	$ 634.212.216,92	32,56%	$ 20.250.480,70	1,04%				
28	S-28	22/12/2024	$ 650.072.944,39	33,38%	$ 15.860.727,47	0,81%				
29	S-29	29/12/2024	$ 663.682.314,47	34,08%	$ 13.609.370,08	0,70%				
30	S-30	5/01/2025	$ 673.618.417,22	34,59%	$ 9.936.102,75	0,51%				
31	S-31	12/01/2025	$ 683.554.519,97	35,10%	$ 9.936.102,75	0,51%				
32	S-32	19/01/2025	$ 693.490.622,72	35,61%	$ 9.936.102,75	0,51%				
33	S-33	26/01/2025	$ 703.766.316,78	36,14%	$ 10.275.694,06	0,53%				
34	S-34	2/02/2025	$ 714.137.793,00	36,67%	$ 10.371.476,22	0,53%				
35	S-35	9/02/2025	$ 724.265.806,04	37,19%	$ 10.128.013,04	0,52%				
36	S-36	16/02/2025	$ 731.593.992,49	37,56%	$ 7.328.186,45	0,38%				
37	S-37	23/02/2025	$ 738.922.178,94	37,94%	$ 7.328.186,45	0,38%				
38	S-38	2/03/2025	$ 757.980.970,75	38,92%	$ 19.058.791,81	0,98%				
39	S-39	9/03/2025	$ 796.179.171,30	40,88%	$ 38.198.200,55	1,96%				
40	S-40	16/03/2025	$ 835.853.763,56	42,92%	$ 39.674.592,26	2,04%				
41	S-41	23/03/2025	$ 876.597.467,07	45,01%	$ 40.743.703,51	2,09%				
42	S-42	30/03/2025	$ 917.341.170,58	47,10%	$ 40.743.703,51	2,09%				
43	S-43	6/04/2025	$ 931.369.380,59	47,82%	$ 14.028.210,01	0,72%				
44	S-44	13/04/2025	$ 941.787.649,20	48,36%	$ 10.418.268,61	0,53%				
45	S-45	20/04/2025	$ 952.206.592,93	48,89%	$ 10.418.943,73	0,53%				
46	S-46	27/04/2025	$ 962.842.934,88	49,44%	$ 10.636.341,95	0,55%				
47	S-47	4/05/2025	$ 972.624.266,23	49,94%	$ 9.781.331,35	0,50%				
48	S-48	11/05/2025	$ 980.098.488,48	50,32%	$ 7.474.222,25	0,38%				
49	S-49	18/05/2025	$ 994.922.494,90	51,09%	$ 14.824.006,42	0,76%				
50	S-50	25/05/2025	$ 1.015.068.758,81	52,12%	$ 20.146.263,91	1,03%				
51	S-51	1/06/2025	$ 1.035.215.022,72	53,15%	$ 20.146.263,91	1,03%				
52	S-52	8/06/2025	$ 1.055.361.286,63	54,19%	$ 20.146.263,91	1,03%				
53	S-53	15/06/2025	$ 1.075.507.550,54	55,22%	$ 20.146.263,91	1,03%				
54	S-54	22/06/2025	$ 1.095.383.369,94	56,24%	$ 19.875.819,40	1,02%				
55	S-55	29/06/2025	$ 1.114.027.164,38	57,20%	$ 18.643.794,44	0,96%				
56	S-56	6/07/2025	$ 1.132.670.958,82	58,16%	$ 18.643.794,44	0,96%				
57	S-57	13/07/2025	$ 1.151.314.753,26	59,12%	$ 18.643.794,44	0,96%				
58	S-58	20/07/2025	$ 1.171.281.482,43	60,14%	$ 19.966.729,17	1,03%				
59	S-59	27/07/2025	$ 1.192.206.198,82	61,21%	$ 20.924.716,39	1,07%				
60	S-60	3/08/2025	$ 1.209.634.483,11	62,11%	$ 17.428.284,29	0,89%				
61	S-61	10/08/2025	$ 1.226.076.594,25	62,95%	$ 16.442.111,14	0,84%				
62	S-62	17/08/2025	$ 1.233.714.313,88	63,35%	$ 7.637.719,63	0,39%				
63	S-63	24/08/2025	$ 1.241.172.352,05	63,73%	$ 7.458.038,17	0,38%				
64	S-64	31/08/2025	$ 1.248.365.634,36	64,10%	$ 7.193.282,31	0,37%				
65	S-65	7/09/2025	$ 1.254.878.115,87	64,43%	$ 6.512.481,51	0,33%				
66	S-66	14/09/2025	$ 1.261.390.597,38	64,77%	$ 6.512.481,51	0,33%				
67	S-67	21/09/2025	$ 1.267.733.439,63	65,09%	$ 6.342.842,25	0,33%				
68	S-68	28/09/2025	$ 1.273.953.439,66	65,41%	$ 6.220.000,03	0,32%				
69	S-69	5/10/2025	$ 1.280.173.439,69	65,73%	$ 6.220.000,03	0,32%				
70	S-70	12/10/2025	$ 1.286.393.439,72	66,05%	$ 6.220.000,03	0,32%				
71	S-71	19/10/2025	$ 1.325.893.877,29	68,08%	$ 39.500.437,57	2,03%				
72	S-72	26/10/2025	$ 1.366.073.507,47	70,14%	$ 40.179.630,18	2,06%				
73	S-73	2/11/2025	$ 1.406.253.137,65	72,21%	$ 40.179.630,18	2,06%				
74	S-74	9/11/2025	$ 1.446.432.767,83	74,27%	$ 40.179.630,18	2,06%				
75	S-75	16/11/2025	$ 1.473.252.146,74	75,65%	$ 26.819.378,91	1,38%				
76	S-76	23/11/2025	$ 1.485.874.113,84	76,29%	$ 12.621.967,10	0,65%				
77	S-77	30/11/2025	$ 1.498.696.083,31	76,95%	$ 12.821.969,47	0,66%				

78	S-78	7/12/2025	$ 1.511.518.052,78	77,61%	$ 12.821.969,47	0,66%
79	S-79	14/12/2025	$ 1.524.340.022,25	78,27%	$ 12.821.969,47	0,66%
80	S-80	21/12/2025	$ 1.533.088.604,89	78,72%	$ 8.748.582,64	0,45%
81	S-81	28/12/2025	$ 1.541.349.091,56	79,14%	$ 8.260.486,67	0,42%
82	S-82	4/01/2026	$ 1.547.764.734,78	79,47%	$ 6.415.643,22	0,33%
83	S-83	11/01/2026	$ 1.554.180.378,00	79,80%	$ 6.415.643,22	0,33%
84	S-84	18/01/2026	$ 1.561.147.319,89	80,16%	$ 6.966.941,89	0,36%
85	S-85	25/01/2026	$ 1.569.039.773,60	80,56%	$ 7.892.453,71	0,41%
86	S-86	1/02/2026	$ 1.577.169.941,22	80,98%	$ 8.130.167,62	0,42%
87	S-87	8/02/2026	$ 1.585.066.137,73	81,39%	$ 7.896.196,51	0,41%
88	S-88	15/02/2026	$ 1.592.896.342,39	81,79%	$ 7.830.204,66	0,40%
89	S-89	22/02/2026	$ 1.600.740.077,38	82,19%	$ 7.843.734,99	0,40%
90	S-90	1/03/2026	$ 1.608.739.411,11	82,60%	$ 7.999.333,73	0,41%
91	S-91	8/03/2026	$ 1.616.532.746,82	83,00%	$ 7.793.335,71	0,40%
92	S-92	15/03/2026	$ 1.625.499.763,32	83,46%	$ 8.967.016,50	0,46%
93	S-93	22/03/2026	$ 1.637.498.649,21	84,08%	$ 11.998.885,89	0,62%
94	S-94	29/03/2026	$ 1.649.771.243,75	84,71%	$ 12.272.594,54	0,63%
95	S-95	5/04/2026	$ 1.664.573.433,63	85,47%	$ 14.802.189,88	0,76%
96	S-96	12/04/2026	$ 1.680.566.021,32	86,29%	$ 15.992.587,69	0,82%
97	S-97	19/04/2026	$ 1.696.558.609,01	87,11%	$ 15.992.587,69	0,82%
98	S-98	26/04/2026	$ 1.704.432.501,33	87,52%	$ 7.873.892,32	0,40%
99	S-99	3/05/2026	$ 1.712.140.705,99	87,91%	$ 7.708.204,66	0,40%
100	S-100	10/05/2026	$ 1.721.817.914,73	88,41%	$ 9.677.208,74	0,50%
101	S-101	17/05/2026	$ 1.736.558.276,80	89,17%	$ 14.740.362,07	0,76%
102	S-102	24/05/2026	$ 1.751.298.638,87	89,92%	$ 14.740.362,07	0,76%
103	S-103	31/05/2026	$ 1.766.039.000,94	90,68%	$ 14.740.362,07	0,76%
104	S-104	7/06/2026	$ 1.774.935.235,23	91,14%	$ 8.896.234,29	0,46%
105	S-105	14/06/2026	$ 1.781.081.291,74	91,45%	$ 6.146.056,51	0,32%
106	S-106	21/06/2026	$ 1.787.227.348,25	91,77%	$ 6.146.056,51	0,32%
107	S-107	28/06/2026	$ 1.793.373.404,76	92,08%	$ 6.146.056,51	0,32%
108	S-108	5/07/2026	$ 1.799.519.461,27	92,40%	$ 6.146.056,51	0,32%
109	S-109	12/07/2026	$ 1.805.665.517,78	92,71%	$ 6.146.056,51	0,32%
110	S-110	19/07/2026	$ 1.811.811.574,29	93,03%	$ 6.146.056,51	0,32%
111	S-111	26/07/2026	$ 1.817.957.630,80	93,34%	$ 6.146.056,51	0,32%
112	S-112	2/08/2026	$ 1.824.103.687,31	93,66%	$ 6.146.056,51	0,32%
113	S-113	9/08/2026	$ 1.830.249.743,82	93,98%	$ 6.146.056,51	0,32%
114	S-114	16/08/2026	$ 1.836.395.800,33	94,29%	$ 6.146.056,51	0,32%
115	S-115	23/08/2026	$ 1.842.541.856,84	94,61%	$ 6.146.056,51	0,32%
116	S-116	30/08/2026	$ 1.848.687.913,35	94,92%	$ 6.146.056,51	0,32%
117	S-117	6/09/2026	$ 1.854.833.969,86	95,24%	$ 6.146.056,51	0,32%
118	S-118	13/09/2026	$ 1.860.980.026,37	95,55%	$ 6.146.056,51	0,32%
119	S-119	20/09/2026	$ 1.867.126.082,88	95,87%	$ 6.146.056,51	0,32%
120	S-120	27/09/2026	$ 1.873.272.139,39	96,18%	$ 6.146.056,51	0,32%
121	S-121	4/10/2026	$ 1.879.089.924,30	96,48%	$ 5.817.784,91	0,30%
122	S-122	11/10/2026	$ 1.884.669.995,30	96,77%	$ 5.580.071,00	0,29%
123	S-123	18/10/2026	$ 1.890.250.066,30	97,06%	$ 5.580.071,00	0,29%
124	S-124	25/10/2026	$ 1.895.830.137,30	97,34%	$ 5.580.071,00	0,29%
125	S-125	1/11/2026	$ 1.901.410.208,30	97,63%	$ 5.580.071,00	0,29%
126	S-126	8/11/2026	$ 1.906.990.279,30	97,92%	$ 5.580.071,00	0,29%
127	S-127	15/11/2026	$ 1.912.570.350,30	98,20%	$ 5.580.071,00	0,29%
128	S-128	22/11/2026	$ 1.918.150.421,30	98,49%	$ 5.580.071,00	0,29%
129	S-129	29/11/2026	$ 1.923.730.492,30	98,78%	$ 5.580.071,00	0,29%
130	S-130	6/12/2026	$ 1.929.310.563,30	99,06%	$ 5.580.071,00	0,29%
131	S-131	13/12/2026	$ 1.934.890.634,30	99,35%	$ 5.580.071,00	0,29%
132	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 12.684.276,30	0,65%
					$ 1.947.574.910,60	100%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón
	Directora de Interventoría.
	CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ
