AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL**			**FECHA:**	19/08/2024
Semana No	**11**	**DEL :**	18-ago-24	**AL:**	24-ago-24
Plazo Total	**25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)**	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		80	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**10,18%**			
Nombre del Supervisor :	**Jorge Beltrán Gómez**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

VANGUARDIA, AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,67%**	**14,43%**	**(%) Ejecutado**	**1,92%**	**16,00%**
Valor programado ($)	**$ 13.130.675,17**	**$ 281.112.033,16**	**Valor ejecutado**	**$ 24.546.309,00**	**$ 311.702.916,00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**1,57%**
				Valor Adelanto	**$ 30.590.882,84**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	**Contratista:**	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	**Contrato No:**	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	**Valor Inicial:**	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	**Plazo inicial:**	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS	**Plazo actualizado:**	25 MESES Y 25 DÍAS
Fecha de iniciación:	6-jun-24	**Fecha de iniciación:**	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	**Valor total actual del contrato:**	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EL DÍA MIERCOLES 21-08-24 SE REALIZA EL COMITÉ DE OBRA No. 10

SOLICITUDES URGENTES

Se manifiesta por parte de la supervisora del aeropuerto y interventoría dar prioridad a las siguientes actividades.

- Pendiente el mantenimiento de la torre de control
- Adecuación de punto de aseo para el área de sanidad
- Mantenimiento del domo en la sala de abordaje #2
- Mantenimiento del andén de la fachada lado sur
- Mantenimiento de la oficina AIM (adecuación de ventanas con papel polarizado, adecuación de baños, pintura en general.
- Mantenimiento de humedades, estuco y pintura en la fachada lado Norte.

SALA #2

- Mantenimiento de baños segundo piso
- Inicio de mantenimiento sala # 2
- Mantenimiento de interruptor para el baño
- Mantenimiento, limpieza y pintura de sillas
- Mantenimiento de divisiones de baños

SALA #3

- Mantenimiento de orinal
- Mantenimiento de pintura de sillas
- Mantenimiento de pintura, franja azul
- Mantenimiento de puerta del baño

SANIDAD

- Mantenimiento del enchape de muro en el pasillo principal
- Mantenimiento de puerta en el baño del consultorio
- Corrección de acabados de pintura de muros
- Limpieza de guarda escobas en general
- Mantenimiento de tomas y extractores de olores de los baños.
- Mantenimiento de cubierta, cambio de la estructura de madera y cambio de tejas.
- Resane de enchape del mesón de sala de procedimiento

AVANCE

- Baño de mujeres del primer piso
- Lavamanos baño de hombres primer piso
- Terminación de mantenimiento de baños
- Mantenimiento de pisos
- Mantenimiento de fachada sanidad, costado plataforma.
- Mantenimiento de fachada sala AIM

SALA #1

- Mantenimiento de dispensadores de jabón
- Mantenimiento Tapa de la tapa del gabinete eléctrico
- Mantenimiento de parlantes
- Mantenimiento de luminaria de baños
- Mantenimiento de pintura de puertas
- Mantenimiento de vidrios partidos

SST

- Se manifiesta por parte de la interventoría y de la supervisora Luz Miriam Santiago, usar los elementos de protección personal en todo momento, también se hace la recomendación que durante las actividades de trabajos en alturas hagan uso de los elementos requeridos para tal fin.
- Se manifiesta por parte de la interventoría que se hace necesario estar pendiente de los acabados de obra pintura y el aseo de las áreas de trabajo.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

"Actividades realizadas en obra del (18 al 124 de agosto del 2024)

• SANIDAD AEROPORTUARIA: Se realizan actividades de mantenimiento de las observaciones realizadas en el recorrido del día 21-ago-24 en las áreas internas, se realizó el mantenimiento de enchape del mesón de sala de procedimiento, mantenimiento de enchape del muro del pasillo principal, mantenimiento de tomas y extractores de olores de los baños, instalación de vinilo adhesivo mantenimiento de humedad y limpieza de media caña en sala de procedimientos.
• SALA DE LLEGADA DE PASAJEROS, ALFA 7: Se realiza la limpieza de pisos, instalación de vinilo adhesivo.
• FACHADA LADO SUR: Se realizaron actividades de mantenimiento de estuco y pintura, pintura de puertas y ventanas, mantenimiento de humedades. Se continua con las actividades de adecuación de cubierta del parqueadero de ambulancias.
• ESTACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS: Se realizó el mantenimiento de la manguera que estaba ocasionando el derrame del combustible.
• TRABAJOS NOCTURNOS: Aseo en general en la terminal aérea, limpieza de pisos y áreas donde se realizan trabajos, mantenimiento de y pintura de la franja azul de la sala #3, aplicación de boquilla en el salón principal, ingreso a taquillas.
• TORRE DE CONTROL: Retiro e instalación de manto impermeabilizante □
• SALA DE ABORDAJE # 3: Se realiza el mantenimiento de pintura, mantenimiento de puntos eléctricos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS SST

Se realizó una charla preoperacional abordando las funciones del COPASST y se llevó a cabo una sesión de calistenia. Posteriormente, se realizó una ronda de inspección para evaluar al contratista, revisando los elementos de protección personal y las condiciones de seguridad en cada frente de trabajo.

• Se realizó una charla preoperacional enfocada en la seguridad en el armado y traslado de andamios, y se llevó a cabo una sesión de calistenia. Posteriormente, se realizó una ronda de inspección para evaluar al contratista en aspectos de seguridad. Se hicieron las siguientes recomendaciones: mantener las áreas limpias al finalizar las actividades y proveer capuchones a los colaboradores para protección contra temperaturas extremas del sol.

• Se realizó una charla preoperacional enfocada en la seguridad en trabajos con escaleras y se llevó a cabo una sesión de calistenia. Posteriormente, se realizó una ronda de inspección para evaluar al contratista en aspectos de seguridad. Se hicieron las siguientes recomendaciones: establecer un punto de hidratación y asegurar la disposición final adecuada de los residuos.

• Se realizó una charla preoperacional enfocada en las posturas adecuadas, seguida de una sesión de calistenia. Posteriormente, se realizó una inspección para evaluar al contratista en aspectos de seguridad. Durante esta inspección, se reiteraron las recomendaciones previas, ya que el contratista no ha cumplido plenamente con los requisitos. Las recomendaciones incluyeron la entrega completa de equipos de protección personal (EPP), el establecimiento de un punto de hidratación y la limpieza de todas las áreas al finalizar las actividades. En cuanto a la señalización y el cierre de áreas de trabajo, se ha observado que se está cumpliendo adecuadamente.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FAO-CTO-23001163-077-2024	PROGRAMACION MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO Y MANTENIMIENTO E INSTALCION DE CUBIERTA PARA AIM
FAO-CTO-23001163-078-2023	ALCANCE AL DIAGNÓSTICO PRESENTADO JUNIO 2024 - GRUPO FAO SAS
FAO-CTO-23001163-079-2024	COTIZACIÓN MUEBLE DE COCINA TORRE DE CONTROL
FAO-CTO-23001163-079-2024	RESPUESTA A, CO-FJ-1280-089-2024 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS 1

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CO-FJ-1280-089-2024	ATENCIÓN INMEDIATA - RESPUESTA A MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS
CO-FJ-1280-090-2024	ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No 10
CO-FJ-1280-091-2024	ATENCIÓN A COMPROMISOS CONTRACTUALES PENDIENTES
CO-FJ-1280-092-2024	VISITA DE ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE INTERVENTORÍA
CO-FJ-1280-093-2024	SOLICITUD INMEDIATA DE ATENCIÓN AL ASEO EN SITIOS DE OBRA
CO-FJ-1280-094-2024	SOLICITUD INMEDIATA AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
CO-FJ-1280-095-2024	APROBACION COTIZACIONES PARA EL MUEBLE DE LA TORRE DE CONTROL
CO-FJ-1280-096-2024	ATENCIÓN URGENTE POR AFECTACIÓN A TERCEROS EN MANTENIIENTOS DE PINTURA

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISOS PENDIENTES

* Atender las emergencias y necesidades en la torre de control.
* Se requiere la entrega de las bandejas y las urnas de vidrio.
* Realizar el mantenimiento con ornamentación de las puertas.
* Pendiente la emergencia de la planta de equipos electrógenos.
* Adecuación de punto de aseo para el área de sanidad
* Mantenimiento del domo en la sala de abordaje #2

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

PENDIENTES EVIDENCIADOS POSTERIOR AL COMITÉ DE OBRA No.9

SANIDAD	SALA No. 1
* Resane de enchape del mesón de sala de procedimiento	* Mantenimiento de dispensadores de jabón
* Mantenimiento del enchape de muro en el pasillo principal	* Mantenimiento tapa de la tapa del gabinete eléctrico
* Mantenimiento de puerta en el baño del consultorio	* Mantenimiento de parlantes
* Corrección de acabados de pintura de muros	* Mantenimiento de luminaria de baños
* Limpieza de guarda escobas en general	* Mantenimiento de pintura de las puertas de los baños
* Mantenimiento de tomas y extractores de olores de los baños	* Mantenimiento de vidrios rotos en las ventanas
* Mantenimiento de cubierta, cambio de la estructura de madera y cambio de tejas	
SALA No. 2	**SALA No. 3**
* Mantenimiento de baños segundo piso	* Mantenimiento de orinal
* Inicio de mantenimiento sala # 2	* Mantenimiento de pintura de sillas
* Mantenimiento de interruptor para el baño	* Mantenimiento de pintura, franja azul
* Mantenimiento, limpieza y pintura de sillas	* Mantenimiento de puerta del baño
* Mantenimiento de divisiones de baños	
OFICINA DE AVIANCA	**SALA DE LLEGADA DE PASAJEROS**
* Mantenimiento de humedad muro	* Mantenimiento de cielo raso en los baños
* Mantenimiento de cubierta	* Instalación de accesorios en los baños
* Mantenimiento de puerta de ingreso	* Mantenimiento de enchape en los baños

NOTA	Se le comunico al contratista del contrato de mantenimiento 23001163 H4 de 2023, que la interventoria aprovará el acta de entrega una vez sean atendidas estas actividades pendientes evidenciadas en el recorrido de supervision realizado el dia 15-ago-2024 y el recorrido del 21-ago-24.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA


PERSONAL DE OBRA			
PERSONAL OPERATIVO		PERSONAL ADMINISTRATIVO	
INSPECTOR DE OBRA	2	DIRECTOR DE OBRA	1
OFICIAL	2	RESIDENTE DE OBRA	1
AYUDANTE	7	PROFESIONAL SST	1
TOTAL	11	TOTAL	3


PERSONAL DE INTERVENTORIA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
PROFESIONAL SST	1
TOTAL	3

Personal de Interventoría	3
Personal del Contratista	14
Total Personal en Obra	17

EQUIPOS EN OBRA:	Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

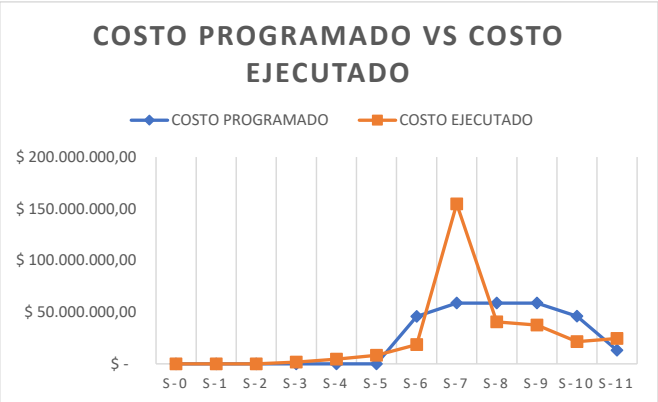

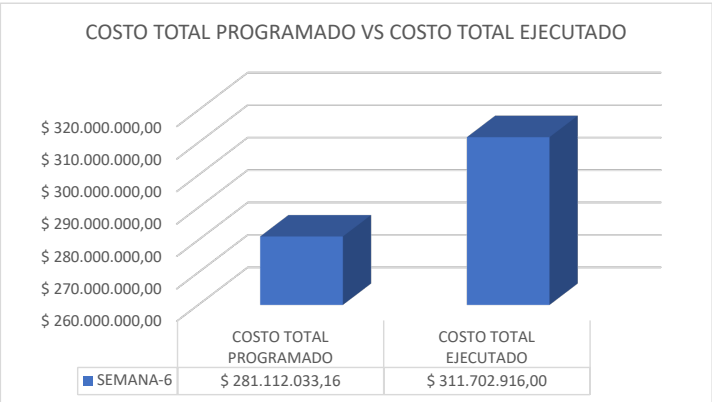

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

AVANCE FINANCIERO DE OBRA	
NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento del 16,00%. Equivalente a $311,702,916,00 millones de pesos.


AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA	
NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de interventoría presenta un avance porcentual de tiempo transcurrido de 10,18%.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MUROS DE LA FACHADA LADO SUR



No. FOTO	Mantenimiento de pintura y cubrimiento de puertas y ventanas para aplicación de pintura
1	

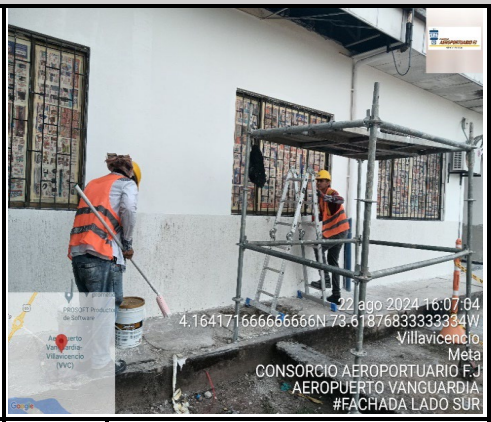

No. FOTO	Mantenimiento de pintura y cubrimiento de puertas y ventanas para aplicación de pintura
2	



No. FOTO	Mantenimiento de pintura y aplicación de estuco
3	

MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS DE LA FACHADA LADO SUR



No. FOTO	Mantenimiento de pintura de puertas y ventanas en sanidad
4	



No. FOTO	Mantenimiento de pintura de puertas y ventanas oficina de grupo control y seguridad
5	



No. FOTO	Mantenimiento de pintura de puertas y ventanas oficina AIM
6	

MANTENIMIENTO DE PINTURA EN SALA DE ABORDAJE # 3



No. FOTO	Mantenimiento de pintura, franja azul
7	



No. FOTO	Mantenimiento de pintura, franja azul
8	



No. FOTO	Mantenimiento de pinturade las sillas
9	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

MANTENIMIENTOS EN EL ÁREA DE SANIDAD



No. FOTO	Mantenimiento de enchape de muro en el pasillo principal
10	



No. FOTO	ntenimiento de extractores de olores en los baño
11	



No. FOTO	Mantenimiento de enchape en mesón de sala de procedimientos
12	

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS



No. FOTO	Mantenimiento de aire acondicionado en el cuarto de almacenamiento de medicamentos
13	



No. FOTO	Mantenimiento de aire acondicionado en el cuarto de almacenamiento de medicamentos
14	



No. FOTO	Mantenimiento de aire acondicionado en la estación de bomberos sala SEI
15	

MANTENIMIENTOS CUADRILLA ELÉCTRICA



No. FOTO	Mantenimientos de luminarias e instalacion de estractores en baños de sanidad
16	




No. FOTO	Mantenimiento de aires acondicionados
17	



No. FOTO	Mantenimientos de luminarias e instalacion de estractores en baños de sanidad
18	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS

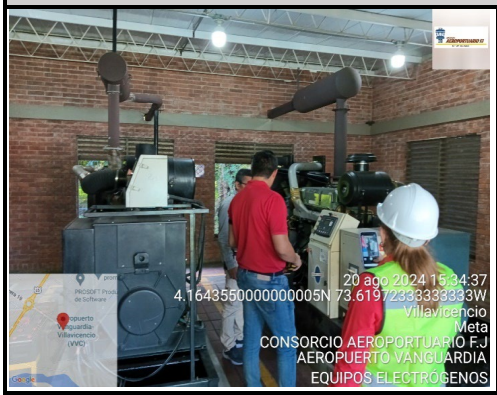

No. FOTO	Atención de emergencias en la planta de equipos electrógenos
19	



No. FOTO	Mantenimiento de equipos electrógenos, reparación de la manguera que estaba ocasionando el derrame de combustible
20	



No. FOTO	Atención de emergencias en la planta de equipos electrógenos
21	


MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y ENTREGA DE BANDEJAS



No. FOTO	Mantenimiento y desmonte de la cubierta y la estructura metálica del parqueadero de ambulancias
22	



No. FOTO	Mantenimiento y desmonte de la estructura metálica del parqueadero de ambulancias
23	

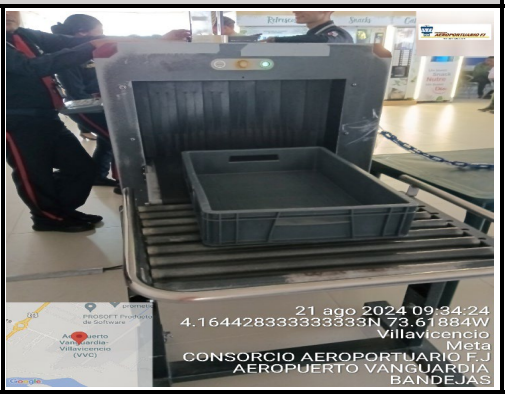

No. FOTO	Entrega de bandejas para la revisión de elementos en la máquina de rayos X
24	

MANTENIMIENTO DEL MANTO EN LA TORRE DE CONTROL



No. FOTO	Mantenimiento de manto impermeabilizante en la torre de control
25	



No. FOTO	Mantenimiento de manto impermeabilizante en la torre de control
26	



No. FOTO	Mantenimiento de manto impermeabilizante en la torre de control
27	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

GESTIÓN SST

		
No. FOTO 28	**Charla Preoperacional en seguridad en armado y traslado con andamios**	**No. FOTO 29**	**Señalización cierre de área de trabajo**	**No. FOTO 30**	**Charla Preoperacional en seguridad de trabajos con escaleras**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Veintiséis	(26)	días del mes de	agosto	de	2024
(Día en letras)	(Día en Números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

(Firma)

Sandra Yonaira Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

PRESUPUESTO CON MAYORES Y MENORES

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CAT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						+	-		
	1			**MAMPOSTERIA**								
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	$ 38.916,00	$ 2.334.960,00	0	-20	$ 40,00	$1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	$ 30.706,00	$ 1.842.360,00	0	0	$ 60,00	$1.842.360,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	$ 26.258,00	$ 3.938.700,00	0	0	$ 150,00	$3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	$ 38.490,00	$ 76.306.425,00	0	0	$ 1.982,50	$76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	$ 29.591,00	$ 29.324.681,00	0	0	$ 991,00	$29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	$ 15.640,00	$ 37.536.000,00	0	0	$ 2.400,00	$37.536.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	$ 66.017,00	$ 3.895.003,00	0		$ 59,00	$3.895.003,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	$ 33.550,00	$ 1.342.000,00	0		$ 40,00	$1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	$ 1.841,00	$ 736.400,00	0	0	$ 400,00	$736.400,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	$ 27.292,00	$ 42.657.298,00	0	0	$ 1.563,00	$42.657.297,75
Subtotal								**$ 199.913.827,00**				**$ 199.135.506,75**
	2			**PISOS**								
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	$ 20.128,00	$ 14.089.600,00	0	-300	$ 400,00	$8.051.200,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	$ 86.865,00	$ 9.989.475,00	0		$ 115,00	$9.989.475,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO)	M2	38,00	$ 175.568,00	$ 6.671.584,00	0	-37	$ 1,00	$175.568,00
Subtotal								**$ 30.750.659,00**				**$ 18.216.243,00**
	3			**CUBIERTA Y CIELORASO**							$ -	
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO;NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	$ 480.205,00	$ 11.524.920,00	0	0	$ 24,00	$11.524.920,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	$ 89.881,00	$ 44.041.690,00	0	0	$ 490,00	$44.041.690,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	$ 140.472,00	$ 68.831.280,00	0	-300	$ 190,00	$26.689.680,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	$ 89.781,00	$ 33.039.408,00	0		$ 368,00	$33.039.408,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	$ 28.249,00	$ 2.824.900,00	0	0	$ 100,00	$2.824.900,00
Subtotal								**$ 160.262.198,00**				**$ 118.120.598,00**
	4			**CARPINTERIA METÁLICA**								
19	4.1		4.1	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	$ 451.209,00	$ 2.256.045,00	0		$ 5,00	$2.256.045,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSINAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	$ 17.857,00	$ 5.357.100,00	200	0	$ 500,00	$8.928.500,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	$ 22.736,00	$ 4.547.200,00	0	0	$ 200,00	$4.547.200,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACREO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	$ 83.129,00	$ 6.816.578,00	0	0	$ 82,00	$6.816.578,00
Subtotal								**$ 18.976.923,00**				**$ 22.548.323,00**
	5			**CARPINTERIA MADERA**								
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	$ 476.557,00	$ 3.335.899,00		-5	$ 2,00	$953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	$ 12.995,00	$ 2.011.626,00	0		$ 154,80	$2.011.626,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	$ 38.231,00	$ 2.959.079,00	0		$ 77,40	$2.959.079,40
Subtotal								**$ 8.306.604,00**				**$ 5.923.819,40**
	6			**CRISTALERIA**								
26	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/0 PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	$ 289.652,00	$ 14.482.600,00		-30	$ 20,00	$5.793.040,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	$ 84.356,00	$ 4.217.800,00		-50	$ -	$0,00
Subtotal								**$ 18.700.400,00**				**$ 5.793.040,00**

7				**CANALETAS Y PORTACABLES**								
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	$ 61.879,00	$ 30.939.500,00		250	$ 750,00	$46.409.250,00
Subtotal								**$ 30.939.500,00**				**$ 46.409.250,00**
8				**LIMPIEZA PROFUNDA**								
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	$ 9.054,00	$ 82.391.400,00	0		$ 9.100,00	$82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	$ 14.260,00	$ 87.342.500,00	0		$ 6.125,00	$87.342.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	$ 7.870,00	$ 11.805.000,00	0		$ 1.500,00	$11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	$ 627.943,00	$ 100.470.880,00	0		$ 160,00	$100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	$ 30.741,00	$ 293.365.667,00		-1000	$ 8.543,14	$262.624.666,74
Subtotal								**$ 575.375.447,00**				**$ 544.634.446,74**
9				**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**								
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 61.126.435,00	$ 61.126.435,00	0		$ 1,00	$61.126.435,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	$ 22.193.560,00	$ 22.193.560,00	0		$ 1,00	$22.193.560,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 72.618.205,00	$ 72.618.205,00	0		$ 1,00	$72.618.205,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	$ 589.218,00	$ 14.141.232,00	0	-24	$ -	$0,00
Subtotal								**$ 170.079.432,00**				**$ 155.938.200,00**
10				**MANO DE OBRA**								
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	$ 11.766.194,00	$ 352.985.820,00	0	0	$ 30,00	$352.985.820,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	$ 39.080,00	$ 18.758.400,00	200	0	$ 680,00	$26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	$ 36.074,00	$ 25.973.280,00	200	0	$ 920,00	$33.188.080,00
	SUBTOTAL				SUBTOTAL			**$ 397.717.500,00**				**$ 412.748.300,00**
							SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO	**$ 1.611.022.490,00**				**$ 1.529.467.726,89**

IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 11.956.808,00		$ 0,19	$ 11.351.518,00
SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)		**$ 1.622.979.298,00**			**$ 1.540.819.244,89**

11				**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**								
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	$ 324.595.613,00	$ 324.595.613,00				$ 406.755.666,11
							TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**$ 324.595.613,00**				$ 406.755.666,11

VALOR TOTAL	**$ 1.947.574.911,00**		**$ 1.947.574.911,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.

DESCRIPCION		**PORCENTAJE**
ADMINISTRACIÓN	**A=**	20%
IMPREVISTO	**I=**	3%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	28%

	20%
	3%
	5%
	28%

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	**MINISTERIO DE TRANSPORTE** **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL** **CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 de agosto **Y EL** 24 de agosto **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING.JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

		FECHA	AGOSTO 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																														
NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1							
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1							
DIANA CRISTINA REYES DIAZ	65.707.341	SISOMA INTERVETORIA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1							
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0

		FECHA	SEPTIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																													
NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	M	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA																														
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA																														
DIANA CRISTINA REYES DIAZ	65.707.341	SISOMA INTERVETORIA																														
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 de agosto **Y EL** 24 de agosto **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

AGOSTO 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO

FECHA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NOMBRE	**CARGO**	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ	DIRECTOR DE OBRA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1								
LOREDANA PERDOMO	PROFESIONAL SST AMBIENTAL	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1								
WILIAM CAVIEDES	INGENIERO RESIDENTE	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1								
LUZ MARINA BLANCO	AUXILIAR DE INGENIERIA																				1	1	1	1								
EDGAR SALINAS	INSPECTOR	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1								
JHON JAIRO GUTIERREZ	MAESTRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1								
CESAR RODRIGUEZ	OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1								
ALEXANDER FLOREZ	OFICIAL	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1								
JAVIER ANDRES VALENCIA	ELECTRICO	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1								
JHON JAIRO CUESTA	AYUDANTE																															
ALVARO MACIAS	AYUDANTE																															
REINALDO GUZMAN GIRALDO	OFICIAL	1	1			1	1	1	1	1	1										1	1	1	1								
JUAN ESTEBAN LOPEZ FONSECA	AYUDANTE	1		1		1	1	1	1	1	1																					
GUILLERO ALEJANDRO GONZALES BERNAL	AYUDANTE	1	1	1																	1	1	1	1								
FERNANDO ARTURO CARATI REYES	OFICIAL																				1	1	1	1								
MARCO LEYTON DOS PASOS GARCIA	AYUDANTE	1		1																												
CANDELARIA MARTINEZ DIAZ	LAVADO PISOS																															
HECTOR FABIAN LOPEZ SAMUDIO	OFICIAL	1	1	1		1	1	1	1	1	1										1	1	1	1								
JUAN DAVID LOZANO	AYUDANTE		1	1		1	1	1	1	1	1												1	1								
YURY ANDREA CRUZ RODRIGUEZ	LAVADO PISOS																															
YENNI LORENA SILVA GONZALEZ	LAVADO PISOS																															
CARLOS VARGAS	AIRES ACONDICIONADOS		1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1														
CARLOS BONACI	AIRES ACONDICIONADOS		1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1														
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		13	14	13	2	14	14	14	14	14	14	0	10	10	10	10	10	10	0	0	13	13	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0

SEPTIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO

FECHA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
NOMBRE	**CARGO**	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
ORLANDO ORDOÑEZ	DIRECTOR DE OBRA																														
LOREDANA PERDOMO	PROFESIONAL SST AMBIENTAL																														
WILIAM CAVIEDES	INGENIERO RESIDENTE																														
LUZ MARINA BLANCO	AUXILIAR DE INGENIERIA																														
EDGAR SALINAS	INSPECTOR																														
JHON JAIRO GUTIERREZ	MAESTRO																														
CESAR RODRIGUEZ	OFICIAL																														
ALEXANDER FLOREZ	OFICIAL																														
JAVIER ANDRES VALENCIA	ELECTRICO																														
JHON JAIRO CUESTA	AYUDANTE																														
ALVARO MACIAS	AYUDANTE																														
REINALDO GUZMAN GIRALDO	OFICIAL																														
JUAN ESTEBAN LOPEZ FONSECA	AYUDANTE																														
GUILLERO ALEJANDRO GONZALES BERNAL	AYUDANTE																														
FERNANDO ARTURO CARATI REYES	OFICIAL																														
MARCO LEYTON DOS PASOS GARCIA	AYUDANTE																														
CANDELARIA MARTINEZ DIAZ	LAVADO PISOS																														
HECTOR FABIAN LOPEZ SAMUDIO	OFICIAL																														
JUAN DAVID LOZANO	AYUDANTE																														
YURY ANDREA CRUZ RODRIGUEZ	LAVADO PISOS																														
YENNI LORENA SILVA GONZALEZ	LAVADO PISOS																														
CARLOS VARGAS	AIRES ACONDICIONADOS																														
CARLOS BONACI	AIRES ACONDICIONADOS																														
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	DE

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 de agosto **Y EL** 24 de agosto **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

FECHA		AGOSTO 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																													SEPTIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
NOMBRE	**CARGO**	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
ORLANDO ORDOÑEZ	DIRECTOR DE OBRA																																																																
LOREDANA PERDOMO	PROFESIONAL SST AMBIENTAL																																																														
WILIAM CAVIEDES	INGENIERO RESIDENTE																																																														
EDGAR SALINAS	INSPECTOR																																																														
JHON JAIRO GUTIERREZ	MAESTRO																																																														
CESAR RODRIGUEZ	OFICIAL																																																														
ALEXANDER FLOREZ	OFICIAL																																																														
JAVIER ANDRES VALENCIA	ELECTRICO																																																														
JHON JAIRO CUESTA	AYUDANTE	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																																										
ALVARO MACIAS	AYUDANTE	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																																									
REINALDO GUZMAN GIRALDO	OFICIAL																																																														
JUAN ESTEBAN LOPEZ FONSECA	AYUDANTE																																																														
GUILLERO ALEJANDRO GONZALES BERNAL	AYUDANTE																																																													
FERNANDO ARTURO CARATI REYES	OFICIAL	1	1	1		1	1	1	1	1	1																																																				
MARCO LEYTON DOS PASOS GARCIA	AYUDANTE																																																													
CANDELARIA MARTINEZ DIAZ	LAVADO PISOS	1	1	1		1	1	1	1	1	1																																																			
HECTOR FABIAN LOPEZ SAMUDIO	OFICIAL																																																													
JUAN DAVID LOZANO	AYUDANTE																																																													
YURY ANDREA CRUZ RODRIGUEZ	LAVADO PISOS		1																																																											
YENNI LORENA SILVA GONZALEZ	LAVADO PISOS		1	1		1	1	1	1	1	1																																																			
CARLOS VARGAS	AIRES ACONDICIONADOS																																																														
CARLOS BONACI	AIRES ACONDICIONADOS																																																													
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		4	6	5	0	5	5	5	5	5	5	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			COSTO PROGRAMADO				EJECUTADO			
			PROGRAMADO							
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL	COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 104.547.219,71	5,37%	$ 58.734.393,10	3,02%	$ 187.656.630,00	9,64%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 163.281.612,81	8,38%	$ 58.734.393,10	3,02%	$ 228.308.146,00	11,72%	$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	$ 222.016.005,91	11,40%	$ 58.734.393,10	3,02%	$ 265.699.525,00	13,64%	$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	$ 267.981.357,99	13,76%	$ 45.965.352,08	2,36%	$ 287.156.607,00	14,74%	$ 21.457.082,00	1,10%
11	**S-11**	**25/08/2024**	**$ 281.112.033,16**	**14,43%**	**$ 13.130.675,17**	**0,67%**	**$ 311.702.916,00**	**16,00%**	**$ 24.546.309,00**	**1,26%**
12	S-12	1/09/2024	$ 294.242.708,33	15,11%	$ 13.130.675,17	0,67%		16,00%	$ 0,00	0,00%
13	S-13	8/09/2024	$ 307.373.383,50	15,78%	$ 13.130.675,17	0,67%		16,00%	$ 0,00	0,00%
14	S-14	15/09/2024	$ 320.504.058,67	16,46%	$ 13.130.675,17	0,67%		16,00%	$ 0,00	0,00%
15	S-15	22/09/2024	$ 336.339.384,58	17,27%	$ 15.835.325,91	0,81%		16,00%	$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	$ 352.937.560,70	18,12%	$ 16.598.176,12	0,85%		16,00%	$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	$ 374.247.028,83	19,22%	$ 21.309.468,13	1,09%		16,00%	$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	$ 401.170.505,98	20,60%	$ 26.923.477,15	1,38%		16,00%	$ 0,00	0,00%
19	S-19	20/10/2024	$ 428.093.983,13	21,98%	$ 26.923.477,15	1,38%		16,00%	$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	$ 455.017.460,28	23,36%	$ 26.923.477,15	1,38%				
21	S-21	3/11/2024	$ 481.940.937,43	24,75%	$ 26.923.477,15	1,38%				
22	S-22	10/11/2024	$ 508.770.878,31	26,12%	$ 26.829.940,88	1,38%				
23	S-23	17/11/2024	$ 535.533.086,04	27,50%	$ 26.762.207,73	1,37%				
24	S-24	24/11/2024	$ 562.295.293,77	28,87%	$ 26.762.207,73	1,37%				
25	S-25	1/12/2024	$ 589.057.501,50	30,25%	$ 26.762.207,73	1,37%				
26	S-26	8/12/2024	$ 613.961.736,22	31,52%	$ 24.904.234,72	1,28%				
27	S-27	15/12/2024	$ 634.212.216,92	32,56%	$ 20.250.480,70	1,04%				
28	S-28	22/12/2024	$ 650.072.944,39	33,38%	$ 15.860.727,47	0,81%				
29	S-29	29/12/2024	$ 663.682.314,47	34,08%	$ 13.609.370,08	0,70%				
30	S-30	5/01/2025	$ 673.618.417,22	34,59%	$ 9.936.102,75	0,51%				
31	S-31	12/01/2025	$ 683.554.519,97	35,10%	$ 9.936.102,75	0,51%				
32	S-32	19/01/2025	$ 693.490.622,72	35,61%	$ 9.936.102,75	0,51%				
33	S-33	26/01/2025	$ 703.766.316,78	36,14%	$ 10.275.694,06	0,53%				
34	S-34	2/02/2025	$ 714.137.793,00	36,67%	$ 10.371.476,22	0,53%				
35	S-35	9/02/2025	$ 724.265.806,04	37,19%	$ 10.128.013,04	0,52%				
36	S-36	16/02/2025	$ 731.593.992,49	37,56%	$ 7.328.186,45	0,38%				
37	S-37	23/02/2025	$ 738.922.178,94	37,94%	$ 7.328.186,45	0,38%				
38	S-38	2/03/2025	$ 757.980.970,75	38,92%	$ 19.058.791,81	0,98%				
39	S-39	9/03/2025	$ 796.179.171,30	40,88%	$ 38.198.200,55	1,96%				
40	S-40	16/03/2025	$ 835.853.763,56	42,92%	$ 39.674.592,26	2,04%				
41	S-41	23/03/2025	$ 876.597.467,07	45,01%	$ 40.743.703,51	2,09%				
42	S-42	30/03/2025	$ 917.341.170,58	47,10%	$ 40.743.703,51	2,09%				
43	S-43	6/04/2025	$ 931.369.380,59	47,82%	$ 14.028.210,01	0,72%				
44	S-44	13/04/2025	$ 941.787.649,20	48,36%	$ 10.418.268,61	0,53%				
45	S-45	20/04/2025	$ 952.206.592,93	48,89%	$ 10.418.943,73	0,53%				
46	S-46	27/04/2025	$ 962.842.934,88	49,44%	$ 10.636.341,95	0,55%				
47	S-47	4/05/2025	$ 972.624.266,23	49,94%	$ 9.781.331,35	0,50%				
48	S-48	11/05/2025	$ 980.098.488,48	50,32%	$ 7.474.222,25	0,38%				
49	S-49	18/05/2025	$ 994.922.494,90	51,09%	$ 14.824.006,42	0,76%				
50	S-50	25/05/2025	$ 1.015.068.758,81	52,12%	$ 20.146.263,91	1,03%				
51	S-51	1/06/2025	$ 1.035.215.022,72	53,15%	$ 20.146.263,91	1,03%				
52	S-52	8/06/2025	$ 1.055.361.286,63	54,19%	$ 20.146.263,91	1,03%				
53	S-53	15/06/2025	$ 1.075.507.550,54	55,22%	$ 20.146.263,91	1,03%				
54	S-54	22/06/2025	$ 1.095.383.369,94	56,24%	$ 19.875.819,40	1,02%				
55	S-55	29/06/2025	$ 1.114.027.164,38	57,20%	$ 18.643.794,44	0,96%				
56	S-56	6/07/2025	$ 1.132.670.958,82	58,16%	$ 18.643.794,44	0,96%				
57	S-57	13/07/2025	$ 1.151.314.753,26	59,12%	$ 18.643.794,44	0,96%				
58	S-58	20/07/2025	$ 1.171.281.482,43	60,14%	$ 19.966.729,17	1,03%				
59	S-59	27/07/2025	$ 1.192.206.198,82	61,21%	$ 20.924.716,39	1,07%				
60	S-60	3/08/2025	$ 1.209.634.483,11	62,11%	$ 17.428.284,29	0,89%				
61	S-61	10/08/2025	$ 1.226.076.594,25	62,95%	$ 16.442.111,14	0,84%				
62	S-62	17/08/2025	$ 1.233.714.313,88	63,35%	$ 7.637.719,63	0,39%				
63	S-63	24/08/2025	$ 1.241.172.352,05	63,73%	$ 7.458.038,17	0,38%				
64	S-64	31/08/2025	$ 1.248.365.634,36	64,10%	$ 7.193.282,31	0,37%				
65	S-65	7/09/2025	$ 1.254.878.115,87	64,43%	$ 6.512.481,51	0,33%				
66	S-66	14/09/2025	$ 1.261.390.597,38	64,77%	$ 6.512.481,51	0,33%				
67	S-67	21/09/2025	$ 1.267.733.439,63	65,09%	$ 6.342.842,25	0,33%				
68	S-68	28/09/2025	$ 1.273.953.439,66	65,41%	$ 6.220.000,03	0,32%				
69	S-69	5/10/2025	$ 1.280.173.439,69	65,73%	$ 6.220.000,03	0,32%				
70	S-70	12/10/2025	$ 1.286.393.439,72	66,05%	$ 6.220.000,03	0,32%				
71	S-71	19/10/2025	$ 1.325.893.877,29	68,08%	$ 39.500.437,57	2,03%				
72	S-72	26/10/2025	$ 1.366.073.507,47	70,14%	$ 40.179.630,18	2,06%				
73	S-73	2/11/2025	$ 1.406.253.137,65	72,21%	$ 40.179.630,18	2,06%				
74	S-74	9/11/2025	$ 1.446.432.767,83	74,27%	$ 40.179.630,18	2,06%				
75	S-75	16/11/2025	$ 1.473.252.146,74	75,65%	$ 26.819.378,91	1,38%				
76	S-76	23/11/2025	$ 1.485.874.113,84	76,29%	$ 12.621.967,10	0,65%				
77	S-77	30/11/2025	$ 1.498.696.083,31	76,95%	$ 12.821.969,47	0,66%				
78	S-78	7/12/2025	$ 1.511.518.052,78	77,61%	$ 12.821.969,47	0,66%				

79	S-79	14/12/2025	$ 1.524.340.022,25	78,27%	$ 12.821.969,47	0,66%
80	S-80	21/12/2025	$ 1.533.088.604,89	78,72%	$ 8.748.582,64	0,45%
81	S-81	28/12/2025	$ 1.541.349.091,56	79,14%	$ 8.260.486,67	0,42%
82	S-82	4/01/2026	$ 1.547.764.734,78	79,47%	$ 6.415.643,22	0,33%
83	S-83	11/01/2026	$ 1.554.180.378,00	79,80%	$ 6.415.643,22	0,33%
84	S-84	18/01/2026	$ 1.561.147.319,89	80,16%	$ 6.966.941,89	0,36%
85	S-85	25/01/2026	$ 1.569.039.773,60	80,56%	$ 7.892.453,71	0,41%
86	S-86	1/02/2026	$ 1.577.169.941,22	80,98%	$ 8.130.167,62	0,42%
87	S-87	8/02/2026	$ 1.585.066.137,73	81,39%	$ 7.896.196,51	0,41%
88	S-88	15/02/2026	$ 1.592.896.342,39	81,79%	$ 7.830.204,66	0,40%
89	S-89	22/02/2026	$ 1.600.740.077,38	82,19%	$ 7.843.734,99	0,40%
90	S-90	1/03/2026	$ 1.608.739.411,11	82,60%	$ 7.999.333,73	0,41%
91	S-91	8/03/2026	$ 1.616.532.746,82	83,00%	$ 7.793.335,71	0,40%
92	S-92	15/03/2026	$ 1.625.499.763,32	83,46%	$ 8.967.016,50	0,46%
93	S-93	22/03/2026	$ 1.637.498.649,21	84,08%	$ 11.998.885,89	0,62%
94	S-94	29/03/2026	$ 1.649.771.243,75	84,71%	$ 12.272.594,54	0,63%
95	S-95	5/04/2026	$ 1.664.573.433,63	85,47%	$ 14.802.189,88	0,76%
96	S-96	12/04/2026	$ 1.680.566.021,32	86,29%	$ 15.992.587,69	0,82%
97	S-97	19/04/2026	$ 1.696.558.609,01	87,11%	$ 15.992.587,69	0,82%
98	S-98	26/04/2026	$ 1.704.432.501,33	87,52%	$ 7.873.892,32	0,40%
99	S-99	3/05/2026	$ 1.712.140.705,99	87,91%	$ 7.708.204,66	0,40%
100	S-100	10/05/2026	$ 1.721.817.914,73	88,41%	$ 9.677.208,74	0,50%
101	S-101	17/05/2026	$ 1.736.558.276,80	89,17%	$ 14.740.362,07	0,76%
102	S-102	24/05/2026	$ 1.751.298.638,87	89,92%	$ 14.740.362,07	0,76%
103	S-103	31/05/2026	$ 1.766.039.000,94	90,68%	$ 14.740.362,07	0,76%
104	S-104	7/06/2026	$ 1.774.935.235,23	91,14%	$ 8.896.234,29	0,46%
105	S-105	14/06/2026	$ 1.781.081.291,74	91,45%	$ 6.146.056,51	0,32%
106	S-106	21/06/2026	$ 1.787.227.348,25	91,77%	$ 6.146.056,51	0,32%
107	S-107	28/06/2026	$ 1.793.373.404,76	92,08%	$ 6.146.056,51	0,32%
108	S-108	5/07/2026	$ 1.799.519.461,27	92,40%	$ 6.146.056,51	0,32%
109	S-109	12/07/2026	$ 1.805.665.517,78	92,71%	$ 6.146.056,51	0,32%
110	S-110	19/07/2026	$ 1.811.811.574,29	93,03%	$ 6.146.056,51	0,32%
111	S-111	26/07/2026	$ 1.817.957.630,80	93,34%	$ 6.146.056,51	0,32%
112	S-112	2/08/2026	$ 1.824.103.687,31	93,66%	$ 6.146.056,51	0,32%
113	S-113	9/08/2026	$ 1.830.249.743,82	93,98%	$ 6.146.056,51	0,32%
114	S-114	16/08/2026	$ 1.836.395.800,33	94,29%	$ 6.146.056,51	0,32%
115	S-115	23/08/2026	$ 1.842.541.856,84	94,61%	$ 6.146.056,51	0,32%
116	S-116	30/08/2026	$ 1.848.687.913,35	94,92%	$ 6.146.056,51	0,32%
117	S-117	6/09/2026	$ 1.854.833.969,86	95,24%	$ 6.146.056,51	0,32%
118	S-118	13/09/2026	$ 1.860.980.026,37	95,55%	$ 6.146.056,51	0,32%
119	S-119	20/09/2026	$ 1.867.126.082,88	95,87%	$ 6.146.056,51	0,32%
120	S-120	27/09/2026	$ 1.873.272.139,39	96,18%	$ 6.146.056,51	0,32%
121	S-121	4/10/2026	$ 1.879.089.924,30	96,48%	$ 5.817.784,91	0,30%
122	S-122	11/10/2026	$ 1.884.669.995,30	96,77%	$ 5.580.071,00	0,29%
123	S-123	18/10/2026	$ 1.890.250.066,30	97,06%	$ 5.580.071,00	0,29%
124	S-124	25/10/2026	$ 1.895.830.137,30	97,34%	$ 5.580.071,00	0,29%
125	S-125	1/11/2026	$ 1.901.410.208,30	97,63%	$ 5.580.071,00	0,29%
126	S-126	8/11/2026	$ 1.906.990.279,30	97,92%	$ 5.580.071,00	0,29%
127	S-127	15/11/2026	$ 1.912.570.350,30	98,20%	$ 5.580.071,00	0,29%
128	S-128	22/11/2026	$ 1.918.150.421,30	98,49%	$ 5.580.071,00	0,29%
129	S-129	29/11/2026	$ 1.923.730.492,30	98,78%	$ 5.580.071,00	0,29%
130	S-130	6/12/2026	$ 1.929.310.563,30	99,06%	$ 5.580.071,00	0,29%
131	S-131	13/12/2026	$ 1.934.890.634,30	99,35%	$ 5.580.071,00	0,29%
132	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 12.684.276,30	0,65%
					$ 1.947.574.910,60	100%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón
	Directora de Interventoría.
	CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ
