AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL**			**FECHA:**	16/09/2024
Semana No	**14**	**DEL :**	8-sep-24	**AL:**	14-sep-24
Plazo Total	**25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)**	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		101	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**12,85%**			
Nombre del Supervisor :	**Jorge Beltrán Gómez**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO VANGUARDIA, DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,67%**	**16,46%**	**(%) Ejecutado**	**1,68%**	**23,80%**
Valor programado ($)	**$ 13.130.675,17**	**$ 320.504.058,67**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 32.786.021,00**	**$ 463.556.824,00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**7,35%**
				Valor Adelanto	**$ 143.052.765,33**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	**Contratista:**	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	**Contrato No:**	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	**Valor Inicial:**	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	**Plazo inicial:**	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS	**Plazo actualizado:**	25 MESES Y 25 DÍAS
Fecha de iniciación:	6-jun-24	**Fecha de iniciación:**	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	**Valor total actual del contrato:**	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

EL DÍA JUEVES 12-09-24 SE REALIZA EL COMITÉ DE OBRA No. 13

"Actividades realizadas en obra del (08 al 14 de septiembre del 2024)

- **OFICINA DE ADMINISTRACIÓN:** Se realiza el mantenimiento de luminarias, mantenimiento de pintura de muros, mantenimiento de perfiles metálicos.
- **TORRE DE CONTROL**: Se realiza el mantenimiento de pintura de muros y perfiles metálicos, mantenimiento del mueble de la cocina.
- **FACHADA LADO SUR:** Se realizaron actividades de mantenimiento de estuco y pintura de muros, mantenimiento de humedades.
- **PARQUEADERO PARA AMBULANCIAS:** Se realiza el mantenimiento y adecuación de la cubierta para el parqueadero de ambulancias.
- **ESTACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS:** Se realizó la instalación y desinstalación de los analizadores de redes para realizar la medición de armónicos.
- **CUBIERTA:** Se realiza la instalación de manto impermeabilizante.
- **SALA DE LLEGADA DE PASAJEROS ALFA 7:** Se realiza el mantenimiento de los dispensadores de jabón y dispensadores de toallas, mantenimiento de puerta caída.
- **SALA DE ESPERA No.2:** Se realizo el mantenimiento de pintura de los perfiles metálicos, mantenimiento de pintura de los muros, mantenimiento de boquilla del enchape del piso.
- **SANIDAD:** Ma de los dispensadores de jabón y dispensadores de toallas.
- **ESCALERAS DE ACCESO AL SEGUNDO PISO:** Mantenimiento de la cinta antideslizante, mantenimiento de boquilla.
- **BOMBEROS:** Mantenimiento de redes eléctricas y mantenimiento de luminarias y aires acondicionados.

SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN

SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN

- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electrógenos
- Señalización exterior en baños del primer piso
- Puertas de acceso alfa 7, alfa 3, ornamentación
- Persianas para la oficina AIM y torre de control
- Pintura general parte interna de toda la oficina AIM
- Mantenimiento de la cubierta en sanidad, oficina AIM, alfa 7.
- Mantenimiento del mueble para la sala de espera No. 1
- Mantenimiento de cuarto de aseo para sanidad aeroportuaria
- Mantenimiento de cámaras para el cuarto de equipos electrógenos
- Mantenimiento de punto hidráulico en la plazoleta, mantenimiento de desagües de los lavamanos en las casetas
- Mantenimiento de vidrios y vinilo adhesivo en la sala de espera No.1
- Mantenimiento del sistema de sonido en la sala No.1
- Mantenimiento de las puertas de los baños de la sala de espera No.3
- Mantenimiento de pasadores en los baños del primer piso
- Mantenimiento de sanitarios en los baños para mujeres del primer piso
- Mantenimiento eléctrico en el área del gimnasio de la subestación de bomberos
- Mantenimiento de desagües en los lavamanos y punto hidráulico de las casetas ubicadas en la plazoleta frente al terminal aéreo

NOTA	Se le comunicó al contratista del contrato de mantenimiento 23001163 H4 de 2023, que la interventoria aprobará el acta de entrega de actividades una vez sean atendidas estas actividades pendientes evidenciadas en el recorrido de supervisión realizado el dia 21-ago-24 y el recorrido del 28-ago-2024.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

ACTIVIDADES DESARROLLADAS SST

*Se realiza una charla preoperacional enfocada en el clima y el ambiente laboral, seguida de una sesión de calistenia, se verifica asistencia del personal. Posteriormente, se efectuó una inspección para evaluar al contratista en aspectos de seguridad, incluyendo la revisión de los permisos de trabajo ATS, las inspecciones preoperacionales y el uso adecuado de los elementos de protección individual. Se llevaron a cabo pausas activas a la sombra para permitir el descanso y reducir el riesgo de insolaciones debido a la exposición al sol. Se recomienda al inspector de SST completar el formato de autoreporte de condiciones de salud. Además, se informa que no se dispone de la autorización de la interventoría para realizar trabajos en alturas.

*Se realiza una charla preoperacional centrada en el orden y aseo en las áreas de trabajo, seguida de una sesión de calistenia, se verifica asistencia del personal. Además, se informa que no se cuenta con la autorización de la interventoría para realizar trabajos en alturas. Posteriormente, se efectuó una inspección para evaluar al contratista en aspectos de seguridad. Durante la inspección, se revisaron los permisos de trabajo ATS, las inspecciones preoperacionales y se identificaron los siguientes hallazgos: 1. Áreas sin el cierre adecuado en señalización, presentando un riesgo de caída. 2. Personal sin los elementos de protección individual correspondientes. 3. Herramientas en mal estado. 4.Recipientes de sustancias químicas sin rotulación. Se comunica al inspector SST que no han respondido a los comunicados enviados anteriormente.

*Se realiza una charla preoperacional enfocada en salud ocupacional y SST, seguida de una sesión de calistenia, y se verificó la asistencia del personal. Posteriormente, se efectuó una inspección para evaluar al contratista en aspectos de seguridad, que incluyó la revisión de los permisos de trabajo ATS, las inspecciones preoperacionales, los frentes de trabajo.

*Se realiza una charla preoperacional enfocada en accidentes e incidentes de trabajo, con recomendaciones de seguridad para el bienestar de los trabajadores. Seguida de una sesión de calistenia y se verificó la asistencia del personal. Posteriormente, se efectuó una inspección para evaluar al contratista en aspectos de seguridad, incluyendo la revisión de los permisos de trabajo ATS y las inspecciones preoperacionales. Se recomienda que cada herramienta y equipo tenga un código interno de identificación para facilitar su inspección y seguimiento. Además, se programó una reunión con la interventoría y los administrativos del contratista para el día siguiente.

* Se realiza una charla preoperacional enfocada en los tipos de riesgos que enfrentamos a diario, seguida de una sesión de calistenia. Posteriormente, se efectuó una inspección para evaluar al contratista en aspectos de seguridad, que incluyó la revisión de los permisos de trabajo ATS y las inspecciones preoperacionales. Se verificó la asistencia del personal y se observó que se realizan cierres de áreas, que las áreas están ordenadas y limpias, y que se ha entregado el EPI con mayor frecuencia. Sin embargo, está pendiente la entrega de tapaoidos ajustados al casco y la dotación completa. Finalmente, se llevó a cabo una reunión con el residente, el inspector SST, la auxiliar de ingeniería del Grupo Fao y nosotros, como interventoría residente y Sisoma, con el objetivo de tratar temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FAO-CTO-23001163-0098-2024	PAC DESAGREGADO 2024 - GRUPO FAO SAS
FAO-CTO-23001163-0099-2024	RESPUESTA A COMUNICADO CO-FJ-1280-103-2024
FAO-CTO-23001163-0100-2024	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SEMANA 14.
FAO-CTO-23001163-0101-2024	RESPUESTA A COMUNICADO CO-FJ-1280-104-2024
FAO-CTO-23001163-0102-2024	COTIZACIONES MUEBLE TORRE DE CONTROL Y CÁMARAS DE SEGURIDAD

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CO-FJ-1280-110-2024	APROBACION BMA - (RESPUESTA A COMUNICADO - FAO-CTO-23001163-0096-2024)
CO-FJ-1280-111-2024	RESTRICCIÓN DE TRABAJOS NOCTURNOS Y FINES DE SEMANA
CO-FJ-1280-112-2024	SOLICITUD URGENTE DE RESPUESTA A COMUNICADOS PENDIENTES
CO-FJ-1280-113-2024	ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No13
CO-FJ-1280-114-2024	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
CO-FJ-1280-115-2024	CLIMA ORGANIZACIONAL Y NORMAS DE CONDUCTA
CO-FJ-1280-116-2024	APROBACION DE DISEÑOS - (RESPUESTA A COMUNICADO - FAO-CTO-23001163-094-2024)
CO-FJ-1280-118-2024	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES - INFORMES MENSUALES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA


PERSONAL DE OBRA			
PERSONAL OPERATIVO		PERSONAL ADMINISTRATIVO	
INSPECTOR DE OBRA	2	DIRECTOR DE OBRA	1
OFICIAL	2	RESIDENTE DE OBRA	1
AYUDANTE	5	INSPECTOR SST	1
		INSPECTOR DE APOYO	1
		ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
		ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1
		ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1
TOTAL	9	TOTAL	7


PERSONAL DE INTERVENTORIA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
PROFESIONAL SST	1
TOTAL	3

Personal de Interventoría	3
Personal del Contratista	16
Total Personal en Obra	19

EQUIPOS EN OBRA: Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor.

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

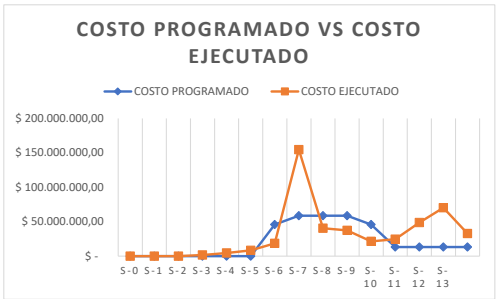

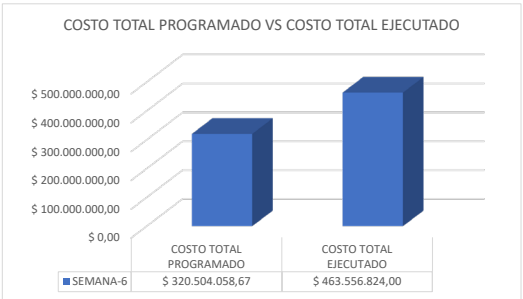


AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

AVANCE FINANCIERO DE OBRA	
NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento por un porcentaje equivalente al 23,80%. Equivalente a $ 463,556,824,00 millones de pesos.

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA	
NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de interventoría presenta un avance porcentual de tiempo transcurrido de 12,85 %.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

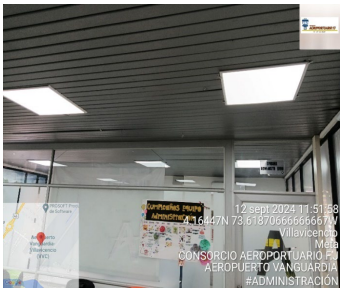

No. FOTO	Mantenimiento de luminarias en la oficina de administración
1	



No. FOTO	Mantenimiento de luminarias en el pasillo y oficinas del área de administración
2	



No. FOTO	Mantenimiento de boquilla en los pasillos y oficinas de administración
3	

MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



No. FOTO	Mantenimiento de estuco en los pasillos y oficinas de administración
4	




No. FOTO	Mantenimiento de pintura en los muros de los pasillos y oficinas de administración
5	



No. FOTO	Mantenimiento de pintura de los perfiles metálicos de los pasillos y oficinas de administración
6	

DESINSTALACIÓN DE ANALIZADORES DE REDES EN EQUIPOS ELECTRÓGENOS

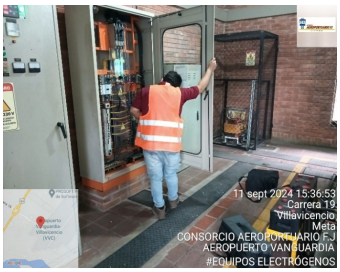

No. FOTO	Desmonte del analizador de redes en la planta de equipos electrógenos
7	



No. FOTO	Desmonte del analizador de redes en la planta de energía del terminal
8	



No. FOTO	Desmonte del analizador de redes en la planta de energía del terminal
9	


MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS DE ACCESO AL SEGUNDO PISO



No. FOTO	Mantenimiento de la cinta antideslizante y la boquilla de las escaleras de acceso al segundo piso
10	



No. FOTO	Mantenimiento de la cinta antideslizante y la boquilla de las escaleras de acceso al segundo piso
11	

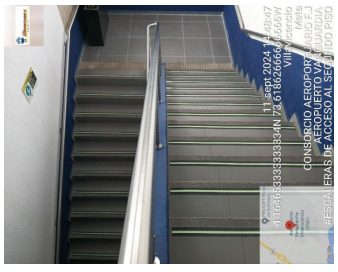

No. FOTO	Mantenimiento de la cinta antideslizante y la boquilla de las escaleras de acceso al segundo piso
12	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

MANTENIMIENTO DE FACHADA LADO SUR DEL TERMINAL AÉREO



No. FOTO	Mantenimiento de humedades en la fachada lado sur
13	



No. FOTO	Mantenimiento de humedades y pintura en la fachada lado sur
14	



No. FOTO	Mantenimiento de humedades y pintura en la fachada lado sur
15	

MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE JABÓN Y TOALLAS



No. FOTO	Mantenimiento de dispensadores de jabón y toallas en sanidad
16	



No. FOTO	Mantenimiento de dispensadores de jabón y toallas en sanidad
17	



No. FOTO	Mantenimiento de dispensadores de jabón y toallas en sala de llegada de pasajeros. Alfa 7
18	

MANTENIMIENTO DEL PARQUEADERO PARA AMBULANCIAS



No. FOTO	Mantenimiento de la cubierta para el parqueadero para ambulancias
19	



No. FOTO	Mantenimiento de la cubierta para el parqueadero para ambulancias
20	




No. FOTO	Mantenimiento de la cubierta para el parqueadero para ambulancias
21	

MANTENIMIENTOS EN LA SALA DE ABORDAJE No.2



No. FOTO	Mantenimiento de boquilla en el pasillo de ingreso a sala No.2
22	

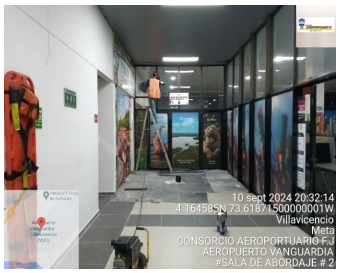

No. FOTO	Mantenimiento de pintura en los perfiles metálicos en el pasillo de ingreso a sala No.2
23	



No. FOTO	Mantenimiento de la cinta antideslizante en las escaleras de salida a plataforma
24	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

MANTENIMIENTOS EN LA SALA DE ABORDAJE No.3



No. FOTO	Mantenimiento de luminarias en la sala de abordaje No.3
25	



No. FOTO	Mantenimiento de luminarias en la sala de abordaje No.3
26	



No. FOTO	Mantenimiento de luminarias en la sala de abordaje No.3
27	

MANTENIMIENTOS EN LA TORRE DE CONTROL



No. FOTO	Mantenimiento de mueble en la cocina de la torre de control
25	



No. FOTO	Mantenimiento de pintura en la perfilería metálica de la torre de control
26	



No. FOTO	Mantenimiento de pintura en los muros de la torre de control
27	

MANTENIMIENTO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA



No. FOTO	Impermeabilización de cubierta con manto asfaltico
25	



No. FOTO	Impermeabilización de cubierta con manto asfaltico
26	



No. FOTO	Impermeabilización de cubierta con manto asfaltico
27	

MANTENIMIENTO DE PASADORES



No. FOTO	Mantenimiento de pasadores en las puertas de la sala de llegada de pasajeros. Alfa 7
25	



No. FOTO	Mantenimiento de pasadores en las puertas de la sala de llegada de pasajeros. Alfa 7
26	



No. FOTO	Mantenimiento de pasadores en las puertas de los baños públicos del primer piso
27	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

OTROS MANTENIMIENTOS



No. FOTO	Mantenimiento de puerta caída en la sala de llegada de pasajeros
25	



No. FOTO	Mantenimiento de chapas en la puerta de ingreso a Sali No.1
26	



No. FOTO	Mantenimiento de aire acondicionado en la estacion de Bomberos
27	

GESTIÓN SST




No. FOTO	Charla preoperacional enfocada en el clima y el ambiente laboral, para la resolución de conflictos.
30	



No. FOTO	Inspección de Seguridad del Personal Operativo: Uso Continuo de Equipos de Protección Individual (EPI)
31	



No. FOTO	charla de accidentes e incidentes de trabajo, con recomendaciones de seguridad para el bienestar de los trabajadores.
32	

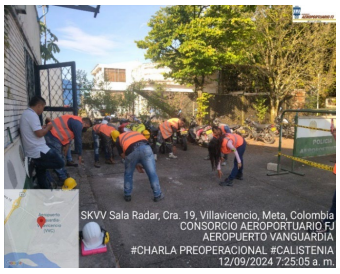

No. FOTO	Sesión de calistenia; nos sirve para preparar el cuerpo para actividades físicas y prevenir lesiones musculoesqueléticas
33	



No. FOTO	Inspección de las Sustancias Químicas Utilizadas en las Actividades: Verificación de la Rotulación
34	



No. FOTO	Señalización de cierre de áreas; con el fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad, para personas externas al proyecto.
35	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2024

(Día en letras) (Día en Números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

Sandra Yonaira Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

PRESUPUESTO CON MAYORES Y MENORES

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CAT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						+	-		
	1			**MAMPOSTERIA**								
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	$ 38.916,00	$ 2.334.960,00	0	-20	$ 40,00	$1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	$ 30.706,00	$ 1.842.360,00	0	0	$ 60,00	$1.842.360,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	$ 26.258,00	$ 3.938.700,00	0	0	$ 150,00	$3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	$ 38.490,00	$ 76.306.425,00	0	0	$ 1.982,50	$76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	$ 29.591,00	$ 29.324.681,00	0	0	$ 991,00	$29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	$ 15.640,00	$ 37.536.000,00	0	0	$ 2.400,00	$37.536.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	$ 66.017,00	$ 3.895.003,00	0		$ 59,00	$3.895.003,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	$ 33.550,00	$ 1.342.000,00	0		$ 40,00	$1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	$ 1.841,00	$ 736.400,00	0	0	$ 400,00	$736.400,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	$ 27.292,00	$ 42.657.298,00	0	0	$ 1.563,00	$42.657.297,75
Subtotal								**$ 199.913.827,00**				**$ 199.135.506,75**
	2			**PISOS**								
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	$ 20.128,00	$ 14.089.600,00	0	-300	$ 400,00	$8.051.200,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	$ 86.865,00	$ 9.989.475,00	0		$ 115,00	$9.989.475,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO)	M2	38,00	$ 175.568,00	$ 6.671.584,00	0	-37	$ 1,00	$175.568,00
Subtotal								**$ 30.750.659,00**				**$ 18.216.243,00**
	3			**CUBIERTA Y CIELORASO**							$ -	
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO;NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	$ 480.205,00	$ 11.524.920,00	0	0	$ 24,00	$11.524.920,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	$ 89.881,00	$ 44.041.690,00	0	0	$ 490,00	$44.041.690,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	$ 140.472,00	$ 68.831.280,00	0	-300	$ 190,00	$26.689.680,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	$ 89.781,00	$ 33.039.408,00	0		$ 368,00	$33.039.408,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	$ 28.249,00	$ 2.824.900,00	0	0	$ 100,00	$2.824.900,00
Subtotal								**$ 160.262.198,00**				**$ 118.120.598,00**
	4			**CARPINTERIA METÁLICA**								
19	4.1		4.1	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	$ 451.209,00	$ 2.256.045,00	0		$ 5,00	$2.256.045,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSINAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	$ 17.857,00	$ 5.357.100,00	200	0	$ 500,00	$8.928.500,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	$ 22.736,00	$ 4.547.200,00	0	0	$ 200,00	$4.547.200,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACREO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	$ 83.129,00	$ 6.816.578,00	0	0	$ 82,00	$6.816.578,00
Subtotal								**$ 18.976.923,00**				**$ 22.548.323,00**
	5			**CARPINTERIA MADERA**								
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	$ 476.557,00	$ 3.335.899,00		-5	$ 2,00	$953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	$ 12.995,00	$ 2.011.626,00	0		$ 154,80	$2.011.626,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	$ 38.231,00	$ 2.959.079,00	0		$ 77,40	$2.959.079,40
Subtotal								**$ 8.306.604,00**				**$ 5.923.819,40**
	6			**CRISTALERIA**								
26	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/0 PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	$ 289.652,00	$ 14.482.600,00		-30	$ 20,00	$5.793.040,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	$ 84.356,00	$ 4.217.800,00		-50	$ -	$0,00
Subtotal								**$ 18.700.400,00**				**$ 5.793.040,00**
	7			**CANALETAS Y PORTACABLES**								
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	$ 61.879,00	$ 30.939.500,00		250	$ 750,00	$46.409.250,00
Subtotal								**$ 30.939.500,00**				**$ 46.409.250,00**

PRESUPUESTO CON MAYORES Y MENORES												
8				**LIMPIEZA PROFUNDA**								
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	$ 9.054,00	$ 82.391.400,00	0		$ 9.100,00	$82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	$ 14.260,00	$ 87.342.500,00	0		$ 6.125,00	$87.342.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	$ 7.870,00	$ 11.805.000,00	0		$ 1.500,00	$11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	$ 627.943,00	$ 100.470.880,00	0		$ 160,00	$100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	$ 30.741,00	$ 293.365.667,00		-1000	$ 8.543,14	$262.624.666,74
Subtotal								**$ 575.375.447,00**				**$ 544.634.446,74**
9				**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**								
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 61.126.435,00	$ 61.126.435,00	0		$ 1,00	$61.126.435,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	$ 22.193.560,00	$ 22.193.560,00	0		$ 1,00	$22.193.560,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 72.618.205,00	$ 72.618.205,00	0		$ 1,00	$72.618.205,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	$ 589.218,00	$ 14.141.232,00	0	-24	$ -	$0,00
Subtotal								**$ 170.079.432,00**				**$ 155.938.200,00**
10				**MANO DE OBRA**								
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	$ 11.766.194,00	$ 352.985.820,00	0	0	$ 30,00	$352.985.820,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	$ 39.080,00	$ 18.758.400,00	200	0	$ 680,00	$26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	$ 36.074,00	$ 25.973.280,00	200	0	$ 920,00	$33.188.080,00
	SUBTOTAL				SUBTOTAL			**$ 397.717.500,00**				**$ 412.748.300,00**
							SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO	**$ 1.611.022.490,00**				**$ 1.529.467.726,89**

IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 11.956.808,00	$ 11.351.518,00
SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)		**$ 1.622.979.298,00**	**$ 1.540.819.244,89**

11				**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**								
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	$ 324.595.613,00	$ 324.595.613,00				$ 406.755.666,11
								TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**$ 324.595.613,00**			$ 406.755.666,11

VALOR TOTAL	**$ 1.947.574.911,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.					**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**					
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.					**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	20%					20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).					**IMPREVISTO**	**I=**	3%					3%
NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.					**UTILIDAD**	**U=**	5%					5%
					TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	28%					28%

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	DE

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08/09/2024 **Y EL** 14/09/2024 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING.JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA / CARGO	AGOSTO 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																													SEPTIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	M	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																			
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																			
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVETORIA																1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																			
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			**2**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	DE

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08/09/2024 **Y EL** 14/09/2024 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

AGOSTO 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO

FECHA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NOMBRE	**CARGO**	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ	DIRECTOR DE OBRA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
JHEYKSON BRAYAN LINARES PABÓN	PROFESIONAL SST AMBIENTAL																															
WILIAM CAVIEDES	INGENIERO RESIDENTE	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
LUZ MARINA BLANCO	AUXILIAR DE INGENIERIA																				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
EDGAR SALINAS	INSPECTOR	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
JHON JAIRO GUTIERREZ	MAESTRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1							
CESAR RODRIGUEZ	OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1
ALEXANDER FLOREZ	OFICIAL	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
JAVIER ANDRES VALENCIA	ELECTRICO	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
JHON JAIRO CUESTA	AYUDANTE																															
ALVARO MACIAS	AYUDANTE																															
REINALDO GUZMAN GIRALDO	OFICIAL	1	1			1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1							
JUAN ESTEBAN LOPEZ FONSECA	AYUDANTE	1		1		1	1	1	1	1	1																					
GUILLERMO ALEJANDRO GONZALES BERNAL	AYUDANTE	1	1	1																	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
FERNANDO ARTURO CARATI REYES	OFICIAL																				1	1	1	1	1							
MARCO LEYTON DOS PASOS GARCIA	AYUDANTE	1		1																												
CANDELARIA MARTINEZ DIAZ	LAVADO PISOS																															
HECTOR FABIAN LOPEZ SAMUDIO	OFICIAL	1	1	1		1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1							
JUAN DAVID LOZANO	AYUDANTE		1	1		1	1	1	1	1	1												1	1	1		1	1	1	1	1	1
YURY ANDREA CRUZ RODRIGUEZ	LAVADO PISOS																															
YENNI LORENA SILVA GONZALEZ	LAVADO PISOS																															
CARLOS VARGAS	AIRES ACONDICIONADOS		1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1														
CARLOS BONACI	AIRES ACONDICIONADOS		1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1														
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		12	13	12	2	13	13	13	13	13	13	0	9	9	9	9	9	9	0	0	12	12	13	13	13	0	8	9	9	9	9	9

SEPTIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO

FECHA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
NOMBRE	**CARGO**	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
ORLANDO ORDOÑEZ	DIRECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1									
JHEYKSON BRAYAN LINARES PABÓN	PROFESIONAL SST AMBIENTAL			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																
WILIAM CAVIEDES	INGENIERO RESIDENTE		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																
LUZ MARINA BLANCO	AUXILIAR DE INGENIERIA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																
EDGAR SALINAS	INSPECTOR		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																
JHON JAIRO GUTIERREZ	MAESTRO																														
CESAR RODRIGUEZ	OFICIAL		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																
ALEXANDER FLOREZ	OFICIAL		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																
JAVIER ANDRES VALENCIA	ELECTRICO		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																
JHON JAIRO CUESTA	AYUDANTE																														
ALVARO MACIAS	AYUDANTE																														
REINALDO GUZMAN GIRALDO	OFICIAL																														
JUAN ESTEBAN LOPEZ FONSECA	AYUDANTE																														
GUILLERMO ALEJANDRO GONZALES BERNAL	AYUDANTE		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																
FERNANDO ARTURO CARATI REYES	OFICIAL		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																
MARCO LEYTON DOS PASOS GARCIA	AYUDANTE																														
CANDELARIA MARTINEZ DIAZ	LAVADO PISOS																														
HECTOR FABIAN LOPEZ SAMUDIO	OFICIAL		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																
JUAN DAVID LOZANO	AYUDANTE																														
YURY ANDREA CRUZ RODRIGUEZ	LAVADO PISOS																														
YENNI LORENA SILVA GONZALEZ	LAVADO PISOS																														
CARLOS VARGAS	AIRES ACONDICIONADOS																														
CARLOS BONACI	AIRES ACONDICIONADOS																														
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		0	10	11	11	11	11	11	0	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08/09/2024 **Y EL** 1409/2024 **PLAZO:** 786 **DÍAS**


SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JORGE BELTRAN


FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

FECHA		AGOSTO 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																													SEPTIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
NOMBRE	**CARGO**	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
ORLANDO ORDOÑEZ	DIRECTOR DE OBRA																																																															
LOREDANA PERDOMO	PROFESIONAL SST AMBIENTAL																																																													
WILIAM CAVIEDES	INGENIERO RESIDENTE																																																													
EDGAR SALINAS	INSPECTOR																																																													
JHON JAIRO GUTIERREZ	MAESTRO																										1	1	1	1				1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1																			
CESAR RODRIGUEZ	OFICIAL																																																													
ALEXANDER FLOREZ	OFICIAL																																																													
JAVIER ANDRES VALENCIA	ELECTRICO																																																													
JHON JAIRO CUESTA ABADIA	AYUDANTE	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																	
ALVARO MACIAS PEÑA	AYUDANTE	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																	
REINALDO GUZMAN GIRALDO	OFICIAL																										1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																	
JUAN ESTEBAN LOPEZ FONSECA	AYUDANTE																																																													
GUILLERO ALEJANDRO GONZALES BERNAL	AYUDANTE																																																												
FERNANDO ARTURO CARATI REYES	OFICIAL	1	1	1		1	1	1	1	1	1																1	1	1	1	1																															
MARCO LEYTON DOS PASOS GARCIA	AYUDANTE																																																												
CANDELARIA MARTINEZ DIAZ	LAVADO PISOS	1	1	1		1	1	1	1	1	1																																																			
HECTOR FABIAN LOPEZ SAMUDIO	OFICIAL																										1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1																											
JUAN DAVID LOZANO	AYUDANTE																																	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																	
YURY ANDREA CRUZ RODRIGUEZ	LAVADO PISOS		1																																																											
YENNI LORENA SILVA GONZALEZ	LAVADO PISOS		1	1		1	1	1	1	1	1																																																			
CARLOS VARGAS	AIRES ACONDICIONADOS																																																													
CARLOS BONACI	AIRES ACONDICIONADOS																																																													
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		4	6	5	0	5	5	5	5	5	5	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	5	6	6	6	6	0	0	6	6	6	6	6	6	0	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			COSTO PROGRAMADO				EJECUTADO			
			PROGRAMADO							
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL	COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 104.547.219,71	5,37%	$ 58.734.393,10	3,02%	$ 187.656.630,00	9,64%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 163.281.612,81	8,38%	$ 58.734.393,10	3,02%	$ 228.308.146,00	11,72%	$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	$ 222.016.005,91	11,40%	$ 58.734.393,10	3,02%	$ 265.699.525,00	13,64%	$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	$ 267.981.357,99	13,76%	$ 45.965.352,08	2,36%	$ 287.156.607,00	14,74%	$ 21.457.082,00	1,10%
11	S-11	25/08/2024	$ 281.112.033,16	14,43%	$ 13.130.675,17	0,67%	$ 311.702.916,00	16,00%	$ 24.546.309,00	1,26%
12	S-12	1/09/2024	$ 294.242.708,33	15,11%	$ 13.130.675,17	0,67%	$ 360.592.928,00	18,51%	$ 48.890.012,00	2,51%
13	S-13	8/09/2024	$ 307.373.383,50	15,78%	$ 13.130.675,17	0,67%	$ 430.770.803,00	22,12%	$ 70.177.875,00	3,60%
14	**S-14**	**15/09/2024**	**$ 320.504.058,67**	**16,46%**	**$ 13.130.675,17**	**0,67%**	**$ 463.556.824,00**	**23,80%**	**$ 32.786.021,00**	**1,68%**
15	S-15	22/09/2024	$ 336.339.384,58	17,27%	$ 15.835.325,91	0,81%		23,80%	$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	$ 352.937.560,70	18,12%	$ 16.598.176,12	0,85%		23,80%	$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	$ 374.247.028,83	19,22%	$ 21.309.468,13	1,09%		23,80%	$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	$ 401.170.505,98	20,60%	$ 26.923.477,15	1,38%		23,80%	$ 0,00	0,00%
19	S-19	20/10/2024	$ 428.093.983,13	21,98%	$ 26.923.477,15	1,38%		23,80%	$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	$ 455.017.460,28	23,36%	$ 26.923.477,15	1,38%				
21	S-21	3/11/2024	$ 481.940.937,43	24,75%	$ 26.923.477,15	1,38%				
22	S-22	10/11/2024	$ 508.770.878,31	26,12%	$ 26.829.940,88	1,38%				
23	S-23	17/11/2024	$ 535.533.086,04	27,50%	$ 26.762.207,73	1,37%				
24	S-24	24/11/2024	$ 562.295.293,77	28,87%	$ 26.762.207,73	1,37%				
25	S-25	1/12/2024	$ 589.057.501,50	30,25%	$ 26.762.207,73	1,37%				
26	S-26	8/12/2024	$ 613.961.736,22	31,52%	$ 24.904.234,72	1,28%				
27	S-27	15/12/2024	$ 634.212.216,92	32,56%	$ 20.250.480,70	1,04%				
28	S-28	22/12/2024	$ 650.072.944,39	33,38%	$ 15.860.727,47	0,81%				
29	S-29	29/12/2024	$ 663.682.314,47	34,08%	$ 13.609.370,08	0,70%				
30	S-30	5/01/2025	$ 673.618.417,22	34,59%	$ 9.936.102,75	0,51%				
31	S-31	12/01/2025	$ 683.554.519,97	35,10%	$ 9.936.102,75	0,51%				
32	S-32	19/01/2025	$ 693.490.622,72	35,61%	$ 9.936.102,75	0,51%				
33	S-33	26/01/2025	$ 703.766.316,78	36,14%	$ 10.275.694,06	0,53%				
34	S-34	2/02/2025	$ 714.137.793,00	36,67%	$ 10.371.476,22	0,53%				
35	S-35	9/02/2025	$ 724.265.806,04	37,19%	$ 10.128.013,04	0,52%				
36	S-36	16/02/2025	$ 731.593.992,49	37,56%	$ 7.328.186,45	0,38%				
37	S-37	23/02/2025	$ 738.922.178,94	37,94%	$ 7.328.186,45	0,38%				
38	S-38	2/03/2025	$ 757.980.970,75	38,92%	$ 19.058.791,81	0,98%				
39	S-39	9/03/2025	$ 796.179.171,30	40,88%	$ 38.198.200,55	1,96%				
40	S-40	16/03/2025	$ 835.853.763,56	42,92%	$ 39.674.592,26	2,04%				
41	S-41	23/03/2025	$ 876.597.467,07	45,01%	$ 40.743.703,51	2,09%				
42	S-42	30/03/2025	$ 917.341.170,58	47,10%	$ 40.743.703,51	2,09%				
43	S-43	6/04/2025	$ 931.369.380,59	47,82%	$ 14.028.210,01	0,72%				
44	S-44	13/04/2025	$ 941.787.649,20	48,36%	$ 10.418.268,61	0,53%				
45	S-45	20/04/2025	$ 952.206.592,93	48,89%	$ 10.418.943,73	0,53%				
46	S-46	27/04/2025	$ 962.842.934,88	49,44%	$ 10.636.341,95	0,55%				
47	S-47	4/05/2025	$ 972.624.266,23	49,94%	$ 9.781.331,35	0,50%				
48	S-48	11/05/2025	$ 980.098.488,48	50,32%	$ 7.474.222,25	0,38%				
49	S-49	18/05/2025	$ 994.922.494,90	51,09%	$ 14.824.006,42	0,76%				
50	S-50	25/05/2025	$ 1.015.068.758,81	52,12%	$ 20.146.263,91	1,03%				
51	S-51	1/06/2025	$ 1.035.215.022,72	53,15%	$ 20.146.263,91	1,03%				
52	S-52	8/06/2025	$ 1.055.361.286,63	54,19%	$ 20.146.263,91	1,03%				
53	S-53	15/06/2025	$ 1.075.507.550,54	55,22%	$ 20.146.263,91	1,03%				
54	S-54	22/06/2025	$ 1.095.383.369,94	56,24%	$ 19.875.819,40	1,02%				
55	S-55	29/06/2025	$ 1.114.027.164,38	57,20%	$ 18.643.794,44	0,96%				
56	S-56	6/07/2025	$ 1.132.670.958,82	58,16%	$ 18.643.794,44	0,96%				
57	S-57	13/07/2025	$ 1.151.314.753,26	59,12%	$ 18.643.794,44	0,96%				
58	S-58	20/07/2025	$ 1.171.281.482,43	60,14%	$ 19.966.729,17	1,03%				
59	S-59	27/07/2025	$ 1.192.206.198,82	61,21%	$ 20.924.716,39	1,07%				
60	S-60	3/08/2025	$ 1.209.634.483,11	62,11%	$ 17.428.284,29	0,89%				
61	S-61	10/08/2025	$ 1.226.076.594,25	62,95%	$ 16.442.111,14	0,84%				
62	S-62	17/08/2025	$ 1.233.714.313,88	63,35%	$ 7.637.719,63	0,39%				
63	S-63	24/08/2025	$ 1.241.172.352,05	63,73%	$ 7.458.038,17	0,38%				
64	S-64	31/08/2025	$ 1.248.365.634,36	64,10%	$ 7.193.282,31	0,37%				
65	S-65	7/09/2025	$ 1.254.878.115,87	64,43%	$ 6.512.481,51	0,33%				
66	S-66	14/09/2025	$ 1.261.390.597,38	64,77%	$ 6.512.481,51	0,33%				
67	S-67	21/09/2025	$ 1.267.733.439,63	65,09%	$ 6.342.842,25	0,33%				
68	S-68	28/09/2025	$ 1.273.953.439,66	65,41%	$ 6.220.000,03	0,32%				
69	S-69	5/10/2025	$ 1.280.173.439,69	65,73%	$ 6.220.000,03	0,32%				
70	S-70	12/10/2025	$ 1.286.393.439,72	66,05%	$ 6.220.000,03	0,32%				

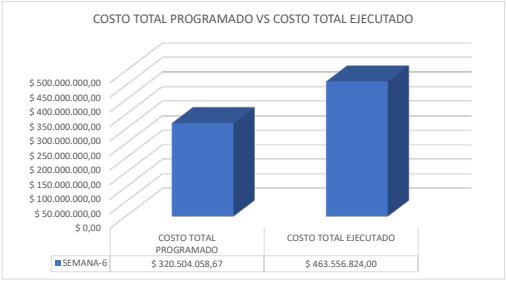

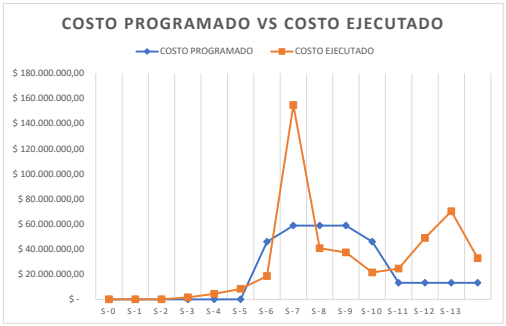

71	S-71	19/10/2025	$ 1.325.893.877,29	68,08%	$ 39.500.437,57	2,03%
72	S-72	26/10/2025	$ 1.366.073.507,47	70,14%	$ 40.179.630,18	2,06%
73	S-73	2/11/2025	$ 1.406.253.137,65	72,21%	$ 40.179.630,18	2,06%
74	S-74	9/11/2025	$ 1.446.432.767,83	74,27%	$ 40.179.630,18	2,06%
75	S-75	16/11/2025	$ 1.473.252.146,74	75,65%	$ 26.819.378,91	1,38%
76	S-76	23/11/2025	$ 1.485.874.113,84	76,29%	$ 12.621.967,10	0,65%
77	S-77	30/11/2025	$ 1.498.696.083,31	76,95%	$ 12.821.969,47	0,66%
78	S-78	7/12/2025	$ 1.511.518.052,78	77,61%	$ 12.821.969,47	0,66%
79	S-79	14/12/2025	$ 1.524.340.022,25	78,27%	$ 12.821.969,47	0,66%
80	S-80	21/12/2025	$ 1.533.088.604,89	78,72%	$ 8.748.582,64	0,45%
81	S-81	28/12/2025	$ 1.541.349.091,56	79,14%	$ 8.260.486,67	0,42%
82	S-82	4/01/2026	$ 1.547.764.734,78	79,47%	$ 6.415.643,22	0,33%
83	S-83	11/01/2026	$ 1.554.180.378,00	79,80%	$ 6.415.643,22	0,33%
84	S-84	18/01/2026	$ 1.561.147.319,89	80,16%	$ 6.966.941,89	0,36%
85	S-85	25/01/2026	$ 1.569.039.773,60	80,56%	$ 7.892.453,71	0,41%
86	S-86	1/02/2026	$ 1.577.169.941,22	80,98%	$ 8.130.167,62	0,42%
87	S-87	8/02/2026	$ 1.585.066.137,73	81,39%	$ 7.896.196,51	0,41%
88	S-88	15/02/2026	$ 1.592.896.342,39	81,79%	$ 7.830.204,66	0,40%
89	S-89	22/02/2026	$ 1.600.740.077,38	82,19%	$ 7.843.734,99	0,40%
90	S-90	1/03/2026	$ 1.608.739.411,11	82,60%	$ 7.999.333,73	0,41%
91	S-91	8/03/2026	$ 1.616.532.746,82	83,00%	$ 7.793.335,71	0,40%
92	S-92	15/03/2026	$ 1.625.499.763,32	83,46%	$ 8.967.016,50	0,46%
93	S-93	22/03/2026	$ 1.637.498.649,21	84,08%	$ 11.998.885,89	0,62%
94	S-94	29/03/2026	$ 1.649.771.243,75	84,71%	$ 12.272.594,54	0,63%
95	S-95	5/04/2026	$ 1.664.573.433,63	85,47%	$ 14.802.189,88	0,76%
96	S-96	12/04/2026	$ 1.680.566.021,32	86,29%	$ 15.992.587,69	0,82%
97	S-97	19/04/2026	$ 1.696.558.609,01	87,11%	$ 15.992.587,69	0,82%
98	S-98	26/04/2026	$ 1.704.432.501,33	87,52%	$ 7.873.892,32	0,40%
99	S-99	3/05/2026	$ 1.712.140.705,99	87,91%	$ 7.708.204,66	0,40%
100	S-100	10/05/2026	$ 1.721.817.914,73	88,41%	$ 9.677.208,74	0,50%
101	S-101	17/05/2026	$ 1.736.558.276,80	89,17%	$ 14.740.362,07	0,76%
102	S-102	24/05/2026	$ 1.751.298.638,87	89,92%	$ 14.740.362,07	0,76%
103	S-103	31/05/2026	$ 1.766.039.000,94	90,68%	$ 14.740.362,07	0,76%
104	S-104	7/06/2026	$ 1.774.935.235,23	91,14%	$ 8.896.234,29	0,46%
105	S-105	14/06/2026	$ 1.781.081.291,74	91,45%	$ 6.146.056,51	0,32%
106	S-106	21/06/2026	$ 1.787.227.348,25	91,77%	$ 6.146.056,51	0,32%
107	S-107	28/06/2026	$ 1.793.373.404,76	92,08%	$ 6.146.056,51	0,32%
108	S-108	5/07/2026	$ 1.799.519.461,27	92,40%	$ 6.146.056,51	0,32%
109	S-109	12/07/2026	$ 1.805.665.517,78	92,71%	$ 6.146.056,51	0,32%
110	S-110	19/07/2026	$ 1.811.811.574,29	93,03%	$ 6.146.056,51	0,32%
111	S-111	26/07/2026	$ 1.817.957.630,80	93,34%	$ 6.146.056,51	0,32%
112	S-112	2/08/2026	$ 1.824.103.687,31	93,66%	$ 6.146.056,51	0,32%
113	S-113	9/08/2026	$ 1.830.249.743,82	93,98%	$ 6.146.056,51	0,32%
114	S-114	16/08/2026	$ 1.836.395.800,33	94,29%	$ 6.146.056,51	0,32%
115	S-115	23/08/2026	$ 1.842.541.856,84	94,61%	$ 6.146.056,51	0,32%
116	S-116	30/08/2026	$ 1.848.687.913,35	94,92%	$ 6.146.056,51	0,32%
117	S-117	6/09/2026	$ 1.854.833.969,86	95,24%	$ 6.146.056,51	0,32%
118	S-118	13/09/2026	$ 1.860.980.026,37	95,55%	$ 6.146.056,51	0,32%
119	S-119	20/09/2026	$ 1.867.126.082,88	95,87%	$ 6.146.056,51	0,32%
120	S-120	27/09/2026	$ 1.873.272.139,39	96,18%	$ 6.146.056,51	0,32%
121	S-121	4/10/2026	$ 1.879.089.924,30	96,48%	$ 5.817.784,91	0,30%
122	S-122	11/10/2026	$ 1.884.669.995,30	96,77%	$ 5.580.071,00	0,29%
123	S-123	18/10/2026	$ 1.890.250.066,30	97,06%	$ 5.580.071,00	0,29%
124	S-124	25/10/2026	$ 1.895.830.137,30	97,34%	$ 5.580.071,00	0,29%
125	S-125	1/11/2026	$ 1.901.410.208,30	97,63%	$ 5.580.071,00	0,29%
126	S-126	8/11/2026	$ 1.906.990.279,30	97,92%	$ 5.580.071,00	0,29%
127	S-127	15/11/2026	$ 1.912.570.350,30	98,20%	$ 5.580.071,00	0,29%
128	S-128	22/11/2026	$ 1.918.150.421,30	98,49%	$ 5.580.071,00	0,29%
129	S-129	29/11/2026	$ 1.923.730.492,30	98,78%	$ 5.580.071,00	0,29%
130	S-130	6/12/2026	$ 1.929.310.563,30	99,06%	$ 5.580.071,00	0,29%
131	S-131	13/12/2026	$ 1.934.890.634,30	99,35%	$ 5.580.071,00	0,29%
132	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 12.684.276,30	0,65%
					$ 1.947.574.910,60	100%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón Directora de Interventoría. CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ
