AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL**			**FECHA:**	30/09/2024
Semana No	**16**	**DEL :**	22-sep-24	**AL:**	28-sep-24
Plazo Total	**25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)**	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		115	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**14,63%**			
Nombre del Supervisor :	**Jorge Beltrán Gómez**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO VANGUARDIA, DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado
(%) Programado:	0,85%	18,12%
($) Valor programado:	$ 16.598.176,12	$ 352.937.560,70

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado:	0,00%	23,80%
($) Valor ejecutado:	$ 0,00	$ 463.556.824,00

Evaluación:	Porcentaje Adelanto:	5,68%
	Valor Adelanto:	$ 110.619.263,30

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	**Contratista:**	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	**Contrato No:**	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	**Valor Inicial:**	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	**Plazo inicial:**	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS	**Plazo actualizado:**	25 MESES Y 25 DÍAS
Fecha de iniciación:	6-jun-24	**Fecha de iniciación:**	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	**Valor total actual del contrato:**	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

EL DÍA MIERCOLES 25-09-24 SE REALIZA EL COMITÉ DE OBRA No. 15

"Actividades realizadas en obra del (22 al 28 de septiembre del 2024)

- **OFICINA DE ADMINISTRACIÓN:** Se realiza el mantenimiento de luminarias, mantenimiento de pintura de muros, mantenimiento de perfiles metálicos.
- **FACHADA LADO SUR:** Se realizaron actividades de mantenimiento de estuco y pintura de muros, mantenimiento de humedades.
- **SALA DE LLEGADA DE PASAJEROS ALFA 7**: Se realiza el mantenimiento de pintura de la puerta de ingreso.
- **BOMBEROS:** Mantenimiento de redes eléctricas y mantenimiento de luminarias y aires acondicionados.
- **SANIDAD:** Se realizó el mantenimiento de media caña, mantenimiento de luminarias, mantenimiento de desagüe, limpieza de rampa de acceso.
- **SALA DE ABORDAJE No.2:** Se realizó el mantenimiento de enchape de muros, mantenimiento de boquilla, mantenimiento de vinilo adhesivo.

NOTA	Se le comunicó al contratista del contrato de obra No. 23001163 H4 de 2023, quien realiza las actividades de mantenimiento en las instalaciones del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, que la interventoría recibirá a satisfacción las cantidades ejecutadas durante el periodo del presente informe, una vez sean atendidas las observaciones realizadas durante el recorrido realizado el miércoles 18-09-2024, donde se evidencio que el contratista no ha realizado el debido procedimiento de ejecución de las actividades de mantenimiento.

SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN

SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN

- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electrógenos
- Señalización exterior en baños del primer piso
- Puertas de acceso alfa 7, alfa 3, ornamentación
- Pintura general parte interna de toda la oficina AIM
- Mantenimiento de la cubierta en sanidad, oficina AIM, alfa 7.
- Mantenimiento de cuarto de aseo para sanidad aeroportuaria
- Mantenimiento de cámaras para el cuarto de equipos electrógenos
- Mantenimiento de punto hidráulico en la plazoleta, mantenimiento de desagües de los lavamanos en las casetas
- Mantenimiento de vidrios y vinilo adhesivo en la sala de espera No.1
- Mantenimiento del sistema de sonido en la sala No.1
- Mantenimiento de sanitarios en los baños para mujeres del primer piso
- Mantenimiento eléctrico en el área del gimnasio de la subestación de bomberos. (En ejecución)
- Mantenimiento de desagües en los lavamanos y punto hidráulico de las casetas ubicadas en la plazoleta frente al terminal aéreo.
- Mantenimiento de pintura, vinilo adhesivo, luminarias en la oficina de administración.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

ACTIVIDADES DESARROLLADAS SST

*Se realizó una charla de seguridad sobre los reportes de condiciones de salud, seguida de una actividad lúdica de pausa activa y tamizaje de riesgo, organizada por la EPS Salud Total. Se llevó a cabo una inspección para evaluar al contratista en aspectos de seguridad, revisando permisos de trabajo ATS, inspecciones preoperacionales, auto reportes de condiciones de salud y el uso adecuado de equipos de protección individual, así como la señalización. También se revisó la documentación de ingreso del nuevo personal, que incluyó a dos ayudantes y dos operarias de aseo.

*Se realizó una charla de seguridad sobre el significado de TSA en el aeropuerto, seguida de una sesión de calistenia. Se solicitó la planilla de seguridad social del personal de FAO. Además, se llevó a cabo una inspección para evaluar al contratista en aspectos de seguridad, revisando permisos de trabajo ATS, inspecciones preoperacionales y auto reportes de condiciones de salud. También asistimos a una reunión citada por la Aerocivil, donde se abordó el Plan de Manejo Ambiental y la explicación, como diligenciar los formatos para el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA). La interventoría inició la actualización de la base de datos del grupo FAO y se recomendó al personal informar sobre cualquier cambio para mantener la información actualizada.

*Se realizó una charla de seguridad sobre la importancia de avisar o anunciar las actividades al personal requerido para que estén presentes. La interventoría solicitó nuevamente la planilla de seguridad social para avalar las actividades en campo. Se llevó a cabo una inspección para evaluar al contratista en aspectos de seguridad, revisando permisos de trabajo ATS, inspecciones preoperacionales, auto reportes de condiciones de salud y el uso adecuado de equipos de protección individual, así como la señalización. La interventoría no autorizó trabajos con escaleras en mal estado. Además, asistió al comité de seguimiento de obra, donde se manifestó que el grupo FAO incumple en dar respuesta a los comunicados enviados, instándolos a responder y a acatar las normas sobre la entrega de EPI al personal.

*Se realizó una charla de seguridad sobre los tipos de seguridad aeroportuaria que existen en el aeropuerto. Además, se llevó a cabo una inspección para evaluar al contratista en aspectos de seguridad, revisando permisos de trabajo ATS, inspecciones preoperacionales, auto reportes de condiciones de salud y el uso adecuado de equipos de protección individual, así como la señalización. La interventoría se reunió con el área de SST de la Aerocivil para coordinar el simulacro de emergencias que se llevará a cabo el 2 de octubre.

*Se realizó una capacitación dirigida por la interventoría, a cargo del ingeniero Sergio Julián Álvarez Especialista SST de la firma interventora, para todo el personal administrativo y operativo del grupo FAO, abordando temas de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo como medio de mitigación de riesgos relacionados con el correcto uso de EPPs. Durante la capacitación, se llevó a cabo una evaluación de conocimientos, se realizó un compartir y se entregaron obsequios, como canguros y termos de parte de la interventoría, para uso durante los trabajos de obra. Además, se realizó una inspección de dotación y elementos de protección individual al personal operativo y administrativo de las jornadas diurna y nocturna.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA

FAO-CTO-23001163-0107-2024	RESPUESTA CO-FJ-1280-100-2024
FAO-CTO-23001163-0108-2024	BALANCE DE MAYORES Y MENORES Y PRESUPUESTO ADICION
FAO-CTO-23001163-0109-2024	PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA – GRUPO FAO SAS
FAO-CTO-23001163-0110-2024	INFORMES SEMANALES 8, 9 Y 10 – GRUPO FAO SAS
FAO-CTO-23001163-0111-2024	RESPUESTA OFICIO CO-FJ-1280-134-2024 – GRUPO FAO SAS
FAO-CTO-23001163-0113-2024	RESPUESTA OFICIO CO-FJ-1280-125-2024 – ATENCION
FAO-CTO-23001163-0114-2024	RESPUESTA OFICIO 136
FAO-CTO-23001163-0115-2024	INFORMES SEMANALES 11, 12 Y 13 – GRUPO FAO SAS
FAO-CTO-23001163-0116-2024	RESPUESTA COMUNICACIÓN CO-FJ-1280-124-2024 – GRUPO FAO SAS
FAO-CTO-23001163-0117-2024	RESPUESTA COMUNICACIÓN CO-FJ-1280-117-2024 – GRUPO FAO SAS
FAO-CTO-23001163-0118-2024	RESPUESTA COMUNICACIÓN CO-FJ-1280-125-2024 - GRUPO FAO SAS
FAO-CTO-23001163-0119-2024	RESPUESTA AL COMUNICADO CO-FJ-1280-094-2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA

23-09-2024 - CO-FJ-1280-135-2024	VILLAVICENCIO - REQUERIMIENTO DE ATENCIÓN A PENDIENTES PARA RECIBO DE ÁREAS Y SUSPENSIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES
23-09-2024 - CO-FJ-1280-136-2024	VILLAVICENCIO - FALTA DE SOPORTE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL EN PLANILLAS
23-09-2024 - CO-FJ-1280-137-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE CHAPAS Y VINILO ADHESIVO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
23-09-2024 - CO-FJ-1280-138-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE PERSONAL
23-09-2024 - CO-FJ-1280-139-2024	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No15
25-09-2024 - CO-FJ-1280-140-2024	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-107-2024
25-09-2024 - CO-FJ-1280-141-2024	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-114-2024 PAGO PARAFISCALES
25-09-2024 - CO-FJ-1280-142-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE PRESENCIA DE RESIDENTE DE OBRA
25-09-2024 - CO-FJ-1280-143-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE REPORTES SEMANALES DE SST DEL MES DE AGOSTO
25-09-2024 - CO-FJ-1280-144-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE ARCHIVO Y SALA DE ABORDAJE No.1
25-09-2024 - CO-FJ-1280-145-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE IDENTIFICACIÓN EN LOS CHALECOS
26-09-2024 - CO-FJ-1280-146-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE PAGO OPORTUNO EN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
26-09-2024 - CO-FJ-1280-147-2024	VILLAVICENCIO - ALCANCE A COMUNICADO CO-FJ-1280-131-2024 APROBACIÓN ORDENES DE GIRO
26-09-2024 - CO-FJ-1280-148-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE REPORTES SEMANALES DE SST SEMANA 3 MES DE SEPTIEMBRE
27-09-2024 - CO-FJ-1280-149-2024	VILLAVICENCIO - ACTIVIDADAD DE CONCIENTIZACIÓN MITIGACIÓN DE RIESGOS SST
27-09-2024 - CO-FJ-1280-150-2024	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0104-2024
27-09-2024 - CO-FJ-1280-151-2024	VILLAVICENCIO - NOTIFICACIÓN DE INCIDENTE Y SOLICITUD DE MEDIDAS CORRECTIVAS
28-09-2024 - CO-FJ-1280-153-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE DESIGNACIÓN DE PERSONAL PARA ATENDER LOS EQUIPOS ELECTRÓGENOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL DE OBRA EN LA JORNADA DIURNA DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO						
NOMBRE	CARGO	22	23	24	25	26	27	28
		D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
JHEYKSON BRAYAN LINARES PABÓN	INSPECTOR SST		1	1	1	1	1	1
WILLIAM ANDRÉS CAVIEDES CAHUEÑO	RESIDENTE DE OBRA						1	1
LUZ MARINA BLANCO PÉREZ	AUXILIAR DE INGENIERÍA		1	1	1	1	1	1
CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ CASTILLO	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
ALEXANDER FLOREZ GUTIÉRREZ	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
JAVIER ANDRÉS VALENCIA CASTAÑEDA	TÉCNICO ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA			7	7	7	7	8	8


PERSONAL DE OBRA EN LA JORNADA NOCTURNA DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO						
NOMBRE	CARGO	22	23	24	25	26	27	28
		D	L	M	M	J	V	S
JOHN JAIRO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
ÁLVARO MACIAS PEÑA	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
REYNALDO GUZMÁN GIRALDO	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
GELVER ANDRES MACIAS AYALA	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
JERDENSON ANDRÉS CARVAJAL SÁNCHEZ	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
LUISA FERNANDA RUIZ RIVEROS	OPERARIA DE ASEO		1	1	1	1	1	1
JENNY JULAIDY PERDOMO SÁNCHEZ	OPERARIA DE ASEO		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		0	7	7	7	7	7	7


PERSONAL DE INTERVENTORÍA DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE			SEPTIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO						
NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	22	23	24	25	26	27	28
			D	L	M	M	J	V	S
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA		1	1	1	1	1	1
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVETORIA		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			0	3	3	3	3	3	3

DÍA	INTERVENTORÍA	OBRA	TOTAL
DOMINGO	0	0	0
LUNES	3	14	17
MARTES	3	14	17
MIERCOLES	3	14	17
JUEVES	3	14	17
VIERNES	3	15	18
SABADO	3	15	18

EQUIPOS EN OBRA: Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor.

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

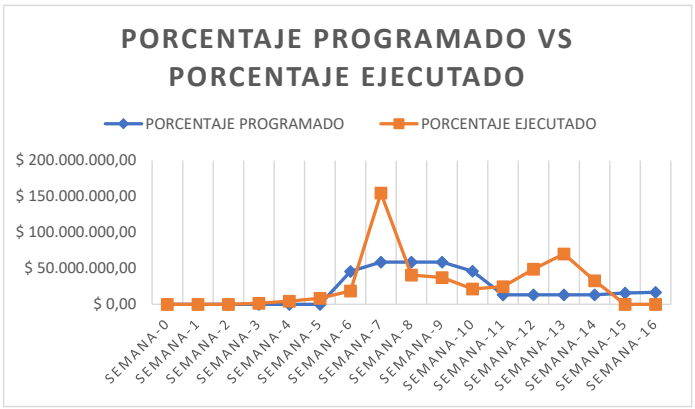

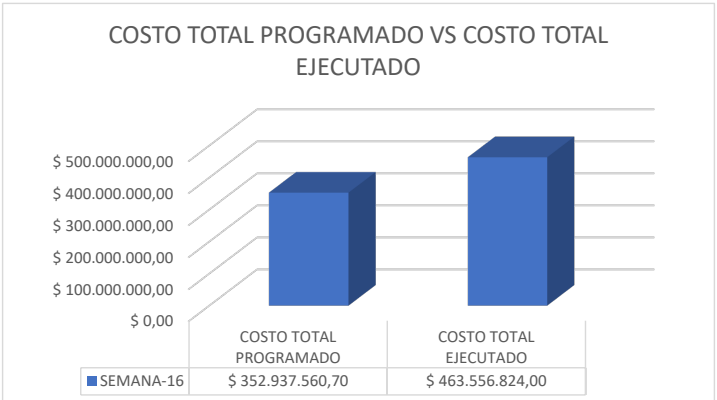

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento por un porcentaje equivalente al 23,80%. Equivalente a $ 463,556,824,00 millones de pesos.

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de interventoría presenta un avance porcentual de tiempo transcurrido de 14,63 %.


AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MANTENIMIENTO DE FACHADA LADO NORTE



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de la pintura regada en el piso de la fachada lado norte
1	

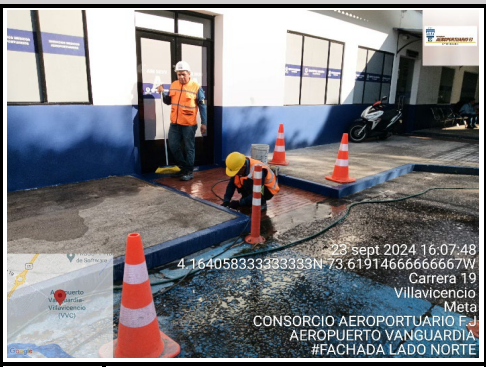

No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de la pintura regada en el piso de la fachada lado norte
2	



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de la pintura regada en el piso de la fachada lado norte
3	

MANTENIMIENTO DE FACHADA LADO NORTE



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento del cieloraso de la fachada lado norte
4	



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento del cieloraso de la fachada lado norte
5	




No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de los huecos en la fachada lado norte
6	

MANTENIMIENTO DE FACHADA LADO NORTE



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de la pinturas de tapas de las cajas de inspección en la fachada lado norte
7	

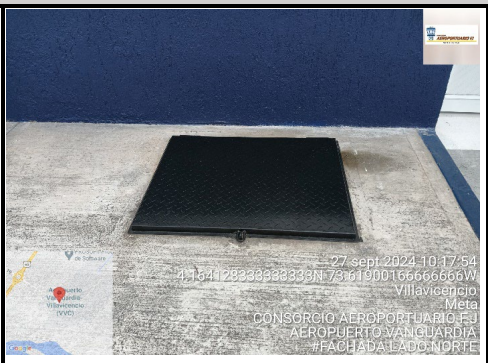

No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de la pinturas de tapas de las cajas de inspección en la fachada lado norte
8	



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de la pinturas de tapas de las cajas de inspección en la fachada lado norte
9	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

MANTENIMIENTO DE FACHADA LADO SUR



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de la pinturas de la puerta de la subestación del terminal aéreo
10	



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de la pinturas de la puerta de la subestación del terminal aéreo
11	



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de la pinturas de la puerta de la subestación del terminal aéreo
12	

MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS



No. FOTO	Se realizó la inspección de la transferencia en la estación de equipos electrógenos
13	



No. FOTO	Se realizó la inspección de la transferencia en la estación de equipos electrógenos
14	



No. FOTO	Se realizó la inspección de la transferencia en la estación de equipos electrógenos
15	

MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de luminarias en la oficina de archivo
16	



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de luminarias en la oficina de archivo
17	



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de luminarias en la oficina de archivo
18	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

MANTENIMIENTO DE SALA DE ABORDAJE No.1



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de vinilo adhesivo en la sala de abordaje No.1
19	



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de vinilo adhesivo en la sala de abordaje No.1
20	



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de la chapa de la puerta de los baños en la sala de abordaje No.1
21	

MANTENIMIENTO DE SALA DE LLEGADA DE PASAJEROS ALFA.7



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de la rejilla de extracción en el baño para mujeres
22	



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de la rejilla de extracción en el baño para hombres
23	



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento del guarda escobas en mal estado
24	

MANTENIMIENTO DE SALA DE LLEGADA DE PASAJEROS ALFA 7.



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de orificios en el cielo raso
25	



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de orificios en el cielo raso
26	



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de win de lavamanos
27	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN SANIDAD



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de guarda escoba en media caña
28	



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de desagüe de lavamanos
29	



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de rampa de acceso
30	

OTROS MANTENIMIENTOS



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de termostato de la lampara en el ingreso a sanidad
31	



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de pintura de las materas metalicas
32	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de la oficina de administración
33	

GESTIÓN SST



No. FOTO	Actividad lúdica de pausa activa y tamizaje de riesgo, organizada por la EPS Salud Total.
34	



No. FOTO	Actualización base de datos del grupo FAO y se recomendó al personal informar sobre cualquier cambio para mantener la información actualizada.
35	




No. FOTO	Capacitación dirigida por ingeniero Sergio Julián Álvarez, para todo el personal administrativo y operativo del grupo FAO, abordando temas de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
36	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

GESTIÓN SST





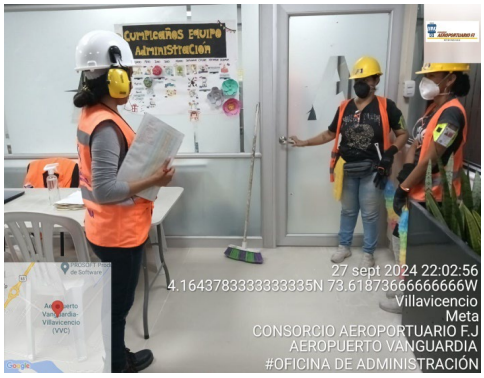

No. FOTO	Inspección de rotulación de productos químicos	No. FOTO	Inspección de dotación y elementos de protección individual personal diurno	No. FOTO	Inspección de dotación y elementos de protección individual personal nocturno
37		38		39	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Treinta	(30)	días del mes de	septiembre	de	2024
(Día en letras)	(Día en Números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

Sandra Yonaira Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

PRESUPUESTO CON MAYORES Y MENORES

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CAT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						+	-		
	1			MAMPOSTERIA								
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	$ 38.916,00	$ 2.334.960,00	0	-20	$ 40,00	$1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	$ 30.706,00	$ 1.842.360,00	0	0	$ 60,00	$1.842.360,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	$ 26.258,00	$ 3.938.700,00	0	0	$ 150,00	$3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	$ 38.490,00	$ 76.306.425,00	0	0	$ 1.982,50	$76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	$ 29.591,00	$ 29.324.681,00	0	0	$ 991,00	$29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	$ 15.640,00	$ 37.536.000,00	0	0	$ 2.400,00	$37.536.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	$ 66.017,00	$ 3.895.003,00	0		$ 59,00	$3.895.003,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	$ 33.550,00	$ 1.342.000,00	0		$ 40,00	$1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	$ 1.841,00	$ 736.400,00	0	0	$ 400,00	$736.400,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	$ 27.292,00	$ 42.657.298,00	0	0	$ 1.563,00	$42.657.297,75
Subtotal								**$ 199.913.827,00**				**$ 199.135.506,75**
	2			PISOS								
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	$ 20.128,00	$ 14.089.600,00	0	-300	$ 400,00	$8.051.200,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	$ 86.865,00	$ 9.989.475,00	0		$ 115,00	$9.989.475,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO)	M2	38,00	$ 175.568,00	$ 6.671.584,00	0	-37	$ 1,00	$175.568,00
Subtotal								**$ 30.750.659,00**				**$ 18.216.243,00**
	3			CUBIERTA Y CIELORASO							$ -	
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO;NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	$ 480.205,00	$ 11.524.920,00	0	0	$ 24,00	$11.524.920,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	$ 89.881,00	$ 44.041.690,00	0	0	$ 490,00	$44.041.690,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	$ 140.472,00	$ 68.831.280,00	0	-300	$ 190,00	$26.689.680,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	$ 89.781,00	$ 33.039.408,00	0		$ 368,00	$33.039.408,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	$ 28.249,00	$ 2.824.900,00	0	0	$ 100,00	$2.824.900,00
Subtotal								**$ 160.262.198,00**				**$ 118.120.598,00**
	4			CARPINTERIA METÁLICA								
19	4.1		4.1	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	$ 451.209,00	$ 2.256.045,00	0		$ 5,00	$2.256.045,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSINAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	$ 17.857,00	$ 5.357.100,00	200	0	$ 500,00	$8.928.500,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	$ 22.736,00	$ 4.547.200,00	0	0	$ 200,00	$4.547.200,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACREO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	$ 83.129,00	$ 6.816.578,00	0	0	$ 82,00	$6.816.578,00
Subtotal								**$ 18.976.923,00**				**$ 22.548.323,00**
	5			CARPINTERIA MADERA								
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	$ 476.557,00	$ 3.335.899,00		-5	$ 2,00	$953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	$ 12.995,00	$ 2.011.626,00	0		$ 154,80	$2.011.626,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	$ 38.231,00	$ 2.959.079,00	0		$ 77,40	$2.959.079,40
Subtotal								**$ 8.306.604,00**				**$ 5.923.819,40**
	6			CRISTALERIA								
26	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/0 PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	$ 289.652,00	$ 14.482.600,00		-30	$ 20,00	$5.793.040,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	$ 84.356,00	$ 4.217.800,00		-50	$ -	$0,00
Subtotal								**$ 18.700.400,00**				**$ 5.793.040,00**
	7			CANALETAS Y PORTACABLES								
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	$ 61.879,00	$ 30.939.500,00		250	$ 750,00	$46.409.250,00
Subtotal								**$ 30.939.500,00**				**$ 46.409.250,00**

PRESUPUESTO CON MAYORES Y MENORES

	8			**LIMPIEZA PROFUNDA**									
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	$ 9.054,00	$ 82.391.400,00	0		$ 9.100,00	$82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	$ 14.260,00	$ 87.342.500,00	0		$ 6.125,00	$87.342.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	$ 7.870,00	$ 11.805.000,00	0		$ 1.500,00	$11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	$ 627.943,00	$ 100.470.880,00	0		$ 160,00	$100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	$ 30.741,00	$ 293.365.667,00		-1000	$ 8.543,14	$262.624.666,74
Subtotal								**$ 575.375.447,00**				**$ 544.634.446,74**
	9			**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**								
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 61.126.435,00	$ 61.126.435,00	0		$ 1,00	$61.126.435,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	$ 22.193.560,00	$ 22.193.560,00	0		$ 1,00	$22.193.560,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 72.618.205,00	$ 72.618.205,00	0		$ 1,00	$72.618.205,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	$ 589.218,00	$ 14.141.232,00	0	-24	$ -	$0,00
Subtotal								**$ 170.079.432,00**				**$ 155.938.200,00**
	10			**MANO DE OBRA**								
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	$ 11.766.194,00	$ 352.985.820,00	0	0	$ 30,00	$352.985.820,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	$ 39.080,00	$ 18.758.400,00	200	0	$ 680,00	$26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	$ 36.074,00	$ 25.973.280,00	200	0	$ 920,00	$33.188.080,00
	SUBTOTAL				SUBTOTAL			**$ 397.717.500,00**				**$ 412.748.300,00**
							SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO	**$ 1.611.022.490,00**				**$ 1.529.467.726,89**

IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 11.956.808,00	$ 11.351.518,00
SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)		**$ 1.622.979.298,00**	**$ 1.540.819.244,89**

	11			**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**									
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	$ 324.595.613,00	$ 324.595.613,00				$ 406.755.666,11
								TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**$ 324.595.613,00**				$ 406.755.666,11

VALOR TOTAL	**$ 1.947.574.911,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**	**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN** **A=**	20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO** **I=**	3%
NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.	**UTILIDAD** **U=**	5%
	TOTAL A.I.U **A.I.U.=**	28%

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	**MINISTERIO DE TRANSPORTE** **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL** **CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/09/2024 **Y EL** 28/09/2024 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING.JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FECHA	AGOSTO 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																													SEPTIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVETORIA																	1	1			1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA				**2**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/09/2024 **Y EL** 28/09/2024 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

AGOSTO 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO

FECHA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NOMBRE	**CARGO**	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
JHEYKSON BRAYAN LINARES PABÓN	INSPECTOR SST																															
WILLIAM ANDRÉS CAVIEDES CAHUEÑO	RESIDENTE DE OBRA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
LUZ MARINA BLANCO PÉREZ	AUXILIAR DE INGENIERÍA																				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
JOSÉ EDGAR SALINAS MARTÍNEZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
NICOLAS FARID SALINAS CARRILLO	INSPECTOR DE OBRA																															
JOHN JAIRO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ	OFICIAL DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1							
CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ CASTILLO	OFICIAL DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1
ALEXANDER FLOREZ GUTIÉRREZ	OFICIAL DE OBRA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
JAVIER ANDRÉS VALENCIA CASTAÑEDA	TÉCNICO ELÉCTRICO	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
ÁLVARO MACIAS PEÑA	AYUDANTE DE OBRA																															
REYNALDO GUZMÁN GIRALDO	OFICIAL DE OBRA	1	1			1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1							
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA																				1	1	1	1	1							
HÉCTOR FABIAN LÓPEZ SAMUDIO	OFICIAL DE OBRA	1	1	1		1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1							
GELVER ANDRES MACIAS AYALA	AYUDANTE DE OBRA																															
FREDY PEÑA MONA	AYUDANTE DE OBRA		1	1		1	1	1	1	1	1												1	1	1		1	1	1	1	1
JERDENSON ANDRÉS CARVAJAL SÁNCHEZ	AYUDANTE DE OBRA																															
LUISA FERNANDA RUIZ RIVEROS	OPERARIA DE ASEO																															
JENNY JULAIDY PERDOMO SÁNCHEZ	OPERARIA DE ASEO																															
			1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1														
			1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1														
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		9	12	9	2	12	12	12	12	12	12	0	9	9	9	9	9	9	0	0	11	11	12	12	12	0	7	8	8	8	8	8

SEPTIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO

FECHA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
NOMBRE	**CARGO**	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
JHEYKSON BRAYAN LINARES PABÓN	INSPECTOR SST			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
WILLIAM ANDRÉS CAVIEDES CAHUEÑO	RESIDENTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1							1	1	
LUZ MARINA BLANCO PÉREZ	AUXILIAR DE INGENIERÍA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
JOSÉ EDGAR SALINAS MARTÍNEZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
NICOLAS FARID SALINAS CARRILLO	INSPECTOR DE OBRA																														
JOHN JAIRO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ	OFICIAL DE OBRA																														
CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ CASTILLO	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
ALEXANDER FLOREZ GUTIÉRREZ	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
JAVIER ANDRÉS VALENCIA CASTAÑEDA	TÉCNICO ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
ÁLVARO MACIAS PEÑA	AYUDANTE DE OBRA																														
REYNALDO GUZMÁN GIRALDO	OFICIAL DE OBRA																														
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
HÉCTOR FABIAN LÓPEZ SAMUDIO	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																
GELVER ANDRES MACIAS AYALA	AYUDANTE DE OBRA																														
FREDY PEÑA MONA	AYUDANTE DE OBRA																														
JERDENSON ANDRÉS CARVAJAL SÁNCHEZ	AYUDANTE DE OBRA																														
LUISA FERNANDA RUIZ RIVEROS	OPERARIA DE ASEO																														
JENNY JULAIDY PERDOMO SÁNCHEZ	OPERARIA DE ASEO																														
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		0	9	10	10	10	10	10	0	10	10	10	10	10	10	0	9	9	9	9	9	9	0	6	6	6	6	7	7	0	0

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	DE

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/09/2024 **Y EL** 28/09/2024 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

FECHA		AGOSTO 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																															SEPTIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
NOMBRE	**CARGO**	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA																																																																
JHEYKSON BRAYAN LINARES PABÓN	INSPECTOR SST																																																														
WILLIAM ANDRÉS CAVIEDES CAHUEÑO	RESIDENTE DE OBRA																																																														
LUZ MARINA BLANCO PÉREZ	AUXILIAR DE INGENIERÍA																																																													
JOSÉ EDGAR SALINAS MARTÍNEZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL																																																													
NICOLAS FARID SALINAS CARRILLO	INSPECTOR DE OBRA																																																													
JOHN JAIRO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ	OFICIAL DE OBRA																											1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1								
CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ CASTILLO	OFICIAL DE OBRA																																																																	
ALEXANDER FLOREZ GUTIÉRREZ	OFICIAL DE OBRA																																																														
JAVIER ANDRÉS VALENCIA CASTAÑEDA	TÉCNICO ELÉCTRICO																																																													
ÁLVARO MACIAS PEÑA	AYUDANTE DE OBRA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
REYNALDO GUZMÁN GIRALDO	OFICIAL DE OBRA																										1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1								
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA	1	1	1		1	1	1	1	1	1																1	1	1	1	1																																				
HÉCTOR FABIAN LÓPEZ SAMUDIO	OFICIAL DE OBRA																										1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1								
GELVER ANDRES MACIAS AYALA	AYUDANTE DE OBRA																																	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																				
FREDY PEÑA MONA	AYUDANTE DE OBRA		1																		

			COSTO PROGRAMADO					EJECUTADO			
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL		COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 45.812.826,61	2,35%		$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 104.547.219,71	5,37%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 187.656.630,00	9,64%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 163.281.612,81	8,38%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 228.308.146,00	11,72%	$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	$ 222.016.005,91	11,40%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 265.699.525,00	13,64%	$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	$ 267.981.357,99	13,76%	$ 45.965.352,08	2,36%		$ 287.156.607,00	14,74%	$ 21.457.082,00	1,10%
11	S-11	25/08/2024	$ 281.112.033,16	14,43%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 311.702.916,00	16,00%	$ 24.546.309,00	1,26%
12	S-12	1/09/2024	$ 294.242.708,33	15,11%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 360.592.928,00	18,51%	$ 48.890.012,00	2,51%
13	S-13	8/09/2024	$ 307.373.383,50	15,78%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 430.770.803,00	22,12%	$ 70.177.875,00	3,60%
14	S-14	15/09/2024	$ 320.504.058,67	16,46%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 32.786.021,00	1,68%
15	S-15	22/09/2024	$ 336.339.384,58	17,27%	$ 15.835.325,91	0,81%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
16	**S-16**	**29/09/2024**	**$ 352.937.560,70**	**18,12%**	**$ 16.598.176,12**	**0,85%**		**$ 463.556.824,00**	**23,80%**	**$ 0,00**	**0,00%**
17	S-17	6/10/2024	$ 374.247.028,83	19,22%	$ 21.309.468,13	1,09%					
18	S-18	13/10/2024	$ 401.170.505,98	20,60%	$ 26.923.477,15	1,38%					
19	S-19	20/10/2024	$ 428.093.983,13	21,98%	$ 26.923.477,15	1,38%					
20	S-20	27/10/2024	$ 455.017.460,28	23,36%	$ 26.923.477,15	1,38%					
21	S-21	3/11/2024	$ 481.940.937,43	24,75%	$ 26.923.477,15	1,38%					
22	S-22	10/11/2024	$ 508.770.878,31	26,12%	$ 26.829.940,88	1,38%					
23	S-23	17/11/2024	$ 535.533.086,04	27,50%	$ 26.762.207,73	1,37%					
24	S-24	24/11/2024	$ 562.295.293,77	28,87%	$ 26.762.207,73	1,37%					
25	S-25	1/12/2024	$ 589.057.501,50	30,25%	$ 26.762.207,73	1,37%					
26	S-26	8/12/2024	$ 613.961.736,22	31,52%	$ 24.904.234,72	1,28%					
27	S-27	15/12/2024	$ 634.212.216,92	32,56%	$ 20.250.480,70	1,04%					
28	S-28	22/12/2024	$ 650.072.944,39	33,38%	$ 15.860.727,47	0,81%					
29	S-29	29/12/2024	$ 663.682.314,47	34,08%	$ 13.609.370,08	0,70%					
30	S-30	5/01/2025	$ 673.618.417,22	34,59%	$ 9.936.102,75	0,51%					
31	S-31	12/01/2025	$ 683.554.519,97	35,10%	$ 9.936.102,75	0,51%					
32	S-32	19/01/2025	$ 693.490.622,72	35,61%	$ 9.936.102,75	0,51%					
33	S-33	26/01/2025	$ 703.766.316,78	36,14%	$ 10.275.694,06	0,53%					
34	S-34	2/02/2025	$ 714.137.793,00	36,67%	$ 10.371.476,22	0,53%					
35	S-35	9/02/2025	$ 724.265.806,04	37,19%	$ 10.128.013,04	0,52%					
36	S-36	16/02/2025	$ 731.593.992,49	37,56%	$ 7.328.186,45	0,38%					
37	S-37	23/02/2025	$ 738.922.178,94	37,94%	$ 7.328.186,45	0,38%					
38	S-38	2/03/2025	$ 757.980.970,75	38,92%	$ 19.058.791,81	0,98%					
39	S-39	9/03/2025	$ 796.179.171,30	40,88%	$ 38.198.200,55	1,96%					
40	S-40	16/03/2025	$ 835.853.763,56	42,92%	$ 39.674.592,26	2,04%					
41	S-41	23/03/2025	$ 876.597.467,07	45,01%	$ 40.743.703,51	2,09%					
42	S-42	30/03/2025	$ 917.341.170,58	47,10%	$ 40.743.703,51	2,09%					
43	S-43	6/04/2025	$ 931.369.380,59	47,82%	$ 14.028.210,01	0,72%					
44	S-44	13/04/2025	$ 941.787.649,20	48,36%	$ 10.418.268,61	0,53%					
45	S-45	20/04/2025	$ 952.206.592,93	48,89%	$ 10.418.943,73	0,53%					
46	S-46	27/04/2025	$ 962.842.934,88	49,44%	$ 10.636.341,95	0,55%					
47	S-47	4/05/2025	$ 972.624.266,23	49,94%	$ 9.781.331,35	0,50%					
48	S-48	11/05/2025	$ 980.098.488,48	50,32%	$ 7.474.222,25	0,38%					
49	S-49	18/05/2025	$ 994.922.494,90	51,09%	$ 14.824.006,42	0,76%					
50	S-50	25/05/2025	$ 1.015.068.758,81	52,12%	$ 20.146.263,91	1,03%					
51	S-51	1/06/2025	$ 1.035.215.022,72	53,15%	$ 20.146.263,91	1,03%					
52	S-52	8/06/2025	$ 1.055.361.286,63	54,19%	$ 20.146.263,91	1,03%					
53	S-53	15/06/2025	$ 1.075.507.550,54	55,22%	$ 20.146.263,91	1,03%					
54	S-54	22/06/2025	$ 1.095.383.369,94	56,24%	$ 19.875.819,40	1,02%					
55	S-55	29/06/2025	$ 1.114.027.164,38	57,20%	$ 18.643.794,44	0,96%					
56	S-56	6/07/2025	$ 1.132.670.958,82	58,16%	$ 18.643.794,44	0,96%					
57	S-57	13/07/2025	$ 1.151.314.753,26	59,12%	$ 18.643.794,44	0,96%					
58	S-58	20/07/2025	$ 1.171.281.482,43	60,14%	$ 19.966.729,17	1,03%					
59	S-59	27/07/2025	$ 1.192.206.198,82	61,21%	$ 20.924.716,39	1,07%					
60	S-60	3/08/2025	$ 1.209.634.483,11	62,11%	$ 17.428.284,29	0,89%					
61	S-61	10/08/2025	$ 1.226.076.594,25	62,95%	$ 16.442.111,14	0,84%					
62	S-62	17/08/2025	$ 1.233.714.313,88	63,35%	$ 7.637.719,63	0,39%					
63	S-63	24/08/2025	$ 1.241.172.352,05	63,73%	$ 7.458.038,17	0,38%					
64	S-64	31/08/2025	$ 1.248.365.634,36	64,10%	$ 7.193.282,31	0,37%					
65	S-65	7/09/2025	$ 1.254.878.115,87	64,43%	$ 6.512.481,51	0,33%					
66	S-66	14/09/2025	$ 1.261.390.597,38	64,77%	$ 6.512.481,51	0,33%					
67	S-67	21/09/2025	$ 1.267.733.439,63	65,09%	$ 6.342.842,25	0,33%					
68	S-68	28/09/2025	$ 1.273.953.439,66	65,41%	$ 6.220.000,03	0,32%					
69	S-69	5/10/2025	$ 1.280.173.439,69	65,73%	$ 6.220.000,03	0,32%					

70	S-70	12/10/2025	$ 1.286.393.439,72	66,05%	$ 6.220.000,03	0,32%					
71	S-71	19/10/2025	$ 1.325.893.877,29	68,08%	$ 39.500.437,57	2,03%					
72	S-72	26/10/2025	$ 1.366.073.507,47	70,14%	$ 40.179.630,18	2,06%					
73	S-73	2/11/2025	$ 1.406.253.137,65	72,21%	$ 40.179.630,18	2,06%					
74	S-74	9/11/2025	$ 1.446.432.767,83	74,27%	$ 40.179.630,18	2,06%					
75	S-75	16/11/2025	$ 1.473.252.146,74	75,65%	$ 26.819.378,91	1,38%					
76	S-76	23/11/2025	$ 1.485.874.113,84	76,29%	$ 12.621.967,10	0,65%					
77	S-77	30/11/2025	$ 1.498.696.083,31	76,95%	$ 12.821.969,47	0,66%					
78	S-78	7/12/2025	$ 1.511.518.052,78	77,61%	$ 12.821.969,47	0,66%					
79	S-79	14/12/2025	$ 1.524.340.022,25	78,27%	$ 12.821.969,47	0,66%					
80	S-80	21/12/2025	$ 1.533.088.604,89	78,72%	$ 8.748.582,64	0,45%					
81	S-81	28/12/2025	$ 1.541.349.091,56	79,14%	$ 8.260.486,67	0,42%					
82	S-82	4/01/2026	$ 1.547.764.734,78	79,47%	$ 6.415.643,22	0,33%					
83	S-83	11/01/2026	$ 1.554.180.378,00	79,80%	$ 6.415.643,22	0,33%					
84	S-84	18/01/2026	$ 1.561.147.319,89	80,16%	$ 6.966.941,89	0,36%					
85	S-85	25/01/2026	$ 1.569.039.773,60	80,56%	$ 7.892.453,71	0,41%					
86	S-86	1/02/2026	$ 1.577.169.941,22	80,98%	$ 8.130.167,62	0,42%					
87	S-87	8/02/2026	$ 1.585.066.137,73	81,39%	$ 7.896.196,51	0,41%					
88	S-88	15/02/2026	$ 1.592.896.342,39	81,79%	$ 7.830.204,66	0,40%					
89	S-89	22/02/2026	$ 1.600.740.077,38	82,19%	$ 7.843.734,99	0,40%					
90	S-90	1/03/2026	$ 1.608.739.411,11	82,60%	$ 7.999.333,73	0,41%					
91	S-91	8/03/2026	$ 1.616.532.746,82	83,00%	$ 7.793.335,71	0,40%					
92	S-92	15/03/2026	$ 1.625.499.763,32	83,46%	$ 8.967.016,50	0,46%					
93	S-93	22/03/2026	$ 1.637.498.649,21	84,08%	$ 11.998.885,89	0,62%					
94	S-94	29/03/2026	$ 1.649.771.243,75	84,71%	$ 12.272.594,54	0,63%					
95	S-95	5/04/2026	$ 1.664.573.433,63	85,47%	$ 14.802.189,88	0,76%					
96	S-96	12/04/2026	$ 1.680.566.021,32	86,29%	$ 15.992.587,69	0,82%					
97	S-97	19/04/2026	$ 1.696.558.609,01	87,11%	$ 15.992.587,69	0,82%					
98	S-98	26/04/2026	$ 1.704.432.501,33	87,52%	$ 7.873.892,32	0,40%					
99	S-99	3/05/2026	$ 1.712.140.705,99	87,91%	$ 7.708.204,66	0,40%					
100	S-100	10/05/2026	$ 1.721.817.914,73	88,41%	$ 9.677.208,74	0,50%					
101	S-101	17/05/2026	$ 1.736.558.276,80	89,17%	$ 14.740.362,07	0,76%					
102	S-102	24/05/2026	$ 1.751.298.638,87	89,92%	$ 14.740.362,07	0,76%					
103	S-103	31/05/2026	$ 1.766.039.000,94	90,68%	$ 14.740.362,07	0,76%					
104	S-104	7/06/2026	$ 1.774.935.235,23	91,14%	$ 8.896.234,29	0,46%					
105	S-105	14/06/2026	$ 1.781.081.291,74	91,45%	$ 6.146.056,51	0,32%					
106	S-106	21/06/2026	$ 1.787.227.348,25	91,77%	$ 6.146.056,51	0,32%					
107	S-107	28/06/2026	$ 1.793.373.404,76	92,08%	$ 6.146.056,51	0,32%					
108	S-108	5/07/2026	$ 1.799.519.461,27	92,40%	$ 6.146.056,51	0,32%					
109	S-109	12/07/2026	$ 1.805.665.517,78	92,71%	$ 6.146.056,51	0,32%					
110	S-110	19/07/2026	$ 1.811.811.574,29	93,03%	$ 6.146.056,51	0,32%					
111	S-111	26/07/2026	$ 1.817.957.630,80	93,34%	$ 6.146.056,51	0,32%					
112	S-112	2/08/2026	$ 1.824.103.687,31	93,66%	$ 6.146.056,51	0,32%					
113	S-113	9/08/2026	$ 1.830.249.743,82	93,98%	$ 6.146.056,51	0,32%					
114	S-114	16/08/2026	$ 1.836.395.800,33	94,29%	$ 6.146.056,51	0,32%					
115	S-115	23/08/2026	$ 1.842.541.856,84	94,61%	$ 6.146.056,51	0,32%					
116	S-116	30/08/2026	$ 1.848.687.913,35	94,92%	$ 6.146.056,51	0,32%					
117	S-117	6/09/2026	$ 1.854.833.969,86	95,24%	$ 6.146.056,51	0,32%					
118	S-118	13/09/2026	$ 1.860.980.026,37	95,55%	$ 6.146.056,51	0,32%					
119	S-119	20/09/2026	$ 1.867.126.082,88	95,87%	$ 6.146.056,51	0,32%					
120	S-120	27/09/2026	$ 1.873.272.139,39	96,18%	$ 6.146.056,51	0,32%					
121	S-121	4/10/2026	$ 1.879.089.924,30	96,48%	$ 5.817.784,91	0,30%					
122	S-122	11/10/2026	$ 1.884.669.995,30	96,77%	$ 5.580.071,00	0,29%					
123	S-123	18/10/2026	$ 1.890.250.066,30	97,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
124	S-124	25/10/2026	$ 1.895.830.137,30	97,34%	$ 5.580.071,00	0,29%					
125	S-125	1/11/2026	$ 1.901.410.208,30	97,63%	$ 5.580.071,00	0,29%					
126	S-126	8/11/2026	$ 1.906.990.279,30	97,92%	$ 5.580.071,00	0,29%					
127	S-127	15/11/2026	$ 1.912.570.350,30	98,20%	$ 5.580.071,00	0,29%					
128	S-128	22/11/2026	$ 1.918.150.421,30	98,49%	$ 5.580.071,00	0,29%					
129	S-129	29/11/2026	$ 1.923.730.492,30	98,78%	$ 5.580.071,00	0,29%					
130	S-130	6/12/2026	$ 1.929.310.563,30	99,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
131	S-131	13/12/2026	$ 1.934.890.634,30	99,35%	$ 5.580.071,00	0,29%					
132	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 12.684.276,30	0,65%					

$ 1.947.574.910,60	100%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón Directora de Interventoría. **CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ**
