AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL**			**FECHA:**	29/10/2024
Semana No	**20**	**DEL :**	20-oct-24	**AL:**	26-oct-24
Plazo Total	**25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)**	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		136	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**17,30%**			
Nombre del Supervisor :	**Jorge Beltrán Gómez**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO VANGUARDIA, DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado
(%) Programado:	**1,38%**	**23,36%**
($) Valor programado:	**$ 26.923.477,15**	**$ 428.093.983,13**

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado:	**2,48%**	**26,85%**
($) Valor ejecutado:	**$ 48.223.864,82**	**$ 522.985.356,82**

Evaluación:	**Porcentaje Adelanto:**	**3,49%**
	Valor Adelanto:	**$ 94.891.373,69**

NOTA: El día 10 de octubre de 2024 se realiza la aprobacion de la orden de giro No.3

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	**Contratista:**	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	**Contrato No:**	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	**Valor Inicial:**	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	**Plazo inicial:**	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS	**Plazo actualizado:**	25 MESES Y 25 DÍAS
Fecha de iniciación:	6-jun-24	**Fecha de iniciación:**	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	**Valor total actual del contrato:**	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

EL DÍA MIERCOLES 23-10-24 SE REALIZA EL COMITÉ DE OBRA No. 19

"Actividades realizadas en obra del (20 al 26 de octubre del 2024)

• **BODEGA DE MALETAS. ALFA 6:** Se continua con el mantenimiento de pintura de muros, mantenimiento de perfiles metálicos, mantenimiento de enchape de muros.
• **SALA DE ABORDAJE No.3:** Se continua con el mantenimiento de baño para mujeres y el baño para hombres.
• **PARQUEADERO PRA AMBULANCIAS:** Se realiza el mantenimiento de pintura de los perfiles metálicos.
• **TORRE DE CONTROL**: Se realizó el mantenimiento del mueble para el descanso de los operarios de la torre de control. Se realizo el mantenimiento de estuco y pintura.
• **BAÑOS MIXTOS DEL PRIMER PISO:** Se realizó el mantenimiento de llave de lavamanos.
• **OFICINAS DE CONTROL Y SEGURIDAD:** Se realiza el mantenimiento de pintura de perfiles metálicos, mantenimiento de humedades y pintura de muros.
• **MANTENIMIENTOS DE LAS OFICINAS DE LAS AEROLINEAS:** Se realiza el mantenimiento de humedades, mantenimiento de estuco y pintura de muros, mantenimiento de perfiles metálicos.
• **MANTENIMIENTOS DE LA CUADRILLA ELÉCTRICA:**
• Mantenimiento del cableado de los fosos de los ascensores.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO

GRUPOS ELECTROGENOS
• Mantenimiento para Grupos Electrógenos de la Estación CAO (Cambio de aceite, filtros, refrigerante, otros).
SALA DE ABORDAJE 2
• Mantenimiento de vidrio roto, y retiró de estructura.
SANIDAD
• Mantenimiento del circuito eléctrico de la Sanidad Aeroportuaria (Urgente).
• Mantenimiento de las lámparas de cuarto de procedimientos, debido a cumplimiento de ciclo de vida y su deficiencia luminaria que presenta (Urgente).
• Mantenimiento de las demás lámparas del área debido al cumplimiento de su ciclo de vida, deficiencia luminaria y otros factores que afectan su desempeño.
BOMBEROS
• Mantenimiento del aire acondicionado de la base de bomberos.
• Mantenimiento de punto eléctrico 110 V y 220 V para zona de la antigua estación de bomberos.
• Mantenimiento del punto de vigilancia de bomberos.
ASCENSORES
• Mantenimiento del foso de los ascensores ubicados en la sala principal y en la sala de abordaje No.1.
SALA 1
• Mantenimiento de los polarizados de estos dos vidrios que son de la sala de abordaje 1., lo anterior por temas de seguridad desde el área pública se puede observar los procedimientos realizados por el personal operadores de seguridad, lo cual representa un Alto riesgo en la seguridad aeroportuaria.
ALFA 8 Y ALFA 13
• Mantenimiento de la señalización de los portones en los filtros de alfa 8 y alfa 13
• Mantenimiento de los puntos de vigilancia de alfa 8 y alfa 13
SALÓN PRINCIPAL DEL AEROPUERTO
• Mantenimiento y Limpieza de todos los vidrios del salón principal
TRAMPA DE GRASAS
• Informe de mantenimiento a la trampa de grasas de aguas residuales no domésticas ubicada en la subestación eléctrica, ya que se debe tener este insumo para los Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA).
CUBIERTA DE LA TERMINAL AÉREA
• Mantenimiento de pintura de las tejas de la cubierta de la terminal aérea.

SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN

SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN	SOLICITUDES PENDIENTES REALIZADAS EN LA SEMANA:
• Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electrógenos • Señalización exterior en baños del primer piso • Pintura general parte interna de toda la oficina AIM • Mantenimiento de la cubierta en sanidad, oficina AIM, alfa 7. • Mantenimiento de cuarto de aseo para sanidad aeroportuaria • Mantenimiento de cámaras para el cuarto de equipos electrógenos • Mantenimiento del sistema de sonido en la sala No.1 • Mantenimiento eléctrico en el área del gimnasio de la subestación de bomberos.	• Puertas de acceso alfa 13, alfa 8, ornamentación • Mantenimiento del circuito eléctrico de la Sanidad Aeroportuaria (Urgente). • Mantenimiento del aire acondicionado de la base de bomberos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS SST

*Se inician actividades con una charla de socialización sobre manejo ambiental, impartida por la ingeniera ambiental Yolima de la Aerocivil. Durante la jornada, se realizó una inspección para evaluar al contratista en temas de seguridad, revisando los permisos de trabajo ATS, las inspecciones preoperacionales y los auto reportes de condiciones de salud. En el seguimiento de los comunicados sobre novedades de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, así como del faltante de entrega de los elementos de protección individual y chalecos identificables, se constató que los hallazgos previos no han sido subsanados.

*Se inician actividades con una charla, calistenia y la presentación formal del residente del contratista. Se recomienda al contratista subsanar los hallazgos pendientes. Durante la jornada, se realizó una inspección para evaluar al contratista en temas de seguridad, revisando los permisos de trabajo ATS, las inspecciones preoperacionales y los auto reportes de condiciones de salud. Se verificaron los frentes de trabajo y, mediante un registro fotográfico, se evidenció que los hallazgos no han sido subsanados. Adicionalmente, se sugiere que, en las actividades de mantenimiento en escalera, debe haber otro compañero que ayude a sostenerla.

*Se inician actividades con la reunión del comité de seguimiento de obra. Durante la jornada, se realizó una inspección para evaluar al contratista en temas de seguridad, revisando los permisos de trabajo ATS, las inspecciones preoperacionales y los auto reportes de condiciones de salud. Se verificaron los frentes de trabajo y, mediante un registro fotográfico, se evidenció que los hallazgos no han sido subsanados. Por parte de la interventoría, se dio aval para trabajar en alturas en áreas específicas, exceptuando la torre de control, ya que falta el certificado de anclajes. Se solicita al contratista que, al realizar actividades de mantenimiento en alturas, notifique a la interventoría para revisar las condiciones de seguridad y la documentación respectiva antes de iniciar las actividades.

*Se inician actividades con una charla y una sesión de calistenia. Posteriormente, se realizó una inspección para evaluar al contratista en temas de seguridad, revisando los permisos de trabajo ATS, las inspecciones preoperacionales y los auto reportes de condiciones de salud. En la inspección, se verificó el incumplimiento contractual del contratista en relación con el cierre de los hallazgos.

*Se inician actividades inspeccionando al contratista en temas de seguridad, revisando los permisos de trabajo ATS, las inspecciones preoperacionales y los auto reportes de condiciones de salud. Durante la inspección, se verificó el incumplimiento contractual del contratista en relación con el cierre de los hallazgos. Se describen los siguientes incumplimientos: No se delimitan todas las áreas intervenidas, y algunas de las delimitadas no están señalizadas, Un trabajador ingresó el 22 de octubre sin los elementos de protección individual completos, El contratista no envió el soporte de entrega de los EPI y la dotación correspondiente, No se realiza la segregación de residuos, ya que se mezclan residuos de construcción y demolición con residuos peligrosos, El campamento no tiene las áreas señalizadas y presenta falta de orden y aseo, La mayoría de las sustancias químicas envasadas no están rotuladas, Se evidencian extensiones en mal estado, y la cinta añadida en la clavija no se considera una acción correctiva, Se emiten comunicados sobre los hallazgos que no requieren atención inmediata en acciones correctivas y se deja evidencia mediante un registro fotográfico.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA

FAO-CTO-23001163-0156-2024	INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE GRUPO FAO
FAO-CTO-23001163-0157-2024	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA□
FAO-CTO-23001163-0158-2024	ACTA DE CANTIDADES PARA ADICIÓN DEL CONTRATO□
FAO-CTO-23001163-0159-2024	SOLICITUD DE PLANOS DE RED SANITARIA EXISTENTE EN LA SALA DE LLEGADA DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO VANGUARDIA, VILLAVICENCIO-META□
FAO-CTO-23001163-0160-2024	REMISISON FICHAS AMBIENTALES AJUSTADAS
FAO-CTO-23001163-0160-2024	RESPUESTA A SU COMUNICADO CO-FJ-1280-183-2024
FAO-CTO-23001163-0161-2024	CAMBIO DE PROFESIONAL INSPECTOR DE APOYO LADO TIERRA Y RESIDENTE AMBIENTAL
FAO-CTO-23001163-0165-2024	REMISISON FICHAS AMBIENTALES AJUSTADAS

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA

18-10-2024 - CO-FJ-1280-192-2024	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0153-2024 INFORME SEMANAL 07 AL 13 DE OCTUBRE 2024
22-10-2024 - CO-FJ-1280-196-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS
23-10-2024 - CO-FJ-1280-194-2024	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-152-2024 (Requisitos Alturas)
23-10-2024 - CO-FJ-1280-195-2024	VILLAVICENCIO - RTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0161-2024 CAMBIO INSP. DE APOYO LADO TIERRA Y ESPECIALISTA AMBIENTAL
23-10-2024 - CO-FJ-1280-197-2024	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No19
24-10-2024 - CO-FJ-1280-198-2024	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL FAO-CTO-23001163-0160-2024-REMISISON FICHAS AMBIENTALES AJUSTADAS.
24-10-2024 - CO-FJ-1280-199-2024	VILLAVICENCIO - ALCANCE A COMUNICADOS CO-FJ-1280-178-2024 Y CO-FJ-1280-189-2024 SOLICITUD DE REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS INTERVENTORÍA
24-10-2024 - CO-FJ-1280-200-2024	VILLAVICENCIO - PRESENTACIÓN DE RESIDENTE DE APOYO A LA INTERVENTORIA
25-10-2024 - CO-FJ-1280-201-2024	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A SU COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0160-2024 (ENTREGA DE EPI Y CHALECOS IDENTIFICABLES)
25-10-2024 - CO-FJ-1280-202-2024	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A SU COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0165-2024 (HALLAZGOS DE SST Y MA)
25-10-2024 - CO-FJ-1280-203-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL
25-10-2024 - CO-FJ-1280-204-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL DE OBRA DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE

NOMBRE	CARGO	20	21	22	23	24	25	26
		D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
CARLOS ALBERTO AGUILAR YAYA	RESIDENTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
LUZ MARINA BLANCO PÉREZ	AUXILIAR DE INGENIERÍA		1	1	1	1	1	1
JHEYKSON BRAYAN LINARES PABÓN	INSPECTOR SST		1	1	1	1	1	1
JOSÉ EDGAR SALINAS MARTÍNEZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL							
NICOLAS FARID SALINAS CARRILLO	INSPECTOR DE OBRA							
JAVIER ANDRÉS VALENCIA CASTAÑEDA	TÉCNICO ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1
JORDI JESÚS GUEVARA RODRÍGUEZ	AYUDANTE ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1
CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ CASTILLO	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
HÉCTOR FABIAN LÓPEZ SAMUDIO	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
LUIS MARIO ROMERO VERA	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
JOHN JAIRO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
REYNALDO GUZMÁN GIRALDO	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
GELVER ANDRES MACIAS AYALA	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
ÁLVARO MACIAS PEÑA	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
HERVER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	AYUDANTE DE OBRA			1	1	1	1	1
LUISA FERNANDA RUIZ RIVEROS	OPERARIA DE ASEO		1	1	1	1	1	1
JENNY JULAIDY PERDOMO SÁNCHEZ	OPERARIA DE ASEO		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		0	16	17	17	17	17	17

PERSONAL DE INTERVENTORÍA DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE


NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	20	21	22	23	24	25	26
			D	L	M	M	J	V	S
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA		1	1	1	1	1	1
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVETORIA		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			0	3	3	3	3	3	3


DÍA	INTERVENTORÍA	OBRA	TOTAL
DOMÍNGO	0	0	0
LUNES	0	16	0
MARTES	3	17	20
MIERCOLES	3	17	20
JUEVES	3	17	20
VIERNES	3	17	20
SÁBADO	3	17	20

EQUIPOS EN OBRA: Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

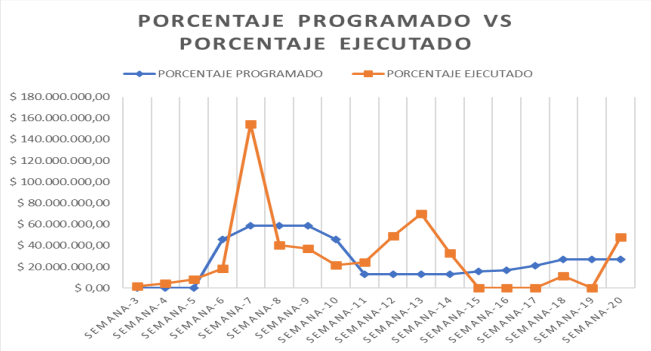

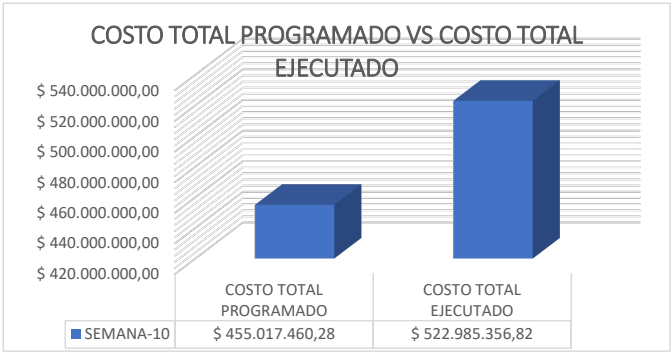

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total	AMORTIZACIÓN	%
ANTICIPO	**Entregado al contratista**	$ 305.869.421,00		
1	**Del 6 de jun al 31 de jul**	**$ 187.656.630,00**	**$ 30.080.000,00**	10
2			$ 50.000.000,00	16
3			$ 100.000.000,00	33
4			$ 125.789.421,00	41
5				
TOTAL ACUMULADO		$ 187.656.630,00	$ 30.080.000,00	10

Valor Total Contrato Obra
$ 1.947.574.911,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 187.656.630,00
% Avance facturado Acumulado
9,64%

NOTA: Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento por un porcentaje equivalente al 9,64%. Equivalente a $ 187.656.630,00 millones de pesos.

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	**jun-24**	$ 27.938.995,00
2	**jul-24**	$ 56.131.974,00
3	**ago-24**	$ 52.372.325,00
4	**sep-24**	$ 27.437.238,00
5		
6		
TOTAL ACUMULADO		$ 163.880.532,00

Valor Total Contrato Obra
$ 838.169.861,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 163.880.532,00
% Avance facturado Acumulado
19,55%

NOTA: Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de interventoría presenta un avance financiero equivalente a 19,55 %.


AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

REGISTRO FOTOGRÁFICO


ENTRADA ALFA 13



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de pintura del portón de alfa 13
1	

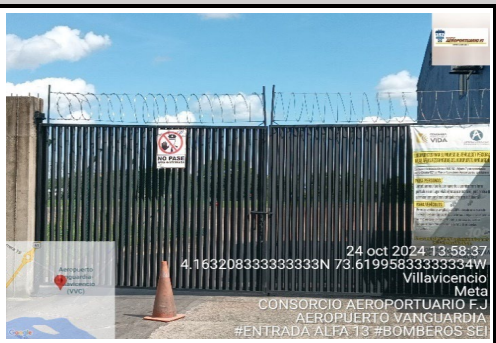

No. FOTO	Se realizó el mantenimiento y ajuste del portón de alfa 13
2	

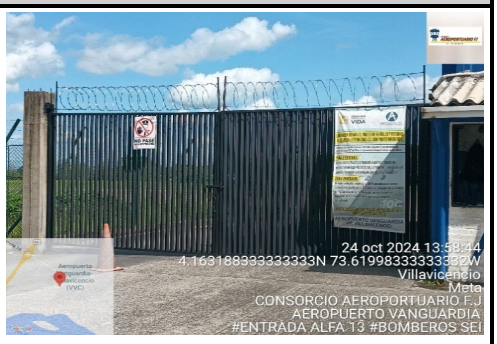


No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de la concertina del portón de alfa 13
3	

MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA SALA DE ABORDAJE No.3



No. FOTO	Mantenimiento de orinal y del inodoro en el baño de la sala de abordaje No.3
4	

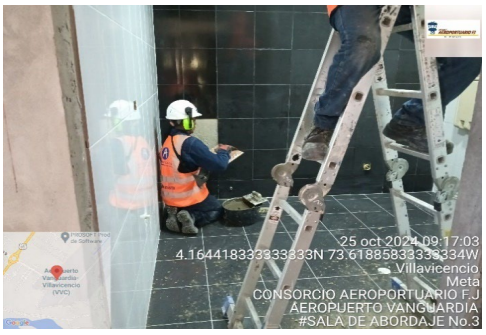

No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del en chape de muro
5	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del en chape de muro
6	

MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA SALA DE ABORDAJE No.3



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del en chape de muro
7	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del en chape de piso
8	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del en chape de piso
9	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

BODEGA DE MALETAS ALFA 6



No. FOTO	
10	Mantenimiento de pintura de perfiles metálicos



No. FOTO	
11	Mantenimiento de pintura de muros



No. FOTO	
12	Mantenimiento de pintura de enchape de muro

MANTENIMIENTO DEL PARQUEADERO DE AMBULANCIAS



No. FOTO	
13	Se realizó mantenimiento de pintura de la estructura metálica



No. FOTO	
14	Se realizó mantenimiento de pintura de la estructura metálica



No. FOTO	
15	Se realizó mantenimiento de pintura de la estructura metálica

MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS AEROLÍNEAS



No. FOTO	
16	Se realiza el mantenimiento de humedades



No. FOTO	
17	Se realiza el mantenimiento de humedades



No. FOTO	
18	Se realiza el mantenimiento de pintura de muros

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

OTROS MANTENIMIENTOS



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento del mueble de la sala de abordaje No.1
19	



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento de orinales en la estación de bomberos
20	



No. FOTO	Recorrido para atender solicitudes de mantenimientos locativos
21	

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE



No. FOTO	Charla de Seguridad antes de iniciar actividades
22	



No. FOTO	Realización de Ejercicios de Calistenia Antes de Actividades
23	



No. FOTO	Inspección rutinaria de SST y MA en el campamento
24	



No. FOTO	Inspección del uso adecuado de los elementos de protección individual
25	



No. FOTO	Inspección de SST en verificación de áreas en delimitación y señalización
26	



No. FOTO	Participación en la socialización centrada en el manejo ambiental, dirigida por la Ingeniera Ambiental Yolima.
27	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Veintinueve	(29)	días del mes de	octubre	de	2024
(Día en letras)	(Día en Números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)



Sandra Yonaira Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

PRESUPUESTO CON MAYORES Y MENORES

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CAT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						+	-		
	1			MAMPOSTERIA								
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	$ 38.916,00	$ 2.334.960,00	0	-20	$ 40,00	$1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	$ 30.706,00	$ 1.842.360,00	0	0	$ 60,00	$1.842.360,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	$ 26.258,00	$ 3.938.700,00	0	0	$ 150,00	$3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	$ 38.490,00	$ 76.306.425,00	0	0	$ 1.982,50	$76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	$ 29.591,00	$ 29.324.681,00	0	0	$ 991,00	$29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	$ 15.640,00	$ 37.536.000,00	0	0	$ 2.400,00	$37.536.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	$ 66.017,00	$ 3.895.003,00	0		$ 59,00	$3.895.003,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	$ 33.550,00	$ 1.342.000,00	0		$ 40,00	$1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	$ 1.841,00	$ 736.400,00	0	0	$ 400,00	$736.400,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	$ 27.292,00	$ 42.657.298,00	0	0	$ 1.563,00	$42.657.297,75
Subtotal								**$ 199.913.827,00**				**$ 199.135.506,75**
	2			PISOS								
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	$ 20.128,00	$ 14.089.600,00	0	-300	$ 400,00	$8.051.200,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	$ 86.865,00	$ 9.989.475,00	0		$ 115,00	$9.989.475,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO)	M2	38,00	$ 175.568,00	$ 6.671.584,00	0	-37	$ 1,00	$175.568,00
Subtotal								**$ 30.750.659,00**				**$ 18.216.243,00**
	3			CUBIERTA Y CIELORASO							$ -	
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO;NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	$ 480.205,00	$ 11.524.920,00	0	0	$ 24,00	$11.524.920,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	$ 89.881,00	$ 44.041.690,00	0	0	$ 490,00	$44.041.690,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	$ 140.472,00	$ 68.831.280,00	0	-300	$ 190,00	$26.689.680,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	$ 89.781,00	$ 33.039.408,00	0		$ 368,00	$33.039.408,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	$ 28.249,00	$ 2.824.900,00	0	0	$ 100,00	$2.824.900,00
Subtotal								**$ 160.262.198,00**				**$ 118.120.598,00**
	4			CARPINTERIA METÁLICA								
19	4.1		4.1	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	$ 451.209,00	$ 2.256.045,00	0		$ 5,00	$2.256.045,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSINAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	$ 17.857,00	$ 5.357.100,00	200	0	$ 500,00	$8.928.500,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	$ 22.736,00	$ 4.547.200,00	0	0	$ 200,00	$4.547.200,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACREO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	$ 83.129,00	$ 6.816.578,00	0	0	$ 82,00	$6.816.578,00
Subtotal								**$ 18.976.923,00**				**$ 22.548.323,00**
	5			CARPINTERIA MADERA								
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	$ 476.557,00	$ 3.335.899,00		-5	$ 2,00	$953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	$ 12.995,00	$ 2.011.626,00	0		$ 154,80	$2.011.626,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	$ 38.231,00	$ 2.959.079,00	0		$ 77,40	$2.959.079,40
Subtotal								**$ 8.306.604,00**				**$ 5.923.819,40**
	6			CRISTALERIA								
26	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/0 PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	$ 289.652,00	$ 14.482.600,00		-30	$ 20,00	$5.793.040,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	$ 84.356,00	$ 4.217.800,00		-50	$ -	$0,00
Subtotal								**$ 18.700.400,00**				**$ 5.793.040,00**
	7			CANALETAS Y PORTACABLES								
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	$ 61.879,00	$ 30.939.500,00		250	$ 750,00	$46.409.250,00
Subtotal								**$ 30.939.500,00**				**$ 46.409.250,00**

PRESUPUESTO CON MAYORES Y MENORES

	8			**LIMPIEZA PROFUNDA**									
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	$ 9.054,00	$ 82.391.400,00	0		$ 9.100,00	$82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	$ 14.260,00	$ 87.342.500,00	0		$ 6.125,00	$87.342.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	$ 7.870,00	$ 11.805.000,00	0		$ 1.500,00	$11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	$ 627.943,00	$ 100.470.880,00	0		$ 160,00	$100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	$ 30.741,00	$ 293.365.667,00		-1000	$ 8.543,14	$262.624.666,74
Subtotal								**$ 575.375.447,00**				**$ 544.634.446,74**
	9			**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**								
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 61.126.435,00	$ 61.126.435,00	0		$ 1,00	$61.126.435,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	$ 22.193.560,00	$ 22.193.560,00	0		$ 1,00	$22.193.560,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 72.618.205,00	$ 72.618.205,00	0		$ 1,00	$72.618.205,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	$ 589.218,00	$ 14.141.232,00	0	-24	$ -	$0,00
Subtotal								**$ 170.079.432,00**				**$ 155.938.200,00**
	10			**MANO DE OBRA**								
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	$ 11.766.194,00	$ 352.985.820,00	0	0	$ 30,00	$352.985.820,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	$ 39.080,00	$ 18.758.400,00	200	0	$ 680,00	$26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	$ 36.074,00	$ 25.973.280,00	200	0	$ 920,00	$33.188.080,00
	SUBTOTAL				SUBTOTAL			**$ 397.717.500,00**				**$ 412.748.300,00**
							SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO	**$ 1.611.022.490,00**				**$ 1.529.467.726,89**

IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 11.956.808,00	$ 0,19 / $ 11.351.518,00
SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)		**$ 1.622.979.298,00**	**$ 1.540.819.244,89**

	11			**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**									
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	$ 324.595.613,00	$ 324.595.613,00				$ 406.755.666,11
								TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**$ 324.595.613,00**				$ 406.755.666,11

VALOR TOTAL	**$ 1.947.574.911,00** / **$ 1.947.574.911,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.

DESCRIPCION		**PORCENTAJE**
ADMINISTRACIÓN	**A=**	20%
IMPREVISTO	**I=**	3%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	28%

20%
3%
5%
28%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/10/2024 **Y EL** 26/10/2024 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING.JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FECHA	OCTUBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																													NOVIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																																				
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																																				
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVETORIA		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																																				
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA				3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

VERSIÓN 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/10/2024 **Y EL** 26/10/2024 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

FECHA

SEPTIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO

NOMBRE	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
CARLOS ALBERTO AGUILAR YAYA	RESIDENTE DE OBRA																														
LUZ MARINA BLANCO PÉREZ	AUXILIAR DE INGENIERÍA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
JHEYKSON BRAYAN LINARES PABÓN	INSPECTOR SST			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
JOSÉ EDGAR SALINAS MARTÍNEZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL																														
NICOLAS FARID SALINAS CARRILLO	INSPECTOR DE OBRA																														
JAVIER ANDRÉS VALENCIA CASTAÑEDA	TÉCNICO ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
JORDI JESÚS GUEVARA RODRÍGUEZ	AYUDANTE ELÉCTRICO																														
CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ CASTILLO	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
HÉCTOR FABIAN LÓPEZ SAMUDIO	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
LUIS MARIO ROMERO VERA	OFICIAL DE OBRA																														
JOHN JAIRO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
REYNALDO GUZMÁN GIRALDO	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
GELVER ANDRES MACIAS AYALA	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
ÁLVARO MACIAS PEÑA	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
HERVER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	AYUDANTE DE OBRA																														
LUISA FERNANDA RUIZ RIVEROS	OPERARIA DE ASEO																1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
JENNY JULAIDY PERDOMO SÁNCHEZ	OPERARIA DE ASEO																1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		**0**	**10**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**0**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**0**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**0**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**0**	**12**

OCTUBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO

NOMBRE	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
CARLOS ALBERTO AGUILAR YAYA	RESIDENTE DE OBRA																					1	1	1	1	1	1					
LUZ MARINA BLANCO PÉREZ	AUXILIAR DE INGENIERÍA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
JHEYKSON BRAYAN LINARES PABÓN	INSPECTOR SST	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
JOSÉ EDGAR SALINAS MARTÍNEZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL																															
NICOLAS FARID SALINAS CARRILLO	INSPECTOR DE OBRA																															
JAVIER ANDRÉS VALENCIA CASTAÑEDA	TÉCNICO ELÉCTRICO	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
JORDI JESÚS GUEVARA RODRÍGUEZ	AYUDANTE ELÉCTRICO								1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ CASTILLO	OFICIAL DE OBRA	1	1	1	1	1						1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
HÉCTOR FABIAN LÓPEZ SAMUDIO	OFICIAL DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
LUIS MARIO ROMERO VERA	OFICIAL DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
JOHN JAIRO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ	OFICIAL DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
REYNALDO GUZMÁN GIRALDO	OFICIAL DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
GELVER ANDRES MACIAS AYALA	AYUDANTE DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
ÁLVARO MACIAS PEÑA	AYUDANTE DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
HERVER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	AYUDANTE DE OBRA																						1	1	1	1	1					
LUISA FERNANDA RUIZ RIVEROS	OPERARIA DE ASEO	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
JENNY JULAIDY PERDOMO SÁNCHEZ	OPERARIA DE ASEO	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**0**	**13**	**14**	**14**	**13**	**15**	**15**	**0**	**0**	**15**	**14**	**14**	**14**	**14**	**0**	**16**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**0**	**0**	**0**		**0**

			COSTO PROGRAMADO					EJECUTADO			
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL		COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 45.812.826,61	2,35%		$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 104.547.219,71	5,37%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 187.656.630,00	9,64%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 163.281.612,81	8,38%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 228.308.146,00	11,72%	$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	$ 222.016.005,91	11,40%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 265.699.525,00	13,64%	$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	$ 267.981.357,99	13,76%	$ 45.965.352,08	2,36%		$ 287.156.607,00	14,74%	$ 21.457.082,00	1,10%
11	S-11	25/08/2024	$ 281.112.033,16	14,43%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 311.702.916,00	16,00%	$ 24.546.309,00	1,26%
12	S-12	1/09/2024	$ 294.242.708,33	15,11%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 360.592.928,00	18,51%	$ 48.890.012,00	2,51%
13	S-13	8/09/2024	$ 307.373.383,50	15,78%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 430.770.803,00	22,12%	$ 70.177.875,00	3,60%
14	S-14	15/09/2024	$ 320.504.058,67	16,46%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 32.786.021,00	1,68%
15	S-15	22/09/2024	$ 336.339.384,58	17,27%	$ 15.835.325,91	0,81%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	$ 352.937.560,70	18,12%	$ 16.598.176,12	0,85%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	$ 374.247.028,83	19,22%	$ 21.309.468,13	1,09%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	$ 401.170.505,98	20,60%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 11.204.668,00	0,58%
19	S-19	20/10/2024	$ 428.093.983,13	21,98%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	$ 455.017.460,28	23,36%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 522.985.356,82	26,85%	$ 48.223.864,82	2,48%
21	S-21	3/11/2024	$ 481.940.937,43	24,75%	$ 26.923.477,15	1,38%					
22	S-22	10/11/2024	$ 508.770.878,31	26,12%	$ 26.829.940,88	1,38%					
23	S-23	17/11/2024	$ 535.533.086,04	27,50%	$ 26.762.207,73	1,37%					
24	S-24	24/11/2024	$ 562.295.293,77	28,87%	$ 26.762.207,73	1,37%					
25	S-25	1/12/2024	$ 589.057.501,50	30,25%	$ 26.762.207,73	1,37%					
26	S-26	8/12/2024	$ 613.961.736,22	31,52%	$ 24.904.234,72	1,28%					
27	S-27	15/12/2024	$ 634.212.216,92	32,56%	$ 20.250.480,70	1,04%					
28	S-28	22/12/2024	$ 650.072.944,39	33,38%	$ 15.860.727,47	0,81%					
29	S-29	29/12/2024	$ 663.682.314,47	34,08%	$ 13.609.370,08	0,70%					
30	S-30	5/01/2025	$ 673.618.417,22	34,59%	$ 9.936.102,75	0,51%					
31	S-31	12/01/2025	$ 683.554.519,97	35,10%	$ 9.936.102,75	0,51%					
32	S-32	19/01/2025	$ 693.490.622,72	35,61%	$ 9.936.102,75	0,51%					
33	S-33	26/01/2025	$ 703.766.316,78	36,14%	$ 10.275.694,06	0,53%					
34	S-34	2/02/2025	$ 714.137.793,00	36,67%	$ 10.371.476,22	0,53%					
35	S-35	9/02/2025	$ 724.265.806,04	37,19%	$ 10.128.013,04	0,52%					
36	S-36	16/02/2025	$ 731.593.992,49	37,56%	$ 7.328.186,45	0,38%					
37	S-37	23/02/2025	$ 738.922.178,94	37,94%	$ 7.328.186,45	0,38%					
38	S-38	2/03/2025	$ 757.980.970,75	38,92%	$ 19.058.791,81	0,98%					
39	S-39	9/03/2025	$ 796.179.171,30	40,88%	$ 38.198.200,55	1,96%					
40	S-40	16/03/2025	$ 835.853.763,56	42,92%	$ 39.674.592,26	2,04%					
41	S-41	23/03/2025	$ 876.597.467,07	45,01%	$ 40.743.703,51	2,09%					
42	S-42	30/03/2025	$ 917.341.170,58	47,10%	$ 40.743.703,51	2,09%					
43	S-43	6/04/2025	$ 931.369.380,59	47,82%	$ 14.028.210,01	0,72%					
44	S-44	13/04/2025	$ 941.787.649,20	48,36%	$ 10.418.268,61	0,53%					
45	S-45	20/04/2025	$ 952.206.592,93	48,89%	$ 10.418.943,73	0,53%					
46	S-46	27/04/2025	$ 962.842.934,88	49,44%	$ 10.636.341,95	0,55%					
47	S-47	4/05/2025	$ 972.624.266,23	49,94%	$ 9.781.331,35	0,50%					
48	S-48	11/05/2025	$ 980.098.488,48	50,32%	$ 7.474.222,25	0,38%					
49	S-49	18/05/2025	$ 994.922.494,90	51,09%	$ 14.824.006,42	0,76%					
50	S-50	25/05/2025	$ 1.015.068.758,81	52,12%	$ 20.146.263,91	1,03%					
51	S-51	1/06/2025	$ 1.035.215.022,72	53,15%	$ 20.146.263,91	1,03%					
52	S-52	8/06/2025	$ 1.055.361.286,63	54,19%	$ 20.146.263,91	1,03%					
53	S-53	15/06/2025	$ 1.075.507.550,54	55,22%	$ 20.146.263,91	1,03%					
54	S-54	22/06/2025	$ 1.095.383.369,94	56,24%	$ 19.875.819,40	1,02%					
55	S-55	29/06/2025	$ 1.114.027.164,38	57,20%	$ 18.643.794,44	0,96%					
56	S-56	6/07/2025	$ 1.132.670.958,82	58,16%	$ 18.643.794,44	0,96%					
57	S-57	13/07/2025	$ 1.151.314.753,26	59,12%	$ 18.643.794,44	0,96%					
58	S-58	20/07/2025	$ 1.171.281.482,43	60,14%	$ 19.966.729,17	1,03%					
59	S-59	27/07/2025	$ 1.192.206.198,82	61,21%	$ 20.924.716,39	1,07%					
60	S-60	3/08/2025	$ 1.209.634.483,11	62,11%	$ 17.428.284,29	0,89%					
61	S-61	10/08/2025	$ 1.226.076.594,25	62,95%	$ 16.442.111,14	0,84%					
62	S-62	17/08/2025	$ 1.233.714.313,88	63,35%	$ 7.637.719,63	0,39%					
63	S-63	24/08/2025	$ 1.241.172.352,05	63,73%	$ 7.458.038,17	0,38%					
64	S-64	31/08/2025	$ 1.248.365.634,36	64,10%	$ 7.193.282,31	0,37%					
65	S-65	7/09/2025	$ 1.254.878.115,87	64,43%	$ 6.512.481,51	0,33%					
66	S-66	14/09/2025	$ 1.261.390.597,38	64,77%	$ 6.512.481,51	0,33%					
67	S-67	21/09/2025	$ 1.267.733.439,63	65,09%	$ 6.342.842,25	0,33%					
68	S-68	28/09/2025	$ 1.273.953.439,66	65,41%	$ 6.220.000,03	0,32%					
69	S-69	5/10/2025	$ 1.280.173.439,69	65,73%	$ 6.220.000,03	0,32%					

70	S-70	12/10/2025	$ 1.286.393.439,72	66,05%	$ 6.220.000,03	0,32%					
71	S-71	19/10/2025	$ 1.325.893.877,29	68,08%	$ 39.500.437,57	2,03%					
72	S-72	26/10/2025	$ 1.366.073.507,47	70,14%	$ 40.179.630,18	2,06%					
73	S-73	2/11/2025	$ 1.406.253.137,65	72,21%	$ 40.179.630,18	2,06%					
74	S-74	9/11/2025	$ 1.446.432.767,83	74,27%	$ 40.179.630,18	2,06%					
75	S-75	16/11/2025	$ 1.473.252.146,74	75,65%	$ 26.819.378,91	1,38%					
76	S-76	23/11/2025	$ 1.485.874.113,84	76,29%	$ 12.621.967,10	0,65%					
77	S-77	30/11/2025	$ 1.498.696.083,31	76,95%	$ 12.821.969,47	0,66%					
78	S-78	7/12/2025	$ 1.511.518.052,78	77,61%	$ 12.821.969,47	0,66%					
79	S-79	14/12/2025	$ 1.524.340.022,25	78,27%	$ 12.821.969,47	0,66%					
80	S-80	21/12/2025	$ 1.533.088.604,89	78,72%	$ 8.748.582,64	0,45%					
81	S-81	28/12/2025	$ 1.541.349.091,56	79,14%	$ 8.260.486,67	0,42%					
82	S-82	4/01/2026	$ 1.547.764.734,78	79,47%	$ 6.415.643,22	0,33%					
83	S-83	11/01/2026	$ 1.554.180.378,00	79,80%	$ 6.415.643,22	0,33%					
84	S-84	18/01/2026	$ 1.561.147.319,89	80,16%	$ 6.966.941,89	0,36%					
85	S-85	25/01/2026	$ 1.569.039.773,60	80,56%	$ 7.892.453,71	0,41%					
86	S-86	1/02/2026	$ 1.577.169.941,22	80,98%	$ 8.130.167,62	0,42%					
87	S-87	8/02/2026	$ 1.585.066.137,73	81,39%	$ 7.896.196,51	0,41%					
88	S-88	15/02/2026	$ 1.592.896.342,39	81,79%	$ 7.830.204,66	0,40%					
89	S-89	22/02/2026	$ 1.600.740.077,38	82,19%	$ 7.843.734,99	0,40%					
90	S-90	1/03/2026	$ 1.608.739.411,11	82,60%	$ 7.999.333,73	0,41%					
91	S-91	8/03/2026	$ 1.616.532.746,82	83,00%	$ 7.793.335,71	0,40%					
92	S-92	15/03/2026	$ 1.625.499.763,32	83,46%	$ 8.967.016,50	0,46%					
93	S-93	22/03/2026	$ 1.637.498.649,21	84,08%	$ 11.998.885,89	0,62%					
94	S-94	29/03/2026	$ 1.649.771.243,75	84,71%	$ 12.272.594,54	0,63%					
95	S-95	5/04/2026	$ 1.664.573.433,63	85,47%	$ 14.802.189,88	0,76%					
96	S-96	12/04/2026	$ 1.680.566.021,32	86,29%	$ 15.992.587,69	0,82%					
97	S-97	19/04/2026	$ 1.696.558.609,01	87,11%	$ 15.992.587,69	0,82%					
98	S-98	26/04/2026	$ 1.704.432.501,33	87,52%	$ 7.873.892,32	0,40%					
99	S-99	3/05/2026	$ 1.712.140.705,99	87,91%	$ 7.708.204,66	0,40%					
100	S-100	10/05/2026	$ 1.721.817.914,73	88,41%	$ 9.677.208,74	0,50%					
101	S-101	17/05/2026	$ 1.736.558.276,80	89,17%	$ 14.740.362,07	0,76%					
102	S-102	24/05/2026	$ 1.751.298.638,87	89,92%	$ 14.740.362,07	0,76%					
103	S-103	31/05/2026	$ 1.766.039.000,94	90,68%	$ 14.740.362,07	0,76%					
104	S-104	7/06/2026	$ 1.774.935.235,23	91,14%	$ 8.896.234,29	0,46%					
105	S-105	14/06/2026	$ 1.781.081.291,74	91,45%	$ 6.146.056,51	0,32%					
106	S-106	21/06/2026	$ 1.787.227.348,25	91,77%	$ 6.146.056,51	0,32%					
107	S-107	28/06/2026	$ 1.793.373.404,76	92,08%	$ 6.146.056,51	0,32%					
108	S-108	5/07/2026	$ 1.799.519.461,27	92,40%	$ 6.146.056,51	0,32%					
109	S-109	12/07/2026	$ 1.805.665.517,78	92,71%	$ 6.146.056,51	0,32%					
110	S-110	19/07/2026	$ 1.811.811.574,29	93,03%	$ 6.146.056,51	0,32%					
111	S-111	26/07/2026	$ 1.817.957.630,80	93,34%	$ 6.146.056,51	0,32%					
112	S-112	2/08/2026	$ 1.824.103.687,31	93,66%	$ 6.146.056,51	0,32%					
113	S-113	9/08/2026	$ 1.830.249.743,82	93,98%	$ 6.146.056,51	0,32%					
114	S-114	16/08/2026	$ 1.836.395.800,33	94,29%	$ 6.146.056,51	0,32%					
115	S-115	23/08/2026	$ 1.842.541.856,84	94,61%	$ 6.146.056,51	0,32%					
116	S-116	30/08/2026	$ 1.848.687.913,35	94,92%	$ 6.146.056,51	0,32%					
117	S-117	6/09/2026	$ 1.854.833.969,86	95,24%	$ 6.146.056,51	0,32%					
118	S-118	13/09/2026	$ 1.860.980.026,37	95,55%	$ 6.146.056,51	0,32%					
119	S-119	20/09/2026	$ 1.867.126.082,88	95,87%	$ 6.146.056,51	0,32%					
120	S-120	27/09/2026	$ 1.873.272.139,39	96,18%	$ 6.146.056,51	0,32%					
121	S-121	4/10/2026	$ 1.879.089.924,30	96,48%	$ 5.817.784,91	0,30%					
122	S-122	11/10/2026	$ 1.884.669.995,30	96,77%	$ 5.580.071,00	0,29%					
123	S-123	18/10/2026	$ 1.890.250.066,30	97,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
124	S-124	25/10/2026	$ 1.895.830.137,30	97,34%	$ 5.580.071,00	0,29%					
125	S-125	1/11/2026	$ 1.901.410.208,30	97,63%	$ 5.580.071,00	0,29%					
126	S-126	8/11/2026	$ 1.906.990.279,30	97,92%	$ 5.580.071,00	0,29%					
127	S-127	15/11/2026	$ 1.912.570.350,30	98,20%	$ 5.580.071,00	0,29%					
128	S-128	22/11/2026	$ 1.918.150.421,30	98,49%	$ 5.580.071,00	0,29%					
129	S-129	29/11/2026	$ 1.923.730.492,30	98,78%	$ 5.580.071,00	0,29%					
130	S-130	6/12/2026	$ 1.929.310.563,30	99,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
131	S-131	13/12/2026	$ 1.934.890.634,30	99,35%	$ 5.580.071,00	0,29%					
132	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 12.684.276,30	0,65%					

$ 1.947.574.910,60	100%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón
	Directora de Interventoría.
	CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ
