AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL**			**FECHA:**	2/12/2024
Semana No	**25**	**DEL :**	24-nov-24	**AL:**	30-nov-24
Plazo Total	**25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)**	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		169	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**21,50%**			
Nombre del Supervisor :	**Jorge Beltrán Gómez**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO VANGUARDIA, DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado
(%) Programado:	**1,37%**	**30,25%**
($) Valor programado:	**$ 26.762.207,73**	**$ 589.057.501,50**

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado:	**0,84%**	**29,95%**
($) Valor ejecutado:	**$ 16.347.502,88**	**$ 583.244.473,59**

Evaluación:	**Porcentaje Adelanto:**	**-0,30%**
	Valor Adelanto:	**-$ 5.813.027,91**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	**Contratista:**	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	**Contrato No:**	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	**Valor Inicial:**	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	**Plazo inicial:**	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS	**Plazo actualizado:**	25 MESES Y 25 DÍAS
Fecha de iniciación:	6-jun-24	**Fecha de iniciación:**	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	**Valor total actual del contrato:**	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

EL DÍA JUEVES 27-11-24 SE REALIZA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 24

"Actividades realizadas en obra del (24 al 30 de noviembre del 2024)

- **FOSO DE ASCENSOR SALA No.1:** Se realiza el mantenimiento y adecuación del foso del ascensor de la sala de abordaje No.1
- **OFICINAS DE LAS AEROLINEAS:** Se realiza el mantenimiento de pintura de muros, mantenimiento de puertas y perfiles metálicos.
- **BAÑOS SALA No.3:** Se realiza la instalación de lavamanos, dispensadores de jabón y dispensadores de toallas, instalación de espejos.
- **BOMBEROS:** Se realiza el mantenimiento de humedades, mantenimiento del circuito eléctrico, mantenimiento de filtraciones en la cubierta.
- **SALA DE ABORDAJE No.2**: S e realiza el desmonte de la estructura de aires acondicionados.
- **SOLÓN PRINCIPAL:** Se realiza el desmonte de pendón, desmonte de cableado eléctrico y pintura de muro.

- **MANTENIMIENTOS DE LA CUADRILLA ELÉCTRICA:**
- Mantenimiento de luminarias en la oficina del SAR
- Desmonte de estructura de aire acondicionado en la sala de espera No.2.

SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO

SANIDAD Y AIM: Solicitud de mantenimiento de la red de desagüe.
BAÑOS MISTOS DEL PRIMER PISO: Solicitud de mantenimiento a lavamanos tapado en el baño para mujeres.
BOMBEROS: Solicitud de mantenimiento del punto de abastecimiento de agua a los carros de bomberos.
SALÓN PRINCIPAL: Solicitud de mantenimiento de los Counters, solicitud de retiro de valla publicitaria, solicitud de mantenimiento de cables a la vista, solicitud de desmonte de estructura de local GIRAPE, solicitud de mantenimiento y aseo de los vidrios y la ventanería del salón principal.
DIRECCIÓN REGIONAL: Solicitud de mantenimiento de vidrios partidos en las oficinas de operación del radar.
SALA DE ABORDAJE No3: Mantenimiento de aire acondicionado.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN	
PENDIENTES POR EJECUTAR	**ACTIVIDADES PENDIENTES EJECUTADAS EN LA SEMANA**
SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN • Pintura general parte interna de toda la oficina AIM • Mantenimiento de la cubierta en sanidad, oficina AIM, alfa 7. • Mantenimiento de cuarto de aseo para sanidad aeroportuaria • Mantenimiento de cámaras para el cuarto de equipos electrógenos **BOMBEROS** • Mantenimiento del punto de vigilancia de bomberos. **ALFA 8 Y ALFA 13** • Mantenimiento de los puntos de vigilancia de alfa 8 y alfa 13 **SALÓN PRINCIPAL DEL AEROPUERTO** • Mantenimiento y Limpieza de todos los vidrios del salón principal **CUBIERTA DE LA TERMINAL AÉREA** • Mantenimiento de pintura de las tejas de la cubierta de la terminal aérea.	**SALA DE ABORDAJE 2** **• Mantenimiento de vidrio roto, y retiró de estructura.**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

*Se inician las actividades con la charla de seguridad y una sesión de calistenia, por parte del contratista. Se realiza revisión de la planilla de seguridad social, se detectaron incumplimientos, como un retraso de tres días en los pagos y la omisión del especialista ambiental en el registro. En la inspección del acopio temporal de residuos peligrosos y de construcción y demolición, se verificó que se está realizando una correcta separación. Además, en las áreas intervenidas para trabajos de mantenimiento, se evidenció un adecuado orden y limpieza.

*Se inician las actividades con la charla de seguridad proporcionada por el contratista, enfocada en la motivación laboral, seguida de una sesión de calistenia. Posteriormente, se realizó una inspección de seguridad en las áreas de intervención, verificando el uso adecuado de los elementos de protección individual, la correcta señalización y delimitación de áreas, así como el mantenimiento del orden y la limpieza en los espacios de trabajo. Asimismo, se llevó a cabo una reunión con el contratista para tratar temas ambientales, donde se les indicó que deben entregar las fichas ambientales el día viernes 29 para proceder con su revisión.

*Se inician las actividades con la charla de seguridad y una sesión de calistenia, por parte del contratista. Posteriormente, se llevó a cabo la reunión del comité de seguimiento de obra, en la cual la interventoría abordó temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo, así como aspectos ambientales. Durante la reunión, se mencionó que se han realizado dos encuentros previos con el contratista para tratar los informes ambientales desde el inicio del proyecto y las fichas ambientales. Adicionalmente, se emitió un comunicado solicitando la hoja de vida del especialista ambiental. En la jornada, también se inspeccionó el acopio temporal de residuos peligrosos y de construcción y demolición, y se solicitó al contratista implementar pausas activas durante la jornada laboral para promover el bienestar del personal.

*Se inician las actividades con la charla de seguridad y una sesión de calistenia, por parte del contratista. seguida de una sesión de calistenia. Posteriormente, la interventoría verificó el informe de seguridad y salud en el trabajo correspondiente al mes de octubre, otorgando su aval. Durante la revisión de la documentación del personal operativo ingresado, se constató que el trabajador Jhojan Tovar presenta una restricción en su examen de énfasis en alturas. Por lo tanto, no se le otorga el aval para realizar actividades de mantenimiento en alturas.

*Se inician las actividades con una capacitación sobre sustancias químicas, impartida por el contratista, seguida de una evaluación de conocimiento y una sesión de calistenia. Posteriormente, se llevó a cabo una inspección de seguridad en las áreas de intervención, verificando el uso correcto de los elementos de protección individual, la señalización y delimitación adecuada de las áreas, así como el mantenimiento del orden y la limpieza en los espacios de trabajo. Adicionalmente, se realizaron pausas activas con una cuadrilla que se encontraba ejecutando actividades de mantenimiento en el área de bomberos, promoviendo el bienestar y la prevención de fatiga laboral.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA	
FAO-CTO-23001163-197-2024	Entrega de cotizaciones bolsa monto agotable ítems 11.1.65, 11.1.67 y 11.1.68.
FAO-CTO-23001163-198-2024	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2024
FAO-CTO-23001163-199-2024	Informe semanal No. 19
FAO-CTO-23001163-200-2024	Cambio del especialista ambiental.
FAO-CTO-23001163-201-2024	Informe semanal No. 20

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA

26-11-2024 - CO-FJ-1280-232-2024	VILLAVICENCIO - REMISIÓN PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
26-11-2024 - CO-FJ-1280-245-2024	VILLAVICENCIO - NOVEDAD DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
26-11-2024 - CO-FJ-1280-246-2024	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL
26-11-2024 - CO-FJ-1280-247-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
26-11-2024 - CO-FJ-1280-248-2024	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A COMUNICADO (SOLICITUD DE TRASLADO Y ADECUACIÓN DEL PUNTO DE VIGILANCIA DE BOMBEROS)
26-11-2024 - CO-FJ-1280-249-2024	VILLAVICENCIO - APROBACION BMA - (RESPUESTA A COMUNICADO - FAO-CTO-23001163-0197-2024
27-11-2024 - CO-FJ-1280-250-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS - (Punto de abastecimiento para los tanques de bomberos)
27-11-2024 - CO-FJ-1280-251-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VALLA DEL PROYECTO
27-11-2024 - CO-FJ-1280-252-2024	VILLAVICENCIO - RTA COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0200-2024 CAMBIO ESPECIALISTA AMBIENTAL
27-11-2024 - CO-FJ-1280-253-2024	VILLAVICENCIO - INFORME DE DIAGNOSTICO DE LA RED SANITARIA DE SANIDAD Y AIM DEL AEROPUERTO VANGUARDIA
28-11-2024 - CO-FJ-1280-254-2024	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0198-2024 - ENTREGA DE INFORME MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2024 (SST)
28-11-2024 - CO-FJ-1280-255-2024	VILLAVICENCIO - REVISIÓN DE DOCUMENTACION DE INGRESO DEL PERSONAL
28-11-2024 - CO-FJ-1280-256-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (SALÓN PRINCIPAL DEL TERMINAL AÉREO)
29-11-2024 - CO-FJ-1280-257-2024	VILLAVICENCIO - APROBACIÓN DE INFORME ELÉCTRICO Y CAMBIO DE TRANSFERENCIA
29-11-2024 - CO-FJ-1280-258-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD ENTREGA DE SOPORTES DE PAGOS SALARIALES DEL PERSONAL
29-11-2024 - CO-FJ-1280-259-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (SALÓN PRINCIPAL DEL TERMINAL AÉREO Y SALA DE ABORDAJE No.3)
29-11-2024 - CO-FJ-1280-260-2024	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A COMUNICADO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE VIDRIOS EN EL ÁREA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL)

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL DE OBRA

NOMBRE	CARGO	24	25	26	27	28	29	30
		D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
CARLOS ALBERTO AGUILAR YAYA	RESIDENTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
LUZ MARINA BLANCO PÉREZ	INSPECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
JHEYKSON BRAYAN LINARES PABÓN	INSPECTOR SST		1	1	1	1	1	1
JOSÉ EDGAR SALINAS MARTÍNEZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL							
JAVIER ANDRÉS VALENCIA CASTAÑEDA	TÉCNICO ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1
JORDI JESÚS GUEVARA RODRÍGUEZ	AYUDANTE ELÉCTRICO		1	1		1	1	1
CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ CASTILLO	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1		
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
JOHN JAIRO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ	OFICIAL DE OBRA		1	1				
REYNALDO GUZMÁN GIRALDO	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
JHON ALEJANDRO MONZÓN MEJÍA	OFICIAL DE OBRA					1	1	1
CARLOS JAVIER MELO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
ÁLVARO MACIAS PEÑA	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
JHOJAN ESTIBEN TOVAR CUESTA	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
LUISA FERNANDA RUIZ RIVEROS	OPERARIA DE ASEO		1	1	1	1	1	1
JENNY JULAIDY PERDOMO SÁNCHEZ	OPERARIA DE ASEO		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA			17	17	15	17	16	16


PERSONAL DE INTERVENTORÍA


NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	24	25	26	27	28	29	30
			D	L	M	M	J	V	S
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA		1	1	1	1	1	1
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
GUILLERMO SABOGAL CHAPARRO	86.062.565	RESIDENTE DE APOYO INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVETORIA		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA				4	4	4	4	4	4

DÍA	INTERVENTORÍA	OBRA	TOTAL
DOMÍNGO			
LUNES	4	17	21
MARTES	4	17	21
MIERCOLES	4	15	19
JUEVES	4	17	21
VIERNES	4	16	20
SÁBADO	4	16	20

EQUIPOS EN OBRA: Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor.

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

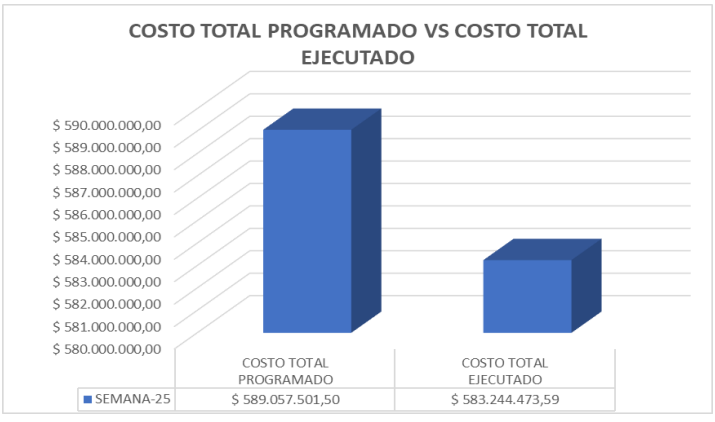

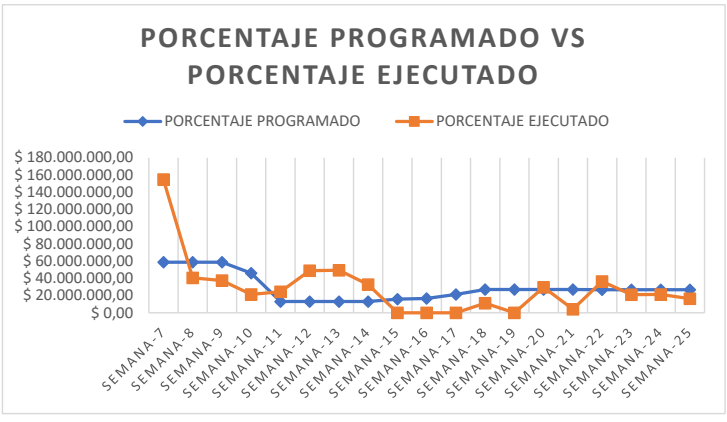

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total	AMORTIZACIÓN	%
ANTICIPO	**Entregado al contratista**	$ 305.869.421,00		
1	**Del 6 de jun al 31 de jul**	**$ 187.656.630,00**	**$ 30.080.000,00**	10
2	Agosto	**$ 155.033.486,00**	$ 50.000.000,00	16
3	Septiembre	**$ 79.168.872,00**	$ 25.789.421,00	33
4			$ 200.000.000,00	41
5				
TOTAL ACUMULADO		$ 421.858.988,00	$ 305.869.421,00	

Valor Total Contrato Obra
$ 1.947.574.911,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 421.858.988,00
% Avance facturado Acumulado
21,66%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento por un porcentaje equivalente al 21,66%. Equivalente a $ 421.858.988,00 millones de pesos.

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	**jun-24**	$ 27.938.995,00
2	**jul-24**	$ 56.131.974,00
3	**ago-24**	$ 52.372.325,00
4	**sep-24**	$ 27.437.238,00
5		
6		
TOTAL ACUMULADO		$ 163.880.532,00

Valor Total Contrato Obra
$ 838.169.861,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 163.880.532,00
% Avance facturado Acumulado
19,55%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de interventoría presenta un avance financiero equivalente a 19,55 %.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

BOMBEROS



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de humedades, estuco y pintura de los muros en el área del gimnasio de bomberos
1	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de humedades, estuco y pintura de los muros en el área del gimnasio de bomberos
2	



No. FOTO	La interventoría verifica los mantenimiento de humedades, estuco y pintura de los muros en el área del gimnasio de bomberos
3	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

BOMBEROS



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de humedades, estuco y pintura de los muros en el área del gimnasio de bomberos
4	



No. FOTO	La interventoría verifica los mantenimiento de humedades, estuco y pintura de los muros en el área del gimnasio de bomberos
5	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de humedades, estuco y pintura de los muros en el área del gimnasio de bomberos
6	


BOMBEROS



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de humedades, estuco y pintura de los muros en el área de la lavanderia
7	



No. FOTO	La interventoría verifica los mantenimiento de humedades, estuco y pintura de los muros en el área de la lavanderia
8	

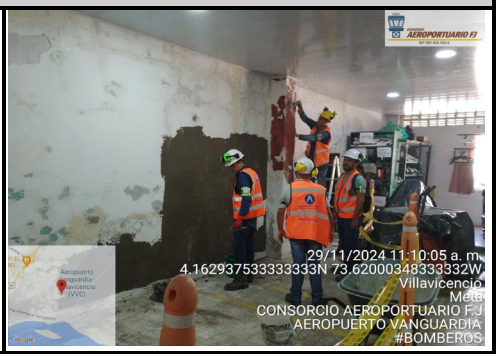

No. FOTO	La interventoría verifica los mantenimiento de humedades, estuco y pintura de los muros en el área de la lavanderia
9	

BOMBEROS



No. FOTO	Mantenimiento de orificios en el cielo raso del área del gimnasio en bomberos
10	



No. FOTO	Mantenimiento de orificios en el cielo raso del área del gimnasio en bomberos
11	



No. FOTO	Mantenimiento de orificios en el cielo raso del área del gimnasio en bomberos
12	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

FOSO DEL ASCENSOR DE ACCESO A SALA DE ABORDAJE No.2



No. FOTO	Se realiza la demolición y adecuación del foso del ascensor de acceso a la sala de abordaje No.2
13	



No. FOTO	Se realiza la demolición y adecuación del foso del ascensor de acceso a la sala de abordaje No.2
14	



No. FOTO	Se realiza la demolición y adecuación del foso del ascensor de acceso a la sala de abordaje No.2
15	

FOSO DEL ASCENSOR DE ACCESO A SALA DE ABORDAJE No.2



No. FOTO	Se realiza la demolición y adecuación del foso del ascensor de acceso a la sala de abordaje No.2
16	



No. FOTO	Se realiza la demolición y adecuación del foso del ascensor de acceso a la sala de abordaje No.2
17	



No. FOTO	Se realiza la demolición y adecuación del foso del ascensor de acceso a la sala de abordaje No.2
18	

FOSO DEL ASCENSOR DE LA SALA DE ABORDAJE No.1



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento y adecuación del foso del ascensor de la sala de abordaje No.1
19	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento y adecuación del foso del ascensor de la sala de abordaje No.1
20	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento y adecuación del foso del ascensor de la sala de abordaje No.1
21	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

SALÓN PRINCIPAL

		
No. FOTO 22	**Retiro de pendón y mantenimiento de pintura de muro**	**No. FOTO** 23	**Retiro de pendón y mantenimiento de pintura de muro**	**No. FOTO** 24	**Retiro de pendón y mantenimiento de pintura de muro**

MANTENIMIENTO DE LA CUADRILLA ELÉCTRICA


		
No. FOTO 25	**Se realiza desmonte de la estructura de aires acondicionados en la sala de abordaje No.2**	**No. FOTO** 26	**Se realiza desmonte de la estructura de aires acondicionados en la sala de abordaje No.2**	**No. FOTO** 27	**Se realiza desmonte de la estructura de aires acondicionados en la sala de abordaje No.2**

MANTENIMIENTO DE LA CUADRILLA ELÉCTRICA

		
No. FOTO 28	**Se realiza la entrega de los elemnetos desmontados al area de almacen del aeropuerto vanguardia**	**No. FOTO** 29	**Se realiza el mantenimiento de luminarias fundidas en las oficinas del SAR**	**No. FOTO** 30	**En las oficinas del SAR se realiza el cambio de 1 panel LED de 18 watts**

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

OTRAS ACTIVIDADES

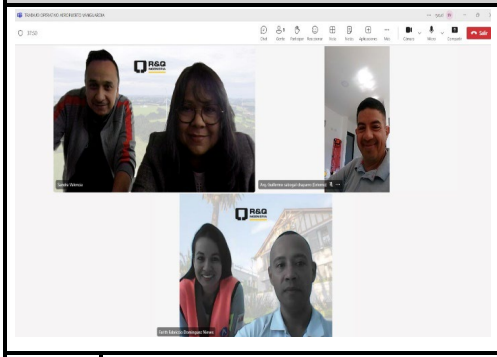

No. FOTO	
31	Se realiza Comité interno de interventoría



No. FOTO	
32	Atención de solicitud de daño en aire acondicionado de la sala de abordaje No.3



No. FOTO	
33	No se realiza atención a la solicitud de daño de vidrios en las oficinas de la dirección regional, la interventoria informa por comunicado 29-11-2024 - CO-FJ-1280-260-2024 - VILLAVICENCIO - RESPUESTA A COMUNICADO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE VIDRIOS EN EL ÁREA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL)

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE



No. FOTO	
34	Realización pausas activas




No. FOTO	
35	Inspección del uso de elementos de protección individual



No. FOTO	
36	Verificación de delimitación y señalización de áreas intervenidas

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

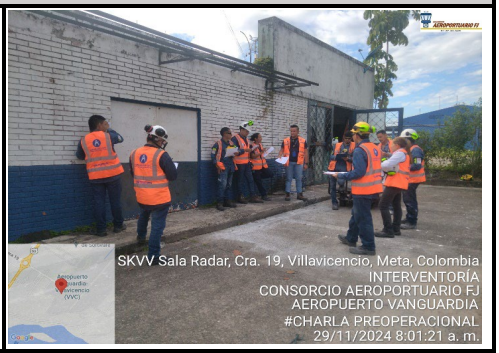					
No. FOTO	**Inspección acopio temporal de residuos; de construcción y demolición y los peligrosos**	**No. FOTO**	**Participación en la realización de ejercicios de calistenia antes de inicio de actividades**	**No. FOTO**	**Participación en las charlas de seguridad**
37		**38**		**39**	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Dos	(02)	días del mes de	Diciembre	de	2024
(Día en letras)	(Día en Números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

Sandra Yonaira Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

PRESUPUESTO CON MAYORES Y MENORES

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CAT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						+	-		
	1			**MAMPOSTERIA**								
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	$ 38.916,00	$ 2.334.960,00	0	-20	$ 40,00	$1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	$ 30.706,00	$ 1.842.360,00	0	0	$ 60,00	$1.842.360,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	$ 26.258,00	$ 3.938.700,00	0	0	$ 150,00	$3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	$ 38.490,00	$ 76.306.425,00	0	0	$ 1.982,50	$76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	$ 29.591,00	$ 29.324.681,00	0	0	$ 991,00	$29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	$ 15.640,00	$ 37.536.000,00	0	0	$ 2.400,00	$37.536.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	$ 66.017,00	$ 3.895.003,00	0		$ 59,00	$3.895.003,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	$ 33.550,00	$ 1.342.000,00	0		$ 40,00	$1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	$ 1.841,00	$ 736.400,00	0	0	$ 400,00	$736.400,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	$ 27.292,00	$ 42.657.298,00	0	0	$ 1.563,00	$42.657.297,75
Subtotal								**$ 199.913.827,00**				**$ 199.135.506,75**
	2			**PISOS**								
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	$ 20.128,00	$ 14.089.600,00	0	-300	$ 400,00	$8.051.200,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	$ 86.865,00	$ 9.989.475,00	0		$ 115,00	$9.989.475,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO)	M2	38,00	$ 175.568,00	$ 6.671.584,00	0	-37	$ 1,00	$175.568,00
Subtotal								**$ 30.750.659,00**				**$ 18.216.243,00**
	3			**CUBIERTA Y CIELORASO**							$ -	
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO;NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	$ 480.205,00	$ 11.524.920,00	0	0	$ 24,00	$11.524.920,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	$ 89.881,00	$ 44.041.690,00	0	0	$ 490,00	$44.041.690,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	$ 140.472,00	$ 68.831.280,00	0	-300	$ 190,00	$26.689.680,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR .10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	$ 89.781,00	$ 33.039.408,00	0		$ 368,00	$33.039.408,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	$ 28.249,00	$ 2.824.900,00	0	0	$ 100,00	$2.824.900,00
Subtotal								**$ 160.262.198,00**				**$ 118.120.598,00**
	4			**CARPINTERIA METÁLICA**								
19	4.1		4.1	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	$ 451.209,00	$ 2.256.045,00	0		$ 5,00	$2.256.045,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSINAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	$ 17.857,00	$ 5.357.100,00	200	0	$ 500,00	$8.928.500,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	$ 22.736,00	$ 4.547.200,00	0	0	$ 200,00	$4.547.200,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACREO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	$ 83.129,00	$ 6.816.578,00	0	0	$ 82,00	$6.816.578,00
Subtotal								**$ 18.976.923,00**				**$ 22.548.323,00**
	5			**CARPINTERIA MADERA**								
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	$ 476.557,00	$ 3.335.899,00		-5	$ 2,00	$953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	$ 12.995,00	$ 2.011.626,00	0		$ 154,80	$2.011.626,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	$ 38.231,00	$ 2.959.079,00	0		$ 77,40	$2.959.079,40
Subtotal								**$ 8.306.604,00**				**$ 5.923.819,40**
	6			**CRISTALERIA**								
26	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/0 PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	$ 289.652,00	$ 14.482.600,00		-30	$ 20,00	$5.793.040,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	$ 84.356,00	$ 4.217.800,00		-50	$ -	$0,00
Subtotal								**$ 18.700.400,00**				**$ 5.793.040,00**
	7			**CANALETAS Y PORTACABLES**								
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	$ 61.879,00	$ 30.939.500,00		250	$ 750,00	$46.409.250,00
Subtotal								**$ 30.939.500,00**				**$ 46.409.250,00**

PRESUPUESTO CON MAYORES Y MENORES

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la

	8			**LIMPIEZA PROFUNDA**									
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	$ 9.054,00	$ 82.391.400,00	0		$ 9.100,00	$82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	$ 14.260,00	$ 87.342.500,00	0		$ 6.125,00	$87.342.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	$ 7.870,00	$ 11.805.000,00	0		$ 1.500,00	$11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	$ 627.943,00	$ 100.470.880,00	0		$ 160,00	$100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	$ 30.741,00	$ 293.365.667,00		-1000	$ 8.543,14	$262.624.666,74
Subtotal								**$ 575.375.447,00**				**$ 544.634.446,74**
	9			**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**								
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 61.126.435,00	$ 61.126.435,00	0		$ 1,00	$61.126.435,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	$ 22.193.560,00	$ 22.193.560,00	0		$ 1,00	$22.193.560,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 72.618.205,00	$ 72.618.205,00	0		$ 1,00	$72.618.205,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	$ 589.218,00	$ 14.141.232,00	0	-24	$ -	$0,00
Subtotal								**$ 170.079.432,00**				**$ 155.938.200,00**
	10			**MANO DE OBRA**								
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	$ 11.766.194,00	$ 352.985.820,00	0	0	$ 30,00	$352.985.820,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	$ 39.080,00	$ 18.758.400,00	200	0	$ 680,00	$26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	$ 36.074,00	$ 25.973.280,00	200	0	$ 920,00	$33.188.080,00
	SUBTOTAL				SUBTOTAL			**$ 397.717.500,00**				**$ 412.748.300,00**
							SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO	**$ 1.611.022.490,00**				**$ 1.529.467.726,89**

				IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 11.956.808,00			$ 0,19	$ 11.351.518,00
				SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)				**$ 1.622.979.298,00**				**$ 1.540.819.244,89**
	11			**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**								
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	$ 324.595.613,00	$ 324.595.613,00				$ 406.755.666,11
							TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**$ 324.595.613,00**				$ 406.755.666,11
				VALOR TOTAL				**$ 1.947.574.911,00**				**$ 1.947.574.911,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	3%
NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.	**UTILIDAD**	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	28%

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24/11/2024 **Y EL** 30/11/2024 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING.JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO / FECHA	OCTUBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																													NOVIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
GUILLERMO SABOGAL CHAPARRO	86.062.565	RESIDENTE DE APOYO INTERVENTORIA																												1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVETORIA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**0**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**0**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24/11/2024 **Y EL** 30/11/2024 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

| FECHA | | OCTUBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO | | |

			COSTO PROGRAMADO					EJECUTADO			
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL		COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	0%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 45.812.826,61	2,35%		$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 104.547.219,71	5,37%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 187.656.630,00	9,64%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 163.281.612,81	8,38%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 228.308.146,00	11,72%	$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	$ 222.016.005,91	11,40%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 265.699.525,00	13,64%	$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	$ 267.981.357,99	13,76%	$ 45.965.352,08	2,36%		$ 287.156.607,00	14,74%	$ 21.457.082,00	1,10%
11	S-11	25/08/2024	$ 281.112.033,16	14,43%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 311.702.916,00	16,00%	$ 24.546.309,00	1,26%
12	S-12	1/09/2024	$ 294.242.708,33	15,11%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 360.592.928,00	18,51%	$ 48.890.012,00	2,51%
13	S-13	8/09/2024	$ 307.373.383,50	15,78%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 410.140.963,98	21,06%	$ 49.548.035,98	2,54%
14	S-14	15/09/2024	$ 320.504.058,67	16,46%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 442.926.984,98	22,74%	$ 32.786.021,00	1,68%
15	S-15	22/09/2024	$ 336.339.384,58	17,27%	$ 15.835.325,91	0,81%		$ 442.926.984,98	22,74%	$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	$ 352.937.560,70	18,12%	$ 16.598.176,12	0,85%		$ 442.926.984,98	22,74%	$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	$ 374.247.028,83	19,22%	$ 21.309.468,13	1,09%		$ 442.926.984,98	22,74%	$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	$ 401.170.505,98	20,60%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 454.131.652,98	23,32%	$ 11.204.668,00	0,58%
19	S-19	20/10/2024	$ 428.093.983,13	21,98%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 454.131.652,98	23,32%	$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	$ 455.017.460,28	23,36%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 483.789.118,28	24,84%	$ 29.657.465,30	1,52%
21	S-21	3/11/2024	$ 481.940.937,43	24,75%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 487.894.509,28	25,05%	$ 4.105.391,00	0,21%
22	S-22	10/11/2024	$ 508.770.878,31	26,12%	$ 26.829.940,88	1,38%		$ 524.419.295,68	26,93%	$ 36.524.786,40	1,88%
23	S-23	17/11/2024	$ 535.533.086,04	27,50%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 545.556.406,80	28,01%	$ 21.137.111,12	1,09%
24	S-24	24/11/2024	$ 562.295.293,77	28,87%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 566.896.970,71	29,11%	$ 21.340.563,91	1,10%
25	S-25	1/12/2024	$ 589.057.501,50	30,25%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 583.244.473,59	29,95%	$ 16.347.502,88	0,84%
26	S-26	8/12/2024	$ 613.961.736,22	31,52%	$ 24.904.234,72	1,28%					
27	S-27	15/12/2024	$ 634.212.216,92	32,56%	$ 20.250.480,70	1,04%					
28	S-28	22/12/2024	$ 650.072.944,39	33,38%	$ 15.860.727,47	0,81%					
29	S-29	29/12/2024	$ 663.682.314,47	34,08%	$ 13.609.370,08	0,70%					
30	S-30	5/01/2025	$ 673.618.417,22	34,59%	$ 9.936.102,75	0,51%					
31	S-31	12/01/2025	$ 683.554.519,97	35,10%	$ 9.936.102,75	0,51%					
32	S-32	19/01/2025	$ 693.490.622,72	35,61%	$ 9.936.102,75	0,51%					
33	S-33	26/01/2025	$ 703.766.316,78	36,14%	$ 10.275.694,06	0,53%					
34	S-34	2/02/2025	$ 714.137.793,00	36,67%	$ 10.371.476,22	0,53%					
35	S-35	9/02/2025	$ 724.265.806,04	37,19%	$ 10.128.013,04	0,52%					
36	S-36	16/02/2025	$ 731.593.992,49	37,56%	$ 7.328.186,45	0,38%					
37	S-37	23/02/2025	$ 738.922.178,94	37,94%	$ 7.328.186,45	0,38%					
38	S-38	2/03/2025	$ 757.980.970,75	38,92%	$ 19.058.791,81	0,98%					
39	S-39	9/03/2025	$ 796.179.171,30	40,88%	$ 38.198.200,55	1,96%					
40	S-40	16/03/2025	$ 835.853.763,56	42,92%	$ 39.674.592,26	2,04%					
41	S-41	23/03/2025	$ 876.597.467,07	45,01%	$ 40.743.703,51	2,09%					
42	S-42	30/03/2025	$ 917.341.170,58	47,10%	$ 40.743.703,51	2,09%					
43	S-43	6/04/2025	$ 931.369.380,59	47,82%	$ 14.028.210,01	0,72%					
44	S-44	13/04/2025	$ 941.787.649,20	48,36%	$ 10.418.268,61	0,53%					
45	S-45	20/04/2025	$ 952.206.592,93	48,89%	$ 10.418.943,73	0,53%					
46	S-46	27/04/2025	$ 962.842.934,88	49,44%	$ 10.636.341,95	0,55%					
47	S-47	4/05/2025	$ 972.624.266,23	49,94%	$ 9.781.331,35	0,50%					
48	S-48	11/05/2025	$ 980.098.488,48	50,32%	$ 7.474.222,25	0,38%					
49	S-49	18/05/2025	$ 994.922.494,90	51,09%	$ 14.824.006,42	0,76%					
50	S-50	25/05/2025	$ 1.015.068.758,81	52,12%	$ 20.146.263,91	1,03%					
51	S-51	1/06/2025	$ 1.035.215.022,72	53,15%	$ 20.146.263,91	1,03%					
52	S-52	8/06/2025	$ 1.055.361.286,63	54,19%	$ 20.146.263,91	1,03%					
53	S-53	15/06/2025	$ 1.075.507.550,54	55,22%	$ 20.146.263,91	1,03%					
54	S-54	22/06/2025	$ 1.095.383.369,94	56,24%	$ 19.875.819,40	1,02%					
55	S-55	29/06/2025	$ 1.114.027.164,38	57,20%	$ 18.643.794,44	0,96%					
56	S-56	6/07/2025	$ 1.132.670.958,82	58,16%	$ 18.643.794,44	0,96%					
57	S-57	13/07/2025	$ 1.151.314.753,26	59,12%	$ 18.643.794,44	0,96%					
58	S-58	20/07/2025	$ 1.171.281.482,43	60,14%	$ 19.966.729,17	1,03%					
59	S-59	27/07/2025	$ 1.192.206.198,82	61,21%	$ 20.924.716,39	1,07%					
60	S-60	3/08/2025	$ 1.209.634.483,11	62,11%	$ 17.428.284,29	0,89%					
61	S-61	10/08/2025	$ 1.226.076.594,25	62,95%	$ 16.442.111,14	0,84%					
62	S-62	17/08/2025	$ 1.233.714.313,88	63,35%	$ 7.637.719,63	0,39%					
63	S-63	24/08/2025	$ 1.241.172.352,05	63,73%	$ 7.458.038,17	0,38%					
64	S-64	31/08/2025	$ 1.248.365.634,36	64,10%	$ 7.193.282,31	0,37%					
65	S-65	7/09/2025	$ 1.254.878.115,87	64,43%	$ 6.512.481,51	0,33%					
66	S-66	14/09/2025	$ 1.261.390.597,38	64,77%	$ 6.512.481,51	0,33%					
67	S-67	21/09/2025	$ 1.267.733.439,63	65,09%	$ 6.342.842,25	0,33%					
68	S-68	28/09/2025	$ 1.273.953.439,66	65,41%	$ 6.220.000,03	0,32%					
69	S-69	5/10/2025	$ 1.280.173.439,69	65,73%	$ 6.220.000,03	0,32%					
70	S-70	12/10/2025	$ 1.286.393.439,72	66,05%	$ 6.220.000,03	0,32%					

71	S-71	19/10/2025	$ 1.325.893.877,29	68,08%	$ 39.500.437,57	2,03%					
72	S-72	26/10/2025	$ 1.366.073.507,47	70,14%	$ 40.179.630,18	2,06%					
73	S-73	2/11/2025	$ 1.406.253.137,65	72,21%	$ 40.179.630,18	2,06%					
74	S-74	9/11/2025	$ 1.446.432.767,83	74,27%	$ 40.179.630,18	2,06%					
75	S-75	16/11/2025	$ 1.473.252.146,74	75,65%	$ 26.819.378,91	1,38%					
76	S-76	23/11/2025	$ 1.485.874.113,84	76,29%	$ 12.621.967,10	0,65%					
77	S-77	30/11/2025	$ 1.498.696.083,31	76,95%	$ 12.821.969,47	0,66%					
78	S-78	7/12/2025	$ 1.511.518.052,78	77,61%	$ 12.821.969,47	0,66%					
79	S-79	14/12/2025	$ 1.524.340.022,25	78,27%	$ 12.821.969,47	0,66%					
80	S-80	21/12/2025	$ 1.533.088.604,89	78,72%	$ 8.748.582,64	0,45%					
81	S-81	28/12/2025	$ 1.541.349.091,56	79,14%	$ 8.260.486,67	0,42%					
82	S-82	4/01/2026	$ 1.547.764.734,78	79,47%	$ 6.415.643,22	0,33%					
83	S-83	11/01/2026	$ 1.554.180.378,00	79,80%	$ 6.415.643,22	0,33%					
84	S-84	18/01/2026	$ 1.561.147.319,89	80,16%	$ 6.966.941,89	0,36%					
85	S-85	25/01/2026	$ 1.569.039.773,60	80,56%	$ 7.892.453,71	0,41%					
86	S-86	1/02/2026	$ 1.577.169.941,22	80,98%	$ 8.130.167,62	0,42%					
87	S-87	8/02/2026	$ 1.585.066.137,73	81,39%	$ 7.896.196,51	0,41%					
88	S-88	15/02/2026	$ 1.592.896.342,39	81,79%	$ 7.830.204,66	0,40%					
89	S-89	22/02/2026	$ 1.600.740.077,38	82,19%	$ 7.843.734,99	0,40%					
90	S-90	1/03/2026	$ 1.608.739.411,11	82,60%	$ 7.999.333,73	0,41%					
91	S-91	8/03/2026	$ 1.616.532.746,82	83,00%	$ 7.793.335,71	0,40%					
92	S-92	15/03/2026	$ 1.625.499.763,32	83,46%	$ 8.967.016,50	0,46%					
93	S-93	22/03/2026	$ 1.637.498.649,21	84,08%	$ 11.998.885,89	0,62%					
94	S-94	29/03/2026	$ 1.649.771.243,75	84,71%	$ 12.272.594,54	0,63%					
95	S-95	5/04/2026	$ 1.664.573.433,63	85,47%	$ 14.802.189,88	0,76%					
96	S-96	12/04/2026	$ 1.680.566.021,32	86,29%	$ 15.992.587,69	0,82%					
97	S-97	19/04/2026	$ 1.696.558.609,01	87,11%	$ 15.992.587,69	0,82%					
98	S-98	26/04/2026	$ 1.704.432.501,33	87,52%	$ 7.873.892,32	0,40%					
99	S-99	3/05/2026	$ 1.712.140.705,99	87,91%	$ 7.708.204,66	0,40%					
100	S-100	10/05/2026	$ 1.721.817.914,73	88,41%	$ 9.677.208,74	0,50%					
101	S-101	17/05/2026	$ 1.736.558.276,80	89,17%	$ 14.740.362,07	0,76%					
102	S-102	24/05/2026	$ 1.751.298.638,87	89,92%	$ 14.740.362,07	0,76%					
103	S-103	31/05/2026	$ 1.766.039.000,94	90,68%	$ 14.740.362,07	0,76%					
104	S-104	7/06/2026	$ 1.774.935.235,23	91,14%	$ 8.896.234,29	0,46%					
105	S-105	14/06/2026	$ 1.781.081.291,74	91,45%	$ 6.146.056,51	0,32%					
106	S-106	21/06/2026	$ 1.787.227.348,25	91,77%	$ 6.146.056,51	0,32%					
107	S-107	28/06/2026	$ 1.793.373.404,76	92,08%	$ 6.146.056,51	0,32%					
108	S-108	5/07/2026	$ 1.799.519.461,27	92,40%	$ 6.146.056,51	0,32%					
109	S-109	12/07/2026	$ 1.805.665.517,78	92,71%	$ 6.146.056,51	0,32%					
110	S-110	19/07/2026	$ 1.811.811.574,29	93,03%	$ 6.146.056,51	0,32%					
111	S-111	26/07/2026	$ 1.817.957.630,80	93,34%	$ 6.146.056,51	0,32%					
112	S-112	2/08/2026	$ 1.824.103.687,31	93,66%	$ 6.146.056,51	0,32%					
113	S-113	9/08/2026	$ 1.830.249.743,82	93,98%	$ 6.146.056,51	0,32%					
114	S-114	16/08/2026	$ 1.836.395.800,33	94,29%	$ 6.146.056,51	0,32%					
115	S-115	23/08/2026	$ 1.842.541.856,84	94,61%	$ 6.146.056,51	0,32%					
116	S-116	30/08/2026	$ 1.848.687.913,35	94,92%	$ 6.146.056,51	0,32%					
117	S-117	6/09/2026	$ 1.854.833.969,86	95,24%	$ 6.146.056,51	0,32%					
118	S-118	13/09/2026	$ 1.860.980.026,37	95,55%	$ 6.146.056,51	0,32%					
119	S-119	20/09/2026	$ 1.867.126.082,88	95,87%	$ 6.146.056,51	0,32%					
120	S-120	27/09/2026	$ 1.873.272.139,39	96,18%	$ 6.146.056,51	0,32%					
121	S-121	4/10/2026	$ 1.879.089.924,30	96,48%	$ 5.817.784,91	0,30%					
122	S-122	11/10/2026	$ 1.884.669.995,30	96,77%	$ 5.580.071,00	0,29%					
123	S-123	18/10/2026	$ 1.890.250.066,30	97,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
124	S-124	25/10/2026	$ 1.895.830.137,30	97,34%	$ 5.580.071,00	0,29%					
125	S-125	1/11/2026	$ 1.901.410.208,30	97,63%	$ 5.580.071,00	0,29%					
126	S-126	8/11/2026	$ 1.906.990.279,30	97,92%	$ 5.580.071,00	0,29%					
127	S-127	15/11/2026	$ 1.912.570.350,30	98,20%	$ 5.580.071,00	0,29%					
128	S-128	22/11/2026	$ 1.918.150.421,30	98,49%	$ 5.580.071,00	0,29%					
129	S-129	29/11/2026	$ 1.923.730.492,30	98,78%	$ 5.580.071,00	0,29%					
130	S-130	6/12/2026	$ 1.929.310.563,30	99,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
131	S-131	13/12/2026	$ 1.934.890.634,30	99,35%	$ 5.580.071,00	0,29%					
132	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 12.684.276,30	0,65%					
					$ 1.947.574.910,60	100%					

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón Directora de Interventoría. **CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ**
