AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL**			**FECHA:**	11/12/2024
Semana No	**26**	**DEL :**	1-dic-24	**AL:**	7-dic-24
Plazo Total	**25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)**	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		176	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**22,39%**			
Nombre del Supervisor :	**Jorge Beltrán Gómez**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO VANGUARDIA, DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado
(%) Programado:	**1,28%**	**31,52%**
($) Valor programado:	**$ 24.904.234,72**	**$ 613.961.736,22**

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado:	**1,36%**	**31,61%**
($) Valor ejecutado:	**$ 26.486.050,00**	**$ 615.584.827,27**

Evaluación:	**Porcentaje Adelanto:**	**0,08%**
	Valor Adelanto:	**$ 1.623.091,05**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	**Contratista:**	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	**Contrato No:**	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	**Valor Inicial:**	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	**Plazo inicial:**	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS	**Plazo actualizado:**	25 MESES Y 25 DÍAS
Fecha de iniciación:	6-jun-24	**Fecha de iniciación:**	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	**Valor total actual del contrato:**	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

EL DÍA MIERCOLES 04-12-24 SE REALIZA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 25

"Actividades realizadas en obra del (01 al 07 de diciembre del 2024)

- **GRUPOS ELECTROGENOS:** Se realiza el mantenimiento del filtro del tanque de suministro de combustible de los grupos electrogenos.
- **BOMBEROS:** Se continua con los mantenimientos de humedades, estuco y pintura de muros, mantenimiento de filtraciones en la cubierta.
- **FOSO DE ASCENSOR SALA No.1 Y SALÓN PRINCIPAL:** Se continua con el mantenimiento de estuco y pintura del cerramiento del foso de los ascensores.
- **OFICINAS DE LAS AEROLINEAS:** Se realiza el mantenimiento de pintura de muros, mantenimiento de puertas y perfiles metálicos.
- **BAÑOS MIXTOS DEL PRIMER PISO:** Se realiza el mantenimiento del lavamanos en el baño para mujeres que se encontraba tapado.
- **SOLÓN PRINCIPAL:** Se realiza el mantenimiento de pintura del muro del salon principal donde se retiro el pendon y la estructura de soporte.

SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO

02/12/24 - OFICINAS DEL SAR: Solicitud de mantenimiento de tubería dañada y cableado eléctrico
03/12/24 - BAÑOS DE LLEGADA DE PASAJEROS: Solicitud de mantenimiento de los baños de la sala de llegada de pasajeros.
05/12/24 - PORTON ENTRADA VEHICULOS SAR: Solicitud de mantenimiento del portón principal del garaje de vehículos

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN	
PENDIENTES POR EJECUTAR	**ACTIVIDADES PENDIENTES EJECUTADAS EN LA SEMANA**
SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN • Pintura general parte interna de toda la oficina AIM • Mantenimiento de la cubierta en sanidad, oficina AIM, alfa 7. • Mantenimiento de cuarto de aseo para sanidad aeroportuaria • Mantenimiento de cámaras para el cuarto de equipos electrógenos **ALFA 8 Y ALFA 13** • Mantenimiento de los puntos de vigilancia de alfa 8 y alfa 13 **SALÓN PRINCIPAL DEL AEROPUERTO** • Mantenimiento y Limpieza de todos los vidrios del salón principal **CUBIERTA DE LA TERMINAL AÉREA** • Mantenimiento de pintura de las tejas de la cubierta de la terminal aérea.	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

*Se inician las actividades con la charla de seguridad y una sesión de calistenia por parte del contratista. Se verifica el acopio temporal de los residuos de construcción, demolición y peligrosos, constatándose que se encuentra desordenado. Se le solicita al contratista realizar la disposición final de los residuos. Además, se solicita por correo la documentación que debe contener el informe mensual de seguridad y salud en el trabajo, así como los reportes semanales pendientes de SST. Se informa también sobre la relación del personal que cuenta con el aval de la interventoría para realizar actividades en alturas. Finalmente, se le recuerda que aún no ha cumplido con la parte ambiental de la obligación contractual.

*Se inician las actividades con la participación en la charla sobre motivación laboral y la sesión de calistenia por parte del contratista. Se recomienda al contratista el cumplimiento estricto de las normas de seguridad en trabajos en alturas. Posteriormente, se realiza una ronda de seguridad y se verifica el área en la que se lleva a cabo el mantenimiento del ascensor interno. Se constata el cumplimiento de la delimitación y señalización del área, así como el uso adecuado de los elementos de protección contra caídas y los elementos de protección individual (EPI). Además, se realiza la revisión de las fichas ambientales proporcionadas por el contratista, y se le indica que debe atender las observaciones correspondientes para enviar la consolidación final a la Aerocivil.

*Se inician las actividades con una charla de seguridad y una sesión de calistenia por el contratista. Posteriormente, se lleva a cabo la reunión del comité de seguimiento de obra, en la cual se abordan puntos específicos relacionados con seguridad y salud en el trabajo (SST) y aspectos ambientales. En dicha reunión, se mencionó que se realizó la entrega de las fichas ambientales y sus respectivos soportes a la supervisión, y se destacó que fue aprobada la hoja de vida de la ingeniera especialista ambiental. Además, se informó que aún están pendientes los informes ambientales. Se continúa con la inspección en el área del ascensor interno, donde se están llevando a cabo actividades de mantenimiento en alturas. Durante la inspección, se solicita al contratista incluir una plataforma metálica adicional en los andamios para mejorar la seguridad en el desplazamiento, lo que permitirá realizar las actividades de manera más segura.

*Se inician las actividades con una charla de seguridad y una sesión de calistenia por parte del contratista. Posteriormente, se verifican las áreas en las que se realizan actividades de mantenimiento, constatando el orden y aseo de los espacios, así como el uso adecuado de los elementos de protección individual (EPI) y las condiciones de seguridad en el entorno de trabajo. Se lleva a cabo la revisión de los informes ambientales correspondientes al periodo del inicio del proyecto hasta noviembre, los cuales son remitidos a la Aerocivil como parte del cumplimiento contractual del proyecto. Asimismo, se revisan los reportes semanales de seguridad y salud en el trabajo (SST), constatando que se cumple con la información requerida.

*Se inician las actividades con una charla de seguridad y una sesión de calistenia, lideradas por el contratista, en la cual la interventoría también participa. A continuación, se realiza una ronda de inspección, verificando las condiciones de seguridad en el área de trabajo. Se solicita al contratista la entrega de la documentación necesaria para su revisión y control, tal como corresponde en relación con seguridad y salud en el trabajo (SST) y aspectos ambientales. Además, se participó en una actividad de bienestar organizada por Aerocivil, en la que se llevó a cabo un compartir y la rifa de una ancheta navideña entre el grupo FAO

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA	
FAO-CTO-23001163-203-2024	ENTREGA FORMULARIO NO1 PROPUESTA ECONÓMICA MAYORES Y MENORES PARA ADICIÓN Y ACTA NO3 DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA CON AUMENTO DE VALOR.
FAO-CTO-23001163-204-2024	ENTREGA DE INFORMES AMBIENTALES DE CONFORMIDAD

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA	
02-12-2024 - CO-FJ-1280-261-2024	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No25
03-12-2024 - CO-FJ-1280-258-2024	VILLAVICENCIO - ENTREGA DE FICHAS AMBIENTALES Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
05-12-2024 - CO-FJ-1280-262-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Baños de la sala de llegada de pasajeros)
05-12-2024 - CO-FJ-1280-263-2024	VILLAVICENCIO - ENTREGA ACTA NO.3 DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA CON AUMENTO DE VALOR.
05-12-2024 - CO-FJ-1280-264-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (SALÓN PRINCIPAL DEL TERMINAL AÉREO Y SALA DE ABORDAJE No.3)
05-12-2024 - CO-FJ-1280-265-2024	VILLAVICENCIO - ENTREGA DE INFORMES AMBIENTALES Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
09-12-2024 - CO-FJ-1280-266-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE ENVÍO DE SOPORTE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
10-12-2024 - CO-FJ-1280-267-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE CAMBIO DE INSPECTOR SISO
10-12-2024 - CO-FJ-1280-268-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Sala CCTV y sala de abordaje No.2)

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL DE OBRA

NOMBRE	CARGO	1	2	3	4	5	6	7
		D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
CARLOS ALBERTO AGUILAR YAYA	RESIDENTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
LUZ MARINA BLANCO PÉREZ	INSPECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
JHEYKSON BRAYAN LINARES PABÓN	INSPECTOR SST		1	1	1	1	1	1
JOSÉ EDGAR SALINAS MARTÍNEZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL							
JAVIER ANDRÉS VALENCIA CASTAÑEDA	TÉCNICO ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1
JORDI JESÚS GUEVARA RODRÍGUEZ	AYUDANTE ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1
CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ CASTILLO	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
REYNALDO GUZMÁN GIRALDO	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
JHON ALEJANDRO MONZÓN MEJÍA	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
ÁLVARO MACIAS PEÑA	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
JHOJAN ESTIBEN TOVAR CUESTA	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
LUISA FERNANDA RUIZ RIVEROS	OPERARIA DE ASEO		1	1	1	1	1	1
JENNY JULAIDY PERDOMO SÁNCHEZ	OPERARIA DE ASEO		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA			16	16	16	16	16	16


PERSONAL DE INTERVENTORÍA


NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	1	2	3	4	5	6	7
			D	L	M	M	J	V	S
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA		1	1	1	1	1	1
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
GUILLERMO SABOGAL CHAPARRO	86.062.565	RESIDENTE DE APOYO INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVETORIA		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA				4	4	4	4	4	4

DÍA	INTERVENTORÍA	OBRA	TOTAL
DOMÍNGO			
LUNES	4	17	21
MARTES	4	17	21
MIERCOLES	4	15	19
JUEVES	4	17	21
VIERNES	4	16	20
SÁBADO	4	16	20

EQUIPOS EN OBRA: Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor.

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

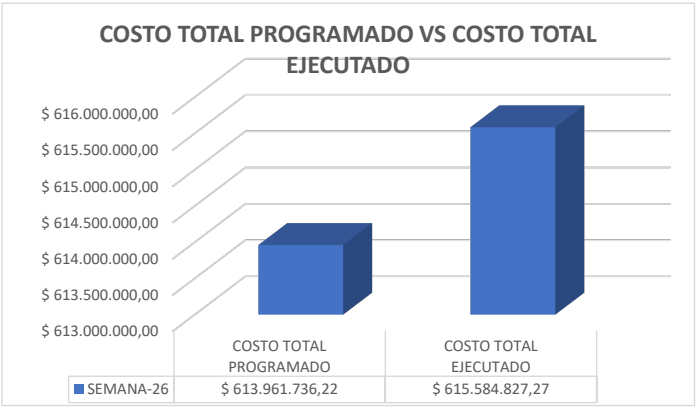

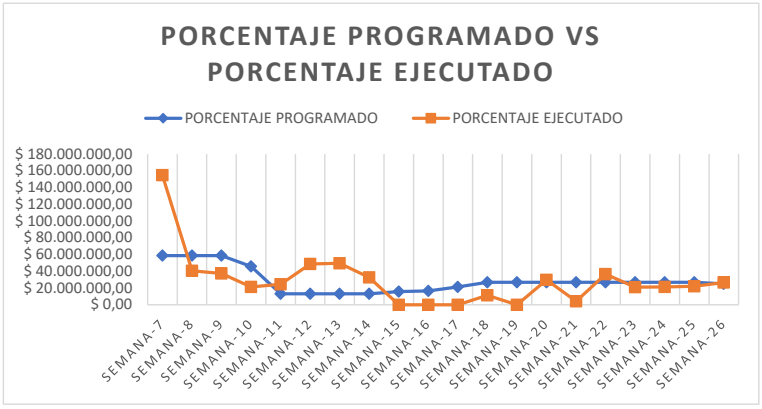

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total	AMORTIZACIÓN	%
ANTICIPO	**Entregado al contratista**	$ 305.869.421,00		
1	**Del 6 de jun al 31 de jul**	**$ 187.656.630,00**	**$ 30.080.000,00**	$ 16,03
2	Agosto	**$ 155.033.486,00**	$ 50.000.000,00	$ 32,25
3	Septiembre	**$ 79.168.872,00**	$ 25.789.421,00	$ 32,58
4	Octubre	**$ 70.812.433,70**	$ 35.000.000,00	$ 49,43
5	Noviembre			
TOTAL ACUMULADO		$ 421.858.988,00	$ 140.869.421,00	$ 33,39

Valor Total Contrato Obra
$ 1.947.574.911,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 421.858.988,00
% Avance facturado Acumulado
21,66%

NOTA: Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento por un porcentaje equivalente al 21,66%. Equivalente a $ 421.858.988,00 millones de pesos.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	jun-24	$ 27.938.995,00
2	jul-24	$ 56.131.974,00
3	ago-24	$ 52.372.325,00
4	sep-24	$ 27.437.238,00
5		
6		
TOTAL ACUMULADO		$ 163.880.532,00

Valor Total Contrato Obra
$ 838.169.861,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 163.880.532,00
% Avance facturado Acumulado
19,55%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de interventoría presenta un avance financiero equivalente a 19,55 %.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

TANQUE DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE



No. FOTO	Se realiza el reporte de fallas en el suministro de combustible a las plantas de los grupos electrógenos
1	



No. FOTO	Se realiza mantenimiento del filtro del tanque de almacenamiento de combustible de los grupos electrógenos
2	



No. FOTO	Cambio del filtro del tanque de suministro de combustible de los grupos electrógenos
3	

BOMBEROS



No. FOTO	Estado inicial de los muros de la zona de almacenamiento en la estación de Bomberos
4	



No. FOTO	Revisión de las actividades de mantenimiento de humedades, estuco y pintura de muros en la estación de bomberos
5	



No. FOTO	Mantenimiento de humedades, estuco y pintura de muros en la estación de bomberos
6	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

BOMBEROS



No. FOTO	Mantenimiento de humedades, estuco y pintura de muros en la estación de bomberos
7	



No. FOTO	Mantenimiento de humedades, estuco y pintura de muros en la estación de bomberos
8	



No. FOTO	Mediciones de las actividades de mantenimiento de humedades, estuco y pintura de muros en la estación de bomberos
9	

FOSO DEL ASCENSOR DEL SALÓN PRINCIPAL



No. FOTO	Se realiza el desmonte del cerramiento de la estructura del foso de ascensor en mal estado
10	



No. FOTO	Se realiza la instalacion de lamina superboard para el cerramiento perimetral del foso de los ascensores
11	



No. FOTO	Aplicación de estuco y pintura para el acabado final del cerramiento perimetral del foso del ascensor del salón principal
12	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

FOSO DEL ASCENSOR DE LA SALA DE ABORDAJE No.1



No. FOTO	Se realizo el desmonte del cerramiento en superboard del foso del ascensor de la sala de abordaje No.1
13	



No. FOTO	instalación del superboard para el cerramiento perimetral del foso del ascensor de la sala de abordaje No.1
14	



No. FOTO	Acabados finales de estuco y pintura para el mantenimiento del foso del ascensor de la sala de abordaje No.1
15	

SALÓN PRINCIPAL



No. FOTO	Estado inicial del muro en el salón principal del aeropuerto Vanguardia
16	



No. FOTO	Se realizo el retiro del pendon y la estructura existente
17	



No. FOTO	Acabado final, despues del desmonte y retiro del pendon y la estructura, mantenimiento de pintura.
18	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

OFICINAS DE LAS AEROLINEAS



No. FOTO	Estado inicial de las puertas de las oficinas de las aerolíneas
19	



No. FOTO	Se realiza la verificación del procedimiento del mantenimiento de los marcos y las puertas
20	



No. FOTO	Estado final del mantenimiento de pintura de marcos y puertas en las oficinas de las aerolíneas
21	

EVENTUALIDADES PRESENTADAS DURANTE LA SEMANA



No. FOTO	La interventoría y el contratista de obra a tienden la solicitud realizada por la administración del aeropuerto Vanguardia
22	



No. FOTO	Taponamiento del lavamanos del baño para damas
23	



No. FOTO	Mantenimiento de lavamanos realizado en el baño para damas
24	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

OTRAS ACTIVIDADES



No. FOTO	Visita a campo, atendiendo la solicitud de taponamiento de los baños de llegada de pasajeros
25	



No. FOTO	Visita a la torre de control, atendiendo la solicitud de mantenimiento de la chapa de la puerta
26	



No. FOTO	Visita a la sala de abordaje No.2, atendiendo la solicitud de daño de la mesa donde se realiza la inspección de las maletas
27	

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE



No. FOTO	Inspección punto ecológico
28	



No. FOTO	Inspección del uso de elementos de protección individual
29	



No. FOTO	Verificación de delimitación y señalización de áreas intervenidas
30	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

		
No. FOTO **31**	**Inspección acopio temporal de residuos; de construcción y demolición y los peligrosos**	**No. FOTO** **32**	**Participación en la realización de ejercicios de calistenia antes de inicio de actividades**	**No. FOTO** **33**	**Participación en las charlas de seguridad**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Once	(11)	días del mes de	Diciembre	de	2024
(Día en letras)	(Día en Números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

Sandra Yonaira Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

PRESUPUESTO CON MAYORES Y MENORES

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CAT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						+	-		
	1			**MAMPOSTERIA**								
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	$ 38.916,00	$ 2.334.960,00	0	-20	$ 40,00	$1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	$ 30.706,00	$ 1.842.360,00	0	0	$ 60,00	$1.842.360,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	$ 26.258,00	$ 3.938.700,00	0	0	$ 150,00	$3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	$ 38.490,00	$ 76.306.425,00	0	0	$ 1.982,50	$76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	$ 29.591,00	$ 29.324.681,00	0	0	$ 991,00	$29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	$ 15.640,00	$ 37.536.000,00	0	0	$ 2.400,00	$37.536.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	$ 66.017,00	$ 3.895.003,00	0		$ 59,00	$3.895.003,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	$ 33.550,00	$ 1.342.000,00	0		$ 40,00	$1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	$ 1.841,00	$ 736.400,00	0	0	$ 400,00	$736.400,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	$ 27.292,00	$ 42.657.298,00	0	0	$ 1.563,00	$42.657.297,75
Subtotal								**$ 199.913.827,00**				**$ 199.135.506,75**
	2			**PISOS**								
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	$ 20.128,00	$ 14.089.600,00	0	-300	$ 400,00	$8.051.200,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	$ 86.865,00	$ 9.989.475,00	0		$ 115,00	$9.989.475,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO)	M2	38,00	$ 175.568,00	$ 6.671.584,00	0	-37	$ 1,00	$175.568,00
Subtotal								**$ 30.750.659,00**				**$ 18.216.243,00**
	3			**CUBIERTA Y CIELORASO**							$ -	
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO;NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	$ 480.205,00	$ 11.524.920,00	0	0	$ 24,00	$11.524.920,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	$ 89.881,00	$ 44.041.690,00	0	0	$ 490,00	$44.041.690,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	$ 140.472,00	$ 68.831.280,00	0	-300	$ 190,00	$26.689.680,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	$ 89.781,00	$ 33.039.408,00	0		$ 368,00	$33.039.408,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	$ 28.249,00	$ 2.824.900,00	0	0	$ 100,00	$2.824.900,00
Subtotal								**$ 160.262.198,00**				**$ 118.120.598,00**
	4			**CARPINTERIA METÁLICA**								
19	4.1		4.1	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	$ 451.209,00	$ 2.256.045,00	0		$ 5,00	$2.256.045,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSINAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	$ 17.857,00	$ 5.357.100,00	200	0	$ 500,00	$8.928.500,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	$ 22.736,00	$ 4.547.200,00	0	0	$ 200,00	$4.547.200,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACREO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	$ 83.129,00	$ 6.816.578,00	0	0	$ 82,00	$6.816.578,00
Subtotal								**$ 18.976.923,00**				**$ 22.548.323,00**
	5			**CARPINTERIA MADERA**								
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	$ 476.557,00	$ 3.335.899,00		-5	$ 2,00	$953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	$ 12.995,00	$ 2.011.626,00	0		$ 154,80	$2.011.626,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	$ 38.231,00	$ 2.959.079,00	0		$ 77,40	$2.959.079,40
Subtotal								**$ 8.306.604,00**				**$ 5.923.819,40**
	6			**CRISTALERIA**								
26	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	$ 289.652,00	$ 14.482.600,00		-30	$ 20,00	$5.793.040,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	$ 84.356,00	$ 4.217.800,00		-50	$ -	$0,00
Subtotal								**$ 18.700.400,00**				**$ 5.793.040,00**
	7			**CANALETAS Y PORTACABLES**								
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	$ 61.879,00	$ 30.939.500,00		250	$ 750,00	$46.409.250,00
Subtotal								**$ 30.939.500,00**				**$ 46.409.250,00**
	8			**LIMPIEZA PROFUNDA**								
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	$ 9.054,00	$ 82.391.400,00	0		$ 9.100,00	$82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	$ 14.260,00	$ 87.342.500,00	0		$ 6.125,00	$87.342.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	$ 7.870,00	$ 11.805.000,00	0		$ 1.500,00	$11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	$ 627.943,00	$ 100.470.880,00	0		$ 160,00	$100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	$ 30.741,00	$ 293.365.667,00		-1000	$ 8.543,14	$262.624.666,74
Subtotal								**$ 575.375.447,00**				**$ 544.634.446,74**
	9			**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**								
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 61.126.435,00	$ 61.126.435,00	0		$ 1,00	$61.126.435,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	$ 22.193.560,00	$ 22.193.560,00	0		$ 1,00	$22.193.560,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 72.618.205,00	$ 72.618.205,00	0		$ 1,00	$72.618.205,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	$ 589.218,00	$ 14.141.232,00	0	-24	$ -	$0,00
Subtotal								**$ 170.079.432,00**				**$ 155.938.200,00**
	10			**MANO DE OBRA**								
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	$ 11.766.194,00	$ 352.985.820,00	0	0	$ 30,00	$352.985.820,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	$ 39.080,00	$ 18.758.400,00	200	0	$ 680,00	$26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	$ 36.074,00	$ 25.973.280,00	200	0	$ 920,00	$33.188.080,00
	SUBTOTAL				SUBTOTAL			**$ 397.717.500,00**				**$ 412.748.300,00**
								SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO	**$ 1.611.022.490,00**				**$ 1.529.467.726,89**
							IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 11.956.808,00		$ 0,19	$ 11.351.518,00
							SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)		**$ 1.622.979.298,00**			**$ 1.540.819.244,89**
	11			**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**								
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	$ 324.595.613,00	$ 324.595.613,00				$ 406.755.666,11
							TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE		**$ 324.595.613,00**				$ 406.755.666,11
							VALOR TOTAL		**$ 1.947.574.911,00**				**$ 1.947.574.911,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	3%
NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.	**UTILIDAD**	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	28%

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	**MINISTERIO DE TRANSPORTE** **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL** **CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA**	VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/12/2024 **Y EL** 7/12/2024 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING.JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA / CARGO	NOVIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																														DICIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																												
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																												
GUILLERMO SABOGAL CHAPARRO	86.062.565	RESIDENTE DE APOYO INTERVENTORIA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																												
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVETORIA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																												
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			4	4	0	0	4	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/12/2024 **Y EL** 7/12/2024 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

FECHA

NOVIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
NOMBRE	**CARGO**	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1
CARLOS ALBERTO AGUILAR YAYA	RESIDENTE DE OBRA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA																				1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
LUZ MARINA BLANCO PÉREZ	INSPECTOR DE OBRA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
JHEYKSON BRAYAN LINARES PABÓN	INSPECTOR SST	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
JOSÉ EDGAR SALINAS MARTÍNEZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL																														
JAVIER ANDRÉS VALENCIA CASTAÑEDA	TÉCNICO ELÉCTRICO	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
JORDI JESÚS GUEVARA RODRÍGUEZ	AYUDANTE ELÉCTRICO	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1
CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ CASTILLO	OFICIAL DE OBRA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1			
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
REYNALDO GUZMÁN GIRALDO	OFICIAL DE OBRA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA	OFICIAL DE OBRA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
JHON ALEJANDRO MONZÓN MEJÍA	OFICIAL DE OBRA																												1	1	1
ÁLVARO MACIAS PEÑA	AYUDANTE DE OBRA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
JHOJAN ESTIBEN TOVAR CUESTA	AYUDANTE DE OBRA																									1	1	1	1	1	1
LUISA FERNANDA RUIZ RIVEROS	OPERARIA DE ASEO	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
JENNY JULAIDY PERDOMO SÁNCHEZ	OPERARIA DE ASEO	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		13	13	0	0	13	13	13	13	13	0	0	13	13	13	13	13	0	13	13	14	14	14	14	0	15	15	14	16	15	15

DICIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA		1	1	1	1	1	1																								
CARLOS ALBERTO AGUILAR YAYA		1	1	1	1	1	1																								
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ		1	1	1	1	1	1																								
LUZ MARINA BLANCO PÉREZ		1	1	1	1	1	1																								
JHEYKSON BRAYAN LINARES PABÓN		1	1	1	1	1	1																								
JOSÉ EDGAR SALINAS MARTÍNEZ																															
JAVIER ANDRÉS VALENCIA CASTAÑEDA		1	1	1	1	1	1																								
JORDI JESÚS GUEVARA RODRÍGUEZ		1	1	1	1	1	1																								
CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ CASTILLO		1	1	1	1	1																									
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES		1	1	1	1	1	1																								
REYNALDO GUZMÁN GIRALDO		1	1	1	1	1	1																								
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA		1	1	1	1	1	1																								
JHON ALEJANDRO MONZÓN MEJÍA		1	1	1	1	1	1																								
ÁLVARO MACIAS PEÑA		1	1	1	1	1	1																								
JHOJAN ESTIBEN TOVAR CUESTA		1	1	1	1	1	1																								
LUISA FERNANDA RUIZ RIVEROS		1	1	1	1	1	1																								
JENNY JULAIDY PERDOMO SÁNCHEZ		1	1	1	1	1	1																								
	0	16	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

			COSTO PROGRAMADO					EJECUTADO			
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL		COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	0%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 45.812.826,61	2,35%		$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 104.547.219,71	5,37%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 187.656.630,00	9,64%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 163.281.612,81	8,38%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 228.308.146,00	11,72%	$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	$ 222.016.005,91	11,40%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 265.699.525,00	13,64%	$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	$ 267.981.357,99	13,76%	$ 45.965.352,08	2,36%		$ 287.156.607,00	14,74%	$ 21.457.082,00	1,10%
11	S-11	25/08/2024	$ 281.112.033,16	14,43%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 311.702.916,00	16,00%	$ 24.546.309,00	1,26%
12	S-12	1/09/2024	$ 294.242.708,33	15,11%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 360.592.928,00	18,51%	$ 48.890.012,00	2,51%
13	S-13	8/09/2024	$ 307.373.383,50	15,78%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 410.140.963,98	21,06%	$ 49.548.035,98	2,54%
14	S-14	15/09/2024	$ 320.504.058,67	16,46%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 442.926.984,98	22,74%	$ 32.786.021,00	1,68%
15	S-15	22/09/2024	$ 336.339.384,58	17,27%	$ 15.835.325,91	0,81%		$ 442.926.984,98	22,74%	$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	$ 352.937.560,70	18,12%	$ 16.598.176,12	0,85%		$ 442.926.984,98	22,74%	$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	$ 374.247.028,83	19,22%	$ 21.309.468,13	1,09%		$ 442.926.984,98	22,74%	$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	$ 401.170.505,98	20,60%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 454.131.652,98	23,32%	$ 11.204.668,00	0,58%
19	S-19	20/10/2024	$ 428.093.983,13	21,98%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 454.131.652,98	23,32%	$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	$ 455.017.460,28	23,36%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 483.789.118,28	24,84%	$ 29.657.465,30	1,52%
21	S-21	3/11/2024	$ 481.940.937,43	24,75%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 487.894.509,28	25,05%	$ 4.105.391,00	0,21%
22	S-22	10/11/2024	$ 508.770.878,31	26,12%	$ 26.829.940,88	1,38%		$ 524.419.295,68	26,93%	$ 36.524.786,40	1,88%
23	S-23	17/11/2024	$ 535.533.086,04	27,50%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 545.556.406,80	28,01%	$ 21.137.111,12	1,09%
24	S-24	24/11/2024	$ 562.295.293,77	28,87%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 566.896.970,71	29,11%	$ 21.340.563,91	1,10%
25	S-25	1/12/2024	$ 589.057.501,50	30,25%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 589.098.777,27	30,25%	$ 22.201.806,56	1,14%
26	S-26	8/12/2024	$ 613.961.736,22	31,52%	$ 24.904.234,72	1,28%		$ 615.584.827,27	31,61%	$ 26.486.050,00	1,36%
27	S-27	15/12/2024	$ 634.212.216,92	32,56%	$ 20.250.480,70	1,04%					
28	S-28	22/12/2024	$ 650.072.944,39	33,38%	$ 15.860.727,47	0,81%					
29	S-29	29/12/2024	$ 663.682.314,47	34,08%	$ 13.609.370,08	0,70%					
30	S-30	5/01/2025	$ 673.618.417,22	34,59%	$ 9.936.102,75	0,51%					
31	S-31	12/01/2025	$ 683.554.519,97	35,10%	$ 9.936.102,75	0,51%					
32	S-32	19/01/2025	$ 693.490.622,72	35,61%	$ 9.936.102,75	0,51%					
33	S-33	26/01/2025	$ 703.766.316,78	36,14%	$ 10.275.694,06	0,53%					
34	S-34	2/02/2025	$ 714.137.793,00	36,67%	$ 10.371.476,22	0,53%					
35	S-35	9/02/2025	$ 724.265.806,04	37,19%	$ 10.128.013,04	0,52%					
36	S-36	16/02/2025	$ 731.593.992,49	37,56%	$ 7.328.186,45	0,38%					
37	S-37	23/02/2025	$ 738.922.178,94	37,94%	$ 7.328.186,45	0,38%					
38	S-38	2/03/2025	$ 757.980.970,75	38,92%	$ 19.058.791,81	0,98%					
39	S-39	9/03/2025	$ 796.179.171,30	40,88%	$ 38.198.200,55	1,96%					
40	S-40	16/03/2025	$ 835.853.763,56	42,92%	$ 39.674.592,26	2,04%					
41	S-41	23/03/2025	$ 876.597.467,07	45,01%	$ 40.743.703,51	2,09%					
42	S-42	30/03/2025	$ 917.341.170,58	47,10%	$ 40.743.703,51	2,09%					
43	S-43	6/04/2025	$ 931.369.380,59	47,82%	$ 14.028.210,01	0,72%					
44	S-44	13/04/2025	$ 941.787.649,20	48,36%	$ 10.418.268,61	0,53%					
45	S-45	20/04/2025	$ 952.206.592,93	48,89%	$ 10.418.943,73	0,53%					
46	S-46	27/04/2025	$ 962.842.934,88	49,44%	$ 10.636.341,95	0,55%					
47	S-47	4/05/2025	$ 972.624.266,23	49,94%	$ 9.781.331,35	0,50%					
48	S-48	11/05/2025	$ 980.098.488,48	50,32%	$ 7.474.222,25	0,38%					
49	S-49	18/05/2025	$ 994.922.494,90	51,09%	$ 14.824.006,42	0,76%					
50	S-50	25/05/2025	$ 1.015.068.758,81	52,12%	$ 20.146.263,91	1,03%					
51	S-51	1/06/2025	$ 1.035.215.022,72	53,15%	$ 20.146.263,91	1,03%					
52	S-52	8/06/2025	$ 1.055.361.286,63	54,19%	$ 20.146.263,91	1,03%					
53	S-53	15/06/2025	$ 1.075.507.550,54	55,22%	$ 20.146.263,91	1,03%					
54	S-54	22/06/2025	$ 1.095.383.369,94	56,24%	$ 19.875.819,40	1,02%					
55	S-55	29/06/2025	$ 1.114.027.164,38	57,20%	$ 18.643.794,44	0,96%					
56	S-56	6/07/2025	$ 1.132.670.958,82	58,16%	$ 18.643.794,44	0,96%					
57	S-57	13/07/2025	$ 1.151.314.753,26	59,12%	$ 18.643.794,44	0,96%					
58	S-58	20/07/2025	$ 1.171.281.482,43	60,14%	$ 19.966.729,17	1,03%					
59	S-59	27/07/2025	$ 1.192.206.198,82	61,21%	$ 20.924.716,39	1,07%					
60	S-60	3/08/2025	$ 1.209.634.483,11	62,11%	$ 17.428.284,29	0,89%					
61	S-61	10/08/2025	$ 1.226.076.594,25	62,95%	$ 16.442.111,14	0,84%					
62	S-62	17/08/2025	$ 1.233.714.313,88	63,35%	$ 7.637.719,63	0,39%					
63	S-63	24/08/2025	$ 1.241.172.352,05	63,73%	$ 7.458.038,17	0,38%					
64	S-64	31/08/2025	$ 1.248.365.634,36	64,10%	$ 7.193.282,31	0,37%					
65	S-65	7/09/2025	$ 1.254.878.115,87	64,43%	$ 6.512.481,51	0,33%					
66	S-66	14/09/2025	$ 1.261.390.597,38	64,77%	$ 6.512.481,51	0,33%					
67	S-67	21/09/2025	$ 1.267.733.439,63	65,09%	$ 6.342.842,25	0,33%					
68	S-68	28/09/2025	$ 1.273.953.439,66	65,41%	$ 6.220.000,03	0,32%					
69	S-69	5/10/2025	$ 1.280.173.439,69	65,73%	$ 6.220.000,03	0,32%					

70	S-70	12/10/2025	$ 1.286.393.439,72	66,05%	$ 6.220.000,03	0,32%					
71	S-71	19/10/2025	$ 1.325.893.877,29	68,08%	$ 39.500.437,57	2,03%					
72	S-72	26/10/2025	$ 1.366.073.507,47	70,14%	$ 40.179.630,18	2,06%					
73	S-73	2/11/2025	$ 1.406.253.137,65	72,21%	$ 40.179.630,18	2,06%					
74	S-74	9/11/2025	$ 1.446.432.767,83	74,27%	$ 40.179.630,18	2,06%					
75	S-75	16/11/2025	$ 1.473.252.146,74	75,65%	$ 26.819.378,91	1,38%					
76	S-76	23/11/2025	$ 1.485.874.113,84	76,29%	$ 12.621.967,10	0,65%					
77	S-77	30/11/2025	$ 1.498.696.083,31	76,95%	$ 12.821.969,47	0,66%					
78	S-78	7/12/2025	$ 1.511.518.052,78	77,61%	$ 12.821.969,47	0,66%					
79	S-79	14/12/2025	$ 1.524.340.022,25	78,27%	$ 12.821.969,47	0,66%					
80	S-80	21/12/2025	$ 1.533.088.604,89	78,72%	$ 8.748.582,64	0,45%					
81	S-81	28/12/2025	$ 1.541.349.091,56	79,14%	$ 8.260.486,67	0,42%					
82	S-82	4/01/2026	$ 1.547.764.734,78	79,47%	$ 6.415.643,22	0,33%					
83	S-83	11/01/2026	$ 1.554.180.378,00	79,80%	$ 6.415.643,22	0,33%					
84	S-84	18/01/2026	$ 1.561.147.319,89	80,16%	$ 6.966.941,89	0,36%					
85	S-85	25/01/2026	$ 1.569.039.773,60	80,56%	$ 7.892.453,71	0,41%					
86	S-86	1/02/2026	$ 1.577.169.941,22	80,98%	$ 8.130.167,62	0,42%					
87	S-87	8/02/2026	$ 1.585.066.137,73	81,39%	$ 7.896.196,51	0,41%					
88	S-88	15/02/2026	$ 1.592.896.342,39	81,79%	$ 7.830.204,66	0,40%					
89	S-89	22/02/2026	$ 1.600.740.077,38	82,19%	$ 7.843.734,99	0,40%					
90	S-90	1/03/2026	$ 1.608.739.411,11	82,60%	$ 7.999.333,73	0,41%					
91	S-91	8/03/2026	$ 1.616.532.746,82	83,00%	$ 7.793.335,71	0,40%					
92	S-92	15/03/2026	$ 1.625.499.763,32	83,46%	$ 8.967.016,50	0,46%					
93	S-93	22/03/2026	$ 1.637.498.649,21	84,08%	$ 11.998.885,89	0,62%					
94	S-94	29/03/2026	$ 1.649.771.243,75	84,71%	$ 12.272.594,54	0,63%					
95	S-95	5/04/2026	$ 1.664.573.433,63	85,47%	$ 14.802.189,88	0,76%					
96	S-96	12/04/2026	$ 1.680.566.021,32	86,29%	$ 15.992.587,69	0,82%					
97	S-97	19/04/2026	$ 1.696.558.609,01	87,11%	$ 15.992.587,69	0,82%					
98	S-98	26/04/2026	$ 1.704.432.501,33	87,52%	$ 7.873.892,32	0,40%					
99	S-99	3/05/2026	$ 1.712.140.705,99	87,91%	$ 7.708.204,66	0,40%					
100	S-100	10/05/2026	$ 1.721.817.914,73	88,41%	$ 9.677.208,74	0,50%					
101	S-101	17/05/2026	$ 1.736.558.276,80	89,17%	$ 14.740.362,07	0,76%					
102	S-102	24/05/2026	$ 1.751.298.638,87	89,92%	$ 14.740.362,07	0,76%					
103	S-103	31/05/2026	$ 1.766.039.000,94	90,68%	$ 14.740.362,07	0,76%					
104	S-104	7/06/2026	$ 1.774.935.235,23	91,14%	$ 8.896.234,29	0,46%					
105	S-105	14/06/2026	$ 1.781.081.291,74	91,45%	$ 6.146.056,51	0,32%					
106	S-106	21/06/2026	$ 1.787.227.348,25	91,77%	$ 6.146.056,51	0,32%					
107	S-107	28/06/2026	$ 1.793.373.404,76	92,08%	$ 6.146.056,51	0,32%					
108	S-108	5/07/2026	$ 1.799.519.461,27	92,40%	$ 6.146.056,51	0,32%					
109	S-109	12/07/2026	$ 1.805.665.517,78	92,71%	$ 6.146.056,51	0,32%					
110	S-110	19/07/2026	$ 1.811.811.574,29	93,03%	$ 6.146.056,51	0,32%					
111	S-111	26/07/2026	$ 1.817.957.630,80	93,34%	$ 6.146.056,51	0,32%					
112	S-112	2/08/2026	$ 1.824.103.687,31	93,66%	$ 6.146.056,51	0,32%					
113	S-113	9/08/2026	$ 1.830.249.743,82	93,98%	$ 6.146.056,51	0,32%					
114	S-114	16/08/2026	$ 1.836.395.800,33	94,29%	$ 6.146.056,51	0,32%					
115	S-115	23/08/2026	$ 1.842.541.856,84	94,61%	$ 6.146.056,51	0,32%					
116	S-116	30/08/2026	$ 1.848.687.913,35	94,92%	$ 6.146.056,51	0,32%					
117	S-117	6/09/2026	$ 1.854.833.969,86	95,24%	$ 6.146.056,51	0,32%					
118	S-118	13/09/2026	$ 1.860.980.026,37	95,55%	$ 6.146.056,51	0,32%					
119	S-119	20/09/2026	$ 1.867.126.082,88	95,87%	$ 6.146.056,51	0,32%					
120	S-120	27/09/2026	$ 1.873.272.139,39	96,18%	$ 6.146.056,51	0,32%					
121	S-121	4/10/2026	$ 1.879.089.924,30	96,48%	$ 5.817.784,91	0,30%					
122	S-122	11/10/2026	$ 1.884.669.995,30	96,77%	$ 5.580.071,00	0,29%					
123	S-123	18/10/2026	$ 1.890.250.066,30	97,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
124	S-124	25/10/2026	$ 1.895.830.137,30	97,34%	$ 5.580.071,00	0,29%					
125	S-125	1/11/2026	$ 1.901.410.208,30	97,63%	$ 5.580.071,00	0,29%					
126	S-126	8/11/2026	$ 1.906.990.279,30	97,92%	$ 5.580.071,00	0,29%					
127	S-127	15/11/2026	$ 1.912.570.350,30	98,20%	$ 5.580.071,00	0,29%					
128	S-128	22/11/2026	$ 1.918.150.421,30	98,49%	$ 5.580.071,00	0,29%					
129	S-129	29/11/2026	$ 1.923.730.492,30	98,78%	$ 5.580.071,00	0,29%					
130	S-130	6/12/2026	$ 1.929.310.563,30	99,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
131	S-131	13/12/2026	$ 1.934.890.634,30	99,35%	$ 5.580.071,00	0,29%					
132	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 12.684.276,30	0,65%					

$ 1.947.574.910,60 100%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón
	Directora de Interventoría.
	CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ
