AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL**			**FECHA:**	30/12/2024
Semana No	**29**	**DEL :**	22-dic-24	**AL:**	28-dic-24
Plazo Total	**25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)**	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		197	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**25,06%**			
Nombre del Supervisor :	**Jorge Beltrán Gómez**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO VANGUARDIA, DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado
(%) Programado:	**0,70%**	**34,08%**
($) Valor programado:	**$ 13.609.370,08**	**$ 663.682.314,47**

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado:	**0,40%**	**36,58%**
($) Valor ejecutado:	**$ 7.773.317,00**	**$ 712.429.817,59**

Evaluación:	**Porcentaje Adelanto:**	**2,50%**
	Valor Adelanto:	**$ 48.747.503,12**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	**Contratista:**	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	**Contrato No:**	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	**Valor Inicial:**	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	**Plazo inicial:**	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS	**Plazo actualizado:**	25 MESES Y 25 DÍAS
Fecha de iniciación:	6-jun-24	**Fecha de iniciación:**	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	**Valor total actual del contrato:**	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

EL DÍA JUEVES 26-12-24 SE REALIZA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 28

"actividades realizadas en obra del (22 al 28 de diciembre del 2024)

• **LIMPIEZA Y LAVADO DE PISOS, FACHADA, PUERTAS Y VENTANAS:** Se continua con el lavado y limpieza en las oficinas de dirección, fachada lado sur, fachada lado norte.
• **OTROS MANTENIMIENTOS:** se realiza el mantenimiento de inodoro en el baño para hombres de la sala de abordaje No.2. Se realiza mantenimiento del lavaplatos de las oficinas de administración.
• **CUADRILLA ELÉCTRICA:** Se realiza en mantenimiento de luminarias en la zona de taquillas del terminal aéreo.

SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO

26/12/24 - SALAS DE ABORDAJE: Solicitud de cambio o mantenimiento de URNAS - Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio.
27/12/24 - SALA DE ABORDAJE No.2: Daño de baño de mujeres - sala de abordaje 2 - segundo piso - Aeropuerto Vanguardia – Villavicencio.

SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN

PENDIENTES POR EJECUTAR	ACTIVIDADES PENDIENTES EJECUTADAS EN LA SEMANA
SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN • Mantenimiento de la cubierta en sanidad, oficina AIM, alfa 7. • Mantenimiento de cuarto de aseo para sanidad aeroportuaria • Mantenimiento de cámaras para el cuarto de equipos electrógenos **ALFA 8 Y ALFA 13** • Mantenimiento de los puntos de vigilancia de alfa 8 y alfa 13 **SALÓN PRINCIPAL DEL AEROPUERTO** • Mantenimiento y Limpieza de todos los vidrios del salón principal **CUBIERTA DE LA TERMINAL AÉREA** • Mantenimiento de pintura de las tejas de la cubierta de la terminal aérea.	• Pintura general parte interna de toda la oficina AIM

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
*La interventoría inicia labores administrativas a las 7:00 a.m. y verifica que solo han llegado 2 operativos del contratista de obra para atender emergencias. Se realiza un comunicado para la entrega de los informes mensuales de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo correspondientes a los meses de junio hasta noviembre. Además, se emite un comunicado sobre la revisión de la planilla de seguridad social suministrada por parte del contratista, donde se observa que hay un atraso de 4 días en el pago. También se emite un comunicado en respuesta al procedimiento constructivo para realizar trabajos de mantenimiento en la base SEI, área de bomberos, para el desmontaje y montaje de tejas. En este comunicado se hacen recomendaciones puntuales para evitar incidentes y accidentes laborales, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas y seguras para el personal que ejecutará la actividad. *La interventoría inicia labores administrativas a las 7:00 a.m. y el contratista de obra comienza actividades a las 8:00 a.m. Se realiza una ronda de inspección y se verifica que la cuadrilla eléctrica esté realizando actividades de mantenimiento en la instalación de luminarias, constatando que cuentan con los elementos de protección individual adecuados y están cumpliendo con las condiciones de seguridad. Se realiza la verificación de la investigación del accidente de trabajo, haciendo observaciones para que el contratista de obra atienda y envíe la documentación corregida y completa para su remisión a la Aerocivil. Posteriormente, se lleva a cabo la reunión del comité de seguimiento de obra, en la que se abordan temas de SST y medio ambiente. En esta reunión, se menciona que el contratista de obra no ha enviado la documentación de ingreso de la especialista ambiental y se solicita que el personal que realice actividades de mantenimiento en hidrolavado con productos químicos cuente con los elementos de protección individual adecuados, como botas de caucho, protección visual y respiratoria con mascarilla con filtro, para evitar posibles riesgos de salud a los trabajadores y prevenir afectaciones. *La interventoría inicia labores administrativas a las 7:00 a.m. y el contratista de obra comienza actividades a las 8:00 a.m. Participamos en la charla de seguridad y la sesión de calistenia dirigida por el contratista de obra. Se continúa con una ronda de inspección, verificando que las áreas estén ordenadas y limpias, con delimitación adecuada, y que el personal cuente con los elementos de protección individual correspondientes. Se solicita al contratista que se lleven a cabo las pausas activas de manera regular.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA	
FAO-CTO-23001163-0222-2024	Entrega memorias de cantidades de mayores y menores No2
FAO-CTO-23001163-0223-2024	Entrega de cotizaciones bolsa monto agotable ítem 11.1.70 y 11.1.71
FAO-CTO-23001163-0224-2024	MEMORIAS CANTIDADES MAYORES Y MENORES No2 firmadas
FAO-CTO-23001163-0225-2024	Programación semana 29
FAO-CTO-23001163-0226-2024	Entrega Informe semanal No28
FAO-CTO-23001163-0227-2024	Información del personal disponible para los días 23 y 24 de diciembre de 2024
FAO-CTO-23001163-0229-2024	Respuesta a solicitud CO-FJ-1280-292-2024- SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (SALA DE ABORDAJE NO.2)
FAO-CTO-23001163-0230-2024	ACCIDENTE LABORAL 10-12-2024
CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA	
CO-FJ-1280-299-2024	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No28
CO-FJ-1280-291-2024	VILLAVICENCIO - APROBACIÓN DE COTIZACIÓN - RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0223-2024
CO-FJ-1280-295-2024	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS
CO-FJ-1280-296-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE INFORME DEL MANTENIMIENTO REALIZADO A ALA BANDA TRANSPORTADORA
CO-FJ-1280-297-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE CUADRILLA ELÉCTRICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO VANGUARDIA
CO-FJ-1280-298-2024	VILLAVICENCIO - ENTREGA DE INFORMES AMBIENTALES Y SST DE INTERVENTORÍA
CO-FJ-1280-300-2024	VILLAVICENCIO - REVISIÓN DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
CO-FJ-1280-301-2024	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A SU COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0219-2024 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
CO-FJ-1280-302-2024	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-213-2024 ENTREGA DE INFORME MENSUAL SST NOV
CO-FJ-1280-303-2024	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0230-2024 ACCIDENTE LABORAL 10-12-2024
CO-FJ-1280-305-2024	VILLAVICENCIO - INFORMACIÓN SOBRE DESCUENTO POR MULTA AL CONTRATISTA DE OBRA POR EL VALOR DE $ 4.909.852,72 BÁSICO.
CO-FJ-1280-306-2024	VILLAVICENCIO - INFORMACIÓN SOBRE DESCUENTO POR MULTA AL CONTRATISTA DE OBRA POR EL VALOR DE $ 4.909.852,72 BÁSICO.
CO-FJ-1280-307-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (SALA DE ABORDAJE NO.2)
CO-FJ-1280-308-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (SALAS DE ABORDAJE)
CO-FJ-1280-309-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (SALA DE ABORDAJE No.1)

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL DE OBRA

NOMBRE	CARGO	22	23	24	25	26	27	28
		D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA					1	1	1
CARLOS ALBERTO AGUILAR YAYA	RESIDENTE DE OBRA					1	1	1
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA					1	1	1
LUZ MARINA BLANCO PÉREZ	INSPECTOR DE OBRA					1	1	1
JHEYKSON BRAYAN LINARES PABÓN	INSPECTOR SST					1	1	1
JOSÉ EDGAR SALINAS MARTÍNEZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL							
JAVIER ANDRÉS VALENCIA CASTAÑEDA	TÉCNICO ELÉCTRICO		1	1		1	1	1
JORDI JESÚS GUEVARA RODRÍGUEZ	AYUDANTE ELÉCTRICO						1	1
CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ CASTILLO	OFICIAL DE OBRA							
JOHN JAIRO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ	OFICIAL DE OBRA						1	1
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA					1	1	1
ALEX FERNANDO ANDRADE	OFICIAL DE OBRA					1	1	1
REYNALDO GUZMÁN GIRALDO	OFICIAL DE OBRA					1	1	1
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA	OFICIAL DE OBRA					1	1	1
JHON ALEJANDRO MONZÓN MEJÍA	OFICIAL DE OBRA		1	1		1	1	1
JHOJAN ESTIBEN TOVAR CUESTA	AYUDANTE DE OBRA					1	1	1
LUISA FERNANDA RUIZ RIVEROS	OPERARIA DE ASEO					1	1	1
JENNY JULAIDY PERDOMO SÁNCHEZ	OPERARIA DE ASEO					1	1	1
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA			2	2	0	14	16	16


PERSONAL DE INTERVENTORÍA


NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	22	23	24	25	26	27	28
			D	L	M	M	J	V	S
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA		1	1		1	1	1
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1		1	1	1
GUILLERMO SABOGAL CHAPARRO	86.062.565	RESIDENTE DE APOYO INTERVENTORIA		1	1		1	1	1
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVETORIA		1	1		1	1	1
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA				4	4	0	4	4	4

DÍA	INTERVENTORÍA	OBRA	TOTAL
DOMÍNGO			
LUNES	4	2	6
MARTES	4	2	6
MIERCOLES	0	0	0
JUEVES	4	14	18
VIERNES	4	16	20
SÁBADO	4	16	20

EQUIPOS EN OBRA: Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor.

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

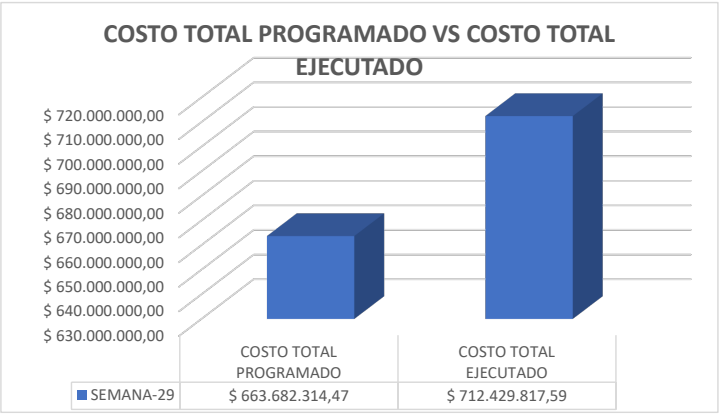

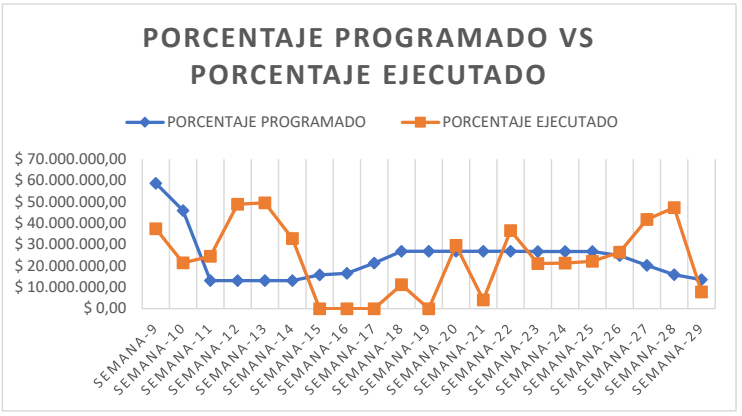

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total	AMORTIZACIÓN	%
ANTICIPO	**Entregado al contratista**	$ 305.869.421,00		
1	**Del 6 de jun al 31 de jul**	**$ 187.656.630,00**	**$ 30.025.061,00**	16,00%
2	Agosto	**$ 155.033.486,00**	$ 50.000.000,00	32,25%
3	Septiembre	**$ 78.800.698,00**	$ 25.789.421,00	32,73%
4	Octubre	**$ 70.812.436,00**	$ 35.000.000,00	49,43%
5	Noviembre	**$ 83.585.060,00**	$ 35.000.000,00	41,87%
6	Diciembre	**$ 410.217.392,00**	$ 130.054.939,00	31,70%
TOTAL ACUMULADO		$ 986.105.702,00	$ 305.869.421,00	

Valor Total Contrato Obra
$ 1.947.574.911,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 986.105.702,00
% Avance facturado Acumulado
50,63%

NOTA: Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento por un porcentaje equivalente al 50,63%. Equivalente a $ 986,105,702,70 millones de pesos.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	jun-24	$ 27.938.995,00
2	jul-24	$ 56.131.974,00
3	ago-24	$ 46.738.612,55
4	sep-24	$ 27.203.529,71
5	oct-24	$ 25.632.258,47
6	nov-24	$ 28.408.636,76
7	dic-24	$ 111.368.251,61
TOTAL ACUMULADO		$ 323.422.258,00

Valor Total Contrato Obra
$ 838.169.861,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 323.422.258,00
% Avance facturado Acumulado
38,59%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, la interventoría presenta un avance financiero equivalente a $ 323,422,258,00 con un porcentaje de 38,59 %.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

GRUPOS ELECTRÓGENOS



No. FOTO	Se realiza inspección del estado de los filtros, de las plantas de los grupos electrógenos
1	



No. FOTO	Se realiza inspección del estado de los filtros, de las plantas de los grupos electrógenos
2	



No. FOTO	Se realiza inspección con el personal de obra y de la interventoría para coordinar la instalacion de la transferencia de los grupos electrogenos
3	

BAÑOS MIXTOS DEL PRIMER PISO



No. FOTO	Se realiza la inspección del estado de la puerta del baño para damas que se encontraba caída.
4	



No. FOTO	Se realiza la inspección del estado de la puerta del baño para damas que se encontraba caída.
5	



No. FOTO	Se realiza la inspección del estado de la puerta del baño para damas que se encontraba caída.
6	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

SAL DE LLEGADA DE PASAJEROS - ALFA 7



No. FOTO	Se realiza la limpieza y mantenimiento del piso, asimismo el mantenimiento de la boquilla del enchape del piso
7	



No. FOTO	Se realiza la limpieza y mantenimiento del piso, asimismo el mantenimiento de la boquilla del enchape del piso
8	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de humedades en los muros de entrega de equipaje en la sala de llegada de pasajeros
9	

FACHADA LADO NORTE



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento y limpieza de la fachada lado norte, asimismo se realizan las correcciones de pintura.
10	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento y limpieza de la fachada lado norte, asimismo se realizan las correcciones de pintura.
11	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento y limpieza de la fachada lado norte, asimismo se realizan las correcciones de pintura.
12	

OFICINA DE AIM



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de humedades en los muros y mantenimiento de pintura de muros
13	




No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de humedades en los muros y mantenimiento de pintura de muros
14	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de humedades en los muros y mantenimiento de pintura de muros
15	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

MANTENIMIENTOS DE LA CUADRILLA ELÉCTRICA

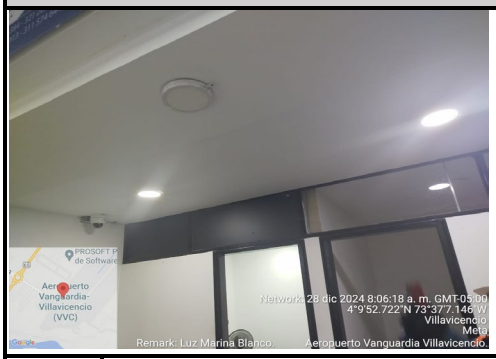

No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de luminarias fundidas en los modulos de las aerolineas
16	




No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de luminarias fundidas en los modulos de las aerolineas
17	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de luminarias fundidas en los modulos de las aerolineas
18	


MANTENIMIENTOS DE LA CUADRILLA ELÉCTRICA

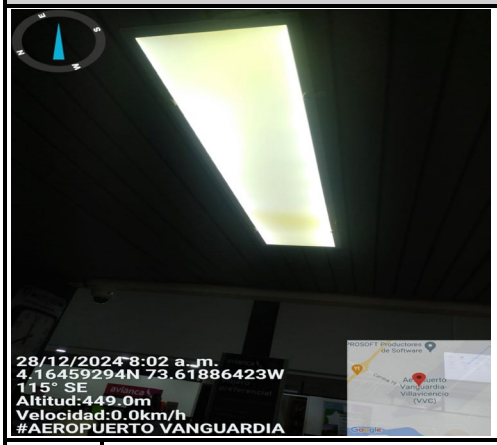

No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de luminarias fundidas en la entrada principal del terminal aéreo
19	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de luminarias fundidas en la entrada principal del terminal aéreo
20	

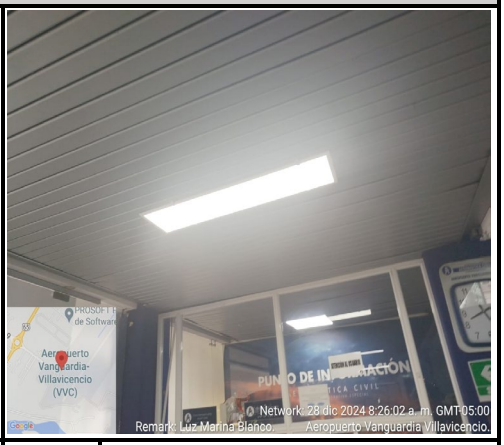

No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de luminarias fundidas en la entrada principal del terminal aéreo
21	

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE



No. FOTO	Participación en las charlas de seguridad
22	



No. FOTO	Participación en la realización de ejercicios de calistenia antes de inicio de actividades
23	



No. FOTO	Inspección de orden y aseo en área intervenida
24	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE



No. FOTO	
25	Inspección a la cuadrilla eléctrica para verificar que se encuentren trabajando en condiciones seguras y que cuenten con los elementos de protección individual adecuados



No. FOTO	
26	Inspección acopio temporal de residuos; de construcción y demolición y los peligrosos



No. FOTO	
27	Inspección de la rotulación de los productos químicos

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE



No. FOTO	
28	Inspección al campamento para verificar que el kit de emergencia, la camilla, el botiquín de primeros auxilios y el extintor estén visibles y de fácil acceso en caso de emergencia



No. FOTO	
29	nspección al campamento para verificar que el punto de hidratación esté en condiciones higiénicas. Se comprobó que el área estuviera limpia, con agua potable disponible y en envases adecuados, asegurando su fácil acceso y correcta conservación.



No. FOTO	
30	Inspección al campamento para verificar que el punto ecológico cuente con la respectiva segregación de residuos. Se comprobó que los contenedores estuvieran correctamente etiquetados y separados según el tipo de residuo, garantizando el cumplimiento de las normas ambientales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Treinta	(30)	días del mes de	Diciembre	de	2024
(Día en letras)	(Día en Números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

Sandra Yonaira Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

PRESUPUESTO CON MAYORES Y MENORES

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CAT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						+	-		
	1			**MAMPOSTERIA**								
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	$ 38.916,00	$ 2.334.960,00	0	-20	$ 40,00	$1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	$ 30.706,00	$ 1.842.360,00	0	0	$ 60,00	$1.842.360,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	$ 26.258,00	$ 3.938.700,00	0	0	$ 150,00	$3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	$ 38.490,00	$ 76.306.425,00	0	0	$ 1.982,50	$76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	$ 29.591,00	$ 29.324.681,00	0	0	$ 991,00	$29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	$ 15.640,00	$ 37.536.000,00	0	0	$ 2.400,00	$37.536.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	$ 66.017,00	$ 3.895.003,00	0		$ 59,00	$3.895.003,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	$ 33.550,00	$ 1.342.000,00	0		$ 40,00	$1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	$ 1.841,00	$ 736.400,00	0	0	$ 400,00	$736.400,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	$ 27.292,00	$ 42.657.298,00	0	0	$ 1.563,00	$42.657.297,75
Subtotal								**$ 199.913.827,00**				**$ 199.135.506,75**
	2			**PISOS**								
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	$ 20.128,00	$ 14.089.600,00	0	-300	$ 400,00	$8.051.200,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	$ 86.865,00	$ 9.989.475,00	0		$ 115,00	$9.989.475,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO)	M2	38,00	$ 175.568,00	$ 6.671.584,00	0	-37	$ 1,00	$175.568,00
Subtotal								**$ 30.750.659,00**				**$ 18.216.243,00**
	3			**CUBIERTA Y CIELORASO**							$ -	
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO;NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	$ 480.205,00	$ 11.524.920,00	0	0	$ 24,00	$11.524.920,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	$ 89.881,00	$ 44.041.690,00	0	0	$ 490,00	$44.041.690,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	$ 140.472,00	$ 68.831.280,00	0	-300	$ 190,00	$26.689.680,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	$ 89.781,00	$ 33.039.408,00	0		$ 368,00	$33.039.408,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	$ 28.249,00	$ 2.824.900,00	0	0	$ 100,00	$2.824.900,00
Subtotal								**$ 160.262.198,00**				**$ 118.120.598,00**
	4			**CARPINTERIA METÁLICA**								
19	4.1		4.1	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	$ 451.209,00	$ 2.256.045,00	0		$ 5,00	$2.256.045,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSINAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	$ 17.857,00	$ 5.357.100,00	200	0	$ 500,00	$8.928.500,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	$ 22.736,00	$ 4.547.200,00	0	0	$ 200,00	$4.547.200,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACREO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	$ 83.129,00	$ 6.816.578,00	0	0	$ 82,00	$6.816.578,00
Subtotal								**$ 18.976.923,00**				**$ 22.548.323,00**
	5			**CARPINTERIA MADERA**								
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	$ 476.557,00	$ 3.335.899,00		-5	$ 2,00	$953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	$ 12.995,00	$ 2.011.626,00	0		$ 154,80	$2.011.626,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	$ 38.231,00	$ 2.959.079,00	0		$ 77,40	$2.959.079,40
Subtotal								**$ 8.306.604,00**				**$ 5.923.819,40**
	6			**CRISTALERIA**								
26	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	$ 289.652,00	$ 14.482.600,00		-30	$ 20,00	$5.793.040,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	$ 84.356,00	$ 4.217.800,00		-50	$ -	$0,00
Subtotal								**$ 18.700.400,00**				**$ 5.793.040,00**
	7			**CANALETAS Y PORTACABLES**								
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	$ 61.879,00	$ 30.939.500,00		250	$ 750,00	$46.409.250,00
Subtotal								**$ 30.939.500,00**				**$ 46.409.250,00**
	8			**LIMPIEZA PROFUNDA**								
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	$ 9.054,00	$ 82.391.400,00	0		$ 9.100,00	$82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	$ 14.260,00	$ 87.342.500,00	0		$ 6.125,00	$87.342.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	$ 7.870,00	$ 11.805.000,00	0		$ 1.500,00	$11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	$ 627.943,00	$ 100.470.880,00	0		$ 160,00	$100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	$ 30.741,00	$ 293.365.667,00		-1000	$ 8.543,14	$262.624.666,74
Subtotal								**$ 575.375.447,00**				**$ 544.634.446,74**
	9			**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**								
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 61.126.435,00	$ 61.126.435,00	0		$ 1,00	$61.126.435,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	$ 22.193.560,00	$ 22.193.560,00	0		$ 1,00	$22.193.560,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 72.618.205,00	$ 72.618.205,00	0		$ 1,00	$72.618.205,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	$ 589.218,00	$ 14.141.232,00	0	-24	$ -	$0,00
Subtotal								**$ 170.079.432,00**				**$ 155.938.200,00**
	10			**MANO DE OBRA**								
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	$ 11.766.194,00	$ 352.985.820,00	0	0	$ 30,00	$352.985.820,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	$ 39.080,00	$ 18.758.400,00	200	0	$ 680,00	$26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	$ 36.074,00	$ 25.973.280,00	200	0	$ 920,00	$33.188.080,00
	SUBTOTAL				SUBTOTAL			**$ 397.717.500,00**				**$ 412.748.300,00**
							SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO	**$ 1.611.022.490,00**				**$ 1.529.467.726,89**
				IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 11.956.808,00			$ 0,19	$ 11.351.518,00
				SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)				**$ 1.622.979.298,00**				**$ 1.540.819.244,89**
	11			**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**								
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	$ 324.595.613,00	$ 324.595.613,00				$ 406.755.666,11
							TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**$ 324.595.613,00**				$ 406.755.666,11
				VALOR TOTAL				**$ 1.947.574.911,00**				**$ 1.947.574.911,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE				
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.							
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	20%				20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	3%				3%
NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.	**UTILIDAD**	**U=**	5%				5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	28%				28%

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/12/2024 **Y EL** 28/12/2024 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING.JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA / CARGO	NOVIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																													DICIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			
GUILLERMO SABOGAL CHAPARRO	86.062.565	RESIDENTE DE APOYO INTERVENTORIA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVETORIA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			4	4	0	0	4	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	4	4	0	4	4	4	0	0	0

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/12/2024 **Y EL** 28/12/2024 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JORGE BELTRAN


FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

FECHA		NOVIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																														DICIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NOMBRE	**CARGO**	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1			
CARLOS ALBERTO AGUILAR YAYA	RESIDENTE DE OBRA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1			
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA																			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1			
LUZ MARINA BLANCO PÉREZ	INSPECTOR DE OBRA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1			
JHEYKSON BRAYAN LINARES PABÓN	INSPECTOR SST	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1			
JOSÉ EDGAR SALINAS MARTÍNEZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL																																																																						
JAVIER ANDRÉS VALENCIA CASTAÑEDA	TÉCNICO ELÉCTRICO	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1			
JORDI JESÚS GUEVARA RODRÍGUEZ	AYUDANTE ELÉCTRICO	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1				
CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ CASTILLO	OFICIAL DE OBRA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1										
JOHN JAIRO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ	OFICIAL DE OBRA																																							1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1										
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1			
ALEX FERNANDO ANDRADE	OFICIAL DE OBRA																																		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1								1	1	1			
REYNALDO GUZMÁN GIRALDO	OFICIAL DE OBRA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1			
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA	OFICIAL DE OBRA	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1			
JHON ALEJANDRO MONZÓN MEJÍA	OFICIAL DE OBRA																												1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1			
JHOJAN ESTIBEN TOVAR CUESTA	AYUDANTE DE OBRA																									1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1			
LUISA FERNANDA RUIZ RIVEROS	OPERARIA DE ASEO	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1			
JENNY JULAIDY PERDOMO SÁNCHEZ	OPERARIA DE ASEO	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1			
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		12	12	0	0	12	12	12	12	12	0	0	12	12	12	12	12	0	12	12	13	13	13	13	0	14	14	13	15	14	14	0	15	15	15	15	15	15	0	15	13	17	17	17	17	0	17	17	17	17	17	17	0	2	2	0	14	16	16	0	0	0

			COSTO PROGRAMADO					EJECUTADO			
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL		COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	0%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 45.812.826,61	2,35%		$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 104.547.219,71	5,37%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 187.656.630,00	9,64%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 163.281.612,81	8,38%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 228.308.146,00	11,72%	$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	$ 222.016.005,91	11,40%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 265.699.525,00	13,64%	$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	$ 267.981.357,99	13,76%	$ 45.965.352,08	2,36%		$ 287.156.607,00	14,74%	$ 21.457.082,00	1,10%
11	S-11	25/08/2024	$ 281.112.033,16	14,43%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 311.702.916,00	16,00%	$ 24.546.309,00	1,26%
12	S-12	1/09/2024	$ 294.242.708,33	15,11%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 360.592.928,00	18,51%	$ 48.890.012,00	2,51%
13	S-13	8/09/2024	$ 307.373.383,50	15,78%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 410.140.963,98	21,06%	$ 49.548.035,98	2,54%
14	S-14	15/09/2024	$ 320.504.058,67	16,46%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 442.926.984,98	22,74%	$ 32.786.021,00	1,68%
15	S-15	22/09/2024	$ 336.339.384,58	17,27%	$ 15.835.325,91	0,81%		$ 442.926.984,98	22,74%	$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	$ 352.937.560,70	18,12%	$ 16.598.176,12	0,85%		$ 442.926.984,98	22,74%	$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	$ 374.247.028,83	19,22%	$ 21.309.468,13	1,09%		$ 442.926.984,98	22,74%	$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	$ 401.170.505,98	20,60%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 454.131.652,98	23,32%	$ 11.204.668,00	0,58%
19	S-19	20/10/2024	$ 428.093.983,13	21,98%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 454.131.652,98	23,32%	$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	$ 455.017.460,28	23,36%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 483.789.118,28	24,84%	$ 29.657.465,30	1,52%
21	S-21	3/11/2024	$ 481.940.937,43	24,75%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 487.894.509,28	25,05%	$ 4.105.391,00	0,21%
22	S-22	10/11/2024	$ 508.770.878,31	26,12%	$ 26.829.940,88	1,38%		$ 524.419.295,68	26,93%	$ 36.524.786,40	1,88%
23	S-23	17/11/2024	$ 535.533.086,04	27,50%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 545.556.406,80	28,01%	$ 21.137.111,12	1,09%
24	S-24	24/11/2024	$ 562.295.293,77	28,87%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 566.896.970,71	29,11%	$ 21.340.563,91	1,10%
25	S-25	1/12/2024	$ 589.057.501,50	30,25%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 589.098.777,27	30,25%	$ 22.201.806,56	1,14%
26	S-26	8/12/2024	$ 613.961.736,22	31,52%	$ 24.904.234,72	1,28%		$ 615.584.827,27	31,61%	$ 26.486.050,00	1,36%
27	S-27	15/12/2024	$ 634.212.216,92	32,56%	$ 20.250.480,70	1,04%		$ 657.384.921,59	33,75%	$ 41.800.094,32	2,15%
28	S-28	22/12/2024	$ 650.072.944,39	33,38%	$ 15.860.727,47	0,81%		$ 704.656.500,59	36,18%	$ 47.271.579,00	2,43%
29	S-29	29/12/2024	$ 663.682.314,47	34,08%	$ 13.609.370,08	0,70%		$ 712.429.817,59	36,58%	$ 7.773.317,00	0,40%
30	S-30	5/01/2025	$ 673.618.417,22	34,59%	$ 9.936.102,75	0,51%					
31	S-31	12/01/2025	$ 683.554.519,97	35,10%	$ 9.936.102,75	0,51%					
32	S-32	19/01/2025	$ 693.490.622,72	35,61%	$ 9.936.102,75	0,51%					
33	S-33	26/01/2025	$ 703.766.316,78	36,14%	$ 10.275.694,06	0,53%					
34	S-34	2/02/2025	$ 714.137.793,00	36,67%	$ 10.371.476,22	0,53%					
35	S-35	9/02/2025	$ 724.265.806,04	37,19%	$ 10.128.013,04	0,52%					
36	S-36	16/02/2025	$ 731.593.992,49	37,56%	$ 7.328.186,45	0,38%					
37	S-37	23/02/2025	$ 738.922.178,94	37,94%	$ 7.328.186,45	0,38%					
38	S-38	2/03/2025	$ 757.980.970,75	38,92%	$ 19.058.791,81	0,98%					
39	S-39	9/03/2025	$ 796.179.171,30	40,88%	$ 38.198.200,55	1,96%					
40	S-40	16/03/2025	$ 835.853.763,56	42,92%	$ 39.674.592,26	2,04%					
41	S-41	23/03/2025	$ 876.597.467,07	45,01%	$ 40.743.703,51	2,09%					
42	S-42	30/03/2025	$ 917.341.170,58	47,10%	$ 40.743.703,51	2,09%					
43	S-43	6/04/2025	$ 931.369.380,59	47,82%	$ 14.028.210,01	0,72%					
44	S-44	13/04/2025	$ 941.787.649,20	48,36%	$ 10.418.268,61	0,53%					
45	S-45	20/04/2025	$ 952.206.592,93	48,89%	$ 10.418.943,73	0,53%					
46	S-46	27/04/2025	$ 962.842.934,88	49,44%	$ 10.636.341,95	0,55%					
47	S-47	4/05/2025	$ 972.624.266,23	49,94%	$ 9.781.331,35	0,50%					
48	S-48	11/05/2025	$ 980.098.488,48	50,32%	$ 7.474.222,25	0,38%					
49	S-49	18/05/2025	$ 994.922.494,90	51,09%	$ 14.824.006,42	0,76%					
50	S-50	25/05/2025	$ 1.015.068.758,81	52,12%	$ 20.146.263,91	1,03%					
51	S-51	1/06/2025	$ 1.035.215.022,72	53,15%	$ 20.146.263,91	1,03%					
52	S-52	8/06/2025	$ 1.055.361.286,63	54,19%	$ 20.146.263,91	1,03%					
53	S-53	15/06/2025	$ 1.075.507.550,54	55,22%	$ 20.146.263,91	1,03%					
54	S-54	22/06/2025	$ 1.095.383.369,94	56,24%	$ 19.875.819,40	1,02%					
55	S-55	29/06/2025	$ 1.114.027.164,38	57,20%	$ 18.643.794,44	0,96%					
56	S-56	6/07/2025	$ 1.132.670.958,82	58,16%	$ 18.643.794,44	0,96%					
57	S-57	13/07/2025	$ 1.151.314.753,26	59,12%	$ 18.643.794,44	0,96%					
58	S-58	20/07/2025	$ 1.171.281.482,43	60,14%	$ 19.966.729,17	1,03%					
59	S-59	27/07/2025	$ 1.192.206.198,82	61,21%	$ 20.924.716,39	1,07%					
60	S-60	3/08/2025	$ 1.209.634.483,11	62,11%	$ 17.428.284,29	0,89%					
61	S-61	10/08/2025	$ 1.226.076.594,25	62,95%	$ 16.442.111,14	0,84%					
62	S-62	17/08/2025	$ 1.233.714.313,88	63,35%	$ 7.637.719,63	0,39%					
63	S-63	24/08/2025	$ 1.241.172.352,05	63,73%	$ 7.458.038,17	0,38%					
64	S-64	31/08/2025	$ 1.248.365.634,36	64,10%	$ 7.193.282,31	0,37%					
65	S-65	7/09/2025	$ 1.254.878.115,87	64,43%	$ 6.512.481,51	0,33%					
66	S-66	14/09/2025	$ 1.261.390.597,38	64,77%	$ 6.512.481,51	0,33%					
67	S-67	21/09/2025	$ 1.267.733.439,63	65,09%	$ 6.342.842,25	0,33%					
68	S-68	28/09/2025	$ 1.273.953.439,66	65,41%	$ 6.220.000,03	0,32%					
69	S-69	5/10/2025	$ 1.280.173.439,69	65,73%	$ 6.220.000,03	0,32%					
70	S-70	12/10/2025	$ 1.286.393.439,72	66,05%	$ 6.220.000,03	0,32%					

71	S-71	19/10/2025	$ 1.325.893.877,29	68,08%	$ 39.500.437,57	2,03%					
72	S-72	26/10/2025	$ 1.366.073.507,47	70,14%	$ 40.179.630,18	2,06%					
73	S-73	2/11/2025	$ 1.406.253.137,65	72,21%	$ 40.179.630,18	2,06%					
74	S-74	9/11/2025	$ 1.446.432.767,83	74,27%	$ 40.179.630,18	2,06%					
75	S-75	16/11/2025	$ 1.473.252.146,74	75,65%	$ 26.819.378,91	1,38%					
76	S-76	23/11/2025	$ 1.485.874.113,84	76,29%	$ 12.621.967,10	0,65%					
77	S-77	30/11/2025	$ 1.498.696.083,31	76,95%	$ 12.821.969,47	0,66%					
78	S-78	7/12/2025	$ 1.511.518.052,78	77,61%	$ 12.821.969,47	0,66%					
79	S-79	14/12/2025	$ 1.524.340.022,25	78,27%	$ 12.821.969,47	0,66%					
80	S-80	21/12/2025	$ 1.533.088.604,89	78,72%	$ 8.748.582,64	0,45%					
81	S-81	28/12/2025	$ 1.541.349.091,56	79,14%	$ 8.260.486,67	0,42%					
82	S-82	4/01/2026	$ 1.547.764.734,78	79,47%	$ 6.415.643,22	0,33%					
83	S-83	11/01/2026	$ 1.554.180.378,00	79,80%	$ 6.415.643,22	0,33%					
84	S-84	18/01/2026	$ 1.561.147.319,89	80,16%	$ 6.966.941,89	0,36%					
85	S-85	25/01/2026	$ 1.569.039.773,60	80,56%	$ 7.892.453,71	0,41%					
86	S-86	1/02/2026	$ 1.577.169.941,22	80,98%	$ 8.130.167,62	0,42%					
87	S-87	8/02/2026	$ 1.585.066.137,73	81,39%	$ 7.896.196,51	0,41%					
88	S-88	15/02/2026	$ 1.592.896.342,39	81,79%	$ 7.830.204,66	0,40%					
89	S-89	22/02/2026	$ 1.600.740.077,38	82,19%	$ 7.843.734,99	0,40%					
90	S-90	1/03/2026	$ 1.608.739.411,11	82,60%	$ 7.999.333,73	0,41%					
91	S-91	8/03/2026	$ 1.616.532.746,82	83,00%	$ 7.793.335,71	0,40%					
92	S-92	15/03/2026	$ 1.625.499.763,32	83,46%	$ 8.967.016,50	0,46%					
93	S-93	22/03/2026	$ 1.637.498.649,21	84,08%	$ 11.998.885,89	0,62%					
94	S-94	29/03/2026	$ 1.649.771.243,75	84,71%	$ 12.272.594,54	0,63%					
95	S-95	5/04/2026	$ 1.664.573.433,63	85,47%	$ 14.802.189,88	0,76%					
96	S-96	12/04/2026	$ 1.680.566.021,32	86,29%	$ 15.992.587,69	0,82%					
97	S-97	19/04/2026	$ 1.696.558.609,01	87,11%	$ 15.992.587,69	0,82%					
98	S-98	26/04/2026	$ 1.704.432.501,33	87,52%	$ 7.873.892,32	0,40%					
99	S-99	3/05/2026	$ 1.712.140.705,99	87,91%	$ 7.708.204,66	0,40%					
100	S-100	10/05/2026	$ 1.721.817.914,73	88,41%	$ 9.677.208,74	0,50%					
101	S-101	17/05/2026	$ 1.736.558.276,80	89,17%	$ 14.740.362,07	0,76%					
102	S-102	24/05/2026	$ 1.751.298.638,87	89,92%	$ 14.740.362,07	0,76%					
103	S-103	31/05/2026	$ 1.766.039.000,94	90,68%	$ 14.740.362,07	0,76%					
104	S-104	7/06/2026	$ 1.774.935.235,23	91,14%	$ 8.896.234,29	0,46%					
105	S-105	14/06/2026	$ 1.781.081.291,74	91,45%	$ 6.146.056,51	0,32%					
106	S-106	21/06/2026	$ 1.787.227.348,25	91,77%	$ 6.146.056,51	0,32%					
107	S-107	28/06/2026	$ 1.793.373.404,76	92,08%	$ 6.146.056,51	0,32%					
108	S-108	5/07/2026	$ 1.799.519.461,27	92,40%	$ 6.146.056,51	0,32%					
109	S-109	12/07/2026	$ 1.805.665.517,78	92,71%	$ 6.146.056,51	0,32%					
110	S-110	19/07/2026	$ 1.811.811.574,29	93,03%	$ 6.146.056,51	0,32%					
111	S-111	26/07/2026	$ 1.817.957.630,80	93,34%	$ 6.146.056,51	0,32%					
112	S-112	2/08/2026	$ 1.824.103.687,31	93,66%	$ 6.146.056,51	0,32%					
113	S-113	9/08/2026	$ 1.830.249.743,82	93,98%	$ 6.146.056,51	0,32%					
114	S-114	16/08/2026	$ 1.836.395.800,33	94,29%	$ 6.146.056,51	0,32%					
115	S-115	23/08/2026	$ 1.842.541.856,84	94,61%	$ 6.146.056,51	0,32%					
116	S-116	30/08/2026	$ 1.848.687.913,35	94,92%	$ 6.146.056,51	0,32%					
117	S-117	6/09/2026	$ 1.854.833.969,86	95,24%	$ 6.146.056,51	0,32%					
118	S-118	13/09/2026	$ 1.860.980.026,37	95,55%	$ 6.146.056,51	0,32%					
119	S-119	20/09/2026	$ 1.867.126.082,88	95,87%	$ 6.146.056,51	0,32%					
120	S-120	27/09/2026	$ 1.873.272.139,39	96,18%	$ 6.146.056,51	0,32%					
121	S-121	4/10/2026	$ 1.879.089.924,30	96,48%	$ 5.817.784,91	0,30%					
122	S-122	11/10/2026	$ 1.884.669.995,30	96,77%	$ 5.580.071,00	0,29%					
123	S-123	18/10/2026	$ 1.890.250.066,30	97,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
124	S-124	25/10/2026	$ 1.895.830.137,30	97,34%	$ 5.580.071,00	0,29%					
125	S-125	1/11/2026	$ 1.901.410.208,30	97,63%	$ 5.580.071,00	0,29%					
126	S-126	8/11/2026	$ 1.906.990.279,30	97,92%	$ 5.580.071,00	0,29%					
127	S-127	15/11/2026	$ 1.912.570.350,30	98,20%	$ 5.580.071,00	0,29%					
128	S-128	22/11/2026	$ 1.918.150.421,30	98,49%	$ 5.580.071,00	0,29%					
129	S-129	29/11/2026	$ 1.923.730.492,30	98,78%	$ 5.580.071,00	0,29%					
130	S-130	6/12/2026	$ 1.929.310.563,30	99,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
131	S-131	13/12/2026	$ 1.934.890.634,30	99,35%	$ 5.580.071,00	0,29%					
132	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 12.684.276,30	0,65%					
					$ 1.947.574.910,60	100%					

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón
	Directora de Interventoría.
	CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ
