AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL**			**FECHA:**	7-ene-25
Semana No	**30**	**DEL :**	29-dic-24	**AL:**	4-ene-25
Plazo Total	**25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)**	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		204	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**25,95%**			
Nombre del Supervisor :	**Jorge Beltrán Gómez**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO VANGUARDIA, DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado
(%) Programado:	**0,51%**	**34,59%**
($) Valor programado:	**$ 9.936.102,75**	**$ 673.618.417,22**

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado:	**0,98%**	**37,56%**
($) Valor ejecutado:	**$ 19.128.821,00**	**$ 731.558.638,59**

Evaluación:	**Porcentaje Adelanto:**	**2,97%**
	Valor Adelanto:	**$ 57.940.221,37**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	**Contratista:**	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	**Contrato No:**	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	**Valor Inicial:**	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	**Plazo inicial:**	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS	**Plazo actualizado:**	25 MESES Y 25 DÍAS
Fecha de iniciación:	6-jun-24	**Fecha de iniciación:**	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	**Valor total actual del contrato:**	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

EL DÍA VIERNES 03-01-25 SE REALIZA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 29

"actividades realizadas en obra del (29 de diciembre de 2024 al 04 de enero del 2025)

• **LIMPIEZA Y LAVADO DE PISOS, FACHADA, PUERTAS Y VENTANAS:** Se continua con el lavado y limpieza de la fachada lado norte, entrada principal.
• **GRUPOS ELECTRÓGENOS:** Se realiza el mantenimiento del filtro del tanque de suministro de los grupos electrógenos.
- Se realiza la inspección de la trampa de grasas en compañia del contratista de obra.
- Se realiza la inspeccion de los filtros y nivel de aceite de los grupos electrógenos.
• **OTROS MANTENIMIENTOS:** se realiza el mantenimiento de inodoro en el baño para hombres de la sala de abordaje No.2.
- Se realizo el mantenimiento de fuga de agua en la tuberia de agua potable en la fachada lado norte.
• **CUADRILLA ELÉCTRICA:** Se realiza en mantenimiento de luminarias en la zona de taquillas del terminal aéreo.
- Se realiza el mantenimiento de luminarias en la sala de espera No.1.

SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO

30/12/2024 – SALÓN PRINCIPAL: Desmonte de Andamios por afectación de modalidad a los pasajeros - Aeropuertos Vanguardia de Villavicencio
30/12/2024 – DIRECCIÓN REGIONAL: retiro de polarizados oficina dirección regional
30/12/2024 – SALA DE ESPERA No.3: mantenimiento aire acondicionado sala 3 presentan fallas
30/12/2024 – FACHADA EXTERIOR EDIFICIO: Fuga de agua - Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio
02/01/2025 – OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN: filtración de agua - baño de mujeres - área administrativa - aeropuerto vanguardia de Villavicencio
03/01/2025 – PLANTA DE GRUPOS ELECTRÓGENOS: Inconvenientes en el fluido de suministro de combustible a las plantas.
03/01/2025 – SALA DE ABORDAJE No.3: Solicitud de arreglo chapas de la puerta sala de abordaje N°3 - Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio
03/01/2025 – ENTRADA PRINCIPAL: Solicitud de arreglo de losas sueltas - ingreso peatonal - Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio
03/01/2025 – OFICINAS DE CONTROL Y SEGURIDAD: Solicitud de reparación lavamanos del área de control y seguridad - aeropuerto vanguardia – Villavicencio
03/01/2025 – TORRE DE CONTROL: Solicitud de reparación - fuga de agua - torre de control - Aeropuerto Vanguardia – Villavicencio
04-01-2025 – SALA DE ABORDAJE No.1: Solicitud de arreglo marco de la puerta de sala de abordaje 1 - Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio
04-01-2025 – Solicitud de cambio de vidrios de los baños - Aeropuerto vanguardia - Villavicencio

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN

PENDIENTES POR EJECUTAR	ACTIVIDADES PENDIENTES EJECUTADAS EN LA SEMANA
SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN • Mantenimiento de la cubierta en sanidad, oficina AIM, alfa 7. • Mantenimiento de cuarto de aseo para sanidad aeroportuaria • Mantenimiento de cámaras para el cuarto de equipos electrógenos **ALFA 8 Y ALFA 13** • Mantenimiento de los puntos de vigilancia de alfa 8 y alfa 13 **SALÓN PRINCIPAL DEL AEROPUERTO** • Mantenimiento y Limpieza de todos los vidrios del salón principal **CUBIERTA DE LA TERMINAL AÉREA** • Mantenimiento de pintura de las tejas de la cubierta de la terminal aérea.	• Pintura general parte interna de toda la oficina AIM

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

*La interventoría inicia labores administrativas a las 7:00 a.m. y el contratista de obra comienza actividades a las 8:00 a.m. Participamos en la charla de seguridad y la sesión de calistenia dirigida por el contratista de obra. Se continúa con una ronda de inspección, verificando que las áreas estén ordenadas y limpias, con delimitación adecuada, y que el personal cuente con los elementos de protección individual correspondientes. Se solicita al contratista que se lleven a cabo las pausas activas de manera regular."□

*La interventoría inicia labores administrativas a las 7:00 a.m., mientras que el contratista de obra comienza sus actividades a las 8:00 a.m. Participamos en la charla de seguridad y en la sesión de calistenia dirigida por el contratista de obra. Posteriormente, se realizó una ronda de inspección, en la cual verificamos las áreas intervenidas. Durante la inspección, observamos que en el área destinada al mantenimiento y limpieza de vidrios, el trabajador no utilizaba guantes de caucho. Además, constatamos que el área no estaba delimitada ni señalizada adecuadamente, y el químico utilizado, thinner, no estaba rotulado. Ante estos hallazgos, se solicitó de inmediato al contratista que tomara las medidas correctivas correspondientes con la mayor urgencia posible.□

*La interventoría inicia labores administrativas a las 7:00 a.m., mientras que el contratista de obra comienza sus actividades a las 8:00 a.m. Participamos en la charla de seguridad y en la sesión de calistenia dirigida por el contratista de obra. Por parte de la interventoría, se revisó la hoja de vida de la profesional SST y se le dio el aval correspondiente. Posteriormente, se llevó a cabo el comité de seguimiento de obra, en el cual se abordaron puntos fundamentales en materia de SST y ambiental. Durante este comité, se aprobó la hoja de vida de la profesional SST y se informó que se encontraba en proceso de revisión por segunda vez el accidente de trabajo. Una vez finalizada la revisión, se notificará para proceder con la entrega a Aerocivil.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA

FAO-CTO-23001163-0231-2024	ENTREGA DE INFORME SEMANAL 16 AL 22 DEL MES DE DICIEMBRE 2024
FAO-CTO-23001163-0232-2024	Respuesta a solicitud CO-FJ-1280-168-2024 y CO-FJ-1280-295-2024, MANTENIMIENTO LOCATIVOS, (TUBO DE ABASTECIMIENTO DE LOS CARROS DE BOMBEROS)
FAO-CTO-23001163-0233-2024	Respuesta a solicitud CO-FJ-1280-293-2024-solicitud urgente de mantenimiento locativos (sala de abordaje No3)
FAO-CTO-23001163-0234-2024	Respuesta a solicitud CO-FJ-1280-179-2024 y CO-FJ-1280-295-2024 - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS - (Mueble de la cocina de las ofi
FAO-CTO-23001163-0235-2024	Respuesta a solicitud CO-FJ-1280-295-2024, REITERACIÓN DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS
FAO-CTO-23001163-0236-2024	RESPUESTA A SU COMUNICADO AL COMUNICADO CO-FJ-1280-301-2024 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO - COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0236-2024
FAO-CTO-23001163-0237-2024	SOLICITUD DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y PRESENCIA DE LA ESPECIALISTA AMBIENTAL RESPUESTA DE COMUNICADO CO-FJ-1280-281-2024 - COMUNICADO FAO-
FAO-CTO-23001163-0238-2024	Asunto solicitud del permiso y fecha para la desinstalación e instalación de la transferencia ubicada en la zona de grupo electrógeno

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA

28-12-2024 - CO-FJ-1280-310-2024	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A COMUNICADO (FAO-CTO-23001163-0235-2024)
28-12-2024 - CO-FJ-1280-311-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE PERMISO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE LA TRANSFERENCIA DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS
28-12-2024 - CO-FJ-1280-312-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (BAÑOS DE LA SALA DE ABORDAJE No.1 Y FACHADA LADO SUR DE LA SALA DE ABORDAJE No.1)
28-12-2024 - CO-FJ-1280-313-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE PERSONAL IDÓNEO PARA ATENDER LAS EVENTUALIDADES EN LAS BATERÍAS SANITARIAS EN LA TEMPORADA DE FIN DE AÑO
30-12-2024 - CO-FJ-1280-314-2024	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0214-2024 REPORTE SEMANAL SST DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE 2024
30-12-2024 - CO-FJ-1280-315-2024	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0231-2024 REPORTE SEMANAL SST DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2024
30-12-2024 - CO-FJ-1280-316-2024	VILLAVICENCIO - SOLICITUD ENTREGA DE SOPORTES DE LA DISPOSICIÓN FINAL Y RTA A SU COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0237-2024
30-12-2024 - CO-FJ-1280-317-2024	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No29
30-12-2024 - CO-FJ-1280-318-2024	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0244-2024 APROBACIÓN INSPECTOR DE APOYO
02-01-2025 - CO-FJ-1280-001-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A COMUNICADO (RETIRO DE POLARIZADOS OFICINA DIRECCION REGIONAL)
02-01-2025 - CO-FJ-1280-002-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN - SOLICITUD DE INFORME DEL MANTENIMIENTO REALIZADO A ALA BANDA TRANSPORTADORA
02-01-2025 - CO-FJ-1280-003-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Mantenimiento del filtro del tanque de suministro de combustible)
03-01-2025 - CO-FJ-1280-004-2024	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0248-2024 - ENTREGA HOJA DE VIDA INSPECTORA SST
03-01-2025 - CO-FJ-1280-006-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN DE LA SOLICITUDES No. 05-12-2024 - CO-FJ-1280-262-2024 Y 20-12-2024 - CO-FJ-1280-294-2024. (PROPUESTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED SANITARIA DE LA SALA DE LL
04-01-2025 - CO-FJ-1280-007-2024	VILLAVICENCIO - REVISIÓN DOCUMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO DEL DÍA 10.12.2024

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

ENERO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO

NOMBRE	CARGO	29	30	31	1	2	3	4
		D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA		1	1		1	1	1
CARLOS ALBERTO AGUILAR YAYA	RESIDENTE DE OBRA		1	1		1	1	1
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA		1	1		1	1	1
LUZ MARINA BLANCO PÉREZ	INSPECTOR DE OBRA		1	1				
JHEYKSON BRAYAN LINARES PABÓN	INSPECTOR SST		1	1		1	1	1
JOSÉ EDGAR SALINAS MARTÍNEZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL							
JAVIER ANDRÉS VALENCIA CASTAÑEDA	TÉCNICO ELÉCTRICO		1	1		1	1	1
JORDI JESÚS GUEVARA RODRÍGUEZ	AYUDANTE ELÉCTRICO		1	1			1	1
CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ CASTILLO	OFICIAL DE OBRA							1
JOHN JAIRO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ	OFICIAL DE OBRA		1	1		1	1	1
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA		1	1		1	1	1
ALEX FERNANDO ANDRADE	OFICIAL DE OBRA		1	1		1	1	1
REYNALDO GUZMÁN GIRALDO	OFICIAL DE OBRA		1	1		1	1	1
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA	OFICIAL DE OBRA		1	1		1	1	1
JHON ALEJANDRO MONZÓN MEJÍA	OFICIAL DE OBRA		1	1		1	1	1
JHOJAN ESTIBEN TOVAR CUESTA	AYUDANTE DE OBRA		1	1		1	1	1
LUISA FERNANDA RUIZ RIVEROS	OPERARIA DE ASEO		1	1		1	1	1
JENNY JULAIDY PERDOMO SÁNCHEZ	OPERARIA DE ASEO		1	1				
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		0	16	16	0	13	14	15


PERSONAL DE INTERVENTORÍA


NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	29	30	31	1	2	3	4
			D	L	M	M	J	V	S
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA		1	1		1	1	1
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1		1	1	1
GUILLERMO SABOGAL CHAPARRO	86.062.565	RESIDENTE DE APOYO INTERVENTORIA		1	1		1	1	1
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVETORIA		1	1		1	1	1
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			0	4	4	0	4	4	4

DÍA	INTERVENTORÍA	OBRA	TOTAL
DOMÍNGO			
LUNES	4	16	20
MARTES	4	16	20
MIERCOLES	0	0	0
JUEVES	4	13	17
VIERNES	4	14	18
SÁBADO	4	15	19

EQUIPOS EN OBRA: Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor.

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

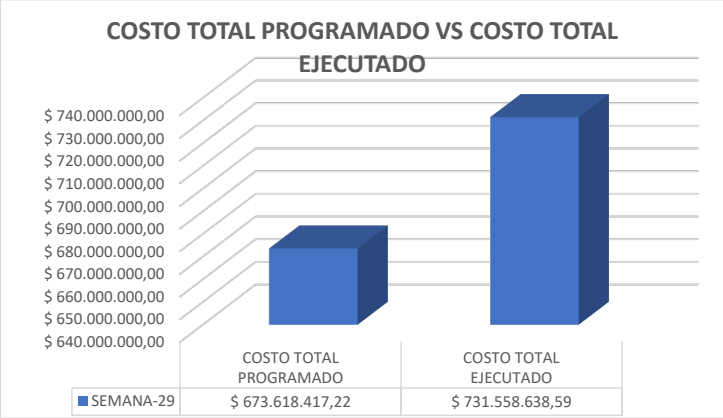

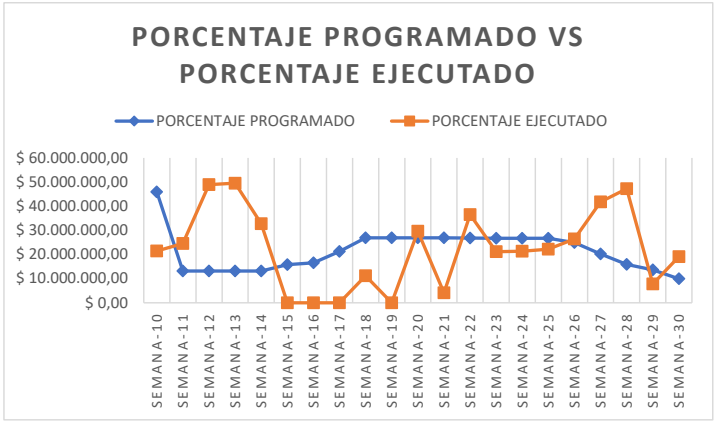

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total	AMORTIZACIÓN	%
ANTICIPO	**Entregado al contratista**	$ 305.869.421,00		
1	**Del 6 de jun al 31 de jul**	**$ 187.656.630,00**	**$ 30.025.061,00**	16,00%
2	Agosto	**$ 155.033.486,00**	$ 50.000.000,00	32,25%
3	Septiembre	**$ 78.800.698,00**	$ 25.789.421,00	32,73%
4	Octubre	**$ 70.812.436,00**	$ 35.000.000,00	49,43%
5	Noviembre	**$ 83.585.060,00**	$ 35.000.000,00	41,87%
6	Diciembre	**$ 410.217.392,00**	$ 130.054.939,00	31,70%
TOTAL ACUMULADO		$ 986.105.702,00	$ 305.869.421,00	

Valor Total Contrato Obra
$ 1.947.574.911,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 986.105.702,00
% Avance facturado Acumulado
50,63%

NOTA: Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento por un porcentaje equivalente al 50,63%. Equivalente a $ 986,105,702,70 millones de pesos.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	jun-24	$ 27.938.995,00
2	jul-24	$ 56.131.974,00
3	ago-24	$ 46.738.612,55
4	sep-24	$ 27.203.529,71
5	oct-24	$ 25.632.258,47
6	nov-24	$ 28.408.636,76
7	dic-24	$ 111.368.251,61
TOTAL ACUMULADO		$ 323.422.258,00

Valor Total Contrato Obra
$ 838.169.861,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 323.422.258,00
% Avance facturado Acumulado
38,59%

NOTA: Para la fecha del presente informe semanal, la interventoría presenta un avance financiero equivalente a $ 323,422,258,00 con un porcentaje de 38,59 %.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

GRUPOS ELECTRÓGENOS



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del filtro del tanque de suministro de combustible de las plantas de los grupos electrógenos
1	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del filtro del tanque de suministro de combustible de las plantas de los grupos electrógenos
2	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del filtro del tanque de suministro de combustible de las plantas de los grupos electrógenos
3	

GRUPOS ELECTRÓGENOS



No. FOTO	Se realiza inspección del estado de los filtros, de las plantas de los grupos electrógenos
4	



No. FOTO	Se realiza inspección del estado de los filtros, de las plantas de los grupos electrógenos
5	



No. FOTO	Se realiza inspección del estado de los filtros, de las plantas de los grupos electrógenos
6	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

GRUPOS ELECTRÓGENOS



No. FOTO	Se realiza inspección del estado de la trampa de grasas, en la planta de los grupos electrógenos
7	



No. FOTO	Se realiza inspección del estado de la trampa de grasas, en la planta de los grupos electrógenos
8	



No. FOTO	Se realiza inspección del estado de la trampa de grasas, en la planta de los grupos electrógenos
9	

INSTALACIÓN DE LA VALLA INFORMATIVA



No. FOTO	Se realiza la instalación de la valla informativa del contrato de obra No. 23001163 H4 de 2023
10	



No. FOTO	Se realiza la instalación de la valla informativa del contrato de obra No. 23001163 H4 de 2023
11	



No. FOTO	Se realiza la instalación de la valla informativa del contrato de obra No. 23001163 H4 de 2023
12	

OFICINA DE AIM



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de las oficinas de AIM. Mantenimiento de pintura de muros y perfiles metálicos, mantenimiento de humedades.
13	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de las oficinas de AIM. Mantenimiento de pintura de muros y perfiles metálicos, mantenimiento de humedades.
14	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de las oficinas de AIM. Mantenimiento de pintura de muros y perfiles metálicos, mantenimiento de humedades.
15	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

SALA LLEGADA DE PASAJEROS - ALFA 7



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del orificio del muro, mantenimiento de humedades y pintura de muros
16	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del orificio del muro, mantenimiento de humedades y pintura de muros
17	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del orificio del muro, mantenimiento de humedades y pintura de muros
18	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de inodoro en la sala de abordaje No.2
19	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de inodoro en la sala de abordaje No.2
20	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de inodoro en la sala de abordaje No.2
21	

ARREGLO HIDRAULICO FACHADA LADO NORTE



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de tubería rota en la fachada norte del terminal
22	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de tubería rota en la fachada norte del terminal
23	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de tubería rota en la fachada norte del terminal
24	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

VISITA PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO DEL TANQUE DE SUMINISTRO DE LOS CARROS DE BOMBEROS



No. FOTO	Se realiza visita de campo para el levantamiento de las cantidades para realizar el mantenimiento del tanque de almacenamiento de agua de bomberos
25	



No. FOTO	Se realiza visita de campo para el levantamiento de las cantidades para realizar el mantenimiento del tanque de almacenamiento de agua de bomberos
26	




No. FOTO	Se realiza visita de campo para el levantamiento de las cantidades para realizar el mantenimiento del tanque de almacenamiento de agua de bomberos
27	

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE



No. FOTO	Participación en las charlas de seguridad
28	

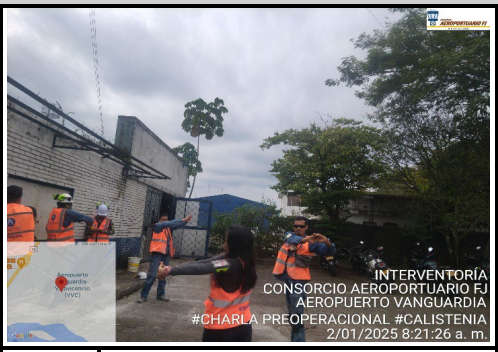

No. FOTO	Participación en la realización de ejercicios de calistenia antes de inicio de actividades
29	



No. FOTO	Se solicitó al contratista delimitar el área de acopio temporal de residuos; de construcción y demolición y los peligrosos y atendieron a la solicitud.
30	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE







No. FOTO		No. FOTO		No. FOTO	
31	Inspección al campamento para verificar que el punto ecológico cuente con la respectiva segregación de residuos. Se comprobó que los contenedores estuvieran	32	Inspección al campamento para verificar que el punto de hidratación esté en condiciones higiénicas. Se comprobó que el área estuviera limpia, con agua potable disponible y en envases adecuados, asegurando su fácil acceso y correcta conservación.	33	Inspección de la rotulación de los productos químicos. Se solicitó al contratista rotular este producto químico y atendieron a la solicitud

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE







No. FOTO		No. FOTO		No. FOTO	
34	Inspección de áreas intervenidas. Se verificó que el trabajador no cuenta con guantes de caucho para la labor de limpieza y no estaba bien señalizada el área. Se solicita al contratista atender a estos hallazgos	35	Se evidencia cierre de hallazgo en delimitary señalizar el área intervenida para la actividad de limpieza	36	Se evidencia cierre de hallazgo de entrega de elemento de protección individual; guantes de caucho para la labor de limpieza.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Siete	(07)	días del mes de	Enero	de	2025
(Día en letras)	(Día en Números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

Sandra Yonaira Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

PRESUPUESTO CON MAYORES Y MENORES

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CAT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						+	-		
	1			**MAMPOSTERIA**								
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	$ 38.916,00	$ 2.334.960,00	0	-20	$ 40,00	$1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	$ 30.706,00	$ 1.842.360,00	0	0	$ 60,00	$1.842.360,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	$ 26.258,00	$ 3.938.700,00	0	0	$ 150,00	$3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	$ 38.490,00	$ 76.306.425,00	0	0	$ 1.982,50	$76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	$ 29.591,00	$ 29.324.681,00	0	0	$ 991,00	$29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	$ 15.640,00	$ 37.536.000,00	0	0	$ 2.400,00	$37.536.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	$ 66.017,00	$ 3.895.003,00	0		$ 59,00	$3.895.003,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	$ 33.550,00	$ 1.342.000,00	0		$ 40,00	$1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	$ 1.841,00	$ 736.400,00	0	0	$ 400,00	$736.400,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	$ 27.292,00	$ 42.657.298,00	0	0	$ 1.563,00	$42.657.297,75
Subtotal								**$ 199.913.827,00**				**$ 199.135.506,75**
	2			**PISOS**								
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	$ 20.128,00	$ 14.089.600,00	0	-300	$ 400,00	$8.051.200,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	$ 86.865,00	$ 9.989.475,00	0		$ 115,00	$9.989.475,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO)	M2	38,00	$ 175.568,00	$ 6.671.584,00	0	-37	$ 1,00	$175.568,00
Subtotal								**$ 30.750.659,00**				**$ 18.216.243,00**
	3			**CUBIERTA Y CIELORASO**							$ -	
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO;NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	$ 480.205,00	$ 11.524.920,00	0	0	$ 24,00	$11.524.920,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	$ 89.881,00	$ 44.041.690,00	0	0	$ 490,00	$44.041.690,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	$ 140.472,00	$ 68.831.280,00	0	-300	$ 190,00	$26.689.680,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	$ 89.781,00	$ 33.039.408,00	0		$ 368,00	$33.039.408,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	$ 28.249,00	$ 2.824.900,00	0	0	$ 100,00	$2.824.900,00
Subtotal								**$ 160.262.198,00**				**$ 118.120.598,00**
	4			**CARPINTERIA METÁLICA**								
19	4.1		4.1	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	$ 451.209,00	$ 2.256.045,00	0		$ 5,00	$2.256.045,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSINAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	$ 17.857,00	$ 5.357.100,00	200	0	$ 500,00	$8.928.500,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	$ 22.736,00	$ 4.547.200,00	0	0	$ 200,00	$4.547.200,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACREO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	$ 83.129,00	$ 6.816.578,00	0	0	$ 82,00	$6.816.578,00
Subtotal								**$ 18.976.923,00**				**$ 22.548.323,00**
	5			**CARPINTERIA MADERA**								
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	$ 476.557,00	$ 3.335.899,00		-5	$ 2,00	$953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	$ 12.995,00	$ 2.011.626,00	0		$ 154,80	$2.011.626,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	$ 38.231,00	$ 2.959.079,00	0		$ 77,40	$2.959.079,40
Subtotal								**$ 8.306.604,00**				**$ 5.923.819,40**
	6			**CRISTALERIA**								
26	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	$ 289.652,00	$ 14.482.600,00		-30	$ 20,00	$5.793.040,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	$ 84.356,00	$ 4.217.800,00		-50	$ -	$0,00
Subtotal								**$ 18.700.400,00**				**$ 5.793.040,00**
	7			**CANALETAS Y PORTACABLES**								
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	$ 61.879,00	$ 30.939.500,00		250	$ 750,00	$46.409.250,00
Subtotal								**$ 30.939.500,00**				**$ 46.409.250,00**
	8			**LIMPIEZA PROFUNDA**								
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	$ 9.054,00	$ 82.391.400,00	0		$ 9.100,00	$82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	$ 14.260,00	$ 87.342.500,00	0		$ 6.125,00	$87.342.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	$ 7.870,00	$ 11.805.000,00	0		$ 1.500,00	$11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	$ 627.943,00	$ 100.470.880,00	0		$ 160,00	$100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	$ 30.741,00	$ 293.365.667,00		-1000	$ 8.543,14	$262.624.666,74
Subtotal								**$ 575.375.447,00**				**$ 544.634.446,74**
	9			**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**								
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 61.126.435,00	$ 61.126.435,00	0		$ 1,00	$61.126.435,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	$ 22.193.560,00	$ 22.193.560,00	0		$ 1,00	$22.193.560,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 72.618.205,00	$ 72.618.205,00	0		$ 1,00	$72.618.205,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	$ 589.218,00	$ 14.141.232,00	0	-24	$ -	$0,00
Subtotal								**$ 170.079.432,00**				**$ 155.938.200,00**
	10			**MANO DE OBRA**								
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	$ 11.766.194,00	$ 352.985.820,00	0	0	$ 30,00	$352.985.820,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	$ 39.080,00	$ 18.758.400,00	200	0	$ 680,00	$26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	$ 36.074,00	$ 25.973.280,00	200	0	$ 920,00	$33.188.080,00
	SUBTOTAL				SUBTOTAL			**$ 397.717.500,00**				**$ 412.748.300,00**
							SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO	**$ 1.611.022.490,00**				**$ 1.529.467.726,89**
				IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 11.956.808,00			$ 0,19	$ 11.351.518,00
				SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)				**$ 1.622.979.298,00**				**$ 1.540.819.244,89**
	11			**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**								
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	$ 324.595.613,00	$ 324.595.613,00				$ 406.755.666,11
							TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**$ 324.595.613,00**				$ 406.755.666,11
				VALOR TOTAL				**$ 1.947.574.911,00**				**$ 1.947.574.911,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE				
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.							
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	20%				20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	3%				3%
NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.	**UTILIDAD**	**U=**	5%				5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	28%				28%

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29/12/2024 **Y EL** 4/01/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING.JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

| NOMBRE | DOCUMENTO | CARGO / FECHA | DICIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENERO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29/12/2024 **Y EL** 4/01/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JORGE BELTRAN


FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

FECHA		DICIEMBRE DE 2024 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																															ENERO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NOMBRE	**CARGO**	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1		1	1		1	1	1																												
CARLOS ALBERTO AGUILAR YAYA	RESIDENTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1		1	1		1	1																												
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1		1	1		1	1																												
LUZ MARINA BLANCO PÉREZ	INSPECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1		1	1																																
JHEYKSON BRAYAN LINARES PABÓN	INSPECTOR SST		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1		1	1		1	1	1																												
JOSÉ EDGAR SALINAS MARTÍNEZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL																																																																		
JAVIER ANDRÉS VALENCIA CASTAÑEDA	TÉCNICO ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1		1	1	1																												
JORDI JESÚS GUEVARA RODRÍGUEZ	AYUDANTE ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1						1	1		1	1			1	1																												
CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ CASTILLO	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1														1																												
JOHN JAIRO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ	OFICIAL DE OBRA									1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1						1	1		1	1		1	1	1																												
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1		1	1		1	1	1																												
ALEX FERNANDO ANDRADE	OFICIAL DE OBRA									1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1		1	1		1	1	1																												
REYNALDO GUZMÁN GIRALDO	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1		1	1		1	1	1																												
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1		1	1		1	1	1																												
JHON ALEJANDRO MONZÓN MEJÍA	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1		1	1	1																												
JHOJAN ESTIBEN TOVAR CUESTA	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1		1	1		1	1	1																												
LUISA FERNANDA RUIZ RIVEROS	OPERARIA DE ASEO		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1		1	1		1	1	1																												
JENNY JULAIDY PERDOMO SÁNCHEZ	OPERARIA DE ASEO		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1	1	1		1	1																																
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		0	15	15	15	15	15	15	0	15	13	17	17	17	17	0	17	17	17	17	17	17	0	2	2	0	14	16	16	0	16	16	0	13	14	15	0	0	0

			COSTO PROGRAMADO					EJECUTADO			
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL		COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	0%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 45.812.826,61	2,35%		$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 104.547.219,71	5,37%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 187.656.630,00	9,64%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 163.281.612,81	8,38%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 228.308.146,00	11,72%	$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	$ 222.016.005,91	11,40%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 265.699.525,00	13,64%	$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	$ 267.981.357,99	13,76%	$ 45.965.352,08	2,36%		$ 287.156.607,00	14,74%	$ 21.457.082,00	1,10%
11	S-11	25/08/2024	$ 281.112.033,16	14,43%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 311.702.916,00	16,00%	$ 24.546.309,00	1,26%
12	S-12	1/09/2024	$ 294.242.708,33	15,11%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 360.592.928,00	18,51%	$ 48.890.012,00	2,51%
13	S-13	8/09/2024	$ 307.373.383,50	15,78%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 410.140.963,98	21,06%	$ 49.548.035,98	2,54%
14	S-14	15/09/2024	$ 320.504.058,67	16,46%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 442.926.984,98	22,74%	$ 32.786.021,00	1,68%
15	S-15	22/09/2024	$ 336.339.384,58	17,27%	$ 15.835.325,91	0,81%		$ 442.926.984,98	22,74%	$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	$ 352.937.560,70	18,12%	$ 16.598.176,12	0,85%		$ 442.926.984,98	22,74%	$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	$ 374.247.028,83	19,22%	$ 21.309.468,13	1,09%		$ 442.926.984,98	22,74%	$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	$ 401.170.505,98	20,60%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 454.131.652,98	23,32%	$ 11.204.668,00	0,58%
19	S-19	20/10/2024	$ 428.093.983,13	21,98%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 454.131.652,98	23,32%	$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	$ 455.017.460,28	23,36%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 483.789.118,28	24,84%	$ 29.657.465,30	1,52%
21	S-21	3/11/2024	$ 481.940.937,43	24,75%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 487.894.509,28	25,05%	$ 4.105.391,00	0,21%
22	S-22	10/11/2024	$ 508.770.878,31	26,12%	$ 26.829.940,88	1,38%		$ 524.419.295,68	26,93%	$ 36.524.786,40	1,88%
23	S-23	17/11/2024	$ 535.533.086,04	27,50%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 545.556.406,80	28,01%	$ 21.137.111,12	1,09%
24	S-24	24/11/2024	$ 562.295.293,77	28,87%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 566.896.970,71	29,11%	$ 21.340.563,91	1,10%
25	S-25	1/12/2024	$ 589.057.501,50	30,25%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 589.098.777,27	30,25%	$ 22.201.806,56	1,14%
26	S-26	8/12/2024	$ 613.961.736,22	31,52%	$ 24.904.234,72	1,28%		$ 615.584.827,27	31,61%	$ 26.486.050,00	1,36%
27	S-27	15/12/2024	$ 634.212.216,92	32,56%	$ 20.250.480,70	1,04%		$ 657.384.921,59	33,75%	$ 41.800.094,32	2,15%
28	S-28	22/12/2024	$ 650.072.944,39	33,38%	$ 15.860.727,47	0,81%		$ 704.656.500,59	36,18%	$ 47.271.579,00	2,43%
29	S-29	29/12/2024	$ 663.682.314,47	34,08%	$ 13.609.370,08	0,70%		$ 712.429.817,59	36,58%	$ 7.773.317,00	0,40%
30	S-30	5/01/2025	$ 673.618.417,22	34,59%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 731.558.638,59	37,56%	$ 19.128.821,00	0,98%
31	S-31	12/01/2025	$ 683.554.519,97	35,10%	$ 9.936.102,75	0,51%					
32	S-32	19/01/2025	$ 693.490.622,72	35,61%	$ 9.936.102,75	0,51%					
33	S-33	26/01/2025	$ 703.766.316,78	36,14%	$ 10.275.694,06	0,53%					
34	S-34	2/02/2025	$ 714.137.793,00	36,67%	$ 10.371.476,22	0,53%					
35	S-35	9/02/2025	$ 724.265.806,04	37,19%	$ 10.128.013,04	0,52%					
36	S-36	16/02/2025	$ 731.593.992,49	37,56%	$ 7.328.186,45	0,38%					
37	S-37	23/02/2025	$ 738.922.178,94	37,94%	$ 7.328.186,45	0,38%					
38	S-38	2/03/2025	$ 757.980.970,75	38,92%	$ 19.058.791,81	0,98%					
39	S-39	9/03/2025	$ 796.179.171,30	40,88%	$ 38.198.200,55	1,96%					
40	S-40	16/03/2025	$ 835.853.763,56	42,92%	$ 39.674.592,26	2,04%					
41	S-41	23/03/2025	$ 876.597.467,07	45,01%	$ 40.743.703,51	2,09%					
42	S-42	30/03/2025	$ 917.341.170,58	47,10%	$ 40.743.703,51	2,09%					
43	S-43	6/04/2025	$ 931.369.380,59	47,82%	$ 14.028.210,01	0,72%					
44	S-44	13/04/2025	$ 941.787.649,20	48,36%	$ 10.418.268,61	0,53%					
45	S-45	20/04/2025	$ 952.206.592,93	48,89%	$ 10.418.943,73	0,53%					
46	S-46	27/04/2025	$ 962.842.934,88	49,44%	$ 10.636.341,95	0,55%					
47	S-47	4/05/2025	$ 972.624.266,23	49,94%	$ 9.781.331,35	0,50%					
48	S-48	11/05/2025	$ 980.098.488,48	50,32%	$ 7.474.222,25	0,38%					
49	S-49	18/05/2025	$ 994.922.494,90	51,09%	$ 14.824.006,42	0,76%					
50	S-50	25/05/2025	$ 1.015.068.758,81	52,12%	$ 20.146.263,91	1,03%					
51	S-51	1/06/2025	$ 1.035.215.022,72	53,15%	$ 20.146.263,91	1,03%					
52	S-52	8/06/2025	$ 1.055.361.286,63	54,19%	$ 20.146.263,91	1,03%					
53	S-53	15/06/2025	$ 1.075.507.550,54	55,22%	$ 20.146.263,91	1,03%					
54	S-54	22/06/2025	$ 1.095.383.369,94	56,24%	$ 19.875.819,40	1,02%					
55	S-55	29/06/2025	$ 1.114.027.164,38	57,20%	$ 18.643.794,44	0,96%					
56	S-56	6/07/2025	$ 1.132.670.958,82	58,16%	$ 18.643.794,44	0,96%					
57	S-57	13/07/2025	$ 1.151.314.753,26	59,12%	$ 18.643.794,44	0,96%					
58	S-58	20/07/2025	$ 1.171.281.482,43	60,14%	$ 19.966.729,17	1,03%					
59	S-59	27/07/2025	$ 1.192.206.198,82	61,21%	$ 20.924.716,39	1,07%					
60	S-60	3/08/2025	$ 1.209.634.483,11	62,11%	$ 17.428.284,29	0,89%					
61	S-61	10/08/2025	$ 1.226.076.594,25	62,95%	$ 16.442.111,14	0,84%					
62	S-62	17/08/2025	$ 1.233.714.313,88	63,35%	$ 7.637.719,63	0,39%					
63	S-63	24/08/2025	$ 1.241.172.352,05	63,73%	$ 7.458.038,17	0,38%					
64	S-64	31/08/2025	$ 1.248.365.634,36	64,10%	$ 7.193.282,31	0,37%					
65	S-65	7/09/2025	$ 1.254.878.115,87	64,43%	$ 6.512.481,51	0,33%					
66	S-66	14/09/2025	$ 1.261.390.597,38	64,77%	$ 6.512.481,51	0,33%					
67	S-67	21/09/2025	$ 1.267.733.439,63	65,09%	$ 6.342.842,25	0,33%					
68	S-68	28/09/2025	$ 1.273.953.439,66	65,41%	$ 6.220.000,03	0,32%					
69	S-69	5/10/2025	$ 1.280.173.439,69	65,73%	$ 6.220.000,03	0,32%					
70	S-70	12/10/2025	$ 1.286.393.439,72	66,05%	$ 6.220.000,03	0,32%					

71	S-71	19/10/2025	$ 1.325.893.877,29	68,08%	$ 39.500.437,57	2,03%					
72	S-72	26/10/2025	$ 1.366.073.507,47	70,14%	$ 40.179.630,18	2,06%					
73	S-73	2/11/2025	$ 1.406.253.137,65	72,21%	$ 40.179.630,18	2,06%					
74	S-74	9/11/2025	$ 1.446.432.767,83	74,27%	$ 40.179.630,18	2,06%					
75	S-75	16/11/2025	$ 1.473.252.146,74	75,65%	$ 26.819.378,91	1,38%					
76	S-76	23/11/2025	$ 1.485.874.113,84	76,29%	$ 12.621.967,10	0,65%					
77	S-77	30/11/2025	$ 1.498.696.083,31	76,95%	$ 12.821.969,47	0,66%					
78	S-78	7/12/2025	$ 1.511.518.052,78	77,61%	$ 12.821.969,47	0,66%					
79	S-79	14/12/2025	$ 1.524.340.022,25	78,27%	$ 12.821.969,47	0,66%					
80	S-80	21/12/2025	$ 1.533.088.604,89	78,72%	$ 8.748.582,64	0,45%					
81	S-81	28/12/2025	$ 1.541.349.091,56	79,14%	$ 8.260.486,67	0,42%					
82	S-82	4/01/2026	$ 1.547.764.734,78	79,47%	$ 6.415.643,22	0,33%					
83	S-83	11/01/2026	$ 1.554.180.378,00	79,80%	$ 6.415.643,22	0,33%					
84	S-84	18/01/2026	$ 1.561.147.319,89	80,16%	$ 6.966.941,89	0,36%					
85	S-85	25/01/2026	$ 1.569.039.773,60	80,56%	$ 7.892.453,71	0,41%					
86	S-86	1/02/2026	$ 1.577.169.941,22	80,98%	$ 8.130.167,62	0,42%					
87	S-87	8/02/2026	$ 1.585.066.137,73	81,39%	$ 7.896.196,51	0,41%					
88	S-88	15/02/2026	$ 1.592.896.342,39	81,79%	$ 7.830.204,66	0,40%					
89	S-89	22/02/2026	$ 1.600.740.077,38	82,19%	$ 7.843.734,99	0,40%					
90	S-90	1/03/2026	$ 1.608.739.411,11	82,60%	$ 7.999.333,73	0,41%					
91	S-91	8/03/2026	$ 1.616.532.746,82	83,00%	$ 7.793.335,71	0,40%					
92	S-92	15/03/2026	$ 1.625.499.763,32	83,46%	$ 8.967.016,50	0,46%					
93	S-93	22/03/2026	$ 1.637.498.649,21	84,08%	$ 11.998.885,89	0,62%					
94	S-94	29/03/2026	$ 1.649.771.243,75	84,71%	$ 12.272.594,54	0,63%					
95	S-95	5/04/2026	$ 1.664.573.433,63	85,47%	$ 14.802.189,88	0,76%					
96	S-96	12/04/2026	$ 1.680.566.021,32	86,29%	$ 15.992.587,69	0,82%					
97	S-97	19/04/2026	$ 1.696.558.609,01	87,11%	$ 15.992.587,69	0,82%					
98	S-98	26/04/2026	$ 1.704.432.501,33	87,52%	$ 7.873.892,32	0,40%					
99	S-99	3/05/2026	$ 1.712.140.705,99	87,91%	$ 7.708.204,66	0,40%					
100	S-100	10/05/2026	$ 1.721.817.914,73	88,41%	$ 9.677.208,74	0,50%					
101	S-101	17/05/2026	$ 1.736.558.276,80	89,17%	$ 14.740.362,07	0,76%					
102	S-102	24/05/2026	$ 1.751.298.638,87	89,92%	$ 14.740.362,07	0,76%					
103	S-103	31/05/2026	$ 1.766.039.000,94	90,68%	$ 14.740.362,07	0,76%					
104	S-104	7/06/2026	$ 1.774.935.235,23	91,14%	$ 8.896.234,29	0,46%					
105	S-105	14/06/2026	$ 1.781.081.291,74	91,45%	$ 6.146.056,51	0,32%					
106	S-106	21/06/2026	$ 1.787.227.348,25	91,77%	$ 6.146.056,51	0,32%					
107	S-107	28/06/2026	$ 1.793.373.404,76	92,08%	$ 6.146.056,51	0,32%					
108	S-108	5/07/2026	$ 1.799.519.461,27	92,40%	$ 6.146.056,51	0,32%					
109	S-109	12/07/2026	$ 1.805.665.517,78	92,71%	$ 6.146.056,51	0,32%					
110	S-110	19/07/2026	$ 1.811.811.574,29	93,03%	$ 6.146.056,51	0,32%					
111	S-111	26/07/2026	$ 1.817.957.630,80	93,34%	$ 6.146.056,51	0,32%					
112	S-112	2/08/2026	$ 1.824.103.687,31	93,66%	$ 6.146.056,51	0,32%					
113	S-113	9/08/2026	$ 1.830.249.743,82	93,98%	$ 6.146.056,51	0,32%					
114	S-114	16/08/2026	$ 1.836.395.800,33	94,29%	$ 6.146.056,51	0,32%					
115	S-115	23/08/2026	$ 1.842.541.856,84	94,61%	$ 6.146.056,51	0,32%					
116	S-116	30/08/2026	$ 1.848.687.913,35	94,92%	$ 6.146.056,51	0,32%					
117	S-117	6/09/2026	$ 1.854.833.969,86	95,24%	$ 6.146.056,51	0,32%					
118	S-118	13/09/2026	$ 1.860.980.026,37	95,55%	$ 6.146.056,51	0,32%					
119	S-119	20/09/2026	$ 1.867.126.082,88	95,87%	$ 6.146.056,51	0,32%					
120	S-120	27/09/2026	$ 1.873.272.139,39	96,18%	$ 6.146.056,51	0,32%					
121	S-121	4/10/2026	$ 1.879.089.924,30	96,48%	$ 5.817.784,91	0,30%					
122	S-122	11/10/2026	$ 1.884.669.995,30	96,77%	$ 5.580.071,00	0,29%					
123	S-123	18/10/2026	$ 1.890.250.066,30	97,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
124	S-124	25/10/2026	$ 1.895.830.137,30	97,34%	$ 5.580.071,00	0,29%					
125	S-125	1/11/2026	$ 1.901.410.208,30	97,63%	$ 5.580.071,00	0,29%					
126	S-126	8/11/2026	$ 1.906.990.279,30	97,92%	$ 5.580.071,00	0,29%					
127	S-127	15/11/2026	$ 1.912.570.350,30	98,20%	$ 5.580.071,00	0,29%					
128	S-128	22/11/2026	$ 1.918.150.421,30	98,49%	$ 5.580.071,00	0,29%					
129	S-129	29/11/2026	$ 1.923.730.492,30	98,78%	$ 5.580.071,00	0,29%					
130	S-130	6/12/2026	$ 1.929.310.563,30	99,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
131	S-131	13/12/2026	$ 1.934.890.634,30	99,35%	$ 5.580.071,00	0,29%					
132	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 12.684.276,30	0,65%					
					$ 1.947.574.910,60	100%					

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón
	Directora de Interventoría.
	CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ
