AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL**			**FECHA:**	10-mar-25
Semana No	**39**	**DEL :**	2-mar-25	**AL:**	8-mar-25
Plazo Total	**25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)**	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		276	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**35,11%**			
Nombre del Supervisor :	**Jorge Beltrán Gómez**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO VANGUARDIA, DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado
(%) Programado:	1,96%	40,88%
($) Valor programado:	$ 38.198.200,55	$ 796.179.171,30

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado:	0,37%	44,84%
($) Valor ejecutado:	$ 7.182.080,00	$ 873.215.813,00

Evaluación:	Porcentaje Adelanto:	3,96%
	Valor Adelanto:	$ 77.036.641,70

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	Contratista:	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	Contrato No:	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	Valor Inicial:	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	Valor Actualizado al modificatorio :	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	Plazo inicial:	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS	Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS
Fecha de iniciación:	6-jun-24	Fecha de iniciación:	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	Fecha de vencimiento:	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	Valor total actual del contrato:	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

EL DÍA VIERNES 28-02-25 SE REALIZA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 37

"actividades realizadas en obra del (23 de febrero al 01 de marzo del 2025)

• POLICIA AEROPORTUARIA:
- Se continúan las actividades de mantenimiento de pintura de muros, mantenimiento de humedades, mantenimiento de puertas y perfiles metálicos, mantenimiento de cielo raso.

FOSOS DE ASCENSORES:
- Se realiza el mantenimiento de guarda escobas, para evitar las filtraciones de agua a los fosos.

• GRUPO ELECTRÓGENO:
- Se realiza la inspección de las plantas, revisión de los filtros y niveles de combustible.
- Se realiza el mantenimiento del filtro del tanque de suministro de combustible a las plantas de los grupos electrógenos.

• ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES:
- Se realiza el mantenimiento de inodoro tapado en los baños públicos del primer piso.
- Se realiza el destaponamieno del lavamanos del baño para hombres de la sala de abordaje No.02.
- Se atiende la eventualidad con el fluido eléctrico en sanidad aeroportuaria.

SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO

04-03-2025 - SOLICITUD COLABORACIÓN REVISIÓN DE FALLA DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA INSPECTORES - FALLA AA OFICINA VVC - GRUPO DE CONTROL Y SEGURIDAD.
05-03-2025 - REQUERIMIENTO INSUMOS PARA LA OPERACIÓN, SISTEMA DE ENERGÍA - TRANSFERENCIA.
05-03-2025 - SISTEMAS DE ENERGÍA-GRUPOS ELECTRÓGENOS RADIADOR GE#1
05-03-2025 - DAÑO AIRE ACONDICIONADO - SANIDAD VVC.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN

BOMBEROS: PENDIENTE DE HABILITACION DE TRABAJOS EN ALTURAS
- Solicitud de mantenimiento del punto de abastecimiento de los carros de bomberos. (27/11/2024)
- Cambio de cubierta. (05/12/2024)

SALA DE LLEGADA DE PASAJEROS ALFA - 7: PENDIENTE DE PROGRAMACIÓN
- Solicitud de mantenimiento de los baños de la sala de llegada de pasajeros (05/12/2024)

GRUPOS ELECTRÓGENOS: PENDIENTE DE PROGRAMACIÓN
- mantenimiento del tanque de suministro de combustible de los grupos electrógenos. (15/11/2024)
- puesta en funcionamiento de las cámaras (27/11/2024)
- mantenimiento de la trampa de grasas (15/11/2024**)**

SALÓN PRINCIPAL DEL AEROPUERTO: PENDIENTE DE PROGRAMACIÓN
- mantenimiento y limpieza de todos los vidrios del salón principal. (28/11/2024)

CUBIERTA DE LA TERMINAL AÉREA: PENDIENTE DE PROGRAMACIÓN
- mantenimiento de pintura de las tejas de la cubierta de la terminal aérea. (15/11/2024)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

*La interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m. Se realiza el comunicado de revisión de la documentación de ingreso del ayudante eléctrico Michael Rubio, en donde validamos y constatamos que no puede ejecutar actividades en alturas, ya que las recomendaciones médicas contraindican el trabajo en alturas. El concepto de actitud establece una restricción absoluta para este tipo de actividades. Se lleva a cabo también una inspección en campo para verificar el diligenciamiento de los formatos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido.

*La interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m. Participamos en la charla de seguridad y la sesión de calistenia, dirigidas por el contratista de obra. Se realiza la verificación de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo los permisos de trabajo, ATS, preoperacionales y los reportes de condiciones de salud. Durante la revisión, se constata que la profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y la especialidad ambiental no asistieron. Además, se realiza la verificación de las áreas y se constata que aún no se ha entregado la dotación al personal operativo antiguo.

*La interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m. Participamos en la charla de seguridad y la sesión de calistenia, dirigidas por el contratista de obra. Se realiza la verificación de los formatos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, solicitando la entrega de los reportes semanales SST y los informes mensuales de febrero correspondientes a SST y medio ambiente. No se evidencia la presencia del Inspector SST del contratista de obra.

*La interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m. La interventoría hace presencia en el lugar de encuentro, donde se llevan a cabo las charlas de seguridad y la sesión de calistenia. Se observa la presencia de poco personal operativo, ya que tres de ellos se retiraron manifestando inconformismo debido al no pago salarial, quedando únicamente presente el técnico electricista. Se evidencia la no presencia del especialista ambiental. Se realiza la entrega formal al área SST de la región Oriente del procedimiento en caliente para obtener el certificado SST, requisito necesario para el permiso de trabajo en caliente. Además, se reitera la solicitud de entrega de la dotación faltante al personal operativo antiguo, requiriendo que esta se entregue a más tardar el día 7 de marzo.

*a interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m. Participamos en la charla y la sesión de calistenia dirigida por el contratista de obra. Se constató que solo la cuadrilla eléctrica se hizo presente en campo. Se llevó a cabo el comité de seguimiento de obra, en donde se abordaron temas de SSTA. Durante la reunión, se solicitó la entrega de la dotación pendiente del personal operativo, cuyo compromiso quedó establecido para el lunes 10 de marzo. También se solicitó la entrega de los informes de SST y ambiental, así como la subsanación de los hallazgos ambientales. Además, se requirió la entrega inmediata de la documentación del personal activo y retirado, cuyo compromiso quedó para antes del 8 de marzo y se solicitó la entrega de los soportes de planilla de seguridad social integral para el día viernes 14 de mayo, cuya fecha de vigencia debe ser cumplida.

*

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA	
FAO-CTO-23001163-0342-2025	EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD, ATENTAMENTE REMITO COPIA DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATISTAS JURÍDICOS SST 2024
FAO-CTO-23001163-0343-2025	RESPUESTA SOLICITUD CO-FJ-1280-094-2025 URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS. (Mantenimiento del foso del ascensor del salón principal)
FAO-CTO-23001163-0344-2025	ASUNTO Entrega informe técnico eléctrico grupo electrógenos
FAO-CTO-23001163-0346-2025	Asunto Entrega cotizaciones para el arreglo tarjeta aire acondicionado área sanidad, mantenimiento orinales baño segundo piso y mantenimiento válvu
FAO-CTO-23001163-0347-2025	Asunto entrega de Informe semanal No 37
FAO-CTO-23001163-0348-2025	Asunto Programación semana 38
FAO-CTO-23001163-0349-2025	Solicitud de autorización para la disposición de residuos ordinarios, orgánicos y reciclables en el punto de acopio temporal del aeropuerto
FAO-CTO-23001163-0350-2025	ENTREGA DE REPORTE SEMANAL DEL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FAO-CTO-23001163-0351-2025	Reporte semana 17 al 21 febrero- ambiental
FAO-CTO-23001163-0353-2025	SE COMPARTE LA REMISION DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATISTAS JURIDICOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS OTORGADO AL GRUPO FAO SAS
FAO-CTO-23001163-0354-2025	Asunto RESPUESTA AL COMUNICADO CO-FJ-1280-117-2025 “VILLAVICENCIO – NO APROBACIÓN DE COTIZACIÓN - RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-033
FAO-CTO-23001163-0355-2025	ENVIO DOCUMENTACION DE INGRESO DEL PERSONAL NUEVO
FAO-CTO-23001163-0356-2025	Asunto entrega cotización acometida red eléctrica área grupo electrógenos de la terminal aérea de Villavicencio
FAO-CTO-23001163-0357-2025	RESPUESTA AL COMUNICADO CO-FJ-1280-121-2025 (NO APROBACIÓN DE INGRESO DEL TECNÓLOGO ELÉCTRICO CIVIL)
FAO-CTO-23001163-0358-2025	ENTREGA DE MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS Y HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS ALMACENADOS EN LA BODEGA
FAO-CTO-23001163-0359-2025	ENTREGA DE DOCUMENTACION PERSONAL NUEVO – AYUDANTE ELECTRICO

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA

24-02-2025 - CO-FJ-1280-117-2025	VILLAVICENCIO - NO APROBACIÓN DE COTIZACIÓN - RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0338-2025
24-02-2025 - CO-FJ-1280-118-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS. (Mantenimiento de las bodegas)
24-02-2025 - CO-FJ-1280-119-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS. (Mantenimiento de los filtros de los grupos electrógenos)
24-02-2025 - CO-FJ-1280-120-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No37
25-02-2025 - CO-FJ-1280-121-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A SU COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0308-2024 (NO APROBACIÓN DE INGRESO DEL TECNÓLOGO ELÉCTRICO CIVIL)
26-02-2025 - CO-FJ-1280-122-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD ENTREGA INMEDIATA DE DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO
26-02-2025 - CO-FJ-1280-123-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Mantenimientos de los filtros de las plantas de los grupos electrógenos y tanque de suministro
26-02-2025 - CO-FJ-1280-124-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No4 MES SEPTIEMBRE 2024
27-02-2025 - CO-FJ-1280-125-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A SU COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0350-2025 REPORTE SEMANAL SST DEL 17 AL 22 DE FEBRERO 2025
27-02-2025 - CO-FJ-1280-126-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A SU COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0351-2025 REPORTE SEMANAL AMBIENTAL DEL 17 AL 22 DE FEBRERO 2025
27-02-2025 - CO-FJ-1280-127-2025	VILLAVICENCIO - TRASLADO DE SOLICITUD PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN EL AEROPUERTO VANGUARDIA
27-02-2025 - CO-FJ-1280-128-2025	VILLAVICENCIO - APROBACIÓN DE COTIZACIÓN BMA - RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN - FAO-CTO-23001163-0346-2025
28-02-2025 - CO-FJ-1280-129-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0353-2025 REVISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN SST PARA TRABAJOS EN ALTURAS
28-02-2025 - CO-FJ-1280-130-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA DE LA CERTIFICACIÓN SST PARA TRABAJOS EN ALTURAS CONTRATISTA GRUPO FAO
28-02-2025 - CO-FJ-1280-131-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0355-2025 REVISIÓN DOCUMENTACIÓN DE INGRESO PERSONAL OPERATIVO

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL DE OBRA

NOMBRE	CARGO	23	24	25	26	27	28	1
		D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
CARLOS ALBERTO AGUILAR YAYA	RESIDENTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
DIANA ALEJANDRA CAICEDO OSPINA	INSPECTOR SST		1	1	1	1	1	1
PAULA ANDREA RUIZ RODRÍGUEZ	PASANTE SST		1	1	1	1	1	1
JUDITH TERESA MEJIA LOZANO	ESPECIALISTA AMBIENTAL		1	1	1	1	1	1
JAVIER ANDRÉS VALENCIA CASTAÑEDA	TÉCNICO ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1
JOSE LUIS GUEVARA RODRÍGUEZ	AYUDANTE ELÉCTRICO		1	1	1	1		
MAYCOL MAURICIO RUBIO REINA	AYUDANTE ELÉCTRICO					1	1	1
URIEL ALEXANDER GONZÁLEZ CASTRO	MAESTRO DE OBRA				1	1	1	1
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
EIDER ALEXANDER TORRES SERNA	AYUDANTE DE OBRA				1	1	1	1
EDIT MER DURAN MADRID	AYUDANTE DE OBRA				1	1	1	1
LUISA FERNANDA RUIZ RIVEROS	OPERARIA DE ASEO		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		**0**	**11**	**11**	**14**	**15**	**14**	**14**


PERSONAL DE INTERVENTORÍA


NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	23	24	25	26	27	28	1
			D	L	M	M	J	V	S
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA		1	1	1	1	1	1
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
GUILLERMO SABOGAL CHAPARRO	86.062.565	RESIDENTE DE APOYO		1	1	1	1	1	1
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVETORIA		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			**0**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**

DÍA	INTERVENTORÍA	OBRA	TOTAL
DOMÍNGO			
LUNES	4	11	15
MARTES	4	11	15
MIERCOLES	4	14	18
JUEVES	4	15	19
VIERNES	4	14	18
SÁBADO	4	14	18

EQUIPOS EN OBRA: Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor.

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

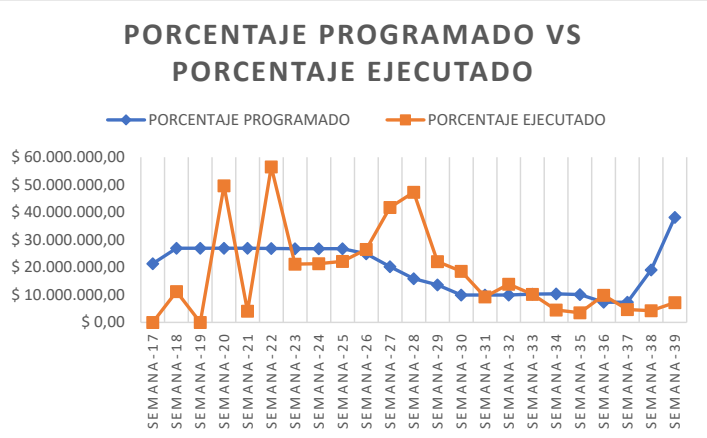

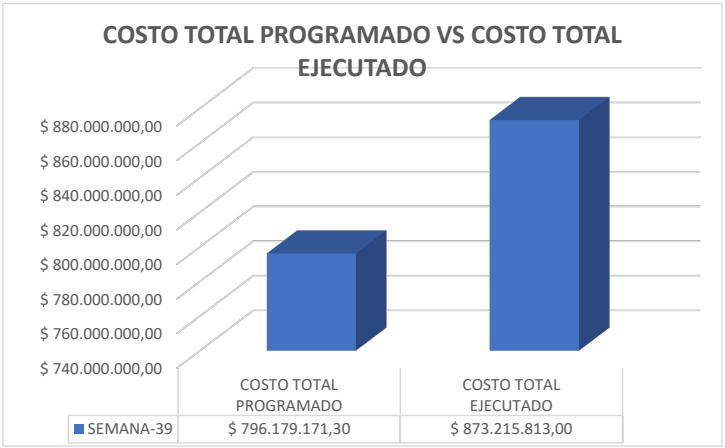

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total	AMORTIZACIÓN	%
ANTICIPO	Entregado al contratista	$ 305.869.421,00		
1	Del 6 de jun al 31 de jul	$ 187.656.630,00	$ 30.025.061,00	16,00%
2	Agosto	$ 155.033.486,00	$ 50.000.000,00	32,25%
3	Septiembre	$ 78.800.698,00	$ 25.789.421,00	32,73%
4	Octubre	$ 70.812.436,00	$ 35.000.000,00	49,43%
5	Noviembre	$ 83.585.060,00	$ 35.000.000,00	41,87%
6	Diciembre	$ 211.480.739,00	$ 65.000.000,00	30,74%
TOTAL ACUMULADO		$ 787.369.049,00	$ 240.814.482,00	

Valor Total Contrato Obra
$ 1.947.574.911,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 787.369.049,00
% Avance facturado Acumulado
40,43%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento por un porcentaje equivalente al 40,43%. Equivalente a $ 787,369,049,00 millones de pesos.

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	jun-24	$ 27.938.995,00
2	jul-24	$ 56.131.974,00
3	ago-24	$ 46.738.612,55
4	sep-24	$ 27.203.529,71
5	oct-24	$ 25.632.258,47
6	nov-24	$ 28.408.636,76
7	dic-24	$ 60.909.810,00
TOTAL ACUMULADO		$ 272.963.816,00

Valor Total Contrato Interventoría
$ 838.169.861,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 272.963.816,00
% Avance facturado Acumulado
32,57%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, la interventoría presenta un avance financiero equivalente a $ 272.963.816,00 con un porcentaje de 32,57 %.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

GRUPOS ELECTRÓGENOS



No. FOTO	Se realiza inspección del estado de los filtros de las plantas de los grupos electrógenos
1	



No. FOTO	Se verifica el estado de los filtros del tanque de suministro de combustible, a los grupos electrógenos.
2	



No. FOTO	Se verifica el estado de los filtros de las plantas de los grupos electrógenos.
3	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

OFICINAS DE POLICÍA AEROPORTUARIA



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del enchape del piso del pasillo principal de la policía aeroportuaria
4	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del enchape del piso del pasillo principal de la policía aeroportuaria
5	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del enchape del piso del pasillo principal de la policía aeroportuaria
6	

OFICINAS DE POLICÍA AEROPORTUARIA



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del mesón en el área de servicio de la policía aeroportuaria
7	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del enchape y pintura en vinilo
8	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de la pintura de la puertas y perfiles metálicos
9	

MANTENIMIENTO DE LA GARITA DE ALFA 8



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de la garita de vigilancia en el filtro de alfa 8
10	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de la garita de vigilancia en el filtro de alfa 8
11	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de la garita de vigilancia en el filtro de alfa 8
12	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32


ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de la huedad presentada en la sala VIP
13	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de la huedad presentada en la sala VIP
14	

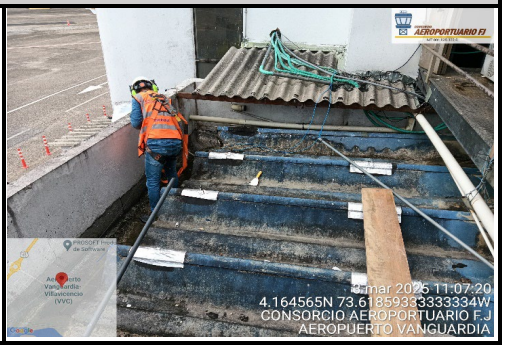

No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de la huedad presentada en la sala VIP
15	

ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de la fuga presentada en el baño de la sala de abordaje No.02
16	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de la fuga presentada en el baño de la sala de abordaje No.02
17	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de la fuga presentada en el baño de la sala de abordaje No.02
18	

ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del aire acondicionado del cuarto de medicamentos de sanidad
19	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del aire acondicionado del cuarto de medicamentos de sanidad
20	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del aire acondicionado del cuarto de medicamentos de sanidad
21	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES

		
No. FOTO 22 — Se realiza el mantenimiento de los orinales del baño público del segundo piso	**No. FOTO** 23 — Se realiza el mantenimiento de los orinales del baño público del segundo piso	**No. FOTO** 24 — Se realiza el mantenimiento de los orinales del baño público del segundo piso

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

		
No. FOTO 25 — Participación en las charlas de seguridad	**No. FOTO** 26 — Participación en la realización de ejercicios de calistenia antes de inicio de actividades	**No. FOTO** 27 — Inspección; validando los formatos del SGSST antes de inicio de actividades

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

		
No. FOTO 28 — Inspección; validando los formatos del SGSST en campo	**No. FOTO** 29 — Inspección del uso de elementos de protección individual acorde a la actividad	**No. FOTO** 30 — Inspección de dotación y EPI personal nuevo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Diez	(10)	días del mes de	Marzo	de	2025
(Día en letras)	(Día en Números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

Sandra Yonaira Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 2

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	1			**MAMPOSTERIA**								
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	$ 38.916,00	$ 2.334.960,00		-20,00	40,00	$ 1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	$ 30.706,00	$ 1.842.360,00	50,00		110,00	$ 3.377.660,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	$ 26.258,00	$ 3.938.700,00			150,00	$ 3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	$ 38.490,00	$ 76.306.425,00			1982,50	$ 76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	$ 29.591,00	$ 29.324.681,00			991,00	$ 29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	$ 15.640,00	$ 37.536.000,00		-700,00	1700,00	$ 26.588.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	$ 66.017,00	$ 3.895.003,00	44,50		103,50	$ 6.832.760,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	$ 33.550,00	$ 1.342.000,00			40,00	$ 1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	$ 1.841,00	$ 736.400,00	3700,00		4100,00	$ 7.548.100,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	$ 27.292,00	$ 42.657.298,00			1563,00	$ 42.657.298,00
Subtotal								**$ 199.913.827,00**				**$ 199.472.264,00**
	2			**PISOS**								
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	$ 20.128,00	$ 14.089.600,00		-650,00	50,00	$ 1.006.400,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	$ 86.865,00	$ 9.989.475,00		-65,00	50,00	$ 4.343.250,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO)	M2	38,00	$ 175.568,00	$ 6.671.584,00		-37,00	1,00	$ 175.568,00
Subtotal								**$ 30.750.659,00**				**$ 5.525.218,00**
	3			**CUBIERTA Y CIELORASO**								
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO;NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	$ 480.205,00	$ 11.524.920,00		-12,00	12,00	$ 5.762.460,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	$ 89.881,00	$ 44.041.690,00		-130,00	360,00	$ 32.357.160,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	$ 140.472,00	$ 68.831.280,00		-428,25	61,75	$ 8.674.146,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	$ 89.781,00	$ 33.039.408,00		-359,60	8,40	$ 754.160,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	$ 28.249,00	$ 2.824.900,00		-90,00	10,00	$ 282.490,00
Subtotal								**$ 160.262.198,00**				**$ 47.830.416,00**
	4			**CARPINTERIA METÁLICA**								
19	4.1		4.1	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	$ 451.209,00	$ 2.256.045,00		-3,00	2,00	$ 902.418,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSIANAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	$ 17.857,00	$ 5.357.100,00	3500,00		3800,00	$ 67.856.600,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	$ 22.736,00	$ 4.547.200,00		-110,00	90,00	$ 2.046.240,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACREO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	$ 83.129,00	$ 6.816.578,00	40,58		122,58	$ 10.189.953,00
Subtotal								**$ 18.976.923,00**				**$ 80.995.211,00**
	5			**CARPINTERIA MADERA**								
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	$ 476.557,00	$ 3.335.899,00		-5,00	2,00	$ 953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	$ 12.995,00	$ 2.011.626,00		-50,00	104,80	$ 1.361.876,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	$ 38.231,00	$ 2.959.079,00			77,40	$ 2.959.079,00
Subtotal								**$ 8.306.604,00**				**$ 5.274.069,00**
	6			**CRISTALERIA**								
26	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/0 PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	$ 289.652,00	$ 14.482.600,00		-50,00	-	$ 0,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	$ 84.356,00	$ 4.217.800,00		-50,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 18.700.400,00**				**$ 0,00**
	7			**CANALETAS Y PORTACABLES**								
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	$ 61.879,00	$ 30.939.500,00		-490,00	10,00	$ 618.790,00
Subtotal								**$ 30.939.500,00**				**$ 618.790,00**

licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-1	**Versión**	3

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 2

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	8			**LIMPIEZA PROFUNDA**								
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	$ 9.054,00	$ 82.391.400,00		0,00	9100,00	$ 82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	$ 14.260,00	$ 87.342.500,00		-2000,00	4125,00	$ 58.822.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	$ 7.870,00	$ 11.805.000,00			1500,00	$ 11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	$ 627.943,00	$ 100.470.880,00			160,00	$ 100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	$ 30.741,00	$ 293.365.667,00		-1435,77	8107,37	$ 249.228.771,00
Subtotal								**$ 575.375.447,00**				**$ 502.718.551,00**
	9			**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**								
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 61.126.435,00	$ 61.126.435,00		-0,50	0,50	$ 30.563.218,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	$ 22.193.560,00	$ 22.193.560,00	1,00	0,00	2,00	$ 44.387.120,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 72.618.205,00	$ 72.618.205,00		-0,25	0,75	$ 54.463.654,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	$ 589.218,00	$ 14.141.232,00		-24,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 170.079.432,00**				**$ 129.413.992,00**
	10			**MANO DE OBRA**								
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	$ 11.766.194,00	$ 352.985.820,00		-4,00	26,00	$ 305.921.044,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	$ 39.080,00	$ 18.758.400,00	200,00		680,00	$ 26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	$ 36.074,00	$ 25.973.280,00	1963,00		2683,00	$ 96.786.542,00
Subtotal								**$ 397.717.500,00**				**$ 429.281.986,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 1.611.022.490,00**				**$ 1.401.130.497,00**
				IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 11.956.808,00			0,19	**$ 10.399.015,00**
				SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)				**$ 1.622.979.298,00**				**$ 1.411.529.512,00**
	11			**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**								
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	$ 324.595.613,00	$ 324.595.613,00				$ 536.045.399,00
							TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**$ 324.595.613,00**				**$ 536.045.399,00**
				VALOR TOTAL				**$ 1.947.574.911,00**				**$ 1.947.574.911,00**

	DESCRIPCION			PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.				
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**		20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**		3%
NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.	**UTILIDAD**	**U=**		5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**		28%

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA
CC 79556358
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FAO SAS

SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
CC 63359726
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02/03/2025 **Y EL** 8/03/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING.JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FECHA	FEBRERO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																									MARZO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																									
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																									
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVETORIA		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																									
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA				**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02/03/2025 **Y EL** 8/03/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

FECHA		FEBRERO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																										MARZO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NOMBRE	**CARGO**	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																								
CARLOS ALBERTO AGUILAR YAYA	RESIDENTE DE OBRA	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																								
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																								
DIANA ALEJANDRA CAICEDO OSPINA	INSPECTOR SST	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1			1	1	1																								
PAULA ANDREA RUIZ RODRÍGUEZ	PASANTE SST										1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1																								
JUDITH TERESA MEJIA LOZANO	ESPECIALISTA AMBIENTAL			1	1	1	1							1					1			1			1	1	1	1	1			1		1		1																								
JAVIER ANDRÉS VALENCIA CASTAÑEDA	TÉCNICO ELÉCTRICO	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																								
MAYCOL MAURICIO RUBIO REINA	AYUDANTE ELÉCTRICO																											1	1			1	1	1		1	1																								
YEISON FERNANDO BETANCUR AYALA	AYUDANTE ELÉCTRICO																																			1	1																								
URIEL ALEXANDER GONZÁLEZ CASTRO	MAESTRO DE OBRA																										1	1	1	1																														
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1																								
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA	OFICIAL DE OBRA	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1																								
EIDER ALEXANDER TORRES SERNA	AYUDANTE DE OBRA																										1	1	1	1	1																												
EDIT MER DURAN MADRID	AYUDANTE DE OBRA																										1	1	1	1	1																												
LUISA FERNANDA RUIZ RIVEROS	OPERARIA DE ASEO	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1																								
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		8	0	9	9	9	9	8	8	0	9	9	9	9	10	9	0	9	10	9	9	10	9	0	10	10	13	14	14	11	0	13	11	10	6	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			COSTO PROGRAMADO					EJECUTADO			
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL		COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	0%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 45.812.826,61	2,35%		$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 104.547.219,71	5,37%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 187.656.630,00	9,64%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 163.281.612,81	8,38%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 228.308.146,00	11,72%	$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	$ 222.016.005,91	11,40%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 265.699.525,00	13,64%	$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	$ 267.981.357,99	13,76%	$ 45.965.352,08	2,36%		$ 287.156.607,00	14,74%	$ 21.457.082,00	1,10%
11	S-11	25/08/2024	$ 281.112.033,16	14,43%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 311.702.916,00	16,00%	$ 24.546.309,00	1,26%
12	S-12	1/09/2024	$ 294.242.708,33	15,11%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 360.592.928,00	18,51%	$ 48.890.012,00	2,51%
13	S-13	8/09/2024	$ 307.373.383,50	15,78%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 430.770.803,00	22,12%	$ 70.177.875,00	3,60%
14	S-14	15/09/2024	$ 320.504.058,67	16,46%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 32.786.021,00	1,68%
15	S-15	22/09/2024	$ 336.339.384,58	17,27%	$ 15.835.325,91	0,81%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	$ 352.937.560,70	18,12%	$ 16.598.176,12	0,85%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	$ 374.247.028,83	19,22%	$ 21.309.468,13	1,09%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	$ 401.170.505,98	20,60%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 11.204.668,00	0,58%
19	S-19	20/10/2024	$ 428.093.983,13	21,98%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	$ 455.017.460,28	23,36%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 524.418.957,30	26,93%	$ 49.657.465,30	2,55%
21	S-21	3/11/2024	$ 481.940.937,43	24,75%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 528.524.348,30	27,14%	$ 4.105.391,00	0,21%
22	S-22	10/11/2024	$ 508.770.878,31	26,12%	$ 26.829.940,88	1,38%		$ 585.049.134,70	30,04%	$ 56.524.786,40	2,90%
23	S-23	17/11/2024	$ 535.533.086,04	27,50%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 606.186.245,82	31,13%	$ 21.137.111,12	1,09%
24	S-24	24/11/2024	$ 562.295.293,77	28,87%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 627.526.809,73	32,22%	$ 21.340.563,91	1,10%
25	S-25	1/12/2024	$ 589.057.501,50	30,25%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 649.728.616,29	33,36%	$ 22.201.806,56	1,14%
26	S-26	8/12/2024	$ 613.961.736,22	31,52%	$ 24.904.234,72	1,28%		$ 676.214.666,29	34,72%	$ 26.486.050,00	1,36%
27	S-27	15/12/2024	$ 634.212.216,92	32,56%	$ 20.250.480,70	1,04%		$ 718.014.760,61	36,87%	$ 41.800.094,32	2,15%
28	S-28	22/12/2024	$ 650.072.944,39	33,38%	$ 15.860.727,47	0,81%		$ 765.286.339,61	39,29%	$ 47.271.579,00	2,43%
29	S-29	29/12/2024	$ 663.682.314,47	34,08%	$ 13.609.370,08	0,70%		$ 787.369.049,00	40,43%	$ 22.082.709,39	1,13%
30	S-30	5/01/2025	$ 673.618.417,22	34,59%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 805.952.284,00	41,38%	$ 18.583.235,00	0,95%
31	S-31	12/01/2025	$ 683.554.519,97	35,10%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 815.249.829,00	41,86%	$ 9.297.545,00	0,48%
32	S-32	19/01/2025	$ 693.490.622,72	35,61%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 829.111.743,00	42,57%	$ 13.861.914,00	0,71%
33	S-33	26/01/2025	$ 703.766.316,78	36,14%	$ 10.275.694,06	0,53%		$ 839.295.695,00	43,09%	$ 10.183.952,00	0,52%
34	S-34	2/02/2025	$ 714.137.793,00	36,67%	$ 10.371.476,22	0,53%		$ 843.786.348,00	43,32%	$ 4.490.653,00	0,23%
35	S-35	9/02/2025	$ 724.265.806,04	37,19%	$ 10.128.013,04	0,52%		$ 847.270.374,00	43,50%	$ 3.484.026,00	0,18%
36	S-36	16/02/2025	$ 731.593.992,49	37,56%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 857.125.493,00	44,01%	$ 9.855.119,00	0,51%
37	S-37	23/02/2025	$ 738.922.178,94	37,94%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 861.773.136,00	44,25%	$ 4.647.643,00	0,24%
38	S-38	2/03/2025	$ 757.980.970,75	38,92%	$ 19.058.791,81	0,98%		$ 866.033.733,00	44,47%	$ 4.260.597,00	0,22%
39	S-39	9/03/2025	$ 796.179.171,30	40,88%	$ 38.198.200,55	1,96%		$ 873.215.813,00	44,84%	$ 7.182.080,00	0,37%
40	S-40	16/03/2025	$ 835.853.763,56	42,92%	$ 39.674.592,26	2,04%					
41	S-41	23/03/2025	$ 876.597.467,07	45,01%	$ 40.743.703,51	2,09%					
42	S-42	30/03/2025	$ 917.341.170,58	47,10%	$ 40.743.703,51	2,09%					
43	S-43	6/04/2025	$ 931.369.380,59	47,82%	$ 14.028.210,01	0,72%					
44	S-44	13/04/2025	$ 941.787.649,20	48,36%	$ 10.418.268,61	0,53%					
45	S-45	20/04/2025	$ 952.206.592,93	48,89%	$ 10.418.943,73	0,53%					
46	S-46	27/04/2025	$ 962.842.934,88	49,44%	$ 10.636.341,95	0,55%					
47	S-47	4/05/2025	$ 972.624.266,23	49,94%	$ 9.781.331,35	0,50%					
48	S-48	11/05/2025	$ 980.098.488,48	50,32%	$ 7.474.222,25	0,38%					
49	S-49	18/05/2025	$ 994.922.494,90	51,09%	$ 14.824.006,42	0,76%					
50	S-50	25/05/2025	$ 1.015.068.758,81	52,12%	$ 20.146.263,91	1,03%					
51	S-51	1/06/2025	$ 1.035.215.022,72	53,15%	$ 20.146.263,91	1,03%					
52	S-52	8/06/2025	$ 1.055.361.286,63	54,19%	$ 20.146.263,91	1,03%					
53	S-53	15/06/2025	$ 1.075.507.550,54	55,22%	$ 20.146.263,91	1,03%					
54	S-54	22/06/2025	$ 1.095.383.369,94	56,24%	$ 19.875.819,40	1,02%					
55	S-55	29/06/2025	$ 1.114.027.164,38	57,20%	$ 18.643.794,44	0,96%					
56	S-56	6/07/2025	$ 1.132.670.958,82	58,16%	$ 18.643.794,44	0,96%					
57	S-57	13/07/2025	$ 1.151.314.753,26	59,12%	$ 18.643.794,44	0,96%					
58	S-58	20/07/2025	$ 1.171.281.482,43	60,14%	$ 19.966.729,17	1,03%					
59	S-59	27/07/2025	$ 1.192.206.198,82	61,21%	$ 20.924.716,39	1,07%					
60	S-60	3/08/2025	$ 1.209.634.483,11	62,11%	$ 17.428.284,29	0,89%					
61	S-61	10/08/2025	$ 1.226.076.594,25	62,95%	$ 16.442.111,14	0,84%					
62	S-62	17/08/2025	$ 1.233.714.313,88	63,35%	$ 7.637.719,63	0,39%					
63	S-63	24/08/2025	$ 1.241.172.352,05	63,73%	$ 7.458.038,17	0,38%					
64	S-64	31/08/2025	$ 1.248.365.634,36	64,10%	$ 7.193.282,31	0,37%					
65	S-65	7/09/2025	$ 1.254.878.115,87	64,43%	$ 6.512.481,51	0,33%					
66	S-66	14/09/2025	$ 1.261.390.597,38	64,77%	$ 6.512.481,51	0,33%					
67	S-67	21/09/2025	$ 1.267.733.439,63	65,09%	$ 6.342.842,25	0,33%					
68	S-68	28/09/2025	$ 1.273.953.439,66	65,41%	$ 6.220.000,03	0,32%					
69	S-69	5/10/2025	$ 1.280.173.439,69	65,73%	$ 6.220.000,03	0,32%					
70	S-70	12/10/2025	$ 1.286.393.439,72	66,05%	$ 6.220.000,03	0,32%					

71	S-71	19/10/2025	$ 1.325.893.877,29	68,08%	$ 39.500.437,57	2,03%					
72	S-72	26/10/2025	$ 1.366.073.507,47	70,14%	$ 40.179.630,18	2,06%					
73	S-73	2/11/2025	$ 1.406.253.137,65	72,21%	$ 40.179.630,18	2,06%					
74	S-74	9/11/2025	$ 1.446.432.767,83	74,27%	$ 40.179.630,18	2,06%					
75	S-75	16/11/2025	$ 1.473.252.146,74	75,65%	$ 26.819.378,91	1,38%					
76	S-76	23/11/2025	$ 1.485.874.113,84	76,29%	$ 12.621.967,10	0,65%					
77	S-77	30/11/2025	$ 1.498.696.083,31	76,95%	$ 12.821.969,47	0,66%					
78	S-78	7/12/2025	$ 1.511.518.052,78	77,61%	$ 12.821.969,47	0,66%					
79	S-79	14/12/2025	$ 1.524.340.022,25	78,27%	$ 12.821.969,47	0,66%					
80	S-80	21/12/2025	$ 1.533.088.604,89	78,72%	$ 8.748.582,64	0,45%					
81	S-81	28/12/2025	$ 1.541.349.091,56	79,14%	$ 8.260.486,67	0,42%					
82	S-82	4/01/2026	$ 1.547.764.734,78	79,47%	$ 6.415.643,22	0,33%					
83	S-83	11/01/2026	$ 1.554.180.378,00	79,80%	$ 6.415.643,22	0,33%					
84	S-84	18/01/2026	$ 1.561.147.319,89	80,16%	$ 6.966.941,89	0,36%					
85	S-85	25/01/2026	$ 1.569.039.773,60	80,56%	$ 7.892.453,71	0,41%					
86	S-86	1/02/2026	$ 1.577.169.941,22	80,98%	$ 8.130.167,62	0,42%					
87	S-87	8/02/2026	$ 1.585.066.137,73	81,39%	$ 7.896.196,51	0,41%					
88	S-88	15/02/2026	$ 1.592.896.342,39	81,79%	$ 7.830.204,66	0,40%					
89	S-89	22/02/2026	$ 1.600.740.077,38	82,19%	$ 7.843.734,99	0,40%					
90	S-90	1/03/2026	$ 1.608.739.411,11	82,60%	$ 7.999.333,73	0,41%					
91	S-91	8/03/2026	$ 1.616.532.746,82	83,00%	$ 7.793.335,71	0,40%					
92	S-92	15/03/2026	$ 1.625.499.763,32	83,46%	$ 8.967.016,50	0,46%					
93	S-93	22/03/2026	$ 1.637.498.649,21	84,08%	$ 11.998.885,89	0,62%					
94	S-94	29/03/2026	$ 1.649.771.243,75	84,71%	$ 12.272.594,54	0,63%					
95	S-95	5/04/2026	$ 1.664.573.433,63	85,47%	$ 14.802.189,88	0,76%					
96	S-96	12/04/2026	$ 1.680.566.021,32	86,29%	$ 15.992.587,69	0,82%					
97	S-97	19/04/2026	$ 1.696.558.609,01	87,11%	$ 15.992.587,69	0,82%					
98	S-98	26/04/2026	$ 1.704.432.501,33	87,52%	$ 7.873.892,32	0,40%					
99	S-99	3/05/2026	$ 1.712.140.705,99	87,91%	$ 7.708.204,66	0,40%					
100	S-100	10/05/2026	$ 1.721.817.914,73	88,41%	$ 9.677.208,74	0,50%					
101	S-101	17/05/2026	$ 1.736.558.276,80	89,17%	$ 14.740.362,07	0,76%					
102	S-102	24/05/2026	$ 1.751.298.638,87	89,92%	$ 14.740.362,07	0,76%					
103	S-103	31/05/2026	$ 1.766.039.000,94	90,68%	$ 14.740.362,07	0,76%					
104	S-104	7/06/2026	$ 1.774.935.235,23	91,14%	$ 8.896.234,29	0,46%					
105	S-105	14/06/2026	$ 1.781.081.291,74	91,45%	$ 6.146.056,51	0,32%					
106	S-106	21/06/2026	$ 1.787.227.348,25	91,77%	$ 6.146.056,51	0,32%					
107	S-107	28/06/2026	$ 1.793.373.404,76	92,08%	$ 6.146.056,51	0,32%					
108	S-108	5/07/2026	$ 1.799.519.461,27	92,40%	$ 6.146.056,51	0,32%					
109	S-109	12/07/2026	$ 1.805.665.517,78	92,71%	$ 6.146.056,51	0,32%					
110	S-110	19/07/2026	$ 1.811.811.574,29	93,03%	$ 6.146.056,51	0,32%					
111	S-111	26/07/2026	$ 1.817.957.630,80	93,34%	$ 6.146.056,51	0,32%					
112	S-112	2/08/2026	$ 1.824.103.687,31	93,66%	$ 6.146.056,51	0,32%					
113	S-113	9/08/2026	$ 1.830.249.743,82	93,98%	$ 6.146.056,51	0,32%					
114	S-114	16/08/2026	$ 1.836.395.800,33	94,29%	$ 6.146.056,51	0,32%					
115	S-115	23/08/2026	$ 1.842.541.856,84	94,61%	$ 6.146.056,51	0,32%					
116	S-116	30/08/2026	$ 1.848.687.913,35	94,92%	$ 6.146.056,51	0,32%					
117	S-117	6/09/2026	$ 1.854.833.969,86	95,24%	$ 6.146.056,51	0,32%					
118	S-118	13/09/2026	$ 1.860.980.026,37	95,55%	$ 6.146.056,51	0,32%					
119	S-119	20/09/2026	$ 1.867.126.082,88	95,87%	$ 6.146.056,51	0,32%					
120	S-120	27/09/2026	$ 1.873.272.139,39	96,18%	$ 6.146.056,51	0,32%					
121	S-121	4/10/2026	$ 1.879.089.924,30	96,48%	$ 5.817.784,91	0,30%					
122	S-122	11/10/2026	$ 1.884.669.995,30	96,77%	$ 5.580.071,00	0,29%					
123	S-123	18/10/2026	$ 1.890.250.066,30	97,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
124	S-124	25/10/2026	$ 1.895.830.137,30	97,34%	$ 5.580.071,00	0,29%					
125	S-125	1/11/2026	$ 1.901.410.208,30	97,63%	$ 5.580.071,00	0,29%					
126	S-126	8/11/2026	$ 1.906.990.279,30	97,92%	$ 5.580.071,00	0,29%					
127	S-127	15/11/2026	$ 1.912.570.350,30	98,20%	$ 5.580.071,00	0,29%					
128	S-128	22/11/2026	$ 1.918.150.421,30	98,49%	$ 5.580.071,00	0,29%					
129	S-129	29/11/2026	$ 1.923.730.492,30	98,78%	$ 5.580.071,00	0,29%					
130	S-130	6/12/2026	$ 1.929.310.563,30	99,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
131	S-131	13/12/2026	$ 1.934.890.634,30	99,35%	$ 5.580.071,00	0,29%					
132	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 12.684.276,30	0,65%					
					$ 1.947.574.910,60	100%					

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón Directora de Interventoría. **CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ**
