AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL**			**FECHA:**	26-may-25
Semana No	**50**	**DEL :**	18-may-25	**AL:**	24-may-25
Plazo Total	**25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)**	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		352	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**44,78%**			
Nombre del Supervisor :	**Angela Constanza Castellanos**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO VANGUARDIA, DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado
(%) Programado:	**1,03%**	**52,12%**
($) Valor programado:	**$ 20.146.263,91**	**$ 1.015.068.758,81**

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado:	**4,67%**	**57,89%**
($) Valor ejecutado:	**$ 90.957.655,94**	**$ 1.127.476.453,27**

Evaluación:	**Porcentaje Adelanto:**	**5,77%**
	Valor Adelanto:	**$ 112.407.694,46**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	**Contratista:**	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	**Contrato No:**	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	**Valor Inicial:**	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	**Plazo inicial:**	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS	**Plazo actualizado:**	25 MESES Y 25 DÍAS
Fecha de iniciación:	6-jun-24	**Fecha de iniciación:**	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	**Valor total actual del contrato:**	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

EL DÍA JUEVES 22-05-25 SE REALIZA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 49

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL (18 AL 24 DE MAYO DEL 2025)

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Se realizó la verificación del estado de los filtros, aceite y refrigerante de la planta No. 1.	Buen estado	NO
2	Se realizó la verificación del estado de los filtros, aceite y refrigerante de la planta No. 2.	Buen estado	NO
3	Se realizó la visita de campo con el contratista de obra para la toma de datos necesarios para atender los mantenimientos de la trampa de grasas, y el tanque de suministro de combustible	Bien realizado	NO
4	Se realizó la visita de campo con el contratista de obra para la toma de datos necesarios para atender los mantenimientos de la trampa de grasas, y el tanque de suministro de combustible	En ejecución	NO
5	Se continua con el mantenimiento del tanque de bomberos.	En ejecución	NO
6	Se realiza el mantenimiento de la cubierta del ascensor lado plataforma, instalación de manto impermeabilizante.	Bien realizado	NO
7	Se realizó el mantenimiento de la fuga de agua presentada en los módulos de la aerolínea de Avianca	Bien realizado	NO
8	Se realizó el mantenimiento de la gotera presentada en la sala VIP	Bien realizado	NO
9	Se realiza el mantenimiento del orinal en el baño público del primer piso, salón principal	Bien realizado	NO
10	Se realiza mantenimiento a portón en entrada Alfa 6, zona de equipaje de bodega	Bien realizado	NO
11	Se realiza mantenimiento a lampara del baño hombres, salida de pasajeros	Bien realizado	NO
12	Se realiza desmonte de cubierta en base SEI de bomberos	En ejecución	NO
13	Se realiza cambio de dispensador de toallas de papel en baño de hombres y mujeres del primer piso del salón principal.	Bien realizado	NO
14	Se realiza el ingreso de la estructura metálica a la base SEI de bomberos	En ejecución	NO

SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO

19-05-2025 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA # 2
20-05-2025 - Fusser sistema eléctrico guardia
21-05-2025 - Informe del proyecto a la fecha

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN

* Mantenimiento de la transferencia de los grupos electrógenos
* Mantenimiento de la fachada de la torre de control y el terminal aéreo
* Cambio de correas de la planta No. 2

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

***Lunes 19 de mayo 2025.** Se verificó la realización de la charla SST y la rutina de calistenia. Se continuó con la inspección en el baño de hombres del primer piso, donde se realizan trabajos de mantenimiento para reparar el sistema push del sanitario original. El área estaba delimitada, pero no se encontraron señales de advertencia visibles. Se solicita al contratista corregir este hallazgo. El personal contaba con los elementos de protección personal adecuados para la actividad. En el pasillo de los módulos, se verificó que el área estaba bien delimitada y con señales de advertencia. Un trabajador realizaba labores de aseo y dejó la zona limpia y despejada. Se reviso la planilla de seguridad social del personal y se evidenció que falta la planilla del director de obra, por lo que se solicita su entrega urgente para cumplir con la obligación contractual. También se inició la revisión del personal subcontratado encargado del mantenimiento de la estructura metálica en la base sei de bomberos, con el fin de gestionar el certificado de cumplimiento en SST ante la Regional Oriente.

***Martes 20 de mayo 2025.** Se realizó la revisión de la documentación del personal subcontratado, la empresa inmeol para el desarrollo de la instalación de estructuras en el área de base sei de bomberos, el gimnasio y la bodega, con el fin de gestionar el certificado de cumplimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) ante la Regional Oriente. Se emitió comunicación formal entregando la documentación requerida. Asimismo, se envió comunicación relacionada con la revisión documental de la actividad de trabajo eléctrico, solicitando la entrega pendiente de la documentación del especialista eléctrico. Esta información es necesaria para proceder con la emisión del certificado de cumplimiento SST correspondiente al personal faltante y a las actividades de riesgo eléctrico. Adicionalmente, se verificó el certificado de competencia en trabajo en caliente del trabajador Edgar Barbosa, avalando que cumple con los requisitos para ejecutar actividades de mantenimiento bajo esta modalidad.

***Miércoles 21 de mayo 2025.** Se verificó la realización de la charla SST y la rutina de calistenia al inicio de la jornada. El personal firmó los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo el permiso de trabajo, chequeos preoperacionales y el reporte de condiciones de salud. Durante la inspección en campo, se verificaron condiciones seguras en las actividades de mantenimiento relacionadas con la instalación de cinta en la cubierta del ascensor externo, como parte del proceso de impermeabilización. Los trabajadores fueron encontrados utilizando una escalera de forma segura: uno de ellos ubicado en la parte superior, con el sistema de posicionamiento debidamente anclado, y el otro en la parte inferior, sosteniéndola. Ambos hacían uso de los elementos de protección personal (EPP) acordes a la actividad.

***Jueves 22 de mayo 2025.** Se realizó la verificación de los reportes semanales de SSTA y ssu respectiva aprobación. Así mismo la revisión de la planilla de seguridad social integral del director de obra, constatando un retraso de cuatro días en el pago. Se recomienda al contratista cumplir con esta obligación de forma oportuna para evitar afectaciones contractuales y legales. Posteriormente, se entregó la documentación al área de SST de la Dirección Regional Oriente con el fin de gestionar la certificación de cumplimiento para todo el personal activo directo. Se llevó a cabo el Comité de Seguimiento de Obra N.º 49, en el cual se solicitó al contratista la entrega de los paz y salvos del personal retirado, el uso del chaleco correspondiente, y la entrega de documentación faltante relacionada con los trabajos de riesgo eléctrico, instalación de estructura metálica y puntos de anclaje.

***Viernes 23 de mayo 2025.** Se verificó la realización de la charla SST y la rutina de calistenia al inicio de la jornada. Por parte de la interventoría, se presentó al nuevo residente ante el personal del contratista. Posteriormente, se realizó un recorrido en campo, específicamente en el área antigua de bomberos, donde se observó el desarme de andamios para su traslado a la base de bomberos, con el fin de ser rearmados en ese lugar. Se realizó la entrega de la documentación de cumplimiento SST para su certificación por parte de la Regional Oriente, correspondiente a las actividades de instalación de anclajes. En horas de la tarde, se llevó a cabo una reunión en la que participaron la interventoría, personal del contratista de obra y el encargado del turno de bomberos, con el fin de coordinar el inicio del desmonte de tejas de la cubierta del gimnasio, se deja acta y registro fotográfico como evidencia.

***Sábado 24 de mayo 2025.** Se verificó la documentación del vehículo y del conductor encargado del descargue de material para la cubierta del gimnasio en la base de bomberos. Se constató que toda la documentación se encuentra vigente, incluyendo: licencia de conducción, revisión técnico-mecánica, tarjeta de propiedad del vehículo y la planilla de seguridad social integral del personal. Se supervisó el proceso de descargue, el cual se ejecutó aplicando las normas de seguridad vial, el área fue debidamente señalizada y todos los trabajadores que participaron en el descargue contaban con los elementos de protección personal (EPP) requeridos. Además, se coordinó el descargue de forma segura, dejando los perfiles cubiertos y el área delimitada y señalizada como medida preventiva.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA

FAO-CTO-23001163-0542-2025	progamacion semanal No 50
FAO-CTO-23001163-0543-2025	Envió informe semanal No 49 e informe eléctrico del Aeropuerto Vanguardia
FAO-CTO-23001163-0544-2024	Envío de acta de recibo parcial No 10.
FAO-CTO-23001163-0545-2025	COMUNICADO-FAO-CTO-23001163-0545-2025 ENVIO REPORTE SEMANAL PERIODO DEL 12 al 17 de mayo 2025.
FAO-CTO-23001163-0546-2025	COMUNICADO-FAO-CTO-23001163-0546-2025 ENVIO SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTO ORLANDO.
FAO-CTO-23001163-0545-2025	Envió de cotización de materiales para las plantas del Aeropuerto Vanguardia Villavicencio
FAO-CTO-23001163-0546-2025	Envío cotizaciones para mantenimientos en el aeropuerto vanguardia
FAO-CTO-23001163-0548-2025	Envío compilado acta 10 con valores actualizados.
FAO-CTO-23001163-0549-2025	COMUNICADO-FAO-CTO-23001163-0549-2025 Solicitud de respuesta a interventoría de la documentación enviada inicialmente, y de los faltantes del SUMBCONTRATISTA INMEOL SAS.
FAO-CTO-23001163-0550-2025	Memorias de calculo, plano de detalles de acometidas y bandejas de la subestación y esquema general de la transferencia a instalar vista frontal.
FAO-CTO-23001163-0551-2025	Respuesta a comunicado –Personal faltante Aeropuerto Vanguardia Villavicencio
FAO-CTO-23001163-0552-2025	Envío compilado acta 10 con observaciones subsanadas.

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA

12-05-2025 - CO-FJ-1280-316-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0538-2025 REVISIÓN DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (GRUPO FAO SAS)
13-05-2025 - CO-FJ-1280-317-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No49
13-05-2025 - CO-FJ-1280-318-2025	VILLAVICENCIO - ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DE BASE SEI Y BODEGA
13-05-2025 - CO-FJ-1280-319-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A COMUNICACIÓN 2025292050017971 ID 1665544 Equipos electrógenos
13-05-2025 - CO-FJ-1280-320-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS PARA CERTIFICADO SST GRUPO FAO (PERSONAL; INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA)
13-05-2025 - CO-FJ-1280-321-2025	VILLAVICENCIO - APROBACIÓN DE COTIZACIÓN - RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0545-2025 – (suministro de materiales para el mantenimiento correctivo de las plantas de los grupos electrógenos)
14-05-2025 - CO-FJ-1280-322-2025	VILLAVICENCIO - APROBACIÓN DE COTIZACIÓN - RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0546-2025 – (suministro e instalación de dispensador de papel higiénico metálico incluye tornillería)
15-05-2025 - CO-FJ-1280-323-2025	VILLAVICENCIO - APROBACIÓN DE COTIZACIÓN - RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0546-2025 – (adecuación de sistema de redes eléctricas en el área de bodega de SATENA, incluye materiales y equipos para su funcionamiento)
15-05-2025 - CO-FJ-1280-324-2025	VILLAVICENCIO - APROBACIÓN DE COTIZACIÓN - RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0546-2025 – (suministro e instalación de puerta y ventana en aluminio con vidrio laminado 3x3, incluye equipos, materiales para su debida instalación.)
15-05-2025 - CO-FJ-1280-325-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0531-2025 REVISION DE LA DOCUMENTACION PARA EL TRABAJO ELECTRICO - CAMBIO DE LA TRANSFERENCIA
15-05-2025 - CO-FJ-1280-326-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0541-2025 REVISIÓN REPORTE SEMANAL AMBIENTAL DEL 12 AL 17 MAYO 2025
15-05-2025 - CO-FJ-1280-327-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0545-2025 REVISIÓN REPORTE SEMANAL SST DEL 12 AL 17 MAYO 2025
15-05-2025 - CO-FJ-1280-328-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0546-2025 REVISIÓN DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DIRECTOR DE OBRA
15-05-2025 - CO-FJ-1280-329-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS PARA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SST (CONTRATISTA GRUPO FAO SAS)
15-05-2025 - CO-FJ-1280-330-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Mantenimiento del portón en entrada Alfa 6, zona de equipaje de bodega)
15-05-2025 - CO-FJ-1280-331-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS PARA CERTIFICADO SST GRUPO FAO (INSTALACIÓN DE ANCLAJES)
15-05-2025 - CO-FJ-1280-332-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Mantenimiento de la lampara del baño hombres, salida de pasajeros)
15-05-2025 - CO-FJ-1280-333-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Mantenimiento de filtración de agua en muro del ascensor en edificio principal)

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRE	CARGO	18	19	20	21	22	23	24
		D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
YINETH STERLING LOSADA	RESIDENTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
DIANA PATRICIA ÁVILA ZÚA	INSPECTOR SST		1	1	1	1	1	1
JUDITH TERESA MEJIA LOZANO	ESPECIALISTA AMBIENTAL			1		1	1	
WILLIAM ANDRÉS CAVIEDES CAHUEÑO	COORDINADOR TÉCNICO		1	1	1	1	1	1
PAULA ANDREA RUIZ RODRÍGUEZ	PASANTE SST		1	1	1	1	1	
JHONATHAN ALIRIO GÁMEZ RODRÍGUEZ	TÉCNICO ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1
YEISON FERNANDO BETANCUR AYALA	AYUDANTE ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1
LUIS ÁNGEL VILLALOBOS RINCÓN	AYUDANTE ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1
URIEL ALEXANDER GONZÁLEZ CASTRO	MAESTRO DE OBRA		1	1	1	1	1	1
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA		1		1	1	1	1
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA	OFICIAL DE OBRA				1	1	1	1
EDGAR JUVER BARBOSA DELGADO	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
EDIT MER DURAN MADRID	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
EIDER ALEXANDER TORRES SERNA	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA		0	14	14	15	16	16	13

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA


NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	18	19	20	21	22	23	24
			D	L	M	M	J	V	S
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA		1	1	1	1	1	1
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			0	3	3	3	3	3	3


DÍA	INTERVENTORÍA	OBRA	TOTAL
DOMÍNGO			
LUNES	3	14	17
MARTES	3	14	17
MIERCOLES	3	15	18
JUEVES	3	16	19
VIERNES	3	16	19
SABADO	3	13	16

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

EQUIPOS EN OBRA:	Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor.

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

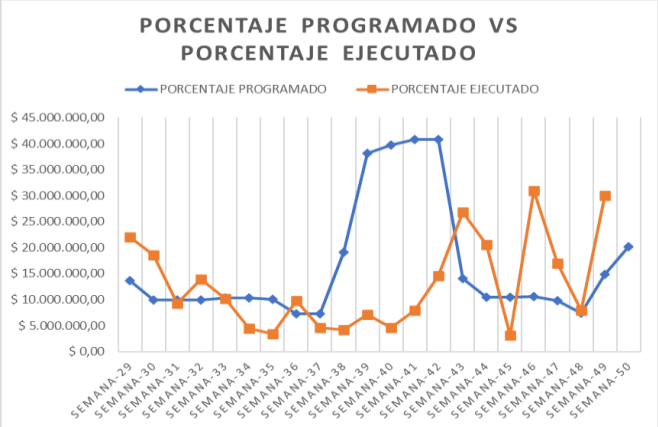

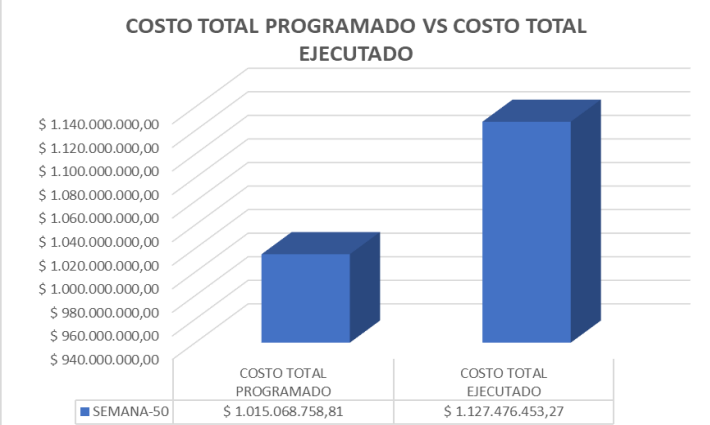

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total	AMORTIZACIÓN	%
ANTICIPO	Entregado al contratista	**$ 305.869.421,00**		
1	Del 6 de jun al 31 de jul	**$ 187.656.630,00**	**$ 30.025.061,00**	16,00%
2	Agosto	**$ 155.033.486,00**	$ 50.000.000,00	32,25%
3	Septiembre	**$ 78.800.698,00**	$ 25.789.421,00	32,73%
4	Octubre	**$ 70.812.436,00**	$ 35.000.000,00	49,43%
5	Noviembre	**$ 83.585.060,00**	$ 35.000.000,00	41,87%
6	Diciembre	**$ 144.103.712,00**	$ 29.000.000,00	20,12%
7	Enero	**$ 53.551.056,00**	$ 10.710.211,00	20,00%
8	Febrero	**$ 20.657.485,00**	$ 4.131.497,00	20,00%
9	Marzo	**$ 32.301.368,00**	$ 6.460.274,00	20,00%
TOTAL ACUMULADO		$ 826.501.931,00	$ 226.116.464,00	

Valor Total Contrato Obra
$ 1.947.574.911,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 826.501.931,00
% Avance facturado Acumulado
42,44%

NOTA:	**Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento por un porcentaje equivalente al 42,44%. Equivalente a $ 826,501,931,00 millones de pesos.**

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	**jun-24**	$ 27.938.995,00
2	**jul-24**	$ 56.131.974,00
3	**ago-24**	$ 46.738.612,55
4	**sep-24**	$ 27.203.529,71
5	**oct-24**	$ 25.632.258,47
6	**nov-24**	$ 28.408.636,76
7	**dic-24**	$ 43.785.303,84
8	**ene-25**	$ 20.782.905,00
9	**feb-25**	$ 12.450.479,00
10	**mar-25**	$ 15.407.556,00
TOTAL ACUMULADO		$ 304.480.250,00

Valor Total Contrato Interventoría
$ 838.169.861,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 304.480.250,00
% Avance facturado Acumulado
36,33%

NOTA:	**Para la fecha del presente informe semanal, la interventoría presenta un avance financiero equivalente a $ 304,480,250,00 con un porcentaje de 36,33%.**

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

REGISTRO FOTOGRÁFICO



No. FOTO	
1	Se realizó la verificación del estado de los filtros, aceite y refrigerante de la planta No. 2.



No. FOTO	
2	Se realizó la verificación del estado de los filtros, aceite y refrigerante de la planta No. 1.




No. FOTO	
3	Se realizó la visita de campo con el contratista de obra para la toma de datos necesarios para atender los mantenimientos de la trampa de grasas, y el tanque de suministro de combustible



No. FOTO	
4	Se realizó la entrega del mantenimiento del tanque de bomberos. (esta actividad no fue recibida debido a una fuga que se evidenció en el punto de intervención)



No. FOTO	
5	Se realizó la entrega del mantenimiento del tanque de bomberos. (esta actividad no fue recibida debido a una fuga que se evidenció en el punto de intervención)

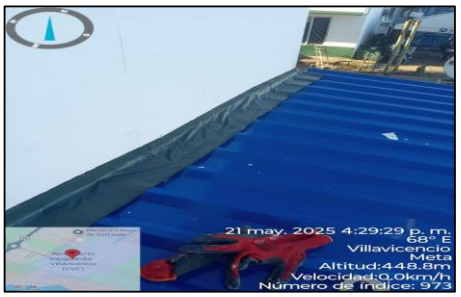

No. FOTO	
6	Se realiza el mantenimiento de la cubierta del ascensor lado plataforma, instalación de manto impermeabilizante.



No. FOTO	
7	Se realiza el mantenimiento de la cubierta del ascensor lado plataforma, instalación de manto impermeabilizante.



No. FOTO	
8	Se realizo el mantenimiento de la fuga de agua presentada en los módulos de la aerolínea de Avianca



No. FOTO	
9	Se realizo el mantenimiento de la fuga de agua presentada en los módulos de la aerolínea de Avianca

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

					
No. FOTO	**Se realizó el mantenimiento de la gotera presentada en la sala VIP**	**No. FOTO**	**Se realizó el mantenimiento de la gotera presentada en la sala VIP**	**No. FOTO**	**Se realiza el mantenimiento del orinal en el baño publico del primer piso, salón principal**
10		**11**		**12**	
					
No. FOTO	**Se realiza mantenimiento a portón en entrada Alfa 6, zona de equipaje de bodega**	**No. FOTO**	**Se realiza mantenimiento a portón en entrada Alfa 6, zona de equipaje de bodega**	**No. FOTO**	**Se realiza mantenimiento a lampara del baño hombres, salida de pasajeros**
13		**14**		**15**	
					
No. FOTO	**Se realiza mantenimiento a lampara del baño hombres, salida de pasajeros**	**No. FOTO**	**Se realiza desmonte de cubierta en base SEI de bomberos**	**No. FOTO**	**Se realiza desmonte de cubierta en base SEI de bomberos**
16		**17**		**18**	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

					
No. FOTO	**Se realiza desmonte de cubierta en base SEI de bomberos**	**No. FOTO**	**Se realiza cambio de dispensador de toallas de papel en baño de hombres y mujeres del primer piso del salón principal.**	**No. FOTO**	**Se realiza cambio de dispensador de toallas de papel en baño de hombres y mujeres del primer piso del salón principal.**
19		**20**		**21**	
					
No. FOTO	**Se realiza el ingreso de la estructura metálica a la base SEI de bomberos**	**No. FOTO**	**Se realiza el ingreso de la estructura metálica a la base SEI de bomberos**	**No. FOTO**	**Se realiza el ingreso de la estructura metálica a la base SEI de bomberos**
22		**23**		**24**	
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE					
					
No. FOTO	**Verificación de la realización de charla de seguridad y salud en el trabajo**	**No. FOTO**	**Verificación de la realización de calistenia al inicio de la jornada laboral**	**No. FOTO**	**Verificación de actividades críticas en alturas, enfocado en garantizar que los trabajadores cuenten con los equipos de protección contra caídas adecuados**
25		**26**		**27**	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

	**No. FOTO**	**Verificación del proceso de descarga de perfilería para estructura metálica, con atención especial a la seguridad vial y al control del tránsito vehicular durante la operación, garantizando la protección del personal y la correcta coordinación en el área de trabajo**		**No. FOTO**	**Verificación del proceso de descarga de perfilería para estructura metálica, asegurando la delimitación clara del área de trabajo y el control del paso de vehículos. Se implementaron medidas de seguridad vial para proteger al personal y garantizar una operación ordenada y segura**
28			**29**		
	**No. FOTO**	**Verificación del proceso de descarga de perfilería para estructura metálica, asegurando que el descargue inicie de manera segura, aplicando medidas para garantizar una operación ordenada y sin riesgos**	
30					
	**No. FOTO**	**Verificación constatando que los materiales quedaron debidamente acopiados, cubiertos para protección contra las condiciones ambientales y en un área claramente delimitada y señalizada, garantizando la seguridad y el orden en el lugar de almacenamiento.**		**No. FOTO**	**Verificación trabajos con escalera, aunque no se superen los 2 metros de altura, se aplican medidas de seguridad como el uso de equipos de protección contra caídas, debido al riesgo generado por la posición ladeada del cuerpo o pérdida de estabilidad.**
31			**32**		
	**No. FOTO**	**Verificación del diligenciamiento de formatos del SG-SST, incluyendo permisos de trabajo, inspecciones preoperacionales y reportes de salud**	
33					

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Veintiséis	26	días del mes de	Mayo	de	2025
(Día en letras)	(Día en Números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

Sandra Yonaira Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-3	**Versión**	3

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 2

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	1			**MAMPOSTERIA**								
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	$ 38.916,00	$ 2.334.960,00		-20,00	40,00	$ 1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	$ 30.706,00	$ 1.842.360,00	50,00		110,00	$ 3.377.660,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	$ 26.258,00	$ 3.938.700,00			150,00	$ 3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	$ 38.490,00	$ 76.306.425,00			1982,50	$ 76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	$ 29.591,00	$ 29.324.681,00			991,00	$ 29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	$ 15.640,00	$ 37.536.000,00		-700,00	1700,00	$ 26.588.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	$ 66.017,00	$ 3.895.003,00	44,50		103,50	$ 6.832.760,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	$ 33.550,00	$ 1.342.000,00			40,00	$ 1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	$ 1.841,00	$ 736.400,00	3700,00		4100,00	$ 7.548.100,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	$ 27.292,00	$ 42.657.298,00			1563,00	$ 42.657.298,00
Subtotal								**$ 199.913.827,00**				**$ 199.472.264,00**
	2			**PISOS**								
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	$ 20.128,00	$ 14.089.600,00		-650,00	50,00	$ 1.006.400,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	$ 86.865,00	$ 9.989.475,00		-65,00	50,00	$ 4.343.250,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO)	M2	38,00	$ 175.568,00	$ 6.671.584,00		-37,00	1,00	$ 175.568,00
Subtotal								**$ 30.750.659,00**				**$ 5.525.218,00**
	3			**CUBIERTA Y CIELORASO**								
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO;NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	$ 480.205,00	$ 11.524.920,00		-12,00	12,00	$ 5.762.460,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	$ 89.881,00	$ 44.041.690,00		-130,00	360,00	$ 32.357.160,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	$ 140.472,00	$ 68.831.280,00		-428,25	61,75	$ 8.674.146,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	$ 89.781,00	$ 33.039.408,00		-359,60	8,40	$ 754.160,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	$ 28.249,00	$ 2.824.900,00		-90,00	10,00	$ 282.490,00
Subtotal								**$ 160.262.198,00**				**$ 47.830.416,00**
	4			**CARPINTERIA METÁLICA**								
19	4.1		4.1	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	$ 451.209,00	$ 2.256.045,00		-3,00	2,00	$ 902.418,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSINAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	$ 17.857,00	$ 5.357.100,00	3500,00		3800,00	$ 67.856.600,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	$ 22.736,00	$ 4.547.200,00		-110,00	90,00	$ 2.046.240,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACREO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	$ 83.129,00	$ 6.816.578,00	40,58		122,58	$ 10.189.953,00
Subtotal								**$ 18.976.923,00**				**$ 80.995.211,00**
	5			**CARPINTERIA MADERA**								
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	$ 476.557,00	$ 3.335.899,00		-5,00	2,00	$ 953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	$ 12.995,00	$ 2.011.626,00		-50,00	104,80	$ 1.361.876,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	$ 38.231,00	$ 2.959.079,00			77,40	$ 2.959.079,00
Subtotal								**$ 8.306.604,00**				**$ 5.274.069,00**
	6			**CRISTALERIA**								
26	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/0 PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	$ 289.652,00	$ 14.482.600,00		-50,00	-	$ 0,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	$ 84.356,00	$ 4.217.800,00		-50,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 18.700.400,00**				**$ 0,00**
	7			**CANALETAS Y PORTACABLES**								
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	$ 61.879,00	$ 30.939.500,00		-490,00	10,00	$ 618.790,00
Subtotal								**$ 30.939.500,00**				**$ 618.790,00**

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 2

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	8			**LIMPIEZA PROFUNDA**								
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	$ 9.054,00	$ 82.391.400,00		0,00	9100,00	$ 82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	$ 14.260,00	$ 87.342.500,00		-2000,00	4125,00	$ 58.822.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	$ 7.870,00	$ 11.805.000,00			1500,00	$ 11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	$ 627.943,00	$ 100.470.880,00			160,00	$ 100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	$ 30.741,00	$ 293.365.667,00		-1435,77	8107,37	$ 249.228.771,00
Subtotal								**$ 575.375.447,00**				**$ 502.718.551,00**
	9			**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**								
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 61.126.435,00	$ 61.126.435,00		-0,50	0,50	$ 30.563.218,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	$ 22.193.560,00	$ 22.193.560,00	1,00	0,00	2,00	$ 44.387.120,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 72.618.205,00	$ 72.618.205,00		-0,25	0,75	$ 54.463.654,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	$ 589.218,00	$ 14.141.232,00		-24,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 170.079.432,00**				**$ 129.413.992,00**
	10			**MANO DE OBRA**								
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	$ 11.766.194,00	$ 352.985.820,00		-4,00	26,00	$ 305.921.044,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	$ 39.080,00	$ 18.758.400,00	200,00		680,00	$ 26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	$ 36.074,00	$ 25.973.280,00	1963,00		2683,00	$ 96.786.542,00
Subtotal								**$ 397.717.500,00**				**$ 429.281.986,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 1.611.022.490,00**				**$ 1.401.130.497,00**
				IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 11.956.808,00			0,19	**$ 10.399.015,00**
				SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)				**$ 1.622.979.298,00**				**$ 1.411.529.512,00**
	11			**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**								
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	$ 324.595.613,00	$ 324.595.613,00				$ 536.045.399,00
							TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**$ 324.595.613,00**				**$ 536.045.399,00**
				VALOR TOTAL				**$ 1.947.574.911,00**				**$ 1.947.574.911,00**

	DESCRIPCION			PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.				
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**		20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**		3%
NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.	**UTILIDAD**	**U=**		5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**		28%

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA
CC 79556358
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FAO SAS

SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
CC 63359726
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18/05/2025 **Y EL** 24/05/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING.JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

FECHA			ABRIL DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																													MAYO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																													
NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1							
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1							
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVENTORIA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1							
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18/05/2025 **Y EL** 24/05/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JORGE BELTRAN


FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

| FECHA | | ABRIL DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO | | |

			COSTO PROGRAMADO					EJECUTADO			
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL		COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	0%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 45.812.826,61	2,35%		$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 104.547.219,71	5,37%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 187.656.630,00	9,64%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 163.281.612,81	8,38%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 228.308.146,00	11,72%	$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	$ 222.016.005,91	11,40%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 265.699.525,00	13,64%	$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	$ 267.981.357,99	13,76%	$ 45.965.352,08	2,36%		$ 287.156.607,00	14,74%	$ 21.457.082,00	1,10%
11	S-11	25/08/2024	$ 281.112.033,16	14,43%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 311.702.916,00	16,00%	$ 24.546.309,00	1,26%
12	S-12	1/09/2024	$ 294.242.708,33	15,11%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 360.592.928,00	18,51%	$ 48.890.012,00	2,51%
13	S-13	8/09/2024	$ 307.373.383,50	15,78%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 430.770.803,00	22,12%	$ 70.177.875,00	3,60%
14	S-14	15/09/2024	$ 320.504.058,67	16,46%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 32.786.021,00	1,68%
15	S-15	22/09/2024	$ 336.339.384,58	17,27%	$ 15.835.325,91	0,81%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	$ 352.937.560,70	18,12%	$ 16.598.176,12	0,85%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	$ 374.247.028,83	19,22%	$ 21.309.468,13	1,09%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	$ 401.170.505,98	20,60%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 11.204.668,00	0,58%
19	S-19	20/10/2024	$ 428.093.983,13	21,98%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	$ 455.017.460,28	23,36%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 524.418.957,30	26,93%	$ 49.657.465,30	2,55%
21	S-21	3/11/2024	$ 481.940.937,43	24,75%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 528.524.348,30	27,14%	$ 4.105.391,00	0,21%
22	S-22	10/11/2024	$ 508.770.878,31	26,12%	$ 26.829.940,88	1,38%		$ 585.049.134,70	30,04%	$ 56.524.786,40	2,90%
23	S-23	17/11/2024	$ 535.533.086,04	27,50%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 606.186.245,82	31,13%	$ 21.137.111,12	1,09%
24	S-24	24/11/2024	$ 562.295.293,77	28,87%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 627.526.809,73	32,22%	$ 21.340.563,91	1,10%
25	S-25	1/12/2024	$ 589.057.501,50	30,25%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 649.728.616,29	33,36%	$ 22.201.806,56	1,14%
26	S-26	8/12/2024	$ 613.961.736,22	31,52%	$ 24.904.234,72	1,28%		$ 676.214.666,29	34,72%	$ 26.486.050,00	1,36%
27	S-27	15/12/2024	$ 634.212.216,92	32,56%	$ 20.250.480,70	1,04%		$ 718.014.760,61	36,87%	$ 41.800.094,32	2,15%
28	S-28	22/12/2024	$ 650.072.944,39	33,38%	$ 15.860.727,47	0,81%		$ 765.286.339,61	39,29%	$ 47.271.579,00	2,43%
29	S-29	29/12/2024	$ 663.682.314,47	34,08%	$ 13.609.370,08	0,70%		$ 787.369.049,00	40,43%	$ 22.082.709,39	1,13%
30	S-30	5/01/2025	$ 673.618.417,22	34,59%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 805.952.284,00	41,38%	$ 18.583.235,00	0,95%
31	S-31	12/01/2025	$ 683.554.519,97	35,10%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 815.249.829,00	41,86%	$ 9.297.545,00	0,48%
32	S-32	19/01/2025	$ 693.490.622,72	35,61%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 829.111.743,00	42,57%	$ 13.861.914,00	0,71%
33	S-33	26/01/2025	$ 703.766.316,78	36,14%	$ 10.275.694,06	0,53%		$ 839.295.695,00	43,09%	$ 10.183.952,00	0,52%
34	S-34	2/02/2025	$ 714.137.793,00	36,67%	$ 10.371.476,22	0,53%		$ 843.786.348,00	43,32%	$ 4.490.653,00	0,23%
35	S-35	9/02/2025	$ 724.265.806,04	37,19%	$ 10.128.013,04	0,52%		$ 847.270.374,00	43,50%	$ 3.484.026,00	0,18%
36	S-36	16/02/2025	$ 731.593.992,49	37,56%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 857.125.493,00	44,01%	$ 9.855.119,00	0,51%
37	S-37	23/02/2025	$ 738.922.178,94	37,94%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 861.773.136,00	44,25%	$ 4.647.643,00	0,24%
38	S-38	2/03/2025	$ 757.980.970,75	38,92%	$ 19.058.791,81	0,98%		$ 866.033.733,00	44,47%	$ 4.260.597,00	0,22%
39	S-39	9/03/2025	$ 796.179.171,30	40,88%	$ 38.198.200,55	1,96%		$ 873.215.813,00	44,84%	$ 7.182.080,00	0,37%
40	S-40	16/03/2025	$ 835.853.763,56	42,92%	$ 39.674.592,26	2,04%		$ 877.877.069,00	45,08%	$ 4.661.256,00	0,24%
41	S-41	23/03/2025	$ 876.597.467,07	45,01%	$ 40.743.703,51	2,09%		$ 885.784.982,00	45,48%	$ 7.907.913,00	0,41%
42	S-42	30/03/2025	$ 917.341.170,58	47,10%	$ 40.743.703,51	2,09%		$ 900.341.603,24	46,23%	$ 14.556.621,24	0,75%
43	S-43	6/04/2025	$ 931.369.380,59	47,82%	$ 14.028.210,01	0,72%		$ 927.131.725,24	47,60%	$ 26.790.122,00	1,38%
44	S-44	13/04/2025	$ 941.787.649,20	48,36%	$ 10.418.268,61	0,53%		$ 947.674.781,20	48,66%	$ 20.543.055,96	1,05%
45	S-45	20/04/2025	$ 952.206.592,93	48,89%	$ 10.418.943,73	0,53%		$ 950.790.829,20	48,82%	$ 3.116.048,00	0,16%
46	S-46	27/04/2025	$ 962.842.934,88	49,44%	$ 10.636.341,95	0,55%		$ 981.714.252,13	50,41%	$ 30.923.422,93	1,59%
47	S-47	4/05/2025	$ 972.624.266,23	49,94%	$ 9.781.331,35	0,50%		$ 998.652.395,13	51,28%	$ 16.938.143,00	0,87%
48	S-48	11/05/2025	$ 980.098.488,48	50,32%	$ 7.474.222,25	0,38%		$ 1.006.528.866,33	51,68%	$ 7.876.471,20	0,40%
49	S-49	18/05/2025	$ 994.922.494,90	51,09%	$ 14.824.006,42	0,76%		$ 1.036.518.797,33	53,22%	$ 29.989.931,00	1,54%
50	S-50	25/05/2025	$ 1.015.068.758,81	52,12%	$ 20.146.263,91	1,03%		$ 1.127.476.453,27	57,89%	$ 90.957.655,94	4,67%
51	S-51	1/06/2025	$ 1.035.215.022,72	53,15%	$ 20.146.263,91	1,03%					
52	S-52	8/06/2025	$ 1.055.361.286,63	54,19%	$ 20.146.263,91	1,03%					
53	S-53	15/06/2025	$ 1.075.507.550,54	55,22%	$ 20.146.263,91	1,03%					
54	S-54	22/06/2025	$ 1.095.383.369,94	56,24%	$ 19.875.819,40	1,02%					
55	S-55	29/06/2025	$ 1.114.027.164,38	57,20%	$ 18.643.794,44	0,96%					
56	S-56	6/07/2025	$ 1.132.670.958,82	58,16%	$ 18.643.794,44	0,96%					
57	S-57	13/07/2025	$ 1.151.314.753,26	59,12%	$ 18.643.794,44	0,96%					
58	S-58	20/07/2025	$ 1.171.281.482,43	60,14%	$ 19.966.729,17	1,03%					
59	S-59	27/07/2025	$ 1.192.206.198,82	61,21%	$ 20.924.716,39	1,07%					
60	S-60	3/08/2025	$ 1.209.634.483,11	62,11%	$ 17.428.284,29	0,89%					
61	S-61	10/08/2025	$ 1.226.076.594,25	62,95%	$ 16.442.111,14	0,84%					
62	S-62	17/08/2025	$ 1.233.714.313,88	63,35%	$ 7.637.719,63	0,39%					
63	S-63	24/08/2025	$ 1.241.172.352,05	63,73%	$ 7.458.038,17	0,38%					
64	S-64	31/08/2025	$ 1.248.365.634,36	64,10%	$ 7.193.282,31	0,37%					
65	S-65	7/09/2025	$ 1.254.878.115,87	64,43%	$ 6.512.481,51	0,33%					
66	S-66	14/09/2025	$ 1.261.390.597,38	64,77%	$ 6.512.481,51	0,33%					
67	S-67	21/09/2025	$ 1.267.733.439,63	65,09%	$ 6.342.842,25	0,33%					
68	S-68	28/09/2025	$ 1.273.953.439,66	65,41%	$ 6.220.000,03	0,32%					
69	S-69	5/10/2025	$ 1.280.173.439,69	65,73%	$ 6.220.000,03	0,32%					
70	S-70	12/10/2025	$ 1.286.393.439,72	66,05%	$ 6.220.000,03	0,32%					

71	S-71	19/10/2025	$ 1.325.893.877,29	68,08%	$ 39.500.437,57	2,03%					
72	S-72	26/10/2025	$ 1.366.073.507,47	70,14%	$ 40.179.630,18	2,06%					
73	S-73	2/11/2025	$ 1.406.253.137,65	72,21%	$ 40.179.630,18	2,06%					
74	S-74	9/11/2025	$ 1.446.432.767,83	74,27%	$ 40.179.630,18	2,06%					
75	S-75	16/11/2025	$ 1.473.252.146,74	75,65%	$ 26.819.378,91	1,38%					
76	S-76	23/11/2025	$ 1.485.874.113,84	76,29%	$ 12.621.967,10	0,65%					
77	S-77	30/11/2025	$ 1.498.696.083,31	76,95%	$ 12.821.969,47	0,66%					
78	S-78	7/12/2025	$ 1.511.518.052,78	77,61%	$ 12.821.969,47	0,66%					
79	S-79	14/12/2025	$ 1.524.340.022,25	78,27%	$ 12.821.969,47	0,66%					
80	S-80	21/12/2025	$ 1.533.088.604,89	78,72%	$ 8.748.582,64	0,45%					
81	S-81	28/12/2025	$ 1.541.349.091,56	79,14%	$ 8.260.486,67	0,42%					
82	S-82	4/01/2026	$ 1.547.764.734,78	79,47%	$ 6.415.643,22	0,33%					
83	S-83	11/01/2026	$ 1.554.180.378,00	79,80%	$ 6.415.643,22	0,33%					
84	S-84	18/01/2026	$ 1.561.147.319,89	80,16%	$ 6.966.941,89	0,36%					
85	S-85	25/01/2026	$ 1.569.039.773,60	80,56%	$ 7.892.453,71	0,41%					
86	S-86	1/02/2026	$ 1.577.169.941,22	80,98%	$ 8.130.167,62	0,42%					
87	S-87	8/02/2026	$ 1.585.066.137,73	81,39%	$ 7.896.196,51	0,41%					
88	S-88	15/02/2026	$ 1.592.896.342,39	81,79%	$ 7.830.204,66	0,40%					
89	S-89	22/02/2026	$ 1.600.740.077,38	82,19%	$ 7.843.734,99	0,40%					
90	S-90	1/03/2026	$ 1.608.739.411,11	82,60%	$ 7.999.333,73	0,41%					
91	S-91	8/03/2026	$ 1.616.532.746,82	83,00%	$ 7.793.335,71	0,40%					
92	S-92	15/03/2026	$ 1.625.499.763,32	83,46%	$ 8.967.016,50	0,46%					
93	S-93	22/03/2026	$ 1.637.498.649,21	84,08%	$ 11.998.885,89	0,62%					
94	S-94	29/03/2026	$ 1.649.771.243,75	84,71%	$ 12.272.594,54	0,63%					
95	S-95	5/04/2026	$ 1.664.573.433,63	85,47%	$ 14.802.189,88	0,76%					
96	S-96	12/04/2026	$ 1.680.566.021,32	86,29%	$ 15.992.587,69	0,82%					
97	S-97	19/04/2026	$ 1.696.558.609,01	87,11%	$ 15.992.587,69	0,82%					
98	S-98	26/04/2026	$ 1.704.432.501,33	87,52%	$ 7.873.892,32	0,40%					
99	S-99	3/05/2026	$ 1.712.140.705,99	87,91%	$ 7.708.204,66	0,40%					
100	S-100	10/05/2026	$ 1.721.817.914,73	88,41%	$ 9.677.208,74	0,50%					
101	S-101	17/05/2026	$ 1.736.558.276,80	89,17%	$ 14.740.362,07	0,76%					
102	S-102	24/05/2026	$ 1.751.298.638,87	89,92%	$ 14.740.362,07	0,76%					
103	S-103	31/05/2026	$ 1.766.039.000,94	90,68%	$ 14.740.362,07	0,76%					
104	S-104	7/06/2026	$ 1.774.935.235,23	91,14%	$ 8.896.234,29	0,46%					
105	S-105	14/06/2026	$ 1.781.081.291,74	91,45%	$ 6.146.056,51	0,32%					
106	S-106	21/06/2026	$ 1.787.227.348,25	91,77%	$ 6.146.056,51	0,32%					
107	S-107	28/06/2026	$ 1.793.373.404,76	92,08%	$ 6.146.056,51	0,32%					
108	S-108	5/07/2026	$ 1.799.519.461,27	92,40%	$ 6.146.056,51	0,32%					
109	S-109	12/07/2026	$ 1.805.665.517,78	92,71%	$ 6.146.056,51	0,32%					
110	S-110	19/07/2026	$ 1.811.811.574,29	93,03%	$ 6.146.056,51	0,32%					
111	S-111	26/07/2026	$ 1.817.957.630,80	93,34%	$ 6.146.056,51	0,32%					
112	S-112	2/08/2026	$ 1.824.103.687,31	93,66%	$ 6.146.056,51	0,32%					
113	S-113	9/08/2026	$ 1.830.249.743,82	93,98%	$ 6.146.056,51	0,32%					
114	S-114	16/08/2026	$ 1.836.395.800,33	94,29%	$ 6.146.056,51	0,32%					
115	S-115	23/08/2026	$ 1.842.541.856,84	94,61%	$ 6.146.056,51	0,32%					
116	S-116	30/08/2026	$ 1.848.687.913,35	94,92%	$ 6.146.056,51	0,32%					
117	S-117	6/09/2026	$ 1.854.833.969,86	95,24%	$ 6.146.056,51	0,32%					
118	S-118	13/09/2026	$ 1.860.980.026,37	95,55%	$ 6.146.056,51	0,32%					
119	S-119	20/09/2026	$ 1.867.126.082,88	95,87%	$ 6.146.056,51	0,32%					
120	S-120	27/09/2026	$ 1.873.272.139,39	96,18%	$ 6.146.056,51	0,32%					
121	S-121	4/10/2026	$ 1.879.089.924,30	96,48%	$ 5.817.784,91	0,30%					
122	S-122	11/10/2026	$ 1.884.669.995,30	96,77%	$ 5.580.071,00	0,29%					
123	S-123	18/10/2026	$ 1.890.250.066,30	97,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
124	S-124	25/10/2026	$ 1.895.830.137,30	97,34%	$ 5.580.071,00	0,29%					
125	S-125	1/11/2026	$ 1.901.410.208,30	97,63%	$ 5.580.071,00	0,29%					
126	S-126	8/11/2026	$ 1.906.990.279,30	97,92%	$ 5.580.071,00	0,29%					
127	S-127	15/11/2026	$ 1.912.570.350,30	98,20%	$ 5.580.071,00	0,29%					
128	S-128	22/11/2026	$ 1.918.150.421,30	98,49%	$ 5.580.071,00	0,29%					
129	S-129	29/11/2026	$ 1.923.730.492,30	98,78%	$ 5.580.071,00	0,29%					
130	S-130	6/12/2026	$ 1.929.310.563,30	99,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
131	S-131	13/12/2026	$ 1.934.890.634,30	99,35%	$ 5.580.071,00	0,29%					
132	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 12.684.276,30	0,65%					
					$ 1.947.574.910,60	100%					

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón
	Directora de Interventoría.
	CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ
