	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión	Código	
	Vigencia a partir de 29/04/2010	03	FMI043	

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA — CONTRATO No. 407 - 2025

OBJETO: CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA : CONSORCIO ESCUELA LA CONQUISTA 2025

INTERVENTOR: HG INGENIERIA Y DESARROLLO SAS

PERÍODO A PAGAR: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2025 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

En LA JAGUA DE IBIRICO, a los veintiseis (26) dias del mes de NOVIEMBRE del año 2025 se reunieron CESAR ANDRES ALARCON VELAQUEZ representante legal del Contratista y MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE representante legal de Interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL	ACUMULADO	PRESENTE MES	ACUMULADO	ACUMULADO	PRESENTE MES	ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR
1	PRELIMINARES								-	-	-	-	-
1,01	DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL (INC. RETIRO)	M2	563,60	10.894,62	6.140.205,00		563,60	563,60	-	6.140.205,00	6.140.205,00	-	-
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	422,70	5.577,69	2.357.691,00		422,70	422,70	-	2.357.691,00	2.357.691,00	-	-
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS								-	-	-	-	-
2,01	EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS	M3	40,67	60.210,00	2.448.741,00		40,67	40,67	-	2.448.741,00	2.448.741,00	-	-
2,02	EXCAVACIÓN PARA CONCRETO CICLOPEO DE 0,30X0,60 Y PARA	ML	297,78	35.713,85	10.634.869,00		297,78	297,78	-	10.634.869,00	10.634.869,00	-	-
2,03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	23,24	51.075,38	1.186.992,00		23,24	23,24	-	1.186.992,00	1.186.992,00	-	-
3	ESTRUCTURAS								-	-	-	-	-
3,01	SOLADOS DE CONCRETO DE 2500 PSI E=0,05	M2	40,67	39.386,92	1.601.866,00		40,67	40,67	-	1.601.866,00	1.601.866,00	-	-
3,02	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	12,20	752.262,31	9.177.600,00		12,20	12,20	-	9.177.600,00	9.177.600,00	-	-
3,03	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,30 X 0,30	ML	58,10	82.696,15	4.804.647,00		58,10	58,10	-	4.804.647,00	4.804.647,00	-	-
3,04	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN (60% PIEDRA - 40% CONCRETO 3000 PSI) 0,30X0,30	ML	256,90	37.384,62	9.604.108,00		256,90	256,90	-	9.604.108,00	9.604.108,00	-	-
3,05	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,30 X 0,30	ML	281,80	78.602,31	22.150.130,00		281,80	281,80	-	22.150.130,00	22.150.130,00	-	-
3,06	COLUMNA EN CONCRETO DE 0,20 X 0,20 CONCRETO DE 3000 PSI	ML	66,40	77.776,15	5.164.337,00		66,40	66,40	-	5.164.337,00	5.164.337,00	-	-
3,07	VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,20	ML	275,80	75.352,31	20.782.166,00		275,80	275,80	-	20.782.166,00	20.782.166,00	-	-
4	ACEROS								-	-	-	-	-
4,01	ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI	KG	4.664,40	7.726,15	36.037.893,00		4.664,40	4.664,40	-	36.037.893,00	36.037.893,00	-	-
5	MAMPOSTERIA								-	-	-	-	-
5,01	MAMPOSTERIA CONFINADA PARA MURO DE CERRAMIENTO EN	M2	215,80	40.675,38	8.777.748,00		215,80	215,80	-	8.777.748,00	8.777.748,00	-	-
5,02	PAÑETES LISO ALLANADO	M2	557,60	38.136,15	21.264.719,00		557,60	557,60	-	21.264.719,00	21.264.719,00	-	-
5,03	FILOS Y DILATACIONES	ML	1.347,80	14.700,77	19.813.697,00		1.347,80	1.347,80	-	19.813.697,00	19.813.697,00	-	-
6	CARPINTERIA METALICA								-	-	-	-	-
6,01	MALLA ESLABONADA C. 10	M2	581,60	86.613,85	50.374.613,00		-	-	-	-	-	581,60	50.374.613,00
6,02	TUBO METALICO 3" PARA AMARRE DE MALLA	ML	64,00	140.662,31	9.002.388,00		-	-	-	-	-	64,00	9.002.388,00
6,03	TUBO METALICO 2" PARA AMARRE DE MALLA	ML	1.194,40	94.729,23	113.144.593,00		304,98	304,98	-	28.890.521,00	28.890.521,00	889,42	84.254.072,00
7	ACABADOS								-	-	-	-	-
7,01	PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURA METÁLICA	M2	1.151,20	33.371,54	38.417.315,00		304,98	304,98	-	10.177.652,00	10.177.652,00	846,22	28.239.663,00
7,02	GRANIPLAST	M2	563,60	45.733,08	25.775.162,00		-	-	-	-	-	563,60	25.775.162,00
8	SEGURIDAD								-	-	-	-	-
8,01	ALAMBRE DE PUAS (4 LÍNEAS)	ML	281,80	10.693,85	3.013.526,00		-	-	-	-	-	281,80	3.013.526,00
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					421.675.006,00				-	221.015.582,00	221.015.582,00		200.659.424,00
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					126.502.501,00				-	66.304.675,00	66.304.675,00		60.197.827,00
	ADMINISTRACIÓN	24,00%			101.202.001,00				-	53.043.740,00	53.043.740,00		48.158.262,00
	IMPREVISTOS	1,00%			4.216.750,00				-	2.210.156,00	2.210.156,00		2.006.594,00
	UTILIDAD	5,00%			21.083.750,00				-	11.050.779,00	11.050.779,00		10.032.971,00
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD	0,00%			-				-	-	-		-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					548.177.507,00				-	287.320.257,00	287.320.257,00		260.857.251,00

BALANCE PRESUPUESTAL

274.088.753,50
13.231.503,50

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL Vigencia a partir de 29/04/2010	Versión 03	Código FMI043	

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA CONTRATO No. 407 - 2025
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCUELA LA CONQUISTA 2025
INTERVENTOR: HG INGENIERIA Y DESARROLLO SAS
PERÍODO A PAGAR: DEL 22 DE OCTUBRE DE 2025 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

En LA JAGUA DE IBIRICO, a los veintiseis (26) días del mes de NOVIEMBRE del año 2025 se reunieron CESAR ANDRES ALARCON VELAQUEZ representante legal del Contratista y MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE representante legal de Interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL	ACUMULADO	PRESENTE MES	ACUMULADO	ACUMULADO	PRESENTE MES	ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR
	V/R INICIAL CONTRATO:		548.177.507,00		V/R ANTICIPO:			-					
	V/R ADICIONES:				% ANTICIPO :			0%					
	V/R ACTUAL CONTRATO:		548.177.507,00		% RETEGARANTIA :								

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE	VALOR	% PAGADO	RETENCIÓN	AMORTIZACIÓ	SALDO POR	VALOR NETO A	SALDO POR	% PAGADO
1	ACTA No. 1	26-nov.-25	287.320.257,00	52,41%	-	-	-	287.320.257,00	260.857.250,00	52,41%
2										
3										
	TOTAL		287.320.257,00	52,41%	-	-	-	287.320.257,00	260.857.250,00	

EL CONTRATISTA:

Firma: Cesar Alarcon V.
Nombre: CESAR ANDRES ALARCON VELAQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE
FECHA DE ELABORACIÓN

EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoria, o por el Director de Obra, o Consultoria y por el Director de Interventoria.

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	
		nov-25	
		25 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES	ÍTEM	1,01	DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL (INC. RETIRO)	UNIDAD DE MEDIDA	M2



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
FACHADA ENTRADA PRINCIPAL	49,18	2				98,36
FACHADA LATERAL DERECHA	86,38	2				172,76
FACHADA LATERAL IZQUIERDA	99,37	2				198,74
FACHADA PORTERIOR FONDO	46,87	2				93,74
					Subtotal	563,60
					Vienen	
					TOTAL	563,60

OBSERVACIONES:

Wilson Puello C

WILSON PUELLO CARVAJAL

RESIDENTE DE OBRA

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	
		nov-25	
		25 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES	ÍTEM	1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	UNIDAD DE MEDIDA	M2



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
FACHADA ENTRADA PRINCIPAL	49,18	1,5				73,77
FACHADA LATERAL DERECHA	86,38	1,5				129,57
FACHADA LATERAL IZQUIERDA	99,37	1,5				149,06
FACHADA PORTERIOR FONDO	46,87	1,5				70,31
Subtotal						422,70
Vienen						
TOTAL						422,70

OBSERVACIONES:

Wilson Puello C

WILSON PUELLO CARVAJAL

RESIDENTE DE OBRA

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	
		nov-25	
		25 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPÍTULO	2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	ÍTEM	2,01	EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS	UNIDAD DE MEDIDA	M3



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	RADIO		
FACHADA ENTRADA PRINCIPAL (49,64m)	0,7	0,7	1,00		15	7,35
FACHADA LATERAL DERECHA (87,01m)	0,7	0,7	1,00		25	12,25
FACHADA LATERAL IZQUIERDA (104,70m)	0,7	0,7	1,00		29	14,21
FACHADA PORTERIOR FONDO (47,99m)	0,7	0,7	1,00		14	6,86
Subtotal						40,67
Vienen						
TOTAL						40,67

OBSERVACIONES:

Wilson Puello C

WILSON PUELLO CARVAJAL

RESIDENTE DE OBRA

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	
		nov-25	
		25 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPÍTULO	2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	ÍTEM	2,02	EXCAVACIÓN PARA CONCRETO CICLOPEO DE 0,30X0,60 Y PARA VIGAS DE AMARRE	UNIDAD DE MEDIDA	ML



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	RADIO		
FACHADA ENTRADA PRINCIPAL	77,64				15	67,14
FACHADA LATERAL DERECHA	93,79				25	76,29
FACHADA LATERAL IZQUIERDA	105,89				29	85,59
FACHADA PORTERIOR FONDO	78,56				14	68,76
Subtotal						297,78
Vienen						
TOTAL						297,78

OBSERVACIONES:

Wilson Puello C

WILSON PUELLO CARVAJAL

RESIDENTE DE OBRA

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	
		nov-25	
		25 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPÍTULO	2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	ÍTEM	2,03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	UNIDAD DE MEDIDA	M3



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	A1	A2	ALTO	RADIO		
FACHADA ENTRADA PRINCIPAL	0,49	0,09	0,70		15	4,20
FACHADA LATERAL DERECHA	0,49	0,09	0,70		25	7,00
FACHADA LATERAL IZQUIERDA	0,49	0,09	0,70		29	8,12
FACHADA PORTERIOR FONDO	0,49	0,09	0,70		14	3,92
				Subtotal		23,24
				Vienen		
				TOTAL		23,24

OBSERVACIONES:

Wilson Puello C

WILSON PUELLO CARVAJAL
RESIDENTE DE OBRA

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	
		nov-25	
		25 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPÍTULO	3	ESTRUCTURAS	ÍTEM	3,01	SOLADOS DE CONCRETO DE 2500 PSI E=0,05	UNIDAD DE MEDIDA	M2



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	RADIO		
FACHADA ENTRADA PRINCIPAL	0,7	0,7			15	7,35
FACHADA LATERAL DERECHA	0,7	0,7			25	12,25
FACHADA LATERAL IZQUIERDA	0,7	0,7			29	14,21
FACHADA PORTERIOR FONDO	0,7	0,7			14	6,86
Subtotal						40,67
Vienen						
TOTAL						40,67

OBSERVACIONES:

Wilson Puello C

WILSON PUELLO CARVAJAL
RESIDENTE DE OBRA

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	
		nov-25	
		25 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÒN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPÍTULO	3	ESTRUCTURAS	ÍTEM	3,02	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	UNIDAD DE MEDIDA	M3



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	RADIO		
FACHADA ENTRADA PRINCIPAL	0,7	0,7	0,30		15	2,21
FACHADA LATERAL DERECHA	0,7	0,7	0,30		25	3,68
FACHADA LATERAL IZQUIERDA	0,7	0,7	0,30		29	4,26
FACHADA POSTERIOR FONDO	0,7	0,7	0,30		14	2,06
Subtotal						12,20
Vienen						
TOTAL						12,20

OBSERVACIONES:

Wilson Puello C

WILSON PUELLO CARVAJAL

RESIDENTE DE OBRA

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	
		nov-25	
		25 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPÍTULO	3	ESTRUCTURAS	ÍTEM	3,03	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,30 X 0,30	UNIDAD DE MEDIDA	ML



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	RADIO		
FACHADA ENTRADA PRINCIPAL			0,70		15	10,50
FACHADA LATERAL DERECHA			0,70		25	17,50
FACHADA LATERAL IZQUIERDA			0,70		29	20,30
FACHADA PORTERIOR FONDO			0,70		14	9,80
Subtotal						58,10
Vienen						
TOTAL						58,10

OBSERVACIONES:

Wilson Puello C

WILSON PUELLO CARVAJAL

RESIDENTE DE OBRA

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA nov-25 25 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPÍTULO	3	ESTRUCTURAS	ÍTEM	3,04	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN (60% PIEDRA - 40% CONCRETO 3000 PSI) 0,30X0,30	UNIDAD DE MEDIDA	ML



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	RADIO		
FACHADA ENTRADA PRINCIPAL	49,18		0,30		15	44,68
FACHADA LATERAL DERECHA	86,38		0,30		25	78,88
FACHADA LATERAL IZQUIERDA	99,37		0,30		29	90,67
FACHADA PORTERIOR FONDO	46,87		0,30		14	42,67
					Subtotal	256,90
					Vienen	
					TOTAL	256,90

OBSERVACIONES:

WILSON PUELLO CARVAJAL
RESIDENTE DE OBRA

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	
		nov-25	
		25 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPÍTULO	3	ESTRUCTURAS	ÍTEM	3,05	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,30 X 0,30	UNIDAD DE MEDIDA	ML



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	RADIO		
FACHADA ENTRADA PRINCIPAL	49,18				1	49,18
FACHADA LATERAL DERECHA	86,38				1	86,38
FACHADA LATERAL IZQUIERDA	99,37				1	99,37
FACHADA POSTERIOR FONDO	46,87				1	46,87
Subtotal						281,80
Vienen						
TOTAL						281,80

OBSERVACIONES:

Wilson Puello C

WILSON PUELLO CARVAJAL

RESIDENTE DE OBRA

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	
		nov-25	
		25 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPÍTULO	3	ESTRUCTURAS	ÍTEM	3,06	COLUMNA EN CONCRETO DE 0,20 X 0,20 CONCRETO DE 3000 PSI	UNIDAD DE MEDIDA	ML



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	RADIO		
FACHADA ENTRADA PRINCIPAL	0,8				15	12,00
FACHADA LATERAL DERECHA	0,8				25	20,00
FACHADA LATERAL IZQUIERDA	0,8				29	23,20
FACHADA PORTERIOR FONDO	0,8				14	11,20
					Subtotal	66,40
					Vienen	
					TOTAL	66,40

OBSERVACIONES:

Wilson Puello C

WILSON PUELLO CARVAJAL

RESIDENTE DE OBRA

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	
		nov-25	
		25 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPITULO	3	ESTRUCTURAS	ÍTEM	3,07	VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,20	UNIDAD DE MEDIDA	ML



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	RADIO		
FACHADA ENTRADA PRINCIPAL	49,18				1	49,18
PORTON PRINCIPAL	-3					-3,00
FACHADA LATERAL DERECHA	86,38				1	86,38
FACHADA LATERAL IZQUIERDA	99,37				1	99,37
PORTON PRINCIPAL	-3					-3,00
FACHADA POSTERIOR FONDO	46,87				1	46,87
Subtotal						275,80
Vienen						
TOTAL						275,80

OBSERVACIONES:

Wilson Puello C

WILSON PUELLO CARVAJAL

RESIDENTE DE OBRA

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	
		nov-25	
		25 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPÍTULO	4	ACEROS	ÍTEM	4,01	ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI	UNIDAD DE MEDIDA	KG



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	#	PESO	CANT.		
ZAPATA	1	1/2"	1,00	8,00	83	664,00
PEDESTAL	2,5	1/2"	1,00	4,00	83	830,00
ESTRIBO PEDESTAL	1	3/8"	0,56	5,00	83	232,40
ESTRIBO COLUMNA	1	3/8"	0,56	6,00	83	278,88
VIGA DE AMARRE CERRAMIENTO	4	1/2"	1,00	192,04	1	768,16
ESTRIBO VIGA DE AMARRE	1	3/8"	0,56	1.281,27	1	717,51
TRASLAPOS	4	1/2"	1,00	0,60	128	76,82
VIGA AEREA	4	1/2"	1,00	192,04	1	768,16
ESTRIBO VIGA AEREA	0,8	3/8"	0,56	961,20	1	430,62
TRASLAPOS	4	1/2"	1,00	0,60	128	76,82

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	
		nov-25	
		25 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPÍTULO	5	MAMPOSTERIA	ÍTEM	5,01	MAMPOSTERIA CONFINADA PARA MURO DE CERRAMIENTO EN LADRILLO PANELON	UNIDAD DE MEDIDA	M2



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT		
FACHADA ENTRADA PRINCIPAL	3,25		0,80	15,00	1	39,00
FACHADA LATERAL DERECHA	3,25		0,80	25,00	1	65,00
FACHADA LATERAL IZQUIERDA	3,25		0,80	29,00	1	75,40
FACHADA POSTERIOR FONDO	3,25		0,80	14,00	1	36,40
Subtotal						215,80
Vienen						
TOTAL						215,80

OBSERVACIONES:

Wilson Puello


WILSON PUELLO CARVAJAL

RESIDENTE DE OBRA

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	
		nov-25	
		25 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPÍTULO	5	MAMPOSTERIA	ÍTEM	5.02	PAÑETES LISO ALLANADO	UNIDAD DE MEDIDA	M2

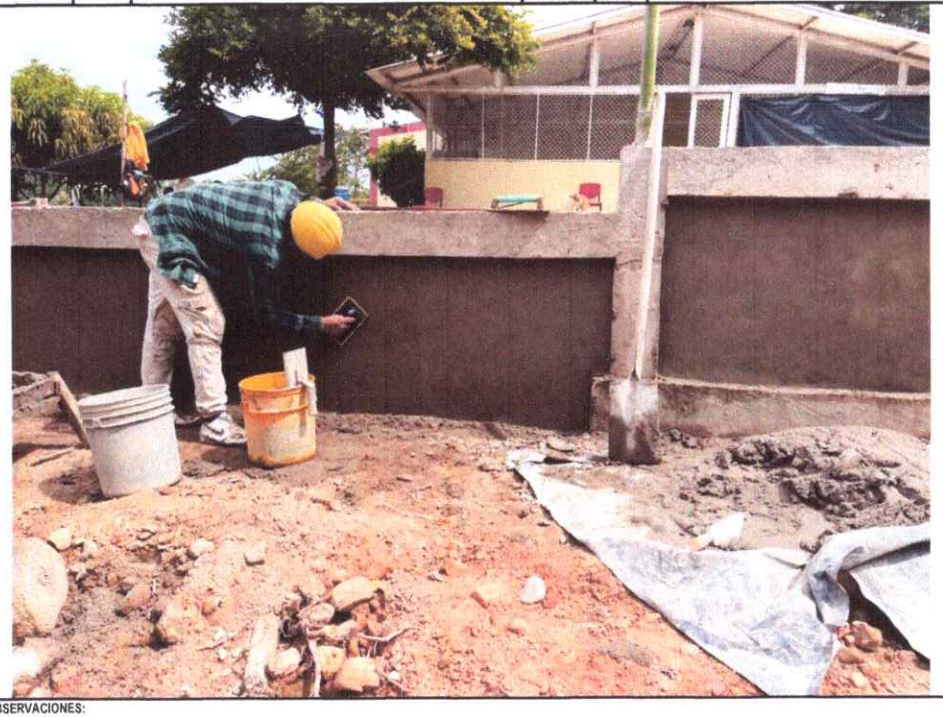

Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT		
FACHADA ENTRADA PRINCIPAL	49,18		1,00	2,00	1	98,36
FACHADA LATERAL DERECHA	86,38		1,00	2,00	1	172,76
FACHADA LATERAL IZQUIERDA	99,37		1,00	2,00	1	198,74
Portón	-3		1,00	2,00		-6,00
FACHADA POSTERIOR FONDO	46,87		1,00	2,00	1	93,74
Subtotal						557,60
Vienen						
TOTAL						557,60

OBSERVACIONES:

Wilson Puello C

WILSON PUELLO CARVAJAL

RESIDENTE DE OBRA

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	
		nov-25	
		25 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPITULO	5	MAMPOSTERIA	ÍTEM	5.03	FILOS Y DILATACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ML



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT		
FACHADA ENTRADA PRINCIPAL	8,1			15,00	2	243,00
	0,8			1,00	2	1,60
FACHADA LATERAL DERECHA	8,1			25,00	2	405,00
	0,8			1,00	2	1,60
FACHADA LATERAL IZQUIERDA	8,1			29,00	2	469,80
FACHADA POSTERIOR FONDO	8,1			14,00	2	226,80
Subtotal						1.347,80
Vienen						
TOTAL						1.347,80

OBSERVACIONES:

Wilson Puello C

WILSON PUELLO CARVAJAL

RESIDENTE DE OBRA

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	
		nov-25	
		25 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPÍTULO	6	CARPINTERIA METALICA	ÍTEM	6,03	TUBO METALICO 2" PARA AMARRE DE MALLA	UNIDAD DE MEDIDA	ML



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT		
COLUMNAS DE CERRAMIENTO	3,5			1,00	83	290,50
DIAGONALES DEL CERRAMIENTO	4,1			1,00	3,5	14,48
Subtotal						304,98
Vienen						
TOTAL						304,98

OBSERVACIONES:

Wilson Puello C

WILSON PUELLO CARVAJAL

RESIDENTE DE OBRA

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA nov-25 25 de 25	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

CAPÍTULO	7	ACABADOS	ÍTEM	7,01	PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURA METÁLICA	UNIDAD DE MEDIDA	M2



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT		
FACHADA LATERAL DERECHA	76,2		2,00		2	304,98
Subtotal						304,98
Vienen						
TOTAL						304,98

OBSERVACIONES:

Wilson Puello C

WILSON PUELLO CARVAJAL

RESIDENTE DE OBRA
