ANEXO ACTA DE CONTRATO DE OBRA

ANEXO AL ACTA Nº 01 DEL CONTRATO SAMC-002-2025
(ACTA DE RECIBO PARCIAL ___ ACTA DE RECIBO FINAL _____)

ALCALDÍA DE CONTRATACIÓN

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO : SAMC-002-2025

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION EN EL MARCO DEL CONVENIO N°CO1.PCCNTR.6937310 (IT-CD-24-14) CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR: $ 348,697,142.87 % EJECUCION **64.56%**


ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS (ACTA No.1)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
			UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1		**MANTENIMIENTO VIAS CONTRATACION**										
1.1		Desmonte y Limpieza en Zonas No Boscosas	Ha	3.00	$ 418,374.81	$ 1,255,124.44	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
1.2		Remoción Manual de Derrumbes Menores	M3	10.15	$ 40,660.00	$ 412,699.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
1.3		Limpieza a Mano de Cunetas, Zanjas y Descoles	ml	1,015.20	$ 10,103.70	$ 10,257,280.00	436.98	$ 4,415,116.44	210.00	$ 2,121,777.78	210.00	$ 2,121,777.78
1.4		Limpieza a Mano de Alcantarillas	und	30.00	$ 143,265.93	$ 4,297,977.78	5.00	$ 716,329.63	5.00	$ 716,329.63	5.00	$ 716,329.63
1.5		Transporte de material de afirmado y provenientes de la excavación de la explanación y deslizamientos, para distancias mayores de mil metros (1,000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	21,070.72	$ 1,845.19	$ 38,879,380.39	6,062.03	$ 11,185,567.95	4,679.61	$ 8,634,752.58	4,679.61	$ 8,634,752.58
1.6		Remoción de Derrumbes a Maquina	m3	51.00	$ 6,657.04	$ 339,508.89	50.00	$ 332,851.85	35.00	$ 232,996.30	35.00	$ 232,996.30
1.7		Poda de la parte aerea de árboles tipo IV	und	30.00	$ 60,940.74	$ 1,828,222.22		$ -		$ -	0.00	$ -
1.8		Conformacion y compactación de calzada existente (no incluye material)	m2	10,405.00	$ 1,716.30	$ 17,858,062.96	73,000.00	$ 125,289,629.63	38,000.00	$ 65,219,259.26	38,000.00	$ 65,219,259.26
1.9		Suministro, instalación y compatacion de afirmado (no incluye transporte)	m3	1,041.00	$ 75,480.00	$ 78,574,680.00	1,541.53	$ 116,354,684.40	1,190.00	$ 89,821,200.00	1,190.00	$ 89,821,200.00
		COSTO DIRECTO OBRA				**$ 153,702,935.68**		**$ 258,294,179.90**		**$ 166,746,315.54**		**$ 166,746,315.54**
		ADMINISTRACIÓN			29%	$ 44,573,851.35		$ 74,905,312.17		$ 48,356,431.51		$ 48,356,431.51
		IMPREVISTOS			1%	$ 1,537,029.36		$ 2,582,941.80		$ 1,667,463.16		$ 1,667,463.16
		UTILIDAD			5%	$ 7,685,146.78		$ 12,914,709.00		$ 8,337,315.78		$ 8,337,315.78
		COSTO INDIRECTO OBRA				**$ 53796027.490.00**		**$ 90,402,963**		**$ 225,107,525.99**		**$ 225,107,525.99**
		COSTO TOTAL DE OBRA				**$ 207,498,963**		**$ 348,697,143**				
		PMT			1%	**$ 9,444,130**						
		PMA				**$ 15,521,800**						
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 232,464,893.17**		**$ 348,697,142.87**		**$ 225,107,525.99**		**$ 225,107,525.99**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: **DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTA ($225.107.525,99)**

CARLOS CASTILLO RUEDA
REP. LEGAL COOPRESSTA NIT 804.013.342-7
CONTRATISTA

DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MUNICIPIO DE CONTRATACION

MEMORIAS DE CONSTRUCCION												
PROYECTO	OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION EN EL MARCO DEL CONVENIO N°CO1.PCCNTR.6937310 (IT-CD-24-14) CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER											
LOCALIZACION	VIA CONTRATATACION-GUACAMAYO/VIA CONTRATACION CHIMA		**DESCRIPCIÓN:**		Limpieza a Mano de Cunetas, Zanjas y Descoles							
COORDENADAS MAGNA SIRGAS	INICIO					FINAL						
ITEM	1.3	**UNIDAD**	**ML**	**INICIO**				**FINAL**				

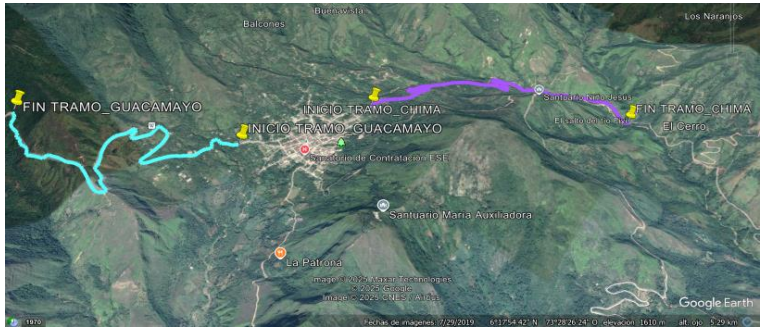ESQUEMA		**Dimensiones**				**LONGITUD REALIZADA EN LIMPIEZA DE CUNETAS**	**Medida Total**
		Localización		**Longitud**	**Descripción**		
		Inicio	**Fin**	**KM**			
		TRAMO 1				**ML**	
		K0+000.00	K4+000.00	4.00	TRAMO CONTRATACION-GUACAMAYO	80	80.00
		TRAMO 2					
		K0+000.00	K3+600.00	3.60	TRAMO CONTRATACION-CHIMA	130	130.00
					Subtotal		210.00
					TOTAL		**210.00**


CARLOS CASTILLO RUEDA
REP. LEGAL COOPRESSTA NIT 804.013.342-7
CONTRATISTA


DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MUNICIPIO DE CONTRATACION

MEMORIAS DE CONSTRUCCION

PROYECTO	OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION EN EL MARCO DEL CONVENIO N°CO1.PCCNTR.6937310 (IT-CD-24-14) CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER								
LOCALIZACION	VIA CONTRATATACION-GUACAMAYO/VIA CONTRATACION CHIMA		**DESCRIPCIÓN:**		Limpieza a Mano de Alcantarillas				
COORDENADAS MAGNA SIRGAS	INICIO					FINAL			
ITEM	1.4	**UNIDAD**	**UND**	**INICIO**			**FINAL**		

ESQUEMA

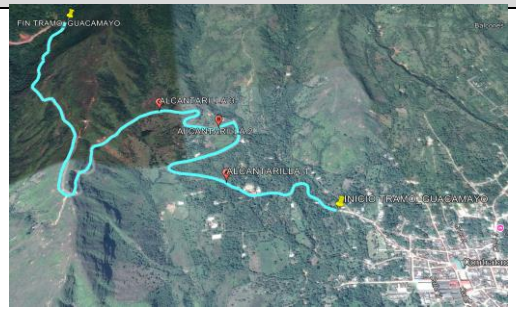

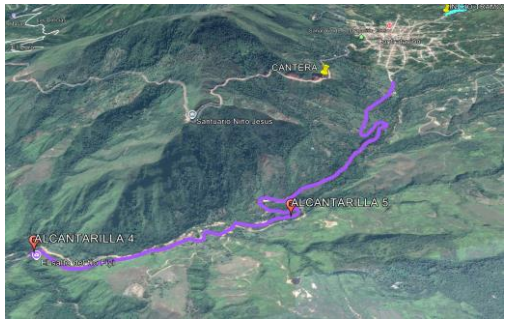


	Dimensiones					
	Localización		Longitud	Descripción	ALCANTARILLA	Medida Total
	Inicio	Fin	KM	m		M3
	COORDENADAS				CANTIDAD	
	73°28'48.13"O	6°16'58.05"N		ALCANTARILLA 1	1	1.00
	73°28'58.53"O	6°16'59.20"N		ALCANTARILLA 2	1	1.00
	73°29'3.33"O	6°16'51.02"N		ALCANTARILLA 3	1	1.00
	TRAMO 2					
	73°27'25.06"O	6°18'32.85"N		ALCANTARILLA 4		1.00
	73°28'4.58"O	6°18'25.49"N		ALCANTARILLA 5		1.00
				Subtotal		5.00
				TOTAL		**5.00**

CARLOS CASTILLO RUEDA
REP. LEGAL COOPRESSTA NIT 804.013.342-
CONTRATISTA

DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MUNICIPIO DE CONTRATACION


MEMORIAS DE CONSTRUCCION

PROYECTO	OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION EN EL MARCO DEL CONVENIO N°CO1.PCCNTR.6937310 (IT-CD-24-14) CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER														
LOCALIZACION	VIA CONTRATATACION-GUACAMAYO/VIA CONTRATACION CHIMA		**DESCRIPCIÓN:**	Transporte de material de afirmado y provenientes de la excavación de la explanación y deslizamientos, para distancias mayores de mil metros (1,000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)											
COORDENADAS MAGNA SIRGAS	INICIO							FINAL							
ITEM	1.50	**UNIDAD**	**M3-KM**	**INICIO**						**FINAL**					
ESQUEMA				**KM RECEBERA - RESTAURANTE BRISAS**	**Localización**		**Longitud**	**Descripción**		**VIAJE**		**KMS TOTALES**	**TOTAL**		
					Inicio	**Fin**	**KM**	**m**					**K**		
					TRAMO 1					**#VIAJES**	**M3**		**KM-M3**		
					K0+000.00	K0+400.00	3.93	TRAMO CONTRATACION-GUACAMAYO		80	7	560	2202.17		
					TRAMO 2										
					K0+000.00	K3+600.00	3.93	TRAMO CONTRATACION-CHIMA		90	7	630	2477.44		
								Subtotal					4679.61		
								TOTAL					**4679.61**		

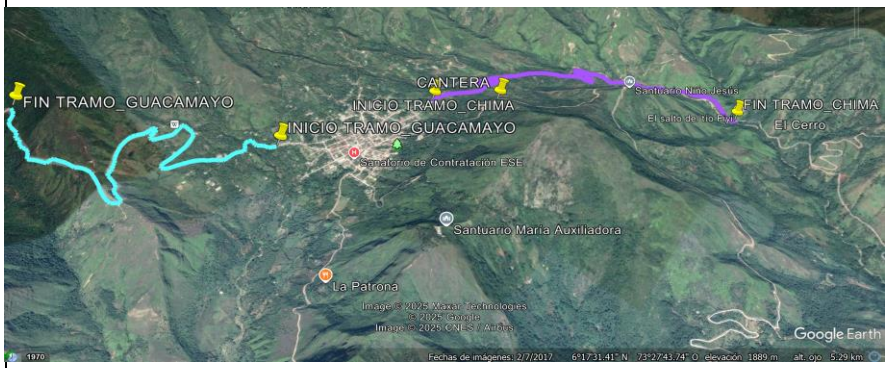

CARLOS CASTILLO RUEDA
REP. LEGAL COOPRESSTA NIT 804.013.342-
CONTRATISTA

DIEGO FERNANDO [illegible] CARREÑO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MUNICIPIO DE CONTRATACION

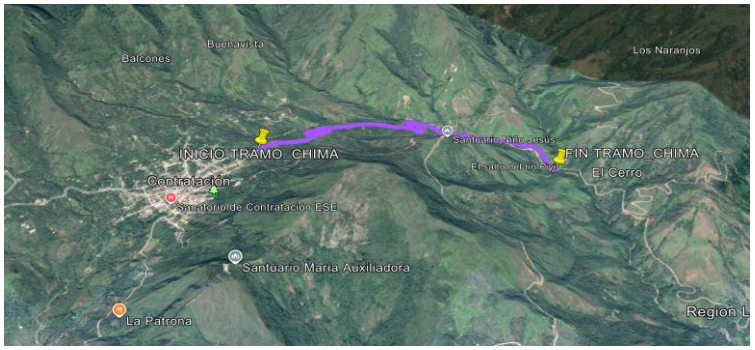MEMORIAS DE CONSTRUCCION													
PROYECTO	OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION EN EL MARCO DEL CONVENIO N°CO1.PCCNTR.6937310 (IT-CD-24-14) CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER												
LOCALIZACION	VIA CONTRATATACION-GUACAMAYO/VIA CONTRATACION CHIMA		**DESCRIPCIÓN:**		Remoción de Derrumbes a Maquina								
COORDENADAS MAGNA SIRGAS	INICIO					FINAL							
ITEM	1.60	**UNIDAD**	**m3**	**INICIO**				**FINAL**					
ESQUEMA					**Dimensiones**					**VIAJE**		**Medida Total**	
						Localización		**Longitud**	**Descripción**				
						Inicio	**Fin**	**KM**	**m**				**M3**
						TRAMO 1				**#VIAJES**	**M3**		
						K0+000.00	K4+000.00	4.00	TRAMO CONTRATACION-GUACAMAYO	0	0	0.00	
						TRAMO 2							
						K0+000.00	K3+600.00	3.60	TRAMO CONTRATACION-CHIMA	5	7	35.00	
									Subtotal			35.00	
									TOTAL			**35.00**	


CARLOS CASTILLO RUEDA
REP. LEGAL COOPRESSTA NIT 804.013.342-7
CONTRATISTA

DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MUNICIPIO DE CONTRATACION

MEMORIAS DE CONSTRUCCION

PROYECTO	OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION EN EL MARCO DEL CONVENIO N°CO1.PCCNTR.6937310 (IT-CD-24-14) CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
LOCALIZACION	VIA CONTRATATACION-GUACAMAYO/VIA CONTRATACION CHIMA	**DESCRIPCIÓN:**	Conformacion y compactación de calzada existente (no incluye material)				
COORDENADAS MAGNA SIRGAS	INICIO			FINAL			
ITEM	1.80	**UNIDAD**	**m2**	**INICIO**		**FINAL**	


ESQUEMA



	Dimensiones					
	Localización		Longitud	Descripción	ANCHO VIA	Medida Total
	Inicio	Fin	KM	m		M2
TRAMO 1						
	K0+000.00	K4+000.00	4.00	TRAMO CONTRATACION-GUACAMAYO	5	20000.00
TRAMO 2						
	K0+000.00	K3+600.00	3.60	TRAMO CONTRATACION-CHIMA	5	18000.00
Subtotal						38000.00
TOTAL						**38000.00**

CARLOS CASTILLO RUEDA
REP. LEGAL COOPRESSTA NIT 804.013.34
CONTRATISTA

DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MUNICIPIO DE CONTRATACION

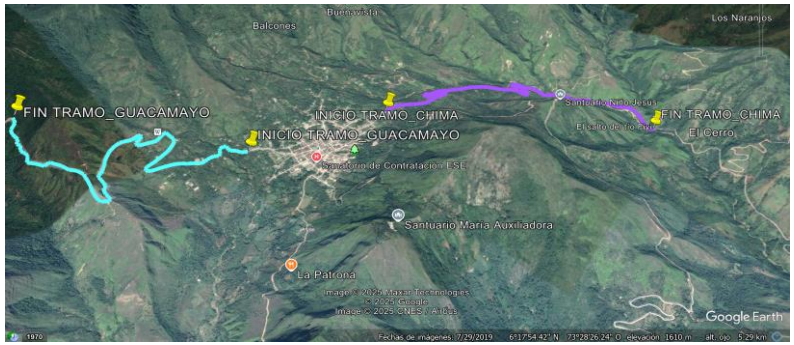MEMORIAS DE CONSTRUCCION												
PROYECTO	OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION EN EL MARCO DEL CONVENIO N°CO1.PCCNTR.6937310 (IT-CD-24-14) CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER											
LOCALIZACION	VIA CONTRATATACION-GUACAMAYO/VIA CONTRATACION CHIMA		**DESCRIPCIÓN:**		Suministro, instalación y compatacion de afirmado (no incluye transporte)							
COORDENADAS MAGNA SIRGAS	INICIO					FINAL						
ITEM	1.90	**UNIDAD**	**m3**	**INICIO**				**FINAL**				
ESQUEMA					**Dimensiones**					**VIAJE**		**Medida Total**
						Localización		**Longitud**	**Descripción**			
						Inicio	**Fin**	**KM**	**m**			**M3**
						TRAMO 1				**#VIAJES**	**M3**	
						K0+000.00	K4+000.00	4.00	TRAMO CONTRATACION-GUACAMAYO	80	7	560.00
						TRAMO 2						
						K0+000.00	K3+600.00	3.60	80.00	90	7	630.00
									Subtotal			1190.00
									TOTAL			**1190.00**

CARLOS CASTILLO RUEDA
REP. LEGAL COOPRESSTA NIT 804.013.342-7
CONTRATISTA

DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MUNICIPIO DE CONTRATACION
