
Id		Calendario de tareas	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Método del valor acumulado
1		ICCU263-2		**CTO ICCU-263-2025 "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA"**	**$ 5.993.209.302,00**	**215 días**	**lun 12/05/25**	**mié 11/02/26**			**% físico completad**
2		ICCU263-2		**ACTA DE INICIO**	**$ 0,00**	**0 días**	**lun 12/05/25**	**lun 12/05/25**		**4;9CC+10 días;10CC+14 dí**	**% físico cc**
3		ICCU263-2		**ACTIVIDADES PREVIAS**	**$ 0,00**	**71 días**	**lun 12/05/25**	**lun 11/08/25**			**% físico cc**
4		ICCU263-2		Levantamiento Topografico Tramo 2	$ 0,00	9 días	lun 12/05/25	jue 22/05/25	2	5;11	% físico cc
5		ICCU263-2		Levantamiento Topográfico Tramo 1	$ 0,00	12 días	jue 22/05/25	vie 6/06/25	4	6CC+2 días;11	% físico cc
6		ICCU263-2		Estudios previos Tramo 1	$ 0,00	60 días	sáb 24/05/25	lun 11/08/25	5CC+2 días	7CC;11	% físico cc
7		ICCU263-2		Apiques verificación T1 y T2	$ 0,00	2 días	sáb 24/05/25	mar 27/05/25	6CC	8CC;11	% físico cc
8		ICCU263-2		Estudios previos Tramo 2	$ 0,00	40 días	sáb 24/05/25	mié 16/07/25	7CC	11;35;36FC+37 días	% físico cc
9		ICCU263-2		Actas de vecindad	$ 0,00	10 días	vie 23/05/25	jue 5/06/25	2CC+10 días	11	% físico cc
10		ICCU263-2		Socialización inicio de obras	$ 0,00	1 día	mié 28/05/25	jue 29/05/25	2CC+14 días	11	% físico cc
11		**ICCU263-2**		**Fin actividades previas**	**$ 0,00**	**0 días**	**lun 11/08/25**	**lun 11/08/25**	**4;5;6;7;8;9;10**		**% físico cc**
12		**ICCU263-2**		**EJECUCIÓN DE OBRA**	**$ 5.993.209.302,00**	**215 días**	**lun 12/05/25**	**mié 11/02/26**			**% físico cc**
13		ICCU263-2		Elaboración y tramite PMT	$ 0,00	26 días	lun 12/05/25	vie 13/06/25	2	16CC+18 días;14CC+18 dí	% físico cc
14		**ICCU263-2**		**Aprobación interventoria Tramo 1**	**$ 0,00**	**0 días**	**mar 3/06/25**	**mar 3/06/25**	**13CC+18 días**	**15FC+8 días**	**% físico cc**
15		**ICCU263-2**		**Aprobación entidad contratante tramo 1**	**$ 0,00**	**0 días**	**vie 13/06/25**	**vie 13/06/25**	**14FC+8 días**	**59**	**% físico cc**
16		**ICCU263-2**		**Aprobación interventoria Tramo 2**	**$ 0,00**	**0 días**	**mar 3/06/25**	**mar 3/06/25**	**13CC+18 días**	**17FC+32 días**	**% físico cc**
17		**ICCU263-2**		**Aprobación entidad contratante Tramo 2**	**$ 0,00**	**0 días**	**mar 15/07/25**	**mar 15/07/25**	**16FC+32 días**	**18;21FC+10 días**	**% físico cc**
18		**ICCU263-2**		**Inicio actividades de obra**	**$ 5.993.209.302,00**	**165 días**	**mar 15/07/25**	**mié 11/02/26**	**17**	**188**	**% físico cc**
19		**ICCU263-2**		**TRAMO 2 (K5+540 a K6+000)**	**$ 1.246.879.763,57**	**127 días**	**mié 16/07/25**	**vie 26/12/25**			**% físico cc**
20		**ICCU263-2**		**ALCANTARILLA 1 (K5+590)**	**$ 51.225.912,04**	**21 días**	**sáb 26/07/25**	**sáb 23/08/25**			**% físico cc**
21		ICCU263		Implementación PMT	$ 0,00	1 día	sáb 26/07/25	lun 28/07/25	17FC+10 días	22;187CC	% físico c
22		ICCU263		Demolición	$ 1.232.590,00	3 días	lun 28/07/25	jue 31/07/25	21	23CC	% físico c
23		ICCU263		Excavaciones varias	$ 1.233.792,00	2 días	lun 28/07/25	mié 30/07/25	22CC	24CC	% físico c
24		ICCU263		Transporte y disposición	$ 16.135.302,15	2 días	lun 28/07/25	mié 30/07/25	23CC	32	% físico c
25		ICCU263		Concreto clase D, fc=3000 psi (bases)	$ 3.138.940,89	2 días	jue 14/08/25	sáb 16/08/25	29	26	% físico completa
26		ICCU263		Concreto clase D, fc=3000 psi (elevaciones)	$ 5.404.769,80	3 días	sáb 16/08/25	jue 21/08/25	25	31	% físico completa
27		ICCU263		Suministro e instalación de tuberia concreto reforzado 36"	$ 7.032.767,00	2 días	jue 31/07/25	lun 4/08/25	32	28	% físico completa
28		ICCU263		Relleno para estructuras	$ 3.138.993,00	2 días	lun 4/08/25	mié 6/08/25	27	29	% físico c
29		ICCU263		Suministro y figurado de acero FY 60000psi	$ 9.269.792,00	6 días	mié 6/08/25	jue 14/08/25	28	25	% físico completa
30		ICCU263		Concreto ciclópeo, 2500 psi 40% rajón para elevaciones	$ 1.732.243,20	1 día	vie 22/08/25	sáb 23/08/25	31	33	% físico completa
31		ICCU263		Concreto ciclópeo, 2500 psi 40% rajón para bases	$ 1.278.075,60	1 día	jue 21/08/25	vie 22/08/25	26	30	% físico c
32		ICCU263		Concreto clase F, 2000 psi para solados y atraques	$ 1.628.646,40	1 día	mié 30/07/25	jue 31/07/25	24	27	% físico completa
33		**ICCU263**		**Fin Alcantarilla 1**	**$ 0,00**	**0 días**	**sáb 23/08/25**	**sáb 23/08/25**	**30**	**56**	**% físico c**
34		**ICCU263-2**		**ESTRUCTURA PAVIMENTOS T2 (K5+440-K6+000)**	**$ 1.078.122.201,50**	**107 días**	**mié 16/07/25**	**sáb 29/11/25**			**% físico cc**
35		ICCU263-2		Fresado	$ 28.826.280,00	8 días	mié 16/07/25	vie 25/07/25	8	115	% físico cc
36		ICCU263-2		Excavaciones	$ 31.256.064,00	8 días	mar 2/09/25	jue 11/09/25	8FC+37 días	38CC;45;37CC	% físico cc
37		ICCU263-2		DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	$ 8.381.612,00	8 días	mar 2/09/25	jue 11/09/25	36CC		% físico completa
38		ICCU263-2		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	$ 161.353.021,50	8 días	mié 19/11/25	sáb 29/11/25	36CC;40CC;44CC		% físico completa
39		ICCU263-2		Afirmado	$ 14.742.234,00	1 día	sáb 20/09/25	lun 22/09/25	45	40CC+15 días	% físico cc
40		ICCU263-2		BG	$ 98.470.008,00	20 días	jue 9/10/25	mié 5/11/25	39CC+15 días	41CC+5 días;38CC	% físico cc
41		ICCU263-2		Suministro y figurado de acero FY 60000psi	$ 91.493.376,00	20 días	jue 16/10/25	mar 11/11/25	40CC+5 días	42CC+5 días	% físico completa
42		ICCU263-2		Cuneta de concreto clase D	$ 151.007.814,00	20 días	mié 22/10/25	mar 18/11/25	41CC+5 días	43	% físico cc
43		ICCU263-2		Riego de imprimación	$ 23.439.360,00	1 día	mar 18/11/25	mié 19/11/25	42	44	% físico cc
44		ICCU263-2		MD19	$ 430.173.072,00	2 días	mié 19/11/25	vie 21/11/25	43	38CC;46;171CC+25 días	% físico cc
45		ICCU263-2		RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	$ 38.979.360,00	8 días	jue 11/09/25	sáb 20/09/25	36	39	% físico completa
46		**ICCU263-2**		**Fin T2 Fase 1**	**$ 0,00**	**0 días**	**vie 21/11/25**	**vie 21/11/25**	**44**	**56;48CC+3 días**	**% físico cc**
47		**ICCU263-2**		**BOX**	**$ 117.531.650,03**	**23 días**	**mié 26/11/25**	**vie 26/12/25**			**% físico cc**
48		ICCU263		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	$ 913.920,00	1 día	mié 26/11/25	jue 27/11/25	46CC+3 días	49CC	% físico completa

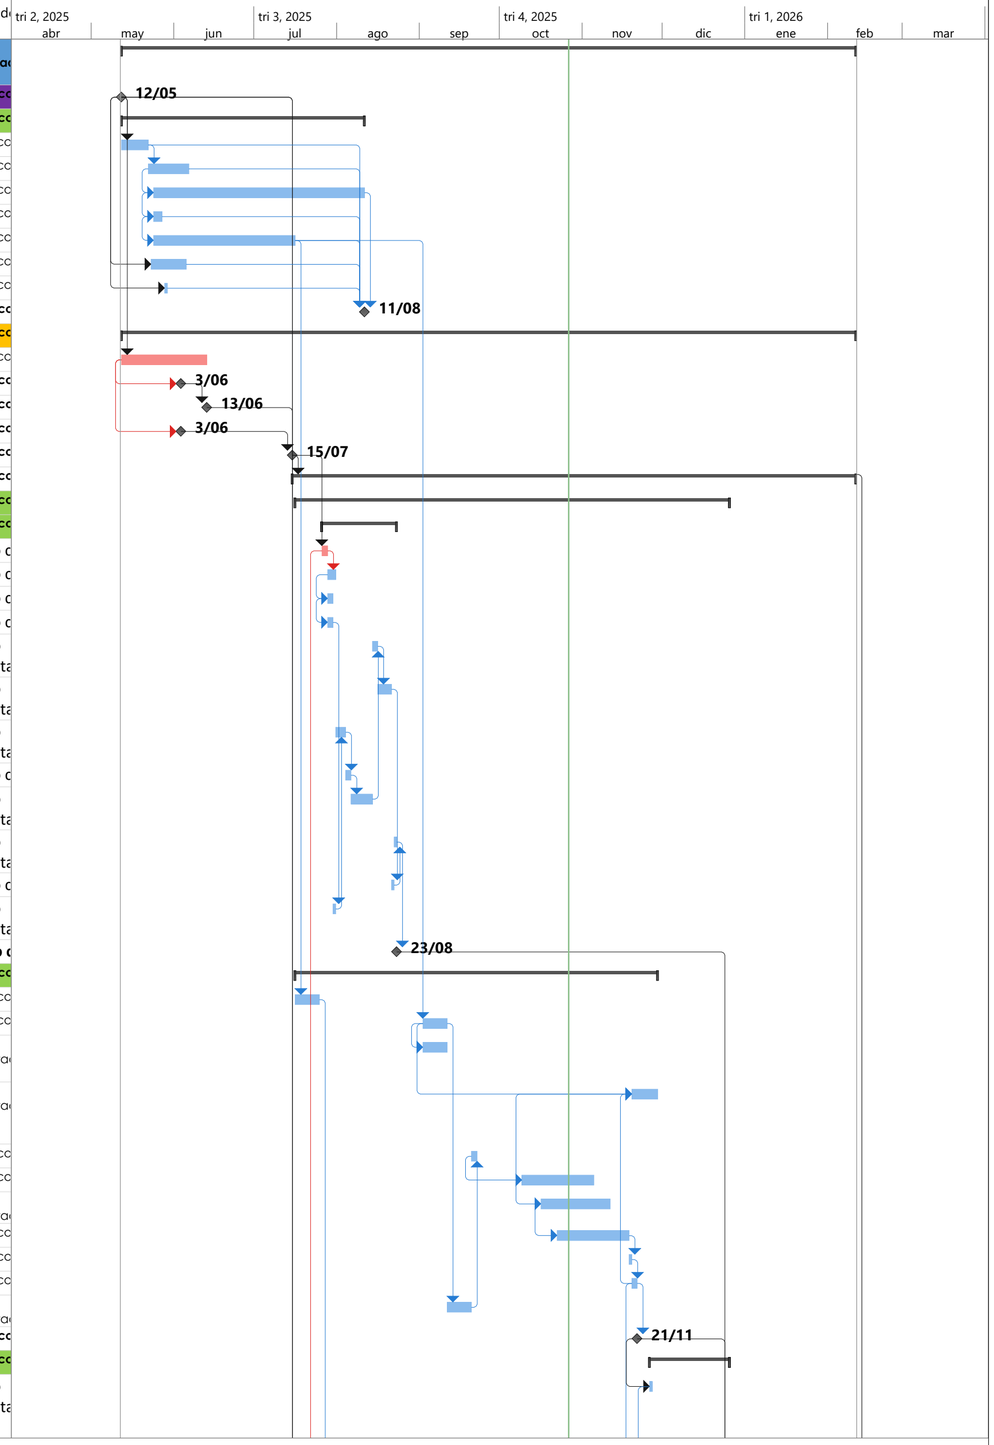

Proyecto: ICCU-263-2025-CLB-
Fecha: lun 27/10/25


Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	

Elaboró
Diego Morales
Residente de Obra

Revisó
Carlos Bernal
Director de Obra

Aprobó
Hernando Villota
Director de Interventoria

Id	Calendario de tareas	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Método del valor acumulado
49	ICCU263		DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	$ 1.479.108,00	4 días	mié 26/11/25	lun 1/12/25	48CC	53	% físico completa
50	ICCU263		BOX COULVERT PREFABRICADO EN CONCRETO DE 4200 PSI DIMENSIONES 2.0 X 2.0 m (incluye emboquillada)	$ 91.410.360,00	1 día	mar 2/12/25	mié 3/12/25	53	54	% físico completa
51	ICCU263		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	$ 5.330.432,43	2 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25	55	52	% físico completa
52	ICCU263		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	$ 4.387.636,00	4 días	vie 19/12/25	vie 26/12/25	51	56	% físico completa
53	ICCU263		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	$ 1.425.065,60	1 día	lun 1/12/25	mar 2/12/25	49	50	% físico completa
54	ICCU263		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	$ 1.931.688,00	1 día	mié 3/12/25	jue 4/12/25	50	55	% físico c
55	ICCU263		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	$ 10.653.440,00	10 días	jue 4/12/25	mié 17/12/25	54	51	% físico completa
56	**ICCU263-2**		**Fin Tramo 2**	**$ 0,00**	**0 días**	**vie 26/12/25**	**vie 26/12/25**	**33;46;52**	**188**	**% físico cc**
57	**ICCU263-2**		**TRAMO 1 (K0+000-K1+500)**	**$ 3.749.003.064,98**	**164 días**	**mar 15/07/25**	**mar 10/02/26**			**% físico cc**
58	**ICCU263-2**		**ALCANTARILLA 2 K0+705**	**$ 53.235.274,04**	**19 días**	**mar 15/07/25**	**vie 8/08/25**			**% físico cc**
59	ICCU263		Implementación PMT	$ 0,00	1 día	mar 15/07/25	mié 16/07/25	15	60	% físico c
60	ICCU263		Demolición	$ 1.232.590,00	5 días	mié 16/07/25	mar 22/07/25	59	61CC	% físico c
61	ICCU263		Excavaciones varias	$ 1.233.792,00	2 días	mié 16/07/25	vie 18/07/25	60CC	62CC;63	% físico c
62	ICCU263		Transporte y disposición	$ 16.135.302,15	2 días	mié 16/07/25	vie 18/07/25	61CC	63	% físico c
63	ICCU263		Concreto clase F	$ 1.628.646,40	2 días	vie 18/07/25	lun 21/07/25	61;62	64	% físico c
64	ICCU263		Suministro e instalación de tuberia concreto reforzado 36"	$ 9.042.129,00	2 días	lun 21/07/25	mié 23/07/25	63	65	% físico completa
65	ICCU263		Relleno para estructuras	$ 3.138.993,00	2 días	mié 23/07/25	vie 25/07/25	64	66	% físico c
66	ICCU263		Suministro y figurado de acero FY 60000psi	$ 9.269.792,00	6 días	vie 25/07/25	vie 1/08/25	65	67	% físico completa
67	ICCU263		Concreto clase D, FC=3000 psi bases	$ 3.138.940,89	1 día	vie 1/08/25	lun 4/08/25	66	68	% físico c
68	ICCU263		Concreto clase D, fc=3000 psi elevaciones	$ 5.404.769,80	1 día	lun 4/08/25	mar 5/08/25	67	69	% físico completa
69	ICCU263		CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	$ 1.278.075,60	1 día	mar 5/08/25	mié 6/08/25	68	70	% físico completa
70	ICCU263		CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	$ 1.732.243,20	1 día	mié 6/08/25	vie 8/08/25	69	71	% físico completa
71	**ICCU263**		**Fin Alcantarilla 2**	**$ 0,00**	**0 días**	**vie 8/08/25**	**vie 8/08/25**	**70**	**168;73**	**% físico c**
72	**ICCU263-2**		**ALCANTARILLA 3 K1+470**	**$ 51.225.912,04**	**89 días**	**vie 8/08/25**	**sáb 29/11/25**			**% físico cc**
73	ICCU263		Implementación PMT	$ 0,00	1 día	vie 8/08/25	sáb 9/08/25	71	74	% físico c
74	ICCU263		Demolición	$ 1.232.590,00	5 días	sáb 9/08/25	vie 15/08/25	73	75CC	% físico c
75	ICCU263		Excavaciones varias	$ 1.233.792,00	2 días	sáb 9/08/25	mar 12/08/25	74CC	76CC	% físico c
76	ICCU263		Transporte y disposición	$ 16.135.302,15	2 días	sáb 9/08/25	mar 12/08/25	75CC	77	% físico c
77	ICCU263		Concreto clase F	$ 1.628.646,40	2 días	mar 12/08/25	jue 14/08/25	76	78	% físico c
78	ICCU263		Suministro e instalación de tuberia concreto reforzado 36"	$ 7.032.767,00	2 días	jue 14/08/25	sáb 16/08/25	77	79	% físico completa
79	ICCU263		Relleno para estructuras	$ 3.138.993,00	20 días	sáb 16/08/25	jue 11/09/25	78	80FC+25 días	% físico c
80	ICCU263		Suministro y figurado de acero FY 60000psi	$ 9.269.792,00	30 días	sáb 11/10/25	jue 20/11/25	79FC+25 días	81	% físico completa
81	ICCU263		Concreto clase D, FC=3000 psi bases	$ 3.138.940,89	1 día	jue 20/11/25	vie 21/11/25	80	82	% físico c
82	ICCU263		Concreto clase D, fc=3000 psi elevaciones	$ 5.404.769,80	4 días	vie 21/11/25	jue 27/11/25	81	83	% físico completa
83	ICCU263		CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	$ 1.278.075,60	1 día	jue 27/11/25	vie 28/11/25	82	84	% físico completa
84	ICCU263		CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	$ 1.732.243,20	1 día	vie 28/11/25	sáb 29/11/25	83	85	% físico completa
85	**ICCU263**		**Fin Alcantarilla 3**	**$ 0,00**	**0 días**	**sáb 29/11/25**	**sáb 29/11/25**	**84**	**168**	**% físico c**
86	**ICCU263-2**		**ALCANTARILLA 4 K1+070**	**$ 51.225.912,04**	**41 días**	**mié 5/11/25**	**lun 29/12/25**			**% físico cc**
87	ICCU263-2		Implementación PMT	$ 0,00	1 día	mié 5/11/25	jue 6/11/25	119	88CC+10 días	% físico cc
88	ICCU263-2		Demolición	$ 1.232.590,00	5 días	mar 18/11/25	mar 25/11/25	87CC+10 días	89CC	% físico cc
89	ICCU263-2		Excavaciones varias	$ 1.233.792,00	2 días	mar 18/11/25	jue 20/11/25	88CC	90CC	% físico cc
90	ICCU263-2		Transporte y disposición	$ 16.135.302,15	2 días	mar 18/11/25	jue 20/11/25	89CC	91	% físico cc
91	ICCU263-2		Concreto clase F	$ 1.628.646,40	2 días	jue 20/11/25	lun 24/11/25	90	92CC+15 días	% físico cc
92	ICCU263-2		Suministro e instalación de tuberia concreto reforzado 36"	$ 7.032.767,00	2 días	mié 10/12/25	vie 12/12/25	91CC+15 días	93	% físico completa
93	ICCU263-2		Relleno para estructuras	$ 3.138.993,00	2 días	vie 12/12/25	lun 15/12/25	92	94;101	% físico cc

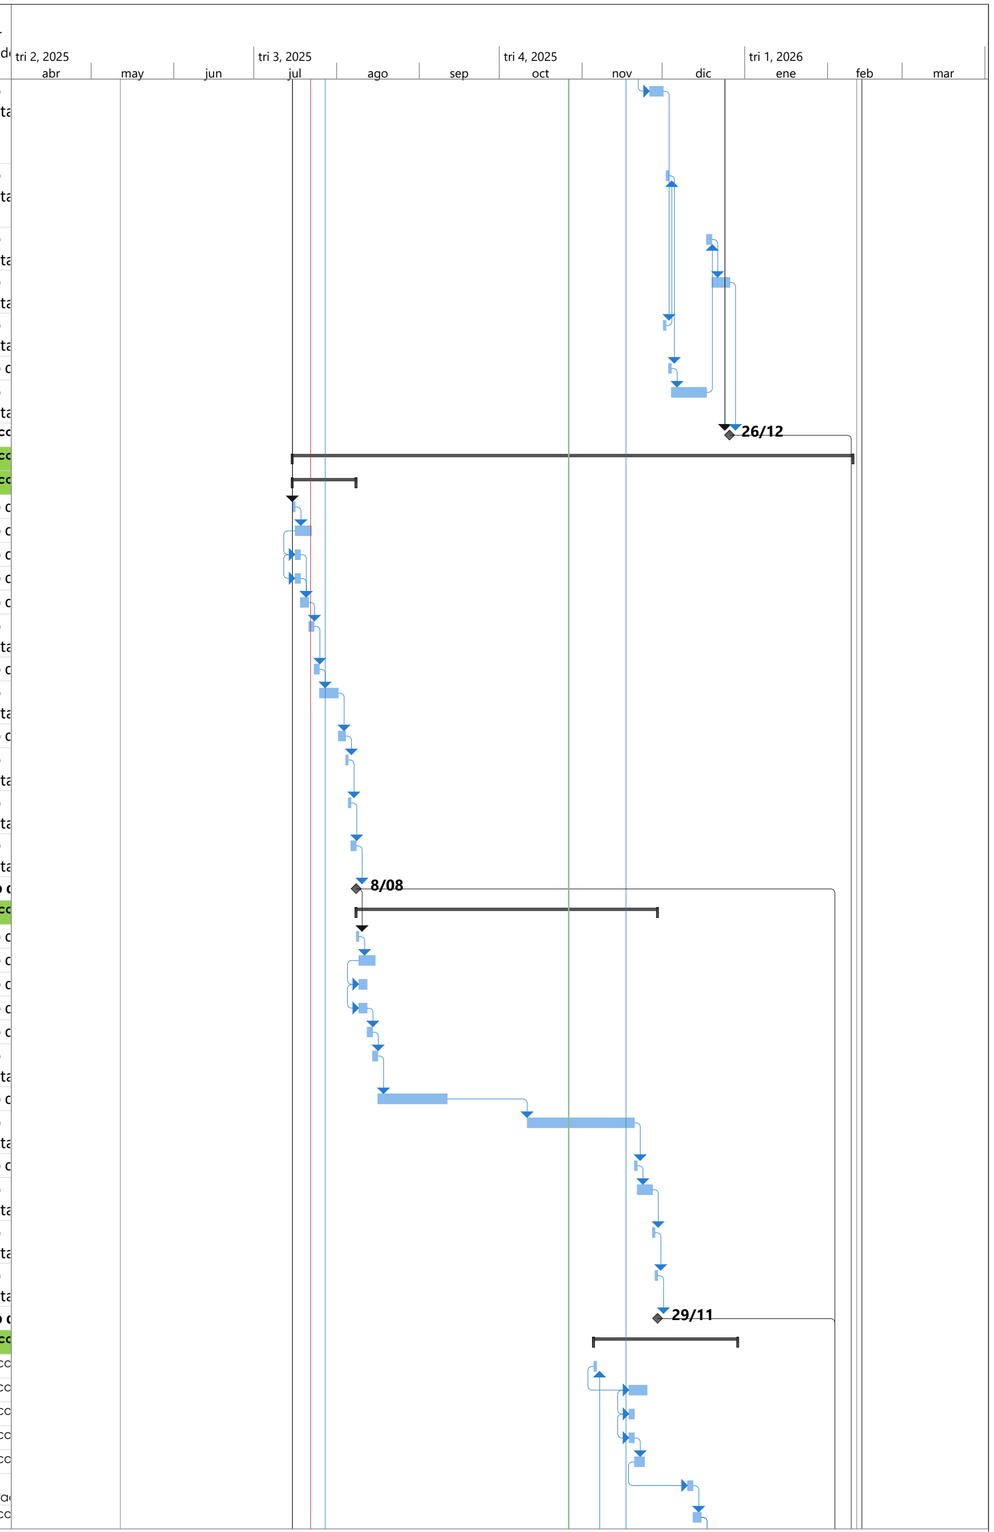

Proyecto: ICCU-263-2025-CLB-
Fecha: lun 27/10/25


Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

Elaboró
Diego Morales
Residente de Obra

Revisó
Carlos Bernal
Director de Obra

Aprobó
Hernando Villota
Director de Interventoria

Id	Calendario de tareas	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Método del valor acumulado
94	ICCU263-2		Suministro y figurado de acero FY 60000psi	$ 9.269.792,00	6 días	lun 15/12/25	mar 23/12/25	93	95	% físico completa
95	ICCU263-2		Concreto clase D, FC=3000 psi bases	$ 3.138.940,89	1 día	mar 23/12/25	mié 24/12/25	94	96	% físico cc
96	ICCU263-2		Concreto clase D, fc=3000 psi elevaciones	$ 5.404.769,80	1 día	mié 24/12/25	vie 26/12/25	95	97	% físico cc
97	ICCU263-2		CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	$ 1.278.075,60	1 día	vie 26/12/25	sáb 27/12/25	96	98	% físico completa
98	ICCU263-2		CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	$ 1.732.243,20	1 día	sáb 27/12/25	lun 29/12/25	97	99	% físico cc
99	**ICCU263-2**		**Fin Alcantarilla 4**	**$ 0,00**	**0 días**	**lun 29/12/25**	**lun 29/12/25**	**98**	**168**	**% físico cc**
100	**ICCU263-2**		**ALCANTARILLA DOBLE K1+155**	**$ 117.015.891,08**	**19 días**	**lun 15/12/25**	**vie 9/01/26**			**% físico cc**
101	ICCU263-2		Implementación PMT	$ 0,00	1 día	lun 15/12/25	mar 16/12/25	93	102	% físico cc
102	ICCU263-2		Demolición	$ 2.465.180,00	5 días	mar 16/12/25	mar 23/12/25	101	103CC	% físico cc
103	ICCU263-2		Excavaciones varias	$ 2.467.584,00	2 días	mar 16/12/25	jue 18/12/25	102CC	104CC	% físico cc
104	ICCU263-2		Transporte y disposición	$ 32.270.604,30	2 días	mar 16/12/25	jue 18/12/25	103CC	105	% físico cc
105	ICCU263-2		Concreto clase F	$ 3.257.292,80	2 días	jue 18/12/25	lun 22/12/25	104	106	% físico cc
106	ICCU263-2		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=48"	$ 28.629.601,00	2 días	lun 22/12/25	mié 24/12/25	105	107	% físico completa
107	ICCU263-2		Relleno para estructuras	$ 6.277.986,00	2 días	mié 24/12/25	sáb 27/12/25	106	108	% físico cc
108	ICCU263-2		Suministro y figurado de acero FY 60000psi	$ 18.539.584,00	6 días	sáb 27/12/25	lun 5/01/26	107	109	% físico completa
109	ICCU263-2		Concreto clase D bases	$ 6.277.881,78	1 día	lun 5/01/26	mar 6/01/26	108	110	% físico cc
110	ICCU263-2		Concreto clase D elevaciones	$ 10.809.539,60	1 día	mar 6/01/26	mié 7/01/26	109	112	% físico cc
111	ICCU263-2		CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	$ 3.464.486,40	1 día	jue 8/01/26	vie 9/01/26	112	113	% físico completa
112	ICCU263-2		CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	$ 2.556.151,20	1 día	mié 7/01/26	jue 8/01/26	110	111	% físico completa
113	**ICCU263-2**		**Fin Alcantarilla 5**	**$ 0,00**	**0 días**	**vie 9/01/26**	**vie 9/01/26**	**111**	**168**	**% físico cc**
114	**ICCU263-2**		**ESTRUCTURA PAVIMENTOS T1 FASE 1 (K1+500-K1+1250)**	**$ 466.740.078,85**	**110 días**	**vie 25/07/25**	**sáb 13/12/25**			**% físico cc**
115	ICCU263		Fresado	$ 11.121.250,00	3 días	vie 25/07/25	mar 29/07/25	35	116CC;126	% físico c
116	ICCU263		Transporte	$ 91.433.378,85	20 días	vie 25/07/25	jue 21/08/25	115CC	117CC+40 días	% físico c
117	ICCU263		Excavaciones	$ 8.812.800,00	20 días	lun 15/09/25	jue 9/10/25	116CC+40 días	118CC	% físico c
118	ICCU263		Demoliciones	$ 20.954.030,00	10 días	lun 15/09/25	vie 26/09/25	117CC	119CC+15 días	% físico c
119	ICCU263		BG	$ 47.727.810,00	25 días	vie 3/10/25	mié 5/11/25	118CC+15 días	120;87	% físico c
120	ICCU263		Suministro y figurado de acero FY 60000psi	$ 38.140.800,00	14 días	mié 5/11/25	lun 24/11/25	119	121CC+4 días	% físico c
121	ICCU263		Cuneta de concreto clase D	$ 62.919.922,50	20 días	lun 10/11/25	vie 5/12/25	120CC+4 días	122	% físico c
122	ICCU263		Riego de imprimación	$ 9.592.000,00	3 días	vie 5/12/25	mié 10/12/25	121	123;159	% físico c
123	ICCU263		MD19	$ 176.038.087,50	3 días	mié 10/12/25	sáb 13/12/25	122	124	% físico c
124	**ICCU263**		**Fin T1 Fase 1**	**$ 0,00**	**0 días**	**sáb 13/12/25**	**sáb 13/12/25**	**123**	**168**	**% físico c**
125	**ICCU263-2**		**ESTRUCTURA PAVIMENTOS T1 FASE 2 (K1+250- K1+110)**	**$ 854.218.455,84**	**143 días**	**mar 29/07/25**	**vie 30/01/26**			**% físico cc**
126	ICCU263-2		Fresado	$ 6.227.900,00	8 días	mar 29/07/25	sáb 9/08/25	115	127CC;145;128FC+50 días	% físico cc
127	ICCU263-2		Transporte	$ 51.202.692,16	8 días	sáb 6/12/25	mié 17/12/25	126CC;132CC;133C		% físico cc
128	ICCU263-2		Excavaciones	$ 34.716.883,20	20 días	vie 10/10/25	jue 6/11/25	126FC+50 días	129CC;141CC+6 días;130C	% físico cc
129	ICCU263-2		Demoliciones	$ 11.734.256,80	20 días	vie 10/10/25	jue 6/11/25	128CC		% físico cc
130	ICCU263-2		Rajón para mejoramiento	$ 132.882.803,76	5 días	jue 6/11/25	mié 12/11/25	128CC+20 días	127CC;131CC+3 días	% físico cc
131	ICCU263-2		Afirmado	$ 50.257.157,72	8 días	lun 10/11/25	jue 20/11/25	130CC+3 días	127CC	% físico cc
132	ICCU263-2		SBG	$ 23.626.372,00	6 días	sáb 29/11/25	sáb 6/12/25	138	133;127CC	% físico cc
133	ICCU263-2		BG	$ 26.727.573,60	6 días	sáb 6/12/25	lun 15/12/25	132	134CC+8 días;127CC	% físico cc
134	ICCU263-2		Suministro y figurado de acero FY 60000psi	$ 132.384.768,00	20 días	mié 17/12/25	mié 14/01/26	133CC+8 días	135FC+5 días	% físico cc
135	ICCU263-2		Concreto para pavimento rígido MR-43	$ 184.410.072,00	8 días	mié 21/01/26	vie 30/01/26	134FC+5 días;141	136CC;142CC	% físico cc
136	ICCU263-2		Cuneta de concreto clase D	$ 35.235.156,60	8 días	mié 21/01/26	vie 30/01/26	135CC		% físico cc
137	ICCU263-2		Geotextil NT 2500	$ 12.996.060,00	3 días	jue 6/11/25	lun 10/11/25	128	139	% físico cc
138	ICCU263-2		Material granular filtrante	$ 15.453.216,00	5 días	lun 24/11/25	sáb 29/11/25	140	132	% físico cc
139	ICCU263-2		GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 22.116.640,00	5 días	lun 10/11/25	sáb 15/11/25	137	140	% físico completa
140	ICCU263-2		TUBERÍA DRENAJE PVC 160	$ 13.100.100,00	5 días	sáb 15/11/25	lun 24/11/25	139	138	% físico cc
141	ICCU263-2		Gavión	$ 100.843.750,00	15 días	sáb 18/10/25	vie 7/11/25	128CC+6 días	135	% físico cc
142	ICCU263-2		Limpieza de pontones y box	$ 303.054,00	1 día	mié 21/01/26	jue 22/01/26	135CC	143	% físico cc
143	ICCU263-2		**Fin T1 Fase 2**	$ 0,00	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	142		% físico cc
144	**ICCU263-2**		**ESTRUCTURA PAVIMENTOS T1 FASE 3 (K1+110 a K0+500)**	**$ 1.226.168.948,39**	**118 días**	**sáb 9/08/25**	**jue 8/01/26**			**% físico cc**
145	ICCU263-2		Fresado	$ 27.135.850,00	8 días	sáb 9/08/25	mié 20/08/25	126	157;146CC;147FC+50 días	% físico cc
146	ICCU263-2		Transporte	$ 223.097.444,39	4 días	mié 31/12/25	mar 6/01/26	154CC;145CC;150C		% físico cc
147	ICCU263-2		Demolición	$ 51.127.833,20	10 días	mar 21/10/25	mar 4/11/25	145FC+50 días	150	% físico cc
148	ICCU263-2		SBG	$ 60.753.528,00	8 días	vie 7/11/25	mar 18/11/25	150	146CC;149CC+10 días	% físico cc
149	ICCU263-2		BG	$ 116.455.856,40	8 días	jue 20/11/25	lun 1/12/25	148CC+10 días	151CC+5 días;146CC	% físico cc
150	ICCU263-2		Geotextil NT 2500	$ 42.701.340,00	3 días	mar 4/11/25	vie 7/11/25	147	146CC;148	% físico cc
151	ICCU263-2		Suministro y figurado de acero FY 60000psi	$ 93.063.552,00	10 días	jue 27/11/25	mié 10/12/25	149CC+5 días	152CC+2 días	% físico completa
152	ICCU263-2		Cuneta de concreto clase C, 4000 psi	$ 153.524.610,90	18 días	sáb 29/11/25	mar 23/12/25	151CC+2 días	153	% físico cc

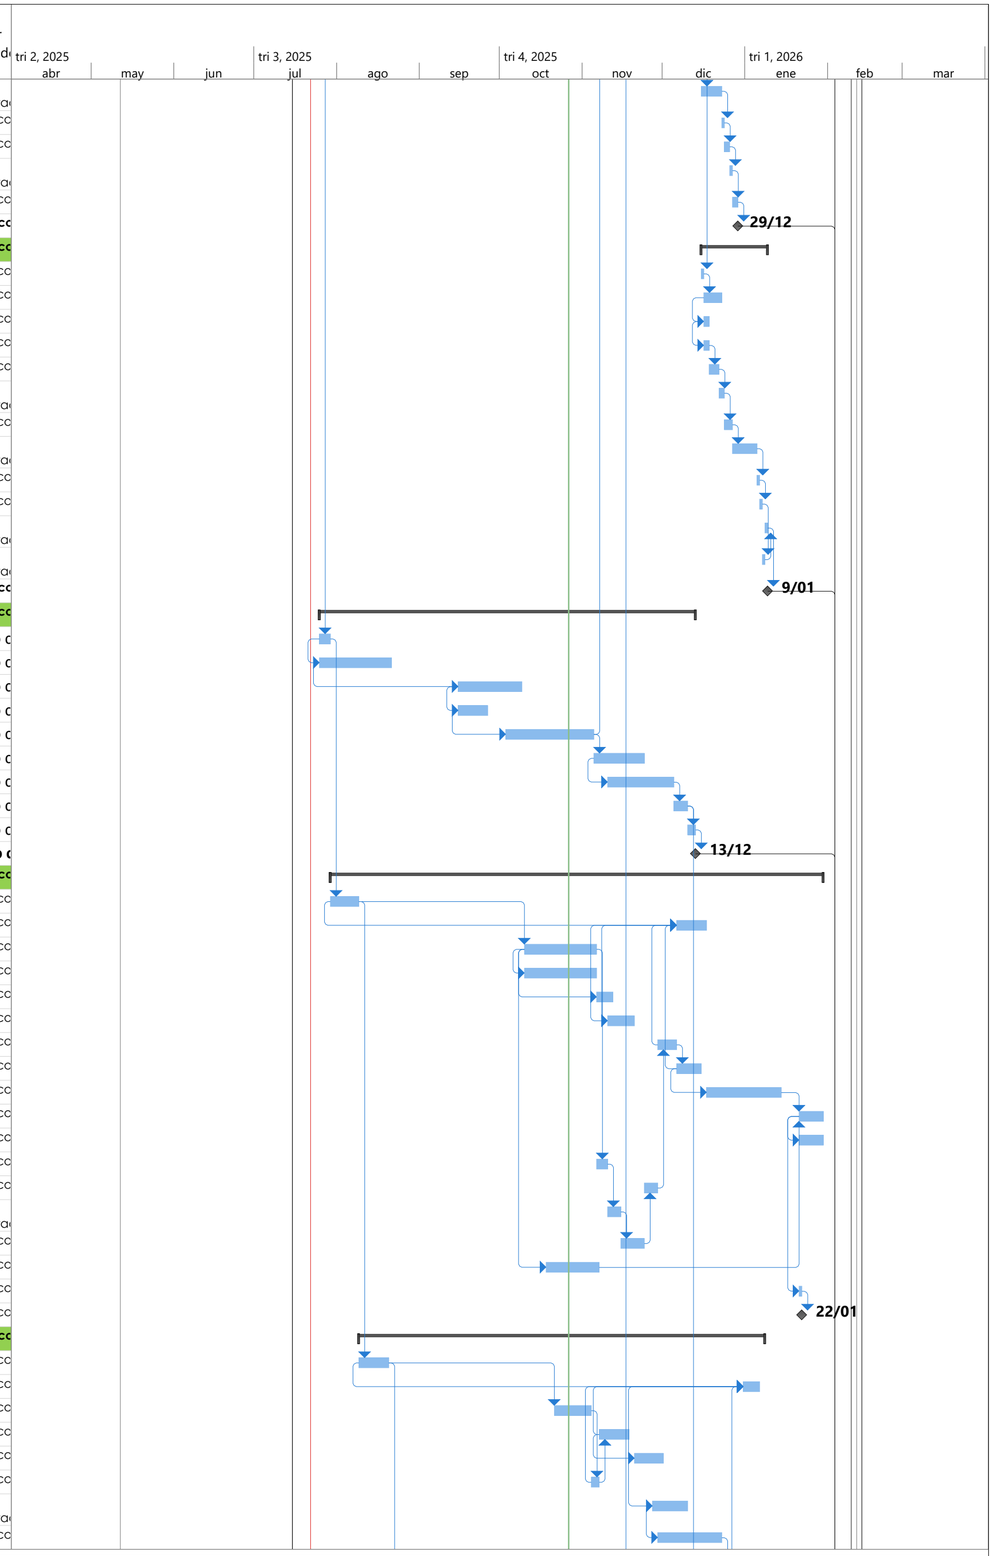

Proyecto: ICCU-263-2025-CLB-
Fecha: lun 27/10/25


Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

Elaboró
Diego Morales
Residente de Obra

Revisó
Carlos Bernal
Director de Obra

Aprobó
Hernando Villota
Director de Interventoria

Id	Calendario de tareas	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Método del valor acumulado
153	ICCU263-2		Riego de imprimación	$ 28.776.000,00	6 días	mar 23/12/25	mié 31/12/25	152	154	% físico cc
154	ICCU263-2		MD19	$ 429.532.933,50	6 días	mié 31/12/25	jue 8/01/26	153	146CC;155	% físico cc
155	**ICCU263-2**		**Fin T1 Fase 3**	**$ 0,00**	**0 días**	**jue 8/01/26**	**jue 8/01/26**	**154**	**168**	**% físico cc**
156	**ICCU263-2**		**ESTRUCTURA PAVIMENTOS T1 FASE 4 (K0+500-K0+000)**	**$ 929.172.592,70**	**136 días**	**mié 20/08/25**	**mar 10/02/26**			**% físico cc**
157	ICCU263-2		Fresado	$ 22.242.500,00	8 días	mié 20/08/25	vie 29/08/25	145	158CC	% físico cc
158	ICCU263-2		Transporte	$ 182.866.757,70	3 días	mar 3/02/26	vie 6/02/26	157CC;161CC;165C(		% físico cc
159	ICCU263-2		Excavaciones	$ 10.575.360,00	15 días	mié 10/12/25	mar 30/12/25	122	160CC;166	% físico cc
160	ICCU263-2		Demoliciones	$ 41.908.060,00	15 días	mié 10/12/25	mar 30/12/25	159CC		% físico cc
161	ICCU263-2		BG	$ 95.455.620,00	10 días	mar 6/01/26	mar 20/01/26	166	162;158CC	% físico cc
162	ICCU263-2		Suministro y figurado de acero FY 60000psi	$ 76.281.600,00	15 días	mar 20/01/26	vie 6/02/26	161	163CC+8 días	% físico cc
163	ICCU263-2		Cuneta de concreto clase C, 4000 psi	$ 125.839.845,00	10 días	jue 29/01/26	mar 10/02/26	162CC+8 días	164CC+3 días	% físico cc
164	ICCU263-2		Riego de imprimación	$ 19.184.000,00	1 día	lun 2/02/26	mar 3/02/26	163CC+3 días	165	% físico cc
165	ICCU263-2		MD19	$ 352.076.175,00	2 días	mar 3/02/26	jue 5/02/26	164	158CC;167;174CC+5 días;1	% físico cc
166	ICCU263-2		Geotextil NT 2500	$ 2.742.675,00	5 días	mar 30/12/25	mar 6/01/26	159	161	% físico cc
167	**ICCU263-2**		**Fin T1 Fase 4**	**$ 0,00**	**0 días**	**jue 5/02/26**	**jue 5/02/26**	**165**	**168**	**% físico cc**
168	**ICCU263-2**		**Fin Tramo 1**	**$ 0,00**	**0 días**	**jue 5/02/26**	**jue 5/02/26**	**71;85;99;113;124;155**	**188**	**% físico cc**
169	**ICCU263-2**		**BACHEO**	**$ 348.686.740,06**	**30 días**	**lun 22/12/25**	**vie 30/01/26**			**% físico cc**
170	ICCU263		MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	$ 299.585.961,60	30 días	lun 22/12/25	vie 30/01/26	171CC	172	% físico completa
171	ICCU263		EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 KM)	$ 49.100.778,46	30 días	lun 22/12/25	vie 30/01/26	44CC+25 días	170CC	% físico completa
172	**ICCU263**		**Fin Bacheo**	**$ 0,00**	**0 días**	**vie 30/01/26**	**vie 30/01/26**	**170**	**188**	**% físico c**
173	**ICCU263-2**		**Señalización**	**$ 230.598.439,39**	**6 días**	**mar 3/02/26**	**mar 10/02/26**			**% físico cc**
174	ICCU263		LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	$ 47.448.946,39	1 día	lun 9/02/26	mar 10/02/2(	165CC+5 días	183	% físico c
175	ICCU263		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	$ 10.292.808,00	1 día	lun 9/02/26	mar 10/02/2(	165CC+5 días	183	% físico c
176	ICCU263		TOPE DEFENSA METÁLICA	$ 11.494.005,00	1 día	mar 3/02/26	mié 4/02/26	165CC	183	% físico c
177	ICCU263		SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	$ 661.986,00	1 día	mar 3/02/26	mié 4/02/26	165CC	183	% físico c
178	ICCU263		DEFENSA METÁLICA	$ 75.546.570,00	1 día	mar 3/02/26	mié 4/02/26	165CC	183	% físico c
179	ICCU263		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	$ 20.355.204,00	1 día	lun 9/02/26	mar 10/02/26	165CC+5 días	183	% físico completa
180	ICCU263		SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	$ 49.150.188,00	1 día	mar 3/02/26	mié 4/02/26	165CC	183	% físico c
181	ICCU263		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	$ 10.951.200,00	1 día	lun 9/02/26	mar 10/02/26	165CC+5 días	183	% físico completa
182	ICCU263		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS (EN DEFENSAS METÁLICAS	$ 4.697.532,00	1 día	mar 3/02/26	mié 4/02/26	165CC	183	% físico completa
183	ICCU263		Fin Señalización	$ 0,00	0 días	mar 10/02/26	mar 10/02/2(	174;175;176;177;	188	% físico c
184	**ICCU263-2**		**COMPONENTES DE GESTIÓN**	**$ 418.041.294,00**	**165 días**	**mar 15/07/25**	**mié 11/02/26**			**% físico cc**
185	ICCU263-2		Plan de Manejo de trafico	$ 131.060.000,00	165 días	mar 15/07/25	mié 11/02/26	2	188	% físico cc
186	ICCU263-2		Plan de adaptación de la guia ambiental	$ 149.951.587,00	165 días	mar 15/07/25	mié 11/02/26	2	188	% físico cc
187	ICCU263-2		Ajustes	$ 137.029.707,00	155 días	sáb 26/07/25	mié 11/02/26	21CC	188	% físico cc
188	**ICCU263-2**		**Fin Contrato ICCU 263-2025**	**$ 0,00**	**0 días**	**mié 11/02/26**	**mié 11/02/26**	**56;168;172;185;186;1**		**% físico cc**

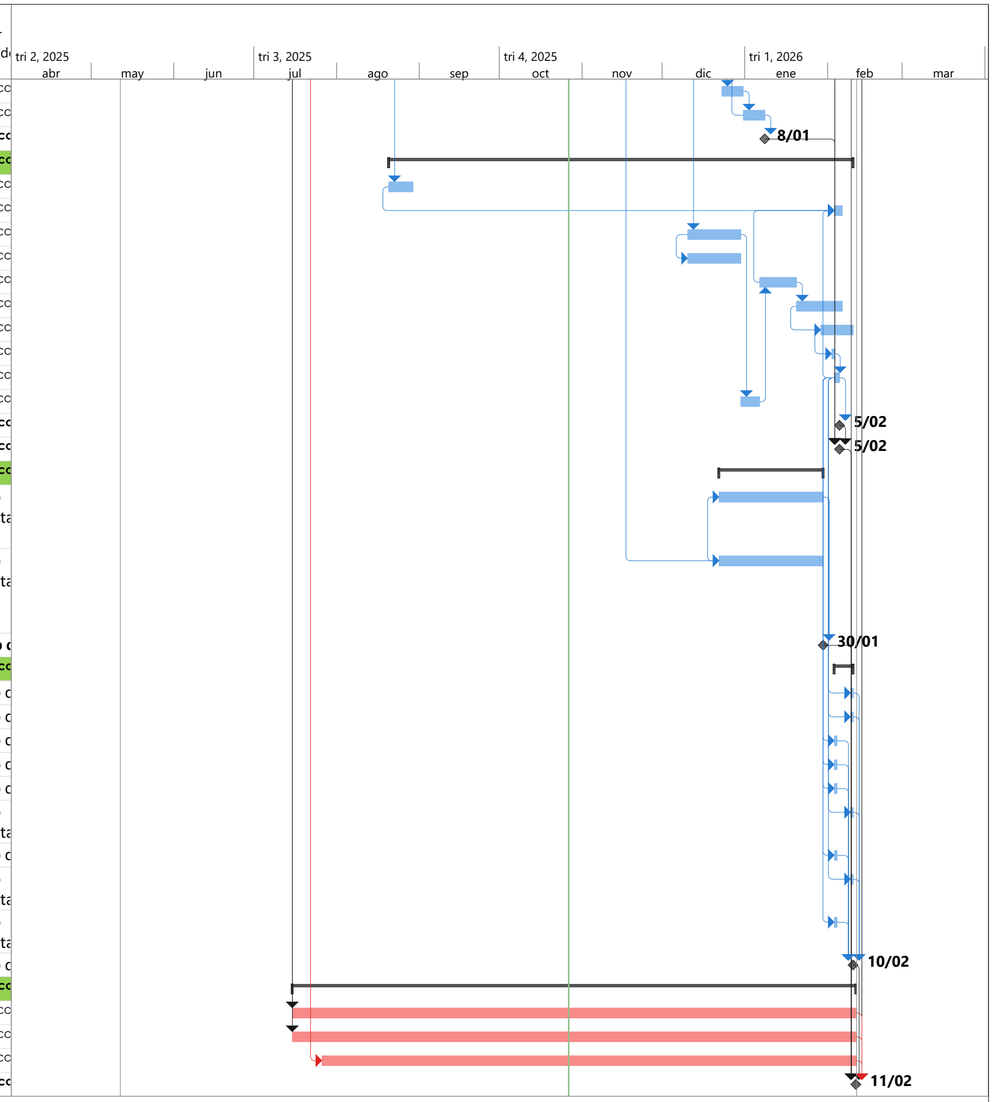

Proyecto: ICCU-263-2025-CLB-
Fecha: lun 27/10/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

Elaboró
Diego Morales
Residente de Obra

Revisó
Carlos Bernal
Director de Obra

Aprobó
Hernando Villota
Director de Interventoria
