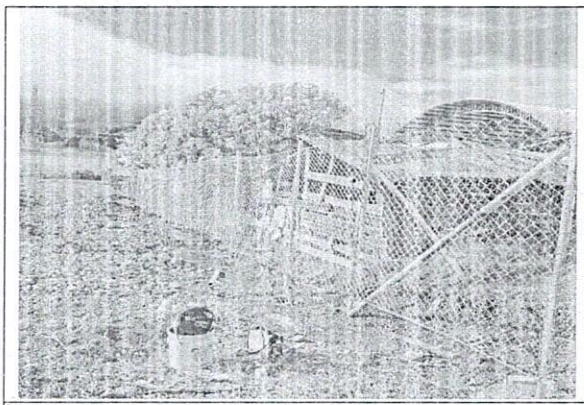
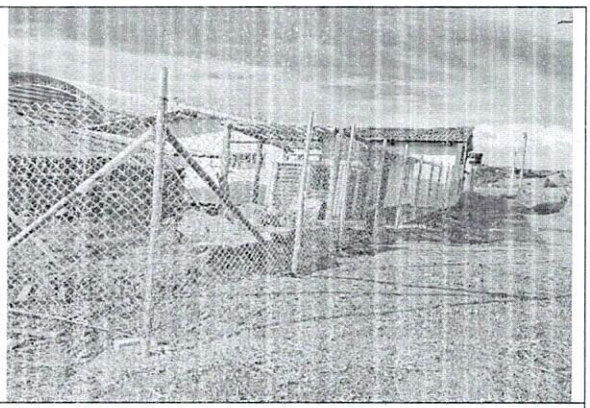
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° CPSP 175-2025	
Informe Parcial *Del Informe No.* ***1 de 1***	*Informe Final X*
Periodo del Informe:	*Del 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2025*
Fecha en la que se rinde el informe:	*11 de diciembre del 2025*

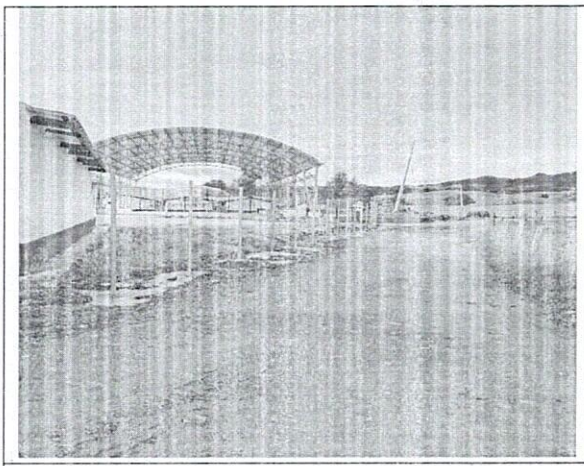
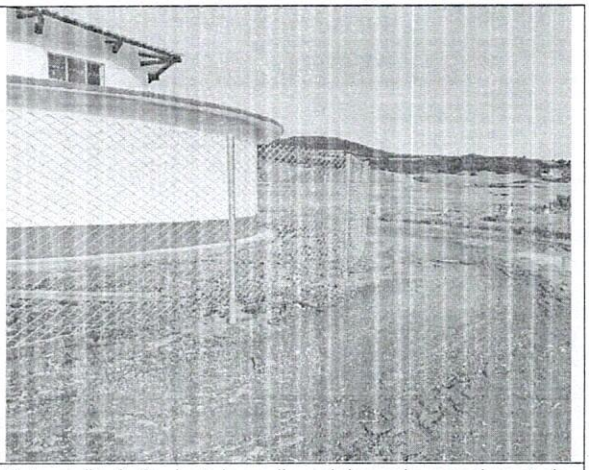
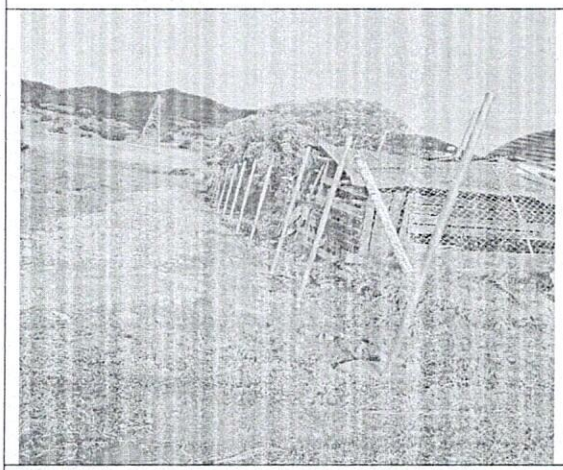
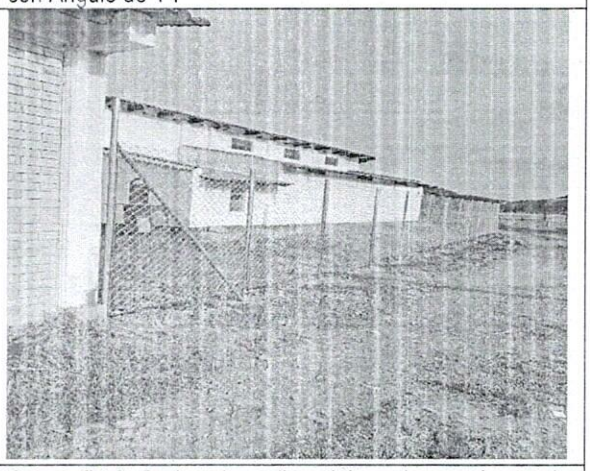
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSE
NIT / C.C.	900275495-1
Supervisor	ROBERTH LEONARDO ROCHA ALARCON
Cargo	Secretario de Infraestructura y Planeación
Objeto del Contrato o Convenio	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CERRAMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS EN LA SEDE EDUCATIVA Y EN EL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSÉ SUSCRITOS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSÉ Y EL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	7 de noviembre de 2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	11 de noviembre de 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2025000509 del 29 de septiembre de 2025
Registro Presupuestal	2025000653 del 07 de noviembre de 2025
Valor Inicial del Contrato o Convenio	DIEZ Y OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. ($18.000,000).
Adición 1	
Valor Total del Contrato	DIEZ Y OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. ($18.000,000).
Plazo de Ejecución Inicial	Dos (2) meses, Contados a partir del cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejecución.
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	Dos (2) meses, Contados a partir del cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejecución.

Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	10 de enero de 2025
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. *DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:*

El contratista desarrollo las siguientes actividades contractuales durante el periodo comprendido entre el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2025:

	
Fotografía 1. Se Instala malla eslabonada por el costado izquierdo con una altura de 3 metros y soportada en tubos de 3" metálicos y confinada con Angulo de 1".	Fotografía 2. Se Instala malla eslabonada por el costado posterior de la institución de san José con una altura de 3 metros y soportada en tubos de 3" metálicos y confinada con Angulo de 1".

	
Fotografía 3. Se Instala tubería metálica de 3" confinada en concreto para soportar la malla eslabonada por el frente de la institución entre la cancha y la capilla.	Fotografía 4. Se Instala malla eslabonada por el costado derecho de la institución de san José con una altura de 3 metros y soportada en tubos de 3" metálicos y confinada con Angulo de 1".
	
Fotografía 3. Se Instala tubería metálica de 3" confinada en concreto para soportar la malla eslabonada por el frente de la institución entre la cancha y la capilla.	Fotografía 6. Se Instala malla eslabonada por el costado derecho de la capilla de san José con una altura de 3 metros y soportada en tubos de 3" metálicos y confinada con Angulo de 1".

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

- Se instala un total de 118 ml de cerramiento en malla eslabonada que alcanza salón comunal, capilla y parte de la institución educativa de san José.
- En la parte inferior del cerramiento se soporta con una viga de amarre de poste a poste con unas medidas de 12cms x 18cms por 118 metros de larga.

- Se instala un ángulo de 1" para confinamiento superior del cerramiento con una longitud de 118 metros lineales.

Cantidades ejecutadas con el convenio.

BALANCE DE MAYORES Y MENORES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARMEN DE CARUPA.					
OBJETO:	***CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE CERRAMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS EN LA SEDE EDUCATIVA Y EN EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSE, SUSCRITO ENTRE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOSE Y EL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA.***				
ITEM ICCU 2025	*ITEM*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*V/UNITARIO*	*V/TOTAL*
	PRELIMINARES				
2	CIMIENTOS				
2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0	$860.192	$0
2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3		$605.415	$0
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$0
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2		$135.258	$0
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG		$8.165	$0
6	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS				
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2		$33.433	$0
10	CARPINTERÍA METÁLICA				
10,10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	107,9091	$166.807	$18.000.000
18	PINTURAS				
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2		$11.707	$0
18,26	PINTURA EPÓXICA	M2		$21.375	$0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					**$18.000.000**

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	$18.000.000	
Valor Adición	0	
Valor Ejecutado		$18.000.000
Saldo a favor del Contratista		0
Saldo a favor de la Entidad para liberar	0	
Sumas iguales	$18.000.000	$18.000.000

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

N/A

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

N/A

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

En mi calidad de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales **CPS 175-2025,** CERTIFICO que el contratista JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSE, identificado con NIT. N° 900275495-1, cumplió a satisfacción con las obligaciones contractuales adquiridas, por lo que se procede a AUTORIZAR el pago de los honorarios correspondientes al periodo comprendido entre el 11 de noviembre al 10 de diciembre de 2025. Por un valor de **DIEZ Y OCHO MILLONES M/CTE. ($ 18.000.000)** Según lo establecido en el contrato, a la fecha el avance de ejecución del contrato es del 100 %.

ING. ROBERTH LEONARDO ROCHA ALARCON
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN
Supervisor Contrato CPS 175-2025.

ELABORO: ING. JAIME ALBERTO SANTANA
REVISO Y APROBO: ING. ROBERTH LEONARDO ROCHA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION
