Melgar, Tolima 09/12/2025

70- 0 0 1 9 0 0 10 DIC 2025

Ingeniero

ING. JAIRO HERNANDO DIAZ GIRALDO
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Físico
Alcaldía Municipal Melgar – Tolima
Ciudad.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MELGAR
NIT. 890701933-4
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO
RECIBI: Jillon Rodrios HORA: 4:30 pm
FECHA: 10/12/25 ANEXOS:
FOLIOS:

Asunto: Cuenta de Cobro N° 5

Cordial saludo

Mediante la presente envío cuenta de cobro para solicitud desembolso Acta Parcial N.° 5 del contrato N.° 087 Del 17 de Febrero 2025, y que tiene por objeto, ***CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2025.***

Los valores objeto del cobro, deberán ser consignados en la Cuenta de ahorros N.° 263232191 del Banco **BOGOTA** denominada **EMPUMELGAR – ALUMBRADO PUBLICO 2025.**

Agradezco su amable y diligente colaboración.

FERNANDO ENRIQUE BERRIOS LÓPEZ
Director Operativo
EMPUMELGAR E.S.P

Proyectó: Pilar Vasquez – Técnico Coordinador Misión -09/12/2025
Reviso: Fernando Enrique Berrios López - Director Operativo -09/12/2025

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asis

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

Melgar, Tolima 09/12/2025

Cuenta de cobro N°.005

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR-TOLIMA
NIT 890.701.933-4

DEBE A

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR

EMPUMELGAR E.S.P

NIT 809.001.720-4

La suma de **CUATROCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($401.643.101,91) M/CTE** correspondiente al valor del quinto pago del contrato N° 087 DEL 17 de febrero del 2025, contrato entre la alcaldía de Melgar y la Empresa de Servicios Públicos EMPUMELGAR E.S.P., para desarrollar el programa de mantenimiento, operación, modernización y ampliación de cobertura de la red de alumbrado público en el municipio de melgar para la vigencia 2025.

GUSTAVO ALBERTO FABRIZIO ARMANDO VALENCIA BERNAL
Gerente
EMPUMELGAR E.S.P

Proyectó Santiago Espinosa Salgado -Profesional Cumplimiento Misión - 09/12/2025 Santiago E.
Reviso: Fernando Enrique Berrios López– Director Operativo - 09/12/2025

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asis

SGS CO20/962285

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
EMPUMELGAR E.S.P.

HACE CONSTAR QUE:

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Melgar E.S.P "EMPUMELGAR E.S.P", Identificada con Nit 809.001.720-4, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa efectuó el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Melgar - Tolima, a los tres (03) días del mes de diciembre del 2025, se expide a solicitud de la Alcaldía de Melgar, como cuenta de cobro acta parcial N°5 al "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P., EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2025.". Detallo planillas pagadas correspondientes al convenio en mención periodo febrero del 2025 N°9482891287 valor (9.394.700,00); marzo del 2025 N°9483807975 valor (23.990.900,00); abril del 2025 N°9485378513 valor (25.832.600,00); mayo del 2025 N°9486904155 valor (26.932.300,00); junio del 2025 N°9487788813 valor (26.109.700,00); julio del 2025 N°9489809986 valor (26.354.200,00); agosto del 2025 N°9491390903 valor (26.965.200,00); septiembre N°9492960201 valor (22.993.900,00); y octubre N°9494472468 valor (19.058.600,00)

Cordialmente,

LIBIA JOHANNA TORO HERRERA
johanna.toro@empumelgaresp.com
Profesional de apoyo a la gestión
Contador TP191173-T

Anexo (tres)3 Folios.

Proyectó: Libia Johanna Toro Herrera-Profesional de apoyo a la Gestión-03/12/2025
Revisó: Mary Alejandra Ladino Llanos-Profesional de apoyo a la Gestión-03/12/2025
Revisó: Oscar Fernando Sánchez Rojas-Director Administrativo y Financiero-03/12/2025

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SGS
CO20/962285

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9BA7527FB1DE0CB1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LIBIA JOHANNA TORO HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1106890769 de MELGAR (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 191173-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *





Como Anexo a cuenta de cobro acta parcial N°5 al "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P., EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2025.





Se anexa como cta de cobro Acta Parcial N°5 al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P., EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2025. Fecha 03 de diciembre del 2025.

	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	M-GI-FT-007
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	04
	FORMATO	ACTA PARCIAL	1 DE 1
			18/03/2020

ALCALDÍA DE MELGAR MUNICIPIO DE MELGAR	PROYECTO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2025	CONTRATO No	087 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025
			VALOR CONTRATADO	$ 3.862.635.633,47
			VALOR ADICIONAL	$ 621.937.547,40
	SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	VALOR EJECUTADO A	$ 2.979.653.111,11
			PLAZO DE EJECUCION	31 DE DICIEMBRE DE 2025
			FECHA INICIO	17 DE FEBRERO DEL 2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INTERVENTOR	N/A	FECHA SUSPENSION N	N/A
			FECHA REINICIO No 1	N/A
			SUSPENSIÓN No 2	N/A
	CONTRATISTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P	FECHA ACTA DE REIN	N/A
			RECIBO FINAL DE	N/A
			FECHA PRESENTE ACT	9/12/2025

	CONDICIONES ACTUALIZADAS					PRESENTA ACTA		ACUMULADO ACTA 04		ACUMULADO ACTA 03		ACUMULADO ACTA 02		ACUMULADO ACTA 01		POR EJECUTAR	
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
I	**MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS**																
1.1	Desconexion y desmonte de luminarias de Alumbrado Publico Existentes.	Und	498,0	$ 352.311,09	$ 175.450.922,71	-	$ -	123,00	$ 43.334.264,04	150,00	$ 52.846.663,47	53,00	$ 18.672.487,76			172,00	$ 60.597.507,44
1.2	Suministro e instalación de luminarias Led AP (Clasificación M4-M5) 40w	Und	230,0	$ 1.245.979,74	$ 286.575.339,13	-	$ -	51,00	$ 63.544.966,50	94,00	$ 117.122.095,12	25,00	$ 31.149.493,38			60,00	$ 74.758.784,12
1.3	Suministro e instalación de luminarias Led AP(Clasificación M3) 80w	Und	200,0	$ 1.456.779,74	$ 291.355.947,07	-	$ -	36,00	$ 52.444.070,47	83,00	$ 120.912.718,03	39,00	$ 56.814.409,68			42,00	$ 61.184.748,88
1.4	Suministro e instalación de luminarias Led AP(Clasificación M3) - Vias anchas principales	Und	68,0	$ 2.147.287,55	$ 146.015.553,17	-	$ -	46,00	$ 98.775.227,14	2,00	$ 4.294.575,09		$ -			20,00	$ 42.945.750,93
				COSTOS DIRECTOS	$ 899.397.762,06												$ 239.486.791,38
II	**MANTENIMIENTO, REPARACION Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO**																
2.1	Reparacion Luminarias Sodio de 70W	Und	100,0	$ 567.117,10	$ 56.711.709,74	-	$ -	15,00	$ 8.506.756,46	72,00	$ 40.832.431,01	13,00	$ 7.372.522,27			0,00	$ -
2.2	Reparacion Luminarias Sodio de 150W	Und	100,0	$ 647.038,64	$ 64.703.864,20	-	$ -	25,00	$ 16.175.966,05	23,00	$ 14.881.888,77	52,00	$ 33.646.009,38			0,00	$ -
2.3	Mantenimiento- Suministro e instalacion de bombillo de sodio de 70 W	Und	100,0	$ 388.506,45	$ 38.850.644,92	-	$ -	37,00	$ 14.374.738,62	42,00	$ 16.317.270,87	21,00	$ 8.158.635,43			0,00	$ -
2.4	Mantenimiento- Suministro e instalacion de bombillo de sodio de 150 W	Und	100,0	$ 405.606,45	$ 40.560.644,92	-	$ -	71,00	$ 28.798.057,89	22,00	$ 8.923.341,88	7,00	$ 2.839.245,14			0,00	$ -
2.5	Poste de 8 M Concreto 510 KGF	Und	16,0	$ 1.429.541,69	$ 22.872.667,03		$ -	8,00	$ 11.436.333,51		$ -		$ -			8,00	$ 11.436.333,51
2.6	Poste de 10 M Concreto 510 KGF	Und	8,0	$ 2.263.641,69	$ 18.109.133,51		$ -		$ -		$ -		$ -			8,00	$ 18.109.133,51
2.7	Poste Reforzado En Fibra de Vidrio 8 M 510 KGF	Und	5,0	$ 1.684.504,34	$ 8.422.521,70		$ -		$ -		$ -		$ -			5,00	$ 8.422.521,70
2.8	Reparación de redes de baja tensión en Cable Trenzado	Ml	1003,0	$ 328.254,98	$ 329.239.742,917	-	$ -	164,00	$ 53.833.816,39	346,00	$ 113.576.222,38	245,00	$ 80.422.469,61			248,00	$ 81.407.234,54
				COSTOS DIRECTOS	$ 579.470.928,928												$ 119.375.223,26
III	**AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (Entrada Puerta Negra Vereda San Cristobal)**																
3.1	Localizacion y Replanteo	Ml	0,0	$ 11.576,79	$ -											0,00	$ -
3.2	Excavacion de postes y retenidas	Und	23,0	$ 305.160,19	$ 7.018.684,4											23,00	$ 7.018.684,43

	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	M-GI-FT-007
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	04
	FORMATO	ACTA PARCIAL	1 DE 1
			18/03/2020

3.3	Suministro e instalacion de poste de 12 m 1050 kgf	Und	1,0	$ 3.903.944,99	$ 3.903.945,0											1,0	$ 3.903.944,99
3.4	Suministro e instalacion de poste de 9 m 1050 kgf	Und	2,0	$ 2.565.073,91	$ 5.130.147,8											2,0	$ 5.130.147,81
3.5	Suministro e instalacion de poste de 9 m 750 kgf	Und	10,0	$ 2.195.973,91	$ 21.959.739,1											10,0	$ 21.959.739,05
3.6	Suministro e instalacion de poste de 9 m 510 kgf	Und	10,0	$ 2.104.773,91	$ 21.047.739,1											10,0	$ 21.047.739,05
3.7	Pintura para poste	Und	23,0	$ 388.603,91	$ 8.937.889,8											23,0	$ 8.937.889,82
3.8	Suministro e instalación de estructura para retención	Und	8,0	$ 627.253,91	$ 5.018.031,2											8,0	$ 5.018.031,24
3.9	Suministro e instalación de red de baja tensión de alumbrado publico	Mts	800,0	$ 353.807,51	$ 283.046.004,2											800,0	$ 283.046.004,19
3.10	Suministro e instalacion de red de media tension	Mts	150,0	$ 384.925,91	$ 57.738.885,8											150,0	$ 57.738.885,79
3.11	Suministro e instalacion de transformador monofasico con puesta a tierra	Und	1,0	$ 22.499.953,91	$ 22.499.953,9											1,0	$ 22.499.953,91
3.12	Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 12 m 1050 kgf	Und	1,0	$ 1.456.382,09	$ 1.456.382,1											1,0	$ 1.456.382,09
3.13	Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 9 m 1050 kgf	Und	2,0	$ 1.450.128,09	$ 2.900.256,2											2,0	$ 2.900.256,17
3.14	Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 9 m 750 kgf	Und	10,0	$ 1.446.342,09	$ 14.463.420,9											10,0	$ 14.463.420,85
3.15	Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 9 m 510 kgf	Und	10,0	$ 1.443.962,09	$ 14.439.620,9											10,0	$ 14.439.620,85
3.16	Suministro e instalacion de puesta a tierra del sistema de alumbrado publico	Und	8,0	$ 749.976,65	$ 5.999.813,2											8,0	$ 5.999.813,16
3.17	Suministro e instalacion de accesorios para red de baja tension de alumbrado publico	Und	35,0	$ 371.430,67	$ 13.000.073,28											35,0	$ 13.000.073,28
3.18	Tramites, diseños, linea viva, Retie, legalizacion y acompañamiento Ampliacion Cobertura	Glb	1,0	$ 34.000.000,00	$ 34.000.000,00		$ -		$ -	$ 0,50	$ 17.000.000,00	0,50	$ 17.000.000,00			0,00	$ -
				COSTOS DIRECTOS	$ 522.560.586,70												$ 488.560.586,70
IV	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																
4.1	Poda, cargue, retiro y disposicion final de material vegetal	UND	200,0	$ 431.379,54	$ -					(-54)	-$ 23.294.495,06	54,00	$ 23.294.495,06				$ -
V	VEHICULOS																
5.1	Alquiler de Vehiculo para Transporte de Insumos, materiales y Cuadrilla de Alumbrado Publico	Glb	1,7	$ 375.116.666,66	$ 375.116.666,66	0,733	$ 25.124.999,99	0,25	$ 93.779.166,66	0,23	$ 84.654.166,67	0,45	$ 169.308.333,33		$ -	0,00600	$ 2.250.000,00
5.2	Alquiler de Vehiculo tipo camion doble cabina con grua articulada certificada (capacidad minima de carga de 3000kg), canasta, barreno y volco	Glb	1,7	$ 243.950.000,00	$ 243.950.000,00	0,19	$ 46.537.500,00	0,25	$ 60.987.500,00	0,25	$ 45.475.000,00	0,50	$ 90.950.000,00		$ -	0,00	$ -
				COSTOS DIRECTOS	$ 619.066.666,66												$ 2.250.000,00

	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	M-GI-FT-007
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	01
	FORMATO	ACTA PARCIAL	1 DE 1
			18/03/2020

VI	GASTOS ADMINISTRATIVOS																		
6.1	Gastos Administrativos y Organizacionales	Glb	1,9	$ 887.779.425,18	$ 887.779.425,18	0,0788	$ 70.000.000,00	0,0038	$ 3.372.731,31	0,1699	$ 138.368.652,72	0,15	$ 122.089.987,70	0,62	$ 550.183.272,91	0,0042	$ 3.764.780,54		
				COSTOS DIRECTOS	$ 887.779.425,18												$ 3.764.780,54		
VII	NO PREVISTOS																		
N.P 01	"Poda, cargue y retiro de material vegetal – Manejo de vegetación en redes de alumbrado público (sin disposición final)"	Und	200,0	$ 381.379,54	$ 76.275.907,64	-	$ -	30,00	$ 11.441.386,15	$ 140,00	$ 53.393.135,35	-	$ -	-	$ -	30,00	$ 11.441.386,15		
N.P 02	Mantenimiento Transformadores	Glb	1,0	$ 18.103.754,39	$ 18.103.754,39	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -					1,00	$ 18.103.754,39		
N.P 03	Alumbrado Navideño 2025	Glb	1,0	$ 259.980.601,92	$ 259.980.601,92	1,00	$ 259.980.601,92												
				COSTOS DIRECTOS	$ 354.360.263,95												$ 29.545.140,54		
	TOTAL OBRA				$ 3.862.635.633,47		$ 401.643.101,91		$ 560.804.981,20		$ 805.303.666,29		$ 661.718.088,74		$ 550.183.272,91		$ 882.982.522,41		
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				$ 3.862.635.633,47												$ 3.862.635.633,47		
	TOTAL OBRA				$ 3.862.635.633,47												$ -		
	VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						$ 401.643.101,91		$ 560.804.981,20		$ 805.303.666,29		$ 661.718.088,74		$ 550.183.272,91				
	VALOR TOTAL EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN						$ 401.643.101,91		$ 560.804.981,20		$ 805.303.666,29		$ 661.718.088,74		$ 550.183.272,91		$ 3.862.635.633,47		

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 3.240.698.086,07
VALOR ADICIONAL N°01	$ 361.956.945,48
VALOR ADICIONAL N°02	$ 259.980.601,92
VALOR CONTRATO	$ 3.862.635.633,47
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR ACTA PARCIAL	$ 401.643.101,91
VALOR ACTA N° 1	$ 550.183.272,91
VALOR ACTA N° 2	$ 661.718.088,74
VALOR ACTA N° 3	$ 805.303.666,29
VALOR ACTA N° 4	$ 560.804.981,20
VALOR NETO CANCELADO ACTA PARCIAL	$ 401.643.101,91
VALOR EJECUTADO	$ 2.979.653.111,06
SALDO POR EJECUTAR	$ 882.982.522,41

ING. FERNANDO ENRIQUE BERRIOS LÓPEZ
DIRECTOR OPERATIVO EMPUMELGAR E.S.P
CONTRATISTA

Santiago E.S.

ING. SANTIAGO ESPINOSA SALGADO
COORDINADOR ALUMBRADO PUBLICO
CONTRATISTA

ING. JAIRO HERNANDO DIAZ GIRALDO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO
SUPERVISOR CONTRATO No. 087 De Febrero Del 2025

ING. SEBASTIAN HENAO MORALES
APOYO A LA SUPERVISON
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DILIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA.

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	CÓDIGO	M-GI-FT-006
			VERSIÓN	04
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1 DE 2
	FORMATO	ACTA DE MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y MODIFICACIÓN DE ITEM NO PREVISTO	VIGENTE DESDE	18/03/2020

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2025

CONTRATISTA: Empresa de Servicios Publicos EMPUMELGAR E.S.P

INTERVENTOR: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Fisico — Fecha presente acta: 8-nov-25

CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
					CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNT	VALOR	+ O -			
MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS								
Desconexión y desmonte de luminarias de Alumbrado Publico Existentes	Und	498,0	$ 352.311,09	$ 175.450.922,71	=	$ 352.311,09	498,0	$ 175.450.922,71
Suministro e instalacion de luminaria led AP (Clasificacion M4-M5) 40w	Und	230,0	$ 1.245.979,74	$ 286.575.339,13	=	$ 1.245.979,74	230,0	$ 286.575.339,13
Suministro e instalación de luminarias Led AP(Clasificación M3) 80w	Und	200,0	$ 1.456.779,74	$ 291.355.947,07	=	$ 1.456.779,74	200,0	$ 291.355.947,07
Suministro e instalación de luminarias Led AP(Clasificación M3) - Vias anchas principales	Und	68,0	$ 2.147.287,55	$ 146.015.553,17	=	$ 2.147.287,55	68,0	$ 146.015.553,17
			COSTOS DIRECTOS	**$ 899.397.762,06**				**$ 899.397.762,06**
MANTENIMIENTO, REPARACION Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO								
Reparacion Luminarias Sodio de 70W	Und	100,0	$ 567.117,10	$ 56.711.709,74	=	$ 567.117,10	100,00	$ 56.711.709,74
Reparacion Luminarias Sodio de 150W	Und	100,0	$ 647.038,64	$ 64.703.864,20	=	$ 647.038,64	100,00	$ 64.703.864,20
Mantenimiento- Suministro e instalacion de bombillo de sodio de 70 W	Und	100,0	$ 388.506,45	$ 38.850.644,92	=	$ 388.506,45	100,00	$ 38.850.644,92
Mantenimiento- Suministro e instalacion de bombillo de sodio de 150 W	Und	100,0	$ 405.606,45	$ 40.560.644,92	=	$ 405.606,45	100,00	$ 40.560.644,92
Poste de 8 M Concreto 510 KGF	Und	16,0	$ 1.429.541,69	$ 22.872.667,03	=	$ 1.429.541,69	16,00	$ 22.872.667,03
Poste de 10 M Concreto 510 KGF	Und	8,0	$ 2.263.641,69	$ 18.109.133,51	=	$ 2.263.641,69	8,00	$ 18.109.133,51
Poste Reforzado En Fibra de Vidrio 8 M 510 KGF	Und	5,0	$ 1.684.504,34	$ 8.422.521,70	=	$ 1.684.504,34	5,00	$ 8.422.521,70
Reparación de redes de baja tensión en Cable Trenzado	Ml	1003,0	$ 328.254,98	$ 329.239.742,92	=	$ 328.254,98	1.003,00	$ 329.239.742,92
			COSTOS DIRECTOS	**$ 579.470.928,93**				**$ 579.470.928,93**

AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (Entrada Puerta Negra Vereda San Cristobal)								
Localizacion y Replanteo	Ml	0,0	$ 11.576,79	$ -	=	$ 11.576,79	0,0	$ -
Excavacion de postes y retenidas	Und	23,0	$ 305.160,19	$ 7.018.684,4	=	$ 305.160,19	23,0	$ 7.018.684,43
Suministro e instalacion de poste de 12 m 1050 kgf	Und	1,0	$ 3.903.944,99	$ 3.903.945,0	=	$ 3.903.944,99	1,0	$ 3.903.944,99
Suministro e instalacion de poste de 10 m 1050 kgf	Und	2,0	$ 2.565.073,91	$ 5.130.147,8	=	$ 2.565.073,91	2,0	$ 5.130.147,81
Suministro e instalacion de poste de 10 m 750 kgf	Und	10,0	$ 2.195.973,91	$ 21.959.739,1	=	$ 2.195.973,91	10,0	$ 21.959.739,05
Suministro e instalacion de poste de 10 m 510 kgf	Und	10,0	$ 2.104.773,91	$ 21.047.739,1	=	$ 2.104.773,91	10,0	$ 21.047.739,05
Pintura para poste	Und	23,0	$ 388.603,91	$ 8.937.889,8	=	$ 388.603,91	23,0	$ 8.937.889,82
Suministro e instalación de estructura para retención	Und	8,0	$ 627.253,91	$ 5.018.031,2	=	$ 627.253,91	8,0	$ 5.018.031,24
Suministro e Instalación de red de baja tensión de alumbrado publico	mts	800,0	$ 353.807,51	$ 283.046.004,2	=	$ 353.807,51	800,0	$ 283.046.004,19
Suministro e instalacion de red de media tension	mts	150,0	$ 384.925,91	$ 57.738.885,8	=	$ 384.925,91	150,0	$ 57.738.885,79
Suministro e instalacion de transformador monofasico con puesta a tierra	Und	1,0	$ 22.499.953,91	$ 22.499.953,9	=	$ 22.499.953,91	1,0	$ 22.499.953,91
Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 12 m 1050 kgf	Und	1,0	$ 1.456.382,09	$ 1.456.382,1	=	$ 1.456.382,09	1,0	$ 1.456.382,09
Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 10 m 1050 kgf	Und	2,0	$ 1.450.128,09	$ 2.900.256,2	=	$ 1.450.128,09	2,0	$ 2.900.256,17
Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 10 m 750 kgf	Und	10,0	$ 1.446.342,09	$ 14.463.420,9	=	$ 1.446.342,09	10,0	$ 14.463.420,85
Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 10 m 510 kgf	Und	10,0	$ 1.443.962,09	$ 14.439.620,9	=	$ 1.443.962,09	10,0	$ 14.439.620,85
Suministro e instalacion de puesta a tierra del sistema de alumbrado publico	Und	8,0	$ 749.976,65	$ 5.999.813,2	=	$ 749.976,65	8,0	$ 5.999.813,16
Suministro e instalacion de accesorios para red de baja tension de alumbrado publico	Und	35,0	$ 371.430,67	$ 13.000.073,3	=	$ 371.430,67	35,0	$ 13.000.073,28
Tramites, diseños, linea viva, Retie, legalizacion y acompañamiento Ampliacion Cobertura	Glb	1,0	$ 34.000.000,00	$ 34.000.000,0	=	$ 34.000.000,00	1,0	$ 34.000.000,00
			COSTOS DIRECTOS	**$ 522.560.586,70**				**$ 522.560.586,70**
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS								
Poda, cargue, retiro y disposicion final de material vegetal (Escombrera aurtorizada) Manejo de Vegetacion redes de Alumbrado Publico	UND	0,0	$ 431.379,54	$ -	-	$ 431.379,54	0,0	$ -
			COSTOS DIRECTOS	**$ -**				**$ -**
VEHICULOS								
Alquiler de Vehículo para Transporte de Insumos, materiales y Cuadrilla de Alumbrado Publico	Glb	1,9	$ 375.116.666,66	$ 375.116.666,66	=	$ 375.116.666,66	1,9	$ 375.116.666,66
Alquiler de Vehiculo tipo camion doble cabina con grua articulada certificada (capacidad minima de carga de 3000kg), canasta, barreno y volco	Glb	1,7	$ 243.950.000,00	$ 243.950.000,0	=	$ 243.950.000,00	1,7	$ 243.950.000,00
			COSTOS DIRECTOS	**$ 619.066.666,66**				**$ 619.066.666,66**

GASTOS ADMINISTRATIVOS								
Gastos Administrativos y Organizacionales	Glb	1,90	$ 887.779.425,18	$ 887.779.425,18	=	$ 887.779.425,18	1,90	$ 887.779.425,18
			COSTOS DIRECTOS	**$ 887.779.425,18**				**$ 887.779.425,18**
NO PREVISTOS								
"Poda, cargue y retiro de material vegetal – Manejo de vegetación en redes de alumbrado público (sin disposición final)"	Und	200,00	$ 381.379,54	$ 76.275.907,64	=	$ 381.379,54	200,00	$ 76.275.907,64
Mantenimiento Transformadores	Glb	1,00	$ 18.103.754,39	$ 18.103.754,39	=	$ 18.103.754,39	1,00	$ 18.103.754,39
Alumbrado Navideño 2025	Glb	1,00	$ 259.980.601,92		+		1,00	$ 259.980.601,92
			COSTOS DIRECTOS	**$ 94.379.662,03**				**$ 354.360.263,95**
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				**3.602.655.031,55**				**3.862.635.633,47**
A.I.U. 26%				**0,00**				**0,00**
TOTAL OBRA				**3.602.655.031,55**				**3.862.635.633,47**

DIRERENCIA	
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.602.655.031,55
VALOR DEL ADICIONAL	$ 259.980.601,92
VALOR TOTAL DEL CONTRA	$ 3.862.635.633,47

ING. FERNANDO ENRIQUE BERRIOS LÓPEZ
DIRECTOR OPERATIVO EMPUMELGAR E.S.P

CONTRATISTA

ING. JAIRO HERNANDO DIAZ GIRALDO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO
SUPERVISOR CONTRATO No. 087 De Febrero Del 2025

Santiago Espinosa S.

ING. SANTIAGO ESPINOSA SALGADO
COORDINADOR ALUMBRADO PUBLICO

CONTRATISTA

ING. SEBASTIAN HENAO MORALES
PROF. APOYO SUPERVISION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA.

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	87	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2025.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	5
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	FECHA	dic-25
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	5	VEHICULOS	
ITEM N°:	5.1	DESCRIPCION ITEM: Alquiler de Vehículo para Transporte de Insumos, materiales y Cuadrilla de Alumbrado Publico	UND: UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
 	VEHICULOS				GLB	0,73	0,73
					SUBTOTAL		0,733
					VIENEN		
					TOTAL		0,733

OBSERVACIONES:

Aprobo: FIRMA NOMBRE: FERNANDO ENRIQUE BERRIOS LOPEZ Cargo: DIRECTOR TECNICO	Elaboro: FIRMA Santiago E.S. NOMBRE:SANTIAGO ESPINOSA SALGADO Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.	REVISO: FIRMA NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	87	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2025.

CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	5
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	FECHA	dic-25
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		

CAPITULO:	5		VEHICULOS			
ITEM N°.	5.2		DESCRIPCION ITEM	Alquiler de Vehiculo tipo camion doble cabina con grua articulada certificada (capacidad minima de carga de 3000kg), canasta, barreno y volco	UND	UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	Nº DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
 	VEHICULOS				GLB	0,19	0,19
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL		0,19
					VIENEN		
					TOTAL		0,19

Aprobo: FIRMA NOMBRE: FERNANDO ENRIQUE BERRIOS LÓPEZ Cargo: DIRECTOR TECNICO	Elaboro: FIRMA Santiago E.S NOMBRE: SANTIAGO ESPINOSA SALGADO Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.	REVISO: FIRMA NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	87	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2025.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	5
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	FECHA	dic-25
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	6	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	
ITEM N°.	6.1	DESCRIPCION ITEM: Gastos Administrativos y Organizacionales	UND: UND


PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Gastos Administrativos y Organizacionales				UND	UND	0,0788
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL		0,0788
					VIENEN		
					TOTAL		0,0788

Aprobo:	Elaboro:	REVISO:
FIRMA	FIRMA Santiago E.S.	FIRMA
NOMBRE: FERNANDO ENRIQUE BERRIOS LÓPEZ	NOMBRE: SANTIAGO ESPINOSA SALGADO	NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES
Cargo: DIRECTOR TÉCNICO.	Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	M-GI-FT-011
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	VIGENTE DESDE	18/03/2020

CONTRATO N:	87	OBJETO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2025.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.	CORTE N°	5
INTERVENTORIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	FECHA	dic-25
TRAMO:	MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
CAPITULO:	NP	NO PREVISTOS	
ITEM N°.	NP03	DESCRIPCION ITEM	ALUMBRADO NAVIDEÑO 2025

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES M	DIMENSIONES M	DIMENSIONES L	MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
   	ALUMBRADO PUBLICO 2025					1	1

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	1
	VIENEN	
	TOTAL	1

Aprobo:	Elaboro:	REVISO:
FIRMA	FIRMA Santiago E.S	FIRMA
NOMBRE: FERNANDO ENRIQUE BERRIOS LÓPEZ	NOMBRE: SANTIAGO ESPINOSA SALGADO	NOMBRE: SEBASTIAN HENAO MORALES
Cargo: DIRECTOR TECNICO	Cargo: COORD. ALUMBRADO PUBLICO.	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA

INFORME DE ACITIVIDADES N°5
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 087-2025
ALUMBRADO PUBLICO

DIRECCIÓN OPERATIVA

MELGAR-TOLIMA
2025

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

1. CONTENIDO

1. CONTENIDO 2

2. INTRODUCCIÓN 3

3. OBJETIVO 4

OBJETIVOS ESPECIFICOS 4

4. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 5

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 5

1. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 6

2. AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA ACTA PARCIAL. 8

3. ACTIVIDADES REALIZADAS 14

4. VEHICULOS 14

5. ACTIVIDADES PARA EJECUCION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 18

6. RECURSO HUMANO APOYO ALUMBRADO PUBLICO 19

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SGS
CO20/962285

2. INTRODUCCIÓN

El presente informe de ejecución y avance del contrato interadministrativo N° 087 del 2025 Alumbrado Público tiene como propósito principal ofrecer información detallada del progreso alcanzado en la ejecución en relación con los aspectos técnicos, financieros y administrativos, se destacan cuatro aspectos fundamentales: mantenimiento correctivo y preventivo, modernización, ampliación y optimización. Cada uno de estos aspectos es crucial para garantizar el funcionamiento eficiente y confiable de la infraestructura de alumbrado público, así como para satisfacer las necesidades de la comunidad y promover el desarrollo sostenible de la región.

Adicional en este informe, se analizarán los avances realizados en cada área, destacando las acciones llevadas a cabo, los logros alcanzados y las dificultades en el proceso inicial del contrato interadministrativo N° 087 entre la Empresa de Servicios Públicos EMPUMELGAR E.S.P y la Alcaldía Municipal de Melgar Tolima.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

3. OBJETIVO

Evaluar el progreso y la ejecución del contrato de Alumbrado Público, centrándose en los aspectos de mantenimiento, modernización, ampliación y optimización, con el fin de garantizar un funcionamiento eficiente y confiable del sistema de alumbrado público y satisfacer las necesidades y requerimientos de la comunidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Evaluar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo realizadas durante el periodo establecido, identificando áreas de mejora y proponiendo medidas correctivas según sea necesario.
- Analizar el progreso de las iniciativas de modernización implementadas en el sistema de alumbrado público, incluyendo la adopción de tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia energética para el Municipio y la calidad de iluminación.
- Evaluar el impacto de las actividades de ampliación del sistema de alumbrado público en términos de cobertura en zona rural del Municipio.
- Analizar los resultados de las acciones de optimización realizadas con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y reducir los mantenimientos correctivos.

Por lo anterior podemos tener una guía a la evaluación exhaustiva del progreso y la ejecución del contrato de alumbrado público, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones informadas y la implementación de mejoras continuas en el sistema.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SISTEMA CERTIFICADO ISO 9001 SGS CO20/962285

4. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 087 DEL 17 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2025.
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR TOLIMA
CONTRATISTA	EMPUMELGAR E.S.P
SUPERVISION	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 3.240.698.086,07
ADICION N° 01 VALOR	$ 361.956.945,48
ADICION N° 02 VALOR	$ 259.980.601,92
VALOR FINAL CONTRATO	$ 3.862.635.633,47
FECHA INICIO	17 DE FEBRERO DEL 2025
FECHA FINAL	31 DE DICIEMBRE DEL 2025

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

5 ACTIVIDADES PARA EJECUTAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
I	**MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS**		
1.1	Desconexión y desmonte de luminarias de Alumbrado Publico Existentes	Und	498,0
1.2	Suministro e instalacion de luminaria led AP (Clasificacion M4-M5)	Und	200,0
1.3	Suministro e instalacion de luminaria led AP (Clasificacion M3)	Und	200,0
1.4	Suministro e instalacion de luminaria led AP (Clasificacion M3) - Vias anchas principales	Und	68,0
II	**MANTENIMIENTO, REPARACION Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO**		
2.1	Reparacion Luminarias Sodio de 70W	Und	100,0
2.2	Reparacion Luminarias Sodio de 150W	Und	100,0
2.3	Mantenimiento- Suministro e instalacion de bombillo de sodio de 70 W	Und	100,0
2.4	Mantenimiento- Suministro e instalacion de bombillo de sodio de 150 W	Und	100,0
2.5	Poste de 8 M Concreto 510 KGF	Und	9,0
2.6	Poste de 10 M Concreto 510 KGF	Und	8,0
2.7	Poste Reforzado En Fibra de Vidrio 8 M 510 KGF	Und	5,0
2.8	Reparación de redes de baja tensión en Cable Trenzado	Ml	1005,0
III	**AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (Entrada Puerta Negra Vereda San Cristobal)**		
3.1	Localizacion y Replanteo	Ml	700,0
3.2	Excavacion de postes y retenidas	Und	23,0
3.3	Suministro e instalacion de poste de 12 m 1050 kgf	Und	1,0
3.4	Suministro e instalacion de poste de 9 m 1050 kgf	Und	2,0
3.5	Suministro e instalacion de poste de 9 m 750 kgf	Und	10,0
3.6	Suministro e instalacion de poste de 9 m 510 kgf	Und	10,0
3.7	Pintura para poste	Und	23,0
3.8	Suministro e instalación de estructura para retención	Und	8,0

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SISTEMA CERTIFICADO ISO 9001 SGS CO20/962285

- **Avance de Ejecución**

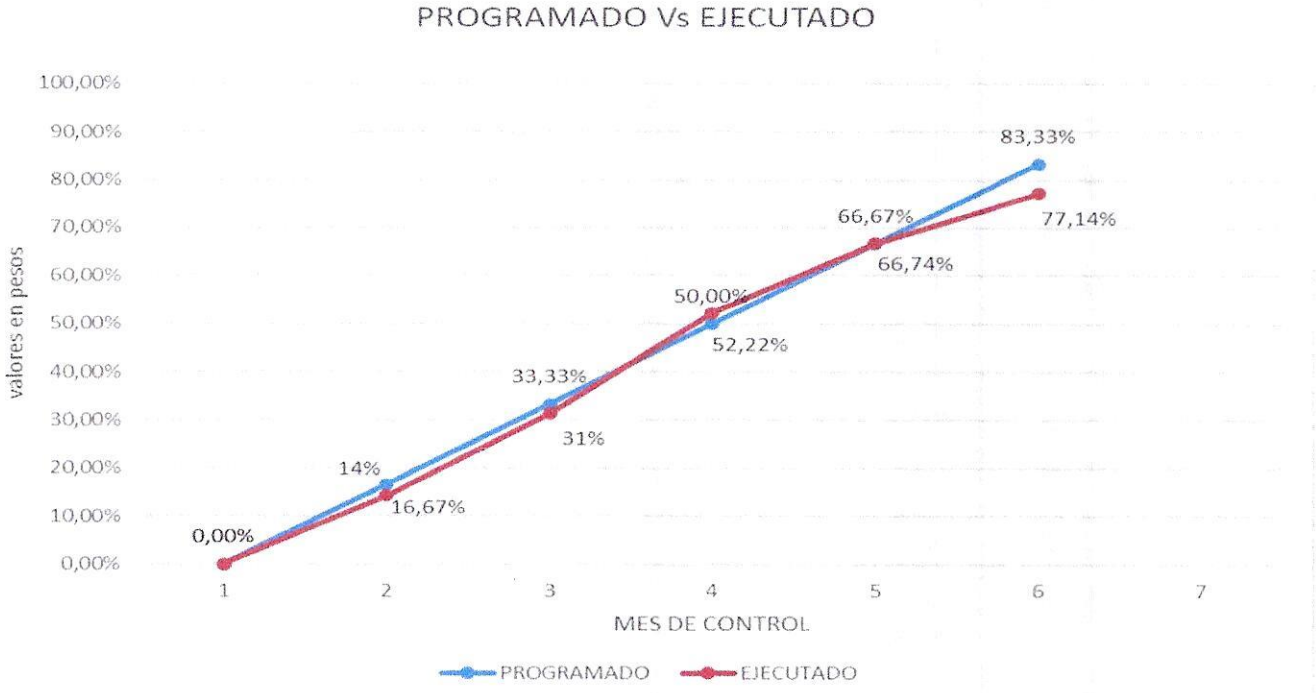
AVANCE DE EJECUCION			
DETALLE	**VALOR**		**PONCENTUAL**
AVANCE ACTA PARCIAL N°01	$	**550.183.272,91**	14%
AVANCE ACTA PARCIAL N°02	$	**661.718.088,74**	17%
AVANCE ACTA PARCIAL N°03	$	**805.303.666,29**	21%
AVANCE ACTA PARCIAL N°04	$	**560.804.981,20**	15%
AVANCE ACTA PARCIAL N°05	$	**401.643.101,91**	10%
AVANCE POR EJECUTAR	$	**882.982.522,42**	22,86%
VALOR TOTAL	$	**3.862.635.633,47**	100,00%



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SGS
CO20/962285





EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

3.9	Suministro e Instalación de red de baja tensión de alumbrado publico	Mts	800,0
3.10	Suministro e instalacion de red de media tension	Mts	150,0
3.11	Suministro e instalacion de transformador monofasico con puesta a tierra	Und	1,0
3.12	Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 12 m 1050 kgf	Und	1,0
3.13	Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 9 m 1050 kgf	Und	2,0
3.14	Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 9 m 750 kgf	Und	10,0
3.15	Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 9 m 510 kgf	Und	10,0
3.16	Suministro e instalacion de puesta a tierra del sistema de alumbrado publico	Und	8,0
3.17	Suministro e instalacion de accesorios para red de baja tension de alumbrado publico	Und	35,0
3.18	Tramites, diseños, linea viva, Retie, legalizacion y acompañamiento Ampliacion Cobertura	Glb	1,0
IV	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		
4.1	Poda, cargue, retiro y 7isposición final de material vegetal (Escombrera aurtorizada) Manejo de Vegetacion redes de Alumbrado Publico	UND	200,0
V	VEHICULOS		
5.1	Alquiler de Vehículo para Transporte de Insumos, materiales y Cuadrilla de Alumbrado Publico	Glb	1,0
5.2	Alquiler de Vehiculo tipo camion doble cabina con grua articulada certificada (capacidad minima de carga de 3000kg), canasta, barreno y volco	Glb	1,0
VI	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
6.1	Gastos Administrativos y Organizacionales	Glb	1,0
NP	NO PREVISTOS		
NP01	"Poda, cargue y retiro de material vegetal – Manejo de vegetación en redes de alumbrado público (sin disposición final)"	UND	200
NP02	Mantenimiento Transformadores	Glb	1
NP 03	Alumbrado Navideño	Glb	1

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

6. AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA ACTA PARCIAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRATADAS	CANT EJECUTADAS	AVANCE FISICO
I	MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS				
1.1	Desconexión y desmonte de luminarias de Alumbrado Público Existentes	Und	498	326	65%
1.2	Suministro e instalacion de luminaria led AP (Clasificacion M4-M5)	Und	230	170	74%
1.3	Suministro e instalacion de luminaria led AP (Clasificacion M3)	Und	200	158	79%
1.4	Suministro e instalacion de luminaria led AP (Clasificacion M3) - Vias anchas principales	Und	68	48	71%
II	MANTENIMIENTO, REPARACION Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO				
2.1	Reparacion Luminarias Sodio de 70W	Und	100	100	100%
2.2	Reparacion Luminarias Sodio de 150W	Und	100	100	100%
2.3	Mantenimiento- Suministro e instalacion de bombillo de sodio de 70 W	Und	100	100	100%
2.4	Mantenimiento- Suministro e instalacion de bombillo de sodio de 150 W	Und	100	100	100%
2.5	Poste de 8 M Concreto 510 KGF	Und	16	8	50%
2.6	Poste de 10 M Concreto 510 KGF	Und	8	0	0%
2.7	Poste Reforzado En Fibra de Vidrio 8 M 510 KGF	Und	5	0	0%
2.8	Reparación de redes de baja tensión en Cable Trenzado	Ml	1003	755	75%
III	AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (Entrada Puerta Negra Vereda San Cristobal)				
3.1	Localizacion y Replanteo	Ml	0		0%
3.2	Excavacion de postes y retenidas	Und	23		0%
3.3	Suministro e instalacion de poste de 12 m 1050 kgf	Und	1		0%
3.4	Suministro e instalacion de poste de 9 m 1050 kgf	Und	2		0%
3.5	Suministro e instalacion de poste de 9 m 750 kgf	Und	10		0%
3.6	Suministro e instalacion de poste de 9 m 510 kgf	Und	10		0%
3.7	Pintura para poste	Und	23		0%
3.8	Suministro e instalación de estructura para retención	Und	8		0%
3.9	Suministro e Instalación de red de baja tensión de alumbrado publico	Mts	800		0%
3.10	Suministro e instalacion de red de media tension	Mts	150		0%

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asis

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

3.11	Suministro e instalacion de transformador monofasico con puesta a tierra	Und	1		0%
3.12	Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 12 m 1050 kgf	Und	1		0%
3.13	Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 9 m 1050 kgf	Und	2		0%
3.14	Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 9 m 750 kgf	Und	10		0%
3.15	Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 9 m 510 kgf	Und	10		0%
3.16	Suministro e instalacion de puesta a tierra del sistema de alumbrado publico	Und	8		0%
3.17	Suministro e instalacion de accesorios para red de baja tension de alumbrado publico	Und	35		0%
3.18	Tramites, diseños, linea viva, Retie, legalizacion y acompañamiento Ampliación Cobertura	Glb	1	1	100%
V	VEHICULOS				
5.1	Alquiler de Vehículo para Transporte de Insumos, materiales y Cuadrilla de Alumbrado Publico	Glb	1,5	1,45	97%
5.2	Alquiler de Vehiculo tipo camion doble cabina con grua articulada certificada (capacidad minima de carga de 3000kg), canasta, barreno y volco	Glb	1,5	1,45	97%
VI	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
6.1	Gastos Administrativos y Organizacionales	Glb	1,9	1,85	97%
NP	NO PREVISTOS				
NP01	"Poda, cargue y retiro de material vegetal – Manejo de vegetación en redes de alumbrado público (sin disposición final)"	UND	200	170	85%
NP02	Mantenimiento Transformadores	Glb	1	0	0%
NP03	Alumbrado Navideño	Glb	1	1	100%

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

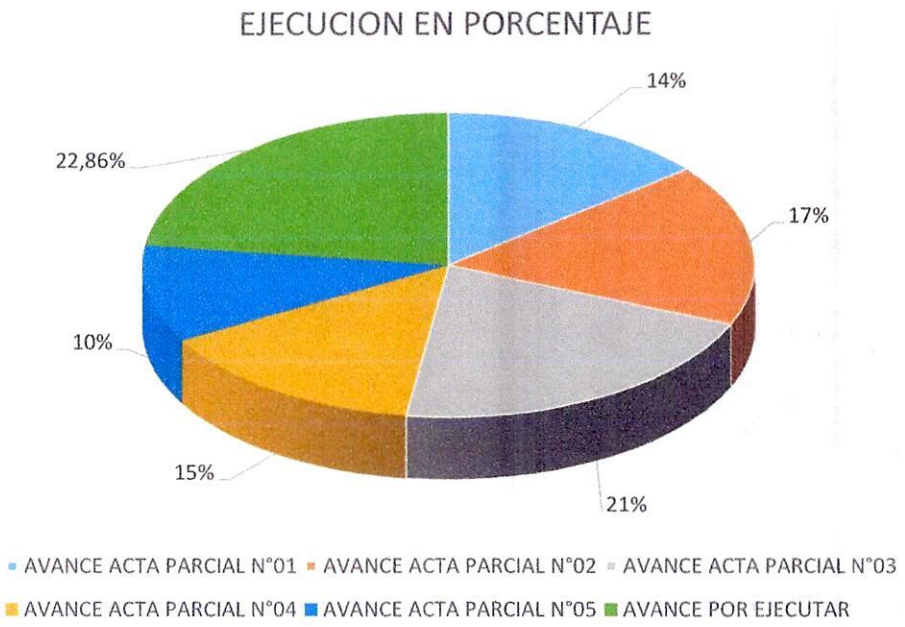
SISTEMA CERTIFICACIÓN ISO 9001 SGS CO20/962285

CONTROL DE EJECUCION CONTRATO

Prog Vs Ejecutado	INICIO	ACTA PARCIAL N°1	ACTA PARCIAL N°2	ACTA PARCIAL N°3	ACTA PARCIAL N°4	ACTA PARCIAL N°5
PROGRAMADO	-	$ 643.772.605,58	$ 643.772.605,58	$ 643.772.605,58	$ 643.772.605,58	$ 643.772.605,58
EJECUTADO	-	$ 550.183.272,91	$ 661.718.088,74	$ 805.303.666,29	$ 560.804.981,20	$ 401.643.101,91
Prog Vs Ejecutado	INICIO	COBRO N° 01	COBRO N° 02	COBRO N° 03	COBRO N° 04	COBRO N° 05
PROGRAMADO	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
EJECUTADO	0,00%	14%	17%	21%	15%	10%
Prog Vs Ejecutado	INICIO	ACUMULADO ACTA PARCIAL N°1	ACUMULADO ACTA PARCIAL N°2	ACUMULADO ACTA PARCIAL N°3	ACUMULADO ACTA PARCIAL N°4	ACUMULADO ACTA PARCIAL N°5
PROGRAMADO	-	$ 643.772.605,58	$ 1.287.545.211,16	$ 1.931.317.816,74	$ 2.575.090.422,32	$ 3.218.863.027,90
EJECUTADO	-	$ 550.183.272,91	$ 1.211.901.361,65	$ 2.017.205.027,94	$ 2.578.010.009,14	$ 2.979.653.111,05
Prog Vs Ejecutado	INICIO	ACUMULADO N° 1	ACUMULADO N° 2	ACUMULADO N° 3	ACUMULADO N° 4	ACUMULADO N° 5
PROGRAMADO	0,00%	16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%
EJECUTADO	0,00%	14%	31%	52,22%	66,74%	77,14%

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

7. ACTIVIDADES REALIZADAS
8. VEHICULOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N°37 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025

CONTRATISTA: EDUARD SEBASTIA QUEVEDO ESPITIA

VALOR DEL CONTRATO: SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($78.250.000,00)

PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA 4X4 CON CONDUCTOR PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y LOGÍSTICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA -ÁREA DE ALUMBRADO DE EMPUMELGAR E.S.P.

VEHICULOS	
	
FOTO N°1	FOTO N°2

FICHA DE MANEJO VEHICULO
MARCA: VOLKSWAGUEN AMAROKTRENDLINE
PLACA: GUU698
N° DE LICENCIA DE TRANSITO: 10020468674
AÑO: 2014
NOMBRE DEL CONDUCTOR: ROBINSON LEAL

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N°130 DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CONTRATISTA: FABEL FERNEY RICO ALZATE

VALOR DEL CONTRATO: DIECISEIS MILLONES M/CTE ($16.000.000)

PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA 4X4 CON CONDUCTOR PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y LOGÍSTICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA -ÁREA DE ALUMBRADO DE EMPUMELGAR E.S.P.





FICHA DE MANEJO VEHICULO
MARCA: RENAULT
PLACA: DMY680
N° DE LICENCIA DE TRANSITO: 10013254677
AÑO: 2017
NOMBRE DEL CONDUCTOR: LIBARDO SANCHEZ

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N°32 DEL 21 DE FEBRERO DEL 2025

CONTRATISTA: GRUPO INCA

VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($243.050.000)

PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN VEHÍCULO TIPO GRUA – PLATAFORMA – DOBLE CABINA, CON SERVICIOS DE BRAZO HIDRÁULICO CERTIFICADO, CANASTA PARA TRABAJO EN ALTURAS, BARRENO PARA APERTURA DE HOYOS, VOLCÓ Y OPERADOR – CON CONDUCTOR, PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES DE GRAN DIMENSIÓN REQUERIDO PARA EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE EMPUMELGAR E.S.P.

VEHICULOS	
	
FOTO N°1	**FOTO N°2**

FICHA DE MANEJO CAMION FOTON
MARCA: KODIAK
PLACA: OBE - 050
N° DE LICENCIA DE TRANSITO: 10021423835
AÑO: 1997
NOMBRE DEL CONDUCTOR: DORIAN AGUDELO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

N.P 03 ALUMBRADO NAVIDEÑO



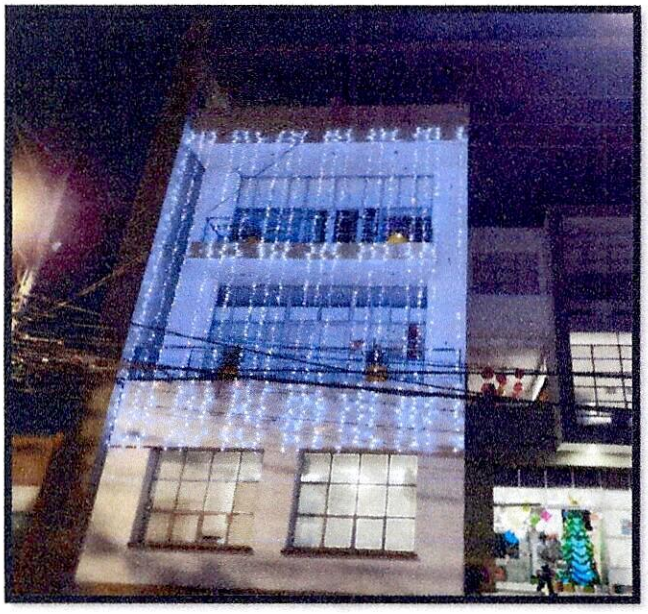
empumelgar e.s.p

FORMATO MINUTA DE CONTRATO	CÓDIGO: GJ-F005 VERSIÓN: 04 VIGENTE DESDE: 15/01/2025

TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO	VALOR
CONTRATO DE SERVICIO	CD-131-2025	$ 259.980.601,92 IVA INCLUIDO

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	LA FUNDACIÓN NOMADES TECNOLOGIA ONG
CEDULA O NIT	900243110-1
DIRECCIÓN	CL 16 J G BIS 25 NEIVA HUILA
CORREO ELECTRÓNICO	[illegible]
TELÉFONO	3017860521 - 3156324143
DEFINICIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR E IDENTIFICACIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA ALQUILER, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, DESINSTALACIÓN Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	El valor estimado del presente contrato es por la suma de El valor estimado del presente contrato es por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS UN PESOS Y NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($259.980.601,92). INCLUYE IVA. Discriminado así: Valor Base: ($218.471.094) Iva 19% ($41.509.507,92)
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato es hasta el **31 de diciembre de 2025**, término contado a partir de la fecha que indique el acta de inicio suscrita por el CONTRATISTA y EL SUPERVISOR del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de legalización y perfeccionamiento. *Nota. De común acuerdo entre las partes, la fecha de desinstalación puede prorrogarse más allá del tiempo de ejecución establecido, dada la particularidad de las actividades y el riesgo que esta actividad genera en propios y visitantes municipales. En todo caso esta actividad no puede superar el 15 de enero de 2026, en cuyo caso será considerada como una obligación post contractual, ejecutada bajo la supervisión y acompañamiento del personal de Alumbrado Público.*







EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

9. ACTIVIDADES PARA EJECUCION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

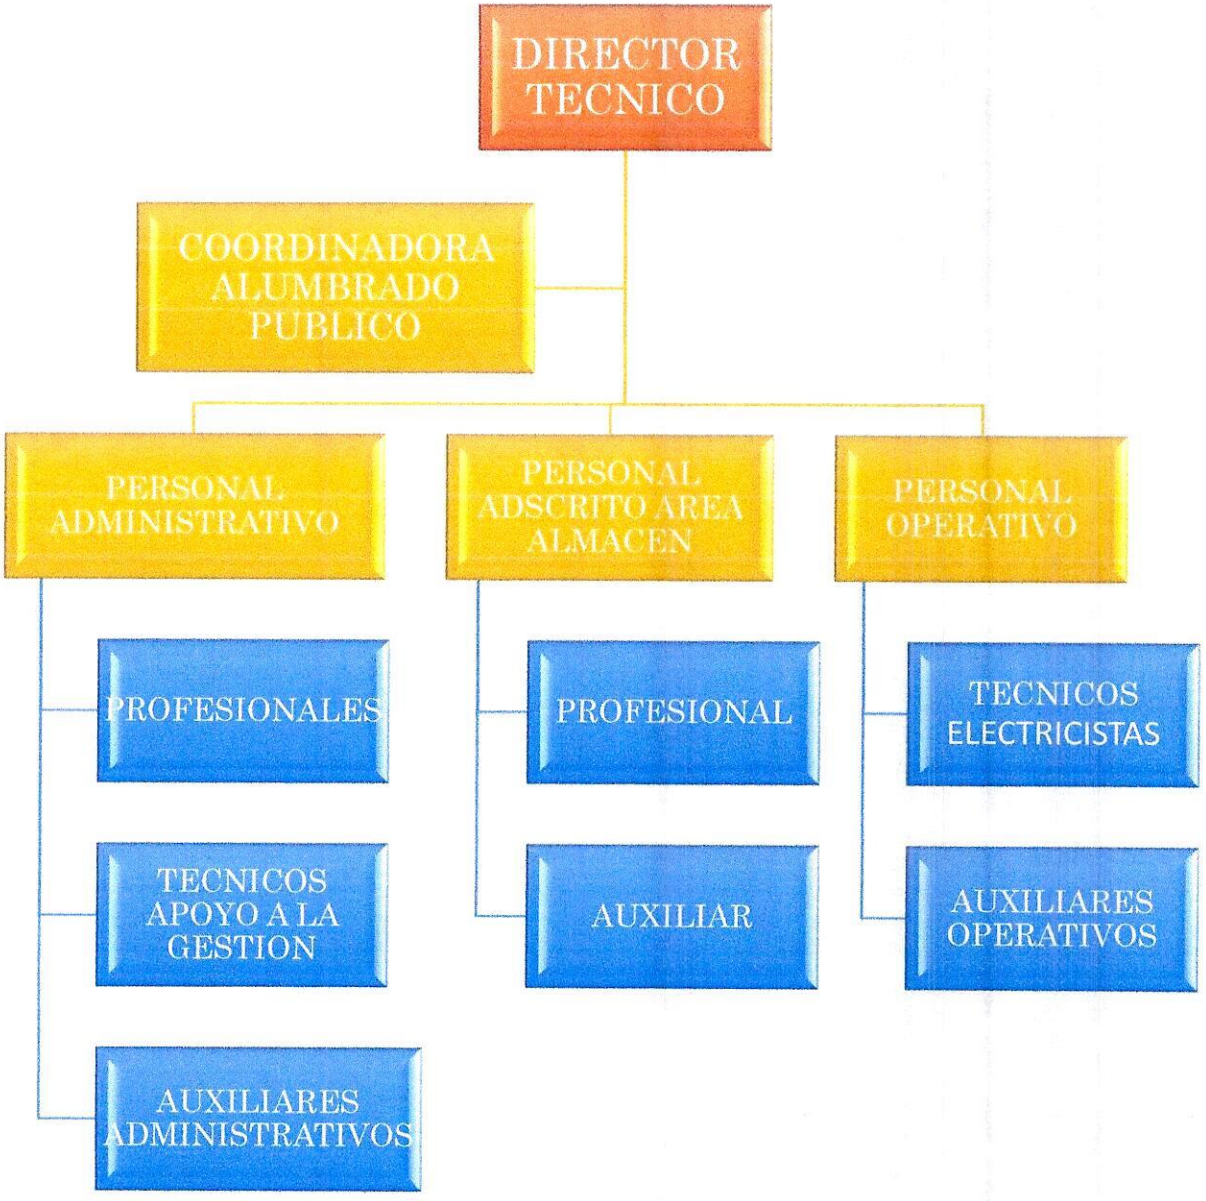


Fuente: Empumelgar e.s.p

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

10. RECURSO HUMANO APOYO ALUMBRADO PUBLICO



Fuente: Empumelgar e.s.p

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

PERSONAL ALUMBRADO PUBLICO CONTRATACION		
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO
1	AGUILAR MORALES YINETH	PROFESIONAL DE APOYO A LA GEST
2	AREVALO GALINDO LEONARDO ALFONSO	OPERARIO AUXILIAR MISION
3	ESPINOSA SALGADO SANTIAGO	PROF. CUMPLIMIENTO MISION
4	HERRADA CAMILA	PROFESIONAL DE APOYO A LA GEST
5	BERNAL PINILLA ANDERSON SNEIDER	OPERARIO AUXILIAR MISION
6	QUINTERO DAVID	PROF. CUMPLIMIENTO MISION
7	CUEVAS ORTIZ BRYAN	ASISTENTE CUMPLI MISION
8	TREJOS LOPEZ ESTEFANIA	ASISTENTE CUMPLI MISION
9	BALLESTEROS JUAN CARLOS	OPERARIO AUXILIAR MISION
10	LOZANO EDUARDO	TECNICO OPERATIVO MISION
11	LOMBO BELLER ERNESTO	TECNICO OPERATIVO MISION
12	DIAZ CADENA ERIKA PAOLA	PROFESIONAL DE APOYO A LA GEST
13	VARGAS NICOLAS	OPERARIO AUXILIAR MISION
14	HERNANDEZ CRISTOFER	OPERARIO AUXILIAR MISION
15	RAMIREZ EDISON OSWALDO	OPERARIO AUXILIAR MISION
16	RODRIGUEZ LOZADA CARLOS SANTIAGO	OPERARIO AUXILIAR MISION
17	PRECIADO LUIS	OPERARIO AUXILIAR MISION
18	ORTEGA CASTRO JOHIS WILLIAM	OPERARIO AUXILIAR MISION
19	CARDENAS CASTRO BERNARDO	OPERARIO AUXILIAR MISION
20	MENDEZ ORTIZ FERNANDO	OPERARIO AUXILIAR MISION
21	PARRA CASTRO RAFAEL ANTONIO	TECNICO OPERATIVO MISION
22	VASQUEZ MARIA DEL PILAR	TECNICO COORDINADOR MISION

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:	Pilar Vásquez	Santiago Espinosa Salgado	Fernando Enrique Berrios López
FIRMA:		Santiago E.S.	
CARGO:	Técnico Coordinador Misión	Prof. Universitario Mision	Director Operativo
FECHA:	09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962285

DIAGNOSTICO SST
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°087 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025
INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE
LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPUMELGAR E.S.P.
PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN
Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE
MELGAR PARA LA VIGENCIA 2025

MELGAR- TOLIMA

2025

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO....2

1. INTRODUCCIÓN....3

PLAN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO....4

2. REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE....4

3.REGISTRO FOTOGRAFICO DE ENTREGA DE EPP....4

A. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LAS CUADRILLAS DE ALUMBRADO PÚBLICO....4

4. CHARLAS Y RECOMENDACIONES....5

5. INSPECCIÓN FRENTE DE VEHÍCULOS....6

6. INSPECCIÓN FRENTE DE TRABAJO....10

7. TOMA DE ANTOPROMETRIA....13

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el contrato interadministrativo N°087 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025, suscrito en el municipio de Melgar - Tolima, que contempla desarrollar el programa de mantenimiento, operación, modernización y ampliación de cobertura de la red de alumbrado público en el municipio de Melgar. Nos permitimos elaborar el presente informe mensual donde se registra el seguimiento, trazabilidad, capacitación, entrega de EPP y acompañamiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondientes al mes de NOVIEMBRE se tienen en cuenta toda y cada una de las actividades dispuestas en el protocolo de bioseguridad, implementado por la empresa de servicios Públicos Empumelgar E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co

PLAN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para llevar a cabo el plan del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el contrato interadministrativo N°087 del 17 de febrero del 2025 que tiene por objeto: **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2025**

Se rige bajo las pautas descritas e implementadas por la empresa de servicios públicos EMPUMELGAR E.S.P.

Las actividades contempladas en plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran establecidas a través del ciclo PHVA que permite la mejora continua, incluye aspectos tales como: política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, valorar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los funcionarios en cumplimiento de los estándares mínimos.

2. REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.

3.REGISTRO FOTOGRAFICO DE ENTREGA DE EPP.

a. Suministro de Elementos de Protección personal para las cuadrillas de alumbrado público.

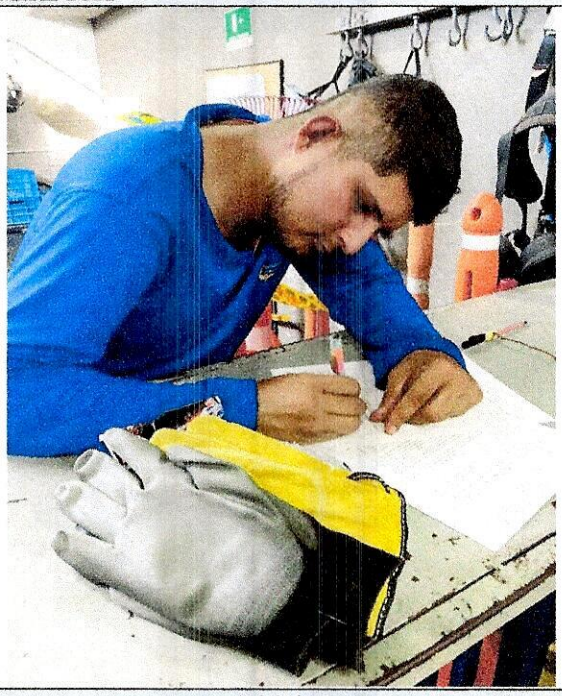
El principal propósito de los EPP es proteger a los trabajadores de los riesgos específicos presentes en su entorno laboral, como caídas de objetos, Los EPP son una herramienta fundamental para reducir la probabilidad de accidentes laborales. Al usarlos adecuadamente, los trabajadores tienen una capa de protección adicional que puede prevenir lesiones graves o incluso salvar vidas en situaciones de alto riesgo.

- Guantes dieléctricos.
- Guantes poliuretano.
- Gafas claras.
- Gafas oscuras.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co

EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
	
FOTO 1	FOTO 2
EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
	

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co

FOTO 3	FOTO 4
EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
	
FOTO 5	FOTO 6
EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
	
FOTO 7	FOTO 8

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co

EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
	
FOTO 9	FOTO 10

EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
	
FOTO 11	FOTO 12

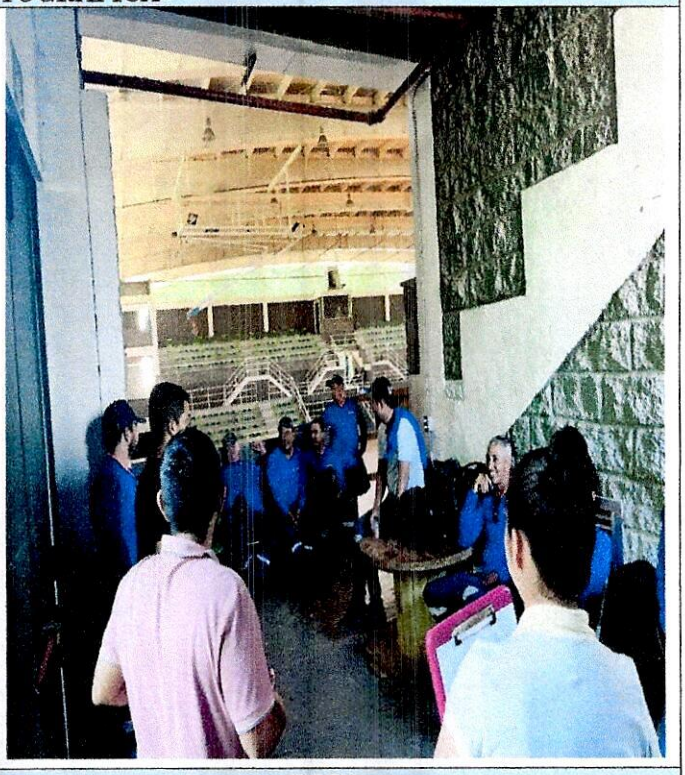
FUENTE: Empumelgar E.S.P

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co

4. CHARLAS Y RECOMENDACIONES.

Fortalecer la cultura de la prevención y el autocuidado en el área de alumbrado público mediante el desarrollo de charlas informativas, capacitaciones y recomendaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), orientadas a sensibilizar al personal operativo y administrativo sobre la importancia de implementar prácticas seguras en el desarrollo de sus funciones. Estas acciones buscan garantizar la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados a la labor, tales como trabajo en alturas, manipulación de equipos eléctricos, exposición a condiciones climáticas adversas y tránsito vehicular, promoviendo así el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Del mismo modo, se pretende fomentar la responsabilidad individual y colectiva en el uso correcto de los elementos de protección personal (EPP), el respeto por las señales de seguridad, la comunicación efectiva entre los equipos de trabajo y la participación activa en la mejora continua de las condiciones laborales. A través de estas estrategias se busca reducir la frecuencia y severidad de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, garantizando entornos de trabajo seguros, saludables y eficientes, que contribuyan tanto al bienestar físico, mental y social de los trabajadores como al cumplimiento de los objetivos institucionales del servicio de alumbrado público.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
	
FOTO 1	FOTO 2

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co

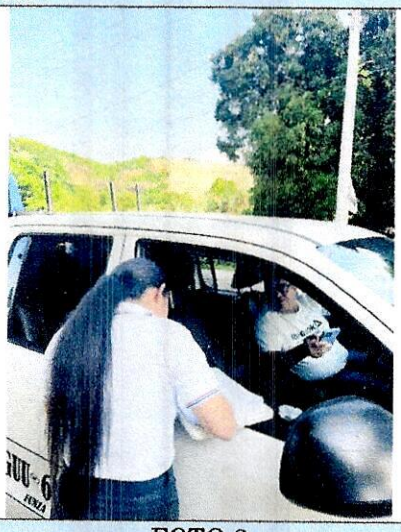
EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
	
FOTO 1	FOTO 2
EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
	
FOTO 1	FOTO 2

FUENTE: Empumelgar E.S.P

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email: serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co

5. INSPECCIÓN FRENTE DE VEHÍCULOS.

- Las inspecciones de automóviles realizadas por el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo son esenciales para garantizar que los vehículos empleados en las actividades laborales cumplan con las normativas de seguridad, para proteger tanto a los conductores como a los trabajadores y el entorno en general. Estas inspecciones no solo están relacionadas con el buen estado mecánico de los vehículos, sino también con su uso adecuado y la prevención de accidentes laborales.

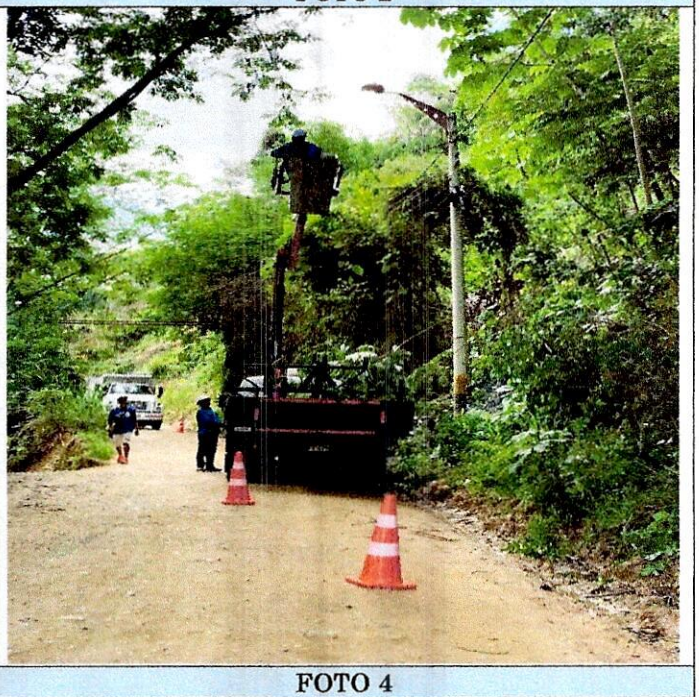
EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
	
FOTO 1	FOTO 2

FUENTE: Empumelgar E.S.P

6. INSPECCIÓN FRENTE DE TRABAJO.

- La inspección frente de trabajo son una parte fundamental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en cualquier empresa, especialmente en entornos con altos riesgos, como el trabajo de alumbrado público. Estas inspecciones se realizan por diversas razones clave que contribuyen a la prevención de accidentes, verificar que se haya diligenciado correctamente el permiso de trabajo en alturas y la mejora continua de las condiciones laborales.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co

EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4

FUENTE: Empumelgar E.S.P

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8

FUENTE: Empumelgar E.S.P

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co

TOMA DE ANTROPOMETRÍA.

Una toma antropométrica es la medición de las características físicas del cuerpo humano con el fin de evaluar el estado nutricional, el crecimiento, la composición corporal y, en algunos casos, el riesgo de enfermedades.
Se realiza la toma de: Peso, Altura y Presión Arterial.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
	
FOTO 1	FOTO 2

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 - 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co

empumelgar e.s.p	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS	CÓDIGO: GO-F023 VERSIÓN: 04 VIGENTE DESDE: 30/09/2020

CONTROL DE MODIFICACIONES

ANTERIOR VERSIÓN	NUEVA VERSIÓN	FECHA (DD-MM-AAAA)	NATURALEZA DEL CAMBIO

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:	MARIA CAMILA HERRADA PEDREROS	ALEYDA DIAZ GAITAN	FERNANDO BERRIOS
FIRMA:			
CARGO:	PRF APOYO A LA GESTION	PRF PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION	DIRECTOR OPERATIVO
FECHA:			

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
