INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PERÍODO: ENERO DE 2025

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
NIT. 860.038.275-3

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

CONVENIADO:

Organismos de Acción Comunal en los municipios de Bolívar, Florián, Guavatá, La Belleza, Sucre y Vélez en el departamento del Santander, para lo cual se requiere realizar labores de control y seguimiento.

Objeto del Convenio Solidario

MUNICIPIO	ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL	CONVENIO No	OBJETO
BOLIVAR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL	3951-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
FLORIAN	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL GUALILO	4267-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIAN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
GUAVATA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE LA UNION	4478-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
GUAVATA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POPOA	4767-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
LA BELLEZA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN	3753-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
LA BELLEZA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL	4175-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

SUCRE	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ORGANOS	4490-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VELEZ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA	4357-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ- SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VELEZ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL GAITAL	4367-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VELEZ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA	4424-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VELEZ	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA	4565-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

REVISIÓN DOCUMENTAL				
	CARGO	**FIRMA**	**FECHA**	**VERSIÓN**
ELABORÓ	Director de Interventoría	Jorge H. Forero Forero	31/01/2025	V01
	Residente de interventoría	Jaime Chacón Durán	31/01/2025	V01
REVISÓ	Director de Interventoría	Jorge H. Forero Forero	31/01/2025	V01

TABLA DE CONTENIDO

1 ALCANCE 10
2 DESCRIPCION DEL PROYECTO. 13
2.1 Localización 13
2.2 Municipios en la zona de influencia: 31
2.3 Inventario y estado inicial de la vía: 34
2.4 Características técnicas del proyecto: 39
3 INFORMACION DEL CONVENIO SOLIDARIO. 40
3.1 Información general de los convenios solidarios: 40
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes y acciones a seguir por la interventoría: 51
3.2.1 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS: 51
3.2.2 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUALILO: 54
3.2.3 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BERLIN: 58
3.2.4 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL: 60
3.2.5 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA: 62
ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA 62
REGISTRO FOTOGRÁFICO 63
3.2.6 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA: 66
3.2.7 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL: 72
3.2.8 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TEBAIDA: 83
3.2.9 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POPOA: 95
3.2.10 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION: 97
3.2.11 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL: 100
3.3 Seguimientos ítems no previstos: 103

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría: 103
4 REPORTE DE EJECUCION MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO. 104
4.1. Informes semanales 104
4.1 Maquinaria y Equipos convenio solidario. 104
4.2 Personal, control aportes legales y seguridad social convenio solidario. 106
4.2.1 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS: 106
4.2.2 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA GUALILO: 106
4.2.3 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA BERLIN: 106
4.2.4 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA CHACHIPAYAL: 106
4.2.5 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA: 107
4.2.6 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA: 107
4.2.7 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL: 107
4.2.8 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA TEBAIDA: 107
4.2.9 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA POPOA: 108
4.2.10 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION: 108
4.2.11 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL: 108
4.3 Informe financiero y presupuestal convenios solidarios. 108
4.4 Estado general del tiempo (noviembre 2024). 109
4.5 Resumen de ensayos de laboratorio. 109
4.6 Seguimiento garantías y seguros convenio solidario. 109
4.7 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra. 113
4.8 Otros documentos seguimiento mensual. 113
4.8.1 Seguimiento a la inversión del anticipo de obra. 113
4.8.2 Seguimiento al programa de obra. 113
4.8.3 Seguimiento al programa de inversiones. 113
4.8.4 Actas suscritas 113
4.8.5 Actas de reunión 113
5 INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 114

5.1 Información general del contrato de interventoría: 114
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor: 115
5.3 Informes de especialistas y profesionales: 116
5.3.1. Informes técnicos acorde a los Estudios y Diseños (E y D) 116
5.3.2. Informe social. (Se anexa reporte de gestión del período (PAGA)). 116
5.4 Informes del programa anual de caja 166
5.5 Informes matrices de riesgo 167
5.6 REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 175
5.6.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría. 175
5.6.2 Personal control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría. 175
5.6.3 Información financiera y presupuestal contrato de interventoría. 175
5.6.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría. 176
5.6.5 Seguimiento al plan de calidad de contrato de interventoría. 176
5.6.6 Vigilancia y control de actividades en campo 176
5.6.7 Sistematización de información 177
5.6.8 Personal y equipo de las JAC 177
5.6.9 Calidad de los materiales empleados 177
5.6.10 Otros documentos seguimiento mensual 177
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 179
7 ANEXOS 183
7.1 Relación de correspondencia. 185
7.2 Bitácora del mes correspondiente. 185

INDICE DE ILUTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 Localización del proyecto. 13
ILUSTRACIÓN 2 Ubicación de bolívar, en Santander 14
ILUSTRACIÓN 3 Vereda Guamal – Bolívar 15

ILUSTRACIÓN 4 Vereda Guamal – Bolívar 15
ILUSTRACIÓN 5 . Ubicación de Florián, en Santander 16
ILUSTRACIÓN 6 . Vereda Galilo, Florián en Santander 17
ILUSTRACIÓN 7 Ubicación de Guavatá, en Santander 18
ILUSTRACIÓN 8 Vereda la unión, Guavatá en Santander 18
ILUSTRACIÓN 9 Vereda la unión, Guavatá en Santander 19
ILUSTRACIÓN 10 Vereda la Popoa, Guavatá en Santander 19
ILUSTRACIÓN 11 Vereda la Popoa, Guavatá en Santander 20
ILUSTRACIÓN 12 Ubicación de La Belleza, en Santander 21
ILUSTRACIÓN 13 Sector Curva Elver Marin Lizimaco – La Belleza 22
ILUSTRACIÓN 14 Vereda Berlín-Municipio La Belleza – Departamento Santander 22
ILUSTRACIÓN 15 Sector La Ye – La Belleza 23
ILUSTRACIÓN 16 Vereda Cachipayal – Municipio La Belleza – Departamento de Santander 23
ILUSTRACIÓN 17 Municipio de Sucre – Departamento de Santander 24
ILUSTRACIÓN 18 Vía La Peña de Órganos – Municipio de Sucre 25
ILUSTRACIÓN 19 Vereda Órganos – Municipio Sucre – Departamento Santander 25
ILUSTRACIÓN 20 Vélez en Santander 26
ILUSTRACIÓN 21 Tramo Vereda El Gaital – Vélez 27
ILUSTRACIÓN 22 Vereda El Gaital – Vélez 27
ILUSTRACIÓN 23 Tramo Vereda La Palmera – Vélez 28
ILUSTRACIÓN 24 Vereda La Palmera – Vélez 28
ILUSTRACIÓN 25 Tramo Vereda Tebaida – Vélez 29
ILUSTRACIÓN 26 Vereda Tebaida – Vélez 29
ILUSTRACIÓN 27 Tramo Vereda Tubavita – Vélez 30

INDICE DE TABLAS

TABLA 1 Municipio área de influencia 31
TABLA 2 Municipio área de influencia 31
TABLA 3 Municipio área de influencia 32
TABLA 4 Municipio área de influencia 32
TABLA 5 Municipio área de influencia 33
TABLA 6 Municipio área de influencia 33
TABLA 7 Registro fotográfico inicial 39
TABLA 8 Información convenio solidario 51
TABLA 9 Relación de equipo en obra en los convenios 105
TABLA 10 Horas precipitaciones del mes 109
TABLA 11 Relación de Pólizas del contrato de obra - convenio No. 1631 de 2024 113
TABLA 12 Información contrato de interventoría. 114
TABLA 13 Informe presupuestal PAC 166
TABLA 14 Fuente: Pliego de condiciones proceso CMA-DEO-SVR-CCPT-010-2024 174
TABLA 15 Personal de interventoría 175
TABLA 16 Pólizas contrato de interventoría. 176

ALCANCE

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Bolívar: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de **Bolívar** del departamento de Santander, en la **vereda Guamal**, teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+00 Latitud**: **5,969724 Longitud: -73,776561** y punto de referencia final el **PR 2 + 700 Latitud: 5,983081 Longitud: -73,782193**, de la **vía Tres esquinas siempre vivas**, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS.

Florián: El proyecto inicial se encontraba ubicado en la zona rural del Municipio de **Florián** del departamento de **Santander**, en la vereda **El Gualilo**, teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+000** con coordenadas **latitud 5,816922** y **longitud** de -**73,976306** y punto de referencia final el **PR 0 + 250** con coordenadas **latitud 5,815680** y **longitud -73,978134,** de la vía El Occidente, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS. Sin embargo se evidenció que dicho tramo se encuentra ubicado sobre una vía de orden intermunicipal, el municipio de Florián certificó que el corredor vial en este momento cuenta con destinación de recursos públicos para su intervención por esta razón la comunidad solicitó el cambio de tramo de intervención a la vía de orden terciario localizada en el punto de coordenadas **PR 0 + 000 5°49'25.87"N, 73°58'17.58"O** y punto de referencia **PR 0+150 5°49'22.11"N, 73°58'14.61"O**.



Ilustración 1. Localización Tramo Gualilo propuesto

Guavatá: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de **Guavatá** del departamento de **Santander**, en la **vereda La Unión,** teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+00 Latitud**: **5,9195512 Longitud: -73,7520709** y punto de referencia final el **PR 1 + 109 Latitud: 5,9140169 Longitud: -73,7560334**, de la vía Escuela La Unión, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS.

Guavatá: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de **Guavatá** del departamento de **Santander**, en la **vereda Popoa**, teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+00 Latitud: 5,9578883 Longitud: -73,7072234** y punto de referencia final el **PR 0 + 860 Latitud: 5,9552618 Longitud: -73,703082,** de la **vía La Loma Buena Vista - Popoa**, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS.

La Belleza : El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de **La Belleza** del departamento de **Santander**, en la **vereda Berlín**, teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+000** con coordenadas **latitud 5,900514** y **longitud de -73,955943** y punto de referencia final el **PR 0 + 253** con coordenadas **latitud**

5.902776 y **longitud -73,956393**, de la **vía Curva Elver Marín Lizimaco**, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial SANTANDER del INVIAS.

La Belleza: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de **La Belleza** del departamento de **Santander**, en la **vereda Cachipayal**, teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+000** con coordenadas **latitud 5,841841** y **longitud de -74,027477** y punto de referencia final el **PR 0 + 200** con coordenadas **latitud 5,842706** y **longitud -74,027531**, de la **vía Sector la Ye**, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial SANTANDER del INVIAS.

Sucre: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Sucre del departamento de **Santander**, en la **vereda Órganos**, teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+000** con coordenadas **latitud 5,910798 y longitud de -73,805426** y punto de referencia final el PR 0 + 200 con coordenadas **latitud 5,911956 y longitud -73,80666,** de la **vía La Peña de Órganos**, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial SANTANDER del INVIAS.

Vélez: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de **Vélez** del departamento de **Santander**, en la **vereda El Gaital,** teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+00 Latitud: 6,0714167 Longitud: -73,7115468** y punto de referencia final el **PR 1 + 530 Latitud: 6,0696692 Longitud: -73,69917**, de la **vía Gaital alto**, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS.

Vélez: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de **Vélez** del departamento de **Santander**, en la **vereda La Palmera**, teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+00 Latitud: 6,0100299 Longitud: -73,6610768** y punto de referencia **final el PR 0 + 701 Latitud: 6,0202302 Longitud: -73,6544321**, de **la vía Vereda Palmeras**, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS.

Vélez: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de **Vélez** del departamento de **Santander,** en la **vereda Tebaida**, teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+00 Latitud: 6,0591036 Longitud: -73,7113136** y punto de

referencia final el **PR 2 + 650 Latitud: 6,0682169 Longitud: -73,7257631**, de **la vía La Florida el Salitre**, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS.

Vélez: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de **Vélez** del departamento de **Santander**, en la **vereda Tubavita**, teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+00 Latitud: 6,0253102 Longitud: -73,6674229** y punto de referencia final el **PR 0 + 652 Latitud: 6,026582 Longitud: -73,6622084**, de **la vía San Victorino**, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Localización

Los proyectos objeto del siguiente Concurso se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas de los municipios de Bolívar, Florián, Guavatá, La Belleza, Sucre y Vélez; a continuación, se registra la ubicación de cada obra a ejecutar y realizar por la interventoría.

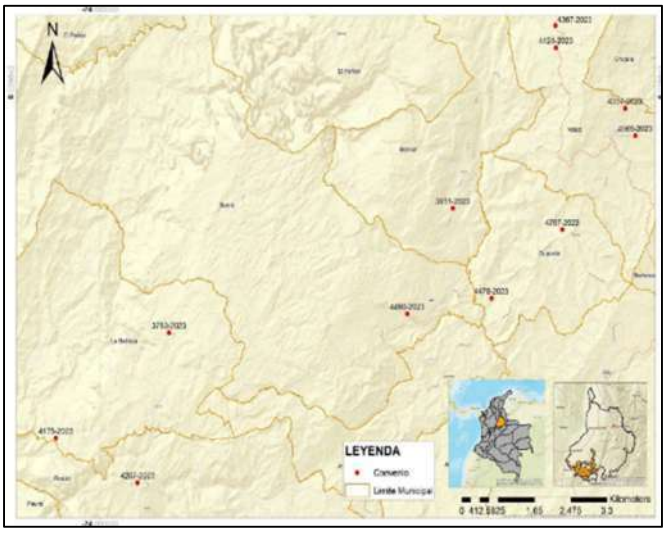


Ilustración 2 Localización del proyecto.

El Municipio de **Bolívar** se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: **5,98897**
Longitud: **-73,7711**

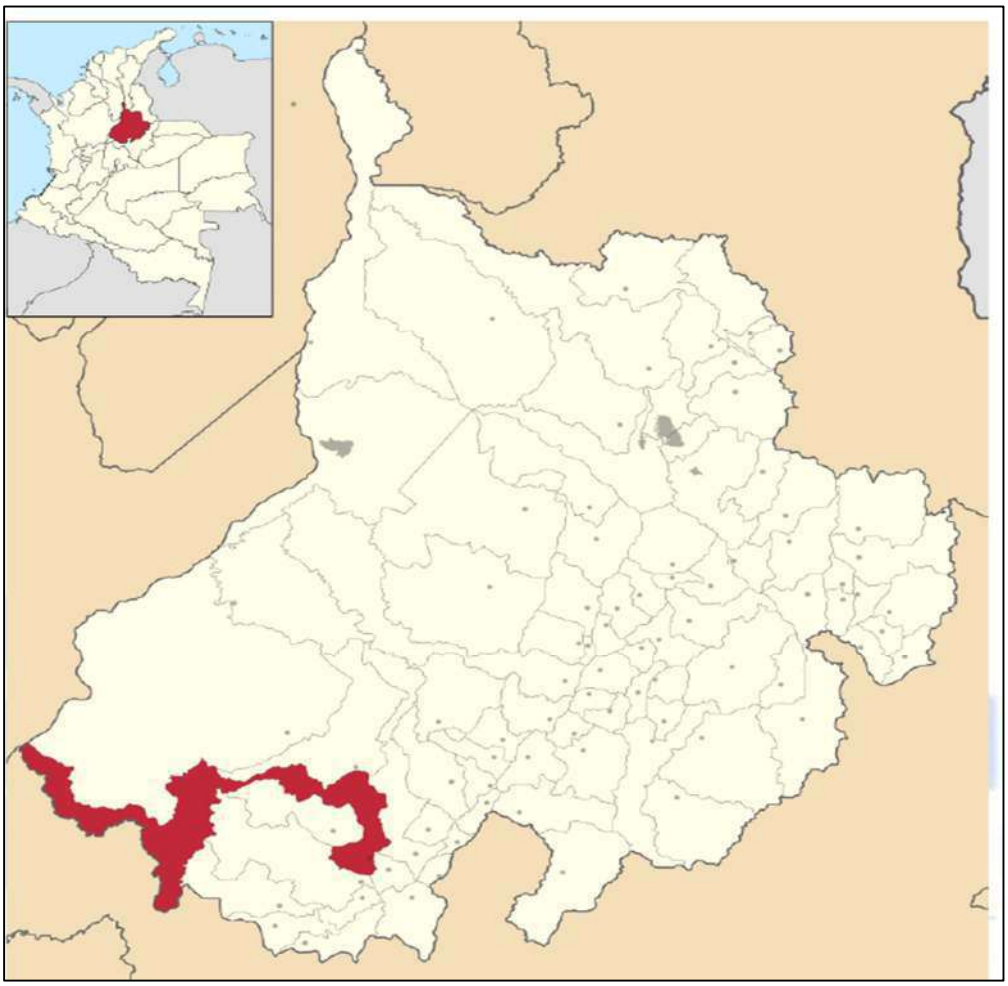


Ilustración 3 Ubicación de bolívar, en Santander



Ilustración 4 Vereda Guamal – Bolívar



Ilustración 5 Vereda Guamal – Bolívar

El Municipio de **FLORIAN** se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: **5°48'10"N**
Longitud: **73°58'17"O**



Ilustración 6 **Ubicación de Florián, en Santander**



Ilustración 7 Vereda Galilo, Florián en Santander (Nuevo Tramo Propuesto, en proceso de Revisión)

El Municipio de **Guavatá** se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: **5,95483**
Longitud: **-73,7013**



Ilustración 8 Ubicación de Guavatá, en Santander

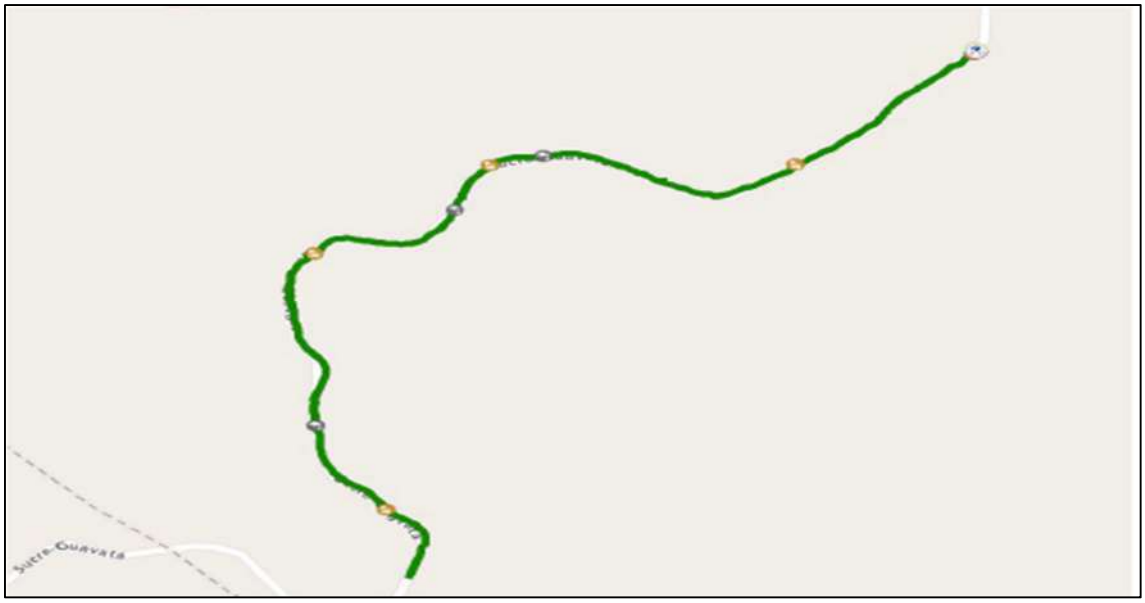


Ilustración 9 Vereda la unión, Guavatá en Santander

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025



Ilustración 10 Vereda la unión, Guavatá en Santander

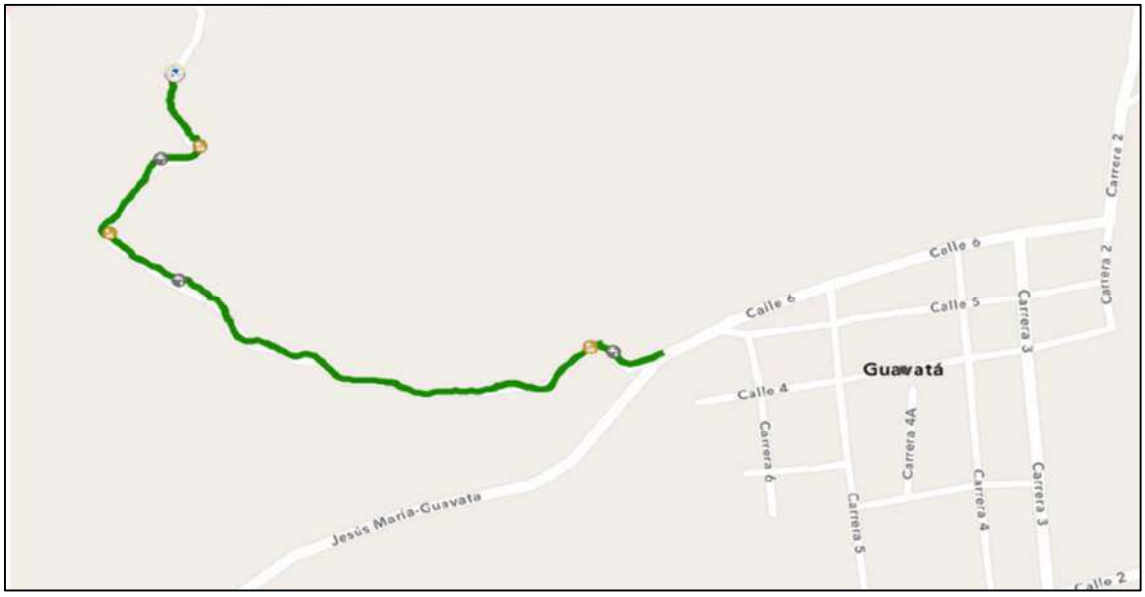


Ilustración 11 Vereda la Popoa, Guavatá en Santander

ILUSTRACIÓN 1



Ilustración 12 Vereda la Popoa, Guavatá en Santander

El Municipio de **La Belleza** se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: **5°51’27”N**
Longitud: **73°57’56”O**



Ilustración 13 Ubicación de La Belleza, en Santander

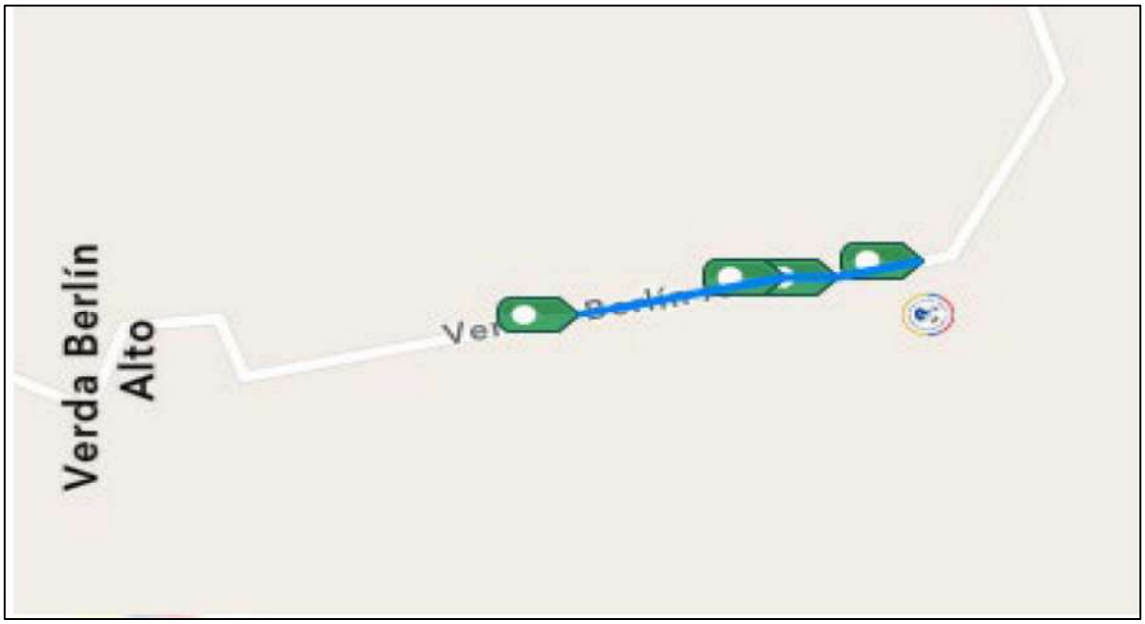


Ilustración 14 Sector Curva Elver Marin Lizimaco – La Belleza

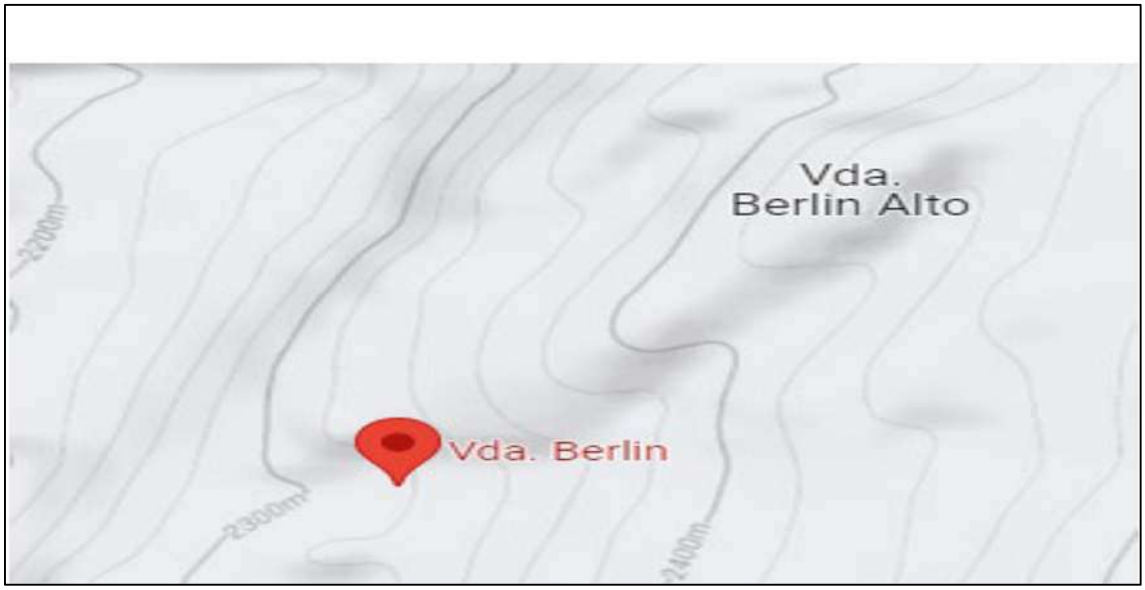


Ilustración 15 Vereda Berlín-Municipio La Belleza – Departamento Santander

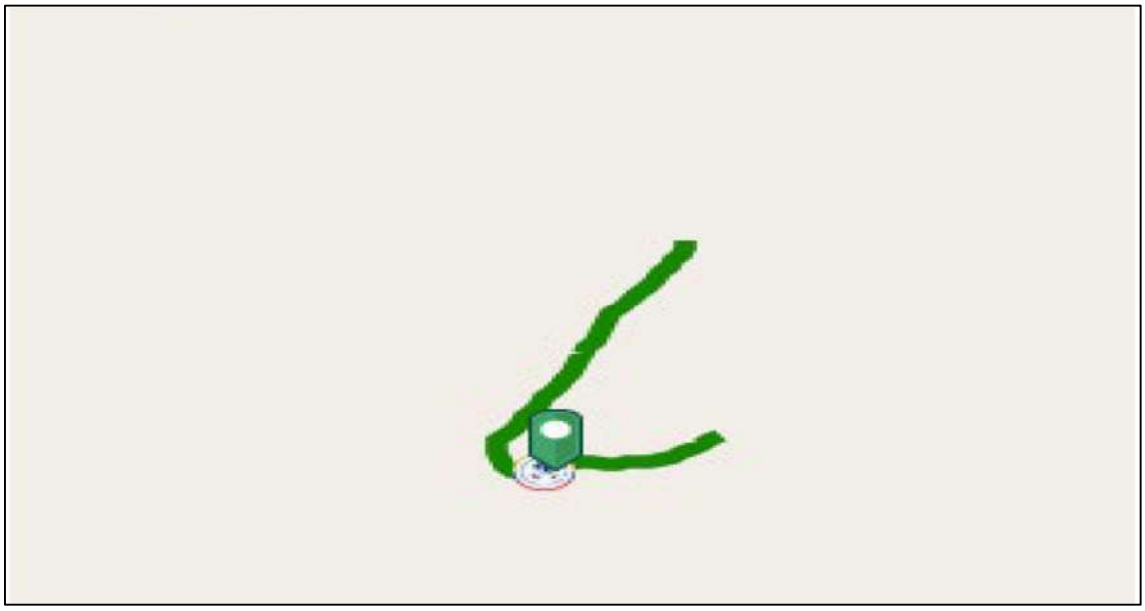


Ilustración 16 Sector La Ye – La Belleza



Ilustración 17 Vereda Cachipayal – Municipio La Belleza – Departamento de Santander

El Municipio de **Sucre** se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: **5°55'05"N**
Longitud: **73°47'29"O**



Ilustración 18 Municipio de Sucre – Departamento de Santander

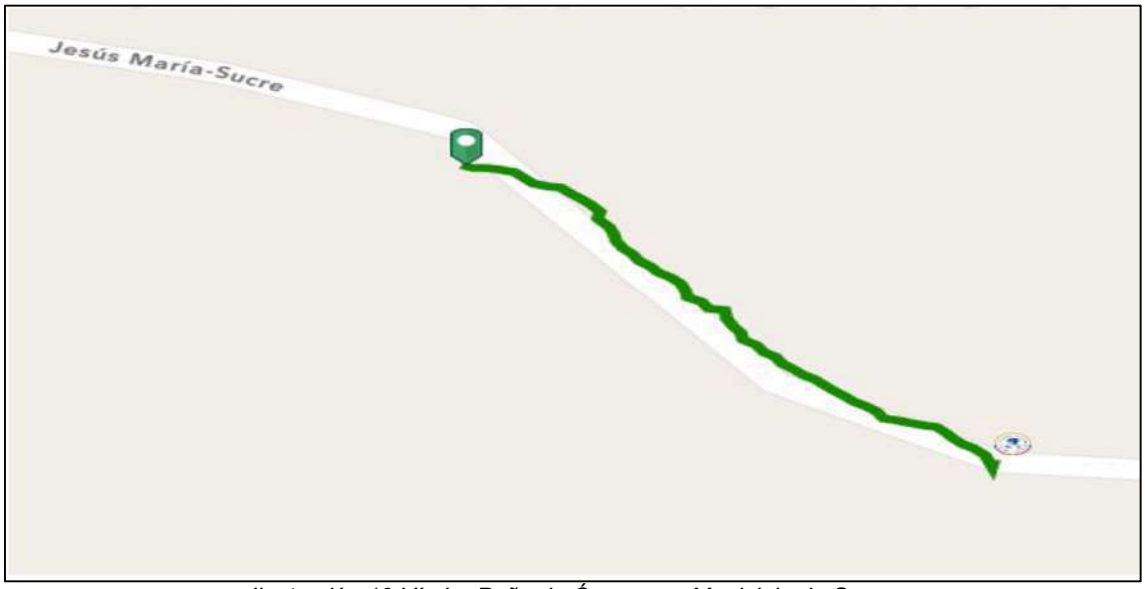


Ilustración 19 Vía La Peña de Órganos – Municipio de Sucre

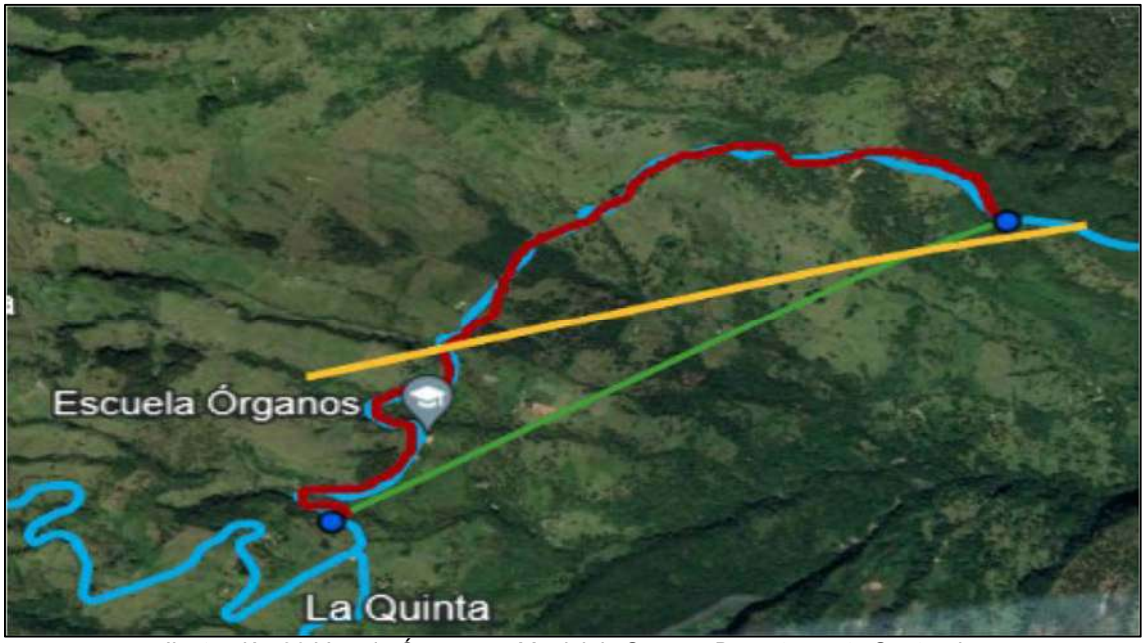


Ilustración 20 Vereda Órganos – Municipio Sucre – Departamento Santander

El Municipio de **Vélez** se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: **6,017**
Longitud: **-73,667**



Ilustración 21 Vélez en Santander

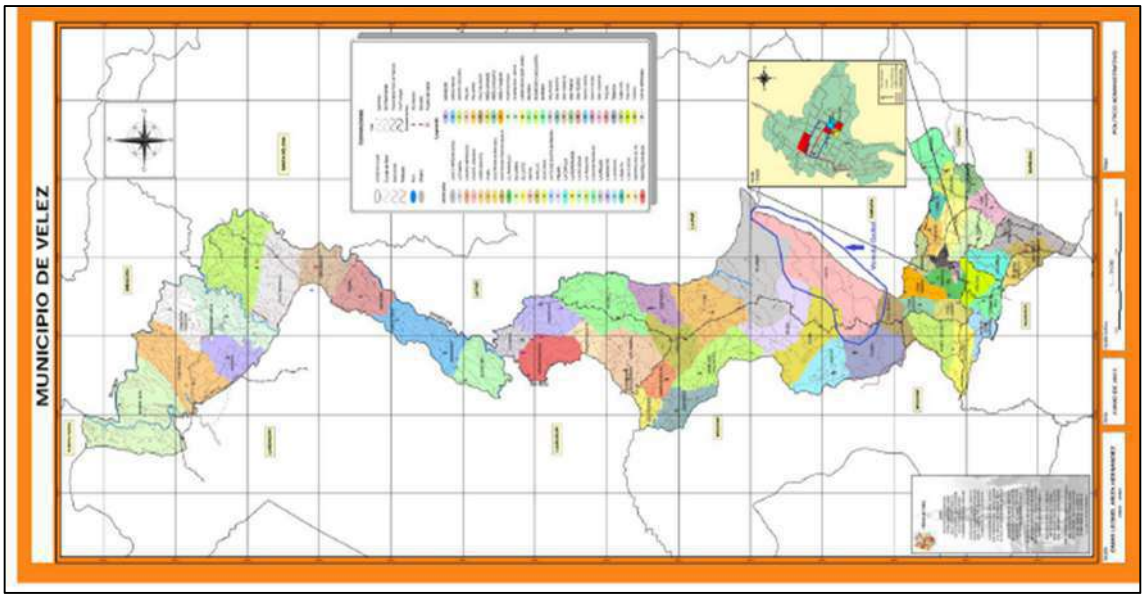


Ilustración 22 Vereda El Gaital – Vélez

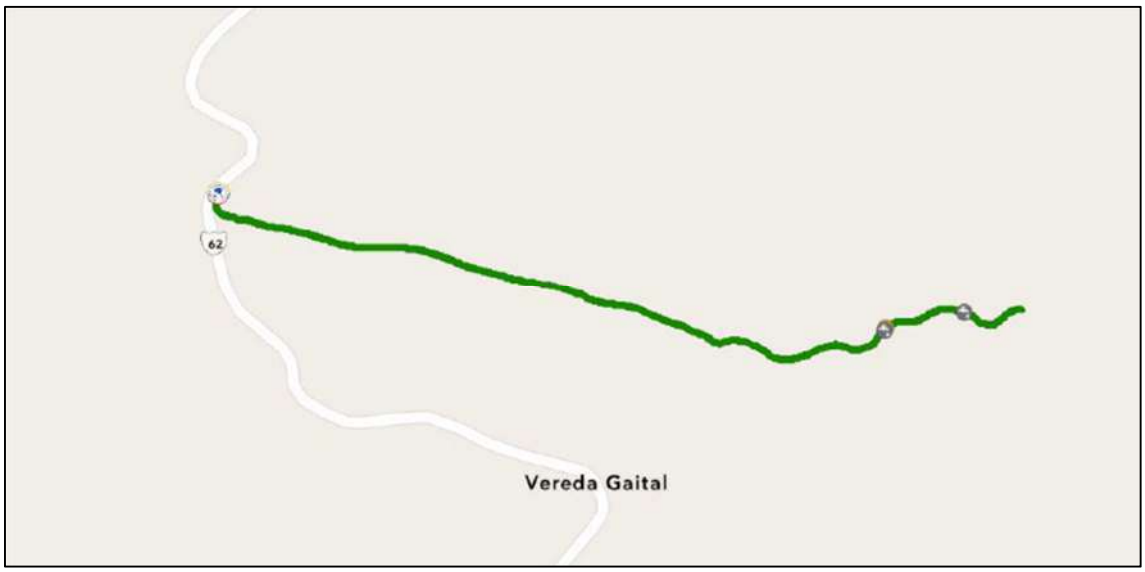


Ilustración 23 Tramo Vereda El Gaital – Vélez

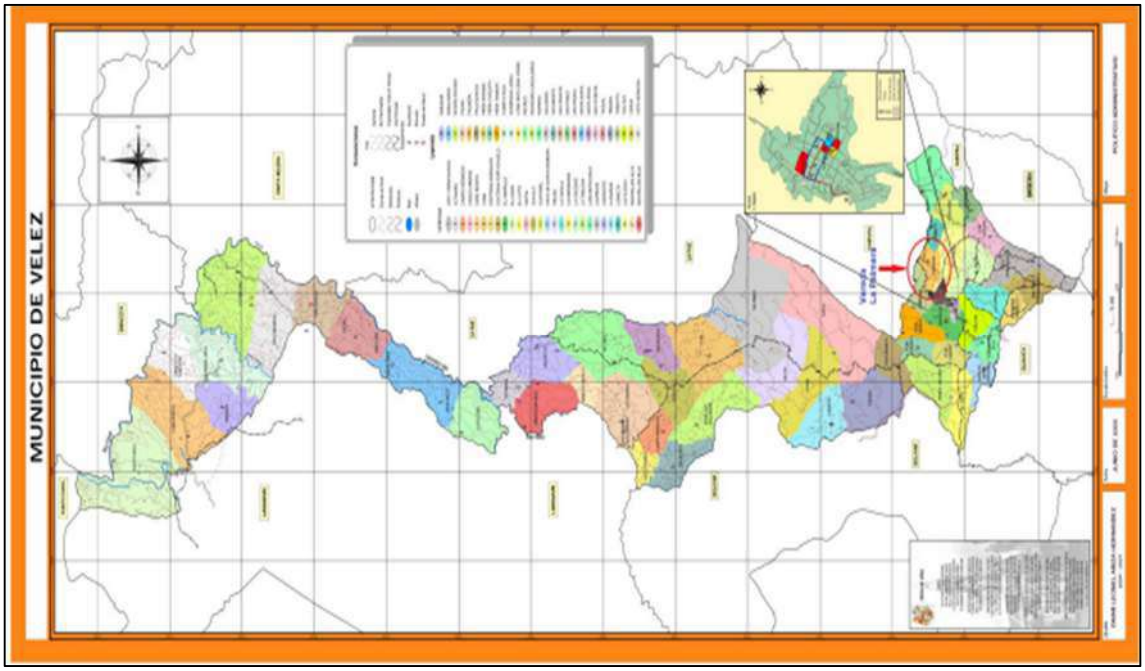


Ilustración 24 Vereda La Palmera – Vélez



Ilustración 25 Tramo Vereda La Palmera – Vélez

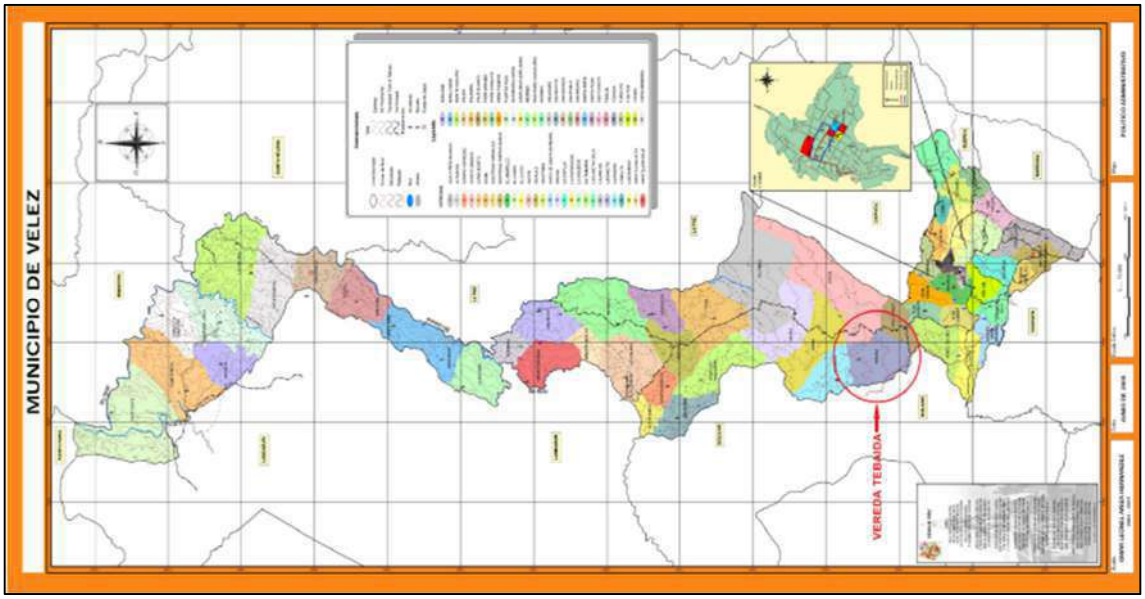


Ilustración 26 Ilustración 27 Vereda Tebaida – Vélez

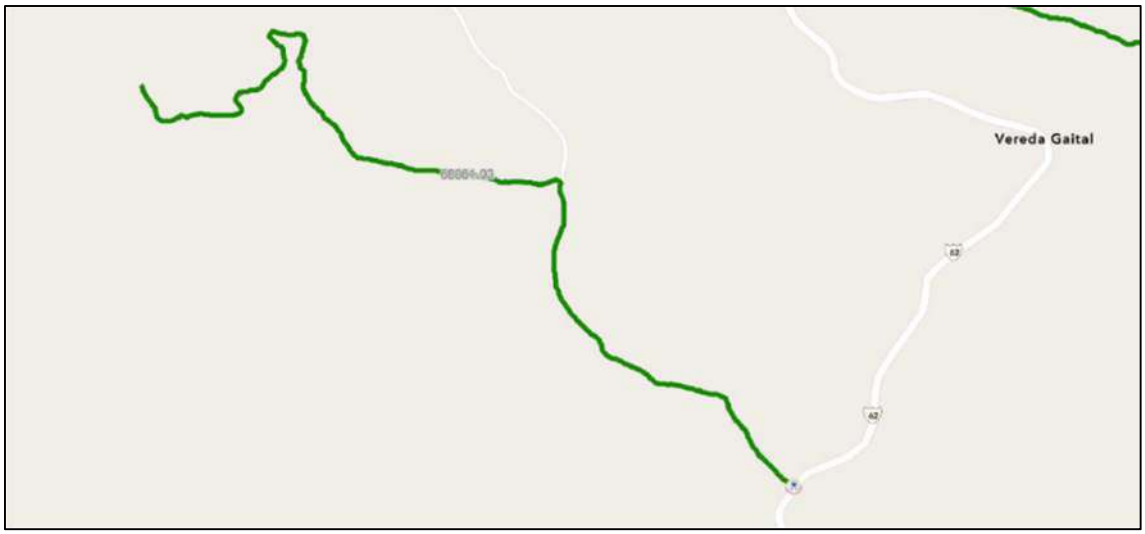


Ilustración 28 Tramo Vereda Tebaida – Vélez

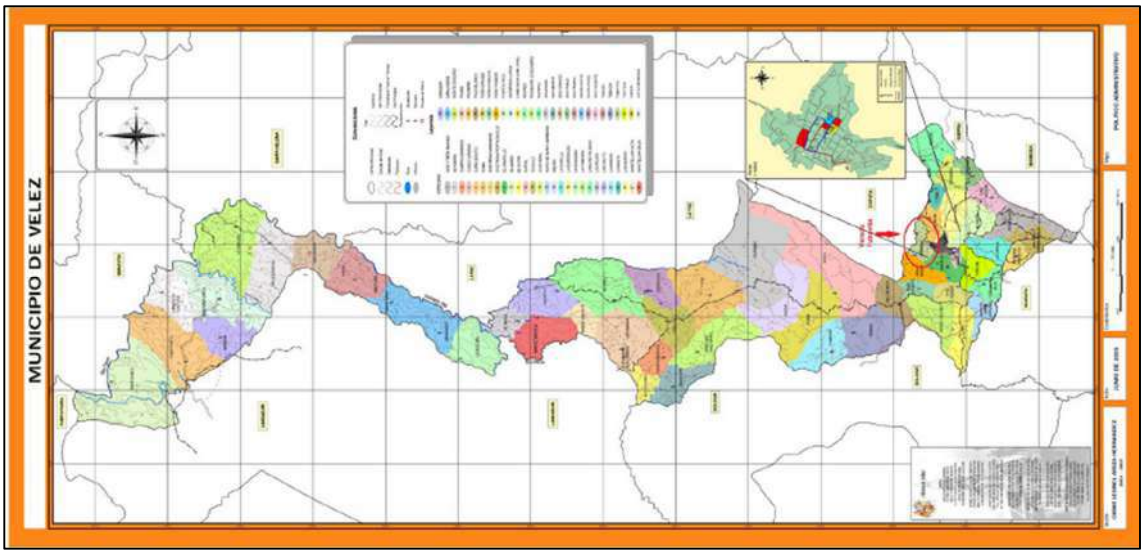


Ilustración 29 **Vereda Tubavita – Vélez**



Ilustración 30 Tramo Vereda Tubavita – Vélez

Municipios en la zona de influencia:

El municipio de **Bolívar** se encuentra localizado en la provincia de Vélez del Departamento de Santander, dista **246 kilómetros** de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la agricultura y la ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de **957,25 Km** cuadrados de los cuales solo 150,00 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

Municipio:	**BOLIVAR**
N° Habitantes:	**11.803**
Actividad económica:	Ganadería y agricultura (caña de azúcar,aguacate).

TABLA 1 Municipio área de influencia
Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. – 2024

El municipio de **FLORIAN** se encuentra localizado en la provincia VELEZ del Departamento del SANTANDER, dista 334,6 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada principalmente la ganadería y la avicultura, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 191 Km cuadrados, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

Municipio:	**FLORIAN**
N° Habitantes:	**6.000**
Actividad económica:	Ganadería y agricultura (caña de azúcar,cafe).

TABLA 2 Municipio área de influencia
Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. – 2024

El municipio de **Guavatá** se encuentra localizado en la provincia de Vélez del Departamento de Santander, dista 238 kilómetros de la Ciudad capital del departamento.

En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la agricultura y la ganadería y producción de derivados de la guayaba, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 56,00 Km cuadrados de los cuales solo 2,00 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

Municipio:	**GUAVATA**
N° Habitantes:	**4.464**
Actividad económica:	Ganadería y agricultura (caña de azúcar,café, guayaba).

TABLA 3 Municipio área de influencia
Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. – 2024

El municipio de **LA BELLEZA** se encuentra localizado en la provincia VELEZ del Departamento del SANTANDER, dista 273,8 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada principalmente cultivo de café, fique, ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 219 Km cuadrados, de los cuales solo 0.18 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

Municipio:	**LA BELLEZA**
N° Habitantes:	**8.700**
Actividad económica:	Ganadería y agricultura (tomate, gulupa, mora, lulo).

TABLA 4 Municipio área de influencia
Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. – 2024

Municipio:	**SUCRE**

El

N° Habitantes:	**8.842**
Actividad económica:	Ganadería y agricultura (caña de azúcar, café).

municipio de **SUCRE** se encuentra localizado en la provincia **VELEZ** del Departamento del **SANTANDER**, dista **254,6** kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada principalmente cultivo de café, fique, ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de **606,95** Km cuadrados, de los cuales solo **0.39** kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

TABLA 5 Municipio área de influencia
Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. – 2024

El municipio de **Vélez** se encuentra localizado en la provincia de Vélez del Departamento de Santander, dista **231** kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con **la agricultura y la ganadería y producción de derivados de la guayaba**, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de **271,34** Km cuadrados de los cuales solo **20,00** kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

Municipio:	**VELEZ**
N° Habitantes:	**20.000**
Actividad económica:	Ganadería y agricultura (caña de azúcar, café, guayaba).

TABLA 6 Municipio área de influencia
Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. – 2024

Inventario y estado inicial de la vía:

La vía de la vereda el **GUAMAL** tiene una longitud aproximada 702 ml con un ancho promedio de 5m, actualmente en condiciones regulares, a lo largo del corredor no cuenta con obras de arte de drenajes que requieren su implementación. El área de influencia de la vía está destinada principalmente para el desarrollo de actividades agropecuarias, y es una zona de amplia influencia agrícola.

La vía de la vereda **GUALILO** tiene una longitud aproximada 250 ml con un ancho promedio de 5m, actualmente en condiciones regulares, a lo largo del corredor no cuenta con obras de arte de drenajes que requieren su implementación. El área de influencia de la vía está destinada principalmente para el desarrollo de actividades agropecuarias, y es una zona de amplia influencia agrícola.

La vía de la vereda **LA UNIÓN** tiene una longitud aproximada 108 ml con un ancho promedio de 5m, actualmente en condiciones regulares, a lo largo del corredor cuenta con obras de arte de drenajes que requieren limpieza. El área de influencia de la vía está destinada principalmente para el desarrollo de actividades agropecuarias, y es una zona de amplia influencia agrícola.

La vía de la vereda **POPOA** tiene una longitud aproximada 860 ml con un ancho promedio de 5m, actualmente en condiciones regulares, a lo largo del corredor cuenta con obras de arte de drenajes que requieren limpieza. El área de influencia de la vía está destinada principalmente para el desarrollo de actividades agropecuarias, y es una zona de amplia influencia agrícola.

La vía de la vereda **BERLÍN** tiene una longitud aproximada 253 ml con un ancho promedio de 5m, actualmente en condiciones regulares, a lo largo del corredor no cuenta con obras de arte de drenajes que requieren implementación. El área de influencia de la vía está destinada principalmente para el desarrollo de actividades agropecuarias, y es una zona de amplia influencia agrícola.

La vía de la vereda **CACHIPAYAL** tiene una longitud aproximada 200 ml con un ancho promedio de 5m, actualmente en condiciones regulares, a lo largo del corredor cuenta con obras de arte de drenajes que requieren limpieza. El área de influencia de la vía está destinada principalmente para el desarrollo de actividades agropecuarias, y es una zona de amplia influencia agrícola.
La vía de la vereda **ÓRGANO** tiene una longitud aproximada 200 ml con un ancho promedio de 5m, actualmente en condiciones regulares, a lo largo del corredor no cuenta con obras de arte de drenajes que requieren implementación. El área de influencia de la vía está destinada principalmente para el desarrollo de actividades agropecuarias, y es una zona de amplia influencia agrícola.

La vía de la vereda **PALMERA** tiene una longitud aproximada 701 ml con un ancho promedio de 5m, actualmente en condiciones regulares, a lo largo del corredor cuenta con obras de arte de drenajes que requieren limpieza. El área de influencia de la vía está destinada principalmente para el desarrollo de actividades agropecuarias, y es una zona de amplia influencia agrícola.

La vía de la vereda **TEBAIDA** tiene una longitud aproximada 652 ml con un ancho promedio de 5m, actualmente en condiciones regulares, a lo largo del corredor no cuenta con obras de arte de drenajes que requieren implementación. El área de influencia de la vía está destinada principalmente para el desarrollo de actividades agropecuarias, y es una zona de amplia influencia agrícola.

La vía de la vereda **TUBAVITA** tiene una longitud aproximada 652 ml con un ancho promedio de 5m, actualmente en condiciones regulares, a lo largo del corredor cuenta con obras de arte de drenajes que requieren limpieza. El área de influencia de la vía está destinada principalmente para el desarrollo de actividades agropecuarias, y es una zona de amplia influencia agrícola.

A continuación, en la siguiente tabla se muestra el registro fotográfico inicial.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

MUNICIPIO BOLIVAR	
	
Ubicación del tramo Vereda Guamal	**Ubicación del tramo Vereda Guamal**
MUNICIPIO DE FLORIAN	
	
Ubicación del tramo Vereda Gualilo	**Ubicación del tramo Vereda Gualilo**
MUNICIPIO DE GUAVATA	

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

	
Ubicación del tramo Vereda La unión	**Ubicación del tramo Vereda La unión**
	
Ubicación del tramo Vereda Popoa	**Ubicación del tramo Vereda Popoa**
LA BELLEZA	
	
Ubicación del tramo Vereda Berlín	**Ubicación del tramo Vereda Berlín**
	
Ubicación del tramo Vereda Cachipayal	**Ubicación del tramo Vereda Cachipayal**
SUCRE	

	
Ubicación del tramo Vereda Órganos	**Ubicación del tramo Vereda Órganos**
VELEZ	
	
Ubicación del tramo Vereda Tubavita	**Ubicación del tramo Vereda Tubavita**
	
Ubicación del tramo Vereda Gaital	**Ubicación del tramo Vereda Gaital**
	
Ubicación del tramo Vereda Tebaida	**Ubicación del tramo Vereda Tebaida**

	
Ubicación del tramo Vereda Palmera	**Ubicación del tramo Vereda Palmera**

TABLA 7 Registro fotográfico inicial

Fuente: Elaboración propia – TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. – 2024

Características técnicas del proyecto:

El Alcance priorizado para el corredor consiste en la construcción de las obras de infraestructura vial para el **EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS** en los municipios de Bolívar, Florián, Guavatá, la Belleza, Sucre y Vélez. Comprende las siguientes intervenciones:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

- La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el Organismo de Acción Comunal, la interventoría y el Instituto, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "**REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir. Siguiendo los lineamientos de las normas:

1. CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES actualizadas mediante Resolución No 002483 del 19 de octubre de 2020 del Ministerio de Transporte.

2. NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS – **INVIAS**, actualizadas mediante Resolución No 001375 del 26 de mayo de 2014 del Ministerio de Transporte.

3. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN - **INVIAS**.

INFORMACION DEL CONVENIO SOLIDARIO.

Información general de los convenios solidarios:

NUMERO DE CONVENIO	3951 de 2023 GUAMAL
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL** **MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTANDER**
NIT	900.302.264-9 GUAMAL
REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR MANUEL GALEANO ARIZA
DIRECCIÓN	**Municipio de Bolívar** Vereda Guamal
E-MAIL	jacguamalbolivar@gmail.com
MUNICIPIO IMPACTADO	BOLIVAR
ESTADO	EJECUCIÓN
VALOR	$201.006.719,00 GUAMAL

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

PLAZO INICIAL	10 DIAS GUAMAL
FECHA DE INICIO	21/12/2023 GUAMAL
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	31/12/2023 GUAMAL
SUSPENSIÓN No 1	Desde el 27 de diciembre de 2023 hasta 27 de mayo de 2024
PRORROGA N°1	Hasta el 27 de septiembre de 2024
PRÓRROGA N°2	Hasta el 11 de noviembre de 2024
PRÓRROGA N°3	Hasta el 16 de diciembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN (Actualizada)	16/12/2024 GUAMAL

NUMERO DE CONVENIO	4267 de 2023 GUALILO
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIAN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUALILO** **MUNICIPIO DE FLORIAN SANTANDER**
NIT	804.006.290-3 GUALILO
REPRESENTANTE LEGAL	YINET RODRIGUEZ TORRES
DIRECCIÓN	**Municipio de Florián** Vda El Gualilo Fca San Andrecito
E-MAIL	reases1957@hotmail.com
MUNICIPIO IMPACTADO	FLORIAN
ESTADO	EJECUCIÓN
VALOR	$ 200.963.321,00 GUALILO
PLAZO INICIAL	57 DIAS GUALILO
FECHA DE INICIO	11/03/2023 GUALILO
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	11/08/2024 GUALILO
SUSPENSIÓN No 01	Desde el 21 de abril de 2024 hasta el 06 de junio de 2024
REANUDACIÓN No 1	27 de mayo de 2024

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

SUSPENSIÓN 02	Desde el 16 septiembre hasta el 15 de octubre de 2024
PRORROGA No 01 A AL SUSPENSIÓN No 2	Desde el 16 octubre hasta el 06 de noviembre de 2024
PRORROGA No 02 A LA SUSPENSIÓN No 2	Desde el 07 de noviembre al 20 de noviembre de 2024
PRORROGA No 03 A LA SUSPENSIÓN No 2	Desde el 21 de noviembre al 04 de diciembre de 2024
PRORROGA No 04 A LA SUSPENSIÓN No 2	Desde el 05 de diciembre al 18 de diciembre de 2024
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN (Actualizada)	N/A

NUMERO DE CONVENIO	4478 de 2023 LA UNION
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION MUNICIPIO DE GUAVATA SANTANDER**
NIT	800.026.045-6 LA UNION
REPRESENTANTE LEGAL	YAMID ARDILA MARIN
DIRECCIÓN	**Municipio de Guavatá** CR 3 4 30 BRR CENTRO
E-MAIL	ardila1959@gmail.com
MUNICIPIO IMPACTADO	GUAVATA
ESTADO	EJECUCIÓN
VALOR	$ 200.981.336,00 LA UNION
PLAZO INICIAL	45 DIAS LA UNION
FECHA DE INICIO	17/11/2023 LA UNION
FECHA DE	31/12/2023 LA UNION

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	
SUSPENSIÓN No 1	Desde el 27 de diciembre de 2023 hasta 27 de mayo de 2024
PRORROGA N°1	Hasta el 27 de septiembre de 2024
PRORROGA N°2	Hasta el 11 de noviembre de 2024
PRORROGA N°3	Hasta el 16 de diciembre de 2024
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN (Actualizada)	16/12/2024 LA UNION

NUMERO DE CONVENIO	4767 de 2023 POPOA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POPOA** **MUNICIPIO DE GUAVATA SANTANDER**
NIT	901.736.580-8 POPOA
REPRESENTANTE LEGAL	ADRIANA GERENA GONZALEZ
DIRECCIÓN	**Municipio de Guavatá** CR 3 4 30 BRR CENTRO Vda popoa mcp de Guavatá
E-MAIL	Adriana.gerena.rodriguez@gmail.com
MUNICIPIO IMPACTADO	GUAVATA
ESTADO	EJECUCIÓN
VALOR	$ 200.995.632,00 POPOA
PLAZO INICIAL	31 DIAS POPOA
FECHA DE INICIO	30/11/2023 POPOA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

FECHA DE TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	31/12/2023 POPOA
SUSPENSIÓN No 1	Desde el 27 de diciembre de 2023 hasta 27 de mayo de 2024
PRORROGA N°1	Hasta el 27 de septiembre de 2024
PRORROGA N°2	Hasta el 11 de noviembre de 2024
PRORROGA N°3	Hasta el 16 de diciembre
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN (Actualizada)	16/12/2024 POPOA

NUMERO DE CONVENIO	3753 de 2023 BERLIN
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BERLIN** **MUNICIPIO DE LA BELLEZA SANTANDER**
NIT	901.069.98-5 BERLIN
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS NORBEY CLAVIJO VELASCO
DIRECCIÓN	**Municipio La Belleza** Vda Berlin Fca Las Violetas
E-MAIL	jacberlinlabelleza@gmail.com
MUNICIPIO IMPACTADO	LA BELLEZA
ESTADO	EJECUCIÓN
VALOR	$ 200.108.139,00 LA BERLIN

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

PLAZO INICIAL	86 DIAS BERLIN
FECHA DE INICIO	10/05/2023 BERLIN
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	31/12/2023 BERLIN
SUSPENSIÓN No 1	Desde el 27 de diciembre de 2023 hasta 27 de mayo de 2024
PRORROGA N°1	Hasta el 27 de septiembre de 2024
PRORROGA N°2	Hasta el 11 de noviembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN (Actualizada)	11/11/2024

NUMERO DE CONVENIO	4175 de 2023 CACHIPAYAL
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL MUNICIPIO DE LA BELLEZA SANTANDER**
NIT	800.010.670-1 CACHIPAYAL
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO OVALLE PINEDA
DIRECCIÓN	**Municipio La Belleza** Vda Cachipayal
E-MAIL	ovallepinedajp@gmail.com
MUNICIPIO IMPACTADO	LA BELLEZA
ESTADO	EJECUCIÓN
VALOR	$ 200.319.574,00 CACHIPAYAL

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

PLAZO INICIAL	58 DIAS CACHIPAYAL
FECHA DE INICIO	11/03/2023 CACHIPAYAL
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	31/12/2023 CACHIPAYAL
SUSPENSIÓN No 1	Desde el 27 de diciembre de 2023 hasta 27 de mayo de 2024
PRORROGA N°1	Hasta el 27 de septiembre de 2024
PRORROGA N°2	Hasta el 11 de noviembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN (Actualizada)	11/11/2024

NUMERO DE CONVENIO	4490 de 2023 ORGANOS
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS MUNICIPIO DE SUCRE SANTANDER**
NIT	901.689.546-5 ORGANOS
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY JOHANA CARANTON CARANTON
DIRECCIÓN	**Municipio de sucre** Vereda Órganos Finca San Isidro
E-MAIL	cominito1001@hotmail.com
MUNICIPIO IMPACTADO	SUCRE
ESTADO	EJECUCIÓN
VALOR	$ 200.785.769,00 ORGANOS
PLAZO INICIAL	44 DIAS ORGANOS

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

FECHA DE INICIO	17/11/2023 ORGANOS
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	31/12/2023 ORGANOS
SUSPENSIÓN No 1	Desde el 27 de diciembre de 2023 hasta 27 de mayo de 2024
PRORROGA N°1	Hasta el 27 de septiembre de 2024
PRORROGA N°2	Hasta el 11 de noviembre de 2024
PRORROGA N°3	Hasta el 22 de noviembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN (Actualizada)	22/11/2024

NUMERO DE CONVENIO	4357 de 2023 GAITAL
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GAITAL MUNICIPIO DE LA VELEZ SANTANDER**
NIT	800.220.791-3 GAITAL
REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO GONZALEZ PINZON
DIRECCIÓN	**Municipio de Vélez** Vda Gaital
E-MAIL	jacgaital@gmail.com
MUNICIPIO IMPACTADO	VELEZ
ESTADO	EJECUCIÓN

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

VALOR	$ 201.016.649,00 GAITAL
PLAZO INICIAL	47 DIAS GAITAL
FECHA DE INICIO	15/11/2023 GAITAL
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	31/12/2023 GAITAL
SUSPENSIÓN No 1	Desde el 27 de diciembre de 2023 hasta 27 de mayo de 2024
PRORROGA N°1	Hasta el 27 de septiembre de 2024
PRORROGA N°2	Hasta el 11 de noviembre de 2024
PRORROGA N°3	Hasta el 16 de diciembre de 2024
PRORROGA N°4	Hasta el 23 de diciembre de 2024
PRORROGA N°5	Hasta el 31 de enero de 2025
FECHA TERMINACIÓN (Actualizada)	31/01/2025

NUMERO DE CONVENIO	4367 de 2023 PALMERA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALMERA MUNICIPIO DE LA VELEZ SANTANDER**
NIT	800.069.65-1 PALMERA
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS AUGUSTO ARIZA SANTAMARIA
DIRECCIÓN	**Municipio de Vélez** Vda La Palmera Fca El Porvenir
E-MAIL	juntaveredapalmera@gmail.com
MUNICIPIO IMPACTADO	VELEZ

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

ESTADO	EJECUCION
VALOR	$ 201.029.468,00 PALMERA
PLAZO INICIAL	40 DIAS PALMERA
FECHA DE INICIO	21/11/2023 PALMERA
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	31/12/2023 PALMERA
SUSPENSIÓN No 1	Desde el 27 de diciembre de 2023 hasta 27 de mayo de 2024
PRORROGA N°1	Hasta el 27 de septiembre de 2024
PRORROGA N°2	Hasta el 11 de noviembre de 2024
PRORROGA N°3	Hasta el 16 de diciembre de 2024
PRORROGA N°4	Hasta el 23 de diciembre de 2024
PRORROGA N°5	Hasta el 13 de enero de 2025
FECHA TERMINACIÓN (Actualizada)	13/01/2025

NUMERO DE CONVENIO	4424 de 2023 TEBAIDA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TEBAIDA** **MUNICIPIO DE LA VELEZ SANTANDER**
NIT	800.002.824-3 TEBAIDA
REPRESENTANTE LEGAL	NESTOR ILDEFONSO FONTECHA SANDOVAL
DIRECCIÓN	**Municipio de Vélez** Vda tebaida fca Buenavista chachafruto
E-MAIL	asesoriasaura@yahoo.es
MUNICIPIO IMPACTADO	VELEZ

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

ESTADO	EJECUCION
VALOR	$ 200.996.240,00 TEBAIDA
PLAZO INICIAL	46 DIAS TEBAIDA
FECHA DE INICIO	16/11/2023 TEBAIDA
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	31/12/2023 TEBAIDA
SUSPENSIÓN No 1	Desde el 27 de diciembre de 2023 hasta 27 de mayo de 2024
PRORROGA N°1	Hasta el 27 de septiembre de 2024
PRORROGA N°2	Hasta el 11 de noviembre de 2024
PRORROGA N°3	Hasta el 16 de diciembre de 2024
PRORROGA N°4	Hasta el 23 de diciembre de 2024
PRORROGA N°5	Hasta el 31 de enero de 2025
FECHA TERMINACIÓN (Actualizada)	31/01/2025

NUMERO DE CONVENIO	4565 de 2023 TUBAVITA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA MUNICIPIO DE LA VELEZ SANTANDER**
NIT	900.058.159-7 TUBAVITA
REPRESENTANTE LEGAL	GLADYS CHACON HERNANDEZ
DIRECCIÓN	**Municipio de Vélez** Vda tebaida fca Buenavista chachafruto
E-MAIL	juntaacvertubavita@gmail.com,
MUNICIPIO IMPACTADO	VELEZ

ESTADO	EJECUCION
VALOR	$ 201.030.449,00 TUBAVITA
PLAZO INICIAL	46 DIAS TUBAVITA
FECHA DE INICIO	16/11/2023 TUBAVITA
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	31/12/2023 TUBAVITA
SUSPENSIÓN No 1	Desde el 27 de diciembre de 2023 hasta 27 de mayo de 2024
PRORROGA N°1	Hasta el 27 de septiembre de 2024
PRORROGA N°2	Hasta el 11 de noviembre de 2024
PRORROGA N°3	Hasta el 16 de diciembre de 2024
PRORROGA N°4	Hasta el 23 de diciembre de 2024
PRORROGA N°5	Hasta el 13 de enero de 2025
FECHA TERMINACIÓN (Actualizada)	13/01/2025

TABLA 8 Información Convenios solidarios (11).
Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. – 2024

Descripción de las actividades ejecutadas en el mes y acciones a seguir por la interventoría:

Durante el mes de enero de 2025, se relacionan las actividades ejecutadas en cada convenio de las veredas correspondientes a los municipios de Bolívar, Florián, Guavatá, la Belleza, Sucre y Vélez, a continuación, se detalla el desarrollo y las acciones realizadas:

1.1.1 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS:

Durante el periodo correspondiente, por parte la OAC del convenio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

ACTIVIDADES DE AVANCE DEL CONVENIO

*27/12/2024 Se realizó la reunión de Socialización de cierre del Proyecto propuesta por la JAC, con participación de la Interventoría del Convenio y la comunidad local.

*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra

* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.

*27/12/2024 Se realizó la actividad Social propuesta por la JAC, con participación de la Interventoría del Convenio y la comunidad local.

*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra

* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA ORGANOS

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025



Placas huella terminadas



Placas huella terminadas



Placas huella terminadas



Canal discipador terminado



Placa conmemorativa



Reunión socialización de cierre de Proyecto

1.1.2 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUALILO:

ACTIVIDADES DE AVANCE DEL CONVENIO

- 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores.

- 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas.

- 01/10/2024 se contactó por celular y wasap a los ingenieros Pedro José Barón e Ingeniero Reynaldo Mantilla, se coordinó que el Ing. Reynaldo realizar el levantamiento técnico, Se le enviaron los documentos que solicitó (acta visita, reg. foto y kmz). Por otra parte, al Ing. Residente de obra se le solicitó hablar con la alcaldía para el permiso de intervención.

- 11/10/2024 SE REALIZÓ VISITA POR PARTE DE EQUIPO TÉCNICO DEL PROGRAMA Y LA INTERVENTORÍA PARA CARACTERIZACIÓN DEL NUEVO TRAMO PROPUESTO.

- 21/10/2024 JAC Presentó presupuesto de obra ajustado según precios de la región. A la fecha la Secretaría de planeación de Florián no ha emitido el permiso de intervención.

- 25/10/2024 Secretaría de planeación de Florián emitió el permiso de intervención.

ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

- 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores.

- 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas.

- 01/10/2024 se contactó por celular y wasap a los ingenieros Pedro José Barón e Ingeniero Reynaldo mantilla, se coordinó que el Ing. Reynaldo realizar el levantamiento técnico, Se le enviaron los documentos que solicitó (acta visita, reg. foto y kmz). Por otra parte, al Ing. Residente de obra se le solicitó hablar con la alcaldía para el permiso de intervención.

- 03/10/2024 Interventoría realizó reunión virtual con INVIAS, se expuso el estado general de los convenios.

- 11/10/2024 SE REALIZÓ VISITA POR PARTE DE EQUIPO TÉCNICO DEL PROGRAMA Y LA INTERVENTORÍA PARA CARACTERIZACIÓN DEL NUEVO TRAMO PROPUESTO.


- 21/10/2024 Interventoría realizó revisión del presupuesto presentado por la JAC.

- 31/10/2024 Interventoría envió oficio TIC-INVIAS-1631-205 - Respuesta Radicado 2024S-VSAN-066955 (RESPUESTA RADICADO 2024E-VUVRAZ-088127) Con la información solicitada para trámite de cambio de tramo.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO

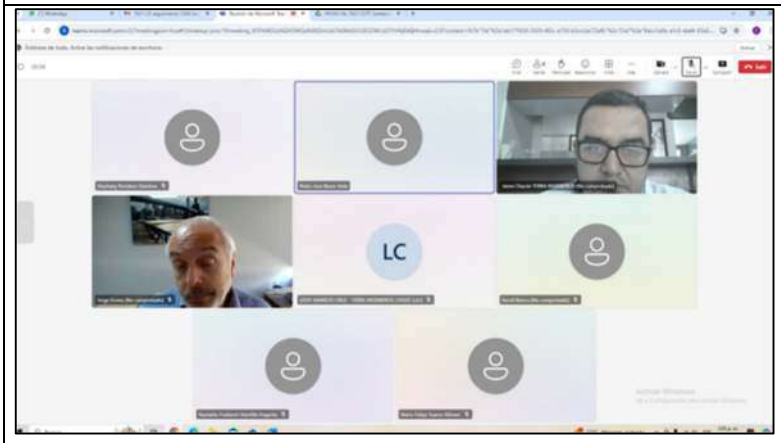	21/09/2024 Visita a la nueva localización del tramo a construir
	21/09/2024 Reunión con la JAC e Interventoría
	03/10/2024 Reunión INTERENTORÍA E INVIAS se expuso el estado general de avance de los convenios.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

	11/10/2024 Visita de Campo Equipo Técnico INVIAS, e Interventoría. Residente de Obra y PJAC
	11/10/2024 Extracto del anexo técnico donde se describe la ubicación del tramo
	11/10/2024 Visita de Campo Equipo Técnico INVIAS, e Interventoría. Al nuevo sector a intervenir

	11/10/2024 Visita de Campo Equipo Técnico INVIAS, e Interventoría. Al nuevo sector a intervenir

1.1.3 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BERLIN:

Durante el periodo correspondiente, por parte la OAC del convenio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

ACTIVIDADES DE AVANCE DEL CONVENIO

* 28/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

* 28/01/2025 se realiza devolución de los Rendimientos financieros al Tesoro Nacional y se encuentra en Trámite el cierre de la cuenta del Convenio.

ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.

* 23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra

* 28/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 Placas huella terminadas	 Placas huella terminadas
 Placas huella terminadas	 Placas huella terminadas
 Placas huella terminadas	 Placas huella terminadas

 Inauguración del Tramo de Placas huella	 Reunión de Socialización de Cierre de Proyecto
 Plan de Inversión Social (Olla Comunitaria)	 Plan de Inversión Social (Olla Comunitaria)

1.1.4 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL:

Durante el periodo correspondiente, por parte la OAC del convenio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

ACTIVIDADES DE AVANCE DEL CONVENIO

* 28/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.

* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

* 23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr>
<td>

Reunión de Socialización de cierre de Proyecto</td>
<td>

Reunión de Socialización de cierre de Proyecto</td>
</tr>
<tr>
<td>

Plan de inversión social (Olla Comunitaria)</td>
<td>

Comité operativo para autorización de cheques para pago de Proveedores</td>
</tr>
</table>

 Placas huella terminadas	 Placas huella terminadas

1.1.5 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA:

Durante el periodo correspondiente, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

ACTIVIDADES DE AVANCE DEL CONVENIO

* 01/01/2025 La JAC culminó el 100% de ejecución de las obras programadas durante el mes de diciembre de 2024.

* 02/01/2025 Se encuentra en realización el cierre Ambiental y Social del convenio.

* 13/01/2024 Interventoría realizo visita de obra, se realizaron observaciones al contratista para recibo definitivo de las obras.

* 16/01/2025 Se encuentra en gestión la ejecución del Rubro PAGA, y la actividad social de terminación de terminación de obras con la comunidad.

ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

* 10/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.

* 13/01/2025 Interventoría GESTIONÓ mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-275 - Solicitud de cambio de propuesta social Vereda Tubavita del municipio de Vélez al INVIAS.

* 13/01/2025 Interventoría realizó visita técnica a la obra, solicitó a la JAC realizar el relleno detrás de bordillo en sectores específicos. Esto con el fin de garantizar la vida útil de la placahuella.

* 15/01/2025 Interventoría realizó reunión virtual para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.

* 16/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.

* 23/01/2025 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-280 - REITERACIÓN DE LA SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA.

* 28/01/2025 Interventoría JAC y Veeduría Realizó comité de pagos a proveedores del convenio.

* 29/01/2025 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-290 - Inicio de procedimiento de aplicación de multas por incumplimiento (Área Ambiental)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	10/01/2025 Convocatoria para pagos de los convenios en Puente Nacional

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

	13/01/2025 Tramo No3 100% Terminado
	13/01/2025 Tramo No.2 100% Terminado

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

	13/01/2025 Tramo No.1 100% Terminado
	13/01/2025 Reunión con la comunidad JAC Vereda Tubavita

	25/01/2025 Actividad cierre Social e inauguración de placa-huellas vereda Tubavita

1.1.6 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA:

Durante el periodo correspondiente, por parte la OAC del convenio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

ACTIVIDADES DE AVANCE DEL CONVENIO

* 30/12/2024 Se alcanza ejecución del 100% de la obra placa huella en concreto 3000 psi. Placa huella L=121m

* 02/01/2025 Se encuentra en realización el cierre Ambiental y Social del convenio.

* 13/01/2024 Interventoría realizo visita de obra, se realizaron observaciones al contratista para recibo definitivo de las obras.

* 16/01/2025 Se encuentra en gestión la ejecución del Rubro PAGA, y la actividad social de terminación de terminación de obras con la comunidad.

* 21/01/2025 JAC envió el comunicado Invitación a la inauguración de la placa huella Vereda La Palmera municipio de Vélez.

ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

* 10/01/2025 Interventoría, JAC y Veeduría realizaron comité operativo de pago a proveedores.

* 15/01/2025 Interventoría realizó reunión virtual para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.

* 16/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para autorización de pagos del convenio.

* 23/01/2025 Interventoría emitió el comunicado TIC-INVIAS-1631-280 - REITERACIÓN DE LA SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA.

* 25/01/2025 Interventoría realizó acompañamiento a la actividad social de inauguración de las obras en la vereda La Palmera.

* 28/01/2025 Interventoría, JAC y Veeduría realizaron comité operativo de pagos.

* 29/01/2025 Interventoría emitió el comunicado referente al área ambiental TIC-INVIAS-1631-287 - Inicio de procedimiento de aplicación de multas por incumplimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

		13/01/2025 Pagos a los convenios en Puente Nacional - Santander
		13/01/2025 Obra Terminada

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

		13/01/2025 Obra Terminada
		13/01/2025 Obra Terminada

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

		13/01/2025 Obra Terminada
		13/01/2025 Obra Terminada

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9 01/01/2025 a 31/01/2025

		13/01/2025 Obra Terminada
		13/01/2025 Obra Terminada

		25/01/2025 Actividad cierre social e inauguración Obra JAC La Palmera
		28/01/2025 Pagos a los convenios en Puente Nacional Santander

1.1.7 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL:

Durante el periodo correspondiente, por parte la OAC del convenio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

TRASIEGO DE MATERIALES

El trasiego de materiales, especialmente los materiales pétreos, para la vereda Gaital, Debe realizarse en dos (2) etapas:

1 etapa: Desde la cantera autorizada ambientalmente CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA S.A.S. Localizada en el municipio de Moniquirá (Boyacá) se traen las volquetas cargadas completamente realizando un recorrido de 52,1 Km envía pavimentada, allí se realiza un acopio provisional en el sector del Colegio Gaital.

2 etapa: Se realiza recorrido en camino veredal destapado, hasta la obra, longitud aproximada 1.3Km, sin embargo, la pendiente inicial es bastante alta, la vía estrecha con abismo por el costado derecho. En época de invierno se vuelve imposible el tráfico de vehículos pesados en este sector. Debido a las condiciones del terreno, las volquetas solamente se pueden llenar a media altura.

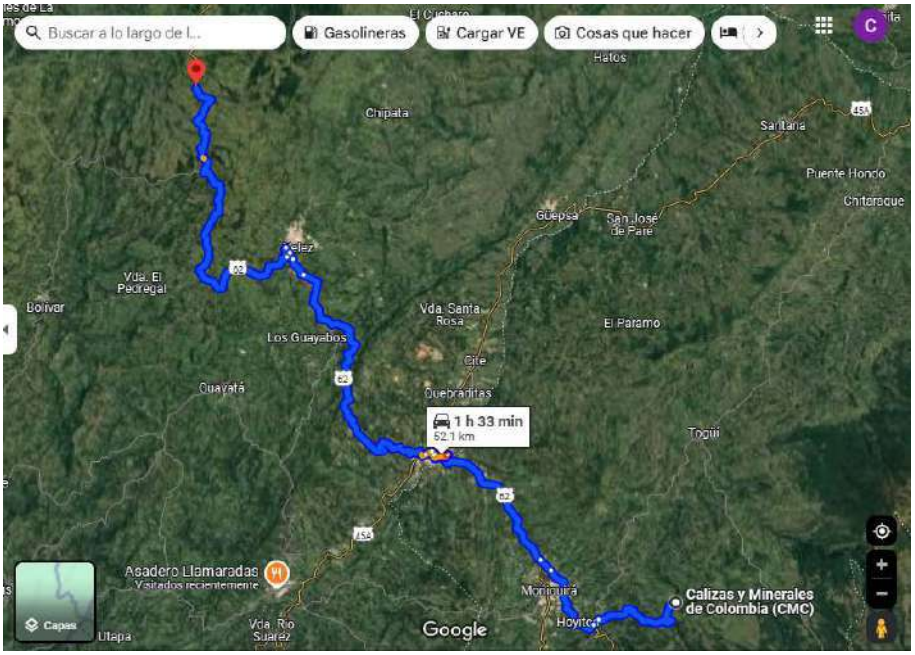


Imagen. Recorrido Etapa 1 en carretera pavimentada 52,1 Km (Trasiego Materiales).

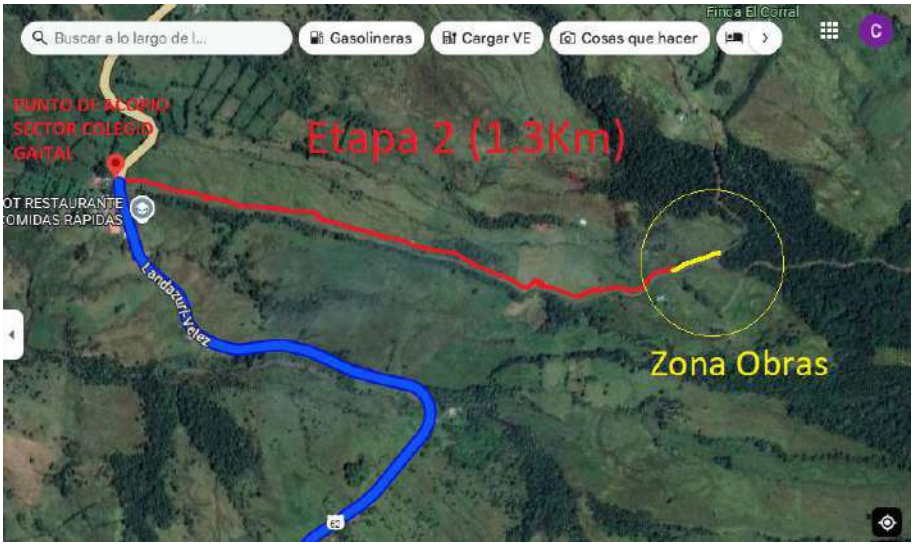


Imagen. Etapa 2 Camino destapado (1.3Km) desde el punto de acopio (Colegio Gaital) hasta la obra (Vereda Gaital).



Fotografía. Volqueta Descargando material en el punto de acopio sector colegio Gaital.



Fotografía. Punto de Acopio (Sector Colegio Gaital)



Imagen. Punto Inicio Etapa 2 (Trasiego de Materiales Vereda Gaital)



Fotografía. Volqueta accediendo a la Etapa 2 del recorrido, la máquina retroexcavadora va detrás ayudando a la Volqueta.



Fotografía. Volqueta con dificultad para transitar por la vía de acceso. (Etapa 2)



Fotografía. Maquinaria ayudando a subir a la volqueta (Etapa 2)



Fotografía. Maquinaria ayudando a desenterrar la volqueta cargada (Etapa 2)

ACTIVIDADES DE AVANCE DEL CONVENIO

* 02/01/2025 No se realizaron actividades en obra durante la última semana.

* 09/01/2025 No se realizaron actividades en obra durante la última semana.

* 13/01/2025 Se retoman actividades en obra, se realiza arreglo vía de acceso manualmente, se reciben materiales en obra, se hace encofrado para planchuelas.

* 20/01/2025 Se realiza fundida de concreta piedra pegada.

* 23/01/2025 Se avanza en la construcción de huellas en concreto reforzado 3000 psi, también se realiza piedra pegada en concreto ciclópeo.

* 28/01/2025 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.

*29/01/2025 Avanza ejecución de obras, formaleta para placa-huella.

ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

* 03/01/2025 Interventoría RADICÓ comunicado TIC-INVIAS-1631-269 - Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – Convenios No. 4367 de 2023 – OAC VEREDA GAITAL.

* 09/01/2025 Interventoría verifica la no actividad en obra durante la última semana.

* 10/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.

* 14/01/2025 Interventoría realiza toma de densidades de campo en la Sub-base granular aplicada.

* 15/01/2025 Interventoría realizó reunión virtual para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.

* 16/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.

* 21/01/2025 Interventoría emitió el comunicado TIC-INVIAS-1631-278 Cumplimento con los elementos de protección personal (EPP), a la JAC Gaital.

* 24/01/2025 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-281 - REITERACIÓN DE LA SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA.

* 28/01/2025 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	20/12/2024 Extendido y compactado de subbase granular
	13/01/2025 Construcción formaleta para placa-huella

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

		14/01/2025 Toma densidades de campo en subbase por parte interventoría
		16/01/2025 Materiales puestos en obra
		20/01/2025 Instalación formaleta para piedra pegada

		21/01/2025 Avance fundida de piedra pegada
		23/01/2025 Avance ejecución de obra, concreto ciclópea piedra pegada
		24/01/2025 Avance de obra instalación acero de refuerzo

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

		27/01/2025 Avance de obra
		28/01/2025 Pagos a los convenios en Puente Nacional Santander
		29/01/2025 Avance de obra

1.1.8 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TEBAIDA:

Durante el periodo correspondiente, por parte la OAC del convenio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

TRASIEGO DE MATERIALES

El trasiego de materiales, especialmente los materiales pétreos, para la vereda Gaital, Debe realizarse en dos (2) etapas:

1 etapa: Desde la cantera autorizada ambientalmente CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA S.A.S. Localizada en el municipio de Moniquirá (Boyacá) se traen las volquetas cargadas completamente realizando un recorrido de 50,1 Km envía pavimentada, allí se realiza un acopio provisional en el sector La Florida.

2 etapa: Se realiza recorrido en camino veredal destapado, hasta la obra, longitud aproximada 2.5 Km, sin embargo, en época de invierno se vuelve imposible el tráfico de vehículos pesados en este sector. Las volquetas no pueden transitar por algunos sectores los cuales presentan pendiente alta y estrechez en la vía, además de esto los vehículos pesados deterioran significativamente los terrenos saturados, haciendo difícil el tráfico inclusive al transporte liviano. Para este tramo del recorrido se determinó mediante visita de interventoría y supervisión realizada el día 25 de noviembre de 2024, de realizar el trasiego en camioneta.

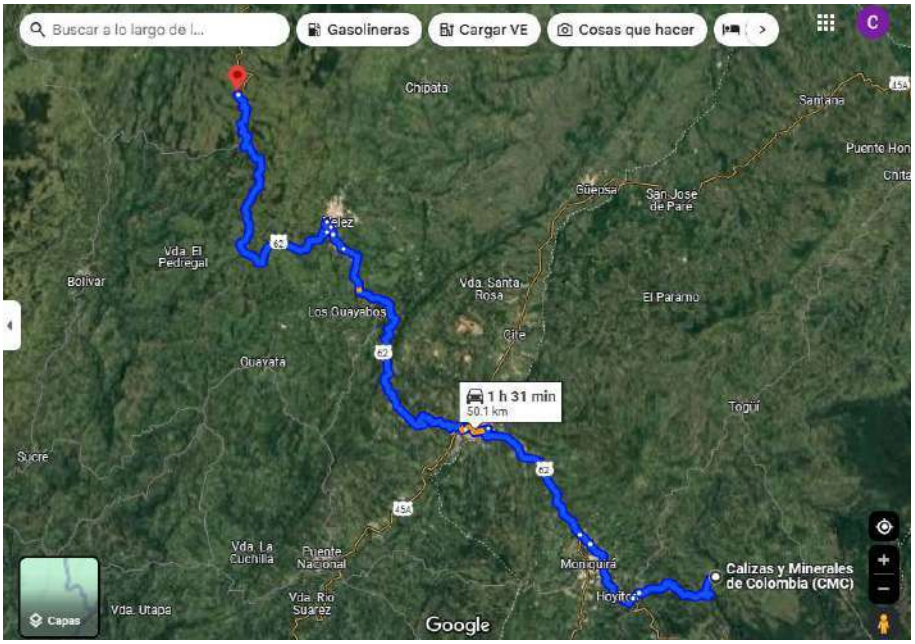


Imagen. Trasiego de materiales etapa 1 desde cantera CALIZAS Y MINERALES (Moniquirá) hasta el sector La Florida, localizado en la vía Vélez-Landázuri (Log Total 50,1 Km)

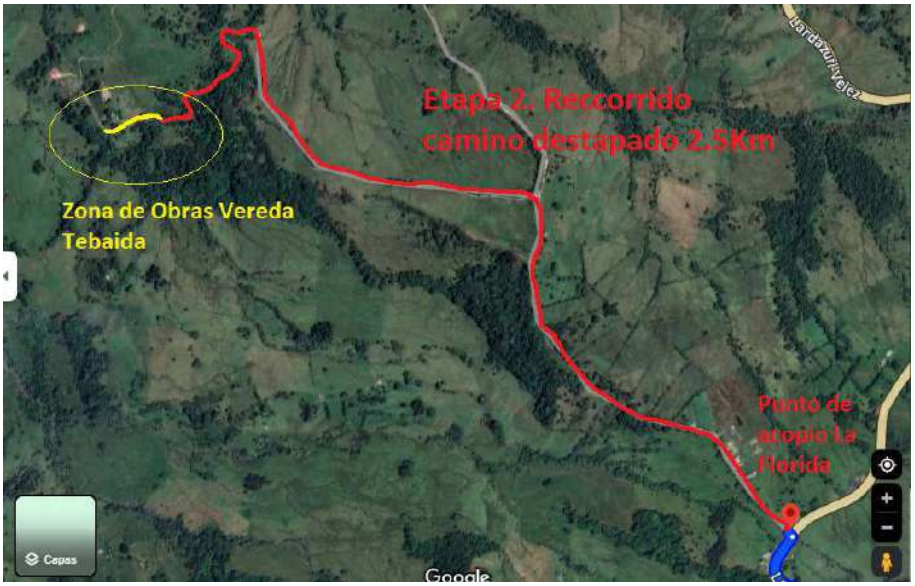


Imagen. Trasiego de Materiales etapa 2 desde el punto de acopio La Florida hasta el sitio de obras en la vereda Tebaida. (Long Total 2.5 Km)



Fotografía. 25 nov 2024 visita Interventoría y Supervisión al convenio 4424 Vereda Tebaida.



Fotografía. Pinto de acopio de Materiales Sector La Florida



Imagen. Punto de Acopio La Florida (**6.058434, -73.711694)**



Fotografía. Puntos críticos en la vía (Etapa 2)



Fotografía. Arreglo de puntos críticos en la vía de acceso.



Fotografía. Maquinaria Ayudando a desenterrar la volqueta.



Fotografía. Puntos Críticos de a vía de acceso.



Fotografía. Cargue de materiales pétreos en camioneta



Fotografía. Descargue de materiales de la camioneta de forma manual.



Fotografía. Descargue de materiales de la camioneta de forma manual.

ACTIVIDADES DE AVANCE DEL CONVENIO

* 02/01/2025 No se evidencia realización de actividades en obra.

* 07/01/2025 Se retoman actividades en obra, avanza construcción de placa huellas en concreto reforzado 3000 psi.

* 07/01/2025 Se realiza trasiego de materiales en camioneta, desde el sector La Florida hasta la obra.

* 16/01/2025 Continúa construcción de placa huellas instalación de acero de refuerzo para riostras.

* 23/01/2025 Avanza construcción de placa-huellas Sector PR00+60 al PR 00+100.

* 29/01/2025 Avanza construcción de placa-huellas Sector PR00+80 al PR 00+100.

*29/01/2025 Avance estimado en ejecución de obra física 80%.

ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

* 02/01/2025 Interventoría realiza permanente seguimiento a la ejecución de las obras, mediante inspección visual de las mismas.

* 10/01/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.

* 14/01/2025 Interventoría realiza visita técnica inspección de obra.

* 15/01/2025 Interventoría realizó reunión virtual para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.

* 16/01/2025 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.

* 28/01/2025 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.

* 29/01/2025 Interventoría emitió a INVIAS el comunicado TIC-INVIAS-1631-283 - Entrega propuesta Social 4424-2023 OAC Vereda Tebaida del municipio de Vélez.

* 29/01/2025 Interventoría emitió a la JAC el comunicado TIC-INVIAS-1631-282 - Incumplimiento del Contratista en la entrega de la documentación de la Gestión Ambiental Inicial OAC Vereda Tebaida.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO

		07/01/2025 Formaleta para construcción de huellas en concreto
		07/01/2025 Formaleta para construcción de huellas en concreto
		07/01/2025 Formaleta para construcción de huellas en concreto

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

		14/01/2025 Replanteo en subbase granular para construcción de riostras
		15/01/2025 Replanteo en subbase granular para construcción de riostras
		16/01/2025 Instalación acero de refuerzo para riostras

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

		23/01/2025 Avance construcción de placa-huellas sector PR0+60 al PR00+100
		23/01/2025 Avance construcción de placa-huellas sector PR0+60 al PR00+100
		23/01/2025 Avance construcción de placa-huellas sector PR0+60 al PR00+100

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

		24/01/2025 Fundida de Riostras
		27/01/2025 Fundida de bordillos
		28/01/2025 Avance de obra Sector K0+080 al K0+100

1.1.9 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POPOA:

Durante el periodo correspondiente, por parte la OAC del convenio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

ACTIVIDADES AVANCE DE CONVENIO

* 10/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

* 28/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.

* 03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-271 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotecnia de los estudios y diseños presentados por la misma

* 10/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra.

* 28/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Comité operativo autorización de Cheques para pago de Proveedores (16-01-2025)



Comité operativo autorización de Cheques para pago de Proveedores (28-01-2025)



Socialización de cierre de Proyecto



Socialización de cierre de Proyecto

 Placas huella terminadas	 Placas huella terminadas
 Placas huella terminadas	 Placas huella terminadas

1.1.10 <u>JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION:</u>

Durante el periodo correspondiente, por parte la OAC del convenio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

ACTIVIDADES DE AVANCE DE CONVENIO

* 10/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

* 28/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.

* 03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-271 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma

* 10/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra.

* 28/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

<table>
<tr>
<td>

Comité operativo autorización de Cheques para pago de Proveedores (16-01-2025)</td>
<td>
Comité operativo autorización de Cheques para pago de Proveedores (28-01-2025)</td>
</tr>
<tr>
<td>

Socialización de Cierre de Poyecto</td>
<td>

Plan de Inversión Social (Olla Comunitaria)</td>
</tr>
<tr>
<td>

Placas huella terminadas</td>
<td>

Placas huella terminadas</td>
</tr>
</table>

 Placas huella terminadas	 Placas huella terminadas
 Rampa de Acceso a Placas huella	 Placas huella terminadas

1.1.11 <u>JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL:</u>

Durante el periodo correspondiente, por parte la OAC del convenio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

ACTIVIDADES DE AVANCE DE OBRA

16/12/2024 Las obras se encuentran ejecutadas en un 100%.

02/01/2025 Se encuentra en realización el cierre Ambiental y Social del convenio.

16/01/2024 en este momento se encuentra en gestión la ejecución del RUBRO PAGA.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

* 10/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.

* 15/01/2025 Interventoría realizó reunión para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.

* 16/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.

* 24/01/2025 Interventoría emitió el comunicado TIC-INVIAS-1631-281 - REITERACIÓN DE LA SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA

* 29/01/2025 Interventoría emitió el comunicado TIC-INVIAS-1631-286 - Inicio de procedimiento de aplicación de multas por incumplimiento. (Área Ambiental).

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	12/12/2024 Placa-huella Terminada

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

		12/12/2024 Placa-huella Terminada
		12/12/2024 Placa-huella Terminada

	12/12/2024 Placa-huella Terminada

Seguimientos ítems no previstos:

N/A

Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría:

Estado de avance:

- En el presente período, se realizaron comités de autorización de pagos a proveedores del convenio, de tipo administrativo y de costos directos de obra.

- Se realizó seguimiento y control, soportado de conceptos técnicos y aprobaciones por parte de los especialistas de Interventoría sobre los resultados de los Estudios y Diseños presentados por parte de las Veredas de los Municipios de Santander: de Bolívar, Guavatá, La Belleza, Sucre y Vélez, descritas en el ***numeral: Descripción de las actividades ejecutadas en el mes y acciones a seguir por la interventoría.***

- Se desarrolla con competencia y en tiempos oportunos cada uno de los requerimientos solicitados por el Instituto Nacional de Vías – **INVIAS.**

- Durante el período estuvieron en ejecución de obras los siguientes convenios:

CONVENIO	OBJETO	JUNTA
4367	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA **EL GAITAL** DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL - VELEZ
4424	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA **TEBAIDA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA - VELEZ

La interventoría realiza el seguimiento a la ejecución de las propias de estos convenios, se cuenta en campo con inspector de obra, quien realiza permanente verificación del personal en obra, calidad de los materiales empleados, avance de ejecución de obra.

REPORTE DE EJECUCION MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO.

4.1. Informes semanales

Para garantizar el correcto desarrollo del proyecto, se efectúan los informes semanales detallados de cada una de las Juntas/Organizaciones de Acción Comunal correspondientes a las Veredas de los Municipios de Santander: Bolívar, Florián, Guavatá, La Belleza, Sucre y Vélez, para verificar a detalle el avance de las actividades ejecutadas en la semana y acumuladas.

Maquinaria y Equipos convenio solidario.

Según lo consignado en el Anexo Técnico, el cual es parte integral del convenio solidario, el Organismo de Acción Comunal dispondrá en el momento que se requiera para dar inicio oportuno a las obras, un equipo y herramienta para el desarrollo de todas las actividades, el cual se encuentra descrito en los Análisis de Precios Unitarios y conforme a los rendimientos establecidos por la entidad establece lo siguiente:

EQUIPO	DISPONIBLE	EN OBRA
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	1	1
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	1	1
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	1
Vibro-compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	1
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	1
Ruteadora	1	1
Compresor (barrido y soplado)	1	1
Camioneta D – 300	1	1
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Compresor 120 HP, con martillo	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Aspersor manual	1	1

TABLA 9 Relación de equipo disponible en obra para los convenios BERLÍN, CACHIPAYAL Y ÓRGANOS
Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. – 2024

Listado de Herramienta menor de Referencia:

No.	Herramienta
1	Pica
2	Pala
3	Carretilla
4	Motosierra
5	Guadañadora
6	Herramienta de poda
7	Boquillera metálica
8	Texturizador de concreto
9	Palustre

10	Mazo 2 lb
11	Puntero
12	Martillo
13	Cizalla manual
14	Azadón
15	Barra agrícola 12 lb

Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. – 2024

Personal, control aportes legales y seguridad social convenio solidario.

1.2.1 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS:

A la fecha de corte del presente Informe no hubo personal laborando con la OAC en vista de que las obras culminaron el pasado 22 de noviembre de 2024.

1.2.2 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA GUALILO:

A la fecha de corte del presente Informe no hubo personal laborando con la OAC en vista de que las obras proyectadas para este Convenio no fueron llevadas a cabo, en vista de que no fue viabilizada su ejecución.

1.2.3 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA BERLIN:

A la fecha de corte del presente Informe no hubo personal laborando con la OAC en vista de que las obras culminaron el pasado 31 de octubre de 2024.

1.2.4 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA CHACHIPAYAL:

A la fecha de corte del presente Informe no hubo personal laborando con la OAC en vista de que las obras culminaron el pasado 31 de octubre de 2024.

1.2.5 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA:

A la fecha de corte del presente Informe no hubo personal laborando con la OAC en vista de que las obras culminaron el pasado 31 de diciembre de 2024.

1.2.6 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA:

A la fecha de corte del presente Informe no hubo personal laborando con la OAC en vista de que las obras culminaron el pasado 31 de diciembre de 2024.

1.2.7 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL:

Personal que a la fecha ha laborado con la OAC:

Ingeniera Residente de Obra	Laura Alejandra Pinzón Silva
Contador	Juan Harvey Ramírez Camacho
Maestro De Obra	Juan Ángel Gamboa Herreño (CC. 1.101.755.923)
Ayudante	Rodrigo Pinzón Fontecha (cc13.957.042)
Ayudante	José Alejandro González Sedano (CC. 1101752579)
Ayudante	Misael Díaz Quiroga Díaz (CC. 13954281)
Ayudante	John Jairo Rodríguez Rodríguez (CC. 91.136.267)

1.2.8 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA TEBAIDA:

Personal que a la fecha ha laborado con la OAC:

Ingeniero Residente de Obra	Miguel Ángel Másmela Zapata
Contador	Yaneth González Fontecha
Maestro De Obra	Osma Pinzón Juan Bautista

	(maestro) cc.1101755772
Ayudante	Torres Figueroa Abelardo CC. 5689273
Ayudante	Díaz Mateus Luis Antonio CC. 1101755409
Ayudante	Serrano Serrano José de la Cruz CC. 91011682
Ayudante	Ingrid Tatiana Díaz Fontecha CC. 1101754164

1.2.9 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA POPOA:

A la fecha de corte del presente Informe no hubo personal laborando con la OAC en vista de que las obras culminaron el pasado 13 de diciembre de 2024.

1.2.10 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION:

A la fecha de corte del presente Informe no hubo personal laborando con la OAC en vista de que las obras culminaron el pasado 08 de diciembre de 2024.

1.2.11 JUNTA Y/O ORGANISMO DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL:

A la fecha de corte del presente Informe no hubo personal laborando con la OAC en vista de que las obras culminaron el pasado 16 de diciembre de 2024.

La interventoría ha sugerido y reiterado la presentación de hojas de vida del personal contractual pendiente, para su revisión previa al inicio de actividades, cumpliendo con los requerimientos y acreditaciones contractuales del convenio.

Informe financiero y presupuestal convenios solidarios.

Se anexa informe financiero y presupuestal de Cada uno de los convenios en ejecución.

Estado general del tiempo (enero 2024).

Tabla 1. Clasificación de la precipitación según la intensidad

Clase	Intensidad media en una hora (mm/h)
Moderadas	> 2 y ≤ 15
Fuertes	>15 y ≤ 30
Muy fuertes	>30 y ≤ 60
Torrenciales	>60

Tabla. Clasificación de las lluvias según su intensidad

CLASE DE TIEMPO	DÍAS	PORCENTAJE
Seco	25	80%
Lluvias moderadas	6	20%
Lluvias fuertes	0	0,0%
Lluvias muy fuertes	0	0,0%
Lluvias torrenciales	0	0,0%
TOTAL DÍAS	**31**	**100,0%**

Tabla 1 Días de precipitaciones del mes

Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES – 2024

Resumen de ensayos de laboratorio.

Se anexan ensayos de laboratorio de los convenios que se encuentran en ejecución de obras. GAITAL Y TEBAIDA.

Seguimiento garantías y seguros convenio solidario.

Se solicita a cada uno de las JUNTAS Y/O ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL la actualización de las Pólizas, acorde al cambio de fechas y finalización actual de los contratos.

POLIZAS – COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A – ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN CONVENIO 3951 GUAMAL			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-100042548	17/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-100042548	17/10/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-100042548	31/12/2023	31/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	B-100011086	17/10/2023	31/12/2023

POLIZAS – LA PREVISORA S.A. - ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN CONVENIO 4478 LA UNIÓN			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-3001992	16/11/2023	30/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-3001992	16/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-3001992	31/12/2023	31/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	1014743	16/11/2023	31/12/2023

POLIZAS – MUNDIAL DE SEGUROS S.A - ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN CONVENIO 4267 GUALILO			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-100316381	29/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-100316381	29/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-100316381	31/12/2023	31/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	NB-100079082	29/11/2023	31/12/2023

POLIZAS – LA PREVISORA S.A. - ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN CONVENIO 4767 POPOA			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA

Cumplimiento	NB-3002003	31/10/2024	16/10/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-3002003	31/12/2026	16/12/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-3002003	16/12/2024	16/12/2029
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	1014764	20/12/2023	16/12/2024

POLIZAS – LA PREVISORA S.A. - ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN CONVENIO 3753 BERLÍN			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-3001976	27/07/2025	11/09/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-3001976	27/09/2026	11/11/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-3001976	11/11/2024	11/11/2029
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	1014717	12/12/2023	11/11/2024

POLIZAS – LA PREVISORA S.A. - ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN CONVENIO 4175 CACHIPAYAL			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-3001983	03/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-3001983	03/12/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-3001983	31/12/2023	31/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	1014731	3/11/2023	31/12/2023

POLIZAS – LA PREVISORA S.A. - ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN CONVENIO 4490 ORGANOS			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-3001994	31/10/2024	22/09/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-3001994	31/12/2026	22/11/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-3001994	22/11/2024	22/11/2029
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	1014746	31/12/2023	22/11/2024

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

POLIZAS – LA PREVISORA S.A. - ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN CONVENIO 4357 TUBAVITA			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-3001997	31/10/2024	16/10/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-3001997	31/12/2026	16/12/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-3001997	16/12/2024	16/12/2029
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	1014749	20/12/2023	16/12/2024

POLIZAS – LA PREVISORA S.A. - ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN CONVENIO 4367 GAITAL			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-3001991	14/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-3001991	14/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-3001991	31/12/2023	31/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	1014744	14/11/2023	31/12/2023

POLIZAS – LA PREVISORA S.A. - ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN CONVENIO 4424 TEBAIDA			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-3001993	31/10/2024	16/10/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-3001993	31/12/2026	16/12/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-3001993	16/12/2024	16/12/2029
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	1014745	31/12/2023	16/12/2024

POLIZAS – MUNDIAL DE SEGUROS S.A - ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 4565 LA PALMERA			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-100043087	08/11/2024	23/10/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-100043087	08/11/2024	23/12/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-100043087	23/12/2024	23/12/2029

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100011257	21/11/2023	23/12/2024

TABLA 10 Relación de Pólizas del contrato de obra - convenio No. 1631 de 2024
Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES – 2024

Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

El seguimiento de Calidad se centra en los ensayos de laboratorio básicos para las obras a realizar, como lo son, Densidades de campo en la Subbase Granular y Ensayos a los concretos.

Otros documentos seguimiento mensual.

1.2.12 Seguimiento a la inversión del anticipo de obra.

Para los presentes convenios solidarios no se realizó anticipo de obra.

1.2.13 Seguimiento al programa de obra.

Se hace seguimiento a la programación de obra de los convenios que se encuentran en ejecución de actividades de obra GAITAL Y TEBAIDA.

1.2.14 Seguimiento al programa de inversiones.

Se anexa el programa de inversiones ejecutadas durante el período.

1.2.15 Actas suscritas

Se anexa documentación correspondiente al presente periodo.

1.2.16 Actas de reunión

Se anexa documentación correspondiente al presente periodo.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Información general del contrato de interventoría:

NUMERO DE CONTRATO	1631 DE 2024
PROCESO	CMA-DEO-SVR-CCPT-010-2024,
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.
CONTRATISTA	**TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.**
NIT	860.038.275-3
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HERNANDO FORERO FORERO
DIRECCIÓN	Av. Carrera 15 # 100-69 Oficina 306
TELEFONO	312 2958359
E-MAIL	Gerencia@terraingenierosciviles.com
ID SECOP	CO1.NTC.5196283
MUNICIPIOS IMPACTADOS	BOLIVAR, VÉLEZ, SUCRE, GUAVATÁ Y LA BELEZA
SUPERVISOR	HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
ESTADO	EJECUCIÓN
VALOR INICIAL	**$ 394.093.490. M/CTE INCLUIDO IVA** (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS)
ADICIÓN N°1	$ 81.075.700,00. M/CTE INCLUIDO IVA
ADICIÓN N°2	$ 60.238.990,00. M/CTE INCLUIDO IVA
VALOR TOTAL ACUMULADO	**$ 535.408.180,00. M/CTE INCLUIDO IVA**
PLAZO INICIAL	CUATRO MESES
FECHA DE INICIO	27/05/2024
FECHA DE TERMINACION (I)	27/09/2024
PRÓRROGA N°1	11/11/2024
PRORROGA N°2	16/12/2024
PRORROGA N°3	23/12/2024
PRORROGA N°4	31/01/2025
FECHA TERMINACIÓN (Act)	**31/01/2025**

TABLA 11 Información contrato de interventoría.

Descripción de las actividades realizadas por el interventor:

La interventoría en cumplimiento de las funciones emanadas del contrato N°1631 de 2024 suscrito con el INVIAS, ha realizado actividades concernientes a sus obligaciones, estas enmarcadas en velar el buen desarrollo de la obra y el cumplimiento del objeto contractual a cabalidad, a continuación, describimos las actividades realizadas que conllevan.

Generales

- Apoyar la realización de todos los objetivos contractuales.
- Vigilar y controlar que se cumplan los términos y condiciones del contrato, como lo son: tiempo, calidad, cantidades y el correcto uso de los recursos.
- Sostener una comunicación fluida y coordinada entre todas las partes involucradas en la realización del proyecto.
- Organizar reuniones, conformar comités de trabajo, pedir los informes de los procesos y verificar que todo se lleve de manera adecuada.
- Brindar prontas soluciones en caso de que se presenten problemas de ejecución de las tareas.
- Monitorear y controlar los riesgos que sean identificados.
- Estar pendiente de recibir o rechazar los insumos o materiales necesarios para llevar a cabo la obra o el proyecto. También es necesario identificar cuando los recursos no se ajustan a lo requerido.
- Reportar inconsistencias en el cumplimiento del contrato.

Administrativos

- Administrar y mantener un archivo con todos los expedientes del contrato.
- Entregar de forma oportuna los informes que certifiquen el cumplimiento y el control de las operaciones ante el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

Financieras

- Llevar un registro de los pagos o cambios que se realicen al contrato. Además de llevar un control sobre el presupuesto.
- Documentar todos los pagos realizados al contratista, revisando previamente toda la documentación requerida.

- Controlar que en caso de que las actividades adicionales aumenten el valor y se salgan del presupuesto o de lo estipulado en el contrato cuente con una justificación y autorización, y realizar el correspondiente balance y ajuste.

Legales

- Una de las funciones de la interventoría es vigilar que todas las garantías del contrato se mantengan vigentes hasta que se finalice el contrato.
- Mantener informadas a las partes involucradas sobre las posibilidades de realizar modificaciones al contrato y verificar si son viables o no.
- Vigilar y llevar un control sobre el cumplimiento del contratista con sus aportes a la seguridad social: EPS, ARL, pensiones y cajas de compensación.
- Es fundamental vigilar que todas las solicitudes y peticiones que hagan las autoridades o los particulares en relación al desarrollo del contrato se tramiten de manera oportuna

Informes de especialistas y profesionales:

5.3. Informes técnicos acorde a los Estudios y Diseños (E y D).

Se enviaron las aprobaciones de las diferentes áreas técnicas, de los diferentes convenios.

5.4. Informe social. (Se anexa reporte de gestión del período (PAGA)).

Nombre JAC	Nro de respuesta tercera entrega	Observaciones tercera entrega	Presupuesto PAGA (Enfoque Soial)	Actividad Plan de Inversión social	OBSERVACIONES	EN GENERAL
BOLIVAR GUAMAL	2024S-VBOG-091490	NO OBJECCION	4.567.271,00	Ramada ubicada en predio donado a JAC	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** Dentro de las actividades del Convenio 3951 de 2023 se realizó la ejecución del Plan de Gestión social, el cual contemplo cinco fichas las cuales se describen a continuación: C1. Protocolo para el servicio de atención al usuario: en cumplimiento de la Ley 1755 y Ley 1712 de 2014, se elaboraron los siguientes documentos; Ficha del programa Protocolo para el servicio de Atención al usuario, formato de PQRS, base de datos de	No se han recibido PQRS en ninguno de los convenios, las reuniones de socialización de cierre se tienen programadas para el mes de diciembre. Los comités de

					seguimiento de PQRS. A la terminación del contrato no se presentó ninguna PQRS por lo cual se dio por cerrado el programa sin ninguna Objeción. Se programó con presidente de Junta de acción comunal solicitar paz y salvo de la personería municipal de la Bolívar – Santander, en la cual Certifique que no existen PQRS en su despacho o Pendientes sociales para este convenio. C2. Socializaciones: Se brindaron espacios para informar a la comunidad y participar e integración social. C3. Participación comunitaria: En cumplimiento en la Ley 850 de 2003 y la ley 1757 de 2015, para este convenio la comunidad decidió conformar comité de participación comunitaria el día 05 de junio de 2024, para el día de la socialización de cierre, se tiene programado informar a los miembros de comité que teniendo cuenta que no existieron PQRS, el convenio y los recursos se terminaron y la obra ya se ejecutó a satisfacción, se debe elaborar acta de cierre del comité de participación comunitaria. C4. Contratación de mano de obra local. C5. Inclusión social con perspectiva de género: Durante la ejecución del convenio se empleó listados de asistencia con enfoque diferencial en las diferentes reuniones, socializaciones y capacitaciones también se diligencio el formato de inclusión social en la gestión de los proyectos. Se realizó una capacitación de inclusión social a los trabajadores del convenio. La **propuesta de inversión social** por un valor de 4.567.271 el cual obtuvo NO OBJECION mediante oficio 2024S-VBOG-091490 Fecha: 2024-12-03 17:56:19, fue autorizado para la construcción de una ramada para reunir a la comunidad en un terreno donado a la J.A.C. la cual se encuentra en estado constructivo.	participación comunitaria se cerraran el día de la socialización de cierre. Los formatos de cierre se recopilaran una vez terminen obra.

SUCRE ORGANOS	2024S-VBOG-094213	NO OBJECCION	4.560.860,00	Dotación de sillas plásticas JAC y almuerzo inauguración Placa huella, placa con memorativa.	se ejecutó el plan de inversión social y se realizó la reunión de cierre del convenio el día 27 de diciembre de 2024. Se explicó al ing. Residente los formatos a diligenciar para el cierre del contrato. 1. Anexo 18. INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS 2. MASPS-MN1-IN-3-FR-2 BALANCE DEL ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO_OAC 3. CERTIFICADOS DE RESIDENCIA 4. PAZ Y SALVOS DE TRABAJADORES. 5. MASPS-MN1-IN-3-FR-6 PRE-ACTA MENSUAL INVERSION SOCIAL (FACTURAS DE INSUMOS PROPUESTA SOCIAL, REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUÉS) 6. SOCIALIZACIÓN DE CIERRE (PRESENTACION EN POWERT POINT, ACTA DE REUNIÓN, LISTA DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRAFICO, INVITACIONES O CONVOCATORIA DE LA COMUNIDAD)	No se han recibido PQRS en ninguno de los convenios, las reuniones de socialización de cierre se tienen programadas para el mes de diciembre. Los comités de participación comunitaria se cerraron el día de la socialización de cierre. Los formatos de cierre se recopilaran una vez terminen obra.
FLORIAN GUALILO			4.396.766,00	N/A	NO APLICA	No se han recibido PQRS en ninguno de los convenios, las reuniones de socialización de cierre se tienen programadas para el mes de diciembre. Los comités de participación comunitaria se cerraran el día de la socialización de cierre. Los formatos de cierre se recopilaran una vez terminen obra.
LA BELLEZA BERLIN	2024S-VBOG-088792	NO OBJECCION	4.541.200,00	Almuerzo reunión de cierre y embellecimiento escuela veredal	Se ejecuto presupuesto social, se realizó reunión de cierre del convenio, se está recopilando la información para el cierre social el cual se describe a continuación: 1. Anexo 18. INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS 2. MASPS-MN1-IN-3-FR-2 BALANCE DEL ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO_OAC 3. CERTIFICADOS DE RESIDENCIA 4. PAZ Y SALVOS DE TRABAJADORES.	No se han recibido PQRS en ninguno de los convenios, las reuniones de socialización de cierre se tienen programadas para el mes de diciembre.

					5. MASPS-MN1-IN-3-FR-6 PRE-ACTA MENSUAL INVERSION SOCIAL (FACTURAS DE INSUMOS PROPUESTA SOCIAL, REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUÉS) 6. SOCIALIZACIÓN DE CIERRE (PRESENTACION EN POWERT POINT, ACTA DE REUNIÓN, LISTA DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRAFICO, INVITACIONES O CONVOCATORIA DE LA COMUNIDAD)	Los comités de participación comunitaria se cerraran el día de la socialización de cierre. Los formatos de cierre se recopilaran una vez terminen obra.
LA BELLEZA CACHIPAYAL	2024S-VBOG-088792	NO OBJECCION	4.547.334,00	Arreglo comedor escolar, almuerzo reunión de cierre.	Se ejecutó presupuesto social, se realizó reunión de cierre del convenio, se está recopilando la información para el cierre social el cual se describe a continuación: 1. Anexo 18. INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS 2. MASPS-MN1-IN-3-FR-2 BALANCE DEL ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO_OAC 3. CERTIFICADOS DE RESIDENCIA 4. PAZ Y SALVOS DE TRABAJADORES. 5. MASPS-MN1-IN-3-FR-6 PRE-ACTA MENSUAL INVERSION SOCIAL (FACTURAS DE INSUMOS PROPUESTA SOCIAL, REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUÉS) 6. SOCIALIZACIÓN DE CIERRE (PRESENTACION EN POWERT POINT, ACTA DE REUNIÓN, LISTA DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRAFICO, INVITACIONES O CONVOCATORIA DE LA COMUNIDAD.	No se han recibido PQRS en ninguno de los convenios, las reuniones de socialización de cierre se tienen programadas para el mes de diciembre. Los comites de participación comunitaria se cerraran el día de la socialización de cierre. Los formatos de cierre se recopilaran una vez terminen obra.
VELEZ TUBAVITA	oficio 2024S-VBOG-094213	NO OBJECCION	4.398.714,00	Compra de insumos para la junta de acción comunal, sillas, mesas y silla de ruedas.	Se ejecutó propuesta de inversión social por un valor de $ 4.398.714 el cual obtuvo NO OBJECION mediante oficio 2024S-VBOG-094213 el plan anterior habría sido aprobado mediante oficio 2024S-VBOG-088959 Fecha: 2024-11-26 17:01:03, en la cual se había aprobado olla comunitaria pero la comunidad a través del comité de participación solicito una nueva propuesta social que fue radicada mediante oficio 2025E-VUVRAZ-003203 Fecha Radicación: 2025-01-13 15:42:46 donde solicitan compra de insumos para la junta de acción comunal, sillas, mesas y silla de ruedas. Se explico al ing. Residente los formatos a diligenciar para el cierre del contrato. 1. Anexo 18. INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS	No se han recibido PQRS en ninguno de los convenios, las reuniones de socialización de cierre se tienen programadas para el mes de diciembre. Los comités de participación comunitaria se cerraran el día de la socialización de cierre. Los formatos de cierre se recopilaran una

					2. MASPS-MN1-IN-3-FR-2 BALANCE DEL ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO_OAC 3. CERTIFICADOS DE RESIDENCIA 4. PAZ Y SALVOS DE TRABAJADORES. 5. MASPS-MN1-IN-3-FR-6 PRE-ACTA MENSUAL INVERSION SOCIAL (2) (FACTURAS DE INSUMOS PROPUESTA SOCIAL, REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUÉS) 6. SOCIALIZACIÓN DE CIERRE (PRESENTACION EN POWERT POINT, ACTA DE REUNIÓN, LISTA DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRAFICO, INVITACIONES O CONVOCATORIA DE LA COMUNIDAD.	vez terminen obra.
VELEZ LA PALMERA	2024S-VBOG-088329	NO OBJECCION	4.567.931,00	Embellecimiento escuela veredal, kit escolares, hidratación colaboradores y almuerzo inauguración placa huella y reunión de cierre.	Se ejecutó propuesta de inversión social por un valor de $4.567.931 el cual obtuvo NO OBJECION mediante oficio 2024S-VBOG-094213 de fecha 2024S-VBOG-088329 Fecha: 2024-11-25 15:07:10, donde se realizaron las siguientes actividades, entrega de kit escolares, olla comunitaria, embellecimiento escuela rural e hidratación para colaboradores. Dentro de las actividades del Convenio 4565 de 2023 se realizó la ejecución del Plan de Gestión social, el cual contemplo cinco fichas las cuales se describen a continuación: C1. Protocolo para el servicio de atención al usuario. Se programó con presidente de Junta de acción comunal solicitar paz y salvo de la personería municipal de la Vélez – Santander, en la cual Certifique que no existen PQRS en su despacho o pendientes sociales para este convenio. C2. Socializaciones: Se brindaron espacios para informar a la comunidad y participar e integración social en busca de mantener a los habitantes del sector, vereda y municipio sobre la obra a ejecutar "Placa – huella" teniendo en cuenta los enfoques de género, población y diferencial. C3. Participación comunitaria: En cumplimiento en la Ley 850 de 2003 y la ley 1757 de 2015, para este convenio la comunidad decidió conformar veeduría la cual fue radicada ante personería municipal el día 11 de junio de 2024 para el día de la socialización se tiene programado informar a los miembros de la veeduría que deben proceder a liquidar dicha veeduría ante personería municipal teniendo cuenta que no existieron PQRS, el convenio y los recursos se terminaron y la	No se han recibido PQRS en ninguno de los convenios, las reuniones de socialización de cierre se tienen programadas para el mes de diciembre. Los comites de participación comunitaria se cerraran el día de la socialización de cierre. Los formatos de cierre se recopilaran una vez terminen obra.

					obra ya se ejecutó a satisfacción. C4. Contratación de mano de obra local. C5. Inclusión social con perspectiva de género: Durante la ejecución del convenio se empleó listados de asistencia con enfoque diferencial en las diferentes reuniones, socializaciones y capacitaciones también se diligencio el formato de inclusión social en la gestión de los proyectos. Se realizó una capacitación de inclusión social a los trabajadores del convenio. Se explicó al ing. Residente los formatos a diligenciar para el cierre del contrato. 1. Anexo 18. INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS 2. MASPS-MN1-IN-3-FR-2 BALANCE DEL ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO_OAC 3. CERTIFICADOS DE RESIDENCIA 4. PAZ Y SALVOS DE TRABAJADORES. 5. MASPS-MN1-IN-3-FR-6 PRE-ACTA MENSUAL INVERSION SOCIAL (FACTURAS DE INSUMOS PROPUESTA SOCIAL, REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUÉS) 6. SOCIALIZACIÓN DE CIERRE (PRESENTACION EN POWERT POINT, ACTA DE REUNIÓN, LISTA DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRAFICO, INVITACIONES O CONVOCATORIA DE LA COMUNIDAD)	
VELEZ GAITAL	n/a	n/a	4.398.313,00	n/a	Dentro de las actividades del Convenio 4367 de 2023 se realizó la ejecución del Plan de Gestión social, el cual contemplo cinco fichas las cuales se describen a continuación: C1. Protocolo para el servicio de atención al usuario. C2. Socializaciones: Se brindaron espacios para informar a la comunidad y participar e integración social en busca de mantener a los habitantes del sector, vereda y municipio sobre la obra a ejecutar “Placa – huella” teniendo en cuenta los enfoques de género, población y diferencial. C3. Participación comunitaria: La comunidad decidió conformar comité de participación comunitaria el día 06 de junio de 2024, para el día de la socialización de cierre, se tiene programado informar a los miembros de comité que teniendo cuenta que no existieron PQRS, el convenio y los recursos se terminaron y la obra ya se ejecutó a satisfacción, se debe elaborar acta de cierre del comité de participación comunitaria.	No se han recibido PQRS en ninguno de los convenios, las reuniones de socialización de cierre se tienen programadas para el mes de diciembre. Los comités de participación comunitaria se cerraran el día de la socialización de cierre. Los formatos de cierre se recopilaran una vez terminen obra.

					C4. Contratación de mano de obra local. C5. Inclusión social con perspectiva de género. 2.2. ACTIVIDADES PENDIENTES: * SE ENCUENTRA EN TRAMITE PROCESO DE DILIGENCIAMIENTO DE LOS SIGUIENTES FORMATOS PARA ENTREGA Y CIERRE SOCIAL Y OBTENER NO OBJECION POR PARTE DE LA OFICINA DE SOSTENIBILIDAD. MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto. MASPS-MN1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSION SOCIAL MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto. Anexo 18. INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS A la fecha se encuentra en revisión de la interventoría los documentos para presentar propuesta social a la oficina de sostenibilidad, debido a que se debían realizar algunos ajustes. * FALTA: RADICACION DE DOCUMENTOS NO OBJECIÓN OFICINA DE SOSTENIBILIDAD	
VELEZ TEBAIDA			4.397.721,00	Mejoramiento de la vía veredal por malas condiciones, dificultad para sacar productos agrícolas.	Dentro de las actividades del Convenio 4424 de 2023 se realizó la ejecución del Plan de Gestión social, el cual contemplo cinco fichas las cuales se describen a continuación: C1. Protocolo para el servicio de atención al usuario: Se programó con presidente de Junta de acción comunal solicitar paz y salvo de la personería municipal de la Vélez – Santander, en la cual Certifique que no existen PQRS en su despacho o pendientes sociales para este convenio. C2. Socializaciones: Se brindaron espacios para informar a la comunidad y participar e integración social en busca de mantener a los habitantes del sector, vereda y municipio sobre la obra a ejecutar "Placa – huella" teniendo en cuenta los enfoques de género, población y diferencial. C3. Participación comunitaria: la comunidad decidió conformar comité de participación comunitaria el día 06 de junio de 2024, para	No se han recibido PQRS en ninguno de los convenios, las reuniones de socialización de cierre se tienen programadas para el mes de diciembre. Los comités de participación comunitaria se cerraran el día de la socialización de cierre. Los formatos de cierre se recopilaran una vez terminen obra.

					el día de la socialización de cierre, se tiene programado informar a los miembros de comité que teniendo cuenta que no existieron PQRS, el convenio y los recursos se terminaron y la obra ya se ejecutó a satisfacción, se debe elaborar acta de cierre del comité de participación comunitaria. C4. Contratación de mano de obra local. C5. Inclusión social con perspectiva de género: Durante la ejecución del convenio se empleó listados de asistencia con enfoque diferencial en las diferentes reuniones, socializaciones y capacitaciones también se diligencio el formato de inclusión social en la gestión de los proyectos. Se realizó una capacitación de inclusión social a los trabajadores del convenio. SE ENCUENTRA EN TRAMITE PROCESO DE DILIGENCIAMIENTO DE LOS SIGUIENTES FORMATOS PARA ENTREGA Y CIERRE SOCIAL Y OBTENER NO OBJECION POR PARTE DE LA OFICINA DE SOSTENIBILIDAD. MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto. MASPS-MN1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSION SOCIAL MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto. Anexo 18. INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS A la fecha se encuentra en revisión de la interventoría los documentos para presentar propuesta social a la oficina de sostenibilidad, debido a que se debían realizar algunos ajustes. FALTA: RADICACION DE DOCUMENTOS NO OBJECIÓN OFICINA DE SOSTENIBILIDAD.	

GUAVATA POPOA			4.566.949,00	Reemplazar tuberia y tanques en mal estado acueducto veredal.	La Propuesta del Plan de Inversión social cuneta con la No Objeción por parte del INVIAS y se tiene programado por parte de la JAC realizar la Reunión de Socialización de cierre del Proyecto el 01 de febrero de 2025 Se explicó al ing. Residente los formatos a diligenciar para el cierre del contrato. 1. Anexo 18. INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS 2. MASPS-MN1-IN-3-FR-2 BALANCE DEL ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO_OAC 3. CERTIFICADOS DE RESIDENCIA 4. PAZ Y SALVOS DE TRABAJADORES. 5. MASPS-MN1-IN-3-FR-6 PRE-ACTA MENSUAL INVERSION SOCIAL (FACTURAS DE INSUMOS PROPUESTA SOCIAL, REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUÉS) 6. SOCIALIZACIÓN DE CIERRE (PRESENTACION EN POWERT POINT, ACTA DE REUNIÓN, LISTA DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRAFICO, INVITACIONES O CONVOCATORIA DE LA COMUNIDAD)	No se han recibido PQRS en ninguno de los convenios, las reuniones de socialización de cierre se tienen programadas para el mes de diciembre. Los comites de participación comunitaria se cerraran el día de la socialización de cierre. Los formatos de cierre se recopilaran una vez terminen obra.
GUAVATA LA UNION	2024S-VBOG-096834	NO OBJECCION	4.566.534,00	Sillas plásticas y almuerzo comunitario.	La Propuesta del Plan de Inversión social cuneta con la No Objeción por parte del INVIAS y se tiene programado por parte de la JAC realizar la Reunión de Socialización de cierre del Proyecto el 01 de febrero de 2025 Se explicó al ing. Residente los formatos a diligenciar para el cierre del contrato. 1. Anexo 18. INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS 2. MASPS-MN1-IN-3-FR-2 BALANCE DEL ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO_OAC 3. CERTIFICADOS DE RESIDENCIA 4. PAZ Y SALVOS DE TRABAJADORES. 5. MASPS-MN1-IN-3-FR-6 PRE-ACTA MENSUAL INVERSION SOCIAL (FACTURAS DE INSUMOS PROPUESTA SOCIAL, REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUÉS) 6. SOCIALIZACIÓN DE CIERRE (PRESENTACION EN POWERT POINT, ACTA DE REUNIÓN, LISTA DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRAFICO, INVITACIONES O CONVOCATORIA DE LA COMUNIDAD)	No se han recibido PQRS en ninguno de los convenios, las reuniones de socialización de cierre se tienen programadas para el mes de diciembre. Los comites de participación comunitaria se cerraran el día de la socialización de cierre. Los formatos de cierre se recopilaran una vez terminen obra.

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL EN CADA CONVENIO

Junta de Acción Comunal Vereda Órganos

Dentro de las actividades del Convenio 4490 de 2023 se realizó la ejecución del Plan de Gestión social, el cual contemplo cinco fichas las cuales se describen a continuación:

C1. Protocolo para el servicio de atención al usuario: en cumplimiento de la Ley 1755 y Ley 1712 de 2014, se elaboraron los siguientes documentos; Ficha del programa Protocolo para el servicio de atención al usuario, formato de PQRS, base de datos de seguimiento de PQRS. A la terminación del contrato no se presentó ninguna PQRS por lo cual se dio por cerrado el programa sin ninguna Objeción. De igual manera se gestionó paz y salvo de la personería municipal de la Sucre – Santander, en la cual Certifica que no existen PQRS en su despacho o pendientes sociales para este convenio.

C2. Socializaciones: Se brindaron espacios para informar a la comunidad y participar e integración social en busca de mantener a los habitantes del sector, vereda y municipio sobre la obra a ejecutar “Placa – huella” teniendo en cuenta los enfoques de género, población y diferencial.

En la vereda Órganos se realizó la reunión de inicio el día 05 de junio de 2024 con la participación de 21 personas. La reunión de cierre se ejecutó el 27 de diciembre de 2024 con la participación de 60 personas, realizándose este mismo día la inauguración de la placa huella. Se realizaron los siguientes integrables incluidos en el balance social, Ficha de socialización, presentación en power point, acta de reunión, listados de asistencia, registros fotográficos y piezas comunicativas. Dándose por cumplidas las actividades de este programa.

C3. Participación comunitaria: En cumplimiento en la Ley 850 de 2003 y la ley 1757 de 2015, para este convenio la comunidad decidió conformar veeduría según consta en acta de conformación de fecha 05 de junio de 2024 en EL MOMENTO LA VEEDURIA SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE CIERRE ANTE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SUCRE PARA CIERRE DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION COMUNITARIA.

C4. Contratación de mano de obra local: Con el fin de brindar oportunidades laborales a la comunidad del área de influencia directa se oferto a través del WhatsApp de la vereda la oferta laboral de mano de obra calificada y no calificada, cada miembro aporto su certificado de residencia, al igual que su paz y salvo al finalizar el convenio.

C5. Inclusión social con perspectiva de género: Durante la ejecución del convenio se empleó listados de asistencia con enfoque diferencial en las diferentes reuniones, socializaciones y capacitaciones también se diligencio el formato de inclusión social en la gestión de los proyectos. Se realizó una capacitación de inclusión social a los trabajadores del convenio.

Para estos convenios por parte de INVIAS se diligenciaron los siguientes formatos del área social según requerimiento:

MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.

MASPS-MN1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSION SOCIAL

MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.

Anexo 18. INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

Se ejecutó propuesta de inversión social por un valor de $ 4.560.860 el cual obtuvo NO OBJECION mediante oficio 2024S-VBOG-094213 de fecha 2024-12-11 19:14:35, se realizó Almuerzo comunitario, sillas rimax sin brazo, manguera para transporte de agua acueducto rural.

Junta de Acción Comunal Vereda Gualilo

Para esta Junta no se ejecutaron actividades Gestión Social ya que no se ejecutó el Proyecto, en vista de que no se viabilizó.

Junta de Acción Comunal Vereda Berlín

Dentro de las actividades del Convenio 3753 de 2023 se realizó la ejecución del Plan de Gestión social, el cual contemplo cinco fichas las cuales se describen a continuación:

C1. Protocolo para el servicio de atención al usuario: en cumplimiento de la Ley 1755 y Ley 1712 de 2014, se elaboraron los siguientes documentos; Ficha del programa Protocolo para el servicio de atención al usuario, formato de PQRS, base de datos de seguimiento de PQRS. A la terminación del contrato no se presentó ninguna PQRS por lo cual se dio por cerrado el programa sin ninguna Objeción. De igual manera se gestionó paz y salvo de la personería municipal de la Belleza – Santander, en la cual Certifica que no existen PQRS en su despacho o pendientes sociales para este convenio.

C2. Socializaciones: Se brindaron espacios para informar a la comunidad y participar e integración social en busca de mantener a los habitantes del sector, vereda y municipio sobre la obra a ejecutar “Placa – huella” teniendo en cuenta los enfoques de género, población y diferencial.

En la vereda Berlín se realizó la reunión de inicio el día 07 de junio de 2024 con la participación de 13 personas. La reunión de cierre se ejecutó el 13 de diciembre de 2024 con la participación de 33 personas, realizándose este mismo día la inauguración de la placa huella. Se realizaron los siguientes integrables incluidos en el balance social, Ficha de socialización, presentación en power point, acta de reunión, listados de asistencia, registros fotográficos y piezas comunicativas. Dándose por cumplidas las actividades de este programa.

C3. Participación comunitaria: En cumplimiento en la Ley 850 de 2003 y la ley 1757 de 2015, para este convenio la comunidad decidió conformar comité de participación comunitaria según consta en acta de conformación de fecha 07 de junio de 2024 y se dio por cerrado el día 13 de diciembre de 2024, según consta en acta de reunión con sus respectivos soportes.

C4. Contratación de mano de obra local: Con el fin de brindar oportunidades laborales a la comunidad del área de influencia directa se oferto a través del WhatsApp de la vereda la oferta laboral de mano de obra calificada y no calificada, cada miembro aporto su certificado de residencia, al igual que su paz y salvo al finalizar el convenio.

C5. Inclusión social con perspectiva de género: Durante la ejecución del convenio se empleó listados de asistencia con enfoque diferencial en las diferentes reuniones, socializaciones y capacitaciones también se diligencio el formato de inclusión social en la gestión de los proyectos. Se realizó una capacitación de inclusión social a los trabajadores del convenio.

Para estos convenios por parte de INVIAS se diligenciaron los siguientes formatos del área social según requerimiento:

MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.

MASPS-MN1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSION SOCIAL

MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.

Anexo 18. INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

Se ejecutó propuesta de inversión social por un valor de $ 4.541.200 el cual obtuvo NO OBJECION mediante oficio 2024S-VBOG-088792 de fecha 26 de noviembre de 2024, se realizó arreglo escuela rural y almuerzo comunitario.

Junta de Acción Comunal Vereda Cachipayal

Dentro de las actividades del Convenio 4175 de 2023 se realizó la ejecución del Plan de Gestión social, el cual contemplo cinco fichas las cuales se describen a continuación:

C1. Protocolo para el servicio de atención al usuario: en cumplimiento de la Ley 1755 y Ley 1712 de 2014, se elaboraron los siguientes documentos; Ficha del programa Protocolo para el servicio de atención al usuario, formato de PQRS, base de datos de seguimiento de PQRS. A la terminación del contrato no se presentó ninguna PQRS por lo cual se dio por cerrado el programa sin ninguna Objeción. De igual manera se gestionó paz y salvo de la personería municipal de la Belleza – Santander, en la cual Certifica que no existen PQRS en su despacho o pendientes sociales para este convenio.

C2. Socializaciones: Se brindaron espacios para informar a la comunidad y participar e integración social en busca de mantener a los habitantes del sector, vereda y municipio sobre la obra a ejecutar “Placa – huella” teniendo en cuenta los enfoques de género, población y diferencial.

En la vereda Cachipayal se realizó la reunión de inicio el día 07 de junio de 2024 con la participación de 9 personas. La reunión de cierre se ejecutó el 13 de diciembre de 2024 con la participación de 26 personas, realizándose este mismo día la inauguración de la placa huella. Se realizaron los siguientes integrables incluidos en el balance social, Ficha de socialización, presentación en power point, acta de reunión, listados de asistencia, registros fotográficos y piezas comunicativas. Dándose por cumplidas las actividades de este programa.

C3. Participación comunitaria: En cumplimiento en la Ley 850 de 2003 y la ley 1757 de 2015, para este convenio la comunidad decidió conformar comité de participación comunitaria según consta en acta de conformación de fecha 07 de junio de 2024 y se dio por cerrado el día 13 de diciembre de 2024, según consta en acta de reunión con sus respectivos soportes.

C4. Contratación de mano de obra local: Con el fin de brindar oportunidades laborales a la comunidad del área de influencia directa se oferto a través del WhatsApp de la vereda la

oferta laboral de mano de obra calificada y no calificada, cada miembro aporto su certificado de residencia, al igual que su paz y salvo al finalizar el convenio.

C5. Inclusión social con perspectiva de género: Durante la ejecución del convenio se empleó listados de asistencia con enfoque diferencial en las diferentes reuniones, socializaciones y capacitaciones también se diligencio el formato de inclusión social en la gestión de los proyectos. Se realizó una capacitación de inclusión social a los trabajadores del convenio.

Para estos convenios por parte de INVIAS se diligenciaron los siguientes formatos del área social según requerimiento:

MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.

MASPS-MN1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSION SOCIAL

MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.

Anexo 18. INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

Junta de Acción Comunal Vereda Tubavita

Dentro de las actividades del Convenio 4357 de 2023 se realizó la ejecución del Plan de Gestión social, el cual contemplo cinco fichas las cuales se describen a continuación:

C1. Protocolo para el servicio de atención al usuario: en cumplimiento de la Ley 1755 y Ley 1712 de 2014, se elaboraron los siguientes documentos; Ficha del programa Protocolo para el servicio de atención al usuario, formato de PQRS, base de datos de seguimiento de PQRS. A la terminación del contrato no se presentó ninguna PQRS por lo cual se dio por cerrado el programa sin ninguna Objeción.

Se programó con presidente de Junta de acción comunal solicitar paz y salvo de la personería municipal de la Vélez – Santander, en la cual Certifique que no existen PQRS en su despacho o pendientes sociales para este convenio.

C2. Socializaciones: Se brindaron espacios para informar a la comunidad y participar e integración social en busca de mantener a los habitantes del sector, vereda y municipio sobre la obra a ejecutar “Placa – huella” teniendo en cuenta los enfoques de género, población y diferencial.

En la vereda Tubavita se realizó la reunión de inicio el día 06 de junio de 2024 con la participación de 20 personas. La reunión de cierre se ejecutará el 25 de enero de 2025 a la cual está invitada la alcaldía y personería municipal, INVIAS oficina sostenibilidad, área social nacional y departamental, toda la comunidad de la vereda, alcaldía, realizándose este mismo día la inauguración de la placa huella. Se está trabajando en los siguientes integrables incluidos en el balance social, Ficha de socialización, presentación en power point, acta de reunión, listados de asistencia, registros fotográficos y piezas comunicativas. Para dar cumplimiento a las actividades de este programa.

C3. Participación comunitaria: En cumplimiento en la Ley 850 de 2003 y la ley 1757 de 2015, para este convenio la comunidad decidió conformar comité de participación comunitaria según consta en acta de conformación de fecha 06 de junio de 2024 la cual conto con la participación de 6 personas y 3 de ella formaron el comité para el día de la socialización se tiene programado realizar el cierre del comité de participación teniendo cuenta que no existieron PQRS, el convenio y los recursos se terminaron y la obra ya se ejecutó a satisfacción.

C4. Contratación de mano de obra local: Con el fin de brindar oportunidades laborales a la comunidad del área de influencia directa se oferto a través del WhatsApp de la vereda la oferta laboral de mano de obra calificada y no calificada, Se está a la espera que la J.A.C. aporte los respectivos soportes de cada miembro que laboro en el convenio como son: certificado de residencia, al igual que su paz y salvo al finalizar el convenio.

C5. Inclusión social con perspectiva de género: Durante la ejecución del convenio se empleó listados de asistencia con enfoque diferencial en las diferentes reuniones, socializaciones y capacitaciones también se diligencio el formato de inclusión social en la gestión de los proyectos. Se realizó una capacitación de inclusión social a los trabajadores del convenio.

SE ENCUENTRA EN TRAMITE PROCESO DE DILIGENCIAMIENTO DE LOS SIGUIENTES FORMATOS PARA ENTREGA Y CIERRE SOCIAL Y OBTENER NO OBJECION POR PARTE DE LA OFICINA DE SOSTENIBILIDAD.

MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.

MASPS-MN1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSION SOCIAL

MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.

Anexo 18. INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

Se ejecutó propuesta de inversión social por un valor de 4.398.714 el cual obtuvo NO OBJECION mediante oficio 2024S-VBOG-094213 de fecha 2024S-VBOG-088959 Fecha: 2024-11-26 17:01:03, en la cual se había aprobado olla comunitaria pero la comunidad a través del comité de participación solicito una nueva propuesta social que fue radicada mediante oficio 2025E-VUVRAZ-003203 Fecha Radicación: 2025-01-13 15:42:46 donde solicitan compra de insumos para la junta de acción comunal, sillas, mesas y silla de ruedas.

Junta de Acción Comunal Vereda Gaital

Dentro de las actividades del Convenio 4367 de 2023 se realizó la ejecución del Plan de Gestión social, el cual contemplo cinco fichas las cuales se describen a continuación:

C1. Protocolo para el servicio de atención al usuario: en cumplimiento de la Ley 1755 y Ley 1712 de 2014, se elaboraron los siguientes documentos; Ficha del programa Protocolo para el servicio de atención al usuario, formato de PQRS, base de datos de seguimiento de PQRS. A la terminación del contrato no se presentó ninguna PQRS por lo cual se dio por cerrado el programa sin ninguna Objeción.

Se programó con presidente de Junta de acción comunal solicitar paz y salvo de la personería municipal de Vélez – Santander, en la cual Certifique que no existen PQRS en su despacho o pendientes sociales para este convenio.

C2. Socializaciones: Se brindaron espacios para informar a la comunidad y participar e integración social en busca de mantener a los habitantes del sector, vereda y municipio sobre la obra a ejecutar “Placa – huella” teniendo en cuenta los enfoques de género, población y diferencial.

En la vereda GAITAL se realizó la reunión de inicio el día 06 de junio de 2024 con la participación de 16 personas. La reunión de cierre aún no se ha programado porque la placa huella aún está en ejecución, pero ya se les informo que a dicha reunión se deben realizar invitaciones a: la alcaldía y personería municipal, INVIAS oficina sostenibilidad, área social nacional y departamental, toda la comunidad de la vereda, alcaldía, realizándose este mismo día la inauguración de la placa huella.

Y se deben trabajar los siguientes integrables incluidos en el balance social, Ficha de socialización, presentación en power point, acta de reunión, listados de asistencia,

registros fotográficos y piezas comunicativas. Para dar cumplimiento a las actividades de este programa.

C3. Participación comunitaria: En cumplimiento en la Ley 850 de 2003 y la ley 1757 de 2015, para este convenio la comunidad decidió conformar comité de participación comunitaria el día 06 de junio de 2024, para el día de la socialización de cierre, se tiene programado informar a los miembros de comité que teniendo cuenta que no existieron PQRS, el convenio y los recursos se terminaron y la obra ya se ejecutó a satisfacción, se debe elaborar acta de cierre del comité de participación comunitaria.

C4. Contratación de mano de obra local: Con el fin de brindar oportunidades laborales a la comunidad del área de influencia directa se oferto a través del WhatsApp de la vereda la oferta laboral de mano de obra calificada y no calificada, Se está a la espera que la J.A.C. aporte los respectivos soportes de cada miembro que laboro en el convenio como son: certificado de residencia, al igual que su paz y salvo al finalizar el convenio.

C5. Inclusión social con perspectiva de género: Durante la ejecución del convenio se empleó listados de asistencia con enfoque diferencial en las diferentes reuniones, socializaciones y capacitaciones también se diligencio el formato de inclusión social en la gestión de los proyectos. Se realizó una capacitación de inclusión social a los trabajadores del convenio.

SE ENCUENTRA EN TRAMITE PROCESO DE DILIGENCIAMIENTO DE LOS SIGUIENTES FORMATOS PARA ENTREGA Y CIERRE SOCIAL Y OBTENER NO OBJECION POR PARTE DE LA OFICINA DE SOSTENIBILIDAD.

MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.

MASPS-MN1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSION SOCIAL

MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.

Anexo 18. INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

A la fecha se encuentra en revisión de la interventoría los documentos para presentar propuesta social a la oficina de sostenibilidad, debido a que se debían realizar algunos ajustes.

FALTA: RADICACION DE DOCUMENTOS NO OBJECIÓN OFICINA DE SOSTENIBILIDAD.

Junta de Acción Comunal Vereda Tebaida

Dentro de las actividades del Convenio 4424 de 2023 se realizó la ejecución del Plan de Gestión social, el cual contemplo cinco fichas las cuales se describen a continuación:

C1. Protocolo para el servicio de atención al usuario: en cumplimiento de la Ley 1755 y Ley 1712 de 2014, se elaboraron los siguientes documentos; Ficha del programa Protocolo para el servicio de atención al usuario, formato de PQRS, base de datos de seguimiento de PQRS. A la terminación del contrato no se presentó ninguna PQRS por lo cual se dio por cerrado el programa sin ninguna Objeción.

Se programó con presidente de Junta de acción comunal solicitar paz y salvo de la personería municipal de la Vélez – Santander, en la cual Certifique que no existen PQRS en su despacho o pendientes sociales para este convenio.

C2. Socializaciones: Se brindaron espacios para informar a la comunidad y participar e integración social en busca de mantener a los habitantes del sector, vereda y municipio sobre la obra a ejecutar “Placa – huella” teniendo en cuenta los enfoques de género, población y diferencial.

En la vereda TEBAIDA se realizó la reunión de inicio el día 06 de junio de 2024 con la participación de 20 personas. La reunión de cierre aún no se ha programado porque la placa huella aún está en ejecución, pero ya se les informo que a dicha reunión se deben realizar invitaciones a: la alcaldía y personería municipal, INVIAS oficina sostenibilidad, área social nacional y departamental, toda la comunidad de la vereda, alcaldía, realizándose este mismo día la inauguración de la placa huella.

Y se deben trabajar los siguientes integrables incluidos en el balance social, Ficha de socialización, presentación en power point, acta de reunión, listados de asistencia, registros fotográficos y piezas comunicativas. Para dar cumplimiento a las actividades de este programa.

C3. Participación comunitaria: En cumplimiento en la Ley 850 de 2003 y la ley 1757 de 2015, para este convenio la comunidad decidió conformar comité de participación comunitaria el día 06 de junio de 2024, para el día de la socialización de cierre, se tiene programado informar a los miembros de comité que teniendo cuenta que no existieron PQRS, el convenio y los recursos se terminaron y la obra ya se ejecutó a satisfacción, se debe elaborar acta de cierre del comité de participación comunitaria.

C4. Contratación de mano de obra local: Con el fin de brindar oportunidades laborales a la comunidad del área de influencia directa se oferto a través del WhatsApp de la vereda la oferta laboral de mano de obra calificada y no calificada, Se está a la espera que la J.A.C. aporte los respectivos soportes de cada miembro que laboro en el convenio como son: certificado de residencia, al igual que su paz y salvo al finalizar el convenio.

C5. Inclusión social con perspectiva de género: Durante la ejecución del convenio se empleó listados de asistencia con enfoque diferencial en las diferentes reuniones, socializaciones y capacitaciones también se diligencio el formato de inclusión social en la gestión de los proyectos. Se realizó una capacitación de inclusión social a los trabajadores del convenio.

SE ENCUENTRA EN TRAMITE PROCESO DE DILIGENCIAMIENTO DE LOS SIGUIENTES FORMATOS PARA ENTREGA Y CIERRE SOCIAL Y OBTENER NO OBJECION POR PARTE DE LA OFICINA DE SOSTENIBILIDAD.

MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.

MASPS-MN1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSION SOCIAL

MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.

Anexo 18. INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

A la fecha se encuentra en revisión de la interventoría los documentos para presentar propuesta social a la oficina de sostenibilidad, debido a que se debían realizar algunos ajustes.

FALTA: RADICACION DE DOCUMENTOS NO OBJECIÓN OFICINA DE SOSTENIBILIDAD.

Junta de Acción Comunal Vereda Popoa

Dentro de las actividades del Convenio 4767 de 2023 se realizó la ejecución del Plan de Gestión social, el cual contemplo cinco fichas las cuales se describen a continuación:

C1. Protocolo para el servicio de atención al usuario: en cumplimiento de la Ley 1755 y Ley 1712 de 2014, se elaboraron los siguientes documentos; Ficha del programa Protocolo para el servicio de atención al usuario, formato de PQRS, base de datos de seguimiento de PQRS. A la terminación del contrato no se presentó ninguna PQRS por lo cual se dio por cerrado el programa sin ninguna Objeción.

Se programó con presidente de Junta de acción comunal solicitar paz y salvo de la personería municipal de la Guavatá – Santander, en la cual Certifique que no existen PQRS en su despacho o pendientes sociales para este convenio.

C2. Socializaciones: Se brindaron espacios para informar a la comunidad y participar e integración social en busca de mantener a los habitantes del sector, vereda y municipio sobre la obra a ejecutar “Placa – huella” teniendo en cuenta los enfoques de género, población y diferencial.

En la vereda POPOA se realizó la reunión de inicio el día 07 de junio de 2024 con la participación de 21 personas. La reunión de cierre se ejecutará el 1 de febrero de 2025 a la cual está invitada la alcaldía y personería municipal, INVIAS oficina sostenibilidad, área social nacional y departamental, toda la comunidad de la vereda, alcaldía, realizándose este mismo día la inauguración de la placa huella. Se está trabajando en los siguientes integrables incluidos en el balance social, Ficha de socialización, presentación en power point, acta de reunión, listados de asistencia, registros fotográficos y piezas comunicativas. Para dar cumplimiento a las actividades de este programa.

C3. Participación comunitaria: En cumplimiento en la Ley 850 de 2003 y la ley 1757 de 2015, para este convenio la comunidad decidió conformar comité de participación comunitaria el día 07 de junio de 2024 para el día de la socialización se tiene programado informar a los miembros de comité que teniendo cuenta que no existieron PQRS, el convenio y los recursos se terminaron y la obra ya se ejecutó a satisfacción, se debe elaborar acta de cierre del comité de participación comunitaria.

C4. Contratación de mano de obra local: Con el fin de brindar oportunidades laborales a la comunidad del área de influencia directa se oferto a través del WhatsApp de la vereda la oferta laboral de mano de obra calificada y no calificada, Se está a la espera que la J.A.C. aporte los respectivos soportes de cada miembro que laboro en el convenio como son: certificado de residencia, al igual que su paz y salvo al finalizar el convenio.

C5. Inclusión social con perspectiva de género: Durante la ejecución del convenio se empleó listados de asistencia con enfoque diferencial en las diferentes reuniones, socializaciones y capacitaciones también se diligencio el formato de inclusión social en la gestión de los proyectos. Se realizó una capacitación de inclusión social a los trabajadores del convenio.

SE ENCUENTRA EN TRAMITE PROCESO DE DILIGENCIAMIENTO DE LOS SIGUIENTES FORMATOS PARA ENTREGA Y CIERRE SOCIAL Y OBTENER NO OBJECION POR PARTE DE LA OFICINA DE SOSTENIBILIDAD.

MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.

MASPS-MN1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSION SOCIAL

MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.

Anexo 18. INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

Se ejecutó propuesta de inversión social por un valor de 4.566.949 el cual obtuvo NO OBJECION mediante oficio 2024S-VBOG-094213 de fecha 2024S-VBOG-099538 Fecha: 2024-12-30, donde se realizaron las siguientes actividades, compra de guadaña y olla comunitaria.

Junta de Acción Comunal Vereda La Unión

Dentro de las actividades del Convenio 4478 de 2023 se realizó la ejecución del Plan de Gestión social, el cual contemplo cinco fichas las cuales se describen a continuación:

C1. Protocolo para el servicio de atención al usuario: en cumplimiento de la Ley 1755 y Ley 1712 de 2014, se elaboraron los siguientes documentos; Ficha del programa Protocolo para el servicio de atención al usuario, formato de PQRS, base de datos de seguimiento de PQRS. A la terminación del contrato no se presentó ninguna PQRS por lo cual se dio por cerrado el programa sin ninguna Objeción.

Se programó con presidente de Junta de acción comunal solicitar paz y salvo de la personería municipal de la Guavatá – Santander, en la cual Certifique que no existen PQRS en su despacho o pendientes sociales para este convenio.

C2. Socializaciones: Se brindaron espacios para informar a la comunidad y participar e integración social en busca de mantener a los habitantes del sector, vereda y municipio sobre la obra a ejecutar “Placa – huella” teniendo en cuenta los enfoques de género, población y diferencial.

En la vereda UNIÓN se realizó la reunión de inicio el día 05 de junio de 2024 con la participación de 21 personas. La reunión de cierre se ejecutará el 1 de febrero de 2025 a la cual está invitada la alcaldía y personería municipal, INVIAS oficina sostenibilidad, área social nacional y departamental, toda la comunidad de la vereda, alcaldía, realizándose este mismo día la inauguración de la placa huella. Se está trabajando en los siguientes integrables incluidos en el balance social, Ficha de socialización, presentación en powert

point, acta de reunión, listados de asistencia, registros fotográficos y piezas comunicativas. Para dar cumplimiento a las actividades de este programa.

C3. Participación comunitaria: En cumplimiento en la Ley 850 de 2003 y la ley 1757 de 2015, para este convenio la comunidad decidió conformar comité de participación comunitaria el día 05 de junio de 2024, para el día de la socialización de cierre a realizarse el 1 de febrero de 2025, se tiene programado informar a los miembros de comité que teniendo cuenta que no existieron PQRS, el convenio y los recursos se terminaron y la obra ya se ejecutó a satisfacción, se debe elaborar acta de cierre del comité de participación comunitaria.

C4. Contratación de mano de obra local: Con el fin de brindar oportunidades laborales a la comunidad del área de influencia directa se oferto a través del WhatsApp de la vereda la oferta laboral de mano de obra calificada y no calificada, Se está a la espera que la J.A.C. aporte los respectivos soportes de cada miembro que laboro en el convenio como son: certificado de residencia, al igual que su paz y salvo al finalizar el convenio.

C5. Inclusión social con perspectiva de género: Durante la ejecución del convenio se empleó listados de asistencia con enfoque diferencial en las diferentes reuniones, socializaciones y capacitaciones también se diligencio el formato de inclusión social en la gestión de los proyectos. Se realizó una capacitación de inclusión social a los trabajadores del convenio.

SE ENCUENTRA EN TRAMITE PROCESO DE DILIGENCIAMIENTO DE LOS SIGUIENTES FORMATOS PARA ENTREGA Y CIERRE SOCIAL Y OBTENER NO OBJECION POR PARTE DE LA OFICINA DE SOSTENIBILIDAD.

MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.

MASPS-MN1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSION SOCIAL

MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.

Anexo 18. INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

Se ejecutó propuesta de inversión social por un valor de 4.566.534 el cual obtuvo NO OBJECION mediante oficio de fecha 2024S-VBOG-096834 Fecha: 2024-12-19 21:13:01, donde se realizaron las siguientes actividades; sillas plásticas y transporte vereda, olla comunitaria.

Junta de Acción Comunal Vereda Guamal

Dentro de las actividades del Convenio 3951 de 2023 se realizó la ejecución del Plan de Gestión social, el cual contemplo cinco fichas las cuales se describen a continuación:

C1. Protocolo para el servicio de atención al usuario: en cumplimiento de la Ley 1755 y Ley 1712 de 2014, se elaboraron los siguientes documentos; Ficha del programa Protocolo para el servicio de atención al usuario, formato de PQRS, base de datos de seguimiento de PQRS. A la terminación del contrato no se presentó ninguna PQRS por lo cual se dio por cerrado el programa sin ninguna Objeción.

Se programó con presidente de Junta de acción comunal solicitar paz y salvo de la personería municipal de la Bolívar – Santander, en la cual Certifique que no existen PQRS en su despacho o pendientes sociales para este convenio.

C2. Socializaciones: Se brindaron espacios para informar a la comunidad y participar e integración social en busca de mantener a los habitantes del sector, vereda y municipio sobre la obra a ejecutar “Placa – huella” teniendo en cuenta los enfoques de género, población y diferencial.

En la vereda GUAMAL se realizó la reunión de inicio el día 05 de junio de 2024 con la participación de 13 personas. La reunión de cierre aún no se ha programado está en discusión de la comunidad la fecha de cierre e inauguración de la placa huella, pero ya se les informo que a dicha reunión se deben realizar invitaciones a: la alcaldía y personería municipal, INVIAS oficina sostenibilidad, área social nacional y departamental, toda la comunidad de la vereda, alcaldía, realizándose este mismo día la inauguración de la placa huella.

Y se deben trabajar los siguientes integrables incluidos en el balance social, Ficha de socialización, presentación en power point, acta de reunión, listados de asistencia, registros fotográficos y piezas comunicativas. Para dar cumplimiento a las actividades de este programa.

C3. Participación comunitaria: En cumplimiento en la Ley 850 de 2003 y la ley 1757 de 2015, para este convenio la comunidad decidió conformar comité de participación comunitaria el día 05 de junio de 2024, para el día de la socialización de cierre, se tiene programado informar a los miembros de comité que teniendo cuenta que no existieron PQRS, el convenio y los recursos se terminaron y la obra ya se ejecutó a satisfacción, se debe elaborar acta de cierre del comité de participación comunitaria.

C4. Contratación de mano de obra local: Con el fin de brindar oportunidades laborales a la comunidad del área de influencia directa se oferto a través del WhatsApp de la vereda la oferta laboral de mano de obra calificada y no calificada, Se está a la espera que la J.A.C. aporte los respectivos soportes de cada miembro que laboro en el convenio como son: certificado de residencia, al igual que su paz y salvo al finalizar el convenio.

C5. Inclusión social con perspectiva de género: Durante la ejecución del convenio se empleó listados de asistencia con enfoque diferencial en las diferentes reuniones, socializaciones y capacitaciones también se diligencio el formato de inclusión social en la gestión de los proyectos. Se realizó una capacitación de inclusión social a los trabajadores del convenio.

SE ENCUENTRA EN TRAMITE PROCESO DE DILIGENCIAMIENTO DE LOS SIGUIENTES FORMATOS PARA ENTREGA Y CIERRE SOCIAL Y OBTENER NO OBJECION POR PARTE DE LA OFICINA DE SOSTENIBILIDAD.

MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.

MASPS-MN1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSION SOCIAL

MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.

Anexo 18. INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

La propuesta de inversión social por un valor de 4.567.271 el cual obtuvo NO OBJECION mediante oficio 2024S-VBOG-091490 Fecha: 2024-12-03 17:56:19, fue autorizado para la construcción de una ramada para reunir a la comunidad en un terreno donado a la J.A.C. la cual se encuentra en estado constructivo.

5.4.1. Informe ambiental (se anexa reporte de gestión).

ACTIVIDADES DEL ÁREA AMBIENTAL

Durante el período del mes de enero de 2025, la Interventoría realizó el seguimiento a la gestión ambiental de los Convenios a cargo del Contrato de Interventoría Nº 1631 de 2023, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O

MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN CADA CONVENIO

Junta de Acción Comunal Vereda Órganos

El seguimiento a los programas y proyectos del plan de manejo ambiental, se realiza de acuerdo a la Guía Ambiental proyectos de infraestructura – PAGA modo carretero. A continuación, se relacionan los programas y proyectos ambientales, objeto de seguimiento por parte de la Interventoría:

PROGRAMAS	SUB PROGRAMA	DESCRIPCION	CÓDIGO	APLICA	
				SI	NO
1. Gestión del Proyecto	Subprograma 1,1.	Conformación grupo de gestión social y ambiental.	(DAGA-1.1-01).	X	
	Subprograma 1,2.	Capacitación y concienciación al personal de obra.	(DAGA-1.2-02).	X	
	Subprograma 1,3.	Cumplimiento de requerimientos legales	(DAGA-1.3–03).	X	
2. Manejo de las actividades constructivas	Subprograma 2,1.	Manejo integral de materiales de construcción.	(PAC-2.1-04).	X	
	Subprograma 2,2.	Señalización manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	(PAC-2.3-06).	X	
	Subprograma 2,3.	Manejo integral de residuos generados en actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.	(PAC-2.5-08).	X	

A continuación, se relaciona la trazabilidad de la correspondencia enviada, tanto a la Junta de Acción Comunal del Convenio, como los diferentes los requerimientos solicitados por el INVIAS en relación a la Gestión y Cierre Ambiental del Convenio No.4490 de 2023.

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
CORRESPONDENCIA ENVIADA			

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
1	5/09/2024	TIC-INVIAS-1631-157	Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
2	11/09/2024	TIC-INVIAS-1631-161	Revisión de documentos a Títulos Mineros y ambientales.
3	5/10/2024	TIC-INVIAS-1631-172	Solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA propuesto por cada proyecto.
4	15/10/2024	TIC-INVIAS-1631-190	Remisión de la Gestión Inicial correspondiente al Convenio Solidario No.4490 de 2023. Vereda Órganos del Municipio de Sucre. Radicado INVIAS: 2024E-VUVRAZ-102057 del 16 de octubre de 2024.
5	2/10/2024	TIC-INVIAS-1631-182	Tercera reiteración de la presentación de información Ambiental, para el Inicio de Obras.
7	2/11/2024	TIC-INVIAS-1631-211	Reiteración a solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA del Proyecto, para dar cierre ambiental del Proyecto.
8	24/12/2024	TIC-INVIAS-1631-255	Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
9	05/11/2024	2024S-VBOG-081870	Respuesta oficio TIC-INVIAS-1631-190 con radicado INVIAS No 2024E-VUVRAZ-102057 con fecha del 16/10/2024. Gestión Inicial correspondiente al Convenio Solidario No. 4490-2023.
10	05/11/2024	2024S-VBOG-081870	Respuesta oficio TIC-INVIAS-1631-209 con radicado INVIAS No.2024E-VUVRAZ-111675, recibido el 07/11/2024. Subsanación a las observaciones señaladas en el oficio No.2024S-VBOG-081870, Relacionada con la Gestión Inicial del Convenio Solidario No. 4490-2023. Aval de la Gestión Inicial del Convenio.

A continuación, se relaciona los permisos y/o autorizaciones para el normal desarrollo del Convenio.

1) Se realizaron las debidas capacitaciones propuestas en el PMA del Convenio, en las cuales se trataron temas relacionados con el componente ambiental, especialmente en el manejo ambiental de los residuos sólidos comunes y especiales, en el manejo de los materiales, los cuales deben estar bien ubicados y acordonados, así mismo, estos deben

ser cubiertos para evitar la contaminación por aire y lluvias.

2) Paz y salvos de los proveedores de materiales de construcción, quienes cuentan con las autorizaciones para la explotación de materiales pétreos.
Proveedor No.1. TECNOCONSTRUCTORES LIMITADA, identificada con Nit. 804.003.612-8.

3). La secretaria de Planeación del Municipio de Sucre (Santander), fue la encargada del manejo de Residuos comunes y especiales generados en el proyecto.

4) Las obras fueron debidamente señalizadas y aisladas. El agua, fue suministrada mediante la captación de agua, suministrada por el sr. SENÉN QUIROGA PEÑA, quien cuenta con permiso de Concesión de aguas, autorizado por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS. Para estas actividades se cuenta con las debidas autorizaciones y paz y salvo a la terminación de la obra.

5). El Convenio realizó la implementación del PMA, en el desarrollo de las actividades constructivas del Convenio.

6). Para la Disposición de las excavaciones generadas en las actividades de construcción de las obras, estas fueron ubicadas en el predio del Señor JORGE ALIRIO BAREÑO MATEUS, quien autorizo a la JAC de la Vereda Órganos, para disponer el material de excavación y así mismo, expidió certificado de paz y salvo, por todo concepto a la JAC. Se anexa copia de paz y salvo.

7). La JAC de la Vereda de Órganos, realiza la solicitud del Paz y Salvo ante CAS, en el cual se certificará que el convenio no presenta PASIVOS AMBIENTALES pendientes.

8) El Convenio No.4490 de 2023, cumplió con la implementación de las medidas ambientales propuestas en el PMA, presentado el 16/10/2024, mediante radicado TIC-INVIAS-1631-190, ante el INVIAS para le gestión inicial del convenio

9) Mediante radicado No.2024S-VBOG-087322 del 21 de noviembre de 2024, la Subdirección de Sostenibilidad – INVIAS, avala la documentación presentada en la etapa inicial para dar inicio al desarrollo del Convenio No.4490 de 2023.

10) Se está a la espera de la certificación y/o Paz y Salvo, emitido por la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, solicitud realizada por la JAC.

11) Esta Interventoría, está a la espera de que la JAC de la Vereda Órganos realice la radicación de la documentación inherente al BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, para dar cierre ambiental al Convenio.

Junta de Acción Comunal Vereda Gualilo

Para esta Junta no se ejecutaron actividades Gestión Social ya que no se ejecutó el Proyecto, en vista de que no se viabilizó.

Junta de Acción Comunal Vereda Berlín

La Interventoría realizó el seguimiento a la gestión ambiental del Convenio No.3753 de 2023.

El seguimiento a los programas y proyectos del plan de manejo ambiental, se realiza de acuerdo a la Guía Ambiental proyectos de infraestructura – PAGA modo carretero. A continuación, se relacionan los programas y proyectos ambientales, objeto de seguimiento por parte de la Interventoría:

PROGRAMAS	SUB PROGRAMA	DESCRIPCION	CÓDIGO	APLICA	
				SI	NO
1. Gestión del Proyecto	Subprograma 1,1.	Conformación grupo de gestión social y ambiental.	(DAGA-1.1-01).	X	
	Subprograma 1,2.	Capacitación y concienciación al personal de obra.	(DAGA-1.2-02).	X	
	Subprograma 1,3.	Cumplimiento de requerimientos legales	(DAGA-1.3–03).	X	
2. Manejo de las actividades constructivas	Subprograma 2,1.	Manejo integral de materiales de construcción.	(PAC-2.1-04).	X	
	Subprograma 2,2.	Señalización manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	(PAC-2.3-06).	X	
	Subprograma 2,3.	Manejo integral de residuos generados en	(PAC-2.5-08).		

PROGRAMAS	SUB PROGRAMA	DESCRIPCION	CÓDIGO	APLICA	
				SI	NO
		actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.		X	

A continuación, se relaciona la trazabilidad de la correspondencia enviada, tanto a la Junta de Acción Comunal del Convenio, como los diferentes los requerimientos solicitados por el INVIAS en relación a la Gestión y Cierre Ambiental del Convenio No.3753 de 2023.

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
1	5/09/2024	TIC-INVIAS-1631-157	Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
2	11/09/2024	TIC-INVIAS-1631-161	Revisión de documentos a Títulos Mineros y ambientales.
3	5/10/2024	TIC-INVIAS-1631-172	Solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA propuesto por cada proyecto.
4	11/10/2024	TIC-INVIAS-1631-177	Remisión de la Gestión Inicial correspondiente al Convenio Solidario No.3753 de 2023. Vereda Berlín del Municipio de La Belleza.
5	2/10/2024	TIC-INVIAS-1631-182	Tercera reiteración de la presentación de información Ambiental, para el Inicio de Obras.
6	5/11/2024	TIC-INVIAS-1631-206	Respuesta a Radicado INVIAS 2024S-VBOG-079235. Gestión Inicial Convenio No.3753 de 2023 - Vereda Berlín.
7	2/11/2024	TIC-INVIAS-1631-211	Reiteración a solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA del Proyecto, para dar cierre ambiental del Proyecto.
8	24/12/2024	TIC-INVIAS-1631-255	Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.

A continuación, se relaciona los permisos y/o autorizaciones para el normal desarrollo del Convenio.

1). Se realizaron las debidas capacitaciones propuestas en el PMA del Convenio, en las cuales se trataron temas relacionados con el componente ambiental, especialmente en el manejo ambiental de los residuos sólidos comunes y especiales, en el manejo de los materiales, los cuales deben estar bien ubicados y acordonados, así mismo, estos deben

ser cubiertos para evitar la contaminación por aire y lluvias.

2). Licencia minero-ambiental para la explotación de materiales pétreos. Proveedor denominado ALIRIO TELLEZ PEÑA, Resolución No. 396 del 24 de junio de 2014. Por la cual se delimita un área de Reserva Especial en el municipio de la Belleza en el departamento de Santander. NIT: 91.300.842. Se adjunta a este informe el certificado de paz y salvo emitido por el representante legal.

3). Empresa autorizada por Administración Pública Cooperativa Acueducto, Aseo y Alcantarillado del Municipio de la Belleza (Santander), fue la encargada del manejo de Residuos comunes y especiales generados en el proyecto.

4). Las obras fueron debidamente señalizadas y aisladas. El agua, fue suministrada mediante la captación de agua lluvia, suministrada por el sr. Lisímaco Ariza, quien cuenta con un sistema rudimentario en su vivienda para la recolección del agua lluvia. Para estas actividades se cuenta con las debidas autorizaciones y paz y salvo a la terminación de la obra.

5). Para la Disposición de las excavaciones generadas en las actividades de construcción de las obras, estas fueron ubicadas en el predio del Señor CARLOS NORBEY CLAVIJO VELASCO, quien autorizo a la JAC de la Vereda Berlín, para disponer el material de excavación y así mismo, expidió certificado de paz y salvo, por todo concepto a la JAC. Se anexa copia del paz y salvo.

6). La JAC de la Vereda de Berlín, realiza la solicitud del Paz y Salvo ante CAS, en el cual se certificará que el convenio no presenta PASIVOS AMBIENTALES pendientes

7) El Convenio No.3753 de 2023, cumplió con las medidas ambientales propuestas en el PMA, presentado el 11/10/2024, mediante radicado TIC-INVIAS-1631-177, ante el INVIAS para le gestión inicial del convenio.

8) Se está a la espera de la certificación y/o Paz y Salvo emitido por la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, solicitud realizada el 07 de enero de 2025.

9) La Interventoría, se encuentra la espera de que la JAC de la Vereda Berlín realice la radicación de la documentación inherente al BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, para dar cierre ambiental al Convenio.

Junta de Acción Comunal Vereda Cachipayal

La Interventoría realizó el seguimiento a la gestión ambiental del Convenio No. 4175 de 2023, cuyo objetivo es: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Cachipayal del Municipio de la Belleza, en el Departamento de Santander, para el Mejoramiento Vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

El seguimiento a los programas y proyectos del plan de manejo ambiental, se realiza de acuerdo a la Guía Ambiental proyectos de infraestructura – PAGA modo carretero. A continuación, se relacionan los programas y proyectos ambientales, objeto de seguimiento por parte de la Interventoría:

PROGRAMAS	SUB PROGRAMA	DESCRIPCION	CÓDIGO	APLICA	
				SI	NO
1. Gestión del Proyecto	Subprograma 1,1.	Conformación grupo de gestión social y ambiental.	(DAGA-1.1-01).	X	
	Subprograma 1,2.	Capacitación y concienciación al personal de obra.	(DAGA-1.2-02).	X	
	Subprograma 1,3.	Cumplimiento de requerimientos legales	(DAGA-1.3–03).	X	
2. Manejo de las actividades constructivas	Subprograma 2,1.	Manejo integral de materiales de construcción.	(PAC-2.1-04).	X	
	Subprograma 2,2.	Señalización manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	(PAC-2.3-06).	X	
	Subprograma 2,3.	Manejo integral de residuos generados en actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.	(PAC-2.5-08).	X	

A continuación, se relaciona la trazabilidad de la correspondencia enviada, tanto a la Junta de Acción Comunal del Convenio, como los diferentes los requerimientos solicitados por el INVIAS en relación a la Gestión y Cierre Ambiental del Convenio No.4175 de 2023.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
1	5/09/2024	TIC-INVIAS-1631-157	Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
2	11/09/2024	TIC-INVIAS-1631-161	Revisión de documentos a Títulos Mineros y ambientales.
3	2/10/2024	TIC-INVIAS-1631-182	Tercera reiteración de la presentación de información Ambiental, para el Inicio de Obras.
4	5/10/2024	TIC-INVIAS-1631-172	Solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA propuesto por cada proyecto.
5	11/10/2024	TIC-INVIAS-1631-176	Remisión de la Gestión Inicial correspondiente al Convenio Solidario No. 4175-2023 - La Vereda Cachipayal del Municipio de La Belleza.
6	15/10/2024	TIC-INVIAS-1631-191	Alcance oficio TIC-INVIAS-1631-176 del 2024-10-15 - Relacionado con el Plan de Manejo Ambiental Convenio No.4175. Vereda Cachipayal del Municipio de La Belleza.
7	27/09/2024	TIC-INVIAS-1631-180	Solicitud de aprobación de proveedores para el suministro de materiales de construcción en los convenios solidarios suscritos entre INVIAS y los organismos de acción comunal en el marco del Programa Caminos comunitarios de la paz total – lote 2 convenios 3951 de 2023, 4267…
7	15/10/2024	TIC-INVIAS-1631-192	Alcance oficio - Relacionado con el Plan de Manejo Ambiental Convenio No.4175. Vereda Cachipayal del Municipio de La Belleza en la cual se otorga visto bueno y avala a los proveedores propuestos para el suministro de materiales pétreos al convenio mencionado en el asunto
8	2/11/2024	TIC-INVIAS-1631-211	Reiteración a solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA del Proyecto, para dar cierre ambiental del Proyecto.
9	24/12/2024	TIC-INVIAS-1631-255	Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.
10	24/01/2025	TIC-INVIAS-1631-281	Reiteración de la Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.
CORRESPONDENCIA ENVIADA INVIAS			
			Respuesta comunicación del 27 de septiembre de 2024, radicada con número TICINVIAS-1631-180 y radicado No. 2024E-VUVRAZ-095155 del 27/09/2024. Solicitud de aprobación de proveedores para el suministro de materiales de construcción en los convenios solidarios suscritos entre INVIAS y los organismos de acción comunal

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
11	15/10/2024	2024S-VBOG-075012	en el marco del Programa Caminos comunitarios de la paz total – lote.
12	25/10/2005	2024S-VBOG-079236	INVIAS, presenta observaciones a la documentación de la Gestión Inicial del Convenio No. 4175 de 2023.
13	21/11/2024	2024S-VBOG-087310	Respuesta oficio TIC-INVIAS-1631-208 con radicado INVIAS No. 2024E-VUVRAZ-110422, recibido el 05/11/2024. Subsanación a las observaciones señaladas en el oficio No.2024S-VBOG-079236,relacionada con la Gestión Final del Convenio Solidario No. 4175-2023

A continuación, se relaciona los permisos y/o autorizaciones para el normal desarrollo del Convenio.

1). Se realizaron las debidas capacitaciones propuestas en el PMA del Convenio, en las cuales se trataron temas relacionados con el componente ambiental, especialmente en el manejo ambiental de los residuos sólidos comunes y especiales, en el manejo de los materiales, los cuales deben estar bien ubicados y acordonados, así mismo, estos deben ser cubiertos para evitar la contaminación por aire y lluvias.

2). Licencia minero-ambiental para la explotación de materiales pétreos. Proveedor denominado HECTOR ALONSO MORENO QUITIAN, avalado mediante Resolución No. 396 del 24 de junio de 2014. Por la cual se delimita un área de Reserva Especial en el municipio de la Belleza en el departamento de Santander. NIT: 91.300.842.

3). La Administración Pública Cooperativa Acueducto, Aseo y Alcantarillado, fue la encargada del manejo de Residuos comunes y especiales generados en el convenio No.4175 de 2023, autorizado el 01 de octubre de 2024.

4). Las obras fueron debidamente señalizadas y aisladas. El agua, fue suministrada mediante la captación de agua, suministrada por la Junta de Acción Comunal de la Vereda Cachipayal quien cuenta con la adecuación de un sistema de captación de aguas lluvias para uso del convenio en sus actividades de preparación del concreto.

5). Para la Disposición del material producto de las excavaciones generadas en las actividades de construcción de las obras, estas fueron ubicadas en el predio del Señor Ricardo Gaitán Quiroga, quien autorizo a la JAC de la Vereda Cachipayal, para disponer

el material de excavación en su predio, ubicado en la Vereda Cachipayal.

6). El Convenio No.4175 de 2023, cumplió con las medidas ambientales propuestas en el PMA, presentado el 11/10/2024, mediante radicado TIC-INVIAS-1631-176, ante el INVIAS para le gestión inicial del convenio.

7). Se está a la espera de la certificación y/o Paz y Salvo emitido por la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, solicitud que debe ser realizada por la Junta de Acción Comunal de la Vereda Cachipayal.

8). Esta Interventoría, está a la espera de que la JAC de la Vereda Berlín realice la entrega de la documentación y sus evidencias de la implementación del PMA y seguidamente la radicación de la documentación inherente al BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, para dar cierre ambiental al Convenio.

Junta de Acción Comunal Vereda Tubavita

El seguimiento a los programas y proyectos del plan de manejo ambiental, se realiza de acuerdo a la Guía Ambiental proyectos de infraestructura – PAGA modo carretero. A continuación, se relacionan los programas y proyectos ambientales, objeto de seguimiento por parte de la Interventoría:

PROGRAMAS	SUB PROGRAMA	DESCRIPCION	CÓDIGO	APLICA	
				SI	NO
1. Gestión del Proyecto	Subprograma 1,1.	Conformación grupo de gestión social y ambiental.	(DAGA-1.1-01).	X	
	Subprograma 1,2.	Capacitación y concienciación al personal de obra.	(DAGA-1.2-02).	X	
	Subprograma 1,3.	Cumplimiento de requerimientos legales	(DAGA-1.3–03).	X	
2. Manejo de las actividades constructivas	Subprograma 2,1.	Manejo integral de materiales de construcción.	(PAC-2.1-04).	X	
	Subprograma 2,2.	Señalización manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	(PAC-2.3-06).	X	
	Subprograma 2,3.	Manejo integral de residuos generados en actividades de	(PAC-2.5-08).	X	

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

PROGRAMAS	SUB PROGRAMA	DESCRIPCION	CÓDIGO	APLICA	
				SI	NO
		construcción y demolición (RCD) y lodos.			

A continuación, se relaciona la trazabilidad de la correspondencia enviada, tanto a la Junta de Acción Comunal del Convenio, como los diferentes los requerimientos solicitados por el INVIAS en relación a la Gestión y Cierre Ambiental del Convenio No.4357 de 2023.

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
1	5/09/2024	TIC-INVIAS-1631-157	Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
2	11/09/2024	TIC-INVIAS-1631-161	Revisión de documentos a Títulos Mineros y ambientales.
3	2/10/2024	TIC-INVIAS-1631-182	Tercera reiteración de la presentación de información Ambiental, para el Inicio de Obras.
4	5/10/2024	TIC-INVIAS-1631-172	Solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA propuesto por cada proyecto.
5	2/11/2024	TIC-INVIAS-1631-211	Reiteración a solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA del Proyecto, para dar cierre ambiental del Proyecto.
6	20/11/2024	TIC-INVIAS-1631-224	Radicación Gestión Ambiental – PMA - Convenio No. 4357 de 2023 OAC – VEREDA TUBAVITA
7	16/12/2024	TIC-INVIAS-1631-249	Respuesta a Radicado INVIAS2024S-VBOG-092183 del 05 de diciembre de 2024. Convenio No. 4357-2023 – Vereda – Tubavita. Radicado INVIAS No. 2024E-VUVRAZ-117686 del 21/11/ 2024. Con Anexos.
9	24/12/2024	TIC-INVIAS-1631-255	Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.
			Reiteración de la Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
10	23/01/2025	TIC-INVIAS-1631-280	
CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INVIAS			
11	05/12/2024	2024S-VBOG-092183	Requerimiento: Respuesta oficio TIC-INVIAS-1631-224 con radicado INVIAS No. 2024E-VUVRAZ-117686 del 21/11/ 2024. Gestión Inicial del Convenio Solidario No. 4357-2023.

A continuación, se relaciona los permisos y/o autorizaciones para el normal desarrollo del Convenio.

1). Se realizaron las debidas capacitaciones propuestas en el PMA del Convenio, en las cuales se trataron temas relacionados con el componente ambiental, especialmente en el manejo ambiental de los residuos sólidos comunes y especiales, en el manejo de los materiales, los cuales fueron bien ubicados y acordonados, así mismo, estos fueron cubiertos para evitar la contaminación por aire y lluvias. Las obras fueron debidamente señalizadas y aisladas. Ver anexo 1 y registro fotográfico.

2). Licencia minero-ambiental para la explotación de materiales pétreos. Proveedor denominado CALIZAS Y MINERALES, Licencia Ambiental según Resolución No. 932 del 09 de noviembre de 2007 y Contrato Único de Concesión para la explotación de minerales No.1304-15.

3). El agua, fue suministrada mediante la captación de agua lluvia, suministrada por la señora Oliva Vanegas de Angulo, propietaria del predio Rancho Quemado, cuenta con sistema de captación de aguas lluvias que utiliza para diferentes actividades domésticas y agrícolas de su finca, está dispuesta a suministrar el recurso agua, para la preparación de concretos del convenio.

4). Para la Disposición de las excavaciones generadas en las actividades de construcción de las obras, estas fueron ubicadas en el predio del Sr. LEONARDO QUITIAN ARIZA, quien hace parte de la comunidad de la Vereda Tubavita y autorizó a la JAC, para el uso del predio para la disposición del material anteriormente mencionado. Se anexa paz y salvo, emitido por el dueño del predio, en el cual se afirma que se recibe el predio a satisfacción.

5). El Convenio No.4357 de 2023, presentó el 20/11/2024, mediante radicado TIC-INVIAS-1631-224, ante el INVIAS la documentación para le gestión inicial del convenio.

6). Se está a la espera de la certificación y/o Paz y Salvo, emitido por la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, solicitud que debe ser realizada por la junta de Acción Comunal de la Vereda POPOA, en relación al Convenio No.4357 de 2023.

7). Esta Interventoría, está a la espera de que la JAC de la Vereda Tubavita, presente las evidencias de la implementación del PMA y seguidamente realice la radicación de la documentación inherente al BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, para dar cierre ambiental al Convenio.

Junta de Acción Comunal Vereda Gaital

La Interventoría realizó el seguimiento a la gestión ambiental de los contratos del Convenio No.4367-2023, cuyo objeto es: Aunar Esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal Vereda Gaital del Municipio de Vélez en el Departamento de Santander para el Mejoramiento Vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total

El seguimiento a los programas y proyectos del plan de manejo ambiental, se realiza de acuerdo a la Guía Ambiental proyectos de infraestructura – PAGA modo carretero. A continuación, se relacionan cada convenio, sus programas y proyectos ambientales, objeto de seguimiento por parte de la Interventoría:

PROGRAMAS	SUB PROGRAMA	DESCRIPCION	CÓDIGO	APLICA	
				SI	NO
1. Gestión del Proyecto	Subprograma 1,1.	Conformación grupo de gestión social y ambiental.	(DAGA-1.1-01).	X	
	Subprograma 1,2.	Capacitación y concienciación al personal de obra.	(DAGA-1.2-02).	X	
	Subprograma 1,3.	Cumplimiento de requerimientos legales	(DAGA-1.3–03).	X	
2. Manejo de las actividades constructivas	Subprograma 2,1.	Manejo integral de materiales de construcción.	(PAC-2.1-04).	X	

PROGRAMAS	SUB PROGRAMA	DESCRIPCION	CÓDIGO	APLICA	
				SI	NO
	Subprograma 2,2.	Señalización manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	(PAC-2.3-06).	X	
	Subprograma 2,3.	Manejo integral de residuos generados en actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.	(PAC-2.5-08).	X	

A continuación, se relaciona la trazabilidad de la correspondencia enviada, tanto a la Junta de Acción Comunal del Convenio, como los diferentes los requerimientos solicitados por el INVIAS en relación a la Gestión y Cierre Ambiental del Convenio No.4367 de 2023.

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
1	5/09/2024	TIC-INVIAS-1631-157	Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
2	11/09/2024	TIC-INVIAS-1631-161	Revisión de documentos a títulos mineros y ambientales.
3	5/10/2024	TIC-INVIAS-1631-172	Solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA propuesto por cada proyecto.
4	2/10/2024	TIC-INVIAS-1631-182	Tercera reiteración de la presentación de información Ambiental, para el Inicio de Obras.
5	2/11/2024	TIC-INVIAS-1631-211	Reiteración a solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA del Proyecto, para dar cierre ambiental del Proyecto.
6	24/12/2024	TIC-INVIAS-1631-255	Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.
7	03/01/2025	TIC-INVIAS-1631-269	Remisión Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – Convenios No. 4367 de 2023 – OAC VEREDA GAITAL.
10	23/01/2025	TIC-INVIAS-1631-280	Reiteración de la Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.

A continuación, se relaciona los permisos y/o autorizaciones para el normal desarrollo del Convenio.

1). Se realizaron las debidas capacitaciones propuestas en el PMA del Convenio, en las cuales se trataron temas relacionados con el componente ambiental, especialmente en el manejo ambiental de los residuos sólidos comunes y especiales, en el manejo de los materiales, los cuales fueron bien ubicados y acordonados, así mismo, estos fueron cubiertos para evitar la contaminación por aire y lluvias. Anexo 1.

2. Licencia minero-ambiental para la explotación de materiales pétreos. Proveedor denominado CALIZAS Y MINERALES, Licencia Ambiental según Resolución No. 932 del 09 de noviembre de 2007 y Contrato Único de Concesión para la explotación de minerales No.1304-15.

3). Las obras fueron debidamente señalizadas y aisladas. El agua, fue suministrada mediante la captación de agua lluvia, suministrada por el señor JAIRO PINZÓN, Presidente de la JAC, quien cuenta con un sistema rudimentario en su vivienda para la recolección del agua lluvia. Para estas actividades se cuenta con la debida autorización.

4). Para la Disposición de las excavaciones generadas en las actividades de construcción de las obras, fueron ubicadas en vías cercanas o alternas al tramo del convenio, que necesitarán de dicho material para mejoramiento.

5). El Convenio No.4367 de 2023, presentó el 03/01/2025, mediante radicado TIC-INVIAS-1631-269, ante el INVIAS para le gestión inicial del convenio.

6). Se está a la espera que la JAC de la Vereda Gaital, solicite a la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, expida la certificación y/o Paz y Salvo del Convenio.

7). Esta Interventoría está a la espera de que la JAC de la Vereda Gaital, presente el BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, con sus anexos para dar cierre ambiental al convenio.

Junta de Acción Comunal Vereda Tebaida

La Interventoría realizó el seguimiento a la gestión ambiental del Convenio No.4424 de 2023, cuyo objeto es: Aunar Esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Tebaida del Municipio de Vélez, en el Departamento de

Santander, para el Mejoramiento Vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

El seguimiento a los programas y proyectos del plan de manejo ambiental, se realiza de acuerdo a la Guía Ambiental proyectos de infraestructura – PAGA modo carretero. A continuación, se relacionan los programas y proyectos ambientales, objeto de seguimiento por parte de la Interventoría:

PROGRAMAS	SUB PROGRAMA	DESCRIPCION	CÓDIGO	APLICA	
				SI	NO
1. Gestión del Proyecto	Subprograma 1,1.	Conformación grupo de gestión social y ambiental.	(DAGA-1.1-01).	X	
	Subprograma 1,2.	Capacitación y concienciación al personal de obra.	(DAGA-1.2-02).	X	
	Subprograma 1,3.	Cumplimiento de requerimientos legales	(DAGA-1.3–03).	X	
2. Manejo de las actividades constructivas	Subprograma 2,1.	Manejo integral de materiales de construcción.	(PAC-2.1-04).	X	
	Subprograma 2,2.	Señalización manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	(PAC-2.3-06).	X	
	Subprograma 2,3.	Manejo integral de residuos generados en actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.	(PAC-2.5-08).	X	

A continuación, se relaciona la trazabilidad de la correspondencia enviada, tanto a la Junta de Acción Comunal del Convenio, como los diferentes los requerimientos solicitados por el INVIAS en relación a la Gestión y Cierre Ambiental del Convenio No.4424 de 2023.

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
1	5/09/2024	TIC-INVIAS-1631-157	Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
2	11/09/2024	TIC-INVIAS-1631-161	Revisión de documentos a Títulos Mineros y ambientales.
			Tercera reiteración de la presentación de

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
3	2/10/2024	TIC-INVIAS-1631-182	información Ambiental, para el Inicio de Obras.
4	5/10/2024	TIC-INVIAS-1631-172	Solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA propuesto por cada proyecto.
5	02/11/2024	TIC-INVIAS-1631-211	Reiteración a solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA del Proyecto, para dar cierre ambiental del Proyecto.
6	24/12/2024	TIC-INVIAS-1631-255	Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.
7	24/01/2025	TIC-INVIAS-1631-281	Reiteración de la Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.

A continuación, se relaciona los permisos y/o autorizaciones para el normal desarrollo del Convenio.

1). Se realizaron las debidas capacitaciones propuestas en el PMA del Convenio, en las cuales se trataron temas relacionados con el componente ambiental, especialmente en el manejo ambiental de los residuos sólidos comunes y especiales, en el manejo de los materiales, los cuales fueron bien ubicados y acordonados, así mismo, estos fueron cubiertos para evitar la contaminación por aire y lluvias. Las obras fueron debidamente señalizadas y aisladas. Ver anexo 1 y registro fotográfico.

2. Licencia minero-ambiental para la explotación de materiales pétreos. Proveedor denominado CALIZAS Y MINERALES, cuenta con la Licencia Ambiental según Resolución No. 932 del 09 de noviembre de 2007 y Contrato Único de Concesión para la explotación de minerales No.1304-15.

3). El agua, fue suministrada mediante la recolección de aguas lluvia para la preparación de concretos del convenio.

4). Para la Disposición de las excavaciones generadas en las actividades de construcción de las obras, estas fueron ubicadas en el predio del Sr. OSCAR CAMILO DIAZ FONTECHA, quien hace parte de la comunidad de la Vereda Tebaida y autorizó a la JAC, para el uso del predio para la disposición del material anteriormente mencionado.

5). El Convenio No.4424 de 2023, a la fecha no ha presentado la documentación para la gestión inicial del convenio.

6). La solicitud de la certificación y/o Paz y Salvo, emitida por la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, que debe ser realizada por la junta de Acción Comunal de la Vereda POPOA - Convenio No.4767 de 2023, para el cierre ambiental del Convenio.

7). Esta Interventoría, está a la espera de que la JAC de la Vereda Tebaida presente las evidencias de la implementación del PMA y seguidamente realice la radicación de la documentación inherente al BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, para dar cierre ambiental al Convenio.

Junta de Acción Comunal Vereda Popoa

La Interventoría realizó el seguimiento a la gestión ambiental del Convenio No.4767 de 2023, cuyo objeto es: Aunar Esfuerzos Entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Popoa del Municipio de Guavatá, en el Departamento de Santander, para el Mejoramiento Vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total

El seguimiento a los programas y proyectos del plan de manejo ambiental, se realiza de acuerdo a la Guía Ambiental proyectos de infraestructura – PAGA modo carretero. A continuación, se relacionan los programas y proyectos ambientales, objeto de seguimiento por parte de la Interventoría:

PROGRAMAS	SUB PROGRAMA	DESCRIPCION	CÓDIGO	APLICA	
				SI	NO
1. Gestión del Proyecto	Subprograma 1,1.	Conformación grupo de gestión social y ambiental.	(DAGA-1.1-01).	X	
	Subprograma 1,2.	Capacitación y concienciación al personal de obra.	(DAGA-1.2-02).	X	
	Subprograma 1,3.	Cumplimiento de requerimientos legales	(DAGA-1.3–03).	X	
2. Manejo de las actividades constructivas	Subprograma 2,1.	Manejo integral de materiales de construcción.	(PAC-2.1-04).	X	
	Subprograma 2,2.	Señalización manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	(PAC-2.3-06).	X	

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

PROGRAMAS	SUB PROGRAMA	DESCRIPCION	CÓDIGO	APLICA	
				SI	NO
	Subprograma 2,3.	Manejo integral de residuos generados en actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.	(PAC-2.5-08).	X	

A continuación, se relaciona la trazabilidad de la correspondencia enviada, tanto a la Junta de Acción Comunal del Convenio, como los diferentes los requerimientos solicitados por el INVIAS en relación a la Gestión y Cierre Ambiental del Convenio No.4767 de 2023.

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
1	5/09/2024	TIC-INVIAS-1631-157	Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
2	11/09/2024	TIC-INVIAS-1631-161	Revisión de documentos a Títulos Mineros y ambientales.
3	5/10/2024	TIC-INVIAS-1631-172	Solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA propuesto por cada proyecto.
4	08/11/2024	TIC-INVIAS-1631-213	Radicación la Gestión Inicial - Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – Convenios No.4767 de 2023 OAC VEREDA POPOA.
5	2/10/2024	TIC-INVIAS-1631-182	Tercera reiteración de la presentación de información Ambiental, para el Inicio de Obras.
6	2/11/2024	TIC-INVIAS-1631-211	Reiteración a solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA del Proyecto, para dar cierre ambiental del Proyecto.
7	22/11/2024	TIC-INVIAS-1631-232	Respuesta a Radicado INVIAS 2024S-VCAU-086715 del 20 de noviembre de 2024.
8	24/12/2024	TIC-INVIAS-1631-255	Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.
CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INVIAS			

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
9	20/11/2024	2024S-VCAU-086715	Observaciones a la documentación de la Gestión Inicial del Convenio No. No. 4767-2023
10	28/11/2024	2024S-VBOG-089829	Respuesta al oficio TIC-INVIAS-1631-232 con radicado INVIAS No. 2024EVUVRAZ-118549 del 22/11/2024. Respuesta a Radicado INVIAS 2024S-VCAU-086715 del 20 de noviembre de 2024.

A continuación, se relaciona los permisos y/o autorizaciones para el normal desarrollo del Convenio.

1). Se realizaron las debidas capacitaciones propuestas en el PMA del Convenio, en las cuales se trataron temas relacionados con el componente ambiental, especialmente en el manejo ambiental de los residuos sólidos comunes y especiales, en el manejo de los materiales, los cuales fueron bien ubicados y acordonados, así mismo, estos fueron cubiertos para evitar la contaminación por aire y lluvias. Las obras fueron debidamente señalizadas y aisladas.

2) Licencia minero-ambiental para la explotación de materiales pétreos. Proveedor denominado CALIZAS Y MINERALES, Licencia Ambiental según Resolución No. 932 del 09 de noviembre de 2007 y Contrato Único de Concesión para la explotación de minerales No.1304-15.

3) La Secretaría de Infraestructura del Municipio de Guavatá – Santander, fue la encargada del manejo de Residuos comunes y especiales generados en el proyecto, mediante autorización emitida para el Convenio No.4767 de 2023.

4) El agua, fue suministrada mediante la captación de agua lluvia, suministrada por la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POPOA, quien cuenta con un sistema rudimentario para la recolección del agua lluvia. Para estas actividades se cuenta con la debida autorización de la Presidente de la JAC, la señora ADRIANA GERENA GONZALEZ.

5) Para la Disposición de las excavaciones generadas en las actividades de construcción de las obras, estas fueron ubicadas en vías alternas o cercanas al gramo a intervenir por el convenio, esta actividad fue autorizada por la Secretaría de Infraestructura del

Municipio de Guavatá Santander.

6) El Convenio No.4767 de 2023, presentó el 08/11/2024, mediante radicado TIC-INVIAS-1631-213, ante el INVIAS la documentación para le gestión inicial del convenio.

7) Se está a la espera de la certificación y/o Paz y Salvo, emitido por la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, solicitud que debe ser realizada por la junta de Acción Comunal de la Vereda POPOA, en relación al Convenio No.4767 de 2023.

8) Esta Interventoría, está a la espera de que la JAC de la Vereda POPOA, realice la radicación de la documentación inherente al BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, para dar cierre ambiental al Convenio.

Junta de Acción Comunal Vereda La Unión

La Interventoría realizó el seguimiento a la gestión ambiental de los contratos del Convenio No. 4478-2023, cuyo objeto es: Aunar Esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal Vereda La Unión del Municipio de Guavatá en el Departamento de Santander para el Mejoramiento Vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total

El seguimiento a los programas y proyectos del plan de manejo ambiental, se realiza de acuerdo a la Guía Ambiental proyectos de infraestructura – PAGA modo carretero. A continuación, se relacionan cada convenio, sus programas y proyectos ambientales, objeto de seguimiento por parte de la Interventoría:

PROGRAMAS	SUB PROGRAMA	DESCRIPCION	CÓDIGO	APLICA	
				SI	NO
1. Gestión del Proyecto	Subprograma 1,1.	Conformación grupo de gestión social y ambiental.	(DAGA-1.1-01).	X	
	Subprograma 1,2.	Capacitación y concienciación al personal de obra.	(DAGA-1.2-02).	X	
	Subprograma 1,3.	Cumplimiento de requerimientos legales	(DAGA-1.3–03).	X	
2. Manejo de las	Subprograma 2,1.	Manejo integral de	(PAC-2.1-04).	X	

PROGRAMAS	SUB PROGRAMA	DESCRIPCION	CÓDIGO	APLICA	
				SI	NO
actividades constructivas		materiales de construcción.			
	Subprograma 2,2.	Señalización manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	(PAC-2.3-06).	X	
	Subprograma 2,3.	Manejo integral de residuos generados en actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.	(PAC-2.5-08).	X	

A continuación, se relaciona la trazabilidad de la correspondencia enviada, tanto a la Junta de Acción Comunal del Convenio, como los diferentes los requerimientos solicitados por el INVIAS en relación a la Gestión y Cierre Ambiental del Convenio No.4478 de 2023.

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
1	5/09/2024	TIC-INVIAS-1631-157	Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
2	11/09/2024	TIC-INVIAS-1631-161	Revisión de documentos a títulos mineros y ambientales.
3	5/10/2024	TIC-INVIAS-1631-172	Solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA propuesto por cada proyecto.
4	2/10/2024	TIC-INVIAS-1631-182	Tercera reiteración de la presentación de información Ambiental, para el Inicio de Obras.
5	2/11/2024	TIC-INVIAS-1631-211	Reiteración a solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA del Proyecto, para dar cierre ambiental del Proyecto.
6	07/11/2024	TIC-INVIAS-1631-225	Radicación ante el INVIAS de la Documentación correspondiente a la Gestión Ambiental Inicial del Convenio No.4478 - Vereda La Unión.
7	13/12/2024	TIC INVIAS 1631 246	Respuesta a Radicado INVIAS 2024S-VBOG-

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
			092184 del 05 de diciembre de 2024.
8	24/12/2024	TIC-INVIAS-1631-255	Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.
9	23/01/2025	TIC-INVIAS-1631-280	Reiteración de la Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra
CORRESPONDENCIA RECIBIDA - INVIAS			
10	05/12/2024	2024S-VBOG-092184	INVIAS, presenta observaciones a Respuesta oficio TIC-INVIAS-1631-225. Relacionado con el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – Convenios No. 4478 de 2023 OAC La Unión.

A continuación, se relaciona los permisos y/o autorizaciones para el normal desarrollo del Convenio.

1) Para el suministro de materiales pétreos el Convenio, contó con un proveedor que cuenta con Licencia minero-ambiental para la explotación de materiales pétreos. Proveedor denominado CALIZAS Y MINERALES, Licencia Ambiental según Resolución No. 932 del 09 de noviembre de 2007 y Contrato Único de Concesión para la explotación de minerales No.1304-15.

2). Las obras fueron debidamente señalizadas y aisladas. El agua, fue suministrada mediante la captación de agua lluvia, suministrada por el señor YAMID ARDILA MARÍN, quien cuenta con un sistema rudimentario en su vivienda para la recolección del agua lluvia. Para estas actividades se cuenta con la debida autorización.

3). Para la Disposición de las excavaciones generadas en las actividades de construcción de las obras, fueron ubicadas a lo largo de las vías alternas y/o cercanas al tramo del convenio, esta actividad fue autorizada por la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Guavatá Santander

4). Los residuos sólidos comunes y especiales, tales como las bolsas de cemento, fueron manejados por la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Guavatá Santander, quien autorizó a la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Unión a llevar los residuos al sitio

de disposición que tiene el municipio para el manejo de los residuos domiciliarios.

5) El Convenio No.4478 de 2023, presentó el 07/11/2024, mediante radicado TIC-INVIAS-1631-225, ante el INVIAS para le gestión inicial del convenio.

6) Se está a la espera que la JAC de la Vereda La Unión solicite a la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, expida la certificación y/o Paz y Salvo del Convenio.

7) Esta Interventoría está a la espera de que la JAC de la Vereda La Unión, presente el BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, con sus anexos para dar cierre ambiental al convenio.

Junta de Acción Comunal Vereda Guamal

La Interventoría realizó el seguimiento a la gestión ambiental del Convenio No. 3951 de 2023.

El seguimiento a los programas y proyectos del plan de manejo ambiental, se realiza de acuerdo a la Guía Ambiental proyectos de infraestructura – PAGA modo carretero. A continuación, se relacionan los programas y proyectos ambientales, objeto de seguimiento por parte de la Interventoría:

PROGRAMAS	SUB PROGRAMA	DESCRIPCION	CÓDIGO	APLICA	
				SI	NO
1. Gestión del Proyecto	Subprograma 1,1.	Conformación grupo de gestión social y ambiental.	(DAGA-1.1-01).	X	
	Subprograma 1,2.	Capacitación y concienciación al personal de obra.	(DAGA-1.2-02).	X	
	Subprograma 1,3.	Cumplimiento de requerimientos legales	(DAGA-1.3–03).	X	
2. Manejo de las actividades constructivas	Subprograma 2,1.	Manejo integral de materiales de construcción.	(PAC-2.1-04).	X	
	Subprograma 2,2.	Señalización manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	(PAC-2.3-06).	X	

PROGRAMAS	SUB PROGRAMA	DESCRIPCION	CÓDIGO	APLICA	
				SI	NO
	Subprograma 2,3.	Manejo integral de residuos generados en actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.	(PAC-2.5-08).	X	

A continuación, se relaciona la trazabilidad de la correspondencia enviada, tanto a la Junta de Acción Comunal del Convenio, como los diferentes los requerimientos solicitados por el INVIAS en relación a la Gestión y Cierre Ambiental del Convenio No.3951 de 2023.

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
1	5/09/2024	TIC-INVIAS-1631-157	Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
2	11/09/2024	TIC-INVIAS-1631-161	Revisión de documentos a Títulos Mineros y ambientales.
3	5/10/2024	TIC-INVIAS-1631-172	Solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA propuesto por cada proyecto.
4	15/10/2024	TIC-INVIAS-1631-233	Radicación de la La Gestión Ambiental Inicial del Convenio No. 3951 de 2023 OAC. - Plan de Adaptación de la Guía Ambiental. Vereda Guamal del Municipio de Bolívar. **Radicado INVIAS:** 2024E-VUVRAZ-119820 del 26/11/2024.
5	2/10/2024	TIC-INVIAS-1631-182	Tercera reiteración de la presentación de información Ambiental, para el Inicio de Obras.
7	2/11/2024	TIC-INVIAS-1631-211	Reiteración a solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA del Proyecto, para dar cierre ambiental del Proyecto.
8	24/12/2024	TIC-INVIAS-1631-255	Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.

A continuación, se relaciona los permisos y/o autorizaciones para el normal desarrollo del Convenio.

1). Se realizaron las debidas capacitaciones propuestas en el PMA del Convenio, en las cuales se trataron temas relacionados con el componente ambiental, especialmente en el manejo ambiental de los residuos sólidos comunes y especiales, en el manejo de los materiales, los cuales deben estar bien ubicados y acordonados, así mismo, estos deben ser cubiertos para evitar la contaminación por aire y lluvias.

2) El Convenio contó con los proveedores de materiales de construcción, quienes cuentan con las autorizaciones ambientales para la explotación de materiales pétreos. Proveedor No.1. MACOINTH SAS, identificada con Nit. 900.451538 -1. Licencia ambiental No.0941 del 09 de noviembre de 2007.

3). La Administración Cooperativa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo “Aguas de Bolívar” - ACUABOL, fue la encargada del manejo de Residuos comunes y especiales generados en el convenio No.3951 de 2023.

4). Las obras fueron debidamente señalizadas y aisladas. El agua, fue suministrada mediante la captación de agua, suministrada por la Junta de Acción Comunal de la Vereda Guamal, quien cuenta con permiso de Concesión de aguas, autorizado por la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, mediante Resolución No.0328-20 del 30 de octubre de 2020.

5). El Convenio realizó la implementación del PMA, en el desarrollo de las actividades constructivas del Convenio.

6). Para la Disposición de las excavaciones generadas en las actividades de construcción de las obras, estas fueron ubicadas en el predio del Señor GUIDO ORLANDO QUIROGA, quien autorizo a la JAC de la Vereda Guamal, para disponer el material de excavación en su predio, ubicado en la Vereda Guamal.

7) El Convenio No.3951 de 2023, cumplió con la implementación de las medidas ambientales propuestas en el PMA, presentado el 26/11/2024, mediante radicado TIC-

INVIAS-1631-233, ante el INVIAS para le gestión inicial del convenio.

8) Se está a la espera que la Junta de Acción Comunal de la Vereda Guamal, radique ante la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, solicitud del paz y salvo o certificación de NO PASIVOS AMBIENTALES del Convenio 3951 de 2023.

9) La Interventoría, se encuentra a la espera de que la JAC de la Vereda Guamal realice la radicación de la documentación inherente al BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, para dar cierre ambiental al Convenio.

Informes del programa anual de caja (INTERVENTORÍA)

Realizando el control y evaluación de la programación mensual de los recursos a ejecutar en el presente convenio solidario y para el contrato de interventoría, se realiza comparación con la ejecución mensual para el presente mes.

INFORMACIÓN PRESPUESTAL - PAC (MES ENERO 2025)			
PERÍODO	**VALOR CONTRATADO (ACTUALIZADO)**	**VALOR EJECUTADO MES**	**% EJECUTADO**
MES JUNIO	**$535.408.180**	$33.209.925,0	6,20%
MES JULIO		$54.144.881,0	10,11%
MES AGOSTO		$70.866.404,0	13,24%
MES SEPTIEMBRE		$61.443.222,4	11,48%
MES OCTUBRE		$91.534.800,0	17,10%
MES NOVIEMBRE		$104.320.160,0	19,48%
MES DICIEMBRE		$97.164.547,2	18,15%
MES ENERO		$22.724.240,4	4,24%
Total, Inversión ACUMULADA		**$535.408.180,0**	100,00%

TABLA 12 Informe presupuestal PAC.

Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES – 2024

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

Informes matrices de riesgo.

En el presente período, se realizó seguimiento y verificación.

No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	AFECTA LA EJECUCION DEL CONVENIO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
					INVIAS	JAC					
1	Riesgo Económico	**Desabastecimiento de materias primas e insumos.** Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del convenio, se presenten limitaciones a la consecución de materia primas e insumos de las fuentes de suministros previstas o por el retiro del mercado por parte de sus productores.	Retrasos de las Obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos a la JAC	Riesgo Bajo		X	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia	Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna.	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	Al inicio de la ejecución del convenio	A la terminación de la ejecución del convenio
2	Riesgo Económico	**Variación de precios durante la ejecución del convenio.** Se refiere a la posibilidad de que los precios del Formulario 1 - Presupuesto oficial sean influenciados con alzas en el mercado.	Afectación al equilibrio económico del convenio	Riesgo Bajo	X	X	Durante la etapa de ejecución se validará por la Interventoría y la Supervisión del convenio el alza en los precios para tomar las medidas correctivas pertinentes.	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	Al inicio de la ejecución del convenio	A la terminación de la ejecución del convenio

3	Riesgo Operacional - Social	**Cambio en la ubicación de las obras menores.** Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras herramientas legales.	Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto.	Riesgo Bajo	X	X	Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del convenio, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	Al inicio de la ejecución del convenio	A la terminación de la ejecución del convenio
4	Riesgo Sociales o Políticos	**Orden público:** Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras.	Posible pérdida de Bienes de la JAC, daños en obras del proyecto, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución de las obras.	Riesgo Alto	X	X	Es responsabilidad de la JAC junto con la Interventoría, únicamente de Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del convenio. El INVIAS de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del convenio. La JAC e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para en tal caso superar los atrasos.	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento

5	Riesgo Operacional	**Accidentalidad:** Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte de la JAC.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra, inconformidad con la obra por parte de los usuarios de la vía.	Riesgo Alto		**X**	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	Al inicio de la ejecución del convenio	A la terminación de la ejecución del convenio
6	Riesgo Operacional	**Variación de las actividades y cantidades de obra por revisión y aplicación de la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructuras Viales del INVIAS por la JAC:** Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios resultados de la aplicación de la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructuras Viales del INVIAS necesaria para la correcta ejecución y operación de las obras.	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del convenio y por ende las actividades y las cantidades de obra.	Riesgo Medio	**X**	**X**	Realizar una interventoría adecuada durante la etapa revisión y aplicación de la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructuras Viales del INVIAS para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en la revisión y aplicación de la cartilla.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	al inicio de la revisión y aplicación de la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructuras Viales del INVIAS	al final de la revisión y aplicación de la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructuras Viales del INVIAS
8	Riesgo Operacional	**Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o** por deficiente programación de ejecución de las obras.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	Riesgo Bajo		**X**	Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras no autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	Al inicio de la ejecución del convenio	A la terminación de la ejecución del convenio

9	Riesgo Operacional	**Variación de cantidades de obra debidamente justificadas:** Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. INVIAS asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y la JAC asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual.	Riesgo Medio	**X**	**X**	Seguimiento por la Supervisión e Interventoría en la fase revisión y aplicación de la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructuras Viales del INVIAS	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	al inicio de la revisión y aplicación de la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructuras Viales del INVIAS	al final de la revisión y aplicación de la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructuras Viales del INVIAS
10	Riesgo Operacional	**Requerimiento de mayor tiempo en la etapa de ejecución de las obras** por efectos de la existencia de dificultades técnicas no imputables a la JAC para la construcción de obras; la JAC debe ejecutar las actividades y obras necesarias de acuerdo a los valores presentados en el Formulario No. 1 Presupuesto oficial, y el INVIAS ajustará las condiciones del plazo.	Retraso en el plazo de ejecución del convenio y el aumento en los costos administrativos del convenio.	Riesgo Alto	**X**	**X**	Seguimiento permanente por parte de la Interventoría y la Supervisión al cumplimiento en la etapa de construcción	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	Al inicio de la ejecución del convenio.	A la terminación de la ejecución del convenio
11	Riesgo Operacional	**Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales y/o Lugares de disposición de sobrantes, presentados y/o propuestos y/o proyectados por la JAC**. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo para las fuentes de materiales y/o para los lugares de disposición de sobrantes.	Impacto económico, social y ambiental para la ejecución del convenio.	Riesgo Alto	**X**	**X**	Ajuste a las distancias estimadas inicialmente por el INVIAS con base en la información recogida en la zona de ejecución con acompañamiento de la Interventoría y la Supervisión.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del convenio

12	Riesgo Operacional	**Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes:** Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. La JAC deberá realizar todas las gestiones que correspondan. EL INVIAS asumirá los costos que correspondan de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 1682 de 2013	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto	Riesgo Bajo	**X**	**X**	Desde la Fase Precontractual y en la etapa contractual solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	Fase precontractual, y cuando se detecte la existencia de redes de servicio público que interfieran con el proyecto	cuando se solucione la interferencia de las redes de servicio público existentes
13	Riesgo Financiero-Administrativo	**Riesgo Administrativo:** Se deriva de los efectos provenientes de la mayor permanencia del personal calificado y así como todos los gastos descritos en la administración que exceden el plazo inicial del convenio que puedan afectar el presupuesto del convenio.	Impacto negativo por el aumento de los costos en la ejecución del convenio.	Riesgo Alto	**X**	**X**	Realizar por parte de L JAC proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, anexo técnico y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor JAC	Al inicio de la ejecución del convenio	A la terminación del convenio
14	Riesgo Regulatorio	**Expedición y/o modificación de normas:** Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la firma del convenio, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del convenio previsto con la normatividad existente.	Riesgo Bajo	**X**	**X**	Proceder de acuerdo a las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior a la firma del convenio, que afecten el normal desarrollo de este, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor- JAC	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el convenio	A la terminación del convenio
15	Riesgo Ambiental	**Gestión Ambiental:** Demora en la obtención de permisos ambientales por demora y/o inadecuada presentación de soportes y estudios.	Retraso en la Ejecución de los trabajos	Riesgo Bajo		**X**	Seguimiento por parte del Interventor a la gestión documentada de JAC para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-JAC	Al inicio de la ejecución del convenio	Una vez obtenida la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales

16	Riesgo Ambiental	**Pasivos Ambientales:** Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.	Impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto	Riesgo Bajo		**X**	Seguimiento por parte del Interventor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de Especialistas Ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. Seguimiento por parte de la Subdirección de Sostenibilidad. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-JAC	Al inicio de la ejecución del convenio	A la terminación del convenio
17	Riesgo Social	**Manifestación Social**: Se refiere a la posibilidad de que la Comunidad presente inconformidades frente a la construcción y puesta en servicio del proyecto. Riesgo asociado a los procesos de Gestión Social que realice la JAC y que estén en cabeza de esta.	Inconformidad de la comunidad en proceso de Gestión Social por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra.	Riesgo Bajo		**X**	Seguimiento de la Interventoría y la Supervisión de todos los protocolos y procesos de Gestión Social de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior, cuando sea requerido.	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor-JAC	Al inicio de la ejecución del convenio	A la liquidación del convenio con el cierre ambiental

18	Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor asegurable**. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad de la JAC. Riesgo que asume la JAC. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de INVIAS.	Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes de la JAC	Riesgo Medio		**X**	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de fenómenos naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes de la JAC, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.	SI	JAC	Etapa precontractual	Una vez instalado la JAC en el proyecto e implementado el plan de seguridad industrial con las debidas revisiones.
19	Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor no asegurable.** Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros. Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación ó de la JAC, cambios en las obras por necesidad de ajustar la intervención .	Riesgo Medio	**X**	**X**	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendientes a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con INVIAS el tratamiento contractual al proyecto	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor-JAC	Etapa precontractual	A la terminación del convenio

20	Riesgos de la Salud	**Presencia de Riesgos Biológicos.** Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del convenio, los colaboradores de la JAC, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	Riesgo Alto		**X**	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud.	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor-JAC	Al inicio de la ejecución del convenio	A la terminación del convenio
21	Riesgos de la Salud	**Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal.** Se refiere a la posibilidad de que la JAC no disponga o suministre a sus colaboradores y demás, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Biológico.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos	Riesgo Medio		**X**	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad en lo atinente a los EPP y la de riesgo biológico.	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor-JAC	Al inicio de la ejecución del convenio y de manera permanente.	A la terminación del convenio
22	Riesgos de Corrupción	**Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras.** Se refiere a la posibilidad de que la JAC, la Interventoría y los funcionarios del Invias, promuevan y/o participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros, facturación, calidad y cantidad de materiales e insumos y obras sin justificar.	Graves daños Institucionales. Daño a la reputación de las entidades participantes, pérdida de recursos y daños sociales.	Riesgo Alto	**X**	**X**	Socialización e inspecciones visuales con la comunidad de los recursos desembolsados contra las obras en ejecución. Un manejo de cuenta conjunto. Cheques a primer beneficiario. Pagos contra facturas. Informes semanales de avances de obras. Denuncias en tiempo real de acciones fraudulentas.	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor-JAC, Ciudadanía	Al inicio de la ejecución del convenio	A la terminación del convenio

TABLA 13 Fuente: Pliego de condiciones proceso CMA-DEO-SVR-CCPT-010-2024

REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

1.2.17 Equipo y vehículos contrato de interventoría.

Durante el presente periodo la interventoría dispuso de vehículo para el transporte de personal en visitas y reuniones en la obra, la información el vehículo cumple con las especificaciones que exige el INVIAS en el marco del contrato de interventoría, así mismo se anexa documento MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

1.2.18 Personal control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.

El control de personal para el presente mes arroja que ***TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S***. a la fecha tiene un total de seis (6) personas empleadas de las cuales seis (6) son empleos directos, a continuación, se presenta la tabla para información del personal.

N°	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD CONTRATANTE
1	79.343.910	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Interventoría
2	13.718.760	JAIME CHACÓN DURÁN	RESIDENTE 1 DE INTERVENTORÍA	Interventoría
6	79,683,578	FABIAN TAFUR SANCHEZ	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VIAS	Interventoría
7	4,168,408	CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	Interventoría
12	1.101.753.108	ALDEMAR PARRA DIAZ	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	Interventoría
13	1.101.752.433	ADRANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA	TOPÓGRAFA	Interventoría

TABLA 14 Personal de interventoría.
Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. – 2024

En el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA,* muestra el control y los documentos pertinentes al personal de interventoría.

1.2.19 Información financiera y presupuestal contrato de interventoría.

En el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT, se* muestra el control presupuestal de la ejecución del contrato de interventoría.

1.2.20 Seguimiento garantías contrato de interventoría.

Se realiza seguimiento a las garantías y seguros del contrato de interventoría, a la fecha del presente informe ha transcurrido un periodo inicial desde el 27 de mayo de 2024 fecha del acta de inicio, en ese orden en la siguiente tabla se registra en resumen las garantías y seguros que amparan a la entidad INVIAS en el marco del presente contrato de interventoría.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. –ANEXO 12 1631			
POLIZA	No	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	33-44-101249469	08/05/2024	31/07/2025
Buen manejo y correcta y correcta inversión del anticipo	33-44-101249469	08/05/2024	31/07/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	33-44-101249469	08/05/2024	31/01/2028
Calidad del servicio	33-44-101249469	08/09/2024	08/09/2029

TABLA 15 Pólizas contrato de interventoría.
Fuente: Elaboración propia. – Terra Ingenieros Civiles S.A.S. – 2024

A continuación, en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS INT, se* muestra el control a las garantías para los meses descritos anteriormente.

1.2.21 Seguimiento al plan de calidad de contrato de interventoría.

Para garantizar el cumplimiento de este aspecto, se han implementado recursos técnicos y administrativos, acompañados de la supervisión constante del personal profesional designado con este propósito específico. Estas medidas se orientan a elevar la calidad de los proyectos, siguiendo rigurosamente los lineamientos establecidos por el sistema de gestión de calidad, así mismo se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

1.2.22 Vigilancia y control de actividades en campo

Durante las labores de campo, se segue un plan basado en las actividades diarias de

interventoría. Se realiza un riguroso seguimiento de las tareas diarias llevadas a cabo por el contratista, verificando tanto los procedimientos como la metodología empleada en la ejecución.

1.2.23 Sistematización de información

Se dispone de personal debidamente capacitado para el manejo de la información, garantizando así que los datos recolectados en el campo se procesen correctamente de acuerdo con los formatos requeridos. Además, se lleva a cabo una verificación y control exhaustivo de la información recopilada por la interventoría. Paralelamente, se supervisa que el contratista implemente los procedimientos apropiados para el procesamiento de su información, asegurando la integridad y precisión de los datos en todo el proceso.

1.2.24 Personal y equipo de las JAC

Se garantiza que durante la ejecución del contrato se disponga del personal profesional y técnico necesario para llevar a cabo las actividades de manera adecuada. Además, se asegura la participación activa de este personal en las reuniones programadas, contribuyendo así a la eficiencia y efectividad en el desarrollo de los proyectos.

1.2.25 Calidad de los materiales empleados

Esta interventoría se encargará de verificar, calificar y aprobar o rechazar los materiales que se utilizarán en el contrato de obra, según los requisitos del proyecto y especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vías.

1.2.26 Otros documentos seguimiento mensual

- *Seguimiento a la inversión del anticipo*.

Para el presente contrato no se tiene contemplado anticipo, por lo tanto, no se realiza seguimiento.

- **Plan de cargas o seguimiento al plan de cargas.**

Mediante el formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN CARGAS, se muestra a detalle el seguimiento y control al de la programación de recursos de la interventoría.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9 01/01/2025 a 31/01/2025

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- En el presente período, se realizaron reuniones presenciales, virtuales, visitas de obra y, comités de seguimiento y control constantes con los Presidentes de Junta, Veedores, Ingenieros Residentes de obra y contadoras de cada una de las O.A.C. para el proceso de inicio de obras, realización de compromisos, despejar inquietudes y tener mayor claridad en cuanto a los ajustes necesarios.

- Se realizó seguimiento y control, soportado de conceptos técnicos por parte de los especialistas de Interventoría sobre los resultados de los Estudios y Diseños presentados por parte de las Veredas de los Municipios de Santander: de Bolívar, Florián, Guavatá, La Belleza, Sucre y Vélez, descritas en el ***numeral: Descripción de las actividades ejecutadas en el mes y acciones a seguir por la interventoría.***

- Se emitió conceptos y elevo solicitudes al Instituto Nacional de Vías, acorde a temas tratados con cada una de las Veredas de los Municipios de Santander: Bolívar, Florián, Guavatá, La Belleza, Sucre y Vélez.

- Se desarrolla con competencia y en tiempos oportunos cada uno de los requerimientos solicitados por el Instituto Nacional de Vías – **INVIAS.**

- Para el mes de ENERO 2025 se presenta el siguiente cuadro de ejecución de convenios.

No.	CONVENIO	OBJETO	ESTADO OBRAS
1	3753	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA **BERLIN** DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	EJECUTADO 100%

2	3951	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA **GUAMAL** DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	EJECUTADO 100%
3	4175	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA **CACHIPAYAL** DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	EJECUTADO 100%
4	4267	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **EL GUALILO** DEL MUNICIPIO FLORIAN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.	N/A
5	4357	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA **TUBAVITA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	EJECUTADO EL 100%
6	4367	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA **EL GAITAL** DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	EN EJECUCIÓN (25%)
7	4424	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA **TEBAIDA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	EN EJECUCIÓN (95%)

8	4478	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA **LA UNIÓN** DEL MUNICIPIO DE GUAVATA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	EJECUTADO 100%
9	4490	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE **ORGANOS** DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	EJECUTADO 100%
10	4565	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA **LA PALMERA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	EJECUTADO 100%
11	4767	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA **POPOA** DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	EJECUTADO 100%

- Se realizaron comités operativos para pagos a proveedores de la siguiente manera:

COMITÉS OPERATIVOS	GUAMAL	GUALILO	LA UNIÓN	POPOA	BERLÍN	CACHIPAYAL	ÓRGANOS	TUBAVITA	EL GAITAL	TEBAIDA	LA PALMERA
PAGOS Y CHEQUES 1	17/09/2024	N/A	18/09/2024	12/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024
PAGOS Y CHEQUES 2	02/10/2024	N/A	08/10/2024	08/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	17/09/2024	08/10/2024
PAGOS Y CHEQUES 3	07/10/2024	N/A	15/10/2024	22/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	29/10/2024	08/10/2024	22/10/2024

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9
01/01/2025 a 31/01/2025

PAGOS Y CHEQUES 4	22/10/2024	N/A	22/10/2024	29/10/2024	21/10/2024	29/10/2024	22/10/2024	29/10/2024	05/11/2024	22/10/2024	29/10/2024
PAGOS Y CHEQUES 5	29/10/2024	N/A	29/10/2024	12/11/2024	05/11/2024	12/11/2024	29/10/2024	05/11/2024	14/11/2024	05/11/2024	05/11/2024
PAGOS Y CHEQUES 6	05/11/2024	N/A	12/11/2024	19/11/2024	25/11/2024	19/11/2024	05/11/2024	12/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	12/11/2024
PAGOS Y CHEQUES 7	25/11/2024	N/A	19/11/2024	25/11/2024	02/12/2024	16/01/2025	19/11/2024	25/11/2024	02/12/2024	25/11/2024	25/11/2024
PAGOS Y CHEQUES 8	11/12/2024	N/A	25/11/2024	02/12/2024	16/01/2025	N/A	25/11/2024	02/12/2024	11/12/2024	02/12/2024	02/12/2024
PAGOS Y CHEQUES 9	N/A	N/A	02/12/2024	11/12/2024	N/A	N/A	02/12/2024	11/12/2024	18/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
PAGOS Y CHEQUES 10	N/A	N/A	11/12/2024	18/12/2024	N/A	N/A	18/12/2024	18/12/2024	20/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
PAGOS Y CHEQUES 11	N/A	N/A	18/12/2024	10/01/2025	N/A	N/A	16/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
PAGOS Y CHEQUES 12	N/A	N/A	10/01/2025	16/01/2025	N/A	N/A	N/A	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
PAGOS Y CHEQUES 13	N/A	N/A	16/01/2025	28/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PAGOS Y CHEQUES 14	N/A	N/A	28/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Observaciones y/o Recomendaciones

- El sistema de pagos planteado para la realización de los convenios, puede generar expectativas erradas en los reportes mensuales que realiza la interventoría, es decir, el avance financiero del Convenio, siempre es mayor al avance físico ejecutado ya que muchos de los pagos a proveedores importantes como materiales y equipos deben realizarse por adelantado al proveedor antes de ser aprovechados en obra.

- La carga administrativa de la interventoría es más elevada, comparada con las interventorías a contratistas que son empresas privadas, ya que la interventoría entra a un minucioso análisis de la inversión realizada, proveedores, impuestos, administración de la obra, convirtiéndose en una figura similar a una administración delegada, más que una interventoría.

- Las interventorías que realizan este tipo de convenios deben verse así mismas, como unos tutores o guías, más que supervisores o vigilantes, ya que es de comprender que las JAC no son empresas privadas con experiencia en la realización de obras civiles, o contratos con el estado. Deben ser interventorías con un cierto grado de flexibilidad, esto en pro de la ejecución y feliz término de las obras, esto sin dejar a un lado las responsabilidades técnicas, ambientales, sociales, y demás.

- El personal de interventoría no tiene dentro de su equipo un CONTADOR, este profesional es clave para el buen ejercicio de la labor de vigilancia y control de la interventoría de estos convenios, esto sin dejar a un lado el control técnico, ambiental, legal, etc.

- Los dignatarios o presidentes de Junta, no cuentan con un rubro de salario, sin embargo, ellos son quienes manejan los convenios teniendo que dedicar tiempo, trabajo, y adquirir compromisos con proveedores, comunidad y el Estado mismo.

- La figura de Director de obra, no existe en los convenios, este cargo es muy importante ya que las responsabilidades no son las mismas que las de un residente de obra, por lo tanto pueden quedar vacíos en la responsabilidad de ciertos aspectos técnicos, ambientales, sociales, etc. Sería preferible tener un director de obra que un residente, si el caso fuera elegir qué tipo de profesional técnico debería tener el convenio.

- Las metas de la interventoría son más difíciles de cumplir al observarse que el canal de comunicación principal CORREO ELECTRÓNICO no es muy eficaz tratándose muchas veces de la responsabilidad adquirida en el manejo de este medio a cargo de los presentes de junta, se ve limitada por la costumbre de manejar el medio, el conocimiento de la responsabilidad que implica tener ese buzón en funcionamiento, e inclusive algunos no tienen experticia en el manejo de dichos canales de comunicación.

- Las responsabilidades Sociales, Ambientales y SST de las JAC de los carecen de profesionales afines que mantengan dicha gestión completa y actualizada en los tiempos requeridos contractualmente, lo cual hace más difícil la consecución de resultados por parte de la interventoría. Muchas veces esta carga es transmitida al ingeniero residente o al contador del convenio, generando en ocasiones inconformidad por aumento en la carga laboral.

- Sería bueno recomendar a las interventorías, en la etapa precontractual, el dedicar un espacio a mantener cierta supervisión a los profesionales de primer empleo que el programa exige, ya que muchas veces en el diario trajín se olvida que son personas que están adquiriendo experiencia en ciertos aspectos del trabajo de campo y por lo tanto necesitan una guía inicial en algunas gestiones.

ANEXOS

Relación de correspondencia.

Se anexa documentación correspondiente al presente periodo.

Bitácora del mes correspondiente.

Se anexa bitácoras de los convenios que se encuentran en ejecución.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No.	3951 DE 2023 4267 DE 2023 4478 DE 2023 4767 DE 2023 3753 DE 2023 4175 DE 2023 4490 DE 2023 4357 DE 2023 4367 DE 2023 4424 DE 2023 4565 DE 2023	**Contratista:**	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO BOLIVAR JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIAN JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO GUAVATÁ JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO GUAVATA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO LA BELLEZA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO LA BELLEZA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO SUCRE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO VELEZ JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GAITAL DEL MUNICIPIO VELEZ JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TEBAIDA DEL MUNICIPIO VELEZ JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO VELEZ
Contrato de Interventoría No.	1631 DE 2023	**Interventoría:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Objeto Contrato de Interventoría:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL No.	9	**MES O PERIODO:**	ene-25

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Items no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 01-12-2025

HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

RESOLUCION DE DESIGANCION N°1650 DEL 15 DE MAYO DE 2025

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ene-25

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023

INTERVENTORÍA: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3951 DE 2023,4267 DE 2023 ,4478 DE 2023,4767 DE 2023,3753 DE 2023, 4175 DE 2023,4490 DE 2023 , 4357 DE 2023, 4367 DE 2023, 4424 DE 2023,4565 DE 2023.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO BOLIVAR; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIAN; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO GUAVATA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO GUAVATA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO LA BELLEZA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO LA BELLEZA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO SUCRE ; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO VELEZ; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GAITAL DEL MUNICIPIO VELEZ; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TEBAIDA DEL MUNICIPIO VELEZ; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO VELEZ

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES (Noviembre 2024)																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA IIX-848	CAMIONETA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA (1) IGR18G	MOTOCICLETA 150 CC O MAYOR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Firma
01-12-2025
Nombre: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 52202-47079

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 -2024 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

CONTRATOS	3951 -2023	**CONTRATISTAS:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL
CONTRATOS	4267 - 2023	**CONTRATISTAS:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL GUALILO
CONTRATOS	4478 - 2023	**CONTRATISTAS:**	LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA UNION
CONTRATOS	4767 -2023	**CONTRATISTAS:**	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA
CONTRATOS	3753 - 2023	**CONTRATISTAS:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN
CONTRATOS	4175 - 2023	**CONTRATISTAS:**	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL
CONTRATOS	4490 - 2023	**CONTRATISTAS:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORGANOS
CONTRATOS	4357 - 2023	**CONTRATISTAS:**	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA
CONTRATOS	4367 - 2023	**CONTRATISTAS:**	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL
CONTRATOS	4424 - 2023	**CONTRATISTAS:**	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA
CONTRATOS	4565 - 2023	**CONTRATISTAS:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA

NOMBRE ARL: VIDA COLPATRIA S.A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJASAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	79.343.910	Director de Interventoría	$ 600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	$ 12.900.000	VIDA COLPATRIA S.A	V	ALIANSALUD EPS S.A.	84254040	$ 516.000	COLPENSIONES	84254040	$ 2.064.000	CAJASAN			
6	LIZETH PAOLA RUIZ MONCADA	1.002.583.483	Inspector SST	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,0%	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	$ 2.000.000	VIDA COLPATRIA S.A	V	Nueva EPS	84254040	$ 80.000	PORVENIR	84254040	$ 320.000	CAJASAN			
12	ALDEMAR PARRA NIEVES	1.101.753.108	Inspector	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00%	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	$ 1.800.000	VIDA COLPATRIA S.A	V	Nueva EPS	84254040	$ 72.000	PORVENIR	84254040	$ 288.000	CAJASAN			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 4.400.000																																															

El Interventor adjunta la certificación de fecha 31/01/2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Otservaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría Supervisor del Contrato de InterventoríaMatrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Firma 31-1-2025
Nombre: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
Matrícula Profesional No.: 52202-47079

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 -2024

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MES INFORME MENSUAL: ENERO

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

CONVENIO No: 3951 -2023	**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL
CONVENIO No: 4267 - 2023	**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL GUALILO
CONVENIO No: 4478 - 2023	**CONTRATISTA:** LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA UNION
CONVENIO No: 4767 -2023	**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA
CONVENIO No: 3753 - 2023	**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN
CONVENIO No: 4175 - 2023	**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL
CONVENIO No: 4490 - 2023	**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORGANOS
CONVENIO No: 4357 - 2023	**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA
CONVENIO No: 4367 - 2023	**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL
CONVENIO No: 4424 - 2023	**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA
CONVENIO No: 4565 - 2023	**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	421024	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 394.093.490,00	$ -
2024	1137024	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACIÓN	Adición 1	$ 81.075.700,00	$ (0,00)
2024	421024	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACIÓN	Adición 2	$ 60.238.990,00	$ 20.924.960,40
TOTAL						$ 535.408.180,00	$ 20.924.960,40

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 535.408.180**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								421024 del 15/05/2024	$ 394.093.490,00			
								1137024 del 19/11/2024	$ 81.075.700,00			
								421024 del 28/12/2024	$ 60.238.990,00			
1	**may-24**	$ -	$ -	$ -				421024 del 15/05/2024	$ 394.093.490,00	$ 535.408.180,00		
2	**jun-24**	$ 27.907.500,00	$ 5.302.425,00	$ 33.209.925,00				421024 del 15/05/2024	$ 360.883.565,00	$ 502.198.255,00	14476 de 06/11/2024	
3	**jul-24**	$ 45.499.900,00	$ 8.644.981,00	$ 54.144.881,00				421024 del 15/05/2025	$ 306.738.684,00	$ 448.053.374,00	15103 de 13/11/2024	
4	**ago-24**	$ 59.551.600,00	$ 11.314.804,00	$ 70.866.404,00				421024 del 15/05/2024	$ 235.872.280,00	$ 377.186.970,00	14482 de 06/11/2024	
5	**sep-24**	$ 51.632.960,00	$ 9.810.262,40	$ 61.443.222,40				421024 del 15/05/2025	$ 174.429.057,60	$ 315.743.747,60	15004 de 12/11/2024	
6	**oct-24**	$ 76.920.000,00	$ 14.614.800,00	$ 91.534.800,00				421024 del 15/05/2026	$ 82.894.257,60	$ 224.208.947,60	17665 del 09/12/2024	
7	**nov-24**	$ 69.659.040,00	$ 13.235.217,60	$ 82.894.257,60				421024 del 15/05/2024	$ -	$ 141.314.690,00	20471 del 30/12/2024	
		$ 18.004.960,00	$ 3.420.942,40	$ 21.425.902,40				1137024 del 19/11/2024	$ 59.649.797,60	$ 119.888.787,60		
8	**dic-24**	$ 50.125.880,34	$ 9.523.917,26	$ 59.649.797,60				1137024 del 19/11/2024	$ (0,00)	$ 60.238.990,00	20671 de 31/12/2024	
		$ 33.036.999,66	$ 6.277.029,94	$ 39.314.029,60				421024 del 28/12/2024	$ 20.924.960,40	$ 20.924.960,40		
9	**ene-25**	$ 17.583.000,00	$ 3.340.770,00	$ 20.923.770,00				421024 del 28/12/2024	$ 1.190,40	$ 1.190,40		
10												
11												
12												
13												
14												
TOTALES		**$ 449.921.840,00**	**$ 85.485.149,60**	**$ 535.406.989,60**								

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	$ 368.263.840,00	$ 69.970.129,60	$ 438.233.969,60
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 81.658.000,00	$ 15.515.020,00	$ 97.173.020,00
*			
VALOR TOTAL	$ 449.921.840,00	$ 85.485.149,60	$ 535.406.989,60

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Firma 02-12-2025

Nombre: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-47079

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/2

FECHA: 27/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2024 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 27/5/2024

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 394,093,490.00

VALOR ACUMULADO: $ 475,169,190.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 39,409,349.00	8	5	2024	10	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 78,818,698.00	8	5	2024	10	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 78,818,698.00	8	5	2024	10	9	2027
Calidad del servicio	30%	$ 118,228,047.00	10	9	2024	10	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101249469

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 24/5/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 39,409,349.00	8	5	2024	29	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 78,818,698.00	8	5	2024	29	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 78,818,698.00	8	5	2024	29	9	2027
Calidad del servicio	30%	$ 118,228,047.00	27	9	2024	27	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101249469

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 2/9/2024

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 39,409,349.00	8	5	2024	11	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 78,818,698.00	8	5	2024	11	5	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 78,818,698.00	8	5	2024	11	11	2027
Calidad del servicio	30%	$ 118,228,047.00	8	9	2024	8	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101249469

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/2

FECHA: 27/11/2024
(Día / Mes / Año)

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 23/10/2024

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 47,516,919.00	8	5	2024	16	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 78,818,698.00	8	5	2024	16	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 95,033,838.00	8	5	2024	16	12	2027
Calidad del servicio	30%	$ 142,550,757.00	8	9	2024	8	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101249469

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: EN TRAMITE

OBSERVACIONES:

El Anexo No. 9 de la póliza de cumplimiento, corresponde a la actualización de las vigencias de los amparos de acuerdo con el acta de inicio del contrato 1631 de 2024 con fecha de terminación hasta el 16 de diciembre de 2024

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520261517 CND

Firma 01-12-2025

Nombre: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5 2 2 0 2 - 4 7 0 7 9

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 5

- POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
- POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☑
- POR PRÓRROGA ☑
- POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
- POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 - 2024

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
RESOLUCIÓN No.: 1786 DE 23/05/2024 (Indicar día/mes/año)

CONVENIO No.: 3951 -2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL
CONVENIO No.: 4267 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL GUALILO
CONVENIO No.: 4478 - 2023	CONTRATISTA: LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA UNION
CONVENIO No.: 4767 -2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA
CONVENIO No.: 3753 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN
CONVENIO No.: 4175 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL
CONVENIO No.: 4490 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORGANOS
CONVENIO No.: 4357 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA
CONVENIO No.: 4367 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL
CONVENIO No.: 4424 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TERAIDA
CONVENIO No.: 4565 - 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/05/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 394.093.490,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 475.169.190,00

PLAZO ACUMULADO: 6,87 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 81.075.700,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS COSTO MENSUAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS PRIMA REGIONAL	MODIFICACIONES CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 10/12/2024 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 10/12/2024 VALOR	+/-	MODIFICACIONES PRESENTES TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	PRESENTES VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 7 de fecha 05/12/2024 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 7 de fecha 05/12/2024 VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1		Director de Interventoría	$ 6.000.000,00		2,00	$ 12.000.000,00			3,25	$ 19.500.000,00	+	0,35	$ 2.100.000,00	3,00	$ 18.000.000,00	3,60	$ 21.600.000,00
2		Ingeniero Residente de interventoría	$ 4.900.000,00		3,00	$ 14.700.000,00			8,50	$ 41.650.000,00	+	1,00	$ 4.900.000,00	7,50	$ 36.750.000,00	9,50	$ 46.550.000,00
3		Profesional Ambiental	$ 3.400.000,00		2,50	$ 8.500.000,00			4,00	$ 13.600.000,00	+	0,50	$ 1.700.000,00	3,50	$ 11.900.000,00	4,50	$ 15.300.000,00
4		Profesional Social	$ 3.000.000,00		3,00	$ 9.000.000,00			6,50	$ 19.500.000,00	+	0,50	$ 1.500.000,00	6,00	$ 18.000.000,00	7,00	$ 21.000.000,00
5		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 8.265.000,00				$ -		0,00		0,00	$ -	0,00	
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.700.000,00		0,00	$ -			0,72	$ 4.104.000,00		0,00	$ -	0,50	$ 2.850.000,00	0,72	$ 4.104.000,00
		Especialista en Estructuras	$ 5.700.000,00		0,00	$ -			0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 5.700.000,00		0,00	$ -			0,72	$ 4.104.000,00		0,00	$ -	0,50	$ 2.850.000,00	0,72	$ 4.104.000,00
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.700.000,00		0,00	$ -			0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.700.000,00		0,00	$ -			0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Ambiental	$ 5.700.000,00		0,00	$ -			0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TECNICO															
6		Inspector SST	$ 2.000.000,00		5,00	$ 10.000.000,00			7,00	$ 14.000.000,00	+	1,00	$ 2.000.000,00	6,00	$ 12.000.000,00	8,00	$ 16.000.000,00
7		Inspector	$ 1.800.000,00		20,00	$ 36.000.000,00			8,02	$ 14.436.000,00	+	2,50	$ 4.500.000,00	6,52	$ 11.736.000,00	10,52	$ 18.936.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO															
8		Técnico Administrativo	$ 1.300.000,00		3,50	$ 4.550.000,00			6,00	$ 7.800.000,00	+	0,5	$ 650.000,00	5,50	$ 7.150.000,00	6,50	$ 8.450.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 103.015.000,00				$ 138.694.000,00	+		$ 17.350.000,00		$ 121.236.000,00		$ 156.044.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36				$ 2,36			2,36		$ 2,36		2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 243.115.400,00				$ 327.317.840,00	+		$ 40.946.000,00		$ 286.116.960,00		$ 368.263.840,00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9		Viaticos Director y/o Residentes y/o Especialistas	$ 200.000,00	Día	25,00	$ 5.000.000,00			0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
10		Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.500.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 16.500.000,00			6,77	$ 37.235.000,00	+	1,23	$ 6.765.000,00	6,00	$ 33.000.000,00	8,00	$ 44.000.000,00
11		Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	Según comprobante por mes	25,00	$ 16.250.000,00			11,02	$ 7.163.000,00	+	2,50	$ 1.625.000,00	9,52	$ 6.188.000,00	13,52	$ 8.788.000,00
12		Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 24.000.000,00			2,20	$ 13.200.000,00		0,00	$ -	2,00	$ 12.000.000,00	2,20	$ 13.200.000,00
13		Ensayos de laboratorios	$ 900.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 3.600.000,00			4,00	$ 3.600.000,00		0,00	$ -	2,50	$ 2.250.000,00	4,00	$ 3.600.000,00
14		Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 800.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 3.200.000,00			7,00	$ 5.600.000,00	+	1	$ 800.000,00	6,00	$ 4.800.000,00	8,00	$ 6.400.000,00
		OTROS COSTOS															
15		Transportes aéreos y/o terrestres y/o fluvial (incluye peajes y combustible)	$ 1.350.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 5.400.000,00			0,94	$ 1.269.000,00		0,00	$ -	0,94	$ 1.269.000,00	0,94	$ 1.269.000,00
16		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.200.000,00			6,61	$ 1.983.000,00	+	0,81	$ 243.000,00	6,00	$ 1.800.000,00	7,42	$ 2.226.000,00
17		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.200.000,00			6,44	$ 1.932.000,00	+	0,81	$ 243.000,00	5,84	$ 1.752.000,00	7,25	$ 2.175.000,00
18		Veedurias Técnica Comunitaría	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 600.000,00			0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE								**$ 2.000,00**	-		$ (1.000,00)				$ 1.000,00
		* SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 76.950.000,00				$ 71.984.000,00			$ 9.675.000,00		$ 63.059.000,00		$ 81.659.000,00
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS (A)+(B) =(C)				$ 320.065.400,00				$ 399.301.840,00			$ 50.621.000,00		$ 349.175.960,00		$ 449.922.840,00
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)				$ 11.105.600,00											$ -
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS (C)+(D) =(E)				$ 331.171.000,00				$ 399.301.840,00			$ 50.621.000,00		$ 349.175.960,00		$ 449.922.840,00
		* IVA = 19% * € = (F)				$ 62.922.490,00				$ 75.867.350,00			$ 9.617.990,00		$ 66.343.432,40		$ 85.485.340,00
		* COSTO TOTAL = (E) + (F)				**$ 394.093.490,00**				**$ 475.169.190,00**			**$ 60.238.990,00**		**$ 415.519.392,40**		**$ 535.408.180,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 399.301.840,00	$ 75.867.350,00	$ 475.169.190,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR): NOVIEMBRE	$ 349.175.960,00	$ 66.343.432,40	$ 415.519.392,40
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ 50.621.000,00	$ 9.617.990,00	$ 60.238.990,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 100.746.880,00	$ 19.141.907,60	$ 119.888.787,60

PLAZO EN MESES	
INICIAL	4
ADICIONAL	2,87
ACUMULADO	6,87
FALTANTE	1

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio) *Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:*

La solicitud de la presenta prorroga No 4 y adición No 2 del contrato de interventoría, se genera con el fin de garantizar la presencia de la interventoría, , atendiendo a que el plazo actual es insuficiente para realizar el acompañamiento, seguimiento, vigilancia y control a los once (11) convenios solidarios en ejecución, de conformidad con la información contractual del estado de cada uno de estos convenios descritos en el alcance de las actividades a desarrollar, atendiendo a que se tuvieron inconvenientes de orden logístico y la falta de experiencia de las JAC, para el desarrollo de las actividades iniciales del proyecto al igual que las pésimas condiciones climáticas de la zona de ejecución principalmente el mal tiempo de lluvias frecuentes en Vélez, y Bolívar Santander.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre:JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202- 611517 CND

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2726CPG

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
GERENTE DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
Matrícula Profesional No.: 17202-70460

Firmado digitalmente por LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ

Firma
Nombre: CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
Subdirectora de Vías Regionales (E)
Matrícula Profesional No. 25202-38619

Revisión:

Director Territorial (E) Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC
Reynaldo Mantilla

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Gestor Técnico de Proyecto Nombre:PEDRO JOSÉ BARÓN AVILA
Matrícula Profesional No.:

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO.
COVENIOS JUNTAS/ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL
DEPARTAMENTOS SANTANDER

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.

Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

FORMATOS
CONVENIO 3951
DE 2023 GUAMAL
BOLIVAR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** ene-25

CONTRATO DE OBRA No.: 3951 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO BOLIVAR DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL

PLAZO INICIAL: 10 DIAS
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 27/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 16/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 7 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.006.719,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.006.719,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 201.006.719,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	140
	Mejoramiento	N/A	0
	Rehabilitación	N/A	0
Estructuras	Alacantarillas	UND	0
	Gavión	N/A	0
	Pontones	N/A	0
Mantenimiento		N/A	0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	TOTAL
Pavimentación	Placa Huella	ML	92,00	**146,85**
	Mejoramiento	N/A	0,00	**0,00**
	Rehabilitación	N/A	0,00	**0,00**
Estructuras	Alacantarillas	UND	0,00	**0,00**
	Gavión	N/A	0,00	**0,00**
	Pontones	N/A	0,00	**0,00**
Mantenimiento		N/A	0,00	**0,00**
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	1,00	**1,00**

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 152.242.362,00	$ 0,00	$ 152.242.362,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.197.086,00	$ 0,00	$ 43.197.086,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.567.271,00	$ 0,00	$ 4.567.271,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.006.719,00	$ 0,00	$ 200.006.719,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES (DICIEMBRE 2024)

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 85.196.539,57	$ 0,00	85.196.539,57	159.463.104,66
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 9.835.500,00	$ 0,00	9.835.500,00	36.072.294,41
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 4.471.319,93	$ 0,00	0,00	4.471.319,93
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
VALOR EJECUTADO	$ 99.503.359,50	$ 0,00	95.032.039,57	200.006.719,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 200.006.719,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 200.006.719,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES (DICIEMBRE 2024)

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			
Obra treminada	Obra Terminada	Obra Terminada	Rampa final

OBSERVACIONES

1. En el mes de Diciembre de 2024 se terminaron las obras propias del convenio (Placahuella Tramo 146,85 m).
2. En este momento se encuentra en proceso de liquidación del convenio, cierre de cuenta y cierres Ambiental y Social, es posible que se presenten ajustes a los valores registrados.

Firma

Nombre JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ene-2025

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO BOLIVAR DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 3951 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
VOLQUETA		7M3																															
RETROEXCAVADORA		ORUGA																															
VIBROCOMPACTADOR		7 TOM																															
MEZCLADORA		1 BULTO																															
VIBRADOR DE CONCRETO		N/A																															
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:
La ejecución de obras terminó en diciembre de 2024. DURANTE EL PERÍODO NO SE REALIZARON OBRAS DEL CONVENIO.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO HURTADO PEDRAZA
Matrícula Profesional No.: 041037-0547416 BYC
Residente de Obra

Firma
Nombre: JAIME CHACON DURAN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 682021-12213 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 3951 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO BOLIVAR DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JORGE EDUARDO HURTADO PEDRAZA	1049634413	ING. RESIDENTE																																	INDEPENDIENTE													
2	NANCY ANDREA DURAN	28034878	CONTADORA																																	INDEPENDIENTE													
3	VARGAS MORENO OLFER ARTURO	1096482494	OFICIAL																																	JAC GUAMAL													
4	VELASCO ANYI LORENA	1096484830	AYUDANTE																																	JAC GUAMAL													
5	LOPEZ ARIZA EDGAR	13706996	AYUDANTE																																	JAC GUAMAL													
6	QUIROGA QUIROGA JESE VLADIMIR	13707093	AYUDANTE																																	JAC GUAMAL													
7	FRANCO ARIZA DANIEL	13707182	AYUDANTE																																	JAC GUAMAL													
8	QUIROGA MIGUEL OCTAVIO	13707611	AYUDANTE																																	JAC GUAMAL													
9	MORENO RUEDA WILLIAM	13959312	AYUDANTE																																	JAC GUAMAL													
10	LÓPEZ ARIZA DIOCLIDES	79915355	MAESTRO																																	JAC GUAMAL													

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

1. LAS OBRAS DEL CONVENIO CULMINARON SU EJECUCIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
2. DURANTE EL PERÍODO NO SE REALIZARON OBRAS DEL CONVENIO.

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO HURTADO PEDRAZA
Matrícula Profesional No.: 041037-0547416 E
Residente de Obra

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: _____ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** _____

CONTRATO DE OBRA No: 3951 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO BOLIVAR DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

MES INFORME MENSUAL: ENERO 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2024 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	157423	34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	10	NACION	3951 DE 2023	$ 200.006.719	N/A
		TOTAL					

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
1	Cheque No.000001 $ 2.250.000,00 ABONO ESTUDIOS Y DISEÑOS	17/09/2024			$ 2.250.000,00	$ 0,00	$ 2.250.000,00				$ 197.756.719				GASTOS ADMINISTRATIVOS
2	Cheque No.000002 $ 400.000,00 SUBSIDIO TRANSPORTE DEL	17/09/2024			$ 400.000,00	$ 0,00	$ 400.000,00				$ 197.356.719				GASTOS ADMINISTRATIVOS
3	Cheque No.000004 $ 300.000,00 PAPELERÍA (AGOSTO 2024)	17/09/2024			$ 300.000,00	$ 0,00	$ 300.000,00				$ 197.056.719				GASTOS ADMINISTRATIVOS
4	Cheque No.000005 $ 1.960.000,00 SALARIO CONTADORA MES DE	17/09/2024			$ 1.960.000,00	$ 0,00	$ 1.960.000,00				$ 195.096.719				GASTOS ADMINISTRATIVOS
5	Cheque No.000006 $ 3.500.000,00 SALARIO INGENIERO RESIDENTE	17/09/2024			$ 3.500.000,00	$ 0,00	$ 3.500.000,00				$ 191.596.719				GASTOS ADMINISTRATIVOS
6	Cheque No.000003 $ 1.905.089,41 REEMBOLSO PAGO PÓLIZAS	2/10/2024			$ 1.905.089,41	$ 0,00	$ 1.905.089,41				$ 189.691.630				GASTOS ADMINISTRATIVOS
7	Cheque No.000007 $ 400.000,00 SUBSIDIO TRANSPORTE DEL	2/10/2024			$ 400.000,00	$ 0,00	$ 400.000,00				$ 189.291.630				GASTOS ADMINISTRATIVOS
8	Cheque No.000010 $ 768.200,00 HONORARIOS CONTADORA MES DE	7/10/2024			$ 768.200,00	$ 0,00	$ 768.200,00				$ 188.523.430				GASTOS ADMINISTRATIVOS
9	Cheque No.000011 $ 300.000,00 PAPELERÍA (SEPTIEMBRE 2024)	7/10/2024			$ 300.000,00		$ 300.000,00				$ 188.223.430				GASTOS ADMINISTRATIVOS
10	Cheque No.000021 $ 280.000,00 Examenes medicos ocupacionales	29/10/2024			$ 280.000,00	$ 0,00	$ 280.000,00				$ 187.943.430				GASTOS ADMINISTRATIVOS
11	Cheque No.000016 $ 2.284.800,00 Alquiler de Maquinaria vibro	29/10/2024			$ 2.284.800,00	$ 0,00	$ 2.284.800,00				$ 185.658.630				COSTOS DIRECTOS DE OBRA

12	Cheque No.000017 $ 1.639.950,00 Dotación para 7 trabajadores, EPPs,	29/10/2024			$ 1.639.950,00	$ 0,00	$ 1.639.950,00				$ 184.018.680				GASTOS ADMINISTRATIVOS
13	Cheque No.000013 $ 1.500.000,00 Topografía de campo Tramo Priorizado	29/10/2024			$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 1.500.000,00				$ 182.518.680				GASTOS ADMINISTRATIVOS
14	Cheque No.000018 $ 19.803.325,70 Compra de Arena, Cemento, Varilla,	29/10/2024			$ 19.803.325,70	$ 0,00	$ 19.803.325,70				$ 162.715.354				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
15	Cheque No.000014 $ 9.009.000,00 Transportes 14 viajes desde Moniquirá x	29/10/2024			$ 9.009.000,00	$ 0,00	$ 9.009.000,00				$ 153.706.354				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
16	Cheque No.000012 $ 2.078.700,00 11,5 Horas de Retro $130.000/hr	29/10/2024			$ 2.078.700,00	$ 0,00	$ 2.078.700,00				$ 151.627.654				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
17	Cheque No.000019 $ 400.000,00 Auxilio de Transporte para el	29/10/2024			$ 400.000,00	$ 0,00	$ 400.000,00				$ 151.227.654				GASTOS ADMINISTRATIVOS
18	Cheque No.000020 $ 1.960.000,00 Honorarios Contadora mes	29/10/2024			$ 1.960.000,00	$ 0,00	$ 1.960.000,00				$ 149.267.654				GASTOS ADMINISTRATIVOS
19	Cheque No.000011 $ 300.000,00 CHEQUE 000011	5/11/2024			$ 300.000,00	$ 0,00	$ 300.000,00				$ 148.967.654				GASTOS ADMINISTRATIVOS
20	Cheque No.000023 $ 3.690.000,00 CHEQUE 000023	5/11/2024			$ 3.690.000,00	$ 0,00	$ 3.690.000,00				$ 145.277.654				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
21	Cheque No.000024 $ 9.652.500,00 CHEQUE 000024	5/11/2024			$ 9.652.500,00	$ 0,00	$ 9.652.500,00				$ 135.625.154				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
22	Cheque No.000025 $ 15.657.600,00 CHEQUE 000025	5/11/2024			$ 15.657.600,00	$ 0,00	$ 15.657.600,00				$ 119.967.554				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
23	Cheque No.000026 $ 254.000,00 CHEQUE 000026	25/11/2024			$ 254.000,00	$ 0,00	$ 254.000,00				$ 119.713.554				RETENCIONES Y OTROS
24	Cheque No.000027 $ 744.050,00 CHEQUE 000027	25/11/2024			$ 744.050,00	$ 0,00	$ 744.050,00				$ 118.969.504				GASTOS ADMINISTRATIVOS
25	Cheque No.000028 $ 3.726.060,00 CHEQUE 000028	25/11/2024			$ 3.726.060,00	$ 0,00	$ 3.726.060,00				$ 115.243.444				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
26	Cheque No.000029 $ 4.979.400,00 CHEQUE 000029	25/11/2024			$ 4.979.400,00	$ 0,00	$ 4.979.400,00				$ 110.264.044				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
27	Cheque No.000030 $ 32.390.427,00 CHEQUE 000030	25/11/2024			$ 32.390.427,00	$ 0,00	$ 32.390.427,00				$ 77.873.617				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
28	Cheque No.000031 $ 2.251.712,00 CHEQUE 000031	25/11/2024			$ 2.251.712,00	$ 0,00	$ 2.251.712,00				$ 75.621.905				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
29	Cheque No.000032 $ 993.700,00 CHEQUE 000032	25/11/2024			$ 993.700,00	$ 0,00	$ 993.700,00				$ 74.628.205				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
30	Cheque No.000033 $ 984.300,00 CHEQUE 000033	25/11/2024			$ 984.300,00	$ 0,00	$ 984.300,00				$ 73.643.905				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
31	Cheque No.000034 $ 115.000,00 CHEQUE 000034	25/11/2024			$ 115.000,00	$ 0,00	$ 115.000,00				$ 73.528.905				GASTOS ADMINISTRATIVOS
32	Cheque No.000035 $ 300.800,00 CHEQUE 000035	25/11/2024			$ 300.800,00	$ 0,00	$ 300.800,00				$ 73.228.105				GASTOS ADMINISTRATIVOS
33	Cheque No.000036 $ 185.250,00 CHEQUE 000036	25/11/2024			$ 185.250,00	$ 0,00	$ 185.250,00				$ 73.042.855				GASTOS ADMINISTRATIVOS
34	Cheque No.000048 $ 764.600,00 CHEQUE 000048	25/11/2024			$ 764.600,00	$ 0,00	$ 764.600,00				$ 72.278.255				COSTOS DIRECTOS DE OBRA

35	Cheque No.000038 $ 3.500.000,00 CHEQUE 000038	25/11/2024			$ 3.500.000,00	$ 0,00	$ 3.500.000,00				$ 68.778.255				GASTOS ADMINISTRATIVOS
36	Cheque No.000039 $ 1.960.000,00 CHEQUE 000039	25/11/2024			$ 1.960.000,00	$ 0,00	$ 1.960.000,00				$ 66.818.255				GASTOS ADMINISTRATIVOS
37	Cheque No.000040 $ 923.374,00 CHEQUE 000040	25/11/2024			$ 923.374,00	$ 0,00	$ 923.374,00				$ 65.894.881				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
38	Cheque No.000041 $ 1.368.455,00 CHEQUE 000041	25/11/2024			$ 1.368.455,00	$ 0,00	$ 1.368.455,00				$ 64.526.426				GASTOS ADMINISTRATIVOS
39	Cheque No.000042 $ 589.158,00 CHEQUE 000042	25/11/2024			$ 589.158,00	$ 0,00	$ 589.158,00				$ 63.937.268				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
40	Cheque No.000042 $ 589.158,00 CHEQUE 000042	25/11/2024			$ 589.158,00	$ 0,00	$ 589.158,00				$ 63.348.110				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
41	Cheque No.000043 $ 652.776,00 CHEQUE 000043	25/11/2024			$ 652.776,00	$ 0,00	$ 652.776,00				$ 62.695.334				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
42	Cheque No.000044 $ 620.967,00 CHEQUE 000044	25/11/2024			$ 620.967,00	$ 0,00	$ 620.967,00				$ 62.074.367				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
43	Cheque No.000045 $ 589.158,00 CHEQUE 000045	25/11/2024			$ 589.158,00	$ 0,00	$ 589.158,00				$ 61.485.209				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
44	Cheque No.000046 $ 589.158,00 CHEQUE 000046	25/11/2024			$ 589.158,00	$ 0,00	$ 589.158,00				$ 60.896.051				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
45	Cheque No.000047 $ 200.000,00 CHEQUE 000047	25/11/2024			$ 200.000,000	$ 0,00	$ 200.000,00				$ 60.696.051				GASTOS ADMINISTRATIVOS
46	Cheque No.000050 $ 6.538.000,00 Materiales Pétreos	11/12/2024			$ 6.538.000,000	$ 0,00	$ 6.538.000,00				$ 54.158.051				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
47	Cheque No.000051 $ 2.819.495,80 Materiales Arena	11/12/2024			$ 2.819.495,800	$ 0,00	$ 2.819.495,80				$ 51.338.555				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
48	Cheque No.000052 $ 4.471.319,93 Materiales	11/12/2024			$ 4.471.319,930	$ 0,00	$ 4.471.319,93				$ 46.867.235				PAGA
49	Cheque No.000053 $ 672.000,00 Alquiler Bibrador de Concreto	11/12/2024			$ 672.000,000	$ 0,00	$ 672.000,00				$ 46.195.235				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
50	Cheque No.000054 $ 2.592.000,00 Alquiler RANA Compactador manual	11/12/2024			$ 2.592.000,000	$ 0,00	$ 2.592.000,00				$ 43.603.235				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
51	Cheque No.000055 $ 5.710.600,00 Pago Seguridad Social Ora JAC	11/12/2024			$ 5.710.600,000	$ 0,00	$ 5.710.600,00				$ 37.892.635				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
52	Cheque No.000056 $ 2.897.500,00 Materiales	11/12/2024			$ 2.897.500,000	$ 0,00	$ 2.897.500,00				$ 34.995.135				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
53	Cheque No.000057 $ 4.504.500,00 Servicio de Transporte de materiales	11/12/2024			$ 4.504.500,000	$ 0,00	$ 4.504.500,00				$ 30.490.635				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
54	Cheque No.000058 $ 5.250.000,00 Honorarios Ing Residente	11/12/2024			$ 5.250.000,000	$ 0,00	$ 5.250.000,00				$ 25.240.635				GASTOS ADMINISTRATIVOS
55	Cheque No.000059 $ 2.171.000,00 PAGO RETENCION EN LA	11/12/2024			$ 2.171.000,000	$ 0,00	$ 2.171.000,00				$ 23.069.635				RETENCIONES Y OTROS
56	Cheque No.000060 $ 446.194,00 Combustible y lubricante para la	11/12/2024			$ 446.194,000	$ 0,00	$ 446.194,00				$ 22.623.441				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
57	Cheque No.000061 $ 200.000,00 Subsidio de Transporte Dignatario	11/12/2024			$ 200.000,000	$ 0,00	$ 200.000,00				$ 22.423.441				GASTOS ADMINISTRATIVOS

58	Cheque No.000062 $ 1.191.800,00 Honorarios Contadora Mes	11/12/2024			$ 1.191.800,000	$ 0,00	$ 1.191.800,00				$ 21.231.641				GASTOS ADMINISTRATIVOS
59	Cheque No.000063 $ 2.624.925,00 NOMINA 16 NOV AL 12 DIC	11/12/2024			$ 2.624.925,000	$ 0,00	$ 2.624.925,00				$ 18.606.716				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
60	Cheque No.000064 $ 3.193.700,00 NOMINA 16 NOV AL 12 DIC	11/12/2024			$ 3.193.700,000	$ 0,00	$ 3.193.700,00				$ 15.413.016				GASTOS ADMINISTRATIVOS
61	Cheque No.000065 $ 3.563.675,00 NOMINA 16 NOV AL 12 DIC	11/12/2024			$ 3.563.675,000	$ 0,00	$ 3.563.675,00				$ 11.849.341				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
62	Cheque No.000066 $ 1.846.064,00 NOMINA 16 NOV AL 12 DIC	11/12/2024			$ 1.846.064,000	$ 0,00	$ 1.846.064,00				$ 10.003.277				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
63	Cheque No.000067 $ 1.823.636,00 NOMINA 16 NOV AL 12 DIC	11/12/2024			$ 1.823.636,000	$ 0,00	$ 1.823.636,00				$ 8.179.641				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
64	Cheque No.000068 $ 1.684.985,00 NOMINA 16 NOV AL 12 DIC	11/12/2024			$ 1.684.985,000	$ 0,00	$ 1.684.985,00				$ 6.494.656				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
65	Cheque No.000069 $ 1.715.978,00 NOMINA 16 NOV AL 12 DIC	11/12/2024			$ 1.715.978,000	$ 0,00	$ 1.715.978,00				$ 4.778.678				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
TOTAL DEL PERÍODO							**$ 0,000**								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
PAGOS REALIZADOS SEPTIEMBRE 2024			$8.410.000,00
PAGOS REALIZADOS OCTUBRE 2024			$42.329.065,11
PAGOS REALIZADOS NOVIEMBRE 2024			$88.571.603,00
PAGOS REALIZADOS DICIEMBRE 2024			$55.917.372,73
PAGOS REALIZADOS ENERO 2025			$0,00
VALOR TOTAL			**$195.228.040,84**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO HURTADO PEDRAZA
Matrícula Profesional No.: 041037-0547418 B1
Residente de Obra

Firma
Nombre: ING. JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: TP 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 3951 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO BOLIVAR DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	23	24	22	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	22	20	23	23	24	24	730
Lluvias moderadas	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	1	0	0	12
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

LAS OBRAS PROPIAS DEL CONVENIO FUERON TERMINADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, DURANTE EL PERÍODO NO SE REALIZARON LABORES DE CONSTRUCCIÓN

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO HURTADO PEDRAZA
Matrícula Profesional No.: 041037-0547416 BYC
Residente de Obra

Firma
Nombre: JAIME CHACON DURAN
Matrícula Profesional No.: 682021-12213 STD
Residente de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 3951 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31-ene **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO BOLIVAR DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 - 2024 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	1/11/2024	ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO	INV E 142	Vereda GUAMAL, CANTERA EL CAIRO	1	N/A	6,40%	SI	HUMEDAD ÓPTIMA
1	1/11/2024	ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO	INV E 142	Vereda GUAMAL, CANTERA EL CAIRO	1	N/A	2225,00	SI	DENSIDAD SECA MÁXIMA (KG/M3)
1	1/11/2024	TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE ARENA	INV E- 161	Vereda GUAMAL Tramo k0+040	1	95%	**95,90%**	SI	N/A
2	1/11/2024	TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE ARENA INV E- 161	INV E- 161	Vereda GUAMAL Tramo k0+090	1	95%	**97,50%**	SI	N/A
3	1/11/2024	TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE ARENA INV E- 161	INV E- 161	Vereda GUAMAL Tramo k0+130	1	95%	**102,20%**	SI	N/A
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	16/11/2024	TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE ARENA	INV E- 161	Vereda GUAMAL Tramo k0+022	1	95%	**99,30%**	SI	N/A
2	16/11/2024	TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE ARENA	INV E- 161	Vereda GUAMAL Tramo k0+005	1	95%	**100,50%**	SI	N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

							FECHA		31/01/2025 (Día / Mes / Año)
1	16/11/2024	ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO	INV E 142	Vereda GUAMAL, CANTERA EL CAIRO	1	N/A	5,20%	SI	HUMEDAD ÓPTIMA
1	16/11/2024	ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO	INV E 142	Vereda GUAMAL, CANTERA EL CAIRO	1	N/A	2264,00	SI	DENSIDAD SECA MÁXIMA (KG/M3)
1	Vaciado 11/11/2024 Rotura 09/12/2024	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV. E - 410 ASTM C39	PLACA HUELLA VEREDA GUAMAL KO+020	1	3000 psi	3792.02	SI	FALLA T4
2	Vaciado 11/11/2024 Rotura 09/12/2024	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV. E - 410 ASTM C39	PLACA HUELLA VEREDA GUAMAL KO+020	1	3000 psi	4021,67	SI	FALLA T4
1	8/01/2025	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV. E - 410 ASTM C39	CUNETA VEREDA GUAMAL KO+140	1	3000 psi	3046.24	SI	FALLA T5
2	8/01/2025	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV. E - 410 ASTM C39	CUNETA VEREDA GUAMAL KO+140	1	3000 psi	3172.02	SI	FALLA T4

OBSERVACIONES:

SE ANEXAN LOS RESULTADOS ENTREGADOS A LA FECHA POR LA JAC

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO HURTADO PEDRAZA
Matrícula Profesional No.: 041037-0547416 B`
Residente de Obra

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGION **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 3951 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.006.719,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.006.719,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: n/a

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: n/a

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631-2024 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.201.343,80	17/10/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.050.335,95	17/10/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.302.015,70	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100042548

Certificado de modificación o anexo No.: anexo 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: N/A

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	17/10/2023	31/12/2023

Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100011086 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL (NIT.860037013-6)

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: N/A

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025
(Día) (Mes) (Año)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

A LA FECHA LA JAC NO HA PRESENTADO LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CORRESPONDIENTE CON LA RESPECTIVA PRÓRROGA DEL CONVENIO

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 3951 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL

FECHA DE INICIO: 21/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA 31/12/2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 16/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------- NO X APROBADO: SI ------- NO ------- VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

CONTRACTUALMENTE NO SE EXIGIÓ PRESENTACIÓN DE PLAN DE CALIDAD AL EJECUTOR DEL CONVENIO, SE MANEJAN PARÁMETROS MÍNIMOS DE ENSAYOS Y LABORATORIOS (DENSIDADES DE SUBBASE GRANULAR Y ESAYO DE CONCRETOS A COMPRESIÓN).

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

OBSERVACIONES:

LA FUNCIÓN DE INTERVENTORÍA ES REVISAR LOS ENSAYOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA, Y REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS DE MATERIALES.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------- NO X APROBADO: SI ------- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

N/A

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

N/A

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: .....

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025
(Día) (Mes) (Año)

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: .....

OBSERVACIONES:

N/A

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

N/A

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

N/A

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma N/A	Firma N/A	Firma	Firma N/A
Nombre:	Nombre:	Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS CONVENIO 4478 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN - GUAVATÁ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** ene-25

CONTRATO DE OBRA No.: 4478 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION

PLAZO INICIAL: 45 DIAS
FECHA DE INICIO: 17/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 27/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/09/2024
PLAZO ACUMULADO: 5,43 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.981.336,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.981.336,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	110
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alacantarillas	UND	1
	Gavión	N/A	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	20	117
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alacantarillas	UND	1	1
	Gavión	N/A		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 152.217.814,00	$ 0,00	$ 152.217.814,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.196.988,00	$ 0,00	$ 43.196.988,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.566.534,00	$ 0,00	$ 4.566.534,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.981.336,00	$ 0,00	$ 199.981.336,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 14.277.907,40	$ 0,00	14.277.907,40	163.334.563,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	0,00	4.300.000,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 20.169.293,00	$ 0,00	20.169.293,00	33.346.773,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
VALOR EJECUTADO	$ 34.447.200,40	$ 0,00	34.447.200,40	200.981.336,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	200.981.336,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	200.981.336,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**11**

REGISTRO FOTOGRÁFICO








PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma

Nombre JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoria
Matricula
Profesional 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ene-2025

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 4478 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023

INTERVENTORÍA: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
EL PROYECTO NO CUENTA CON MAQUINARIA Y EQUIPO YA QUE LAS OBRAS CULMINARON EL 08 DE DICIEMBRE DE 2024																																	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	#¡DIV/0!
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: No se ejecutaron actividades de obra fisica, por tal motivo, no se encuentra contratada la maquinaria necesaria.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra JEISON LEANDRO CAMACHO AVILA
Matrícula Profesional No.: 01122 11237 CPITVC

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría LEONARDO DUQUE JIMÉNEZ
Matrícula Profesional No.: 17202-161446 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4478 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

NOMBRE ARL: 0 **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** 0

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										

EL CONVENIADO NO CUENTA CON PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO YA QUE LAS OBRAS CULMINARON EL 31 DE OCTUBRE DE 2024

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JEISON CAMACHO AVILA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 01122 11237 CPITVC

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4478 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN

MES INFORME MENSUAL: ene-25 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	1297723	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Principal	$ 199.981.336
			TOTAL			$ 199.981.336

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.981.336,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	sep-24	$ 11.099.369	$ -	$ 11.099.369	$ -	$ -	0	CE 001; CE 002; CE 004; CE 006 - 10/09/2024	$ 188.881.967	$ 188.881.967				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
2	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	oct-24	$ 27.303.250	$ -	$ 27.303.250	$ -	$ -	0	CE 009 a CE 012 - 08/10/2024	$ 161.578.717	$ 161.578.717				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
3	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	oct-24	$ 26.620.712	$ -	$ 26.620.712	$ -	$ -	0	CE 013 a CE 014 - 15/10/2024	$ 134.958.005	$ 134.958.005				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
4	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	oct-24	$ 12.361.663	$ -	$ 12.361.663	$ -	$ -	0	CE 016 a CE 021 - 22/10/2024	$ 122.596.342	$ 122.596.342				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
5	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	oct-24	$ 2.089.137	$ -	$ 2.089.137	$ -	$ -	0	CE 022 a CE 024 - 29/10/2024	$ 120.507.205	$ 120.507.205				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
6	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	nov-24	$ 34.912.979	$ -	$ 34.912.979	$ -	$ -	0	CE 025 a CE 041 - 12/11/2024	$ 85.594.226	$ 85.594.226				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
7	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	nov-24	$ 11.174.240	$ -	$ 11.174.240	$ -	$ -	0	CE 035, 036 y 042 a CE 044 - 18/11/2024	$ 74.419.986	$ 74.419.986				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
8	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	nov-24	$ 6.961.520	$ -	$ 6.961.520	$ -	$ -	0	CE 046 a CE 055 - 25/11/2024	$ 67.458.466	$ 67.458.466				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
9	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	dic-24	$ 28.098.095	$ -	$ 28.098.095	$ -	$ -	0	CE 058; CE 057; CE 056; CE 045; CE 059; CE 063; CE 061; CE 060; CE 066 - 02/12/2024	$ 39.360.371	$ 39.360.371				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
10	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	dic-24	$ 8.878.833	$ -	$ 8.878.833	$ -	$ -	0	CE 064 a CE 071 - 11/12/2024	$ 30.481.538	$ 30.481.538				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
11	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	dic-24	$ 9.841.172	$ -	$ 9.841.172	$ -	$ -	0	CHEQUE N° 72 - 18/12/2024	$ 20.640.366	$ 20.640.366				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
11	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	ene-25	$ 9.483.800		$ 9.483.800	$ -	$ -	0	CE 068; CE 070; CE 073; CE 077 - 10/01/2025	$ 11.156.566	$ 11.156.566				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
11	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	ene-25	$ 5.013.204		$ 5.013.204	$ -	$ -	0	CE 075 a CE 080 - 16/01/2025	$ 6.143.362	$ 6.143.362				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
11	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	ene-25	$ 4.823.193		$ 4.823.193	$ -	$ -	0	CE 074; CE 081; CE 082 - 28/01/2025	$ 1.320.169	$ 1.320.169				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
	TOTALES		**$ 198.661.167**		**$ 198.661.167**					**$ 1.320.169**	**$ 1.320.169**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*OBRAS	$ 146.581.442	$ -	**$ 146.581.442**
*GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 52.079.725	$ -	**$ 52.079.725**
*PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	**$** -
-			
-			
-			
-			
-			
VALOR TOTAL	$ 198.661.167	$ -	**$ 198.661.167**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JEISON LEANDRO CAMACHO AVILA
Residente de obra
Matrícula Profesional No.: 01122 11237 CPITVC

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4478 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																0
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

LAS OBRAS OBJETO DEL CONVENIO FUERON CULMINADAS EL 08 DE DICIEMBRE DE 2024

Firma
Nombre: JEISON LEANDRO CAMACHO AVILA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 01122 11237 CPITVC

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría LEONARDO DUQUE JIMÉNEZ
Matrícula Profesional No.: 17202-161446 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/01/2025
(Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:	3753 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	ene-2025	**PROYECTO:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1631 DE 2023	**INTERVENTOR:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	25/10/2024	Ensayo de Densidad de Campo para Subbase (Método del Cono de Arena)	INV.E-161-07	Vía Escuela La Unión	2	>95%	95,80% 98,10%	SI SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: JEISON LEANDRO CAMACHO AVILA
Residente de Obra
Matrícula
Profesional No.: 01122 11237 CPITVC

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4478 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 17/11/2023
PLAZO INICIAL: 45 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/11/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200.981.336,00
VALOR ACUMULADO: $ 200.981.336,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 40.196.268,00	16-112023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10.049.067,00	16/11/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60.294.401,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001992
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: POLIZAS – LA PREVISORA S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 10/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 232.000.000,00	16	11	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014743 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025
(Día) (Mes) (Año)

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 10/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

EL CONVENIADO SE ENCUENTRA REALIZANDO EL TRÁMITE DE ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4478 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN

FECHA DE INICIO: 17/11/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 45 DIAS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 11/11/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------- NO ------- APROBADO: SI ------- NO ------- VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------- NO ------- APROBADO: SI ------- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: .....

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: .....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: JEISON LEANDRO CAMACHO AVILA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 01122 11237 CPITVC

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional: 25202-61517 CND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 4478 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
(Indicar número y año)

JUSTIFICACIÓN:
NOTA: PARA EL PRESENTE CONTRATO NO SE LE REALIZÓ ENTREGA DE ANTICIPO A LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAVATÁ

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: YAMID ARDILA MARIN
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Cédula de Ciudadanía.: 13.617.846

Firma:
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. ____ **MES:** ENERO DE 2025 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 4478 DE 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. ____ **DE** ____ ENTIDAD FINANCIERA: ____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. ____ **BANCO** ____ SUCURSAL: ____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: ____ **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:
PARA EL PRESENTE CONTRATO NO SE LE REALIZO ENTREGA DE ANTICIPO A LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31/01/2025
	(Día / Mes / Año)

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma: 
Nombre: YAMID ARDILA MARIN
Representante Legal o Delegado
Contratista
Cédula de Ciudadanía: 13.617.846

Firma: 
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS CONVENIO 4767 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA - GUAVATÁ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** ene-25

CONTRATO DE OBRA No.: 4767 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA

PLAZO INICIAL: 31 DIAS
FECHA DE INICIO: 30/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 6/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 16/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 7,33 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.995.632,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.995.632,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 200.995.632,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	103
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alacantarillas	UND	1
	Gavión	N/A	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	20	103
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alacantarillas	UND	1	1
	Gavión	N/A		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 152.264.363,00	$ 0,00	$ 152.264.363,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 0,00	$ 0,00
COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.197.174,00	$ 0,00	$ 43.197.174,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.567.931,00	$ 0,00	$ 4.567.931,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.029.468,00	$ 0,00	$ 200.029.468,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 39.000.000,00	$ 0,00	39.000.000,00	152.264.363,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	0,00	4.100.000,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ 13.162.730,00	$ 0,00	13.162.730,00	43.197.174,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
VALOR EJECUTADO	$ 52.162.730,00	$ 0,00	52.162.730,00	199.561.537,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	199.561.537,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	199.561.537,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100%	

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1



Terminación placa huella 103 metros.



Foto 2



Construccion de alcantarilla

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma

Nombre JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoria
Matricula
Profesional 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ene/2025

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 4767 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EL PROYECTO NO CUENTA CON MAQUINARIA Y EQUIPO YA QUE LAS OBRAS CULMINARON EL 13 DE DICIEMBRE DE 2024																																		
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL EN REPARACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	3	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	1	100

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado)

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelante o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra VIVIANA PAOLA RODRIGUEZ ARIZA
Matrícula Profesional No.: 25202215781CND

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría LEONARDO DUQUE JIMÉNEZ
Matrícula Profesional No.: 17202-161446 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4767 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene/2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATÁ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1																																															
2																																															
4																																															
5																																															
6																																															
7																																															
8																																															

EL CONVENIADO NO CUENTA CON PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO YA QUE LAS OBRAS CULMINARON EL 31 DE OCTUBRE DE 2024

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: VIVIANA PAOLA RODRIGUEZ ARIZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202215781CND

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4767 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA

MES INFORME MENSUAL: ene-25 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	1312123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Principal	$ 199.995.632
			TOTAL			$ 199.995.632

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.995.632,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
1	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	sep-24	$ 11.082.656	$ -	$ 11.082.656	$ -	$ -	0	CE 001 a CE 007 - 10/09/2024	$ 188.912.976	$ 188.912.976				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0							
2	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	oct-24	$ 26.625.450	$ -	$ 26.625.450	$ -	$ -	0	CE 009 a CE 015 - 08/10/2024	$ 162.287.526	$ 162.287.526				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0							
3	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	oct-24	$ 23.120.669	$ -	$ 23.120.669	$ -	$ -	0	CE 023 a CE 040 - 15/10/2024	$ 139.166.857	$ 139.166.857				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0							
4	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	oct-24	$ 1.942.374	$ -	$ 1.942.374	$ -	$ -	0	CE 018 a CE 019 - 22/10/2024	$ 137.224.483	$ 137.224.483				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de
5	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	oct-24	$ 11.320.930	$ -	$ 11.320.930	$ -	$ -	0	CE 020 a CE 025 - 29/10/2024	$ 125.903.553	$ 125.903.553				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de
6	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	nov-24	$ 45.528.752		$ 45.528.752	$ -	$ -	0	CE 026 a CE 046 - 12/11/2024	$ 80.374.801	$ 80.374.801				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de
7	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	nov-24	$ 4.518.000		$ 4.518.000	$ -	$ -	0	CE 031; CE 032; CE 047 - 19/11/2024	$ 75.856.801	$ 75.856.801				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de
8	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	nov-24	$ 8.246.323		$ 8.246.323	$ -	$ -	0	CE 050 a CE 060 - 25/11/2024	$ 67.610.478	$ 67.610.478				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de
8	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	dic-24	$ 25.612.475		$ 25.612.475	$ -	$ -	0	CE 048 Y CE 061 a CE 68- 02/12/2024	$ 41.998.003	$ 41.998.003				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de
8	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	dic-24	$ 9.281.717		$ 9.281.717	$ -	$ -	0	CE 069 a CE 073 - 11/12/2024	$ 32.716.286	$ 32.716.286				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de
8	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	dic-24	$ 9.955.875		$ 9.955.875	$ -	$ -	0	CHEQUE N° 75 - 18/12/2024	$ 22.760.411	$ 22.760.411				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de
8	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	ene-25	$ 9.457.200		$ 9.457.200	$ -	$ -	0	CHEQUE N° 75 - 18/12/2024	$ 13.303.211	$ 13.303.211				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de
8	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	ene-25	$ 3.473.600		$ 3.473.600	$ -	$ -	0	CHEQUE N° 75 - 18/12/2024	$ 9.829.611	$ 9.829.611				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de
8	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	ene-25	$ 4.825.926		$ 4.825.926	$ -	$ -	0	CHEQUE N° 75 - 18/12/2024	$ 5.003.685	$ 5.003.685				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de
TOTALES			**$ 194.991.947**		**$ 194.991.947**					**$ 5.003.685**	**$ 5.003.685**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*OBRAS	$ 143.634.908	$ -	**$ 143.634.908**
*GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 51.357.039	$ -	**$ 51.357.039**
*PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	**$ -**
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 194.991.947	$ -	**$ 194.991.947**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: VIVIANA PAOLA RODRIGUEZ ARIZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202215781CND

Firma
Nombe: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4767 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene/2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																0
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

LAS OBRAS OBJETO DEL CONVENIO FUERON CULMINADAS EL 13 DE DICIEMBRE DE 2024

Firma
Nombre: VIVIANA PAOLA RODRIGUEZ ARIZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202215781CND

Firma
Nombre: LEONARDO DUQUE JIMENEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-161446 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/01/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:	4767 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	ENERO DE 2024	**PROYECTO:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1631 DE 2023	**INTERVENTOR:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Dia/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	25/10/2024	Ensayo de Densidad de Campo para Subbase (Método del Cono de Arena)	INV.E-161-07	Vía Buena Vista - Popoa	1	>95%	96,20%	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: VIVIANA PAOLA RODRIGUEZ ARIZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520221578 1CND

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4767 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 30/11/2023

PLAZO INICIAL: 44 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.785.769,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.785.769,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.100.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 40.199.127,00	30/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10.049.782,00	30/11/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60.298.690,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002003

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000,00	30	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014764 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 40.199.127,00	31/10/2024	16/10/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10.049.782,00	31/12/2026	16/12/2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60.298.690,00	16/12/2024	16/12/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002003

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 260.000.000,00	30	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014764 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4767 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA

FECHA DE INICIO: 30/11/2023 (Indicar dia, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 44 DIAS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 16/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: .....

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: .....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: VIVIANA PAOLA RODRIGUEZ ARIZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202215781CND

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional: 25202-61517 CND	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 4767 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

JUSTIFICACIÓN:
NOTA: PARA EL PRESENTE CONTRATO NO SE LE REALIZÓ ENTREGA DE ANTICIPO A LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATÁ

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: Adriana Gerena
Nombre: ADRIANA GERENA GONZALEZ
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Cédula de Ciudadanía.: 1.097.332.297

Firma:
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____ **MES:** DICIEMBRE DE 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 4767 DE 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. _____ **DE** _____ ENTIDAD FINANCIERA: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: _____ **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

PARA EL PRESENTE CONTRATO NO SE LE REALIZÓ ENTREGA DE ANTICIPO A LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATÁ

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma: Adriana Gerena
Nombre: ADRIANA GERENA GONZALEZ
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Cédula de Ciudadanía.: 1.097.332.297

Firma:
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS CONVENIO 3753 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLÍN - LA BELLEZA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** ene-25

CONTRATO DE OBRA No.: 3753 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

PLAZO INICIAL:	86 DIAS		
FECHA DE INICIO:	10/05/2023	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 200.108.139,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	31/12/2023	**VALOR ADICIONALES (incluido I**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	27/05/2024	**VALOR ACUMULADO (incluido I**	$ 200.108.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	11/11/2024	**ANTICIPO CONCEDIDO:**	$ 200.108.139,00
PLAZO ACUMULADO:	13,00 MESES	**ANTICIPO AMORTIZADO:**	$ -

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INT HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	149
	Mejoramiento	N/A	0
	Rehabilitación	N/A	0
Estructuras	Alacantarillas	UND	0
	Gavión	N/A	0
	Pontones	N/A	0
Mantenimiento		N/A	0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	ANTIDAD ME	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimen	Placa Hue	ML	0	154
	Mejoramie	N/A		0
	Rehabilita	N/A		0
Estructur	Alacantar	UND	0	0
	Gavión	N/A		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios	GB	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 147.941.290,00	$ 0,00	$ 147.941.290,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.652.861,00	$ 0,00	$ 46.652.861,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.513.988,00	$ 0,00	$ 4.513.988,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.108.139,00	$ 0,00	$ 199.108.139,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 0,00	$ 0,00	0,00	134.602.766,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 0,00	$ 0,00	0,00	64.505.373,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
VALOR EJECUTADO	$ 0,00	$ 0,00	0,00	199.108.139,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	199.108.139,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	199.108.139,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Placa huella terminada



Vista general Tramo Placa huella

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma

Nombre JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matricula
Profesional 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Escriba el texto aquí

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ene-2025

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3753 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023

INTERVENTORÍA: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
EL PROYECTO NO CUENTA CON MAQUINARIA Y EQUIPO YA QUE LAS OBRAS CULMINARON EL 31 DE OCTUBRE DE 2024																																	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
En el mes de Julio todavía no se cuenta con maquinaria dado que se realizo la parte de estudios y diseños únicamente

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra JORGE ROMALDO FANDIÑO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 54202-304584 NTS

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría LEONARDO DUQUE JIMÉNEZ
Matrícula Profesional No. 17202-161448 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/01/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 3753 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1																																																		
2																		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 3753 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN

MES INFORME MENSUAL: ENERO.-2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	1146623	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Principal	$ 199.108.139
			TOTAL			$ 199.108.139

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199.108.139,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	sep-24	$ 16.158.878		$ 16.158.878	$ -	$ -	0	CE 001 a CE 009 - 10/09/2024	$ 182.949.261	$ 182.949.261				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
					$ -	$ -	$ -	0							
2	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	oct-24	$ 41.748.958		$ 41.748.958	$ -	$ -	0	CE 010 a CE 012 - 02/10/2024	$ 141.200.303	$ 141.200.303				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
					$ -	$ -	$ -	0							
3	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	oct-24	$ 23.558.543		$ 23.558.543	$ -	$ -	0	CE 013 a CE 026 - 15/10/2024	$ 117.641.760	$ 117.641.760				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
					$ -	$ -	$ -	0							
4	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	oct-24	$ 50.111.364		$ 50.111.364	$ -	$ -	0	CE 027 a CE 029 - 21/10/2024	$ 67.530.396	$ 67.530.396				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
					$ -	$ -	$ -	0							
5	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	nov-24	$ 34.642.329		$ 34.642.329	$ -	$ -	0	5/11/2024	$ 32.888.067	$ 32.888.067				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra y otros gastos administrativos.
6	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	nov-24	$ 12.602.085		$ 14.852.084	$ -	$ -	0	25/11/2024	$ 18.035.983	$ 18.035.983				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra y otros gastos administrativos.
7	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	dic-24	$ 16.664.888		$ 16.664.888	$ -	$ -	0		$ 1.371.094	$ 1.371.094				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra y otros gastos administrativos.
8	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	ene-25	$ 39.741,6		$ 39.741,64	$ -	$ -			$ 1.331.353	$ 1.331.353				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra y otros gastos administrativos.
TOTALES					**$ 197.776.786**					**$ 1.331.353**	**$ 1.331.353**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*OBRAS	$ 133.231.672	$ -	**$ 133.231.672**
*GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 64.545.115	$ -	**$ 64.545.115**
*PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 197.776.786	$ -	**$ 197.776.786**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE RONALDO FANDIÑO GOMEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-304584 NTS

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 3753 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																0
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

LAS OBRAS OBJETO DEL CONVENIO FUERON CULMINADAS EL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Firma
Nombre: JORGE ROMALDO FANDIÑO GOMEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-304584 NTS

Firma
Nombre: LEONARDO DUQUE JIMÉNEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 682021-12213 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/01/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:	3753 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	ene-2025	**PROYECTO:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1631 DE 2023	**INTERVENTOR:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha de vaciado(Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
EL CONVENIADO NO PRESENTA ENSAYOS DE LABORATORIO YA QUE LAS OBRAS CULMINARON EL 31 DE OCTUBRE DE 2024									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
EL CONVENIADO NO PRESENTA ENSAYOS DE LABORATORIO YA QUE LAS OBRAS CULMINARON EL 31 DE OCTUBRE DE 2024									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE ROMALDO FANDIÑO GOMEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-304584 NTS

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula P 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 3753 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 10/05/2023
PLAZO INICIAL: 86 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/11/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200.108.139,00
VALOR ACUMULADO: $ 200.108.139,00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		40.021.628,00	4/10/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		10.005.407,00	4/10/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		60.032.442,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001976
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: POLIZAS – LA PREVISORA S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 8/08/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 232.000.000,00	4	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014717 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: POLIZAS – LA PREVISORA S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 15/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025
(Día) (Mes) (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** X **MODIFICACIÓN No.:** 3 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		40.021.628,00	27/07/2025	11/09/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		10.005.407,00	27/09/2027	11/11/2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		60.032.442,00	11/11/2024	11/11/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001976

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: POLIZAS – LA PREVISORA S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** X **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	12	12	2023	11	11	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014717 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: POLIZAS – LA PREVISORA S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 3753 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN

FECHA DE INICIO: 10/05/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 86 DIAS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 11/11/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: .....

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: .....

FECHA 31/01/2025 (Dia) (Mes) (Año)

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: JORGE ROMALDO FANDIÑO GOMEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional: 25202-61517 CND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 3753 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

JUSTIFICACIÓN:
NOTA: PARA EL PRESENTE CONTRATO NO SE LE REALIZÓ ENTREGA DE ANTICIPO A LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: CARLOS NORBEY CLAVIJO VELASCO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Cédula de Ciudadanía: 91.301.354

Firma:
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. ..... **MES:** ..... **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 3753 DE 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. ..... **DE** ..... ENTIDAD FINANCIERA: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. ..... **BANCO** ..... SUCURSAL: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: ..... **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$** ..... - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLÍN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

PARA EL PRESENTE CONTRATO NO SE LE REALIZÓ ENTREGA DE ANTICIPO A LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma: 
Nombre: CARLOS NORBEY CLAVIJO VELASCO
Representante Legal o Delegado
Contratista
Cédula de Ciudadanía No.: 91.301.354

Firma: 
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS CONVENIO 4175 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL - LA BELLEZA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** ene/2025

CONTRATO DE OBRA No.: 4175 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL

PLAZO INICIAL: 58 dias
FECHA DE INICIO: 11/03/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 27/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 11/11/2024
PLAZO ACUMULADO: 15,00 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.319.574,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA) $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) $ 200.319.574,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 200.319.574,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:** HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	144
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alacantarillas	UND	
	Gavión	N/A	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	ANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	84	144
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alacantarillas	UND	0	0
	Gavión	N/A		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 148.310.412,00	$ 0,00	$ 148.310.412,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.501.772,00	$ 0,00	$ 46.501.772,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.507.390,00	$ 0,00	$ 4.507.390,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.319.574,00	$ 0,00	$ 199.319.574,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 0,00	$ 0,00	0,00	161.824.734,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	0,00	4.800.000,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 0,00	$ 0,00	0,00	32.694.840,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
VALOR EJECUTADO	$ 0,00	$ 0,00	0,00	199.319.574,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 146.151.770,30
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 199.319.574,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 136,38%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **8**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto







Indicar la localización y actividad. **Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma

Nombre JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoria
Matricula
Profesional 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** **SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ene/2025

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 4175 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023

INTERVENTORÍA: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				**DÍAS DEL MES**																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
EL PROYECTO NO CUENTA CON MAQUINARIA Y EQUIPO YA QUE LAS OBRAS CULMINARON EL 31 DE OCTUBRE DE 2024																																
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACION				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta oblig
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra Jorge Eduardo Hurtado Pedraza
Matrícula Profesional No.: 041037-0547416 BYC

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría LEONARDO DUQUE JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 17202-161446 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4175 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1																																															OPS
2																																																			
3																																																		
4																																																		
5																																																		
6																																																		
7																																																		
8																																																		
9																																																		

EL CONVENIADO NO CUENTA CON PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO YA QUE LAS OBRAS CULMINARON EL 31 DE OCTUBRE DE 2024

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO HURTADO PEDRAZA
Director
Matrícula Profesional No.: 041037-0547416 BYC

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4175 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL

MES INFORME MENSUAL: ENERO.-2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	1253123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Principal	$ 199.319.574
			TOTAL			$ 199.319.574

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199.319.574,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	sep-24	$ 15.147.640	$ -	$ 15.147.640	$ -	$ -	0	CE 001 a CE 006 - 10/09/2024	$ 184.171.934	$ 184.171.934				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
				$ -	$ -	$ -	$ -	0							
2	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	oct-24	$ 49.149.065	$ -	$ 49.149.065	$ -	$ -	0	CE 007 a CE 016 - 10/10/2024	$ 135.022.869	$ 135.022.869				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
				$ -	$ -	$ -	$ -	0							
3	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	oct-24	$ 41.864.779	$ -	$ 41.864.779	$ -	$ -	0	CE 008; CE 018; CE 019; CE 020; CE 021; CE 023 Y CE 024 - 15/10/2024	$ 93.158.090	$ 93.158.090				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
				$ -	$ -	$ -	$ -	0							
4	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	oct-24	$ 38.861.990	$ -	$ 38.861.990	$ -	$ -	0	CE 025 a CE 034 - 29/10/2024	$ 54.296.100	$ 54.296.100				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
				$ -	$ -	$ -	$ -	0							
5	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	nov-24	$ 28.197.323	$ -	$ 28.197.323	$ -	$ -	0	CE 24; CE36 a CE40 - 12/11/2024	$ 26.098.777	$ 26.098.777				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
6	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	nov-24	$ 19.385.510	$ -	$ 19.385.510	$ -	$ -	0	CE41; CE42; CE43;CE44 Y CE37 - 19/11/2024	$ 6.713.267	$ 6.713.267				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra y suministro de materiales.
7	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	ene-25	$ 6.713.267		$ 6.713.267				CE 052 Y CE 054 - 16/01/2025	$ -	$ -				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra y suministro de materiales.
TOTALES					**$ 199.319.574**					**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*OBRAS	$ 161.655.734	$ -	**$ 161.655.734**
*GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 37.663.840	$ -	**$ 37.663.840**
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 199.319.574	$ -	**$ 199.319.574**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO HURTADO PEDRAZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 041607-054748 BYC

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4175 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																															
Lluvias moderadas																															
Lluvias intensas																															
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

LAS OBRAS OBJETO DEL CONVENIO FUERON CULMINADAS EL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Firma
Nombre: Jorge Eduardo Hurtado Pedraza
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 041037-0547416 BYC

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría LEONARDO DUQUE JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 17202-161446 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/01/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:	4175 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	ene/2025	**PROYECTO:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1631 DE 2023	**INTERVENTOR:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
PARA EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE REMITIERON ENSAYOS DE LABORATORIO EN VISTA DE QUE LAS OBRA CONCLUYERON EL 31 DE OCTUBRE DE 2024									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
PARA EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE REMITIERON ENSAYOS DE LABORATORIO EN VISTA DE QUE LAS OBRA CONCLUYERON EL 31 DE OCTUBRE DE 2024									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jorge Eduardo Hurtado Pedraza
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 041037-0547418 BYC

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4175 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 30/11/2023

PLAZO INICIAL: 44 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/11/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.319.574,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.319.574,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 40.063.915,00	30/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10.015.979,00	30/11/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60.095.873,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001983

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 7/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000,00	3	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014731 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

EL CONVENIADO SE ENCUENTRA REALIZANDO EL TRÁMITE DE ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO

Director de Interventoría

Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4175 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MAR

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL

FECHA DE INICIO: 11/03/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 58 dias **FECHA DE VENCIMIENTO:** 11/11/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ____ NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ N ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: Jorge Eduardo Hurtado Pedraza
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 041037-0547416 BYC

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 0

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: 0

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional: 25202-61517 CND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 4175 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

JUSTIFICACIÓN:
NOTA: PARA EL PRESENTE CONTRATO NO SE LE REALIZO ENTREGA DE ANTICIPO A LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: JUAN PABLO OVALLE PINEDA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Cédula de Ciudadanía No.: 5.771.781

Firma:
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS CONVENIO 4490 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS - SUCRE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** ene-2025

CONTRATO DE OBRA No.: 4490 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS

PLAZO INICIAL:
FECHA DE INICIO: 17/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 27/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/11/2024
PLAZO ACUMULADO: 7,30 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.785.769,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.785.769,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 200.785.769,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	142
	Mejoramiento	N/A	0
	Rehabilitación	N/A	0
Estructuras	Alacantarillas	UND	0
	Gavión	N/A	0
	Pontones	N/A	0
Mantenimiento		N/A	0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	145	175
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alacantarillas	UND	0	0
	Gavión	N/A		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 152.028.677,00	$ 0,00	$ 152.028.677,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.196.232,00	$ 0,00	$ 43.196.232,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.560.860,00	$ 0,00	$ 4.560.860,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.785.769,00	$ 0,00	$ 199.785.769,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 30.718.733,00	$ 0,00	30.718.733,00	136.970.586,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	0,00	4.700.000,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 24.943.889,00	$ 0,00	24.943.889,00	58.115.183,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
VALOR EJECUTADO	$ 55.662.622,00	$ 0,00	55.662.622,00	199.785.769,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	199.785.769,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	199.785.769,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**14**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA ORGANOS SUCRE SANTANDER SECTOR LA PEÑA- PLACA HUELLA CONSTRUIDA



VEREDA ORGANOS SUCRE SANTANDER SECTRO LA PEÑA- VISITA DE CAMPO INICIO TRAMO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma

Nombre JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoria
Matricula
Profesional 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ene-2025

CONTRATO No. 4490 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
EL PROYECTO NO CUENTA CON MAQUINARIA Y EQUIPO YA QUE LAS OBRAS CULMINARON EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024																																	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	3	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: CRISTIAN IVAN MARIN QUITIAN
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 151037-0508189 STD

Firma
Nombre: LEONARDO DUQUE JIMÉNEZ
Residente de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 17202-161446 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4490 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-25 **PROYECTO:** ALIANZA ESPECIFICA ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	

EL CONVENIADO NO CUENTA CON PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO YA QUE LAS OBRAS CULMINARON EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CRISTIAN IVAN MARIN QUITIAN
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 151037-0508189 STD

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4490 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS

MES INFORME MENSUAL: ene-25 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	1312123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Principal	$ 199.785.769
			TOTAL			$ 199.785.769

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.785.769,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
1	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	sep-24	$ 62.387.533	$ -	$ 62.387.533	$ -	$ -	0	CE 001 a CE 012 - 10/09/2024	$ 137.398.236	$ 137.398.236				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
				$ -	$ -	$ -	$ -	0							
2	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	oct-24	$ 28.807.470	$ -	$ 28.807.470	$ -	$ -	0	CE 013 a CE 022 - 02/10/2024	$ 108.590.766	$ 108.590.766				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
				$ -	$ -	$ -	$ -	0							
3	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	oct-24	$ 37.109.448	$ -	$ 37.109.448	$ -	$ -	0	CE 026 a CE 043 - 15/10/2024	$ 71.481.318	$ 71.481.318				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
				$ -	$ -	$ -	$ -	0							
4	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	oct-24	$ 2.573.500	$ -	$ 2.573.500	$ -	$ -	0	CE 044 - 22/10/2024	$ 68.907.818	$ 68.907.818				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
5	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	oct-24	$ 1.807.024	$ -	$ 1.807.024	$ -	$ -	0	CE 045 a CE 046 - 29/10/2024	$ 67.100.794	$ 67.100.794				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
6	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	nov-24	$ 17.382.050	$ -	$ 17.382.050	$ -	$ -	0	CE 047 a CE 057 - 05/11/2024	$ 49.718.744	$ 49.718.744				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
7	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	nov-24	$ 19.624.507	$ -	$ 19.624.507	$ -	$ -	0	CE 058 a CE 071 - 19/11/2024	$ 30.094.237	$ 30.094.237				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
8	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	nov-24	$ 18.656.065	$ -	$ 18.656.065	$ -	$ -	0	CE 072 a CE 082 - 25/11/2024	$ 11.438.172	$ 11.438.172				En este Comité operativo se aprobaron pagos por concepto de Nómina del personal de Obra, suministro de materiales y alquiler de maquinaria y equipos.
9	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	dic-24	$ 4.931.603	$ -	$ 4.931.603	$ -	$ -	0	CE 083 a CE 085 - 2/12/2024	$ 6.506.569	$ 6.506.569				
9	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	dic-24	$ 5.007.574	$ -	$ 5.007.574	$ -	$ -	0	CE 086 a CE 090 - 18/12/2024	$ 1.498.995	$ 1.498.995				
10	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	ene-25	$ 1.498.995	$ -	$ 1.498.995	$ -	$ -	0	CE 041 - 29/10/2024	$ -	$ -				
TOTALES			**$ 199.785.769**	**$ -**	**$ 199.785.769**					**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*OBRAS	$ 136.970.586	$ -	**$ 136.970.586**
*GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 62.815.183	$ -	**$ 62.815.183**
*PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	**$ -**
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 199.785.769	$ -	**$ 199.785.769**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CRISTIAN IVAN MARIN QUITIAN
Residente de obra
Matrícula Profesional No.: 151037-0508189 STD

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4490 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																0
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

LAS OBRAS OBJETO DEL CONVENIO FUERON CULMINADAS EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

Firma
Nombre: CRISTIAN IVAN MARIN QUITIAN
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 151037-0508189 STD

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/01/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:	4490 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	ENERO DE 2025	**PROYECTO:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1631 DE 2023	**INTERVENTOR:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									

PARA EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE REMITIERON ENSAYOS DE LABORATORIO EN VISTA DE QUE LAS OBRA CONCLUYERON EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

PARA EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE REMITIERON ENSAYOS DE LABORATORIO EN VISTA DE QUE LAS OBRA CONCLUYERON EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: CRISTIAN IVAN MARIN QUITIAN
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 151037-0508189 STD

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4490 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 17/11/2023

PLAZO INICIAL: 44 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.785.769,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.785.769,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		40.157.154,00	17/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		10.039.289,00	17/11/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		60.235.731,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001994

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 4/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000,00	17	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014746 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		40.157.154,00	31/10/2024	22/09/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		10.039.289,00	31/12/2026	22/112027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		60.235.731,00	22/11/2024	22/11/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001994

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 260.000.000,00	31	12	2023	22	11	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014746 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4490 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS

FECHA DE INICIO: 17/11/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 44 DIAS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 11/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ..... **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** .....

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ..... **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** .....

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: .....

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: .....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional: 25202-61517 CND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 4490 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

JUSTIFICACIÓN:
NOTA: PARA EL PRESENTE CONTRATO NO SE LE REALIZÓ ENTREGA DE ANTICIPO A LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: LEIDY JOHANA CARANTON CARANTON
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Cédula de Ciudadanía.: 1.099.342.608

Firma:
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. ..... **MES:** ENERO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 4490 DE 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. ..... **DE** ..... ENTIDAD FINANCIERA: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. ..... **BANCO** ..... SUCURSAL: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: ..... **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:
PARA EL PRESENTE CONTRATO NO SE LE REALIZÓ ENTREGA DE ANTICIPO A LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma: _____
Nombre: LEIDY JOHANA CARAMTON CARANTON
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Cédula de Ciudadanía.: 1.099.342.608

Firma: _____
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS CONVENIO 4357 DE 2023 TUBAVITA VELEZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** ene-25

CONTRATO DE OBRA No.: 4357 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA

PLAZO INICIAL: 46 DIAS
FECHA DE INICIO: 16/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 27/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 13/01/2025
PLAZO ACUMULADO: 5,47 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.030.449,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.030.449,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 201.030.449,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	119
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alacantarillas	UND	1
	Gavión	N/A	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	75,00	**123,50**
	Mejoramiento	N/A	33,00	**123,50**
	Rehabilitación	N/A	0,00	**0,00**
Estructuras	Alacantarillas	UND	1,00	**1,00**
	Gavión	N/A	0,00	**0,00**
	Pontones	N/A	0,00	**0,00**
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	100%	**100%**

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 145.972.999,00	$ 0,00	$ 145.972.999,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.658.736,00	$ 0,00	$ 49.658.736,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.398.714,00	$ 0,00	$ 4.398.714,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.030.449,00	$ 0,00	$ 200.030.449,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$8.563.317,24	$0,00	$8.563.317,24	$150.386.393,02
GASTOS ADMINISTRATIVOS (INC DISEÑOS)	$0,00	$0,00	$0,00	$43.814.063,67
GESTIÓN SOCIAL (PAGA)	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
OTROS GASTOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
TOTAL	**$8.563.317,24**	**$0,00**	**$8.563.317,24**	**$194.200.456,69**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 200.030.449,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 194.200.456,69
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 97,09%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 10

REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO No.3 TERMINADO



TRAMO No.2 TERMINADO



TRAMO No.1 TERMINADO



ALCANTARILLA TERMINADA

			
13/01/2025 Visita previa a recibo de convenio (Tramo 3 Terminado)	13/01/2025 Visita previa a recibo de convenio (Tramo 2 Terminado)	25/01/2025 Actividad social de cierre, inauguración de la placahuella Vereda Tubavita	25/01/2025 Actividad social de cierre, inauguración de la placahuella Vereda Tubavita

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica) **N/A**

OBSERVACIONES:
A LA FECHA SE TIENE EJECUTADO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA, NO SE HA EJECUTADO EL RUBRO PAGA

Firma
Nombre JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ene-2025

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 4357 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Retroexcavadaroa de llantas																																
Vibro Compactador		**10 Ton**																														
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																
TOTAL ACTIVO																																
TOTAL EN REPARACIÓN																																
TOTAL INACTIVO																																

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:
LAS OBRAS DEL CONVENIO FUERON CULMINADAS EN EL MES DICIEMBRE DE 2024, DURANTE EL PERÍODO NO SE EJECUTARON OBRAS.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligaci
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra MARIA CAMILA DIAZ CARRASCO
Matrícula Profesional No.: 151037-0513350 STD

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría JAIME CHACÓN DURÁN
Matrícula Profesional No.: 682021-12213 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4357 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	MARÍA CAMILA DÍAZ CARRA	1101758682	ING RESIDENTE DE OBRA																																	MARÍA CAMILA DÍAZ CARRASCO														
2	ALBA RUTH SANTAMARIA AI	63437843	CONTADORA																																	ALBA RUTH SANTAMARIA ARIZA														
3	Diego Leonardo Barbosa Ar.	Cc 1101753321	AYUDANTE																																	JAC TUBAVITA														
4	Edilberto Cubides	CC 13956198	AYUDANTE																																	JAC TUBAVITA														
5	Luis Ariel Díaz Ariza	cc13956736	AYUDANTE																																	JAC TUBAVITA														
6	Ramiro Díaz Quiroga	cc 13955127	MAESTRO																																	JAC TUBAVITA														
7	Javier Galeano Hernández	cc 7'171.930	AYUDANTE																																	JAC TUBAVITA														
8	Juan Pablo Morales Castillo	cc 1070922552	AYUDANTE																																	JAC TUBAVITA														

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

LAS OBRAS DEL CONVENIO FUERON CULMINADAS EN EL MES DICIEMBRE DE 2024, DURANTE EL PERÍODO NO SE EJECUTARON OBRAS.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: MARIA CAMILA DIAZ CARRASCO
Ingeniera Residente de obra
Matricula Profesional No. 151037-0513350 STD

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4357 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	1300423	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Principal	$ 200.030.449
TOTAL						$ 200.030.449

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 200.030.449,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación	Indicar pago según		Observaciones
													SI	NO	
1	Cheque No.000001 $ 1.960.000,00 SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR(A), Período del 01 al 31 de Agosto de 2024.	10/09/2024			$ 1.960.000,00	$ 0,00	$ 1.960.000,00				$ 198.070.449,00				GASTOS ADMINISTRATIVOS
2	Cheque No.000002 $ 3.500.000,00 SERVICIOS PROFESIONALES INGENIERO(A) RESIDENTE DE OBRA Período del 01 al 31 de Agosto de 2024.	10/09/2024			$ 3.500.000,00	$ 0,00	$ 3.500.000,00				$ 194.570.449,00				GASTOS ADMINISTRATIVOS
3	Cheque No.000003 $ 3.276.000,00 ANTICIPO PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS del convenio	10/09/2024			$ 3.276.000,00	$ 0,00	$ 3.276.000,00				$ 191.294.449,00				GASTOS ADMINISTRATIVOS
4	Cheque No.000004 $ 400.000,00 SUBSIDIO AL DIGNATARIO PARA TRANSPORTES Período del 01 al 31 de Agosto de 2024	10/09/2024			$ 400.000,00	$ 0,00	$ 400.000,00				$ 190.894.449,00				GASTOS ADMINISTRATIVOS
5	Cheque No.000005 $ 1.557.644,00 REEMBOLSO (PAGO DE PÓLIZAS No.1014749-0 y Actualización 3001997-0)	10/09/2024			$ 1.557.644,00	$ 0,00	$ 1.557.644,00				$ 189.336.805,00				GASTOS ADMINISTRATIVOS
6	Cheque No.000006 $ 994.800,00 SERVICIOS PROFESIONALES INGENIERA RESIDENTE (JUNIO Y JULIO 2024), Valor	2/10/2024			$ 994.800,00	$ 0,00	$ 994.800,00				$ 188.342.005,00				GASTOS ADMINISTRATIVOS
7	Cheque No.000009 $ 400.000,00 SUBSIDIO PARA TRANSPORTES DEL DIGNATARIO	2/10/2024			$ 400.000,00	$ 0,00	$ 400.000,00				$ 187.942.005,00				GASTOS ADMINISTRATIVOS
8	Cheque No.000011 $ 120.000,00 Valla (1x2)	2/10/2024			$ 120.000,00	$ 0,00	$ 120.000,00				$ 187.822.005,00				GASTOS ADMINISTRATIVOS
9	Cheque No.000007 $ 3.472.000,00 SERVICIOS PROFESIONALES INGENIERA RESIDENTE (SEPTIEMBRE 2024)	15/10/2024			$ 3.472.000,00	$ 0,00	$ 3.472.000,00				$ 184.350.005,00				GASTOS ADMINISTRATIVOS

10	Cheque No.000010 $ 1.944.320,00 HONORARIOS DE LA CONTADORA MES SEPTIEMBRE 2024	15/10/2024			$ 1.944.320,00	$ 0,00	$ 1.944.320,00				$ 182.405.685,00				GASTOS ADMINISTRATIVOS
11	Cheque No.000012 $ 150.000,00 Exámenes de ingreso personal nómina	15/10/2024			$ 150.000,00	$ 0,00	$ 150.000,00				$ 182.255.685,00				GASTOS ADMINISTRATIVOS
12	Cheque No.000013 $ 1.928.802,00 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN	15/10/2024			$ 1.928.802,00	$ 0,00	$ 1.928.802,00				$ 180.326.883,00				GASTOS ADMINISTRATIVOS
13	Cheque No.000014 $ 300.000,00 Caja menor -papeleria	29/10/2024			$ 300.000,00	$ 0,00	$ 300.000,00				$ 180.026.883,00				GASTOS ADMINISTRATIVOS
14	Cheque No.000015 $ 690.060,00 Cheque No.000015 concepto SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PERSONAL (BOTAS DE CAUCHO PUNTA DE ACERO Y GUANTES)	29/10/2024			$ 690.060,00	$ 0,00	$ 690.060,00				$ 179.336.823,00				GASTOS ADMINISTRATIVOS
15	Cheque No.000016 $ 240.000,00 COMBUSTIBLE	29/10/2024			$ 240.000,00	$ 0,00	$ 240.000,00				$ 179.096.823,00				GASTOS ADMINISTRATIVOS
16	Cheque No.000017 $ 6.687.100,00 MATERIALES PÉTREOS	29/10/2024			$ 6.687.100,00	$ 0,00	$ 6.687.100,00				$ 172.409.723,00				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
17	Cheque No.000018 $ 1.657.500,00 TUBERÍA DE CONCRETO	29/10/2024			$ 1.657.500,00	$ 0,00	$ 1.657.500,00				$ 170.752.223,00				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
18	Cheque No.000019 $ 12.310.527,42 MATERIALES DE FERRETERÍA	29/10/2024			$ 12.310.527,42	$ 0,00	$ 12.310.527,42				$ 158.441.695,58				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
19	Cheque No.000020 $ 3.743.000,00 TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	29/10/2024			$ 3.743.000,00	$ 0,00	$ 3.743.000,00				$ 154.698.695,58				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
20	Cheque No.000021 $ 2.939.400,00 ALQUILER RETROEXCAVADORA	29/10/2024			$ 2.939.400,00	$ 0,00	$ 2.939.400,00				$ 151.759.295,58				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
21	Cheque No.000022 $ 430.000,00 SUMINISTRO DE MATERIALES (FORMALETA)	29/10/2024			$ 430.000,00	$ 0,00	$ 430.000,00				$ 151.329.295,58				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
22	Cheque No.000023 $ 4.117.300,00 TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	5/11/2024			$ 4.117.300,00	$ 0,00	$ 4.117.300,00				$ 147.211.995,58				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
23	Cheque No.000024 $ 643.010,00 COMBUSTIBLE	5/11/2024			$ 643.010,00	$ 0,00	$ 643.010,00				$ 146.568.985,58				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
24	Cheque No.000025 $ 5.382.300,00 MATERIALES PÉTREOS	5/11/2024			$ 5.382.300,00	$ 0,00	$ 5.382.300,00				$ 141.186.685,58				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
25	Cheque No.000026 $ 400.000,00 SUBSIDIO TRANSPORTES DIGNARTARIO	12/11/2024			$ 400.000,00	$ 0,00	$ 400.000,00				$ 140.786.685,58				GASTOS ADMINISTRATIVOS
26	Cheque No.000027 $ 630.000,00 RETENCION EN LA FUENTE	12/11/2024			$ 630.000,00	$ 0,00	$ 630.000,00				$ 140.156.685,58				RETENCIONES Y OTROS
27	Cheque No.000028 Y Cheque No.000045 $ 97.000,00 pago impuesto industria y comercio	12/11/2024			$ 97.000,00	$ 0,00	$ 97.000,00				$ 140.059.685,58				RETENCIONES Y OTROS
28	Cheque No.000029 $ 600.000,00 PAPALERÍA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	12/11/2024			$ 600.000,00	$ 0,00	$ 600.000,00				$ 139.459.685,58				GASTOS ADMINISTRATIVOS
29	Cheque No.000030 $ 980.000,00 Contadora	12/11/2024			$ 980.000,00	$ 0,00	$ 980.000,00				$ 138.479.685,58				GASTOS ADMINISTRATIVOS
30	Cheque No.000031 $ 1.132.333,33 NOMINA	12/11/2024			$ 1.132.333,33	$ 0,00	$ 1.132.333,33				$ 137.347.352,25				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
31	Cheque No.000032 $ 1.390.000,00 NOMINA	12/11/2024			$ 1.390.000,00	$ 0,00	$ 1.390.000,00				$ 135.957.352,25				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
32	Cheque No.000033 $ 1.132.333,33 NOMINA	12/11/2024			$ 1.132.333,33	$ 0,00	$ 1.132.333,33				$ 134.825.018,92				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
33	Cheque No.000034 $ 1.897.666,67 NOMINA MAESTRO	12/11/2024			$ 1.897.666,67	$ 0,00	$ 1.897.666,67				$ 132.927.352,25				GASTOS ADMINISTRATIVOS
34	Cheque No.000035 $ 1.132.333,33 NOMINA	12/11/2024			$ 1.132.333,33	$ 0,00	$ 1.132.333,33				$ 131.795.018,92				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
35	Cheque No.000036 $ 1.132.333,33 NOMINA	12/11/2024			$ 1.132.333,33	$ 0,00	$ 1.132.333,33				$ 130.662.685,59				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
36	Cheque No.000037 $ 1.356.300,00 SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE	12/11/2024			$ 1.356.300,00	$ 0,00	$ 1.356.300,00				$ 129.306.385,59				COSTOS DIRECTOS DE OBRA

37	Cheque No.000038 $ 270.000,00 ENSAYOS LABORATORIOS	12/11/2024			$ 270.000,00	$ 0,00	$ 270.000,00				$ 129.036.385,59				GASTOS ADMINISTRATIVOS
38	Cheque No.000008 $ 1.385.280,00 ESTUDIOS Y DISEÑOS (SALDO)	25/11/2024			$ 1.385.280,00	$ 0,00	$ 1.385.280,00				$ 127.651.105,59				GASTOS ADMINISTRATIVOS
39	Cheque No.000039 $ 3.486.000,00 RESIDENTE OCTUBRE	25/11/2024			$ 3.486.000,00	$ 0,00	$ 3.486.000,00				$ 124.165.105,59				GASTOS ADMINISTRATIVOS
40	Cheque No.000040 $ 1.952.160,00 CONTADORA	25/11/2024			$ 1.952.160,00	$ 0,00	$ 1.952.160,00				$ 122.212.945,59				GASTOS ADMINISTRATIVOS
41	Cheque No.000041 $ 13.228.844,00 MATERIALES FERRETERÍA	25/11/2024			$ 13.228.844,00	$ 0,00	$ 13.228.844,00				$ 108.984.101,59				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
42	Cheque No.000042 $ 1.520.000,00 TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	25/11/2024			$ 1.520.000,00	$ 0,00	$ 1.520.000,00				$ 107.464.101,59				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
43	Cheque No.000043 $ 620.000,00 MATERIALES FORMALETA	25/11/2024			$ 620.000,00	$ 0,00	$ 620.000,00				$ 106.844.101,59				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
44	Cheque No.000044 $ 671.170,00 MAQUINARIA	25/11/2024			$ 671.170,00	$ 0,00	$ 671.170,00				$ 106.172.931,59				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
45	Cheque No.000046 $ 679.000,00 Nomina 15 Noviembre al 30 Noviembre 2024	2/12/2024			$ 679.000,00	$ 0,00	$ 679.000,00				$ 105.493.931,59				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
46	Cheque No.000047 $ 679.000,00 Nomina 15 Noviembre al 30 Noviembre 2024	2/12/2024			$ 679.000,00	$ 0,00	$ 679.000,00				$ 104.814.931,59				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
47	Cheque No.000048 $ 1.139.000,00 Nomina 15 Noviembre al 30 Noviembre 2024	2/12/2024			$ 1.139.000,00	$ 0,00	$ 1.139.000,00				$ 103.675.931,59				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
48	Cheque No.000049 $ 679.000,00 Nomina 15 Noviembre al 30 Noviembre 2024	2/12/2024			$ 679.000,00	$ 0,00	$ 679.000,00				$ 102.996.931,59				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
49	Cheque No.000050 $ 834.000,00 Nomina 15 Noviembre al 30 Noviembre 2024	2/12/2024			$ 834.000,00	$ 0,00	$ 834.000,00				$ 102.162.931,59				GASTOS ADMINISTRATIVOS
50	Cheque No.000051 $ 679.000,00 Nomina 15 Noviembre al 30 Noviembre 2024	2/12/2024			$ 679.000,00	$ 0,00	$ 679.000,00				$ 101.483.931,59				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
51	Cheque No.000052 $ 847.830,00 Alquiler de VIBROCOMPACTADOR	2/12/2024			$ 847.830,00	$ 0,00	$ 847.830,00				$ 100.636.101,59				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
52	Cheque No.000053 $ 451.000,00 Pago de Retenciones a la DIAN MES NOVIEMBRE 2024	2/12/2024			$ 451.000,00	$ 0,00	$ 451.000,00				$ 100.185.101,59				RETENCIONES Y OTROS
53	Cheque No.000054 $ 4.063.200,00 Seguridad Social MES NOVIEMBRE DE 2024	2/12/2024			$ 4.063.200,00	$ 0,00	$ 4.063.200,00				$ 96.121.901,59				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
54	Cheque No.000055 $ 400.000,00 Subsidio de Transporte al dignatario MES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024	2/12/2024			$ 400.000,00	$ 0,00	$ 400.000,00				$ 95.721.901,59				GASTOS ADMINISTRATIVOS
55	Cheque No.000056 $ 6.768.650,00 Compra de materiales Petreos	11/12/2024			$ 6.768.650,00	$ 0,00	$ 6.768.650,00				$ 88.953.251,59				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
56	Cheque No.000057 $ 876.074,00 Reembolso pago de Pólizas Convenio	11/12/2024			$ 876.074,00	$ 0,00	$ 876.074,00				$ 88.077.177,59				GASTOS ADMINISTRATIVOS
57	Cheque No.000058 $ 3.372.120,00 Transporte de materiales petreos	11/12/2024			$ 3.372.120,00	$ 0,00	$ 3.372.120,00				$ 84.705.057,59				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
58	Cheque No.000059 $ 8.719.143,66 Suministro de materiales de Ferretería	11/12/2024			$ 8.719.143,66	$ 0,00	$ 8.719.143,66				$ 75.985.913,93				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
59	Cheque No.000060 $ 3.781.200,00 Alquiler de Retroexcavadora (27,40 Horas)	11/12/2024			$ 3.781.200,00	$ 0,00	$ 3.781.200,00				$ 72.204.713,93				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
60	Cheque No.000061 $ 976.080,00 Honorarios Contadora	11/12/2024			$ 976.080,00	$ 0,00	$ 976.080,00				$ 71.228.633,93				GASTOS ADMINISTRATIVOS

61	Cheque No.000062 $ 150.000,00 Mano de Obra demolición piedra con cemento expansivo	11/12/2024			$ 150.000,00	$ 0,00	$ 150.000,00				$ 71.078.633,93				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
62	Cheque No.000063 $ 679.000,00 Nómina 1-15 y 16-23 Dic	18/12/2024			$ 679.000,00	$ 0,00	$ 679.000,00				$ 70.399.633,93				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
63	Cheque No.000064 $ 1.014.669,00 Nómina 1-15 y 16-23 Dic	18/12/2024			$ 1.014.669,00	$ 0,00	$ 1.014.669,00				$ 69.384.964,93				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
64	Cheque No.000065 $ 679.000,00 Nómina 1-15 y 16-23 Dic	18/12/2024			$ 679.000,00	$ 0,00	$ 679.000,00				$ 68.705.964,93				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
65	Cheque No.000066 $ 1.014.769,00 Nómina 1-15 y 16-23 Dic	18/12/2024			$ 1.014.769,00	$ 0,00	$ 1.014.769,00				$ 67.691.195,93				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
66	Cheque No.000067 $ 1.139.000,00 Nómina 1-15 y 16-23 Dic	18/12/2024			$ 1.139.000,00	$ 0,00	$ 1.139.000,00				$ 66.552.195,93				GASTOS ADMINISTRATIVOS
67	Cheque No.000068 $ 1.844.792,00 Nómina 1-15 y 16-23 Dic	18/12/2024			$ 1.844.792,00	$ 0,00	$ 1.844.792,00				$ 64.707.403,93				GASTOS ADMINISTRATIVOS
68	Cheque No.000069 $ 679.000,00 Nómina 1-15 y 16-23 Dic	18/12/2024			$ 679.000,00	$ 0,00	$ 679.000,00				$ 64.028.403,93				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
69	Cheque No.000070 $ 1.014.669,00 Nómina 1-15 y 16-23 Dic	18/12/2024			$ 1.014.669,00	$ 0,00	$ 1.014.669,00				$ 63.013.734,93				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
70	Cheque No.000071 $ 834.000,00 Nómina 1-15 y 16-23 Dic	18/12/2024			$ 834.000,00	$ 0,00	$ 834.000,00				$ 62.179.734,93				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
71	Cheque No.000072 $ 1.251.315,00 Nómina 1-15 y 16-23 Dic	18/12/2024			$ 1.251.315,00	$ 0,00	$ 1.251.315,00				$ 60.928.419,93				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
72	Cheque No.000073 $ 679.000,00 Nómina 1-15 y 16-23 Dic	18/12/2024			$ 679.000,00	$ 0,00	$ 679.000,00				$ 60.249.419,93				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
73	Cheque No.000074 $ 1.014.669,00 Nómina 1-15 y 16-23 Dic	18/12/2024			$ 1.014.669,00	$ 0,00	$ 1.014.669,00				$ 59.234.750,93				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
74	Cheque No.000075 $ 3.425.100,00 Compra de materiales Petreos (Recebo 21 m3) (Grava 3/4 21 m3) (Subbase 7 m3)	18/12/2024			$ 3.425.100,00	$ 0,00	$ 3.425.100,00				$ 55.809.650,93				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
75	Cheque No.000076 $ 2.495.180,00 Honorarios Ing. Residente periodos noviembre y diciembre de 2024	18/12/2024			$ 2.495.180,00	$ 0,00	$ 2.495.180,00				$ 53.314.470,93				GASTOS ADMINISTRATIVOS
76	Cheque No.000077 $ 1.794.000,00 Alquiler de Retroexcavadora (13,0 Horas)	18/12/2024			$ 1.794.000,00	$ 0,00	$ 1.794.000,00				$ 51.520.470,93				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
77	Cheque No.000078 $ 23.759.546,38 Suministro de materiales de Ferretería	18/12/2024			$ 23.759.546,38	$ 0,00	$ 23.759.546,38				$ 27.760.924,55				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
78	Cheque No.000079 $ 709.000,00 Reembolso varios	18/12/2024			$ 709.000,00	$ 0,00	$ 709.000,00				$ 27.051.924,55				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
79	Cheque No.000080 $ 2.290.800,00 Levantamiento Topográfico final	18/12/2024			$ 2.290.800,00	$ 0,00	$ 2.290.800,00				$ 24.761.124,55				GASTOS ADMINISTRATIVOS
80	Cheque No.000081 $ 2.622.760,00 Transporte de Materiales Petreos (Recebo 21 m3) (Grava 3/4 21 m3) (Subbase 7 m3)	18/12/2024			$ 2.622.760,00	$ 0,00	$ 2.622.760,00				$ 22.138.364,55				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
81	Cheque No.000082 $ 3.116.700,00 Reembolso Pago de Seguridad Social de trabajadores	18/12/2024			$ 3.116.700,00	$ 0,00	$ 3.116.700,00				$ 19.021.664,55				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
82	Cheque No.000083 $ 478.080,00 Pago realización Ensayos de Laboratorio	18/12/2024			$ 478.080,00	$ 0,00	$ 478.080,00				$ 18.543.584,55				GASTOS ADMINISTRATIVOS
83	Cheque No.000084 $ 1.423.000,00 Reembolso pago de Retención en la fuente mes de diciembre de 2024	18/12/2024			$ 1.423.000,00	$ 0,00	$ 1.423.000,00				$ 17.120.584,55				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
84	Cheque No.000085 $ 273.000,00 Reembolso pago de Reteica	18/12/2024			$ 273.000,00	$ 0,00	$ 273.000,00				$ 16.847.584,55				COSTOS DIRECTOS DE OBRA

85	Cheque No.000087 $ 200.000,00 Alquiler de compactador (Canguro) y compra de insumos. Reembolso.	10/01/2025			$ 200.000,00	$ 0,00	$ 200.000,00				$ 16.647.584,55				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
86	Cheque No.000088 $ 431.100,00 Alquiler de Vibrocompactador 3 horas x $150.000/hr	10/01/2025			$ 431.100,00	$ 0,00	$ 431.100,00				$ 16.216.484,55				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
87	Cheque No.000089 $ 773.925,00 Nómina 24 dic al 31 dic	10/01/2025			$ 773.925,00	$ 0,00	$ 773.925,00				$ 15.442.559,55				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
88	Cheque No.000091 $ 473.925,00 Nómina 24 dic al 31 dic	10/01/2025			$ 473.925,00	$ 0,00	$ 473.925,00				$ 14.968.634,55				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
89	Cheque No.000090 $ 575.325,00 Nómina 24 dic al 31 dic	10/01/2025			$ 575.325,00	$ 0,00	$ 575.325,00				$ 14.393.309,55				GASTOS ADMINISTRATIVOS
90	Cheque No.000086 $ 6.767.317,24 Compra de : 115 varillas 3/8, 7m3 Arena, 7 m3	28/01/2025			$ 6.767.317,24	$ 0,00	$ 6.767.317,24				$ 7.625.992,31				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
91	Cheque No.000092 $ 720.000,00 Transporte Recebo (14m3)	28/01/2025			$ 720.000,00	$ 0,00	$ 720.000,00				$ 6.905.992,31				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
92	Cheque No.000093 $ 243.000,00 Pago de Retenciones realizadas mes de Enero 2025	28/01/2025			$ 243.000,00	$ 0,00	$ 243.000,00				$ 6.662.992,31				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
93	Cheque No.000094 $ 833.000,00 Compra de Recebo 14 m3 para rellenos.	28/01/2025			$ 833.000,00	$ 0,00	$ 833.000,00				$ 5.829.992,31				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
TOTAL							**$ 194.200.456,69**								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
PAGOS REALIZADOS SEPTIEMBRE			$ 10.693.644,00
PAGOS REALIZADOS OCTUBRE			$ 38.007.509,42
PAGOS REALIZADOS NOVIEMBRE			**$ 45.156.363,99**
PAGOS REALIZADOS DICIEMBRE			**$ 89.325.347,04**
PAGOS REALIZADOS ENERO 2025			**$ 11.017.592,24**
VALOR TOTAL			**$ 194.200.456,69**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MARÍA CAMILA DIAZ CARRASCO
Matrícula Profesional No.: 151037-0513350 STD
Residente de Obra (Tubavita)

Firma
Nombe: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesion 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4357 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	23	24	22	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	22	20	23	23	24	24	730
Lluvias moderadas	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	1	0	0	12
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

LAS OBRAS PROPIAS DEL CONVENIO FUERON TERMINADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, DURANTE EL PERÍODO NO SE REALIZARON LABORES DE CONSTRUCCIÓN

Firma
Nombre: MARIA CAMILA DIAZ CARRASCO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 151037-0513350 STD

Firma
Nombre: ING. JAIME CHACON DURÁN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 682021-12213 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:	4357 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	ene-2025	**PROYECTO:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1631 DE 2023	**INTERVENTOR:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	12/11/2024	DENSIDAD CONO DE ARENA TRAMO 1	**INV E- 161**	EN SITIO	1	95%	103,18	SI	N/A
1	12/11/2024	DENSIDAD CONO DE ARENA TRAMO 1	**INV E- 161**	EN SITIO	1	95%	94,96	SI	N/A
1	12/11/2024	DENSIDAD CONO DE ARENA TRAMO 1	**INV E- 161**	EN SITIO	1	95%	96,3	SI	N/A
2	19/11/2024	DENSIDAD CONO DE ARENA TRAMO 2	**INV E- 161**	EN SITIO	1	95%	94,88	SI	N/A
2	19/11/2024	DENSIDAD CONO DE ARENA TRAMO 2	**INV E- 161**	EN SITIO	1	95%	97,53	SI	N/A
2	19/11/2024	DENSIDAD CONO DE ARENA TRAMO 2	**INV E- 161**	EN SITIO	1	95%	95,54	SI	N/A
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
6	16/11/2024	DENSIDAD CONO DE ARENA TRAMO 1	**INV E- 161**	EN SITIO	1	95%	104%	SI	N/A
6	16/11/2024	DENSIDAD CONO DE ARENA TRAMO 2	**INV E- 161**	EN SITIO	1	95%	102%	SI	N/A
6	16/11/2024	DENSIDAD CONO DE ARENA TRAMO 2	**INV E- 161**	EN SITIO	1	95%	97%	SI	N/A

1	20/11/2024	NSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO I.N.V. E 142	I.N.V. E 142	CANTERA METRÓPOLIS - MONIQUIRÁ BOYACÁ	1	N/A	4,30%	SI	HUMEDAD ÓPTIMA
2	20/11/2024	NSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO I.N.V. E 142	I.N.V. E 142	CANTERA METRÓPOLIS - MONIQUIRÁ BOYACÁ	1	N/A	2.31 GR/CM3	SI	DENSIDAD SECA MÁXIMA
18	14/01/2025	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV. E - 410 ASTM C39	CUNETA VEREDA TUBAVITA TRAMO 2	1	3000 psi	3102.42	SI	FALLA T3
19	14/01/2025	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV. E - 410 ASTM C39	CUNETA VEREDA TUBAVITA TRAMO 2	1	3000 psi	3056.28	SI	FALLA T5
20	14/01/2025	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV. E - 410 ASTM C39	PLACA HUELLA VEREDA TUBAVITA TRAMO 2	1	3000 psi	3282.7	SI	FALLA T3
21	14/01/2025	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV. E - 410 ASTM C39	PLACA HUELLA VEREDA TUBAVITA TRAMO 2	1	3000 psi	3182.90	SI	FALLA T3

OBSERVACIONES:

SE PRESENTAN LOS ENAYOS REALIZADOS POR LA JAC A LA FECHA

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MARÍA CAMILA DIAZ CARRASCO
Matrícula Profesional No.: 151037-0513350 STD
Residente de Obra (Tubavita)

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4357 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 16/11/2023

PLAZO INICIAL: 46 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/01/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.030.449,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.030.449,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		40.201.343,80	15/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		10.050.335,95	15/11/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		60.302.015,70	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001997

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/10/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: n/a **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** n/a **SUSPENSIÓN No.:** n/a

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.206.090,00	31	10	2024	16	10	2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.309.135,00	16	12	2024	16	12	2029
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.051.523,00	31	12	2026	16	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001997

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS NIT. 860.002.400-2

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: n/a

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 3 **PRÓRROGA No.:** n/a **MODIFICACIÓN No.:** n/a **SUSPENSIÓN No.:** n/a

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	20	12	2023	16	12	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014749 **OTRAS PÓLIZAS No.** n/a

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS NIT. 860.002.400-2

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: n/a

OBSERVACIONES:

SE ANEXA LA ULTIMA ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS PRESENTADA POR LA JAC

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4357 DE 2023
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA

FECHA DE INICIO: 16/11/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 46 DIAS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 13/01/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:
CONTRACTUALMENTE NO SE EXIGIÓ LA PRESENTACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE UN PLAN DE CALIDAD, SIN EMBARGO EL CONTRATISTA REALIZARÁ ENSAYOS DE MATERIALES BÁSICOS (DENSIDADES DE SUBBASE GRANULAR Y ENSAYO DE CILINDROS A COMPRESIÓN)

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

OBSERVACIONES:
CONTRACTUALMENTE NO SE EXIGIÓ AL CONTRATISTA LA PRESENTACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE UN PLAN DE CALIDAD, SIN EMBARGO INTERVENTORÍA REALIZARÁ ENSAYOS DE MATERIALES BÁSICOS (DENSIDADES DE SUBBASE GRANULAR Y ENSAYO DE CILINDROS A COMPRESIÓN)

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------- APROBADO: SI ------- NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO -------

OBSERVACIONES:

N/A

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ____

OBSERVACIONES:

N/A

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ____

OBSERVACIONES:

N/A

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

N/A

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

N/A

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma N/A	Firma N/A	Firma 	Firma N/A
Nombre:	Nombre:	Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional: 25202-61517 CND	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS CONVENIO 4367 DE 2023 GAITAL VELEZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** ENERO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No.: 4367 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL

PLAZO INICIAL: 47 DIAS
FECHA DE INICIO: 15/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 27/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2025
PLAZO ACUMULADO: 9,70 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.016.649,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.016.649,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	110
	Mejoramiento	ML	0
	Rehabilitación	N/A	0
Estructuras	Alacantarillas	UND	0
	Gavión	N/A	0
	Pontones	N/A	0
Mantenimiento		N/A	0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	10,00	20,00
	Mejoramiento	ML	0,00	0,00
	Rehabilitación	N/A	0,00	0,00
Estructuras	Alacantarillas	UND	0,00	0,00
	Gavión	N/A	0,00	0,00
	Pontones	N/A	0,00	0,00
Mantenimiento		N/A	0,00	0,00
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	1,00	1,00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 146.610.444,00	$ 0,00	$ 146.610.444,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.007.892,00	$ 0,00	$ 49.007.892,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.398.313,00	$ 0,00	$ 4.398.313,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.016.649,00	$ 0,00	$ 200.016.649,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 3.030.206,47	$ 0,00	$ 3.030.206,47	$ 16.378.845,26
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 8.307.752,00	$ 0,00	$ 8.307.752,00	$ 36.152.569,52
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR EJECUTADO	**$ 11.337.958,47**	**$ 0,00**	**$ 11.337.958,47**	**$ 52.531.414,78**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 146.610.444,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 52.531.414,78
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 35,83%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2 **(Ingeniera y Contador)**
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5 **(Maestro y 4 Ayudantes)**
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0 **(Operadores y conductores)**
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **7**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 	 	 	
27/1/2025 Avance de obra, acero de refeurzo de placas y riostras instalado, plachuelas en concreto 3000 psi y centro-anchos en piedra pegada	28/01/2025 Avance de obra, placahuelas en concreto 3000 psi y centro-sobre anchos en piedra pegada.	29/1/2025 Instalación de formaleta para huelas en concreto	30/1/2025 Personal de obra

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

OBSERVACIONES:

1. SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE FILTROS A LO LARGO DE LOS 2 COSTADOS DEL PROYECTO, ASI MISMO SE REALIZA EL REPLANTEO DE LA VIA, INSTALACION DE LA SUB BASE GRANULAR, FIGURADO DE ACERO, ACOPIA DE MATERIAL EN LA ZONA. ASI MISMO IMPORTANTE RESALTAR QUE A PARTIR DEL 25 DE DICIEMBRE 2024 LA EJECUCION DE LA OBRA SE SUSPENDIO DEBIDO A LA EPOCA DECEMBRINA Y EL INVIERNO QUE SE PRESENTO, ASI MISMO NO SE CONTABA CON LA MISMA DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS EN CANTERA Y EN FERRETERIA PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES.

2. EL TRASIEGO DE MATERIALES DESDE LA CANTERA HASTA LA OBRA DEBE REALIZARSE EN DOS (2) ETAPAS, PRIMERO EN CARRETERA PAVIMENTADA DESDE LA CANTERA EN MONIQUIRÁ (COORD 5.847162, -73.545363) HASTA EL PUNTO DEL COLEGIO GAITAL (50KM APROX) (COORD 6.0711565, -73.7118011 COLEGIO GAITAL), ALLÍ SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL, POSTERIORMENTE SE CARGA EN VOLQUETAS A MEDIA ALTURA PARA SUBIR POR LA VÍA DE ACCESO DESDE EL ACOPIO HASTA LA OBRA (COORD 6.069554, -73.700654) EN UN TRAYECTO DE APROXIMADAMENTE 1,3 KM.

Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO 2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL

CONTRATO No. 4367 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				**DÍAS DEL MES**																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
VOLQUETA		7M3																															
RETROEXCAVADORA																																	
VIBROCOMPACTADOR																																	
MEZCLADORA																A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			TOTAL ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	19	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	19	1
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: Ing. Laura Alejandra Pinzón Silva
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 15202-302740 BYC

Firma

Nombre: ING. JAIME CHACÓN DURÁN
Residente de interventoría
Matrícula Profesional No.: 682021-12213 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4367 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJASAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JUAN HARVEY RAMIREZ CAMACHO	cc 91'245.968 de Bucaramanga	CONTADOR	$ 1.960.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUAN HARVEY RAMIREZ CAMACHO	n/a	$ 6.800	POSITIVA	SALUD MIA	32026408	$ 162.500	COLPENSIONES	32026408	$ 208.000	N/A	N/A	N/A	diciembre
2	LAURA ALEJANDRA PINZON SILVA	CC. 1.101.756.910 Vélez, Santander	ING. RESIDENTE DE OBRA	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	LAURA ALEJANDRA PINZON SILVA	n/a	$ 7.500	POSITIVA	SANITAS	32043030	$ 178.000	PORVENIR	32043030	$ 227.800	N/A	N/A	N/A	ene-25
3	Johan Fernando hernández Silva (CC7177533) (Maestro de Obra)	(CC7177533) (Maestro de Obra)	Maestro de Obra)	$ 2.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC GAITAL	$ 1.160.000,00	$ 80.800	N/A	NUEVA EPS	32204979	$ 145.000	PORVENIR	32204979	$ 185.000	CAJASAN	N/A	$ 46.400	DICIEMBRE
6	Misael Díaz Quiroga (CC13954281) (Ayudante)	(CC13954281) (Ayudante)	Ayudante)	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC GAITAL	$ 650.000,00	$ 45.300	N/A	NUEVA EPS	32204979	$ 81.300	COLPENSIONES	32204979	$ 104.000	CAJASAN	N/A	$ 26.000	DICIEMBRE
5	José Alejandro González Sedano (CC1101752579) (Ayudante)	(CC1101752579) (Ayudante)	Ayudante)	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC GAITAL	$ 650.000,00	$ 45.300	N/A	NUEVA EPS	32204979	$ 81.300	PORVENIR	32204979	$ 104.000	CAJASAN	N/A	$ 26.000	DICIEMBRE
4	Jorge Enrique Díaz Villamil (CC1101756589) (Ayudante)	(CC1101756589) (Ayudante)	Ayudante)	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC GAITAL	$ 650.000,00	$ 45.300	N/A	NUEVA EPS	32204979	$ 81.300	COLPENSIONES	32204979	$ 104.000	CAJASAN	N/A	$ 26.000	DICIEMBRE

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

OBSERVACIONES

LA JAC NO HA PRESENTADO A LA FECHA EL PAGO DE LA RESPECTIVA PLANILLA DE SEG SOCIAL DEL PERÍODO.

El contratista adjunta la certificación de fecha n/a a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Laura Alejandra Pinzón Silva
TP: 15202-302740 BYC
Ingeniera Residente de Obra

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4367 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL

MES INFORME MENSUAL: ENERO 2025 **PROYECTO:** ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	1297823	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Principal	$ 200.016.649
			TOTAL			$ 200.016.649

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 200.016.649,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
44	Cheque No.000045 $ 7.013.300,00 Adquisición de material Petreo correspondiente a 14 m3 de Rajón y 63 m3 de de Triturado para la Obra	10/01/2025			$ 7.013.300,00	$ 0,00	$ 7.013.300,00				$ 54.018.281,06				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
45	Cheque No.000046 $ 259.200,00 Ensayos de Laboratorio (Densidades de campo método Cono de arena) para La Obra.	10/01/2025			$ 259.200,00	$ 0,00	$ 259.200,00				$ 53.759.081,06				GASTOS ADMINISTRATIVOS
46	Cheque No.000047 $ 3.486.000,00 Honorarios Ing. Residente periodo del 07 de diciembre de 2024 al 06 de enero de 2025	10/01/2025			$ 3.486.000,00	$ 0,00	$ 3.486.000,00				$ 50.273.081,06				GASTOS ADMINISTRATIVOS
47	Cheque No.000048 $ 1.332.800,00 Reembolso por compra de material de Material Petreo correspondiente a 14 m3 de Triturado para La Obra	10/01/2025			$ 1.332.800,00	$ 0,00	$ 1.332.800,00				$ 48.940.281,06				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
48	Cheque No.000049 $ 1.383.100,00 Reembolso por pago de Seguridad Social del personal de la Obra.	10/01/2025			$ 1.383.100,00	$ 0,00	$ 1.383.100,00				$ 47.557.181,06				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
49	Cheque No.000050 $ 1.040.606,00 Pago de Retención en La Fuente mes de diciembre de 2024	10/01/2025			$ 1.040.606,00	$ 0,00	$ 1.040.606,00				$ 46.516.575,06				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
50	Cheque No.000051 $ 3.201.250,00 Transporte de triturado 1/2" (64m3) y Rajón (14m3) desde La Cantera hasta el Colegio Gaital	28/01/2025			$ 3.201.250,00	$ 0,00	$ 3.201.250,00				$ 43.315.325,06				COSTOS DIRECTOS DE OBRA

51	Cheque No.000052 $ 1.185.600,00 SOBREACARREO DE MATERIALES PÉTREOS (COLEGIO - OBRA) 63m3 Triturado + 14 m3 Rajón =	28/01/2025			$ 1.185.600,00	$ 0,00	$ 1.185.600,00				$ 42.129.725,06				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
52	Cheque No.000053 $ 1.379.000,00 TRANSPORTE DE 14 M3 DE TRITURADO DESDE LA CANTERA DE MONIQUIRÁ HASTA EL	28/01/2025			$ 1.379.000,00	$ 0,00	$ 1.379.000,00				$ 40.750.725,06				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
53	Cheque No.000054 $ 1.200.000,00 Alquile de retro excavadora para cargue de material de sobreacarreo (78m3)	28/01/2025			$ 1.200.000,00	$ 0,00	$ 1.200.000,00				$ 39.550.725,06				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
54	Cheque No.000055 $ 2.400.000,00 Saldo Estudios y Diseños del Convenio	28/01/2025			$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 2.400.000,00				$ 37.150.725,06				GASTOS ADMINISTRATIVOS
55	Cheque No.000056 $ 1.573.000,00 Alquiler de Mezcladora (DESDE EL 13 ENERO AL 12 FEBRERO 2025)	28/01/2025			$ 1.573.000,00	$ 0,00	$ 1.573.000,00				$ 35.577.725,06				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
56	Cheque No.000057 $ 132.289,58 Retención Industria y Comercio (Reembolso	28/01/2025			$ 132.289,58	$ 0,00	$ 132.289,58				$ 35.445.435,48				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
57	Cheque No.000058 $ 897.050,00 Saldo por Compra de materiales Pétreos (Adquisición de material Petreo correspondiente a 14 m3 de	28/01/2025			$ 897.050,00	$ 0,00	$ 897.050,00				$ 34.548.385,48				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
58	Cheque No.000059 $ 893.542,00 Actualización pólizas del convenio (Pago anticipado) a la JAC.	28/01/2025			$ 893.542,00	$ 0,00	$ 893.542,00				$ 33.654.843,48				GASTOS ADMINISTRATIVOS
59	Cheque No.000060 $ 1.269.010,00 NOMINA DEL 13 ENERO AL 27 DE ENERO 2025	28/01/2025			$ 1.269.010,00	$ 0,00	$ 1.269.010,00				$ 32.385.833,48				GASTOS ADMINISTRATIVOS
60	Cheque No.000061 $ 754.810,00 NOMINA DEL 13 ENERO AL 27 DE ENERO 2025	28/01/2025			$ 754.810,00	$ 0,00	$ 754.810,00				$ 31.631.023,48				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
61	Cheque No.000062 $ 654.169,00 NOMINA DEL 13 ENERO AL 27 DE ENERO 2025	28/01/2025			$ 654.169,00	$ 0,00	$ 654.169,00				$ 30.976.854,48				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
62	Cheque No.000063 $ 704.489,00 NOMINA DEL 13 ENERO AL 27 DE ENERO 2025	28/01/2025			$ 704.489,00	$ 0,00	$ 704.489,00				$ 30.272.365,48				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
63	Cheque No.000064 $ 150.962,00 NOMINA DEL 13 ENERO AL 27 DE ENERO 2025	28/01/2025			$ 150.962,00	$ 0,00	$ 150.962,00				$ 30.121.403,48				COSTOS DIRECTOS DE OBRA

TOTAL DEL PERÍODO							**$ 30.910.178**								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
PAGOS SEPTIEMBRE			**$ 3.919.859**
PAGOS OCTUBRE			**$ 52.408.228**
PAGOS NOVIEMBRE			**$ 7.613.717**
PAGOS DICIEMBRE			**$ 75.043.264**
PAGOS ENERO			**$ 30.910.178**
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			**$ 169.895.246**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Laura Alejandra Pinzón Silva
TP: 15202-302740 BYC
Ingeniera Residente de Obra

Firma
Nombe: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4367 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	23	24	22	24	24	24	24	18	24	24	24	22	24	22	18	22	24	22	22	18	18	18	18	18	18	18	20	23	23	24	24	671
Lluvias moderadas	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	1	0	0	12
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

N/A

Firma
Nombre: Laura Alejandra Pinzón Silva
TP: 15202-302740 BYC
Ingeniera Residente de Obra

Firma
Nombre: ING. JAIME CHACON DURAN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 682021-12213 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:	4367 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	ENERO DE 2025	**PROYECTO:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1631 DE 2023	**INTERVENTOR:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	20/11/2024	NSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO I.N.V. E 142	I.N.V. E 142	CANTERA METRÓPOLIS - MONIQUIRÁ BOYACÁ	1	N/A	4,30%	SI	HUMEDAD ÓPTIMA
2	20/11/2024	NSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO I.N.V. E 142	I.N.V. E 142	CANTERA METRÓPOLIS - MONIQUIRÁ BOYACÁ	1	N/A	2.31 GR/CM3	SI	DENSIDAD SECA MÁXIMA
3	14/01/2025	TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE	INV E- 161	K0+090 CARRIL IZQ	1	95%	99,10%	SI	DENSIDAD EN SUBBASE GRANULAR
4	14/01/2025	TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE	INV E- 161	K0+060 CARRIL DER	1	95%	101,10%	SI	DENSIDAD EN SUBBASE GRANULAR
5	14/01/2025	TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE	INV E- 161	K0+020 CARRIL IZQ	1	95%	96,10%	SI	DENSIDAD EN SUBBASE GRANULAR

OBSERVACIONES:

LA JAC NO HA PRESENTADO ENSAYOS PROPIOS DE LABORATORIO

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibr
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital l

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Laura Alejandra Pinzón Silva
TP: 15202-302740 BYC
Ingeniera Residente de Obra

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4367 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL

OBJETO DEL CONTRATO:

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 15/11/2023

PLAZO INICIAL: 47 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.016.649,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.016.649,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		40.203.330,00	14/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemni:		10.050.883,00	14/11/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		60.304.995,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001991

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/09/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemniz			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

A LA FFECHA DEL PRESENTE INFORME LA JAC NO HA PRESENTADO ULTIMA ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS ADQUIRIDAS PARA COBERTURA DEL CONVENIO

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4367 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL

FECHA DE INICIO: 15/11/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 47 DIAS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/01/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ____ NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

CONTRACTUALMENTE NO SE EXIGIÓ LA PRESENTACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE UN PLAN DE CALIDAD, SIN EMBARGO EL CONTRATISTA REALIZARÁ ENSAYOS DE MATERIALES BÁSICOS (DENSIDADES DE SUBBASE GRANULAR Y ENSAYO DE CILINDROS A COMPRESIÓN)

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ N ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

CONTRACTUALMENTE NO SE EXIGIÓ AL CONTRATISTA LA PRESENTACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE UN PLAN DE CALIDAD, SIN EMBARGO INTERVENTORÍA REALIZARÁ ENSAYOS DE MATERIALES BÁSICOS (DENSIDADES DE SUBBASE GRANULAR Y ENSAYO DE CILINDROS A COMPRESIÓN)

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _

No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: .....

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: .....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		

IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma N/A	Firma N/A	Firma 	Firma N/A
Nombre:	Nombre:	Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional: 25202-61517 CND	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS CONVENIO 4424 DE 2023 TEBAIDA VELEZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** ene-25

CONTRATO DE OBRA No.: 4424 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA

PLAZO INICIAL: 46 DIAS
FECHA DE INICIO: 16/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 27/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2025
PLAZO ACUMULADO: 9,67 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.996.240,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.996.240,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 200.996.240,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	120
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alacantarillas	UND	1
	Gavión	N/A	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	82,80	107,20
	Mejoramiento	N/A	0,00	0,00
	Rehabilitación	N/A	0,00	0,00
Estructuras	Alacantarillas	UND	1,00	1,00
	Gavión	N/A	0,00	0,00
	Pontones	N/A	0,00	0,00
Mantenimiento		N/A	0,00	0,00
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	1,00	1,00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 146.590.706,00	$ 0,00	$ 146.590.706,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.007.813,00	$ 0,00	$ 49.007.813,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.397.721,00	$ 0,00	$ 4.397.721,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.996.240,00	$ 0,00	$ 199.996.240,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 17.042.082,03	$ 0,00	17.042.082,03	$150.804.011,70
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 8.464.922,00	$ 0,00	8.464.922,00	$40.963.035,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$0,00
VALOR EJECUTADO	**$ 25.507.004,03**	**$ 0,00**	**25.507.004,03**	**$191.767.046,70**

Nota: Valores basados en los pagos realizados la fecha según rubro.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 146.590.706,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 150.804.011,70
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 89,33%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Rampa Inicial


Placahuella Terinada


Placahuella Terminada


Placahuella Terminada


Placahuella Terminada


Visita SST Interventoría Vereda Tebaida

					
Descole de Alcantarilla (Antes de Desencofrar)	Encole de alcantarilla (Antes de Desencofrar)	Placahuella Terminada	Placahuella Terminada	Placahuella Terminada	Rampa Final

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

OBSERVACIONES:

Durante el período culminó la ejecución de las obras. Para la ejecución del convenio fue necesario realizar sobreacarreos de materiales pétreos y otros, esto debido al estado de la vía de acceso al sitio de las obras, en el cuerpo del informe mensual se detalla el proceso de transportes de materiales para la obra.

Firma

Nombre JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ene-2025

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 4424 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023

INTERVENTORÍA: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
VOLQUETA																																		
RETROEXCAVADORA																																		
VIBRO COMPACTAODO																																		
CAMIONETA										A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MEZCLADORA										A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO										2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL ACTIVO										2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	100,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	100,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0,00%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Para el periodo de este informe 2 el contratista se encuentra realizando vinculacion de personal, revision y/o ajustes a diseños y ajuste de presupuesto del convenio

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
C.C. 1.098.742.151 de Bucaramanga

Firma
Nombre:
Residente de Obra MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
Matrícula Profesional No.: 68202165983 STD

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría JAIME CHACÓN DURÁN
Matrícula Profesional No.: 682021-12213 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4424 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA MUNICIPIO DE VELEZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-25 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 - 2024 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES SAS

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJASAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes de noviembre (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
2	JUAN BAUTISTA OSMA PINZÓN	1.101.755.409	MAESTRO	2.098.000	X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA	$ 1.678.400	$ 116.900	V	Nueva EPS	8634621102	$ 209.800	PROTECCIÓN	8634621102	$ 268.600	$ 67.200	$ 33.600	$ 50.400	RETIRO
3	LUIS ANTONIO DIAZ MATEUS	1.101.755.409	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA	$ 1.138.800	$ 79.300	V	Nueva EPS	8634621102	$ 142.400	PORVENIR	8634621102	$ 182.300	$ 45.600	$ 22.800	$ 34.200	RETIRO
5	JOSE DE LA CRUZ SERRANO SERRANO	91.011.682	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA	$ 1.138.800	$ 79.300	V	Nueva EPS	8634621102	$ 142.400	COLPENSIONES	8634621102	$ 182.300	$ 45.600	$ 22.800	$ 34.200	RETIRO
6	ABELARDO TORRES FIGUEROA	5.689.273	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA	$ 1.138.800	$ 79.300	V	Nueva EPS	8634621102	$ 142.400	COLPENSIONES	8634621102	$ 182.300	$ 45.600	$ 22.800	$ 34.200	RETIRO
7	INGRIT TATIANA DIAZ FONTECHA	1.101.754.164	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA	$ 1.138.800	$ 79.300	V	Nueva EPS	8634621102	$ 142.400	COLPENSIONES	8634621102	$ 182.300	$ 45.600	$ 22.800	$ 34.200	RETIRO
8																			
9																			
10																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

n/a

El contratista adjunta la certificación de fecha n/a a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4424 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA

MES INFORME MENSUAL: enero de 2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	1297023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Principal	$ 199.996.240
			TOTAL			$ 199.996.240

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.996.240,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
1	Cheque No.000001 $ 1.557.393,00 Concepto 1. REEMBOLSO (PÓLIZA 3001993-0 y RCE 1014745-0), Valor $1'557.393,00 Beneficiario: NESTOR	10/09/2024			$ 1.557.393,00	$ 0,00	$ 1.557.393,00				$ 198.438.847				GASTOS ADMINISTRATIVOS
2	Cheque No.000002 $ 400.000,00 Concepto 1. SUBSIDIO AL DIGNATARIO PARA TRANSPORTES, Valor $400.000,00 Beneficiario: NESTOR	10/09/2024			$ 400.000,00	$ 0,00	$ 400.000,00				$ 198.038.847				GASTOS ADMINISTRATIVOS
3	Cheque No.000003 $ 2.400.000,00 Concepto 1. ABONO ESTUDIOS Y DISEÑOS, Valor $2'400.000 Beneficiario: JEFFERSON CAMILO AGUILAR PARRA	17/09/2024			$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 2.400.000,00				$ 195.638.847				GASTOS ADMINISTRATIVOS
4	Cheque No.000004 $ 3.136.000,00 Concepto 1. PAGO INGENIERO RESIDENTE MES AGOSTO 2024, Beneficiario: MIGUEL ÁNGEL MÁSMELA	8/10/2024			$ 3.136.000,00	$ 0,00	$ 3.136.000,00				$ 192.502.847				GASTOS ADMINISTRATIVOS
5	Cheque No.000005 $ 1.952.160,00 Concepto 1. PAGO INGENIERO CONTADORA MES AGOSTO 2024, Beneficiaria: YANETH GONZÁLEZ	8/10/2024			$ 1.952.160,00	$ 0,00	$ 1.952.160,00				$ 190.550.687				GASTOS ADMINISTRATIVOS
6	Cheque No.000007 $ 400.000,00 Concepto 1. SUBSIDIO DE TRANSPORTE PARA EL DIGNATARIO, Beneficiario: NESTOR IDELFONSO	8/10/2024			$ 400.000,00	$ 0,00	$ 400.000,00				$ 190.150.687				GASTOS ADMINISTRATIVOS
7	Cheque No.000008 $ 2.467.059,00 Concepto 1. COMPRA TUBERÍA CONCRETO, Beneficiario: MACOINTH S.A.S. NIT.900451538-1	22/10/2024			$ 2.467.059,00	$ 0,00	$ 2.467.059,00				$ 187.683.628				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
8	Cheque No.000009 $ 15.925.550,00 materiales (subbase, grava 3/4, rajón) segun factura FE 1320; Valor $ 15.925.550 Beneficiario: CALIZAS &	22/10/2024			$ 15.925.550,00	$ 0,00	$ 15.925.550,00				$ 171.758.078				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
9	Cheque No.000010 $ 18.931.248,00 materiales (cemento estructural art x 42.5 kg, barra corrugada d 3/8 N. 3 x 6 M, alambre negro según factura ; Valor $	22/10/2024			$ 18.931.248,00	$ 0,00	$ 18.931.248,00				$ 152.826.830				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
10	Cheque No.000011 $ 100.000,00 pago de valla publicitaria segun factura # 053; Valor $ 100.000; Beneficiario: YORMAN ANDRÉS FONTECHA REYES	22/10/2024			$ 100.000,00	$ 0,00	$ 100.000,00				$ 152.726.830				GASTOS ADMINISTRATIVOS

11	Cheque No.000012 $ 134.400,00 pago de examenes de salud ocupacional de ingreso según Cuenta de Cobro; Valor: $ 134.400; Beneficiario: LILIANA	22/10/2024			$ 134.400,00	$ 0,00	$ 134.400,00				$ 152.592.430				GASTOS ADMINISTRATIVOS
12	Cheque No.000013 $ 3.563.530,00 Materiales de Construcción (Arena) 28 m3; Factura 1446; Beneficiario: CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	22/10/2024			$ 3.563.530,00	$ 0,00	$ 3.563.530,00				$ 149.028.900				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
13	Cheque No.000014 $ 1.523.050,00 Elementos de Protección trabajadores y Dotación (Factura electrónica FVEH-364); Beneficiario: HELÍ ALBERTO PÁEZ	22/10/2024			$ 1.523.050,00	$ 0,00	$ 1.523.050,00				$ 147.505.850				GASTOS ADMINISTRATIVOS
14	Cheque No.000015 $ 1.903.031,00 Concepto 1. COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MATERIALES DE FERRETERÍA ,	5/11/2024			$ 1.903.031,00	$ 0,00	$ 1.903.031,00				$ 145.602.819				GASTOS ADMINISTRATIVOS
15	Cheque No.000016 $ 5.346.000,00 pago de Transporte de materiales (Triturado) Beneficiario: JORGE LUIS WANDURRAGA SANCHEZ NIT.	5/11/2024			$ 5.346.000,00	$ 0,00	$ 5.346.000,00				$ 140.256.819				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
16	Cheque No.000017 $ 526.800,00 pago de Seguridad Social personal de Obra; Beneficiario: NESTOR IDELFONSO FONTECHA SANDOVAL C.C. Y/O NIT.	5/11/2024			$ 526.800,00	$ 0,00	$ 526.800,00				$ 139.730.019				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
17	Cheque No.000018 $ 1.747.000,00 Formulario 3510612808412 Recibo 4910879454388 RETENCIÓN EN LA FUENTE	19/11/2024			$ 1.747.000,00	$ 0,00	$ 1.747.000,00				$ 137.983.019				RETENCIONES Y OTROS
18	Cheque No.000019 $ 1.350.000,00 SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA	19/11/2024			$ 1.350.000,00	$ 0,00	$ 1.350.000,00				$ 136.633.019				GASTOS ADMINISTRATIVOS
19	Cheque No.000020 $ 1.464.512,00 NOMINA OFICIAL DEL 24 OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	25/11/2024			$ 1.464.512,00	$ 0,00	$ 1.464.512,00				$ 135.168.507				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
20	Cheque No.000021 $ 814.800,00 NOMINA AYUDANTE DEL 24 OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	25/11/2024			$ 814.800,00	$ 0,00	$ 814.800,00				$ 134.353.707				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
21	Cheque No.000022 $ 814.800,00 NOMINA AYUDANTE DEL 24 OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	25/11/2024			$ 814.800,00	$ 0,00	$ 814.800,00				$ 133.538.907				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
22	Cheque No.000023 $ 905.333,00 NOMINA AYUDANTE DEL 24 OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	25/11/2024			$ 905.333,00	$ 0,00	$ 905.333,00				$ 132.633.574				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
23	Cheque No.000024 $ 814.800,00 NOMINA AYUDANTE DEL 24 OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	25/11/2024			$ 814.800,00	$ 0,00	$ 814.800,00				$ 131.818.774				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
24	Cheque No.000025 $ 1.431.573,00 NOMINA MAESTRO DEL 24 OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	25/11/2024			$ 1.431.573,00	$ 0,00	$ 1.431.573,00				$ 130.387.201				GASTOS ADMINISTRATIVOS
25	Cheque No.000026 $ 400.000,00 SUBSIDIO AL DIGNATARIO MES DE OCTUBRE	2/12/2024			$ 400.000,00	$ 0,00	$ 400.000,00				$ 129.987.201				GASTOS ADMINISTRATIVOS
26	Cheque No.000027 $ 4.204.800,00 Seguridad Social JAC noviembre	2/12/2024			$ 4.204.800,00	$ 0,00	$ 4.204.800,00				$ 125.782.401				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
27	Cheque No.000028 $ 3.136.000,00 HONORARIOS ING. RESIDENTE MES DE SEPTIEMBRE	2/12/2024			$ 3.136.000,00	$ 0,00	$ 3.136.000,00				$ 122.646.401				GASTOS ADMINISTRATIVOS
28	Cheque No.000029 $ 1.952.160,00 HONORARIOS CONTADORA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	2/12/2024			$ 1.952.160,00	$ 0,00	$ 1.952.160,00				$ 120.694.241				GASTOS ADMINISTRATIVOS
29	Cheque No.000030 $ 7.078.500,00 TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS SUBBASE (13 VIAJES)	2/12/2024			$ 7.078.500,00	$ 0,00	$ 7.078.500,00				$ 113.615.741				COSTOS DIRECTOS DE OBRA

30	Cheque No.000031 $ 8.711.010,00 TRANSPORTE SOBREACARREO MATERIALES	2/12/2024			$ 8.711.010,00	$ 0,00	$ 8.711.010,00				$ 104.904.731				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
31	Cheque No.000032 $ 11.473.200,00 ALQUILER MAQUINARIA VIBRO COMPACTADOR ($10'920.000), TRANSPORTE VIBRO ($1'000.000)	11/12/2024			$ 11.473.200,00	$ 0,00	$ 11.473.200,00				$ 93.431.531				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
32	Cheque No.000033 $ 14.393.700,00 ALQUILER RETROEXCAVADORA ($10920.000), FLETE TRANSP RETRO ($1'200.000) Y TRANSPORTE DE	11/12/2024			$ 14.393.700,00	$ 0,00	$ 14.393.700,00				$ 79.037.831				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
33	Cheque No.000034 $ 1.494.000,00 TOPOGRAFÍA (PAGO No.2)	11/12/2024			$ 1.494.000,00	$ 0,00	$ 1.494.000,00				$ 77.543.831				GASTOS ADMINISTRATIVOS
34	Cheque No.000035 $ 647.000,00 REEMBOLSO PAGO DE RETENCIONES NOVIEMBRE 2024	11/12/2024			$ 647.000,00	$ 0,00	$ 647.000,00				$ 76.896.831				RETENCIONES Y OTROS
35	Cheque No.000037 $ 1.048.800,00 ENSAYOS DE LABORATORIO Y ALQUILER DE CAMISAS PARA MUESTRAS DE CONCRETO	11/12/2024			$ 1.048.800,00	$ 0,00	$ 1.048.800,00				$ 75.848.031				GASTOS ADMINISTRATIVOS
36	Cheque No.000038 $ 1.790.826,67 NOMINA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE	18/12/2024			$ 1.790.826,67	$ 0,00	$ 1.790.826,67				$ 74.057.204				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
37	Cheque No.000039 $ 1.163.066,67 NOMINA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE	18/12/2024			$ 1.163.066,67	$ 0,00	$ 1.163.066,67				$ 72.894.138				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
38	Cheque No.000040 $ 1.114.333,33 NOMINA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE	18/12/2024			$ 1.114.333,33	$ 0,00	$ 1.114.333,33				$ 71.779.804				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
39	Cheque No.000041 $ 1.163.066,67 NOMINA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE	18/12/2024			$ 1.163.066,67	$ 0,00	$ 1.163.066,67				$ 70.616.738				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
40	Cheque No.000042 $ 1.114.333,33 NOMINA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE	18/12/2024			$ 1.114.333,33	$ 0,00	$ 1.114.333,33				$ 69.502.404				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
41	Cheque No.000043 $ 1.915.360,00 NOMINA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE	18/12/2024			$ 1.915.360,00	$ 0,00	$ 1.915.360,00				$ 67.587.044				GASTOS ADMINISTRATIVOS
42	Cheque No.000044 $ 3.136.000,00 HONORARIOS INGENIERO RESIDENTE MES OCTUBRE 2024	18/12/2024			$ 3.136.000,00	$ 0,00	$ 3.136.000,00				$ 64.451.044				GASTOS ADMINISTRATIVOS
43	Cheque No.000045 $ 1.952.160,00 HONORARIOS CONTADORA MES OCUBRE 2024	18/12/2024			$ 1.952.160,00	$ 0,00	$ 1.952.160,00				$ 62.498.884				GASTOS ADMINISTRATIVOS
44	Cheque No.000046 $ 14.048.532,00 COMPRA DE CEMENTO (250 BULTOS) Y 500 VARILLAS No.3	18/12/2024			$ 14.048.532,00	$ 0,00	$ 14.048.532,00				$ 48.450.352				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
45	Cheque No.000047 $ 1.978.818,00 INSUMOS, TABLA, DISCO DE CORTE, PLÁSTICO	18/12/2024			$ 1.978.818,00	$ 0,00	$ 1.978.818,00				$ 46.471.534				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
46	Cheque No.000048 $ 300.000,00 PAPELERÍA MES SEPTIEMBRE 2024	18/12/2024			$ 300.000,00	$ 0,00	$ 300.000,00				$ 46.171.534				GASTOS ADMINISTRATIVOS
47	Cheque No.000049 $ 5.044.050,00 TRANSPORTE DE MATERIALES (Sobreacarreo) EN CAMIONETA + 2 FLETES MONIQUIRÁ - LA FLORIDA	18/12/2024			$ 5.044.050,00	$ 0,00	$ 5.044.050,00				$ 41.127.484				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
48	Cheque No.000050 $ 1.905.761,00 COMPRA DE MATERIALES (ARENA)	18/12/2024			$ 1.905.761,00	$ 0,00	$ 1.905.761,00				$ 39.221.723				COSTOS DIRECTOS DE OBRA

49	Cheque No.000051 $ 4.609.500,00 PAGO SEG SOCIAL MES DICIEMBRE DE 2024	18/12/2024			$ 4.609.500,00	$ 0,00	$ 4.609.500,00				$ 34.612.223				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
50	Cheque No.000052 $ 876.026,00 ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS REFERENCIA DE PAGO 117278801; REF 117276101	18/12/2024			$ 876.026,00	$ 0,00	$ 876.026,00				$ 33.736.197				GASTOS ADMINISTRATIVOS
51	Cheque No.000053 $ 1.803.702,00 NOMINA DEL 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE	10/01/2025			$ 1.803.702,00	$ 0,00	$ 1.803.702,00				$ 31.932.495				GASTOS ADMINISTRATIVOS
52	Cheque No.000054 $ 1.755.845,00 NOMINA DEL 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE	10/01/2025			$ 1.755.845,00	$ 0,00	$ 1.755.845,00				$ 30.176.650				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
53	Cheque No.000055 $ 1.103.400,00 NOMINA DEL 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE	10/01/2025			$ 1.103.400,00	$ 0,00	$ 1.103.400,00				$ 29.073.250				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
54	Cheque No.000056 $ 1.093.323,00 NOMINA DEL 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE	10/01/2025			$ 1.093.323,00	$ 0,00	$ 1.093.323,00				$ 27.979.927				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
55	Cheque No.000057 $ 1.123.564,00 NOMINA DEL 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE	10/01/2025			$ 1.123.564,00	$ 0,00	$ 1.123.564,00				$ 26.856.363				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
56	Cheque No.000058 $ 1.093.323,00 NOMINA DEL 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE	10/01/2025			$ 1.093.323,00	$ 0,00	$ 1.093.323,00				$ 25.763.040				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
57	Cheque No.000059 $ 1.104.429,00 NOMINA DEL 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE	10/01/2025			$ 1.104.429,00	$ 0,00	$ 1.104.429,00				$ 24.658.611				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
58	Cheque No.000060 $ 1.920.000,00 SALDO ESTUDIOS Y DISEÑOS	10/01/2025			$ 1.920.000,00	$ 0,00	$ 1.920.000,00				$ 22.738.611				GASTOS ADMINISTRATIVOS
59	Cheque No.000065 $ 2.081.220,00 NOMINA DEL 07 de enero al 31 de enero de 2025	28/01/2025			$ 2.081.220,00	$ 0,00	$ 2.081.220,00				$ 20.657.391				GASTOS ADMINISTRATIVOS
60	Cheque No.000064 $ 1.472.012,00 NOMINA DEL 07 de enero al 31 de enero de 2025	28/01/2025			$ 1.472.012,00	$ 0,00	$ 1.472.012,00				$ 19.185.379				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
61	Cheque No.000066 $ 1.472.012,00 NOMINA DEL 07 de enero al 31 de enero de 2025	28/01/2025			$ 1.472.012,00	$ 0,00	$ 1.472.012,00				$ 17.713.367				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
62	Cheque No.000067 $ 1.472.012,00 NOMINA DEL 07 de enero al 31 de enero de 2025	28/01/2025			$ 1.472.012,00	$ 0,00	$ 1.472.012,00				$ 16.241.355				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
63	Cheque No.000068 $ 1.472.012,00 NOMINA DEL 07 de enero al 31 de enero de 2025	28/01/2025			$ 1.472.012,00	$ 0,00	$ 1.472.012,00				$ 14.769.343				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
64	Cheque No.000061 $ 1.986.000,00 REEMBOLSO RETENCIONES MES DE DICIEMBRE 2024	28/01/2025			$ 1.986.000,00	$ 0,00	$ 1.986.000,00				$ 12.783.343				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
65	Cheque No.000062 $ 1.894.150,00 REEMBOLSO PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO DEL 2025 Y ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS DE	28/01/2025			$ 1.894.150,00	$ 0,00	$ 1.894.150,00				$ 10.889.193				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
66	Cheque No.000063 $ 700.000,00 PAPELERÍA DICIEMBRE 2024 ($300.000) - SUBSIDIO DE TRANSPORTE PARA EL DIGNATARIO	28/01/2025			$ 700.000,00	$ 0,00	$ 700.000,00				$ 10.189.193				GASTOS ADMINISTRATIVOS
67	Cheque No.000069 $ 1.960.000,00 HONORARIOS CONTADORA NOV 2024 (ULTIMO)	28/01/2025			$ 1.960.000,00	$ 0,00	$ 1.960.000,00				$ 8.229.193				GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL PERÍODO							**$ 25.507.004,00**								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	**IVA**	**TOTAL**
PAGOS REALIZADOS WEPTIEMBRE			$4.357.393,00
PAGOS REALIZADOS OCTUBRE			$48.132.997,00
PAGOS REALIZADOS NOVIEMBRE			$17.118.649,00
PAGOS REALIZADOS DICIEMBRE			$96.651.003,67
PAGOS REALIZADOS ENERO			$25.507.004,00
VALOR TOTAL			**$191.767.046,67**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
C.C. 13.542.131 de Bucaramanga
Firma
Nombre: MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
Matrícula Profesional No.: 68202165983 STD
Residente de Obra (Tebaida)

Firma
Nombe: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4424 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	18	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	18	18	24	22	22	20	23	23	24	16	707
Lluvias moderadas	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	1	0	0	12
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

N/A

Firma
MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
C.C. 13.542.131 de Bucaramanga
Nombre: MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202165983 STD

Firma
Nombre: JAIME CHACÓN DURÁN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 682021-12213 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/01/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:	4424 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	ene-2025	**PROYECTO:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1631 DE 2023	**INTERVENTOR:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	18/12/2024	ENSAYO DE RESISTENCIA CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. E 410	I.N.V. E 410	OBRA	3	N/A	NA	NA	
2	17/12/2024	ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO I.N.V. E 142	I.N.V. E 142	CANTERA CALIZAS Y MINERALES (MONIQUIRÁ)	1	N/A	7,20%	SI	HUMEDAD ÓPTIMA
3	17/12/2024	ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO I.N.V. E 142	I.N.V. E 142	CANTERA CALIZAS Y MINERALES (MONIQUIRÁ)	1	N/A	2318,00	SI	DENSIDAD SECA MÁXIMA (KG/M3)
4	17/12/2024	ENSAYO DE PESO UNITARIO DEL SUELO EN TERRENO I.N.V. E 161	I.N.V. E 142	CANTERA CALIZAS Y MINERALES (MONIQUIRÁ)	2	N/A	98,00	SI	DENSIDAD DE COMPACTACION
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	17/12/2024	TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE ARENA	INV E- 161	VEREDA TEBAIDA K0+115 EJE	1	95,00%	95,50%	SI	N/A
2	17/12/2024	TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE ARENA	INV E- 161	VEREDA TEBAIDA K0+075 EJE	1	95,00%	103,80%	SI	N/A

2	17/12/2024	TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE ARENA	INV E- 161	VEREDA TEBAIDA K0+040 EJE	1	95,00%	96,20%	SI	N/A

OBSERVACIONES:

DURANTE EL PERÍODO SE TOMARON MUESTRAS DE CONCRETO, SIN EMBARGO A LA FECHA NO SSE TIENEN LOS RESULTADOS

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
C.C. 13.542.131 de Bucaramanga
Firma
Nombre: MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
Matrícula Profesional No.: 68202165983 STD
Residente de Obra (Tebaida)

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4424 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 16/11/2023

PLAZO INICIAL: 46 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/01/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.996.240,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.996.240,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	40.199.248,00	15/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemniz	5%	10.049.812,00	15/11/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	60.298.872,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001993

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/09/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	15	11	2023	31	12	2023
Otros	20	$ 40.199.248,00	15	11	2023	31	10	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014745 **OTRAS PÓLIZAS No.** 3001993

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** n/a **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	40.199.248,00	16/10/2025	23/10/2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	60.298.872,00	23/12/2024	23/12/2029
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	5%	10.049.812,00	16/12/2027	23/12/2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001993

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS NIT. 860.002.400-2

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** n/a **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	20	12	2023	23	12	2024
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014745 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS NIT. 860.002.400-2

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: N/A

OBSERVACIONES:

SE ANEXA ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN PRÓRROGA 04 DEL CONVENIO

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025 (Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4424 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA

FECHA DE INICIO: 16/11/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 46 DIAS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/01/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------- NO ------ APROBADO: SI ------- NO ------- VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:
CONTRACTUALMENTE NO SE EXIGIÓ LA PRESENTACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE UN PLAN DE CALIDAD, SIN EMBARGO EL CONTRATISTA REALIZARÁ ENSAYOS DE MATERIALES BÁSICOS (DENSIDADES DE SUBBASE GRANULAR Y ENSAYO DE CILINDROS A COMPRESIÓN)

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ----------

OBSERVACIONES:
CONTRACTUALMENTE NO SE EXIGIÓ AL CONTRATISTA LA PRESENTACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE UN PLAN DE CALIDAD, SIN EMBARGO INTERVENTORÍA REALIZARÁ ENSAYOS DE MATERIALES BÁSICOS (DENSIDADES DE SUBBASE GRANULAR Y ENSAYO DE CILINDROS A COMPRESIÓN)

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------- NO ------- APROBADO: SI ------- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

N/A

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

N/A

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: .....
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: .....
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: .....
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: .....
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: .....
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: .....

OBSERVACIONES:

N/A

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

N/A

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

N/A

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: NA	Nombre: NA	Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: NA	Matrícula Profesional No.: NA	Matrícula Profesional: 25202-61517 CND	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS CONVENIO 4565 DE 2023 LA PALMERA VELEZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** ene-25

CONTRATO DE OBRA No.: 4565 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA

PLAZO INICIAL: 40 DIAS
FECHA DE INICIO: 21/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 27/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 8,47 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.029.468,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.029.468,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 201.029.468,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	119
	Mejoramiento	N/A	0
	Rehabilitación	N/A	0
Estructuras	Alacantarillas	UND	0
	Gavión	N/A	0
	Pontones	N/A	0
Mantenimiento		N/A	0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	TOTAL
Pavimentación	Placa Huella	ML	0,00	**121,00**
	Mejoramiento	N/A	0,00	**0,00**
	Rehabilitación	N/A	0,00	**0,00**
Estructuras	Alacantarillas	UND	0,00	**0,00**
	Gavión	N/A	0,00	**0,00**
	Pontones	N/A	0,00	**0,00**
Mantenimiento		N/A	0,00	**0,00**
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	1,00	**1,00**

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 145.806.174,00	$ 0,00	$ 145.806.174,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.849.109,00	$ 0,00	$ 49.849.109,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.374.185,00	$ 0,00	$ 4.374.185,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.029.468,00	$ 0,00	$ 200.029.468,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 3.478.596,75	$ 0,00	$ 3.478.596,75	$ 151.403.420,72
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 2.058.265,00	$ 0,00	$ 2.058.265,00	$ 43.894.167,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.567.931,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR EJECUTADO	**$ 5.536.861,75**	**$ 0,00**	**$ 5.536.861,75**	**$ 199.865.518,72**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 201.029.468,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 199.865.518,72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 99,42%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **14**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			
13/01/2025 Visita previa a recibo de convenio, placa-huella terminada	13/01/2025 Visita previa a recibo de convenio, placa-huella terminada	13/01/2025 Visita previa a recibo de convenio, placa-huella terminada	13/01/2025 Visita previa a recibo de convenio, placa-huella terminada
			
13/01/2025 Visita previa a recibo de convenio, placa-huella terminada	13/01/2025 Visita previa a recibo de convenio, placa-huella terminada	25/01/2025 Acto social de cierre e inauguración de las obras organizado por la JAC.	25/01/2025 Acto social de cierre e inauguración de las obras organizado por la JAC.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

OBSERVACIONES:

1. Las obras propias del convenio fueron terminadas en el mes de Diciembre de 2024.
2. En este momento se encuentra en proceso de liquidación del convenio, cierre de cuenta y cierres Ambiental y Social, es posible que se presenten ajustes a los valores registrados.
3. Se realizó la actividad de cierre Social e inauguración de la placahuela el día 25 de enero de 2025.

Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ene/2025

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 4565 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023

INTERVENTORÍA: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				**DÍAS DEL MES**																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
MEZCLADORA DE UN BULTO																																
COMPACTADOR MANUAL, TIPO SALTARÍN																																
COMPACTADOR MANUAL, TIPO RANA																																
PLANTA ELECTRICA																																
VIBRADOR DE CONCRETO																																
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																
TOTAL ACTIVO																																
TOTAL EN REPARACIÓN																																
TOTAL INACTIVO																																

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

DURANTE EL PERÍODO NO SE EJECUTARON OBRAS DEL CONVENIO

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre:
Residente de Obra JESÚS ALBERTO DÍAZ ARIZA
Matrícula Profesional No.: 68202112197 STD

Firma

Nombre:
Residente de Interventoría ING. JAIME CHACOND URÁN
Matrícula Profesional No.: 68202112213 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4565 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene/2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** N/A

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Jesús Alberto Díaz Ariza	13957231	Ing. Residente																																Jesús Alberto Díaz Ariza														
2	Laura Carolina Ariza Nieves	1101756764	Contaora																																Laura Carolina Ariza Nieves														
3	Rigoberto Ariza Duarte	13953823	Oficial																																JAC Vereda La														
4	Luis Ovidio Duarte Hernandez	1005196326	Ayudante																																JAC Vereda La														
5	Yobany Guiza Hernandez	13957092	Ayudante																																JAC Vereda La														
6	Saul Jerez Hernandez	1007477730	Ayudante																																JAC Vereda La														
7	Luis Enrrique Lucena Colombo	7131661	Ayudante																																JAC Vereda La														
8	Carlos Daniel Quiñonez Maza	1003040962	Ayudante																																JAC Vereda La														
9	Efren Ramirez Olarte	13954019	Oficial																																JAC Vereda La														
10	Robinson Santamaria Ariza	13959325	Maestro																																JAC Vereda La														

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

DURANTE EL PERÍODO NO SE EJECUTARON OBRAS DEL CONVENIO.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JESÚS ALBERTO DÍAZ ARIZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-112197 STD

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matricula Profesional: 25202-61517 (

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4565 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA

MES INFORME MENSUAL: dic/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	1329523	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 10,00	Nacion	Principal	$ 200.029.468
TOTAL						$ 200.029.468

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 200.029.468,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas	Indicar pago según		Observaciones
													SI	NO	
103	Cheque No.75 $ 1.978.000,00 Saldo Estudios y Diseños	10/01/2025			$ 1.978.000,00	$ 0,00	$ 1.978.000,00				$ 3.722.811				GASTOS ADMINISTRATIVOS
104	Cheque No.110 $ 1.761.617,75 Compra de Cemento (55 Bultos)	10/01/2025			$ 1.761.617,75	$ 0,00	$ 1.761.617,75				$ 1.961.193				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
105	Cheque No.111 $ 80.265,00 Actualización Pólizas	10/01/2025			$ 80.265,00	$ 0,00	$ 80.265,00				$ 1.880.928				GASTOS ADMINISTRATIVOS
106	Cheque No.112 $ 1.049.997,00 Compra Arena de Río (1 viaje) 7m3	10/01/2025			$ 1.049.997,00	$ 0,00	$ 1.049.997,00				$ 830.931				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
107	Cheque No.113 $ 225.382,00 Reembolso Pago de retneciones y Reteica (Enero 2025)	10/01/2025			$ 225.382,00	$ 0,00	$ 225.382,00				$ 605.549				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
108	Cheque No.116 $ 441.600,00 Desembolso para pago de nómina de dos (2) Trabajadores.	28/01/2025			$ 441.600,00	$ 0,00	$ 441.600,00				$ 163.949				COSTOS DIRECTOS DE OBRA
TOTALES PERÍODO							**$ 5.536.861,75**								


Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
PAGOS REALIZADOS SEPTIEMBRE - 2024			$ 8.783.354
PAGOS REALIZADOS OCTUBRE- 2024			$ 39.797.377
PAGOS REALIZADOS NOVIEMBRE- 2024			$ 39.635.245
PAGOS REALIZADOS DICIEMBRE- 2024			$ 106.112.681
PAGOS REALIZADOS ENERO- 2025			$ 5.536.862
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			$ 199.865.519

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.





Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JESÚS ALBERTO DÍAZ ARIZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-112197 STD

Firma
Nombe: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4565 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene/2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	23	24	22	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	22	20	23	23	24	24	730
Lluvias moderadas	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	1	0	0	12
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

DURANTE EL PERÍODO NO SE EJECUTARON OBRAS DE CONVENIO

Firma
Nombre: JESÚS ALBERTO DIAZ ARIZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-112197 STD

Firma
Nombre: ING. JAIME CHACÓN DURÁN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202112213 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:	4565 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	ene/2025	**PROYECTO:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1631 DE 2023	**INTERVENTOR:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									
1	20/11/2024	NSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO I.N.V. E 142	I.N.V. E 142	CANTERA METRÓPOLIS - MONIQUIRÁ BOYACÁ	1	N/A	4,30%	SI	HUMEDAD ÓPTIMA
2	20/11/2024	NSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO I.N.V. E 142	I.N.V. E 142	CANTERA METRÓPOLIS - MONIQUIRÁ BOYACÁ	1	N/A	2.31 GR/CM3	SI	DENSIDAD SECA MÁXIMA
3	28/11/2024	TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE ARENA	INV E- 161	VEREDA LA PALMERA K0+060 EJE	1	95%	104,60%	SI	N/A
4	28/11/2024	TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE ARENA	INV E- 161	VEREDA LA PALMERA K0+030 EJE	1	95%	96,30%	SI	N/A
22	17/01/2025	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV. E - 410 ASTM C39	PLACA HUELLA LA PALMERA K0+100	1	3000 PSI	3155.61	SI	N/A
23	17/01/2025	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV. E - 410 ASTM C39	PLACA HUELLA LA PALMERA K0+100	1	3000 PSI	3200.25	SI	N/A
24	23/01/2025	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV. E - 410 ASTM C39	PLACA HUELLA LA PALMERA K0+110	1	3000 PSI	3406.05	SI	N/A
25	23/01/2025	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV. E - 410 ASTM C39	PLACA HUELLA LA PALMERA K0+110	1	3000 PSI	3778.60	SI	N/A

OBSERVACIONES:

Interventoría solcitó a la JAC presentar los ensayos y laboratorios realizados.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que ev
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrad
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los r

Firma N/A	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: JESÚS ALBERTO DÍAZ ARIZA	Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Obra	Residente de Obra	Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 68202-112197 STD	Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4565 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 21/11/2023

PLAZO INICIAL: 40 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.029.468,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.029.468,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.300.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	40.205.893,60	21/11/2023	23/12/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	5%	10.051.473,40	21/11/2023	23/12/2024
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	60.308.840,40	21/12/2023	23/12/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100043087

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/09/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo básico-predios,labores y operaciones		$ 260.000.000,00	21	11	2023	23	12	2024
Patronal		$ 260.000.000,00	21	11	2023	23	12	2024
Contratistas y subcontratistas		$ 260.000.000,00	21	11	2023	23	12	2024
Vehículos propios y no propios		$ 260.000.000,00	21	11	2023	23	12	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100011257 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 5

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** 5 **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20%	40.205.893,60	23/12/2024	13/11/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemni:	10%	10.051.473,40	23/12/2024	13/01/2028
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	60.308.840,40	13/01/2025	13/01/2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-10043087

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL (NIT.860037013-6)

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: N/A

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** 5 **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Amparo básico-predios,labores y operaciones		$ 284.700.000,00	21	11	2023	13	1	2025
Patronal		$ 284.700.000,00	21	11	2023	13	1	2025
Contratistas y subcontratistas		$ 284.700.000,00	21	11	2023	13	1	2025
Vehículos propios y no propios		$ 284.700.000,00	21	11	2023	13	1	2025

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100011257 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL (NIT.860037013-6)

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: N/A

OBSERVACIONES:

N/A

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4565 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA

FECHA DE INICIO: 21/11/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 40 DIAS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 23/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ____ NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

CONTRACTUALMENTE NO SE ESTABLECIÓ LA PRESENTACIÓN NI/O SEGUIMIENTO DE UN PLAN DE CALIDAD, SIN EMBARGO SE REALIZAN LOS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIOS BÁSICOS DE OBRA (DENSIDADES SUBBASEG GRANULAR Y ENSAYO DE CONCRETOS A COMPRESIÓN)

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ N ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORIA: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

N/A

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI N O

OBSERVACIONES:

N/A

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

N/A

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES:

N/A

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

N/A

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

N/A

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma N/A	Firma N/A	Firma	Firma N/A
Nombre:	Nombre:	Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional: 25202-61517 CND	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO.
INFORMES SEMANALES

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.

Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 2/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **32** del 27/12/2024 al 2/1/2025 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA **GUAMAL** DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL		
CONVENIO No.	3951 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,006,719.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,006,719.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,006,719.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,006,719.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 518,667,972		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 16,740,208		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	201,006,719.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150,755,039.25	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	159,507,243.18	79.35%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(8,752,203.93)	-4.35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$	36,072,294.41	17.95%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**201,006,719.00**	**100.00%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**195,579,537.59**	**97.30%**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(8,752,203.93)	-4.35%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%

Observaciones: El valor reportado la semana anterior (30) incluyó en el monto las retenciones pagadas a la DIAN, sin embargo esto no es correcto ya que las Retenciones forman parte de los COSTOS DIRECTOS DE OBRA. El valor de OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS, corresponden a valores ejecutados, valores de pagos anticipados a proveedores y presupuesto PAGA. Durante el período se alcanzó el 100% de la meta física.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 517,656,948.00	96.68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 518,667,972.00	96.87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4,437,510.20	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,184,753.60	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% — Avance o Atraso Físico %: 2.86%

Meta Física Ejecutada %: 102.86%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	metros lineales	140
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	140.00			140.00	100.00%
Ejec	**144.00**			**144.00**	**102.86%**
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de opera	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchill	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	5.89916	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	-73.58554	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: La JAC Presentó la cantera CANTERA EL CAIRO S.A.S. NIT. 900729004 localizada en KM 6 VIA MONIQUIRA-TUNJA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN REVISIÓN

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10.00	7.00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10.00	7.00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.00	0.00
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.00	0.00

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 7/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se da inicio a las actividades con la junta de acción comunal vereda Guamal del municipio de Bolívar - Santander
* Se realiza el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se realiza entrega de cotizaciones para Estudios y Diseños.
* Se asiste a comité semanal en conjunto con Interventoría.
* Se realiza entrega de cotizaciones correspondientes a los Estudios y Diseños (EyD), las cuales no fueron aprobadas por la interventoría, por elevados costos.
* Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 22 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 02 Sep. Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS
* Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.

FECHA: 2/1/2025 (Día / Mes / Año)

* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo.
* 10/09/2024 JAC presentó cotización para realización de Estudios y diseños del convenio.
* 17/09/2024 Se realizó aprobación de la cotización de Estudios y diseños por 4'500.000
* 17/09/2024 Se envió a la Interventoría los Estudios y diseños, Interventoría respondió Observaciones.
* 20/09/2024 Se recibió comunicado TIC-INVIAS-1631-165 Solicitando completar los estudios y diseños.
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 03/10/2024 Se realizó reunión INTERVENTORÍA - INVIAS se expuso el estado general de los convenios, sin embargo se programó reunión extraordinaria con las veredas GUAMAL Y GAITAL.
* 04/10/2024 Se estableció compromiso por parte de la JAC de presentar la documentación pendiente y adelantar la gestión necesaria para realización del convenio, con mayor diligencia y compromiso.
* 08/10/2024 Se realizó visita al sitio, esta visita había sido solicitada porque los dueños de los predios aledaños no dejaban hacer volteadero para las volquetas, sin embargo al llegar al sitio estaba reunida gran parte de la comunidad solicitaron hacer las placa huellas en el sector que más lo requiere, que es iniciando el corredor vial, un sector de alta pendiente.
* 08/10/2024 Se solicitó al diseñador realizar el cambio de tramo, se autorizó el pago de estos diseños adicionales al proveedor.
* 09/10/2024 SE trabajó revisión de cotizaciones vía Google meet. En espera de los diseños definitivos
* 10/10/2024 Interventoría emitió TIC-INVIAS-1631-175- Observaciones del especialista en geotecnia a los EyD - GUAMAL
* 16/10/2024 A la fecha la JAC no ha presentado los diseños definitivos del tramo a intervenir
* 21/10/2024 Se realizó topografía de terreno para completar el levantamiento de diseño del tramo priorizado.
* 22/10/2024 Se realizó **comité aprobación de cotizaciones** de materiales e insumos representativos del convenio.
* 23/10/2024 Por vía WhatsApp se enviaron documentos de diseño, pero hace falta una entrega organizada y formal del los diseños del nuevo tramo.

29/10/2024 JAC envío correo con estudios y diseños, sin embargo, la documentación no está completa falta diseño geométrico.
29/10/2024 Se realizó **ajuste del presupuesto** de obra
29/10/2024 Se realizaron pagos para materiales de construcción,
29/10/2024 JAC norma renuncia del ingeniero residente, envió hoja de vida de ingeniero residente para aprobación.
01/11/2024 INICIO OBRAS
05/11/2024 Se realizó COMITÉ DE PAGOS a proveedores del convenio.
06/11/2024 SE TIENE APLICADA SUBBASE GRANULAR, SE REALIZA FIGURADO DE ACERO Y FORMALETA PARA PLACAHUELLA
08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROGRAMACIÓN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONVENIO.
13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA.
18/11/2024 DURANTE EL PERÍODO SE AVANZÓ SATISFACTORIAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE PLACAHUELLAS.
19/11/2024 NO FUÉ POSIBLE REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES, EL BANCO NO ENTREGA AÚN LA CHEQUERA SOLICITADA POR LA JUNTA
25/11/2024 SE REALIZÓ COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
27/11/2024 DURAN TE EL PERÍODO SE AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLAS EN CONCRETO 3000PSI.
27/11/2024 SE PROGRAMA HOY REUNION VIRTUAL CON EL DISEÑADOR PARA QUE PRESENTE CORRECCIONES A LOS INFORMES DE DISEÑO.
04/12/2024 Durante la última semana se avanzó satisfactoriamente en la construcción de placa huellas.
11/12/2024 Durante la última semana se avanzó satisfactoriamente en la construcción de placa huellas. fecha terminación 16/12/2024
16/12/2024 Se tiene ejecutado el 100% de la meta física programada.
26/12/2024 Se encuentra en realización la gestión para cierre de la cuenta bancaria y liquidación del conenio.
02/01/2025 Se encuentra en realización el cierre Ambiental y Social del convenio.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se realizará la actividad PAGA-
* Dar cierre a la gestión ambiental del CONVENIO
* Realizar los Pagos pendientes principalmente de tipo administrativo, Planillas de seg social, Devolución de retenciones, Devolución de rendimientos, etc.
* Dar cierre a la parte contable y cuenta del convenio.

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA:

		SEMANA 24
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
12/12/2024 Placa huella Construida



FOTOGRAFÍA 2
12/12/2024 Placa huella Construida



FOTOGRAFÍA 3
12/12/2024 Construcción de placa huellas

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del convenciado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
2. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega prioritaria de los estudios y diseños (EyD), de acuerdo a que oportunamente se realizó y se dio un visto bueno a la cotización presentada, no obstante, el Ingeniero Aldahir Peña, argumenta que han tenido inconvenientes con el correo electrónico y que se ha dificultado recopilar la información.
-Se envió un oficio TIC-INVIAS-1631-096, en el cual se expone la preocupación por la dilatación de tiempos de entrega de documentación requerida (especialmente Estudios y Diseños), acorde a que no se han obtenido respuestas a las solicitudes emitidas por parte del personal de interventoría.
Por parte de la interventoría se les envía información correspondiente y se encuentra disponible para cualquier inquietud, no obstante, haciendo hincapié a que no se pueden extender los tiempos de entrega, porque podría afectar y generar un detrimento en el periodo estipulado de finalización del proyecto.
3. Por parte de la O.A.C. presente nuevamente cotizaciones para los Estudios y Diseños (EyD), lo cual no corresponde a los costos del sector, siendo estos muy elevados.
4. La O.A.C. se encuentra realizando subsanaciones de acuerdo a observaciones emitidas por la Interventoría.
5. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A.C
6. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-114 - OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de GUAMAL, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el periodo correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales genera la aplicación de las multas contempladas en el convenio.
7. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
8. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social pagadas.
9. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.
* A la fecha del presente informe, la JAC Guamal no ha presentado cotizaciones de ESTUDIOS Y DISEÑOS con precios ajustados al mercado.
* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
*12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 17/09/2024 Interventoría realizó aprobación de pagos con cheque para gastos administrativos.
* 20/09/2024 Interventoría envió al especialista en Geotecnia el estudio presentado (Faltaron Estudios de diseño geométrico y Pavimentos).
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 03/10/2024 Se realizó reunión INTERVENTORÍA - INVIAS se expuso el estado general de los convenios, sin embargo se programó reunión extraordinaria con las veredas GUAMAL Y GAITAL.
* 04/10/2024 Se estableció compromiso por parte de la JAC de presentar la documentación pendiente y adelantar la gestión necesaria para realización del convenio, con mayor diligencia y compromiso.
* 08/10/2024 Interventoría realizó visita al sitio, esta visita había sido solicitada porque los dueños de los predios aledaños no dejaban hacer volteadero para las volquetas, sin embargo al llegar al sitio estaba reunida gran parte de la comunidad solicitaron hacer las placa huellas en el sector que más lo requiere, que es iniciando el corredor vial, un sector de alta pendiente.
* 10/10/2024 Interventoría emitió TIC-INVIAS-1631-175- Observaciones del especialista en geotecnia a los EyD - GUAMAL
* 22/10/2024 Se realizó comité aprobación de cotizaciones de materiales e insumos representativos del convenio.
* 29/10/2024 Se realizaron pagos para materiales de construcción
* 05/11/2024 Interventoría , JAC y Veeduría realizan COMITÉ DE PAGOS a proveedores del convenio.
* 14/11/2024 Interventoría Coordinó la asistencia de las JAC a la CAPACITACIÓN ASPECTOS CONTABLES organizada por INVIAS
* 16/11/2024 INTERVENTORÍA REALIZÓ ENSAYOS DE DENSIDADES EN LA SUBBASE GRANULAR DEL SECTOR DONDE AÚN FALTA POR FUNDIR PLACHAUELLA
* 19/11/2024 NO FUÉ POSIBLE REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES, EL BANCO NO ENTREGA AÚN LA CHEQUERA SOLICITADA POR LA JUNTA
* 20/11/2024 Interventoría envió a la JAC el comunicado TIC-INVIAS-1631-229 OBSERVACIONES ÁREA PAVIMENTOS A LOS E Y D DEL TRAMO PRIORIZADO
* 27/11/2024 INTERVNETORÍA REALIZÓ REUNION VIRTUAL CON EL DISEÑADOR PARA QUE PRESENTE CORRECCIONES A LOS INFORMES DE DISEÑO.
* 02/12/2024 Interventoría Realizó comités de pagos a proveedores del convenio.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST
* 09/12/2024 Interventoría envió comunicado TIC-INVIAS-1631-241 CONCEPTO FAVORABLE AL ESTUDIO DE GEOTECNIA CORRESPONDIENTE A LOS EYD - GUAMAL
* 11/12/2024 Interventoría JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 12/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST.
* 24/12/2024 Interventoría envio comunicado TIC-INVIAS-1631-257 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA VEREDA GUAMAL - BOLÍVAR

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 2/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: **32** (Numeración consecutiva) del 27/12/2024 al 2/1/2025 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE **LA UNION** DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION		
CONVENIO No.	4478 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,981,336.00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,981,336.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,981,336.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,981,336.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 518,667,972		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 16,740,208		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200,981,336.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200,981,336.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	184,796,669.33	91.95%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	16,184,666.67	8.05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	16,184,666.67	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200,981,336.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200,981,336.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	20,098,133.60	10.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	20,098,133.60	10.00%

Observaciones: Se culminan las obras objeto del Convenio en la semana de ejecución de obra No.9

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	517,656,948.00	96.68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	518,667,972.00	96.87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.20	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,753.60	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% | Avance o Atraso Físico % 10.38%

Meta Física Ejecutada % 110.38%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	106
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	106.00			106.00	100%
Ejec	117.00			117.00	110%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: La JAC se encuentra pendiente a remitir a esta interventoría dicha información.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-225 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8.0	7.0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15.0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se da inicio a las actividades el día 27/05/2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
04/10/20244 El 15 DE AGOSTO INTERVENTORÍA EMITIÓ CONCEPTO FAVORABLE A LOS DISEÑOS DEL ÁREA DE PAVIMENTOS Y DISEÑO GEOMÉTRICO TIC-INVIAS-1631-132
04/10/2044 Se realizó trabajo de oficina conjuntamente con el Ing. residente de Obra para avanzar en el AJUSTE PRESUPUESTAL, el presupuesto definitivo quedó revisado, pendiente aprobaciones de Estudios y Diseños.
04/10/2044 Se realizó revisión de PRESUPUESTO AJUSTADO, fue enviado al Ing. Director de Interventoría para revisión.
16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-197 con observaciones al área Hidráulica de los Estudios y diseños entregados por la JAC
16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-198 con aspectos a corregir después de la tercera revisión al Informe de Geotecnia como parte de los Estudios y diseños entregados por la JAC
17/10/2024 Se remite a la JAC por medio de Correo electrónico la Prórroga N° 2 al Convenio N° 4478 - 2023 con el fin de que El conveniado actualice las Pólizas del mismo.
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 Se remite a la JAC por medio de Correo electrónico la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio N° 4478 - 2023 con el fin de que El conveniado actualice las Pólizas del mismo.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 18/11/2024 la JAC realiza entrega mediante correo electrónico de documentación de gestión ambiental.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 27/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 97 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, franja de enrocado central también de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía y rampas de inicio y final también en concreto reforzado de 21 mpa.

* 27/11/2024 se tiene ejecutado a la fecha también, la instalación de 5,0 ml de tubería en concreto de 21 mpa, con su respectivo atraque y relleno, se cuenta con la estructura de encole terminada y se encuentra en proceso de instalación de acero de refuerzo y formaleta para la estructura de descole de la alcantarilla proyectada en este tramo.

* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-225 al invias radicando el paga del convenio.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 02/12/2024 se realizará revisión de balance del convenio para determinar una posible ampliación de la meta física.
* 05/12/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 06/12/2024 Se culminan las actividades de ejecución de la Obra objeto del Convenio con una Meta física de 117 ml de Placas huella construidas en Concreto de 21 Mpa y Construcción de una (1) Alcantarilla con una Instalación de 5 ml de Tubería en concreto de 36" con sus respectivas Estructuras de Encole y Descole también en Concreto de 21 Mpa.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*13/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-246 respuesta a radicado invias 2024s-vbog-092184 del 05 de diciembre de 2024 acerca de la gestión ambiental del convenio
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*17/12/2024 se remite a la JAC prórroga n° 3 del convenio para actualización de pólizas
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-258 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-270 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotecnia de los estudios y diseños presentados por la misma

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realizará seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* La O.A.C. realizará entrega de subsanaciones a observaciones realizadas por la Interventoría para los Estudios y Diseños (EyD).
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 32
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	0.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	110.38%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	110.38%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	110.38%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	110.38%

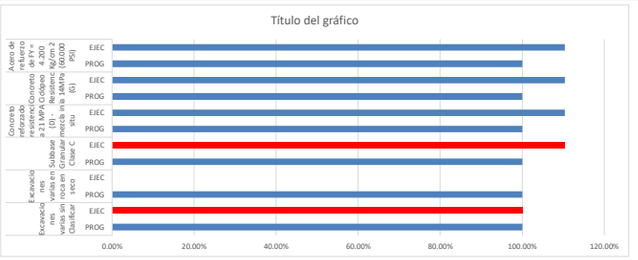

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 Instalación Acero de refuerzo para Placas huella



FOTO 2 Instalación Acero de refuerzo para Descole Alcantarilla



FOTO 3 Fundida de Cunetas en Concreto de 21 Mpa

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 04/10/20244 El 15 DE AGOSTO INTERVENTORÍA EMITIÓ CONCEPTO FAVORABLE A LOS DISEÑOS DEL ÁREA DE PAVIMENTOS Y DISEÑO GEOMÉTRICO TIC-INVIAS-1631-132
* 04/10/2044 Se realizó revisión de PRESUPUESTO AJUSTADO, fue enviado al Ing. Director de Interventoría para revisión.
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-197 con observaciones al área Hidráulica de los Estudios y diseños entregados por la JAC
16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-197 con aspectos a corregir después de la tercera revisión al Informe de Geotecnia como parte de los Estudios y diseños entregados por la JAC
17/10/2024 Se remite a la JAC por medio de Correo electrónico la Prórroga N° 2 al Convenio N° 4478 - 2023 con el fin de que El conveniado actualice las Pólizas del mismo.
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 Se remite a la JAC por medio de Correo electrónico la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio N° 4478 - 2023 con el fin de que El conveniado actualice las Pólizas del mismo.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*12/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 12/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 18/11/2024 la JAC realiza entrega mediante correo electrónico de documentación de gestión ambiental.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 27/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo

* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 97 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, franja de enrocado central también de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía y rampas de inicio y final también en concreto reforzado de 21 mpa.

* 27/11/2024 se tiene ejecutado a la fecha también, la instalación de 5,0 ml de tubería en concreto de 21 mpa, con su respectivo atraque y relleno, se cuenta con la estructura de encole terminada y se encuentra en proceso de instalación de acero de refuerzo y formaleta para la estructura de descole de la alcantarilla proyectada en este tramo.
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-225 al invias radicando el paga del convenio.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 02/12/2024 se realizará revisión de balance del convenio para determinar una posible ampliación de la meta física.

* 06/12/2024 Se culminan las actividades de ejecución de la Obra objeto del Convenio con una Meta física de 117 ml de Placas huella construidas en Concreto de 21 Mpa y Construcción de una (1) Alcantarilla con una Instalación de 5 ml de Tubería en concreto de 36" con sus respectivas Estructuras de Encole y Descole también en Concreto de 21 Mpa.

* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

*13/12/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-246 respuesta a radicado invias 2024s-vbog-092184 del 05 de diciembre de 2024 acerca de la gestión ambiental del convenio

*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*17/12/2024 se remite a la jac prórroga n° 3 del convenio para actualización de pólizas
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-258 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.

*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-270 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotecnia de los estudios y diseños presentados por la misma

* Se realizó seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 2/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **32** del 27/12/2024 al 2/1/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA **POPOA** DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

CONVENIO SOLIDARIO:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POPOA			INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
				INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONVENIO No.	4767 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,995,632.00	CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,995,632.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/12/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,995,632.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,995,632.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 518,667,972		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 16,740,208		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO			
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200,995,632.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200,995,632.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	185,010,965.33	92.05%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	15,984,666.67	7.95%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	15,984,666.67	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200,995,632.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200,995,632.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	17,211,162.00	8.56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	10,049,781.60	5.00%

Observaciones: Esta es la semana de ejecución de obra No.10

INTERVENTORÍA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	517,656,948.00	96.68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	518,667,972.00	96.87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.20	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,753.60	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 83.74% — Avance o Atraso Físico %: 0.00%

Meta Física Ejecutada %: 83.74%

	Meta Física (Programa de Obra)			**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**					
	Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
*	Construcción de placa huella	Global	123	Prog	103.00			103.00	84%
				Ejec	103.00			103.00	84%
*				Prog					
				Ejec					
*				Prog					
				Ejec					
*				Prog					
				Ejec					
*				Prog					
				Ejec					
*				Prog					
				Ejec					
*				Prog					
				Ejec					
*				Prog					
				Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: La JAC se encuentra pendiente a remitir a esta interventoría dicha información.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-213 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2024

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7.00	7.00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2.00	7.00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.00	0.00
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.00	0.00

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 8/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
*2/10/2024 El Contratista presentó Cotizaciones para revisión y aprobación
* 4/10/2024 La JAC envió documentos de la cantera CALIZAS Y MINERALES
* 4/10/2024 Se realizó comité aprobatorio de COTIZACIONES
* 4/10/2024 PARA TENER EN CUENTA, EL CBR DEL TERRENO ES INFERIOR AL 3%, sin embargo el ingeniero Residente de Obra, aclaró que se debe corregir este párrafo en el Estudio de Geotecnia , porque el ceber de diseño SI ES SUPERIOR A 3%
* 8/10/2024 Se realizó Comité Operativo No.2 para firma de cheques y/o transferencias para pagos a Proveedores
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto, ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 20/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 20/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-222 a la JAC con las observaciones producto de la revisión del componente hidráulico de los estudio y diseños entregados por el conveniado.
* 20/11/2024 la jac realiza la entrega de las correcciones al área de geotecnia de los estudios y diseños
* 26/11/2024 la jac remite a la interventoría comunicado informando que pretende realizar la devolución de los recursos destinados para el paga.
* 27/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 83 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, incluyendo también la franja de enrocado central de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía (sin bordillo) y rampa de inicio en concreto reforzado de 21 mpa. 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 05/12/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
**11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
**11/12/2024 Se continua con la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 12/12/2024 la jac realiza la entrega de la última versión de los estudios del área de geotecnia de los estudios y diseños
* 12/12/2024 se culminan las actividades de ejecución de obra con una meta física de 103 ml de placas huella construidas y construcción de 6,0 ml de alcantarilla en tubería en concreto de 36" con sus respectivas estructuras de encole y descole
* 16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
* 17/12/2024 se remite a la jac prórroga n° 3 del convenio para actualización de pólizas
* 18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 19/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-254 al Invias con Entrega oficial del Plan de inversión social del convenio.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-259 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-271 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotecnia de los estudios y diseños presentados por la misma

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realizará seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* La O.A.C. realizará entrega de subsanaciones a observaciones realizadas por la Interventoría para los Estudios y Diseños (EyD).
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 32
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	0.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%

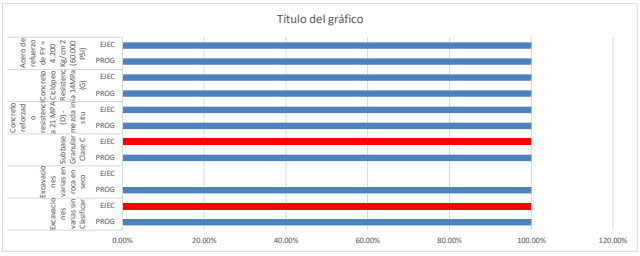

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
Placas Huella terminadas



FOTO 2
Placas Huella terminadas



FOTO 3
Placas Huella terminadas

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores

*2/10/2024 El Contratista presentó Cotizaciones para revisión y aprobación
* 4/10/2024 Se realizó reunión de seguimiento con INVIAS, presentación del estado de avance de los convenios
* 4/10/2024 La JAC envió documentos de la cantera CALIZAS Y MINERALES
* 4/10/2024 Se realizó comité aprobatorio de COTIZACIONES
* 8/10/2024 Se realizó Comité Operativo No.2 para firma de cheques y/o transferencias para pagos a Proveedores
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto, ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 20/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-222 a la JAC con las observaciones producto de la revisión del componente hidráulico de los estudio y diseños entregados por el conveniado.
* 20/11/2024 la JAC realiza la entrega de las correcciones al área de geotecnia de los estudios y diseños
* 26/11/2024 la JAC remite a la interventoría comunicado informando que pretende realizar la devolución de los recursos destinados para el paga.
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 83 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, incluyendo también la franja de enrocado central de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía (sin bordillo) y rampa de inicio en concreto reforzado
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/12/2024 la JAC realiza la entrega de la última versión de los estudios del área de geotecnia de los estudios y diseños
* 12/12/2024 se culminan las actividades de ejecución de obra con una meta física de 103 ml de placas huella construidas y construcción de 6,0 ml de alcantarilla en tubería en concreto de 36" con sus respectivas estructuras de encole y descole
* 16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
* 17/12/2024 se remite a la jac prórroga n° 3 del convenio para actualización de pólizas
* 18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 19/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-254 al Invias con Entrega oficial del Plan de inversión social del convenio.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-259 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-271 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotecnia de los estudios y diseños presentados por la misma
* Se realizó seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 2/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER SEMANA No.: **32** del 27/12/2024 al 2/1/2025 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA **BERLIN** DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL BERLIN

CONVENIO No.	3753 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,108,139.00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,108,139.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%

CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,108,139.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,108,139.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 518,667,972		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 16,740,208		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200,108,139.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200,108,139.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	200,108,139.00	100.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	17,076,666.67	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200,108,139.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200,108,139.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%

Observaciones: la ejecución de la Obra se culminó en la semana No.7

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	517,656,948.00	96.68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	518,667,972.00	96.87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.20	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,753.60	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% Avance o Atraso Físico % 3.36%
Meta Física Ejecutada % 103.36%

	Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
*	Construcción de placa huella	ml	149	Prog	149.00			149.00	100.00%
				Ejec	154.00			154.00	103.36%
*				Prog					
				Ejec					
*				Prog					
				Ejec					
*				Prog					
				Ejec					
*				Prog					
				Ejec					
*				Prog					
				Ejec					
*				Prog					
				Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: BERLÍN TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	1
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	1	1
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	1
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	1
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	1
Ruteadora	1	1
Compresor (barrido y soplado)	1	1
Camioneta D-300	1	1
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Compresor 120 HP, con martillo	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Aspersor manual	1	1
Total	13	13

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	6,3 km de la Obra	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	Cerca al casco urbano municipal	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

Observaciones: La JAC presento los documentos de la antera **ASOCIACION DE MINEROS AGROINDUSTRIALES AMBIENTALISTAS LA BELLEZA TMR ONG**. Localizada cerca al casco urbano del Municipio a 6,3 km del Sitio de la Obra.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-177 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2/2

FECHA: 2/1/2025 (Día / Mes / Año)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10.0	7.0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial el 7/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
*02/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 10/10/2024 La JAC envió formatos de gestión ambiental
*15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*21/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 23/10/2024 Se realizó visita de Obra por parte de los Componentes Ambiental, Social y Técnico de La Interventoría
* 24/10/2024 La JAC en la presente semana realizó la entrega del Plan de Inversión social Proyectado en el Convenio.
* 25/10/2024 Mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-203 La Interventoría realiza la Entrega oficial al INVIAS de las correcciones solicitadas al Plan de inversión social del convenio 3753 – 2023 OAC Vereda Berlín.
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-219 a la JAC solicitando la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la JAC realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la JAC
* 29/11/2024 La JAC realizó la entrega de las Pólizas del Convenio actualizadas al 11 de noviembre de2024
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-260 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-272 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotecnia de los estudios y diseños presentados por la misma

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realizará seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 32
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	80.00%
	EJEC	0.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%

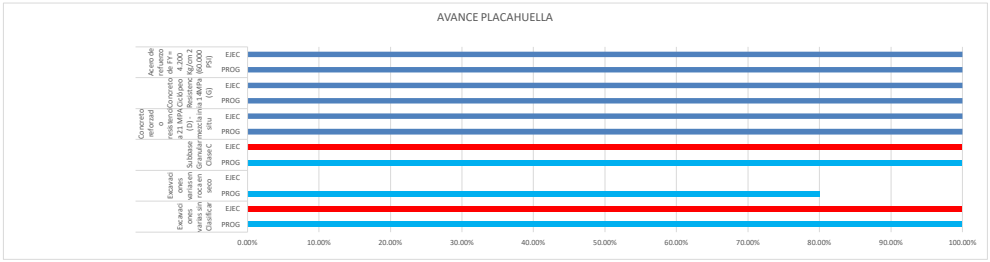

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
Placa huella terminada



FOTO 2
Placa huella terminada



FOTO 3
Vista general Placa huella construida

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
*02/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 04/10/2024 Se realizó reunión de seguimiento con INVIAS, presentación del estado de avance de los convenios
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 10/10/2024 La JAC envió formatos de gestión ambiental
*15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*21/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 23/10/2024 Se realizó visita de Obra por parte de los Componentes Ambiental, Social y Técnico de La Interventoría
* 25/10/2024 Mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-203 La Interventoría realiza la Entrega oficial al INVIAS de las correcciones solicitadas al Plan de inversión social del convenio 3753 – 2023 OAC Vereda Berlín.
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

* 06/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para bordillos de cunetas y limpieza de la obra.

* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-219 a la jac solicitando la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la JAC realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la JAC
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.
* 29/11/2024 La JAC realizó la entrega de las Pólizas del Convenio actualizadas al 11 de noviembre de2024
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-260 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-272 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotecnia de los estudios y diseños presentados por la misma

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,

Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 2/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: **32** del 27/12/2024 al 2/1/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **CACHIPAYAL** DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL

CONVENIO No.	4175 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,319,574.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,319,574.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%

CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,319,574.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,319,574.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 518,667,971		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 16,740,209		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		$200,319,574.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		$200,319,574.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		$200,319,574.00	100.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		$0.00	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		$42,026,640.00	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200,319,574.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200,319,574.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
	$ -		

Observaciones: la ejecución de la Obra se culminó en la semana No.7

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	517,656,948.00	96.68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	518,667,971.00	96.87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.20	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,753.60	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% | Avance o Atraso Físico % -7.10%
Meta Física Ejecutada % 92.90%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	ml	155
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	155.00			155.00	100.00%
Ejec	144.00			144.00	92.90%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	1
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	1	1
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	1
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	1
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	1
Ruteadora	1	1
Compresor (barrido y soplado)	1	1
Camioneta D-300	1	1
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Compresor 120 HP, con martillo	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Aspersor manual	1	1
Total	13	13

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: CACHIPAYAL | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cerca al caso Urbano	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	Distancia 13Km de la obra	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
La JAC de Cachipayal presentó los documentos de la Cantera SCS BUENAVISTA , RLHECTOR ALONSO MORENO QUITIAN , Localizada 13 Km del sitio de la obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-176 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10.0	7.0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 7/06/2024.

- Durante el período se realizó acompañamiento y asesoría al personal Administrativo de la OAC en la formulación del presupuesto de Gestión Social del convenio

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 10/10/2024 La JAC envió formatos de gestión ambiental
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 23/10/2024 Se realizó visita de Obra por parte de los Componentes Ambiental, Social y Técnico de La Interventoría
* 24/10/2024 La JAC en la presente semana realizó la entrega del Plan de Inversión social Proyectado en el Convenio.
* 25/10/2024 Mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-203 La Interventoría realiza la Entrega oficial al INVIAS de las correcciones solicitadas al Plan de inversión social del convenio 4175 – 2023 OAC Vereda Cachipayal.
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 El Conveniado realiza la entrega del Informe de Replanteo y Nivelación Topográfica del tramo.

FECHA: 2/1/2025 (Dia / Mes / Año)

* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 15/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-219 a la jac solicitando la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la JAC realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la JAC
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-261 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-273 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realizará seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* La O.A.C. realizará entrega de subsanaciones a observaciones realizadas por la Interventoría para los Estudios y Diseños (EyD).
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 32
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	80.00%
	EJEC	0.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
Placa huella terminada



FOTO 2
Placa huella terminada



FOTO 3
Vista general Tramo de Placa huella

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 10/10/2024 La JAC envió formatos de gestión ambiental
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 23/10/2024 Se realizó visita de Obra por parte de los Componentes Ambiental, Social y Técnico de La Interventoría
* 25/10/2024 Mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-203 La Interventoría realiza la Entrega oficial al INVIAS de las correcciones solicitadas al Plan de inversión social del convenio 4175 – 2023 OAC Vereda Cachipayal.
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 06/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para bordillos de cunetas y limpieza de la obra.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 15/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-219 a la jac solicitando la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la JAC realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la JAC
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-261 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-273 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 2/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **32** del 27/12/2024 al 2/1/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA **ORGANOS** DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS

CONVENIO No.	4490 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,785,769.00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,785,769.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.

INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%

CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,785,769.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,785,769.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 518,667,972		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 16,740,208		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200,785,769.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200,785,769.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	166,342,065.77	82.85%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	34,443,703.23	17.15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	34,443,703.23	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200,785,769.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200,785,769.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%

Observaciones:
Esta es la semana de ejecución de obra No.9

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	517,656,948.00	96.68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	518,667,972.00	96.87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.20	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,753.60	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% — Avance o Atraso Físico %: 16.67%

Meta Física Ejecutada %: 116.67%

Meta Fisica (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	ml	150
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	150.00			150.00	100.00%
Ejec	175.00			175.00	116.67%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: ORGANOS — TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	1
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	1	1
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	1
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	1
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	1
Ruteadora	1	1
Compresor (barrido y soplado)	1	1
Camioneta D-300	1	1
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Compresor 120 HP, con martillo	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Reparador Trabajar	1	1
Total	13	13

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	5.896845	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	-73.837612	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: La JAC presentó documento RUCOM y licencias del proveedor de materiales pétreos llamado TECNOCONSTRUCTORES, (Cantera Peña Blanca) localizado a 10 Km del sector en intervención. Pendiente solicitar al proveedor las licencias ambientales de la fuente de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-190 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA: 2/1/2025 (Día / Mes / Año)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8.0	7.0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15.0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se presenta cambio residente de interventoría el 03/07/2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 04/10/2024 Se realizó reunión de seguimiento con INVIAS, presentación del estado de avance de los convenios
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 15/10/2024 La JAC remitió a la Interventoría los documentos de Gestión Ambiental del Convenio, quien a su vez mediante comunicado N° TIC-INVIAS-1631-190 realizó la radicación de los mencionados documentos ante La Subdirección de sostenibilidad del Invias
* 16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-193 con aspectos a corregir después de la tercera revisión al Informe de Geotecnia como parte de los Estudios y diseños entregados por la JAC
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 después de realizar el balance presupuestal del convenio se llegó a la conclusión de que se puede ampliar la meta física proyectada de 10 ml para construir un total de placas huella de 160 ml de longitud aproximada, ampliación que se encuentra en ejecución a la fecha
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 después de realizar el balance presupuestal del convenio se llegó a la conclusión de que se puede ampliar la meta física proyectada de 20 ml para construir un total de placas huella de 170 ml de longitud aproximada, ampliación que se encuentra en ejecución a la fecha
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 se encuentra pendiente iniciar la entrega de la documentación para la liquidación del convenio por parte de la jac
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la jac realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la jac 27/11/2024 se culminan las obras del presente convenio
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 175 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, franja de enrocado central también de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía y rampas de inicio y final también en concreto reforzado de 21 mpa, completando de esta manera el 116,7 % del alcance del proyecto ya que se tenía un alcance inicial de 150 ml y se pudo ampliar la meta física en 25 ml.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 19/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-252 a la JAC emitiendo concepto favorable por parte del Especialista respectivo al componente de Geología y Geotecnia de Los Estudios y Diseños del Proyecto.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-262 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*27/12/2024 Se realizó la actividad Social propuesta por la JAC, con participación de la Interventoría del Convenio y la comunidad local.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará la entrega de los resultados Estudios y Diseños (Ed) para revisión de Interventoría.
* Se realizará revisión del presupuesto ajustado acorde a los diseños y al cotizaciones y precios dela zona que presente la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del contrato
* Se iniciara presentación de hojas de vida personal contractual y proceso afiliación del personal operativo y presentación a Interventoría
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 32
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	0.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	116.70%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	116.70%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	116.70%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	116.70%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Placa huella terminada


Placa huella terminada


Placa huella terminada

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 04/10/2024 Se realizó reunión de seguimiento con INVIAS, presentación del estado de avance de los convenios
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 15/10/2024 La JAC remitió a la Interventoría los documentos de Gestión Ambiental del Convenio, quien a su vez mediante comunicado N° TIC-INVIAS-1631-190 realizó la radicación de los mencionados documentos ante La Subdirección de sostenibilidad del Invias
* 16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-193 con aspectos a corregir después de la tercera revisión al Informe de Geotecnia como parte de los Estudios y diseños entregados por la JAC
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 después de realizar el balance presupuestal del convenio se llegó a la conclusión de que se puede ampliar la meta física proyectada de 10 ml para construir un total de placas huella de 160 ml de longitud aproximada, ampliación que se encuentra en ejecución a la fecha
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 después de realizar el balance presupuestal del convenio se llegó a la conclusión de que se puede ampliar la meta física proyectada de 20 ml para construir un total de placas huella de 170 ml de longitud aproximada, ampliación que se encuentra en ejecución a la fecha
* 25/11/2024 se realiza comité
* 27/11/2024 se encuentra pendiente iniciar la entrega de la documentación para la liquidación del convenio por parte de la jac
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la jac realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la jac 27/11/2024 se culminan las obras del presente convenio
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 175 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, franja de enrocado central también de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía y rampas de inicio y final también en concreto reforzado de 21 mpa,
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 19/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-252 a la JAC emitiendo concepto favorable por parte del Especialista respectivo al componente de Geología y Geotecnia de Los Estudios y Diseños del Proyecto.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-262 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*27/12/2024 Se realizó la actividad Social propuesta por la JAC, con participación de la Interventoría del Convenio y la comunidad local.
* Se realizó seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

	FECHA	2/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER SEMANA No.: **32** del 27/12/2024 al 2/1/2025 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA **TUBAVITA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ- SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Construcción de Placa huella y Una (1) Alcantarilla; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA			INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
				INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONVENIO No.	4357 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,030,449.00	CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,030,449.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/1/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,030,449.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,030,449.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 518,667,972		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 16,740,208		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO			INTERVENTORÍA		
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201,030,449.00		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 517,656,948.00	96.68%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 150,772,836.75	75.00%			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 160,658,543.33	79.92%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 518,667,972.00	96.87%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (9,885,706.58)	-4.92%			
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 40,371,905.67	20.08%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4,437,510.20	0.83%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$ 201,030,449.00**	100.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,184,753.60	0.78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$ 201,030,449.00**	100.00%			
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0.00%		**SI**	**NO**
			RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20,103,044.90	10.00%	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		
			PERIODO FACTURADO:		
			VALOR FACTURA:	$ -	
Observaciones: Las OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS corresponden a pagos realizados a proveedores del convenio en el rubro de gastos administrativos, incluye pagos anticipados a proveedores. Durante el período se avanzó satisfactoriamente en la construcción de las obras.			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		
			Observaciones:		

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% Avance o Atraso Físico % 0.84%
Meta Física Ejecutada % 100.84%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	119
*	Alcantarilla	Unidad	1
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	119.00				
Ejec	120.00				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,2	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades se

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	**5.871507800**	PERMISO MINERO:	SI NO
	-73.524087000	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PÉTREOS ESCOGIDA ES "CALIZAS Y MINERALES S.A.S. NIT. 900414198-1 LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8.0	7.0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 7/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se da inicio a las actividades con la junta de acción comunal vereda La unión del municipio de Guavatá - Santander.
* Se realiza entrega de cotizaciones para los Estudios y Diseños
* Se realiza comité técnico/operativo para aprobación de Cotización de estudios y diseños.
* Se realiza seguimiento, control y verificación de las actividades iniciales necesarias para la formulación de estudios y diseños (topografía, apique, ensayo PDC y conteo vehicular).
* Se solicitarán cotizaciones de transporte y materiales necesarios para la ejecución de la obra física en harás de ajustar precios unitarios.
* Se participa en reunión general y comité de obra con la interventoría para revisar avances.
* Se realiza visita y recorrido con el Ing. Director del INVIAS Santander Marlon Gamboa, JAC e Interventoría el día 04 de julio 2024.
* Se continúa haciendo el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se realiza las actividades iniciales necesarias para la formulación de estudios y diseños.
* Se recepcionan y validan las cotizaciones de transporte, materiales y valla publicitaria necesarios para la ejecución de la obra física en aras de ajustar precios unitarios.
* Se participa en reunión de comité de obra con la interventoría para revisar avances de la actividad de estudios y diseños.
* Se efectúa visita de campo en conjunto con la interventoría, representantes de la comunidad, presidente de JAC, residente de obra y director del convenio a fin de despejar dudas de la comunidad.
* Se realiza revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realiza seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realiza mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio

FECHA: 2/1/2025 (Día / Mes / Año)

* Se realiza el respectivo ajuste a precios unitarios del proyecto y se formulará la programación de obra y programación de compras.
* Se participa en comités de obra y demás que sean solicitados.
* Se hace visita en campo, lugar de la obra para tomar fotografías de los tramos y demás que sean necesarias.
* Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 21 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 02 Sep. Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS.
* Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.
* 05 sep. Se recibieron observaciones al Contratista GEOTECNIA TIC-INVIAS-1631-154
* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo.
* 16/09/2024 Se realizó visita al sitio de la obra con Interventoría, se solicitó la realización de una alcantarilla.
* 20/09/2024 Se instaló Valla informativa del Convenio.
* 23/09/2024 Se envió a interventoría relación de los pagos realizados hasta el momento.
* 25/09/2024 Se realizó revisión de cotizaciones de materiales en oficina de interventoría.
* 26/09/2024 JAC realizó solicitud de prórroga al convenio 4357 de 2023.
* 01/10/2024 Interventoría envió oficio Radicado: 2024E-VUVRAZ-096167 TIC-INVIAS-1631-166 INFORMANDO **LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA**
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 10/10/2024 Se realizó comité aprobación de COTIZACIONES de insumos y materiales.
* 15/10/2024 Se realizó comité de pagos a proveedores.
* **18/10/2024 INICIO OBRAS**
* 24/10/2024 Se realizó aprobación de estudios y diseños.
* 25/10/2024 - 31/10/2024 Se realizó Mejoramiento de subrasante en Pedraplén, Instalación tubería de concreto 36".
* 07/11/2024 DURANTE EL PERÍODO SE AVANZÓ EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL CONVENIO, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y APLICACIÓN DE SUBBASE GRNAULAR
* 05/11/2024 JAC INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
* 09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROGRAMACIÓN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONVENIO.
* 12/11/2024 SE REALIZÓ COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA.
* 13/11/2024 SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA PROYECTADA
* 18/11/2024 DURANTE EL PERÍODO SE AVANZÓ SATISFACTORIAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLAS.
* 25/11/2024 SE REALIZÓ COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 27/11/2024 DURANTE LA SEMANA SE AVANZÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLAS. JAC SOLICITA REVISIÓN EN SITIO PARA CONSTRUCCIÓN DE FILTROS
* 03/12/2024 Interventoría envió comunicado TIC-INVIAS-1631-238- CONCEPTO FAVORABLE AL ESTUDIO HIDRAULICO - TUBAVITA, con esto quedan todos los componentes técnicos aprobados.
* 04/12/2024 Se construyen Filtros en los 3 Tramos de placa huella, se evidencia flujo freático en los 3 sectores en intervención.
* 04/12/2024 Durante la semana se avanzó satisfactoriamente en la construcción de placa huellas.
* 11/12/2024 Durante la semana se avanzó satisfactoriamente en la construcción de placa huellas.
* 11/12/2024 Se realizó demolición de roca, para avanzar con la construcción de cuneta del tramo No.2
* 18/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* **30/12/2024 Se completó el 100% de las obras, placa huella en concreto.**
* 02/01/2025 Se encuentra en realización el cierre Ambiental y Social del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Avanzar en la construcción de las obras del convenio.
* Se realizará constante seguimiento a la ejecución del convenio en aspectos técnicos, administrativos, sociales, ambientales y sst.
* Se participará en comités operativos y demás que sean solicitados.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA


PLACAHUELLA

		SEMANA 32
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
MEJORAMIENTO CON PEDRAPLEN	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	100.84%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	100.84%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%



ALCANTARILLA

		SEMANA 32
Construcción Alcantarilla	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
Tramo No3 100% Terminado



FOTO 2
Tramo No.2 100% Terminado



Foto 3
Tramo No.1 100% Terminado

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a
2. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega prioritaria de los estudios y diseños (EyD) acorde a que NO se deben generar retrocesos que afecten, ni generen
3. El día 12-08-2024 La O.A.C. realiza entrega de los Estudios y Diseños.
4. El día 15-08-2024 y 16-08-2024 Los Ingenieros especialistas de La interventoría realiza observaciones a los Estudios y Diseños presentados.
5. El día 21-08-2024 La O.A.C. presenta subsanaciones a los Estudios y Diseños por observaciones de la Interventoría.
6. El día 28-08-2024 se emite concepto favorable por el especialista de vías para los Estudios y Diseños (EyD).
7. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A.C
8. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-109 - OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de TUBAVITA, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el periodo correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales genera la aplicación de las multas contempladas en el convenio.

9. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
10. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social pagadas.
11. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.
* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 10 sep Se programó visita a la vereda teniendo en cuenta, que la alcantarilla a construir se encuentra sobre un terreno removido, la Ingeniera Residente solicitó inspección del sitio para autorizar la construcción de estructuras en este punto.
*12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 16/09/2024 Interventoría realizó Visita al sitio de las obras, la comunidad solicitó realización de alcantarilla.
* 25/09/2024 Se realizó revisión de cotizaciones de materiales se hicieron observaciones a la JAC.
* 01/10/2024 Interventoría envió oficio Radicado: 2024E-VUVRAZ-096167 TIC-INVIAS-1631-166 INFORMANDO **LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA**
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 03/10/2024 Se realizó reunión virtual con INVIAS se expuso el estado general de los convenios.
* 10/10/2024 Se realizó comité aprobación de COTIZACIONES de insumos y materiales.
* 15/10/2024 Se realizó comité de pagos a proveedores.
* 29/10/2024 Se realizó comité de pagos a proveedores.
* 05/11/2024 JAC INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 14/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINA LAS JAC PARA CAPACITACIÓN POR PARTE INVIAS SOBRE AREA CONTABLE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS
* 12/11/2024 JAC INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 16/11/2024 INTERVENTORÍA REALIZA TOMA DE DENSIDADES DE CAMPO EN LA SUBBASE GRANULAR APLICADA
* 25/11/2024 JAC, INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 21/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINÓ LAS JAC PARA CAPACITACIÓN AMBIENTAL POR PARTE DE INVIAS.
* 02/12/2024 Interventoría Realizó comité de pagos a proveedores del convenio.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST
* 10/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST.
* 11/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 18/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 24/12/2024 Interventoría envió comunicado TIC-INVIAS-1631-263 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA TUBAVITA – VÉLEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 2/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 32 del 27/12/2024 al 2/1/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA **EL GAITAL** DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GAITAL		
CONVENIO No.	4367 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,016,649.00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,016,649.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,016,649.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,016,649.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 518,667,972.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 16,740,208.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	201,016,649.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150,762,486.75	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	13,348,638.79	6.64%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	137,413,847.96	68.36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	27,844,817.52	13.85%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**201,016,649.00**	**100.00%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**41,193,456.31**	**20.49%**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	159,823,192.69	79.51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	20,101,664.90	10.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%

Observaciones: El convenio se encuentra en etapa de ejecución de obras. Durante el período el avance en construcción fue poco sin embargo se realiza acopio de materiales en sitio y adquisición de insumos. A la fecha las condiciones climáticas han mejorado, sin embargo el terreno sigue siendo de difícil acceso. La consecución de Vibro compactador en la zona es difícil.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	517,656,948.00	96.68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	518,667,972.00	96.87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.20	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,753.60	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% | Avance o Atraso Físico % -90.91%

Meta Física Ejecutada % 9.09%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	110
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	110.00			110.00	100.00%
Ejec	10.00			10.00	9.09%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	5.871515582	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	-73.524041619	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: La JAC Presentó la cantera CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SAS NIT.900414198 localizada en el municipio de MONIQUIRÁ

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**6.0**	**7.0**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 7/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se realiza el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se realizó de una inspección en obra donde se encontró un afloramiento de aguas Subterráneas en la zona a intervenir a las cuales se le debe dar una alternativa de para las canalizaciones.
* Se realiza entrega de cotizaciones para los Estudios y Diseños.
* Se realiza comité técnico/operativo para aprobación de Cotización de estudios y diseños.
*Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 22 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 02 Sep. Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS.
* Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.
* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo.
* 10/09/2024 Se envió a interventoría cotizaciones de topografía para revisión.
* 13/09/2024 Se realizó reunión e n oficina con la interventoría, se revisó cotizaciones de materiales y ajuste presupuestal.

* 22/09/2024 Se envió a interventoría la relación de Pagos Realizados.
* 26/09/2024 Se trabajó en oficina la revisión de cotizaciones de materiales e insumos.
* 01/10/2024 Se envió TIC-INVIAS-1631-170- CONCEPTO FAVORABLE A LOS EYD - GAITAL
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 02/10/2024 El Presidente de la JAC manifestó verbalmente que la Junta realizará la Construcción del filtro necesario.
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 04/10/2024 Se realizó reunión extraordinaria con INTERVENTORÍA E INVIAS, la JAC se comprometió enviar las cotizaciones faltantes y el presupuesto proyectado. Y avanzar en la ejecución de obra teniendo en cuenta el tiempo que queda de ejecución.
* 09/10/2024 SE HAN HECHO OBSERVACIONES COTIZACIONES 09 OCT SE REALIZARÁ REVISIÓN FINAL Y COMITE DE APROBACIÓN DE COTIZACIONES.
* EL DÍA 17 DE OCTUBRE SE REALIZARÓ VISITA DE CAMPO PARA VERIFICAR LA MANERA DE REALIZAR LOS TRANSPORTES, POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO EL CONTRATISTA PROPONE REALIZAR UN ACOPIO DE MATERIAL PREVIO AL PUNTO DEFINITIVO DE DISPOSICIÓN EN OBRA.
* **21/10/2024 Inicio de actividades de Obra.**
* 24/10/2024 Se realizó comité de aprobación de COTIZACIONES DE INSUMOS Y MATERIALES.
* Hay poca disponibilidad de maquinaria en la zona (Vibrocompactador).
* 06/11/2024 A LA FECHA SE HAN ADQUIRIDO MATERIALES PÉTREOS, SE REALIZÓ TOPOGRAFÍA DE CAMPO, SE HAN REALIZADO CORRECCIÓN DE FALLOS EN ZONA DE LA PLACAHUELLA. sE REALIZA CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO EN CAMPO. SE HAN PRESENTADO LLUVIAS EN LA ULTIMA SEMANA QUE NO PERMITEN ACARREO DE MATERIALES.
* 07/11/2024 LAS VOLQUETAS CON MATERIAL NO HAN PODIDO ACCEDER AL SITIO DE LAS OBRAS DEBIDO AL ESTADO DE LA CARRETERA LA CUAL ES MUY PENDIENTE Y POR LAS LLUVIAS LOS VEHICULOS SE QUEDAN PATINANDO EN EL BARRO.
* 08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
* 08/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROGRAMACIÓN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONVENIO.
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA.
* 15/11/2024 INTERVENTORÍA APROBÓ LA HOJA DE VIDA DE LA INGENIERA RESIDENTE LAURA PINZÓN.
* 18/11/2024 LAS CONSTANTES LLUVIAS PRESENTADAS DURANTE EL PERÍODO AFECTAN GRANDEMENTE LA VÍA DE ACCESO, NO ES FACTIBLE SUBIR MATERIALES A OBRA, DE IGUAL MANERA LA CONSECUCIÓN DE MAQUINARIA (VIBROCOMPACTADOR) ES DIFICIL, SE EVALÚA EL TIPO DE VIBROCOMPACTADOR A UTILIZAR YA QUE NO DEBE SER MUY PESADO.
* 20/11/2024 EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN REPROGRAMACIÓN DE OBRAS.
* 22/11/2024 EL ING REYNALDO MANTILLA DE INVIAS (SANTANDER) REALIZÓ VISITA AL SITIO, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 25/11/2024 EL ING. PEDRO J BARÓN DE INVIAS (BOGOTÁ) REALIZÓ VISITA AL SITIO CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 05/12/2024 Durante la última semana se cuenta con mejores condiciones del terreno, se ingresó maquinaria retroexcavadora para realizar adecuación de la subrasante. Se acopian materiales en sitio
* 10/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST. Se evidencia la necesidad de realizar filtros en terreno.
* 11/12/2024 Durante el período se realizó acopio de materiales pétreos, Conformación de subrasante, cargue de materiales en acopio
* 11/12/2024 El transporte de materiales pétreos se realiza en dos etapas, la primera desde la cantera (Moniquirá) hasta el sitio de acopio (Sector Colegio Gaital), la segunda etapa consiste en realizar cargue de volquetas a media capacidad desde ese punto de acopio hasta el sitio de la obra, recorrido de aproximadamente 1,4 Km de alta pendiente, vía destapara, estrecha con dificultad de acceso en época de lluvias.
* 17/12/2024 Se realiza extendido y compactación de subbase granular.
* 18/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 20/12/2024 Se realiza aplicación y compactación de subbase granular
* 20/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 24/12/2024 Interventoría emitió cmomunicado TIC-INVIAS-1631-264 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA GAITAL VÉLEZ
* 26/12/2024 Durante el período se han preentido lluvias, las cuales afectan la vía de acceso al sitio de las obras, no es posible subir materiales pétreos desde el punto colegio hasta la obra.
* 02/12/2024 No se realizaron actividades en obra durante la última semana.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se dará continuidad a la construcción de la obra, se espera tener la totalidad de la subbase granular aplicada y compactada.
* Se dará inicio a la construcción de estructura de placa huella en concreto reforzado de 3000 psi.
* Se realizará suministro de materiales de obra.
* Se realizarán pagos a proveedores del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 24
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	50.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	65.00%
	EJEC	0.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	65.00%
	EJEC	0.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	75.00%
	EJEC	20.00%

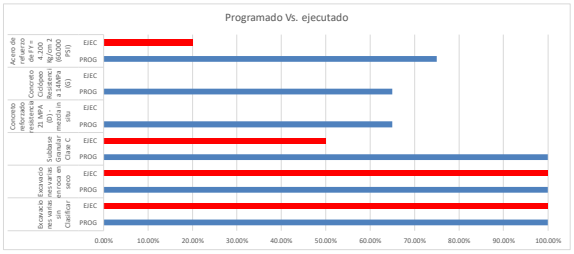

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1
20/12/2024 Subbase Granular aplicada



FOTO 2
20/12/2024 Subbase Granular aplicada



FOTO 3
20/12/2024 Subbase Granular aplicada

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
2. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega prioritaria de los estudios y diseños (EyD) acorde a que NO se deben generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en los tiempos ya estipulados.
3. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A.C

4. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-111 - OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de GAITAL, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el periodo correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales genera la aplicación de las multas contempladas en el convenio.
5. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
6. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social pagadas.

7. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.

* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios.
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 13/09/2024 Interventoría envió a todas las JAC TIC-INVIAS-1631-163 - Reiteración oficio TIC-INVIAS-1631-157 del 05/09/2024 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras
* 25/09/2024 Interventoría envió requerimiento a la JAC instalación de Buzón de PQR.
* 26/09/2024 Interventoría atendió en oficina a la JAC para las cotizaciones de materiales.
* 01/10/2024 Se envió TIC-INVIAS-1631-170- CONCEPTO FAVORABLE A LOS EYD - GAITAL
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 02/10/2024 El Presidente de la JAC manifestó verbalmente que la Junta realizará la Construcción del filtro necesario.
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL

* 03/10/2024 Interventoría expuso a INVIAS el estado general de los convenios en reunión virtual, se programó reunión extraordinaria para el día siguiente con las juntas GAITAL Y GUAMAL.

* 04/10/2024 Se realizó reunión extraordinaria con INTERVENTORÍA E INVIAS, la JAC se comprometió enviar las cotizaciones faltantes y el presupuesto proyectado. Y avanzar en la ejecución de obra teniendo en cuenta el tiempo que queda de ejecución.

* EL DÍA 17 DE OCTUBRE INTERVENTORÍA REALIZARÓ VISITA DE CAMPO PARA VERIFICAR LA MANERA DE REALIZAR LOS TRANSPORTES, POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO EL CONTRATISTA PROPONE REALIZAR UN ACOPIO DE MATERIAL PREVIO AL PUNTO DEFINITIVO DE DISPOSICIÓN EN OBRA. SE REALIZÓ REUNIÓN CON LA VEEDURÍA PARA ESTABLECER LA METODOLOGÍA DE TRANSPORTE.

* 24/10/2024 Se realizó comité de aprobación de COTIZACIONES DE INSUMOS Y MATERIALES.
* 05/11/2024 Interventoría realizó conjuntamente con la JAC y Veeduría COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 14/11/2024 Interventoría realizó conjuntamente con la JAC y Veeduría COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO

* 19/11/2024 Interventoría realizó visita de obra Director, Social, SST y Residente de Interventoría al sitio de las obras, para verificar el avance del convenio y el estado de la vía de acceso.

* 19/11/2024 Interventoría realizó COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO, EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ
* 22/11/2024 Interventoría realizó acompañamiento a la visita del ingeniero Reynaldo Mantilla de INVIAS SANTADNER.
* 25/11/2024 El Director de Interventoría realizó la visita conjunta con el Ing. Pedro J Barón a la obra, se verificó el avance de obra y el estado de la vía de acceso.
* 02/12/2024 Interventoría Autorizó comité de pagos a proveedores del convenio.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST.
* 10/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST.
* 11/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 14/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-248 POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PROPIAS DEL CONVENIO CONVENIO 4367 -2023 JAC GAITAL.
* 18/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 20/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 24/12/2024 Interventoría emitió cmomunicado TIC-INVIAS-1631-264 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA GAITAL VÉLEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 32 del 27/12/2024 al 2/1/2025 — Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE **TEBAIDA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

1 Tramo Placa huella y Una (1) alcantarilla en concreto reforzado; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TEBAIDA

CONVENIO No.	4424 de 2023	VALOR INICIAL:	$	200,996,240.00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	200,996,240.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%

CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$	394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$	141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$	535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$	-
		VALOR AMORTIZADO:	$	-
		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,996,240.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,996,240.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 394,093,490.00	$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 518,667,972		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 394,093,490.00	$ 16,740,208		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200,996,240.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150,747,180.00	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	51,920,307.80	25.83%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	98,826,872.20	49.17%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	32,498,113.00	16.17%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**200,996,240.00**	**100.00%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**84,418,420.80**	**42.00%**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	116,577,819.20	58.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	20,099,624.00	10.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,019,924.80	2.00%

Observaciones: El avance se ve reflejado en los gastos administrativos ejecutados y la compra de materiales para realización de las obras. Durante el período se realizaron actividades constructivas de manera satisfactoria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	517,656,948.00	96.68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	518,667,972.00	96.87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.20	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,753.60	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% — Avance o Atraso Físico %: -64.00%
Meta Física Ejecutada %: 36.00%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	140
*	Alcantarilla	Unidad	1
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	140.00				100.00%
Ejec	50.40				36.00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico seman

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg) 52. Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades se

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	**5.871515582**	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	-73.52404162	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: La JAC Presentó la cantera CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SAS NIT.900414198 localizada en el municipio de MONIQUIRÁ

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9.00	7.00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9.00	7.00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.00	0.00
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.00	0.00

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 7/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se continua en este periodo por parte de la JAC actualización de Presupuesto de Obra.
* Se envían para aprobación de la interventoría cotizaciones de (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se inicia la vinculación de personal mano de obra no calificada y maestro general.
* Se participa de reunión técnica programada por la interventoría.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio y avance de los estudios y diseños para lograr pasar a la ejecución del proyecto, fue rechazada la propuesta de los estudios y Diseños por presupuesto ya se está realizando nuevas cotizaciones y se realizará entrega nuevamente para
* Se realizó nuevamente entrega de cotizaciones para los Estudios y Diseños.
* Se realizó comité técnico/operativo para aprobación de Cotización de estudios y diseños.
* Se realizaron tomas de muestras de subrasante para estudios y diseños.
* Se radica a la aseguradora solicitud para actualización de pólizas.
* Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 21 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 02 Sep. Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS.
* Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.

FECHA: 2/1/2025 (Día / Mes / Año)

* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo.
* 10/09/2024 Se envió a interventoría los Estudios y Diseños del convenio para revisión.
* 11/09/2024 Se Instaló el buzón de sugerencias para la comunidad.
* 18/09/2024 Se realizó revisión de cotizaciones y de presupuesto en la oficina de interventoría
* 23/09/2024 Se recibió oficio TIC-INVIAS-1631-168 con las observaciones del área de PAVIMENTOS a la JAC
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 03/10/2024 Se envío Diseño Hidráulico a la Especialista Eugenia Villegas
* 05/10/2024 Se emitió TIC-INVIAS-1631-171- CONCEPTO FAVORABLE A LOS EYD - TEBAIDA
* 08/10/2024 Se realizó comité de pagos a proveedores del convenio.
* 18/10/2024 se REALIZÓ COMITÉ DE APROBACIÓN DE COTIZACIONES.
*** 21/10/2024 Se inician labores de obra.**
* 22/10/2024 Se realiza comité de pagos a proveedores.
* Se realiza acopio de materiales en obra, se cubren materiales pétreos con plástico.
* Se realiza corte y figurado de acero de refuerzo, para viguetas de placa huella.
* 5/11/2024 SE REALIZA COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 06/11/2024 SE ACOPIAN MATERIALES EN OBRA CONTINUA FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO LAS LLUVIAS PRESENTADAS ATRASAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
* 07/11/2024 LA OCURRENCIA DE LLUVIAS EN LA ZONA DIFICULTA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y BAJA EL RENDIMIENTO DE LAS ACTIIDADES DE OBRA.
* 08/11/2024 SE AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA.
* 08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
* 09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROC}
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA
* 18/11/2024 A CAUSA DE LAS LLUVIAS PRESENTADAS DIARIAMENTE DURANTE EL PERÍODO, EL ESTADO DE LA VÍA NO PERMITE EL ACCESO DE VEHÍCULOS PESADOS CON MATERIALES, LA COMUNIDAD SOLICITÓ ESPERAR A QUE CESEN LAS LLUVIAS PARA TRANSITAR CON VEHÍCULOS PESADOS POR LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA, DE IGUAL MANERA SE REQUIERE LA REALIZACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO PARA INGRESAR MATERIALES.
* 19/11/2024 SE REALIZA COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 20/11/2024 EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN REPROGRAMACIÓN DE OBRAS.
* 22/11/2024 EL ING REYNALDO MANTILLA DE INVIAS (SANTANDER) REALIZÓ VISITA AL SITIO, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 25/11/2024 EL ING. PEDRO J BARÓN DE INVIAS (BOGOTÁ) REALIZÓ VISITA AL SITIO CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO. SE TOMO LA DESICIÓN CONJUNTA CON LA COMUNIDAD DE REALIZAR EL TRASIEGO DE MATERIALES A LA OBRA EN CAMIONETA PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y DISMINUIR EL DAÑO EN LA VÍA
* 25/11/2024 SE REALIZA COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
02/12/2024 Se Tiene compactado 70% del tramo de subbase granular para iniciar instalación de acero de refuerzo y formaleta en sitio.
03/12/2024 Inicia Instalación de formaleta en madera para placa huellas.
04/12/2024 Durante la semana el alcance en obra a sido satisfactorio, ya se tiene 70% de la subbase granular compactada, para iniciar la construcción de concreto reforzado de placa huella
09/12/2024 Ingreso ayudante de construcción Tatiana.
11/12/2024 Durante el período se avanzo satisfactoriamente en la construcción de las obras, se tiene subbase granular compactada y el día 10 dic se realizó la primera fundida de concreto clase D huellas
17/12/2024 Inicio fundida de Viguetas en concreto 3000psi.
18/12/2024 Se realiza construcción de piedra pegada en zona central de la placa huella
20/12/2024 Se realiza fundida de riostras en concreto 3000psi reforzado.
30/12/2024 Avanza construcción de palca huellas de manera satisfactoria.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se dará continuidad a la construcción de la obra, se espera tener la subbase granular aplicada y compactada.
* Se dará continuidad a la construcción de estructura de placa huella en concreto reforzado de 3000 psi.
* Se realizará suministro de materiales de obra.
* Se realizarán pagos a proveedores del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA


PLACAHUELLA

		SEMANA 32
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	36.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	36.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	46.00%



ALCANTARILLA

		SEMANA 32
Construcción Alcantarilla	PROG	100.00%
	EJEC	50.00%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
30/12/2024 Instalación acero de refuerzo para encole de alcantarilla



FOTO 2
30/12/2024 Día lluvioso Cobertura de materiales con plástico



FOTO 3
30/12/2024 Replanteo en subbase para riostras

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
2. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega prioritaria de los estudios y diseños (EyD) acorde a que NO se deben generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en los tiempos ya estipulados.
3. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A.C
4. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-108 - OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de TEBAIDA, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el periodo correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales genera la aplicación de las multas contempladas en el convenio.
5. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
6. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social pagadas.
7. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.
* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios.
* 13/09/2024 Interventoría envió a todas las JAC TIC-INVIAS-1631-163 - Reiteración oficio TIC-INVIAS-1631-157 del 05/09/2024 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 23/09/2024 Se envió oficio TIC-INVIAS-1631-168 con las observaciones No.2 del área de PAVIMENTOS a la JAC.
* 26/09/2024 Interventoría Programo REUNIÓN Virtual con el Ing. Nelson Acevedo Gestor Ambiental para consultar sobre la aprobación de fuentes de materiales para los convenios.
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 03/10/2024 Se envío Diseño Hidráulico a la Especialista Eugenia Villegas
* 18/10/2024 se REALIZÓ COMITÉ DE APROBACIÓN DE COTIZACIONES.
* 22/10/2024 Interventoría y JAC realizan comité de pagos a proveedores.
* 5/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEDURA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 14/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINA LAS JAC PARA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN CONTABLE POR PARTE DE INVIAS
* 19/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 19/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINA LAS JAC PARA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN AMBIENTAL POR PARTE DE INVIAS
* 22/11/2024 INTERVENTORÍA REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A VISITA DEL ING REYNALDO MANTILLA DE INVIAS (SANTANDER) QUIEN REALIZÓ VISITA AL SITIO, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 25/11/2024 EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Y EL ING. PEDRO J BARÓN DE INVIAS (BOGOTÁ) REALIZAN VISITA AL SITIO CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO. SE TOMO LA DESICIÓN
* 25/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 02/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST
* 10/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST.
* 11/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 17/12/2024 Interventoría realiza toma de densidades en la subbase granular aplicada.
* 18/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 19/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-251 CONCEPTO FAVORABLE AL ESTUDIO DE GEOTECNIA CORRESPONDIENTE A LOS EYD - TEBAIDA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,

Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 2/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER SEMANA No.: **32** (Numeración consecutiva) del 27/12/2024 al 2/1/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA **LA PALMERA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALMERA		
CONVENIO No.	4565 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,029,468.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,029,468.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/1/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 81,075,700.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,029,468.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,029,468.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 518,667,972		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 16,740,208		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	201,029,468.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150,772,101.00	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	156,585,635.00	77.89%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-$	5,813,534.00	-2.89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	44,443,833.00	22.11%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**201,029,468.00**	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**201,029,468.00**	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	32,164,714.88	16.00%

Observaciones: Las OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS corresponde a pagos realizados a proveedores del convenio, incluyendo pagos adelantados de materiales. Durante el período se avanzó satisfactoriamente en la construcción de las obras.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	517,656,948.00	96.68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	518,667,972.00	96.87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.20	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,753.60	0.78%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% Avance o Atraso Físico % 0.84%
Meta Física Ejecutada % 100.84%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	119
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	119.00			119.00	100.00%
Ejec	120.00			120.00	100.84%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	**5.8715078**	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	-7.3524087	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

LA FUENTE DE MATERIALES PÉTREOS ESCOGIDA ES **"CALIZAS Y MINERALES S.A.S. NIT. 900414198-1** LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10.00	7.00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10.00	7.00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.00	0.00
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.00	0.00

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial el 6/06/2024.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2/2

FECHA: 2/1/2025 (Día / Mes / Año)

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se realizó la socialización con la junta de acción comunal vereda Palmera del municipio de Vélez - Santander
* 9 habitantes de la Vereda La Palmera estuvieron realizando demolición de las cintas huellas con demoledores y herramienta manual pero no pudieron avanzar mucho debido a que el concreto reforzado estaba bastante resistente por lo cual finalmente analizaron la opción de gestionar una retroexcavadora con la Alcaldía o particular para
* Se realizó por parte del Ingeniero Geotecnia la actividad de campo para la toma de muestras de suelo en la zona del proyecto para el correspondiente estudio de suelos
* Se realizó levantamiento topográfico del sitio del proyecto.
* Se realiza entrega de cotizaciones para los Estudios y Diseños
* Se realiza comité técnico/operativo para aprobación de Cotización de estudios y diseños.
* Se realiza el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se realiza visita y recorrido con el Ing. Director del INVIAS Santander Marlon Gamboa, JAC e Interventoría el día 04 de julio 2024, En la zona del proyecto estuvieron presentes la Interventoría y delegados del INVIAS con el fin de revisar el estado del proyecto. Se aprovechó esta visita para sugerirles a modo de solicitud de lo siguiente: 1) la La comunidad de la Vereda La Palmera, realizará gestión administrativa para conseguir una retroexcavadora y de esa forma demoler las cintas huellas
* La firma encargada de los estudios del proyecto, realizará el correspondiente estudio de tránsito, hidrológico e hidráulico de la zona del proyecto para la entrega final de todos estudios
* Radicar a la Interventoría el ajuste de los estudios y diseños.
* Se le informó a la firma encargada de los estudios y diseños, las observaciones realizadas por la Interventoría para subsanación.
* Se radicó oficio en la Alcaldía Municipal de Vélez, comunicándole al Señor Alcalde el proyecto de placa huellas que se va a realizar en la Vereda La Palmera, entre el INVIAS y la JAC de la Vereda La Palmera
* Se trabajó en la actualización del presupuesto, y a la espera de la aprobación final de los estudios y diseños para terminar esta actividad.
* Se realizó la socialización con la junta de acción comunal vereda Palmera del municipio de Vélez - Santander
* Se realiza el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
*Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 21 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 28/08/2024 Interventoría emitió TIC-INVIAS-1631-148- CONCEPTO FAVORABLE A LOS EYD - LA PALMERA
* 02/09/2024 Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS.
* 02/10/2024 Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* 03/09/2024 Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.
* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo
* 11/09/2024 Se realizó comité operativo aprobación de cotizaciones de insumos y materiales.
* 24/09/2024 Interventoría envió a INVIAS TIC-INVIAS-1631-169 - Placa Huella. Vereda La Palmera, Municipio de Vélez. Oficio de interventoría a INVIAS solicitando revisión y aval de la construcción de la placa huella sobre las huellas existentes.
* 24/09/2024 Se emitió concepto aprobatorio al diseño de pavimentos presentado por la JAC
* 01/10/2024 Se realizó reunión con INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 08/10/2024 Se realizaron pagos a proveedores del Convenio
* 08/10/2024 Se realizó visita de campo para verificar las cinta huellas existentes en sitio, se realizará demolición de esta estructura con el fin de garantizar la cimentación de la nueva placa huella.
* 17/10/2024 SE REALIZA REVISIÓN PRESUPUESTO AJUTADO, TENIENDO EN CUENTA LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE LA CINTA HUELLA EXISTENTE. SE ENCUENTRA EN REALIZACIÓN EXAMENES MÉDICOS DEL PERSONAL QUE VA A TRABAJAR EN OBRA
*** INICIO OBRAS 18/10/2024**
* SE REALIZÓ DEMOLICIÓN DE LAS CINTA HUELLAS EN CONCRETO REFORZADO EXISTENTES.
* DURANTE LA SEMANA ENTRE EL 24-30 OCT SE AVANZÓ POCO DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EQUIPOS DE MAQUINARIA EN LA ZONA.
* 5/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEDURA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 06/11/2024 SE PRESENTAN LLUVIAS DIARIAMENTE DURANTE LA ULTIMA SEMANA LO CUAL DIFICULTA EL INGRESO DE MAQUINARIA AL SECTOR, DEBIDO AL ESTADO DEL TERRENO Y DE LAS ALTAS PENDIENTES
* 07/11/2024 LAS VOLQUETAS COMI MATERIAL NO HAN PODIDO ACCEDER AL SITIO DE LAS OBRAS DEBIDO AL ESTADO DE LA CARRETERA LA CUAL ES MUY PENDIENTE Y POR LAS LLUVIAS LOS VEHICULOS SE QUEDAN PATINANDO EN EL BARRO.
* 08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
* 09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROGRAMACIÓN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONVENIO.
* 12/11/2024 SE REALIZÓ COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA
* 18/11/2024 LA OCURRENCIA DIARIA DE LLUVIAS NO PERMITE EL INGRESO DE VEHÍCULOS PESADOS A LA VEREDA, VA A SER NECESARIO REALIZAR AFIRMADOS EN LA VÍA DE ACCESO PARA PODER INGRESAR MATERIALES.
* 19/11/2024 JAC, INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 20/11/2024 EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN REPROGRAMACIÓN DE OBRAS.
* 25/11/2024 EL ING. PEDRO J BARÓN DE INVIAS (BOGOTÁ) REALIZÓ VISITA AL SITIO CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 27/11/2024 EL ESTADO DEL CLIMA HA MEJORADO, SE REACTIVAN LAS ACTIVIDADES DE OBRA, SIN EMBARGO EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO SIGUE SIENDO DIFÍCIL Y EL TRAFICO PESADO DE LA ZONA AFECTA DEMASIADO LA VÍA
* 28/11/2024 Se realiza la primera fundida de concreto 3000 psi para placa huella, se implementa sistema de canal para manejo del concreto. Hoy la interventoría toma densidades de campo en la subbase granular.
* 02/12/2024 Se realiza instalación de concreto piedra pegada centro y anchos.
* 04/11/2024 Durante la semana avanzó satisfactoriamente la construcción de placa huellas en concreto 3000 psi, se tienen 30 ml de placa huella fundidos
* 11/12/2024 Durante el período se avanzó satisfactoriamente en la construcción de las obras
* 19/12/2024 Se realiza construcción de placa huellas en concreto reforzado K0+080
* **30/12/2024 Se alcanza ejecución del 100% de la obra placa huella en concreto 3000 psi**
* 02/01/2025 Se encuentra en realización el cierre Ambiental y Social del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se dará continuidad a la construcción de la obra, se tiene la subbase granular aplicada y compactada.
* Se dará continuidad a la construcción de estructura de placa huella en concreto reforzado de 3000 psi.
* Se realizará suministro de materiales de obra.
* Se realizarán pagos a proveedores del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA:

		SEMANA 32
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	100.84%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	100.84%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	110.00%
	EJEC	100.84%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
20/12/2024 Avance ejecución obras



FOTO 2
20/12/2024 Avance ejecución obras



FOTO 3
20/12/2024 Avance ejecución obras

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del convenio realizando la socialización con la
2. La interventoría emite Respuesta el día 23-07-2024 con observaciones a los Estudios y Diseños presentados por la J.A.C. La Palmera el día 20-07-2024, Haciendo hincapié a que el día 20-07-2024 se les realizó observación puntual por no adjuntar el Estudio de Suelos y geotécnico.
3. El día 29-07-2024 la O.A.C. realiza entrega de Estudio de Suelos y geotécnico correspondiente a los Estudios y Diseños (EyD).
4. El día 02-08-2024 Interventoría realiza observaciones al Estudio de Suelos y geotécnico correspondiente a los Estudios y Diseños (EyD).
5. El día 28-08-2024 se dio concepto favorable por parte del especialista de vías para los EyD.
6. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A.C
7. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-110- OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de LA PALMERA, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el periodo correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales genera la aplicación de las multas contempladas en el convenio
8. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
9. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social
10. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.
* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios.
* 13/09/2024 Interventoría envió a todas las JAC TIC-INVIAS-1631-163 - Reiteración oficio TIC-INVIAS-1631-157 del 05/09/2024 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 24/09/2024 Interventoría envió a INVIAS TIC-INVIAS-1631-169 - Placa Huella. Vereda La Palmera, Municipio de Vélez. Oficio de interventoría a INVIAS solicitando revisión y aval de la construcción de la placa huella sobre las huellas existentes.
* 24/09/2024 Se emitió concepto aprobatorio al diseño de pavimentos presentado por la JAC
* 01/10/2024 Se realizó reunión con INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 08/10/2024 Interventoría autorizó realización de pagos a proveedores.
* 22/10/2024 Interventoría autorizó realización de pagos a proveedores.
* 29/10/2024 Interventoría autorizó realización de pagos a proveedores.
* 5/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEDURA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 12/11/2024 JAC, INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 14/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINÓ LA ASISTENCIA DE LAS JAC A CAPACITACIÓN CONTABLE PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS.
* 19/11/2024 JAC, INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 25/11/2024 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REALIZÓ VIVISTA CONJUNTAMENTE CON INVIAS BOGOTÁ A LA OBRA, VERIFICAR ESTADO DE OBRA.
* 02/12/2024 Interventoría Realizó comité de pagos a proveedores del convenio.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST
* 11/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría realizaron comité operativo de pago a proveedores.
* 18/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría realizaron comité operativo de pago a proveedores.
* 19/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-253 CONCEPTO FAVORABLE AL ESTUDIO DE GEOTECNIA CORRESPONDIENTE A LOS EYD - LA PALMERA
* 24/12/2024 Interventoría emitió el comunicado TIC-INVIAS-1631-266 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA LA PALMERA -VELEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,

Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 9/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **33** (Numeración consecutiva) del 3/1/2025 al 9/1/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA **GUAMAL** DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL		
CONVENIO No.	3951 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,006,719.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,006,719.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,006,719.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,006,719.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 522,852,726		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 12,555,454		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	201,006,719.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150,755,039.25	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	159,507,243.18	79.35%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(8,752,203.93)	-4.35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	36,072,294.41	17.95%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**201,006,719.00**	**100.00%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**195,579,537.59**	**97.30%**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(8,752,203.93)	-4.35%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%

Observaciones: El valor correspondiente a la inversión total ejecutada corresponde a la suma de pagos realizadas en todos los rubros (Costos Directos, Gastos Administrativos, PAGA, etc). En este momento la JAC se encuentra en proceso de devolución de rendimientos financieros, y cancelación de la cuenta.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 522,094,458.00	97.51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 522,852,726.00	97.65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% — Avance o Atraso Físico % 4.89%

Meta Física Ejecutada % 104.89%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	metros lineales	140
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	140.00			140.00	100.00%
Ejec	**146.85**			**146.85**	**104.89%**
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de oper	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Tor	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuch	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO UNICO DE PLACAHUELLA — TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	5.89916	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	-73.58554	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: La JAC Presentó la cantera CANTERA EL CAIRO S.A.S. NIT. 900729004 localizada en KM 6 VIA MONIQUIRA-TUNJA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN REVISIÓN

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10.00	7.00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10.00	7.00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.00	0.00
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.00	0.00

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 7/06/2024.

FECHA: 9/1/2025 (Día / Mes / Año)

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se da inicio a las actividades con la junta de acción comunal vereda Guamal del municipio de Bolívar - Santander
* Se realiza el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se realiza entrega de cotizaciones para Estudios y Diseños.
* Se asiste a comité semanal en conjunto con Interventoría.
* Se realiza entrega de cotizaciones correspondientes a los Estudios y Diseños (EyD), las cuales no fueron aprobadas por la interventoría, por elevados costos.
* Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 22 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 02 Sep. Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS
* Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.
* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo.
* 10/09/2024 JAC presentó cotización para realización de Estudios y diseños del convenio.
* 17/09/2024 Se realizó aprobación de la cotización de Estudios y diseños por 4'500.000
* 17/09/2024 Se envió a la Interventoría los Estudios y diseños, Interventoría respondió Observaciones.
* 20/09/2024 Se recibió comunicado TIC-INVIAS-1631-165 Solicitando completar los estudios y diseños.
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 03/10/2024 Se realizó reunión INTERVENTORÍA - INVIAS se expuso el estado general de los convenios, sin embargo se programó reunión extraordinaria con las veredas GUAMAL Y GAITAL.
* 04/10/2024 Se estableció compromiso por parte de la JAC de presentar la documentación pendiente y adelantar la gestión necesaria para realización del convenio, con mayor diligencia y compromiso.
* 08/10/2024 Se realizó visita al sitio, esta visita había sido solicitada porque los dueños de los predios aledaños no dejaban hacer volteadero para las volquetas, sin embargo al llegar al sitio estaba reunida gran parte de la comunidad solicitaron hacer las placa huellas en el sector que más lo requiere, que es iniciando el corredor vial, un sector de alta pendiente.
* 08/10/2024 Se solicitó al diseñador realizar el cambio de tramo, se autorizó el pago de estos diseños adicionales al proveedor.
* 09/10/2024 SE trabajó revisión de cotizaciones vía Google meet. En espera de los diseños definitivos
* 10/10/2024 Interventoría emitió TIC-INVIAS-1631-175- Observaciones del especialista en geotecnia a los EyD - GUAMAL
* 16/10/2024 A la fecha la JAC no ha presentado los diseños definitivos del tramo a intervenir
* 21/10/2024 Se realizó topografía de terreno para completar el levantamiento de diseño del tramo priorizado.
* 22/10/2024 Se realizó **comité aprobación de cotizaciones** de materiales e insumos representativos del convenio.
* 23/10/2024 Por vía WhatsApp se enviaron documentos de diseño, pero hace falta una entrega organizada y formal del los diseños del nuevo tramo.

29/10/2024 JAC envío correo con estudios y diseños, sin embargo, la documentación no está completa falta diseño geométrico.
29/10/2024 Se realizó **ajuste del presupuesto** de obra
29/10/2024 Se realizaron pagos para materiales de construcción,
29/10/2024 JAC norma renuncia del ingeniero residente, envió hoja de vida de ingeniero residente para aprobación.
01/11/2024 INICIO OBRAS
05/11/2024 Se realizó COMITÉ DE PAGOS a proveedores del convenio.
06/11/2024 SE TIENE APLICADA SUBBASE GRANULAR, SE REALIZA FIGURADO DE ACERO Y FORMALETA PARA PLACAHUELLA
08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROGRAMACIÓN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONVENIO.
13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA.
18/11/2024 DURANTE EL PERÍODO SE AVANZÓ SATISFACTORIAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE PLACAHUELLAS.
19/11/2024 NO FUÉ POSIBLE REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES, EL BANCO NO ENTREGA AÚN LA CHEQUERA SOLICITADA POR LA JUNTA
25/11/2024 SE REALIZÓ COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
27/11/2024 DURAN TE EL PERÍODO SE AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLAS EN CONCRETO 3000PSI.
27/11/2024 SE PROGRAMA HOY REUNION VIRTUAL CON EL DISEÑADOR PARA QUE PRESENTE CORRECCIONES A LOS INFORMES DE DISEÑO.
04/12/2024 Durante la última semana se avanzó satisfactoriamente en la construcción de placa huellas.
11/12/2024 Durante la última semana se avanzó satisfactoriamente en la construcción de placa huellas. fecha terminación 16/12/2024
16/12/2024 Se tiene ejecutado el 100% de la meta física programada. Tramo Placa huella L=146,85 mts
26/12/2024 Se encuentra en realización la gestión para cierre de la cuenta bancaria y liquidación del convenio.
02/01/2025 Se encuentra en realización el cierre Ambiental y Social del convenio.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se realizará la actividad PAGA-
* Dar cierre a la gestión ambiental del CONVENIO
* Realizar los Pagos pendientes principalmente de tipo administrativo, Planillas de seg social, Devolución de retenciones, Devolución de rendimientos, etc.
* Dar cierre a la parte contable y cuenta del convenio.

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA:

		SEMANA 24
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
12/12/2024 Placa huella Construida



FOTOGRAFÍA 2
12/12/2024 Placa huella Construida



FOTOGRAFÍA 3
12/12/2024 Construcción de placa huellas

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del convenio realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
2. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega prioritaria de los estudios y diseños (EyD), de acuerdo a que oportunamente se realizó y se dio un visto bueno a la cotización presentada, no obstante, el Ingeniero Aldahir Peña, argumenta que han tenido inconvenientes con el correo electrónico y que se ha dificultado recopilar la información.
-Se envió un oficio TIC-INVIAS-1631-096, en el cual se expone la preocupación por la dilatación de tiempos de entrega de documentación requerida (especialmente Estudios y Diseños), acorde a que no se han obtenido respuestas a las solicitudes emitidas por parte del personal de interventoría.
Por parte de la interventoría se les envía información correspondiente y se encuentra disponible para cualquier inquietud, no obstante, haciendo hincapié a que no se pueden extender los tiempos de entrega, porque podría afectar y generar un detrimento en el periodo estipulado de finalización del proyecto.
3. Por parte de la O.A.C. presente nuevamente cotizaciones para los Estudios y Diseños (EyD), lo cual no corresponde a los costos del sector, siendo estos muy elevados.
4. La O.A.C. se encuentra realizando subsanaciones de acuerdo a observaciones emitidas por la Interventoría.
5. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A.C
6. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-114 - OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de GUAMAL, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el período correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales conlleva la aplicación de las multas contempladas en el convenio.
7. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
8. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social pagadas.
9. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.
* A la fecha del presente informe, la JAC Guamal no ha presentado cotizaciones de ESTUDIOS Y DISEÑOS con precios ajustados al mercado.
* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
*12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 17/09/2024 Interventoría realizó aprobación de pagos con cheque para gastos administrativos.
* 20/09/2024 Interventoría envió al especialista en Geotecnia el estudio presentado (Faltaron Estudios de diseño geométrico y Pavimentos).
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 03/10/2024 Se realizó reunión INTERVENTORÍA - INVIAS se expuso el estado general de los convenios, sin embargo se programó reunión extraordinaria con las veredas GUAMAL Y GAITAL.
* 04/10/2024 Se estableció compromiso por parte de la JAC de presentar la documentación pendiente y adelantar la gestión necesaria para realización del convenio, con mayor diligencia y compromiso.
* 08/10/2024 Interventoría realizó visita al sitio, esta visita había sido solicitada porque los dueños de los predios aledaños no dejaban hacer volteadero para las volquetas, sin embargo al llegar al sitio estaba reunida gran parte de la comunidad solicitaron hacer las placa huellas en el sector que más lo requiere, que es iniciando el corredor vial, un sector de alta pendiente.
* 10/10/2024 Interventoría emitió TIC-INVIAS-1631-175- Observaciones del especialista en geotecnia a los EyD - GUAMAL
* 22/10/2024 Se realizó comité aprobación de cotizaciones de materiales e insumos representativos del convenio.
* 29/10/2024 Se realizaron pagos para materiales de construcción
* 05/11/2024 Interventoría , JAC y Veeduría realizan COMITÉ DE PAGOS a proveedores del convenio.
* 14/11/2024 Interventoría Coordino la asistencia de las JAC a la CAPACITACIÓN ASPECTOS CONTABLES organizada por INVIAS
* 16/11/2024 INTERVENTORÍA REALIZÓ ENSAYOS DE DENSIDADES EN LA SUBBASE GRANULAR DEL SECTOR DONDE AÚN FALTA POR FUNDIR PLACHAUELLA
* 19/11/2024 NO FUÉ POSIBLE REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES, EL BANCO NO ENTREGA AÚN LA CHEQUERA SOLICITADA POR LA JUNTA
* 20/11/2024 Interventoría envió a la JAC el comunicado TIC-INVIAS-1631-229 OBSERVACIONES ÁREA PAVIMENTOS A LOS E Y D DEL TRAMO PRIORIZADO
* 27/11/2024 INTERVNETORÍA REALIZÓ REUNION VIRTUAL CON EL DISEÑADOR PARA QUE PRESENTE CORRECCIONES A LOS INFORMES DE DISEÑO.
* 02/12/2024 Interventoría Realizó comités de pagos a proveedores del convenio.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST
* 09/12/2024 Interventoría envió comunicado TIC-INVIAS-1631-241 CONCEPTO FAVORABLE AL ESTUDIO DE GEOTECNIA CORRESPONDIENTE A LOS EYD - GUAMAL
* 11/12/2024 Interventoría JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 12/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST.
* 24/12/2024 Interventoría envió comunicado TIC-INVIAS-1631-257 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA VEREDA GUAMAL - BOLÍVAR
* 16/01/2025 Interventoría realizó reunión para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 9/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 33 (Numeración consecutiva) del 3/1/2025 al 9/1/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE **LA UNION** DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION			INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
				INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONVENIO No.	4478 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,981,336.00	CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,981,336.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/12/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,981,336.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,981,336.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 522,852,726		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 12,555,454		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO			
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200,981,336.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200,981,336.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	184,796,669.33	91.95%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	16,184,666.67	8.05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	16,184,666.67	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200,981,336.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200,981,336.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	20,098,133.60	10.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	20,098,133.60	10.00%

Observaciones: Se culminan las obras objeto del Convenio en la semana de ejecución de obra No.9

INTERVENTORÍA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	522,094,458.00	97.51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	522,852,726.00	97.65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% | Avance o Atraso Físico %: 10.38%

Meta Física Ejecutada %: 110.38%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	106
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	106.00			106.00	100%
Ejec	117.00			117.00	110%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: La JAC se encuentra pendiente a remitir a esta interventoría dicha información.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-225 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA: 9/1/2025 (Día / Mes / Año)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8.0	7.0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15.0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se da inicio a las actividades el día 27/05/2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
04/10/20244 El 15 DE AGOSTO INTERVENTORÍA EMITIÓ CONCEPTO FAVORABLE A LOS DISEÑOS DEL ÁREA DE PAVIMENTOS Y DISEÑO GEOMÉTRICO TIC-INVIAS-1631-132
04/10/2044 Se realizó trabajo de oficina conjuntamente con el Ing. residente de Obra para avanzar en el AJUSTE PRESUPUESTAL, el presupuesto definitivo quedó revisado, pendiente aprobaciones de Estudios y Diseños.
04/10/2044 Se realizó revisión de PRESUPUESTO AJUSTADO, fue enviado al Ing. Director de Interventoría para revisión.
16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-197 con observaciones al área Hidráulica de los Estudios y diseños entregados por la JAC
16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-198 con aspectos a corregir después de la tercera revisión al Informe de Geotecnia como parte de los Estudios y diseños entregados por la JAC
17/10/2024 Se remite a la JAC por medio de Correo electrónico la Prórroga N° 2 al Convenio N° 4478 - 2023 con el fin de que El conveniado actualice las Pólizas del mismo.
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 Se remite a la JAC por medio de Correo electrónico la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio N° 4478 - 2023 con el fin de que El conveniado actualice las Pólizas del mismo.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 18/11/2024 la JAC realiza entrega mediante correo electrónico de documentación de gestión ambiental.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 27/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 97 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, franja de enrocado central también de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía y rampas de inicio y final también en concreto reforzado de 21 mpa.

* 27/11/2024 se tiene ejecutado a la fecha también, la instalación de 5,0 ml de tubería en concreto de 21 mpa, con su respectivo atraque y relleno, se cuenta con la estructura de encole terminada y se encuentra en proceso de instalación de acero de refuerzo y formaleta para la estructura de descole de la alcantarilla proyectada en este tramo.

* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-225 al invias radicando el paga del convenio.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 02/12/2024 se realizará revisión de balance del convenio para determinar una posible ampliación de la meta física.
* 05/12/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 06/12/2024 Se culminan las actividades de ejecución de la Obra objeto del Convenio con una Meta física de 117 ml de Placas huella construidas en Concreto de 21 Mpa y Construcción de una (1) Alcantarilla con una Instalación de 5 ml de Tubería en concreto de 36" con sus respectivas Estructuras de Encole y Descole también en Concreto de 21 Mpa.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*13/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-246 respuesta a radicado invias 2024s-vbog-092184 del 05 de diciembre de 2024 acerca de la gestión ambiental del convenio
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*17/12/2024 se remite a la JAC prórroga n° 3 del convenio para actualización de pólizas
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-258 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-270 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realizará seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* La O.A.C. realizará entrega de subsanaciones a observaciones realizadas por la Interventoría para los Estudios y Diseños (EyD).
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 33
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	0.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	110.38%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	110.38%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	110.38%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	110.38%

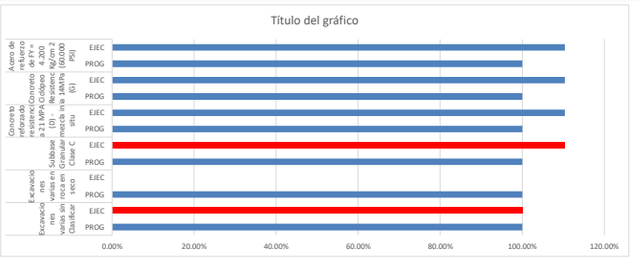

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 Instalación Acero de refuerzo para Placas huella



FOTO 2 Instalación Acero de refuerzo para Descole Alcantarilla



FOTO 3 Fundida de Cunetas en Concreto de 21 Mpa

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 04/10/20244 El 15 DE AGOSTO INTERVENTORÍA EMITIÓ CONCEPTO FAVORABLE A LOS DISEÑOS DEL ÁREA DE PAVIMENTOS Y DISEÑO GEOMÉTRICO TIC-INVIAS-1631-132
* 04/10/2044 Se realizó revisión de PRESUPUESTO AJUSTADO, fue enviado al Ing. Director de Interventoría para revisión.
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-197 con observaciones al área Hidráulica de los Estudios y diseños entregados por la JAC
16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-197 con aspectos a corregir después de la tercera revisión al Informe de Geotecnia como parte de los Estudios y diseños entregados por la JAC
17/10/2024 Se remite a la JAC por medio de Correo electrónico la Prórroga N° 2 al Convenio N° 4478 - 2023 con el fin de que El conveniado actualice las Pólizas del mismo.
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 Se remite a la JAC por medio de Correo electrónico la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio N° 4478 - 2023 con el fin de que El conveniado actualice las Pólizas del mismo.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*12/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 12/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 18/11/2024 la JAC realiza entrega mediante correo electrónico de documentación de gestión ambiental.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 27/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo

* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 97 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, franja de enrocado central también de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía y rampas de inicio y final también en concreto reforzado de 21 mpa.

* 27/11/2024 se tiene ejecutado a la fecha también, la instalación de 5,0 ml de tubería en concreto de 21 mpa, con su respectivo atraque y relleno, se cuenta con la estructura de encole terminada y se encuentra en proceso de instalación de acero de refuerzo y formaleta para la estructura de descole de la alcantarilla proyectada en este tramo.
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-225 al invias radicando el paga del convenio.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 02/12/2024 se realizará revisión de balance del convenio para determinar una posible ampliación de la meta física.

* 06/12/2024 Se culminan las actividades de ejecución de la Obra objeto del Convenio con una Meta física de 117 ml de Placas huella construidas en Concreto de 21 Mpa y Construcción de una (1) Alcantarilla con una Instalación de 5 ml de Tubería en concreto de 36" con sus respectivas Estructuras de Encole y Descole también en Concreto de 21 Mpa.

* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

*13/12/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-246 respuesta a radicado invias 2024s-vbog-092184 del 05 de diciembre de 2024 acerca de la gestión ambiental del convenio

*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*17/12/2024 se remite a la jac prórroga n° 3 del convenio para actualización de pólizas
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-258 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.

*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-270 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma

* Se realizó seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 9/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER SEMANA No.: **33** del 3/1/2025 al 9/1/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA **POPOA** DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POPOA		
CONVENIO No.	4767 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,995,632.00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,995,632.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,995,632.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,995,632.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 522,852,726		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 394,093,490		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200,995,632.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200,995,632.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	185,010,965.33	92.05%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	15,984,666.67	7.95%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	15,984,666.67	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200,995,632.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200,995,632.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	17,211,162.00	8.56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	10,049,781.60	5.00%

Observaciones: Esta es la semana de ejecución de obra No.10

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	522,094,458.00	97.51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	522,852,726.00	97.65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 83.74% Avance o Atraso Físico % 0.00%
Meta Física Ejecutada % 83.74%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	123
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	103.00			103.00	84%
Ejec	103.00			103.00	84%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: La JAC se encuentra pendiente a remitir a esta interventoría dicha información.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2/2

FECHA: 9/1/2025 (Día / Mes / Año)

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-213 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2024

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7.00	7.00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2.00	7.00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.00	0.00
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.00	0.00

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 8/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
*2/10/2024 El Contratista presentó Cotizaciones para revisión y aprobación
* 4/10/2024 La JAC envió documentos de la cantera CALIZAS Y MINERALES
* 4/10/2024 Se realizó comité aprobatorio de COTIZACIONES
* 4/10/2024 PARA TENER EN CUENTA, EL CBR DEL TERRENO ES INFERIOR AL 3%, sin embargo el ingeniero Residente de Obra, aclaró que se debe corregir este párrafo en el Estudio de Geotecnia , porque el ceber de diseño SI ES SUPERIOR A 3%
* 8/10/2024 Se realizó Comité Operativo No.2 para firma de cheques y/o transferencias para pagos a Proveedores
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto, ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 20/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 20/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-222 a la JAC con las observaciones producto de la revisión del componente hidráulico de los estudio y diseños entregados por el conveniado.
* 20/11/2024 la jac realiza la entrega de las correcciones al área de geotecnia de los estudios y diseños
* 26/11/2024 la jac remite a la interventoría comunicado informando que pretende realizar la devolución de los recursos destinados para el paga.
* 27/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 83 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, incluyendo también la franja de enrocado central de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía (sin bordillo) y rampa de inicio en concreto reforzado de 21 mpa. 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 05/12/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
*11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*11/12/2024 Se continua con la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 12/12/2024 la jac realiza la entrega de la última versión de los estudios del área de geotécnia de los estudios y diseños
* 12/12/2024 se culminan las actividades de ejecución de obra con una meta física de 103 ml de placas huella construidas y construcción de 6,0 ml de alcantarilla en tubería en concreto de 36" con sus respectivas estructuras de encole y descole
* 16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
* 17/12/2024 se remite a la jac prórroga n° 3 del convenio para actualización de pólizas
* 18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 19/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-254 al Invias con Entrega oficial del Plan de inversión social del convenio.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-259 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-271 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realizará seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* La O.A.C. realizará entrega de subsanaciones a observaciones realizadas por la Interventoría para los Estudios y Diseños (EyD).
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 33
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	0.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%

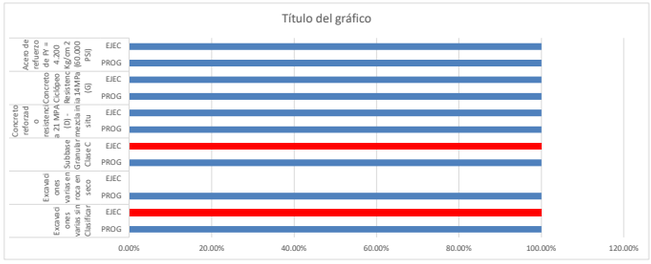

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
Placas Huella terminadas



FOTO 2
Placas Huella terminadas



FOTO 3
Placas Huella terminadas

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
*2/10/2024 El Contratista presentó Cotizaciones para revisión y aprobación
* 4/10/2024 Se realizó reunión de seguimiento con INVIAS, presentación del estado de avance de los convenios
* 4/10/2024 La JAC envió documentos de la cantera CALIZAS Y MINERALES
* 4/10/2024 Se realizó comité aprobatorio de COTIZACIONES
* 8/10/2024 Se realizó Comité Operativo No.2 para firma de cheques y/o transferencias para pagos a Proveedores
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto, ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 20/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-222 a la JAC con las observaciones producto de la revisión del componente hidráulico de los estudio y diseños entregados por el conveniado.
* 20/11/2024 la JAC realiza la entrega de las correcciones al área de geotecnia de los estudios y diseños
* 26/11/2024 la JAC remite a la interventoría comunicado informando que pretende realizar la devolución de los recursos destinados para el paga.
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 83 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, incluyendo también la franja de enrocado central de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía (sin bordillo) y rampa de inicio en
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/12/2024 la JAC realiza la entrega de la última versión de los estudios del área de geotécnia de los estudios y diseños
* 12/12/2024 se culminan las actividades de ejecución de obra con una meta física de 103 ml de placas huella construidas y construcción de 6,0 ml de alcantarilla en tubería en concreto de 36" con sus respectivas estructuras de encole y descole
* 16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
* 17/12/2024 se remite a la jac prórroga n° 3 del convenio para actualización de pólizas
* 18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 19/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-254 al Invias con Entrega oficial del Plan de inversión social del convenio.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-259 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-271 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma
* Se realizó seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,

Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 9/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER SEMANA No.: **33** del 3/1/2025 al 9/1/2025 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA **BERLIN** DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL BERLIN

CONVENIO No.	3753 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,108,139.00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,108,139.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%

CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,108,139.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,108,139.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 522,852,726		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 12,555,454		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200,108,139.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200,108,139.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	200,108,139.00	100.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	17,076,666.67	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200,108,139.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200,108,139.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%

Observaciones: la ejecución de la Obra se culminó en la semana No.7

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	522,094,458.00	97.51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	522,852,726.00	97.65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,753.60	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% Avance o Atraso Físico % 3.36%
Meta Física Ejecutada % 103.36%

	Meta Física (Programa de Obra)			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	
*	Construcción de placa huella	ml	149	
*				
*				
*				
*				
*				
*				
*				

Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	149.00			149.00	100.00%
Ejec	154.00			154.00	103.36%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: BERLÍN TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	1
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	1	1
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	1
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	1
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	1
Ruteadora	1	1
Compresor (barrido y soplado)	1	1
Camioneta D-300	1	1
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Compresor 120 HP, con martillo	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Aspersor manual	1	1
Total	13	13

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	6,3 km de la Obra	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	Cerca al casco urbano municipal	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

Observaciones: La JAC presento los documentos de la antera **ASOCIACION DE MINEROS AGROINDUSTRIALES AMBIENTALISTAS LA BELLEZA TMR ONG**. Localizada cerca al casco urbano del Municipio a 6,3 km del Sitio de la Obra.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2/2

FECHA: 9/1/2025 (Día / Mes / Año)

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-177 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10.0	7.0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:
* Se realizó socialización inicial el 7/06/2024.
* Se realizó socialización de terminación de la Obra el 13/12/2024.
* Se ejecutó el Plan de Inversión Social

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
*02/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 10/10/2024 La JAC envió formatos de gestión ambiental
*15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*21/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 23/10/2024 Se realizó visita de Obra por parte de los Componentes Ambiental, Social y Técnico de La Interventoría
* 24/10/2024 La JAC en la presente semana realizó la entrega del Plan de Inversión social Proyectado en el Convenio.
* 25/10/2024 Mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-203 La Interventoría realiza la Entrega oficial al INVIAS de las correcciones solicitadas al Plan de inversión social del convenio 3753 – 2023 OAC Vereda Berlín.
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-219 a la JAC solicitando la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la JAC realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la JAC
* 29/11/2024 La JAC realizó la entrega de las Pólizas del Convenio actualizadas al 11 de noviembre de2024
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-260 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-272 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realizará seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 33
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	80.00%
	EJEC	0.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%

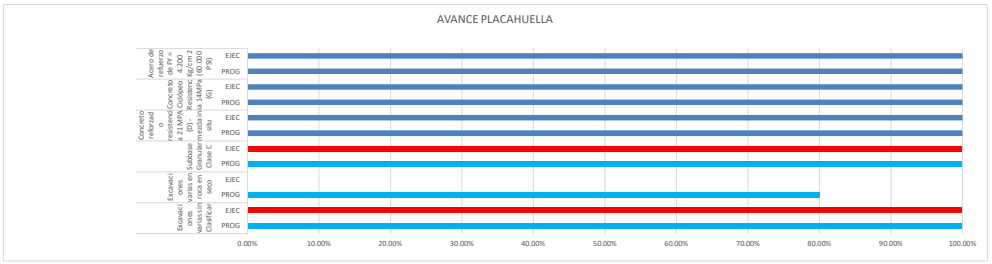

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
Placa huella terminada



FOTO 2
Placa huella terminada



FOTO 3
Vista general Placa huella construida

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
*02/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 04/10/2024 Se realizó reunión de seguimiento con INVIAS, presentación del estado de avance de los convenios
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 10/10/2024 La JAC envió formatos de gestión ambiental
*15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*21/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 23/10/2024 Se realizó visita de Obra por parte de los Componentes Ambiental, Social y Técnico de La Interventoría
* 25/10/2024 Mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-203 La Interventoría realiza la Entrega oficial al INVIAS de las correcciones solicitadas al Plan de inversión social del convenio 3753 – 2023 OAC Vereda Berlín.
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 06/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para bordillos de cunetas y limpieza de la obra.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-219 a la jac solicitando la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la JAC realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la JAC
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.
* 29/11/2024 La JAC realizó la entrega de las Pólizas del Convenio actualizadas al 11 de noviembre de2024
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-260 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-272 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,

Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 9/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: **33** del 3/1/2025 al 9/1/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **CACHIPAYAL** DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL

CONVENIO No.	4175 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,319,574.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,319,574.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%

CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,319,574.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,319,574.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 522,852,726		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 12,555,454		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		$200,319,574.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		$200,319,574.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		$200,319,574.00	100.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		$0.00	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		$42,026,640.00	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200,319,574.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200,319,574.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
	$ -		

Observaciones: la ejecución de la Obra se culminó en la semana No.7

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	522,094,458.00	97.51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	522,852,726.00	97.65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% | Avance o Atraso Físico % -7.10%
Meta Física Ejecutada % 92.90%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	ml	155
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	155.00			155.00	100.00%
Ejec	144.00			144.00	92.90%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CACHIPAYAL | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	1
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	1	1
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	1
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	1
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	1
Ruteadora	1	1
Compresor (barrido y soplado)	1	1
Camioneta D-300	1	1
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Compresor 120 HP, con martillo	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Aspersor manual	1	1
Total	13	13

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Cerca al caso Urbano	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	Distancia 13Km de la obra	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
La JAC de Cachipayal presentó los documentos de la Cantera SCS BUENAVISTA , RLHECTOR ALONSO MORENO QUITIAN , Localizada 13 Km del sitio de la obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-176 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10.0	7.0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:
*Se realizó socialización inicial 7/06/2024.
* Durante el período se realizó acompañamiento y asesoría al personal Administrativo de la OAC en la formulación del presupuesto de Gestión Social del convenio.
* Se realizó socialización de terminación de la Obra el 13/12/2024.
* Se ejecutó el Plan de Inversión Social

FECHA: 9/1/2025 (Día / Mes / Año)

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 10/10/2024 La JAC envió formatos de gestión ambiental
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 23/10/2024 Se realizó visita de Obra por parte de los Componentes Ambiental, Social y Técnico de La Interventoría
* 24/10/2024 La JAC en la presente semana realizó la entrega del Plan de Inversión social Proyectado en el Convenio.
* 25/10/2024 Mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-203 La Interventoría realiza la Entrega oficial al INVIAS de las correcciones solicitadas al Plan de inversión social del convenio 4175 – 2023 OAC Vereda Cachipayal.
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 El Conveniado realiza la entrega del Informe de Replanteo y Nivelación Topográfica del tramo.
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 15/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-219 a la jac solicitando la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la JAC realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la JAC
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-261 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-273 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realizará seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* La O.A.C. realizará entrega de subsanaciones a observaciones realizadas por la Interventoría para los Estudios y Diseños (EyD).
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 33
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	80.00%
	EJEC	0.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
Placa huella terminada



FOTO 2
Placa huella terminada



FOTO 3
Vista general Tramo de Placa huella

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 10/10/2024 La JAC envió formatos de gestión ambiental
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 23/10/2024 Se realizó visita de Obra por parte de los Componentes Ambiental, Social y Técnico de La Interventoría
* 25/10/2024 Mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-203 La Interventoría realiza la Entrega oficial al INVIAS de las correcciones solicitadas al Plan de inversión social del convenio 4175 – 2023 OAC Vereda Cachipayal.
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

* 06/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para bordillos de cunetas y limpieza de la obra.

* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 15/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-219 a la jac solicitando la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la JAC realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo

* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la JAC
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-261 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-273 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 9/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **33** (Numeración consecutiva) del 3/1/2025 al 9/1/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA **ORGANOS** DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS		
CONVENIO No.	4490 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,785,769.00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,785,769.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,785,769.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,785,769.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 522,852,726		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 12,555,454		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200,785,769.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200,785,769.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	166,342,065.77	82.85%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	34,443,703.23	17.15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	34,443,703.23	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200,785,769.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200,785,769.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%

Observaciones:
Esta es la semana de ejecución de obra No.9

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	522,094,458.00	97.51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	522,852,726.00	97.65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% — Avance o Atraso Físico % 16.67%

Meta Física Ejecutada % 116.67%

Meta Fisica (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	ml	150
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	150.00			150.00	100.00%
Ejec	175.00			175.00	116.67%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: ORGANOS — TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	1
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	1	1
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	1
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	1
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	1
Ruteadora	1	1
Compresor (barrido y soplado)	1	1
Camioneta D-300	1	1
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Compresor 120 HP, con martillo	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Reparador Trancar	1	1
Total	13	13

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	5.896845	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	-73.837612	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: La JAC presentó documento RUCOM y licencias del proveedor de materiales pétreos llamado TECNOCONSTRUCTORES, (Cantera Peña Blanca) localizado a 10 Km del sector en intervención. Pendiente solicitar al proveedor las licencias ambientales de la fuente de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-190 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8.0	7.0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15.0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

* Se presenta cambio residente de interventoría el 03/07/2024.
* Se realizó socialización inicial el 5/06/2024.
* Se realizó socialización de terminación de la Obra el 27/12/2024.
* Se ejecutó el Plan de Inversión Social

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 04/10/2024 Se realizó reunión de seguimiento con INVIAS, presentación del estado de avance de los convenios
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 15/10/2024 La JAC remitió a la Interventoría los documentos de Gestión Ambiental del Convenio, quien a su vez mediante comunicado N° TIC-INVIAS-1631-190 realizó la radicación de los mencionados documentos ante La Subdirección de sostenibilidad del Invias
* 16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-193 con aspectos a corregir después de la tercera revisión al Informe de Geotécnia como parte de los Estudios y diseños entregados por la JAC
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 después de realizar el balance presupuestal del convenio se llegó a la conclusión de que se puede ampliar la meta física proyectada de 10 ml para construir un total de placas huella de 160 ml de longitud aproximada, ampliación que se encuentra en ejecución a la fecha
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 después de realizar el balance presupuestal del convenio se llegó a la conclusión de que se puede ampliar la meta física proyectada de 20 ml para construir un total de placas huella de 170 ml de longitud aproximada, ampliación que se encuentra en ejecución a la fecha
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 se encuentra pendiente iniciar la entrega de la documentación para la liquidación del convenio por parte de la jac
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la jac realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la jac 27/11/2024 se culminan las obras del presente convenio
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 175 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, franja de enrocado central también de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía y rampas de inicio y final también en concreto reforzado de 21 mpa, completando de esta manera el 116,7 % del alcance del proyecto ya que se tenía un alcance inicial de 150 ml y se pudo ampliar la meta física en 25 ml.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 19/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-252 a la JAC emitiendo concepto favorable por parte del Especialista respectivo al componente de Geología y Geotécnia de Los Estudios y Diseños del Proyecto.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-262 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*27/12/2024 Se realizó la actividad Social propuesta por la JAC, con participación de la Interventoría del Convenio y la comunidad local.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará la entrega de los resultados Estudios y Diseños (EyD) para revisión de Interventoría.
* Se realizará revisión del presupuesto ajustado acorde a los diseños y al cotizaciones y precios dela zona que presente la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del contrato
* Se iniciara presentación de hojas de vida personal contractual y proceso afiliación del personal operativo y presentación a Interventoría
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 33
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	0.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	116.70%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	116.70%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	116.70%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	116.70%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Placa huella terminada


Placa huella terminada


Placa huella terminada

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 04/10/2024 Se realizó reunión de seguimiento con INVIAS, presentación del estado de avance de los convenios
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 15/10/2024 La JAC remitió a la Interventoría los documentos de Gestión Ambiental del Convenio, quien a su vez mediante comunicado N° TIC-INVIAS-1631-190 realizó la radicación de los mencionados documentos ante La Subdirección de sostenibilidad del Invias
* 16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-193 con aspectos a corregir después de la tercera revisión al Informe de Geotécnia como parte de los Estudios y diseños entregados por la JAC
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 después de realizar el balance presupuestal del convenio se llegó a la conclusión de que se puede ampliar la meta física proyectada de 10 ml para construir un total de placas huella de 160 ml de longitud aproximada, ampliación que se encuentra en ejecución a la fecha
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 después de realizar el balance presupuestal del convenio se llegó a la conclusión de que se puede ampliar la meta física proyectada de 20 ml para construir un total de placas huella de 170 ml de longitud aproximada, ampliación que se encuentra en ejecución a la fecha
* 25/11/2024 se realiza comité
* 27/11/2024 se encuentra pendiente iniciar la entrega de la documentación para la liquidación del convenio por parte de la jac
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la jac realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la jac 27/11/2024 se culminan las obras del presente convenio
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 175 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, franja de enrocado central también de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía y rampas de inicio y final también en concreto reforzado de 21 mpa,
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 19/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-252 a la JAC emitiendo concepto favorable por parte del Especialista respectivo al componente de Geología y Geotécnia de Los Estudios y Diseños del Proyecto.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-262 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*27/12/2024 Se realizó la actividad Social propuesta por la JAC, con participación de la Interventoría del Convenio y la comunidad local.
* Se realizó seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,

Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 9/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **33** (Numeración consecutiva) del 3/1/2025 al 9/1/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA **TUBAVITA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ- SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Construcción de Placa huella y Una (1) Alcantarilla; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

CONVENIO SOLIDARIO:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA			INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
				INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONVENIO No.	4357 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,030,449.00	CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,030,449.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/1/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,030,449.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,030,449.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 522,852,726		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 12,555,454		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO			
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	201,030,449.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150,772,836.75	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	141,823,075.78	70.55%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	8,949,760.97	4.45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	43,814,063.67	21.79%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**201,030,449.00**	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**185,637,139.45**	92.34%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	15,393,309.55	7.66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%

Observaciones: Las OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS corresponden a pagos realizados a proveedores del convenio en el rubro de gastos administrativos, incluye pagos anticipados a proveedores. En este momento se encuentra en gestión la ejecución del Rubro PAGA. Las actividades de obra se encuentran 100% ejecutadas.

INTERVENTORÍA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	522,094,458.00	97.51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	522,852,726.00	97.65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% — Avance o Atraso Físico % 3.78%

Meta Física Ejecutada % 103.78%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	119
*	Alcantarilla	Unidad	1
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	119.00				
Ejec	123.50				
Prog	1.00				
Ejec	1.00				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,2	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades se

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	**5.871507800**	PERMISO MINERO:	SI	NO
	-73.524087000	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PÉTREOS ESCOGIDA ES "CALIZAS Y MINERALES S.A.S. NIT. 900414198-1 LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8.0	7.0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 7/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se da inicio a las actividades con la junta de acción comunal vereda La unión del municipio de Guavatá - Santander.
* Se realiza entrega de cotizaciones para los Estudios y Diseños
* Se realiza comité técnico/operativo para aprobación de Cotización de estudios y diseños.
* Se realiza seguimiento, control y verificación de las actividades iniciales necesarias para la formulación de estudios y diseños (topografía, apique, ensayo PDC y conteo vehicular).
* Se solicitarán cotizaciones de transporte y materiales necesarios para la ejecución de la obra física en harás de ajustar precios unitarios.
* Se participa en reunión general y comité de obra con la interventoría para revisar avances.
* Se realiza visita y recorrido con el Ing. Director del INVIAS Santander Marlon Gamboa, JAC e Interventoría el día 04 de julio 2024.
* Se continúa haciendo el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se realiza las actividades iniciales necesarias para la formulación de estudios y diseños.
* Se recepcionan y validan las cotizaciones de transporte, materiales y valla publicitaria necesarios para la ejecución de la obra física en aras de ajustar precios unitarios.
* Se participa en reunión de comité de obra con la interventoría para revisar avances de la actividad de estudios y diseños.
* Se efectúa visita de campo en conjunto con la interventoría, representantes de la comunidad, presidente de JAC, residente de obra y director del convenio a fin de despejar dudas de la comunidad.
* Se realiza revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realiza seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realiza mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio

FECHA: 9/1/2025 (Día / Mes / Año)

* Se realiza el respectivo ajuste a precios unitarios del proyecto y se formulará la programación de obra y programación de compras.
* Se participa en comités de obra y demás que sean solicitados.
* Se hace visita en campo, lugar de la obra para tomar fotografías de los tramos y demás que sean necesarias.
* Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 21 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 02 Sep. Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS.
* Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.
* 05 sep. Se recibieron observaciones al Contratista GEOTECNIA TIC-INVIAS-1631-154
* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo.
* 16/09/2024 Se realizó visita al sitio de la obra con Interventoría, se solicitó la realización de una alcantarilla.
* 20/09/2024 Se instaló Valla informativa del Convenio.
* 23/09/2024 Se envió a interventoría relación de los pagos realizados hasta el momento.
* 25/09/2024 Se realizó revisión de cotizaciones de materiales en oficina de interventoría.
* 26/09/2024 JAC realizó solicitud de prórroga al convenio 4357 de 2023.
* 01/10/2024 Interventoría envió oficio Radicado: 2024E-VUVRAZ-096167 TIC-INVIAS-1631-166 INFORMANDO **LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA**
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 10/10/2024 Se realizó comité aprobación de COTIZACIONES de insumos y materiales.
* 15/10/2024 Se realizó comité de pagos a proveedores.
* **18/10/2024 INICIO OBRAS**
* 24/10/2024 Se realizó aprobación de estudios y diseños.
* 25/10/2024 - 31/10/2024 Se realizó Mejoramiento de subrasante en Pedraplén, Instalación tubería de concreto 36".
* 07/11/2024 DURANTE EL PERÍODO SE AVANZÓ EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL CONVENIO, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y APLICACIÓN DE SUBBASE GRNAULAR
* 05/11/2024 JAC INTERVENTORÍA Y YEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
* 09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROGRAMACIÓN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONVENIO.
* 12/11/2024 SE REALIZÓ COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA.
* 13/11/2024 SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA PROYECTADA
* 18/11/2024 DURANTE EL PERÍODO SE AVANZÓ SATISFACTORIAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLAS.
* 25/11/2024 SE REALIZÓ COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 27/11/2024 DURANTE LA SEMANA SE AVANZÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLAS. JAC SOLICITA REVISIÓN EN SITIO PARA CONSTRUCCIÓN DE FILTROS
* 03/12/2024 Interventoría envió comunicado TIC-INVIAS-1631-238- CONCEPTO FAVORABLE AL ESTUDIO HIDRAULICO - TUBAVITA, con esto quedan todos los componentes técnicos aprobados.
* 04/12/2024 Se construyen Filtros en los 3 Tramos de placa huella, se evidencia flujo freático en los 3 sectores en intervención.
* 04/12/2024 Durante la semana se avanzó satisfactoriamente en la construcción de placa huellas.
* 11/12/2024 Durante la semana se avanzó satisfactoriamente en la construcción de placa huellas.
* 11/12/2024 Se realizó demolición de roca, para avanzar con la construcción de cuneta del tramo No.2
* 18/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* **30/12/2024 Se completó el 100% de las obras, placa huella en concreto. Longitud Ejecutada 123,5 mts de Placa huella + 1 Alcantarilla.**
* 02/01/2025 Se encuentra en realización el cierre Ambiental y Social del convenio.
* 13/01/2024 Interventoría realizo visita de obra, se realizaron observaciones al contratista para recibo definitivo de las obras.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Avanzar en la construcción de las obras del convenio.
* Se realizará constante seguimiento a la ejecución del convenio en aspectos técnicos, administrativos, sociales, ambientales y sst.
* Se participará en comités operativos y demás que sean solicitados.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA


PLACAHUELLA

		SEMANA 33
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
MEJORAMIENTO CON PEDRAPLEN	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	103.78%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	103.78%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%



ALCANTARILLA

		SEMANA 33
Construcción Alcantarilla	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
Tramo No3 100% Terminado



FOTO 2
Tramo No.2 100% Terminado



Foto 3
Tramo No.1 100% Terminado

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del convenio realizando la socialización con la comunidad el paso a
2. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega prioritaria de los estudios y diseños (EyD) acorde a que NO se deben generar retrocesos que afecten, ni generen
3. El día 12-08-2024 La O.A.C. realiza entrega de los Estudios y Diseños.
4. El día 15-08-2024 y 16-08-2024 Los Ingenieros especialistas de La interventoría realiza observaciones a los Estudios y Diseños presentados.
5. El día 21-08-2024 La O.A.C. presenta subsanaciones a los Estudios y Diseños por observaciones de la Interventoría.
6. El día 28-08-2024 se emite concepto favorable por el especialista de vías para los Estudios y Diseños (EyD).
7. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A. C
8. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-109 - OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de TUBAVITA, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el periodo correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales genera la aplicación de las multas contempladas en el convenio.

9. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
10. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social pagadas.
11. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.

* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 10 sep Se programó visita a la vereda teniendo en cuenta, que la alcantarilla a construir se encuentra sobre un terreno removido, la Ingeniera Residente solicitó inspección del sitio para autorizar la construcción de estructuras en este punto.
* 12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 16/09/2024 Interventoría realizó Visita al sitio de las obras, la comunidad solicitó realización de alcantarilla.
* 25/09/2024 Se realizó revisión de cotizaciones de materiales se hicieron observaciones a la JAC.
* 01/10/2024 Interventoría envió oficio Radicado: 2024E-VUVRAZ-096167 TIC-INVIAS-1631-166 INFORMANDO **LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA**
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 03/10/2024 Se realizó reunión virtual con INVIAS se expuso el estado general de los convenios.
* 10/10/2024 Se realizó comité aprobación de COTIZACIONES de insumos y materiales.
* 15/10/2024 Se realizó comité de pagos a proveedores.
* 29/10/2024 Se realizó comité de pagos a proveedores.
* 05/11/2024 JAC INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 14/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINA LAS JAC PARA CAPACITACIÓN POR PARTE INVIAS SOBRE AREA CONTABLE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS
* 12/11/2024 JAC INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 16/11/2024 INTERVENTORÍA REALIZA TOMA DE DENSIDADES DE CAMPO EN LA SUBBASE GRANULAR APLICADA
* 25/11/2024 JAC, INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 21/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINÓ LAS JAC PARA CAPACITACIÓN AMBIENTAL POR PARTE DE INVIAS.
* 02/12/2024 Interventoría Realizó comité de pagos a proveedores del convenio.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST
* 10/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST.
* 11/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 18/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 24/12/2024 Interventoría envió comunicado TIC-INVIAS-1631-263 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA TUBAVITA – VÉLEZ
* 16/01/2025 Interventoría realizó reunión para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 9/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 33 (Numeración consecutiva) del 3/1/2025 al 9/1/2025 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA **EL GAITAL** DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GAITAL		
CONVENIO No.	4367 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,016,649.00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,016,649.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,016,649.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,016,649.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 522,852,726.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 12,555,454.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO			
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	201,016,649.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150,762,486.75	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	13,348,638.79	6.64%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	137,413,847.96	68.36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	27,844,817.52	13.85%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**201,016,649.00**	**100.00%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**41,193,456.31**	**20.49%**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	159,823,192.69	79.51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	20,101,664.90	10.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%

Observaciones: El convenio se encuentra en etapa de ejecución de obras. Durante el período el avance en construcción fue poco sin embargo se realiza acopio de materiales en sitio y adquisición de insumos. A la fecha las condiciones climáticas han mejorado, sin embargo el terreno sigue siendo de difícil acceso. La consecución de Vibro compactador en la zona es difícil.

INTERVENTORÍA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	522,094,458.00	97.51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	522,852,726.00	97.65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% | Avance o Atraso Físico % -90.91%

Meta Física Ejecutada % 9.09%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	110
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	110.00			110.00	100.00%
Ejec	10.00			10.00	9.09%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	5.871515582	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	-73.524041619	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: La JAC Presentó la cantera CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SAS NIT.900414198 localizada en el municipio de MONIQUIRÁ

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**6.0**	**7.0**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 7/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se realiza el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se realizó de una inspección en obra donde se encontró un afloramiento de aguas Subterráneas en la zona a intervenir a las cuales se le debe dar una alternativa de para las canalizaciones.
* Se realiza entrega de cotizaciones para los Estudios y Diseños.
* Se realiza comité técnico/operativo para aprobación de Cotización de estudios y diseños.
*Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 22 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 02 Sep. Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS.
* Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.
* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo.
* 10/09/2024 Se envió a interventoría cotizaciones de topografía para revisión.
* 13/09/2024 Se realizó reunión e n oficina con la interventoría, se revisó cotizaciones de materiales y ajuste presupuestal.

* 22/09/2024 Se envió a interventoría la relación de Pagos Realizados.
* 26/09/2024 Se trabajó en oficina la revisión de cotizaciones de materiales e insumos.
* 01/10/2024 Se envió TIC-INVIAS-1631-170- CONCEPTO FAVORABLE A LOS EYD - GAITAL
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 02/10/2024 El Presidente de la JAC manifestó verbalmente que la Junta realizará la Construcción del filtro necesario.
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 04/10/2024 Se realizó reunión extraordinaria con INTERVENTORÍA E INVIAS, la JAC se comprometió enviar las cotizaciones faltantes y el presupuesto proyectado. Y avanzar en la ejecución de obra teniendo en cuenta el tiempo que queda de ejecución.
* 09/10/2024 SE HAN HECHO OBSERVACIONES COTIZACIONES 09 OCT SE REALIZARÁ REVISIÓN FINAL Y COMITE DE APROBACIÓN DE COTIZACIONES.
* EL DÍA 17 DE OCTUBRE SE REALIZARÓ VISITA DE CAMPO PARA VERIFICAR LA MANERA DE REALIZAR LOS TRANSPORTES, POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO EL CONTRATISTA PROPONE REALIZAR UN ACOPIO DE MATERIAL PREVIO AL PUNTO DEFINITIVO DE DISPOSICIÓN EN OBRA.
* **21/10/2024 Inicio de actividades de Obra.**
* 24/10/2024 Se realizó comité de aprobación de COTIZACIONES DE INSUMOS Y MATERIALES.
* Hay poca disponibilidad de maquinaria en la zona (Vibrocompactador).
* 06/11/2024 A LA FECHA SE HAN ADQUIRIDO MATERIALES PÈTREOS, SE REALIZÓ TOPOGRAFÍA DE CAMPO, SE HAN REALIZADO CORRECCIÓN DE FALLOS EN ZONA DE LA PLACAHUELLA. sE REALIZA CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO EN CAMPO. SE HAN PRESENTADO LLUVIAS EN LA ULTIMA SEMANA QUE NO PERMITEN ACARREO DE MATERIALES.
* 07/11/2024 LAS VOLQUETAS CON MATERIAL NO HAN PODIDO ACCEDER AL SITIO DE LAS OBRAS DEBIDO AL ESTADO DE LA CARRETERA LA CUAL ES MUY PENDIENTE Y POR LAS LLUVIAS LOS VEHICULOS SE QUEDAN PATINANDO EN EL BARRO.
* 08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
* 09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROGRAMACIÓN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONVENIO.
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA.
* 15/11/2024 INTERVENTORÍA APROBÓ LA HOJA DE VIDA DE LA INGENIERA RESIDENTE LAURA PINZÓN.
* 18/11/2024 LAS CONSTANTES LLUVIAS PRESENTADAS DURANTE EL PERÍODO AFECTAN GRANDEMENTE LA VÍA DE ACCESO, NO ES FACTIBLE SUBIR MATERIALES A OBRA, DE IGUAL MANERA LA CONSECUCIÓN DE MAQUINARIA (VIBROCOMPACTADOR) ES DIFICIL, SE EVALÚA EL TIPO DE VIBROCOMPACTADOR A UTILIZAR YA QUE NO DEBE SER MUY PESADO.
* 20/11/2024 EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN REPROGRAMACIÓN DE OBRAS.
* 22/11/2024 EL ING REYNALDO MANTILLA DE INVIAS (SANTANDER) REALIZÓ VISITA AL SITIO, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 25/11/2024 EL ING. PEDRO J BARÓN DE INVIAS (BOGOTÁ) REALIZÓ VISITA AL SITIO CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 05/12/2024 Durante la última semana se cuenta con mejores condiciones del terreno, se ingresó maquinaria retroexcavadora para realizar adecuación de la subrasante. Se acopian materiales en sitio
* 10/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST. Se evidencia la necesidad de realizar filtros en terreno.
* 11/12/2024 Durante el período se realizó acopio de materiales pétreos, Conformación de subrasante, cargue de materiales en acopio
* 11/12/2024 El transporte de materiales pétreos se realiza en dos etapas, la primera desde la cantera (Moniquirá) hasta el sitio de acopio (Sector Colegio Gaital), la segunda etapa consiste en realizar cargue de volquetas a media capacidad desde ese punto de acopio hasta el sitio de la obra, recorrido de aproximadamente 1,4 Km de alta pendiente, vía destapara, estrecha con dificultad de acceso en época de lluvias.
* 17/12/2024 Se realiza extendido y compactación de subbase granular.
* 18/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 20/12/2024 Se realiza aplicación y compactación de subbase granular
* 20/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 24/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-264 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA GAITAL VÉLEZ
* 26/12/2024 Durante el período se han presentado lluvias, las cuales afectan la vía de acceso al sitio de las obras, no es posible subir materiales pétreos desde el punto colegio hasta la obra.
* 02/01/2025 No se realizaron actividades en obra durante la última semana.
* 09/01/2025 No se realizaron actividades en obra durante la última semana.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se dará continuidad a la construcción de la obra, se espera tener la totalidad de la subbase granular aplicada y compactada.
* Se dará inicio a la construcción de estructura de placa huella en concreto reforzado de 3000 psi.
* Se realizará suministro de materiales de obra.
* Se realizarán pagos a proveedores del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 24
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	50.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	65.00%
	EJEC	0.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	65.00%
	EJEC	0.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	75.00%
	EJEC	20.00%

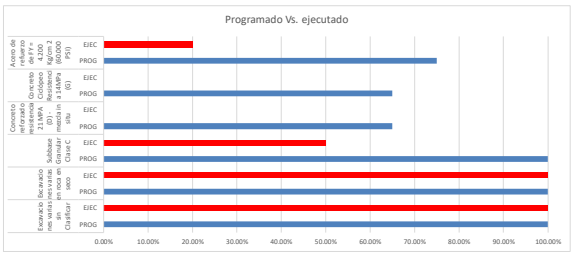

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1
20/12/2024 Subbase Granular aplicada



FOTO 2
20/12/2024 Subbase Granular aplicada



FOTO 3
20/12/2024 Subbase Granular aplicada

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
2. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega prioritaria de los estudios y diseños (EyD) acorde a que NO se deben generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en los tiempos ya estipulados.
3. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A.C

4. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-111 - OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de GAITAL, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el periodo correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales genera la aplicación de las multas contempladas en el convenio.
5. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
6. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social pagadas.

7. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.

* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios.
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 13/09/2024 Interventoría envió a todas las JAC TIC-INVIAS-1631-163 - Reiteración oficio TIC-INVIAS-1631-157 del 05/09/2024 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras
* 25/09/2024 Interventoría envió requerimiento a la JAC instalación de Buzón de PQR.
* 26/09/2024 Interventoría atendió en oficina a la JAC para las cotizaciones de materiales.
* 01/10/2024 Se envió TIC-INVIAS-1631-170- CONCEPTO FAVORABLE A LOS EYD - GAITAL
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 02/10/2024 El Presidente de la JAC manifestó verbalmente que la Junta realizará la Construcción del filtro necesario.
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL

* 03/10/2024 Interventoría expuso a INVIAS el estado general de los convenios en reunión virtual, se programó reunión extraordinaria para el día siguiente con las juntas GAITAL Y GUAMAL.

* 04/10/2024 Se realizó reunión extraordinaria con INTERVENTORÍA E INVIAS, la JAC se comprometió enviar las cotizaciones faltantes y el presupuesto proyectado. Y avanzar en la ejecución de obra teniendo en cuenta el tiempo que queda de ejecución.

* EL DÍA 17 DE OCTUBRE INTERVENTORÍA REALIZARÓ VISITA DE CAMPO PARA VERIFICAR LA MANERA DE REALIZAR LOS TRANSPORTES, POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO EL CONTRATISTA PROPONE REALIZAR UN ACOPIO DE MATERIAL PREVIO AL PUNTO DEFINITIVO DE DISPOSICIÓN EN OBRA. SE REALIZÓ REUNIÓN CON LA VEEDURÍA PARA ESTABLECER LA METODOLOGÍA DE TRANSPORTE.

* 24/10/2024 Se realizó comité de aprobación de COTIZACIONES DE INSUMOS Y MATERIALES.
* 05/11/2024 Interventoría realizó conjuntamente con la JAC y Veeduría COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 14/11/2024 Interventoría realizó conjuntamente con la JAC y Veeduría COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO

* 19/11/2024 Interventoría realizó visita de obra Director, Social, SST y Residente de Interventoría al sitio de las obras, para verificar el avance del convenio y el estado de la vía de acceso.

* 19/11/2024 Interventoría realizó COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO, EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ
* 22/11/2024 Interventoría realizó acompañamiento a la visita del ingeniero Reynaldo Mantilla de INVIAS SANTADNER.
* 25/11/2024 El Director de Interventoría realizó la visita conjunta con el Ing. Pedro J Barón a la obra, se verificó el avance de obra y el estado de la vía de acceso.
* 02/12/2024 Interventoría Autorizó comité de pagos a proveedores del convenio.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST.
* 10/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST.
* 11/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 14/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-248 POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PROPIAS DEL CONVENIO CONVENIO 4367 -2023 JAC GAITAL.
* 18/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 20/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 24/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-264 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA GAITAL VÉLEZ
* 09/01/2025 Interventoría verifica la no actividad en obra durante la última semana.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 33 (Numeración consecutiva) del 3/1/2025 al 9/1/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE **TEBAIDA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

1 Tramo Placa huella y Una (1) alcantarilla en concreto reforzado; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TEBAIDA

CONVENIO No.	4424 de 2023	VALOR INICIAL:	$	200,996,240.00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	200,996,240.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%

CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$	394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$	141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$	535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$	-
		VALOR AMORTIZADO:	$	-
		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,996,240.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,996,240.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 394,093,490.00	$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 522,852,726		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 394,093,490.00	$ 12,555,454		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200,996,240.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150,747,180.00	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	51,920,307.80	25.83%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	98,826,872.20	49.17%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	32,498,113.00	16.17%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**200,996,240.00**	**100.00%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**84,418,420.80**	**42.00%**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	116,577,819.20	58.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	20,099,624.00	10.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,019,924.80	2.00%

Observaciones: El avance se ve reflejado en los gastos administrativos ejecutados y la compra de materiales para realización de las obras. Durante el período se realizaron actividades constructivas de manera satisfactoria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	522,094,458.00	97.51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	522,852,726.00	97.65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% — Avance o Atraso Físico %: -64.00%
Meta Física Ejecutada %: 36.00%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	140
*	Alcantarilla	Unidad	1
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	140.00				100.00%
Ejec	50.40				36.00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico seman

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades se

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	**5.871515582**	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	-73.52404162	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: La JAC Presentó la cantera CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SAS NIT.900414198 localizada en el municipio de MONIQUIRÁ

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9.00	7.00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9.00	7.00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.00	0.00
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.00	0.00

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 7/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se continua en este periodo por parte de la JAC actualización de Presupuesto de Obra.
* Se envían para aprobación de la interventoría cotizaciones de (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se inicia la vinculación de personal mano de obra no calificada y maestro general.
* Se participa de reunión técnica programada por la interventoría.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio y avance de los estudios y diseños para lograr pasar a la ejecución del proyecto, fue rechazada la propuesta de los estudios y Diseños por presupuesto ya se está realizando nuevas cotizaciones y se realizará entrega nuevamente para
* Se realizó nuevamente entrega de cotizaciones para los Estudios y Diseños.
* Se realizó comité técnico/operativo para aprobación de Cotización de estudios y diseños.
* Se realizaron tomas de muestras de subrasante para estudios y diseños.
* Se radica a la aseguradora solicitud para actualización de pólizas.
* Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 21 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 02 Sep. Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS.
* Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.

* Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.
* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo.
* 10/09/2024 Se envió a interventoría los Estudios y Diseños del convenio para revisión.
* 11/09/2024 Se Instaló el buzón de sugerencias para la comunidad.
* 18/09/2024 Se realizó revisión de cotizaciones y de presupuesto en la oficina de interventoría
* 23/09/2024 Se recibió oficio TIC-INVIAS-1631-168 con las observaciones del área de PAVIMENTOS a la JAC
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 03/10/2024 Se envío Diseño Hidráulico a la Especialista Eugenia Villegas
* 05/10/2024 Se emitió TIC-INVIAS-1631-171- CONCEPTO FAVORABLE A LOS EYD - TEBAIDA
* 08/10/2024 Se realizó comité de pagos a proveedores del convenio.
* 18/10/2024 se REALIZÓ COMITÉ DE APROBACIÓN DE COTIZACIONES.
*** 21/10/2024 Se inician labores de obra.**
* 22/10/2024 Se realiza comité de pagos a proveedores.
* Se realiza acopio de materiales en obra, se cubren materiales pétreos con plástico.
* Se realiza corte y figurado de acero de refuerzo, para viguetas de placa huella.
* 5/11/2024 SE REALIZA COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 06/11/2024 SE ACOPIAN MATERIALES EN OBRA CONTINUA FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO LAS LLUVIAS PRESENTADAS ATRASAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
* 07/11/2024 LA OCURRENCIA DE LLUVIAS EN LA ZONA DIFICULTA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y BAJA EL RENDIMIENTO DE LAS ACTIIDADES DE OBRA.
* 08/11/2024 SE AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA.
* 08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
* 09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROC}
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA
* 18/11/2024 A CAUSA DE LAS LLUVIAS PRESENTADAS DIARIAMENTE DURANTE EL PERÍODO, EL ESTADO DE LA VÍA NO PERMITE EL ACCESO DE VEHÍCULOS PESADOS CON MATERIALES, LA COMUNIDAD SOLICITÓ ESPERAR A QUE CESEN LAS LLUVIAS PARA TRANSITAR CON VEHÍCULOS PESADOS POR LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA, DE IGUAL MANERA SE REQUIERE LA REALIZACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO PARA INGRESAR MATERIALES.
* 19/11/2024 SE REALIZA COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 20/11/2024 EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN REPROGRAMACIÓN DE OBRAS.
* 22/11/2024 EL ING REYNALDO MANTILLA DE INVIAS (SANTANDER) REALIZÓ VISITA AL SITIO, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 25/11/2024 EL ING. PEDRO J BARÓN DE INVIAS (BOGOTÁ) REALIZÓ VISITA AL SITIO CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO. SE TOMO LA DESICIÓN CONJUNTA CON LA COMUNIDAD DE REALIZAR EL TRASIEGO DE MATERIALES A LA OBRA EN CAMIONETA PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y DISMINUIR EL DAÑO EN LA VÍA
* 25/11/2024 SE REALIZA COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 02/12/2024 Se Tiene compactado 70% del tramo de subbase granular para iniciar instalación de acero de refuerzo y formaleta en sitio.
* 03/12/2024 Inicia Instalación de formaleta en madera para placa huellas.
* 04/12/2024 Durante la semana el alcance en obra a sido satisfactorio, ya se tiene 70% de la subbase granular compactada, para iniciar la construcción de concreto reforzado de placa huella
* 09/12/2024 Ingreso ayudante de construcción Tatiana.
* 11/12/2024 Durante el periodo se avanzo satisfactoriamente en la construcción de las obras, se tiene subbase granular compactada y el día 10 dic se realizó la primera fundida de concreto clase D huellas
* 17/12/2024 Inicio fundida de Viguetas en concreto 3000psi.
* 18/12/2024 Se realiza construcción de piedra pegada en zona central de la placa huella
* 20/12/2024 Se realiza fundida de riostras en concreto 3000psi reforzado.
* 30/12/2024 Avanza construcción de palca huellas de manera satisfactoria.
* 02/01/2025 No se evidencia realización de actividades en obra.
* 07/01/2025 Se retoman actividades en obra, avanza construcción de placa huellas en concreto reforzado 3000 psi.
* 07/01/2025 Se realiza trasiego de materiales en camioneta, desde el sector La Florida hasta la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se dará continuidad a la construcción de la obra, se espera tener la subbase granular aplicada y compactada.
* Se dará continuidad a la construcción de estructura de placa huella en concreto reforzado de 3000 psi.
* Se realizará suministro de materiales de obra.
* Se realizarán pagos a proveedores del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA


PLACAHUELLA

		SEMANA 33
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	36.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	36.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	46.00%



ALCANTARILLA

		SEMANA 33
Construcción Alcantarilla	PROG	100.00%
	EJEC	50.00%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
07/01/2025 Formaleta para construcción de huellas en concreto



FOTO 2
07/01/2025 Formaleta para construcción de huellas en concreto



FOTO 3
07/01/2025 Formaleta para construcción de huellas en concreto

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del convenio realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
2. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega prioritaria de los estudios y diseños (EyD) acorde a que NO se deben generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en los tiempos ya estipulados.
3. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoria e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A.C
4. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-108 - OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de TEBAIDA, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el periodo correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales genera la aplicación de las multas contempladas en el convenio.
5. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
6. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social pagadas.
7. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.
* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios.
* 13/09/2024 Interventoría envió a todas las JAC TIC-INVIAS-1631-163 - Reiteración oficio TIC-INVIAS-1631-157 del 05/09/2024 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 23/09/2024 Se envió oficio TIC-INVIAS-1631-168 con las observaciones No.2 del área de PAVIMENTOS a la JAC .
* 26/09/2024 Interventoría Programo REUNIÓN Virtual con el Ing. Nelson Acevedo Gestor Ambiental para consultar sobre la aprobación de fuentes de materiales para los convenios.
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 03/10/2024 Se envío Diseño Hidráulico a la Especialista Eugenia Villegas
* 18/10/2024 se REALIZÓ COMITÉ DE APROBACIÓN DE COTIZACIONES.
* 22/10/2024 Interventoría y JAC realizan comité de pagos a proveedores.
* 5/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEDURA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 14/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINA LAS JAC PARA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN CONTABLE POR PARTE DE INVIAS
* 19/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 19/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINA LAS JAC PARA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN AMBIENTAL POR PARTE DE INVIAS
* 22/11/2024 INTERVENTORÍA REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A VISITA DEL ING REYNALDO MANTILLA DE INVIAS (SANTANDER) QUIEN REALIZÓ VISITA AL SITIO, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 25/11/2024 EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Y EL ING. PEDRO J BARÓN DE INVIAS (BOGOTÁ) REALIZAN VISITA AL SITIO CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO. SE TOMO LA DESICIÓN
* 25/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 02/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST
* 10/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST.
* 11/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 17/12/2024 Interventoría realiza toma de densidades en la subbase granular aplicada.
* 18/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 19/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-251 CONCEPTO FAVORABLE AL ESTUDIO DE GEOTECNIA CORRESPONDIENTE A LOS EYD - TEBAIDA
* 02/01/2025 Interventoría realiza permanente seguimiento a la ejecución de las obras, mediante inspección visual de las mismas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,

Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 9/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER SEMANA No.: **33** (Numeración consecutiva) del 3/1/2025 al 9/1/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA **LA PALMERA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALMERA		
CONVENIO No.	4565 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,029,468.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,029,468.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/1/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 81,075,700.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,029,468.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,029,468.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 522,852,726		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 12,555,454		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	201,029,468.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150,772,101.00	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	156,585,635.00	77.89%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-$	5,813,534.00	-2.89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	44,443,833.00	22.11%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**201,029,468.00**	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**201,029,468.00**	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	32,164,714.88	16.00%

Observaciones: Las OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS corresponde a pagos realizados a proveedores del convenio, incluyendo pagos adelantados de materiales. Durante el período se avanzó satisfactoriamente en la construcción de las obras.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	522,094,458.00	97.51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	522,852,726.00	97.65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% Avance o Atraso Físico % 1.68%
Meta Física Ejecutada % 101.68%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	119
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	119.00			119.00	100.00%
Ejec	121.00			121.00	101.68%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	**5.8715078**	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	-7.3524087	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

LA FUENTE DE MATERIALES PÉTREOS ESCOGIDA ES **"CALIZAS Y MINERALES S.A.S. NIT. 900414198-1** LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10.00	7.00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10.00	7.00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.00	0.00
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.00	0.00

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial el 6/06/2024.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2/2

FECHA: 9/1/2025 (Día / Mes / Año)

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se realizó la socialización con la junta de acción comunal vereda Palmera del municipio de Vélez - Santander
* 9 habitantes de la Vereda La Palmera estuvieron realizando demolición de las cintas huellas con demoledores y herramienta manual pero no pudieron avanzar mucho debido a que el concreto reforzado estaba bastante resistente por lo cual finalmente analizaron la opción de gestionar una retroexcavadora con la Alcaldía o particular para
* Se realizó por parte del Ingeniero Geotecnia la actividad de campo para la toma de muestras de suelo en la zona del proyecto para el correspondiente estudio de suelos
* Se realizó levantamiento topográfico del sitio del proyecto.
* Se realiza entrega de cotizaciones para los Estudios y Diseños
* Se realiza comité técnico/operativo para aprobación de Cotización de estudios y diseños.
* Se realiza el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se realiza visita y recorrido con el Ing. Director del INVIAS Santander Marlon Gamboa, JAC e Interventoría el día 04 de julio 2024, En la zona del proyecto estuvieron presentes la Interventoría y delegados del INVIAS con el fin de revisar el estado del proyecto. Se aprovechó esta visita para sugerirles a modo de solicitud de lo siguiente: 1) la La comunidad de la Vereda La Palmera, realizará gestión administrativa para conseguir una retroexcavadora y de esa forma demoler las cintas huellas
* La firma encargada de los estudios del proyecto, realizará el correspondiente estudio de tránsito, hidrológico e hidráulico de la zona del proyecto para la entrega final de todos estudios
* Radicar a la Interventoría el ajuste de los estudios y diseños.
* Se le informó a la firma encargada de los estudios y diseños, las observaciones realizadas por la Interventoría para subsanación.
* Se radicó oficio en la Alcaldía Municipal de Vélez, comunicándole al Señor Alcalde el proyecto de placa huellas que se va a realizar en la Vereda La Palmera, entre el INVIAS y la JAC de la Vereda La Palmera
* Se trabajó en la actualización del presupuesto, y a la espera de la aprobación final de los estudios y diseños para terminar esta actividad.
* Se realizó la socialización con la junta de acción comunal vereda Palmera del municipio de Vélez - Santander
* Se realiza el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
*Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 21 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 28/08/2024 Interventoría emitió TIC-INVIAS-1631-148- CONCEPTO FAVORABLE A LOS EYD - LA PALMERA
* 02/09/2024 Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS.
* 02/10/2024 Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* 03/09/2024 Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.
* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo
* 11/09/2024 Se realizó comité operativo aprobación de cotizaciones de insumos y materiales.
* 24/09/2024 Interventoría envió a INVIAS TIC-INVIAS-1631-169 - Placa Huella. Vereda La Palmera, Municipio de Vélez. Oficio de interventoría a INVIAS solicitando revisión y aval de la construcción de la placa huella sobre las huellas existentes.
* 24/09/2024 Se emitió concepto aprobatorio al diseño de pavimentos presentado por la JAC
* 01/10/2024 Se realizó reunión con INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 08/10/2024 Se realizaron pagos a proveedores del Convenio
* 08/10/2024 Se realizó visita de campo para verificar las cinta huellas existentes en sitio, se realizará demolición de esta estructura con el fin de garantizar la cimentación de la nueva placa huella.
* 17/10/2024 SE REALIZA REVISIÓN PRESUPUESTO AJUTADO, TENIENDO EN CUENTA LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE LA CINTA HUELLA EXISTENTE. SE ENCUENTRA EN REALIZACIÓN EXAMENES MÉDICOS DEL PERSONAL QUE VA A TRABAJAR EN OBRA
* **INICIO OBRAS 18/10/2024**
* SE REALIZÓ DEMOLICIÓN DE LAS CINTA HUELLAS EN CONCRETO REFORZADO EXISTENTES.
* DURANTE LA SEMANA ENTRE EL 24-30 OCT SE AVANZÓ POCO DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EQUIPOS DE MAQUINARIA EN LA ZONA.
* 5/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEDURA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 06/11/2024 SE PRESENTAN LLUVIAS DIARIAMENTE DURANTE LA ULTIMA SEMANA LO CUAL DIFICULTA EL INGRESO DE MAQUINARIA AL SECTOR, DEBIDO AL ESTADO DEL TERRENO Y DE LAS ALTAS PENDIENTES
* 07/11/2024 LAS VOLQUETAS CON MATERIAL NO HAN PODIDO ACCEDER AL SITIO DE LAS OBRAS DEBIDO AL ESTADO DE LA CARRETERA LA CUAL ES MUY PENDIENTE Y POR LAS LLUVIAS LOS VEHICULOS SE QUEDAN PATINANDO EN EL BARRO.
* 08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
* 09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROGRAMACIÓN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONVENIO.
* 12/11/2024 SE REALIZÓ COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA
* 18/11/2024 LA OCURRENCIA DIARIA DE LLUVIAS NO PERMITE EL INGRESO DE VEHÍCULOS PESADOS A LA VEREDA, VA A SER NECESARIO REALIZAR AFIRMADOS EN LA VÍA DE ACCESO PARA PODER INGRESAR MATERIALES.
* 19/11/2024 JAC, INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 20/11/2024 EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN REPROGRAMACIÓN DE OBRAS.
* 25/11/2024 EL ING. PEDRO J BARÓN DE INVIAS (BOGOTÁ) REALIZÓ VISITA AL SITIO CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 27/11/2024 EL ESTADO DEL CLIMA HA MEJORADO, SE REACTIVAN LAS ACTIVIDADES DE OBRA, SIN EMBARGO EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO SIGUE SIENDO DIFÍCIL Y EL TRAFICO PESADO DE LA ZONA AFECTA DEMASIADO LA VÍA
* 28/11/2024 Se realiza la primera fundida de concreto 3000 psi para placa huella, se implementa sistema de canal para manejo del concreto. Hoy la interventoría toma densidades de campo en la subbase granular.
* 02/12/2024 Se realiza instalación de concreto piedra pegada centro y anchos.
* 04/11/2024 Durante la semana avanzó satisfactoriamente la construcción de placa huellas en concreto 3000 psi, se tienen 30 ml de placa huella fundidos
* 11/12/2024 Durante el período se avanzó satisfactoriamente en la construcción de las obras
* 19/12/2024 Se realiza construcción de placa huellas en concreto reforzado K0+080
* **30/12/2024 Se alcanza ejecución del 100% de la obra placa huella en concreto 3000 psi. Placa huella L=121m**
* 02/01/2025 Se encuentra en realización el cierre Ambiental y Social del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se dará continuidad a la construcción de la obra, se tiene la subbase granular aplicada y compactada.
* Se dará continuidad a la construcción de estructura de placa huella en concreto reforzado de 3000 psi.
* Se realizará suministro de materiales de obra.
* Se realizarán pagos a proveedores del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA:

		SEMANA 33
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	101.68%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	101.68%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	110.00%
	EJEC	101.68%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
20/12/2024 Avance ejecución obras



FOTO 2
20/12/2024 Avance ejecución obras



FOTO 3
20/12/2024 Avance ejecución obras

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la
2. La interventoría emite Respuesta el día 23-07-2024 con observaciones a los Estudios y Diseños presentados por la J.A.C. La Palmera el día 20-07-2024, Haciendo hincapié a que el día 20-07-2024 se les realizó observación puntual por no adjuntar el Estudio de Suelos y geotécnico.
3. El día 29-07-2024 la O.A.C. realiza entrega de Estudio de Suelos y geotécnico correspondiente a los Estudios y Diseños (EyD).
4. El día 02-08-2024 Interventoría realiza observaciones al Estudio de Suelos y geotécnico correspondiente a los Estudios y Diseños (EyD).
5. El día 28-08-2024 se dio concepto favorable por parte del especialista de vías para los EyD.
6. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A.C
7. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-110- OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de LA PALMERA, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el periodo correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales, genera la aplicación de las multas contempladas en el convenio.
8. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
9. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social
10. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.
* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios.
* 13/09/2024 Interventoría envió a todas las JAC TIC-INVIAS-1631-163 - Reiteración oficio TIC-INVIAS-1631-157 del 05/09/2024 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 24/09/2024 Interventoría envió a INVIAS TIC-INVIAS-1631-169 - Placa Huella. Vereda La Palmera, Municipio de Vélez. Oficio de interventoría a INVIAS solicitando revisión y aval de la construcción de la placa huella sobre las huellas existentes.
* 24/09/2024 Se emitió concepto aprobatorio al diseño de pavimentos presentado por la JAC
* 01/10/2024 Se realizó reunión con INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 08/10/2024 Interventoría autorizó realización de pagos a proveedores.
* 22/10/2024 Interventoría autorizó realización de pagos a proveedores.
* 29/10/2024 Interventoría autorizó realización de pagos a proveedores.
* 5/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEDURA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 12/11/2024 JAC, INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 14/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINÓ LA ASISTENCIA DE LAS JAC A CAPACITACIÓN CONTABLE PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS.
* 19/11/2024 JAC, INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 25/11/2024 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REALIZÓ VIVISTA CONJUNTAMENTE CON INVIAS BOGOTÁ A LA OBRA, VERIFICAR ESTADO DE OBRA.
* 02/12/2024 Interventoría Realizó comité de pagos a proveedores del convenio.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST
* 11/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría realizaron comité operativo de pago a proveedores.
* 18/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría realizaron comité operativo de pago a proveedores.
* 19/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-253 CONCEPTO FAVORABLE AL ESTUDIO DE GEOTECNIA CORRESPONDIENTE A LOS EYD - LA PALMERA
* 24/12/2024 Interventoría emitió el comunicado TIC-INVIAS-1631-266 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA LA PALMERA -VELEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,

Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER SEMANA No.: **34** del 10/1/2025 al 16/1/2025 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA **GUAMAL** DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL

CONVENIO No.	3951 de 2023	VALOR INICIAL:	$	201,006,719.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	201,006,719.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/12/2024			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%

CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$	394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$	141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$	535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$	-
		VALOR AMORTIZADO:	$	-
		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,006,719.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,006,719.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 527,037,479		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 8,370,701		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	201,006,719.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150,755,039.25	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	159,507,243.18	79.35%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(8,752,203.93)	-4.35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$	36,072,294.41	17.95%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**201,006,719.00**	**100.00%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**195,579,537.59**	**97.30%**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(8,752,203.93)	-4.35%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%

Observaciones: El valor correspondiente a la inversión total ejecutada corresponde a la suma de pagos realizadas en todos los rubros (Costos Directos, Gastos Administrativos, PAGA, etc). En este momento la JAC se encuentra en proceso de devolución de rendimientos financieros, y cancelación de la cuenta.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 526,531,968.00	98.34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 527,037,479.00	98.44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% Avance o Atraso Físico % 4.89%
Meta Física Ejecutada % 104.89%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	metros lineales	140
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	140.00			140.00	100.00%
Ejec	**146.85**			**146.85**	**104.89%**
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de opera	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchill	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO UNICO DE PLACAHUELLA TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	5.89916	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	-73.58554	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: La JAC Presentó la cantera CANTERA EL CAIRO S.A.S. NIT. 900729004 localizada en KM 6 VIA MONIQUIRA-TUNJA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN REVISIÓN

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10.00	7.00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10.00	7.00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.00	0.00
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.00	0.00

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 7/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se da inicio a las actividades con la junta de acción comunal vereda Guamal del municipio de Bolívar - Santander
* Se realiza el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se realiza entrega de cotizaciones para Estudios y Diseños.
* Se asiste a comité semanal en conjunto con Interventoría.
* Se realiza entrega de cotizaciones correspondientes a los Estudios y Diseños (EyD), las cuales no fueron aprobadas por la interventoría, por elevados costos.
* Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 22 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 02 Sep. Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS
* Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.

* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo.
* 10/09/2024 JAC presentó cotización para realización de Estudios y diseños del convenio.
* 17/09/2024 Se realizó aprobación de la cotización de Estudios y diseños por 4'500.000
* 17/09/2024 Se envió a la Interventoría los Estudios y diseños, Interventoría respondió Observaciones.
* 20/09/2024 Se recibió comunicado TIC-INVIAS-1631-165 Solicitando completar los estudios y diseños.
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 03/10/2024 Se realizó reunión INTERVENTORÍA - INVIAS se expuso el estado general de los convenios, sin embargo se programó reunión extraordinaria con las veredas GUAMAL Y GAITAL.
* 04/10/2024 Se estableció compromiso por parte de la JAC de presentar la documentación pendiente y adelantar la gestión necesaria para realización del convenio, con mayor diligencia y compromiso.
* 08/10/2024 Se realizó visita al sitio, esta visita había sido solicitada porque los dueños de los predios aledaños no dejaban hacer volteadero para las volquetas, sin embargo al llegar al sitio estaba reunida gran parte de la comunidad solicitaron hacer las placa huellas en el sector que más lo requiere, que es iniciando el corredor vial, un sector de alta pendiente.
* 08/10/2024 Se solicitó al diseñador realizar el cambio de tramo, se autorizó el pago de estos diseños adicionales al proveedor.
* 09/10/2024 SE trabajó revisión de cotizaciones vía Google meet. En espera de los diseños definitivos
* 10/10/2024 Interventoría emitió TIC-INVIAS-1631-175- Observaciones del especialista en geotecnia a los EyD - GUAMAL
* 16/10/2024 A la fecha la JAC no ha presentado los diseños definitivos del tramo a intervenir
* 21/10/2024 Se realizó topografía de terreno para completar el levantamiento de diseño del tramo priorizado.
* 22/10/2024 Se realizó **comité aprobación de cotizaciones** de materiales e insumos representativos del convenio.
* 23/10/2024 Por vía WhatsApp se enviaron documentos de diseño, pero hace falta una entrega organizada y formal del los diseños del nuevo tramo.

29/10/2024 JAC envío correo con estudios y diseños, sin embargo, la documentación no está completa falta diseño geométrico.
29/10/2024 Se realizó **ajuste del presupuesto** de obra
29/10/2024 Se realizaron pagos para materiales de construcción,
29/10/2024 JAC norma renuncia del ingeniero residente, envió hoja de vida de ingeniero residente para aprobación.
01/11/2024 INICIO OBRAS
05/11/2024 Se realizó COMITÉ DE PAGOS a proveedores del convenio.
06/11/2024 SE TIENE APLICADA SUBBASE GRANULAR, SE REALIZA FIGURADO DE ACERO Y FORMALETA PARA PLACAHUELLA
08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROGRAMACIÓN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONVENIO.
13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA.
18/11/2024 DURANTE EL PERÍODO SE AVANZÓ SATISFACTORIAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE PLACAHUELLAS.
19/11/2024 NO FUÉ POSIBLE REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES, EL BANCO NO ENTREGA AÚN LA CHEQUERA SOLICITADA POR LA JUNTA
25/11/2024 SE REALIZÓ COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
27/11/2024 DURAN TE EL PERÍODO SE AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLAS EN CONCRETO 3000PSI.
27/11/2024 SE PROGRAMA HOY REUNION VIRTUAL CON EL DISEÑADOR PARA QUE PRESENTE CORRECCIONES A LOS INFORMES DE DISEÑO.
04/12/2024 Durante la última semana se avanzó satisfactoriamente en la construcción de placa huellas.
11/12/2024 Durante la última semana se avanzó satisfactoriamente en la construcción de placa huellas. fecha terminación 16/12/2024
16/12/2024 Se tiene ejecutado el 100% de la meta física programada. Tramo Placa huella L=146,85 mts
26/12/2024 Se encuentra en realización la gestión para cierre de la cuenta bancaria y liquidación del convenio.
02/01/2025 Se encuentra en realización el cierre Ambiental y Social del convenio.
16/01/2024 en este momento se encuentra en gestión la ejecución del RUBRO PAGA.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se realizará la actividad PAGA-
* Dar cierre a la gestión ambiental del CONVENIO
* Realizar los Pagos pendientes principalmente de tipo administrativo, Planillas de se social, Devolución de retenciones, Devolución de rendimientos, etc.
* Dar cierre a la parte contable y cuenta del convenio.

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA:

		SEMANA 24
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
12/12/2024 Placa huella Construida



FOTOGRAFÍA 2
12/12/2024 Placa huella Construida



FOTOGRAFÍA 3
12/12/2024 Construcción de placa huellas

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
2. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega prioritaria de los estudios y diseños (EyD), de acuerdo a que oportunamente se realizó y se dio un visto bueno a la cotización presentada, no obstante, el Ingeniero Aldahir Peña, argumenta que han tenido inconvenientes con el correo electrónico y que se ha dificultado recopilar la información.
* 25/07/2024 Se envió un oficio TIC-INVIAS-1631-096, en el cual se expone la preocupación por la dilatación de tiempos de entrega de documentación requerida (especialmente Estudios y Diseños), acorde a que no se han obtenido respuestas a las solicitudes emitidas por parte del personal de interventoría.

Por parte de la interventoría se les envía información correspondiente y se encuentra disponible para cualquier inquietud, no obstante, haciendo hincapié a que no se pueden extender los tiempos de entrega, porque podría afectar y generar un detrimento en el periodo estipulado de finalización del proyecto.
3. Por parte de la O.A.C. presente nuevamente cotizaciones para los Estudios y Diseños (EyD), lo cual no corresponde a los costos del sector, siendo estos muy elevados.
4. La O.A.C. se encuentra realizando subsanaciones de acuerdo a observaciones emitidas por la Interventoría.
5. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A.C
6. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-114 - OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de GUAMAL, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni
7. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
8. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social pagadas.
9. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.
* A la fecha del presente informe, la JAC Guamal no ha presentado cotizaciones de ESTUDIOS Y DISEÑOS con precios ajustados al mercado.
* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
*12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 17/09/2024 Interventoría realizó aprobación de pagos con cheque para gastos administrativos.
* 20/09/2024 Interventoría envió al especialista en Geotecnia el estudio presentado (Faltaron Estudios de diseño geométrico y Pavimentos).
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas

* 03/10/2024 Se realizó reunión INTERVENTORÍA - INVIAS se expuso el estado general de los convenios, sin embargo se programó reunión extraordinaria con las veredas GUAMAL Y GAITAL.

* 04/10/2024 Se estableció compromiso por parte de la JAC de presentar la documentación pendiente y adelantar la gestión necesaria para realización del convenio, con mayor diligencia y compromiso.

* 08/10/2024 Interventoría realizó visita al sitio, esta visita había sido solicitada porque los dueños de los predios aledaños no dejaban hacer volteadero para las volquetas, sin embargo al llegar al sitio estaba reunida gran parte de la comunidad solicitaron hacer las placa huellas en el sector que más lo requiere, que es iniciando el corredor vial, un sector de alta pendiente.
* 10/10/2024 Interventoría emitió TIC-INVIAS-1631-175- Observaciones del especialista en geotecnia a los EyD - GUAMAL
* 22/10/2024 Se realizó comité aprobación de cotizaciones de materiales e insumos representativos del convenio.
* 29/10/2024 Se realizaron pagos para materiales de construcción.
* 05/11/2024 Interventoría , JAC y Veeduría realizan COMITÉ DE PAGOS a proveedores del convenio.
* 14/11/2024 Interventoría Coordinó la asistencia de las JAC a la CAPACITACIÓN ASPECTOS CONTABLES organizada por INVIAS
* 16/11/2024 INTERVENTORÍA REALIZÓ ENSAYOS DE DENSIDADES EN LA SUBBASE GRANULAR DEL SECTOR DONDE AÚN FALTA POR FUNDIR PLACHAUELLA.
* 19/11/2024 NO FUÉ POSIBLE REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES, EL BANCO NO ENTREGA AÚN LA CHEQUERA SOLICITADA POR LA JUNTA.
* 20/11/2024 Interventoría envió a la JAC el comunicado TIC-INVIAS-1631-229 OBSERVACIONES ÁREA PAVIMENTOS A LOS E Y D DEL TRAMO PRIORIZADO.
* 27/11/2024 INTERVNETORÍA REALIZÓ REUNION VIRTUAL CON EL DISEÑADOR PARA QUE PRESENTE CORRECCIONES A LOS INFORMES DE DISEÑO.
* 02/12/2024 Interventoría Realizó comités de pagos a proveedores del convenio.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST.
* 09/12/2024 Interventoría envió comunicado TIC-INVIAS-1631-241 CONCEPTO FAVORABLE AL ESTUDIO DE GEOTECNIA CORRESPONDIENTE A LOS EYD - GUAMAL
* 11/12/2024 Interventoría JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 12/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST.
* 24/12/2024 Interventoría envió comunicado TIC-INVIAS-1631-257 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA VEREDA GUAMAL - BOLÍVAR
* 15/01/2025 Interventoría realizó reunión para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.
* 16/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO.
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	1/2

FECHA: 16/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 33 del 10/1/2025 al 16/1/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE **LA UNION** DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION		
CONVENIO No.	4478 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,981,336.00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,981,336.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,981,336.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,981,336.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 527,037,480		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 8,370,700		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200,981,336.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200,981,336.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	184,796,669.33	91.95%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	16,184,666.67	8.05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	16,184,666.67	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200,981,336.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200,981,336.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	20,098,133.60	10.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	20,098,133.60	10.00%

Observaciones: Se culminan las obras objeto del Convenio en la semana de ejecución de obra No.9

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	526,531,968.00	98.34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	527,037,480.00	98.44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% | Avance o Atraso Físico % 10.38%

Meta Física Ejecutada % 110.38%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	106
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	106.00			106.00	100%
Ejec	117.00			117.00	110%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: La JAC se encuentra pendiente a remitir a esta interventoría dicha información.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-225 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8.0	7.0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15.0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se da inicio a las actividades el día 27/05/2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
04/10/20244 El 15 DE AGOSTO INTERVENTORÍA EMITIÓ CONCEPTO FAVORABLE A LOS DISEÑOS DEL ÁREA DE PAVIMENTOS Y DISEÑO GEOMÉTRICO TIC-INVIAS-1631-132
04/10/20244 Se realizó trabajo de oficina conjuntamente con el Ing. residente de Obra para avanzar en el AJUSTE PRESUPUESTAL, el presupuesto definitivo quedó revisado, pendiente aprobaciones de Estudios y Diseños.
04/10/20244 Se realizó revisión de PRESUPUESTO AJUSTADO, fue enviado al Ing. Director de Interventoría para revisión.
16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-197 con observaciones al área Hidráulica de los Estudios y diseños entregados por la JAC
16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-198 con aspectos a corregir después de la tercera revisión al Informe de Geotecnia como parte de los Estudios y diseños entregados por la JAC
17/10/2024 Se remite a la JAC por medio de Correo electrónico la Prórroga N° 2 al Convenio N° 4478 - 2023 con el fin de que El conveniado actualice las Pólizas del mismo.
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 Se remite a la JAC por medio de Correo electrónico la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio N° 4478 - 2023 con el fin de que El conveniado actualice las Pólizas del mismo.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 18/11/2024 la JAC realiza entrega mediante correo electrónico de documentación de gestión ambiental.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 27/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 97 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, franja de enrocado central también de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía y rampas de inicio y final también en concreto reforzado de 21 mpa.

* 27/11/2024 se tiene ejecutado a la fecha también, la instalación de 5,0 ml de tubería en concreto de 21 mpa, con su respectivo atraque y relleno, se cuenta con la estructura de encole terminada y se encuentra en proceso de instalación de acero de refuerzo y formaleta para la estructura de descole de la alcantarilla proyectada en este tramo.

* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-225 al invias radicando el paga del convenio.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 02/12/2024 se realizará revisión de balance del convenio para determinar una posible ampliación de la meta física.
* 05/12/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 06/12/2024 Se culminan las actividades de ejecución de la Obra objeto del Convenio con una Meta física de 117 ml de Placas huella construidas en Concreto de 21 Mpa y Construcción de una (1) Alcantarilla con una Instalación de 5 ml de Tubería en concreto de 36" con sus respectivas Estructuras de Encole y Descole también en Concreto de 21 Mpa.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*13/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-246 respuesta a radicado invias 2024s-vbog-092184 del 05 de diciembre de 2024 acerca de la gestión ambiental del convenio
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*17/12/2024 se remite a la JAC prórroga n° 3 del convenio para actualización de pólizas
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-258 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-270 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realizará seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* La O.A.C. realizará entrega de subsanaciones a observaciones realizadas por la Interventoría para los Estudios y Diseños (EyD).
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 34
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	0.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	110.38%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	110.38%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	110.38%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	110.38%

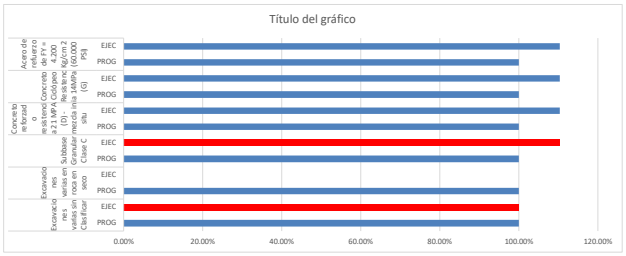

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 Instalación Acero de refuerzo para Placas huella



FOTO 2 Instalación Acero de refuerzo para Descole Alcantarilla



FOTO 3 Fundida de Cunetas en Concreto de 21 Mpa

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 04/10/20244 El 15 DE AGOSTO INTERVENTORÍA EMITIÓ CONCEPTO FAVORABLE A LOS DISEÑOS DEL ÁREA DE PAVIMENTOS Y DISEÑO GEOMÉTRICO TIC-INVIAS-1631-132
* 04/10/20244 Se realizó revisión de PRESUPUESTO AJUSTADO, fue enviado al Ing. Director de Interventoría para revisión.
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-197 con observaciones al área Hidráulica de los Estudios y diseños entregados por la JAC
16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-197 con aspectos a corregir después de la tercera revisión al Informe de Geotecnia como parte de los Estudios y diseños entregados por la JAC
17/10/2024 Se remite a la JAC por medio de Correo electrónico la Prórroga N° 2 al Convenio N° 4478 - 2023 con el fin de que El conveniado actualice las Pólizas del mismo.
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 Se remite a la JAC por medio de Correo electrónico la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio N° 4478 - 2023 con el fin de que El conveniado actualice las Pólizas del mismo.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*12/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 12/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 18/11/2024 la JAC realiza entrega mediante correo electrónico de documentación de gestión ambiental.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 27/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo

* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 97 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, franja de enrocado central también de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía y rampas de inicio y final también en concreto reforzado de 21 mpa.

* 27/11/2024 se tiene ejecutado a la fecha también, la instalación de 5,0 ml de tubería en concreto de 21 mpa, con su respectivo atraque y relleno, se cuenta con la estructura de encole terminada y se encuentra en proceso de instalación de acero de refuerzo y formaleta para la estructura de descole de la alcantarilla proyectada en este tramo.
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-225 al invias radicando el paga del convenio.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 02/12/2024 se realizará revisión de balance del convenio para determinar una posible ampliación de la meta física.

* 06/12/2024 Se culminan las actividades de ejecución de la Obra objeto del Convenio con una Meta física de 117 ml de Placas huella construidas en Concreto de 21 Mpa y Construcción de una (1) Alcantarilla con una Instalación de 5 ml de Tubería en concreto de 36" con sus respectivas Estructuras de Encole y Descole también en Concreto de 21 Mpa.

* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

*13/12/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-246 respuesta a radicado invias 2024s-vbog-092184 del 05 de diciembre de 2024 acerca de la gestión ambiental del convenio

*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*17/12/2024 se remite a la jac prórroga n° 3 del convenio para actualización de pólizas
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-258 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-270 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma
* Se realizó seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 16/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **33** del 10/1/2025 al 16/1/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA **POPOA** DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

CONVENIO SOLIDARIO:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POPOA			INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
				INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONVENIO No.	4767 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,995,632.00	CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,995,632.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/12/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,995,632.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,995,632.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 527,037,480		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 8,370,700		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO			
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200,995,632.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200,995,632.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	185,010,965.33	92.05%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	15,984,666.67	7.95%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	15,984,666.67	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200,995,632.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200,995,632.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	17,211,162.00	8.56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	10,049,781.60	5.00%

Observaciones: Esta es la semana de ejecución de obra No.10

INTERVENTORÍA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	526,531,968.00	98.34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	527,037,480.00	98.44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 83.74% — Avance o Atraso Físico %: 0.00%

Meta Física Ejecutada %: 83.74%

	Meta Física (Programa de Obra)			**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**					
	Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
*	Construcción de placa huella	Global	123	Prog	103.00			103.00	84%
				Ejec	103.00			103.00	84%
*				Prog					
				Ejec					
*				Prog					
				Ejec					
*				Prog					
				Ejec					
*				Prog					
				Ejec					
*				Prog					
				Ejec					
*				Prog					
				Ejec					
*				Prog					
				Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: La JAC se encuentra pendiente a remitir a esta interventoría dicha información.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-213 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA: 9/1/2025 (Día / Mes / Año)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7.00	7.00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2.00	7.00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.00	0.00
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.00	0.00
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	14	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 8/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
*2/10/2024 El Contratista presentó Cotizaciones para revisión y aprobación
* 4/10/2024 La JAC envió documentos de la cantera CALIZAS Y MINERALES
* 4/10/2024 Se realizó comité aprobatorio de COTIZACIONES
* 4/10/2024 PARA TENER EN CUENTA, EL CBR DEL TERRENO ES INFERIOR AL 3%, sin embargo el ingeniero Residente de Obra, aclaró que se debe corregir este párrafo en el Estudio de Geotecnia , porque el ceber de diseño SI ES SUPERIOR A 3%
* 8/10/2024 Se realizó Comité Operativo No.2 para firma de cheques y/o transferencias para pagos a Proveedores
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto, ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 20/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 20/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-222 a la JAC con las observaciones producto de la revisión del componente hidráulico de los estudio y diseños entregados por el conveniado.
* 20/11/2024 la jac realiza la entrega de las correcciones al área de geotecnia de los estudios y diseños
* 26/11/2024 la jac remite a la interventoría comunicado informando que pretende realizar la devolución de los recursos destinados para el paga.
* 27/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 83 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, incluyendo también la franja de enrocado central de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía (sin bordillo) y rampa de inicio en concreto reforzado de 21 mpa. 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 05/12/2024 se continuan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
*11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*11/12/2024 Se continua con la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 12/12/2024 la jac realiza la entrega de la última versión de los estudios del área de geotécnia de los estudios y diseños
* 12/12/2024 se culminan las actividades de ejecución de obra con una meta física de 103 ml de placas huella construidas y construcción de 6,0 ml de alcantarilla en tubería en concreto de 36" con sus respectivas estructuras de encole y descole
* 16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
* 17/12/2024 se remite a la jac prórroga n° 3 del convenio para actualización de pólizas
* 18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 19/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-254 al Invias con Entrega oficial del Plan de inversión social del convenio.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-259 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-271 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realizará seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* La O.A.C. realizará entrega de subsanaciones a observaciones realizadas por la Interventoría para los Estudios y Diseños (EyD).
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 34
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	0.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%

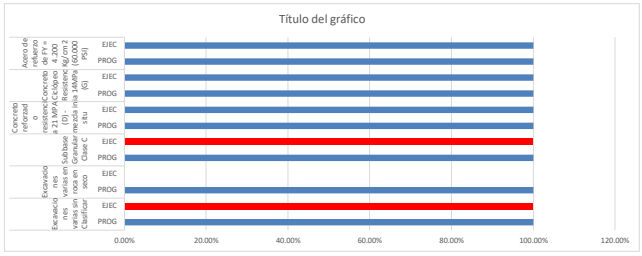

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
Placas Huella terminadas



FOTO 2
Placas Huella terminadas



FOTO 3
Placas Huella terminadas

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
*2/10/2024 El Contratista presentó Cotizaciones para revisión y aprobación
* 4/10/2024 Se realizó reunión de seguimiento con INVIAS, presentación del estado de avance de los convenios
* 4/10/2024 La JAC envió documentos de la cantera CALIZAS Y MINERALES
* 4/10/2024 Se realizó comité aprobatorio de COTIZACIONES
* 8/10/2024 Se realizó Comité Operativo No.2 para firma de cheques y/o transferencias para pagos a Proveedores
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto, ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 20/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-222 a la JAC con las observaciones producto de la revisión del componente hidráulico de los estudio y diseños entregados por el conveniado.
* 20/11/2024 la JAC realiza la entrega de las correcciones al área de geotecnia de los estudios y diseños
* 26/11/2024 la JAC remite a la interventoría comunicado informando que pretende realizar la devolución de los recursos destinados para el paga.
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 83 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, incluyendo también la franja de enrocado central de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía (sin bordillo) y rampa de inicio en concreto reforzado
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/12/2024 la JAC realiza la entrega de la última versión de los estudios del área de geotécnia de los estudios y diseños
* 12/12/2024 se culminan las actividades de ejecución de obra con una meta física de 103 ml de placas huella construidas y construcción de 6,0 ml de alcantarilla en tubería en concreto de 36" con sus respectivas estructuras de encole y descole
* 16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
* 17/12/2024 se remite a la jac prórroga n° 3 del convenio para actualización de pólizas
* 18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 19/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-254 al Invias con Entrega oficial del Plan de inversión social del convenio.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-259 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-271 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma
* Se realizó seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO.
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 16/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: **34** (Numeración consecutiva) del 10/1/2025 al 16/1/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA **BERLIN** DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL BERLIN

CONVENIO No.	3753 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,108,139.00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,108,139.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%

CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,108,139.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,108,139.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 527,037,480		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 8,370,700		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200,108,139.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200,108,139.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	200,108,139.00	100.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	17,076,666.67	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200,108,139.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200,108,139.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%

Observaciones: la ejecución de la Obra se culminó en la semana No.7

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	526,531,968.00	98.34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	527,037,480.00	98.44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% | Avance o Atraso Físico % 3.36%
Meta Física Ejecutada % 103.36%

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	ml	149
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	149.00			149.00	100.00%
Ejec	154.00			154.00	103.36%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: BERLÍN | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	1
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	1	1
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	1
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	1
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	1
Ruteadora	1	1
Compresor (barrido y soplado)	1	1
Camioneta D-300	1	1
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Compresor 120 HP, con martillo	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Aspersor manual	1	1
Total	13	13

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: 6,3 km de la Obra	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
Cerca al casco urbano municipal	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

Observaciones: La JAC presento los documentos de la antera **ASOCIACION DE MINEROS AGROINDUSTRIALES AMBIENTALISTAS LA BELLEZA TMR ONG**. Localizada cerca al casco urbano del Municipio a 6,3 km del Sitio de la Obra.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-177 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2/2

FECHA: 16/1/2025 (Día / Mes / Año)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10.0	7.0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
* Se realizó socialización inicial el 7/06/2024.
* Se realizó socialización de terminación de la Obra el 13/12/2024.
* Se ejecutó el Plan de Inversión Social

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
*02/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 10/10/2024 La JAC envió formatos de gestión ambiental
*15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*21/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 23/10/2024 Se realizó visita de Obra por parte de los Componentes Ambiental, Social y Técnico de La Interventoría
* 24/10/2024 La JAC en la presente semana realizó la entrega del Plan de Inversión social Proyectado en el Convenio.
* 25/10/2024 Mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-203 La Interventoría realiza la Entrega oficial al INVIAS de las correcciones solicitadas al Plan de inversión social del convenio 3753 – 2023 OAC Vereda Berlín.
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-219 a la JAC solicitando la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la JAC realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la JAC
* 29/11/2024 La JAC realizó la entrega de las Pólizas del Convenio actualizadas al 11 de noviembre de2024
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-260 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-272 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realizará seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 34
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	80.00%
	EJEC	0.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%

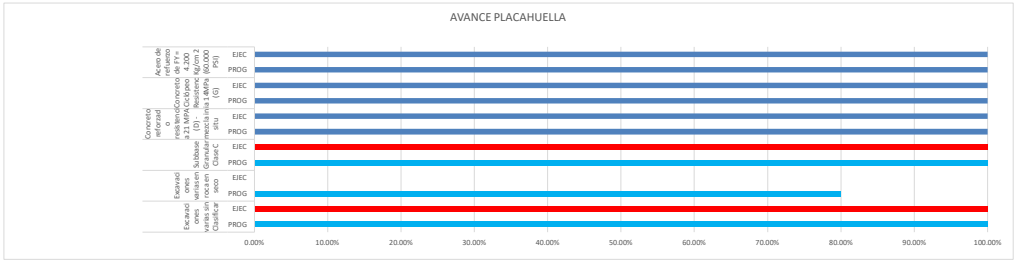

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
Placa huella terminada



FOTO 2
Placa huella terminada



FOTO 3
Vista general Placa huella construida

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
*02/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 04/10/2024 Se realizó reunión de seguimiento con INVIAS, presentación del estado de avance de los convenios
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 10/10/2024 La JAC envió formatos de gestión ambiental
*15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*21/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 23/10/2024 Se realizó visita de Obra por parte de los Componentes Ambiental, Social y Técnico de La Interventoría
* 25/10/2024 Mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-203 La Interventoría realiza la Entrega oficial al INVIAS de las correcciones solicitadas al Plan de inversión social del convenio 3753 – 2023 OAC Vereda Berlín.
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

* 06/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para bordillos de cunetas y limpieza de la obra.

* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-219 a la jac solicitando la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la JAC realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo

* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la JAC
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.
* 29/11/2024 La JAC realizó la entrega de las Pólizas del Convenio actualizadas al 11 de noviembre de2024
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-260 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-272 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,

Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 16/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **33** del 10/1/2025 al 16/1/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **CACHIPAYAL** DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL

CONVENIO No.	4175 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,319,574.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,319,574.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%

CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,319,574.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,319,574.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 527,037,480		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 8,370,700		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		$200,319,574.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		$200,319,574.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		$200,319,574.00	100.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		$0.00	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		$42,026,640.00	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200,319,574.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200,319,574.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
	$ -		

Observaciones: la ejecución de la Obra se culminó en la semana No.7

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	526,531,968.00	98.34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	527,037,480.00	98.44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% — Avance o Atraso Físico % -7.10%
Meta Física Ejecutada % 92.90%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	ml	155
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	155.00			155.00	100.00%
Ejec	144.00			144.00	92.90%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CACHIPAYAL — TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	1
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	1	1
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	1
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	1
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	1
Ruteadora	1	1
Compresor (barrido y soplado)	1	1
Camioneta D-300	1	1
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Compresor 120 HP, con martillo	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Aspersor manual	1	1
Total	13	13

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Cerca al caso Urbano	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	Distancia 13Km de la obra	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
La JAC de Cachipayal presentó los documentos de la Cantera SCS BUENAVISTA , RLHECTOR ALONSO MORENO QUITIAN , Localizada 13 Km del sitio de la obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-176 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10.0	7.0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:
*Se realizó socialización inicial 7/06/2024.
* Durante el período se realizó acompañamiento y asesoría al personal Administrativo de la OAC en la formulación del presupuesto de Gestión Social del convenio.
* Se realizó socialización de terminación de la Obra el 13/12/2024.
* Se ejecutó el Plan de Inversión Social

FECHA: 9/1/2025 (Día / Mes / Año)

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 10/10/2024 La JAC envió formatos de gestión ambiental
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 23/10/2024 Se realizó visita de Obra por parte de los Componentes Ambiental, Social y Técnico de La Interventoría
* 24/10/2024 La JAC en la presente semana realizó la entrega del Plan de Inversión social Proyectado en el Convenio.
* 25/10/2024 Mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-203 La Interventoría realiza la Entrega oficial al INVIAS de las correcciones solicitadas al Plan de inversión social del convenio 4175 – 2023 OAC Vereda Cachipayal.
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 El Conveniado realiza la entrega del Informe de Replanteo y Nivelación Topográfica del tramo.
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 15/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-219 a la jac solicitando la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la JAC realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la JAC
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-261 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-273 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realizará seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* La O.A.C. realizará entrega de subsanaciones a observaciones realizadas por la Interventoría para los Estudios y Diseños (EyD).
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 34
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	80.00%
	EJEC	0.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
Placa huella terminada



FOTO 2
Placa huella terminada



FOTO 3
Vista general Tramo de Placa huella

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 10/10/2024 La JAC envió formatos de gestión ambiental
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 23/10/2024 Se realizó visita de Obra por parte de los Componentes Ambiental, Social y Técnico de La Interventoría
* 25/10/2024 Mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-203 La Interventoría realiza la Entrega oficial al INVIAS de las correcciones solicitadas al Plan de inversión social del convenio 4175 – 2023 OAC Vereda Cachipayal.
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

* 06/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para bordillos de cunetas y limpieza de la obra.

* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 15/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-219 a la jac solicitando la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la JAC realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo

* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la JAC
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-261 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-273 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 16/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **34** (Numeración consecutiva) del 10/1/2025 al 16/1/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA **ORGANOS** DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS		
CONVENIO No.	4490 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,785,769.00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,785,769.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,785,769.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,785,769.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 527,037,480		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 8,370,700		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200,785,769.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200,785,769.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	166,342,065.77	82.85%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	34,443,703.23	17.15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	34,443,703.23	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200,785,769.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200,785,769.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%

Observaciones:
Esta es la semana de ejecución de obra No.9

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	526,531,968.00	98.34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	527,037,480.00	98.44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% — Avance o Atraso Físico % 16.67%

Meta Física Ejecutada % 116.67%

Meta Fisica (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	ml	150
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	150.00			150.00	100.00%
Ejec	175.00			175.00	116.67%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: ORGANOS — TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	1
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	1	1
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	1
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	1
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	1
Ruteadora	1	1
Compresor (barrido y soplado)	1	1
Camioneta D-300	1	1
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Compresor 120 HP, con martillo	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Reparador Trasvial	1	1
Total	13	13

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	5.896845	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	-73.837612	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: La JAC presentó documento RUCOM y licencias del proveedor de materiales pétreos llamado TECNOCONSTRUCTORES, (Cantera Peña Blanca) localizado a 10 Km del sector en intervención. Pendiente solicitar al proveedor las licencias ambientales de la fuente de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-190 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA: 16/1/2025 (Día / Mes / Año)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8.0	7.0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15.0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

* Se presenta cambio residente de interventoría el 03/07/2024.
* Se realizó socialización inicial el 5/06/2024.
* Se realizó socialización de terminación de la Obra el 27/12/2024.
* Se ejecutó el Plan de Inversión Social

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 04/10/2024 Se realizó reunión de seguimiento con INVIAS, presentación del estado de avance de los convenios
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 15/10/2024 La JAC remitió a la Interventoría los documentos de Gestión Ambiental del Convenio, quien a su vez mediante comunicado N° TIC-INVIAS-1631-190 realizó la radicación de los mencionados documentos ante La Subdirección de sostenibilidad del Invias
* 16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-193 con aspectos a corregir después de la tercera revisión al Informe de Geotecnia como parte de los Estudios y diseños entregados por la JAC
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 después de realizar el balance presupuestal del convenio se llegó a la conclusión de que se puede ampliar la meta física proyectada de 10 ml para construir un total de placas huella de 160 ml de longitud aproximada, ampliación que se encuentra en ejecución a la fecha
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 después de realizar el balance presupuestal del convenio se llegó a la conclusión de que se puede ampliar la meta física proyectada de 20 ml para construir un total de placas huella de 170 ml de longitud aproximada, ampliación que se encuentra en ejecución a la fecha
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 se encuentra pendiente iniciar la entrega de la documentación para la liquidación del convenio por parte de la jac
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la jac realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la jac 27/11/2024 se culminan las obras del presente convenio
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 175 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, franja de enrocado central también de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía y rampas de inicio y final también en concreto reforzado de 21 mpa, completando de esta manera el 116,7 % del alcance del proyecto ya que se tenía un alcance inicial de 150 ml y se pudo ampliar la meta física en 25 ml.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 19/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-252 a la JAC emitiendo concepto favorable por parte del Especialista respectivo al componente de Geología y Geotécnia de Los Estudios y Diseños del Proyecto.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-262 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*27/12/2024 Se realizó la actividad Social propuesta por la JAC, con participación de la Interventoría del Convenio y la comunidad local.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará la entrega de los resultados Estudios y Diseños (EyD) para revisión de Interventoría.
* Se realizará revisión del presupuesto ajustado acorde a los diseños y al cotizaciones y precios dela zona que presente la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del contrato
* Se iniciara presentación de hojas de vida personal contractual y proceso afiliación del personal operativo y presentación a Interventoría
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 34
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	0.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	116.70%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	116.70%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	116.70%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	116.70%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Placa huella terminada


Placa huella terminada


Placa huella terminada

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 04/10/2024 Se realizó reunión de seguimiento con INVIAS, presentación del estado de avance de los convenios
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 15/10/2024 La JAC remitió a la Interventoría los documentos de Gestión Ambiental del Convenio, quien a su vez mediante comunicado N° TIC-INVIAS-1631-190 realizó la radicación de los mencionados documentos ante La Subdirección de sostenibilidad del Invias
* 16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-193 con aspectos a corregir después de la tercera revisión al Informe de Geotecnia como parte de los Estudios y diseños entregados por la JAC
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 después de realizar el balance presupuestal del convenio se llegó a la conclusión de que se puede ampliar la meta física proyectada de 10 ml para construir un total de placas huella de 160 ml de longitud aproximada, ampliación que se encuentra en ejecución a la fecha
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 después de realizar el balance presupuestal del convenio se llegó a la conclusión de que se puede ampliar la meta física proyectada de 20 ml para construir un total de placas huella de 170 ml de longitud aproximada, ampliación que se encuentra en ejecución a la fecha
* 25/11/2024 se realiza comité
* 27/11/2024 se encuentra pendiente iniciar la entrega de la documentación para la liquidación del convenio por parte de la jac
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la jac realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la jac 27/11/2024 se culminan las obras del presente convenio
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 175 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, franja de enrocado central también de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía y rampas de inicio y final también en concreto reforzado de 21 mpa,
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 19/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-252 a la JAC emitiendo concepto favorable por parte del Especialista respectivo al componente de Geología y Geotécnia de Los Estudios y Diseños del Proyecto.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-262 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*27/12/2024 Se realizó la actividad Social propuesta por la JAC, con participación de la Interventoría del Convenio y la comunidad local.
* Se realizó seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 16/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **34** del 10/1/2025 al 16/1/2025 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA **TUBAVITA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ- SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Construcción de Placa huella y Una (1) Alcantarilla; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA

CONVENIO No.	4357 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,030,449.00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,030,449.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/1/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%

CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,030,449.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,030,449.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 527,037,480		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 8,370,700		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	201,030,449.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150,772,836.75	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	141,823,075.78	70.55%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	8,949,760.97	4.45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$	43,814,063.67	21.79%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**201,030,449.00**	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**185,637,139.45**	92.34%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	15,393,309.55	7.66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%

Observaciones: Las OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS corresponden a pagos realizados a proveedores del convenio en el rubro de gastos administrativos, incluye pagos anticipados a proveedores. En este momento se encuentra en gestión la ejecución del Rubro PAGA. Las actividades de obra se encuentran 100% ejecutadas.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	526,531,968.00	98.34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	527,037,480.00	98.44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% — Avance o Atraso Físico %: 3.78%
Meta Física Ejecutada %: 103.78%

Meta Fisica (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	119
*	Alcantarilla	Unidad	1
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Pros	119.00				
Ejec	123.50				
Prog	1.00				
Ejec	1.00				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operació	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las activida

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	**5.871507800** **-73.524087000**	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PÉTREOS ESCOGIDA ES "CALIZAS Y MINERALES S.A.S. NIT. 900414198-1 LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8.0	7.0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 7/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se da inicio a las actividades con la junta de acción comunal vereda La unión del municipio de Guavatá - Santander.
* Se realiza entrega de cotizaciones para los Estudios y Diseños
* Se realiza comité técnico/operativo para aprobación de Cotización de estudios y diseños.
* Se realiza seguimiento, control y verificación de las actividades iniciales necesarias para la formulación de estudios y diseños (topografía, apique, ensayo PDC y conteo vehicular).
* Se solicitarán cotizaciones de transporte y materiales necesarios para la ejecución de la obra física en haras de ajustar precios unitarios.
* Se participa en reunión general y comité de obra con la interventoría para revisar avances.
* Se realiza visita y recorrido con el Ing. Director del INVIAS Santander Marlon Gamboa, JAC e Interventoría el día 04 de julio 2024.
* Se continúa haciendo el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se realiza las actividades iniciales necesarias para la formulación de estudios y diseños.
* Se recepcionan y validan las cotizaciones de transporte, materiales y valla publicitaria necesarios para la ejecución de la obra física en aras de ajustar precios unitarios.
* Se participa en reunión de comité de obra con la interventoría para revisar avances de la actividad de estudios y diseños.
* Se efectúa visita de campo en conjunto con la interventoría, representantes de la comunidad, presidente de JAC, residente de obra y director del convenio a fin de despejar dudas de la comunidad.
* Se realiza revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realiza seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realiza mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio
* Se realiza el respectivo ajuste a precios unitarios del proyecto y se formulará la programación de obra y programación de compras.
* Se participa en comités de obra y demás que sean solicitados.
* Se hace visita en campo, lugar de la obra para tomar fotografías de los tramos y demás que sean necesarias.
* Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 21 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.

FECHA: 16/1/2025 (Día / Mes / Año)

* 02 Sep. Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS.
* Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.
* 05 sep. Se recibieron observaciones al Contratista GEOTECNIA TIC-INVIAS-1631-154
* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo.
* 16/09/2024 Se realizó visita al sitio de la obra con Interventoría, se solicitó la realización de una alcantarilla.
* 20/09/2024 Se instaló Valla informativa del Convenio.
* 23/09/2024 Se envió a interventoría relación de los pagos realizados hasta el momento.
* 25/09/2024 Se realizó revisión de cotizaciones de materiales en oficina de interventoría.
* 26/09/2024 JAC realizó solicitud de prórroga al convenio 4357 de 2023.
* 01/10/2024 Interventoría envió oficio Radicado: 2024E-VUVRAZ-096167 TIC-INVIAS-1631-166 INFORMANDO **LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA**
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 10/10/2024 Se realizó comité aprobación de COTIZACIONES de insumos y materiales.
* 15/10/2024 Se realizó comité de pagos a proveedores.
* **18/10/2024 INICIO OBRAS**
* 24/10/2024 Se realizó aprobación de estudios y diseños.
* 25/10/2024 - 31/10/2024 Se realizó Mejoramiento de subrasante en Pedraplén, Instalación tubería de concreto 36".
* 07/11/2024 DURANTE EL PERÍODO SE AVANZÓ EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL CONVENIO, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y APLICACIÓN DE SUBBASE GRNAULAR
* 05/11/2024 JAC INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
* 09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROGRAMACIÓN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONVENIO.
* 12/11/2024 SE REALIZÓ COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA.
* 13/11/2024 SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA PROYECTADA
* 18/11/2024 DURANTE EL PERÍODO SE AVANZÓ SATISFACTORIAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLAS.
* 25/11/2024 SE REALIZÓ COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 27/11/2024 DURANTE LA SEMANA SE AVANZÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLAS. JAC SOLICITA REVISIÓN EN SITIO PARA CONSTRUCCIÓN DE FILTROS
* 03/12/2024 Interventoría envió comunicado TIC-INVIAS-1631-238- CONCEPTO FAVORABLE AL ESTUDIO HIDRAULICO - TUBAVITA, con esto quedan todos los componentes técnicos aprobados.
* 04/12/2024 Se construyen Filtros en los 3 Tramos de placa huella, se evidencia flujo freático en los 3 sectores en intervención.
* 04/12/2024 Durante la semana se avanzó satisfactoriamente en la construcción de placa huellas.
* 11/12/2024 Durante la semana se avanzó satisfactoriamente en la construcción de placa huellas.
* 11/12/2024 Se realizó demolición de roca, para avanzar con la construcción de cuneta del tramo No.2
* 18/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* **30/12/2024 Se completó el 100% de las obras, placa huella en concreto. Longitud Ejecutada 123,5 mts de Placa huella + 1 Alcantarilla.**
* 02/01/2025 Se encuentra en realización el cierre Ambiental y Social del convenio.
* 13/01/2024 Interventoría realizo visita de obra, se realizaron observaciones al contratista para recibo definitivo de las obras.
* 16/01/2025 Se encuentra en gestión la ejecución del Rubro PAGA, y la actividad social de terminación de terminación de obras con la comunidad.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Avanzar en la construcción de las obras del convenio.
* Se realizará constante seguimiento a la ejecución del convenio en aspectos técnicos, administrativos, sociales, ambientales y sst.
* Se participará en comités operativos y demás que sean solicitados.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA


PLACAHUELLA

		SEMANA 34
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
MEJORAMIENTO CON PEDRAPLEN	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	103.78%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	103.78%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%



ALCANTARILLA

		SEMANA 34
Construcción Alcantarilla	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 ...13/01/2025 Tramo No3 100% Terminado



FOTO 2 13/01/2025 Tramo No.2 100% Terminado



Foto 3 13/01/2025 Tramo No.1 100% Terminado

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
2. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega prioritaria de los estudios y diseños (EyD) acorde a que NO se deben generar retrocesos que afecten,
3. El día 12-08-2024 La O.A.C. realiza entrega de los Estudios y Diseños.
4. El día 15-08-2024 y 16-08-2024 Los Ingenieros especialistas de La interventoría realiza observaciones a los Estudios y Diseños presentados.
5. El día 21-08-2024 La O.A.C. presenta subsanaciones a los Estudios y Diseños por observaciones de la Interventoría.
6. El día 28-08-2024 se emite concepto favorable por el especialista de vías para los Estudios y Diseños (EyD).
7. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A..C
8. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-109 - OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de TUBAVITA, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el periodo correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales genera la aplicación de las multas contempladas en el convenio.
9. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
10. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social
11. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.
* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 10 sep Se programó visita a la vereda teniendo en cuenta, que la alcantarilla a construir se encuentra sobre un terreno removido, la Ingeniera Residente solicitó inspección del sitio para autorizar la construcción de estructuras en este punto.
* 12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 16/09/2024 Interventoría realizó Visita al sitio de las obras, la comunidad solicitó realización de alcantarilla.
* 25/09/2024 Se realizó revisión de cotizaciones de materiales se hicieron observaciones a la JAC.
* 01/10/2024 Interventoría envió oficio Radicado: 2024E-VUVRAZ-096167 TIC-INVIAS-1631-166 INFORMANDO **LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA**
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 03/10/2024 Se realizó reunión virtual con INVIAS se expuso el estado general de los convenios.
* 10/10/2024 Se realizó comité aprobación de COTIZACIONES de insumos y materiales.
* 15/10/2024 Se realizó comité de pagos a proveedores.
* 29/10/2024 Se realizó comité de pagos a proveedores.
* 05/11/2024 JAC INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 14/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINA LAS JAC PARA CAPACITACIÓN POR PARTE INVIAS SOBRE AREA CONTABLE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS
* 12/11/2024 JAC INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 16/11/2024 INTERVENTORÍA REALIZA TOMA DE DENSIDADES DE CAMPO EN LA SUBBASE GRANULAR APLICADA
* 25/11/2024 JAC, INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 21/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINÓ LAS JAC PARA CAPACITACIÓN AMBIENTAL POR PARTE DE INVIAS.
* 02/12/2024 Interventoría Realizó comité de pagos a proveedores del convenio.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST
* 10/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST.
* 11/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 18/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 24/12/2024 Interventoría envió comunicado TIC-INVIAS-1631-263 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA TUBAVITA – VÉLEZ.
* 13/01/2025 Interventoría GESTIONÓ mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-275 - Solicitud de cambio de propuesta social Vereda Tubavita del municipio de Vélez al INVIAS.
* 15/01/2025 Interventoría realizó reunión virtual para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.
* 16/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 34 del 10/1/2025 al 16/1/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA **EL GAITAL** DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GAITAL		
CONVENIO No.	4367 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,016,649.00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,016,649.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,016,649.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,016,649.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 527,037,480.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 8,370,700.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO			
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	201,016,649.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150,762,486.75	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	14,368,678.77	7.15%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	136,393,807.98	67.85%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	27,844,817.52	13.85%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**201,016,649.00**	**100.00%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**42,213,496.29**	**21.00%**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	158,803,152.71	79.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	20,101,664.90	10.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	2,010,166.49	1.00%

Observaciones: El convenio se encuentra en etapa de ejecución de obras. Durante el período el avance en construcción fue poco sin embargo se realiza acopio de materiales en sitio y adquisición de insumos. A la fecha las condiciones climáticas han mejorado, sin embargo el terreno sigue siendo de difícil acceso. La consecución de Vibro compactador en la zona es difícil.

INTERVENTORÍA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	526,531,968.00	98.34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	527,037,480.00	98.44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% Avance o Atraso Físico % -90.91%
Meta Física Ejecutada % 9.09%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	110
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	110.00			110.00	100.00%
Ejec	10.00			10.00	9.09%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	5.871515582	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	-73.524041619	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: La JAC Presentó la cantera CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SAS NIT.900414198 localizada en el municipio de MONIQUIRÁ

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**6.0**	**7.0**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 7/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se realiza el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se realizó de una inspección en obra donde se encontró un afloramiento de aguas Subterráneas en la zona a intervenir a las cuales se le debe dar una alternativa de para las canalizaciones.
* Se realiza entrega de cotizaciones para los Estudios y Diseños.
* Se realiza comité técnico/operativo para aprobación de Cotización de estudios y diseños.
*Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 22 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 02 Sep. Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS.
* Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.
* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo.
* 10/09/2024 Se envió a interventoría cotizaciones de topografía para revisión.
* 13/09/2024 Se realizó reunión e n oficina con la interventoría, se revisó cotizaciones de materiales y ajuste presupuestal.

* 22/09/2024 Se envió a interventoría la relación de Pagos Realizados.
* 26/09/2024 Se trabajó en oficina la revisión de cotizaciones de materiales e insumos.
* 01/10/2024 Se envió TIC-INVIAS-1631-170- CONCEPTO FAVORABLE A LOS EYD - GAITAL
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 02/10/2024 El Presidente de la JAC manifestó verbalmente que la Junta realizará la Construcción del filtro necesario.
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 04/10/2024 Se realizó reunión extraordinaria con INTERVENTORÍA E INVIAS, la JAC se comprometió enviar las cotizaciones faltantes y el presupuesto proyectado. Y avanzar en la ejecución de obra teniendo en cuenta el tiempo que queda de ejecución.
* 09/10/2024 SE HAN HECHO OBSERVACIONES COTIZACIONES 09 OCT SE REALIZARÁ REVISIÓN FINAL Y COMITE DE APROBACIÓN DE COTIZACIONES.
* EL DÍA 17 DE OCTUBRE SE REALIZARÓ VISITA DE CAMPO PARA VERIFICAR LA MANERA DE REALIZAR LOS TRANSPORTES, POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO EL CONTRATISTA PROPONE REALIZAR UN ACOPIO DE MATERIAL PREVIO AL PUNTO DEFINITIVO DE DISPOSICIÓN EN OBRA.
* **21/10/2024 Inicio de actividades de Obra.**
* 24/10/2024 Se realizó comité de aprobación de COTIZACIONES DE INSUMOS Y MATERIALES.
* Hay poca disponibilidad de maquinaria en la zona (Vibrocompactador).
* 06/11/2024 A LA FECHA SE HAN ADQUIRIDO MATERIALES PÉTREOS, SE REALIZÓ TOPOGRAFÍA DE CAMPO, SE HAN REALIZADO CORRECCIÓN DE FALLOS EN ZONA DE LA PLACAHUELLA. sE REALIZA CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO EN CAMPO. SE HAN PRESENTADO LLUVIAS EN LA ULTIMA SEMANA QUE NO PERMITEN ACARREO DE MATERIALES.
* 07/11/2024 LAS VOLQUETAS CON MATERIAL NO HAN PODIDO ACCEDER AL SITIO DE LAS OBRAS DEBIDO AL ESTADO DE LA CARRETERA LA CUAL ES MUY PENDIENTE Y POR LAS LLUVIAS LOS VEHICULOS SE QUEDAN PATINANDO EN EL BARRO.
* 08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
* 08/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROGRAMACIÓN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONVENIO.
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA.
* 15/11/2024 INTERVENTORÍA APROBÓ LA HOJA DE VIDA DE LA INGENIERA RESIDENTE LAURA PINZÓN.
* 18/11/2024 LAS CONSTANTES LLUVIAS PRESENTADAS DURANTE EL PERÍODO AFECTAN GRANDEMENTE LA VÍA DE ACCESO, NO ES FACTIBLE SUBIR MATERIALES A OBRA, DE IGUAL MANERA LA CONSECUCIÓN DE MAQUINARIA (VIBROCOMPACTADOR) ES DIFICIL, SE EVALÚA EL TIPO DE VIBROCOMPACTADOR A UTILIZAR YA QUE NO DEBE SER MUY PESADO.
* 20/11/2024 EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN REPROGRAMACIÓN DE OBRAS.
* 22/11/2024 EL ING REYNALDO MANTILLA DE INVIAS (SANTANDER) REALIZÓ VISITA AL SITIO, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 25/11/2024 EL ING. PEDRO J BARÓN DE INVIAS (BOGOTÁ) REALIZÓ VISITA AL SITIO CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 05/12/2024 Durante la última semana se cuenta con mejores condiciones del terreno, se ingresó maquinaria retroexcavadora para realizar adecuación de la subrasante. Se acopian materiales en sitio
* 10/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST. Se evidencia la necesidad de realizar filtros en terreno.
* 11/12/2024 Durante el período se realizó acopio de materiales pétreos, Conformación de subrasante, cargue de materiales en acopio
* 11/12/2024 El transporte de materiales pétreos se realiza en dos etapas, la primera desde la cantera (Moniquirá) hasta el sitio de acopio (Sector Colegio Gaital), la segunda etapa consiste en realizar cargue de volquetas a media capacidad desde ese punto de acopio hasta el sitio de la obra, recorrido de aproximadamente 1,4 Km de alta pendiente, vía destapara, estrecha con dificultad de acceso en época de lluvias.
* 17/12/2024 Se realiza extendido y compactación de subbase granular.
* 18/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 20/12/2024 Se realiza aplicación y compactación de subbase granular
* 20/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 24/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-264 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA GAITAL VÉLEZ
* 26/12/2024 Durante el período se han presentado lluvias, las cuales afectan la vía de acceso al sitio de las obras, no es posible subir materiales pétreos desde el punto colegio hasta la obra.
* 02/01/2025 No se realizaron actividades en obra durante la última semana.
* 09/01/2025 No se realizaron actividades en obra durante la última semana.
* 13/01/2025 Se retoman actividades en obra, se realiza arreglo vía de acceso manualmente, se reciben materiales en obra, se hace encofrado para planchuelas.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se dará continuidad a la construcción de la obra, se espera tener la totalidad de la subbase granular aplicada y compactada.
* Se dará inicio a la construcción de estructura de placa huella en concreto reforzado de 3000 psi.
* Se realizará suministro de materiales de obra.
* Se realizarán pagos a proveedores del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 24
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	65.00%
	EJEC	0.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	65.00%
	EJEC	0.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	75.00%
	EJEC	20.00%

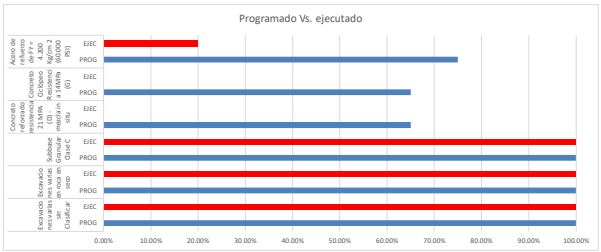

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1
13/01/2025 Construcción formaleta para placa huella



FOTO 2
14/01/2025 Toma densidades de campo en subbase por parte interventoría



FOTO 3
16/01/2025 Materiales puestos en obra

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del convenciado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
2. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega prioritaria de los estudios y diseños (EyD) acorde a que NO se deben generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en los tiempos ya estipulados.
3. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A.C

4. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-111 - OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de GAITAL, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el periodo correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales genera la aplicación de las multas contempladas en el convenio.

5. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
6. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social pagadas.

7. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.

* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios.
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 13/09/2024 Interventoría envió a todas las JAC TIC-INVIAS-1631-163 - Reiteración oficio TIC-INVIAS-1631-157 del 05/09/2024 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras
* 25/09/2024 Interventoría envió requerimiento a la JAC instalación de Buzón de PQR.
* 26/09/2024 Interventoría atendió en oficina a la JAC para las cotizaciones de materiales.
* 01/10/2024 Se envió TIC-INVIAS-1631-170- CONCEPTO FAVORABLE A LOS EYD - GAITAL
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 02/10/2024 El Presidente de la JAC manifestó verbalmente que la Junta realizará la Construcción del filtro necesario.
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 03/10/2024 Interventoría expuso a INVIAS el estado general de los convenios en reunión virtual, se programó reunión extraordinaria para el día siguiente con las juntas GAITAL Y GUAMAL.
* 04/10/2024 Se realizó reunión extraordinaria con INTERVENTORÍA E INVIAS, la JAC se comprometió enviar las cotizaciones faltantes y el presupuesto proyectado. Y avanzar en la ejecución de obra teniendo en cuenta el tiempo que queda de ejecución.
* EL DÍA 17 DE OCTUBRE INTERVENTORÍA REALIZARÓ VISITA DE CAMPO PARA VERIFICAR LA MANERA DE REALIZAR LOS TRANSPORTES, POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO EL CONTRATISTA PROPONE REALIZAR UN ACOPIO DE MATERIAL PREVIO AL PUNTO DEFINITIVO DE DISPOSICIÓN EN OBRA. SE REALIZÓ REUNIÓN CON LA VEEDURÍA PARA ESTABLECER LA METODOLOGÍA DE TRANSPORTE.
* 24/10/2024 Se realizó comité de aprobación de COTIZACIONES DE INSUMOS Y MATERIALES.
* 05/11/2024 Interventoría realizó conjuntamente con la JAC y Veeduría COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 14/11/2024 Interventoría realizó conjuntamente con la JAC y Veeduría COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO

* 19/11/2024 Interventoría realizó visita de obra Director, Social, SST y Residente de Interventoría al sitio de las obras, para verificar el avance del convenio y el estado de la vía de acceso.

* 19/11/2024 Interventoría realizó COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO, EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ
* 22/11/2024 Interventoría realizó acompañamiento a la visita del ingeniero Reynaldo Mantilla de INVIAS SANTADNER.
* 25/11/2024 El Director de Interventoría realizó la visita conjunta con el Ing. Pedro J Barón a la obra, se verificó el avance de obra y el estado de la vía de acceso.
* 02/12/2024 Interventoría Autorizó comité de pagos a proveedores del convenio.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST.
* 10/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST.
* 11/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.

* 14/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-248 POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PROPIAS DEL CONVENIO 4367 -2023 JAC GAITAL.

* 18/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 20/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 24/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-264 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA GAITAL VÉLEZ
* 03/01/2025 Interventoría RADICÓ comunicado TIC-INVIAS-1631-269 - Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – Convenios No. 4367 de 2023 – OAC VEREDA GAITAL.
* 09/01/2025 Interventoría verifica la no actividad en obra durante la última semana.
* 14/01/2025 Interventoría realiza toma de densidades de campo en la Sub-base granular aplicada.
* 15/01/2025 Interventoría realizó reunión virtual para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.
* 16/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **34** del 10/1/2025 al 16/1/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE **TEBAIDA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

1 Tramo Placa huella y Una (1) alcantarilla en concreto reforzado; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TEBAIDA

CONVENIO No.	4424 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,996,240.00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,996,240.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,996,240.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,996,240.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 394,093,490.00	$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 527,037,480		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 394,093,490.00	$ 8,370,700		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200,996,240.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 150,747,180.00	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 68,000,007.00	33.83%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 82,747,173.00	41.17%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 32,498,113.00	16.17%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$ 200,996,240.00**	**100.00%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$ 100,498,120.00**	**50.00%**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 100,498,120.00	50.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20,099,624.00	10.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 30,149,436.00	15.00%

Observaciones: El avance se ve reflejado en los gastos administrativos ejecutados y la compra de materiales para realización de las obras. Durante el período se realizaron actividades constructivas de manera satisfactoria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 526,531,968.00	98.34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 527,037,480.00	98.44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% — Avance o Atraso Físico %: -60.71%
Meta Física Ejecutada %: 39.29%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	140
*	Alcantarilla	Unidad	1
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	140.00				100.00%
Ejec	55.00				39.29%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico seman

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg) 52. Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades se

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	**5.871515582**	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	-73.52404162	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: La JAC Presentó la cantera CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SAS NIT.900414198 localizada en el municipio de MONIQUIRÁ

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9.00	7.00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9.00	7.00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.00	0.00
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.00	0.00

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 7/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se continua en este periodo por parte de la JAC actualización de Presupuesto de Obra.
* Se envían para aprobación de la interventoría cotizaciones de (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se inicia la vinculación de personal mano de obra no calificada y maestro general.
* Se participa de reunión técnica programada por la interventoría.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio y avance de los estudios y diseños para lograr pasar a la ejecución del proyecto, fue rechazada la propuesta de los estudios y Diseños por presupuesto ya se está realizando nuevas cotizaciones y se realizará entrega nuevamente para
* Se realizó nuevamente entrega de cotizaciones para los Estudios y Diseños.
* Se realizó comité técnico/operativo para aprobación de Cotización de estudios y diseños.
* Se realizaron tomas de muestras de subrasante para estudios y diseños.
* Se radica a la aseguradora solicitud para actualización de pólizas.
* Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 21 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 02 Sep. Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS.
* Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.

* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo.
* 10/09/2024 Se envió a interventoría los Estudios y Diseños del convenio para revisión.
* 11/09/2024 Se Instaló el buzón de sugerencias para la comunidad.
* 18/09/2024 Se realizó revisión de cotizaciones y de presupuesto en la oficina de interventoría
* 23/09/2024 Se recibió oficio TIC-INVIAS-1631-168 con las observaciones del área de PAVIMENTOS a la JAC
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 03/10/2024 Se envío Diseño Hidráulico a la Especialista Eugenia Villegas
* 05/10/2024 Se emitió TIC-INVIAS-1631-171- CONCEPTO FAVORABLE A LOS EYD - TEBAIDA
* 08/10/24 Se realizó comité de pagos a proveedores del convenio.
* 18/10/2024 se REALIZÓ COMITÉ DE APROBACIÓN DE COTIZACIONES.
* **21/10/2024 Se inician labores de obra.**
* 22/10/2024 Se realiza comité de pagos a proveedores.
* Se realiza acopio de materiales en obra, se cubren materiales pétreos con plástico.
* Se realiza corte y figurado de acero de refuerzo, para viguetas de placa huella.
* 5/11/2024 SE REALIZA COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 06/11/2024 SE ACOPIAN MATERIALES EN OBRA CONTINUA FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO LAS LLUVIAS PRESENTADAS ATRASAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
* 07/11/2024 LA OCURRENCIA DE LLUVIAS EN LA ZONA DIFICULTA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y BAJA EL RENDIMIENTO DE LAS ACTIIDADES DE OBRA.
* 08/11/2024 SE AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA.
* 08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
* 09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROC}
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA
* 18/11/2024 A CAUSA DE LAS LLUVIAS PRESENTADAS DIARIAMENTE DURANTE EL PERÍODO, EL ESTADO DE LA VÍA NO PERMITE EL ACCESO DE VEHÍCULOS PESADOS CON MATERIALES, LA COMUNIDAD SOLICITÓ ESPERAR A QUE CESEN LAS LLUVIAS PARA TRANSITAR CON VEHÍCULOS PESADOS POR LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA, DE IGUAL MANERA SE REQUIERE LA REALIZACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO PARA INGRESAR MATERIALES.
* 19/11/2024 SE REALIZA COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 20/11/2024 EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN REPROGRAMACIÓN DE OBRAS.
* 22/11/2024 EL ING REYNALDO MANTILLA DE INVIAS (SANTANDER) REALIZÓ VISITA AL SITIO, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 25/11/2024 EL ING. PEDRO J BARÓN DE INVIAS (BOGOTÁ) REALIZÓ VISITA AL SITIO CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO. SE TOMO LA DESICIÓN CONJUNTA CON LA COMUNIDAD DE REALIZAR EL TRASIEGO DE MATERIALES A LA OBRA EN CAMIONETA PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y DISMINUIR EL DAÑO EN LA VÍA
* 25/11/2024 SE REALIZA COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 02/12/2024 Se Tiene compactado 70% del tramo de subbase granular para iniciar instalación de acero de refuerzo y formaleta en sitio.
* 03/12/2024 Inicia Instalación de formaleta en madera para placa huellas.
* 04/12/2024 Durante la semana el alcance en obra a sido satisfactorio, ya se tiene 70% de la subbase granular compactada, para iniciar la construcción de concreto reforzado de placa huella
* 09/12/2024 Ingreso ayudante de construcción Tatiana.
* 11/12/2024 Durante el período se avanzo satisfactoriamente en la construcción de las obras, se tiene subbase granular compactada y el día 10 dic se realizó la primera fundida de concreto clase D huellas
* 17/12/2024 Inicio fundida de Viguetas en concreto 3000psi.
* 18/12/2024 Se realiza construcción de piedra pegada en zona central de la placa huella
* 20/12/2024 Se realiza fundida de riostras en concreto 3000psi reforzado.
* 30/12/2024 Avanza construcción de palca huellas de manera satisfactoria.
* 02/01/2025 No se evidencia realización de actividades en obra.
* 07/01/2025 Se retoman actividades en obra, avanza construcción de placa huellas en concreto reforzado 3000 psi.
* 07/01/2025 Se realiza trasiego de materiales en camioneta, desde el sector La Florida hasta la obra.
* 16/01/2025 Continúa construcción de placa huellas instalación de acero de refuerzo para riostras.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se dará continuidad a la construcción de la obra, se espera tener la subbase granular aplicada y compactada.
* Se dará continuidad a la construcción de estructura de placa huella en concreto reforzado de 3000 psi.
* Se realizará suministro de materiales de obra.
* Se realizarán pagos a proveedores del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA


PLACAHUELLA

		SEMANA 34
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	39.29%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	39.29%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	49.29%



ALCANTARILLA

		SEMANA 34
Construcción Alcantarilla	PROG	100.00%
	EJEC	50.00%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
14/01/2025 Replanteo en subbase granular para construcción de riostras



FOTO 2
15/01/2025 Replanteo en subbase granular para construcción de riostras



FOTO 3
16/01/2025 Instalación acero de refuerzo para riostras

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del convenio realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
2. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega prioritaria de los estudios y diseños (EyD) acorde a que NO se deben generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en los tiempos ya estipulados.
3. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoria e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A.C
4. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-108 - OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de TEBAIDA, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el periodo correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales genera la aplicación de las multas contempladas en el convenio.
5. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
6. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social pagadas.
7. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.
* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios.
* 13/09/2024 Interventoría envió a todas las JAC TIC-INVIAS-1631-163 - Reiteración oficio TIC-INVIAS-1631-157 del 05/09/2024 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 23/09/2024 Se envió oficio TIC-INVIAS-1631-168 con las observaciones No.2 del área de PAVIMENTOS a la JAC .
* 26/09/2024 Interventoría Programo REUNIÓN Virtual con el Ing. Nelson Acevedo Gestor Ambiental para consultar sobre la aprobación de fuentes de materiales para los convenios.
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 03/10/2024 Se envío Diseño Hidráulico a la Especialista Eugenia Villegas
* 18/10/2024 se REALIZÓ COMITÉ DE APROBACIÓN DE COTIZACIONES.
* 22/10/2024 Interventoría y JAC realizan comité de pagos a proveedores.
* 5/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEDURA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 14/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINA LAS JAC PARA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN CONTABLE POR PARTE DE INVIAS
* 19/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 19/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINA LAS JAC PARA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN AMBIENTAL POR PARTE DE INVIAS
* 22/11/2024 INTERVENTORÍA REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A VISITA DEL ING REYNALDO MANTILLA DE INVIAS (SANTANDER) QUIEN REALIZÓ VISITA AL SITIO, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 25/11/2024 EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Y EL ING. PEDRO J BARÓN DE INVIAS (BOGOTÁ) REALIZAN VISITA AL SITIO CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO. SE TOMO LA DESICIÓN
* 25/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 02/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST
* 10/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST.
* 11/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 17/12/2024 Interventoría realiza toma de densidades en la subbase granular aplicada.
* 18/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 19/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-251 CONCEPTO FAVORABLE AL ESTUDIO DE GEOTECNIA CORRESPONDIENTE A LOS EYD - TEBAIDA
* 02/01/2025 Interventoría realiza permanente seguimiento a la ejecución de las obras, mediante inspección visual de las mismas.
* 14/01/2025 Interventoría realiza visita inspección de obra.
* 15/01/2025 Interventoría realizó reunión virtual para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.
* 16/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,

Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 16/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **34** del 10/1/2025 al 16/1/2025 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA **LA PALMERA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALMERA

CONVENIO No.	4565 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,029,468.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,029,468.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/1/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%

CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 81,075,700.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,029,468.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,029,468.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 527,037,480		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 8,370,700		

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	201,029,468.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150,772,101.00	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	156,585,635.00	77.89%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-$	5,813,534.00	-2.89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$	44,443,833.00	22.11%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**201,029,468.00**	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**201,029,468.00**	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	32,164,714.88	16.00%

Observaciones: Las OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS corresponde a pagos realizados a proveedores del convenio, incluyendo pagos adelantados de materiales. Durante el período se avanzó satisfactoriamente en la construcción de las obras.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	526,531,968.00	98.34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	527,037,480.00	98.44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% — Avance o Atraso Físico %: 1.68%
Meta Física Ejecutada %: 101.68%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	119
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	119.00			119.00	100.00%
Ejec	121.00			121.00	101.68%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	**5.8715078**	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	-7.3524087	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

LA FUENTE DE MATERIALES PÉTREOS ESCOGIDA ES **"CALIZAS Y MINERALES S.A.S. NIT. 900414198-1** LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: EN GESTIÓN

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10.00	7.00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10.00	7.00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.00	0.00
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.00	0.00

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial el 6/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se realizó la socialización con la junta de acción comunal vereda Palmera del municipio de Vélez - Santander
* 9 habitantes de la Vereda La Palmera estuvieron realizando demolición de las cintas huellas con demoledores y herramienta manual pero no pudieron avanzar mucho debido a que el concreto reforzado estaba bastante resistente por lo cual finalmente analizaron la opción de gestionar una retroexcavadora con la Alcaldía o particular para ejecutar
* Se realizó por parte del Ingeniero Geotecnia la actividad de campo para la toma de muestras de suelo en la zona del proyecto para el correspondiente estudio de suelos
* Se realizó levantamiento topográfico del sitio del proyecto.
* Se realiza entrega de cotizaciones para los Estudios y Diseños
* Se realiza comité técnico/operativo para aprobación de Cotización de estudios y diseños.
* Se realiza el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se realiza visita y recorrido con el Ing. Director del INVIAS Santander Marlon Gamboa, JAC e Interventoría el día 04 de julio 2024, En la zona del proyecto estuvieron presentes la Interventoría y delegados del INVIAS con el fin de revisar el estado del proyecto. Se aprovechó esta visita para sugerirles a modo de solicitud de lo siguiente: 1) la posibilidad
* La comunidad de la Vereda La Palmera, realizará gestión administrativa para conseguir una retroexcavadora y de esa forma demoler las cintas huellas
* La firma encargada de los estudios del proyecto, realizará el correspondiente estudio de tránsito, hidrológico e hidráulico de la zona del proyecto para la entrega final de todos estudios
* Radicar a la Interventoría el ajuste de los estudios y diseños.
* Se le informó a la firma encargada de los estudios y diseños, las observaciones realizadas por la Interventoría para subsanación.
* Se radicó oficio en la Alcaldía Municipal de Vélez, comunicándole al Señor Alcalde el proyecto de placa huellas que se va a realizar en la Vereda La Palmera, entre el INVIAS y la JAC de la Vereda La Palmera
* Se trabajó en la actualización del presupuesto, y a la espera de la aprobación final de los estudios y diseños para terminar esta actividad.
* Se realizó la socialización con la junta de acción comunal vereda Palmera del municipio de Vélez - Santander
* Se realiza el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
*Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 21 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 28/0'8/2024 Interventoría emitió TIC-INVIAS-1631-148- CONCEPTO FAVORABLE A LOS EYD - LA PALMERA
* 02/09/2024 Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS.
* 02/10/2024 Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* 03/09/2024 Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.

FECHA: 16/1/2025 (Día / Mes / Año)

* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo
* 11/09/2024 Se realizó comité operativo aprobación de cotizaciones de insumos y materiales.
* 24/09/2024 Interventoría envió a INVIAS TIC-INVIAS-1631-169 - Placa Huella. Vereda La Palmera, Municipio de Vélez. Oficio de interventoría a INVIAS solicitando revisión y aval de la construcción de la placa huella sobre las huellas existentes.
* 24/09/2024 Se emitió concepto aprobatorio al diseño de pavimentos presentado por la JAC
* 01/10/2024 Se realizó reunión con INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 08/10/2024 Se realizaron pagos a proveedores del Convenio
* 08/10/2024 Se realizó visita de campo para verificar las cinta huellas existentes en sitio, se realizará demolición de esta estructura con el fin de garantizar la cimentación de la nueva placa huella.
* 17/10/2024 SE REALIZA REVISIÓN PRESUPUESTO AJUTADO, TENIENDO EN CUENTA LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE LA CINTA HUELLA EXISTENTE. SE ENCUENTRA EN REALIZACIÓN EXAMENES MÉDICOS DEL PERSONAL QUE VA A TRABAJAR EN OBRA
* **INICIO OBRAS 18/10/2024**
* SE REALIZÓ DEMOLICIÓN DE LAS CINTA HUELLAS EN CONCRETO REFORZADO EXISTENTES.
* DURANTE LA SEMANA ENTRE EL 24-30 OCT SE AVANZÓ POCO DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EQUIPOS DE MAQUINARIA EN LA ZONA.
* 5/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEDURA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 06/11/2024 SE PRESENTAN LLUVIAS DIARIAMENTE DURANTE LA ULTIMA SEMANA LO CUAL DIFICULTA EL INGRESO DE MAQUINARIA AL SECTOR, DEBIDO AL ESTADO DEL TERRENO Y DE LAS ALTAS PENDIENTES
* 07/11/2024 LAS VOLQUETAS CON MATERIAL NO HAN PODIDO ACCEDER AL SITIO DE LAS OBRAS DEBIDO AL ESTADO DE LA CARRETERA LA CUAL ES MUY PENDIENTE Y POR LAS LLUVIAS LOS VEHICULOS SE QUEDAN PATINANDO EN EL BARRO.
* 08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
* 09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROGRAMACIÓN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONVENIO.
* 12/11/2024 SE REALIZÓ COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA
* 18/11/2024 LA OCURRENCIA DIARIA DE LLUVIAS NO PERMITE EL INGRESO DE VEHÍCULOS PESADOS A LA VEREDA, VA A SER NECESARIO REALIZAR AFIRMADOS EN LA VÍA DE ACCESO PARA PODER INGRESAR MATERIALES.
* 19/11/2024 JAC, INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 20/11/2024 EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN REPROGRAMACIÓN DE OBRAS.
* 25/11/2024 EL ING. PEDRO J BARÓN DE INVIAS (BOGOTÁ) REALIZÓ VISITA AL SITIO CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 27/11/2024 EL ESTADO DEL CLIMA HA MEJORADO, SE REACTIVAN LAS ACTIVIDADES DE OBRA, SIN EMBARGO EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO SIGUE SIENDO DIFÍCIL Y EL TRAFICO PESADO DE LA ZONA AFECTA DEMASIADO LA VÍA
* 28/11/2024 Se realiza la primera fundida de concreto 3000 psi para placa huella, se implementa sistema de canal para manejo del concreto. Hoy la interventoría toma densidades de campo en la subbase granular.
* 02/12/2024 Se realiza instalación de concreto piedra pegada centro y anchos.
* 04/11/2024 Durante la semana avanzó satisfactoriamente la construcción de placa huellas en concreto 3000 psi, se tienen 30 ml de placa huella fundidos
* 11/12/2024 Durante el período se avanzó satisfactoriamente en la construcción de las obras
* 19/12/2024 Se realiza construcción de placa huellas en concreto reforzado K0+080
* **30/12/2024 Se alcanza ejecución del 100% de la obra placa huella en concreto 3000 psi. Placa huella L=121m**
* 02/01/2025 Se encuentra en realización el cierre Ambiental y Social del convenio.
* 13/01/2024 Interventoría realizo visita de obra, se realizaron observaciones al contratista para recibo definitivo de las obras.
* 16/01/2025 Se encuentra en gestión la ejecución del Rubro PAGA, y la actividad social de terminación de terminación de obras con la comunidad

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se dará continuidad a la construcción de la obra, se tiene la subbase granular aplicada y compactada.
* Se dará continuidad a la construcción de estructura de placa huella en concreto reforzado de 3000 psi.
* Se realizará suministro de materiales de obra.
* Se realizarán pagos a proveedores del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA:

		SEMANA 34
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	101.68%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	101.68%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	110.00%
	EJEC	101.68%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
13/01/2025 Obra Terminada



FOTO 2
13/01/2025 Obra Terminada



FOTO 3
13/01/2025 Obra Terminada

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad
2. La interventoría emite Respuesta el día 23-07-2024 con observaciones a los Estudios y Diseños presentados por la J.A.C. La Palmera el día 20-07-2024, Haciendo hincapié a que el día 20-07-2024 se les realizó observación puntual por no adjuntar el Estudio de Suelos y geotécnico.
3. El día 29-07-2024 la O.A.C. realiza entrega de Estudio de Suelos y geotécnico correspondiente a los Estudios y Diseños (EyD).
4. El día 02-08-2024 Interventoría realiza observaciones al Estudio de Suelos y geotécnico correspondiente a los Estudios y Diseños (EyD).
5. El día 28-08-2024 se dio concepto favorable por parte del especialista de vías para los EyD.
6. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A.C
7. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-110- OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de LA PALMERA, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el período correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales genera la aplicación de las multas contempladas en el convenio
8. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
9. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social pagadas.
10. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.
* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios.
* 13/09/2024 Interventoría envió a todas las JAC TIC-INVIAS-1631-163 - Reiteración oficio TIC-INVIAS-1631-157 del 05/09/2024 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 24/09/2024 Interventoría envió a INVIAS TIC-INVIAS-1631-169 - Placa Huella. Vereda La Palmera, Municipio de Vélez. Oficio de interventoría a INVIAS solicitando revisión y aval de la construcción de la placa huella sobre las huellas existentes.
* 24/09/2024 Se emitió concepto aprobatorio al diseño de pavimentos presentado por la JAC
* 01/10/2024 Se realizó reunión con INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores

* 08/10/2024 Interventoría autorizó realización de pagos a proveedores.
* 22/10/2024 Interventoría autorizó realización de pagos a proveedores.
* 29/10/2024 Interventoría autorizó realización de pagos a proveedores.
* 5/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEDURA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 12/11/2024 JAC, INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 14/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINÓ LA ASISTENCIA DE LAS JAC A CAPACITACIÓN CONTABLE PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS.
* 19/11/2024 JAC, INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 25/11/2024 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REALIZÓ VIVISTA CONJUNTAMENTE CON INVIAS BOGOTÁ A LA OBRA, VERIFICAR ESTADO DE OBRA.
* 02/12/2024 Interventoría Realizó comité de pagos a proveedores del convenio.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST
* 11/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría realizaron comité operativo de pago a proveedores.
* 18/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría realizaron comité operativo de pago a proveedores.
* 19/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-253 CONCEPTO FAVORABLE AL ESTUDIO DE GEOTECNIA CORRESPONDIENTE A LOS EYD - LA PALMERA
* 24/12/2024 Interventoría emitió el comunicado TIC-INVIAS-1631-266 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA LA PALMERA -VELEZ
* 15/01/2025 Interventoría realizó reunión virtual para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.
* 16/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER SEMANA No.: **35** del 17/1/2025 al 23/1/2025 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA **GUAMAL** DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL

CONVENIO No.	3951 de 2023	VALOR INICIAL:	$	201,006,719.00	
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	201,006,719.00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/12/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%

CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$	394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$	141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$	535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$	-
		VALOR AMORTIZADO:	$	-
		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,006,719.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,006,719.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 531,222,234		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 4,185,946		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	201,006,719.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150,755,039.25	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	159,507,243.18	79.35%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(8,752,203.93)	-4.35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$	36,072,294.41	17.95%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**201,006,719.00**	**100.00%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**195,579,537.59**	**97.30%**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(8,752,203.93)	-4.35%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%

Observaciones: El valor correspondiente a la inversión total ejecutada corresponde a la suma de pagos realizadas en todos los rubros (Costos Directos, Gastos Administrativos, PAGA, etc). En este momento la JAC se encuentra en proceso de devolución de rendimientos financieros, y cancelación de la cuenta.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 530,969,478.00	99.17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 531,222,234.00	99.22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% Avance o Atraso Físico % 4.89%
Meta Física Ejecutada % 104.89%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	metros lineales	140
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	140.00			140.00	100.00%
Ejec	**146.85**			**146.85**	**104.89%**
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de opera	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchill	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO UNICO DE PLACAHUELLA TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	5.89916	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	-73.58554	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: La JAC Presentó la cantera CANTERA EL CAIRO S.A.S. NIT. 900729004 localizada en KM 6 VIA MONIQUIRA-TUNJA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN REVISIÓN

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10.00	7.00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10.00	7.00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.00	0.00
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.00	0.00

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 7/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se da inicio a las actividades con la junta de acción comunal vereda Guamal del municipio de Bolívar - Santander
* Se realiza el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se realiza entrega de cotizaciones para Estudios y Diseños.
* Se asiste a comité semanal en conjunto con Interventoría.
* Se realiza entrega de cotizaciones correspondientes a los Estudios y Diseños (EyD), las cuales no fueron aprobadas por la interventoría, por elevados costos.
* Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 22 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 02 Sep. Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS
* Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 23/1/2025 (Día / Mes / Año)

* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo.
* 10/09/2024 JAC presentó cotización para realización de Estudios y diseños del convenio.
* 17/09/2024 Se realizó aprobación de la cotización de Estudios y diseños por 4'500.000
* 17/09/2024 Se envió a la Interventoría los Estudios y diseños, Interventoría respondió Observaciones.
* 20/09/2024 Se recibió comunicado TIC-INVIAS-1631-165 Solicitando completar los estudios y diseños.
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 03/10/2024 Se realizó reunión INTERVENTORÍA - INVIAS se expuso el estado general de los convenios, sin embargo se programó reunión extraordinaria con las veredas GUAMAL Y GAITAL.
* 04/10/2024 Se estableció compromiso por parte de la JAC de presentar la documentación pendiente y adelantar la gestión necesaria para realización del convenio, con mayor diligencia y compromiso.
* 08/10/2024 Se realizó visita al sitio, esta visita había sido solicitada porque los dueños de los predios aledaños no dejaban hacer volteadero para las volquetas, sin embargo al llegar al sitio estaba reunida gran parte de la comunidad solicitaron hacer las placa huellas en el sector que más lo requiere, que es iniciando el corredor vial, un sector de alta pendiente.
* 08/10/2024 Se solicitó al diseñador realizar el cambio de tramo, se autorizó el pago de estos diseños adicionales al proveedor.
* 09/10/2024 SE trabajó revisión de cotizaciones vía Google meet. En espera de los diseños definitivos
* 10/10/2024 Interventoría emitió TIC-INVIAS-1631-175- Observaciones del especialista en geotecnia a los EyD - GUAMAL
* 16/10/2024 A la fecha la JAC no ha presentado los diseños definitivos del tramo a intervenir
* 21/10/2024 Se realizó topografía de terreno para completar el levantamiento de diseño del tramo priorizado.
* 22/10/2024 Se realizó **comité aprobación de cotizaciones** de materiales e insumos representativos del convenio.
* 23/10/2024 Por vía WhatsApp se enviaron documentos de diseño, pero hace falta una entrega organizada y formal del los diseños del nuevo tramo.

29/10/2024 JAC envío correo con estudios y diseños, sin embargo, la documentación no está completa falta diseño geométrico.
29/10/2024 Se realizó **ajuste del presupuesto** de obra
29/10/2024 Se realizaron pagos para materiales de construcción,
29/10/2024 JAC norma renuncia del ingeniero residente, envió hoja de vida de ingeniero residente para aprobación.
01/11/2024 INICIO OBRAS
05/11/2024 Se realizó COMITÉ DE PAGOS a proveedores del convenio.
06/11/2024 SE TIENE APLICADA SUBBASE GRANULAR, SE REALIZA FIGURADO DE ACERO Y FORMALETA PARA PLACAHUELLA
08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROGRAMACIÓN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONVENIO.
13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA.
18/11/2024 DURANTE EL PERÍODO SE AVANZÓ SATISFACTORIAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE PLACAHUELLAS.
19/11/2024 NO FUÉ POSIBLE REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES, EL BANCO NO ENTREGA AÚN LA CHEQUERA SOLICITADA POR LA JUNTA
25/11/2024 SE REALIZÓ COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
27/11/2024 DURAN TE EL PERÍODO SE AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLAS EN CONCRETO 3000PSI.
27/11/2024 SE PROGRAMA HOY REUNION VIRTUAL CON EL DISEÑADOR PARA QUE PRESENTE CORRECCIONES A LOS INFORMES DE DISEÑO.
04/12/2024 Durante la última semana se avanzó satisfactoriamente en la construcción de placa huellas.
11/12/2024 Durante la última semana se avanzó satisfactoriamente en la construcción de placa huellas. fecha terminación 16/12/2024
16/12/2024 Se tiene ejecutado el 100% de la meta física programada. Tramo Placa huella L=146,85 mts
26/12/2024 Se encuentra en realización la gestión para cierre de la cuenta bancaria y liquidación del convenio.
02/01/2025 Se encuentra en realización el cierre Ambiental y Social del convenio.
16/01/2024 en este momento se encuentra en gestión la ejecución del RUBRO PAGA.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se realizará la actividad PAGA-
* Dar cierre a la gestión ambiental del CONVENIO
* Realizar los Pagos pendientes principalmente de tipo administrativo, Planillas de se social, Devolución de retenciones, Devolución de rendimientos, etc.
* Dar cierre a la parte contable y cuenta del convenio.

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA:

		SEMANA 24
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
12/12/2024 Placa huella Construida



FOTOGRAFÍA 2
12/12/2024 Placa huella Construida



FOTOGRAFÍA 3
12/12/2024 Construcción de placa huellas

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
2. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega prioritaria de los estudios y diseños (EyD), de acuerdo a que oportunamente se realizó y se dio un visto bueno a la cotización presentada, no obstante, el Ingeniero Aldahir Peña, argumenta que han tenido inconvenientes con el correo electrónico y que se ha dificultado recopilar la información.
* 25/07/2024 Se envió un oficio TIC-INVIAS-1631-096, en el cual se expone la preocupación por la dilatación de tiempos de entrega de documentación requerida (especialmente Estudios y Diseños), acorde a que no se han obtenido respuestas a las solicitudes emitidas por parte del personal de interventoría.

Por parte de la interventoría se les envía información correspondiente y se encuentra disponible para cualquier inquietud, no obstante, haciendo hincapié a que no se pueden extender los tiempos de entrega, porque podría afectar y generar un detrimento en el periodo estipulado de finalización del proyecto.
3. Por parte de la O.A.C. presente nuevamente cotizaciones para los Estudios y Diseños (EyD), lo cual no corresponde a los costos del sector, siendo estos muy elevados.
4. La O.A.C. se encuentra realizando subsanaciones de acuerdo a observaciones emitidas por la Interventoría.
5. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A.C
6. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-114 - OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de GUAMAL, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni
7. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
8. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social pagadas.
9. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.
* A la fecha del presente informe, la JAC Guamal no ha presentado cotizaciones de ESTUDIOS Y DISEÑOS con precios ajustados al mercado.
* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
*12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 17/09/2024 Interventoría realizó aprobación de pagos con cheque para gastos administrativos.
* 20/09/2024 Interventoría envió al especialista en Geotecnia el estudio presentado (Faltaron Estudios de diseño geométrico y Pavimentos).
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas

* 03/10/2024 Se realizó reunión INTERVENTORÍA - INVIAS se expuso el estado general de los convenios, sin embargo se programó reunión extraordinaria con las veredas GUAMAL Y GAITAL.

* 04/10/2024 Se estableció compromiso por parte de la JAC de presentar la documentación pendiente y adelantar la gestión necesaria para realización del convenio, con mayor diligencia y compromiso.

* 08/10/2024 Interventoría realizó visita al sitio, esta visita había sido solicitada porque los dueños de los predios aledaños no dejaban hacer volteadero para las volquetas, sin embargo al llegar al sitio estaba reunida gran parte de la comunidad solicitaron hacer las placa huellas en el sector que más lo requiere, que es iniciando el corredor vial, un sector de alta pendiente.
* 10/10/2024 Interventoría emitió TIC-INVIAS-1631-175- Observaciones del especialista en geotecnia a los EyD - GUAMAL
* 22/10/2024 Se realizó comité aprobación de cotizaciones de materiales e insumos representativos del convenio.
* 29/10/2024 Se realizaron pagos para materiales de construcción.
* 05/11/2024 Interventoría , JAC y Veeduría realizan COMITÉ DE PAGOS a proveedores del convenio.
* 14/11/2024 Interventoría Coordinó la asistencia de las JAC a la CAPACITACIÓN ASPECTOS CONTABLES organizada por INVIAS
* 16/11/2024 INTERVENTORÍA REALIZÓ ENSAYOS DE DENSIDADES EN LA SUBBASE GRANULAR DEL SECTOR DONDE AÚN FALTA POR FUNDIR PLACHAUELLA.
* 19/11/2024 NO FUÉ POSIBLE REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES, EL BANCO NO ENTREGA AÚN LA CHEQUERA SOLICITADA POR LA JUNTA.
* 20/11/2024 Interventoría envió a la JAC el comunicado TIC-INVIAS-1631-229 OBSERVACIONES ÁREA PAVIMENTOS A LOS E Y D DEL TRAMO PRIORIZADO.
* 27/11/2024 INTERVNETORÍA REALIZÓ REUNION VIRTUAL CON EL DISEÑADOR PARA QUE PRESENTE CORRECCIONES A LOS INFORMES DE DISEÑO.
* 02/12/2024 Interventoría Realizó comités de pagos a proveedores del convenio.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST.
* 09/12/2024 Interventoría envió comunicado TIC-INVIAS-1631-241 CONCEPTO FAVORABLE AL ESTUDIO DE GEOTECNIA CORRESPONDIENTE A LOS EYD - GUAMAL
* 11/12/2024 Interventoría JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 12/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST.
* 17/12/2024 Mediante Correo Electrónico con el asunto PRORROGA No 3 PARA ACTAUALIZACION DE POLIZAS- GUAMAL, Interventoría solicitó a la JAC realizar la actualización de las pólizas del convenio.
* 24/12/2024 Interventoría envió comunicado TIC-INVIAS-1631-257 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA VEREDA GUAMAL - BOLÍVAR
* 10/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.
* 15/01/2025 Interventoría realizó reunión para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.
* 16/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO.
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 23/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: **35** (Numeración consecutiva) del 17/1/2025 al 23/1/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE **LA UNION** DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION		
CONVENIO No.	4478 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,981,336.00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,981,336.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,981,336.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,981,336.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 531,222,234		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 4,185,946		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200,981,336.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200,981,336.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	184,796,669.33	91.95%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	16,184,666.67	8.05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	16,184,666.67	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200,981,336.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200,981,336.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	20,098,133.60	10.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	20,098,133.60	10.00%

Observaciones: Se culminan las obras objeto del Convenio en la semana de ejecución de obra No.9

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	530,969,478.00	99.17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	531,222,234.00	99.22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% | Avance o Atraso Físico % 10.38%

Meta Física Ejecutada % 110.38%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	106
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	106.00			106.00	100%
Ejec	117.00			117.00	110%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: La JAC se encuentra pendiente a remitir a esta interventoría dicha información.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-225 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA: 23/1/2025 (Día / Mes / Año)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8.0	7.0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15.0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se da inicio a las actividades el día 27/05/2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
04/10/20244 El 15 DE AGOSTO INTERVENTORÍA EMITIÓ CONCEPTO FAVORABLE A LOS DISEÑOS DEL ÁREA DE PAVIMENTOS Y DISEÑO GEOMÉTRICO TIC-INVIAS-1631-132
04/10/2024 Se realizó trabajo de oficina conjuntamente con el Ing. residente de Obra para avanzar en el AJUSTE PRESUPUESTAL, el presupuesto definitivo quedó revisado, pendiente aprobaciones de Estudios y Diseños.
04/10/2024 Se realizó revisión de PRESUPUESTO AJUSTADO, fue enviado al Ing. Director de Interventoría para revisión.
16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-197 con observaciones al área Hidráulica de los Estudios y diseños entregados por la JAC
16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-198 con aspectos a corregir después de la tercera revisión al Informe de Geotecnia como parte de los Estudios y diseños entregados por la JAC
17/10/2024 Se remite a la JAC por medio de Correo electrónico la Prórroga N° 2 al Convenio N° 4478 - 2023 con el fin de que El conveniado actualice las Pólizas del mismo.
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 Se remite a la JAC por medio de Correo electrónico la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio N° 4478 - 2023 con el fin de que El conveniado actualice las Pólizas del mismo.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 18/11/2024 la JAC realiza entrega mediante correo electrónico de documentación de gestión ambiental.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 27/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 97 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, franja de enrocado central también de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía y rampas de inicio y final también en concreto reforzado de 21 mpa.

* 27/11/2024 se tiene ejecutado a la fecha también, la instalación de 5,0 ml de tubería en concreto de 21 mpa, con su respectivo atraque y relleno, se cuenta con la estructura de encole terminada y se encuentra en proceso de instalación de acero de refuerzo y formaleta para la estructura de descole de la alcantarilla proyectada en este tramo.

* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-225 al invias radicando el paga del convenio.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 02/12/2024 se realizará revisión de balance del convenio para determinar una posible ampliación de la meta física.
* 05/12/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 06/12/2024 Se culminan las actividades de ejecución de la Obra objeto del Convenio con una Meta física de 117 ml de Placas huella construidas en Concreto de 21 Mpa y Construcción de una (1) Alcantarilla con una Instalación de 5 ml de Tubería en concreto de 36" con sus respectivas Estructuras de Encole y Descole también en Concreto de 21 Mpa.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*13/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-246 respuesta a radicado invias 2024s-vbog-092184 del 05 de diciembre de 2024 acerca de la gestión ambiental del convenio
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*17/12/2024 se remite a la JAC prórroga n° 3 del convenio para actualización de pólizas
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-258 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-270 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotecnia de los estudios y diseños presentados por la misma
* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realizará seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* La O.A.C. realizará entrega de subsanaciones a observaciones realizadas por la Interventoría para los Estudios y Diseños (EyD).
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 35
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	0.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	110.38%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	110.38%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	110.38%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	110.38%

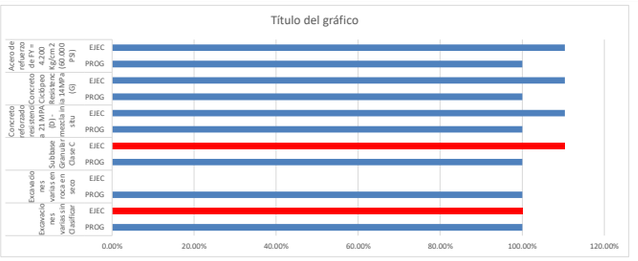

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 Instalación Acero de refuerzo para Placas huella



FOTO 2 Instalación Acero de refuerzo para Descole Alcantarilla



FOTO 3 Fundida de Cunetas en Concreto de 21 Mpa

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-197 con observaciones al área Hidráulica de los Estudios y diseños entregados por la JAC
16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-197 con aspectos a corregir después de la tercera revisión al Informe de Geotecnia como parte de los Estudios y diseños entregados por la JAC
17/10/2024 Se remite a la JAC por medio de Correo electrónico la Prórroga N° 2 al Convenio N° 4478 - 2023 con el fin de que El conveniado actualice las Pólizas del mismo.
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 Se remite a la JAC por medio de Correo electrónico la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio N° 4478 - 2023 con el fin de que El conveniado actualice las Pólizas del mismo.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 18/11/2024 la JAC realiza entrega mediante correo electrónico de documentación de gestión ambiental.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 27/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo

* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 97 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, franja de enrocado central también de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía y rampas de inicio y final también en concreto reforzado de 21 mpa.

* 27/11/2024 se tiene ejecutado a la fecha también, la instalación de 5,0 ml de tubería en concreto de 21 mpa, con su respectivo atraque y relleno, se cuenta con la estructura de encole terminada y se encuentra en proceso de instalación de acero de refuerzo y formaleta para la estructura de descole de la alcantarilla proyectada en este tramo.
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-225 al invias radicando el paga del convenio.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 02/12/2024 se realizará revisión de balance del convenio para determinar una posible ampliación de la meta física.

* 06/12/2024 Se culminan las actividades de ejecución de la Obra objeto del Convenio con una Meta física de 117 ml de Placas huella construidas en Concreto de 21 Mpa y Construcción de una (1) Alcantarilla con una Instalación de 5 ml de Tubería en concreto de 36" con sus respectivas Estructuras de Encole y Descole también en Concreto de 21 Mpa.

* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

*13/12/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-246 respuesta a radicado invias 2024s-vbog-092184 del 05 de diciembre de 2024 acerca de la gestión ambiental del convenio

*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*17/12/2024 se remite a la jac prórroga n° 3 del convenio para actualización de pólizas
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-258 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.

*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-270 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotecnia de los estudios y diseños presentados por la misma

* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 23/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **35** del 17/1/2025 al 23/1/2025 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA **POPOA** DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POPOA

CONVENIO No.	4767 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,995,632.00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,995,632.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.

INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%

CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,995,632.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,995,632.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 531,222,234		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 4,185,946		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200,995,632.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200,995,632.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	185,010,965.33	92.05%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	15,984,666.67	7.95%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	15,984,666.67	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200,995,632.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200,995,632.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	17,211,162.00	8.56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	10,049,781.60	5.00%

Observaciones: Esta es la semana de ejecución de obra No.10

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	530,969,478.00	99.17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	531,222,234.00	99.22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 83.74% — Avance o Atraso Físico %: 0.00%

Meta Física Ejecutada %: 83.74%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	123
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	103.00			103.00	84%
Ejec	103.00			103.00	84%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: La JAC se encuentra pendiente a remitir a esta interventoría dicha información.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-213 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2024

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7.00	7.00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2.00	7.00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.00	0.00
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.00	0.00

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 8/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
*2/10/2024 El Contratista presentó Cotizaciones para revisión y aprobación
* 4/10/2024 La JAC envió documentos de la cantera CALIZAS Y MINERALES
* 4/10/2024 Se realizó comité aprobatorio de COTIZACIONES
* 4/10/2024 PARA TENER EN CUENTA, EL CBR DEL TERRENO ES INFERIOR AL 3%, sin embargo el ingeniero Residente de Obra, aclaró que se debe corregir este párrafo en el Estudio de Geotecnia , porque el ceber de diseño SI ES SUPERIOR A 3%
* 8/10/2024 Se realizó Comité Operativo No.2 para firma de cheques y/o transferencias para pagos a Proveedores
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto, ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 20/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 20/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-222 a la JAC con las observaciones producto de la revisión del componente hidráulico de los estudio y diseños entregados por el conveniado.
* 20/11/2024 la jac realiza la entrega de las correcciones al área de geotecnia de los estudios y diseños
* 26/11/2024 la jac remite a la interventoría comunicado informando que pretende realizar la devolución de los recursos destinados para el paga.
* 27/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 83 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, incluyendo también la franja de enrocado central de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía (sin bordillo) y rampa de inicio en concreto reforzado de 21 mpa. 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 05/12/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
*11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*11/12/2024 Se continua con la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 12/12/2024 la jac realiza la entrega de la última versión de los estudios del área de geotécnia de los estudios y diseños
* 12/12/2024 se culminan las actividades de ejecución de obra con una meta física de 103 ml de placas huella construidas y construcción de 6,0 ml de alcantarilla en tubería en concreto de 36" con sus respectivas estructuras de encole y descole
* 16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
* 17/12/2024 se remite a la jac prórroga n° 3 del convenio para actualización de pólizas
* 18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 19/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-254 al Invias con Entrega oficial del Plan de inversión social del convenio.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-259 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-271 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma
* 10/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realizará seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* La O.A.C. realizará entrega de subsanaciones a observaciones realizadas por la Interventoría para los Estudios y Diseños (EyD).
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 35
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	0.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%

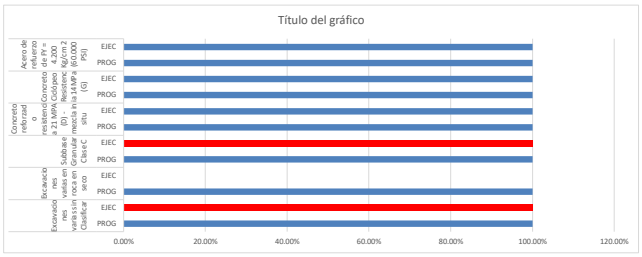

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
Placas Huella terminadas



FOTO 2
Placas Huella terminadas



FOTO 3
Placas Huella terminadas

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
*2/10/2024 El Contratista presentó Cotizaciones para revisión y aprobación
* 4/10/2024 Se realizó reunión de seguimiento con INVIAS, presentación del estado de avance de los convenios
* 4/10/2024 La JAC envió documentos de la cantera CALIZAS Y MINERALES
* 4/10/2024 Se realizó comité aprobatorio de COTIZACIONES
* 8/10/2024 Se realizó Comité Operativo No.2 para firma de cheques y/o transferencias para pagos a Proveedores
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto, ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 20/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-222 a la JAC con las observaciones producto de la revisión del componente hidráulico de los estudio y diseños entregados por el conveniado.
* 20/11/2024 la JAC realiza la entrega de las correcciones al área de geotecnia de los estudios y diseños
* 26/11/2024 la JAC remite a la interventoría comunicado informando que pretende realizar la devolución de los recursos destinados para el paga.
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 83 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, incluyendo también la franja de enrocado central de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía (sin bordillo) y rampa de inicio en concreto reforzado de
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/12/2024 la JAC realiza la entrega de la última versión de los estudios del área de geotécnia de los estudios y diseños
* 12/12/2024 se culminan las actividades de ejecución de obra con una meta física de 103 ml de placas huella construidas y construcción de 6,0 ml de alcantarilla en tubería en concreto de 36" con sus respectivas estructuras de encole y descole
* 16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
* 17/12/2024 se remite a la jac prórroga n° 3 del convenio para actualización de pólizas
* 18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 19/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-254 al Invias con Entrega oficial del Plan de inversión social del convenio.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-259 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-271 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma
* 10/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra

* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 23/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: **35** (Numeración consecutiva) del 17/1/2025 al 23/1/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA **BERLIN** DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL BERLIN

CONVENIO No.	3753 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,108,139.00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,108,139.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%

CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,108,139.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,108,139.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 531,222,234		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 4,185,946		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200,108,139.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200,108,139.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	200,108,139.00	100.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	17,076,666.67	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200,108,139.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200,108,139.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%

Observaciones: la ejecución de la Obra se culminó en la semana No.7

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	530,969,478.00	99.17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	531,222,234.00	99.22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% | Avance o Atraso Físico % 3.36%
Meta Física Ejecutada % 103.36%

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	ml	149
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	149.00			149.00	100.00%
Ejec	154.00			154.00	103.36%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: BERLÍN | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	1
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	1	1
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	1
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	1
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	1
Ruteadora	1	1
Compresor (barrido y soplado)	1	1
Camioneta D-300	1	1
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Compresor 120 HP, con martillo	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Aspersor manual	1	1
Total	13	13

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	6,3 km de la Obra	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	Cerca al casco urbano municipal	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

Observaciones: La JAC presento los documentos de la antera **ASOCIACION DE MINEROS AGROINDUSTRIALES AMBIENTALISTAS LA BELLEZA TMR ONG**. Localizada cerca al casco urbano del Municipio a 6,3 km del Sitio de la Obra.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2/2

FECHA: 23/1/2025 (Día / Mes / Año)

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-177 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10.0	7.0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
* Se realizó socialización inicial el 7/06/2024.
* Se realizó socialización de terminación de la Obra el 13/12/2024.
* Se ejecutó el Plan de Inversión Social

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
*02/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 10/10/2024 La JAC envió formatos de gestión ambiental
*15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*21/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 23/10/2024 Se realizó visita de Obra por parte de los Componentes Ambiental, Social y Técnico de La Interventoría
* 24/10/2024 La JAC en la presente semana realizó la entrega del Plan de Inversión social Proyectado en el Convenio.
* 25/10/2024 Mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-203 La Interventoría realiza la Entrega oficial al INVIAS de las correcciones solicitadas al Plan de inversión social del convenio 3753 – 2023 OAC Vereda Berlín.
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-219 a la JAC solicitando la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la JAC realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la JAC
* 29/11/2024 La JAC realizó la entrega de las Pólizas del Convenio actualizadas al 11 de noviembre de2024
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-260 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-272 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma
* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realizará seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 35
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	80.00%
	EJEC	0.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%

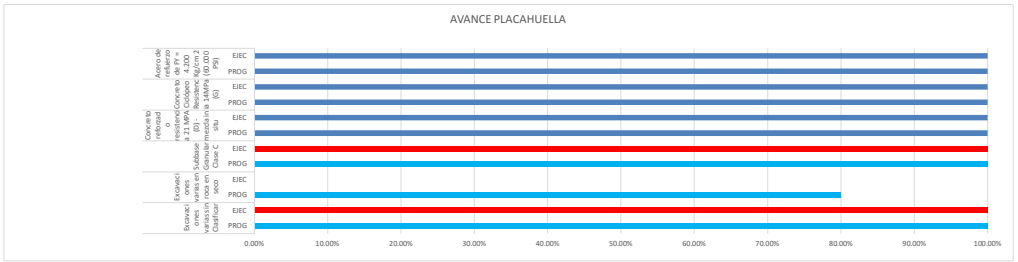

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
Placa huella terminada



FOTO 2
Placa huella terminada



FOTO 3
Vista general Placa huella construida

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
*02/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 04/10/2024 Se realizó reunión de seguimiento con INVIAS, presentación del estado de avance de los convenios
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 10/10/2024 La JAC envió formatos de gestión ambiental
*15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*21/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 23/10/2024 Se realizó visita de Obra por parte de los Componentes Ambiental, Social y Técnico de La Interventoría
* 25/10/2024 Mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-203 La Interventoría realiza la Entrega oficial al INVIAS de las correcciones solicitadas al Plan de inversión social del convenio 3753 – 2023 OAC Vereda Berlín.
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 06/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para bordillos de cunetas y limpieza de la obra.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-219 a la jac solicitando la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la JAC realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la JAC
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.
* 29/11/2024 La JAC realizó la entrega de las Pólizas del Convenio actualizadas al 11 de noviembre de2024
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-260 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-272 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma
* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,

Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 23/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: **35** del 17/1/2025 al 23/1/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **CACHIPAYAL** DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL

CONVENIO No.	4175 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,319,574.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,319,574.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%

CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,319,574.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,319,574.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 531,222,234		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 4,185,946		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		$200,319,574.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		$200,319,574.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		$200,319,574.00	100.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		$0.00	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		$42,026,640.00	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200,319,574.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200,319,574.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
	$ -		

Observaciones: la ejecución de la Obra se culminó en la semana No.7

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	530,969,478.00	99.17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	531,222,234.00	99.22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% | Avance o Atraso Físico % -7.10%
Meta Física Ejecutada % 92.90%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	ml	155
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	155.00			155.00	100.00%
Ejec	144.00			144.00	92.90%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	1
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	1	1
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	1
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	1
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	1
Ruteadora	1	1
Compresor (barrido y soplado)	1	1
Camioneta D-300	1	1
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Compresor 120 HP, con martillo	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Aspersor manual	1	1
Total	13	13

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: CACHIPAYAL | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Cerca al caso Urbano	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	Distancia 13Km de la obra	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
La JAC de Cachipayal presentó los documentos de la Cantera SCS BUENAVISTA , RLHECTOR ALONSO MORENO QUITIAN , Localizada 13 Km del sitio de la obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-176 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10.0	7.0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:
*Se realizó socialización inicial 7/06/2024.
* Durante el período se realizó acompañamiento y asesoría al personal Administrativo de la OAC en la formulación del presupuesto de Gestión Social del convenio.
* Se realizó socialización de terminación de la Obra el 13/12/2024.
* Se ejecutó el Plan de Inversión Social

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 10/10/2024 La JAC envió formatos de gestión ambiental
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 23/10/2024 Se realizó visita de Obra por parte de los Componentes Ambiental, Social y Técnico de La Interventoría
* 24/10/2024 La JAC en la presente semana realizó la entrega del Plan de Inversión social Proyectado en el Convenio.
* 25/10/2024 Mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-203 La Interventoría realiza la Entrega oficial al INVIAS de las correcciones solicitadas al Plan de inversión social del convenio 4175 – 2023 OAC Vereda Cachipayal.
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 El Conveniado realiza la entrega del Informe de Replanteo y Nivelación Topográfica del tramo.
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 15/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-219 a la jac solicitando la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la JAC realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la JAC
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-261 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-273 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma
* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realizará seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* La O.A.C. realizará entrega de subsanaciones a observaciones realizadas por la Interventoría para los Estudios y Diseños (EyD).
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 35
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	80.00%
	EJEC	0.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
Placa huella terminada



FOTO 2
Placa huella terminada



FOTO 3
Vista general Tramo de Placa huella

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 10/10/2024 La JAC envió formatos de gestión ambiental
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 23/10/2024 Se realizó visita de Obra por parte de los Componentes Ambiental, Social y Técnico de La Interventoría
* 25/10/2024 Mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-203 La Interventoría realiza la Entrega oficial al INVIAS de las correcciones solicitadas al Plan de inversión social del convenio 4175 – 2023 OAC Vereda Cachipayal.
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

* 06/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para bordillos de cunetas y limpieza de la obra.

* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 15/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-219 a la jac solicitando la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la JAC realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo

* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la JAC
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-261 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-273 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma
* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 23/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **35** (Numeración consecutiva) del 17/1/2025 al 23/1/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA **ORGANOS** DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS		
CONVENIO No.	4490 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200,785,769.00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200,785,769.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,785,769.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,785,769.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 531,222,234		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 4,185,946		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200,785,769.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200,785,769.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	166,342,065.77	82.85%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	34,443,703.23	17.15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	34,443,703.23	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200,785,769.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200,785,769.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%

Observaciones:
Esta es la semana de ejecución de obra No.9

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	530,969,478.00	99.17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	531,222,234.00	99.22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% — Avance o Atraso Físico % 16.67%

Meta Física Ejecutada % 116.67%

Meta Fisica (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	ml	150
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	150.00			150.00	100.00%
Ejec	175.00			175.00	116.67%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: ORGANOS — TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	1
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	1	1
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	1
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	1
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	1
Ruteadora	1	1
Compresor (barrido y soplado)	1	1
Camioneta D-300	1	1
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Compresor 120 HP, con martillo	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Reparador manual	1	1
Total	13	13

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	5.896845	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	-73.837612	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: La JAC presentó documento RUCOM y licencias del proveedor de materiales pétreos llamado TECNOCONSTRUCTORES, (Cantera Peña Blanca) localizado a 10 Km del sector en intervención. Pendiente solicitar al proveedor las licencias ambientales de la fuente de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-190 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA: 23/1/2025 (Día / Mes / Año)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8.0	7.0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15.0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

* Se presenta cambio residente de interventoría el 03/07/2024.
* Se realizó socialización inicial el 5/06/2024.
* Se realizó socialización de terminación de la Obra el 27/12/2024.
* Se ejecutó el Plan de Inversión Social

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 04/10/2024 Se realizó reunión de seguimiento con INVIAS, presentación del estado de avance de los convenios
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 15/10/2024 La JAC remitió a la Interventoría los documentos de Gestión Ambiental del Convenio, quien a su vez mediante comunicado N° TIC-INVIAS-1631-190 realizó la radicación de los mencionados documentos ante La Subdirección de sostenibilidad del Invias
* 16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-193 con aspectos a corregir después de la tercera revisión al Informe de Geotecnia como parte de los Estudios y diseños entregados por la JAC
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 después de realizar el balance presupuestal del convenio se llegó a la conclusión de que se puede ampliar la meta física proyectada de 10 ml para construir un total de placas huella de 160 ml de longitud aproximada, ampliación que se encuentra en ejecución a la fecha
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 después de realizar el balance presupuestal del convenio se llegó a la conclusión de que se puede ampliar la meta física proyectada de 20 ml para construir un total de placas huella de 170 ml de longitud aproximada, ampliación que se encuentra en ejecución a la fecha
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 se encuentra pendiente iniciar la entrega de la documentación para la liquidación del convenio por parte de la jac
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la jac realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la jac 27/11/2024 se culminan las obras del presente convenio
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 175 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, franja de enrocado central también de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía y rampas de inicio y final también en concreto reforzado de 21 mpa, completando de esta manera el 116,7 % del alcance del proyecto ya que se tenía un alcance inicial de 150 ml y se pudo ampliar la meta física en 25 ml.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 19/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-252 a la JAC emitiendo concepto favorable por parte del Especialista respectivo al componente de Geología y Geotécnia de Los Estudios y Diseños del Proyecto.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-262 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*27/12/2024 Se realizó la actividad Social propuesta por la JAC, con participación de la Interventoría del Convenio y la comunidad local.
*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará la entrega de los resultados Estudios y Diseños (EyD) para revisión de Interventoría.
* Se realizará revisión del presupuesto ajustado acorde a los diseños y al cotizaciones y precios dela zona que presente la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del contrato
* Se iniciara presentación de hojas de vida personal contractual y proceso afiliación del personal operativo y presentación a Interventoría
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 35
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	0.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	116.70%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	116.70%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	116.70%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	116.70%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Placa huella terminada


Placa huella terminada


Placa huella terminada

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 04/10/2024 Se realizó reunión de seguimiento con INVIAS, presentación del estado de avance de los convenios
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 15/10/2024 La JAC remitió a la Interventoría los documentos de Gestión Ambiental del Convenio, quien a su vez mediante comunicado N° TIC-INVIAS-1631-190 realizó la radicación de los mencionados documentos ante La Subdirección de sostenibilidad del Invias
* 16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-193 con aspectos a corregir después de la tercera revisión al Informe de Geotecnia como parte de los Estudios y diseños entregados por la JAC
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 después de realizar el balance presupuestal del convenio se llegó a la conclusión de que se puede ampliar la meta física proyectada de 10 ml para construir un total de placas huella de 160 ml de longitud aproximada, ampliación que se encuentra en ejecución a la fecha
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 después de realizar el balance presupuestal del convenio se llegó a la conclusión de que se puede ampliar la meta física proyectada de 20 ml para construir un total de placas huella de 170 ml de longitud aproximada, ampliación que se encuentra en ejecución a la fecha
* 25/11/2024 se realiza comité
* 27/11/2024 se encuentra pendiente iniciar la entrega de la documentación para la liquidación del convenio por parte de la jac
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la jac realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la jac 27/11/2024 se culminan las obras del presente convenio
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 175 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, franja de enrocado central también de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía y rampas de inicio y final también en concreto reforzado de 21 mpa,
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 19/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-252 a la JAC emitiendo concepto favorable por parte del Especialista respectivo al componente de Geología y Geotécnia de Los Estudios y Diseños del Proyecto.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-262 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*27/12/2024 Se realizó la actividad Social propuesta por la JAC, con participación de la Interventoría del Convenio y la comunidad local.
*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 35 del 17/1/2025 al 23/1/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA **TUBAVITA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ- SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Construcción de Placa huella y Una (1) Alcantarilla; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA

CONVENIO No.	4357 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,030,449.00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,030,449.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/1/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%

CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,030,449.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,030,449.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 531,222,234		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 4,185,946		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	201,030,449.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150,772,836.75	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	141,823,075.78	70.55%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	8,949,760.97	4.45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	43,814,063.67	21.79%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**201,030,449.00**	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**185,637,139.45**	92.34%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	15,393,309.55	7.66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%

Observaciones: Las OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS corresponden a pagos realizados a proveedores del convenio en el rubro de gastos administrativos, incluye pagos anticipados a proveedores. En este momento se encuentra en gestión la ejecución del Rubro PAGA. Las actividades de obra se encuentran 100% ejecutadas.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	530,969,478.00	99.17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	531,222,234.00	99.22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% — Avance o Atraso Físico %: 3.78%
Meta Física Ejecutada %: 103.78%

Meta Fisica (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	119
*	Alcantarilla	Unidad	1
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Pros	119.00				
Ejec	123.50				
Prog	1.00				
Ejec	1.00				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operació	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las activida

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	**5.871507800**	PERMISO MINERO: SI	NO
	-73.524087000	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PÉTREOS ESCOGIDA ES "CALIZAS Y MINERALES S.A.S. NIT. 900414198-1 LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8.0	7.0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 7/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se da inicio a las actividades con la junta de acción comunal vereda La unión del municipio de Guavatá - Santander.
* Se realiza entrega de cotizaciones para los Estudios y Diseños
* Se realiza comité técnico/operativo para aprobación de Cotización de estudios y diseños.
* Se realiza seguimiento, control y verificación de las actividades iniciales necesarias para la formulación de estudios y diseños (topografía, apique, ensayo PDC y conteo vehicular).
* Se solicitarán cotizaciones de transporte y materiales necesarios para la ejecución de la obra física en harás de ajustar precios unitarios.
* Se participa en reunión general y comité de obra con la interventoría para revisar avances.
* Se realiza visita y recorrido con el Ing. Director del INVIAS Santander Marlon Gamboa, JAC e Interventoría el día 04 de julio 2024.
* Se continúa haciendo el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se realiza las actividades iniciales necesarias para la formulación de estudios y diseños.
* Se recepcionan y validan las cotizaciones de transporte, materiales y valla publicitaria necesarios para la ejecución de la obra física en aras de ajustar precios unitarios.
* Se participa en reunión de comité de obra con la interventoría para revisar avances de la actividad de estudios y diseños.
* Se efectúa visita de campo en conjunto con la interventoría, representantes de la comunidad, presidente de JAC, residente de obra y director del convenio a fin de despejar dudas de la comunidad.
* Se realiza revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realiza seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realiza mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio
* Se realiza el respectivo ajuste a precios unitarios del proyecto y se formulará la programación de obra y programación de compras.
* Se participa en comités de obra y demás que sean solicitados.
* Se hace visita en campo, lugar de la obra para tomar fotografías de los tramos y demás que sean necesarias.
* Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 21 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.

FECHA: 23/1/2025 (Día / Mes / Año)

* 02 Sep. Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS.
* Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.
* 05 sep. Se recibieron observaciones al Contratista GEOTECNIA TIC-INVIAS-1631-154
* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo.
* 16/09/2024 Se realizó visita al sitio de la obra con Interventoría, se solicitó la realización de una alcantarilla.
* 20/09/2024 Se instaló Valla informativa del Convenio.
* 23/09/2024 Se envió a interventoría relación de los pagos realizados hasta el momento.
* 25/09/2024 Se realizó revisión de cotizaciones de materiales en oficina de interventoría.
* 26/09/2024 JAC realizó solicitud de prórroga al convenio 4357 de 2023.
* 01/10/2024 Interventoría envió oficio Radicado: 2024E-VUVRAZ-096167 TIC-INVIAS-1631-166 INFORMANDO **LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA**
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 10/10/2024 Se realizó comité aprobación de COTIZACIONES de insumos y materiales.
* 15/10/2024 Se realizó comité de pagos a proveedores.
* **18/10/2024 INICIO OBRAS**
* 24/10/2024 Se realizó aprobación de estudios y diseños.
* 25/10/2024 - 31/10/2024 Se realizó Mejoramiento de subrasante en Pedraplén, Instalación tubería de concreto 36".
* 07/11/2024 DURANTE EL PERÍODO SE AVANZÓ EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL CONVENIO, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y APLICACIÓN DE SUBBASE GRNAULAR
* 05/11/2024 JAC INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
* 09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROGRAMACIÓN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONVENIO.
* 12/11/2024 SE REALIZÓ COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA.
* 13/11/2024 SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA PROYECTADA
* 18/11/2024 DURANTE EL PERÍODO SE AVANZÓ SATISFACTORIAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLAS.
* 25/11/2024 SE REALIZÓ COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 27/11/2024 DURANTE LA SEMANA SE AVANZÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLAS. JAC SOLICITA REVISIÓN EN SITIO PARA CONSTRUCCIÓN DE FILTROS
* 03/12/2024 Interventoría envió comunicado TIC-INVIAS-1631-238- CONCEPTO FAVORABLE AL ESTUDIO HIDRAULICO - TUBAVITA, con esto quedan todos los componentes técnicos aprobados.
* 04/12/2024 Se construyen Filtros en los 3 Tramos de placa huella, se evidencia flujo freático en los 3 sectores en intervención.
* 04/12/2024 Durante la semana se avanzó satisfactoriamente en la construcción de placa huellas.
* 11/12/2024 Durante la semana se avanzó satisfactoriamente en la construcción de placa huellas.
* 11/12/2024 Se realizó demolición de roca, para avanzar con la construcción de cuneta del tramo No.2
* 18/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* **30/12/2024 Se completó el 100% de las obras, placa huella en concreto. Longitud Ejecutada 123,5 mts de Placa huella + 1 Alcantarilla.**
* 02/01/2025 Se encuentra en realización el cierre Ambiental y Social del convenio.
* 13/01/2025 Interventoría realizo visita de obra, se realizaron observaciones al contratista para recibo definitivo de las obras.
* 16/01/2025 Se encuentra en gestión la ejecución del Rubro PAGA, y la actividad social de terminación de terminación de obras con la comunidad.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Avanzar en la construcción de las obras del convenio.
* Se realizará constante seguimiento a la ejecución del convenio en aspectos técnicos, administrativos, sociales, ambientales y sst.
* Se participará en comités operativos y demás que sean solicitados.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA


PLACAHUELLA

		SEMANA 35
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
MEJORAMIENTO CON PEDRAPLEN	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	103.78%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	103.78%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%



ALCANTARILLA

		SEMANA 35
Construcción Alcantarilla	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 ...13/01/2025 Tramo No3 100% Terminado



FOTO 2 13/01/2025 Tramo No.2 100% Terminado



Foto 3 13/01/2025 Tramo No.1 100% Terminado

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
2. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega prioritaria de los estudios y diseños (EyD) acorde a que NO se deben generar retrocesos que afecten, ni
3. El día 12-08-2024 La O.A.C. realiza entrega de los Estudios y Diseños.
4. El día 15-08-2024 y 16-08-2024 Los Ingenieros especialistas de La interventoría realiza observaciones a los Estudios y Diseños presentados.
5. El día 21-08-2024 La O.A.C. presenta subsanaciones a los Estudios y Diseños por observaciones de la Interventoría.
6. El día 28-08-2024 se emite concepto favorable por el especialista de vías para los Estudios y Diseños (EyD).
7. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A..C
8. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-109 - OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de TUBAVITA, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el periodo correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales genera la aplicación de las multas contempladas en el convenio.
9. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
10. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social
11. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.
* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 10 sep Se programó visita a la vereda teniendo en cuenta, que la alcantarilla a construir se encuentra sobre un terreno removido, la Ingeniera Residente solicitó inspección del sitio para autorizar la construcción de estructuras en este punto.
*12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 16/09/2024 Interventoría realizó Visita al sitio de las obras, la comunidad solicitó realización de alcantarilla.
* 25/09/2024 Se realizó revisión de cotizaciones de materiales se hicieron observaciones a la JAC.
* 01/10/2024 Interventoría envió oficio Radicado: 2024E-VUVRAZ-096167 TIC-INVIAS-1631-166 INFORMANDO **LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA**
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 03/10/2024 Se realizó reunión virtual con INVIAS se expuso el estado general de los convenios.
* 10/10/2024 Se realizó comité aprobación de COTIZACIONES de insumos y materiales.
* 15/10/2024 Se realizó comité de pagos a proveedores.
* 29/10/2024 Se realizó comité de pagos a proveedores.
* 05/11/2024 JAC INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 14/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINA LAS JAC PARA CAPACITACIÓN POR PARTE INVIAS SOBRE AREA CONTABLE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS
* 12/11/2024 JAC INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 16/11/2024 INTERVENTORÍA REALIZA TOMA DE DENSIDADES DE CAMPO EN LA SUBBASE GRANULAR APLICADA
* 25/11/2024 JAC, INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 21/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINÓ LAS JAC PARA CAPACITACIÓN AMBIENTAL POR PARTE DE INVIAS.
* 02/12/2024 Interventoría Realizó comité de pagos a proveedores del convenio.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST
* 10/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST.
* 11/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 18/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 24/12/2024 Interventoría envió comunicado TIC-INVIAS-1631-263 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA TUBAVITA – VÉLEZ.
* 10/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.
* 13/01/2025 Interventoría GESTIONÓ mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-275 - Solicitud de cambio de propuesta social Vereda Tubavita del municipio de Vélez al INVIAS.
* 15/01/2025 Interventoría realizó reunión virtual para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.
* 16/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.
* 23/01/2025 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-280 - REITERACIÓN DE LA SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 23/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 35 del 17/1/2025 al 23/1/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA **EL GAITAL** DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GAITAL		
CONVENIO No.	4367 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,016,649.00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,016,649.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,016,649.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,016,649.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 531,222,234.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 4,185,946.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO			
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	201,016,649.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150,762,486.75	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	16,378,845.26	8.15%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	134,383,641.49	66.85%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	27,844,817.52	13.85%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**201,016,649.00**	**100.00%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**44,223,662.78**	**22.00%**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	156,792,986.22	78.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	20,101,664.90	10.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	2,010,166.49	1.00%

Observaciones: El convenio se encuentra en etapa de ejecución de obras. Durante el período el avance en construcción fue poco sin embargo se realiza acopio de materiales en sitio y adquisición de insumos. A la fecha las condiciones climáticas han mejorado, sin embargo el terreno sigue siendo de difícil acceso. La consecución de Vibro compactador en la zona es difícil.

INTERVENTORÍA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	530,969,478.00	99.17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	531,222,234.00	99.22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% | Avance o Atraso Físico % -90.91%

Meta Física Ejecutada % 9.09%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	110
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	110.00			110.00	100.00%
Ejec	10.00			10.00	9.09%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	5.871515582	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	-73.524041619	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: La JAC Presentó la cantera CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SAS NIT.900414198 localizada en el municipio de MONIQUIRÁ

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**6.0**	**7.0**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6.0	7.0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.0	0.0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.0	0.0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 7/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se realiza el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se realizó de una inspección en obra donde se encontró un afloramiento de aguas Subterráneas en la zona a intervenir a las cuales se le debe dar una alternativa de para las canalizaciones.
* Se realiza entrega de cotizaciones para los Estudios y Diseños.
* Se realiza comité técnico/operativo para aprobación de Cotización de estudios y diseños.
*Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 22 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 02 Sep. Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS.
* Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.
* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo.
* 10/09/2024 Se envió a interventoría cotizaciones de topografía para revisión.
* 13/09/2024 Se realizó reunión e n oficina con la interventoría, se revisó cotizaciones de materiales y ajuste presupuestal.
* 22/09/2024 Se envió a interventoría la relación de Pagos Realizados.
* 26/09/2024 Se trabajó en oficina la revisión de cotizaciones de materiales e insumos.
* 01/10/2024 Se envió TIC-INVIAS-1631-170- CONCEPTO FAVORABLE A LOS EYD - GAITAL

FECHA: 23/1/2025 (Día / Mes / Año)

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 02/10/2024 El Presidente de la JAC manifestó verbalmente que la Junta realizará la Construcción del filtro necesario.
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 04/10/2024 Se realizó reunión extraordinaria con INTERVENTORÍA E INVIAS, la JAC se comprometió enviar las cotizaciones faltantes y el presupuesto proyectado. Y avanzar en la ejecución de obra teniendo en cuenta el tiempo que queda de ejecución.
* 09/10/2024 SE HAN HECHO OBSERVACIONES COTIZACIONES 09 OCT SE REALIZARÁ REVISIÓN FINAL Y COMITE DE APROBACIÓN DE COTIZACIONES.
* EL DÍA 17 DE OCTUBRE SE REALIZARÓ VISITA DE CAMPO PARA VERIFICAR LA MANERA DE REALIZAR LOS TRANSPORTES, POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO EL CONTRATISTA PROPONE REALIZAR UN ACOPIO DE MATERIAL PREVIO AL PUNTO DEFINITIVO DE DISPOSICIÓN EN OBRA.
* **21/10/2024 Inicio de actividades de Obra.**
* 24/10/2024 Se realizó comité de aprobación de COTIZACIONES DE INSUMOS Y MATERIALES.
* Hay poca disponibilidad de maquinaria en la zona (Vibrocompactador).
* 06/11/2024 A LA FECHA SE HAN ADQUIRIDO MATERIALES PÉTREOS, SE REALIZÓ TOPOGRAFÍA DE CAMPO, SE HAN REALIZADO CORRECCIÓN DE FALLOS EN ZONA DE LA PLACAHUELLA. sE REALIZA CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO EN CAMPO. SE HAN PRESENTADO LLUVIAS EN LA ULTIMA SEMANA QUE NO PERMITEN ACARREO DE MATERIALES.
* 07/11/2024 LAS VOLQUETAS CON MATERIAL NO HAN PODIDO ACCEDER AL SITIO DE LAS OBRAS DEBIDO AL ESTADO DE LA CARRETERA LA CUAL ES MUY PENDIENTE Y POR LAS LLUVIAS LOS VEHICULOS SE QUEDAN PATINANDO EN EL BARRO.
* 08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
* 09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROGRAMACIÓN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONVENIO.
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA.
* 15/11/2024 INTERVENTORÍA APROBÓ LA HOJA DE VIDA DE LA INGENIERA RESIDENTE LAURA PINZÓN.
* 18/11/2024 LAS CONSTANTES LLUVIAS PRESENTADAS DURANTE EL PERÍODO AFECTAN GRANDEMENTE LA VÍA DE ACCESO, NO ES FACTIBLE SUBIR MATERIALES A OBRA, DE IGUAL MANERA LA CONSECUCIÓN DE MAQUINARIA (VIBROCOMPACTADOR) ES DIFICIL, SE EVALÚA EL TIPO DE VIBROCOMPACTADOR A UTILIZAR YA QUE NO DEBE SER MUY PESADO.
* 20/11/2024 EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN REPROGRAMACIÓN DE OBRAS.
* 22/11/2024 EL ING REYNALDO MANTILLA DE INVIAS (SANTANDER) REALIZÓ VISITA AL SITIO, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 25/11/2024 EL ING. PEDRO J BARÓN DE INVIAS (BOGOTÁ) REALIZÓ VISITA AL SITIO CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 05/12/2024 Durante la última semana se cuenta con mejores condiciones del terreno, se ingresó maquinaria retroexcavadora para realizar adecuación de la subrasante. Se acopian materiales en sitio
* 10/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST. Se evidencia la necesidad de realizar filtros en terreno.
* 11/12/2024 Durante el período se realizó acopio de materiales pétreos, Conformación de subrasante, cargue de materiales en acopio
* 11/12/2024 El transporte de materiales pétreos se realiza en dos etapas, la primera desde la cantera (Moniquirá) hasta el sitio de acopio (Sector Colegio Gaital), la segunda etapa consiste en realizar cargue de volquetas a media capacidad desde ese punto de acopio hasta el sitio de la obra, recorrido de aproximadamente 1,4 Km de alta pendiente, vía destapara, estrecha con dificultad de acceso en época de lluvias.
* 17/12/2024 Se realiza extendido y compactación de subbase granular.
* 18/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 20/12/2024 Se realiza aplicación y compactación de subbase granular
* 20/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 24/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-264 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA GAITAL VÉLEZ
* 26/12/2024 Durante el período se han presentado lluvias, las cuales afectan la vía de acceso al sitio de las obras, no es posible subir materiales pétreos desde el punto colegio hasta la obra.
* 02/01/2025 No se realizaron actividades en obra durante la última semana.
* 09/01/2025 No se realizaron actividades en obra durante la última semana.
* 13/01/2025 Se retoman actividades en obra, se realiza arreglo vía de acceso manualmente, se reciben materiales en obra, se hace encofrado para planchuelas.
* 20/01/2025 Se realiza fundida de concreto piedra pegada.
* 23/01/2025 Se avanza en la construcción de huellas en concreto reforzado 3000 psi, también se realiza piedra pegada en concreto ciclópeo.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se dará continuidad a la construcción de la obra, se espera tener la totalidad de la subbase granular aplicada y compactada.
* Se dará inicio a la construcción de estructura de placa huella en concreto reforzado de 3000 psi.
* Se realizará suministro de materiales de obra.
* Se realizarán pagos a proveedores del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 24
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	65.00%
	EJEC	22.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	65.00%
	EJEC	22.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	75.00%
	EJEC	32.00%

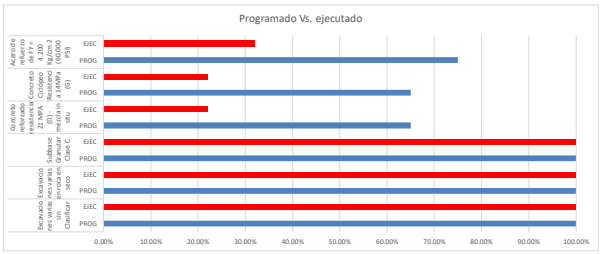

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1
20/01/2025 Instalación formaleta para piedra pegada



FOTO 2
21/01/2025 Avance fundida de piedra pegada



FOTO 3
23/01/2025 Avance ejecución de obra, concreto ciclópeo piedra pegada

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
2. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega prioritaria de los estudios y diseños (EyD) acorde a que NO se deben generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en los tiempos ya estipulados.
3. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A.C
4. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-111 - OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de GAITAL, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el periodo correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales genera la aplicación de las multas contempladas en el convenio.

5. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
6. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social pagadas.

7. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.

* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios.
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 13/09/2024 Interventoría envió a todas las JAC TIC-INVIAS-1631-163 - Reiteración oficio TIC-INVIAS-1631-157 del 05/09/2024 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras
* 25/09/2024 Interventoría envió requerimiento a la JAC instalación de Buzón de PQR.
* 26/09/2024 Interventoría atendió en oficina a la JAC para las cotizaciones de materiales.
* 01/10/2024 Se envió TIC-INVIAS-1631-170- CONCEPTO FAVORABLE A LOS EYD - GAITAL
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 02/10/2024 El Presidente de la JAC manifestó verbalmente que la Junta realizará la Construcción del filtro necesario.
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 03/10/2024 Interventoría expuso a INVIAS el estado general de los convenios en reunión virtual, se programó reunión extraordinaria para el día siguiente con las juntas GAITAL Y GUAMAL.
* 04/10/2024 Se realizó reunión extraordinaria con INTERVENTORÍA E INVIAS, la JAC se comprometió enviar las cotizaciones faltantes y el presupuesto proyectado. Y avanzar en la ejecución de obra teniendo en cuenta el tiempo que queda de ejecución.
* EL DÍA 17 DE OCTUBRE INTERVENTORÍA REALIZARÓ VISITA DE CAMPO PARA VERIFICAR LA MANERA DE REALIZAR LOS TRANSPORTES, POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO EL CONTRATISTA PROPONE REALIZAR UN ACOPIO DE MATERIAL PREVIO AL PUNTO DEFINITIVO DE DISPOSICIÓN EN OBRA. SE REALIZÓ REUNIÓN CON LA VEEDURÍA PARA ESTABLECER LA METODOLOGÍA DE TRANSPORTE.
* 24/10/2024 Se realizó comité de aprobación de COTIZACIONES DE INSUMOS Y MATERIALES.
* 05/11/2024 Interventoría realizó conjuntamente con la JAC y Veeduría COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 14/11/2024 Interventoría realizó conjuntamente con la JAC y Veeduría COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 19/11/2024 Interventoría realizó visita de obra Director, Social, SST y Residente de Interventoría al sitio de las obras, para verificar el avance del convenio y el estado de la vía de acceso.
* 19/11/2024 Interventoría realizó COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO, EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ
* 22/11/2024 Interventoría realizó acompañamiento a la visita del ingeniero Reynaldo Mantilla de INVIAS SANTADNER.
* 25/11/2024 El Director de Interventoría realizó la visita conjunta con el Ing. Pedro J Barón a la obra, se verificó el avance de obra y el estado de la vía de acceso.
* 02/12/2024 Interventoría Autorizó comité de pagos a proveedores del convenio.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST.
* 10/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST.
* 11/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 14/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-248 POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PROPIAS DEL CONVENIO 4367 -2023 JAC GAITAL.
* 18/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 20/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 24/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-264 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA GAITAL VÉLEZ
* 03/01/2025 Interventoría RADICÓ comunicado TIC-INVIAS-1631-269 - Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – Convenios No. 4367 de 2023 – OAC VEREDA GAITAL.
* 09/01/2025 Interventoría verifica la no actividad en obra durante la última semana.
* 10/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores
* 14/01/2025 Interventoría realiza toma de densidades de campo en la Sub-base granular aplicada.
* 15/01/2025 Interventoría realizó reunión virtual para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.
* 16/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.
* 21/01/2025 Interventoría emitió el comunicado TIC-INVIAS-1631-278 Cumplimiento con los elementos de protección personal (EPP), a la JAC Gaital.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO.
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 23/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **35** (Numeración consecutiva) del 17/1/2025 al 23/1/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE **TEBAIDA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

1 Tramo Placa huella y Una (1) alcantarilla en concreto reforzado; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TEBAIDA

CONVENIO No.	4424 de 2023	VALOR INICIAL:	$	200,996,240.00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	200,996,240.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.			
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%			
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$	394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$	141,314,690.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$	535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$	-
		VALOR AMORTIZADO:	$	-
		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,996,240.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200,996,240.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 394,093,490.00	$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 531,222,234		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 394,093,490.00	$ 4,185,946		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200,996,240.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150,747,180.00	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	98,149,443.00	48.83%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	52,597,737.00	26.17%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	32,498,113.00	16.17%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**200,996,240.00**	**100.00%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**130,647,556.00**	**65.00%**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	70,348,684.00	35.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	20,099,624.00	10.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	30,149,436.00	15.00%

Observaciones: El avance se ve reflejado en los gastos administrativos ejecutados y la compra de materiales para realización de las obras. Durante el período se realizaron actividades constructivas de manera satisfactoria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	530,969,478.00	99.17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	531,222,234.00	99.22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% — Avance o Atraso Físico %: -50.00%

Meta Física Ejecutada %: 50.00%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	140
*	Alcantarilla	Unidad	1
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	140.00				100.00%
Ejec	70.00				50.00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico seman

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg) 52. Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades se

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	**5.871515582**	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	-73.52404162	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: La JAC Presentó la cantera CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SAS NIT.900414198 localizada en el municipio de MONIQUIRÁ

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9.00	7.00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9.00	7.00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.00	0.00
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.00	0.00

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 7/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se continua en este periodo por parte de la JAC actualización de Presupuesto de Obra.
* Se envían para aprobación de la interventoría cotizaciones de (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se inicia la vinculación de personal mano de obra no calificada y maestro general.
* Se participa de reunión técnica programada por la interventoría.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio y avance de los estudios y diseños para lograr pasar a la ejecución del proyecto, fue rechazada la propuesta de los estudios y Diseños por presupuesto ya se está realizando nuevas cotizaciones y se realizará entrega nuevamente para
* Se realizó nuevamente entrega de cotizaciones para los Estudios y Diseños.
* Se realizó comité técnico/operativo para aprobación de Cotización de estudios y diseños.
* Se realizaron tomas de muestras de subrasante para estudios y diseños.
* Se radica a la aseguradora solicitud para actualización de pólizas.
* Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 21 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 02 Sep. Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS.
* Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.

* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo.
* 10/09/2024 Se envió a interventoría los Estudios y Diseños del convenio para revisión.
* 11/09/2024 Se Instaló el buzón de sugerencias para la comunidad.
* 18/09/2024 Se realizó revisión de cotizaciones y de presupuesto en la oficina de interventoría
* 23/09/2024 Se recibió oficio TIC-INVIAS-1631-168 con las observaciones del área de PAVIMENTOS a la JAC
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 03/10/2024 Se envío Diseño Hidráulico a la Especialista Eugenia Villegas
* 05/10/2024 Se emitió TIC-INVIAS-1631-171- CONCEPTO FAVORABLE A LOS EYD - TEBAIDA
* 08/10/24 Se realizó comité de pagos a proveedores del convenio.
* 18/10/2024 se REALIZÓ COMITÉ DE APROBACIÓN DE COTIZACIONES.
* **21/10/2024 Se inician labores de obra.**
* 22/10/2024 Se realiza comité de pagos a proveedores.
* Se realiza acopio de materiales en obra, se cubren materiales pétreos con plástico.
* Se realiza corte y figurado de acero de refuerzo, para viguetas de placa huella.
* 5/11/2024 SE REALIZA COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 06/11/2024 SE ACOPIAN MATERIALES EN OBRA CONTINUA FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO LAS LLUVIAS PRESENTADAS ATRASAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
* 07/11/2024 LA OCURRENCIA DE LLUVIAS EN LA ZONA DIFICULTA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y BAJA EL RENDIMIENTO DE LAS ACTIIDADES DE OBRA.
* 08/11/2024 SE AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA.
* 08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
* 09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROC}
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA
* 18/11/2024 A CAUSA DE LAS LLUVIAS PRESENTADAS DIARIAMENTE DURANTE EL PERÍODO, EL ESTADO DE LA VÍA NO PERMITE EL ACCESO DE VEHÍCULOS PESADOS CON MATERIALES, LA COMUNIDAD SOLICITÓ ESPERAR A QUE CESEN LAS LLUVIAS PARA TRANSITAR CON VEHÍCULOS PESADOS POR LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA, DE IGUAL MANERA SE REQUIERE LA REALIZACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO PARA INGRESAR MATERIALES.
* 19/11/2024 SE REALIZA COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 20/11/2024 EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN REPROGRAMACIÓN DE OBRAS.
* 22/11/2024 EL ING REYNALDO MANTILLA DE INVIAS (SANTANDER) REALIZÓ VISITA AL SITIO, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 25/11/2024 EL ING. PEDRO J BARÓN DE INVIAS (BOGOTÁ) REALIZÓ VISITA AL SITIO CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO. SE TOMO LA DESICIÓN CONJUNTA CON LA COMUNIDAD DE REALIZAR EL TRASIEGO DE MATERIALES A LA OBRA EN CAMIONETA PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y DISMINUIR EL DAÑO EN LA VÍA
* 25/11/2024 SE REALIZA COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 02/12/2024 Se Tiene compactado 70% del tramo de subbase granular para iniciar instalación de acero de refuerzo y formaleta en sitio.
* 03/12/2024 Inicia Instalación de formaleta en madera para placa huellas.
* 04/12/2024 Durante la semana el alcance en obra a sido satisfactorio, ya se tiene 70% de la subbase granular compactada, para iniciar la construcción de concreto reforzado de placa huella
* 09/12/2024 Ingreso ayudante de construcción Tatiana.
* 11/12/2024 Durante el período se avanzo satisfactoriamente en la construcción de las obras, se tiene subbase granular compactada y el día 10 dic se realizó la primera fundida de concreto clase D huellas
* 17/12/2024 Inicio fundida de Viguetas en concreto 3000psi.
* 18/12/2024 Se realiza construcción de piedra pegada en zona central de la placa huella
* 20/12/2024 Se realiza fundida de riostras en concreto 3000psi reforzado.
* 30/12/2024 Avanza construcción de palca huellas de manera satisfactoria.
* 02/01/2025 No se evidencia realización de actividades en obra.
* 07/01/2025 Se retoman actividades en obra, avanza construcción de placa huellas en concreto reforzado 3000 psi.
* 07/01/2025 Se realiza trasiego de materiales en camioneta, desde el sector La Florida hasta la obra.
* 16/01/2025 Continúa construcción de placa huellas instalación de acero de refuerzo para riostras.
* 23/01/2025 Avanza construcción de placa huellas Sector PR00+60 al PR 00+100

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se dará continuidad a la construcción de la obra, se espera tener la subbase granular aplicada y compactada.
* Se dará continuidad a la construcción de estructura de placa huella en concreto reforzado de 3000 psi.
* Se realizará suministro de materiales de obra.
* Se realizarán pagos a proveedores del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA


PLACAHUELLA

		SEMANA 35
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	50.00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	50.00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100.00%
	EJEC	60.00%



ALCANTARILLA

		SEMANA 35
Construcción Alcantarilla	PROG	100.00%
	EJEC	50.00%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1
23/01/2025 Avance construcción de placa huellas sector PR0+60 al PR00+100



FOTO 2
23/01/2025 Avance construcción de placa huellas sector PR0+60 al PR00+100



FOTO 3
23/01/2025 Avance construcción de placa huellas sector PR0+60 al PR00+100

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del convenio realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
2. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega prioritaria de los estudios y diseños (Ed) acorde a que NO se deben generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en los tiempos ya estipulados.
3. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A.C
4. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-108 - OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de TEBAIDA, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el periodo correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales genera la aplicación de las multas contempladas en el convenio.
5. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
6. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social pagadas.
7. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.
* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios.
* 13/09/2024 Interventoría envió a todas las JAC TIC-INVIAS-1631-163 - Reiteración oficio TIC-INVIAS-1631-157 del 05/09/2024 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 23/09/2024 Se envió oficio TIC-INVIAS-1631-168 con las observaciones No.2 del área de PAVIMENTOS a la JAC .
* 26/09/2024 Interventoría Programo REUNIÓN Virtual con el Ing. Nelson Acevedo Gestor Ambiental para consultar sobre la aprobación de fuentes de materiales para los convenios.
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 03/10/2024 Se envío Diseño Hidráulico a la Especialista Eugenia Villegas
* 18/10/2024 se REALIZÓ COMITÉ DE APROBACIÓN DE COTIZACIONES.
* 22/10/2024 Interventoría y JAC realizan comité de pagos a proveedores.
* 5/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEDURA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 14/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINA LAS JAC PARA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN CONTABLE POR PARTE DE INVIAS
* 19/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 19/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINA LAS JAC PARA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN AMBIENTAL POR PARTE DE INVIAS

* 22/11/2024 INTERVENTORÍA REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A VISITA DEL ING REYNALDO MANTILLA DE INVIAS (SANTANDER) QUIEN REALIZÓ VISITA AL SITIO, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.

* 25/11/2024 EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Y EL ING. PEDRO J BARÓN DE INVIAS (BOGOTÁ) REALIZAN VISITA AL SITIO CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO. SE TOMO LA DESICIÓN

* 25/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 02/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST
* 10/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST.
* 11/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 17/12/2024 Interventoría realiza toma de densidades en la subbase granular aplicada.
* 18/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 19/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-251 CONCEPTO FAVORABLE AL ESTUDIO DE GEOTECNIA CORRESPONDIENTE A LOS EYD - TEBAIDA
* 26/12/2024 Interventoría emitió el comunicado TIC-INVIAS-1631-256- SOLICITUD DE DOCUMENTOS CONTABLES (General)
* 02/01/2025 Interventoría realiza permanente seguimiento a la ejecución de las obras, mediante inspección visual de las mismas.
* 10/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores
* 14/01/2025 Interventoría realiza visita técnica inspección de obra.
* 15/01/2025 Interventoría realizó reunión virtual para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.
* 16/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,

Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 23/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **35** del 17/1/2025 al 23/1/2025 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA **LA PALMERA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALMERA

CONVENIO No.	4565 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,029,468.00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,029,468.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/1/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%

CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394,093,490.00
FECHA DE INICIO:	27/5/2024	VALOR ADICIONES:	$ 81,075,700.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/9/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535,408,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/1/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201,029,468.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201,029,468.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535,408,180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 531,222,234		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 4,185,946		

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201,029,468.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 150,772,101.00	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 156,585,635.00	77.89%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-$ 5,813,534.00	-2.89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$ 44,443,833.00	22.11%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$ 201,029,468.00**	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$ 201,029,468.00**	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 32,164,714.88	16.00%

Observaciones: Las OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS corresponde a pagos realizados a proveedores del convenio, incluyendo pagos adelantados de materiales. Durante el período se avanzó satisfactoriamente en la construcción de las obras.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 530,969,478.00	99.17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 531,222,234.00	99.22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4,437,510.00	0.83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,184,754.00	0.78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100.00% — Avance o Atraso Físico %: 1.68%
Meta Física Ejecutada %: 101.68%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	119
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	119.00			119.00	100.00%
Ejec	121.00			121.00	101.68%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	**5.8715078**	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	-7.3524087	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

LA FUENTE DE MATERIALES PÉTREOS ESCOGIDA ES **"CALIZAS Y MINERALES S.A.S. NIT. 900414198-1** LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: EN GESTIÓN

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10.00	7.00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10.00	7.00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0.00	0.00
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0.00	0.00

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial el 6/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se realizó la socialización con la junta de acción comunal vereda Palmera del municipio de Vélez - Santander
* 9 habitantes de la Vereda La Palmera estuvieron realizando demolición de las cintas huellas con demoledores y herramienta manual pero no pudieron avanzar mucho debido a que el concreto reforzado estaba bastante resistente por lo cual finalmente analizaron la opción de gestionar una retroexcavadora con la Alcaldía o particular para ejecutar
* Se realizó por parte del Ingeniero Geotecnia la actividad de campo para la toma de muestras de suelo en la zona del proyecto para el correspondiente estudio de suelos
* Se realizó levantamiento topográfico del sitio del proyecto.
* Se realiza entrega de cotizaciones para los Estudios y Diseños
* Se realiza comité técnico/operativo para aprobación de Cotización de estudios y diseños.
* Se realiza el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se realiza visita y recorrido con el Ing. Director del INVIAS Santander Marlon Gamboa, JAC e Interventoría el día 04 de julio 2024, En la zona del proyecto estuvieron presentes la Interventoría y delegados del INVIAS con el fin de revisar el estado del proyecto. Se aprovechó esta visita para sugerirles a modo de solicitud de lo siguiente: 1) la posibilidad
* La comunidad de la Vereda La Palmera, realizará gestión administrativa para conseguir una retroexcavadora y de esa forma demoler las cintas huellas
* La firma encargada de los estudios del proyecto, realizará el correspondiente estudio de tránsito, hidrológico e hidráulico de la zona del proyecto para la entrega final de todos estudios
* Radicar a la Interventoría el ajuste de los estudios y diseños.
* Se le informó a la firma encargada de los estudios y diseños, las observaciones realizadas por la Interventoría para subsanación.
* Se radicó oficio en la Alcaldía Municipal de Vélez, comunicándole al Señor Alcalde el proyecto de placa huellas que se va a realizar en la Vereda La Palmera, entre el INVIAS y la JAC de la Vereda La Palmera
* Se trabajó en la actualización del presupuesto, y a la espera de la aprobación final de los estudios y diseños para terminar esta actividad.
* Se realizó la socialización con la junta de acción comunal vereda Palmera del municipio de Vélez - Santander
* Se realiza el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
*Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 21 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 28/0'8/2024 Interventoría emitió TIC-INVIAS-1631-148- CONCEPTO FAVORABLE A LOS EYD - LA PALMERA
* 02/09/2024 Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS.
* 02/10/2024 Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* 03/09/2024 Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.

* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo
* 11/09/2024 Se realizó comité operativo aprobación de cotizaciones de insumos y materiales.
* 24/09/2024 Interventoría envió a INVIAS TIC-INVIAS-1631-169 - Placa Huella. Vereda La Palmera, Municipio de Vélez. Oficio de interventoría a INVIAS solicitando revisión y aval de la construcción de la placa huella sobre las huellas existentes.
* 24/09/2024 Se emitió concepto aprobatorio al diseño de pavimentos presentado por la JAC
* 01/10/2024 Se realizó reunión con INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 08/10/2024 Se realizaron pagos a proveedores del Convenio
* 08/10/2024 Se realizó visita de campo para verificar las cinta huellas existentes en sitio, se realizará demolición de esta estructura con el fin de garantizar la cimentación de la nueva placa huella.
* 17/10/2024 SE REALIZA REVISIÓN PRESUPUESTO AJUTADO, TENIENDO EN CUENTA LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE LA CINTA HUELLA EXISTENTE. SE ENCUENTRA EN REALIZACIÓN EXAMENES MÉDICOS DEL PERSONAL QUE VA A TRABAJAR EN OBRA
* **INICIO OBRAS 18/10/2024**
* SE REALIZÓ DEMOLICIÓN DE LAS CINTA HUELLAS EN CONCRETO REFORZADO EXISTENTES.
* DURANTE LA SEMANA ENTRE EL 24-30 OCT SE AVANZÓ POCO DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EQUIPOS DE MAQUINARIA EN LA ZONA.
* 5/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEDURA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 06/11/2024 SE PRESENTAN LLUVIAS DIARIAMENTE DURANTE LA ULTIMA SEMANA LO CUAL DIFICULTA EL INGRESO DE MAQUINARIA AL SECTOR, DEBIDO AL ESTADO DEL TERRENO Y DE LAS ALTAS PENDIENTES
* 07/11/2024 LAS VOLQUETAS CON MATERIAL NO HAN PODIDO ACCEDER AL SITIO DE LAS OBRAS DEBIDO AL ESTADO DE LA CARRETERA LA CUAL ES MUY PENDIENTE Y POR LAS LLUVIAS LOS VEHICULOS SE QUEDAN PATINANDO EN EL BARRO.
* 08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
* 09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROGRAMACIÓN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONVENIO.
* 12/11/2024 SE REALIZÓ COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA
* 18/11/2024 LA OCURRENCIA DIARIA DE LLUVIAS NO PERMITE EL INGRESO DE VEHÍCULOS PESADOS A LA VEREDA, VA A SER NECESARIO REALIZAR AFIRMADOS EN LA VÍA DE ACCESO PARA PODER INGRESAR MATERIALES.
* 19/11/2024 JAC, INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 20/11/2024 EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN REPROGRAMACIÓN DE OBRAS.
* 25/11/2024 EL ING. PEDRO J BARÓN DE INVIAS (BOGOTÁ) REALIZÓ VISITA AL SITIO CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 27/11/2024 EL ESTADO DEL CLIMA HA MEJORADO, SE REACTIVAN LAS ACTIVIDADES DE OBRA, SIN EMBARGO EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO SIGUE SIENDO DIFÍCIL Y EL TRAFICO PESADO DE LA ZONA AFECTA DEMASIADO LA VÍA
* 28/11/2024 Se realiza la primera fundida de concreto 3000 psi para placa huella, se implementa sistema de canal para manejo del concreto. Hoy la interventoría toma densidades de campo en la subbase granular.
* 02/12/2024 Se realiza instalación de concreto piedra pegada centro y anchos.
* 04/11/2024 Durante la semana avanzó satisfactoriamente la construcción de placa huellas en concreto 3000 psi, se tienen 30 ml de placa huella fundidos
* 11/12/2024 Durante el período se avanzó satisfactoriamente en la construcción de las obras
* 19/12/2024 Se realiza construcción de placa huellas en concreto reforzado K0+080
* **30/12/2024 Se alcanza ejecución del 100% de la obra placa huella en concreto 3000 psi. Placa huella L=121m**
* 02/01/2025 Se encuentra en realización el cierre Ambiental y Social del convenio.
* 13/01/2024 Interventoría realizo visita de obra, se realizaron observaciones al contratista para recibo definitivo de las obras.
* 16/01/2025 Se encuentra en gestión la ejecución del Rubro PAGA, y la actividad social de terminación de terminación de obras con la comunidad
* 21/01/2025 JAC envió el comunicado Invitación a la inauguración de la placa huella Vereda La Palmera municipio de Vélez.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Gestión para liquidación del convenio, entrega y recibo de obras, cierre social, cierre ambiental, Cancelación de cuenta, etc.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA:

		SEMANA 35
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100.00%
	EJEC	100.00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100.00%
	EJEC	101.68%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100.00%
	EJEC	101.68%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	110.00%
	EJEC	101.68%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
13/01/2025 Obra Terminada



FOTO 2
13/01/2025 Obra Terminada



FOTO 3
13/01/2025 Obra Terminada

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad
2. La interventoría emite Respuesta el día 23-07-2024 con observaciones a los Estudios y Diseños presentados por la J.A.C. La Palmera el día 20-07-2024, Haciendo hincapié a que el día 20-07-2024 se les realizó observación puntual por no adjuntar el Estudio de Suelos y geotécnico.
3. El día 29-07-2024 la O.A.C. realiza entrega de Estudio de Suelos y geotécnico correspondiente a los Estudios y Diseños (EyD).
4. El día 02-08-2024 Interventoría realiza observaciones al Estudio de Suelos y geotécnico correspondiente a los Estudios y Diseños (EyD).
5. El día 28-08-2024 se dio concepto favorable por parte del especialista de vías para los EyD.
6. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A.C
7. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-110- OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de LA PALMERA, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el periodo correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales genera la aplicación de las multas contempladas en el convenio
8. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
9. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social pagadas.
10. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.
* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios.
* 13/09/2024 Interventoría envió a todas las JAC TIC-INVIAS-1631-163 - Reiteración oficio TIC-INVIAS-1631-157 del 05/09/2024 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 24/09/2024 Interventoría envió a INVIAS TIC-INVIAS-1631-169 - Placa Huella. Vereda La Palmera, Municipio de Vélez. Oficio de interventoría a INVIAS solicitando revisión y aval de la construcción de la placa huella sobre las huellas existentes.
* 24/09/2024 Se emitió concepto aprobatorio al diseño de pavimentos presentado por la JAC
* 01/10/2024 Se realizó reunión con INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores

* 08/10/2024 Interventoría autorizó realización de pagos a proveedores.
* 22/10/2024 Interventoría autorizó realización de pagos a proveedores.
* 29/10/2024 Interventoría autorizó realización de pagos a proveedores.
* 5/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEDURA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 12/11/2024 JAC, INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 14/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINÓ LA ASISTENCIA DE LAS JAC A CAPACITACIÓN CONTABLE PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS.
* 19/11/2024 JAC, INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 25/11/2024 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REALIZÓ VIVISTA CONJUNTAMENTE CON INVIAS BOGOTÁ A LA OBRA, VERIFICAR ESTADO DE OBRA.
* 02/12/2024 Interventoría Realizó comité de pagos a proveedores del convenio.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST
* 11/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría realizaron comité operativo de pago a proveedores.
* 18/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría realizaron comité operativo de pago a proveedores.
* 19/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-253 CONCEPTO FAVORABLE AL ESTUDIO DE GEOTECNIA CORRESPONDIENTE A LOS EYD - LA PALMERA
* 24/12/2024 Interventoría emitió el comunicado TIC-INVIAS-1631-266 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA LA PALMERA -VELEZ
* 10/01/2025 Interventoría, JAC y Veeduría realizaron comité operativo de pago a proveedores.
* 15/01/2025 Interventoría realizó reunión virtual para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.
* 16/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para autorización de pagos del convenio.
* 23/01/2025 Interventoría emitió el comunicado TIC-INVIAS-1631-280 - REITERACIÓN DE LA SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **36** del 24/01/2025 al 30/01/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA **GUAMAL** DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL		
CONVENIO No.	3951 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.006.719,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.006.719,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394.093.490,00
FECHA DE INICIO:	27/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141.314.690,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535.408.180,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.006.719,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.006.719,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535.408.180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 535.406.990		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.190		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	201.006.719,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150.755.039,25	75,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	159.507.243,18	79,35%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(8.752.203,93)	-4,35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$	36.072.294,41	17,95%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**201.006.719,00**	**100,00%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**195.579.537,59**	**97,30%**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(8.752.203,93)	-4,35%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0,00%

Observaciones: El valor correspondiente a la inversión total ejecutada corresponde a la suma de pagos realizadas en todos los rubros (Costos Directos, Gastos Administrativos, PAGA, etc). En este momento la JAC se encuentra en proceso de devolución de rendimientos financieros, y cancelación de la cuenta.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 535.408.180,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 535.406.989,60	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.438.702,00	0,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.184.755,60	0,78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% — Avance o Atraso Físico %: 4,89%

Meta Física Ejecutada %: 104,89%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	metros lineales	140
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	140,00			140,00	100,00%
Ejec	**146,85**			**146,85**	**104,89%**
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO UNICO DE PLACAHUELLA — TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de oper	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuch	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	5,89916	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	-73,58554	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: La JAC Presentó la cantera CANTERA EL CAIRO S.A.S. NIT. 900729004 localizada en KM 6 VIA MONIQUIRA-TUNJA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN REVISIÓN

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10,00	7,00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10,00	7,00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0,00	0,00
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0,00	0,00

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 7/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se da inicio a las actividades con la junta de acción comunal vereda Guamal del municipio de Bolívar - Santander
* Se realiza el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se realiza entrega de cotizaciones para Estudios y Diseños.
* Se asiste a comité semanal en conjunto con Interventoría.
* Se realiza entrega de cotizaciones correspondientes a los Estudios y Diseños (EyD), las cuales no fueron aprobadas por la interventoría, por elevados costos.
* Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 22 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 02 Sep. Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS
* Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.

* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo.
* 10/09/2024 JAC presentó cotización para realización de Estudios y diseños del convenio.
* 17/09/2024 Se realizó aprobación de la cotización de Estudios y diseños por 4'500.000
* 17/09/2024 Se envió a la Interventoría los Estudios y diseños, Interventoría respondió Observaciones.
* 20/09/2024 Se recibió comunicado TIC-INVIAS-1631-165 Solicitando completar los estudios y diseños.
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 03/10/2024 Se realizó reunión INTERVENTORÍA - INVIAS se expuso el estado general de los convenios, sin embargo se programó reunión extraordinaria con las veredas GUAMAL Y GAITAL.
* 04/10/2024 Se estableció compromiso por parte de la JAC de presentar la documentación pendiente y adelantar la gestión necesaria para realización del convenio, con mayor diligencia y compromiso.
* 08/10/2024 Se realizó visita al sitio, esta visita había sido solicitada porque los dueños de los predios aledaños no dejaban hacer volteadero para las volquetas, sin embargo al llegar al sitio estaba reunida gran parte de la comunidad solicitaron hacer las placa huellas en el sector que más lo requiere, que es iniciando el corredor vial, un sector de alta pendiente.
* 08/10/2024 Se solicitó al diseñador realizar el cambio de tramo, se autorizó el pago de estos diseños adicionales al proveedor.
* 09/10/2024 SE trabajó revisión de cotizaciones vía Google meet. En espera de los diseños definitivos
* 10/10/2024 Interventoría emitió TIC-INVIAS-1631-175- Observaciones del especialista en geotecnia a los EyD - GUAMAL
* 16/10/2024 A la fecha la JAC no ha presentado los diseños definitivos del tramo a intervenir
* 21/10/2024 Se realizó topografía de terreno para completar el levantamiento de diseño del tramo priorizado.
* 22/10/2024 Se realizó **comité aprobación de cotizaciones** de materiales e insumos representativos del convenio.
* 23/10/2024 Por vía WhatsApp se enviaron documentos de diseño, pero hace falta una entrega organizada y formal del los diseños del nuevo tramo.

29/10/2024 JAC envío correo con estudios y diseños, sin embargo, la documentación no está completa falta diseño geométrico.

29/10/2024 Se realizó **ajuste del presupuesto** de obra

29/10/2024 Se realizaron pagos para materiales de construcción,

29/10/2024 JAC norma renuncia del ingeniero residente, envió hoja de vida de ingeniero residente para aprobación.

01/11/2024 INICIO OBRAS

05/11/2024 Se realizó COMITÉ DE PAGOS a proveedores del convenio.

06/11/2024 SE TIENE APLICADA SUBBASE GRANULAR, SE REALIZA FIGURADO DE ACERO Y FORMALETA PARA PLACAHUELLA

08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.

09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROGRAMACIÓN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONVENIO.

13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA.

18/11/2024 DURANTE EL PERÍODO SE AVANZÓ SATISFACTORIAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE PLACAHUELLAS.

19/11/2024 NO FUÉ POSIBLE REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES, EL BANCO NO ENTREGA AÚN LA CHEQUERA SOLICITADA POR LA JUNTA

25/11/2024 SE REALIZÓ COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO

27/11/2024 DURAN TE EL PERÍODO SE AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLAS EN CONCRETO 3000PSI.

27/11/2024 SE PROGRAMA HOY REUNION VIRTUAL CON EL DISEÑADOR PARA QUE PRESENTE CORRECCIONES A LOS INFORMES DE DISEÑO.

04/12/2024 Durante la última semana se avanzó satisfactoriamente en la construcción de placa huellas.

11/12/2024 Durante la última semana se avanzó satisfactoriamente en la construcción de placa huellas. fecha terminación 16/12/2024

16/12/2024 Se tiene ejecutado el 100% de la meta física programada. Tramo Placa huella L=146,85 mts

26/12/2024 Se encuentra en realización la gestión para cierre de la cuenta bancaria y liquidación del convenio.

02/01/2025 Se encuentra en realización el cierre Ambiental y Social del convenio.

16/01/2024 en este momento se encuentra en gestión la ejecución del RUBRO PAGA.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se realizará la actividad PAGA-
* Dar cierre a la gestión ambiental del CONVENIO
* Realizar los Pagos pendientes principalmente de tipo administrativo, Planillas de se social, Devolución de retenciones, Devolución de rendimientos, etc.
* Dar cierre a la parte contable y cuenta del convenio.

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA:

		SEMANA 24
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
12/12/2024 Placa huella Construida



FOTOGRAFÍA 2
12/12/2024 Placa huella Construida



FOTOGRAFÍA 3
12/12/2024 Construcción de placa huellas

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
2. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega prioritaria de los estudios y diseños (EyD), de acuerdo a que oportunamente se realizó y se dio un visto bueno a la cotización presentada, no obstante, el Ingeniero Aldahir Peña, argumenta que han tenido inconvenientes con el correo electrónico y que se ha dificultado recopilar la información.
* 25/07/2024 Se envió un oficio TIC-INVIAS-1631-096, en el cual se expone la preocupación por la dilatación de tiempos de entrega de documentación requerida (especialmente Estudios y Diseños), acorde a que no se han obtenido respuestas a las solicitudes emitidas por parte del personal de interventoría.

Por parte de la interventoría se les envía información correspondiente y se encuentra disponible para cualquier inquietud, no obstante, haciendo hincapié a que no se pueden extender los tiempos de entrega, porque podría afectar y generar un detrimento en el periodo estipulado de finalización del proyecto.

3. Por parte de la O.A.C. presente nuevamente cotizaciones para los Estudios y Diseños (EyD), lo cual no corresponde a los costos del sector, siendo estos muy elevados.
4. La O.A.C. se encuentra realizando subsanaciones de acuerdo a observaciones emitidas por la Interventoría.
5. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A.C
6. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-114 - OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de GUAMAL, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni
7. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
8. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social pagadas.
9. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.
* A la fecha del presente informe, la JAC Guamal no ha presentado cotizaciones de ESTUDIOS Y DISEÑOS con precios ajustados al mercado.
* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
*12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 17/09/2024 Interventoría realizó aprobación de pagos con cheque para gastos administrativos.
* 20/09/2024 Interventoría envió al especialista en Geotecnia el estudio presentado (Faltaron Estudios de diseño geométrico y Pavimentos).
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas

* 03/10/2024 Se realizó reunión INTERVENTORÍA - INVIAS se expuso el estado general de los convenios, sin embargo se programó reunión extraordinaria con las veredas GUAMAL Y GAITAL.
* 04/10/2024 Se estableció compromiso por parte de la JAC de presentar la documentación pendiente y adelantar la gestión necesaria para realización del convenio, con mayor diligencia y compromiso.

* 08/10/2024 Interventoría realizó visita al sitio, esta visita había sido solicitada porque los dueños de los predios aledaños no dejaban hacer volteadero para las volquetas, sin embargo al llegar al sitio estaba reunida gran parte de la comunidad solicitaron hacer las placa huellas en el sector que más lo requiere, que es iniciando el corredor vial, un sector de alta pendiente.
* 10/10/2024 Interventoría emitió TIC-INVIAS-1631-175- Observaciones del especialista en geotecnia a los EyD - GUAMAL
* 22/10/2024 Se realizó comité aprobación de cotizaciones de materiales e insumos representativos del convenio.
* 29/10/2024 Se realizaron pagos para materiales de construcción
* 05/11/2024 Interventoría , JAC y Veeduría realizan COMITÉ DE PAGOS a proveedores del convenio.
* 14/11/2024 Interventoría Coordinó la asistencia de las JAC a la CAPACITACIÓN ASPECTOS CONTABLES organizada por INVIAS
* 16/11/2024 INTERVENTORÍA REALIZÓ ENSAYOS DE DENSIDADES EN LA SUBBASE GRANULAR DEL SECTOR DONDE AÚN FALTA POR FUNDIR PLACHAUELLA.
* 19/11/2024 NO FUÉ POSIBLE REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES, EL BANCO NO ENTREGA AÚN LA CHEQUERA SOLICITADA POR LA JUNTA.
* 20/11/2024 Interventoría envió a la JAC el comunicado TIC-INVIAS-1631-229 OBSERVACIONES ÁREA PAVIMENTOS A LOS E Y D DEL TRAMO PRIORIZADO.
* 27/11/2024 INTERVNETORÍA REALIZÓ REUNION VIRTUAL CON EL DISEÑADOR PARA QUE PRESENTE CORRECCIONES A LOS INFORMES DE DISEÑO.
* 02/12/2024 Interventoría Realizó comités de pagos a proveedores del convenio.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST.
* 09/12/2024 Interventoría envió comunicado TIC-INVIAS-1631-241 CONCEPTO FAVORABLE AL ESTUDIO DE GEOTECNIA CORRESPONDIENTE A LOS EYD - GUAMAL
* 11/12/2024 Interventoría JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 12/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST.
* 17/12/2024 Mediante Correo Electrónico con el asunto PRORROGA No 3 PARA ACTAUALIZACION DE POLIZAS- GUAMAL, Interventoría solicitó a la JAC realizar la actualizción de las pólizas del convenio.
* 24/12/2024 Interventoría envió comunicado TIC-INVIAS-1631-257 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA VEREDA GUAMAL - BOLÍVAR
* 10/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.
* 15/01/2025 Interventoría realizó reunión para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.
* 16/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.
* 24/01/2025 Interventoría emitió el comunicado TIC-INVIAS-1631-281 - REITERACIÓN DE LA SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA
* 29/01/2025 Interventoría emitió el comunicado TIC-INVIAS-1631-286 - Inicio de procedimiento de aplicación de multas por incumplimiento. (Área Ambiental).

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: **36** (Numeración consecutiva) del 24/01/2025 al 31/01/2025 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE **LA UNION** DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION		
CONVENIO No.	4478 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.981.336,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.981.336,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394.093.490,00
FECHA DE INICIO:	27/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141.314.690,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535.408.180,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.981.336,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.981.336,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535.408.180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 535.406.990		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.190		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200.981.336,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200.981.336,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	184.796.669,33	91,95%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	16.184.666,67	8,05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	16.184.666,67	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200.981.336,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200.981.336,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	20.098.133,60	10,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	20.098.133,60	10,00%

Observaciones: Se culminan las obras objeto del Convenio en la semana de ejecución de obra No.9

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	535.408.180,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	535.406.989,60	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4.438.702,00	0,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4.184.755,60	0,78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% | Avance o Atraso Físico %: 10,38%

Meta Física Ejecutada %: 110,38%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	106
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	106,00			106,00	100%
Ejec	117,00			117,00	110%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: La JAC se encuentra pendiente a remitir a esta interventoría dicha información.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-225 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8,0	7,0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2,0	7,0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0,0	0,0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0,0	0,0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15,0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se da inicio a las actividades el día 27/05/2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
04/10/20244 El 15 DE AGOSTO INTERVENTORÍA EMITIÓ CONCEPTO FAVORABLE A LOS DISEÑOS DEL ÁREA DE PAVIMENTOS Y DISEÑO GEOMÉTRICO TIC-INVIAS-1631-132
04/10/20244 Se realizó trabajo de oficina conjuntamente con el Ing. residente de Obra para avanzar en el AJUSTE PRESUPUESTAL, el presupuesto definitivo quedó revisado, pendiente aprobaciones de Estudios y Diseños.
04/10/20244 Se realizó revisión de PRESUPUESTO AJUSTADO, fue enviado al Ing. Director de Interventoría para revisión.
16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-197 con observaciones al área Hidráulica de los Estudios y diseños entregados por la JAC
16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-198 con aspectos a corregir después de la tercera revisión al Informe de Geotecnia como parte de los Estudios y diseños entregados por la JAC
17/10/2024 Se remite a la JAC por medio de Correo electrónico la Prórroga N° 2 al Convenio N° 4478 - 2023 con el fin de que El conveniado actualice las Pólizas del mismo.
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 Se remite a la JAC por medio de Correo electrónico la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio N° 4478 - 2023 con el fin de que El conveniado actualice las Pólizas del mismo.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 18/11/2024 la JAC realiza entrega mediante correo electrónico de documentación de gestión ambiental.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 27/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo

* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 97 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, franja de enrocado central también de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía y rampas de inicio y final también en concreto reforzado de 21 mpa.

* 27/11/2024 se tiene ejecutado a la fecha también, la instalación de 5,0 ml de tubería en concreto de 21 mpa, con su respectivo atraque y relleno, se cuenta con la estructura de encole terminada y se encuentra en proceso de instalación de acero de refuerzo y formaleta para la estructura de descole de la alcantarilla proyectada en este tramo.

* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-225 al invias radicando el paga del convenio.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 02/12/2024 se realizará revisión de balance del convenio para determinar una posible ampliación de la meta física.
* 05/12/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 06/12/2024 Se culminan las actividades de ejecución de la Obra objeto del Convenio con una Meta física de 117 ml de Placas huella construidas en Concreto de 21 Mpa y Construcción de una (1) Alcantarilla con una Instalación de 5 ml de Tubería en concreto de 36" con sus respectivas Estructuras de Encole y Descole también en Concreto de 21 Mpa.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*13/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-246 respuesta a radicado invias 2024s-vbog-092184 del 05 de diciembre de 2024 acerca de la gestión ambiental del convenio
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*17/12/2024 se remite a la JAC prórroga n° 3 del convenio para actualización de pólizas
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-258 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-270 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma
* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra
* 28/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realizará seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* La O.A.C. realizará entrega de subsanaciones a observaciones realizadas por la Interventoría para los Estudios y Diseños (EyD).
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 36
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100,00%
	EJEC	0,00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100,00%
	EJEC	110,38%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100,00%
	EJEC	110,38%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100,00%
	EJEC	110,38%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100,00%
	EJEC	110,38%

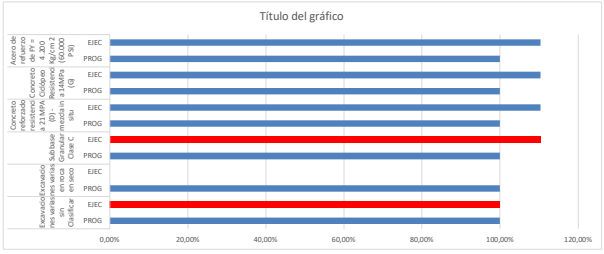

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 Comité Operativo para autorización de Cheques para pagos



FOTO 2 Instalación Acero de refuerzo para Descole Alcantarilla



FOTO 3 Fundida de Cunetas en Concreto de 21 Mpa

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-197 con observaciones al área Hidráulica de los Estudios y diseños entregados por la JAC
16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-197 con aspectos a corregir después de la tercera revisión al Informe de Geotecnia como parte de los Estudios y diseños entregados por la JAC
17/10/2024 Se remite a la JAC por medio de Correo electrónico la Prórroga N° 2 al Convenio N° 4478 - 2023 con el fin de que El conveniado actualice las Pólizas del mismo.
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 Se remite a la JAC por medio de Correo electrónico la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio N° 4478 - 2023 con el fin de que El conveniado actualice las Pólizas del mismo.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 18/11/2024 la JAC realiza entrega mediante correo electrónico de documentación de gestión ambiental.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 27/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo

* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 97 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, franja de enrocado central también de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía y rampas de inicio y final también en concreto reforzado de 21 mpa.

* 27/11/2024 se tiene ejecutado a la fecha también, la instalación de 5,0 ml de tubería en concreto de 21 mpa, con su respectivo atraque y relleno, se cuenta con la estructura de encole terminada y se encuentra en proceso de instalación de acero de refuerzo y formaleta para la estructura de descole de la alcantarilla proyectada en este tramo.
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-225 al invias radicando el paga del convenio.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 02/12/2024 se realizará revisión de balance del convenio para determinar una posible ampliación de la meta física.

* 06/12/2024 Se culminan las actividades de ejecución de la Obra objeto del Convenio con una Meta física de 117 ml de Placas huella construidas en Concreto de 21 Mpa y Construcción de una (1) Alcantarilla con una Instalación de 5 ml de Tubería en concreto de 36" con sus respectivas Estructuras de Encole y Descole también en Concreto de 21 Mpa.

* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*13/12/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-246 respuesta a radicado invias 2024s-vbog-092184 del 05 de diciembre de 2024 acerca de la gestión ambiental del convenio
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*17/12/2024 se remite a la jac prórroga n° 3 del convenio para actualización de pólizas
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-258 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-270 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma
* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra
* 28/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1/2

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **36** del 24/01/2025 al 31/01/2025 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA **POPOA** DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POPOA		
CONVENIO No.	4767 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.995.632,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.995.632,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394.093.490,00
FECHA DE INICIO:	27/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141.314.690,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535.408.180,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.995.632,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.995.632,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535.408.180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 535.406.990		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.190		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200.995.632,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200.995.632,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	185.010.965,33	92,05%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	15.984.666,67	7,95%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$	15.984.666,67	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200.995.632,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200.995.632,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	17.211.162,00	8,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	10.049.781,60	5,00%

Observaciones: Esta es la semana de ejecución de obra No.10

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	535.408.180,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	535.406.989,60	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4.438.702,00	0,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4.184.755,60	0,78%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 83,74% — Avance o Atraso Físico %: 0,00%
Meta Física Ejecutada %: 83,74%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	123
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	103,00			103,00	84%
Ejec	103,00			103,00	84%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: La JAC se encuentra pendiente a remitir a esta interventoría dicha información.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-213 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7,00	7,00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2,00	7,00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0,00	0,00
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0,00	0,00

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 8/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
*2/10/2024 El Contratista presentó Cotizaciones para revisión y aprobación
* 4/10/2024 La JAC envió documentos de la cantera CALIZAS Y MINERALES
* 4/10/2024 Se realizó comité aprobatorio de COTIZACIONES
* 4/10/2024 PARA TENER EN CUENTA, EL CBR DEL TERRENO ES INFERIOR AL 3%, sin embargo el ingeniero Residente de Obra, aclaró que se debe corregir este párrafo en el Estudio de Geotecnia , porque el ceber de diseño SI ES SUPERIOR A 3%
* 8/10/2024 Se realizó Comité Operativo No.2 para firma de cheques y/o transferencias para pagos a Proveedores
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto, ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 20/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 20/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-222 a la JAC con las observaciones producto de la revisión del componente hidráulico de los estudio y diseños entregados por el conveniado.
* 20/11/2024 la jac realiza la entrega de las correcciones al área de geotecnia de los estudios y diseños
* 26/11/2024 la jac remite a la interventoría comunicado informando que pretende realizar la devolución de los recursos destinados para el paga.
* 27/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 83 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, incluyendo también la franja de enrocado central de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía (sin bordillo) y rampa de inicio en concreto reforzado de 21 mpa. 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 05/12/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
*11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*11/12/2024 Se continua con la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para placas huella y cunetas, y se realiza también la construcción de enrocados centrales y laterales en concreto ciclópeo
* 12/12/2024 la jac realiza la entrega de la última versión de los estudios del área de geotécnia de los estudios y diseños
* 12/12/2024 se culminan las actividades de ejecución de obra con una meta física de 103 ml de placas huella construidas y construcción de 6,0 ml de alcantarilla en tubería en concreto de 36" con sus respectivas estructuras de encole y descole
* 16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
* 17/12/2024 se remite a la jac prórroga n° 3 del convenio para actualización de pólizas
* 18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 19/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-254 al Invias con Entrega oficial del Plan de inversión social del convenio.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-259 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-271 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma
* 10/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra
* 28/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realizará seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* La O.A.C. realizará entrega de subsanaciones a observaciones realizadas por la Interventoría para los Estudios y Diseños (EyD).
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 36
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100,00%
	EJEC	0,00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%

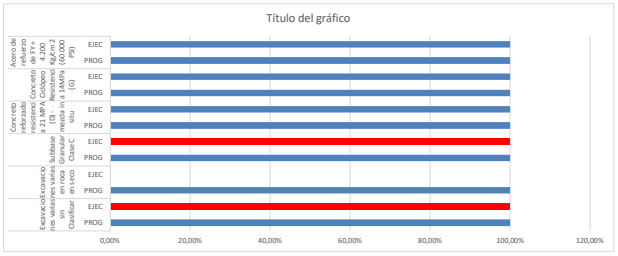

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
Comité Operativo para autorización de Cheques para pagos



FOTO 2
Placas Huella terminadas



FOTO 3
Placas Huella terminadas

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
*2/10/2024 El Contratista presentó Cotizaciones para revisión y aprobación
* 4/10/2024 Se realizó reunión de seguimiento con INVIAS, presentación del estado de avance de los convenios
* 4/10/2024 La JAC envió documentos de la cantera CALIZAS Y MINERALES
* 4/10/2024 Se realizó comité aprobatorio de COTIZACIONES
* 8/10/2024 Se realizó Comité Operativo No.2 para firma de cheques y/o transferencias para pagos a Proveedores
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto, ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 la presencia de lluvias fuertes en los últimos días en el sector del proyecto ha afectado de manera importante el rendimiento de la ejecución de la obra.
* 20/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-222 a la JAC con las observaciones producto de la revisión del componente hidráulico de los estudio y diseños entregados por el conveniado.
* 20/11/2024 la JAC realiza la entrega de las correcciones al área de geotecnia de los estudios y diseños
* 26/11/2024 la JAC remite a la interventoría comunicado informando que pretende realizar la devolución de los recursos destinados para el paga.
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 83 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, incluyendo también la franja de enrocado central de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía (sin bordillo) y rampa de inicio en concreto
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/12/2024 la JAC realiza la entrega de la última versión de los estudios del área de geotécnia de los estudios y diseños
* 12/12/2024 se culminan las actividades de ejecución de obra con una meta física de 103 ml de placas huella construidas y construcción de 6,0 ml de alcantarilla en tubería en concreto de 36" con sus respectivas estructuras de encole y descole
* 16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
* 17/12/2024 se remite a la jac prórroga n° 3 del convenio para actualización de pólizas
* 18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 19/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-254 al Invias con Entrega oficial del Plan de inversión social del convenio.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-259 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-271 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma
* 10/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra
* 28/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: **36** del 24/01/2025 al 31/01/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA **BERLIN** DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL BERLIN

CONVENIO No.	3753 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.108.139,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.108.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%

CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394.093.490,00
FECHA DE INICIO:	27/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141.314.690,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535.408.180,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.108.139,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.108.139,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535.408.180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 535.406.990		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.190		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200.108.139,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200.108.139,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	200.108.139,00	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	17.076.666,67	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200.108.139,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200.108.139,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0,00%

Observaciones: la ejecución de la Obra se culminó en la semana No.7

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	535.408.180,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	535.406.989,60	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4.438.702,00	0,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4.184.755,60	0,78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,00% | Avance o Atraso Físico % 3,36%
Meta Física Ejecutada % 103,36%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	ml	149
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	149,00			149,00	100,00%
Ejec	154,00			154,00	103,36%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: BERLÍN | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	1
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	1	1
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	1
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	1
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	1
Ruteadora	1	1
Compresor (barrido y soplado)	1	1
Camioneta D-300	1	1
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Compresor 120 HP, con martillo	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Aspersor manual	1	1
Total	13	13

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	6,3 km de la Obra	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	Cerca al casco urbano municipal	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

Observaciones: La JAC presento los documentos de la antera **ASOCIACION DE MINEROS AGROINDUSTRIALES AMBIENTALISTAS LA BELLEZA TMR ONG**. Localizada cerca al casco urbano del Municipio a 6,3 km del Sitio de la Obra.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2/2

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-177 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10,0	7,0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2,0	7,0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0,0	0,0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0,0	0,0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
* Se realizó socialización inicial el 7/06/2024.
* Se realizó socialización de terminación de la Obra el 13/12/2024.
* Se ejecutó el Plan de Inversión Social

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
*02/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 10/10/2024 La JAC envió formatos de gestión ambiental
*15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*21/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 23/10/2024 Se realizó visita de Obra por parte de los Componentes Ambiental, Social y Técnico de La Interventoría
* 24/10/2024 La JAC en la presente semana realizó la entrega del Plan de Inversión social Proyectado en el Convenio.
* 25/10/2024 Mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-203 La Interventoría realiza la Entrega oficial al INVIAS de las correcciones solicitadas al Plan de inversión social del convenio 3753 – 2023 OAC Vereda Berlín.
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-219 a la JAC solicitando la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la JAC realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la JAC
* 29/11/2024 La JAC realizó la entrega de las Pólizas del Convenio actualizadas al 11 de noviembre de2024
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-260 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-272 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma
* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra
* 28/01/2025 se realiza devolución de los Rendimientos financieros al Tesoro Nacional y se encuentra en Trámite el cierre de la cuenta del Convenio.
* 28/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realizará seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 36
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	80,00%
	EJEC	0,00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%

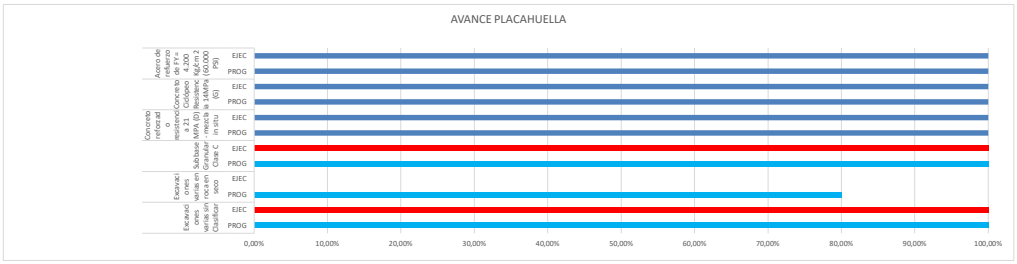

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
Comité Operativo para autorización de Cheques para pagos



FOTO 2
Placa huella terminada



FOTO 3
Vista general Placa huella construida

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
*02/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 04/10/2024 Se realizó reunión de seguimiento con INVIAS, presentación del estado de avance de los convenios
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 10/10/2024 La JAC envió formatos de gestión ambiental
*15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
*21/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 23/10/2024 Se realizó visita de Obra por parte de los Componentes Ambiental, Social y Técnico de La Interventoría
* 25/10/2024 Mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-203 La Interventoría realiza la Entrega oficial al INVIAS de las correcciones solicitadas al Plan de inversión social del convenio 3753 – 2023 OAC Vereda Berlín.
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

* 06/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para bordillos de cunetas y limpieza de la obra.

* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-219 a la jac solicitando la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la JAC realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la JAC
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.
* 29/11/2024 La JAC realizó la entrega de las Pólizas del Convenio actualizadas al 11 de noviembre de2024
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-260 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.

*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-272 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma

* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra

* 28/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO.

Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1/2

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: **36** del 24/01/2025 al 31/01/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **CACHIPAYAL** DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL

CONVENIO No.	4175 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.319.574,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.319.574,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%

CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394.093.490,00
FECHA DE INICIO:	27/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141.314.690,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535.408.180,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.319.574,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.319.574,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535.408.180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 535.406.990		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.190		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		$200.319.574,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		$200.319.574,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		$200.319.574,00	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		$42.026.640,00	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200.319.574,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200.319.574,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0,00%
	$ -		

Observaciones: la ejecución de la Obra se culminó en la semana No.7

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	535.408.180,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	535.406.989,60	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4.438.702,00	0,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4.184.755,60	0,78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 100,00% | Avance o Atraso Físico % -7,10%
Meta Física Ejecutada % 92,90%

Meta Fisica (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	ml	155
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	155,00			155,00	100,00%
Ejec	144,00			144,00	92,90%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52. Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	1
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	1	1
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	1
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	1
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	1
Ruteadora	1	1
Compresor (barrido y soplado)	1	1
Camioneta D-300	1	1
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Compresor 120 HP, con martillo	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Aspersor manual	1	1
Total	13	13

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: CACHIPAYAL | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Cerca al caso Urbano	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	Distancia 13Km de la obra	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
La JAC de Cachipayal presentó los documentos de la Cantera SCS BUENAVISTA , RLHECTOR ALONSO MORENO QUITIAN , Localizada 13 Km del sitio de la obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-176 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10,0	7,0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2,0	7,0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0,0	0,0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0,0	0,0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:
*Se realizó socialización inicial 7/06/2024.
* Durante el período se realizó acompañamiento y asesoría al personal Administrativo de la OAC en la formulación del presupuesto de Gestión Social del convenio.
* Se realizó socialización de terminación de la Obra el 13/12/2024.
* Se ejecutó el Plan de Inversión Social

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 10/10/2024 La JAC envió formatos de gestión ambiental
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 23/10/2024 Se realizó visita de Obra por parte de los Componentes Ambiental, Social y Técnico de La Interventoría
* 24/10/2024 La JAC en la presente semana realizó la entrega del Plan de Inversión social Proyectado en el Convenio.

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

* 25/10/2024 Mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-203 La Interventoría realiza la Entrega oficial al INVIAS de las correcciones solicitadas al Plan de inversión social del convenio 4175 – 2023 OAC Vereda Cachipayal.
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 El Conveniado realiza la entrega del Informe de Replanteo y Nivelación Topográfica del tramo.
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 15/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-219 a la jac solicitando la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la JAC realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la JAC
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-261 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-273 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma
* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra
* 28/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realizará seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* La O.A.C. realizará entrega de subsanaciones a observaciones realizadas por la Interventoría para los Estudios y Diseños (EyD).
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 36
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	80,00%
	EJEC	0,00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
Placa huella terminada



FOTO 2
Placa huella terminada



FOTO 3
Vista general Tramo de Placa huella

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del convenio realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 10/10/2024 La JAC envió formatos de gestión ambiental
* 15/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 23/10/2024 Se realizó visita de Obra por parte de los Componentes Ambiental, Social y Técnico de La Interventoría
* 25/10/2024 Mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-203 La Interventoría realiza la Entrega oficial al INVIAS de las correcciones solicitadas al Plan de inversión social del convenio 4175 – 2023 OAC Vereda Cachipayal.
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 06/11/2024 se continúan la ejecución de actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y fundida de concreto de 21 mpa para bordillos de cunetas y limpieza de la obra.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 15/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-218 a la jac informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 15/11/2024 se remite comunicado tic-invias-1631-219 a la jac solicitando la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la JAC realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la JAC
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-261 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*03/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-273 a la JAC emitiendo el concepto favorable al componente de geología y geotécnia de los estudios y diseños presentados por la misma
* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra
* 28/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **36** del 24/01/2025 al 31/01/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA **ORGANOS** DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS		
CONVENIO No.	4490 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.785.769,00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.785.769,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394.093.490,00
FECHA DE INICIO:	27/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141.314.690,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535.408.180,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.785.769,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.785.769,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535.408.180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 535.406.990		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.190		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200.785.769,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	200.785.769,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	166.342.065,77	82,85%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	34.443.703,23	17,15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	34.443.703,23	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	200.785.769,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	200.785.769,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0,00%

Observaciones:
Esta es la semana de ejecución de obra No.9

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	535.408.180,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	535.406.989,60	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4.438.702,00	0,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4.184.755,60	0,78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,00% — Avance o Atraso Físico % 16,67%

Meta Física Ejecutada % 116,67%

Meta Fisica (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	ml	150
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	150,00			150,00	100,00%
Ejec	175,00			175,00	116,67%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: ORGANOS — TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	1
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	1
Cizalla manual de 90 cm.	1	1
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	1
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	1
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	1
Ruteadora	1	1
Compresor (barrido y soplado)	1	1
Camioneta D-300	1	1
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Compresor 120 HP, con martillo	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Aspersor manual	1	1
Total	13	13

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	5.896845	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	-73.837612	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: La JAC presentó documento RUCOM y licencias del proveedor de materiales pétreos llamado TECNOCONSTRUCTORES, (Cantera Peña Blanca) localizado a 10 Km del sector en intervención. Pendiente solicitar al proveedor las licencias ambientales de la fuente de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL DOCUMENTO SE RADICÓ ANTE EL INVIAS MEDIANTE COMUNICADO TIC-INVIAS-1631-190 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER

OBSERVACIONES:

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8,0	7,0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2,0	7,0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0,0	0,0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0,0	0,0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15,0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

* Se presenta cambio residente de interventoría el 03/07/2024.
* Se realizó socialización inicial el 5/06/2024.
* Se realizó socialización de terminación de la Obra el 27/12/2024.
* Se ejecutó el Plan de Inversión Social

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 04/10/2024 Se realizó reunión de seguimiento con INVIAS, presentación del estado de avance de los convenios
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 15/10/2024 La JAC remitió a la Interventoría los documentos de Gestión Ambiental del Convenio, quien a su vez mediante comunicado N° TIC-INVIAS-1631-190 realizó la radicación de los mencionados documentos ante La Subdirección de sostenibilidad del Invias
* 16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-193 con aspectos a corregir después de la tercera revisión al Informe de Geotecnia como parte de los Estudios y diseños entregados por la JAC
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 después de realizar el balance presupuestal del convenio se llegó a la conclusión de que se puede ampliar la meta física proyectada de 10 ml para construir un total de placas huella de 160 ml de longitud aproximada, ampliación que se encuentra en ejecución a la fecha
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 después de realizar el balance presupuestal del convenio se llegó a la conclusión de que se puede ampliar la meta física proyectada de 20 ml para construir un total de placas huella de 170 ml de longitud aproximada, ampliación que se encuentra en ejecución a la fecha
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 se encuentra pendiente iniciar la entrega de la documentación para la liquidación del convenio por parte de la jac
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la jac realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la jac 27/11/2024 se culminan las obras del presente convenio
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 175 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, franja de enrocado central también de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía y rampas de inicio y final también en concreto reforzado de 21 mpa, completando de esta manera el 116,7 % del alcance del proyecto ya que se tenía un alcance inicial de 150 ml y se pudo ampliar la meta física en 25 ml.
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 19/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-252 a la JAC emitiendo concepto favorable por parte del Especialista respectivo al componente de Geología y Geotécnia de Los Estudios y Diseños del Proyecto.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-262 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*27/12/2024 Se realizó la actividad Social propuesta por la JAC, con participación de la Interventoría del Convenio y la comunidad local.
*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra
* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se realizará la entrega de los resultados Estudios y Diseños (EyD) para revisión de Interventoría.
* Se realizará revisión del presupuesto ajustado acorde a los diseños y al cotizaciones y precios dela zona que presente la JAC.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del contrato
* Se iniciara presentación de hojas de vida personal contractual y proceso afiliación del personal operativo y presentación a Interventoría
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio.
* Se realizará seguimiento a las actividades de obra.
* Se realizará control de calidad a las obras en ejecución.
* Se realizará seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 36
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100,00%
	EJEC	0,00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100,00%
	EJEC	116,70%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100,00%
	EJEC	116,70%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100,00%
	EJEC	116,70%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100,00%
	EJEC	116,70%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
Placa huella terminada



FOTO 2
Placa huella terminada



FOTO 3
Placa huella terminada

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 04/10/2024 Se realizó reunión de seguimiento con INVIAS, presentación del estado de avance de los convenios
* 08/10/2024 La Profesional Ambiental de Interventoría escribió a Ing. Reynaldo de INVIAS , solicitud del PERMISO PARA CANTERAS DE LA BELLEZA Y SUCRE
* 15/10/2024 La JAC remitió a la Interventoría los documentos de Gestión Ambiental del Convenio, quien a su vez mediante comunicado N° TIC-INVIAS-1631-190 realizó la radicación de los mencionados documentos ante La Subdirección de sostenibilidad del Invias
* 16/10/2024 Se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-193 con aspectos a corregir después de la tercera revisión al Informe de Geotecnia como parte de los Estudios y diseños entregados por la JAC
*22/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 29/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 30/10/2024 La Interventoría realiza la entrega a la JAC de la Prórroga N° 2 y los documentos contractuales del Convenio para el trámite de actualización de Pólizas.
* 05/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 12/11/2024 después de realizar el balance presupuestal del convenio se llegó a la conclusión de que se puede ampliar la meta física proyectada de 10 ml para construir un total de placas huella de 160 ml de longitud aproximada, ampliación que se encuentra en ejecución a la fecha
* 15/11/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-218 a la JAC informando sobre la documentación necesaria para la liquidación de los convenios.
* 19/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 20/11/2024 después de realizar el balance presupuestal del convenio se llegó a la conclusión de que se puede ampliar la meta física proyectada de 20 ml para construir un total de placas huella de 170 ml de longitud aproximada, ampliación que se encuentra en ejecución a la fecha
* 25/11/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 27/11/2024 se encuentra pendiente iniciar la entrega de la documentación para la liquidación del convenio por parte de la jac
* 27/11/2024 con respecto al plan de inversión social, se encuentra pendiente que la jac realice ajustes a la propuesta, solicitadas por la interventoría, por lo tanto se encuentra pendiente realizar el cierre financiero del convenio para de esta manera realizar el acta de entrega definitiva y el acta de liquidación del mismo
* 27/11/2024 con respecto al la gestión ambiental se encuentra radicado y aprobado el pma por parte del invias y se encuentra pendiente realizar la entrega de paz y salvos y el cierre ambiental por parte de la jac 27/11/2024 se culminan las obras del presente convenio
* 27/11/2024 a la fecha se realizó la fundida de 175 ml de concreto reforzado de 21 mpa para placa huella la cual incluye las dos (2) franjas de 0,90 ml, vigas riostras, franja de enrocado central también de 0,90 ml y enrocados laterales de 0,45ml en concreto ciclópeo, cunetas a ambos costados de la vía y rampas de inicio y final también en concreto reforzado de 21 mpa,
* 02/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 11/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
*16/12/2024 se realiza la entrega al especialista en geotecnia de la interventoría la última versión del estudio geotécnico del proyecto
*18/12/2024 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* 19/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-252 a la JAC emitiendo concepto favorable por parte del Especialista respectivo al componente de Geología y Geotécnia de Los Estudios y Diseños del Proyecto.
* 24/12/2024 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-262 a la JAC solicitando la documentación para el Balance Ambiental a la terminación del Convenio.
*27/12/2024 Se realizó la actividad Social propuesta por la JAC, con participación de la Interventoría del Convenio y la comunidad local.
*23/01/2025 se remite comunicado TIC-INVIAS-1631-280 a la JAC reiterando la solicitud del Balance ambiental a la terminación del Contrato de Obra
* 16/01/2025 se realiza comité operativo para aprobación de cheques para pagos de proveedores.
* Se realizó seguimiento a las actividades administrativas del convenio.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **36** del 24/01/2025 al 30/01/2025 — Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA **TUBAVITA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ- SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Construcción de Placa huella y Una (1) Alcantarilla; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA				
CONVENIO No.	4357 de 2023	VALOR INICIAL:	$	201.030.449,00	
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	201.030.449,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/01/2025				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.			
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%			
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$	394.093.490,00
FECHA DE INICIO:	27/05/2024	VALOR ADICIONES:	$	141.314.690,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$	535.408.180,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025	VALOR ANTICIPO:	$	-
		VALOR AMORTIZADO:	$	-
		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.030.449,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.030.449,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535.408.180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 535.406.990		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.190		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	201.030.449,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150.772.836,75	75,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	150.386.393,02	74,81%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	386.443,73	0,19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	43.814.063,67	21,79%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**201.030.449,00**	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**194.200.456,69**	96,60%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	6.829.992,31	3,40%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0,00%

Observaciones: Las OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS corresponden a pagos realizados a proveedores del convenio en el rubro de gastos administrativos, incluye pagos anticipados a proveedores. En este momento se encuentra en gestión la ejecución del Rubro PAGA. Las actividades de obra se encuentran 100% ejecutadas.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	535.408.180,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	535.406.989,60	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4.437.510,00	0,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4.184.755,60	0,78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% — Avance o Atraso Físico %: 3,78%
Meta Física Ejecutada %: 103,78%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	119
*	Alcantarilla	Unidad	1
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Pros	119,00				
Ejec	123,50				
Prog	1,00				
Ejec	1,00				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operació	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las activida

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	**5,871507800**	PERMISO MINERO:	SI	NO
	-73,524087000	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PÉTREOS ESCOGIDA ES "CALIZAS Y MINERALES S.A.S. NIT. 900414198-1 LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8,0	7,0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8,0	7,0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0,0	0,0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0,0	0,0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 7/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se da inicio a las actividades con la junta de acción comunal vereda La unión del municipio de Guavatá - Santander.
* Se realiza entrega de cotizaciones para los Estudios y Diseños
* Se realiza comité técnico/operativo para aprobación de Cotización de estudios y diseños.
* Se realiza seguimiento, control y verificación de las actividades iniciales necesarias para la formulación de estudios y diseños (topografía, apique, ensayo PDC y conteo vehicular).
* Se solicitarán cotizaciones de transporte y materiales necesarios para la ejecución de la obra física en harás de ajustar precios unitarios.
* Se participa en reunión general y comité de obra con la interventoría para revisar avances.
* Se realiza visita y recorrido con el Ing. Director del INVIAS Santander Marlon Gamboa, JAC e Interventoría el día 04 de julio 2024.
* Se continúa haciendo el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se realiza las actividades iniciales necesarias para la formulación de estudios y diseños.
* Se recepcionan y validan las cotizaciones de transporte, materiales y valla publicitaria necesarios para la ejecución de la obra física en aras de ajustar precios unitarios.
* Se participa en reunión de comité de obra con la interventoría para revisar avances de la actividad de estudios y diseños.
* Se efectúa visita de campo en conjunto con la interventoría, representantes de la comunidad, presidente de JAC, residente de obra y director del convenio a fin de despejar dudas de la comunidad.
* Se realiza revisión a la información que la JAC radique a la interventoría para dar los trámites pertinentes ante el INVIAS.
* Se realiza seguimiento a las actividades de revisión documental que ejecute la JAC.
* Se realiza mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio
* Se realiza el respectivo ajuste a precios unitarios del proyecto y se formulará la programación de obra y programación de compras.
* Se participa en comités de obra y demás que sean solicitados.
* Se hace visita en campo, lugar de la obra para tomar fotografías de los tramos y demás que sean necesarias.

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

* Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 21 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 02 Sep. Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS.
* Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.
* 05 sep. Se recibieron observaciones al Contratista GEOTECNIA TIC-INVIAS-1631-154
* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo.
* 16/09/2024 Se realizó visita al sitio de la obra con Interventoría, se solicitó la realización de una alcantarilla.
* 20/09/2024 Se instaló Valla informativa del Convenio.
* 23/09/2024 Se envió a interventoría relación de los pagos realizados hasta el momento.
* 25/09/2024 Se realizó revisión de cotizaciones de materiales en oficina de interventoría.
* 26/09/2024 JAC realizó solicitud de prórroga al convenio 4357 de 2023.
* 01/10/2024 Interventoría envió oficio Radicado: 2024E-VUVRAZ-096167 TIC-INVIAS-1631-166 INFORMANDO **LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA**
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 10/10/2024 Se realizó comité aprobación de COTIZACIONES de insumos y materiales.
* 15/10/2024 Se realizó comité de pagos a proveedores.
* **18/10/2024 INICIO OBRAS**
* 24/10/2024 Se realizó aprobación de estudios y diseños.
* 25/10/2024 - 31/10/2024 Se realizó Mejoramiento de subrasante en Pedraplén, Instalación tubería de concreto 36".
* 07/11/2024 DURANTE EL PERÍODO SE AVANZÓ EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL CONVENIO, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y APLICACIÓN DE SUBBASE GRNAULAR
* 05/11/2024 JAC INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
* 09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROGRAMACIÓN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONVENIO.
* 12/11/2024 SE REALIZÓ COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA.
* 13/11/2024 SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA PROYECTADA
* 18/11/2024 DURANTE EL PERÍODO SE AVANZÓ SATISFACTORIAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLAS.
* 25/11/2024 SE REALIZÓ COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 27/11/2024 DURANTE LA SEMANA SE AVANZÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLAS. JAC SOLICITA REVISIÓN EN SITIO PARA CONSTRUCCIÓN DE FILTROS
* 03/12/2024 Interventoría envió comunicado TIC-INVIAS-1631-238- CONCEPTO FAVORABLE AL ESTUDIO HIDRAULICO - TUBAVITA, con esto quedan todos los componentes técnicos aprobados.
* 04/12/2024 Se construyen Filtros en los 3 Tramos de placa huella, se evidencia flujo freático en los 3 sectores en intervención.
* 04/12/2024 Durante la semana se avanzó satisfactoriamente en la construcción de placa huellas.
* 11/12/2024 Durante la semana se avanzó satisfactoriamente en la construcción de placa huellas.
* 11/12/2024 Se realizó demolición de roca, para avanzar con la construcción de cuneta del tramo No.2
* 18/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* **30/12/2024 Se completó el 100% de las obras, placa huella en concreto. Longitud Ejecutada 123,5 mts de Placa huella + 1 Alcantarilla.**
* 02/01/2025 Se encuentra en realización el cierre Ambiental y Social del convenio.
* 13/01/2024 Interventoría realizo visita de obra, se realizaron observaciones al contratista para recibo definitivo de las obras.
* 16/01/2025 Se encuentra en gestión la ejecución del Rubro PAGA, y la actividad social de terminación de terminación de obras con la comunidad.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Avanzar en la construcción de las obras del convenio.
* Se realizará constante seguimiento a la ejecución del convenio en aspectos técnicos, administrativos, sociales, ambientales y sst.
* Se participará en comités operativos y demás que sean solicitados.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA


PLACAHUELLA

		SEMANA 36
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
MEJORAMIENTO CON PEDRAPLEN	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100,00%
	EJEC	103,78%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100,00%
	EJEC	103,78%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%



ALCANTARILLA

		SEMANA 36
Construcción Alcantarilla	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 ...13/01/2025 Tramo No3 100% Terminado



FOTO 2 13/01/2025 Tramo No.2 100% Terminado



Foto 3 13/01/2025 Tramo No.1 100% Terminado

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
2. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega prioritaria de los estudios y diseños (EyD) acorde a que NO se deben generar retrocesos que afecten, ni
3. El día 12-08-2024 La O.A.C. realiza entrega de los Estudios y Diseños.
4. El día 15-08-2024 y 16-08-2024 Los Ingenieros especialistas de La interventoría realiza observaciones a los Estudios y Diseños presentados.
5. El día 21-08-2024 La O.A.C. presenta subsanaciones a los Estudios y Diseños por observaciones de la Interventoría.
6. El día 28-08-2024 se emite concepto favorable por el especialista de vías para los Estudios y Diseños (EyD).
7. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A..C
8. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-109 - OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de TUBAVITA, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el periodo correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales genera la aplicación de las multas contempladas en el convenio.
9. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
10. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social pagadas.
11. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.
* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 10 sep Se programó visita a la vereda teniendo en cuenta, que la alcantarilla a construir se encuentra sobre un terreno removido, la Ingeniera Residente solicitó inspección del sitio para autorizar la construcción de estructuras en este punto.
*12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 16/09/2024 Interventoría realizó Visita al sitio de las obras, la comunidad solicitó realización de alcantarilla.
* 25/09/2024 Se realizó revisión de cotizaciones de materiales se hicieron observaciones a la JAC.
* 01/10/2024 Interventoría envió oficio Radicado: 2024E-VUVRAZ-096167 TIC-INVIAS-1631-166 INFORMANDO **LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA**
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 03/10/2024 Se realizó reunión virtual con INVIAS se expuso el estado general de los convenios.
* 10/10/2024 Se realizó comité aprobación de COTIZACIONES de insumos y materiales.
* 15/10/2024 Se realizó comité de pagos a proveedores.
* 29/10/2024 Se realizó comité de pagos a proveedores.
* 05/11/2024 JAC INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 14/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINA LAS JAC PARA CAPACITACIÓN POR PARTE INVIAS SOBRE AREA CONTABLE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS
* 12/11/2024 JAC INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 16/11/2024 INTERVENTORÍA REALIZA TOMA DE DENSIDADES DE CAMPO EN LA SUBBASE GRANULAR APLICADA
* 25/11/2024 JAC, INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 21/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINÓ LAS JAC PARA CAPACITACIÓN AMBIENTAL POR PARTE DE INVIAS.
* 02/12/2024 Interventoría Realizó comité de pagos a proveedores del convenio.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST
* 10/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST.
* 11/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 18/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 24/12/2024 Interventoría envió comunicado TIC-INVIAS-1631-263 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA TUBAVITA – VÉLEZ.
* 10/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.
* 13/01/2025 Interventoría GESTIONÓ mediante comunicado TIC-INVIAS-1631-275 - Solicitud de cambio de propuesta social Vereda Tubavita del municipio de Vélez al INVIAS.
* 15/01/2025 Interventoría realizó reunión virtual para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.
* 16/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.
* 23/01/2025 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-280 - REITERACIÓN DE LA SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA.
* 28/01/2025 Interventoría JAC y Veeduría Realizó comité de pagos a proveedores del convenio.
* 29/01/2025 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-290 - Inicio de procedimiento de aplicación de multas por incumplimiento (Área Ambiental)

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,

Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1/2

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 36 (Numeración consecutiva) del 24/01/2025 al 30/01/2025 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA **EL GAITAL** DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GAITAL		
CONVENIO No.	4367 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.016.649,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.016.649,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394.093.490,00
FECHA DE INICIO:	27/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141.314.690,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535.408.180,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.016.649,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.016.649,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535.408.180,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 535.406.989,60		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.190,40		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO			
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	201.016.649,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150.762.486,75	75,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	16.378.845,26	8,15%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	134.383.641,49	66,85%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$	36.152.569,52	17,98%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**201.016.649,00**	**100,00%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**52.531.414,78**	**26,13%**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	148.485.234,22	73,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	20.101.664,90	10,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	2.010.166,49	1,00%

Observaciones: El convenio se encuentra en etapa de ejecución de obras. A la fecha las condiciones climáticas han mejorado, sin embargo el terreno sigue siendo de difícil acceso.

INTERVENTORÍA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	535.408.180,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	535.406.989,60	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4.378.702,00	0,82%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4.184.755,60	0,78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,00% | Avance o Atraso Físico % -81,82%

Meta Física Ejecutada % 18,18%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	110
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	110,00			110,00	100,00%
Ejec	20,00			20,00	18,18%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	5,871515582	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	-73,524041619	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: La JAC Presentó la cantera CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SAS NIT.900414198 localizada en el municipio de MONIQUIRÁ

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**9,0**	**7,0**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7,0	7,0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2,0	0,0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0,0	0,0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
VEREDA GAITAL, OFICINA DE INTERVENTORÍA PUENTE NACIONAL	

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 7/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se realiza el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se realizó de una inspección en obra donde se encontró un afloramiento de aguas Subterráneas en la zona a intervenir a las cuales se le debe dar una alternativa de para las canalizaciones.
* Se realiza entrega de cotizaciones para los Estudios y Diseños.
* Se realiza comité técnico/operativo para aprobación de Cotización de estudios y diseños.
*Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 22 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 02 Sep. Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS.
* Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.
* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo.
* 10/09/2024 Se envió a interventoría cotizaciones de topografía para revisión.
* 13/09/2024 Se realizó reunión e n oficina con la interventoría, se revisó cotizaciones de materiales y ajuste presupuestal.
* 22/09/2024 Se envió a interventoría la relación de Pagos Realizados.
* 26/09/2024 Se trabajó en oficina la revisión de cotizaciones de materiales e insumos.
* 01/10/2024 Se envió TIC-INVIAS-1631-170- CONCEPTO FAVORABLE A LOS EYD - GAITAL
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 02/10/2024 El Presidente de la JAC manifestó verbalmente que la Junta realizará la Construcción del filtro necesario.
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 04/10/2024 Se realizó reunión extraordinaria con INTERVENTORÍA E INVIAS, la JAC se comprometió enviar las cotizaciones faltantes y el presupuesto proyectado. Y avanzar en la ejecución de obra teniendo en cuenta el tiempo que queda de ejecución.
* 09/10/2024 SE HAN HECHO OBSERVACIONES COTIZACIONES 09 OCT SE REALIZARÁ REVISIÓN FINAL Y COMITE DE APROBACIÓN DE COTIZACIONES.
* EL DÍA 17 DE OCTUBRE SE REALIZARÓ VISITA DE CAMPO PARA VERIFICAR LA MANERA DE REALIZAR LOS TRANSPORTES, POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO EL CONTRATISTA PROPONE REALIZAR UN ACOPIO DE MATERIAL PREVIO AL PUNTO DEFINITIVO DE DISPOSICIÓN EN OBRA.
*** 21/10/2024 Inicio de actividades de Obra.**
* 24/10/2024 Se realizó comité de aprobación de COTIZACIONES DE INSUMOS Y MATERIALES.

* Hay poca disponibilidad de maquinaria en la zona (Vibrocompactador).
* 06/11/2024 A LA FECHA SE HAN ADQUIRIDO MATERIALES PÉTREOS, SE REALIZÓ TOPOGRAFÍA DE CAMPO, SE HAN REALIZADO CORRECCIÓN DE FALLOS EN ZONA DE LA PLACAHUELLA. sE REALIZA CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO EN CAMPO. SE HAN PRESENTADO LLUVIAS EN LA ULTIMA SEMANA QUE NO PERMITEN ACARREO DE MATERIALES.
* 07/11/2024 LAS VOLQUETAS CON MATERIAL NO HAN PODIDO ACCEDER AL SITIO DE LAS OBRAS DEBIDO AL ESTADO DE LA CARRETERA LA CUAL ES MUY PENDIENTE Y POR LAS LLUVIAS LOS VEHICULOS SE QUEDAN PATINANDO EN EL BARRO.
* 08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
* 09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROGRAMACIÓN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONVENIO.
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA.
* 15/11/2024 INTERVENTORÍA APROBÓ LA HOJA DE VIDA DE LA INGENIERA RESIDENTE LAURA PINZÓN.
* 18/11/2024 LAS CONSTANTES LLUVIAS PRESENTADAS DURANTE EL PERÍODO AFECTAN GRANDEMENTE LA VÍA DE ACCESO, NO ES FACTIBLE SUBIR MATERIALES A OBRA, DE IGUAL MANERA LA CONSECUCIÓN DE MAQUINARIA (VIBROCOMPACTADOR) ES DIFICIL, SE EVALÚA EL TIPO DE VIBROCOMPACTADOR A UTILIZAR YA QUE NO DEBE SER MUY PESADO.
* 20/11/2024 EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN REPROGRAMACIÓN DE OBRAS.
* 22/11/2024 EL ING REYNALDO MANTILLA DE INVIAS (SANTANDER) REALIZÓ VISITA AL SITIO, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 25/11/2024 EL ING. PEDRO J BARÓN DE INVIAS (BOGOTÁ) REALIZÓ VISITA AL SITIO CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 05/12/2024 Durante la última semana se cuenta con mejores condiciones del terreno, se ingresó maquinaria retroexcavadora para realizar adecuación de la subrasante. Se acopian materiales en sitio
* 10/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST. Se evidencia la necesidad de realizar filtros en terreno.
* 11/12/2024 Durante el período se realizó acopio de materiales pétreos, Conformación de subrasante, cargue de materiales en acopio
* 11/12/2024 El transporte de materiales pétreos se realiza en dos etapas, la primera desde la cantera (Moniquirá) hasta el sitio de acopio (Sector Colegio Gaital), la segunda etapa consiste en realizar cargue de volquetas a media capacidad desde ese punto de acopio hasta el sitio de la obra, recorrido de aproximadamente 1,4 Km de alta pendiente, vía destapara, estrecha con dificultad de acceso en época de lluvias.
* 17/12/2024 Se realiza extendido y compactación de subbase granular.
* 18/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 20/12/2024 Se realiza aplicación y compactación de subbase granular
* 20/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 24/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-264 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA GAITAL VÉLEZ
* 26/12/2024 Durante el período se han presentado lluvias, las cuales afectan la vía de acceso al sitio de las obras, no es posible subir materiales pétreos desde el punto colegio hasta la obra.
* 02/01/2025 No se realizaron actividades en obra durante la última semana.
* 09/01/2025 No se realizaron actividades en obra durante la última semana.
* 13/01/2025 Se **retoman actividades** en obra, se realiza arreglo vía de acceso manualmente, se reciben materiales en obra, se hace encofrado para planchuelas.
* 20/01/2025 Se realiza fundida de concreto piedra pegada.
* 23/01/2025 Se avanza en la construcción de huellas en concreto reforzado 3000 psi, también se realiza piedra pegada en concreto ciclópeo.
* 28/01/2025 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
*29/01/2025 Avanza ejecución de obras, formaleta para placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se dará continuidad a la construcción de la obra.
* Se realizará suministro de materiales de obra.
* Se realizarán pagos a proveedores del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA

		SEMANA 24
1. Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
2. Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
3. Subbase Granular Clase C	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
4. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	65,00%
	EJEC	26,13%
5. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	65,00%
	EJEC	26,13%
6. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	75,00%
	EJEC	36,13%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1
24/01/2025 Avance de obra



FOTO 2
27/01/2025 Avance de obra



FOTO 3
29/01/2025 Avance de obra

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del convenio realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
2. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega prioritaria de los estudios y diseños (EyD) acorde a que NO se deben generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en los tiempos ya estipulados.
3. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A.C

4. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-111 - OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de GAITAL, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el período correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales genera la aplicación de las multas contempladas en el convenio.

5. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
6. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social pagadas.
7. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.

* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios.
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 13/09/2024 Interventoría envió a todas las JAC TIC-INVIAS-1631-163 - Reiteración oficio TIC-INVIAS-1631-157 del 05/09/2024 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras
* 25/09/2024 Interventoría envió requerimiento a la JAC instalación de Buzón de PQR.
* 26/09/2024 Interventoría atendió en oficina a la JAC para las cotizaciones de materiales.
* 01/10/2024 Se envió TIC-INVIAS-1631-170- CONCEPTO FAVORABLE A LOS EYD - GAITAL
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 02/10/2024 El Presidente de la JAC manifestó verbalmente que la Junta realizará la Construcción del filtro necesario.
* 2/10/2024 Se realizó comité operativo para autorización de pagos a proveedores en PUENTE NACIONAL
* 03/10/2024 Interventoría expuso a INVIAS el estado general de los convenios en reunión virtual, se programó reunión extraordinaria para el día siguiente con las juntas GAITAL Y GUAMAL.
* 04/10/2024 Se realizó reunión extraordinaria con INTERVENTORÍA E INVIAS, la JAC se comprometió enviar las cotizaciones faltantes y el presupuesto proyectado. Y avanzar en la ejecución de obra teniendo en cuenta el tiempo que queda de ejecución.
* EL DÍA 17 DE OCTUBRE INTERVENTORÍA REALIZARÓ VISITA DE CAMPO PARA VERIFICAR LA MANERA DE REALIZAR LOS TRANSPORTES, POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO EL CONTRATISTA PROPONE REALIZAR UN ACOPIO DE MATERIAL PREVIO AL PUNTO DEFINITIVO DE DISPOSICIÓN EN OBRA. SE REALIZÓ REUNIÓN CON LA VEEDURÍA PARA ESTABLECER LA METODOLOGÍA DE TRANSPORTE.
* 24/10/2024 Se realizó comité de aprobación de COTIZACIONES DE INSUMOS Y MATERIALES.
* 05/11/2024 Interventoría realizó conjuntamente con la JAC y Veeduría COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 14/11/2024 Interventoría realizó conjuntamente con la JAC y Veeduría COMITÉ DE PAGO A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 19/11/2024 Interventoría realizó visita de obra Director, Social, SST y Residente de Interventoría al sitio de las obras, para verificar el avance del convenio y el estado de la vía de acceso.
* 19/11/2024 Interventoría realizó COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO, EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ
* 22/11/2024 Interventoría realizó acompañamiento a la visita del ingeniero Reynaldo Mantilla de INVIAS SANTADNER.
* 25/11/2024 El Director de Interventoría realizó la visita conjunta con el Ing. Pedro J Barón a la obra, se verificó el avance de obra y el estado de la vía de acceso.
* 02/12/2024 Interventoría Autorizó comité de pagos a proveedores del convenio.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST.
* 10/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST.
* 11/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 14/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-248 POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PROPIAS DEL CONVENIO 4367 -2023 JAC GAITAL.
* 18/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 20/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.
* 24/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-264 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA GAITAL VÉLEZ
* 03/01/2025 Interventoría RADICÓ comunicado TIC-INVIAS-1631-269 - Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – Convenios No. 4367 de 2023 – OAC VEREDA GAITAL.
* 09/01/2025 Interventoría verifica la no actividad en obra durante la última semana.
* 10/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores
* 14/01/2025 Interventoría realiza toma de densidades de campo en la Sub-base granular aplicada.
* 15/01/2025 Interventoría realizó reunión virtual para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.
* 16/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.
* 21/01/2025 Interventoría emitió el comunicado TIC-INVIAS-1631-278 Cumplimiento con los elementos de protección personal (EPP), a la JAC Gaital.
* 24/01/2025 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-281 - REITERACIÓN DE LA SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA.
* 28/01/2025 Interventoría, JAC y Veeduría Realizan comité de pagos a proveedores del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO.
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **36** (Numeración consecutiva) del 24/01/2025 al 30/01/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE **TEBAIDA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

1 Tramo Placa huella y Una (1) alcantarilla en concreto reforzado; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TEBAIDA

CONVENIO No.	4424 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.996.240,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.996.240,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
INTEGRANTES: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%

CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394.093.490,00
FECHA DE INICIO:	27/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ 141.314.690,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535.408.180,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.996.240,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.996.240,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 394.093.490,00	$ 535.408.180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 535.406.990		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 394.093.490,00	$ 1.190		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

40963035

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200.996.240,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150.747.180,00	75,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	119.833.957,00	59,62%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	30.913.223,00	15,38%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	40.963.035,00	20,38%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**200.996.240,00**	**100,00%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**160.796.992,00**	**80,00%**
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	40.199.248,00	20,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	20.099.624,00	10,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	30.149.436,00	15,00%

Observaciones: El avance se ve reflejado en los gastos administrativos ejecutados y la compra de materiales para realización de las obras. Durante el período se realizaron actividades constructivas de manera satisfactoria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	535.408.180,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	535.406.989,60	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4.437.510,00	0,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4.184.755,60	0,78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,00% — Avance o Atraso Físico % -42,86%
Meta Física Ejecutada % 57,14%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	140
*	Alcantarilla	Unidad	1
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	140,00				100,00%
Ejec	80,00				57,14%
Prog	1,00				100,00%
Ejec	0,50				50,00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acu

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades seg

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	**5,871515582**	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	-73,52404162	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: La JAC Presentó la cantera CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SAS NIT.900414198 localizada en el municipio de MONIQUIRÁ

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PENDIENTE POR RECIBIR

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9,00	7,00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9,00	7,00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0,00	0,00
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0,00	0,00

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	7
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial 7/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se continua en este periodo por parte de la JAC actualización de Presupuesto de Obra.
* Se envían para aprobación de la interventoría cotizaciones de (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se inicia la vinculación de personal mano de obra no calificada y maestro general.
* Se participa de reunión técnica programada por la interventoría.
* Se realizarán mesas de trabajo en conjunto con la JAC para tratar temas sobre el desarrollo del convenio y avance de los estudios y diseños para lograr pasar a la ejecución del proyecto, fue rechazada la propuesta de los estudios y Diseños por presupuesto ya se está realizando nuevas cotizaciones y se realizará entrega nuevamente para aprobación por
* Se realizó nuevamente entrega de cotizaciones para los Estudios y Diseños.
* Se realizó comité técnico/operativo para aprobación de Cotización de estudios y diseños.
* Se realizaron tomas de muestras de subrasante para estudios y diseños.
* Se radica a la aseguradora solicitud para actualización de pólizas.
* Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 21 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 02 Sep. Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS.
* Durante esta semana se presento el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.
* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo.
* 10/09/2024 Se envió a interventoría los Estudios y Diseños del convenio para revisión.

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

* 11/09/2024 Se Instaló el buzón de sugerencias para la comunidad.
* 18/09/2024 Se realizó revisión de cotizaciones y de presupuesto en la oficina de interventoría
* 23/09/2024 Se recibió oficio TIC-INVIAS-1631-168 con las observaciones del área de PAVIMENTOS a la JAC
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 03/10/2024 Se envío Diseño Hidráulico a la Especialista Eugenia Villegas
* 05/10/2024 Se emitió TIC-INVIAS-1631-171- CONCEPTO FAVORABLE A LOS EYD - TEBAIDA
* 08/10/224 Se realizó comité de pagos a proveedores del convenio.
* 18/10/2024 se REALIZÓ COMITÉ DE APROBACIÓN DE COTIZACIONES.
* **21/10/2024 Se inician labores de obra**.
* 22/10/2024 Se realiza comité de pagos a proveedores.
* Se realiza acopio de materiales en obra, se cubren materiales pétreos con plástico.
* Se realiza corte y figurado de acero de refuerzo, para viguetas de placa huella.
* 5/1/2024 SE REALIZA COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
06/11/2024 SE ACOPIAN MATERIALES EN OBRA CONTINUA FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO LAS LLUVIAS PRESENTADAS ATRASAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
* 07/11/2024 LA OCURRENCIA DE LLUVIAS EN LA ZONA DIFICULTA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y BAJA EL RENDIMIENTO DE LAS ACTIIDADES DE OBRA.
* 08/11/2024 SE AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA.
* 08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
* 09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROGR)
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA
* 18/11/2024 A CAUSA DE LAS LLUVIAS PRESENTADAS DIARIAMENTE DURANTE EL PERÍODO, EL ESTADO DE LA VÍA NO PERMITE EL ACCESO DE VEHÍCULOS PESADOS CON MATERIALES, LA COMUNIDAD SOLICITÓ ESPERAR A QUE CESEN LAS LLUVIAS PARA TRANSITAR CON VEHÍCULOS PESADOS POR LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA, DE IGUAL MANERA SE REQUIERE LA REALIZACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO PARA INGRESAR MATERIALES.
* 19/11/2024 SE REALIZA COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 20/11/2024 EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN REPROGRAMACIÓN DE OBRAS.
* 22/11/2024 EL ING REYNALDO MANTILLA DE INVIAS (SANTANDER) REALIZÓ VISITA AL SITIO, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 25/11/2024 EL ING. PEDRO J BARÓN DE INVIAS (BOGOTÁ) REALIZÓ VISITA AL SITIO CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO. SE TOMO LA DESICIÓN CONJUNTA CON LA COMUNIDAD DE REALIZAR EL TRASIEGO DE MATERIALES A LA OBRA EN CAMIONETA PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y DISMINUIR EL DAÑO EN LA VÍA
* 25/11/2024 SE REALIZA COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 02/12/2024 Se Tiene compactado 70% del tramo de subbase granular para iniciar instalación de acero de refuerzo y formaleta en sitio.
* 03/12/2024 Inicia Instalación de formaleta en madera para placa huellas.
* 04/12/2024 Durante la semana el alcance en obra a sido satisfactorio, ya se tiene 70% de la subbase granular compactada, para iniciar la construcción de concreto reforzado de placa huella
* 09/12/2024 Ingreso ayudante de construcción Tatiana.
* 11/12/2024 Durante el período se avanzo satisfactoriamente en la construcción de las obras, se tiene subbase granular compactada y el día 10 dic se realizó la primera fundida de concreto clase D huellas
* 17/12/2024 Inicio fundida de Viguetas en concreto 3000psi.
* 18/12/2024 Se realiza construcción de piedra pegada en zona central de la placa huella
* 20/12/2024 Se realiza fundida de riostras en concreto 3000psi reforzado.
* 30/12/2024 Avanza construcción de palca huellas de manera satisfactoria.
* 02/01/2025 No se evidencia realización de actividades en obra.
* 07/01/2025 Se retoman actividades en obra, avanza construcción de placa huellas en concreto reforzado 3000 psi.
* 07/01/2025 Se realiza trasiego de materiales en camioneta, desde el sector La Florida hasta la obra.
* 16/01/2025 Continúa construcción de placa huellas instalación de acero de refuerzo para riostras.
* 23/01/2025 Avanza construcción de placa huellas Sector PR00+60 al PR 00+100
* 29/01/2025 Avanza construcción de placa huellas Sector PR00+80 al PR 00+100

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Se dará continuidad a la construcción de la obra, se espera tener la subbase granular aplicada y compactada.
* Se dará continuidad a la construcción de estructura de placa huella en concreto reforzado de 3000 psi.
* Se realizará suministro de materiales de obra.
* Se realizarán pagos a proveedores del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA


PLACAHUELLA

		SEMANA 36
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100,00%
	EJEC	57,14%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100,00%
	EJEC	57,14%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	100,00%
	EJEC	67,14%



ALCANTARILLA

		SEMANA 36
Construcción Alcantarilla	PROG	100,00%
	EJEC	50,00%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



24/01/2025 Fundida de Riostras



FOTO 2
27/01/2025 Fundida de bordillos



FOTO 3
28 Ene 2025 Avance de obra Sector K0+080 al K0+100

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del conveniado realizando la socialización con la comunidad el paso a paso de la ejecución de este proyecto.
2. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega prioritaria de los estudios y diseños (EyD) acorde a que NO se deben generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en los tiempos ya estipulados.
3. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A.C
4. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-108 - OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de TEBAIDA, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el período correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales genera la aplicación de las multas contempladas en el convenio.
5. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
6. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social pagadas.

7. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.
* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios.
* 13/09/2024 Interventoría envió a todas las JAC TIC-INVIAS-1631-163 - Reiteración oficio TIC-INVIAS-1631-157 del 05/09/2024 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 23/09/2024 Se envió oficio TIC-INVIAS-1631-168 con las observaciones No.2 del área de PAVIMENTOS a la JAC .
* 26/09/2024 Interventoría Programo REUNIÓN Virtual con el Ing. Nelson Acevedo Gestor Ambiental para consultar sobre la aprobación de fuentes de materiales para los convenios.
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 01/10/2024 Se realiza Reunión virtual con el INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 03/10/2024 Se envío Diseño Hidráulico a la Especialista Eugenia Villegas.
* 18/10/2024 se REALIZÓ COMITÉ DE APROBACIÓN DE COTIZACIONES.
* 22/10/2024 Interventoría y JAC realizan comité de pagos a proveedores.
* 5/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEDURA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 14/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINA LAS JAC PARA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN CONTABLE POR PARTE DE INVIAS
* 19/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 19/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINA LAS JAC PARA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN AMBIENTAL POR PARTE DE INVIAS
* 22/11/2024 INTERVENTORÍA REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A VISITA DEL ING REYNALDO MANTILLA DE INVIAS (SANTANDER) QUIEN REALIZÓ VISITA AL SITIO, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 25/11/2024 EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Y EL ING. PEDRO J BARÓN DE INVIAS (BOGOTÁ) REALIZAN VISITA AL SITIO CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO. SE TOMO LA DESICIÓN
* 25/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 02/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST
* 10/12/2024 Interventoría realizó visita Técnica, Ambiental y SST.
* 11/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 17/12/2024 Interventoría realiza toma de densidades en la subbase granular aplicada.
* 18/12/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 19/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-251 CONCEPTO FAVORABLE AL ESTUDIO DE GEOTECNIA CORRESPONDIENTE A LOS EYD - TEBAIDA
* 26/12/2024 Interventoría emitió el comunicado TIC-INVIAS-1631-256- SOLICITUD DE DOCUMENTOS CONTABLES (General)
* 02/01/2025 Interventoría realiza permanente seguimiento a la ejecución de las obras, mediante inspección visual de las mismas.
* 10/01/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 14/01/2025 Interventoría realiza visita técnica inspección de obra.
* 15/01/2025 Interventoría realizó reunión virtual para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.
* 16/01/2025 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para realización de pagos a proveedores.
* 28/01/2025 INTERVENTORÍA, JAC Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 29/01/2025 Interventoría emitió a INVIAS el comunicado TIC-INVIAS-1631-283 - Entrega propuesta Social 4424-2023 OAC Vereda Tebaida del municipio de Vélez
* 29/01/2025 Interventoría emitió a la JAC el comunicado TIC-INVIAS-1631-282 - Incumplimiento del Contratista en la entrega de la documentación de la Gestión Ambiental Inicial OAC Vereda Tebaida

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,

Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1/2

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: **36** del 24/01/2025 al 30/01/2025 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA **LA PALMERA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Placa huella; Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. Además, cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALMERA		
CONVENIO No.	4565 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.029.468,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.029.468,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
INTEGRANTES:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 100%		
CONTRATO No.	1631 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 394.093.490,00
FECHA DE INICIO:	27/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ 81.075.700,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 535.408.180,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.029.468,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.029.468,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 535.408.180		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 535.406.990		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.190		

46502098

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	201.029.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	150.772.101,00	75,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	154.527.370,00	76,87%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-$	3.755.269,00	-1,87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$	46.502.098,00	23,13%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**201.029.468,00**	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**201.029.468,00**	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	32.164.714,88	16,00%

Observaciones: Las OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS corresponde a pagos realizados a proveedores del convenio, incluyendo pagos adelantados de materiales. Durante el período se avanzó satisfactoriamente en la construcción de las obras.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	535.408.180,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	535.406.989,60	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4.437.510,00	0,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4.184.755,60	0,78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 100,00% — Avance o Atraso Físico %: 1,68%

Meta Física Ejecutada %: 101,68%

Meta Fisica (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad
*	Construcción de placa huella	Global	119
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	119,00			119,00	100,00%
Ejec	121,00			121,00	101,68%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación	1	
Mezcladora de concreto 1 bulto.	1	
Cizalla manual de 90 cm.	1	
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4.	1	
Ruteadora	1	
Compresor (barrido y soplado)	1	
Camioneta D-300	1	
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Compresor 120 HP, con martillo	1	
Vibrador de concreto	1	
Aspersor manual	1	
Total	13	0

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	**5,8715078**	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	-7,3524087	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

LA FUENTE DE MATERIALES PÉTREOS ESCOGIDA ES **"CALIZAS Y MINERALES S.A.S. NIT. 900414198-1** LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Para el presente convenio solidario no se tiene previsto requerir permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN GESTIÓN

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10,00	7,00
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10,00	7,00
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0,00	0,00
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0,00	0,00

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó socialización inicial el 6/06/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se realizó la socialización con la junta de acción comunal vereda Palmera del municipio de Vélez - Santander
* 9 habitantes de la Vereda La Palmera estuvieron realizando demolición de las cintas huellas con demoledores y herramienta manual pero no pudieron avanzar mucho debido a que el concreto reforzado estaba bastante resistente por lo cual finalmente analizaron la opción de gestionar una retroexcavadora con la Alcaldía o particular para ejecutar
* Se realizó por parte del Ingeniero Geotecnia la actividad de campo para la toma de muestras de suelo en la zona del proyecto para el correspondiente estudio de suelos
* Se realizó levantamiento topográfico del sitio del proyecto.
* Se realiza entrega de cotizaciones para los Estudios y Diseños
* Se realiza comité técnico/operativo para aprobación de Cotización de estudios y diseños.
* Se realiza el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
* Se realiza visita y recorrido con el Ing. Director del INVIAS Santander Marlon Gamboa, JAC e Interventoría el día 04 de julio 2024, En la zona del proyecto estuvieron presentes la Interventoría y delegados del INVIAS con el fin de revisar el estado del proyecto. Se aprovechó esta visita para sugerirles a modo de solicitud de lo siguiente: 1) la posibilidad
* La comunidad de la Vereda La Palmera, realizará gestión administrativa para conseguir una retroexcavadora y de esa forma demoler las cintas huellas
* La firma encargada de los estudios del proyecto, realizará el correspondiente estudio de tránsito, hidrológico e hidráulico de la zona del proyecto para la entrega final de todos estudios
* Radicar a la Interventoría el ajuste de los estudios y diseños.
* Se le informó a la firma encargada de los estudios y diseños, las observaciones realizadas por la Interventoría para subsanación.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2/2

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

* Se radicó oficio en la Alcaldía Municipal de Vélez, comunicándole al Señor Alcalde el proyecto de placa huellas que se va a realizar en la Vereda La Palmera, entre el INVIAS y la JAC de la Vereda La Palmera
* Se trabajó en la actualización del presupuesto, y a la espera de la aprobación final de los estudios y diseños para terminar esta actividad.
* Se realizó la socialización con la junta de acción comunal vereda Palmera del municipio de Vélez - Santander
* Se realiza el seguimiento a las actividades de revisión documental (estudios y diseños) para dar cumplimiento a las actividades contractuales.
*Se asiste a comité virtual el 08-08-2024, con personal de interventoría, ingenieros residentes de obra y el Ing. Reynaldo Mantilla del INVIAS SANTANDER, para tratar temas de seguimiento y avance del proyecto.
* El día 21 de agosto de 2024, se realiza el cambio de firmas en la entidad bancaria, para realizar desembolso de los recursos.
* 28/08/2024 Interventoría emitió TIC-INVIAS-1631-148- CONCEPTO FAVORABLE A LOS EYD - LA PALMERA
* 02/09/2024 Se asiste a CAPATICACIÓN CONTABLE para manejo de chequeras para manejo de los recursos de convenios por parte de INVIAS.
* 02/10/2024 Durante esta semana se presentó el paro de transportadores a nivel nacional, el cual generó significativas variaciones en los precios de materiales e insumos de construcción, lo cual produce incertidumbre en los precios otorgados por los proveedores en las cotizaciones de materiales realizadas.
* 03/09/2024 Se tenía programado la actividad de firmas de cheques de tipo administrativo por parte del Director de Interventoría, sin embargo debido al paro de transportadores no fue posible realizar esta actividad.
* 10/09/2024 Se realizó reunión General con las OACS, en el municipio de Puente Nacional para aprobación de pagos de tipo Administrativo
* 11/09/2024 Se realizó comité operativo aprobación de cotizaciones de insumos y materiales.
* 24/09/2024 Interventoría envió a INVIAS TIC-INVIAS-1631-169 - Placa Huella. Vereda La Palmera, Municipio de Vélez. Oficio de interventoría a INVIAS solicitando revisión y aval de la construcción de la placa huella sobre las huellas existentes.
* 24/09/2024 Se emitió concepto aprobatorio al diseño de pavimentos presentado por la JAC
* 01/10/2024 Se realizó reunión con INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 08/10/2024 Se realizaron pagos a proveedores del Convenio
* 08/10/2024 Se realizó visita de campo para verificar las cinta huellas existentes en sitio, se realizará demolición de esta estructura con el fin de garantizar la cimentación de la nueva placa huella.
* 17/10/2024 SE REALIZA REVISIÓN PRESUPUESTO AJUTADO, TENIENDO EN CUENTA LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE LA CINTA HUELLA EXISTENTE. SE ENCUENTRA EN REALIZACIÓN EXAMENES MÉDICOS DEL PERSONAL QUE VA A TRABAJAR EN OBRA
*** INICIO OBRAS 18/10/2024**
* SE REALIZÓ DEMOLICIÓN DE LAS CINTA HUELLAS EN CONCRETO REFORZADO EXISTENTES.
* DURANTE LA SEMANA ENTRE EL 24-30 OCT SE AVANZÓ POCO DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EQUIPOS DE MAQUINARIA EN LA ZONA.
* 5/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEDURA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 06/11/2024 SE PRESENTAN LLUVIAS DIARIAMENTE DURANTE LA ULTIMA SEMANA LO CUAL DIFICULTA EL INGRESO DE MAQUINARIA AL SECTOR, DEBIDO AL ESTADO DEL TERRENO Y DE LAS ALTAS PENDIENTES
* 07/11/2024 LAS VOLQUETAS CON MATERIAL NO HAN PODIDO ACCEDER AL SITIO DE LAS OBRAS DEBIDO AL ESTADO DE LA CARRETERA LA CUAL ES MUY PENDIENTE Y POR LAS LLUVIAS LOS VEHICULOS SE QUEDAN PATINANDO EN EL BARRO.
* 08/11/2024 LA JAC SOLICITÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA 16 DE DIC DE 2024.
* 09/11/2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO REPROGRAMACIÓN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONVENIO.
* 12/11/2024 SE REALIZÓ COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 13/11/2024 DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, HA REDUCIDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA
* 18/11/2024 LA OCURRENCIA DIARIA DE LLUVIAS NO PERMITE EL INGRESO DE VEHÍCULOS PESADOS A LA VEREDA, VA A SER NECESARIO REALIZAR AFIRMADOS EN LA VÍA DE ACCESO PARA PODER INGRESAR MATERIALES.
* 19/11/2024 JAC, INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 20/11/2024 EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN REPROGRAMACIÓN DE OBRAS.
* 25/11/2024 EL ING. PEDRO J BARÓN DE INVIAS (BOGOTÁ) REALIZÓ VISITA AL SITIO CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, VERIFICÓ EL AVANCE DE OBRA Y EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO.
* 27/11/2024 EL ESTADO DEL CLIMA HA MEJORADO, SE REACTIVAN LAS ACTIVIDADES DE OBRA, SIN EMBARGO EL ESTADO DE LA VÍA DE ACCESO SIGUE SIENDO DIFÍCIL Y EL TRAFICO PESADO DE LA ZONA AFECTA DEMASIADO LA VÍA
* 28/11/2024 Se realiza la primera fundida de concreto 3000 psi para placa huella, se implementa sistema de canal para manejo del concreto. Hoy la interventoría toma densidades de campo en la subbase granular.
* 02/12/2024 Se realiza instalación de concreto piedra pegada centro y anchos.
* 04/11/2024 Durante la semana avanzó satisfactoriamente la construcción de placa huellas en concreto 3000 psi, se tienen 30 ml de placa huella fundidos
* 11/12/2024 Durante el período se avanzó satisfactoriamente en la construcción de las obras
* 19/12/2024 Se realiza construcción de placa huellas en concreto reforzado K0+080
*** 30/12/2024 Se alcanza ejecución del 100% de la obra placa huella en concreto 3000 psi. Placa huella L=121m**
* 02/01/2025 Se encuentra en realización el cierre Ambiental y Social del convenio.
* 13/01/2024 Interventoría realizo visita de obra, se realizaron observaciones al contratista para recibo definitivo de las obras.
* 16/01/2025 Se encuentra en gestión la ejecución del Rubro PAGA, y la actividad social de terminación de terminación de obras con la comunidad
* 21/01/2025 JAC envió el comunicado Invitación a la inauguración de la placa huella Vereda La Palmera municipio de Vélez.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Gestión para liquidación del convenio, entrega y recibo de obras, cierre social, cierre ambiental, Cancelación de cuenta, etc.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

PLACAHUELLA:

		SEMANA 36
Excavaciones varias sin Clasificar	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Excavaciones varias en roca en seco	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Subbase Granular Clase C	PROG	100,00%
	EJEC	100,00%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	PROG	100,00%
	EJEC	101,68%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	PROG	100,00%
	EJEC	101,68%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	PROG	110,00%
	EJEC	101,68%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1
13/01/2025 Obra Terminada



FOTO 2
13/01/2025 Obra Terminada



FOTO 3
25/01/2025 Acto Social Inauguración Placa huellas La Palmera

NOTA:

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Durante los días reportados de la presente semana la interventoría hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del convenio realizando la socialización con la comunidad
2. La interventoría emite Respuesta el día 23-07-2024 con observaciones a los Estudios y Diseños presentados por la J.A.C. La Palmera el día 20-07-2024, Haciendo hincapié a que el día 20-07-2024 se les realizó observación puntual por no adjuntar el Estudio de Suelos y geotécnico.
3. El día 29-07-2024 la O.A.C. realiza entrega de Estudio de Suelos y geotécnico correspondiente a los Estudios y Diseños (EyD).
4. El día 02-08-2024 Interventoría realiza observaciones al Estudio de Suelos y geotécnico correspondiente a los Estudios y Diseños (EyD).
5. El día 28-08-2024 se dio concepto favorable por parte del especialista de vías para los EyD.
6. Se realiza Comité Semanal de seguimiento y control en conjunto con Interventoría e Ingenieros Residentes de obra, haciendo hincapié a los tiempos de entrega de documentación para brindar un óptimo desarrollo y avance al proyecto, requiriendo cumplir con las obligaciones contractuales de cada O.A.C
7. Se envía Oficio TIC-INVIAS-1631-110- OBLIGACIONES CONTRACTUALES por parte de Interventoría a la O.A.C. de LA PALMERA, recordando las obligaciones contractuales adquiridas en el convenio de la referencia, en especial la de realizar la entrega de documentación en tiempos estipulados, en pro de garantizar el adecuado y óptimo desarrollo del proyecto, para no generar retrocesos que afecten, ni generen detrimento directamente en el avance y correcta finalización del proyecto en el periodo correspondiente, con el cumplimiento con el desarrollo de las actividades descritas en el convenio con fecha de finalización del próximo 27 de septiembre. El incumplimiento de tales obligaciones contractuales genera la aplicación de las multas contempladas en el convenio.
8. Se solicitó a la Junta de acción comunal y al Ingeniero residente de obra, la entrega de cotizaciones de materiales y ajuste y balance presupuestal.
9. Se solicitó a la Junta de acción comunal la presentación de hojas de vida para previa revisión al comienzo de obra, ingreso total de personal de obra y planillas de seguridad social pagadas.
10. Se solicita al Ingeniero Residente de Obra el ajuste y entrega de Programación de obra, Plan de trabajo y de compras y actualización de Pólizas de seguridad y cumplimiento, teniendo en cuenta la finalización del proyecto el 27-09-2024.
* Interventoría realiza permanentemente el acompañamiento a los OAC para consolidar información, desarrollar correctamente la parte administrativa en esta etapa del convenio.
* El día 05 de Septiembre interventoría envió el oficio TIC-INVIAS-1631-157 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 12/09/2024 Interventoría realizó reunión Virtual con los funcionarios de INVIAS para revisión del avance general de los convenios.
* 13/09/2024 Interventoría envió a todas las JAC TIC-INVIAS-1631-163 - Reiteración oficio TIC-INVIAS-1631-157 del 05/09/2024 - Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
* 16/09/2024 Interventoría realizó reunión técnica entre los diseñadores y el Especialista en Geotecnia de Interventoría unificar criterios de Diseño.
* 24/09/2024 Interventoría envió a INVIAS TIC-INVIAS-1631-169 - Placa Huella. Vereda La Palmera, Municipio de Vélez. Oficio de interventoría a INVIAS solicitando revisión y aval de la construcción de la placa huella sobre las huellas existentes.
* 24/09/2024 Se emitió concepto aprobatorio al diseño de pavimentos presentado por la JAC
* 01/10/2024 Se realizó reunión con INVIAS para autorización CANTERAS artesanales, ORGANOS CACHIPAYAL Y BERLÍN, de esta autorización depende el inicio de las demás veredas
* 01/10/2024 Se enviaron TIC-INVIAS-1631-182 y TIC-INVIAS-1631-183 - Requerimientos Ambientales para aprobación de presupuestos de obra y realización de pagos a proveedores
* 08/10/2024 Interventoría autorizó realización de pagos a proveedores.
* 22/10/2024 Interventoría autorizó realización de pagos a proveedores.
* 29/10/2024 Interventoría autorizó realización de pagos a proveedores.
* 5/11/2024 INTERVENTORÍA, JAC Y VEDURA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO
* 12/11/2024 JAC, INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 14/11/2024 INTERVENTORÍA COORDINÓ LA ASISTENCIA DE LAS JAC A CAPACITACIÓN CONTABLE PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS.
* 19/11/2024 JAC, INTERVENTORÍA Y VEEDURÍA REALIZAN COMITÉ DE PAGOS A PROVEEDORES DEL CONVENIO.
* 25/11/2024 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REALIZÓ VIVISTA CONJUNTAMENTE CON INVIAS BOGOTÁ A LA OBRA, VERIFICAR ESTADO DE OBRA.
* 02/12/2024 Interventoría Realizó comité de pagos a proveedores del convenio.
* 05/12/2024 Equipo de interventoría programa visitas a las obras y actividades Ambiental, Social, SST
* 11/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría realizaron comité operativo de pago a proveedores.
* 18/12/2024 Interventoría, JAC y Veeduría realizaron comité operativo de pago a proveedores.
* 19/12/2024 Interventoría emitió comunicado TIC-INVIAS-1631-253 CONCEPTO FAVORABLE AL ESTUDIO DE GEOTECNIA CORRESPONDIENTE A LOS EYD - LA PALMERA
* 24/12/2024 Interventoría emitió el comunicado TIC-INVIAS-1631-266 - SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA LA PALMERA -VELEZ
* 10/01/2025 Interventoría, JAC y Veeduría realizaron comité operativo de pago a proveedores.
* 15/01/2025 Interventoría realizó reunión virtual para responder inquietudes respecto al cobro y ejecución del rubro PAGA, con todas las juntas.
* 16/01/2024 Interventoría realizó convocatoria en Puente Nacional para autorización de pagos del convenio.
* 23/01/2025 Interventoría emitió el comunicado TIC-INVIAS-1631-280 - REITERACIÓN DE LA SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA.
* 25/01/2025 Interventoría realizó acompañamiento a la actividad social de inauguración de las obras en la vereda La Palmera.
* 28/01/2025 Interventoría, JAC y Veeduría realizaron comité operativo de pagos.
* 29/01/2025 Interventoría emitió el comunicado referente al área ambiental TIC-INVIAS-1631-287 - Inicio de procedimiento de aplicación de multas por incumplimiento.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE HERNANDO FORERO FORERO,
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO.
RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Relación Correspondencia Enviada

FECHA	NO DE OFICIO	ASUNTO	DESTINO	DESTINATARIO
30/12/2024	TIC-INVIAS-1631-268	ACTA DE COMPROMISO - ACTA DE COSTOS NO.8 DICIEMBRE DE 2024.	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	INVIAS
03/01/2025	TIC-INVIAS-1631-269	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – CONVENIOS NO. 4367 DE 2023 – OAC VEREDA GAITAL.	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	INVIAS
03/01/2025	TIC-INVIAS-1631-270	CONCEPTO FAVORABLE DEL ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA OAC LA UNIÓN.	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	OAC VEREDA LA UNIÓN
03/01/2025	TIC-INVIAS-1631-271	CONCEPTO FAVORABLE DEL ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA OAC POPOA.	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	OAC VEREDA POPOA
03/01/2025	TIC-INVIAS-1631-272	CONCEPTO FAVORABLE DEL ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA OAC BERLÍN.	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	OAC VEREDA BERLIN
03/01/2025	TIC-INVIAS-1631-273	CONCEPTO FAVORABLE DEL ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA OAC CACHIPAYAL.	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	OAC VEREDA CACHIPAYAL
03/01/2025	TIC-INVIAS-1631-274	PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN PRÓRROGA NO 4 Y ADICIÓN NO 2.	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	INVIAS

13/01/2025	TIC-INVIAS-1631-275	SOLICITUD DE CAMBIO DE PROPUESTA SOCIAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ.	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	INVIAS
15/01/2025	TIC-INVIAS-1631-276	INFORME MENSUAL NO 8 – DICIEMBRE 2025	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	INVIAS
21/01/2025	TIC-INVIAS-1631-277	NO GENERACIÓN DE PASIVOS SOCIALES CONTRATO N° 4175-2023 – OAC VEREDA CACHIPAYAL.	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	INVIAS
21/01/2025	TIC-INVIAS-1631-278	CUMPLIMENTO CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	OAC VEREDA GAITAL
23/01/2025	TIC-INVIAS-1631-279	ENTREGA OFICIAL SS – ETAPA DE CIERRE VEREDA CACHIPAYAL – LA BELLEZA N° 4175- 2023	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	INVIAS
23/01/2025	TIC-INVIAS-1631-280	REITERACIÓN DE LA SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	OAC VEREDAS LA UNIÓN, POPOA, BERLÍN, CACHIPAYAL, ÓRGANOS, TUBAVITA, LA PALMERA
24/01/2025	TIC-INVIAS-1631-281	REITERACIÓN DE LA SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	OAC VEREDAS TEBAIDA, GAITAL Y GUAMAL
29/01/2025	TIC-INVIAS-1631-282	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INICIAL OAC VEREDA TEBAIDA.	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	OAC VEREDA TEBAIDA
29/01/2025	TIC-INVIAS-1631-283	ENTREGA PROPUESTA SOCIAL 4424-2023 OAC VEREDA TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ.	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	INVIAS
29/01/2025	TIC-INVIAS-1631-284	INICIO DE PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO.	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	OAC VEREDA BERLÍN
28/01/2025	TIC-INVIAS-1631-285	INICIO DE PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO.	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	OAC VEREDA CACHIPAYAL

28/01/2025	TIC-INVIAS-1631-286	INICIO DE PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO.	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	OAC VEREDA GUAMAL
28/01/2025	TIC-INVIAS-1631-287	INICIO DE PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO.	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	OAC VEREDA LA PALMERA
28/01/2025	TIC-INVIAS-1631-288	INICIO DE PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO.	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	OAC VEREDA ÓRGANOS
28/01/2025	TIC-INVIAS-1631-289	INICIO DE PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO.	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	OAC VEREDA POPOA
28/01/2025	TIC-INVIAS-1631-290	INICIO DE PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO.	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	OAC VEREDA TUBAVITA
28/01/2025	TIC-INVIAS-1631-291	INICIO DE PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO.	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	OAC VEREDA LA UNIÓN
30/01/2025	TIC-INVIAS-1631-293	NO GENERACIÓN DE PASIVOS SOCIALES CONTRATO N° 3753-2023 – OAC VEREDA BERLÍN-MUNICIPIO LA BELLEZA-SANTANDER.	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	INVIAS
31/01/2025	TIC-INVIAS-1631-294	ENTREGA OFICIAL SS – ETAPA DE CIERRE VEREDA BERLÍN – LA BELLEZA N° 3753 - 2023	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	INVIAS
31/01/2025	TIC-INVIAS-1631-295	NO GENERACIÓN DE PASIVOS SOCIALES CONTRATO N° 4490-2023 VEREDA ÓRGANOS – MUNICIPIO SUCRE– SANTANDER.	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	INVIAS

TERRA INGENIEROS CIVILES SAS

Bogotá, 30 de diciembre de 2024

TIC-INVIAS-1631-268

Señores
NSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Att: Ing. Carlos Alberto Parra Silva.
Supervisor Contrato de Interventoría

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: ACTA DE COMPROMISO - ACTA DE COSTOS No.8 DICIEMBRE DE 2024.

Respetado Ingeniero:

Yo, JORGE HERNANDO FORERO FORERO identificado con cédula de ciudadanía No 79.343.910 en mi calidad de representante legal de TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S, quien ejecuta el contrato de Interventoría No. 1631 de 2024 cuyo objeto se encuentra en la referencia del presente comunicado, por medio de esta misiva me comprometo a remitir los documentos soporte para la validación del acta No 8 correspondiente al mes de diciembre de 2024 para su verificación y en caso de que exista alguna diferencia en valores, manifestamos de antemano no presentar objeción respecto a los ajustes que se requieran en el acta siguiente de la forma que consideré pertinente la Entidad.

De acuerdo con lo anterior, se remitirá el formato de control de aportes acompañado de la planilla del pago de parafiscales y los soportes a los que haya lugar del acta de costos del periodo de diciembre de 2024, los cuales serán suministrados en la siguiente acta de costos a cobrar.

Atentamente,

Ing. JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

Bogotá, 03 de enero de 2025

TIC-INVIAS-1631-269

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Atn.: Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de Sostenibilidad - INVIAS
Bogotá D.C

Ref. **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

Asunto: Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – Convenios No. 4367 de 2023 – OAC VEREDA GAITAL.

Respetado Ingeniero:

En el Manual de Interventoría de obra pública 2022, dentro del instructivo para el seguimiento de la gestión ambiental, cuyo objeto es establecer y ejecutar las actividades necesarias para el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la gestión ambiental de los proyectos No licenciados (mínimo impacto), los cuales se rigen bajo los parámetros establecidos en la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura del Subsector Vial - PAGA, establece en su etapa inicial, la entrega de los respectivos formatos debidamente diligenciados y soportes documentales relacionados con el componente ambiental de los Convenios a los cuales la Interventoría realiza control y supervisión en todas sus etapas de acuerdo con el Contrato Nº 4367 de 2023.

De acuerdo con lo anterior, se adjunta al presente oficio los documentos de Gestión Ambiental del convenio Nº.4367 de 2023, cuyo objeto es: "*Aunar Esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y La Junta de Acción Comunal Vereda Gaital del Municipio de Vélez en el Departamento de Santander para el Mejoramiento Vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total"*, con sus debidos soportes, para su aprobación.

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellin
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

www.terraingenierosciviles.com

Tabla 1. Formatos y soportes Trimestrales

Nº	Descripción
1	MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato Radicación y Actualización Ambiental Proyectos
	a. Plano de localización del proyecto (Imagen SIG) b. Registro fotográfico antes de obras (inicial) c. Permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias de los proveedores de recursos*. - Documentos legales de los proveedores de materiales pétreos - Autorización para la disposición de excavaciones en predios privados. - Permiso de toma de agua, con su respectiva concesión de aguas emitida por la Corporación Autónoma Regional de Santander. - Certificación de la oficina de empresa de servicios públicos, quien manejará los residuos comunes generados en la obra. d. Puntos de Georreferenciación, coordenada inicial, central y final de la obra. e. Plan de Gestión Ambiental – de acuerdo a la Guía – PAGA f. Certificación de NO PAGA, de acuerdo a la Complejidad Baja del proyecto.
2	MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental

Cualquier inquietud, estaremos atentos a atender.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Ing. Yolima Hoyos – Ingeniera Ambiental de Interventoría.

Anexos: Un (1) archivo comprimido con la información relacionada en la tabla.

Copia: Ing. Nelson Acevedo – Gestor Ambiental Sostenibilidad – INVIAS. (nacevedo@invias.gov.co)
Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellin
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

www.terraingenierosciviles.com

Bogotá, 03 de enero de 2025

TIC-INVIAS-1631-270

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN
Atn. YAMID ARDILA MARIN
Representante Legal
Vereda la Unión– Guavatá Santander

REF: **CONVENIO N° 4478 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

.

ASUNTO: CONCEPTO FAVORABLE DEL ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA OAC LA UNIÓN.

De manera atenta, en atención a los documentos allegados a esta interventoría, correspondiente a los Estudios y Diseños (EyD) del convenio de la referencia, en vista de que las observaciones realizadas fueron atendidas en su totalidad, y, teniendo en cuenta que, según el estudio presentado, se cuenta con condiciones adecuadas en sitio para la construcción del proyecto, **SE EMITE UN CONCEPTO FAVORABLE**, para la presente alternativa de intervención.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Ing. Jaime Chacón – Residente de Interventoría

Adjunto: Concepto emitido por el Especialista de Interventoría en el área de Geotecnia

Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

I

CONCEPTO TÉCNICO

PARA	Terra Ingenieros Civiles S.A.S
DE	Ing. Carlos Hernán Gutiérrez C. Especialista en Geotecnia
FECHA:	31 de diciembre 2024
ASUNTO	Revisión Final - estudios geotécnico diseño de placa huella **vereda** la union **- Popoa** del municipio de Guavata - Santander -**vereda** Berlin - Cachipayal – municipio de Belleza Santander

Dando alcance al objeto de la consultoría, del contrato No 1631 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ, se elabora el presente documento una vez leído y revisado la documentación allegada por medio electrónico, correspondiente al informe elaborado por la firma **SOLENOPSIS**, laboratorio de suelo, para el diseño de placa huella de la veredas la Union –Popoa - Berlin y Cachipayal, se tienen las siguientes observaciones :

2. OBSERVACIONES AL ESTUDIO

Revisado el documento y contrastadas las observaciones sugeridas en la última revisión, se observa que los volúmenes fueron debidamente complementados, por lo que esta consultoría da la respectiva **APROBACIÓN**, para los tramites y fines pertinentes.

Como en todos tramos objeto del contrato esta consultoría aclara que el aval – aprobación del documento parte de los valores determinados y consignados por el consultor y no son responsabilidad de la consultoría, por lo que cualquier inconsistencia o incoherencia en el contenido de este no es responsabilidad de la consultoría.

Sin otro en particular

Cordialmente,



arlos H. Gutiérrez Carrero
Ing Geólogo-Esp Geotecnia vial.

Carrera 28 # 2ª 08 Sogamoso Boyacá
Cel 310 871 6863 - Tel (038) 775 06 30
Email. cgutierrezcarrero@gmail.com

Bogotá, 03 de enero de 2025

TIC-INVIAS-1631-271

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA
Atn. ADRIANA GERENA GONZALEZ
Representante Legal
Vereda Popoa– Guavatá Santander

REF: **CONVENIO N° 4767 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

.

ASUNTO: CONCEPTO FAVORABLE DEL ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA OAC POPOA.

De manera atenta, en atención a los documentos allegados a esta interventoría, correspondiente a los Estudios y Diseños (EyD) del convenio de la referencia, en vista de que las observaciones realizadas fueron atendidas en su totalidad, y, teniendo en cuenta que, según el estudio presentado, se cuenta con condiciones adecuadas en sitio para la construcción del proyecto, **SE EMITE UN CONCEPTO FAVORABLE**, para la presente alternativa de intervención.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Ing. Jaime Chacón – Residente de Interventoría

Adjunto: Concepto emitido por el Especialista de Interventoría en el área de Geotecnia

Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

I

CONCEPTO TÉCNICO

PARA	Terra Ingenieros Civiles S.A.S
DE	Ing. Carlos Hernán Gutiérrez C. Especialista en Geotecnia
FECHA:	31 de diciembre 2024
ASUNTO	Revisión Final - estudios geotécnico diseño de placa huella **vereda** la union **- Popoa** del municipio de Guavata - Santander -**vereda** Berlin - Cachipayal – municipio de Belleza Santander

Dando alcance al objeto de la consultoría, del contrato No 1631 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ, se elabora el presente documento una vez leído y revisado la documentación allegada por medio electrónico, correspondiente al informe elaborado por la firma **SOLENOPSIS**, laboratorio de suelo, para el diseño de placa huella de la veredas la Union –Popoa - Berlin y Cachipayal, se tienen las siguientes observaciones :

2. OBSERVACIONES AL ESTUDIO

Revisado el documento y contrastadas las observaciones sugeridas en la última revisión, se observa que los volúmenes fueron debidamente complementados, por lo que esta consultoría da la respectiva **APROBACIÓN**, para los tramites y fines pertinentes.

Como en todos tramos objeto del contrato esta consultoría aclara que el aval – aprobación del documento parte de los valores determinados y consignados por el consultor y no son responsabilidad de la consultoría, por lo que cualquier inconsistencia o incoherencia en el contenido de este no es responsabilidad de la consultoría.

Sin otro en particular

Cordialmente,



arlos H. Gutiérrez Carrero
Ing Geólogo-Esp Geotecnia vial.

Carrera 28 # 2ª 08 Sogamoso Boyacá
Cel 310 871 6863 - Tel (038) 775 06 30
Email. cgutierrezcarrero@gmail.com

Bogotá, 03 de enero de 2025

TIC-INVIAS-1631-272

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN
Atn. CARLOS NORBEY CLAVIJO VELASCO
Representante Legal
Vereda Berlín– La Belleza Santander

REF: **CONVENIO N° 3753 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BERLÍN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

.

ASUNTO: CONCEPTO FAVORABLE DEL ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA OAC BERLÍN.

De manera atenta, en atención a los documentos allegados a esta interventoría, correspondiente a los Estudios y Diseños (EyD) del convenio de la referencia, en vista de que las observaciones realizadas fueron atendidas en su totalidad, y, teniendo en cuenta que, según el estudio presentado, se cuenta con condiciones adecuadas en sitio para la construcción del proyecto, **SE EMITE UN CONCEPTO FAVORABLE**, para la presente alternativa de intervención.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Ing. Jaime Chacón – Residente de Interventoría

Adjunto: Concepto emitido por el Especialista de Interventoría en el área de Geotecnia

Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

I

CONCEPTO TÉCNICO

PARA	Terra Ingenieros Civiles S.A.S
DE	Ing. Carlos Hernán Gutiérrez C. Especialista en Geotecnia
FECHA:	31 de diciembre 2024
ASUNTO	Revisión Final - estudios geotécnico diseño de placa huella **vereda** la union **- Popoa** del municipio de Guavata - Santander -**vereda** Berlin - Cachipayal – municipio de Belleza Santander

Dando alcance al objeto de la consultoría, del contrato No 1631 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ, se elabora el presente documento una vez leído y revisado la documentación allegada por medio electrónico, correspondiente al informe elaborado por la firma **SOLENOPSIS**, laboratorio de suelo, para el diseño de placa huella de la veredas la Union –Popoa - Berlin y Cachipayal, se tienen las siguientes observaciones :

2. OBSERVACIONES AL ESTUDIO

Revisado el documento y contrastadas las observaciones sugeridas en la última revisión, se observa que los volúmenes fueron debidamente complementados, por lo que esta consultoría da la respectiva **APROBACIÓN**, para los tramites y fines pertinentes.

Como en todos tramos objeto del contrato esta consultoría aclara que el aval – aprobación del documento parte de los valores determinados y consignados por el consultor y no son responsabilidad de la consultoría, por lo que cualquier inconsistencia o incoherencia en el contenido de este no es responsabilidad de la consultoría.

Sin otro en particular

Cordialmente,



arlos H. Gutiérrez Carrero
Ing Geólogo-Esp Geotecnia vial.

Carrera 28 # 2ª 08 Sogamoso Boyacá
Cel 310 871 6863 - Tel (038) 775 06 30
Email. cgutierrezcarrero@gmail.com

Bogotá, 03 de enero de 2025

TIC-INVIAS-1631-273

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL
Atn. JUAN PABLO OVALLE PINEDA
Representante Legal
Vereda Cachipayal– La Belleza Santander

REF: **CONVENIO N° 4175 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

.

ASUNTO: CONCEPTO FAVORABLE DEL ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA OAC CACHIPAYAL.

De manera atenta, en atención a los documentos allegados a esta interventoría, correspondiente a los Estudios y Diseños (EyD) del convenio de la referencia, en vista de que las observaciones realizadas fueron atendidas en su totalidad, y, teniendo en cuenta que, según el estudio presentado, se cuenta con condiciones adecuadas en sitio para la construcción del proyecto, **SE EMITE UN CONCEPTO FAVORABLE**, para la presente alternativa de intervención.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Ing. Jaime Chacón – Residente de Interventoría

Adjunto: Concepto emitido por el Especialista de Interventoría en el área de Geotecnia

Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

I

CONCEPTO TÉCNICO

PARA	Terra Ingenieros Civiles S.A.S
DE	Ing. Carlos Hernán Gutiérrez C. Especialista en Geotecnia
FECHA:	31 de diciembre 2024
ASUNTO	Revisión Final - estudios geotécnico diseño de placa huella **vereda** la union **- Popoa** del municipio de Guavata - Santander -**vereda** Berlin - Cachipayal – municipio de Belleza Santander

Dando alcance al objeto de la consultoría, del contrato No 1631 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ, se elabora el presente documento una vez leído y revisado la documentación allegada por medio electrónico, correspondiente al informe elaborado por la firma **SOLENOPSIS**, laboratorio de suelo, para el diseño de placa huella de la veredas la Union –Popoa - Berlin y Cachipayal, se tienen las siguientes observaciones :

2. OBSERVACIONES AL ESTUDIO

Revisado el documento y contrastadas las observaciones sugeridas en la última revisión, se observa que los volúmenes fueron debidamente complementados, por lo que esta consultoría da la respectiva **APROBACIÓN**, para los tramites y fines pertinentes.

Como en todos tramos objeto del contrato esta consultoría aclara que el aval – aprobación del documento parte de los valores determinados y consignados por el consultor y no son responsabilidad de la consultoría, por lo que cualquier inconsistencia o incoherencia en el contenido de este no es responsabilidad de la consultoría.

Sin otro en particular

Cordialmente,



arlos H. Gutiérrez Carrero
Ing Geólogo-Esp Geotecnia vial.

Carrera 28 # 2ª 08 Sogamoso Boyacá
Cel 310 871 6863 - Tel (038) 775 06 30
Email. cgutierrezcarrero@gmail.com

Bogotá, 03 de enero de 2024

TIC-INVIAS-1631-274

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA.
Supervisor Contrato de Interventoría

Att: Ing. PEDRO JOSÉ BARÓN
Apoyo supervisión Interventoría

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: Póliza actualizada según prórroga No 4 y adición No 2.

De manera atenta nos permitimos enviar la póliza de garantía de nuestro contrato de la referencia actualizada según prórroga No 4 y adición No 2, para su revisión y fines pertinentes.

Atentamente,

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Anexo: Un archivo PDF

Proyectó: Ing. Leidy Aparicio

Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

www.terraingenierosciviles.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CALLE 100**	**33**	**33-44-101249469**	**12**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**12**	**2024**	**08**	**05**	**2024**	**00:00**	**31**	**01**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	**NIT: 860.038.275-3**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AK 15 NRO. 100 - 69 OFICINA 306	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3122958359

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO, LA CALIDAD DEL SERVICIO, EL BUIEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINAZACIONES LABORALES PARA EL CONTRATO NO.1631 - 2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL
MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 2.
-
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUENTA CON UNA VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**08/05/2024**	**31/07/2025**	**$53,540,818.00**	**$53,540,818.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**08/05/2024**	**31/07/2025**	**$78,818,698.00**	**$78,818,698.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**08/05/2024**	**31/01/2028**	**$107,081,636.00**	**$107,081,636.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**08/09/2024**	**08/09/2029**	**$160,622,454.00**	**$160,622,454.00**

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A PRORROGA NUMERO CUATRO (04) DE 2024 Y ADICION NUMERO DOS (02) DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 31/01/2025 Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO POR UN TOTAL DE $535.408.180

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODFICADOS CONTINUAN IGUAL

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******50,442.00	$ *******8,000.00	$ ******11,104.00	$ **********69,546.00	$ ******400,063,606.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ HERRERA	230579	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101249469

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CALLE 100**	**33**	**33-44-101249469**	**12**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**12**	**2024**	**08**	**05**	**2024**	**00:00**	**31**	**01**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	**NIT: 860.038.275-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
AK 15 NRO. 100 - 69 OFICINA 306	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3122958359

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******50,442.00	$ *******8,000.00	$ ******11,104.00	$ ************69,546.00	$ ******400,063,606.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ HERRERA	230579	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11006619251273(3900)000000069546(96)20250508

REFERENCIA PAGO:

1100661925127-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-44-101249469	12

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	12	2024	08	05	2024	00:00	31	01	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S		**NIT: 860.038.275-3**
DIRECCIÓN: AK 15 NRO. 100 - 69 OFICINA 306	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3122958359

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101249469

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101249469, anexo 12, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 27 días del mes de DICIEMBRE de 2024

33-44-101249469

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Bogotá, 13 de enero de 2025

TIC-INVIAS-1631-275

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Att: Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de Sostenibilidad - INVIAS

Ref. **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2."**

Asunto: Solicitud de cambio de propuesta social Vereda Tubavita del municipio de Vélez.

Cordial saludo,

Mediante la presente ponemos a su consideración el cambio de propuesta social de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Tubavita en el municipio de Guavatá, cambio sugerido por la comunidad para beneficio de la misma y no sea una olla comunitaria. Por lo anterior se adjunta la propuesta ya revisada por esta interventoría.

4357-2023 VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ

En el marco del programa caminos comunitarios de la paz total, se relaciona el envío de los siguientes anexos:

- SOLICITUD CAMBIO DE PROPUESTA
- NO OBJECIÓN ENTREGADA POR OFICINA DE SOSTENIBILIDAD
- PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL 3
- COTIZACIONES ACTIVIDAD
- PROPUESTA ACTIVIDAD
- ACTA DE COMPROMISO DE LA COMUNIDAD

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.

Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

www.terraingenierosciviles.com

Cabe aclarar que la información enviada y relacionada a continuación va desglosada por ítem y la interventoría aprueba la gestión y/o formatos remitidos como lo indica el manual de interventoría

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular;



JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Miryam Prada – Profesional social de Interventoría.
Anexos: (Propuesta vereda Tubavita)

Copia: Ing. Claudia Gómez– Profesional Social DT Santander – (crgomez@invias.gov.co)
Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.

Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

www.terraingenierosciviles.com

Bogotá, 15 de enero de 2025

TIC-INVIAS-1631-276

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Att: Ing. Carlos Alberto Parra Silva.
Supervisor Contrato de Interventoría

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: INFORME MENSUAL No 8 – DICIEMBRE 2025

Respetado Ingeniero:

De manera atenta, me permito remitir el informe mensual No 8 Correspondiente al mes de diciembre de 2025, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Anexo: Un (1) archivo tipo PDF

Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

Bogotá, 21 de enero de 2025

TIC-INVIAS-1631-277

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Att: Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de Sostenibilidad - INVIAS

Ref. **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2."**

Asunto: No generación de pasivos sociales contrato N° 4175-2023 – OAC Vereda Cachipayal.

Cordial saludo,

Por medio de la presente esta interventoría **CERTIFICA** que a la terminación del Convenio 4175 -2023, la Junta de Acción Comunal de la vereda Cachipayal del municipio de La Belleza – Santander en el marco del programa CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **NO SE GENERARON PASIVOS SOCIALES Y/O QUEDARON PENDIENTES SOCIALES**.

Se expide esta certificación a los veintiún (21) días del mes de enero de 2025.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Miryam Prada – Profesional social de Interventoría.

Copia: Ing. Claudia Gómez– Profesional Social DT Santander – (crgomez@invias.gov.co)
Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

Bogotá, enero 21 de 2025

TIC-INVIAS-1631-278

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL - VELEZ
Atte. Jairo González Pinzón (Presidente JAC)

REF: **CONVENIO 4367 -2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ASUNTO: Cumplimento con los elementos de protección personal (EPP)

Cordial saludo,

En calidad de INTERVENTORÍA del convenio de la referencia me permito solicitar a Ud. que los trabajadores tengan y utilicen los elementos de protección personal (EPP) ya que son esenciales para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) así como también la de su bienestar y su integridad.

En específico, requerimos los siguientes soportes:

1. Entrega de dotación y elementos de protección personal (EPP). (Casco, Guantes, Gafas, Botas y Uniforme de Dotación) para cada uno de los trabajadores.

La entrega del respectivo soporte o evidencia debe realizarse en un plazo no mayor a un (1) día hábil contado a partir de la radicación del presente comunicado.

Sin otro particular;



JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Lizeth Paola Ruiz Moncada

Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

Bogotá, 23 de enero de 2025

TIC-INVIAS-1631-279

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Att: Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de Sostenibilidad - INVIAS

Ref. **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2."**

Asunto: Entrega oficial SS – Etapa de cierre vereda Cachipayal – La Belleza N° 4175-2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente se hace entrega de la documentación requerida para el cierre del convenio en el área social de la vereda Cachipayal del municipio de la Belleza – Santander, el cual se encuentra contemplado en el PGS relacionada en el convenio 4175 de 2023 en el marco de programas caminos comunitarios de la paz total.

A continuación, se relacionan los siguientes anexos:

1. ENTREGA OFICIAL CIERRE CACHIPAYAL
    1. MASPS-MN1-IN-3-FR-2 BALANCE DEL ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO_OAC
    2. MASPS-MN1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL - CACHIPAYAL.
    3. MASPS-MN1-IN-3-FR-6 PRE-ACTA MENSUAL INVERSIÓN SOCIAL
    4. SOPORTES DE SOCIALIZACIÓN DE CIERRE
    5. SOPORTES ACTIVIDADES DEL PGS
        C1. Protocolo para el servicio de atención al usuario
        C2. Socializaciones
        C3. Participación comunitaria
        C4. Contratación de mano de obra local
        C5. Inclusión social con perspectiva de género

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellin
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.

Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

www.terraingenierosciviles.com

6. Matriz de Consolidación de Datos CACHIPAYAL - LA BELLEZA
7. CERTIFICADO INTERVENTORÍA NO PASIVOS SOCIALES

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Miryam Prada – Profesional social de Interventoría.

Copia: Ing. Claudia Gómez– Profesional Social DT Santander – (crgomez@invias.gov.co)
Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellin
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.

Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

www.terraingenierosciviles.com

Bogotá, enero 23 de 2025

TIC-INVIAS-1631-280

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN - GUAVATA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA - GUAVATA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLÍN - LA BELLEZA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL - LA BELLEZA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ÓRGANOS - SUCRE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA - VELEZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA - VELEZ

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2."**

ASUNTO: REITERACIÓN DE LA SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que, una vez terminadas las obras constructivas inherentes a los convenios, de la manera más atenta, nos permitimos solicitar, la entrega de la gestión ambiental realizada durante la ejecución de las actividades constructivas, información que ha sido solicitada en diferentes ocasiones por parte de la Interventoría y hace parte de la documentación del cierre ambiental de cada Convenio.

De acuerdo con lo anterior, se deben presentar todas las evidencias y documentos ya solicitados en los siguientes requerimientos con números de radicados:

TIC-INVIAS-1631-172 del 05 de octubre de 2024.
TIC-INVIAS-1631-211 del 02 de noviembre de 2024.
TIC-INVIAS-1631-266 del 24 de diciembre de 2024

Por lo tanto, todas las actividades contempladas en el PMA, deben ser evidenciadas por medio del registro fotográfico fechado y presentado a la Interventoría mediante carpetas para poder tener material de evidencia y formular los informes de cierre.

Así mismo, se deben gestionar todos los paz y salvos con los proveedores de materiales pétreos, proveedor del agua para concretos, de la empresa que manejó los residuos sólidos (bolsas de Cemento), del préstamo de los sitios para disponer las excavaciones, si quien autorizó la disposición del material en vías, este paz y salvo debe ser emitido por la Alcaldía

Se reitera que lo anteriormente solicitado, es importante para la liquidación del convenio.

Cualquier inquietud, estaremos atentos a atender.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Ing. Yolima Hoyos – Ingeniera Ambiental de Interventoría.

Anexos: No aplica

Copia: Ing. Nelson Acevedo – Gestor Ambiental Sostenibilidad – INVIAS. (nacevedo@invias.gov.co)
Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Bogotá, enero 24 de 2025

TIC-INVIAS-1631-281

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA – VELEZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL – VELEZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL - BOLÍVAR

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2."**

ASUNTO: REITERACIÓN DE LA SOLICITUD DEL BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN CONTRATO OBRA

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que, una vez terminadas las obras constructivas inherentes a los convenios, de la manera más atenta, nos permitimos solicitar, la entrega de la gestión ambiental realizada durante la ejecución de las actividades constructivas, información que ha sido solicitada en diferentes ocasiones por parte de la Interventoría y hace parte de la documentación del cierre ambiental de cada Convenio.

De acuerdo con lo anterior, se deben presentar todas las evidencias y documentos ya solicitados en los siguientes requerimientos con números de radicados:

TIC-INVIAS-1631-172 del 05 de octubre de 2024.
TIC-INVIAS-1631-211 del 02 de noviembre de 2024.
TIC-INVIAS-1631-266 del 24 de diciembre de 2024

Por lo tanto, todas las actividades contempladas en el PMA, deben ser evidenciadas por medio del registro fotográfico fechado y presentado a la Interventoría mediante carpetas para poder tener material de evidencia y formular los informes de cierre.

Así mismo, se deben gestionar todos los paz y salvos con los proveedores de materiales pétreos, proveedor del agua para concretos, de la empresa que manejó los residuos sólidos (bolsas de Cemento), del préstamo de los sitios para disponer las excavaciones, si quien autorizó la disposición del material en vías, este paz y salvo debe ser emitido por la Alcaldía

Se reitera que lo anteriormente solicitado, es importante para la liquidación del convenio.

Cualquier inquietud, estaremos atentos a atender.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Ing. Yolima Hoyos – Ingeniera Ambiental de Interventoría.

Anexos: No aplica

Copia: Ing. Nelson Acevedo – Gestor Ambiental Sostenibilidad – INVIAS. (nacevedo@invias.gov.co)
Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Bogotá, 29 de enero de 2025

TIC-INVIAS-1631-282

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA
Atn. NESTOR ILDEFONSO FONTECHA SANDOVAL
Representante Legal
Vereda Tebaida – Vélez Santander

REF: **CONVENIO N° 4424 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

Asunto: Incumplimiento del Contratista en la entrega de la documentación de la Gestión Ambiental Inicial OAC Vereda Tebaida.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que a la fecha en el Convenio No. 4424-2023, se encuentran cerca de su terminación las obras constructivas inherentes al contrato de obra, se informa, lo siguiente:

El Convenio en mención, no presentó la Gestión Ambiental inicial e información de la implementación del Plan de Manejo Ambiental – PMA, durante el desarrollo del proyecto y ha hecho caso omiso a los diferentes requerimientos ambientales, sin obtenerse respuesta a la fecha de la presentación de las evidencias solicitadas en los siguientes requerimientos con sus respectivos números de radicado:

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
1	5/09/2024	TIC-INVIAS-1631-157	Requerimientos Ambientales para el Inicio de Obras.
2	11/09/2024	TIC-INVIAS-1631-161	Revisión de documentos a Títulos Mineros y ambientales.
3	2/10/2024	TIC-INVIAS-1631-182	Tercera reiteración de la presentación de información Ambiental, para el Inicio de Obras.

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
4	5/10/2024	TIC-INVIAS-1631-172	Solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA propuesto por cada proyecto.
5	02/11/2024	TIC-INVIAS-1631-211	Reiteración a solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA del Proyecto, para dar cierre ambiental del Proyecto.
6	24/12/2024	TIC-INVIAS-1631-255	Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato de Obra.
7	24/01/2025	TIC-INVIAS-1631-281	Reiteración de la Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.

Por esta razón, en calidad de interventoría del convenio, nos permitimos recordar los siguientes apartes del mismo:

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL

XIX. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

XXII. Atender los requerimientos, solicitudes y comentarios del Interventor del convenio, y asistir a las reuniones y visitas o recorridos a los que aquellos convoquen conjunta o separadamente.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS. Si durante la ejecución del Convenio se generaran incumplimientos del OAC, se causarán las siguientes multas:

III. Si el OAC no entrega la información completa que le solicite el Interventor del INSTITUTO, que se relacione con el objeto del convenio, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del convenio. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el OAC demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor y/o Supervisor del INSTITUTO.

VI. Por incumplir las órdenes dadas por la Interventor, el OAC se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del convenio, por cada orden incumplida.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al OAC para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de

manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el Artículo 1600 del Código Civil.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el OAC incurra en una de las causales de multa, este autoriza al INSTITUTO para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al OAC, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del convenio.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al OAC, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará a este de continuar con la ejecución del convenio ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

De acuerdo a lo anterior, ante la radicación de esta comunicación, se requiere que, en un plazo no mayor a tres días hábiles, se envíe la información solicitada, para la revisión y aprobación por parte de esta interventoría; así mismo dicha información será remitida al INVIAS.

De no ser así, será necesario dar inicio al respectivo proceso sancionatorio de acuerdo a lo estipulado en el convenio de la referencia.

Cualquier inquietud, estaremos atentos a atender.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Ing. Yolima Hoyos – Ingeniera Ambiental de Interventoría.

Anexos: No aplica

Copia: Ing. Nelson Acevedo – Gestor Ambiental Sostenibilidad – INVIAS. (nacevedo@invias.gov.co)
Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

Bogotá, 29 de enero de 2025

TIC-INVIAS-1631-283

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Att: Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de Sostenibilidad - INVIAS

Ref. **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2."**

Asunto: Entrega propuesta Social 4424-2023 OAC Vereda Tebaida del municipio de Vélez.

Cordial saludo

Por medio de la presente se hace entrega oficial de las correcciones solicitadas por ustedes del Plan de inversión social, el cual se encuentra contemplado en el PGS relacionados con los convenios:

4424-2023 VEREDA TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ

En el marco del programa caminos comunitarios de la paz total, se relaciona el envío de los siguientes anexos:

- PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL 3
- COTIZACIONES ACTIVIDAD
- PROPUESTA ACTIVIDAD
- ACTA DE COMPROMISO DE LA COMUNIDAD

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellin
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.

Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

www.terraingenierosciviles.com

Cabe aclarar que la información enviada y relacionada a continuación va desglosada por ítem y la interventoría aprueba la gestión y/o formatos remitidos como lo indica el manual de interventoría

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Miryam Prada – Profesional social de Interventoría.
Anexos: (Propuesta vereda Tebaida)

Copia: Ing. Claudia Gómez– Profesional Social DT Santander – (crgomez@invias.gov.co)
Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellin
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.

Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

www.terraingenierosciviles.com

Bogotá, enero 29 de 2025

TIC-INVIAS-1631-284

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLÍN - LA BELLEZA

REF: Contrato 1631 de 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN.

ASUNTO: Inicio de procedimiento de aplicación de multas por incumplimiento.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que a la fecha el Convenio No.3753-2023, ya terminó sus obras constructivas inherentes al contrato de obra, se informa, lo siguiente:

Una vez terminadas las obras constructivas inherentes a los convenios, nos permitimos nuevamente solicitar, la entrega de la gestión ambiental realizada durante la ejecución de las actividades constructivas, estas debieron ser documentadas mediante evidencias como registro fotográfico fechado, listado de asistencia a capacitaciones del personal de obra, etc., y presentadas a la Interventoria.

Así mismo, a la fecha se debió gestionar los paz-y-salvos, con los proveedores de materiales pétreos, proveedor del agua para concretos, de la empresa que manejó los residuos sólidos (bolsas de Cemento), del préstamo de los sitios para disponer las excavaciones, si se dispuso en vías alternas a las del proyecto, este paz-y-salvo debe ser emitido por la Alcaldía. Adicionalmente el diligenciamiento de los formatos INVIAS. Lo anterior, con el fin de armar los informes del cierre ambiental del Convenio ante el INVIAS.

Las evidencias y documentos, solicitadas reiteradamente, fueron requeridos en los siguientes números de radicados:

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
1	5/10/2024	TIC-INVIAS-1631-172	Solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA propuesto por cada proyecto.
2	02/11/2024	TIC-INVIAS-1631-211	Reiteración a solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA del

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
			Proyecto, para dar cierre ambiental del Proyecto.
3	24/12/2024	TIC-INVIAS-1631-255	Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.
4	24/01/2025	TIC-INVIAS-1631-281	Reiteración de la Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.

Por esta razón, en calidad de interventoría del convenio, nos permitimos recordar los siguientes apartes del mismo:

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL

XIX. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

XXII. Atender los requerimientos, solicitudes y comentarios del Interventor del convenio, y asistir a las reuniones y visitas o recorridos a los que aquellos convoquen conjunta o separadamente.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS. Si durante la ejecución del Convenio se generaran incumplimientos del OAC, se causarán las siguientes multas:

III. Si el OAC no entrega la información completa que le solicite el Interventor del INSTITUTO, que se relacione con el objeto del convenio, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del convenio. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el OAC demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor y/o Supervisor del INSTITUTO.

VI. Por incumplir las órdenes dadas por la Interventor, el OAC se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del convenio, por cada orden incumplida.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al OAC para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el Artículo 1600 del Código Civil.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el OAC incurra en una de las causales de multa, este autoriza al INSTITUTO para descontar el valor de la misma, la cual se tomará

directamente de cualquier suma que se le adeude al OAC, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del convenio.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al OAC, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará a este de continuar con la ejecución del convenio ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

De acuerdo a lo anterior, ante la radicación de esta comunicación, se requiere que, en un plazo no mayor a tres días hábiles, se envíe la información solicitada en los diferentes oficios anteriormente mencionados, para la revisión y aprobación por parte de esta interventoría; así mismo dicha información será remitida al INVIAS.

De no ser así, será necesario dar inicio al respectivo proceso sancionatorio de acuerdo a lo estipulado en el convenio de la referencia.

Cualquier inquietud, estaremos atentos a atender.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Anexos: No aplica

Proyectó: Yolima Hoyos, Jaime Chacón Durán.

Revisó: Ing. Jorge Forero

Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

Bogotá, enero 28 de 2025

TIC-INVIAS-1631-285

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL - LA BELLEZA

REF: Contrato 1631 de 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN.

ASUNTO: Inicio de procedimiento de aplicación de multas por incumplimiento.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que a la fecha el Convenio No.4175-2023, ya terminó sus obras constructivas inherentes al contrato de obra, se informa, lo siguiente:

Una vez terminadas las obras constructivas inherentes a los convenios, nos permitimos nuevamente solicitar, la entrega de la gestión ambiental realizada durante la ejecución de las actividades constructivas, estas debieron ser documentadas mediante evidencias como registro fotográfico fechado, listado de asistencia a capacitaciones del personal de obra, etc., y presentadas a la Interventoria.

Así mismo, a la fecha se debió gestionar todos los paz-y-salvos, con los proveedores de materiales pétreos, proveedor del agua para concretos, de la empresa que manejó los residuos sólidos (bolsas de Cemento), del préstamo de los sitios para disponer las excavaciones, si se dispuso en vías alternas a las del proyecto, este paz-y-salvo debe ser emitido por la Alcaldía. Adicionalmente el diligenciamiento de los formatos INVIAS. Lo anterior, con el fin de armar los informes del cierre ambiental del Convenio ante el INVIAS.

Las evidencias y documentos, solicitadas reiteradamente, fueron requeridos en los siguientes números de radicados:

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
1	5/10/2024	TIC-INVIAS-1631-172	Solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA propuesto por cada proyecto.
2	02/11/2024	TIC-INVIAS-1631-211	Reiteración a solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA del

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
			Proyecto, para dar cierre ambiental del Proyecto.
3	24/12/2024	TIC-INVIAS-1631-255	Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.
4	24/01/2025	TIC-INVIAS-1631-281	Reiteración de la Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.

Por esta razón, en calidad de interventoría del convenio, nos permitimos recordar los siguientes apartes del mismo:

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL

XIX. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

XXII. Atender los requerimientos, solicitudes y comentarios del Interventor del convenio, y asistir a las reuniones y visitas o recorridos a los que aquellos convoquen conjunta o separadamente.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS. Si durante la ejecución del Convenio se generaran incumplimientos del OAC, se causarán las siguientes multas:

III. Si el OAC no entrega la información completa que le solicite el Interventor del INSTITUTO, que se relacione con el objeto del convenio, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del convenio. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el OAC demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor y/o Supervisor del INSTITUTO.

VI. Por incumplir las órdenes dadas por la Interventor, el OAC se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del convenio, por cada orden incumplida.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al OAC para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el Artículo 1600 del Código Civil.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el OAC incurra en una de las causales de multa, este autoriza al INSTITUTO para descontar el valor de la misma, la cual se tomará

directamente de cualquier suma que se le adeude al OAC, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del convenio.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al OAC, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará a este de continuar con la ejecución del convenio ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

De acuerdo a lo anterior, ante la radicación de esta comunicación, se requiere que, en un plazo no mayor a tres días hábiles, se envíe la información solicitada en los diferentes oficios anteriormente mencionados, para la revisión y aprobación por parte de esta interventoría; así mismo dicha información será remitida al INVIAS.

De no ser así, será necesario dar inicio al respectivo proceso sancionatorio de acuerdo a lo estipulado en el convenio de la referencia.

Cualquier inquietud, estaremos atentos a atender.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Anexos: No aplica

Proyectó: Yolima Hoyos, Jaime Chacón

Revisó: Ing. Jorge Forero

Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

Bogotá, enero 28 de 2025

TIC-INVIAS-1631-286

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL - BOLÍVAR

REF: Contrato 1631 de 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN.

ASUNTO: Inicio de procedimiento de aplicación de multas por incumplimiento.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que a la fecha el Convenio No.3951-2023, ya terminó sus obras constructivas inherentes al contrato de obra, se informa, lo siguiente:

Una vez terminadas las obras constructivas inherentes a los convenios, nos permitimos nuevamente solicitar, la entrega de la gestión ambiental realizada durante la ejecución de las actividades constructivas, estas debieron ser documentadas mediante evidencias como registro fotográfico fechado, listado de asistencia a capacitaciones del personal de obra, etc y presentadas a la Interventoria.

Así mismo, a la fecha se debió gestionar todos los paz-y-salvos, con los proveedores de materiales pétreos, proveedor del agua para concretos, de la empresa que manejó los residuos sólidos (bolsas de Cemento), del préstamo de los sitios para disponer las excavaciones, si se dispuso en vías alternas a las del proyecto, este paz y salvo debe ser emitido por la Alcaldía. Adicionalmente el diligenciamiento de los formatos INVIAS. Lo anterior, con el fin de armar los informes del cierre ambiental del Convenio ante el INVIAS.

Las evidencias y documentos, solicitadas reiteradamente, fueron requeridos en los siguientes números de radicados:

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
1	5/10/2024	TIC-INVIAS-1631-172	Solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA propuesto por cada proyecto.
2	02/11/2024	TIC-INVIAS-1631-211	Reiteración a solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA del

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
			Proyecto, para dar cierre ambiental del Proyecto.
3	24/12/2024	TIC-INVIAS-1631-255	Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.
4	24/01/2025	TIC-INVIAS-1631-281	Reiteración de la Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.

Por esta razón, en calidad de interventoría del convenio, nos permitimos recordar los siguientes apartes del mismo:

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL

XIX. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

XXII. Atender los requerimientos, solicitudes y comentarios del Interventor del convenio, y asistir a las reuniones y visitas o recorridos a los que aquellos convoquen conjunta o separadamente.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS. Si durante la ejecución del Convenio se generaran incumplimientos del OAC, se causarán las siguientes multas:

III. Si el OAC no entrega la información completa que le solicite el Interventor del INSTITUTO, que se relacione con el objeto del convenio, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del convenio. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el OAC demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor y/o Supervisor del INSTITUTO.

VI. Por incumplir las órdenes dadas por la Interventor, el OAC se hará acreedor a una multa
equivalente al [0,3%] del valor del convenio, por cada orden incumplida.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al OAC para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el Artículo 1600 del Código Civil.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el OAC incurra en una de las causales de multa, este autoriza al INSTITUTO para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al OAC, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del convenio.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al OAC, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará a este de continuar con la ejecución del convenio ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

De acuerdo a lo anterior, ante la radicación de esta comunicación, se requiere que, en un plazo no mayor a tres días hábiles, se envíe la información solicitada en los diferentes oficios anteriormente mencionados, para la revisión y aprobación por parte de esta interventoría; así mismo dicha información será remitida al INVIAS.

De no ser así, será necesario dar inicio al respectivo proceso sancionatorio de acuerdo a lo estipulado en el convenio de la referencia.

Cualquier inquietud, estaremos atentos a atender.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Anexos: No aplica

Proyectó: Yolima Hoyos, Jaime Chacón

Revisó: Ing. Jorge Forero

Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

Bogotá, enero 28 de 2025

TIC-INVIAS-1631-287

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA - VELEZ

REF: Contrato 1631 de 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN.

ASUNTO: Inicio de procedimiento de aplicación de multas por incumplimiento.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que a la fecha el Convenio No.4565-2023, ya terminó sus obras constructivas inherentes al contrato de obra, se informa, lo siguiente:

Una vez terminadas las obras constructivas inherentes a los convenios, nos permitimos nuevamente solicitar, la entrega de la gestión ambiental realizada durante la ejecución de las actividades constructivas, estas debieron ser documentadas mediante evidencias como registro fotográfico fechado, listado de asistencia a capacitaciones del personal de obra, etc., y presentadas a la Interventoria.

Así mismo, a la fecha se debió gestionar todos los paz-y-salvos, con los proveedores de materiales pétreos, proveedor del agua para concretos, de la empresa que manejó los residuos sólidos (bolsas de Cemento), del préstamo de los sitios para disponer las excavaciones, si se dispuso en vías alternas a las del proyecto, este paz-y-salvo debe ser emitido por la Alcaldía. Adicionalmente el diligenciamiento de los formatos INVIAS. Lo anterior, con el fin de armar los informes del cierre ambiental del Convenio ante el INVIAS.

Las evidencias y documentos, solicitadas reiteradamente, fueron requeridos en los siguientes números de radicados:

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
1	5/10/2024	TIC-INVIAS-1631-172	Solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA propuesto por cada proyecto.
2	02/11/2024	TIC-INVIAS-1631-211	Reiteración a solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA del

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
			Proyecto, para dar cierre ambiental del Proyecto.
3	24/12/2024	TIC-INVIAS-1631-255	Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.
4	24/01/2025	TIC-INVIAS-1631-281	Reiteración de la Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.

Por esta razón, en calidad de interventoría del convenio, nos permitimos recordar los siguientes apartes del mismo:

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL

XIX. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

XXII. Atender los requerimientos, solicitudes y comentarios del Interventor del convenio, y asistir a las reuniones y visitas o recorridos a los que aquellos convoquen conjunta o separadamente.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS. Si durante la ejecución del Convenio se generaran incumplimientos del OAC, se causarán las siguientes multas:

III. Si el OAC no entrega la información completa que le solicite el Interventor del INSTITUTO, que se relacione con el objeto del convenio, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del convenio. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el OAC demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor y/o Supervisor del INSTITUTO.

VI. Por incumplir las órdenes dadas por la Interventor, el OAC se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del convenio, por cada orden incumplida.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al OAC para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el Artículo 1600 del Código Civil.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el OAC incurra en una de las causales de multa, este autoriza al INSTITUTO para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al OAC, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del convenio.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al OAC, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará a este de continuar con la ejecución del convenio ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

De acuerdo a lo anterior, ante la radicación de esta comunicación, se requiere que, en un plazo no mayor a tres días hábiles, se envíe la información solicitada en los diferentes oficios anteriormente mencionados, para la revisión y aprobación por parte de esta interventoría; así mismo dicha información será remitida al INVIAS.

De no ser así, será necesario dar inicio al respectivo proceso sancionatorio de acuerdo a lo estipulado en el convenio de la referencia.

Cualquier inquietud, estaremos atentos a atender.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Anexos: No aplica

Proyectó: Yolima Hoyos, Jaime Chacón

Revisó: Ing. Jorge Forero

Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

Bogotá, enero 28 de 2025

TIC-INVIAS-1631-288

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ÓRGANOS - SUCRE

REF: Contrato 1631 de 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN.

ASUNTO: Inicio de procedimiento de aplicación de multas por incumplimiento.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que a la fecha el Convenio No.4490-2023, ya terminó sus obras constructivas inherentes al contrato de obra, se informa, lo siguiente:

Una vez terminadas las obras constructivas inherentes a los convenios, nos permitimos nuevamente solicitar, la entrega de la gestión ambiental realizada durante la ejecución de las actividades constructivas, estas debieron ser documentadas mediante evidencias como registro fotográfico fechado, listado de asistencia a capacitaciones del personal de obra, etc., y presentadas a la Interventoria.

Así mismo, a la fecha se debió gestionar todos los paz-y-salvos, con los proveedores de materiales pétreos, proveedor del agua para concretos, de la empresa que manejó los residuos sólidos (bolsas de Cemento), del préstamo de los sitios para disponer las excavaciones, si se dispuso en vías alternas a las del proyecto, este paz-y-salvo debe ser emitido por la Alcaldía. Adicionalmente el diligenciamiento de los formatos INVIAS. Lo anterior, con el fin de armar los informes del cierre ambiental del Convenio ante el INVIAS.

Las evidencias y documentos, solicitadas reiteradamente, fueron requeridos en los siguientes números de radicados:

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
1	5/10/2024	TIC-INVIAS-1631-172	Solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA propuesto por cada proyecto.
2	02/11/2024	TIC-INVIAS-1631-211	Reiteración a solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA del

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
			Proyecto, para dar cierre ambiental del Proyecto.
3	24/12/2024	TIC-INVIAS-1631-255	Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.
4	24/01/2025	TIC-INVIAS-1631-281	Reiteración de la Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.

Por esta razón, en calidad de interventoría del convenio, nos permitimos recordar los siguientes apartes del mismo:

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL

XIX. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

XXII. Atender los requerimientos, solicitudes y comentarios del Interventor del convenio, y asistir a las reuniones y visitas o recorridos a los que aquellos convoquen conjunta o separadamente.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS. Si durante la ejecución del Convenio se generaran incumplimientos del OAC, se causarán las siguientes multas:

III. Si el OAC no entrega la información completa que le solicite el Interventor del INSTITUTO, que se relacione con el objeto del convenio, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del convenio. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el OAC demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor y/o Supervisor del INSTITUTO.

VI. Por incumplir las órdenes dadas por la Interventor, el OAC se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del convenio, por cada orden incumplida.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al OAC para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el Artículo 1600 del Código Civil.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el OAC incurra en una de las causales de multa, este autoriza al INSTITUTO para descontar el valor de la misma, la cual se tomará

directamente de cualquier suma que se le adeude al OAC, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del convenio.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al OAC, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará a este de continuar con la ejecución del convenio ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

De acuerdo a lo anterior, ante la radicación de esta comunicación, se requiere que, en un plazo no mayor a tres días hábiles, se envíe la información solicitada en los diferentes oficios anteriormente mencionados, para la revisión y aprobación por parte de esta interventoría; así mismo dicha información será remitida al INVIAS.

De no ser así, será necesario dar inicio al respectivo proceso sancionatorio de acuerdo a lo estipulado en el convenio de la referencia.

Cualquier inquietud, estaremos atentos a atender.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Anexos: No aplica

Proyectó: Yolima Hoyos, Jaime Chacón

Revisó: Ing. Jorge Forero

Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

Bogotá, enero 28 de 2025

TIC-INVIAS-1631-289

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA - GUAVATA

REF: Contrato 1631 de 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN.

ASUNTO: Inicio de procedimiento de aplicación de multas por incumplimiento.

Cordial saludo,
Teniendo en cuenta que a la fecha el Convenio No.4767-2023, ya terminó sus obras constructivas inherentes al contrato de obra, se informa, lo siguiente:

Una vez terminadas las obras constructivas inherentes a los convenios, nos permitimos nuevamente solicitar, la entrega de la gestión ambiental realizada durante la ejecución de las actividades constructivas, estas debieron ser documentadas mediante evidencias como registro fotográfico fechado, listado de asistencia a capacitaciones del personal de obra, etc y presentadas a la Interventoría.

Así mismo, a la fecha se debió gestionar todos los paz-y-salvos, con los proveedores de materiales pétreos, proveedor del agua para concretos, de la empresa que manejó los residuos sólidos (bolsas de Cemento), del préstamo de los sitios para disponer las excavaciones, si se dispuso en vías alternas a las del proyecto, este paz-y-salvo debe ser emitido por la Alcaldía. Adicionalmente el diligenciamiento de los formatos INVIAS. Lo anterior, con el fin de armar los informes del cierre ambiental del Convenio ante el INVIAS.

Las evidencias y documentos, solicitadas reiteradamente, fueron requeridos en los siguientes números de radicados:

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
1	5/10/2024	TIC-INVIAS-1631-172	Solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA propuesto por cada proyecto.
2	02/11/2024	TIC-INVIAS-1631-211	Reiteración a solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA del

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
			Proyecto, para dar cierre ambiental del Proyecto.
3	24/12/2024	TIC-INVIAS-1631-255	Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.
4	24/01/2025	TIC-INVIAS-1631-281	Reiteración de la Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.

Por esta razón, en calidad de interventoría del convenio, nos permitimos recordar los siguientes apartes del mismo:

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL
XIX. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
XXII. Atender los requerimientos, solicitudes y comentarios del Interventor del convenio, y asistir a las reuniones y visitas o recorridos a los que aquellos convoquen conjunta o separadamente.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS. Si durante la ejecución del Convenio se generaran incumplimientos del OAC, se causarán las siguientes multas:

III. Si el OAC no entrega la información completa que le solicite el Interventor del INSTITUTO, que se relacione con el objeto del convenio, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del convenio. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el OAC demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor y/o Supervisor del INSTITUTO.

VI. Por incumplir las órdenes dadas por la Interventor, el OAC se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del convenio, por cada orden incumplida.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al OAC para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el Artículo 1600 del Código Civil.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el OAC incurra en una de las causales de multa, este autoriza al INSTITUTO para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al OAC, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del convenio.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al OAC, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará a este de continuar con la ejecución del convenio ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

De acuerdo a lo anterior, ante la radicación de esta comunicación, se requiere que, en un plazo no mayor a tres días hábiles, se envíe la información solicitada en los diferentes oficios anteriormente mencionados, para la revisión y aprobación por parte de esta interventoría; así mismo dicha información será remitida al INVIAS.

De no ser así, será necesario dar inicio al respectivo proceso sancionatorio de acuerdo a lo estipulado en el convenio de la referencia.

Cualquier inquietud, estaremos atentos a atender.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Anexos: No aplica

Proyectó: Yolima Hoyos, Jaime Chacón

Revisó: Ing. Jorge Forero

Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Bogotá, Enero 28 de 2025

TIC-INVIAS-1631-290

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA - VELEZ

REF: Contrato 1631 de 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN.

ASUNTO: Inicio de procedimiento de aplicación de multas por incumplimiento.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que a la fecha el Convenio No.4357-2023, ya terminó sus obras constructivas inherentes al contrato de obra, se informa, lo siguiente:

Una vez terminadas las obras constructivas inherentes a los convenios, nos permitimos nuevamente solicitar, la entrega de la gestión ambiental realizada durante la ejecución de las actividades constructivas, estas debieron ser documentadas mediante evidencias como registro fotográfico fechado, listado de asistencia a capacitaciones del personal de obra, etc., y presentadas a la Interventoria.

Así mismo, a la fecha se debió gestionar todos la paz-y-salvos, con los proveedores de materiales pétreos, proveedor del agua para concretos, de la empresa que manejó los residuos sólidos (bolsas de Cemento), del préstamo de los sitios para disponer las excavaciones, si se dispuso en vías alternas a las del proyecto, este paz-y-salvo debe ser emitido por la Alcaldía. Adicionalmente el diligenciamiento de los formatos INVIAS. Lo anterior, con el fin de armar los informes del cierre ambiental del Convenio ante el INVIAS.

Las evidencias y documentos, solicitadas reiteradamente, fueron requeridos en los siguientes números de radicados:

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
1	5/10/2024	TIC-INVIAS-1631-172	Solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA propuesto por cada proyecto.
2	02/11/2024	TIC-INVIAS-1631-211	Reiteración a solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA del

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
			Proyecto, para dar cierre ambiental del Proyecto.
3	24/12/2024	TIC-INVIAS-1631-255	Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.
4	24/01/2025	TIC-INVIAS-1631-281	Reiteración de la Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.

Por esta razón, en calidad de interventoría del convenio, nos permitimos recordar los siguientes apartes del mismo:

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL

XIX. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

XXII. Atender los requerimientos, solicitudes y comentarios del Interventor del convenio, y asistir a las reuniones y visitas o recorridos a los que aquellos convoquen conjunta o separadamente.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS. Si durante la ejecución del Convenio se generaran incumplimientos del OAC, se causarán las siguientes multas:

III. Si el OAC no entrega la información completa que le solicite el Interventor del INSTITUTO, que se relacione con el objeto del convenio, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del convenio. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el OAC demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor y/o Supervisor del INSTITUTO.

VI. Por incumplir las órdenes dadas por la Interventor, el OAC se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del convenio, por cada orden incumplida.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al OAC para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el Artículo 1600 del Código Civil.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el OAC incurra en una de las causales de multa, este autoriza al INSTITUTO para descontar el valor de la misma, la cual se tomará

directamente de cualquier suma que se le adeude al OAC, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del convenio.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al OAC, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará a este de continuar con la ejecución del convenio ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

De acuerdo a lo anterior, ante la radicación de esta comunicación, se requiere que, en un plazo no mayor a tres días hábiles, se envíe la información solicitada en los diferentes oficios anteriormente mencionados, para la revisión y aprobación por parte de esta interventoría; así mismo dicha información será remitida al INVIAS.

De no ser así, será necesario dar inicio al respectivo proceso sancionatorio de acuerdo a lo estipulado en el convenio de la referencia.

Cualquier inquietud, estaremos atentos a atender.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Anexos: No aplica

Proyectó: Yolima Hoyos, Jaime Chacón

Revisó: Ing. Jorge Forero

Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

Bogotá, enero 28 de 2025

TIC-INVIAS-1631-291

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN - GUAVATA

REF: Contrato 1631 de 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN.

ASUNTO: Inicio de procedimiento de aplicación de multas por incumplimiento.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que a la fecha el Convenio No.4478-2023, ya terminó sus obras constructivas inherentes al contrato de obra, se informa, lo siguiente:

Una vez terminadas las obras constructivas inherentes a los convenios, nos permitimos nuevamente solicitar, la entrega de la gestión ambiental realizada durante la ejecución de las actividades constructivas, estas debieron ser documentadas mediante evidencias como registro fotográfico fechado, listado de asistencia a capacitaciones del personal de obra, etc. y presentadas a la Interventoría.

Así mismo, a la fecha se debió gestionar todos los paz-y-salvos, con los proveedores de materiales pétreos, proveedor del agua para concretos, de la empresa que manejó los residuos sólidos (bolsas de Cemento), del préstamo de los sitios para disponer las excavaciones, si se dispuso en vías alternas a las del proyecto, este paz-y-salvo debe ser emitido por la Alcaldía. Adicionalmente el diligenciamiento de los formatos INVIAS. Lo anterior, con el fin de armar los informes del cierre ambiental del Convenio ante el INVIAS.

Las evidencias y documentos, solicitadas reiteradamente, fueron requeridos en los siguientes números de radicados:

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
1	5/10/2024	TIC-INVIAS-1631-172	Solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA propuesto por cada proyecto.
2	02/11/2024	TIC-INVIAS-1631-211	Reiteración a solicitud de la implementación de las medidas contempladas en el PMA del

No.	FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO
			Proyecto, para dar cierre ambiental del Proyecto.
3	24/12/2024	TIC-INVIAS-1631-255	Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.
4	24/01/2025	TIC-INVIAS-1631-281	Reiteración de la Solicitud del Balance Ambiental a la Terminación Contrato Obra.

Por esta razón, en calidad de interventoría del convenio, nos permitimos recordar los siguientes apartes del mismo:

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL

XIX. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

XXII. Atender los requerimientos, solicitudes y comentarios del Interventor del convenio, y asistir a las reuniones y visitas o recorridos a los que aquellos convoquen conjunta o separadamente.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS. Si durante la ejecución del Convenio se generaran incumplimientos del OAC, se causarán las siguientes multas:

III. Si el OAC no entrega la información completa que le solicite el Interventor del INSTITUTO, que se relacione con el objeto del convenio, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del convenio. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el OAC demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor y/o Supervisor del INSTITUTO.

VI. Por incumplir las órdenes dadas por la Interventor, el OAC se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del convenio, por cada orden incumplida.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al OAC para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el Artículo 1600 del Código Civil.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el OAC incurra en una de las causales de multa, este autoriza al INSTITUTO para descontar el valor de la misma, la cual se tomará

directamente de cualquier suma que se le adeude al OAC, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del convenio.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al OAC, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará a este de continuar con la ejecución del convenio ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

De acuerdo a lo anterior, ante la radicación de esta comunicación, se requiere que, en un plazo no mayor a tres días hábiles, se envíe la información solicitada en los diferentes oficios anteriormente mencionados, para la revisión y aprobación por parte de esta interventoría; así mismo dicha información será remitida al INVIAS.

De no ser así, será necesario dar inicio al respectivo proceso sancionatorio de acuerdo a lo estipulado en el convenio de la referencia.

Cualquier inquietud, estaremos atentos a atender.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Anexos: No aplica

Proyectó: Yolima Hoyos, Jaime Chacón

Revisó: Ing. Jorge Forero

Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

Bogotá, 30 de enero de 2025

TIC-INVIAS-1631-293

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Att: Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de Sostenibilidad - INVIAS

Ref. **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2."**

Asunto: No generación de pasivos sociales contrato N° 3753-2023 – OAC Vereda Berlín-Municipio La Belleza-Santander.

Cordial saludo,

Por medio de la presente esta interventoría **CERTIFICA** que a la terminación del Convenio 3753 -2023 la Junta de Acción Comunal de la vereda Berlín del municipio de La Belleza Santander en el marco del programa CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **NO SE GENERARON PASIVOS SOCIALES Y/O QUEDARON PENDIENTES SOCIALES**.

Se expide esta certificación a los treinta (30) días del mes de enero de 2025.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Miryam Prada – Profesional social de Interventoría.

Copia: Ing. Claudia Gómez– Profesional Social DT Santander – (crgomez@invias.gov.co)
Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

Bogotá, 31 de enero de 2025

TIC-INVIAS-1631-294

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Att: Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de Sostenibilidad - INVIAS

Ref. **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2."**

Asunto: Entrega oficial SS – Etapa de cierre vereda Berlín – La Belleza N° 3753 - 2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente se hace entrega de la documentación requerida para el cierre del convenio en la parte social de la vereda Berlín del municipio de la Belleza – Santander, el cual se encuentra contemplado en el PGS relacionada en el convenio 3753 de 2023 en el marco de programas comunitarios de la paz total.

A continuación, se relacionan los siguientes anexos para la entrega oficial cierre Berlín:

1. MASPS-MN1-IN-3-FR-2 BALANCE DEL ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO_OAC
2. MASPS-MN1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL - BERLÍN
3. MASPS-MN1-IN-3-FR-6 PRE-ACTA MENSUAL INVERSIÓN SOCIAL
   3.1. SOPORTES PRE - ACTA INVERSIÓN SOCIAL
4. SOPORTES DE SOCIALIZACIÓN DE CIERRE
5. SOPORTES ACTIVIDADES DEL PGS
   C1. Protocolo para el servicio de atención al usuario
   C2. Socializaciones
   C3. Participación comunitaria
   C4. Contratación de mano de obra local
   C5. Inclusión social con perspectiva de género

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellin
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.

Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

www.terraingenierosciviles.com

6. Matriz de Consolidación de Datos BERLÍN - LA BELLEZA
7. Certificado interventoría no pasivos sociales

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Miryam Prada – Profesional social de Interventoría.

Copia: Ing. Claudia Gómez– Profesional Social DT Santander – (crgomez@invias.gov.co)
Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellin
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.

Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

www.terraingenierosciviles.com

Bogotá, 31 de enero de 2025

TIC-INVIAS-1631-295

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Att: Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de Sostenibilidad - INVIAS

Ref. **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2."**

Asunto: No generación de pasivos sociales contrato N° 4490-2023 VEREDA ORGANOS – MUNICIPIO SUCRE– SANTANDER.

Cordial saludo,

Por medio de la presente esta interventoría **CERTIFICA** que a la terminación del Convenio 4490 - 2023 la Junta de Acción Comunal de la vereda Órganos del municipio Sucre Santander en el marco del programa CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **NO SE GENERARON PASIVOS SOCIALES Y/O QUEDARON PENDIENTES SOCIALES**.

Se expide esta certificación a los treinta un (31) días del mes de enero de 2025.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Miryam Prada – Profesional social de Interventoría.

Copia: Ing. Claudia Gómez– Profesional Social DT Santander – (crgomez@invias.gov.co)
Copia: Ing. Marlon Gamboa– DT Santander INVIAS – (mgamboa@invias.gov.co)
Copia: Ing. Carlos Alberto Parra Silva - Supervisión INVIAS – (cparras@invias.gov.co)
Copia: Ing. Pedro José Barón- Apoyo a la Supervisión INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. Reynaldo Mantilla- Coordinador Programa CCPT INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellin
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

www.terraingenierosciviles.com

Relación Correspondencia Recibida

FECHA	NO DE OFICIO	ASUNTO	DESTINO	DESTINATARIO
14/01/2025	N. A	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL ING RESIDENTE VDA POPOA	OAC VEREDA POPOA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
30/01/2025	N. A	ENVÍO DOCUMENTACIÓN PARA CIERRE AMBIENTAL DEL CONVENIO 3753 DE 2023 DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN	OAC VEREDA BERLIN	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
02/01/2025	N. A	ENVÍO FORMATOS CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A SOLICITUD	OAC VEREDA TUBAVITA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
04/01/2025	N. A	DOCUMENTOS COMITÉ OPERATIVO 18 DICIEMBRE	OAC VEREDA TUBAVITA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
09/01/2025	N. A	DOCUMENTACIONES FALTANTES DE LOS COMITÉS 05, 08 Y 09	OAC VEREDA TUBAVITA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
18/01/2025	N. A	EXTRACTOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024	OAC VEREDA TEBAIDA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
24/01/2025	N. A	FORMATOS Y DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS PAGOS REALIZADOS	OAC VEREDA TEBAIDA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
03/01/2025	N. A	ENVIÓ ADJUNTO AUXILIAR DISCRIMINADO DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	OAC VEREDA LA PALMERA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
08/01/2025	N. A	ENVIÓ ADJUNTO MOVIMIENTO BANCARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA.	OAC VEREDA LA PALMERA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
09/01/2025	N. A	INFORME DEL MES DE DICIEMBRE	OAC VEREDA LA PALMERA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

10/01/2025	N. A	FACTURA PENDIENTE DE LA ARENA DE RÍO, QUE HA QUEDADO COMO COMPROMISO DEL COMITÉ OPERATIVO DEL 10 DE ENERO DE 2025	OAC VEREDA LA PALMERA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
16/01/2025	N. A	TRABAJADORES A LOS QUE NO HA SIDO POSIBLE PAGARLES	OAC VEREDA LA PALMERA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
21/01/2025	N. A	INVITACIÓN A LA INAUGURACIÓN DE LA PLACA HUELLA VEREDA LA PALMERA MUNICIPIO DE VÉLEZ	OAC VEREDA LA PALMERA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

TERRA INGENIEROS CIVILES SAS

ANEXO.
ACTAS DE REUNIÓN

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 - 3

FECHA: 25-01-2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4565-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PALMERA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA **LA PALMERA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Socializar a la comunidad de la vereda La Palmera las actividades realizadas durante la ejecución del convenio 4565-2023

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Presentación de asistentes OAC, interventoría e INVIAS
- Generalidades del convenio solidario y contrato de interventoría
  - Aspectos área técnica
  - Aspectos administrativos
  - Aspectos area socioambiental
  - Cierre comité de participación ciudadana.
- Inquietudes o solicitudes por parte de la comunidad

Se dio inicio a la reunión de cierre del convenio con presencia del señor Alcalde, representantes del concejo, comunidad en general. Se realizo la presentación y generalidades por parte de la profesional

Scanned with ACE Scanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

social de la interventoría. Una vez expuestas las diferentes áreas, se procedió a dar espacio a la comunidad para dar a conocer sus agradecimientos o inquietudes.

El señor Carlos Ariza, presidente de la J.A.C. agradeció la asistencia de los presentes, administración municipal, concejo y comunidad en general.

- Señor Alcalde Orlando Ariza, agradece a la comunidad e interventoría, concejal Diana y José Efraín Díaz. manifiesta agradecimientos al gobierno nacional por la inversión y ejecución a través de las J.A.C. manifiesta que se pudo invertir en 7 polideportivos y mejora de locaciones, que se ha podido realizar convenios con 27 J.A.C para realizar arreglos en vías terciarias. Se realizara convenio para ejecución de la Villa olímpica.
- Concejal José Efraín, agradece a los asistentes por su participación manifiesta que se solicito una semana de maquinaria para intervenir puntos críticos de la vereda, incluido el arreglo de la alcantarilla antes de que ocurran otro punto. También se esta trabajando en el tema del gas.
- Secretario de Gobierno, plantea la vigilancia a vehículos pesados que pueden dañar la placahuella x lo cual propone poner bolardos para evitar el tráfico pesado idea apoyada por la interventoría por parte del ing. Jaime y Leonardo.
- Rigoberto Ariza, agradecimiento a la comunidad asistente y administración municipal, manifiesta que el SENA a través de un técnico les dan 20 mts de placa huella por lo cual pide a la J.A.C trabajar en pro de esta actividad de igual solicita apoyo a la alcaldía para ampliar un poco la placa huella. Administración revisara presupuesto para trabajar al igual que otros puntos.

Scanned with ACE Scanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 -3
		FECHA	23-01-2025 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Presentar liquidación veeduria	01-02-2025	Veeduria.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Ing. Jaime Chacon	Residente Interventoria	TERRA	
Carlos Augusto Arias	Presidente JA	La Palmera	
Orlando Anzaldua	Alcalde	Velez	
Jose Efrain Diaz G.	Concejal	Velez	
Miryam Yanneth Prada	Profesional Social	Terra.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with ACE Scanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS REGISTRO DE ASISTENCIA	Código Versión: 1 Página: 1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: I.A.C. Vereda La Palmera - Vélez **Ciudad/ Municipio:** Vélez **Fecha:** 25-01-2025

Nombre del evento: Socialización de cierre **Lugar:** Placa huella

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento			No. Documento	Edad	Sexo			Discapacidad		Tipo de discapacidad	Etnia					Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
		CC	CE	P			F	M	O	SI	NO		I	N	R	G	P/A					
	Julian Quintero	X			1110175290	20		X			X											
	Gonzalo Camacho	X			13958974	42		1			X											
	Manuel Jose Vera	X			80327347	57		X			X								3107945005	Vd la Palmera		

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente linkhttps://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, mencione el tipo de discapacidad con la letra que la describe.	
V	* Visual -Persona ciega
A	* Auditiva
I/C	* Intelectual/Cognitiva
F	* Física
S/C	* Sordo ceguera
M	* Múltiple, tiene más de un tipo de discapacidad
PS	* Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rom	
N/A	No aplica	

Scanned with ACE Scanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: J.A.C. Vereda La Palmera - Vélez **Ciudad/ Municipio:** Vélez - Santander **Fecha:** 25-01-2025

Nombre del evento: Socialización de cierre. **Lugar:** Placa huella

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento			No. Documento	Edad	Sexo			Discapacidad		Tipo de discapacidad	Etnia						Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
		CC	CE	P			F	M	O	SI	NO		I	N	R	G	P	NA					
	Jaime Chacón Duran	X			1371870	45		X			X									3208122036	TERRA		
	Laura Arias	X			1101756764	34	X				X								asesorias253@outlook.es	3204224687	Contadora		LAURA ARIAS
	Lizeth Paola Ruiz M	X			1096483346	34	X				X								lis. Paola 22 29@hotmail.	3175958+89	Tierra		
	Stephany Rondano G.	X			1002582483	23	X				X								stegamboa05@gmail.com	3208920444	TERRA		
	Jorge Miguel Suarez				13955785	53					X										Alcaldía		
	Ramelino Santamaría	X			28479817	65					X									3176268347	Comunidad		Ramelino Santamaría
	Mercedes Pinzón	X			75089.324	46		X			X									3127200006	TERRA		
	Mario Elena Pos				52414411	48					X									3235112006	Fiscal		
	Carmen Rosa Pob				63435856	57					X									320 2636	Profesora		
	Ulver Solarte				63435573	53													Ulversolarte381@hotmail.com	3115100683	Veedora		
	Ricaborto Ariza				77053823	61					X									3172531781	La Palmera		R. Gaborto Ariza
	Olga Ariza Santamaría	X			1101758041	31	X				X								Olgaariza2525@gmail.com	3208941751	Vda La Palmera		OLGA ARIZA S.
	Wilson Ariza				77456837															3783694896	La Palmera		Wilson

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, especifique el tipo de discapacidad con la letra que le describe	
V	Visual. Persona ciega
A	Auditiva
I/C	Intelectual/Cognitiva
F	Física
S/C	Sordo ceguera
M	Múltiple, tiene más de un tipo de discapacidad
Psi	Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rom	
N/A	No aplica	

Scanned with ACE Scanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 - 3
		FECHA	25-01-2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4357-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TUBAVITA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA **TUBAVITA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Socializar a la comunidad de la vereda Tubavita las actividades realizados durante la ejecución del convenio 4357 - 2023.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Presentación de asistentes, OAC, interventoría, administración municipal.
- Generalidades del convenio solidario y contrato de interventoría
  - Aspectos área técnica
  - Aspectos administrativos
  - Aspectos área socioambientales
  - Cierre comité de participación ciudadana
- Inquietudes o solicitudes por parte de la comunidad.

Se did inicio a la reunión de cierre con presencia del Sr. Alcalde, concejales y comunidad en general, primero se realizó eucaristía, inauguración de placahuella y presentacion de actividades desarrollados en el convenio

Scanned with ACE Scanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se dió espacio a la comunidad y participaron las siguientes personas.

- Sr. Alcalde Orlando Aiza, agradeció a la comunidad en general, interventoria, concejal Diana, sacerdote y presidente J.A.C. recomendo el cuidado de la placahuella por parte de la comunidad, sugiere instalación de bolardes para evitar el tráfico pesado. Manifestó que esta obra valorizaba los predios de la vereda. Informó que la administración gestiono 40 sistemas de riego, 7 escenarios deportivos los cuales en 8 días se habilitaron. entre otros.
- Sr. Gladys presidente J.A.C. solicito a la administración mejoramiento para arreglar el camino a la cuevas de los indios sitio histórico de la vereda.
- Concejal Diana, manifiesta agradecimiento a la comunidad y Señor Libardo
- Veeder Libardo Santamaria, gratitud por la participación de la comunidad resalta la colaboración de la Sra Oliva, Gilberto Brero y Leonardo Quitian.

Sra. presidente de la J.A.C. invitá a la comunidad a compartir un almuerzo comunitario en la casa de una persona de la vereda.

Scanned with ACE Scanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	3 - 3
	FECHA	25-01-2025 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)

RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Ing. Jaime Chacón Durán	Residente de Obra	TERRA ING.	
Diana Hernández	Concejal	Concejo	
Gladys Chocontá A.	Presidenta JAC.	Presidente	
Orlando Ariza Ariza	Alcalde	Vélez	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with ACE Scanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión : J.A.C Vereda Tubavita, - Vélez **Ciudad/ Municipio:** Vélez **Fecha:** 25-01-2025

Nombre del evento: Socialización de cierre **Lugar:** Placa-huella

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento			No. Documento	Edad	Sexo			Discapacidad		Tipo de discapacidad	Etnia						Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
		CC	CE	P			F	M	O	SI	NO		I	N	R	G	P	NA					
	Juan Pablo Morales C	X			1070922555	30		X			X									3133615917			
	Libardo Santamaría				13954926	57		X			X									13'954.926 Vecedor.			
	Dora Hernandez				63437477	44	X				X									3176769319			
	Olivia del Angulo				28477901	71	X				X									3124687737			
	Reynel Manrique				13.971.427	78	X				X									3118141972			
	Monica Pardo Tellez				1101754064	36	X				X									3148799442			
	Blanca Tellez				37865189	61	X				X									3125184300			
	Cadira Daniso				38999493	41	X				X									3045309326			
	Yonathan Franco A	X			1096906655	20		X			X									3134779102			
	Gilberto Forero				19354282	70		X			X									3186528812			
	Claudina Angulo	X			63434256	58		X			X									3132069887			
	Maria Angulo V	X			1095743091	37	X				X								ejecutivaarguto 0408@gmail.com	3123159133			
	Ramiro Diaz				13.955.127	55														3112381961			

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente linkhttps://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, mencione el tipo de discapacidad con la letra que la describe.	
V	* Visual -Persona ciega
A	* Auditiva
I/C	* Intelectual/Cognitiva
F	* Física
S/C	* Sordo ceguera
M	* Múltiple, tiene más de un tipo de discapacidad
PS	* Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rom	
N/A	No aplica	

Scanned with ACE Scanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: J.A.C. Vereda Tubavita - Vélez **Ciudad/ Municipio:** Vélez **Fecha:** 25-01-2025

Nombre del evento: Socialización de cierre **Lugar:** Placa huella

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	G	P	NA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
	Barbara Santamaría				28.479615	64	X				X										Tubavita		
	Victorino Hernández				7395977	69					X										Tubavita		
	Alfredo Rodríguez				80401075	53					X										Tubavita		
	Gilberto Pérez				19377735	67					X									3005972083	Tubavita		
	Leonardo Quiñones				91300435	60					X										Tubavita		
	Yerman Hernández				13.951.561															3213949	Tubavita		
	Stephany Rondano G.	X			1092582483	23					X								stgambaro0930@gmail.com	3208926	Terra		Stephany R.
	Lizeth Paola R.	X			1096933346						X									3115458789	Terra		
	Julia Rita Sánchez	X			63437843	42	X													3115700576	Junta		
	Gladys Ebaneth H.	X			63434698	55													gladysebher@gmail.com	3138856	Tubavita		
	Leonardo Duque Limón	X			75,089374	46		X			X									3127200006	Terra		
	María Camila Díaz C.			X	1101758682	29	X				X								—	3149942418	Residente.		
	Jaime Chacón Durán				13718760	45		X												3208122030	TERRA		

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente linkhttps://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, mencione el tipo de discapacidad con la letra que la describe	
V	* Visual -Persona ciega
A	* Auditiva
I/C	* Intelectual/Cognitiva
F	* Física
S/C	* Sordo ceguera
M	* Múltiple, tiene más de un tipo de discapacidad
P/S	* Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rom	
N/A	No aplica	

Scanned with ACE Scanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 - 3

FECHA: 25-01-25 (Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ..... (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4357-2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TUBAVITA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA **TUBAVITA** DEL MUNICIPIO DE VELEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631-2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Cierre comité de participación ciudadana

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Siendo las 3:00 p.m. se realizá reunión con los miembros del comité de participación comunitario de la Vereda Tubavita del municipio de Velez, con el fin de solicitar cierre del comité de participación

Orden del dia

- saludo
- Objetivo cierre comité comite de participación comunitario
- Revisión compromisos
- Firma de cierre de participación ciudadana convenio 4357-2023

Scanned with ACE Scanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se pregunto a los miembros del comité de participación ciudadana si existía a la fecha alguna duda, inquietudes o PQRS de la comunidad. A lo que manifestaron que **NO.**

Se indago si existía, alguna duda sobre los valores ejecutados, a lo que manifestaron que **NO.**

Por lo cual se da por cerrado el comité de participación ciudadana, por sus representantes:

1. Libardo Santamaría Transviña C.C. 13.954.926
   Cel.: 3118694210
2. Neila Escamilla Santamaría CC 51.918.274
   Cel.: 3194278846
3. Jesús Quiroga Martinez C.C. 13.951.159
   Cel. 3012758114.

Scanned with ACE Scanner

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Libardo Santamaría	Veedor	J.A.C.	
Leonardo Quitian	Veedor	J A C	
Ver Mayoscalla Santamaria		J.A.C.	
Jesús Quiroga	Martinez	J A C	
Pinyam Prada	Profesional Social	Terra	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with ACE Scanner

ANEXO.
ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.

Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

CONVENIO 4478-2023 VEREDA LA UNIÓN

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003.
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

www.terraingenierosciviles.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITE TECNICO/OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/01/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. Convenio 4478 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LA UNION MUNICIPIO GUAVATA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO

Para firma de CHEQUES PARA PAGOS DE SUMINISTROS INICIALES PARA OBRA, propios del presupuesto general del convenio de la referencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda LA UNION, presentó a la intervetoría cheques para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio.
2. Interventoría realiza revisión de los valores, conceptos y beneficiarios de los cheques presentados.
3. Interventoría procede a la firma de los cheques presentados, conjuntamente con el presidente de la JAC y la Contadora de la JAC

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda LA UNION, presentó a la interventoria cheques para su revisión respectivo visado y diligenciamiento por parte de la interventoria.

1.1 CHEQUE N° 0000068 Cuenta 3-6055-000067-1
VALOR CHEQUE $ 4´330.172
Beneficiario: ARNOLDO MARÍN
CC o NIT: 5.658.860

Concepto 1. PAGO ALQUILER BODEGA OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024
Valor: $ 600.000

Concepto 2. PAGO ALQUILER TRONZADORA DEWALL
Valor: $ 200.000

Concepto 3. PAGO ALQUILER TROMPO CAPACIDAD 1 BULTO POR UN PERIODO DE 36 DÍAS
Valor: $ 2´520.000

Concepto 4. PAGO ALQUILER COMPACTADOR DE PLANCHA POR UN PERIODO DE12 DÍAS
Valor: $ 960.000

Concepto 5. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Valor: $ 50.000

1.2 CHEQUE N° 0000070 Cuenta 3-6055-000067-1
VALOR CHEQUE $ 1´867.000
Beneficiario: YAMID ARDILA MARIN
CC o NIT: 13.617.846

Concepto 1. REEMBOLSO PAGO SUBSIDIO AL DIGNATARIO

Valor: $ 600.000

Concepto 2. REEMBOLSO PAGO DESCARGUE 200 SACOS DE CEMENTO LOS DÍAS 26 DE OCTUBRE Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2024
Valor: $ 150.000

Concepto 3. REEMBOLSO PAGO CARGUE 200 SACOS DE CEMENTO LOS DÍAS 26 DE OCTUBRE Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2024
Valor: $ 150.000

Concepto 4. REEMBOLSO PAGO ALMUERZOS OPERARIOS MAQUINARIA AMARILLA PERIODO DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024
Valor: $ 90.000

Concepto 5. REEMBOLSO PAGO DESAYUNOS OPERARIOS MAQUINARIA AMARILLA PERIODO DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024
Valor: $ 72.000

Concepto 6. REEMBOLSO PAGO SUMINISTRO DE ACPM PARA TROMPO Y RANA
Valor: $ 85.000

Concepto 7. REEMBOLSO PAGO DE TRANSPORTE DE RANA DESDE LA UNIÓN A BARBOSA EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2024
Valor: $ 90.000

Concepto 8. REEMBOLSO PAGO DE PAPELERÍA EN GENERAL
Valor: $ 350.000

Concepto 9. REEMBOLSO PAGO DE SUMINISTRO DE 10 LISTONES DE 5 X 5 CM PARA FORMALETA ALCANTARILLA
Valor: $ 80.000

1.3 CHEQUE N° 0000073 Cuenta 3-6055-000067-1
VALOR CHEQUE $ 1´500.000
Beneficiario: KATHERIN LUENGAS SANCHEZ
CC o NIT: 1.097.332.824

Concepto 1. PAGO TOPOGRAFÍA PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024
Valor: $ 1'500.000

1.4 CHEQUE N° 0000077 Cuenta 3-6055-000067-1
VALOR CHEQUE $ 1´786.800
Beneficiario: YAMID ARDILA MARÍN
CC o NIT: 13.617.846

Concepto 1. REEMBOLSO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEL PROYECTO
Valor: $ 1´786.800

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITE TECNICO/OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/01/2025 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**RESPONSABLES**

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
LEONARDO DUQUE JIMÉNEZ	ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	
YAMID ARDILA	PRESIDENTE JAC	JAC LA UNIÓN	
OSCAR ORLANDO SILVA	VEEDOR JAC	JAC LA UNIÓN	
JEISON LEANDRO CAMACHO	ING RESIDENTE DE OBRA	JAC LA UNIÓN	
JORGE HERNANDO FORERO FORERO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITE TECNICO/OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/01/2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. Convenio 4478 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LA UNION MUNICIPIO GUAVATA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO

Para firma de CHEQUES PARA PAGOS DE SUMINISTROS INICIALES PARA OBRA, propios del presupuesto general del convenio de la referencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda LA UNION, presentó a la intervetoría cheques para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio.
2. Interventoría realiza revisión de los valores, conceptos y beneficiarios de los cheques presentados.
3. Interventoría procede a la firma de los cheques presentados, conjuntamente con el presidente de la JAC y la Contadora de la JAC

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda LA UNION, presentó a la interventoria cheques para su revisión respectivo visado y diligenciamiento por parte de la interventoria.

1.1 CHEQUE N° 0000075 Cuenta 3-6055-000067-1
VALOR CHEQUE $ 750.800,00
Beneficiario: JEISON LEANDRO CAMACHO AVILA
CC o NIT: 1.054.682.134

Concepto 1. REINTEGRO PAGO SEGURIDAD SOCIAL JUNIO - JULIO 2024
Valor: $750.800,00

1.2 CHEQUE N° 0000076 Cuenta 3-6055-000067-1
VALOR CHEQUE $ 360.000,00
Beneficiario: JEFFERSON CAMILO AGUILAR PARRA
CC o NIT: 7.321.156

Concepto 1. PAGO ENSAYOS DE LABORATORIO
Valor: $360.000,00

1.3 CHEQUE N° 0000078 Cuenta 3-6055-000067-1
VALOR CHEQUE $ 2.730.000,00
Beneficiario: JOSE JOAQUIN GERENA
CC o NIT: 19.317.595

Concepto 1. ALQUILER PULIDORA - ALQUILER COMPACTADOR
Valor: $2.730.000,00

FECHA: 16/01/2025 (Día / Mes / Año)

1.4 CHEQUE N° 0000079 Cuenta 3-6055-000067-1
VALOR CHEQUE $ 547.404,00
Beneficiario: YAMID ARDILA MARIN
CC o NIT: 13.617.846

Concepto 1. REEMBOLSO PAGO LIQUIDACION ANDRES FRANCO
Valor: $547.404,00

1.5 CHEQUE N° 0000080 Cuenta 3-6055-000067-1
VALOR CHEQUE $ 625.000,00
Beneficiario: CLARA INES GARCIA MAHECHA
CC o NIT: 41.506.897

Concepto 1. REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL JUNIO - JULIO 2024
Valor: $625.000,00

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LEONARDO DUQUE JIMÉNEZ	ING RESIDENTE DE INTERVENT(	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	
YAMID ARDILA	PRESIDENTE JAC	JAC LA UNIÓN	
OSCAR ORLANDO SILVA	VEEDOR JAC	JAC LA UNIÓN	
JEISON LEANDRO CAMACHO	ING RESIDENTE DE OBRA	JAC LA UNIÓN	
JORGE HERNANDO FORERO FORERO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITE TECNICO/OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/01/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. Convenio 4478 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LA UNION MUNICIPIO GUAVATA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO

Para firma de CHEQUES PARA PAGOS DE SUMINISTROS INICIALES PARA OBRA, propios del presupuesto general del convenio de la referencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda LA UNION, presentó a la intervetoría cheques para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio.
2. Interventoría realiza revisión de los valores, conceptos y beneficiarios de los cheques presentados.
3. Interventoría procede a la firma de los cheques presentados, conjuntamente con el presidente de la JAC y la Contadora de la JAC

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda LA UNION, presentó a la interventoria cheques para su revisión respectivo visado y diligenciamiento por parte de la interventoria.

1.1 CHEQUE N° 0000074 Cuenta 3-6055-000067-1
VALOR CHEQUE $ 302.400,00
Beneficiario: YENY CECILIA RODRIGUEZ VALLE
CC o NIT: 32.763.815

Concepto 1. EXAMENES OCUPACIONALES DE EGRESO
Valor: $302.400,00

1.2 CHEQUE N° 0000081 Cuenta 3-6055-000067-1
VALOR CHEQUE $ 2.389.233,00
Beneficiario: YULI PAOLA CASTAÑEDA RODRIGUEZ
CC o NIT: 52.965.220

Concepto 1. ALMUERZO PARA 100 PERSONAS COMO PARTE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL DEL PAGA
Valor: $2.389.233,00

1.3 CHEQUE N° 0000082 Cuenta 3-6055-000067-1
VALOR CHEQUE $ 2.131.560,00
Beneficiario: MARIA ALEJANDRA ARDILA VIVIESCAS
CC o NIT: 1.099.212.995

Concepto 1. COMPRA 33 SILLAS TIPO BARÚ MARCA RIMAX COMO PARTE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL DEL PAGA
Valor: $2.131.560,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITE TECNICO/OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/01/2025 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LEONARDO DUQUE JIMÉNEZ	ING RESIDENTE DE INTERVENT(	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	
YAMID ARDILA	PRESIDENTE JAC	JAC LA UNIÓN	
OSCAR ORLANDO SILVA	VEEDOR JAC	JAC LA UNIÓN	
JEISON LEANDRO CAMACHO	ING RESIDENTE DE OBRA	JAC LA UNIÓN	
JORGE HERNANDO FORERO FORERO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITE TECNICO/OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/01/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. Convenio 4478 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LA UNION MUNICIPIO GUAVATA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO

Para firma de CHEQUES PARA PAGOS DE SUMINISTROS INICIALES PARA OBRA, propios del presupuesto general del convenio de la referencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda LA UNION, presentó a la intervetoría cheques para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio.
2. Interventoría realiza revisión de los valores, conceptos y beneficiarios de los cheques presentados.
3. Interventoría procede a la firma de los cheques presentados, conjuntamente con el presidente de la JAC y la Contadora de la JAC

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda LA UNION, presentó a la interventoria cheques para su revisión respectivo visado y diligenciamiento por parte de la interventoria.

1.1 CHEQUE N° 0000083 Cuenta 3-6055-000067-1
VALOR CHEQUE $ 58.000,00
Beneficiario: DIAN
CC o NIT: 800.197.268

Concepto 1. RETENCIÓN EN LA FUENTE ENERO 2025
Valor: $58.000,00

1.2 CHEQUE N° 0000084 Cuenta 3-6055-000067-1
VALOR CHEQUE $ 179.999,00
Beneficiario: YULI PAOLA CASTAÑEDA RODRIGUEZ
CC o NIT: 52.965.220

Concepto 1. PLASTICO NEGRO
Valor: $179.999,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITE TECNICO/OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LEONARDO DUQUE JIMÉNEZ	ING RESIDENTE DE INTERVENT(	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	
YAMID ARDILA	PRESIDENTE JAC	JAC LA UNIÓN	
OSCAR ORLANDO SILVA	VEEDOR JAC	JAC LA UNIÓN	
JEISON LEANDRO CAMACHO	ING RESIDENTE DE OBRA	JAC LA UNIÓN	
JORGE HERNANDO FORERO FORERO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CONVENIO 4767-2023 VEREDA POPOA

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2°A, 46003.
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

www.terraingenierosciviles.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITE TECNICO/OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/01/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. Convenio 4767 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL POPOA MUNICIPIO GUAVATA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO

Para firma de CHEQUES PARA PAGOS DE SUMINISTROS INICIALES PARA OBRA, propios del presupuesto general del convenio de la referencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda POPOA, presentó a la intervetoría cheques para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio.
2. Interventoría realiza revisión de los valores, conceptos y beneficiarios de los cheques presentados.
3. Interventoría procede a la firma de los cheques presentados, conjuntamente con el presidente de la JAC y la Contadora de la JAC

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.El organismo de ACCION COMUNAL de l vereda POPOA, presentó a la interventoria cheques para su revisión respectivo visado y dilienciamiento por parte de la interventoria.

1.1 CHEQUE N° 000076 Cuenta 3-6055-000068-9
VALOR CHEQUE $ 1.410.500,00
Beneficiario: ADRIANA GERENA GONZALEZ
CC o NIT: 1.097.332.297

Concepto 1. REEMBOLSO PAPELERIA-ALQUILER TRONZADORA-ALQUILER FLEJADORA-BODEGA-DESAYUNOS Y ALMUERZOS OPERARIO-GALON ACPM-REEMBOLSO PAGO ENERGIA ELECTRICA
Valor: $ 1.410.500,00

1.2 CHEQUE N° 000077 Cuenta 3-6055-000068-9
VALOR CHEQUE $ 2.255.200,00
Beneficiario: ADRIANA GERENA GONZALEZ
CC o NIT: 1.097.332.297

Concepto 1. PAGO SEGURIDAD SOCIAL SALUD ENERO 2025 - PENSION DICIEMBRE 2024.
Valor: $ 2.255.200,00

1.3 CHEQUE N° 000078 Cuenta 3-6055-000068-9
VALOR CHEQUE $ 758.900,00
Beneficiario: VIVIANA PAOLA RODRIGUEZ ARIZA
CC o NIT: 1.101.174.865

Concepto 1. REEMBOLSO PAGO SEGURIDAD SOCIAL JUNIO Y JULIO 2024.
Valor: $ 758.900,00

FECHA	10/01/2025
	(Día / Mes / Año)

1.4 CHEQUE N° 000079 Cuenta 3-6055-000068-9
VALOR CHEQUE $ 1.750.000
Beneficiario: ANA CILIA CRUZ OCHOA
CC o NIT: 28.177.747

Concepto 1. MADERA
Valor: $ 1.750.000,00

1.5 CHEQUE N° 000080 Cuenta 3-6055-000068-9
VALOR CHEQUE $ 754.600,00
Beneficiario: YEIMMY DIANITH GERENA ARDILA
CC o NIT: 28.178.238.

Concepto 1. REEMBOLSO PAGO SEGURIDAD SOCIAL JUNIO Y JULIO 2024.
Valor: $ 754.600,00

1.6 CHEQUE N° 000081 Cuenta 3-6055-000068-9
VALOR CHEQUE $ 1.028.000,00
Beneficiario: JACINTO SIERRA ROA
CC o NIT: 80.055.009

Concepto 1. ALQUILER MEZCLADORA PERIODO DEL 25 NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024.
Valor: $ 1.028.000,00

1.7 CHEQUE N° 000082 Cuenta 3-6055-000068-9
VALOR CHEQUE $ 1.500.000,00
Beneficiario: KATHERIN LUENGAS SANCHEZ
CC o NIT: 1.097.332.824

Concepto 1. 130 METROS DE TOPOGRAFIA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
Valor: $ 1.500.000,00

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITE TECNICO/OPERATIVO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/01/2025
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LEONARDO DUQUE JIMÉNEZ	ING RESIDENTE DE INTERVENT	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	
ADRIANA GERENA	PRESIDENTE JAC POPOA	JAC POPOA	
LUIS ANTONIO ROJAS	VEEDOR JAC POPOA	JAC POPOA	
VIVIANA PAOLA RODRIGUEZ ARIZA	ING RESIDENTE DE OBRA	JAC POPOA	
JORGE HERNANDO FORERO FORERO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITE TECNICO/OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/01/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. Convenio 4767 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL POPOA MUNICIPIO GUAVATA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO

Para firma de CHEQUES PARA PAGOS DE SUMINISTROS INICIALES PARA OBRA, propios del presupuesto general del convenio de la referencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda POPOA, presentó a la intervetoría cheques para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio.
2. Interventoría realiza revisión de los valores, conceptos y beneficiarios de los cheques presentados.
3. Interventoría procede a la firma de los cheques presentados, conjuntamente con el presidente de la JAC y la Contadora de la JAC

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.El organismo de ACCION COMUNAL de l vereda POPOA, presentó a la interventoria cheques para su revisión respectivo visado y dilienciamiento por parte de la interventoria.

1.1 CHEQUE N° 000083 Cuenta 3-6055-000068-9
VALOR CHEQUE $ 345,600,00
Beneficiario: BRAYAN CAMILO SUAREZ PEÑA
CC o NIT: 1.099.205.673

Concepto 1. PAGO ALQUILER DE RETROEXCAVADORA TRES (3) HORAS EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
Valor: $ 345.600,00

1.2 CHEQUE N° 000084 Cuenta 3-6055-000068-9
VALOR CHEQUE $ 720.000,00
Beneficiario: ADRIANA GERENA GONZALEZ
CC o NIT: 1.097.332.297

Concepto 1. PAGO ADELANTADO ALQUILER DE RETROEXCAVADORA POR SEIS (6) HORAS
Valor: $ 720.000,00

1.3 CHEQUE N° 000085 Cuenta 3-6055-000068-9
VALOR CHEQUE $ 228.000,00
Beneficiario: JEFERSON CAMILO AGUILAR PARRA
CC o NIT: 7.321.156

Concepto 1. PAGO ENSAYOS DE LABORATORIO
Valor: $ 228.000,00

FECHA: 16/01/2025 (Día / Mes / Año)

1.4 CHEQUE N° 000086 Cuenta 3-6055-000068-9
VALOR CHEQUE $ 1.200.000
Beneficiario: ADRIANA GERENA GONZLEZ
CC o NIT: 1.097.332.297

Concepto 1. SUBSIDIO DIGNATARIO SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE 2024.
Valor: $ 1.200.000,00

1.5 CHEQUE N° 000087 Cuenta 3-6055-000068-9
VALOR CHEQUE $ 980.000,00
Beneficiario: JOSE JOAQUIN GERENA
CC o NIT: 19.317.595

Concepto 1. ALQUILER PULIDORA
Valor: $ 980.000,00

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
PRESENTAR EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y SOPORTES DEL PAGO REALIZADO	23/01/2025	JAC

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LEONARDO DUQUE JIMÉNEZ	ING RESIDENTE DE INTERVENT	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	
ADRIANA GERENA	PRESIDENTE JAC POPOA	JAC POPOA	
LUIS ANTONIO ROJAS	VEEDOR JAC POPOA	JAC POPOA	
VIVIANA PAOLA RODRIGUEZ ARIZA	ING RESIDENTE DE OBRA	JAC POPOA	
JORGE HERNANDO FORERO FORERO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITE TECNICO/OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/01/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. Convenio 4767 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL POPOA MUNICIPIO GUAVATA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO

Para firma de CHEQUES PARA PAGOS DE SUMINISTROS INICIALES PARA OBRA, propios del presupuesto general del convenio de la referencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda POPOA, presentó a la intervetoría cheques para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio.
2. Interventoría realiza revisión de los valores, conceptos y beneficiarios de los cheques presentados.
3. Interventoría procede a la firma de los cheques presentados, conjuntamente con el presidente de la JAC y la Contadora de la JAC

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.El organismo de ACCION COMUNAL de l vereda POPOA, presentó a la interventoria cheques para su revisión respectivo visado y dilienciamiento por parte de la interventoria.

1.1 CHEQUE N° 000088 Cuenta 3-6055-000068-9
VALOR CHEQUE $ 302.400,00
Beneficiario: YENY CECILIA RODRIGUEZ VALLE
CC o NIT: 32.763.815

Concepto 1. 9 EXÁMENES OCUPACIONALES DE EGRESO
Valor: $ 302.400,00

1.2 CHEQUE N° 000089 Cuenta 3-6055-000068-9
VALOR CHEQUE $ 2.023.526,00
Beneficiario: LUIS OMAR CUADRADO CAMACHO
CC o NIT: 91.011.630

Concepto 1. COMPRA GUADAÑA COMO PARTE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL DEL PAGA
Valor: $ 2.023.526,00

1.3 CHEQUE N° 000090 Cuenta 3-6055-000068-9
VALOR CHEQUE $ 2.500.000,00
Beneficiario: ARNOBI BENAVIDES PACHECO
CC o NIT: 91.015.249

Concepto 1. 80 ALMUERZOS COMO PARTE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL DEL PAGA
Valor: $ 2.500.000,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITE TECNICO/OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/01/2025 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**RESPONSABLES**

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LEONARDO DUQUE JIMÉNEZ	ING RESIDENTE DE INTERVENT	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	
ADRIANA GERENA	PRESIDENTE JAC POPOA	JAC POPOA	
LUIS ANTONIO ROJAS	VEEDOR JAC POPOA	JAC POPOA	
VIVIANA PAOLA RODRIGUEZ ARIZA	ING RESIDENTE DE OBRA	JAC POPOA	
JORGE HERNANDO FORERO FORERO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CONVENIO 3753-2023 VEREDA BERLIN

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003.
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

www.terraingenierosciviles.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ TECNICO / OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/01/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 3753-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BERLIN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO
Para Autorización de PAGOS A PROVEEDORES del convenio de la referencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda Berlín, presentó a la intervetoría la realización de pagos a diferentes proceedores del convenio para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría.
2. Interventoría realiza revisión de los valores, conceptos y beneficiarios de las transferencias a realizar.
3. Interventoría procede a la firma de la Relación de Transferencias a realizar, conjuntamente con el Presdiente de la JAC y la Contadora de la JAC.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda Berlín, presentó a la intervetoría la siguiente relación de pagos a realizar para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio:

Transferencia No.1. Banco: BANCOLOMBIA. Tipo de Cuenta: AHORROS. Numero de Cuenta: 81472545558. Beneficiaro: ISAAC FONTECHA PEÑA. Nit o CC: 901.069.198-5. Valor: $ 39.741,64. Concepto: Compra de elementos de Ferretería para la ejecución del Plan de Inversión Social incluido en el PAGA

Las transferencias se realizarán desde la cuenta Corriente No.705178143 Banco Av Villas a nombre de JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BERLÍN MUNICIPIO LA BELLEZA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ TECNICO / OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/01/2025 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
N/A	N/A	N/A

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN N/A (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
CARLOS NORBEY CLAVIJO VELAZCO	PRESIDENTE J.A.C.	JAC BERLÍN	
FERLEIN RODRÍGUEZ ZÁRATE	REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD	JAC BERLÍN	
JORGE FANDIÑO GOMEZ	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	JAC BERLÍN	
JORGE HERNANDO FORERO FORERO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS CIVILES	
LEONARDO DUQUE JIMÉNEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS CIVILES	
MARÍA MAGDALENA ALBINO	CONTADORA	JAC BERLÍN	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ TECNICO / OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/01/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 3753-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BERLIN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO
Para Autorización de PAGOS A PROVEEDORES del convenio de la referencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda Berlín, presentó a la intervetoría la realización de pagos a diferentes proceedores del convenio para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría.
2. Interventoría realiza revisión de los valores, conceptos y beneficiarios de las transferencias a realizar.
3. Interventoría procede a la firma de la Relación de Transferencias a realizar, conjuntamente con el Presdiente de la JAC y la Contadora de la JAC.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda Berlín, presentó a la intervetoría la siguiente relación de pagos a realizar para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio:

Transferencia No.1. Banco: BANCO DE LA REPÚBLICA. Tipo de Cuenta: CORRIENTE. Numero de Cuenta: 61011094. Beneficiaro: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS. Nit o CC: CÓDIGO PORTAFOLIO: 270 CODIGO TRANSACCIÓN: SEBRA 137. Valor: $ 17.586,43. Concepto: Devolución Rendimientos Financieros periodo de noviembre de 2023 a diciembre de 2024

Las transferencias se realizarán desde la cuenta Corriente No.705178143 Banco Av Villas a nombre de JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BERLÍN MUNICIPIO LA BELLEZA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ TECNICO / OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	16/01/2025 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
N/A	N/A	N/A

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN N/A
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
CARLOS NORBEY CLAVIJO VELAZCO	PRESIDENTE J.A.C.	JAC BERLÍN	
FERLEIN RODRÍGUEZ ZÁRATE	REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD	JAC BERLÍN	
JORGE FANDIÑO GOMEZ	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	JAC BERLÍN	
JORGE HERNANDO FORERO FORERO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS CIVILES	
LEONARDO DUQUE JIMÉNEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS CIVILES	
MARÍA MAGDALENA ALBINO	CONTADORA	JAC BERLÍN	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CONVENIO 3951-2023 VEREDA CACHIPAYAL

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003.
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

www.terraingenierosciviles.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ TECNICO / OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/01/2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4175-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CACHIPAYAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO
Para firma de CHEQUES PARA PAGOS A PROVEEDORES del convenio de la referencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda CACHIPAYAL, presentó a la intervetoría cheques de pagos a realizar, para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio.
2. Interventoría realiza revisión de los valores, conceptos y beneficiarios de los cheques presentados.
3. Interventoría procede a la firma de los cheques presentados, conjuntamente con la Presdiente de la JAC y la Contadora de la JAC

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda CACHIPAYAL, presentó a la intervetoría los siguientes cheques para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio:

1.1. Cheque No.000051 Cuenta 36058000128-5
VALOR CHEQUE $ 1´988.338
Concepto : PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL INCLUIDO EN EL PAGA Y REEMBOLSO DE RETENCIÓN PAGADA CON EL CHEQUE N° 39 Y EL EGRESO N° 36 EN EL COMITÉ OPERATIVO DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024
Beneficiario: ISAAC FONTECHA PEÑA
CC O NIT. 5.665..248-1

1.2. Cheque No.000052 Cuenta 36058000128-5
VALOR CHEQUE $ 169.000,00
Concepto REEMBOLSO PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE CORRESPONENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024
Beneficiario: JUAN PABLO OVALLE PINEDA
CC O NIT. 5.771.781

FECHA: 16/01/2025 (Día / Mes / Año)

1.3. Cheque No.000053 Cuenta 36058000128-5
VALOR CHEQUE $ 2'728.428,00
Concepto 1: REEMBOLSO PAGO ALMUERZO COMUNITARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL INCLUIDO EN EL PAGA
Beneficiario: JUAN PABLO OVALLE PINEDA
CC O NIT. 5.771.781

1.4. Cheque No.000054 Cuenta 36058000128-5
VALOR CHEQUE $ 4'298.750,00
Concepto 1: SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR (45,25 M3)
Beneficiario: ASOCIACIÓN DE MINEROS AGROINDUSTRIALES
CC O NIT. 901.378.352

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN N/A (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
JUAN PABLO OVALLE PINEDA	PRESIDENTE J.A.C.	JAC CACHIPAYAL	
SAMUEL LEONARDO CLAVIJO	REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD (VEEDURÍA)	JAC CACHIPAYAL	
JORGE EDUARDO HURTADO PEDRAZA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	JAC CACHIPAYAL	
JORGE HERNANDO FORERO FORERO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	
LEONARDO DUQUE JIMÉNEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	
GUILLERMO EVERTO CLAVIJO VELAZCO	REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD (VEEDURÍA)	JAC CACHIPAYAL	
DIANA MILENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	CONTADORA	JAC CACHIPAYAL	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CONVENIO 4490-2023 VEREDA ORGANOS

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2°A, 46003.
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ TECNICO / OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 16/01/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4490-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ORGANOS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO
Para firma de CHEQUES PARA PAGOS A PROVEEDORES del convenio de la referencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda ORGANOS, presentó a la intervetoría cheques de pago a proveedores para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio.
2. Interventoría realiza revisión de los valores, conceptos y beneficiarios de los cheques presentados.
3. Interventoría procede a la firma de los cheques presentados, conjuntamente con la Presdiente de la JAC y la Contadora de la JAC

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda ORGANOS, presentó a la intervetoría los siguientes cheques de pago a proveedores para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio:

1.1. Cheque No.000088 Cuenta 3-6057-000144-4
VALOR CHEQUE $ 1´809.000,00
Beneficiario: FERRETERÍA TODOHIERROS MERFC S.A.S.
CC O NIT. 901.670.760-1
Concepto 1: COMPRA DE MANGUERA PARA LA COMUNIDAD DE ORGANOS DE ACUERDO AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL VIABILIZADO PARA EL CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS

NOTA: SE ANULA ESTE CHEQUE PORQUE EL PROVEEDOR NO ACEPTA EL PAGO EN CHEQUE, POR LO TANTO SE PROCEDERÁ A CAMBIAR EL PROVEEDOR.

1.2. Cheque No.000091 Cuenta 3-6057-000144-4
VALOR CHEQUE $ 1´771.000,00
Beneficiario: EDGAR ARBEY GONZALEZ
CC O NIT. 79.517.277-0
Concepto 1: ADQUISICIÓN DE MANGUERA PARA LA COMUNIDAD DE ORGANOS DE ACUERDO AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL VIABILIZADO PARA EL CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS

NOTA: ESTE CHEQUE REEMPLAZA EL CHEQUE N° 000088 ANULADO PORQUE EL PROVEEDOR NO ACEPTA EL PAGO EN CHEQUE.

FECHA 16/01/2025
(Día / Mes / Año)

1.3. Cheque No.000092 Cuenta 3-6057-000144-4
VALOR CHEQUE $ 38.000,00
Beneficiario: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)
CC O NIT. 800.197.268
Concepto 1: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE DE 2025

1.3. Cheque No.000093 Cuenta 3-6057-000144-4
VALOR CHEQUE $ 38.000,00
Beneficiario: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)
CC O NIT. 800.197.268
Concepto 1: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE DE 2025

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
N/A	N/A	N/A

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN N/A
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LEIDY JOHANA CARANTON CARANTON	PRESIDENTE J.A.C.	JAC ORGANOS	
JOHANA MILENA MORENO	REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD	JAC ORGANOS	
CRISTIAN IVAN MARIN QUINTIAN	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	JAC ORGANOS	
JORGE HERNANDO FORERO FORERO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	
LEONARDO DUQUE JIMÉNEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CONVENIO 4357-2023 VEREDA TUBAVITA

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003.
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ TECNICO / OPERATIVO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/2

FECHA: 10/01/2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 25
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4357-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TUBAVITA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO
Para firma de CHEQUES PARA PAGOS A PROVEEDORES del convenio de la referencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda Tubavita, presentó a la Intervetoría cheques de pago a proveedores para respectivo visado y diligenciamiento por parte de la Intervetoría del convenio.

2. Interventoría realiza revisión de los valores, conceptos y beneficiarios de los cheques presentados.

3. Interventoría procede a la firma de los cheques presentados, conjuntamente con la Presidente de la JAC y la Contadora de la JAC.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1,01

No. CHEQUE:	**000087**
RUBRO:	Costos Directos de Obra
DOCUMENTO DE PAGO:	Comprobante Egreso CC-13-95
FACTURA O C. COBRO:	Documento Soporte DS28
CONCEPTO:	Alquiler de compactador (Canguro) y compra de insumos. Reembolso.
BENEFICIARIO:	GLADYS CHACON HERNANDEZ
NIT:	63434698
CONTACTO:	Vereda Tubavita (Vélez Santander); Cel. 3138856879
IVA:	$ 0.00
RETENCIÓN:	$ 0.00
RETEICA:	$ 0.00
VALOR CHEQUE:	$ 200.000,00
VALOR TOTAL:	$ 200.000.00
OBSERVACIÓN:	Se realiza reembolso de este recurso a la JAC, presentó soportes de las compras realizadas.

1,02

No. CHEQUE:	**000088**
RUBRO:	Costos Directos de Obra
DOCUMENTO DE PAGO:	COMPROBANTE DE EGRESO CC-13-96
FACTURA O C. COBRO:	DOC SOPORTE DS27, Cuenta de Cobro 8 enero
CONCEPTO:	Alquiler de Vibrocompactador 3 horas x $150.000/hr
BENEFICIARIO:	YERALDIN PARDO HERREÑO
NIT:	13951565-7
CONTACTO:	TEL 7563495, Vereda El Limon Hotel Campestre Los Arrayanes Vélez-Santander
IVA:	$ 0.00
RETENCIÓN:	$ 18.000.00
RETEICA:	$ 900.00
VALOR CHEQUE:	**$ 431.100,00**
VALOR TOTAL:	$ 450.000.00
OBSERVACIÓN:	JAC debe presentar documentos de la maquinaria,.

1,03

RUBRO:	Costos Directos de Obra y Gastos Admin.

nomina del 24 DIC al 31 dic

NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	NUMERO DE CEDULA	NETO PAGADO	COMP EGRESO	RUBRO	CHEQUE No.
RAMIRO DIAZ QUIROGA	Maestro de Construccion	13.955.127	$773.925,00	CC-13-97	COSTOS DIRECTOS	000089

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ TECNICO / OPERATIVO	CÓDIGO	MEPLAN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2/2

FECHA: 10/01/2025 (Día / Mes / Año)

EDILBERTO CUBIDES	Ayudante de construccion	13.956.198	$473.925,00	CC-13-98	COSTOS DIRECTOS	000091
LUIS ARIEL DIAZ ARIZA	Ayudante Experimentado de construccion	13.956.736	$575.325,00	CC-13-99	GASTOS ADMINIS	000090
Total Gastos Administrativos			$773.925,00			
Total Costos Directos			$1.049.250,00			

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	n/A
N/A	N/A	N/A

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: N/A (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
GLADYS CHACON HERNANDEZ	PRESIDENTE J.A.C.	VEREDA TUBAVITA	
LIBARDO SANTA MARÍA	REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD (VEEDURÍA)	VEREDA TUBAVITA	
MARIA CAMILA DIAZ	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	VEREDA TUBAVITA	
JORGE HERNANDO FORERO FORERO	INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TERRA INGENIEROS	
JAIME CHACÓN DURÁN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ TECNICO / OPERATIVO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/01/2026 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4357-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TUBAVITA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO
Para firma de CHEQUES PARA PAGOS A PROVEEDORES del convenio de la referencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda Tubavita, presentó a la intervetoría cheques de pago a proveedores para respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio
2. Interventoria realiza revisión de los valores, conceptos y beneficiarios de los cheques presentados.
3. Interventoria procede a la firma de los cheques presentados, conjuntamente con la Presdiente de la JAC y la Contadora de la JAC.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1,01

No. CHEQUE:	000094
RUBRO:	Costos Directos de Obra
DOCUMENTO DE PAGO:	Comprobante Egreso CC-13-102
FACTURA O C. COBRO:	Factura Electrónica FE1437
CONCEPTO:	Compra de Recebo 14 m3 para rellenos.
BENEFICIARIO:	CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA
NIT:	900058158
CONTACTO:	calmineral.co@gmail.com KILOMETRO 14+500 VÍA BARBOSA-TUNJA VEREDA GONZALEZ
IVA:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 0,00
RETEICA:	$ 0,00
VALOR CHEQUE:	**$ 833.000,00**
VALOR TOTAL:	$ 833.000,00
OBSERVACIÓN:	Material para realización de rellenos detrás de bordillos y Alcantarilla.

1,02

No. CHEQUE:	000086
RUBRO:	Costos Directos de Obra
DOCUMENTO DE PAGO:	Comprobante Egreso CC-13-94
FACTURA O C. COBRO:	Factura FECA-112 (07 enero 2025)
CONCEPTO:	Compra de : 115 varillas 3/8, 7m3 Arena, 7 m3 Triturado, 70 Bultos Cemento
BENEFICIARIO:	ARIZA DUARTE CRISTIAN GERARDO
NIT:	1101755510
CONTACTO:	CR 6 5 A 69 cristianariza7380@gmail.com 3114190113
IVA:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 145.221,40
RETEICA:	$ 0,00
VALOR CHEQUE:	**$ 6.767.317,24**
VALOR TOTAL:	$ 6.912.538,64
OBSERVACIÓN:	JAC adjunta certificación del proveedor de materiales Pétreos ambientalmente autorizado CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA S.A.S acreditando la procedencia del material

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ TECNICO / OPERATIVO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/01/2025 (Día / Mes / Año)

1.03

No. CHEQUE:	000093
RUBRO:	Costos Directos de Obra
DOCUMENTO DE PAGO:	Comprobante Egreso CC-13-103
FACTURA O C. COBRO:	Cuenta de Cobro Junta Tubavita
CONCEPTO:	Pago de Retenciones realizadas mes de Enero 2025
BENEFICIARIO:	GLADYS CHACON HERNANDEZ
NIT:	63434698
CONTACTO:	Vereda Tubavita (Velez Santander), Cel. 3138886679
IVA:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 0,00
RETEICA:	$ 0,00
VALOR CHEQUE:	**$ 243.000,00**
VALOR TOTAL:	$ 243.000,00
OBSERVACIÓN:	Pago adelanteado para cancelación de este rubro, la JAC presentará el soporte del pago realizado.

1.04

No. CHEQUE:	000092
RUBRO:	Costos Directos de Obra
DOCUMENTO DE PAGO:	Comprobante Egreso CC-13-101
FACTURA O C. COBRO:	FECA-116
CONCEPTO:	Transporte Recebo (14m3)
BENEFICIARIO:	ARIZA DUARTE CRISTIAN GERARDO
NIT:	1101755510
CONTACTO:	CR 6 5 A 69 cristianariza7380@gmail.com
IVA:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 80.000,00
RETEICA:	$ 0,00
VALOR CHEQUE:	**$ 720.000,00**
VALOR TOTAL:	$ 800.000,00
OBSERVACIÓN:	N/A

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	n/A
N/A	N/A	N/A

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: N/A (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
GLADYS CHACON HERNANDEZ	PRESIDENTE J.A.C	VEREDA TUBAVITA	
UBARDO SANTA MARÍA	REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD (VEEDURÍA)	VEREDA TUBAVITA	
MARIA CAMILA DIAZ	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	VEREDA TUBAVITA	
JORGE HERNANDO FORERO FORERO	INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TERRA INGENIEROS	
JAIME CHACÓN DURÁN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

CONVENIO 4424-2023 VEREDA TEBAIDA

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2°A, 46003.
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ TECNICO / OPERATIVO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/2

FECHA: 1/01/2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ---------
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4424-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TEBAIDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO
Para firma de CHEQUES PARA PAGOS a proveedores del convenio de la referencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda TEBAIDA, presentó a la intervetoría los pagos a realizar, para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio.

2. Interventoría realiza revisión de los valores, conceptos y beneficiarios de los cheques presentados.

3. Interventoría procede a la firma de los cheques presentados, conjuntamente con la Presdiente de la JAC y el Contadora de la JAC.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. La JUNTA DE ACCION COMUNAL de la vereda TEBAIDA, presentó a la intervetoría los siguientes pagos a realizar para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio:

1.1. RUBRO: NOMINA DEL 19 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NOMINA DEL 19 DE DICIEMBRE AL 31 DIC 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO	BASICO	DIAS LAB	SALARIO	LIQUIDACIÓN	PAGADO	CHEQUE No.	Documento Egreso	RUBRO
JUAN CARLOS CORTÉS SERRANO	$ 2.158.000.00	12	$ 858.944.00	$ 944.758.00	$ 1.803.702.00	Cheque No 000053	00053	GASTOS ADMINISTRATIVOS
OSMA PINZÓN JUAN BAUTISTA	$ 2.093.000.00	12	$ 836.864.00	$ 919.981.00	$ 1.756.845.00	Cheque No 000054	00055	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
DIAZ MATEUS LUIS ANTONIO	$ 1.300.000.00	12	$ 543.200.00	$ 560.200.00	$ 1.103.400.00	Cheque No 000055	00056	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
HERNANDEZ MATEUS VLADIMIR	$ 1.300.000.00	12	$ 543.200.00	$ 550.123.00	$ 1.093.323.00	Cheque No 000056	00057	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
TORRES FIGUEROA ABELARDO	$ 1.300.000.00	12	$ 543.200.00	$ 580.364.00	$ 1.123.564.00	Cheque No 000057	00058	COSTOS DIRECTOS DE OBRA

Powered by CamScanner

SERRANO SERRANO JOSE DE LA CRUZ	$ 1 300 000 00	12	$ 543 200 00	$ 550 123 00	$ 1 093 323 00	Cheque No 000058	00059	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
INGRI TATIANA DIAZ FONTECHA	$ 1 300 000 00	20	$ 905 333 00	$ 199 096 00	$ 1 104 429 00	Cheque No 000059	00060	COSTOS DIRECTOS DE OBRA

1,02

RUBRO:	GASTOS ADMINISTRATIVOS
DOCUMENTO DE PAGO:	C EGRESO 0061
FACTURA O C. COBRO:	Cuenta de Cobro No.02
No. CHEQUE:	000060
CONCEPTO:	SALDO ESTUDIOS Y DISEÑOS
BENEFICIARIO:	JEFFERSON CAMILO AGUILAR PARRA
NIT:	7321156
CONTACTO:	3118508140
IVA:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 480.000,00
RETEICA:	$ 0,00
VALOR CHEQUE:	**$ 1.920.000,00**
VALOR TOTAL:	$ 2.400.000,00
OBSERVACIÓN:	N/A

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
N/A	N/A	N/A

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN N/A (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
NESTOR ILDEFONSO FONTECHA SANDOVAL	PRESIDENTE J.A.C.	JAC TEBAIDA	
ANA CECILIA MATEUS FONTECHA	REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD	JAC TEBAIDA	
MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	JAC TEBAIDA	
JORGE HERNANDO FORERO FORERO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	
JAIME CHACÓN DURÁN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	
YANETH GONZÁLEZ FONTECHA	CONTADORA JAC	JAC TEBAIDA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ TECNICO / OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/01/2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4424-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TEBAIDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO
Para firma de CHEQUES PARA PAGOS a proveedores del convenio de la referencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda TEBAIDA, presentó a la intervetoría los pagos a realizar, para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio.

2. Interventoría realiza revisión de los valores, conceptos y beneficiarios de los cheques presentados.

3. Interventoría procede a la firma de los cheques presentados, conjuntamente con la Presdiente de la JAC y el Contadora de la JAC.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. La JUNTA DE ACCION COMUNAL de la vereda TEBAIDA, presentó a la intervetoría los siguientes pagos a realizar para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio:

1.1.

RUBRO:	NOMINA DEL 07 de enero al 31 de enero de 2025

NÓMINA DEL 7 DE ENERO AL 31 DE ENERO (FINAL)

NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	NÓMINA	LIQUIDACIÓN (7-31ene)	PAGO TOTAL	CHEQUE No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	RUBRO
OSMA PINZÓN JUAN BAUTISTA	1.101.755.772	$ 1.703.728,00	$ 377.492,00	$ 2.081.220,00	65	65	GASTOS ADMINISTRATIVOS
DIAZ MATEUS LUIS ANTONIO	1.101.755.409	$ 1.207.296,00	$ 264.716,00	$ 1.472.012,00	64	66	COSTOS DIRECTOS
TORRES FIGUEROA ABELARDO	5.689.273	$ 1.207.296,00	$ 264.716,00	$ 1.472.012,00	66	67	COSTOS DIRECTOS
SERRANO SERRANO JOSE DE LA CR	91.011.682	$ 1.207.296,00	$ 264.716,00	$ 1.472.012,00	67	68	COSTOS DIRECTOS
INGRI TATIANA DIAZ FONTECHA	1.101.754.164	$ 1.207.296,00	$ 264.716,00	$ 1.472.012,00	68	69	COSTOS DIRECTOS

1,02

RUBRO:	Costos Directos
DOCUMENTO DE PAGO:	COMPROBANTE EGRESO No.000062
FACTURA O C. COBRO:	Formulario 3510619710451, Comprobante Pago DBKiJ7V4EQQM (retefuente), Reporte Retención 810 No. De Pago 785 (Reteica)

	No. CHEQUE:	000061
	CONCEPTO:	REEMBOLSO RETENCIONES MES DE DICIEMBRE 2024
	BENEFICIARIO:	NESTOR IDELFONSO FONTECHA SANDOVAL
	NIT:	13955098-7
	CONTACTO:	3132881905 - Vereda Tebaida Vélez Santander
	IVA:	$ 0,00
	RETENCIÓN:	$ 0,00
	RETEICA:	$ 0,00
	VALOR CHEQUE:	**$ 1.986.000,00**
	VALOR TOTAL:	$ 1.986.000,00
	OBSERVACIÓN:	N/A

1,03	RUBRO:	Costos Directos
	DOCUMENTO DE PAGO:	COMPROBANTE EGRESO No.000063
	FACTURA O C. COBRO:	Cuenta de Cobro 014-24, Planilla (Seg Social) 8634621102 y Actualización Póliza 3001993-0, 1014745-0.
	No. CHEQUE:	000062
	CONCEPTO:	REEMBOLSO PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO DEL 2025 Y ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL
	BENEFICIARIO:	NESTOR IDELFONSO FONTECHA SANDOVAL
	NIT:	13955098-7
	CONTACTO:	3132881905 - Vereda Tebaida Vélez Santander
	IVA:	$ 0,00
	RETENCIÓN:	$ 0,00
	RETEICA:	$ 0,00
	VALOR CHEQUE:	**$ 1.894.150,00**
	VALOR TOTAL:	$ 1.894.150,00
	OBSERVACIÓN:	Pago anticipado para la seguridad social. La JAC asegura que con este valor girado queda totalmente cancelada la planilla adjunta Planilla (Seg Social) 8634621102 Presentará el soporte del pago realizado.

1,04	RUBRO:	Costos Directos
	DOCUMENTO DE PAGO:	COMPROBANTE EGRESO No.000064
	FACTURA O C. COBRO:	Cuenta de Cobro 015-24, Cuenta de Cobro 016-24
	No. CHEQUE:	000063
	CONCEPTO:	PAPELERÍA DICIEMBRE 2024 ($300.000) - SUBSIDIO DE TRANSPORTE PARA EL DIGNATARIO ENERO 2025 ($400.000).
	BENEFICIARIO:	NESTOR IDELFONSO FONTECHA SANDOVAL
	NIT:	13955098-7
	CONTACTO:	3132881905 - Vereda Tebaida Vélez Santander
	IVA:	$ 0,00
	RETENCIÓN:	$ 0,00
	RETEICA:	$ 0,00
	VALOR CHEQUE:	**$ 700.000,00**
	VALOR TOTAL:	$ 700.000,00
	OBSERVACIÓN:	N/A

1,05	RUBRO:	GASTOS ADMINISTRATIVOS
	DOCUMENTO DE PAGO:	COMPROBANTE EGRESO No.000070
	FACTURA O C. COBRO:	JACT17
	No. CHEQUE:	000069

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ TECNICO / OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/01/2025
(Día / Mes / Año)

CONCEPTO:	PAGO HONORARIOS CONTADORA MES DE NOVIEMBRE DEL 2024
BENEFICIARIO:	YANETH GONZÁLEZ FONTECHA
NIT:	63.436.292
CONTACTO:	CARRERA 4 # 5 -19 - 3214425642
IVA:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 0,00
RETEICA:	$ 0,00
VALOR CHEQUE:	**$ 1.960.000,00**
VALOR TOTAL:	$ 1.960.000,00
OBSERVACIÓN:	N/A

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
N/A	N/A	N/A

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN N/A
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
NESTOR ILDEFONSO FONTECHA SANDOVAL	PRESIDENTE J.A.C.	JAC TEBAIDA	
ANA CECILIA MATEUS FONTECHA	REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD	JAC TEBAIDA	
MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	JAC TEBAIDA	
JORGE HERNANDO FORERO FORERO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	
JAIME CHACÓN DURÁN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	
YANETH GONZÁLEZ FONTECHA	CONTADORA JAC	JAC TEBAIDA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CONVENIO 4367-2023 VEREDA GAITAL

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2°A, 46003.
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

www.terraingenierosciviles.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ TECNICO / OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/01/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4367-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL GAITAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO

Para firma de CHEQUES PARA PAGOS A PROVEEDORES, propios del convenio de la referencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda El Gaital, presentó a la intervetoría la realización de pagos con cheques a proveedores del convenio para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio.

2. Interventoría realiza revisión de los valores, conceptos y beneficiarios de los cheques presentados.

3. Interventoría procede a la firma de los cheques presentados, conjuntamente con la Presdiente de la JAC y el Contador de la JAC.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda El Gaital, presentó a la intervetoría los siguientes cheques de pago a proveedores para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio:

1,01

No. CHEQUE:	**000045**
DOCUMENTO DE PAGO:	Comprobante Egreso CC-13-43
FACTURA O C. COBRO:	PENDIENTE
CONCEPTO:	Adquisición de material Petreo correspondiente a 14 m3 de Rajón y 63 m3 de de Triturado para la Obra
RUBRO:	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
BENEFICIARIO:	CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SAS
NIT:	900414198
CONTACTO:	km 14+500 Vía Barbosa - Tunja Vereda Tierra de Gonzalez
IVA:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 150.500,00
RETEICA:	$ 0,00
VALOR CHEQUE:	**$ 7.013.300,00**
VALOR TOTAL:	$ 7.163.800,00
OBSERVACIÓN:	N/a

1,02

No. CHEQUE:	**000046**
DOCUMENTO DE PAGO:	Comprobante Egreso cc-13-44
FACTURA O C. COBRO:	PENDIENTE
CONCEPTO:	Ensayos de Laboratorio (Densidades de campo método Cono de arena) para La Obra.
RUBRO:	GASTOS ADMINISTRATIVOS
BENEFICIARIO:	FWF GEOINGENIERÍA SAS
NIT:	900730123
CONTACTO:	Carrera 7 No. 5C-43 LOCAL 1
IVA:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 26.400,00
RETEICA:	$ 0,00
VALOR CHEQUE:	**$ 259.200,00**
VALOR TOTAL:	$ 285.600,00
OBSERVACIÓN:	SE REALIZA PAGO ADELANTADO, QUEDA COMO COMPROMISO POR PARTE DE LA JAC PRESENTAR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1,03

No. CHEQUE:	**000047**
DOCUMENTO DE PAGO:	Comprobante egreso cc-13-45
FACTURA O C. COBRO:	N° 2
CONCEPTO:	Honorarios Ing. Residente periodo del 07 de diciembre de 2024 al 06 de enero de 2025
RUBRO:	GASTOS ADMINISTRATIVOS
BENEFICIARIO:	LAURA ALEJANDRA PINZON SILVA
NIT:	1101756910
CONTACTO:	321250027
IVA:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 0,00
RETEICA:	$ 14.000,00
VALOR CHEQUE:	**$ 3.486.000,00**
VALOR TOTAL:	$ 3.500.000,00
OBSERVACIÓN:	N/a

1,04

No. CHEQUE:	**000048**
DOCUMENTO DE PAGO:	Comprobante egreso cc-13-46
FACTURA O C. COBRO:	
CONCEPTO:	Reembolso por compra de material de Material Petreo correspondiente a 14 m3 de Triturado para La Obra
RUBRO:	Costos Directos
BENEFICIARIO:	JAIRO GONZALEZ PINZON
NIT:	79671968
CONTACTO:	3185827702
IVA:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 0,00
RETEICA:	$ 0,00
VALOR CHEQUE:	**$ 1.332.800,00**
VALOR TOTAL:	$ 1.332.800,00
OBSERVACIÓN:	N/a

1,05

No. CHEQUE:	**000049**
DOCUMENTO DE PAGO:	Comprobante egreso cc-13-48
FACTURA O C. COBRO:	
CONCEPTO:	Reembolso por pago de Seguridad Social del personal de la Obra.
RUBRO:	GASTOS ADMINISTRATIVOS
BENEFICIARIO:	JAIRO GONZALEZ PINZON
NIT:	79671968
CONTACTO:	3185827702
IVA:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 0,00
RETEICA:	$ 0,00
VALOR CHEQUE:	**$ 1.383.100,00**
VALOR TOTAL:	$ 1.383.100,00
OBSERVACIÓN:	N/a

1,06

No. CHEQUE:	**000050**
DOCUMENTO DE PAGO:	Comprobante egreso cc-13-49
FACTURA O C. COBRO:	Formulkario N° 3510618177151
CONCEPTO:	Pago de Retención en La Fuente mes de diciembre de 2024
RUBRO:	GASTOS ADMINISTRATIVOS
BENEFICIARIO:	DIAN
NIT:	800197268
CONTACTO:	www.dian.gov.co
IVA:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 0,00
RETEICA:	$ 0,00
VALOR CHEQUE:	**$ 1.040.606,00**
VALOR TOTAL:	$ 1.040.606,00
OBSERVACIÓN:	N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ TECNICO / OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/01/2025 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Queda como compromiso presentar Factura de Compra de material Petreo correspondiente a 14 m3 de Rajón y 63 m3 de de Triturado para la Obra	13/01/2025	JAC GAITAL
Queda como compromiso por parte de la JAC presentar factura o documento equivalente de los Ensayos de Laboratorio	13/01/2025	JAC GAITAL

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN N/A (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
JAIRO GONZALEZ PINZON	PRESIDENTE J.A.C.	JAC GAITAL	
JOSE MANUEL GONZÁLEZ	REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD (VEEDURÍA)	VEREDA GAITAL	
JORGE HERNANDO FORERO FORERO	IINGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS	
LEONARDO DUQUE JIMÉNEZ	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS	
JUAN HARVEY RAMIREZ CAMACHO	CONTADOR	JAC GAITAL	
LAURA ALEJANDRA PINZÓN SILVA	ING. RESIDENTE	JAC GAITAL	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ TECNICO / OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 28/01/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4367-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL GAITAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO

Para firma de CHEQUES PARA PAGOS A PROVEEDORES, propios del convenio de la referencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda El Gaital, presentó a la intervetoría la realización de pagos con cheques a proveedores del convenio para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio.

2. Interventoría realiza revisión de los valores, conceptos y beneficiarios de los cheques presentados.

3. Interventoría procede a la firma de los cheques presentados, conjuntamente con la Presdiente de la JAC y el Contador de la JAC.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El organismo de ACCION COMUNAL de la vereda El Gaital, presentó a la intervetoría los siguientes cheques de pago a proveedores para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio:

1,01

No. CHEQUE:	**000051**
DOCUMENTO DE PAGO:	Comprobante Egreso CC-13-55
FACTURA O C. COBRO:	JACG16
CONCEPTO:	Transporte de triturado 1/2" (64m3) y Rajón (14m3) desde La Cantera hasta el Colegio Gaital
RUBRO:	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
BENEFICIARIO:	FERNANDO GONZÁLEZ MENDOZA
NIT:	13957723-1
CONTACTO:	Carrera 6 5A-42
IVA:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 32.500,00
RETEICA:	$ 16.250,00
VALOR CHEQUE:	**$ 3.201.250,00**
VALOR TOTAL:	$ 3.250.000,00
OBSERVACIÓN:	Se aprueba este proveedor de transportes ya que el precio del servicio es favorable.

1,02

No. CHEQUE:	**000052**
DOCUMENTO DE PAGO:	Comprobante Egreso CC-13-60
FACTURA O C. COBRO:	JACG14

	CONCEPTO:	SOBREACARREO DE MATERIALES PÉTREOS (COLEGIO - OBRA) 63m3 Triturado + 14 m3 Rajón = 77m3
	RUBRO:	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
	BENEFICIARIO:	EDUYN RENÉ DÍAZ DÍAZ
	NIT:	13957135
	CONTACTO:	Carrera 6
	IVA:	$ 0,00
	RETENCIÓN:	$ 12.000,00
	RETEICA:	$ 2.400,00
	VALOR CHEQUE:	**$ 1.185.600,00**
	VALOR TOTAL:	$ 1.200.000,00
	OBSERVACIÓN:	N/a

1,03	**No. CHEQUE:**	**000057**
	DOCUMENTO DE PAGO:	COMPROBANTE EGRESO CC-13-50
	FACTURA O C. COBRO:	No. Retención 873 No, Pago 847
	CONCEPTO:	Retención Industria y Comercio (Reembolso
	RUBRO:	Costos Directos
	BENEFICIARIO:	Jairo González Pinzón
	NIT:	79671968
	CONTACTO:	3136802147
	IVA:	$ 0,00
	RETENCIÓN:	$ 0,00
	RETEICA:	$ 0,00
	VALOR CHEQUE:	**$ 132.289,58**
	VALOR TOTAL:	$ 132.289,58
	OBSERVACIÓN:	N/a

1,04	**No. CHEQUE:**	**000056**
	DOCUMENTO DE PAGO:	comprobante egreso CC-13-59
	FACTURA O C. COBRO:	JACG15
	CONCEPTO:	Alquiler de Mezcladora (DESDE EL 13 ENERO AL 12 FEBRERO 2025)
	RUBRO:	Costos Directos de Obra
	BENEFICIARIO:	JOSE MANUEL GONZÁLEZ MENDOZA
	NIT:	1101757399
	CONTACTO:	BRR LOS CEREZOS CA 55
	IVA:	$ 0,00
	RETENCIÓN:	$ 57.000,00
	RETEICA:	$ 0,00
	VALOR CHEQUE:	**$ 1.573.000,00**
	VALOR TOTAL:	$ 1.630.000,00
	OBSERVACIÓN:	El valor incluye el combustible MES DE ENERO de la maquina. Y una Polea para reparar la maquina.

1,05	**No. CHEQUE:**	**000055**
	DOCUMENTO DE PAGO:	comprobante egreso CC-13-56
	FACTURA O C. COBRO:	Cuenta de Cobro
	CONCEPTO:	Saldo Estudios y Diseños del Convenio
	RUBRO:	Gastos Administrativos
	BENEFICIARIO:	JEFFERSON CAMILO AGUILAR PARRA
	NIT:	800220791-3
	CONTACTO:	juancap_d@hotmail.com; Calle 19 No.9-28 Chiquinquirá
	IVA:	$ 0,00
	RETENCIÓN:	$ 0,00
	RETEICA:	$ 0,00
	VALOR CHEQUE:	**$ 2.400.000,00**
	VALOR TOTAL:	$ 2.400.000,00
	OBSERVACIÓN:	JAC debe presentar facturación del proveedor.

1,06	**No. CHEQUE:**	**000054**
	DOCUMENTO DE PAGO:	comprobante egreso CC-13-57

FACTURA O C. COBRO:	Cuenta de Cobro 24 enero 2025
CONCEPTO:	Alquile de retro excavadora para cargue de material de sobreacarreo (78m3)
RUBRO:	Costos Directos de Obra
BENEFICIARIO:	WILSON SÁNCHEZ DÍAZ
NIT:	13955008
CONTACTO:	Carrera 8 No. 6-23 Vélez Santander
IVA:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 0,00
RETEICA:	$ 0,00
VALOR CHEQUE:	**$ 1.200.000,00**
VALOR TOTAL:	$ 1.200.000,00
OBSERVACIÓN:	La Jac certifica que el valor corresponde al cargue de 78 m3 de material.

1,07

No. CHEQUE:	**000053**
DOCUMENTO DE PAGO:	comprobante egreso CC-13-54
FACTURA O C. COBRO:	Cuenta de Cobro 25 enero 2025
CONCEPTO:	TRANSPORTE DE 14 M3 DE TRITURADO DESDE LA CANTERA DE MONIQUIRÁ HASTA EL COLEGIO GAITAL (REALIZADO EN DICIEMBRE 2024)
RUBRO:	Costos Directos de Obra
BENEFICIARIO:	ARIZA DUARTE CRISTIAN GERARDO
NIT:	1101755510
CONTACTO:	CR 6 5 A 69 cristianariza7380@gmail.com
IVA:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 14.000,00
RETEICA:	$ 7.000,00
VALOR CHEQUE:	**$ 1.379.000,00**
VALOR TOTAL:	$ 1.400.000,00
OBSERVACIÓN:	N/A

1,08

No. CHEQUE:	**000059**
DOCUMENTO DE PAGO:	comprobante egreso CC-13-53
FACTURA O C. COBRO:	Referencia de pago 117818301
CONCEPTO:	Actualización pólizas del convenio (Pago anticipado) a la JAC.
RUBRO:	Gastos Adminitrativos
BENEFICIARIO:	Jairo González Pinzón
NIT:	79671968
CONTACTO:	3136802147
IVA:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 0,00
RETEICA:	$ 0,00
VALOR CHEQUE:	**$ 893.542,00**
VALOR TOTAL:	$ 893.542,00
OBSERVACIÓN:	N/A

1,09

No. CHEQUE:	**000058**
DOCUMENTO DE PAGO:	Comprobante egreso CC-13-58
FACTURA O C. COBRO:	Cuenta de Cobro (JAC Gaital)
CONCEPTO:	Saldo por Compra de materiales Pétreos (Adquisición de material Petreo correspondiente a 14 m3 de Rajón y 63 m3 de de Triturado para la Obra) realizado el 10 enero 2025.
RUBRO:	Gastos Adminitrativos
BENEFICIARIO:	CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SAS
NIT:	900414198
CONTACTO:	Km 14+500 Vía Barbosa - Tunja Vereda Tierra de Gonzalez
IVA:	$ 0,00

FECHA 28/01/2025
(Día / Mes / Año)

RETENCIÓN:	$ 19.250,00
RETEICA:	$ 0,00
VALOR CHEQUE:	**$ 897.050,00**
VALOR TOTAL:	$ 916.300,00
OBSERVACIÓN:	Al realizar el pago el 10 de enero no se tuvo en cuenta el aumento de precios por el cambio de año 2025.

1,10 **CONCEPTO** **NOMINA DEL 13 ENERO AL 27 DE ENERO 2025**

Nombre del Empleado	Cedula	Fecha de ingreso	Saldo a Pagar	Cheque #	Comprobante Egreso
JUAN ANGEL GAMBOA HERREÑO	1.101.755.923	13-01-2025	1.269.010	000060	cc-13-61
RODRIGO PIZON FONTECHA	13.957.042	13-01-2025	754.810	000061	cc-13-62
JOSE ALEJANDRO GONZALEZ SEDANO	1.101.752.579	13-01-2025	654.169	000062	cc-13-63
MISAEL QUIROGA DIAZ	13.954.281	13-01-2025	704.489	000063	cc-13-64
JOHN JAIRO RODRIGUE	91.136.267	24-01-2025	150.962	000064	cc-13-65

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
DOCUMENTOS DE LOS VEHÍCULOS DE LOS PROVEEDORES DE TRANSPORTE	31/01/2025	JAC GAITAL

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN N/A
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
JAIRO GONZALEZ PINZON	PRESIDENTE J.A.C.	JAC GAITAL	
JOSE MANUEL GONZÁLEZ	REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD (VEEDURÍA)	VEREDA GAITAL	
JORGE HERNANDO FORERO FORERO	IINGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS	
JAIME CHACÓN DURÁN	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS	
JUAN HARVEY RAMIREZ CAMACHO	CONTADOR	JAC GAITAL	
LAURA ALEJANDRA PINZÓN SILVA	ING. RESIDENTE	JAC GAITAL	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CONVENIO 4565-2023 VEREDA LA PALMERA

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003.
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ TECNICO / OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/3

FECHA: 10/01/2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4565-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PALMERA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO
Para firma de CHEQUES PARA REALIZACIÓN PAGOS propios del convenio de la referencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. La JUNTA DE ACCION COMUNAL de la vereda LA PALMERA, presentó a la intervetoría los pagos a realizar, para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio.
2. Interventoría realiza revisión de los valores, conceptos y beneficiarios de los cheques presentados.
3. Interventoría procede a la firma de los cheques presentados, conjuntamente con el Presdiente de la JAC y la Contadora de la JAC

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. La JUNTA DE ACCION COMUNAL de la vereda LA PALMERA, presentó a la intervetoría los siguientes pagos para su respectivo visado y diligenciamiento:

1,01

RUBRO:	Gastos Administrativos
DOCUMENTO DE PAGO:	Comprobante de Egreso CC-13-107
FACTURA O C. COBRO:	Factura Electrónica FE-35
No. CHEQUE:	**000075**
CONCEPTO:	Saldo Estudios y Diseños
BENEFICIARIO:	JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA
NIT:	7321156
CONTACTO:	CL 19 9 28 Chiquinquirá; Cel. 311 8508140
IVA:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 172.000,00
RETEICA:	$ 0,00
VALOR CHEQUE:	**$ 1.978.000,00**
VALOR TOTAL:	$ 2.150.000,00
OBSERVACIÓN:	JAC Anexa Aprobación de los estudios y diseños.

1,02

RUBRO:	Costos Directos de Obra
DOCUMENTO DE PAGO:	COMPROBANTES DE EGRESO CC-13-105
FACTURA O C. COBRO:	FACTURA ELECTRÓNICA NÚMERO QBH3121

Powered by CamScanner

No. CHEQUE:	**000110**
CONCEPTO:	Compra de Cemento (55 Bultos)
BENEFICIARIO:	HECTOR QUINTANILLA BALAGUERA
NIT:	NIT: 13887576-4
CONTACTO:	3118349879 - 3105592925 - ferreteriaelmaestro7@homail.com
IVA:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 38.130,25
RETEICA:	$ 15.252,00
VALOR CHEQUE:	**$ 1.761.617,75**
VALOR TOTAL:	$ 1.815.000,00
OBSERVACIÓN:	N/A

1,03

RUBRO:	Gastos administrativos
DOCUMENTO DE PAGO:	COMPROBANTES DE EGRESO CC-13-104
FACTURA O C. COBRO:	Referencia de pago 22256253 Referencia de pago 22256252
No. CHEQUE:	**000111**
CONCEPTO:	Actualización Pólizas
BENEFICIARIO:	Carlos Augusto Santamaría
NIT:	1101753207
CONTACTO:	300 3629884; Vereda La Palmera (Vélez-Santander)
IVA:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 0,00
RETEICA:	$ 0,00
VALOR CHEQUE:	**$ 80.265,00**
VALOR TOTAL:	$ 80.265,00
OBSERVACIÓN:	Reembolso para realizaión de actualización pólizas, JAC presento los recibos de la transacción.

1,04

RUBRO:	Costos directos de Obra
DOCUMENTO DE PAGO:	COMPROBANTE EGRESO CC-13-106
FACTURA O C. COBRO:	(Pendiente)
No. CHEQUE:	**000112**
CONCEPTO:	Compra Arena de Río (1 viaje) 7m3
BENEFICIARIO:	ARIZA DUARTE CRISTIAN GERARDO
NIT:	1101755510
CONTACTO:	3114190113 - cristianariza7380@gmail.com
IVA:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 0,00
RETEICA:	$ 0,00
VALOR CHEQUE:	**$ 1.049.997,00**
VALOR TOTAL:	$ 1.049.997,00
OBSERVACIÓN:	La JAC PRESENTARÁ la respectiva factura una vez se realice el pago al proveedor

1,05

RUBRO:	Costos Directos de obra
DOCUMENTO DE PAGO:	COMPROBANTE EGRESO CC-13-108
FACTURA O C. COBRO:	Formulario (Pendiente)
No. CHEQUE:	**000113**
CONCEPTO:	Reembolso Pago de retneciones y Reteica (Enero 2025)
BENEFICIARIO:	Carlos Augusto Santamaría
NIT:	1101753207
CONTACTO:	300 3629884; Vereda La Palmera (Vélez-
IVA:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 0,00

Powered by CamScanner

FECHA: 10/01/2025 (Día / Mes / Año)

RETEICA:	$ 0,00
VALOR CHEQUE:	**$ 225.382,00**
VALOR TOTAL:	$ 225.382,00
OBSERVACIÓN:	En este momento la página no genera formularios, el valor se calcula y la JAC presentará el respectivo pago una vez se realice.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Presentar Factura compra de Arena (1 Viaje)	13/01/2025	JAC LA PALMERA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN N/A (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
CARLOS AUGUSTO ARIZA	PRESIDENTE J.A.C.	VEREDA LA PALMERA	
MARISOL MENESES PÉREZ	REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD	VEREDA LA PALMERA	
JESUS ALBERTO DIAZ	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	VEREDA LA PALMERA	
JORGE HERNANDO FORERO FORERO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS	
JAIME CHACÓN DURÁN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS	
LAURA CAROLINA ARIZA NIEVES	CONTADORA JAC LA PALMERA	VEREDA LA PALMERA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ TECNICO / OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/01/2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4565-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PALMERA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO
Para firma de CHEQUES PARA REALIZACIÓN PAGOS propios del convenio de la referencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. La JUNTA DE ACCION COMUNAL de la vereda LA PALMERA, presentó a la intervetoría los pagos a realizar, para su respectivo visado y diligenciamiento por parte de la intervetoría del convenio.
2. Interventoría realiza revisión de los valores, conceptos y beneficiarios de los cheques presentados.
3. Interventoría procede a la firma de los cheques presentados, conjuntamente con el Presdiente de la JAC y la Contadora de la JAC

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. La JUNTA DE ACCION COMUNAL de la vereda LA PALMERA, presentó a la intervetoría los siguientes pagos para su respectivo visado y diligenciamiento:

1,01	RUBRO:	Costos Directos de Obra
	DOCUMENTO DE PAGO:	Comprobante de Egreso CC-13-109
	FACTURA O C. COBRO:	Cuenta de Cobro
	No. CHEQUE:	**0000116**
	CONCEPTO:	Desembolso para pago de nómina de dos (2) Trabajadores.
	BENEFICIARIO:	Carlos Augusto Santamaría
	NIT:	1101753207
	CONTACTO:	300 3629884; Vereda La Palmera (Vélez-
	IVA:	$ 0,00
	RETENCIÓN:	$ 0,00
	RETEICA:	$ 0,00
	VALOR CHEQUE:	**$ 441.600,00**
	VALOR TOTAL:	$ 441.600,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ TECNICO / OPERATIVO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/01/2025 (Día / Mes / Año)

OBSERVACIÓN:	Se anulan cheques 000031 y 000032 ya que no fue posible contactar a los beneficiarios de estos pagos. Neiver Adley Suárez Díaz y Javier Andrés Fontecha Santamaría. El dinero de este pago será consignado a una cuenta especial de trámites de tipo jurídico.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Comprobante de la Consignación en la cuenta especial	31/01/2025	JAC LA PALMERA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN N/A (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
CARLOS AUGUSTO ARIZA	PRESIDENTE J.A.C.	VEREDA LA PALMERA	
MARISOL MENESES PÉREZ	REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD	VEREDA LA PALMERA	
JESUS ALBERTO DIAZ	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	VEREDA LA PALMERA	
JORGE HERNANDO FORERO FORERO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS	
JAIME CHACÓN DURÁN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	TERRA INGENIEROS	
LAURA CAROLINA ARIZA NIEVES	CONTADORA JAC LA PALMERA	VEREDA LA PALMERA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO.
IDEAM

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.

Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (04/02/2025 17:36)

Nombre estacion:	BOLIVAR [24010640]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Pluviométrica
Latitud:	5.9861111110	**Longitud:**	-73.77083333	**Elevación:**	2165
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS	**Area Operativa:**	Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca	**Departamento:**	Santander
Municipio:	Bolivar	**Fecha instalacíon:**	15/03/1974 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	01/01/2025 00:00-31/01/2025 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencional)	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación	INTENSIDAD
2025-01-01 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-02 00:00	8,2	Preliminar	MODERADAS
2025-01-03 00:00	2,8	Preliminar	MODERADAS
2025-01-04 00:00	1,5	Preliminar	MODERADAS
2025-01-05 00:00	3,7	Preliminar	MODERADAS
2025-01-06 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-07 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-08 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-09 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-11 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-12 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-13 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-14 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-15 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-16 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-17 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-18 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-19 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-20 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-21 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-22 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-23 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-24 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-25 00:00	8,5	Preliminar	MODERADAS
2025-01-26 00:00	4,2	Preliminar	MODERADAS
2025-01-27 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-28 00:00	0,2	Preliminar	MODERADAS
2025-01-29 00:00	4,5	Preliminar	MODERADAS
2025-01-30 00:00	1,3	Preliminar	MODERADAS
2025-01-31 00:00	0	Preliminar	SECO

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (30/01/2025 21:28)

Nombre estacion:	GUAVATA [24010820]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Pluviométrica
Latitud:	5.9613888890	**Longitud:**	-73.7025	**Elevación:**	218
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA M	**Area Operativa:**	Area Operativa 08 - Santande	**Departamento:**	Santander
Municipio:	Guavatá	**Fecha instalacíon:**	15/08/1980 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	01/01/2025 00:00-30/01/2025 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencic	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación	INTENSIDAD
2025-01-01 00:00	0,4	Preliminar	MODERADAS
2025-01-02 00:00	4	Preliminar	MODERADAS
2025-01-03 00:00	0,9	Preliminar	MODERADAS
2025-01-04 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-05 00:00	0,5	Preliminar	MODERADAS
2025-01-06 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-07 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-08 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-09 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-11 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-12 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-13 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-14 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-15 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-16 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-17 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-18 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-19 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-20 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-21 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-22 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-23 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-24 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-25 00:00	2,5	Preliminar	MODERADAS
2025-01-26 00:00	12	Preliminar	MODERADAS
2025-01-27 00:00	9,6	Preliminar	MODERADAS
2025-01-28 00:00	1,2	Preliminar	MODERADAS
2025-01-29 00:00	2,9	Preliminar	MODERADAS

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (04/02/2025 17:24)

Nombre estacion:	SUCRE [24010670]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Pluviométrica
Latitud:	5.9197222220	**Longitud:**	-73.79638889	**Elevación:**	2270
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	**Area Operativa:**	Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca	**Departamento:**	Santander
Municipio:	Sucre	**Fecha instalacíon:**	15/02/1974 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	01/01/2025 00:00-31/01/2025 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencional)	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación	INTENSIDAD
2025-01-01 00:00	1,5	Preliminar	MODERADAS
2025-01-02 00:00	16	Preliminar	FUERTES
2025-01-03 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-04 00:00	32	Preliminar	MUY FUERTES
2025-01-05 00:00	5	Preliminar	MODERADAS
2025-01-06 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-07 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-08 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-09 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-10 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-11 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-12 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-13 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-14 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-15 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-16 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-17 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-18 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-19 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-20 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-21 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-22 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-23 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-24 00:00	5	Preliminar	MODERADAS
2025-01-25 00:00	10,5	Preliminar	MODERADAS
2025-01-26 00:00	20	Preliminar	FUERTES
2025-01-27 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-28 00:00	5	Preliminar	MODERADAS
2025-01-29 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-30 00:00	5	Preliminar	MODERADAS
2025-01-31 00:00	0	Preliminar	SECO

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (04/02/2025 17:52)

Nombre estacion:	JESUS MARIA [24010210]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Pluviométrica
Latitud:	5.8733333330	**Longitud:**	-73.78166667	**Elevación:**	1920
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	**Area Operativa:**	Area Operativa 08 - Santanderes-Arauca	**Departamento:**	Santander
Municipio:	Jesús María	**Fecha instalacíon:**	15/03/1958 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	01/01/2025 00:00-31/01/2025 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencional)	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación	INTENSIDAD
2025-01-01 00:00	4,9	Preliminar	MODERADAS
2025-01-02 00:00	11	Preliminar	MODERADAS
2025-01-03 00:00	1,1	Preliminar	MODERADAS
2025-01-04 00:00	27,5	Preliminar	FUERTES
2025-01-05 00:00	7,2	Preliminar	MODERADAS
2025-01-06 00:00	11,3	Preliminar	MODERADAS
2025-01-07 00:00	12,4	Preliminar	MODERADAS
2025-01-08 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-09 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-10 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-11 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-12 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-13 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-14 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-15 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-16 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-17 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-18 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-19 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-20 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-21 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-22 00:00	0	Preliminar	SECO
2025-01-23 00:00	1,1	Preliminar	MODERADAS
2025-01-24 00:00	4	Preliminar	MODERADAS
2025-01-25 00:00	6,3	Preliminar	MODERADAS
2025-01-26 00:00	26,8	Preliminar	FUERTES
2025-01-27 00:00	11,9	Preliminar	MODERADAS
2025-01-28 00:00	16,2	Preliminar	FUERTES
2025-01-29 00:00	23,3	Preliminar	FUERTES
2025-01-31 00:00	6,9	Preliminar	MODERADAS

ANEXO.

BITÁCORAS DE OBRA

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.

Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

LIBRO DE BITÁCORA

CONVENIO 4424 DE 2023

VEREDA
TEBAIDA

MUNICIPIO
VÉLEZ-SANTANDER

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TEBAIDA

NESTOR ILDEFONSO FONTECHA SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL (CC .13955098)

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
Miguel Ángel Masmela Zapata (Ingeniero Residente de Obra)
TP 68202165983 STD

INTERVENTORÍA: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (MP 25202-61517 CND)

JAIME CHACÓN DURÁN
INGENIERO RESIDENTE (MP 682021-12213 STD)

INICIO DE OBRAS: 21 / OCT / 2024

Lunes 30/Dic/2024

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 1 Oficial, 3 Ayudantes

Equipo: 1 Mezcladora

Clima: Nublado

Actividades Obra:

- Se realiza replanteo manual en Sub base para los cimientos
- Se continúa realización de Corte, figurado y armado de acero en Varilla N° 3/8" para en Cole de la alcantarilla.
- Se realiza encofrado para encole de Alcantarilla.

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Martes 31/12/2024

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 1 Oficial, 3 ayudantes

Equipo: 1 Mezcladora

Clima:

Actividades

- Continua Corte Suministro e instalación de Acero de Refuerzo 3/8" para encole de Alcantarilla.
- Hoy se trabajó hasta 1/2 día.

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA

Residente de Obra

Residente Interventoría

Período del 01/01/2025 al 06/01/2025

- Durante este período no se realizaron actividades de Obra.

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Martes 07/01/2024
Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 4 Ayudantes
Equipo. 1 Mezcladora
Clima: Nublado
Actividades:
- Se realiza Corte, figurado y armado de Acero refuerzo 3/8" para huellas
- Se realiza encofrado para huellas

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
Residente Obra

Residente Interventoría

Miercoles 08/01/2024
Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 1 Oficial, 3 Ayudantes
Equipo: 1 Mezcladora
Clima: Nublado
Actividades
- Se realiza Sobreacarreo de materiales en Carretilla, desde la planta hasta la Obra.
- Se realiza encofrado y acero de refuerzo para huellas.

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
Residente Obra

Residente Interventoría

Jueves 09/01/2024
Personal en Obra: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 4 Ayudantes
Equipo: 1 Mezcladora
Clima: Soleado
Actividades Obra:
- Hoy se realiza fundida de Riostras en Concreto 3000 psi en el Sector PR00+004 al 00+65

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
Ing. Residente de Obra

Ing. Residente Interventoría

Powered by CamScanner

Viernes 10/01/2025

Personal en Obra: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 4 Ayudantes
Equipo: 1 Mezcladora
Clima: Soleado
Actividades de Obra:
- Se realiza fundida de Postes en Concreto 3000psi sector del PR00+40 al PR00+65

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA

Ing. Residente de Obra | Ing. Residente de Interventoría

Sábado 11/01/2025

Personal en Obra: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 4 Ayudantes
Equipo: 1 Mezcladora
Estado Clima: Soleado.
Actividades de Obra.
- Hoy se realiza encofrado para Cunetas y piedra pegada en el Sector PR0+040 al PR0+070
- Se realiza Hidratación del Concreto.

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA

Ing. Residente de Obra | Ing. Residente de Interventoría

Lunes 13/01/2025

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 4 Ayudantes
Equipo: 1 Mezcladora
Clima: Soleado
Actividades Obra:
- Se realiza fundida de Cunetas en Concreto de 3000 psi reforzado margen izquierda y derecha Sector PR0+40 al PR0+65
- Se realiza fundida de Concreto piedra Pegada, en el Sector PR00+40 al PR00+50

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA

Ing. Residente Obra | Ing. Residente Interventoría

Powered by CamScanner

Martes 14/01/2025

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 4 Ayudantes

Equipo: 1 Mezcladora.

Clima: Soleado

Actividades en Obra

- Se realiza replanteo y Excavación manual para Riostras
- Se realiza acopio de Material granular desde la Florida se transporta en la moreta hasta el Sitio de Obra.
- Hoy Se realiza Visita técnica por parte de Interventoría.

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Miércoles 15/01/2025

Personal: 1 Maestro, 4 Ayudantes, 1 Residente Ing.

Equipo: 1 Mezcladora.

Clima: Soleado.

Actividades:

- Se realiza replanteo y Excavación manual para riostras
- Continua Acopio de material granular, transporte desde la Florida hasta el Sitio de la Obra.

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA

Ing. Residente Obra

Ing. Residente Interventoría

Jueves 16/01/2025

Personal: 1 Maestro, 4 Ayudantes, 1 Ing. Residente.

Equipo: 1 Mezcladora

Clima: Soleado

Actividades Obra:

- Continúa replanteo y excavación manual en la Sobbase para las riostras de la plataheella.
- Continúa acopio de material granular, transporte desde La Florida hasta Sitio de Obra
- Se realiza instalación de Acero N°3 para riostras huellas, Cuneta.
- Se realiza encofrado para huellas

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA

Powered by CamScanner

Viernes 17/01/2025
Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro
Equipo: 1 Mezcladora.
Clima: Soleado
Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 4 Ayudantes
Actividades:
- Se realiza fundida de Huellas en Concreto 3000 psi Sector PR: 00+60 al PR 0+080

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA

Ing. Residente Obra | Ing. Residente Interventoría

Sábado 18/01/2025
Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 4 Ayudantes
Equipo: 1 Mezcladora
Clima: Soleado
Actividades:
- Continua fundida de huellas en Concreto 3000 psi Sector PR 0+80 al PR 0+98

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA

Ing. Residente Obra | Ing. Residente Interventoría

Lunes 20/01/2025
Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 4 Ayudantes
Equipos: 1 Mezcladora
Clima: Soleado
Actividades:
- Continúa figurado y Armado de hierro #3 Margen Izquierda y Margen derecha para Cunetas Sector PR 0+60 al PR 0+98
- Continua encofrado para Cunetas y Vigas Riostras margen derecha y margen Izquierda PR 0+060 al PR 0+98

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA

Ing. Residente Obra | Ing. Residente Interventoría

Powered by CamScanner

Martes 21/01/2025

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 4 Ayudantes

Equipos: 1 Mezcladora.

Clima: Soleado

Actividades:

- Se realiza encofrado para Cunetas y Muros Riostras Cunetas margen derecha e Izquierda Sector PR 0+60 al PR 0+98

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA

Ing. Residente Obra

Ing. Residente Interventoría

Miercoles 22/01/2025

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 4 Ayudantes.

Equipos: 1 Mezcladora.

Clima: Soleado.

Actividades:

- Se continua armado y fraguado de hierro N°3 margen Izquierda y derecha de Cunetas sector PR0+60 al PR 0+98
- Continúa con encofrado para Cuneta y Muros margen derecha PR+60 al PR 0+98

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA

Ing. Residente Obra

Ing. Residente Interventoría

Jueves 23/01/2025

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 4 Ayudantes

Equipos: 1 Mezcladora

Clima: Soleado

Actividades:

- Continua Fraguado y Armado de hierro N°3 margen Izquierda y derecha Sector PR0+60 al PR 0+98.
- Continua encofrado para Cunetas y Muros Riostras.
- Se realiza fundida de Riostras en Concreto 3000 psi PR0+60 al 0+98

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA

Ing. Residente Obra

Ing. Residente Interventoría

Powered by CamScanner

Viernes 24/01/2025

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 4 Ayudantes

Equipos: 1 Mezcladora.

Clima: Soleado.

Actividades:

- Se realizo fundida de Cunetas Margen derecha y Margen Izquierda en Concreto 3000 psi Sector PR 0+60 al PR 0+98.

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA

Ing. Residente Obra

Ing. Residente Interventoria

Sábado 25/01/2025

- El dia de hoy no se realizaron actividades en Obra

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA

Ing Residente Obra

Ing. Residente Interventoria

Lunes 27/01/2025

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 4 Ayudantes

Equipo: 1 Mezcladora.

Clima: Soleado

Actividades:

- Se realizo encofrado para bordillos margen derecha y Margen Izquierda y fundida con Concreto 3000psi Sector PR 0+00 al PR 0+030.

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA

Ing. Residente Obra

Ing. Residente Interventoria

Powered by CamScanner

Marks 28/01/2025

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 4 Ayudantes

Equipos: 1 Mezcladora.

Clima: Soleado.

Actividades:

- Se Continúa Con el encofrado para bordillos margen derecha y margen izquierda y fundida en Concreto 3000 psi Sector PR 0+30 al PR 0+60.

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA

Ing. Residente Obra

Ing. Residente Interventoría

Miercoles 29/01/2025

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 4 Ayudantes

Equipos: 1 Mezcladora.

Clima: Soleado

Actividades:

- Se Continúa Con el encofrado y fundida para bordillos margen derecha e Izquierda. en Concreto 3000 psi Sector PR 0+50 al PR 0+80.

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA

Ing. Residente Obra

Ing. Residente Interventoría

Jueves 30/01/2025

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 4 Ayudantes

Equipos: 1 Mezcladora.

Clima: Soleado

Actividades.

- Continua en Cofrado y fundida de bordillos en Concreto 3000 psi, Margen Izquierdo y Derecho, Sector PR 0+50 al PR 0+70

MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA

Ing. Residente Obra

Ing. Residente Interventoría

Powered by CamScanner

LIBRO DE BITÁCORA

CONVENIO 4367 DE 2023

VEREDA
GAITAL

MUNICIPIO
VÉLEZ-SANTANDER

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL GAITAL

JAIRO GONZALEZ PINZON
REPRESENTANTE LEGAL (CC .79.671.968)

Laura Pinzon (Ingeniero Residente de Obra)
TP 25202-422699 CND

INTERVENTORÍA: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (MP 25202-61517 CND)

JAIME CHACÓN DURÁN
INGENIERO RESIDENTE (MP 682021-12213 STD)

INICIO DE OBRAS: 21/OCT/2024

Lunes 23/12/2025

Personal en Obra: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 3 Ayudantes

Equipos en Obra: Herramientas para Corte y figurado de Acero.

Clima: Seco:

Actividades

- Se realiza Corte y figurado de Acero de refuerzo, plepes para Riostras y Armado de Riostras.
- Se acopia material y se realiza adecuación de la Zona

Ing. Residente Obra

Ing. Residente Interventoría

Martes 24/12/2025

Personal en Obra: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 3 Ayudantes

Equipos en Obra: Herramientas para Corte y figurado de Acero de Refuerzo

Clima: Seco

Actividades

- Se realiza Corte y Figurado de Acero de refuerzo, armado Completo de Riostras.
- Se realiza acopio de Materiales en Sector la glorieta y en Obra.

Ing. Residente Obra

Ing. Residente Interventoría

Período del 25/12/2024 al 12/01/2025

- Durante este período no se registraron actividades en Obra.

Residente de Obra

Ing. Residente Interventoría

Powered by CamScanner

Lunes 13/01/2025

Personal en Obra: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 3 Ayudantes
Equipos: Herramienta Menor.
Clima. Seco
Actividades Obra:
- Hoy se realiza formaleta en madera para huellas en Concreto
- Se recibe en Obra materiales (Cemento) y material de Cantera, Piedra rajon en sector Colegio Gaitul.

Ing. Residente Obra | Ing. Residente Interventoría

Martes 14/01/2025

Personal en Obra: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 3 Ayudantes
Equipos: Herramienta Menor.
Clima: Seco
Actividades en Obra:
- Hoy Se realiza arreglo de la Via de Acceso de forma manual
- Se recibe materiales en Obra
- Hoy Interventoría realiza Inspección de Obra y toma de densidades de Campo en Sub base granular

Ing. Residente de Obra | Ing. Residente Interventoría

Miercoles 15/01/2025

Personal en Obra: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 3 Ayudantes
Equipos: Herramienta menor.
Clima: Soleado
Actividades Obra:
- Continua acopio de materiales en Obra (Material Pétreo) arena y grava.
- Se realiza acopio de piedra rajón en Sitio de Obra.
- Se realiza arreglo de puntos críticos en la Vía.

Ing. Residente de Obra | Ing Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Jueves 16/01/2025

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 3 ayudantes

Equipos: Herramienta menor.

Clima: Soleado

Actividades Obra:

- Continua realización de Acopio de materiales pétreos, los trabajadores realizan Cargue de material en Sacos

Ing. Residente Obra

Ing. Residente Interventoría

Viernes 17/01/2025

Personal: 1 Ing Residente, 1 Maestro, 3 Ayudantes

Equipos: Herramienta menor

Clima: Soleado

Actividades Obra:

- Se realiza acopio de materiales granulares en el sitio de las Obras.

Ing. Residente Obra

Ing. Residente Interventoría

Sábado 18/01/2025

(P)

- El día de Hoy no se realizaron actividades en Obra.

Ing. Residente Obra

Ing. Residente Interventoría

Powered by CamScanner

Lunes 20/01/2025
Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 3 Ayudantes
Equipo: 1 Mezcladora
Clima: Soleado
Actividades Obra:
- Se realiza replanteo para instalación de Encofrados de Piedra Pegada Sector PR 0+80 al PR 0+110
- Se instalan encofrados en madera PR+080 al PR 0+110

Ing. Residente Obra | Ing. Residente Interventoría

Martes 21/01/2025
Personal: 1 Maestro, 1 Ing. Residente, 3 Ayudantes.
Equipo: 1 Mezcladora
Clima. Soleado
Actividades:
- Hoy se realiza fundida de Piedra pegada Concreto 2000 psi Sector PR 0+095.

Ing. Residente Obra | Ing Residente Interventoría

Miercoles 22/01/2025
Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 3 Ayudantes
Equipo: 1 Mezcladora
Clima: Soleado
Actividades:
- Se continúa Con la fundida de Piedra Pegada con Concreto 2000 psi Sector PR 0+095 en adelante, centro y Sobre anchos.

Ing. Residente Obra | Ing. Residente Interventoría

Jueves 23/01/2025

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 3 Ayudantes.
Equipos: 1 Mezcladora.
Clima: Soleado
Actividades:
- Se realiza encofrado para piedra pegada, Margen Izquierda Margen derecha Sector PR 0+095 hacia el PR 0+075
- Se realiza fundida de Piedra pegada con concreto 2000psi Sector PR 0+075 – PR 0+095, Centro y Sobreanchos

Ing. Residente Obra | Ing. Residente Interventoría

Viernes 24/01/2025

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 3 Ayudantes.
Equipos: 1 Mezcladora
Clima: Soleado
Actividades:
- Continuación de Encofrado para piedra pegada Margen Izquierda Margen Derecha del PR 0+065 al PR 0+95
- Continúa fundida de Piedra Pegada en Concreto 2000psi Sector PR 0+65 al PR 0+95 Sobreanchos Izq. y Derecha

Ing. Residente Obra | Ing. Residente Interventoría

Sabado 25/01/2025

Personal: 1 Ing Residente, 1 Maestro, 3 ayudantes
Equipos: 1 Mezcladora
Clima: Soleado
Actividades:
- Se realiza desencofrado de la fundida del día anterior Sector Ko+65 al Ko+95.
- Se realiza armado de formaleta para huellas en Concreto 3000psi Sector Ko+75 al PR 0+95.

Ing. Residente de Obra | Ing. Residente Interventoría

Lunes 27/01/2025
Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 4 Ayudantes.
Equipos: 1 Mezcladora.
Clima: Soleado
Actividades:
- Se realiza fundida de Huellas en Concreto 3000 psi Sector PR 0+75 al PR 0+45, Izquierda y lumbrico Huella Derecha.

Ing Residente Obra | Ing. Residente Interventoría

Martes 28/01/2025
Personal: 1 Ing Residente, 1 Maestro, 4 Ayudantes
Equipos: 1 Mezcladora
Clima: Soleado.
Actividades:
- Se continúa con fundida de huellas en Concreto 3000 psi reforzado Sector PR 0+50 al PR 0+65, Huella Izquierda y derecha

Ing. Residente Obra | Ing. Residente Interventoría

Miercoles 29/01/2025
Personal: 1 Ing. Residente, 1 Maestro, 4 Ayudantes
Equipo: 1 Mezcladora.
Clima: Soleado
Actividades:
- Se realiza encofrado y fundida de Pecho pegado con Concreto de 2000 psi Sector PR 0+35 al PR 0+50 margen Izquierda y Derecha.

Ing Residente Obra | Ing. Residente Interventoría

ANEXO.
ENSAYOS DE LABORATORIO

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.

Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

ENSAYOS REALIZADOS
CONVENIOS

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO 3000 PSI

El presente documento contiene el diseño de mezcla de concreto para una resistencia esperada de 3000 psi

Elaborado por: FWF GEOINGENIERÍA S.A.S.
Dirigido a: E&C CONSTRUCCIONES SAS
2021

1 DISEÑO MEZCLA DE CONCRETO HIDRAULICO

PROYECTO: UT placa huella la mesa-el hatillo

INFORMACIÓN GENERAL

Resistencia a la Compresión requerida : 3000 Psi. (210 Kg/cm^2)

Asentamiento recomendado : (7.62cm)
Promedio aire atrapado en 1.8 %

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

AGREGADO GRUESO: Material granular tipo grava con forma angular, redondeada de color gris visos blancos y de contextura rugosa. TM nominal 1".

AGREGADOS DE DISEÑO	GRAVA TM 1"
Densidad Bulk (Kg/m^3)	2692
Porcentaje de absorción (%)	1,11
Masa Unitaria Suelta MUS (Kg/m^3)	1372

AGREGADO FINO: Arena de rio lavada forma redondeada de color gris visos negros, presencia cuarzo.

AGREGADOS DE DISEÑO	ARENA GRIS
Densidad Bulk (Kg/m^3)	2555
Porcentaje de absorción (%)	1,77
Masa Unitaria Suelta MUS (Kg/m^3)	1590
Módulo de finura (MF)	3,26

CEMENTO: "ARGOS"


CEMENTO	TIPO I
Densidad (Kg/m^3)	3100.00
Masa Unitaria Suelta MUS (Kg/m^3)	1230.00

1.2 CÁLCULO DE LAS PROPORCIONES DE DISEÑO.

Escogida la especificación granulométrica según el tamaño máximo, se optimiza la granulometría mediante un proceso de estabilización para determinar la mejor mezcla de arena y grava para lograr un concreto de buenas propiedades de manejabilidad y resistencia para el contenido de cemento calculado.

La estabilización nos arroja la siguiente granulometría:

TAMIZ		PORCENTAJE PASA				
Diámetro (mm)	Alterno	FRANJA RECOMENDADA TM 1"		GRAVILLA	ARENA	MEZCLA MATERIALES
50,8	2"	100	100	100,00	100	100,00
37,50	1 ½"	100	100	97,44	100,00	98,72
25,00	1"	100	100	71,82	100,00	85,91
19,00	3/4"	90	85	57,34	100,00	78,67
12,70	1/2"	78	68	19,56	100,00	59,78
9,50	3/8"	71	58	4,89	95,99	50,44
4,75	No.4	56	40	0,65	86,87	43,76
2,36	No.8	44	27	0,63	78,03	39,33
1,180	No.16	34	18	0,61	63,29	31,95
0,600	No.30	27	13	0,59	30,93	15,76
0,300	No.50	21	9	0,57	14,17	7,37
0,150	No.100	17	6	0,55	4,95	2,75
0,075	No.200	0	0	0,53	2,56	1,54

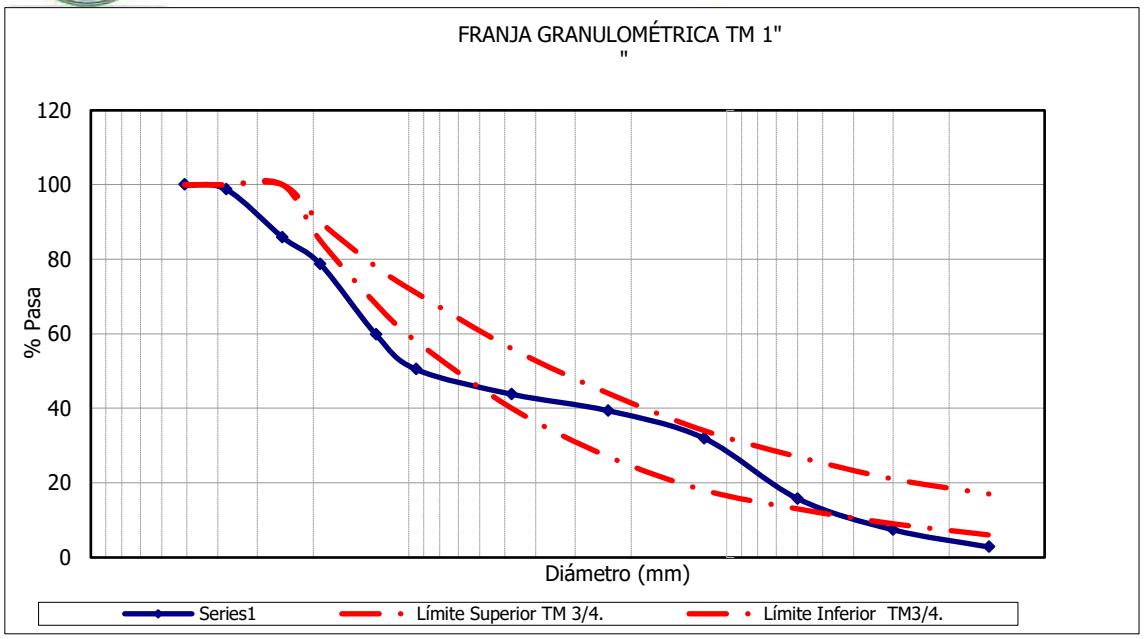

AGREGADO	PROPORCIÓN
Gravilla Sucre-La peña	50%
Arena Pescadero	50%

Tamaño máximo de diseño : 1" (25.00 cm)
Densidad Bulk promedio de los agregados : 2623.3 (Kg/m^3)
Relación Agua/Cemento en peso (a/c) : 0.51

1.2.1 Proporciones para 1 m^3 de concreto corregidas por humedad de los agregados.

Saco cemento (Kg)	42,5

Saco	7,5

MATERIAL	PROPORCIONES EN PESO	PROPORCIONES EN PESO (Kg) POR (M3) DE CONCRETO	DENSIDAD BULK	PROPORCIONES EN VOLUMEN ABSOLUTO (m3) POR (M3) DE CONCRETO	PROPORCIONES EN VOLUMEN SUELTO (m3) POR (M3) DE CONCRETO	AJUSTES POR HUMEDAD Kg/M3
Agua	0,51	180	1000	0,180	0,18	186
Cemento	1,0	320	3100	0,104	0,29	353
Arena	2,6	903	2555	0,353	0,57	922
Grava	2,6	903	2692	0,335	0,66	904
TOTAL		***2306***		***1,00***	***1,71***	***2382***

MATERIAL	PROPORCIONES EN PESO HÚMEDO (Kg) POR (M3) DE CONCRETO	PROPORCIONES EN PESO (Kg) POR SACO DE CEMENTO	PROPORCIONES EN VOLUMEN SUELTO (m3) POR SACO DE CEMENTO
Agua	186	26,30	0,026
Cemento	320	42,5	0,041
Arena	922	130,58	0,082
Grava	904	128,02	0,093
TOTAL	***2379***	***327,4***	***0,267***

1.2.2 Proporciones de diseño para concreto de 3000 Psi. (210 Kg/m^3)

MATERIAL	DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN ABSOLUTO	DOSIFICACIÓN EN PESO	DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN SUELTO
Agua	1,6	0,51	0,65
Cemento	1,0	1,0	1,0
Arena	3,1	2,6	2,0
Grava	2,9	2,6	2,3

1.3.3 Dosificación en baldes para un saco de cemento (Volumen suelto de agregados)

Balde (Litros)	10,0
Balde (m3)	0,010

MATERIAL	PROPORCIONES EN VOLUMEN SUELTO (m3) POR SACO DE CEMENTO	DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN SUELTO	DOSIFICACIÓN EN BALDES DE 10 LITROS
Agua	0,026	0,6	4,0
Cemento	0,041	1,0	4,1
Arena	0,082	2,0	8,2
Grava	0,093	2,3	9,3

1.2.4 Mezcla de Prueba

Número de cilindros de prueba a diseñar: 3

Volumen para un cilindro (m^3)	0,00556
V Total tres cilindros (m^3)	0,0167

MATERIAL	PROPORCIONES EN PESO	PESOS TOTALES (3) CILINDROS DE PRUEBA (Kg)	PESO (1) CILINDRO DE PRUEBA (Kg)
Agua	0,51	3,50	1,166
Cemento	1,0	6,65	2,217
Arena	2,6	17,37	5,791
Grava	2,6	17,03	5,678
TOTAL		***44,84***	***14,947***

1.3.5 Resultados Cilindros de Prueba

Mediante el valor de resistencia obtenido a los 3 días, es posible proyectar la resistencia en un período de 28 días (100% de resistencia), encontrándose un valor posible de 3508 Psi.

Tipo	Fecha	Fecha	Edad	Diámetro	Altura	Peso	Área	Densidad	Carga	R:	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PROYECCIÓN	Tipo de
Estructura	Vaciado	Rotura	Días	(Cm)	(Cm)	(g)	(Cm^2)	(kg/cm^3)	(kG)	L/d	(Kg/Cm^2)	(Psi)	(%)	28 Dias	Falla
DISEÑO 3000 PSI	02/02/19	05/02/19	3	15,30 15,20	30,30 30,30	13063	182,65	2360	14450	1,99	**79,11**	**1125,23**	**37,51**	**3508,47**	T5

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Los ensayos fueron realizados a una muestra suministrada por el cliente, Se recomienda realizar ensayos adicionales para verificar las propiedades mecánicas de los agregados y garantizar su óptimo comportamiento en la mezcla.

- ✓ Las características evaluadas de los agregados permiten obtener la resistencia deseada mezclándolos en las proporciones recomendadas. La granulometría de la grava se ajusta de mejor manera dentro de la franja recomendada AG – 50-1. Las gradaciones de los dos materiales se ajustan de manera satisfactoria para las granulometrías de las especificaciones de igual forma la curva de gradación de la mezcla estabilizada se ajusta en la mayoría de los tamices especificados con la franja recomendada para una mezcla con TM de 1".

- ✓ Se debe tener en cuenta la medida de dosificación de los materiales adoptada en obra, ya sea por peso o por volumen.

- ✓ Se recomienda tomar testigos periódicamente en distintas horas para llevar una mejor trazabilidad a la mezcla.


- ✓ Se resalta la importancia del contenido de agua, en la mezcla tanto por la manejabilidad y consistencia (asentamiento), como para la resistencia (relación agua cemento) que esta controla. Por este motivo y debido a las diferencia de humedades que se pueden dar al momento del ensayo y al momento de efectuar las mezcla en obra, se debe controlar la cantidad de agua para generar la consistencia y resistencia deseadas.

- ✓ Para controlar la proporción de agua, en la mezcla preparada en obra se recomienda realizar pruebas de asentamiento (cono slump) y para verificar la resistencia tomar mínimo tres (3) cilindros.

- ✓ Las principales propiedades del concreto, tales como durabilidad, resistencia, manejabilidad, además de su apariencia final se logran necesariamente con un control de obra adecuado y el correspondiente control de calidad respectivo. Por esta razón es importante realizar los ensayos sobre concreto fresco y endurecido de acuerdo a las normas vigentes correspondiente y por supuesto realizar un análisis de los resultados para verificar las resistencias de diseño.

- ✓ Vale aclarar que estos diseños solo aplican para estos agregados ya que estos dependen de las propiedades intrínsecas en de los materiales. Si por algún motivo se cambia algún agregado, este diseño no aplicaría y de manera inmediata se debe realizar un nuevo diseño.

- ✓ Cabe resaltar que el anterior diseño es preliminar hasta una ve haya cumplido con las fechas de ruptura de los cilindros de lo contrario puede cambiar su dosificación.



ING. LUIS FERNANDO RANGEL
MP. 25202-322135 CND

FORMATOS DE ENSAYOS

HOJA No. 1
DE 6

PROYECTO:	UT PLACA HUELLA LA MESA - EL HATILLO		
DIRIGIDO A :	E&C CONSTRUCCIONES	**FECHA ENSAYO:**	14/09/2021
PROCEDENCIA:	CANTERA - PEÑA BLANCA SUCRE		
DESCRIPCION MATERIAL:	Material granular tipo grava de forma angular de color gris visos blancos		

ENSAYO DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO INV E-213. AGREGADO GRUESO (GRAVILLA)

ANTES DE LAVADO

No. PLATÓN	20
PESO PLATÓN (g)	1024
PESO PLATÓN + MUESTRA (	6138
PESO MUESTRA (g)	5114


DESPUÉS DE LAVADO

PESO PLATÓN (g)	1024
PESO PLATÓN + MUESTRA (	6111
PESO MUESTRA SECA (g)	5087
PASA TAMIZ Nº 200 (%)	0,53

CORRECCIÓN

PESO TT DE LA MUESTRA (g)	5114
Σ PESOS RETENIDOS (g)	5113
ERROR (g)	1,00
ERROR (%)	0,02

TAMIZ Nº	DIÁMETRO (mm)	PESO RETENIDO (g)	PESO CORR (g)	%RETENIDO	%RETENIDO ACUMULADO	%QUE PASA
2"	50,8	0,0	0,00	0,00	0,00	100,00
11/2"	38,1	131,0	131,03	2,56	2,56	97,44
1"	25,00	1310,0	1310,26	25,62	28,18	71,82
3/4"	19,00	740,0	740,14	14,47	42,66	57,34
1/2"	12,50	1932,0	1932,38	37,79	80,44	19,56
3/8"	9,51	750,0	750,15	14,67	95,11	4,89
4	4,75	217,0	217,04	4,24	99,35	0,65
8	2,36	1,0	1,00	0,02	99,37	0,63
16	1,180	1,0	1,00	0,02	99,39	0,61
30	0,600	1,0	1,00	0,02	99,41	0,59
50	0,300	1,0	1,00	0,02	99,43	0,57
100	0,150	1,0	1,00	0,02	99,45	0,55
200	0,074	1,0	1,00	0,02	99,47	0,53
FONDO		27,00	27,01	0,53	100,00	0,00
Σ		5113,00	5114	100		

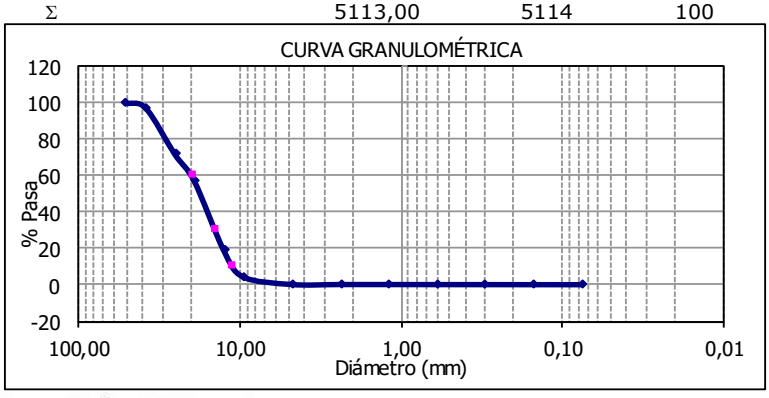


D60	19,5
D30	14,0
D10	11
Cc	0,9
Cu	1,8

ING. LUIS FERNANDO RANGEL
MP 25202-322135 CND

PROYECTO:	UT PLACA HUELLA LA MESA - EL HATILLO		
DIRIGIDO A :	E&C CONSTRUCCIONES	**FECHA ENSAYO:**	14/09/2021
PROCEDENCIA:	CANTERA PEÑA BLANCA SUCRE		
DESCRIPCION MATERIAL:	Material granular tipo grava de forma angular de color gris visos blancos		

FRANJA GRANULOMÉTRICA CONCRETO - INV- ART 630

AGREGADO TIPO AG - 50-1				
TAMIZ	DIÁMETRO	FRANJA ESPECIFICACIÓN		GRAVILLA
No	(mm)	% QUE PASA		% QUE PASA
2"	50,00	100	100	97,44
11/2"	37,50	95	100	71,82
3/4"	19,00	35	70	57,34
3/8"	9,50	10	30	4,89
4	4,75	0	5	0,65

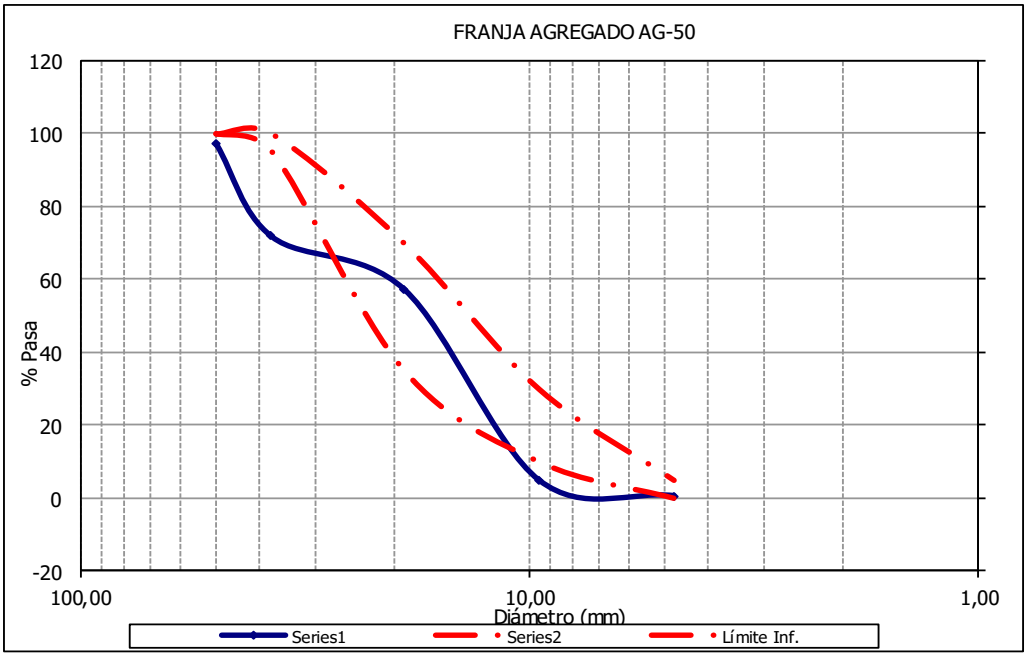

ING. LUIS FERNANDO RANGEL
MP 25202-322135 CND

HOJA No. 3
DE 6

PROYECTO:	UT PLACA HUELLA LA MESA - EL HATILLO		
DIRIGIDO A :	E&C CONSTRUCCIONES	FECHA ENSAYO:	14/09/2021
PROCEDENCIA:	PESCADERO		
DESCRIPCION MATERIAL:	Arena de rio de forma redondeada de color gris oscuro de consistencia rugosa.		

ENSAYO DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO INV E-213. AGREGADO FINO (ARENA)

ANTES DE LAVADO

No. PLATÓN	20
PESO PLATÓN (g)	1047
PESO PLATÓN + MUESTRA (	4770
PESO MUESTRA (g)	3723


DESPUÉS DE LAVADO (g)

PESO PLATÓN (g)	1047
PESO PLATÓN + MUESTRA (	4682
PESO MUESTRA SECA (g)	3635
PASA TAMIZ Nº 200 (%)	2,36

CORRECCIÓN

PESO TT DE LA MUESTRA (g)	3723
Σ PESOS RETENIDOS (g)	3718
ERROR (g)	5,0
ERROR (%)	0,13

TAMIZ Nº	DIÁMETRO (mm)	PESO RETENIDO (g)	PESO CORR (g)	%RETENIDO	%RETENIDO ACUMULADO	%QUE PASA
3/4"	19,10	0,0	0,00	0,00	0,00	100,00
1/2"	12,70	0,0	0,00	0,00	0,00	100,00
3/8"	9,51	149,0	149,20	4,01	4,01	95,99
4	4,76	339,0	339,46	9,12	13,13	86,87
8	2,36	329,0	329,44	8,85	21,97	78,03
16	1,180	548,0	548,74	14,74	36,71	63,29
30	0,600	1203,0	1204,62	32,36	69,07	30,93
50	0,300	623,0	623,84	16,76	85,83	14,17
100	0,150	343,0	343,46	9,23	95,05	4,95
200	0,075	89,0	89,12	2,39	97,44	2,56
FONDO		95,0	95,13	2,56	100,00	0,00
Σ		3718,0	3723,0	100,0		

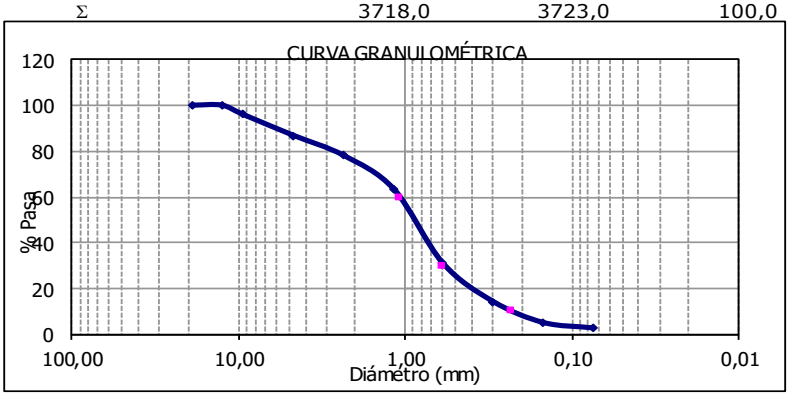

D60	1,1
D30	0,6
D10	0,23

Cc	1,4
Cu	4,8


Módulo de Finura ***3,26***

ING. LUIS FERNANDO RANGEL
MP 25202-322135 CND

PROYECTO:	UT PLACA HUELLA LA MESA - EL HATILLO		
DIRIGIDO A :	E&C CONSTRUCCIONES	FECHA ENSAYO:	14/09/2021
PROCEDENCIA:	PESCADERO		
DESCRIPCION MATERIAL:	Arena de rio de forma redondeada de color gris oscuro de consistencia rugosa.		

FRANJA GRANULOMÉTRICA - CONCRETO - AGREGADO FINO INV- ART 630

TAMIZ	DIÁMETRO	FRANJA ESPECIFICACIÓN		ARENA
No	(mm)	% QUE PASA		% QUE PASA
3/8"	9,50	100	100	95,99
4	4,75	95	100	86,87
8	2,36	80	100	78,03
16	1,19	50	85	63,29
30	0,60	25	60	30,93
50	0,30	10	30	14,17
100	0,150	2	10	4,95

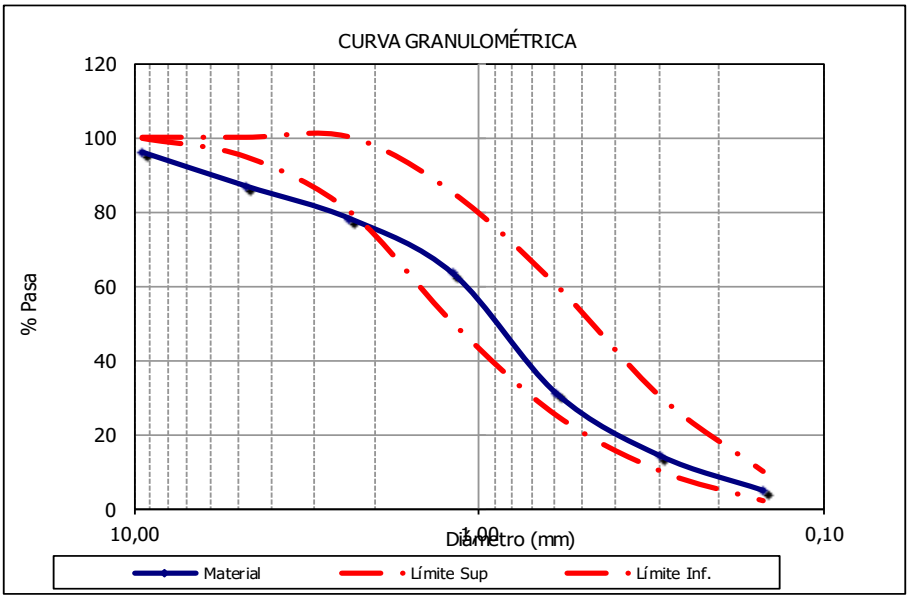

ING. LUIS FERNANDO RANGEL
MP 25202-322135 CND

PROYECTO:	UT PLACA HUELLA LA MESA - EL HATILLO		
DIRIGIDO A :	E&C CONSTRUCCIONES	FECHA ENSAYO:	14/09/2021
PROCEDENCIA:	PESCADERO		

PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN INV E -222, 223

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: Material granular tipo grava de forma angular de color gris visos blancos

No. PLATÓN	H
PESO DEL PLATÓN (g)	117
PESO DEL PLATÓN +MUESTRA SSS (g)	2493
PESO DEL LASTRE + CANASTILLA (g)	1498
PESO LASTRE + CANASTILLA+ MUESTRA (g)	3001
PESO DEL PLATÓN + MUESTRA SECA (g)	2467

Peso Específico aparente (g/cm^3)	***2,692***
Peso Específico SSS (g/cm^3)	***2,72***
Peso Específico Nominal (g/cm^3)	***2,77***
% de Absorción	***1,11***

DESCRIPCION MATERIAL: Arena de rio de forma redondeada de color gris oscuro de consistencia rugosa.

No. PLATÓN	2
PESO DEL PLATÓN (g)	116
PESO DEL PLATÓN +MUESTRA SSS (g)	617
PESO MATRAZ + AGUA (25 ºC) (g)	733,2
PESO MATRAZ + AGUA + MUESTRA (25 ºC) (g)	1041,5
PESO DEL PLATÓN + MUESTRA SECA (g)	608,3

Peso Específico aparente (g/cm^3)		***2,555***
Peso Específico nominal (g/cm^3)		***2,68***
% de Absorción		***1,77***

MASA UNITARIA SUELTA Y COMPACTA INV E- 127

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: Material granular tipo grava de forma angular de color gris visos blancos

Masa Unitaria Suelta (Kg/m^3)	***1372,00***

DESCRIPCION MATERIAL: Arena de rio de forma redondeada de color gris oscuro de consistencia rugosa.

Masa Unitaria Suelta (Kg/m^3)	***1590,00***


ING. LUIS FERNANDO RANGEL
MP 25202-322135 CND

HOJA No. 6
DE 6

PROYECTO: UT PLACA HUELLA LA MESA - EL HATILLO
DIRIGIDO A : E&C CONSTRUCCIONES — FECHA ENSAYO: 14/09/2021
PROCEDENCIA: SUCRE Y PESCADERO

DOSIFICACIÓN DE LOS MATERIALES, MEZCLA DE CONCRETO HIDRÁULICO

TAMIZ		PORCENTAJE PASA				
Diámetro (mm)	Alterno	FRANJA RECOMENDADA TM 1"		GRAVILLA	ARENA	MEZCLA MATERIALES
50,8	2"	100	100	100,00	100	100,00
37,50	1 ½"	100	100	97,44	100,00	98,72
25,00	1"	100	100	71,82	100,00	85,91
19,00	3/4"	90	85	57,34	100,00	78,67
12,70	1/2"	78	68	19,56	100,00	59,78
9,50	3/8"	71	58	4,89	95,99	50,44
4,75	No.4	56	40	0,65	86,87	43,76
2,36	No.8	44	27	0,63	78,03	39,33
1,180	No.16	34	18	0,61	63,29	31,95
0,600	No.30	27	13	0,59	30,93	15,76
0,300	No.50	21	9	0,57	14,17	7,37
0,150	No.100	17	6	0,55	4,95	2,75
0,075	No.200	0	0	0,53	2,56	1,54
				0,00	0,00	

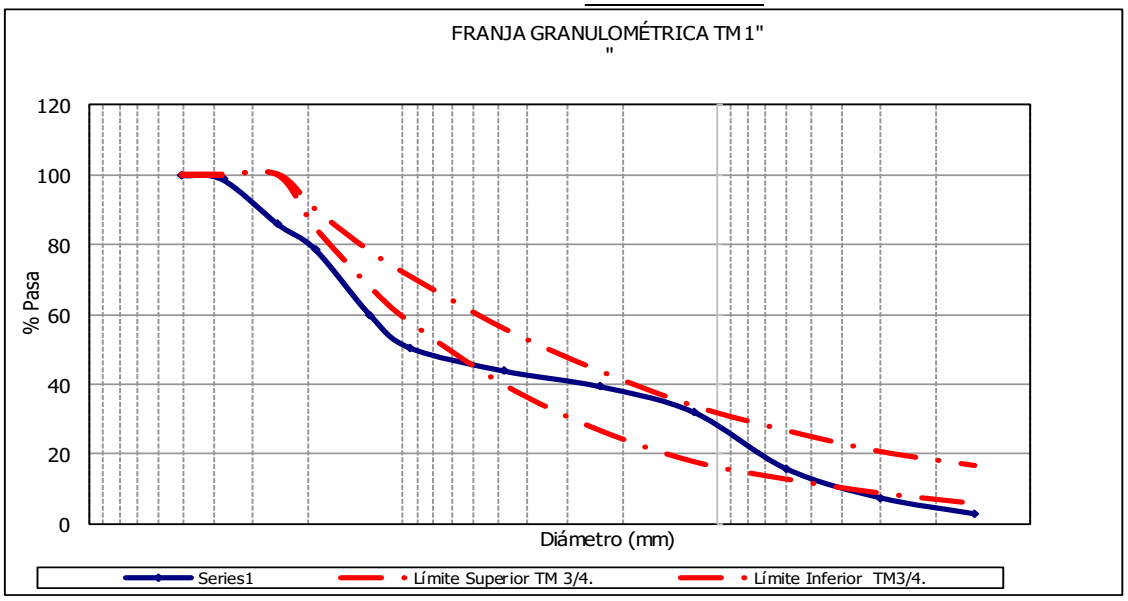

MATERIAL	
GRAVILLA	50%
ARENA	50%

ING. LUIS FERNANDO RANGEL
MP 25202-322135 CND

SOLENOPSIS
LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO:	PLACA HUELLAS LA BELLEZA		
MUNICIPIO:	LA BELLEZA-VEREDA BERLIN	FECHA DE INFORME:	19/09/2024
DIRIGIDO A:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA BELLEZA		
PROCEDENCIA:	BUENA VISTA		

TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE ARENA INV E- 161

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: Material base

TOMA No	TRAMO 1	TRAMO 1			
LUGAR	k0+020	k0+070			
Peso frasco + cono + arena (i) (g)	6306	6489			
Peso frasco + cono + arena (f) (g)	2620	2725			
Peso arena total usada (g)	3686	3764			
Constante del cono (g)	1634	1634			
Peso arena en el hueco (g)	2052	2130			
Densidad de la arena (g/cm^3)	1,4	1,4			
Volumen del orificio (cm^3)	1465,7	1521,4			
Peso material extraído (g)	3372	3490			
Densidad Húmeda (Kg/m^3)	2300,58	2293,90			
Densidad Húmeda (lb/pie^3)	0,00	0,00			
Humedad (%)	8,56	8,39			
Densidad Seca (Kg/m3) (Terreno)	*2119,13*	*2116,25*			
Densidad Máxima Seca (Kg/m3) (P.M)	*2225,00*	*2225,00*			
% Compactación	**95,2**	**95,1**			

HUMEDAD (%)

No Cápsula	M1	M2	M3	M4	
Peso Cápsula (g)	42,8	36,8			
Peso Cápsula + Muestra hum. (g)	485,8	404,3			
Peso Cápsula + Muestra seca (g)	450,86	375,84			
Humedad (%)	8,56	8,39			

OBSERVACIONES: El dato de la densidad maxima fue suministrada por el cliente.

ING. CAMILO AGUILAR
MP 68202-291939 STD
JEFE DE LABORATORIO

SOLENOPSIS
LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO:	PLACA HUELLAS LA BELLEZA		
MUNICIPIO:	LA BELLEZA-VEREDA CACHIPAYAL	FECHA DE INFORME:	19/09/2024
DIRIGIDO A:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA BELLEZA		
PROCEDENCIA:	BUENA VISTA		

TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE ARENA INV E- 161

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: Material base

TOMA No	TRAMO 1	TRAMO 1			
LUGAR	k0+020	k0+060			
Peso frasco + cono + arena (i) (g)	6480	6319			
Peso frasco + cono + arena (f) (g)	2622	2322			
Peso arena total usada (g)	3858	3997			
Constante del cono (g)	1634	1634			
Peso arena en el hueco (g)	2224	2363			
Densidad de la arena (g/cm^3)	1,4	1,4			
Volumen del orificio (cm^3)	1588,6	1687,9			
Peso material extraído (g)	3662	3903			
Densidad Húmeda (Kg/m^3)	2305,22	2312,40			
Densidad Húmeda (lb/pie^3)	0,00	0,00			
Humedad (%)	7,66	9,01			
Densidad Seca (Kg/m3) (Terreno)	*2141,27*	*2121,26*			
Densidad Máxima Seca (Kg/m3) (P.M)	*2225,00*	*2225,00*			
% Compactación	**96,2**	**95,3**			

HUMEDAD (%)

No Cápsula	M1	M2	M3	M4	
Peso Cápsula (g)	43	37,5			
Peso Cápsula + Muestra hum. (g)	388,9	333,9			
Peso Cápsula + Muestra seca (g)	364,3	309,4			
Humedad (%)	7,66	9,01			

OBSERVACIONES: El dato de la densidad maxima fue suministrada por el cliente.

ING. CAMILO AGUILAR
MP 68202-291939 STD
JEFE DE LABORATORIO

PROYECTO:	CONVENIO SOLIDARIO 4490 DE 2023- AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
MUNICIPIO:	SUCRE SANTANDER- VEREDA ORGANOS, SECTOR LA PEÑA
DIRIGIDO A:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
PROCEDENCIA:	TECNO CONSTRUCTORES - CANTERA PEÑA BLANCA, SUCRE
FECHA DE TOMA:	SEPTIEMBRE 28 DE 2024
TIPO DE MATERIAL:	MATERIAL GRANULAR TIPO SUB -BASE GRANULAR

TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE ARENA INV E- 161

SECTOR LA PEÑA

NUMERO	1	2	3		
LUGAR	INDICADA	INDICADA	INDICADA		
Peso frasco + cono + arena (i) (g)	5622	5505	5445		
Peso frasco + cono + arena (f) (g)	1150	1188	1148		
Peso arena total usada (g)	4472	4317	4297		
Constante del cono (g)	1614	1614	1614		
Peso arena en el hueco (g)	2858	2703	2683		
Densidad de la arena (g/cm^3)	1,41	1,41	1,41		
Volumen del orificio (cm^3)	2027,0	1917,0	1902,8		
Peso material extraído (g)	4887	4382	4275		
Densidad Húmeda (Kg/m^3)	2411,01	2285,84	2246,65		
Densidad Húmeda (lb/pie^3)	150,38	142,57	140,13		
Humedad (%)	4,76	4,72	3,95		
Densidad Seca (Kg/m3) (Terreno)	*2301,49*	*2182,80*	*2161,29*		
Densidad Máxima Seca (Kg/m3) (P.M)	*2272,00*	*2272,00*	*2272,00*		
% Compactación	**101,3**	**96,1**	**95,1**		

HUMEDAD (%)

No Cápsula	T5	T4	T8		
Peso Cápsula (g)	25,6	27,1	27,3		
Peso Cápsula + Muestra hum. (g)	496,7	519,60	480,00		
Peso Cápsula + Muestra seca (g)	475,3	497,4	462,8		
Humedad (%)	4,76	4,72	3,95		

OBSERVACIONES:



ING. WILSON F MORENO OLAYA
MAT: 25335190672 C.N.D


FWF GEOINGENIERIA S.A.S
NIT: 900730123-4
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION

FECHA	OCTUBRE 2 DE 2024
PROYECTO:	CONVENIO SOLIDARIO 4490 DE 2023- AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
MUNICIPIO:	SUCRE SANTANDER- VEREDA ORGANOS, SECTOR LA PEÑA
DIRIGIDO A :	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
PROCEDENCIA:	TECNO CONSTRUCTORES - CANTERA PEÑA BLANCA, SUCRE

ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO I.N.V. E 142

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL : *material granular de color gris*

DETERMINACION Nº	1		2	3
NÚMERO DE GOLPES	56		56	56
PESO SUELO HÚMEDO (g)	5500		5500	5500
HUMEDAD HIGROSCÓPICA (%)	0,28		0,28	0,28
PESO SUELO SECO (g)	5485		5485	5485
HUMEDAD DESEADA (%)	2,0		6,0	8,0
HUMEDAD ADICIONAL (%)	1,7		5,7	7,7
VOLUMEN DE AGUA ADICIONAL (cc)	94		314	423
NÚMERO DE MOLDE	1		1	1
PESO DEL MOLDE (g)	7089		7089	7089
PESO DEL MOLDE + SUELO HÚMEDO (g)	11693		12098	12203
PESO DEL SUELO COMPACTO (g)	4604		5009	5114
VOLUMEN DEL MOLDE cm^3)	2124,26		2124,26	2124,26
DENSIDAD HÚMEDA (g/cm^3)	2,167		2,358	2,407
HUMEDAD AL HORNO (%)	1,19		4,30	8,06
DENSIDAD SECA (Kg/m^3)	2141,9		2260,8	2227,8
HUMEDAD (%)				
RECIPIENTE Nº	T3		T12	T7
PESO RECIPIENTE +SUELO HÚMEDO (g)	333,60		332,80	335,70
PESO RECIPIENTE +SUELO SECO (g)	330,00		320,20	312,70
PESO RECIPIENTE (g)	27,30		27,00	27,50
HUMEDAD (%)	1,19		4,30	8,06

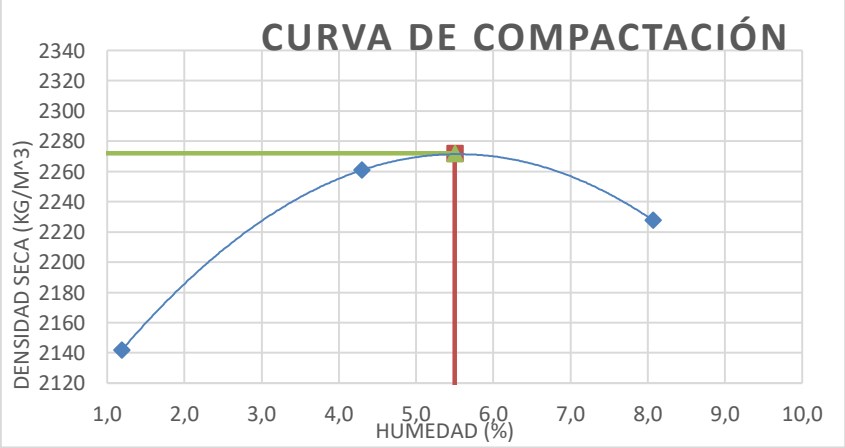

Humedad Óptima

5,50%

Densidad Seca Máxima

Kg/m^3	***2272***
g/cm^3	***2,27***

ING: WILSON F MORENO OLAYA
M.P. 25335190672 C.N.D

SOLENOPSIS
LABORATORIO DE SUELOS

NIT:900806635-1
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONSULTORÍA, DISEÑO, INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
MUNICIPIO:	GUAVATA
DIRIGIDO A:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA UNION
FECHA DE TOMA DE DENSIDADES	25/10/2024
FECHA DE INFORME	20/12/2024

TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE ARENA INV E- 161

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: Material de sub base de forma redondeada con arena de color amarillo

TOMA No	1	2	3	4	5
LUGAR	DENSIDAD 1	DENSIDAD 2			
Peso frasco + cono + arena (i) (g)	6845	6795			
Peso frasco + cono + arena (f) (g)	3015	3512			
Peso arena total usada (g)	3830	3283			
Constante del cono (g)	1646	1646			
Peso arena en el hueco (g)	2184	1637			
Densidad de la arena (g/cm^3)	1,4	1,4			
Volumen del orificio (cm^3)	1560,0	1169,3			
Peso material extraído (g)	3650	2816			
Densidad Húmeda (Kg/m^3)	2339,74	2408,31			
Densidad Húmeda (lb/pie^3)	145,93	150,21			
Humedad (%)	6,22	6,75			
Densidad Seca (Kg/m3) (Terreno)	*2202,75*	*2256,10*			
Densidad Máxima Seca (Kg/m3) (P.M)	*2300,00*	*2300,00*			
% Compactación	**95,8**	**98,1**			

HUMEDAD (%)

No Cápsula	M1	M2			
Peso Cápsula (g)	38,41	38,12			
Peso Cápsula + Muestra hum. (g)	135,25	148,56			
Peso Cápsula + Muestra seca (g)	129,58	141,58			
Humedad (%)	6,22	6,75			

OBSERVACIONES: La corrección por partículas mayores a 3/4" se efectuó en el terreno.



ING. CAMILO AGUILAR
MP 68202-291939 STD
JEFE DE LABORATORIO

Correo electrónico: contactanos@solenopsis.com.co
Celular. 3118508140 – 3156765219
Dirección. San Isidro, vía Barbosa – Bucaramanga, km 1.5 Local 4

SOLENOPSIS
LABORATORIO DE SUELOS

NIT:900806635-1
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONSULTORÍA, DISEÑO, INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
MUNICIPIO:	GUAVATA		
DIRIGIDO A:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA		
FECHA DE TOMA DE DENSIDADES	25/10/2024	FECHA DE INFORME	20/12/2024

TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE ARENA INV E- 161

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: Material de sub base de forma redondeada con arena de color amarillo

TOMA No	1	2	3	4	5
LUGAR	DENSIDAD 1				
Peso frasco + cono + arena (i) (g)	6884				
Peso frasco + cono + arena (f) (g)	3925				
Peso arena total usada (g)	2959				
Constante del cono (g)	1614				
Peso arena en el hueco (g)	1345				
Densidad de la arena (g/cm^3)	1,4				
Volumen del orificio (cm^3)	960,7				
Peso material extraído (g)	2268				
Densidad Húmeda (Kg/m^3)	2360,74				
Densidad Húmeda (lb/pie^3)	0,00				
Humedad (%)	6,74				
Densidad Seca (Kg/m3) (Terreno)	*2211,75*				
Densidad Máxima Seca (Kg/m3) (P.M)	*2300,00*				
% Compactación	**96,2**				

HUMEDAD (%)

No Cápsula	M1				
Peso Cápsula (g)	38,36				
Peso Cápsula + Muestra hum. (g)	188,73				
Peso Cápsula + Muestra seca (g)	179,24				
Humedad (%)	6,74				

OBSERVACIONES: La corrección por partículas mayores a 3/4" se efectuó en el terreno.

ING. CAMILO AGUILAR
MP 68202-291939 STD
JEFE DE LABORATORIO

Correo electrónico: contactanos@solenopsis.com.co
Celular. 3118508140 – 3156765219
Dirección. San Isidro, vía Barbosa – Bucaramanga, km 1.5 Local 4

HOJA Nº 1
DE: 1

FECHA **1/11/2024**


PROYECTO: "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL" – CONVENIO N° 3951 DE 2023

MUNICIPIO: BOLÍVAR SANTANDER
DIRIGIDO A : JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL
PROCEDENCIA: CANTERA EL CAIRO - MONIQUIRA

ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO I.N.V. E 142

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL : SUB-BASE - CONFORMADA POR GRAVA ANGULAR Y FINOS DE COLOR GRIS

DETERMINACION Nº	1	2	3	4
NUMERO DE GOLPES	56	56	56	56
PESO SUELO HÚMEDO (g)	5500	5500	5500	5500
HUMEDAD HIGROSCÓPICA (%)	2.20	2.20	2.20	2.20
PESO SUELO SECO (g)	5382	5382	5382	5382
HUMEDAD DESEADA (%)	3.0	5.0	7.0	9.0
HUMEDAD ADICIONAL (%)	0.8	2.8	4.8	6.8
VOLUMEN DE AGUA ADICIONAL (cc)	43	151	258	366
NUMERO DE MOLDE	3	3	3	3
PESO DEL MOLDE (g)	7104	7104	7104	7104
PESO DEL MOLDE + SUELO HÚMEDO (g)	11690	11993	12155	12003
PESO DEL SUELO COMPACTO (g)	4586	4889	5051	4899
VOLUMEN DEL MOLDE cm^3)	2124.26	2124.26	2124.26	2124.26
DENSIDAD HÚMEDA (g/cm^3)	2.159	2.302	2.378	2.306
HUMEDAD AL HORNO (%)	2.82	4.74	7.03	9.83
DENSIDAD SECA (Kg/m^3)	2099.7	2197.3	2221.5	2099.8
HUMEDAD (%)				
RECIPIENTE Nº	7B	12B	3A	4B
PESO RECIPIENTE +SUELO HÚMEDO (g)	337.60	368.10	386.20	317.30
PESO RECIPIENTE +SUELO SECO (g)	329.20	352.80	363.20	291.60
PESO RECIPIENTE (g)	30.90	30.30	36.20	30.20
HUMEDAD (%)	2.82	4.74	7.03	9.83

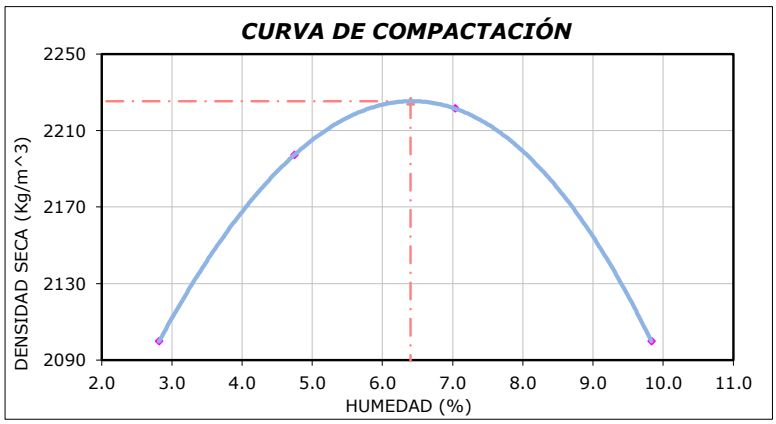

Humedad Óptima

6.40%

Densidad Seca Máxima

Kg/m^3	***2225***
g/cm^3	***2.23***

ING. FREDY YESID DUARTE OLACHICA
M.P. 01109-0989 CPITV

HOJA No. 1
DE 1

PROYECTO:	"ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL" – CONVENIO N° 3951 DE 2023		
MUNICIPIO:	BOLÍVAR SANTANDER		
DIRIGIDO A:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL		
FECHA DE TOMA:	1/11/2024	CAPA	SUB-BASE
DESCRIPCIÓN MATERIAL	SUB-BASE - CONFORMADA POR GRAVA ANGULAR Y FINOS DE COLOR GRIS		


TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE ARENA INV E- 161

TOMA No	1	2	3		
LOCALIZACIÓN	SECTOR TRES ESQUINAS				
	KO+040 CARRIL DER.	KO+090 EJE	KO+130 CARRIL IZQ.		
Profundidad (cm)	11	11	11		
Peso frasco + cono + arena (i) (g)	6106	6074	6027		
Peso frasco + cono + arena (f) (g)	2867	2734	2715		
Peso arena total usada (g)	3239	3340	3312		
Constante del cono (g)	1614	1614	1614		
Peso arena en el hueco (g)	1625	1726	1698		
Densidad de la arena (g/cm^3)	1.41	1.41	1.41		
Volumen del orificio (cm^3)	1152.5	1224.1	1204.3		
Peso material extraído (g)	2680	2815	2955		
Densidad Húmeda (Kg/m^3)	2325.42	2299.62	2453.80		
Densidad Húmeda (lb/pie^3)	145.04	143.43	153.05		
Humedad (%)	8.98	5.96	7.84		
Densidad Seca (Kg/m3) (Terreno)	*2133.80*	*2170.29*	*2275.30*		
Densidad Máxima Seca (Kg/m3) (P.M)	*2225*	*2225*	*2225*		
% Compactación	**95.9**	**97.5**	**102.2**		

HUMEDAD (%)

No Cápsula	18	36	M2		
Peso Cápsula (g)	38.5	45.6	38.4		
Peso Cápsula + Muestra hum. (g)	351.60	410.10	386.20		
Peso Cápsula + Muestra seca (g)	325.8	389.6	360.9		
Humedad (%)	8.98	5.96	7.84		

OBSERVACIONES:




ING. FREDY YESID DUARTE OLACHICA
M.P. 01109-0989 CPITV

TOMA DE DENSIDAD EN TERRENO MÉTODO DEL CONO DE ARENA	**Código:**
	Revisión: 01
	Fecha: 29/08/18

Proyecto:	**CONVENIO 4357 DE 2023 - Placa Huellas vereda Tubavita Vélez - Santander Programa Caminos Comunitarios Para la Paz Total**
Ubicación:	**TRAMO 1 PLACA HUELLA VEREDA TUBAVITA VÉLEZ - SANTANDER**
Fecha del informe:	**12 DE NOVIEMBRE DE 2024**
Tipo Material:	**SUBBASE GRANULAR**

TOMA DE DATOS EN CAMPO						
N°	Muestra	**D-1**	**D-2**	**D-3**		
1	Abscisa	Costado derecho sobre huella	Costado derecho sobre huella	Costado izquierdo sobre huella		
2	Ubicación de muestra	inicial + 15	inicial + 25	inicial + 35		
3	Peso del frasco + Arena inicial (g)	5370	5332	5250		
4	Peso del frasco + Arena restante (g)	2171	2179	2276		
5	Peso de la arena total usada	3199	3153	2974		
6	Constante del cono (grs)	1630	1630	1630		
7	Peso de la arena en el hueco (3-4-6) (g)	1569	1523	1344		
8	Densidad de la arena (g/cm3)	1.41	1.41	1.41		
9	Volumen del hueco (7/8) (cm3)	1113	1080	953		
10	Peso de material extraido	2745	2417	2163		
11	Peso unitario humedo (10/9) (gr/cm³)	2.467	2.238	2.269		
12	Humedad del material extraido (%)	4.4%	2.9%	2.9%		
13	Peso unitario material seco (11/(1+12) (gr/cm³)	2.363	2.175	2.205		
ENSAYO PROCTOR MODIFICADO (DATOS DE LABORATORIO)						
13	Densidad maxima laboratorio (gr/cm³)	2.29	2.29	2.29		
14	Humedad optima de laboratorio (%)	4.5%	4.5%	4.5%		
RESULTADOS DE PRUEBA						
15	% De Compactación de Terreno (12/13*100) (%)	**103.18**	**94.96**	**96.30**		

OBSERVACIONES
El valor de Densidad máxima de laboratorio y Humedad Óptima es suministrada por el cliente

Firma:	
Nombre:	**JHON JAIRO CAMACHO ÁVILA**
Cargo:	**Ing Civil Mat. Prof. 68202-315495**

TOMA DE DENSIDAD EN TERRENO MÉTODO DEL CONO DE ARENA	**Código:**
	Revisión: 01
	Fecha: 29/08/18

Proyecto:	**CONVENIO 4357 DE 2023 - Placa Huellas vereda Tubavita Vélez - Santander Programa Caminos Comunitarios Para la Paz Total**
Ubicación:	**TRAMO 1 PLACA HUELLA VEREDA TUBAVITA VÉLEZ - SANTANDER**
Fecha del informe:	**12 DE NOVIEMBRE DE 2024**
Tipo Material:	**SUBBASE GRANULAR**




















TOMA DE DENSIDAD EN TERRENO MÉTODO DEL CONO DE ARENA	**Código:**
	Revisión: 01
	Fecha: 29/08/18

Proyecto:	**CONVENIO 4357 DE 2023 - Placa Huellas vereda Tubavita Vélez - Santander Programa Caminos Comunitarios Para la Paz Total**
Ubicación:	**TRAMO 2 PLACA HUELLA VEREDA TUBAVITA VÉLEZ - SANTANDER**
Fecha del informe:	**19 DE NOVIEMBRE DE 2024**
Tipo Material:	**SUBBASE GRANULAR**

TOMA DE DATOS EN CAMPO						
N°	Muestra	**D-1**	**D-2**	**D-3**		
1	Abscisa	Costado izquierdo sobre huella	Costado derecho sobre huella	Costado derecho sobre huella		
2	Ubicación de muestra	inicial + 28	inicial + 17	inicial + 5		
3	Peso del frasco + Arena inicial (g)	5194	5140	5037		
4	Peso del frasco + Arena restante (g)	1698	1382	1507		
5	Peso de la arena total usada	3496	3758	3530		
6	Constante del cono (grs)	1630	1630	1630		
7	Peso de la arena en el hueco (3-4-6) (g)	1866	2128	1900		
8	Densidad de la arena (g/cm3)	1.41	1.41	1.41		
9	Volumen del hueco (7/8) (cm3)	1323	1509	1348		
10	Peso de material extraido	2966	3477	3041		
11	Peso unitario humedo (10/9) (gr/cm³)	2.241	2.304	2.257		
12	Humedad del material extraido (%)	3.15%	3.15%	3.15%		
13	Peso unitario material seco (11/(1+12) (gr/cm³)	2.173	2.233	2.188		
ENSAYO PROCTOR MODIFICADO (DATOS DE LABORATORIO)						
13	Densidad máxima laboratorio (gr/cm³)	2.29	2.29	2.29		
14	Humedad óptima de laboratorio (%)	4.5%	4.5%	4.5%		
RESULTADOS DE PRUEBA						
15	% De Compactación de Terreno (12/13*100) (%)	**94.88**	**97.53**	**95.54**		

OBSERVACIONES
El valor de Densidad máxima de laboratorio y Humedad Óptima es suministrada por el cliente

Firma:	
Nombre:	**JHON JAIRO CAMACHO ÁVILA**
Cargo:	**Ing Civil Mat. Prof. 68202-315495**

TOMA DE DENSIDAD EN TERRENO MÉTODO DEL CONO DE ARENA	**Código:**
	Revisión: 01
	Fecha: 29/08/18

Proyecto:	**CONVENIO 4357 DE 2023 - Placa Huellas vereda Tubavita Vélez - Santander Programa Caminos Comunitarios Para la Paz Total**
Ubicación:	**TRAMO 2 PLACA HUELLA VEREDA TUBAVITA VÉLEZ - SANTANDER**
Fecha del informe:	**19 DE NOVIEMBRE DE 2024**
Tipo Material:	**SUBBASE GRANULAR**



















FWF GEOINGENIERIA S.A.S
NIT: 900730123-4
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION

HOJA Nº 1
DE: 1


PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA TEBAIDA EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
MUNICIPIO:	VELEZ - SANTANDER	FECHA DE ENSAYO:	17/12/2024
DIRIGIDO A :	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TEBAIDA		
PROCEDENCIA	CANTERA METROPOLIS EN MONIQUIRÁ		

ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO I.N.V. E 142

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL : **Material granular compuesto por grava de color gris con finos.**

DETERMINACIÓN Nº	1	2	3	4
NÚMERO DE GOLPES	56	56	56	56
PESO SUELO HÚMEDO (g)	5500	5500	5500	5500
HUMEDAD HIGROSCÓPICA (%)	0,56	0,56	0,56	0,56
PESO SUELO SECO (g)	5469	5469	5469	5469
HUMEDAD DESEADA (%)	4,00	6,00	8,00	10,00
HUMEDAD ADICIONAL (%)	3,4	5,4	7,4	9,4
VOLUMEN DE AGUA ADICIONAL (cc)	188	298	407	516
NÚMERO DE MOLDE	1	1	1	1
PESO DEL MOLDE (g)	3341	3341	3341	3341
PESO DEL MOLDE + SUELO HÚMEDO (g)	8302	8541	8587	8450
PESO DEL SUELO COMPACTO (g)	4961	5200	5246	5109
VOLUMEN DEL MOLDE (cm^3)	2111,00	2111,00	2111,00	2111,00
DENSIDAD HÚMEDA (g/cm^3)	2,350	2,463	2,485	2,420
HUMEDAD AL HORNO (%)	4,88	6,56	8,48	10,33
DENSIDAD SECA (Kg/m^3)	2240,7	2311,7	2290,8	2193,7
HUMEDAD (%)				
RECIPIENTE Nº	12	13	17	23
PESO RECIPIENTE +SUELO HÚMEDO (g)	412,36	423,67	444,21	418,17
PESO RECIPIENTE +SUELO SECO (g)	395,00	400,00	412,32	382,58
PESO RECIPIENTE (g)	39,23	39,02	36,23	37,93
HUMEDAD (%)	4,88	6,56	8,48	10,33

CURVA DE COMPACTACIÓN

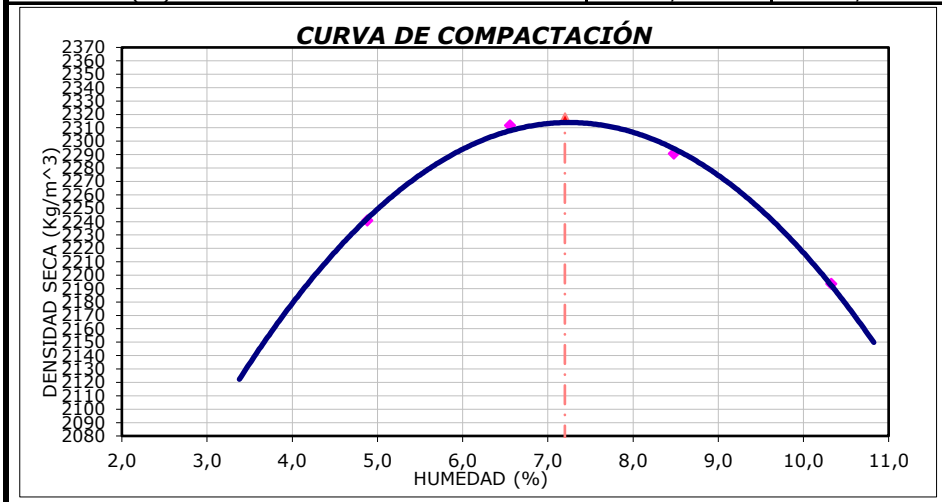

Humedad Óptima

7,20%

Densidad Seca Máxima

Kg/m^3	***2318,0***
g/cm^3	***2,32***

ING. LUIS FERNANDO RANGEL
MP. 25202-322135 CND

CARRERA 7 # 5C-43 AVENIDA DE LAS AMÉRICAS BARBOSA SANTANDER- COLOMBIA
CONTACTOS: 3144615974
E-mail: fwfgeoingenieria@gmail.com

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO

RESISTENCIA (210 Kg/cm^2) 3000 psi

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA TEBAIDA EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DIRIGIDO A
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TEBAIDA

ELABORADO POR:
FWF GEOINGENIERIA SAS

BARBOSA
DICIEMBRE 2025

1 DISEÑO MEZCLA DE CONCRETO HIDRAULICO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA TEBAIDA EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

INFORMACIÓN GENERAL

Resistencia a la Compresión requerida : 3000 Psi. (210 Kg/cm^2)

Asentamiento recomendado : (7.62cm)

Promedio aire atrapado en 1.8 %

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

AGREGADO GRUESO: Material granular tipo grava con forma angular, redondeada de color gris visos blancos y de contextura rugosa. TM nominal 3/4".

AGREGADOS DE DISEÑO	GRAVA TM 3/4"
Densidad Bulk (Kg/m^3)	2716
Porcentaje de absorción (%)	0,63
Masa Unitaria Suelta MUS (Kg/m^3)	1292

AGREGADO FINO: Arena de rio lavada forma redondeada de color gris visos negros, presencia cuarzo.

AGREGADOS DE DISEÑO	ARENA GRIS
Densidad Bulk (Kg/m^3)	2569
Porcentaje de absorción (%)	1,44
Masa Unitaria Suelta MUS (Kg/m^3)	1523
Módulo de finura (MF)	2,83

CEMENTO: "CEMEX DE USO ESTRUCTURAL"


CEMENTO	TIPO I
Densidad (Kg/m^3)	3100.00
Masa Unitaria Suelta MUS (Kg/m^3)	1230.00

1.2 CÁLCULO DE LAS PROPORCIONES DE DISEÑO.

Escogida la especificación granulométrica según el tamaño máximo, se optimiza la granulometría mediante un proceso de estabilización para determinar la mejor mezcla de arena y grava para lograr un concreto de buenas propiedades de manejabilidad y resistencia para el contenido de cemento calculado.

La estabilización nos arroja la siguiente granulometría:

TAMIZ		PORCENTAJE PASA				
Diámetro (mm)	Alterno	FRANJA RECOMENDADA TM 3/4"		GRAVILLA	ARENA	MEZCLA MATERIALES
50,8	2"	100	100	100,00	100	100,00
37,50	1 ½"	100	100	100,00	100,00	100,00
25,00	1"	100	100	100,00	100,00	100,00
19,00	3/4"	90	85	56,78	100,00	78,39
12,70	1/2"	78	68	6,26	100,00	53,13
9,50	3/8"	71	58	3,89	99,73	51,81
4,75	No.4	56	40	2,35	96,81	49,58
2,36	No.8	44	27	2,16	89,12	45,64
1,180	No.16	34	18	1,97	74,10	38,03
0,600	No.30	27	13	1,80	39,53	20,67
0,300	No.50	21	9	1,61	13,39	7,50
0,150	No.100	17	6	1,38	4,11	2,74
0,075	No.200	0	0	1,26	1,89	1,57

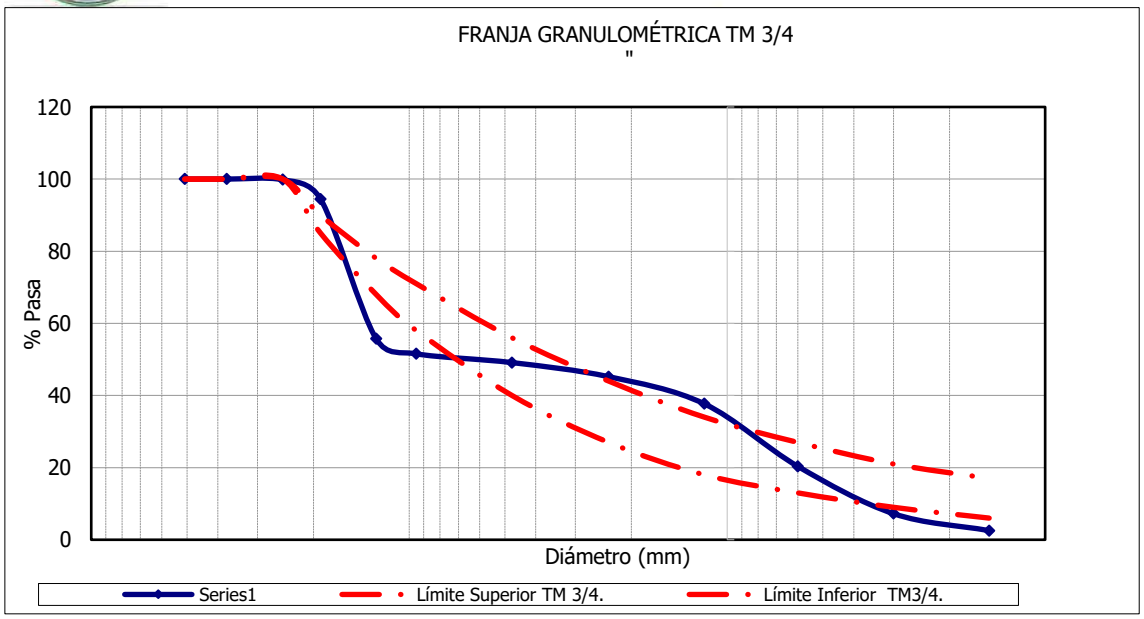

AGREGADO	PROPORCIÓN
Gravilla Moniquirá	50%
Arena Puerto Berrio	50%

Tamaño máximo de diseño : 3/4" (19.00 cm)
Densidad Bulk promedio de los agregados : 2642 (Kg/m^3)
Relación Agua/Cemento en peso (a/c) : 0.51

1.2.1 Proporciones para 1 m^3 de concreto corregidas por humedad de los agregados.

Saco cemento (Kg)	42.5

Saco	7.8

MATERIAL	PROPORCIONES EN PESO	PROPORCIONES EN PESO (Kg) POR (M3) DE CONCRETO	DENSIDAD BULK	PROPORCIONES EN VOLUMEN ABSOLUTO (m3) POR (M3) DE CONCRETO	PROPORCIONES EN VOLUMEN SUELTO (m3) POR (M3) DE CONCRETO	AJUSTES POR HUMEDAD Kg/M3
Agua	0,51	170	1000	0,170	0,17	176
Cemento	1,0	333	3100	0,108	0,27	333
Arena	2,8	931	2569	0,362	0,61	942
Grava	2,8	931	2716	0,343	0,70	932
TOTAL		***2382,9***		***1,00***	***1,77***	***2402***

MATERIAL	PROPORCIONES EN PESO HÚMEDO (Kg) POR (M3) DE CONCRETO	PROPORCIONES EN PESO (Kg) POR SACO DE CEMENTO	PROPORCIONES EN VOLUMEN SUELTO (m3) POR SACO DE CEMENTO
Agua	176	22,45	0,022
Cemento	333	42,50	0,035
Arena	942	120,16	0,079
Grava	932	118,87	0,090
TOTAL	***2399***	***305,90***	***0,251***

1.2.2 Proporciones de diseño para concreto de 3000 Psi. (210 Kg/m^3)

MATERIAL	DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN ABSOLUTO	DOSIFICACIÓN EN PESO	DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN SUELTO
Agua	1,6	0,51	0,65
Cemento	1,0	1,0	1,0
Arena	3,4	2,8	2,3
Grava	3,2	2,8	2,6

1.3.3 Dosificación en baldes para un saco de cemento (Volumen suelto de agregados)

Balde (Litros)	10,0
Balde (m3)	0,010

MATERIAL	PROPORCIONES EN VOLUMEN SUELTO (m3) POR SACO DE CEMENTO	DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN SUELTO	DOSIFICACIÓN EN BALDES DE 10 LITROS
Agua	0,022	0,6	4,0
Cemento	0,035	1,0	3,5
Arena	0,079	2,3	8,0
Grava	0,090	2,6	9,0

1.2.4 Mezcla de Prueba

Número de cilindros de prueba a diseñar: 3

Volumen para un cilindro (m^3)	0,00556
V Total tres cilindros (m^3)	0,0167

MATERIAL	PROPORCIONES EN PESO	PESOS TOTALES (3) CILINDROS DE PRUEBA (Kg)	PESO (1) CILINDRO DE PRUEBA (Kg)
Agua	0,51	3,32	1,106
Cemento	1,0	6,28	2,094
Arena	2,8	17,76	5,921
Grava	2,8	17,57	5,858
TOTAL		***45,22***	***15,074***

1.3.5 Resultados Cilindros de Prueba

Mediante el valor de resistencia obtenido a los 3 días, es posible proyectar la resistencia en un período de 28 días (100% de resistencia), encontrándose un valor posible de 3410 Psi.

Tipo	Fecha	Fecha	Edad	Diámetro	Altura	Peso	Área	Densidad	Carga	R:	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PROYECCIÓN
Estructura	Vaciado	Rotura	Días	(Cm)	(Cm)	(g)	(Cm^2)	(kg/cm^3)	(kG)	L/d	(Kg/Cm^2)	(Psi)	(%)	28 Dias
DISEÑO 3000 PSI	06/12/24	09/12/24	3	10,00	20,00	3660	79,33	2307	6100	1,99	**76,90**	**1093,73**	**36,46**	**3410,26**
				10,10	20,00									
DISEÑO 3000 PSI	06/12/24	13/12/24	7	10,00	20,00	3660	79,33	2307	11400	1,99	**143,71**	**2044,02**	**68,13**	**3309,92**
				10,10	20,00									

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Los ensayos fueron realizados a una muestra suministrada por el cliente, Se recomienda realizar ensayos adicionales para verificar las propiedades mecánicas de los agregados y garantizar su óptimo comportamiento en la mezcla.

- ✓ Las características evaluadas de los agregados permiten obtener la resistencia deseada mezclándolos en las proporciones recomendadas. La granulometría de la grava se ajusta de mejor manera dentro de la franja recomendada AG – 50-1. Las gradaciones de los materiales se sale un poco de manera que para las granulometrías de las especificaciones de igual forma la curva de gradación de la mezcla estabilizada se ajusta en la mayoría de los tamices especificados con la franja recomendada para una mezcla con TM de 3/4".

- ✓ Se debe tener en cuenta la medida de dosificación de los materiales adoptada en obra, ya sea por peso o por volumen.

- ✓ Se recomienda tomar testigos periódicamente en distintas horas para llevar una mejor trazabilidad a la mezcla.

- ✓ Se resalta la importancia del contenido de agua, en la mezcla tanto por la manejabilidad y consistencia (asentamiento), como para la resistencia (relación agua cemento) que esta controla. Por este motivo y debido a las diferencia de humedades que se pueden dar al momento del ensayo y al momento de efectuar las mezcla en obra, se debe controlar la cantidad de agua para generar la consistencia y resistencia deseadas.


- ✓ Para controlar la proporción de agua, en la mezcla preparada en obra se recomienda realizar pruebas de asentamiento (cono slump) y para verificar la resistencia tomar mínimo tres (3) cilindros.

- ✓ Las principales propiedades del concreto, tales como durabilidad, resistencia, manejabilidad, además de su apariencia final se logran necesariamente con un control de obra adecuado y el correspondiente control de calidad respectivo. Por esta razón

es importante realizar los ensayos sobre concreto fresco y endurecido de acuerdo a las normas vigentes correspondiente y por supuesto realizar un análisis de los resultados para verificar las resistencias de diseño.

- ✓ Vale aclarar que estos diseños solo aplican para estos agregados ya que estos dependen de las propiedades intrínsecas en de los materiales. Si por algún motivo se cambia algún agregado, este diseño no aplicaría y de manera inmediata se debe realizar un nuevo diseño.

- ✓ Cabe resaltar que el anterior diseño es preliminar hasta una ve haya cumplido con las fechas de ruptura de los cilindros de lo contrario puede cambiar su dosificación.



ING. LUIS FERNANDO RANGEL
MP. 25202-322135 CND

FORMATOS DE ENSAYOS

HOJA No. 1
DE 6

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA TEBAIDA EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
DIRIGIDO A :	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TEBAIDA		
PROCEDENCIA:	VÉLEZ - SANTANDER	**FECHA ENSAYO:**	26/11/2024
DESCRIPCION MATERIAL:	Material granular tipo grava de forma sub angular de color gris visos blancos		

ENSAYO DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO INV E-213. AGREGADO GRUESO (GRAVILLA)

ANTES DE LAVADO

No. PLATÓN	6B
PESO PLATÓN (g)	1052
PESO PLATÓN + MUESTRA (g)	5272
PESO MUESTRA (g)	4220


DESPUÉS DE LAVADO

PESO PLATÓN (g)	1052
PESO PLATÓN + MUESTRA (g)	5222
PESO MUESTRA SECA (g)	4170
PASA TAMIZ Nº 200 (%)	1,18

CORRECCIÓN

PESO TT DE LA MUESTRA (g)	4220
Σ PESOS RETENIDOS (g)	4216
ERROR (g)	4,00
ERROR (%)	0,09

TAMIZ Nº	DIÁMETRO (mm)	PESO RETENIDO (g)	PESO CORR (g)	%RETENIDO	%RETENIDO ACUMULADO	%QUE PASA
2"	50,8	0,0	0,00	0,00	0,00	100,00
11/2"	38,1	0,0	0,00	0,00	0,00	100,00
1"	25,00	0,0	0,00	0,00	0,00	100,00
3/4"	19,00	1822,0	1823,73	43,22	43,22	56,78
1/2"	12,50	2130,0	2132,02	50,52	93,74	6,26
3/8"	9,51	100,0	100,09	2,37	96,11	3,89
4	4,75	65,0	65,06	1,54	97,65	2,35
8	2,36	8,0	8,01	0,19	97,84	2,16
16	1,180	8,0	8,01	0,19	98,03	1,97
30	0,600	7,0	7,01	0,17	98,20	1,80
50	0,300	8,0	8,01	0,19	98,39	1,61
100	0,150	10,0	10,01	0,24	98,62	1,38
200	0,074	5,0	5,00	0,12	98,74	1,26
FONDO		53,00	53,05	1,26	100,00	0,00
Σ		4216,00	4220	100		

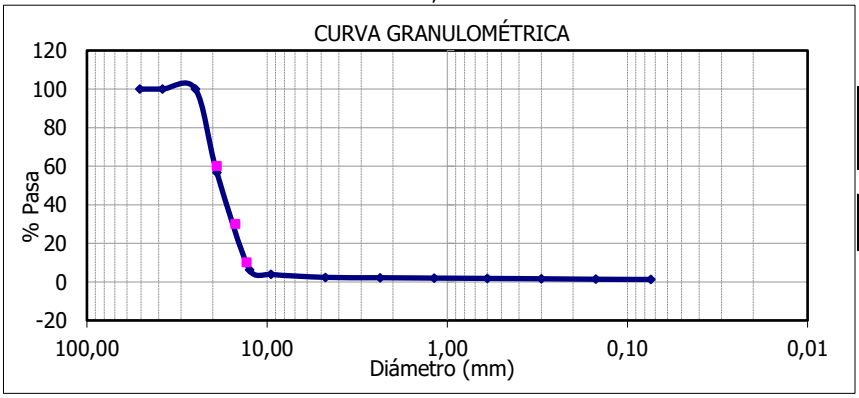

D60	19
D30	15,0
D10	13

Cc	0,9
Cu	1,5


ING. LUIS FERNANDO RANGEL
MP 25202-322135 CND

HOJA No. 2
DE 6

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA TEBAIDA EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
DIRIGIDO A :	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TEBAIDA		
PROCEDENCIA:	VÉLEZ - SANTANDER	**FECHA ENSAYO:**	26/11/2024
DESCRIPCION MATERIAL:	Material granular tipo grava de forma sub angular de color gris visos blancos		

FRANJA GRANULOMÉTRICA CONCRETO - INV- ART 630

AGREGADO TIPO AG - 50-1				
TAMIZ	DIÁMETRO	FRANJA ESPECIFICACIÓN		GRAVILLA
No	(mm)	% QUE PASA		% QUE PASA
2"	50,00	100	100	100,00
1 1/2"	37,50	95	100	100,00
3/4"	19,00	35	70	56,78
3/8"	9,50	10	30	3,89
N° 4	4,75	0	5	2,35

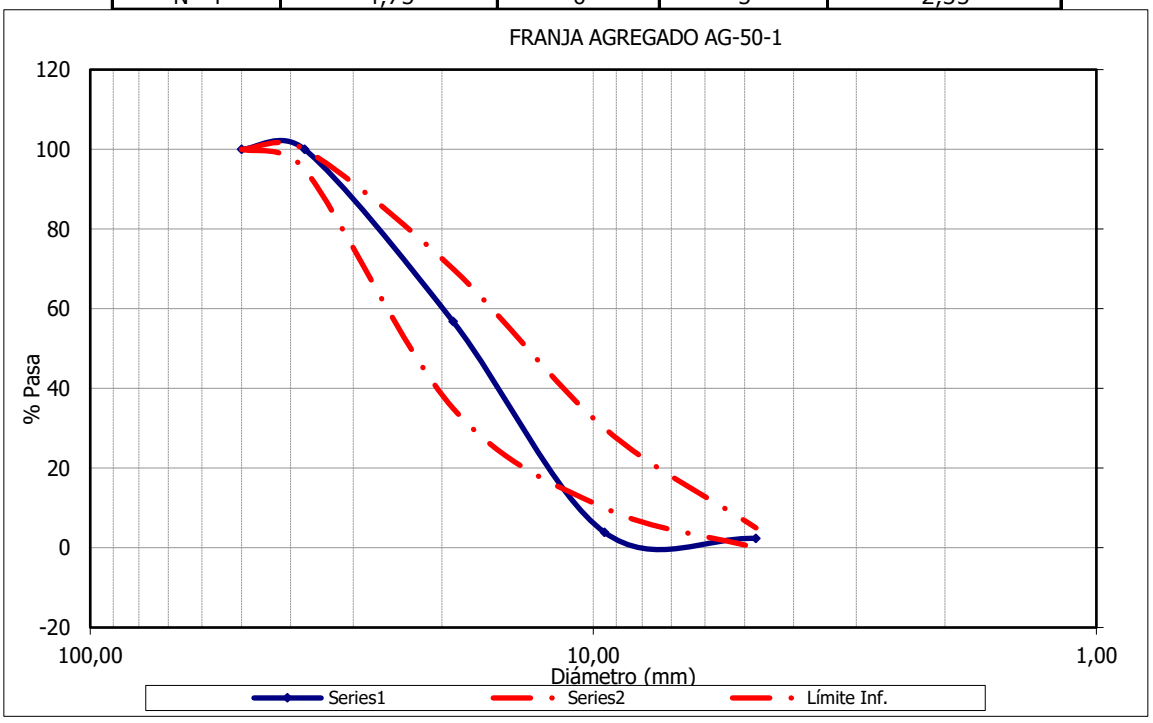

ING. LUIS FERNANDO RANGEL
MP 25202-322135 CND

HOJA No. 3
DE 6

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA TEBAIDA EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
DIRIGIDO A :	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TEBAIDA	FECHA ENSAYO:	26/11/2024
PROCEDENCIA:	PUERTO BERRIO		
DESCRIPCION MATERIAL:	Arena de rio de forma redondeada de color gris oscuro de consistencia rugosa.		

ENSAYO DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO INV E-213. AGREGADO FINO (ARENA)

ANTES DE LAVADO

No. PLATÓN	D
PESO PLATÓN (g)	1070
PESO PLATÓN + MUESTRA (g)	4455
PESO MUESTRA (g)	3385


DESPUÉS DE LAVADO (g)

PESO PLATÓN (g)	1070
PESO PLATÓN + MUESTRA (g)	4391
PESO MUESTRA SECA (g)	3321
PASA TAMIZ Nº 200 (%)	1,89

CORRECCIÓN

PESO TT DE LA MUESTRA (g)	3385
Σ PESOS RETENIDOS (g)	3382
ERROR (g)	3,0
ERROR (%)	0,09

TAMIZ Nº	DIÁMETRO (mm)	PESO RETENIDO (g)	PESO CORR (g)	%RETENIDO	%RETENIDO ACUMULADO	%QUE PASA
3/4"	19,10	0,0	0,00	0,00	0,00	100,00
1/2"	12,70	0,0	0,00	0,00	0,00	100,00
3/8"	9,51	9,0	9,01	0,27	0,27	99,73
4	4,76	99,0	99,09	2,93	3,19	96,81
8	2,36	260,0	260,23	7,69	10,88	89,12
16	1,180	508,0	508,45	15,02	25,90	74,10
30	0,600	1169,0	1170,04	34,57	60,47	39,53
50	0,300	884,0	884,78	26,14	86,61	13,39
100	0,150	314,0	314,28	9,28	95,89	4,11
200	0,075	75,0	75,07	2,22	98,11	1,89
FONDO		64,0	64,06	1,89	100,00	0,00
Σ		3382,0	3385,0	100,0		

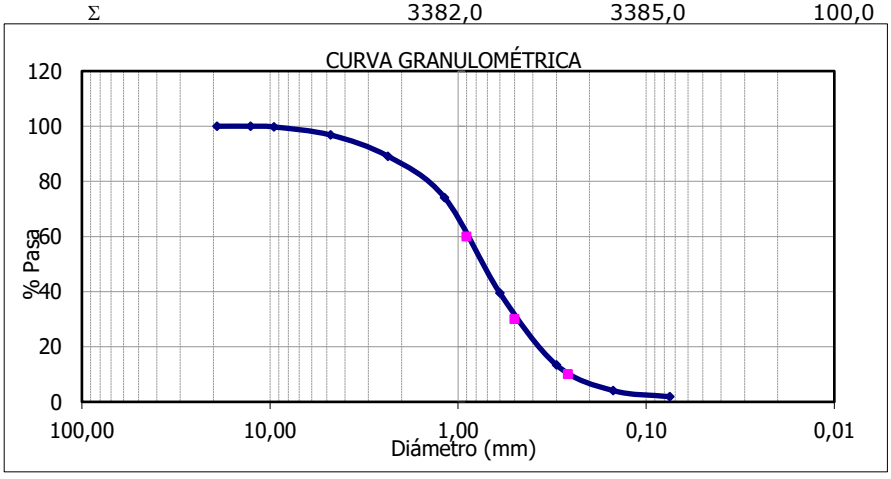

D60	0,9
D30	0,5
D10	0,26

Cc	1,1
Cu	3,5

Módulo de Finura ***2,83***

ING. LUIS FERNANDO RANGEL
MP 25202-322135 CND


Carrera 7 No 6-02 Avenida las Américas en Barbosa Santander- Colombia
Tel. Cel. 3144615974
E-mail:fwfgeoingenieria@gmal.com

HOJA No. 4
DE 6

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA TEBAIDA EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
DIRIGIDO A :	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TEBAIDA	FECHA ENSAYO:	26/11/2024
PROCEDENCIA:	PUERTO BERRIO		
DESCRIPCION MATERIAL:	Arena de rio de forma redondeada de color gris oscuro de consistencia rugosa.		

FRANJA GRANULOMÉTRICA - CONCRETO - AGREGADO FINO INV- ART 630

TAMIZ	DIÁMETRO	FRANJA ESPECIFICACIÓN		ARENA
No	(mm)	% QUE PASA		% QUE PASA
3/8"	9,50	100	100	99,73
4	4,75	95	100	96,81
8	2,36	80	100	89,12
16	1,19	50	85	74,10
30	0,60	25	60	39,53
50	0,30	10	30	13,39
100	0,150	2	10	4,11

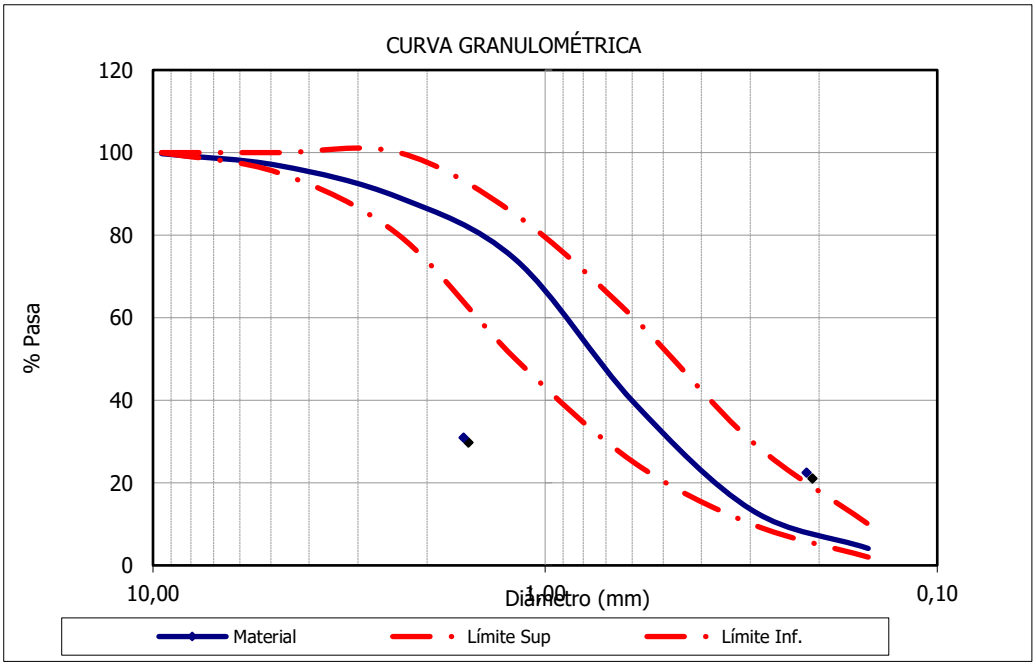

ING. LUIS FERNANDO RANGEL
MP 25202-322135 CND

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA TEBAIDA EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
DIRIGIDO A :	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TEBAIDA	FECHA ENSAYO:	26/11/2024
PROCEDENCIA:	MONIQUIRÁ Y PUERTO BERRIO		

PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN INV E -222, 223

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: Material granular tipo grava de forma sub angular de color gris visos blancos

No. PLATÓN	W
PESO DEL PLATÓN (g)	1004
PESO DEL PLATÓN +MUESTRA SSS (g)	3546
PESO DEL LASTRE + CANASTILLA (g)	1503
PESO LASTRE + CANASTILLA+ MUESTRA (g)	3115
PESO DEL PLATÓN + MUESTRA SECA (g)	3530

Peso Específico aparente (g/cm^3)	***2,716***
Peso Específico SSS (g/cm^3)	***2,73***
Peso Específico Nominal (g/cm^3)	***2,76***
% de Absorción	***0,63***

DESCRIPCION MATERIAL: Arena de rio de forma redondeada de color gris oscuro de consistencia rugosa.

No. PLATÓN	1
PESO DEL PLATÓN (g)	110,4
PESO DEL PLATÓN +MUESTRA SSS (g)	610,7
PESO MATRAZ + AGUA (25 ºC) (g)	733,1
PESO MATRAZ + AGUA + MUESTRA (25 ºC) (g)	1041,4
PESO DEL PLATÓN + MUESTRA SECA (g)	603,6

Peso Específico aparente (g/cm^3)	***2,569***
Peso Específico nominal (g/cm^3)	***2,67***
% de Absorción	***1,44***

MASA UNITARIA SUELTA Y COMPACTA INV E- 127

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: Material granular tipo grava de forma sub angular de color gris visos blancos

Masa Unitaria Suelta (Kg/m^3)	***1322,00***

DESCRIPCION MATERIAL: Arena de rio de forma redondeada de color gris oscuro de consistencia rugosa.


Masa Unitaria Suelta (Kg/m^3)	***1523,00***

ING. LUIS FERNANDO RANGEL
MP 25202-322135 CND

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA TEBAIDA EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
DIRIGIDO A :	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TEBAIDA	FECHA ENSAYO:	26/11/2024
PROCEDENCIA:	MONIQUIRA Y PESCADERO		

DOSIFICACIÓN DE LOS MATERIALES, MEZCLA DE CONCRETO HIDRÁULICO

TAMIZ		PORCENTAJE PASA				
Diámetro (mm)	Alterno	FRANJA RECOMENDADA TM 3/4"		GRAVILLA	ARENA	MEZCLA MATERIALES
50,8	2"	100	100	100,00	100	100,00
37,50	1 ½"	100	100	100,00	100,00	100,00
25,00	1"	100	100	100,00	100,00	100,00
19,00	3/4"	90	85	56,78	100,00	78,39
12,70	1/2"	78	68	6,26	100,00	53,13
9,50	3/8"	71	58	3,89	99,73	51,81
4,75	No.4	56	40	2,35	96,81	49,58
2,36	No.8	44	27	2,16	89,12	45,64
1,180	No.16	34	18	1,97	74,10	38,03
0,600	No.30	27	13	1,80	39,53	20,67
0,300	No.50	21	9	1,61	13,39	7,50
0,150	No.100	17	6	1,38	4,11	2,74
0,075	No.200	0	0	1,26	1,89	1,57
				0,00	0,00	

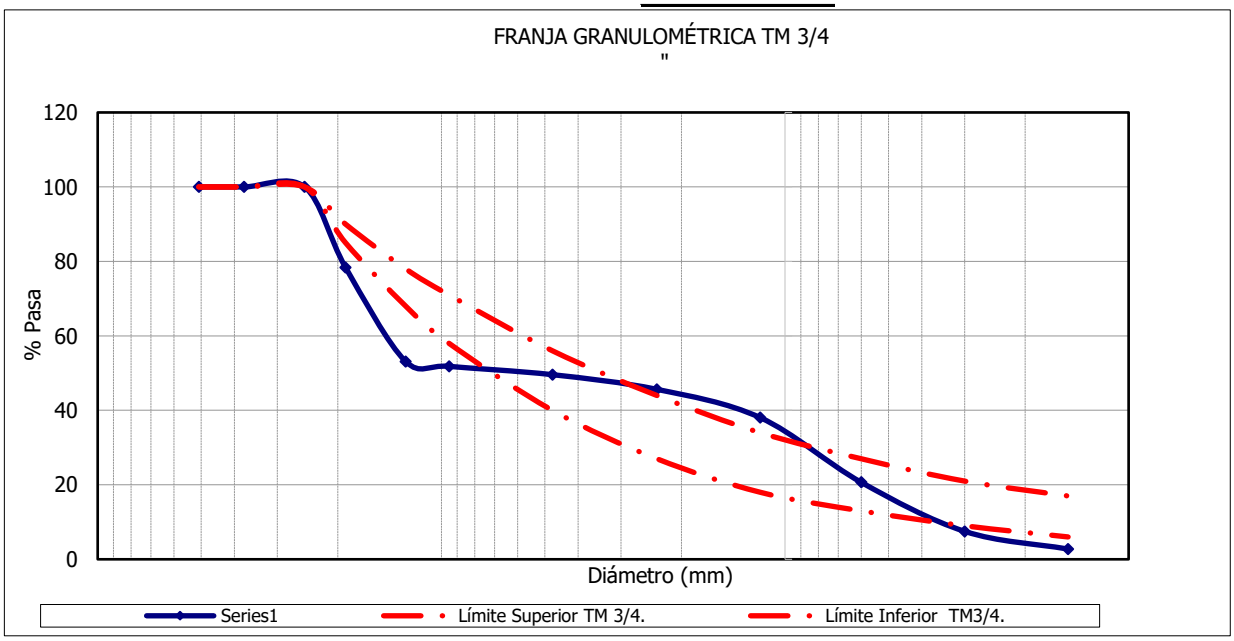

MATERIAL	
GRAVILLA	50%
ARENA	50%

ING. LUIS FERNANDO RANGEL
MP 25202-322135 CND

ENSAYOS REALIZADOS INTERVENTORÍA

FWF GEOINGENIERIA S.A.S
NIT: 900730123-4
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION


PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LO CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
MUNICIPIO:	VELEZ – SANTANDER	**FECHA DE TOMA:**	17 DE DICIEMBRE DE 2024
DIRIGIDO A:	TERRA INGENIEROS S.A.S.		
PROCEDENCIA:	CANTERA METRÓPOLIS - MONIQUIRÁ BOYACÁ		
CAPA:	SUB BASE GRANULAR		

TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE ARENA INV E- 161

DENSIDAD No	1	2	3
PROFUNDIDAD (cm)	11	11	11
LUGAR	VEREDA TEBAIDA K0+115 EJE	VEREDA TEBAIDA K0+075 CARRIL DER	VEREDA TEBAIDA K0+040 EJE
Peso frasco + cono + arena (i) (g)	6617	6562	6513
Peso frasco + cono + arena (f) (g)	2883	2919	3073
Peso arena total usada (g)	3734	3643	3440
Constante del cono (g)	1614	1614	1614
Peso arena en el hueco (g)	2120	2029	1826
Densidad de la arena (g/cm^3)	1.41	1.41	1.41
Volumen del orificio (cm^3)	1503.5	1439.0	1295.0
Peso material extraído (g)	3564	3689	3049
Peso de sobretamaños (g)	979	828	805
% de sobretamaños	27.47	22.45	26.40
Densidad Húmeda (Kg/m^3)	2370.40	2563.57	2354.38
Densidad Húmeda (lb/pie^3)	147.85	159.89	146.85
Humedad (%)	5.94	5.40	4.48
Densidad Seca (Kg/m3) (Terreno)	*2237.50*	*2432.18*	*2253.49*
Densidad Máxima Seca (Kg/m3) (P.M)	*2343*	*2343*	*2343*
% Compactación	**95.5**	**103.8**	**96.2**

HUMEDAD (%)

No Cápsula	31	24	8A
Peso Cápsula (g)	42.7	42.7	42.5
Peso Cápsula + Muestra hum. (g)	436.9	489.5	560.6
Peso Cápsula + Muestra seca (g)	414.8	466.6	538.4
Humedad (%)	5.94	5.40	4.48



ING FREDY YESID DUARTE OLACHICA
MP 01109-0989 CPITV

FWF GEOINGENIERIA S.A.S
NIT: 900730123-4
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION

FECHA: DICIEMBRE 19 DE 2024

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO. INV. E - 410 ASTM C39

PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LO CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2
MUNICIPIO	BOLIVAR SANTANDER
DIRIGIDO A:	TERRA INGENIEROS S.A.S.
RESISTENCIA DE DISEÑO:	CONCRETO f´c = 3000 Psi. (210 Kg/cm2)

No.	Tipo	Fecha	Fecha	Edad	Diámetro	Altura	Peso	Área	Densidad	Carga	R:	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			Tipo de
Cilindro	**Estructura**	**Vaciado**	**Rotura**	**Días**	(Cm)	(Cm)	(g)	(Cm^2)	(kg/cm^3)	(kG)	**L/d**	(Kg/Cm^2)	(Psi)	(%)	**Falla**
11	CUNETA VEREDA GUAMAL KO+040	21/11/24	19/12/24	28	15.10	30.10	12652	177.89	2367	41760	2.00	**234.75**	**3338.87**	**111.30**	T3
					15.00	30.00									
12	CUNETA VEREDA GUAMAL KO+040	21/11/24	19/12/24	28	15.00	30.00	12654	177.89	2371	41610	1.99	**233.90**	**3326.88**	**110.90**	T4
					15.10	30.00									

INFORMACÓN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO			
NUMERO	IM-5230	**MODELO**	TM12
INSTRUMENTO	Maquina de Ensayo a Compresión	**No. DE SERIE EQ.**	159
FABRICANTE	TAMIEQUIPOS LTDA.		

ING. FREDY YESID DUARTE OLACHICA
M.P 01109-0989 CPITV

LABORATORIO
SUELOS – CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CARRRERA 7 # 5C-43 AVENIDA DE LAS AMERICAS BARBOSA SANTADER- COLOMBIA
E-mail: fwfgeoingenieria@gmail.com
CONTACTOS: 3103257287

FWF GEOINGENIERIA S.A.S
NIT: 900730123-4
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION

FECHA: DICIEMBRE 31 DE 2024

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO. INV. E - 410 ASTM C39

PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LO CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2
MUNICIPIO	GUAVATA SANTANDER
DIRIGIDO A:	TERRA INGENIEROS S.A.S.
RESISTENCIA DE DISEÑO:	CONCRETO f´c = 3000 Psi. (210 Kg/cm2)

No.	Tipo	Fecha	Fecha	Edad	Diámetro	Altura	Peso	Área	Densidad	Carga	R:	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			Tipo de
Cilindro	Estructura	Vaciado	Rotura	Días	(Cm)	(Cm)	(g)	(Cm^2)	(kg/cm^3)	(kG)	L/d	(Kg/Cm^2)	(Psi)	(%)	Falla
15	PLACA HUELLA VEREDA POPOA	03/12/24	31/12/24	28	15.10	30.00	12580	177.89	2357	40342	1.99	**225.26**	**3218.00**	**107.27**	T5
					15.00	30.00									
16	PLACA HUELLA VEREDA POPOA	03/12/24	31/12/24	28	15.10	30.00	12644	180.27	2338	39724	1.98	**218.90**	**3127.14**	**104.24**	T3
					15.20	30.00									

INFORMACÓN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO

NUMERO	IM-5230	**MODELO**	TM12
INSTRUMENTO	Maquina de Ensayo a Compresión	**No. DE SERIE EQ.**	159
FABRICANTE	TAMIEQUIPOS LTDA.		

ING. FREDY YESID DUARTE OLACHICA
M.P 01109-0989 CPITV

LABORATORIO
SUELOS – CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CARRRERA 7 # 5C-43 AVENIDA DE LAS AMERICAS BARBOSA SANTADER- COLOMBIA
E-mail: fwfgeoingenieria@gmail.com
CONTACTOS: 3103257287

FWF GEOINGENIERIA S.A.S
NIT: 900730123-4
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION

FECHA: ENERO 07 DE 2025

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO. INV. E - 410 ASTM C39

PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LO CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2
MUNICIPIO	BOLIVAR SANTANDER
DIRIGIDO A:	TERRA INGENIEROS S.A.S.
RESISTENCIA DE DISEÑO:	CONCRETO f´c = 3000 Psi. (210 Kg/cm2)

No.	Tipo	Fecha	Fecha	Edad	Diámetro	Altura	Peso	Área	Densidad	Carga	R:	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			Tipo de
Cilindro	**Estructura**	**Vaciado**	**Rotura**	**Días**	(Cm)	(Cm)	(g)	(Cm^2)	(kg/cm^3)	(kG)	**L/d**	(Kg/Cm^2)	(Psi)	(%)	**Falla**
13	**CUNETA VEREDA GUAMAL KO+020**	10/12/24	07/01/25	28	15.00	30.00	12456	176.71	2350	41020	2.00	**232.13**	**3301.60**	**110.05**	T4
					15.00	30.00									
14	**CUNETA VEREDA GUAMAL KO+120**	10/12/24	07/01/25	28	15.10	30.00	12474	179.08	2322	39920	1.99	**222.92**	**3170.65**	**105.69**	T4
					15.10	30.00									

INFORMACÓN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO			
NUMERO	IM-5230	**MODELO**	TM12
INSTRUMENTO	Maquina de Ensayo a Compresión	**No. DE SERIE EQ.**	159
FABRICANTE	TAMIEQUIPOS LTDA.		

ING. FREDY YESID DUARTE OLACHICA
M.P 01109-0989 CPITV

LABORATORIO
SUELOS – CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CARRRERA 7 # 5C-43 AVENIDA DE LAS AMERICAS BARBOSA SANTADER- COLOMBIA
E-mail: fwfgeoingenieria@gmail.com
CONTACTOS: 3103257287


FWF GEOINGENIERIA S.A.S
NIT: 900730123-4
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION

FECHA: ENERO 07 DE 2024

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO. INV. E - 410 ASTM C39

PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LO CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2
MUNICIPIO	GUAVATA SANTANDER
DIRIGIDO A:	TERRA INGENIEROS S.A.S.
RESISTENCIA DE DISEÑO:	CONCRETO f´c = 3000 Psi. (210 Kg/cm2)

No.	Tipo	Fecha	Fecha	Edad	Diámetro	Altura	Peso	Área	Densidad	Carga	R:	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			Tipo de
Cilindro	**Estructura**	**Vaciado**	**Rotura**	**Días**	(Cm)	(Cm)	(g)	(Cm^2)	(kg/cm^3)	(kG)	**L/d**	(Kg/Cm^2)	(Psi)	(%)	**Falla**
17	**CUNETAS VEREDA POPOA**	10/12/24	07/01/25	28	15.00	30.00	12372	176.71	2330	43890	2.00	**248.37**	**3532.60**	**117.75**	T4
					15.00	30.10									



ING. FREDY YESID DUARTE OLACHICA
M.P 01109-0989 CPITV

INFORMACÓN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO			
NUMERO	IM-5230	**MODELO**	TM12
INSTRUMENTO	Maquina de Ensayo a Compresión	**No. DE SERIE EQ.**	159
FABRICANTE	TAMIEQUIPOS LTDA.		

LABORATORIO
SUELOS – CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CARRRERA 7 # 5C-43 AVENIDA DE LAS AMERICAS BARBOSA SANTADER- COLOMBIA
E-mail: fwfgeoingenieria@gmail.com
CONTACTOS: 3103257287

FWF GEOINGENIERIA S.A.S
NIT: 900730123-4
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION

FECHA: DICIEMBRE 09 DE 2024

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO. INV. E - 410 ASTM C39

PROYECTO:	"ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - CONVENIO 3951
MUNICIPIO	BOLIVAR SANTANDER
DIRIGIDO A:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR
RESISTENCIA DE DISEÑO:	CONCRETO f´c = 3000 Psi. (210 Kg/cm2)

No.	Tipo	Fecha	Fecha	Edad	Diámetro	Altura	Peso	Área	Densidad	Carga	R:	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			Tipo de
Cilindro	Estructura	Vaciado	Rotura	Días	(Cm)	(Cm)	(g)	(Cm^2)	(kg/cm^3)	(kG)	L/d	(Kg/Cm^2)	(Psi)	(%)	Falla
1	PLACA HUELLA VEREDA GUAMAL KO+020	11/11/24	09/12/24	28	15.20	30.10	12733	180.27	2343	48060	1.99	**266.61**	**3792.02**	**126.40**	T4
					15.10	30.20									
2	PLACA HUELLA VEREDA GUAMAL KO+020	11/11/24	09/12/24	28	15.00	30.00	12686	177.89	2373	50300	2.00	**282.75**	**4021.67**	**134.06**	T4
					15.10	30.10									

INFORMACÓN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO			
NUMERO	IM-5230	**MODELO**	TM12
INSTRUMENTO	Maquina de Ensayo a Compresión	**No. DE SERIE EQ.**	159
FABRICANTE	TAMIEQUIPOS LTDA.		

ING. FREDY YESID DUARTE OLACHICA
M.P 01109-0989 CPITV

LABORATORIO
SUELOS – CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CARRRERA 7 # 5C-43 AVENIDA DE LAS AMERICAS BARBOSA SANTADER- COLOMBIA
E-mail: fwfgeoingenieria@gmail.com
CONTACTOS: 3103257287


FWF GEOINGENIERIA S.A.S
NIT: 900730123-4
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION

FECHA: ENERO 08 DE 2025

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO. INV. E - 410 ASTM C39

PROYECTO:	"ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - CONVENIO 3951
MUNICIPIO	BOLIVAR SANTANDER
DIRIGIDO A:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR
RESISTENCIA DE DISEÑO:	CONCRETO f´c = 3000 Psi. (210 Kg/cm2)

No.	Tipo	Fecha	Fecha	Edad	Diámetro	Altura	Peso	Área	Densidad	Carga	R:	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			Tipo de
Cilindro	Estructura	Vaciado	Rotura	Días	(Cm)	(Cm)	(g)	(Cm^2)	(kg/cm^3)	(kG)	L/d	(Kg/Cm^2)	(Psi)	(%)	Falla
1	CUNETA VEREDA GUAMAL KO+140	11/12/24	08/01/25	28	15.00	30.00	12467	177.89	2336	38100	1.99	**214.17**	**3046.24**	**101.54**	T5
					15.10	30.00									
2	CUNETA VEREDA GUAMAL KO+140	11/12/24	08/01/25	28	15.00	30.00	12517	176.71	2361	39410	2.00	**223.01**	**3172.02**	**105.73**	T4
					15.00	30.00									



ING. FREDY YESID DUARTE OLACHICA
M.P 01109-0989 CPITV

INFORMACÓN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO			
NUMERO	IM-5230	**MODELO**	TM12
INSTRUMENTO	Maquina de Ensayo a Compresión	**No. DE SERIE EQ.**	159
FABRICANTE	TAMIEQUIPOS LTDA.		

LABORATORIO
SUELOS – CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CARRRERA 7 # 5C-43 AVENIDA DE LAS AMERICAS BARBOSA SANTADER- COLOMBIA
E-mail: fwfgeoingenieria@gmail.com
CONTACTOS: 3103257287

FWF GEOINGENIERIA S.A.S
NIT: 900730123-4
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION


PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LO CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
MUNICIPIO:	VELEZ – SANTANDER	**FECHA DE TOMA:**	14 DE ENERO DE 2025
DIRIGIDO A:	TERRA INGENIEROS S.A.S.		
PROCEDENCIA:	CANTERA METRÓPOLIS - MONIQUIRÁ BOYACÁ		
CAPA:	SUB BASE GRANULAR		

TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO METODO DEL CONO DE ARENA INV E- 161

DENSIDAD No	1	2	3
PROFUNDIDAD (cm)	11	11	11
LUGAR	VEREDA GAITAL K0+090 CARRIL IZQ	VEREDA GAITAL K0+060 CARRIL DER	VEREDA GAITAL K0+020 CARRIL IZQ
Peso frasco + cono + arena (i) (g)	6210	6173	6132
Peso frasco + cono + arena (f) (g)	2621	2624	2490
Peso arena total usada (g)	3589	3549	3642
Constante del cono (g)	1614	1614	1614
Peso arena en el hueco (g)	1975	1935	2028
Densidad de la arena (g/cm^3)	1.41	1.41	1.41
Volumen del orificio (cm^3)	1400.7	1372.3	1438.3
Peso material extraído (g)	3407	3359	3358
Peso de sobretamaños (g)	889	792	874
% de sobretamaños	26.09	23.58	26.03
Densidad Húmeda (Kg/m^3)	2432.34	2447.64	2334.70
Densidad Húmeda (lb/pie^3)	151.71	152.66	145.62
Humedad (%)	4.80	3.31	3.71
Densidad Seca (Kg/m3) (Terreno)	*2321.02*	*2369.22*	*2251.09*
Densidad Máxima Seca (Kg/m3) (P.M)	*2343*	*2343*	*2343*
% Compactación	**99.1**	**101.1**	**96.1**

HUMEDAD (%)

No Cápsula	M10	M2	12X
Peso Cápsula (g)	38.4	40.3	35.2
Peso Cápsula + Muestra hum. (g)	418.6	380.5	428.9
Peso Cápsula + Muestra seca (g)	401.2	369.6	414.8
Humedad (%)	4.80	3.31	3.71



ING FREDY YESID DUARTE OLACHICA
MP 01109-0989 CPITV

FWF GEOINGENIERIA S.A.S
NIT: 900730123-4
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION

FECHA: ENERO 17 DE 2025

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO. INV. E - 410 ASTM C39

PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LO CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2
MUNICIPIO	VELEZ SANTANDER
DIRIGIDO A:	TERRA INGENIEROS S.A.S.
RESISTENCIA DE DISEÑO:	CONCRETO f´c = 3000 Psi. (210 Kg/cm2)

No.	Tipo	Fecha	Fecha	Edad	Diámetro	Altura	Peso	Área	Densidad	Carga	R:	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			Tipo de
Cilindro	**Estructura**	**Vaciado**	**Rotura**	**Días**	(Cm)	(Cm)	(g)	(Cm^2)	(kg/cm^3)	(kG)	**L/d**	(Kg/Cm^2)	(Psi)	(%)	**Falla**
22	PLACA HUELLA VEREDA LA PALMERA K0+100	20/12/24	17/01/25	28	15.30	30.10	12551	183.85	2264	40790	1.97	**221.86**	**3155.61**	**105.19**	T5
					15.30	30.20									
23	PLACA HUELLA VEREDA LA PALMERA K0+100	20/12/24	17/01/25	28	15.10	30.30	12512	180.27	2294	40560	2.00	**225.00**	**3200.25**	**106.68**	T4
					15.20	30.20									

INFORMACÓN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO			
NUMERO	IM-5230	**MODELO**	TM12
INSTRUMENTO	Maquina de Ensayo a Compresión	**No. DE SERIE EQ.**	159
FABRICANTE	TAMIEQUIPOS LTDA.		

ING. FREDY YESID DUARTE OLACHICA
M.P 01109-0989 CPITV

LABORATORIO
SUELOS – CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CARRRERA 7 # 5C-43 AVENIDA DE LAS AMERICAS BARBOSA SANTADER- COLOMBIA
E-mail: fwfgeoingenieria@gmail.com
CONTACTOS: 3103257287

FWF GEOINGENIERIA S.A.S
NIT: 900730123-4
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION

FECHA: ENERO 14 DE 2025

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO. INV. E - 410 ASTM C39

PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LO CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2
MUNICIPIO	VELEZ SANTANDER
DIRIGIDO A:	TERRA INGENIEROS S.A.S.
RESISTENCIA DE DISEÑO:	CONCRETO f´c = 3000 Psi. (210 Kg/cm2)

No.	Tipo	Fecha	Fecha	Edad	Diámetro	Altura	Peso	Área	Densidad	Carga	R:	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			Tipo de
Cilindro	Estructura	Vaciado	Rotura	Días	(Cm)	(Cm)	(g)	(Cm^2)	(kg/cm^3)	(kG)	L/d	(Kg/Cm^2)	(Psi)	(%)	Falla
18	CUNETA VEREDA TUBAVITA TRAMO 2	09/12/24	14/01/25	36	15.10	30.40	13132	180.27	2392	39320	2.01	**218.12**	**3102.42**	**103.41**	T3
					15.20	30.50									
19	CUNETA VEREDA TUBAVITA TRAMO 2	09/12/24	14/01/25	36	15.10	30.50	13111	179.08	2400	38480	2.02	**214.88**	**3056.28**	**101.88**	T5
					15.10	30.50									
20	PLACA HUELLA VEREDA TUBAVITA TRAMO 2	10/12/24	14/01/25	35	15.20	30.20	12953	181.46	2360	41880	1.99	**230.80**	**3282.70**	**109.42**	T3
					15.20	30.30									
21	PLACA HUELLA VEREDA TUBAVITA TRAMO 2	10/12/24	14/01/25	35	15.20	30.30	12992	180.27	2379	40340	2.00	**223.78**	**3182.90**	**106.10**	T3
					15.10	30.30									

INFORMACÓN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO

NUMERO	IM-5230	**MODELO**	TM12
INSTRUMENTO	Maquina de Ensayo a Compresión	**No. DE SERIE EQ.**	159
FABRICANTE	TAMIEQUIPOS LTDA.		

ING. FREDY YESID DUARTE OLACHICA
M.P 01109-0989 CPITV

LABORATORIO
SUELOS – CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CARRRERA 7 # 5C-43 AVENIDA DE LAS AMERICAS BARBOSA SANTADER- COLOMBIA
E-mail: fwfgeoingenieria@gmail.com
CONTACTOS: 3103257287

FWF GEOINGENIERIA S.A.S
NIT: 900730123-4
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION

FECHA: ENERO 23 DE 2025

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO. INV. E - 410 ASTM C39

PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LO CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2
MUNICIPIO	VELEZ SANTANDER
DIRIGIDO A:	TERRA INGENIEROS S.A.S.
RESISTENCIA DE DISEÑO:	CONCRETO f´c = 3000 Psi. (210 Kg/cm2)

No.	Tipo	Fecha	Fecha	Edad	Diámetro	Altura	Peso	Área	Densidad	Carga	R:	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			Tipo de
Cilindro	**Estructura**	**Vaciado**	**Rotura**	**Días**	(Cm)	(Cm)	(g)	(Cm^2)	(kg/cm^3)	(kG)	**L/d**	(Kg/Cm^2)	(Psi)	(%)	**Falla**
24	PLACA HUELLA VEREDA LA PALMERA K0+110	26/12/24	23/01/25	28	15.30	30.20	12602	182.65	2288	43740	1.98	**239.47**	**3406.05**	**113.53**	T4
					15.20	30.10									
25	PLACA HUELLA VEREDA LA PALMERA K0+110	26/12/24	23/01/25	28	15.10	30.00	12517	180.27	2311	47890	1.98	**265.66**	**3778.60**	**125.95**	T4
					15.20	30.10									

INFORMACÓN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO			
NUMERO	IM-5230	**MODELO**	TM12
INSTRUMENTO	Maquina de Ensayo a Compresión	**No. DE SERIE EQ.**	159
FABRICANTE	TAMIEQUIPOS LTDA.		

ING. FREDY YESID DUARTE OLACHICA
M.P 01109-0989 CPITV

LABORATORIO
SUELOS – CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CARRRERA 7 # 5C-43 AVENIDA DE LAS AMERICAS BARBOSA SANTADER- COLOMBIA
E-mail: fwfgeoingenieria@gmail.com
CONTACTOS: 3103257287

ANEXO.
AUXILIAR DETALLADO

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.

Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO	CODIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No. 3951 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
6	ADMINISTRATIVOS	$ 110.539,00	17-sept-24	CHEQUE	000001	DSJG4	ESTUDIOS Y DISEÑOS	JAN MAURICIO RAMOS DELGADO	79618396	CARRERA 79 # 5-27 SUR BL 10 AP 504 BOGOTA DC	3246533939	baccoramos54@gmail.com	$ 2.250.000,00		$ 2.250.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.250.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		17-sept-24	CHEQUE	000002	DSJG1	Gastos de representación-Auxilio transporte OAC	VICTOR MANUEL GALEANO ARIZA	13707463	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3144071930	JACGUAMALBOLIVAR@GMAIL.COM	$ 400.000,00		$ 400.000,00				$ 400.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		17-sept-24	CHEQUE	000004	DSJG2	PAPELERIA	VICTOR MANUEL GALEANO ARIZA	13707463	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3144071930	JACGUAMALBOLIVAR@GMAIL.COM	$ 300.000,00		$ 300.000,00				$ 300.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		17-sept-24	CHEQUE	000005	DSJG3	NOMINA - Honorario contador mes AGOSTO	NANCY ANDREA DURAN VALDIVIESO	28034878	CARRERA 3 # 8-38 BOLIVAR SANTANDER	3115249248	NDURANVALDIVIESO@GMAIL.COM	$ 1.960.000,00		$ 1.960.000,00				$ 1.960.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		17-sept-24	CHEQUE	000006	DSJG5	NOMINA - Ingeniero residente de obra - Mes 1	ALDAHIR PEÑA HERNANDEZ	1098221481	CALLE 1C # 16-39 PIEDECUESTA SANTANDER	3203706444	ING.ALDAHIR97@GMAIL.COM	$ 3.500.000,00		$ 3.500.000,00				$ 3.500.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		1-oct-24	CHEQUE	000003	CC 5	PAGO DE POLIZAS	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	860037013	CARRERA 36 51-122 BARR CABECERA DEL LLANO BUCARAMANGA SANTANDER		SERVICIOFACTURAELETRONICA@SEGUROSMUNDIAL.COM.CO	$ 1.905.089,41	$ -	$ 1.905.089,41	$ -	$ -	$ -	$ 1.905.089,41		
6	ADMINISTRATIVOS		1-oct-24	CHEQUE	000007	DSJG8	Gastos de representación-Auxilio transporte Septiembe OAC	VICTOR MANUEL GALEANO ARIZA	13707463	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3144071930	JACGUAMALBOLIVAR@GMAIL.COM	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS	$ 114.965,00	7-oct-24	CHEQUE	000010	DSJG9	NOMINA - Honorario contador mes JULIO	NANCY ANDREA DURAN VALDIVIESO	28034878	CARRERA 3 # 8-38 BOLIVAR SANTANDER	3115249248	NDURANVALDIVIESO@GMAIL.COM	$ 768.200,00	$ -	$ 768.200,00	$ -	$ -	$ -	$ 768.200,00		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		29-oct-24	CHEQUE	000012	DSJG14	ALQUILER DE ORUGA RETRO POR 11,5 HORAS	MIGUEL ANTONIO BAREÑO BAREÑO	91018816	CARRERA 5 # 3-36 BARBOSA SANTANDER	3202326537	MIGUELITO1984081 3@GMAIL.COM	$ 1.495.000,00	$ -	$ 1.495.000,00	$ -	$ 59.800,00	$ -	$ 1.435.200,00		
4	TRANSPORTES		29-oct-24	CHEQUE	000012	DSJG15	TRANSPORTE DE ORUGA	MIGUEL ANTONIO BAREÑO BAREÑO	91018816	CARRERA 5 # 3-36 BARBOSA SANTANDER	3202326537	MIGUELITO1984081 3@GMAIL.COM	$ 650.000,00	$ -	$ 650.000,00	$ -	$ 6.500,00	$ -	$ 643.500,00		
6	ADMINISTRATIVOS		29-oct-24	CHEQUE	13	DSJG11	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	MIGUEL ANGEL PARDO BARRERA	1101752935	CALLE 8 2 ESTE CA 34 BARRIO LA ROSITA VELEZ SANTANDER	3118974205	MIGUELPARDOTOPOGRAFO@HOTMAIL.COM	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000,00		
4	TRANSPORTES		29-oct-24	CHEQUE	14	DSJG12	14 VIAJES DE MATERIAL DESDE MONIQUIRA A BOLIVAR	ALIRIO RODRIGUEZ ROJAS	91450072	URB SAN CARLOS DEL RIO LOTE 15 BARBOSA SANTANDER	3118591113	RODRIGUEZALIRIO785@GMAIL.COM	$ 9.100.000,00	$ -	$ 9.100.000,00	$ -	$ 91.000,00	$ -	$ 9.009.000,00		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		29-oct-24	CHEQUE	16	DSJG13	ALQUILER VIBROCOMPACTADOR 17 HORAS	RENE MAURICIO GONZALEZ FANDIÑO	13617030	CALLE 77A # 73-36 AP 211 BOGOTA D.C.	3118761253	rene.mauricio16@gmail.com	$ 2.380.000,00	$ -	$ 2.380.000,00	$ -	$ 95.200,00	$ -	$ 2.284.800,00		
6	ADMINISTRATIVOS		29-oct-24	CHEQUE	17	DSJG17	DOTACIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SGSST	FERNEY ALEJANDRO SANCHEZ GRIMALDO	1049608353	CARRERA 10 # 29-23 TUNJA BOYACA	3004936900	FERALEJO6@HOTMAIL.COM	$ 1.682.000,00	$ -	$ 1.682.000,00	$ -	$ 42.050,00	$ -	$ 1.639.950,00		
2	MATERIAL		29-oct-24	CHEQUE	18	FEAL67	COMPRA DE ARENA, CEMENTO, VARILLA Y ALAMBRE	YEISON ALEXANDER BARRAGAN MOGOLLON	13707217	CARRERA 3 # 8-70 BOLIVAR SANTANDER	3143871002	EDICAMILO24@GMAIL.COM	$ 20.228.500,00	$ -	$ 20.228.500,00	$ -	$ 425.174,30	$ -	$ 19.803.325,70		
6	ADMINISTRATIVOS		29-oct-24	CHEQUE	19	DSJG16	Gastos de representación-Auxilio transporte Octubre OAC	VICTOR MANUEL GALEANO ARIZA	13707463	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3144071930	JACGUAMALBOLIVAR@GMAIL.COM	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		29-oct-24	CHEQUE	20	DSJG17	NOMINA - Honorario contador mes 2 Septiembre	NANCY ANDREA DURAN VALDIVIESO	28034878	CARRERA 3 # 8-38 BOLIVAR SANTANDER	3115249248	NDURANVALDIVIESO@GMAIL.COM	$ 1.960.000,00	$ -	$ 1.960.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.960.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		7-oct-24	CHEQUE	11	DSJG10	PAPELERIA	VICTOR MANUEL GALEANO ARIZA	13707463	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3144071930	JACGUAMALBOLIVAR@GMAIL.COM	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 300.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		29-oct-24	CHEQUE	21	DSJG18	EXAMENES OCUPACIONALES	YENY CECILIA RODRIGUEZ VALLE	32763815	CARRERA 2 # 77-72 CA 1 VELEZ SANTANDER	3115922224	YEROVAOCUPACIONALSAS@GMAIL.COM	$ 280.000,00	$ -	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 280.000,00		
2	MATERIALES		5-nov-24	CHEQUE	23	DSJG20	COMPRA DE MADERA	SAMUEL VARGAS SANTAMARIA	5771976	CALLE 10 # 5-82 BARRIO EL DIAMANTE BOLIVAR SANTANDER	3125479810	ERIKAARIZA1096@GMAIL.COM	$ 3.690.000,00	$ -	$ 3.690.000,00	$ -	$ 129.150,00	$ -	$ 3.560.850,00		
4	TRANSPORTES		5-nov-24	CHEQUE	24	DSJG19	15 VIAJES DE MATERIAL DESDE MONIQUIRA A BOLIVAR	ALIRIO RODRIGUEZ ROJAS	91450072	URB SAN CARLOS DEL RIO LOTE 15 BARBOSA SANTANDER	3118591113	RODRIGUEZALIRIO785@GMAIL.COM	$ 9.750.000,00	$ -	$ 9.750.000,00	$ -	$ 97.500,00	$ -	$ 9.652.500,00		
2	MATERIALES		5-nov-24	CHEQUE	25	FECC55	COMPRA DE SUBBASE, GRAVILLA Y PIEDRA RAJON	CANTERA EL CAIRO SAS	900729004	CARRERA 29 # 18-24 BOGOTA	3133393821	ACEVEDOJORGE2011@HOTMAIL.COM	$ 13.440.000,00	$ 2.553.600,00	$ 15.993.600,00	$ -	$ 336.000,00	$ -	$ 15.657.600,00		
0	PAGO DE IMPUESTOS		24-nov-24	CHEQUE	26	351061299900 2	Retencion en la Fuente MES DE OCTUBRE DE 2024	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	800197168				$ 254.000,00		$ 254.000,00				$ 254.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		24-nov-24	CHEQUE	27	FE-296	TOMA DE DENSIDADES POR METODO DE CONO Y ARENA POR DIA	FWF GEOINGENIERIA SAS	900730123	CARRERA 7 SC-43 LC 1 BARBOSA SANTANDER	3103257287	FWFGEOINGENIERIA@GMAIL.COM	$ 769.930,00		$ 769.930,00		$ 25.880,00		$ 744.050,00		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		24-nov-24	CHEQUE	28	DSJG31	ALQUILER DE ORUGA RETRO POR 24,7 HORAS	MIGUEL ANTONIO BAREÑO BAREÑO	91018816	CARRERA 5 # 3-36 BARBOSA SANTANDER	3202326537	MIGUELITO1984081 3@GMAIL.COM	$ 3.211.000,00		$ 3.211.000,00		$ 128.440,00		$ 3.082.560,00		
4	TRANSPORTES		24-nov-24	CHEQUE	28	DSJG30	TRANSPORTE DE ORUGA	MIGUEL ANTONIO BAREÑO BAREÑO	91018816	CARRERA 5 # 3-36 BARBOSA SANTANDER	3202326537	MIGUELITO1984081 3@GMAIL.COM	$ 650.000,00		$ 650.000,00		$ 6.500,00		$ 643.500,00		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		24-nov-24	CHEQUE	29	DSJG25	ALQUILER VIBROCOMPACTADOR 26 HORAS	RENE MAURICIO GONZALEZ FANDIÑO	13617030	CALLE 77A # 73-36 AP 211 BOGOTA D.C.	3118761253	rene.mauricio16@gmail.com	$ 3.640.000,00	$ -	$ 3.640.000,00	$ -	$ 145.600,00	$ -	$ 3.494.400,00		
4	TRANSPORTES		24-nov-24	CHEQUE	29	DSJG26	TRANSPORTE DE VIBROCOMPACTADOR	RENE MAURICIO GONZALEZ FANDIÑO	13617030	CALLE 77A # 73-36 AP 211 BOGOTA D.C.	3118761253	rene.mauricio16@gmail.com	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -	$ 15.000,00	$ -	$ 1.485.000,00		
2	MATERIALES		24-nov-24	CHEQUE	30	FEAL68	COMPRA DE ARENA, CEMENTO, VARILLA Y ALAMBRE	YEISON ALEXANDER BARRAGAN MOGOLLON	13707217	CARRERA 3 # 8-70 BOLIVAR SANTANDER	3143871002	EDICAMILO24@GMAIL.COM	$ 33.085.500,00		$ 33.085.500,00		$ 695.073,00		$ 32.390.427,00		
2	MATERIALES		24-nov-24	CHEQUE	31	FEFI63	COMPRA DE 160 BARILLAS DE 9MM PARA FLE.IES	CRISTIAN JAVIER GONZALEZ SALAS	1099215935	CARRERA 7 # 7-84 BARBOSA SANTANDER	3214350584	OSCARGONZALEZVARGAS01@GMAIL.COM	$ 2.300.032,00		$ 2.300.032,00		$ 48.320,00		$ 2.251.712,00		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		24-nov-24	CHEQUE	32	FEAL69	COMPRA DE VALDES, PUNTILLAS, MANGUERA, ALAMBREDE PUA, GRAPAS, CABLE CENTELSA, CINTA MET, CINTA TEFLON Y ACCESORIOS PARA CONECCIONES HIDRAULICAS	YEISON ALEXANDER BARRAGAN MOGOLLON	13707217	CARRERA 3 # 8-70 BOLIVAR SANTANDER	3143871002	EDICAMILO24@GMAIL.COM	$ 993.700,00		$ 993.700,00				$ 993.700,00		
4	TRANSPORTES		24-nov-24	CHEQUE	33	DSJG23	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL OPERARIO DEL CILINDRO Y EL OPERARIO DE LA ORUGA	MARTHA CECILIA VARGAS CASTAÑEDA	1096483063	FINCA LOS DURAZNOS VEREDA ALTO NOGALES BOLIVAR SANTANDER	3136880077	JACGUAMALBOLIVAR@GMAIL.COM	$ 1.020.000,00		$ 1.020.000,00		$ 35.700,00		$ 984.300,00		
6	ADMINISTRATIVOS		11/24/2024	CHEQUE	34	DSJG24	COMPRA DE VALLA PUBLICITARIA	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIMATE	900302264	CARRERA 30A # 26-27 AP 401 BARR SANTA INES BOGOTA D.C.	3015302030	CESARD.21@HOTMAIL.COM	$ 115.000,00		$ 115.000,00				$ 115.000,00		
5	MANO DE OBRA		24-nov-24	CHEQUE	35	DSJG28	AFILIACIONES A LOS TRABAJADORES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	LUIS ANGEL SERRANO BARRERA	13707294	CR 3 # 8-38 BOLIVAR	3222145488	NDURANVALDIVIESO@GMAIL.COM	$ 320.000,00		$ 320.000,00		$ 19.200,00		$ 300.800,00		
6	ADMINISTRATIVOS		24-nov-24	CHEQUE	36	DSJG21	DOTACIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SGSST REEMBOLSO A VICTOR MANUEL GALEANO ARIZA	FERNEY ALEJANDRO SANCHEZ GRIMALDO	1049608353	CARRERA 10 # 29-23 TUNJA BOYACA	3004936900	FERALEJO6@HOTMAIL.COM	$ 190.000,00	$ -	$ 190.000,00	$ -	$ 4.750,00	$ -	$ 185.250,00		
6	ADMINISTRATIVOS		24-nov-24	CHEQUE	38	DSJG24	NOMINA - Ingeniero residente de obra - Mes 2	JORGE EDUARDO HURTADO PEDRAZA	1049634413	AV COLON 26-77 BARR LAS NIVES AP 302 TUNJA BOYACA	3208212170	APOYOTECNICOINFRAESLABELLEZA@GMAIL.COM	$ 3.500.000,00		$ 3.500.000,00				$ 3.500.000,00		
5	MANO DE OBRA		24-nov-24	CHEQUE	39	DSJG27	NOMINA - Honorario contador mes 3	NANCY ANDREA DURAN VALDIVIESO	28034878	CARRERA 3 # 8-38 BOLIVAR SANTANDER	3115249248	NDURANVALDIVIESO@GMAIL.COM	$ 1.960.000,00		$ 1.960.000,00				$ 1.960.000,00		
5	MANO DE OBRA		24-nov-24	CHEQUE	40	N/A	QUINCENA DEL 05 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	OLFER ARTURO VARGAS MORENO	1096482494	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3219786443	JAKEVAR-20@HOTMAIL.COM	$ 923.374,00		$ 923.374,00				$ 923.374,00		
6	ADMINISTRATIVOS		24-nov-24	CHEQUE	41	N/A	QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	DIOCLIDES LOPEZ ARIZA	79915355	BARRIO LAS DELICIAS BOLIVAR SANTANDER	3102165153	DIOCLIDESLOPEZ@GMAIL.COM	$ 1.368.455,00		$ 1.368.455,00				$ 1.368.455,00		
5	MANO DE OBRA		24-nov-24	CHEQUE	42	N/A	QUINCENA DEL 05 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	MIGUEL OCTAVIO QUIROGA	13707611	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3134277319	JACGUAMALBOLIVAR@GMAIL.COM	$ 589.158,00		$ 589.158,00				$ 589.158,00		
5	MANO DE OBRA		24-nov-24	CHEQUE	42	N/A	QUINCENA DEL 05 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	WILLIAM MORENO RUEDA	13959312	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3115449828	JACGUAMALBOLIVAR@GMAIL.COM	$ 589.158,00		$ 589.158,00				$ 589.158,00		
5	MANO DE OBRA		24-nov-24	CHEQUE	43	N/A	QUINCENA DEL 05 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	ANYI LORENA VELASCO	3182232560	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3182232560	JACGUAMALBOLIVAR@GMAIL.COM	$ 652.776,00		$ 652.776,00				$ 652.776,00		
5	MANO DE OBRA		24-nov-24	CHEQUE	44	N/A	QUINCENA DEL 05 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	JESE VLADMIR QUIROGA QUIROGA	13707093	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3106088589	JESEQ2@YAHOO.ES	$ 620.967,00		$ 620.967,00				$ 620.967,00		
5	MANO DE OBRA		24-nov-24	CHEQUE	45	N/A	QUINCENA DEL 05 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	DANIEL FRANCO ARIZA	13707182	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3114610737	DANIELFRANCOARIZA79@GMAIL.COM	$ 589.158,00		$ 589.158,00				$ 589.158,00		
5	MANO DE OBRA		24-nov-24	CHEQUE	46	N/A	QUINCENA DEL 05 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	EDGAR LOPEZ ARIZA	13706996	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3203404522	DIANAMARCELAMATEUSRUIZ@GMAIL.COM	$ 589.158,00		$ 589.158,00				$ 589.158,00		
6	ADMINISTRATIVOS		24-nov-24	CHEQUE	47	DSJG32	Gastos de representación-Auxilio transporte OAC	VICTOR MANUEL GALEANO ARIZA	13707463	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3144071930	JACGUAMALBOLIVAR@GMAIL.COM	$ 200.000,00		$ 200.000,00				$ 200.000,00		
4	TRANSPORTES		24-nov-24	CHEQUE	48	CC-1-12	REEMBOLSO DE GASTOS	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GAMAL	900302264	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3136880077	JACGUAMALBOLIVAR@GMAIL.COM	$ 780.600,00		$ 780.600,00		$ 16.000,00		$ 764.600,00		
5	MANO DE OBRA		24-nov-24	CHEQUE	49	N/A	QUINCENA DEL 05 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	MIGUEL OCTAVIO QUIROGA	13707611	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3134277319	JACGUAMALBOLIVAR@GMAIL.COM	$ 589.158,00		$ 589.158,00				$ 589.158,00		
5	MANO DE OBRA		24-nov-24	CHEQUE	49	N/A	QUINCENA DEL 05 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	WILLIAM MORENO RUEDA	13959312	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3115449828	JACGUAMALBOLIVAR@GMAIL.COM	$ 589.158,00		$ 589.158,00				$ 589.158,00		
2	MATERIALES		10-dic-24	CHEQUE	50	FECC60	COMPRA DE GRAVILLA Y PIEDRA RAJON	CANTERA EL CAIRO SAS	900729004	CARRERA 29 # 18-24 BOGOTA	3133393821	ACEVEDOJORGE2011@HOTMAIL.COM	$ 5.040.000,00	$ 957.600,00	$ 5.997.600,00	$ -	$ 126.000,00	$ -	$ 5.871.600,00		
2	MATERIALES		10-dic-24	CHEQUE	50	FECC61	COMPRA DE GRAVILLA Y PIEDRA RAJON	CANTERA EL CAIRO SAS	900729004	CARRERA 29 # 18-24 BOGOTA	3133393821	ACEVEDOJORGE2011@HOTMAIL.COM	$ 560.000,00	$ 106.400,00	$ 666.400,00	$ -	$ -	$ -	$ 666.400,00		
2	MATERIALES		11-dic-24	CHEQUE	51	FEAL70	COMPRA DE ARENA	YEISON ALEXANDER BARRAGAN MOGOLLON	13707217	CARRERA 3 # 8-70 BOLIVAR SANTANDER	3143871002	EDICAMILO24@GMAIL.COM	$ 2.880.000,00		$ 2.880.000,00		$ 60.504,20		$ 2.819.495,80		
7	PAGA		11-dic-24	CHEQUE	52	FEAL71	COMPONENTE PAGA	YEISON ALEXANDER BARRAGAN MOGOLLON	13707217	CARRERA 3 # 8-70 BOLIVAR SANTANDER	3143871002	EDICAMILO24@GMAIL.COM	$ 3.838.042,87	$ 729.228,13	$ 4.567.271,00		$ 95.951,07		$ 4.471.319,93		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		11-dic-24	CHEQUE	53	DSJG33	ALQUILER VIBROCOMPACTADOR DE MANGUERA	ANA PRISCILA GOMEZ BARBOSA	63370359	CARRERA 3 # 6-28 LA BELLEZA SANTANDER	3115143978	ANA.GOMEZBARBOSA@HOTMAIL.COM	$ 700.000,00		$ 700.000,00		$ 28.000,00		$ 672.000,00		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		11-dic-24	CHEQUE	54	DSJG36	ALQUILER COMPACTADOR TIPO RANA	YINA ZEGLETH FONTECHA CASTAÑEDA	1101755710	CARRERA 6 # 6-57 VELEZ SANTANDER	3203976400	VELMOTORS785@GMAIL.COM	$ 2.700.000,00		$ 2.700.000,00		$ 108.000,00		$ 2.592.000,00		
5	MANO DE OBRA		11-dic-24	CHEQUE	55	7952120454	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE	SOI ACH PLANILLA INTEGRADA					$ 5.710.600,00		$ 5.710.600,00				$ 5.710.600,00		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		11-dic-24	CHEQUE	56	FEDM1114	ALQUILER MEZCLADORA	CLEOFELINA ROMERO DE HERNANDEZ	28030920	CARRERA 3 # 9-08 BOLIVAR SANTANDER	3112102524	NDURANVALDIVIESO@GMAIL.COM	$ 3.009.000,00		$ 3.009.000,00		$ 112.000,00		$ 2.897.000,00		
4	TRANSPORTES		11-dic-24	CHEQUE	57	DSJG34	07 VIAJES DE MATERIAL DESDE MONIQUIRA A BOLIVAR EN EL MES DE DICIEMBRE	ALIRIO RODRIGUEZ ROJAS	91450072	URB SAN CARLOS DEL RIO LOTE 15 BARBOSA SANTANDER	3118591113	RODRIGUEZALIRIO785@GMAIL.COM	$ 4.550.000,00	$ -	$ 4.550.000,00	$ -	$ 45.500,00	$ -	$ 4.504.500,00		
6	ADMINISTRATIVOS		11-dic-24	CHEQUE	58	DSJG35	NOMINA - Ingeniero residente de obra - Mes 3	JORGE EDUARDO HURTADO PEDRAZA	1049634413	AV COLON 26-77 BARR LAS NIVES AP 302 TUNJA BOYACA	3208212170	APOYOTECNICOINFRAESLABELLEZA@GMAIL.COM	$ 3.500.000,00		$ 3.500.000,00				$ 3.500.000,00		

6	ADMINISTRATIVOS		11-dic-24	CHEQUE	58	DSJG37	NOMINA - Ingeniero residente de obra - DICIEMBRE DE 2024	JORGE EDUARDO HURTADO PEDRAZA	1049634413	AV COLON 26-77 BARR LAS NIVES AP 302 TUNJA BOYACA	3208212170	APOYOTECNICOINFRAESLABELLEZA@GMAIL.COM	$ 1.750.000,00		$ 1.750.000,00				$ 1.750.000,00		
0	PAGO DE IMPUESTOS		11-dic-24	CHEQUE	59	351061520806S	Retencion en la Fuente MES DE NOVIEMBRE DE 2024	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	800197168				$ 2.171.000,00		$ 2.171.000,00				$ 2.171.000,00		
4	TRANSPORTES		11-dic-24	CHEQUE	60	M2593	COMPRA DE COMBUSTIBLE, GRASA, TORNILLOS, ARANDELAS, TUERCAS	GRUPO EMPRESARIAL MOTOKAR SAS	901354657-6	KM 1 VIA BOLIVAR VELEZ BOLIVAR SANTANDER	3118899922	MOTOKARSAS@HOTMAIL.COM	$ 443.607,44	$ 2.586,56	$ 446.194,00				$ 446.194,00		
6	ADMINISTRATIVOS		11-dic-24	CHEQUE	61	DSJG38	Gastos de representación-Auxilio transporte OAC	VICTOR MANUEL GALEANO ARIZA	13707463	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3144071930	JACGUAMALBOLIVAR@GMAIL.COM	$ 200.000,00		$ 200.000,00				$ 200.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		11-dic-24	CHEQUE	62	DSJG39	NOMINA - Honorario contador mes 4	NANCY ANDREA DURAN VALDIVIESO	28034878	CARRERA 3 # 8-38 BOLIVAR SANTANDER	3115249248	NDURANVALDIVIESO@GMAIL.COM	$ 1.191.800,00		$ 1.191.800,00				$ 1.191.800,00		
5	MANO DE OBRA		11-dic-24	CHEQUE	63	N/A	QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y DEL 01 AL 12 DIC 2024 Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES	OLFER ARTURO VARGAS MORENO	1096482494	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3219786443	JAKEVAR-20@HOTMAIL.COM	$ 2.624.925,00		$ 2.624.925,00				$ 2.624.925,00		
6	ADMINISTRATIVOS		11-dic-24	CHEQUE	64	N/A	QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y DEL 01 AL 12 DIC 2024 Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES	DIOCLIDES LOPEZ ARIZA	79915355	BARRIO LAS DELICIAS BOLIVAR SANTANDER	3102165153	DIOCLIDESLOPEZ@GMAIL.COM	$ 3.193.700,00		$ 3.193.700,00				$ 3.193.700,00		
5	MANO DE OBRA		11-dic-24	CHEQUE	65	N/A	QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y DEL 01 AL 12 DIC 2024 Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES	MIGUEL OCTAVIO QUIROGA	13707611	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3134277319	JACGUAMALBOLIVAR@GMAIL.COM	$ 1.816.704,00		$ 1.816.704,00				$ 1.816.704,00		
5	MANO DE OBRA		11-dic-24	CHEQUE	65	N/A	QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y DEL 01 AL 12 DIC 2024 Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES	WILLIAM MORENO RUEDA	13959312	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3115449828	JACGUAMALBOLIVAR@GMAIL.COM	$ 1.746.971,00		$ 1.746.971,00				$ 1.746.971,00		
5	MANO DE OBRA		11-dic-24	CHEQUE	66	N/A	QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y DEL 01 AL 12 DIC 2024 Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES	ANYI LORENA VELASCO	3182232560	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3182232560	JACGUAMALBOLIVAR@GMAIL.COM	$ 1.846.064,00		$ 1.846.064,00				$ 1.846.064,00		
5	MANO DE OBRA		11-dic-24	CHEQUE	67	N/A	Pago Nómina 16 nov al 30 nov. Pago Nómina 1 al 12 dic. Liquidación	JESE VLADMIR QUIROGA QUIROGA	13707093	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3106088589	JESEQ2@YAHOO.ES	$ 1.823.636,00		$ 1.823.636,00				$ 1.823.636,00		
5	MANO DE OBRA		11-dic-24	CHEQUE	68	N/A	QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y DEL 01 AL 12 DIC 2024 Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES	DANIEL FRANCO ARIZA	13707182	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3114610737	DANIELFRANCOARIZA.73@GMAIL.COM	$ 1.684.985,00		$ 1.684.985,00				$ 1.684.985,00		
5	MANO DE OBRA		11-dic-24	CHEQUE	70	N/A	QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y DEL 01 AL 12 DIC 2024 Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES	EDGAR LOPEZ ARIZA	13706996	VEREDA GUAMAL BOLIVAR SANTANDER	3203404522	DIANAMARCELAMATEUSRUIZ@GMAIL.COM	$ 1.715.798,00		$ 1.715.798,00				$ 1.715.798,00		
													$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
													$ 143.747.115,31	$ 4.349.414,69	$ 148.096.530,00	$ -	$ 2.279.068,27	$ -	$ 195.976.526,84		

Firma:
Nombre: VICTOR MANUEL GALEANO ARIZA
Representante Legal
Contratista

Firma:
Nombre: NANCY ANDREA DURAN VALDIVIESO
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 229734 TP

Firma:
Nombre: Jorge Forero Forero
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No. 25202-61517 CND

Firma:
Nombre: JORGE EDUARDO HURTADO PEDRAZA
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No. 041037-0547416 BYC

nventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
ratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONVENIO No. 4478 de 2023 (Indicar número y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	CONSIGNACION A LA CUENTA INVIAS	$199.981.336,00	20-dic-2023																		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$49.690,00	30-dic-2023				RENDIMIENTOS FINANCIEROS														
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$114.715,00	30-ene-2024				RENDIMIENTOS FINANCIEROS														
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$110.949,00	28-feb-2024				RENDIMIENTOS FINANCIEROS														
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$122.492,00	30-mar-2024				RENDIMIENTOS FINANCIEROS														
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$118.728,00	30-abr-2024				RENDIMIENTOS FINANCIEROS														
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$130.293,00	30-may-2024				RENDIMIENTOS FINANCIEROS														
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$103.524,00	30-jun-2024				RENDIMIENTOS FINANCIEROS														
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$115.086,00	30-jul-2024				RENDIMIENTOS FINANCIEROS														
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$122.818,00	30-ago-2024				RENDIMIENTOS FINANCIEROS														
6	ADMINISTRATIVOS		10-sept-2024	Comprob. Egreso	000005	107608201	Reintegro póliza	William Sanchez Sanchez	5770661	sector vereda la union	3108564898		$ 1.554.969,00	$ -	$ 1.554.969,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.554.969,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		10-sept-2024	Comprob. Egreso	000006	FE21	Estudios y diseños	Jeffersson Camilo Aguilar Parra	7321156	CL 19 928	3118508140	contadoracr10@gmail.com	$ 4.300.000,00	$ -	$ 4.300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.300.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS	$ 113.246,00	10-sept-2024	Comprob. Egreso	000008	Cuenta de cobro N° 1 (10-09-2024)	Pago honorarios Ing Residente agosto 2024	Jeison Camacho	1054682134	Moniquirá	3123796045	topcolinf@gmail.com	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		10-sept-2024	Comprob. Egreso	000009	Cuenta de cobro N° 1 (02-09-2024)	Pago honorarios Contadora por el mes de agosto de 2024	Clara Ines Garcia Mahecha	41506897	Cr 5 26 13	3153757099	garclam124@gmail.com	$ 1.960.000,00	$ -	$ 1.960.000,00	$ -	$ 215.600,00	$ -	$ 1.744.400,00	$ -	
2	MATERIALES		8-oct-2024	Comprob. Egreso	000010	FE1323	Calizas y minerales(Subbase y Grava)	Calizas y minerales de Colombia SAS	900414198	via Barbosa Tunja	3103250949	calmineral.co@gmail.com	$ 8.680.000,00	$ 1.649.200,00	$ 10.329.200,00	$ -	$ 217.000,00	$ -	$ 10.112.200,00	$ -	
2	MATERIALES		8-oct-2024	Comprob. Egreso	000011	Cuenta de cobro N° 1 (08-10-2024)	Arena de rio	Edison Fernando Ruiz	1054682658	CL 20 6 50	3132580302	truiz0408@gmail.com	$ 4.970.000,00	$ -	$ 4.970.000,00	$ -	$ 124.250,00	$ -	$ 4.845.750,00	$ -	
4	TRANSPORTE		8-oct-2024	Comprob. Egreso	000012	Cuenta de cobro N° 1 (08-10-2024)	Fletes cemento-acero	Wilinton Ruiz	74243768	cr 8a 16 69	74243768	wilinton.ruiz75@ogmail.com	$ 12.470.000,00	$ -	$ 12.470.000,00	$ -	$ 124.700,00	$ -	$ 12.345.300,00	$ -	
2	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		15-oct-2024	Comprob. Egreso	000013	FVE817	Cemento-varilla-alambre	Yuli Paola Castañeda Rodriguez	52965220	CL 9 5 43	6077588095	ferredondedario@gmail.com	$ 19.846.105,00	$ 3.770.760,00	$ 23.616.865,00	$ -	$ 496.153,00	$ -	$ 23.120.712,00	$ -	
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS		15-oct-2024	Comprob. Egreso	000014	Cuenta de cobro N° 2 (12-10-2024)	Honorario Ing Residente septiembre 2024	Jeison Camacho	1054682134	Moniquirá	3123796045	topcolinf@gmail.com	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	
4	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$141.363,00	22-oct-2024	Comprob. Egreso	000016	Cuenta de cobro N° 2 (22-10-2024)	Fletes cemento-acero	Wilinton Ruiz	74243768	cr 8a 16 69	74243768	wilinton.ruiz75@ogmail.com	$ 4.080.000,00	$ -	$ 4.080.000,00	$ -	$ 40.800,00	$ -	$ 4.039.200,00	$ -	
2	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		22-oct-2024	Comprob. Egreso	000017	cotizacion	Madera	Miguel Antonio Duarte	5787431	Barbosa	6077485041		$ 2.050.000,00	$ -	$ 2.050.000,00	$ -	$ 51.250,00	$ -	$ 1.998.750,00	$ -	
6	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		22-oct-2024	Comprob. Egreso	000018	cotizacion	Dotacion	Genny Gonzalez	30204456	Barbosa	3102289528	gewano.25@gmail.com	$ 605.042,00	$ 114.958,00	$ 720.000,00	$ -	$ 15.126,00	$ -	$ 704.874,00	$ -	
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22-oct-2024	Comprob. Egreso	000019	Cuenta de cobro N° 1 (22-10-2024)	Subsidio dignatario,pago prestamo ACPM, viaticos operarios	Yamid Ardila	13617846	sector vereda la union	3134715818	jaclaunion2024@gmail.com	$ 808.000,00	$ -	$ 808.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 808.000,00	$ -	
4	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		22-oct-2024	Comprob. Egreso	000020	FVE125	Transporte vibrocompactador	Ingenieria y transportes Serwica SAS	901739348	CL 12A 5 12A	3107671139	ingenieriatransportesserwica@gmail.com	$ 1.250.000,00	$ -	$ 1.250.000,00	$ -	$ 12.500,00	$ -	$ 1.237.500,00	$ -	
2	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		22-oct-2024	Comprob. Egreso	000021	FVE824	Tubo concreto-puntilla-manguera	Yuli Paola Castañeda Rodriguez	52965220	CL 9 5 43	6077588095	ferredondedario@gmail.com	$ 3.067.244,00	$ 582.776,00	$ 3.650.020,00	$ -	$ 76.681,00	$ -	$ 3.573.339,00	$ -	
6	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		29-oct-2024	Comprob. Egreso	000022	552	Exámenes ocupacionales	Yeny Cecilia Rodríguez Valle	32763815	CR 2 77 72 CA 1	3115922224	veroyaocupacionalsas@gmail.com	$ 280.000,00	$ -	$ 280.000,00	$ -	$ 11.200,00	$ -	$ 268.800,00	$ -	
2	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		29-oct-2024	Comprob. Egreso	000023	FE1337	Sub-base y rajon	Calizas y minerales de Colombia SAS	900414198	via Barbosa Tunja	3103250949	calmineral.co@gmail.com	$ 1.260.000,00	$ 239.400,00	$ 1.499.400,00	$ -	$ 31.500,00	$ -	$ 1.467.900,00	$ -	
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29-oct-2024	Comprob. Egreso	000024	cotizacion	Dotacion	Genny Gonzalez	30204456		3102289528	gewano.25@gmail.com	$ 302.521,00	$ 57.479,00	$ 360.000,00	$ -	$ 7.563,00	$ -	$ 352.437,00	$ -	
4	TRANSPORTE		1-nov-2024	Comprob. Egresp	000025	Cuenta de cobro	Reintegro Transporte Vibrocompactador, Combustible, Mezcladora y Viaticos Operarios	YAMID ARDILA MARIN	13.617.846	sector vereda la union	3134715818	jaclaunion2024@gmail.com	$ 814.000,00						$ 814.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		15-nov-2024	Comprob. Egresp	000026	Comprobante egreso 26	Nomina maestro de obra periodos del 24-30 de octubre y 01-15 de noviembre	Luis Vicente Quiroga Quiroga	5658431	sector vereda la union	3112895444	luizvicentequiroga@gmail.com	$ 1.680.000,00	$ -	$ 1.680.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.680.000,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		15-nov-2024	Comprob. Egresp	000027	Comprobante egreso 27	Nomina 18 oct - 15 nov (SE HIZO CAMBIO POR CHEQUE 63)	Andres Franco Mosquera	1101759549	sucre	3223143217		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	
5	MANO DE OBRA		15-nov-2024	Comprob. Egresp	000028	Comprobante egreso 28	Nomina 18 oct - 15 nov	Arnoldo Marin	5658860	sector vereda la union			$ 1.246.667,00	$ -	$ 1.246.667,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.246.667,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		15-nov-2024	Comprob. Egresp	000029	Comprobante egreso 29	Nomina 25 oct - 15 nov	Sergio Peña	5770577	sucre	3161842060		$ 905.333,00	$ -	$ 905.333,00	$ -	$ -	$ -	$ 905.333,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	$ 54.038,00	15-nov-2024	Comprob. Egresp	000030	Comprobante egreso 30	Nomina 28 oct - 15 nov	Julian Ovalle	1095298074	sucre	3223794383	julianovalle8074@gmail.com	$ 769.533,00	$ -	$ 769.533,00	$ -	$ -	$ -	$ 769.533,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		15-nov-2024	Comprob. Egresp	000031	Comprobante egreso 31	Nomina 28 oct - 15 nov	Jhon Peña	1012322473	sucre	3112199774	jp1134902@gmail.com	$ 769.533,00	$ -	$ 769.533,00	$ -	$ -	$ -	$ 769.533,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		15-nov-2024	Comprob. Egresp	000032	Comprobante egreso 32	Nomina 28 oct - 15 nov	Jose Luis Marin	1101018127	sucre	3114619324	joseluismarin0403@gmail.com	$ 769.533,00	$ -	$ 769.533,00	$ -	$ -	$ -	$ 769.533,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		15-nov-2024	Comprob. Egresp	000033	Comprobante egreso 33	Nomina 28 oct - 15 nov	Oscar Marin	1005452668	sucre	3212058854	mauriciomarin.2022@gmail.com	$ 769.533,00	$ -	$ 769.533,00	$ -	$ -	$ -	$ 769.533,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		15-nov-2024	Comprob. Egresp	000034	Comprobante egreso 34	Nomina 28 oct - 15 nov	Jhon Jairo Mateus	1101018034	sucre	3213669929	jjmateus2023@gmail.com	$ 769.533,00	$ -	$ 769.533,00	$ -	$ -	$ -	$ 769.533,00	$ -	
0	PAGO DE IMPUESTOS		12-nov-2024	Comprob. Egresp	000035	Comprobante egreso 35	Retencion en la fuente octubre 2024	DIAN	800197268				$ 1.424.000,00	$ -	$ 1.424.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.424.000,00	$ -	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		15-nov-2024	Comprob. Egresp	000036	81692273	Seguridad social octubre	Yamid Ardila	13617846	sector vereda la union	3134715818	jaclaunion2024@gmail.com	$ 1.183.600,00	$ -	$ 1.183.600,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.183.600,00	$ -	
4	TRANSPORTE		15-nov-2024	Comprob. Egresp	000037	Cuenta de cobro No. 003 (12-11-2024)	Transporte materiales cemento tuberia y feltes	Wilinton Ruiz	74243768	cr 8a 16 69	74243768	wilinton.ruiz75@ogmail.com	$ 5.570.000,00	$ -	$ 5.570.000,00	$ -	$ 55.700,00	$ -	$ 5.514.300,00	$ -	
			12-nov-2024	Comprob. Egresp	000038	ANULADO							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
2	MATERIALES		12-nov-2024	Comprob. Egresp	000039	Cuenta de cobro No. 2 (12-11-2024)	Arena de rio	Edison Fernando Ruiz	1054682658	CL 20 6 50	3132580302	truiz0408@gmail.com	$ 4.970.000,00	$ -	$ 4.970.000,00	$ -	$ 124.250,00	$ -	$ 4.845.750,00	$ -	
2	MATERIALES		12-nov-2024	Comprob. Egresp	000040	FE1358 (12-11-2024)	Grava 3/4, rajon	Calizas y minerales de Colombia SAS	900414198	via Barbosa Tunja	3103250949	calmineral.co@gmail.com	$ 2.410.000,00	$ 457.900,00	$ 2.867.900,00	$ -	$ 60.250,00	$ -	$ 2.807.650,00	$ -	
2	MATERIALES		12-nov-2024	Comprob. Egresp	000041	FVE839 - FVE841 (12-11-24)	Disco, puntilla, manguera,flexometro, botas caucho, cemento, varilla, alambre, guantes,	Yuli Paola Castañeda Rodriguez	52965220	CL 9 5 43	6077588095	ferredondedario@gmail.com	$ 11.366.261,00	$ 2.159.589,59	$ 13.525.850,59	$ -	$ 274.236,00	$ -	$ 13.251.614,59	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		18-nov-2024	Comprob. Egresp	000042	Cuenta de cobro No. 1 (12-11-2024)	Topografia	Katherine Luengas Sanchez	1097332824	Guavata	3232277662		$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000,00	$ -	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		18-nov-2024	Comprob. Egresp	000043	Cuenta de cobro No. 2 (14-11-2024)	Alquiler retroexcavadora	Brayan Camilo Suaez	1099205673	Barbosa	3138224193		$ 5.544.000,00	$ -	$ 5.544.000,00	$ -	$ 221.760,00	$ -	$ 5.322.240,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		18-nov-2024	Comprob. Egresp	000044	Cuenta de cobro No. 2 (18-11-2024)	Pago honorarios Contadora por el mes de septiembre de 2024	Clara Ines Garcia Mahecha	41506897	Cr 5 26 13	3153757099	garclam124@gmail.com	$ 1.960.000,00	$ -	$ 1.960.000,00	$ -	$ 215.600,00	$ -	$ 1.744.400,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		25-nov-2024	Comprob. Egresp	000046	Comprobante egreso 46	quincena 15 al 16 noviembre Y Liquidacion 28 oct - 16 nov	Andres Franco Mosquera	1101759549	sucre	3223143217		$ 547.404,00	$ -	$ 547.404,00	$ -	$ -	$ -	$ 547.404,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		29-nov-2024	Comprob. Egresp	000047	Nomina	Nomina 16 Nov - 30 Nov Mestro de Obra	Luis Vicente Quiroga Quiroga	5658431	sector vereda la union	3112895444	luizvicentequiroga@gmail.com	$ 1.200.000,00	$ -	$ 1.200.000,00	$ -	$ -		$ 1.200.000,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		29-nov-2024	Comprob. Egresp	000048	Nomina	Nomina 16 Nov - 30 Nov	Sergio Peña	5770577	sucre	3161842060		$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -		$ 679.000,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		29-nov-2024	Comprob. Egresp	000049	Nomina	Nomina 16 Nov - 30 Nov	Julian Ovalle	1095298074	sucre	3223794383	julianovalle8074@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -		$ 679.000,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		29-nov-2024	Comprob. Egresp	000050	Nomina	Nomina 16 Nov - 30 Nov	Jhon Peña	1012322473	sucre	3112199774	jp1134902@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -		$ 679.000,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		29-nov-2024	Comprob. Egresp	000051	Nomina	Nomina 16 Nov - 30 Nov	Jose Luis Marin	1101018127	sucre	3114619324	joseluismarin0403@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -		$ 679.000,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		29-nov-2024	Comprob. Egresp	000052	Nomina	Nomina 16 Nov - 30 Nov	Oscar Marin	1005452668	sucre	3212058854	mauriciomarin.2022@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -		$ 679.000,00	$ -	

5	MANO DE OBRA		29-nov-2024	Comprob. Egresp	000053	Nomina	Nomina 16 Nov - 30 Nov	Jhon Jairo Mateus	1101018034	sucre	3213669929	jjmateus2023@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -		$ 679.000,00	$ -		
6	ADMINISTRATIVOS		29-nov-2024	Comprob. Egresp	000054	factura FT63	Vallas y pasacalles	Francisco Torres	5712888	Puente nacional	3105610966	frantors2@hotmail.com	$ 612.000,00	$ -	$ 612.000,00	$ -	$ 24.480,00		$ 587.520,00	$ -		
5	MANO DE OBRA		29-nov-2024	Comprob. Egresp	000055	Nomina	Nomina 16 Nov - 30 Nov	Arnoldo Marin	5658860				$ 1.100.000,00	$ -	$ 1.100.000,00	$ -	$ -		$ 1.100.000,00	$ -		
4	TRANSPORTE		18-nov-2024	Comprob. Egresp	000045		TRANSPORTE MAQUINARIA	Gonzalo Vargas Ruiz	2.193.984				$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00				$ 1.500.000,00			
6	ADMINISTRATIVOS		1-dic-2024	Comprob. Egresp	000056	JACU14	Honorario Ing Residente octubre y noviembre 2024	Jeison Camacho	1054682134	Moniquirá	3123796045	topcolinf@gmail.com	$ 7.000.000,00	$ -	$ 7.000.000,00	$ -	$ -		$ 7.000.000,00	$ -		
6	ADMINISTRATIVOS		1-dic-2024	Comprob. Egresp	000057	JACU15	Pago honorarios Contadora octubre y noviembre de 2024	Ciara Ines Garcia Mahecha	41506897	Cr 5 26 13	3153757099	garclam124@gmail.com	$ 3.920.000,00	$ -	$ 3.920.000,00	$ -	$ 431.200,00	$ -	$ 3.488.800,00	$ -		
6	ADMINISTRATIVOS		1-dic-2024	Comprob. Egresp	000058	JACU16	Topografia octubre 2024	Katherine Luengas Sanchez	1097332824	Guavata	3232277662		$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -	$ -		$ 1.500.000,00	$ -		
2	MATERIALES		1-dic-2024	Comprob. Egresp	000059	FVE851	Varilla/disco/alambre cemento	Yuli Paola Castañeda Rodriguez	52965220	CL 9 5 43	6077588095	ferredondedario@gmail.com	$ 1.950.051,00	$ 370.509,69	$ 2.320.560,69	$ -	$ 48.751,28	$ -	$ 2.271.809,42	$ -		
4	TRANSPORTE	$ 12.480,00	1-dic-2024	Comprob. Egresp	000060	JACU17	Transporte materiales	Wilinton Ruiz	74243768	CR 8a 16 69	74243768	wilinton.ruiz75@o gmail.com	$ 5.220.000,00	$ -	$ 5.220.000,00	$ -	$ 52.200,00	$ -	$ 5.167.800,00	$ -		
2	MATERIALES		1-dic-2024	Comprob. Egresp	000061	FE1387	Base y grava 3/4	Calizas y minerales de Colombia SAS	900414198	via Barbosa Tunja	3103250949	calmineral.co@gmail.com	$ 1.959.000,00	$ 372.210,00	$ 2.331.210,00	$ -	$ 48.975,00	$ -	$ 2.282.235,00	$ -		
5	MANO DE OBRA		1-dic-2024	Comprob. Egresp	000063	Se hace cambio con cheque 27	Yamid Ardila pago quincena Andres Franco por perdida de cedula	Yamid Ardila	13617846	sector vereda la union	3134715818	jaclaunion2024@gmail.com	$ 1.980.000,00	$ -	$ 1.980.000,00	$ -	$ -		$ 1.980.000,00	$ -		
2	MATERIALES		1-dic-2024	Comprob. Egresp	000066	JACU18	Arena de rio	Edison Fernando Ruiz	1054682658	CL 20 6 50	3132580302	truiz0408@gmail.com	$ 2.982.000,00	$ -	$ 2.982.000,00	$ -	$ 74.550,00		$ 2.907.450,00			
5	MANO DE OBRA		5-dic-2024	Comprob. Egresp	000064	82438571	Seguridad social noviembre	Yamid Ardila	13617846	sector vereda la union	3134715818	jaclaunion2024@gmail.com	$ 6.060.800,00	$ -	$ 6.060.800,00	$ -	$ -		$ 6.060.800,00	$ -		
2	MATERIALES		9-dic-2024	Comprob. Egresp	000065	FE1391	Grava 3/4	Calizas y minerales de Colombia SAS	900414198	via Barbosa Tunja	3103250949	calmineral.co@gmail.com	$ 554.000,00	$ 105.260,00	$ 659.260,00	$ -	$ -	$ -	$ 659.260,00	$ -		
4	TRANSPORTE		11-dic-2024	Comprob. Egresp	000067	JACU19	Fletes Barbosa - La Unión	Wilinton Ruiz	74243768	cr 8a 16 69	74243768	wilinton.ruiz75@o gmail.com	$ 380.000,00	$ -	$ 380.000,00	$ -	$ 3.800,00		$ 376.200,00	$ -		
2	MATERIALES		11-dic-2024	Comprob. Egresp	000069	JACU20	Arena de rio	Edison Fernando Ruiz	1054682658	CL 20 6 50	3132580302	truiz0408@gmail.com	$ 994.000,00	$ -	$ 994.000,00	$ -	$ -		$ 994.000,00	$ -		
6	ADMINISTRATIVOS		11-dic-2024	Comprob. Egresp	000071	30019921	Renovación póliza	Previsora seguros					$ 788.573,00	$ -	$ 788.573,00	$ -	$ -		$ 788.573,00	$ -		
5	MANO DE OBRA		18-dic-2024	Comprob. Egresp	000072	Comprobante egreso 72	Nomina, liquidación y retención en la fuente	Yamid Ardila	13617846	sector vereda la union	3134715818	jaclaunion2024@gmail.com	$ 9.841.172,00	$ -	$ 9.841.172,00	$ -	$ -		$ 9.841.172,00	$ -		
6	ADMINISTRATIVOS		10-ene-2025	Comprob. Egresp	000068	Cuenta de cobro No.	Alquiler bodega-tronzadora-trompo-compactador	Arnoldo Marin	5658860	sector vereda la union			$ 4.330.000,00	$ -	$ 4.330.000,00	$ -	$ -		$ 4.330.000,00			
6	ADMINISTRATIVOS		10-ene-2025	Comprob. Egresp	000070	Cuenta de cobro No.	Subsidio dignatario-papaleria-reintegro gastos operarios	Yamid Ardila	13617846	sector vereda la union	3134715818	jaclaunion2024@gmail.com	$ 1.867.000,00	$ -	$ 1.867.000,00	$ -	$ -		$ 1.867.000,00			
6	ADMINISTRATIVOS		10-ene-2025	Comprob. Egresp	000073	JACU21	Topografia noviembre 2024	Katherine Luengas Sanchez	1097332824	Guavata	3232277662		$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -	$ -		$ 1.500.000,00			
5	MANO DE OBRA		10-ene-2025	Comprob. Egresp	000077		Seguridad social salud ene 25 - pension dic 24	Yamid Ardila	13617846	sector vereda la union	3134715818	jaclaunion2024@gmail.com	$ 1.786.800,00	$ -	$ 1.786.800,00	$ -	$ -		$ 1.786.800,00			
5	MANO DE OBRA		16-ene-2025	Comprob. Egresp	000075		Reintegro seguridad social jun - jul 2024	Jeison Camacho					$ 750.800,00	$ -	$ 750.800,00	$ -	$ -		$ 750.800,00			
6	ADMINISTRATIVOS		16-ene-2025	Comprob. Egresp	000076	cuenta de cobro 1	Ensayos de laboratorio	Jeffersson Camilo Aguilar Parra	7321156	CL 19 928	3118508140	contadorgcr10@gmail.com	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00	$ -	$ -		$ 360.000,00			
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		16-ene-2025	Comprob. Egresp	000078	cuenta de cobro 1	Alquiler pulidora - alquiler compactador	Jose Joaquin Gerena	19317595	Guavata	3178736382		$ 2.730.000,00	$ -	$ 2.730.000,00	$ -	$ -		$ 2.730.000,00			
5	MANO DE OBRA		16-ene-2025	Comprob. Egresp	000079		Reintegro LIQUIDACION Andres Franco	Yamid Ardila	13617846	sector vereda la union	3134715818	jaclaunion2024@gmail.com	$ 547.404,00	$ -	$ 547.404,00	$ -	$ -		$ 547.404,00			
6	ADMINISTRATIVOS		16-ene-2025	Comprob. Egresp	000080		Reintegro seguridad social jun - jul 2024	Clara Ines Garcia Mahecha	41506897	Cr 5 26 13	3153757099	garclam124@gmail.com	$ 625.000,00	$ -	$ 625.000,00	$ -	$ -		$ 625.000,00			
6	ADMINISTRATIVOS		28-ene-2025	Comprob. Egresp	000074	Exámenes ocupacionales		Yeny Cecilia Rodriguez Valle	32763815	CR 2 77 72 CA 1	3115922224	yerovaocupacionales@gmail.com	$ 315.000,00	$ -	$ 315.000,00	$ -	$ 12.600,00		$ 302.400,00			
7	PAGA		28-ene-2025	Comprob. Egresp	000081		Almuerzos 100 personas PAGA	Yuli Paola Castañeda Rodriguez	52965220	CL 9 5 43	$ 6.077.588.095	ferredondedario@gmail.com	$ 2.389.233,00	$ -	$ 2.389.233,00	$ -	$ -		$ 2.389.233,00			
7	PAGA		28-ene-2025	Comprob. Egresp	000082		33 Sillas PAGA	Maria Alejandra Ardila	1099212995	Puente Nacional			$ 1.829.665,00	$ 347.636,35	$ 2.177.301,35	$ -	$ 45.741,63	$ -	$ 2.131.559,73			
0	PAGO DE IMPUESTOS		30-ene-2025	Comprob. Egresp	000083		RETENCIÓN EN LA FUENTE ENERO 2025	DIAN	800197268				$ 58.000,00		$ 58.000,00				$ 58.000,00			
2	MATERIALES		30-ene-2025	Comprob. Egresp	000084		PLASTICO NEGRO	Yuli Paola Castañeda Rodriguez	52965220	CL 9 5 43	$ 6.077.588.095	ferredondedario@gmail.com	$ 179.999,00		$ 179.999,00				$ 179.999,00			
													$ 173.068.407,00	$ 9.880.042,28	$ 182.134.449,28	$ -	$ 3.118.417	$ -	$ 199.446.569,73			

Firma:
Nombre: YAMID ARDILA MARIN
Representante Legal
Organización de Acción Comunal

Firma:
Nombre: CLARA INES GARCIA MAHECHA
Contador de la OAC
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 4086-T

Firma:
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Firma:
Nombre: JEISON LEANDRO CAMACHO AVILA
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 01122 11237 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONVENIO No. 4767 de 2023 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA GUAVATA - SANTANDER

RU	DESCRIPCION	INGRESOS Y	FECHA	DOCUMENTO	NUMERO DE CHEQUE	NUMERO	CONCEPTO	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	VALOR ANTES	IVA	VALOR TOTAL	VALOR ANTICIPO	RETENCION	RETENCION	VALOR A	SALDO	OBSERVACIONES
			27-feb				SALDO INICIAL													199.995.632,00	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 11.466,00	2/28/2024				Rendimientos financieros			Vereda popoa										200.007.098,00	$ 199.997.957,00
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 118.528,00	3/30/2024				Rendimientos financieros			Vereda popoa										200.116.485,00	$ 200.108.149,00
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 118.593,00	4/30/2024				Rendimientos financieros			Vereda popoa										200.226.742,00	$ 200.217.865,00
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 126.315,00	5/30/2024				Rendimientos financieros			Vereda popoa										200.344.180,00	$ 200.338.792,00
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 96.804,00	6/30/2024				Rendimientos financieros			Vereda popoa										200.435.596,00	$ 200.427.522,00
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 114.953,00	7/30/2024				Rendimientos financieros			Vereda popoa										200.542.475,00	$ 200.519.029,00
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 122.677,00	8/30/2024				Rendimientos financieros			Vereda popoa										200.665.152,00	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS		8/29/2024		000001		Anulado			Vereda popoa											
	GASTOS ADMINISTRATIVOS		8/29/2024		000002		Anulado			Vereda popoa											
	GASTOS ADMINISTRATIVOS		8/29/2024		000003		Anulado			Vereda popoa											
	GASTOS ADMINISTRATIVOS		8/29/2024		000004		Anulado			Vereda popoa			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	200.619.029,00	
6	ADMINISTRATIVOS	$ 108.975	9-sept-24	Comprob. Egresp	000005	001	Reintegro póliza	Adrian Quintero	5858888	Sector santander			$ 500.000	$ -	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ 500.000	200.228.004,00	$ 189.636.894,00
6	ADMINISTRATIVOS		9-sept-24	Comprob. Egresp	000006	001	Reintegro póliza	Maria Cubides	28177059	Vereda popoa			$ 500.000	$ -	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ 500.000	199.728.004,00	
6	ADMINISTRATIVOS		9-sept-24	Comprob. Egresp	000007	001	Reintegro póliza	Camilo Rojas	5761038	Vereda popoa			$ 522.656	$ -	$ 522.656	$ -	$ -	$ -	$ 522.656	199.205.348,00	
6	ADMINISTRATIVOS		9-sept-24	Comprob. Egresp	000008	001	Estudios y diseños	Camilo Aguilar	7321156	CL 19 9 28	3118508140	contador.acr10@gmail.com	$ 4.100.000	$ -	$ 4.100.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.100.000	195.105.348,00	
6	ADMINISTRATIVOS		9-sept-24	Comprob. Egresp	000009	JACP1	Honorario Ing Residente agosto 2024	Viviana Paola Rodriguez	1101174865	Sector santander	3102220743	vprodriguez14@gmail.com	$ 3.500.000	$ -	$ 3.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.500.000	191.605.348,00	
6	ADMINISTRATIVOS		9-sept-24	Comprob. Egresp	000010	JACP2	Honorario contador agosto 2024	Yeimmy Gerena	28178238	Cr 5 3 86	3114865099	yeimmygerena@gmail.com	$ 1.960.000	$ -	$ 1.960.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.960.000	189.645.348,00	
2	MATERIALES	$ 102.531	8-oct-24	Comprob. Egresp	000011	JACP4	Fletes/cemento y acero	Wilinton Ruiz Beltran	74243768	CR 8 A 16 69	3133660590	wilinton.ruiz75@gmail.com	$ 8.250.000	$ -	$ 8.250.000	$ -	$ 82.500	$ -	$ 8.167.500	181.571.925,00	$ 122.573.334,92
2	MATERIALES		8-oct-24	Comprob. Egresp	000012	FE1322	Grava 3/4	Calizas y minerales	900414198	via barbosa tunja		gatmineral.co@gmail.com	$ 8.680.000	$ 1.640.200	$ 10.329.200	$ -	$ 217.000	$ -	$ 10.112.200	171.459.725,00	
	ADMINISTRATIVOS		8-oct-24	Comprob. Egresp	000013	JACP3	Honorario Ing Residente septiembre 2024	Viviana Paola Rodriguez	1101174865	Sector santander	3102220743	vprodriguez14@gmail.com	$ 3.500.000	$ -	$ 3.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.500.000	167.959.725,00	
			8-oct-24	Comprob. Egresp	000014	001	Anulado						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	167.959.725,00	
2	MATERIALES		8-oct-24	Comprob. Egresp	000015	FEER5	Arena de rio	Edison Fernando Ruiz	1054682658		3132580302		$ 4.970.000	$ -	$ 4.970.000	$ -	$ 124.250	$ -	$ 4.845.750	163.113.975,00	
2	MATERIALES		11-oct-24	Comprob. Egresp	000016	FVE818	Cemento/varilla/tapabocas	Yuli Paola Castañeda	52965220	cl 9 5 43	7588095	farredondedario@gmail.com	$ 19.846.068	$ 3.770.753	$ 23.616.821	$ -	$ 496.152	$ -	$ 23.120.669	139.993.305,78	
					000017		Anulado						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	139.993.305,78	
4	TRANSPORTES		15-oct-24	Comprob. Egresp	000018	FVE124	Transporte vibrocompactador	Ingenieria y transportes Serveica SAS	901739348	CR 12A 5 12A	3107671139	ingenieriatransportesserveica@gmail.com	$ 1.250.000		$ 1.250.000	$ -	$ 12.500	$ -	$ 1.237.500	138.755.805,78	
6	ADMINISTRATIVOS		22-oct-24	Comprob. Egresp	000019	FEDL2024	Uniformes	Genny Gonzalez					$ 605.042	$ 114.958	$ 720.000	$ -	$ 15.126	$ -	$ 704.874	138.050.931,85	
	EQUIPO Y HERRRAMIENTA		22-oct-24	Comprob. Egresp	000020	JACP5	Alquiler Retroexcavadora	Brayan Camilo Suarez Peña	1099205673	guavata	3138224193		$ 3.840.000	$ -	$ 3.840.000	$ -	$ 153.600	$ -	$ 3.686.400	134.364.531,85	
6	ADMINISTRATIVOS		25-oct-24	Comprob. Egresp	000021	JACP6	Exámenes ocupacionales de ingreso	Yeny Cecilia Rodriguez Valle	32763815	Velez	315922224		$ 315.000	$ -	$ 315.000	$ -	$ 12.600	$ -	$ 302.400	134.062.131,85	
2	MATERIALES		26-oct-24	Comprob. Egresp	FE1338		Rajon-filtro	Calizas y minerales	900414198	via barbosa tunja		gatmineral.co@gmail.com	$ 3.930.000	$ 746.700	$ 4.676.700	$ -	$ 98.250	$ -	$ 4.578.450	129.483.681,85	
5	MANO DE OBRA		29-oct-24	Comprob. Egresp	000023	CN	Nomina 16 al 30 de octubre 2024	Raul Malagon	1101175103	Puente Nacional	3144345789	malagonraul1@gmail.com	$ 1.073.680	$ -	$ 1.073.680	$ -	$ -	$ -	$ 1.073.680	128.410.001,85	
5	MANO DE OBRA		29-oct-24	Comprob. Egresp	000024	CN	Nomina 16 al 30 de octubre 2024	Norbey Ariza	1007551977	Puente Nacional	3108785004		$ 1.001.000	$ -	$ 1.001.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.001.000	127.409.001,85	
5	MANO DE OBRA		29-oct-24	Comprob. Egresp	000025	CN	Nomina 16 al 30 de octubre 2024	Jorge Ardila	1097333294	Puente Nacional	3124423801	jorgesilvenardiavargas@gmail.com	$ 679.000	$ -	$ 679.000	$ -	$ -	$ -	$ 679.000	126.730.001,85	
2	MATERIALES		29-oct-24	Comprob. Egresp	000026	FVE825	Tubo-concreto-madera	Yuli Paola Castañeda	52965220	cl 9 5 43	7588095	farredondedario@gmail.com	$ 3.067.339	$ 582.794	$ 3.650.133	$ -	$ 76.683	$ -	$ 3.573.450	123.156.551,92	
6	ADMINISTRATIVOS	$ 52.958	4-nov-24	Comprob. Egresp	000027	FEDL2024	Uniformes	Genny Gonzalez	30204456				$ 302.521	$ 57.479	$ 360.000	$ -	$ 7.563	$ -	$ 352.437	122.273.855,95	$ 62.939.690,95
1	EQUIPO Y HERRRAMIENTA		4-nov-24	Comprob. Egresp	000028	JACP10	Alquiler mezcladora	Jacinto Sierra	80055009				$ 1.000.000	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	121.273.855,95	
6	ADMINISTRATIVOS		4-nov-24	Comprob. Egresp	000029	JACP7	Honorario Ing Residente octubre 2024	Viviana Paola Rodriguez	1101174865	Sector santander	3102220743	vprodriguez14@gmail.com	$ 3.500.000	$ -	$ 3.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.500.000	117.773.855,95	
6	ADMINISTRATIVOS		4-nov-24	Comprob. Egresp	000030	JACP8	Honorario contador septiembre 2024	Yeimmy Gerena	28178238	Cr 5 3 86	3114865099	yeimmygerena@gmail.com	$ 1.960.000	$ -	$ 1.960.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.960.000	115.813.855,95	
	PAGO DE IMPUESTOS		4-nov-24	Comprob. Egresp	000031		Retencion en la fuente octubre 2024	DIAN	800197268				$ 1.212.000	$ -	$ 1.212.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.212.000	114.601.855,95	
6	ADMINISTRATIVOS		4-nov-24	Comprob. Egresp	000032		Seguridad social	Mi planilla/Adriana Gerena	1097332297	Popoa		adriana.gerena.rodriguez@gmail.com	$ 1.806.000	$ -	$ 1.806.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.806.000	112.795.855,95	
5	MANO DE OBRA		12-nov-24	Comprob. Egresp	000033	JACP9	Movimiento tierra	Andres Hernandez	1007771742				$ 500.000	$ -	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ 500.000	112.295.855,95	
5	MANO DE OBRA		12-nov-24	Comprob. Egresp	000034	CN	Nomina 1 -15 noviembre	Raul Malagon	1101175103	Puente Nacional	3144345789	malagonraul1@gmail.com	$ 1.326.321	$ -	$ 1.326.321	$ -	$ -	$ -	$ 1.326.321	110.969.534,95	
5	MANO DE OBRA		15-nov-24	Comprob. Egresp	000035	CN	Nomina 1 -15 noviembre	Norbey Ariza	1007551977	Puente Nacional	3108785004		$ 1.199.000	$ -	$ 1.199.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.199.000	109.770.534,95	
5	MANO DE OBRA		15-nov-24	Comprob. Egresp	000036	CN	Nomina 1 -15 noviembre	Jorge Ardila	1097333294	Puente Nacional	3124423801	jorgesilvenardiavargas@gmail.com	$ 679.000	$ -	$ 679.000	$ -	$ -	$ -	$ 679.000	109.091.534,95	
5	MANO DE OBRA		15-nov-24	Comprob. Egresp	000037	CN	Nomina 23-oc / 30 oct 1 -15 noviembre	Felix Mateus	1101177468				$ 995.866	$ -	$ 995.866	$ -	$ -	$ -	$ 995.866	108.095.668,95	
5	MANO DE OBRA		15-nov-24	Comprob. Egresp	000038	CN	Nomina 24oct / 30 oct -1 -15 noviembre	Nilson sanchez	5658449	Popoa			$ 950.600	$ -	$ 950.600	$ -	$ -	$ -	$ 950.600	107.145.068,95	
5	MANO DE OBRA		15-nov-24	Comprob. Egresp	000039	CN	Nomina 25/oct - 30 oct -1 -15 noviembre	Jairo Osma	5658100	Pavachoque			$ 905.334	$ -	$ 905.334	$ -	$ -	$ -	$ 905.334	106.239.734,95	
5	MANO DE OBRA		15-nov-24	Comprob. Egresp	000040	CN	Nomina 28/oct - 30 oct -1 -15 noviembre	Juan Arce	1073509317				$ 769.534	$ -	$ 769.534	$ -	$ -	$ -	$ 769.534	105.470.200,95	
	EQUIPO Y HERRRAMIENTA		15-nov-24	Comprob. Egresp	000041	002	Reintegro servico compactador	Adriana Gerena	1097332297	Vereda popoa	3144742578	adriana.gerena.rodriguez@gmail.com	$ 714.000	$ -	$ 714.000	$ -	$ -	$ -	$ 714.000	104.756.200,95	
2	MATERIALES		12-nov-24	Comprob. Egresp	000042	FEV840/FVE838	Cemento-varilla-alambre	Yuli Paola Castañeda	52965220	cl 9 5 43	7588095	farredondedario@gmail.com	$ 11.545.462	$ 2.161.338	$ 13.706.800	$ -	$ 275.939	$ -	$ 13.430.861	91.325.339,95	
2	MATERIALES		12-nov-24	Comprob. Egresp	000043	FE1359	Grava 3/4	Calizas y minerales	900414198	via barbosa tunja		gatmineral.co@gmail.com	$ 2.410.000	$ 457.900	$ 2.867.900	$ -	$ 60.250	$ -	$ 2.807.650	88.517.689,95	
4	TRANSPORTES		12-nov-24	Comprob. Egresp	000044	JACP11	Fletes/cemento y acero	Wilinton Ruiz Beltran	74243768	CR 8 A 16 69	3133660590	wilinton.ruiz75@gmail.com	$ 3.605.000	$ -	$ 3.605.000	$ -	$ 36.050	$ -	$ 3.568.950	84.948.739,95	
2	MATERIALES		12-nov-24	Comprob. Egresp	000045	FEER5	Arena de rio	Edison Fernando Ruiz	1054682658		3132580302		$ 4.970.000	$ -	$ 4.970.000	$ -	$ 124.250	$ -	$ 4.845.750	80.102.989,95	
2	MATERIALES		12-nov-24	Comprob. Egresp	000046	JACP12	Madera	Ana Cilia Cruz	28177747				$ 2.450.000	$ -	$ 2.450.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.450.000	77.652.989,95	
6	ADMINISTRATIVOS		12-nov-24	Comprob. Egresp	000047	JACP13	Topografia 130 metro septiembre	Katherin Luengas	1097332824	guavata	3232277662		$ 1.500.000	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	76.152.989,95	
	ADMINISTRATIVOS		12-nov-24	Comprob. Egresp	000048		Reembolso papaleria-acpm	Adriana Gerena	1097332297	Vereda popoa	3144742578	adriana.gerena.rodriguez@gmail.com	$ 1.027.000	$ -	$ 1.027.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.027.000	75.125.989,95	
			18-nov-24	Comprob. Egresp	000049		ANULADO						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	75.125.989,95	
5	MANO DE OBRA		29-nov-24	Comprob. Egresp	000050	CN	Nomina 16-30 noviembre	Norbey Ariza	1007551977	Puente Nacional	3108785004		$ 1.100.000	$ -	$ 1.100.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.100.000	74.025.989,95	
5	MANO DE OBRA		29-nov-24	Comprob. Egresp	000051	CN	Nomina 16-30 noviembre	Jorge Ardila	1097333294	Puente Nacional	3124423801	jorgesilvenardiavargas@gmail.com	$ 679.000	$ -	$ 679.000	$ -	$ -	$ -	$ 679.000	73.346.989,95	
5	MANO DE OBRA		29-nov-24	Comprob. Egresp	000052	CN	Nomina 16-30 noviembre	Felix Mateus	1101177468				$ 679.000	$ -	$ 679.000	$ -	$ -	$ -	$ 679.000	72.667.989,95	
5	MANO DE OBRA		29-nov-24	Comprob. Egresp	000053	CN	Nomina 16-30 noviembre	Nilson sanchez	5658449	Popoa			$ 679.000	$ -	$ 679.000	$ -	$ -	$ -	$ 679.000	71.988.989,95	
5	MANO DE OBRA		29-nov-24	Comprob. Egresp	000054	CN	Nomina 16-30 noviembre	Jairo Osma	5658100	Pavachoque			$ 679.000	$ -	$ 679.000	$ -	$ -	$ -	$ 679.000	71.309.989,95	
5	MANO DE OBRA		29-nov-24	Comprob. Egresp	000055	CN	Liquidacion	Juan Arce	1073509317				$ 289.630	$ -	$ 289.630	$ -	$ -	$ -	$ 289.630	71.020.359,95	
5	MANO DE OBRA		29-nov-24	Comprob. Egresp	000056	CN	Nomina 18-30 noviembre	Juan Suarez	1101179413	Puente Nacional			$ 543.200	$ -	$ 543.200	$ -	$ -	$ -	$ 543.200	70.477.159,95	
2	MATERIALES		29-nov-24	Comprob. Egresp	000057	JACP21	Madera	Marisol Rocha					$ 1.050.000	$ -	$ 1.050.000	$ -	$ 26.250	$ -	$ 1.023.750	69.453.409,95	
5	MANO DE OBRA		29-nov-24	Comprob. Egresp	000058	CN	Liquidacion	Raul Malagon					$ 1.533.556	$ -	$ 1.533.556	$ -	$ -	$ -	$ 1.533.556	67.919.853,95	
5	MANO DE OBRA		29-nov-24	Comprob. Egresp	000059	CN	Nomina 20-30 noviembre	Cristian Sanchez	1101177753	Puente Nacional			$ 452.667	$ -	$ 452.667	$ -	$ -	$ -	$ 452.667	67.467.186,95	
6	ADMINISTRATIVOS		29-nov-24	Comprob. Egresp	000060	FT64	Vallas y pasacalles	Francisco Torres					$ 612.000	$ -	$ 612.000	$ -	$ 24.480	$ -	$ 587.520	66.879.666,95	
6	ADMINISTRATIVOS		1-dic-24	Comprob. Egresp	000061	JACP14	Honorario Ing Residente noviembre	Viviana Paola Rodriguez	1101174865	Sector santander	3102220743	vprodriguez14@gmail.com	$ 3.500.000	$ -	$ 3.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.500.000	63.379.666,95	
6	ADMINISTRATIVOS	$ 12.847	1-dic-24	Comprob. Egresp	000062	JACP15	Honorario contador octubre y noviembre	Yeimmy Gerena	28178238	Cr 5 3 86	3114865099	yeimmygerena@gmail.com	$ 3.920.000	$ -	$ 3.920.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.920.000	59.032.537,95	$ 13.108.753,47
6	ADMINISTRATIVOS		1-dic-24	Comprob. Egresp	000063	JACP16	Topografia 130 metro octubre	Katherin Luengas					$ 1.500.000	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	57.532.537,95	
1	EQUIPO Y HERRRAMIENTA		2-dic-24	Comprob. Egresp	000064	JACP17	Servicio retroexcavadora	Brayan Camilo Suarez Peña	1099205673	guavata	3138224193		$ 4.200.000	$ -	$ 4.200.000	$ -	$ 168.000	$ -	$ 4.032.000	53.500.537,95	
2	MATERIALES		2-dic-24	Comprob. Egresp	000065	FVE852	Varilla-Tubo	Yuli Paola Castañeda	52965220	cl 9 5 43	7588095	farredondedario@gmail.com	$ 3.460.609	$ 657.516	$ 4.118.125	$ -	$ 86.515	$ -	$ 4.031.609	49.468.928,47	
	TRANSPORTES		2-dic-24	Comprob. Egresp	000066	JAPC18	Fletes moniquira - guavata	Wilinton Ruiz Beltran	74243768			wilinton.ruiz75@gmail.com	$ 3.460.000	$ -	$ 3.460.000	$ -	$ 34.600	$ -	$ 3.425.400	46.043.528,47	
2	MATERIALES		2-dic-24	Comprob. Egresp	000067	FE1386	Grava 3/4	Calizas y minerales	900414198	via barbosa tunja		gatmineral.co@gmail.com	$ 1.098.400	$ 202.616	$ 1.269.016	$ -	$ -	$ -	$ 1.269.016	44.774.512,47	
2	MATERIALES		2-dic-24	Comprob. Egresp	000068	FEER5	Arena de rio	Edison Fernando Ruiz	1054682658		3132580302		$ 2.982.000	$ -	$ 2.982.000	$ -	$ 74.550	$ -	$ 2.907.450	41.867.062,47	
	MANO DE OBRA		9-dic-24	Comprob. Egresp	000069	82439075	Seguridad social noviembre	Adriana Gerena	1097332297	Vereda popoa	3144742578	adriana.gerena.rodriguez@gmail.com	$ 4.089.700	$ -	$ 4.089.700	$ -	$ -	$ -	$ 4.089.700	36.677.362,47	
2	MATERIALES		5-dic-24	Comprob. Egresp	000070	JACP19	Madera	Ana Cilia Cruz	28177747	CL 5 3 36	3112028737	anacilacruz@gmail.com	$ 1.200.000	$ -	$ 1.200.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000	35.677.362,47	
				Comprob. Egresp	000071		Anulado							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	35.677.362,47	
4	TRANSPORTES		11-dic-24	Comprob. Egresp	000072	JACP20	Fletes moniquira - guavata	Wilinton Ruiz Beltran	74243768				$ 920.000	$ -	$ 920.000	$ -	$ 9.200	$ -	$ 910.800	34.766.562,47	
	ADMINISTRATIVOS		17-dic-24	Comprob. Egresp	000073		Renovacion poliza	Previsora Seguros	860002400	Cl 57 9 07		contactenos@previsora.gov.co	$ 876.025	$ -	$ 876.025	$ -	$ -	$ -	$ 876.025	33.890.537,47	
2	MATERIALES		5-dic-24	Comprob. Egresp	000074	FE1392	Grava 3/4	Calizas y minerales	900414198	via barbosa tunja		gatmineral.co@gmail.com	$ 1.096.800	$ 208.392	$ 1.305.192	$ -	$ -	$ -	$ 1.305.192	32.585.345,47	
5	MANO DE OBRA		17-dic-24	Comprob. Egresp	000075	CN	Pago liquidaciones - nominas y rete fuente	Adriana Gerena	1097332297	Vereda popoa	3144742578	adriana.gerena.rodriguez@gmail.com	$ 9.841.172	$ -	$ 9.841.172	$ -	$ -	$ -	$ 9.841.172	22.744.173,47	
	ADMINISTRATIVOS		20-dic-24	Comprob. Egresp	000076		Reembolso papaleria-acpm	Adriana Gerena	1097332297	Vereda popoa	3144742578	adriana.gerena.rodriguez@gmail.com	$ 1.410.500	$ -	$ 1.410.500	$ -	$ -	$ -	$ 1.410.500	21.333.673,47	
5	MANO DE OBRA		20-dic-24	Comprob. Egresp	000077		Seguridad social salud ene 25 - pension dic 24	Mi planilla/Adriana Gerena	1097332297	Popoa		adriana.gerena.rodriguez@gmail.com	$ 2.255.200	$ -	$ 2.255.200	$ -	$ -	$ -	$ 2.255.200	19.078.473,47	
6	ADMINISTRATIVOS		20-dic-24	Comprob. Egresp	000078		reintegro seguridad social jun - jul 2024	Viviana Paola Rodriguez	1101174865	Sector santander	3102220743	vprodriguez14@gmail.com	$ 758.900	$ -	$ 758.900	$ -	$ -	$ -	$ 758.900	18.319.573,47	
6	ADMINISTRATIVOS		20-dic-24	Comprob. Egresp	000079	JACP24	pago honorarios ing residente 1 - 15 diciembre 2024	Ana Cilia Cruz	28177747	CL 5 3 36	3112028737	anacilacruz@gmail.com	$ 1.750.000	$ -	$ 1.750.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.750.000	16.569.573,47	
6	ADMINISTRATIVOS		20-dic-24	Comprob. Egresp	000080		reintegro seguridad social jun - jul 2024	Yeimmy Gerena	28178238	Cr 5 3 86	3114865099	yeimmygerena@gmail.com	$ 754.600	$ -	$ 754.600	$ -	$ -	$ -	$ 754.600	15.814.973,47	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		20-dic-24	Comprob. Egresp	000081	JACP23	Alquiler mezcladora	Jacinto Sierra	80055009				$ 1.028.000	$ -	$ 1.028.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.028.000	14.786.973,47	
6	ADMINISTRATIVOS		25-dic-24	Comprob. Egresp	000082	003	Topografia 130 metro noviembre	Katherin Luengas					$ 1.500.000	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	13.286.973,47	
	EQUIPO Y HERRAMIENTA		5-ene-25	Comprob. Egresp	000083		Servicio retroexcavadora	Brayan Camilo Suarez Peña	1099205673	1099205673	guavata	3138224193	$ 360.000	$ -	$ 360.000	$ -	$ 14.400	$ -	$ 345.600	12.763.153,47	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		5-ene-25	Comprob. Egresp	000084		Servicio retroexcavadora	Adriana Gerena	1097332297	Vereda popoa	3144742578	adriana.gerena.rodriguez@gmail.com	$ 720.000	$ -	$ 720.000	$ -	$ -	$ -	$ 720.000	12.043.153,47	
6	ADMINISTRATIVOS		15-ene-25	Comprob. Egresp	000085		Ensayos laboratorio	Camilo Aguilar	7321156	CL 19 9 28	3118508140	contador.acr10@gmail.com	$ 228.000	$ -	$ 228.000	$ -	$ -	$ -	$ 228.000	11.815.153,47	
6	ADMINISTRATIVOS		15-ene-25	Comprob. Egresp	000086		Subsidio al dignatario	Adriana Gerena	1097332297	Vereda popoa	3144742578	adriana.gerena.rodriguez@gmail.com	$ 1.200.000	$ -	$ 1.200.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000	10.615.153,47	
	EQUIPO Y HERRAMIENTA		15-ene-25	Comprob. Egresp	000087		Alquiler pulidora	Jose Joaquin Gerena	19317595	guavata	3178736382		$ 980.000	$ -	$ 980.000	$ -	$ -	$ -	$ 980.000	9.635.153,47	
6	ADMINISTRATIVOS		28-ene-25	Comprob. Egresp	000088		Examenes egreso	Yeny Cecilia Rodriguez Valle	32763815	Velez	315922224		$ 315.000	$ -	$ 315.000	$ -	$ 12.600	$ -	$ 302.400	9.332.753,47	
7	PAGA		28-ene-25	Comprob. Egresp	000089		Compra guadaña PAGA	Omar Cuadrado	91011630	Barbosa	3103293289		$ 1.736.932	$ 330.017	$ 2.066.949	$ -	$ 43.423	$ -	$ 2.023.526	7.309.227,68	
7	PAGA		28-ene-25	Comprob. Egresp	000090		Almuerzos 80 personas	Arnobi Benavides Pacheco	91011249	CR 7 10 48	3213801097	arnobibp@hotmail.com	$ 2.500.000	$ -	$ 2.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.500.000	4.809.227,68	
0	PAGO DE IMPUESTOS		30-ene-25	Comprob. Egresp	000091		Retencion en la fuente enero 2025	DIAN	800197268				$ 70.000	$ -	$ 70.000	$ -	$ -	$ -	$ 70.000	4.739.227,68	
2	MATERIALES		30-ene-25	Comprob. Egresp	000092		Alambre - puntilla	Yuli Paola Castañeda	52965220	cl 9 5 43	7588095	farredondedario@gmail.com	$ 38.656	$ 7.345	$ 46.001	$ -	$ -	$ -	$ 46.001	4.693.227,04	
															$ 197.275.979	$ -	$ 2.286.732	$ -	$ 194.993.246		

Firma:
Nombre: Adriana Gerena
Representante Legal
Contratista

Firma:
Nombre: YEIMMY DIANITH GERENA ARDILA
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.

Firma:
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No. 25202-61517 CND

Firma:
Nombre: VIVIANA PAOLA RODRIGUEZ ARIZA
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No. 2520221581CND

...rritoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
...ista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No. #REF! (Indicar número y año) **ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN MUNICIPIO DE LA BEI** 3

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	$ 19,00	20	21	22	$ 23,00	24	25
RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 199.108.139,00																		$ 199.108.139,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1.526,84	12/31/2023				Rendimientos Financieros Diciembre 2023													$ 199.109.665,84	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1.686,44	1/31/2024				Rendimientos Financieros Enero 2024													$ 199.111.352,28	
4	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	1/31/2024				Notas Debito, Comisión Trasf Oficina 4*1000												$ 2.090,33	$ 199.109.261,95	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1.576,95	12/29/2024				Rendimientos Financieros Febrero 2024													$ 199.112.929,23	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1.686,47	3/31/2024				Rendimientos Financieros Marzo 2024													$ 199.114.615,70	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1.632,72	4/30/2024				Rendimientos FinancierosAbril 2024													$ 199.116.248,42	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1.686,50	5/31/2024				Rendimientos Financieros Mayo 2024													$ 199.117.934,92	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1.632,75	6/30/2024				Rendimientos Financieros Junio 2025													$ 199.119.567,67	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1.686,53	7/31/2024				Rendimientos Financieros Julio 2024													$ 199.121.254,20	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1.686,54	8/31/2024				Rendimientos Financieros Agosto 2024													$ 199.122.940,74	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	9/13/2024	CE 001	CE 001	CC001	Honorarios Profesionales Ingeniero Civil Periodo:01 al 31 de agosto del 2024	Jorge Romaldo Fandiño Gomez	1097665332	Carrera 3 N° 3-73 La Belleza	3123143209	jorgeromaldo26@gmail.com	$ 3.500.000,00		$ 3.500.000,00	0	$ -	0	$ 3.500.000,00	$ 195.622.940,74	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	9/13/2024	CE 002	CE 002	CC002	Asesoría Profesional Preliminar al inicio de obras mes de julio 2024 de la Residente de Obra	Jorge Romaldo Fandiño Gomez	1097665332	Carrera 3 N° 3-73 La Belleza	3123143209	jorgeromaldo26@gmail.com	$ 501.400,00		$ 501.400,00	0	$ -	0	$ 501.400,00	$ 195.121.540,74	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	9/13/2024	CE 003	CE 003	FE-25	Estudios y Diseños de Convenio	Jefferson Camilo Aguilar Parra	7321156	CL 9 9 28 Chiquinquira-Boyaca	3118508140	juancap_d@hotmail.com	$ 4.800.000,00		$ 4.800.000,00	0	$ 192.000,00	0	$ 4.800.000,00	$ 190.321.540,74	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	9/13/2024	CE 004	CE 004	CC 001	Reembolsos Polizas 1014717 - 3001976	Rosaura Maria Rodriguez Forero	28196364	Vereda Berlin	3153782040	jmartinariza@gmail.com	$ 2.680.127,95		$ 2.680.127,95	0	$ -	0	$ 2.680.127,95	$ 187.641.412,79	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	9/13/2024	CE 005	CE 005	CC001	Subsidio al dignatario para transporte, Periodo: 01 al 31 de agosto 2024	Carlos Norbey Clavijo	91301354	Vereda Berlin	3134844556	norbeyclabelleza@gmail.com	$ 400.000,00		$ 400.000,00	0	$ -	0	$ 400.000,00	$ 187.241.412,79	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	9/13/2024	CE 006	CE 006	CC002	Honorarios Profesionales Contadora Pública Periodo: 01 al 31 de agosto 2024	Maria Magdalena Albino Plionieta	28262629	Carrera 3 N° 6-20 La Belleza	3115176930	magdis.01@hotmail.com	$ 1.960.000,00		$ 1.960.000,00	0	$ -	0	$ 1.960.000,00	$ 185.281.412,79	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	9/13/2024	CE 007	CE 007	CC001	Asesoría Profesional Preliminar al inicio de obras mes de julio 2024 de la Contadora Pública	Maria Magdalena Albino Plionieta	28262629	Carrera 3 N° 6-20 La Belleza	3115176930	magdis.01@hotmail.com	$ 377.300,00		$ 377.300,00	0	$ -	0	$ 377.300,00	$ 184.904.112,79	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	9/13/2024	CE 008	CE 008	CC001	Papelería Periodo: 01 al 31 de agosto del 2024	Sandy Tatiana Téllez Guevara	1097666706	Carrera 4 3 11	3169290705	tatianatellez89@gmail.com	$ 300.000,00		$ 300.000,00	0	$ -	0	$ 300.000,00	$ 184.604.112,79	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	9/13/2024	CE 009	CE 009	26	Dotaciones y Suministros	Ferney Alejandro Sanchez Grismaldo	1049608353	carrera 10 29 23 Tunja-Boyaca	3004936900	feralejo9@hotmail.com	$ 1.682.000,00		$ 1.682.000,00	0	$ 42.050,00	0	$ 1.639.950,00	$ 182.964.162,79	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1.552,72	31/09/2024				Rendimientos Financieros Septiembre 2024						$ -		$ -					$ 182.965.715,51	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	31/09/2024				Reintegros Banco AV Villas	Banco Av Villas					$ -		$ -				$ 4.164,00	$ 182.969.879,51	$ 182.778.642,60
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	31/09/2024				Notas Debito, Comisión Trasf Oficina 4*1000	Banco Av Villas					$ -		$ -				$ 189.146,58	$ 182.780.732,93	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	10/3/2024	CE 010	CE 010	FE675	Cemento Gris Estructural MAX 42.5K	Isaac Fontecha Peña	5665248-1	Carrera 4 N° 4-49 La Belleza	3104808655		$ 13.428.571,00	$ 2.551.428,50	$ 15.979.999,50	0	$ 335.714,28	0	$ 15.644.285,22	$ 167.136.447,71	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	10/3/2024	CE 011	CE 011	FV7658	Varillas 3/8 * 60, Flejes 12*17 3/8, Kilos Alambre Negro	Humberto Gonzalez Mancipe	7304186-2	Carrera 9 N° 9-56 Chiquinquira Colombia	3102486890	humbertogonzalez06@yahoo.es	$ 18.049.075,63	$ 3.429.324,37	$ 21.478.400,00	0	$ 451.226,89	0	$ 21.027.173,11	$ 146.109.274,60	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	10/3/2024	CE 012	CC001		Pago de seguridad Social Trabajadores mes de Septiembre	Junta de Acción Comunal Berlin	901069198-5	Vereda Berlin	3134844556	jacberlinlabelleza@gmail.com	$ 5.077.500,00		$ 5.077.500,00	0	$ -	0	$ 5.077.500,00	$ 141.031.774,60	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	10/15/2024	CE 013	CE 013	NOMINA	Nomina del 04 al 30 de Septiembre 2024	Elver Javier Ariza Ariza	91301591	Vereda Berlin La Belleza			$ 1.222.200,00		$ 1.222.200,00	0	$ -	0	$ 1.222.200,00	$ 139.809.574,60	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	10/15/2024	CE 014	CE 014	NOMINA	Nomina del 04 al 30 de Septiembre 2024	Nelson David Ariza Velandia	1097664878	Vereda Berlin La Belleza			$ 1.222.200,00		$ 1.222.200,00	0	$ -	0	$ 1.222.200,00	$ 138.587.374,60	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	10/15/2024	CE 015	CE 015	NOMINA	Nomina del 04 al 30 de Septiembre 2024	Juan Carlos Ariza Velandia	1005274847	Vereda Berlin La Belleza			$ 1.222.200,00		$ 1.222.200,00	0	$ -	0	$ 1.222.200,00	$ 137.365.174,60	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	10/15/2024	CE 016	CE 016	NOMINA	Nomina del 04 al 30 de Septiembre 2024	Carlos Duvan Vargas Ariza	1097666598	Vereda Berlin La Belleza			$ 1.222.200,00		$ 1.222.200,00	0	$ -	0	$ 1.222.200,00	$ 136.142.974,60	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	10/15/2024	CE 017	CE 017	NOMINA	Nomina del 04 al 30 de Septiembre 2024	Yhon Anderson Perez Rodriguez	1097667247	Vereda Berlin La Belleza			$ 1.222.200,00		$ 1.222.200,00	0	$ -	0	$ 1.222.200,00	$ 134.920.774,60	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	10/15/2024	CE 018	CE 018	NOMINA	Nomina del 04 al 30 de Septiembre 2024	Jhon Jairo Vargas Ariza	1097665792	Vereda Berlin La Belleza			$ 1.222.200,00		$ 1.222.200,00	0	$ -	0	$ 1.222.200,00	$ 133.698.574,60	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	10/15/2024	CE 019	CE 019	NOMINA	Nomina del 04 al 30 de Septiembre 2024	Yeferson Eucardo Quitian Clavijo	1005275445	Vereda Berlin La Belleza			$ 1.222.200,00		$ 1.222.200,00	0	$ -	0	$ 1.222.200,00	$ 132.476.374,60	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	10/15/2024	CE 020	CE 020	NOMINA	Nomina del 04 al 30 de Septiembre 2024	Yair Domar Puentes Ariza	91301169	Vereda Berlin La Belleza		ANULADO	$ -		$ -	0	$ -	0	$ 2.066.760,00	$ 130.409.614,60	ANULADO
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	10/15/2024	CE 021	CE 021	CC002	DIAN - Retención en la Fuente Septiembre	Junta de Acción Comunal Berlin	901069198	Vereda Berlin La Belleza	3134844556	jacberlinlabelleza@gmail.com	$ 1.021.000,00		$ 1.021.000,00	0	$ -	0	$ 1.021.000,00	$ 129.388.614,60	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	10/15/2024	CE 022	CE 022	CC003	Honorarios Profesionales Ingeniero Civil Periodo:01 al 30 de Septiembre del 2024	Jorge Romaldo Fandiño Gomez	1097665332	Carrera 3 N° 3-73 La Belleza	3123143209	jorgeromaldo26@gmail.com	$ 3.500.000,00		$ 3.500.000,00	0	$ -	0	$ 3.500.000,00	$ 125.888.614,60	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	10/15/2024	CE 023	CE 023	CC003	Honorarios Profesionales Contadora Pública Periodo: 01 al 30 de Septiembre del 2024	Maria Magdalena Albino Plionieta	28262629	Carrera 3 N° 6-20 La Belleza	3115176930	magdis.01@hotmail.com	$ 1.960.000,00		$ 1.960.000,00	0	$ -	0	$ 1.960.000,00	$ 123.928.614,60	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	10/15/2024	CE 024	CC002		Papelería Periodo: 01 al 30 deseptiembre del 2024	Sandy Tatiana Téllez Guevara	1097666706	Carrera 4 3 11	3169290705	tatianatellez89@gmail.com	$ 300.000,00		$ 300.000,00	0	$ -	0	$ 300.000,00	$ 123.628.614,60	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	10/15/2024	CE 025	CE 025	CC002	Subsidio al dignatario para transporte, Periodo: 01 al 31 de agosto 2024	Carlos Norbey Clavijo	91301354	Vereda Berlin	3134844556	norbeyclabelleza@gmail.com	$ 400.000,00		$ 400.000,00	0	$ -	0	$ 400.000,00	$ 123.228.614,60	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	10/15/2024	CE 026	CE 026	FE735	Cemento Gris Estructural MAX 42.5K	Isaac Fontecha Peña	5665248-1	Carrera 4 N° 4-49 La Belleza	3104808655		$ 6.714.286,00	$ 1.275.714,34	$ 7.990.000,34	0	$ 167.857,15	0	$ 7.822.143,19	$ 115.406.471,41	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	10/21/2024	CE 027	CE 027	FE-8817	Examenes medicos de Ingreso	CEMESO IPS SAS	91073980-4	Carrera 10 Nº 16-33 San Gil	3102732388	cemesoipssas@gmail.com	$ 480.000,00		$ 480.000,00	0	$ -	0	$ 480.000,00	$ 114.926.471,41	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	10/21/2024	CE 028	CE 028	FE-8817	Suministros de subase de triturado, Arena lavado de ria, y de Rajon	Alirio Tellez Peña	91300842-3	Carrera 4 3 124 La Belleza	3107800504	alirioltellez.5@hotmail.com	$ 32.580.000,00	$ 6.190.200,00	$ 38.770.200,00	0	$ 814.500,00	0	$ 37.955.700,00	$ 76.970.771,41	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	10/21/2024	CE 029	CE 029	FE3	Transporte Terrestre decarga	Proyectos y Servicios Buenos Aires SAS	901590930	Vereda Berlin KM6	3213452416	proyectosyserviciosbuenosaires@gmail.com	$ 11.793.600,00		$ 11.793.600,00	0	$ 117.936,00	0	$ 11.675.664,00	$ 65.295.107,41	-$ 65.295.107,41 OCTUBRE
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 953,31	10/31/2024				Rendimientos Financieros Octubre 2024	Banco Av Villas					$ -		$ -					$ 65.296.060,72	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	10/31/2024				Reintegros Banco AV Villas						$ -		$ -				$ 2.197.464,84	$ 67.493.525,56	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	10/31/2024				Notas Debito, Comisión Trasf Oficina 4*1000						$ -		$ -				$ 742.026,50	$ 66.751.499,06	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	11/5/2024	CE 030	CE 030	NOMINA	Nomina del 01 al 31 de Octubre 2024 - Liquidacion 04 Septiembre al 31 de octubre 2024	Elver Javier Ariza Ariza	91301591	Vereda Berlin La Belleza			$ 1.928.282,00		$ 1.928.282,00	0	$ -	0	$ 1.928.282,00	$ 64.823.217,06	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	11/5/2024	CE 031	CE 031	NOMINA	Nomina del 01 al 31 de Octubre 2024 - Liquidacion 04 Septiembre al 31 de octubre 2024	Nelson David Ariza Velandia	1097664878	Vereda Berlin La Belleza			$ 1.928.282,00		$ 1.928.282,00	0	$ -	0	$ 1.928.282,00	$ 62.894.935,06	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	11/5/2024	CE 032	CE 032	NOMINA	Nomina del 01 al 31 de Octubre 2024 - Liquidacion 04 Septiembre al 31 de octubre 2024	Juan Carlos Ariza Velandia	1005274847	Vereda Berlin La Belleza			$ 1.928.282,00		$ 1.928.282,00	0	$ -	0	$ 1.928.282,00	$ 60.966.653,06	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	11/5/2024	CE 033	CE 033	NOMINA	Nomina del 01 al 31 de Octubre 2024 - Liquidacion 04 Septiembre al 31 de octubre 2024	Carlos Duvan Vargas Ariza	1097666598	Vereda Berlin La Belleza			$ 1.928.282,00		$ 1.928.282,00	0	$ -	0	$ 1.928.282,00	$ 59.038.371,06	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	11/5/2024	CE 034	CE 034	NOMINA	Nomina del 01 al 31 de Octubre 2024 - Liquidacion 04 Septiembre al 31 de octubre 2024	Yhon Anderson Perez Rodriguez	1097667247	Vereda Berlin La Belleza			$ 1.928.282,00		$ 1.928.282,00	0	$ -	0	$ 1.928.282,00	$ 57.110.089,06	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO
VERSIÓN

1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	11/5/2024	CE 035	CE 035	NOMINA	Nomina del 01 al 31 de Octubre 2024 - Liquidacion 04 Septiembre al 31 de octubre 2024	Jhon Jairo Vargas Ariza	1097665792	Vereda Berlín La Belleza			$ 1.928.282,00		$ 1.928.282,00	0	$ -	0	$ 1.928.282,00	$ 55.181.807,06		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	11/5/2024	CE 036	CE 036	NOMINA	Nomina del 01 al 31 de Octubre 2024 - Liquidacion 04 al 30 de Septiembre del 2024	Yeferson Eucardo Quitian Clavijo	1005275445	Vereda Berlín La Belleza			$ 259.039,00		$ 259.039,00	0	$ -	0	$ 259.039,00	$ 54.922.768,06		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	11/5/2024	CE 037	CE 037	NOMINA	Nomina del 01 al 31 de Octubre 2024 - Liquidacion 04 Septiembre al 31 de octubre 2024	Yair Domar Puentes Ariza	91301169	Vereda Berlín La Belleza			$ -		$ -	0	$ -	0	$ 5.340.260,00	$ 49.582.508,06		ANULADO
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	11/5/2024	CE 038	CE 038	CC004	Honorarios Profesionales Ingeniero Civil Periodo:01 al 30 de Septiembre del 2024	Jorge Romaldo Fandiño Gomez	1097665332	Carrera 3 N° 3-73 La Belleza	3123143209	jorgeromaldo26@gmail.com	$ 3.500.000,00		$ 3.500.000,00	0	$ -	0	$ 3.500.000,00	$ 46.082.508,06		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	11/5/2024	CE 039	CE 039	CC004	Honorarios Profesionales Contadora Pública Periodo: 01 al 30 de Septiembre del 2024	Maria Magdalena Albino Pilonieta	28262629	Carrera 3 N° 6-20 La Belleza	3115176930	magdis.01@hotmail.com	$ 1.960.000,00		$ 1.960.000,00	0	$ -	0	$ 1.960.000,00	$ 44.122.508,06		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	11/5/2024	CE 040	CE 040	CC003	Papelería Periodo: 01 al 30 deseptiembre del 2024	Sandy Tatiana Téllez Guevara	1097666706	Carrera 4 3 11	3169290705	tatianatellez89@gmail.com	$ 300.000,00		$ 300.000,00	0	$ -	0	$ 300.000,00	$ 43.822.508,06		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	11/5/2024	CE 041	CE 041	CC003	Subsidio al dignatario para tranoporte, Periodo: 01 al 31 de agosto 2024	Carlos Norbey Clavijo	91301354	Vereda Berlín	3134844556	norbeyclabelleza@gmail.com	$ 400.000,00		$ 400.000,00	0	$ -	0	$ 400.000,00	$ 43.422.508,06		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	11/5/2024	CE 042	CE 042	CC003	Pago de seguridad Social Obreros, Retención en la Fuente, Polizas 3001976-3 y 1014717-2 y Madera	Junta de Acción Comunal Berlín	90169198-5	Vereda Berlín	3134844556	jacberlinlabelleza@gmail.com	$ 10.629.679,15		$ 10.629.679,15	0	$ -	0	$ 10.629.679,15	$ 32.792.828,91		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	11/5/2024	CE 043	CE 043	FE810	Tanque, Guantes, Puntilla, Lona Disco y Cemento Gris	Isaac Fontecha Peña	91300842-3	Carrera 4 3 124 La Belleza	3104808655		$ 1.107.562,40	$ 210.436,86	$ 1.317.999,26	0	$ -	0	$ 1.317.999,26	$ 31.474.829,65		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	11/5/2024	CE 044	CE 044	CTA CC01	Alquiler de Mezcladora por 38 dias "$80.000 y Alquiler de un vibro por 28 dias"$49000	Ana Priscila Gomez Barbosa	63370359	Carrera 3 Nº 6 28	3115143978		$ 4.902.000,00		$ 4.902.000,00	0	$ 196.080,00	0	$ 4.705.920,00	$ 26.768.909,65		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	11/5/2024	CE 046	CE 046	FE820	Tanque, Guantes, Puntilla, Lona Disco y Cemento Gris	Isaac Fontecha Peña	91300842-3	Carrera 4 3 124 La Belleza	3104808655		$ 936.974,00	$ 178.025,06	$ 1.114.999,06	0	$ -	0	$ 1.114.999,06	$ 25.653.910,59		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	11/5/2024	CE 047	CE 047	CTA CC01	Letrero (Banner) Laminado Ojales MD 100*200 CMS	Cesar Augusto Rodriguez Dimate	1012340425	Cra 30 a 2b 27 ap 401	3015302030		$ 115.000,00		$ 115.000,00	0	$ -	0	$ 115.000,00	$ 25.538.910,59		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	11/5/2024	CE 048	CE 048	FE827	Tanque, Guantes, Puntilla, Lona Disco y Cemento Gris	Isaac Fontecha Peña	91300842-3	Carrera 4 3 124 La Belleza	3104808655		$ 857.143,00	$ 162.857,17	$ 1.020.000,17	0	$ -	0	$ 1.020.000,17	$ 24.418.910,42		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	11/25/2024	CE 045	CE 045	CC001	Replanteo Topografico, de Niveles y Levantamiento Placa Huella sept-oct-nov	Dairo Arcenio Ariza Tellez	1097664661	CL 54 A 79 G 23 Sur	3208916926	dairoarizaudgmail.com	$ 3.900.000,00		$ 3.900.000,00	0	$ -	0	$ 3.900.000,00	$ 20.618.910,42		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	11/25/2024	CE 049	CE 049	CC004	Pago de seguridad Social Obreros, Retención en la Fuente, Polizas 3001976-3 y 1014717-2 y Madera	Junta de Acción Comunal Berlín	90169198-5	Vereda Berlín	3134844556	jacberlinlabelleza@gmail.com	$ 645.800,00		$ 645.800,00	0	$ -	0	$ 645.800,00	$ 19.973.110,42		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	11/25/2024	CE 050	CE 050	NOMINA	Nomina del 01 al 31 de Octubre 2024 - Liquidacion 04 Septiembre al 31 de octubre 2024	Yair Domar Puentes Ariza	91301169	Vereda Berlín La Belleza			$ -		$ -	0	$ -	0	$ 6.745.756,08	$ 13.227.354,34		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	11/25/2024	CE 051	CE 051	CC005	Honorarios Profesionales Ingeniero Civil Periodo:01 al 30 de Noviembre del 2024	Jorge Romaldo Fandiño Gomez	1097665332	Carrera 3 N° 3-73 La Belleza	3123143209	jorgeromaldo26@gmail.com	$ 3.500.000,00		$ 3.500.000,00	0	$ -	0	$ 3.500.000,00	$ 9.727.354,34		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	11/25/2024	CE 052	CE 052	CC005	Honorarios Profesionales Contadora Pública Periodo: 01 al 30 de Noviembre del 2024	Maria Magdalena Albino Pilonieta	28262629	Carrera 3 N° 6-20 La Belleza	3115176930	magdis.01@hotmail.com	$ 1.960.000,00		$ 1.960.000,00	0	$ -	0	$ 1.960.000,00	$ 7.767.354,34		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	11/25/2024	CE 053	CE 053	FE843	Cemento Gris Estructural MAX 42.5K	Isaac Fontecha Peña	91300842-3	Carrera 4 3 124 La Belleza	3104808655		$ 2.228.571,00	$ 423.428,49	$ 2.651.999,49	0	$ 55.714,28	0	$ 2.596.285,22	$ 5.171.069,12		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 269,94	11/30/2025				Rendimientos Financieros Noviembre						$ -							$ 5.171.339,06		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	11/30/2025				Reintegros Banco AV Villas	Banco Av Villas					$ -						$ 12.406.444,14	$ 17.577.783,21		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	11/30/2025				Notas Debito, Comisión Trasf Oficina 4*1000	Banco Av Villas					$ -						$ 545.614,13	$ 17.032.169,08		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	12/2/2024	CE 054	CE 054	CC005	Retención en la Fuente - Nomina del 01 al 31 de Octubre 2024 - Liquidacion 04 Septiembre al 31 de octubre 2024	Junta de Acción Comunal Berlín	90169198-5	Vereda Berlín	3134844556	jacberlinlabelleza@gmail.com	$ 6.941.956,00		$ 6.941.956,00	0		0	$ 6.941.956,00	$ 10.090.213,08		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	12/2/2024	CE 055	CE 055	FE884	Pintura Escuela sede G Colegio Integrado Don Bosco	Isaac Fontecha Peña	91300842-3	Carrera 4 3 124 La Belleza	3104808655		$ 2.301.681,00	$ 437.319,39	$ 2.739.000,39	0	$ 57.542,03	0	$ 2.681.458,36	$ 7.408.754,71		
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	12/2/2024	CE 056	CE 056	CC 002	Olla Comunitaria (Almuerzo)	Rosaura Maria Rodriguez Forero	28196364	Vereda Berlín	3153782040	jmartinariza@gmail.com	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00	0		0	$ 1.800.000,00	$ 5.608.754,71		
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	12/2/2024	CE 057	CE 057	PROY-131	Transporte	Proyectos y Servicios Buenos Aires SAS	901590930	Vereda Berlín KM6	3213452416	proyectosyserviciosbuenosaires@gmail.com	$ 1.587.600,00		$ 1.587.600,00	0	$ 15.876,00	0	$ 1.571.724,00	$ 4.037.030,71		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	12/2/2024	CE 058	CE 058	FE-4	Suministros de subbase de triturado, Arena lavado de rio	Alirio Tellez Peña	91300842-3	Carrera 4 3 124 La Belleza	3107800504	alriotellez.5@hotmail.com	$ 3.150.000,00	$ 598.500,00	$ 3.748.500,00	0	$ 78.750,00	0	$ 3.669.750,00	$ 367.280,71		
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 8,72	12/31/2024				Rendimientos Financieros Diciembre 2024						$ -							$ 367.289,43		
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	12/31/2024				Reintegros Banco AV Villas	Banco Av Villas					$ -						$ 371.329,40	$ 738.618,83		
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	12/31/2024				Notas Debito, Comisión Trasf Oficina 4*1000	Banco Av Villas					$ -						$ 138.696,55	$ 599.922,28		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	1/15/2025	CE 059	CE 059	FE991	Rodillo, Brocha, cinta	Isaac Fontecha Peña	91300842-3	Carrera 4 3 124 La Belleza	3104808655		$ 33.396,34	$ 6.345,30	$ 39.741,64	0		0	$ 39.741,64	$ 560.180,64		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	1/20/2025	CE 061	CE 061		Rendimientos Financieros	Banco de la Republica	860005216	Bogotá D.C.			$ 17.586,43	0	$ 17.586,43	0		0	$ 17.586,43	$ 542.594,21		
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4,78	1/31/2024				Rendimientos Financieros Enero 2025						$ -							$ 542.598,99		
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	1/31/2024				Notas Debito, Comisión Trasf Oficina 4*1000	Banco Av Villas					$ -						$ 14.636,72	$ 527.962,27		
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	2/10/2025	CE 060	CE 060	CC001-2025	Pago de Reembolso por alquiler de un vibro compactador por 11 días, valor diario CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS MCTE. ($49.136,71) para el CONVENIO 3753 de 2023.		90169198-5	Vereda Berlín	3134844556	jacberlinlabelleza@gmail.com	$ 523.772,05	0	$ 523.772,05	0		0	$ 523.772,05	$ 4.190,22		
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	2/10/2025	CE 062	CE 062		Rendimientos Financieros	Banco de la Republica	860005216	Bogotá D.C.			$ 4,78	0	$ 4,78				$ 4,78	$ 4.185,44		
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ -	2/10/2025				Notas Debito, Comisión Trasf Oficina 4*1000	Banco Av Villas					$ -						$ 2.095,11	$ 2.090,33		
	TOTALES	**$ 17.591,21**											**$ 185.187.717,73**	**$ 15.463.579,48**	**$ 200.127.520,38**	**$ -**	**$ 2.525.246,63**	**$ -**	**$ 229.082.444,64**	$ -		
													28	$ 29,00	30		31	32	$ 33,00			

Firma:
Nombre: CARLOS NORBEL CLAVIJO VELASCO
Representante Legal
Organización de Acción Comunal

Firma:
Nombre: Jorge Hernando Forero Forero
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Firma:
Nombre: MARIA MAGDALENA ALBINO PILONIETA
Contador de la OAC
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 181841-T

Firma:
Nombre: JORGE ROMALDO FANDIÑO GOMEZ
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 54202-304584NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONVENIO No. **4175 de 2023**

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEDL MUNICIPIO DE LA BELLEZA

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORIA
CONVENIO 4175 DE 2023	INGRESO	$ 199.319.574	15/2/2024	0	0	0	INGRESO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.319.574	
	ABONO INTERESES CC ACTIVA	$ 57.147	29/2/2024	0	0	0	ABONO INTERESES A CUENTA EN FEBRERO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.376.721	
	RETENCION EN LA FUENTE CC	$ -	15/2/2024	0	0	0	RETENCION EN LA FUENTE CC FEBRERO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.003	$ 199.372.718	
	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		15/2/2024	0	0	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 199.372.718	
	ABONO INTERESES CC ACTIVA	$ 118.153	27/3/2024	0	0	0	ABONO INTERESES A CUENTA EN MARZO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.490.871	
	RETENCION EN LA FUENTE CC	$ -	27/3/2024	0	0	0	RETENCION EN LA FUENTE CC MARZO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.272	$ 199.482.599	
	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	$ -	27/3/2024	0	0	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MARZO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.482.599	
	ABONO INTERESES CC ACTIVA	$ 118.196	30/4/2024	0	0	0	ABONO INTERESES A CUENTA EN ABRILC	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.600.795	
	RETENCION EN LA FUENTE CC	$ -	30/4/2024	0	0	0	RETENCION EN LA FUENTE CC ABRIL	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.010	$ 199.592.785	
	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	$ -	30/4/2024	0	0	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.592.785	
	ABONO INTERESES CC ACTIVA	$ 125.892	30/5/2024	0	0	0	ABONO INTERESES A CUENTA EN MAYO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.718.677	
	RETENCION EN LA FUENTE CC	$ -	30/5/2024	0	0	0	RETENCION EN LA FUENTE CC MAYO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.277	$ 199.710.400	
	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	$ -	30/5/2024	0	0	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MAYO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.710.400	
	ABONO INTERESES CC ACTIVA	$ 106.814	28/6/2024	0	0	0	ABONO INTERESES A CUENTA EN JUNIO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.817.214	
	RETENCION EN LA FUENTE CC	$ -	28/6/2024	0	0	0	RETENCION EN LA FUENTE CC JUNIO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.480	$ 199.809.734	
	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	$ -	28/6/2024	0	0	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.809.734	
	ABONO INTERESES CC ACTIVA	$ 110.746	31/7/2024	0	0	0	ABONO INTERESES A CUENTA EN JULIO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.920.480	
	RETENCION EN LA FUENTE CC	$ -	31/7/2024	0	0	0	RETENCION EN LA FUENTE CC JULIO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.014	$ 199.912.466	
	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	$ -	31/7/2024	0	0	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS JULIO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.912.466	
	ABONO INTERESES CC ACTIVA	$ 124.628	30/8/2024	0	0	0	ABONO INTERESES A CUENTA EN AGOSTO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.037.094	
	RETENCION EN LA FUENTE CC	$ -	30/8/2024	0	0	0	RETENCION EN LA FUENTE CC AGOSTO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.485	$ 200.029.609	
	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	$ -	30/8/2024	0	0	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.029.609	
1	COSTO DIRECTO DE OBRA	$ -	17/9/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N°1	4	27	DOTACION PARA LOS OBREROS	FERNEY ALEJANDRO SANCHEZ	1049608353-0	CR 10 29 23 TUNJA	3002372369	FERALEJO9@HOTMAIL.COM	$ 1.772.000	$ -	$ 1.772.000	$ -	$ 44.300	$ -	$ 1.727.700	$ 198.301.909	
3	COSTO ADMINISTRATIVO	$ -	12/9/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N°2	5	CUENTA DE COBRO	REEMBOLSO DE POLIZAS	LEIDY YASMINE GOMEZ MARIN	63371200	BARRIO UNICENTRO LA BELLEZA	3103147947	gomezleidy309@gmail.com	$ 1.938.140	$ -	$ 1.938.140	$ -	$ -	$ -	$ 1.938.140	$ 196.363.769	
3	COSTO ADMINISTRATIVO	$ -	12/9/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N°3	6	CUENTA DE COBRO	SUBSIDIO AL DIGNATARIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ 400.000	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ 195.963.769	
3	COSTO ADMINISTRATIVO	$ -	11/9/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N°4	7	CUENTA DE COBRO	PAGO SERVICIOS PRELIMINARES INGENIERO RESIDENTE	JORGE EDUARDO HURTADO PEDRA	1049634413	FLORIAN, SANTANDER	3208212170		$ 4.036.600	$ -	$ 4.036.600	$ -	$ -	$ -	$ 4.036.600	$ 191.927.169	
3	COSTO ADMINISTRATIVO	$ -	11/9/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N°5	8	CUENTA DE COBRO	PAGO SERVICIOS PRELIMINARES CONTADORA	DIANA MILENA GONZALEZ RODRIG	1014220726	VILLA CAMPESTRE, LA BELLEZA	3507107316	milenitagr2@gmail.com	$ 2.437.200	$ -	$ 2.437.200	$ -	$ -	$ -	$ 2.437.200	$ 189.489.969	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	12/9/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N°6	9	CUENTA DE COBRO	ESTUDIO Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	JEFFERSON CAMILO AGUILAR PAR	7321156	CL 19 9 28 CHIQUINQUIRA	3118508140	juancap_d@hotmail.com	$ 4.800.000	$ -	$ 4.800.000	$ -	$ 192.000		$ 4.608.000	$ 184.881.969	
	ABONO INTERESES CC ACTIVA	$ 105.393	30/9/2024	0	0	0	ABONO INTERESES A CUENTA EN AGOSTO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 184.987.362	
	RETENCION EN LA FUENTE CC	$ -	30/9/2024	0	0	0	RETENCION EN LA FUENTE CC AGOSTO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.595	$ 184.979.767	
	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	$ -	30/9/2024	0	0	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 184.979.767	
3	COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	3/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 7	10	CUENTA DE COBRO	VALLA (BANNER) LAMINADA CON OJALETES DE 1MTS X 2MTS	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIM	1012340425	VILLA CAMPESTRE, LA BELLEZA	3138431511	tmstamp.01@gmail.com	$ 115.000	$ -	$ 115.000	$ -	$ -	$ -	$ 115.000	$ 184.864.767	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	3/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 9	12	FV 7669	VARILLAS 3/8 X 60, FLEJES 12X17 3/8 KILOS ALAMBRE NEGRO	HUMBERTO GONZALEZ MANCIPE	7304186	CR 9 9 56 CHIQUINQUIRA	3102486890	humbertogonzalez06@yahoo.es	$ 18.990.000	$ 3.608.099	$ 22.598.099	$ -	$ 474.750	$ -	$ 22.123.349	$ 162.741.418	
3	COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	3/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 10	13	CUENTA DE COBRO	REEMBOLSO PAPELERIA, PLANOS, ALMUERZOS Y HOSPEDAJES	JUAN PABLO OVALLE PINEDA	5771781	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ 400.000	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ 162.341.418	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	4/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 11	14	FE704	CEMENTO GRIS ESTRUCTURAL MAX 42,5K 485 UNIDADES	ISAAC FONTECHA PEÑA	5665248	CR 4 4 49 LA BELLEZA	3104808655		$ 13.979.412	$ 2.656.088	$ 16.635.500	$ -	$ 349.485	$ -	$ 16.286.015	$ 146.055.403	
3	COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	3/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 12	15	CUENTA DE COBRO	SUBSIDIO AL DIGNATARIO POR EL MES DE OCTUBRE	JUAN PABLO OVALLE PINEDA	5771781	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ 400.000	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ 145.655.403	
3	COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	3/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 13	16	CUENTA DE COBRO	PAGO SALARIO INGENIERO RESIDENTE MES DE SEPTIEMBRE Y ABONO DE OCTUBRE	JORGE EDUARDO HURTADO PEDRA	1049634413	FLORIAN, SANTANDER	3208212170		$ 3.933.200	$ -	$ 3.933.200	$ -	$ -	$ -	$ 3.933.200	$ 141.722.203	
3	COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	3/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 14	17	CUENTA DE COBRO	PAGO SALARIO SERVICIO DE CONTABILIDAD MES DE SEPTIEMBRE	DIANA MILENA GONZALEZ RODRIG	1014220726	VILLA CAMPESTRE, LA BELLEZA	3507107316	milenitagr2@gmail.com	$ 1.960.000	$ -	$ 1.960.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.960.000	$ 139.762.203	
3	COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	11/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 16	19	81197350	REEMBOLSO PLANILLA DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	JUAN PABLO OVALLE PINEDA	5771781	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ 1.456.500	$ -	$ 1.456.500	$ -	$ -	$ -	$ 1.456.500	$ 138.305.703	

1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	29/11/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 17	21	PROY-105	TRANSPORTE DE VARILLA	PROYECTOS Y SERVICIOS BUENOS AIRES SAS	901590930	VDA BERLIN KM 6 SEC VIA LA BELLEZA LA GRANJA	3213452416	proyectosyserviciosbuenosaires@gmail.com	$ 2.500.000	$ -	$ 2.500.000		$ 25.000	$ -	$ 2.475.000	$ 135.830.703				
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	15/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 8	11		SUBBASE GRANULKAR SBG 129 M3	SCS BUENA VISTA S.A.S	900543662	CR 4 3 151 LA BELLEZA	3112255232	scsbvistasas@gmail.com	$ 9.675.000	$ 1.838.250	$ 11.513.250	$ -	$ 241.875	$ -	$ 11.271.375	$ 124.559.328				
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	16/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 18	20	NOMMINA	REEMBOLSO NOMINA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2024	JUAN PABLO OVALLE PINEDA	5771781	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ 9.456.074	$ -	$ 9.456.074	$ -	$ -	$ -	$ 9.456.074	$ 115.103.254				
3	COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	22/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 19	22	4910871346653	REEMBOLSO RETENCION EN LA FUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	JUAN PABLO OVALLE PINEDA	5771781	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ 1.483.000	$ -	$ 1.483.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.483.000	$ 113.620.254				
3	COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	22/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 20	23	CUENTA DE COBRO	PAPELERIA RESMAS DE PAPEL, ESFEROS CARPETAS MARCADORES FOLDER...	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIMATE	1012340425	VILLA CAMPESTRE, LA BELLEZA	3138431511	tmstamp.01@gmail.com	$ 400.000	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ 113.220.254				
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	22/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 21	24	113	180 TABLAS DE 2,7X15X300	OSCAR JAVIER MARIN ROJAS	91301497	CASERIO EL RUBI MUNICIPIO DE LA BELLEZA	3505766069	oscarjmarinr@hotmail.com	$ 2.700.000	$ -	$ 2.700.000	$ -	$ 94.500	$ -	$ 2.605.500	$ 110.614.754				
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	18/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 23	27	SCS29 - SCS30	TRANSPORTE DE 122 SUBBASE GRANULAR Y 129 M3 DE MATERIAL TRITURADO Y PIEDRA RAJON	SCS BUENA VISTA S.A.S	900543662	CR 4 3 151 LA BELLEZA	3112255232	scsbvistasas@gmail.com	$ 16.817.000	$ -	$ 16.817.000	$ -	$ 168.170	$ -	$ 16.648.830	$ 93.965.924				
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	18/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 24	28	SCS31	73 M3 DE GRAVA TRITURADA, 42 M3 DE SUBBASE GRANULAR Y 14 M3 DE RAJON	SCS BUENA VISTA S.A.S	900543662	CR 4 3 151 LA BELLEZA	3112255232	scsbvistasas@gmail.com	$ 9.900.000	$ 1.881.000	$ 11.781.000	$ -	$ 247.500	$ -	$ 11.533.500	$ 82.432.424				
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	30/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 22	25	E258	58 M3 ARENA	TECNOCONSTRUCTORS LIMITADA	804003612	CR 4 6 21 LA BELLEZA	3203499371	geraldomarinlb@yahoo.com	$ 2.030.000	$ 385.700	$ 2.415.700	$ -	$ 50.750	$ -	$ 2.364.950	$ 80.067.474				
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	13/11/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 25	29	177	TRANSPORTE DE 58M3 DE ARENA	ASOCIACION DE PRODUCTORES D	901107136	KM 1 VIA LA BELLEZA JESUS MARIA VDA SITIO NUEV	3112029923	leilc.85@hotmail.com	$ 12.180.000	$ -	$ 12.180.000	$ -	$ 121.800	$ -	$ 12.058.200	$ 68.009.274				
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	30/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 26	30	SCS37	ALQUILER MEZCLADORA PARA CONCRETO	SCS BUENA VISTA S.A.S	900543662	CR 4 3 151 LA BELLEZA	3112255232	scsbvistasas@gmail.com	$ 1.571.428	$ 298.571	$ 1.869.999	$ -	$ 62.857	$ -	$ 1.807.142	$ 66.202.132				
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	30/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 27	31	SCS36	TRANSPORTE DE 21M3 DE TRITURADO Y 21M3 DE SUBBASE	SCS BUENA VISTA S.A.S	900543662	CR 4 3 151 LA BELLEZA	3112255232	scsbvistasas@gmail.com	$ 2.814.000	$ -	$ 2.814.000	$ -	$ 28.140	$ -	$ 2.785.860	$ 63.416.272				
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	30/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 28	32	SCS35	21M3 DE GRAVA Y 21M3 DE SUBBASE	SCS BUENA VISTA S.A.S	900543662	CR 4 3 151 LA BELLEZA	3112255232	scsbvistasas@gmail.com	$ 3.255.000	$ 618.450	$ 3.873.450	$ -	$ 81.375	$ -	$ 3.792.075	$ 59.624.197				
3	COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	1/11/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 29	33	CUENTA DE COBRO	PAGO SALARIO INGENIERO RESIDENTE SALDO DEL MES DE OCTUBRE	JORGE EDUARDO HURTADO PEDRA	1049634413	FLORIAN, SANTANDER	3208212170		$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000	$ 56.624.197				
3	COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	30/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 30	34	CUENTA DE COBRO	PAGO SALARIO CONTADORA MES DE OCTUBRE	DIANA MILENA GONZALEZ RODRIG	1014220726	VILLA CAMPESTRE, LA BELLEZA	3507107316	milenitagr2@gmail.com	$ 1.960.000	$ -	$ 1.960.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.960.000	$ 54.664.197				
3	COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	30/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 31	35	CUENTA DE COBRO	PAGO SUBSIDIO AL DIGNATARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	JUAN PABLO OVALLE PINEDA	5771781	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ 400.000	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ 54.264.197				
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	30/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 32	36	NOMINA	PAGO NOMINA A LOS OBREROS DEL 16 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	JUAN PABLO OVALLE PINEDA	5771781	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ 7.730.905	$ -	$ 7.730.905	$ -	$ -	$ -	$ 7.730.905	$ 46.533.292				
3	COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	5/11/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 35	38	FE-8830	EXAMENES MEDICOS DE INGRESO	CEMESO IPS SAS	901073980	CR 10 16 33 SAN GIL	3167410048	cemesoipssas@gmail.com	$ 480.000	$ -	$ 480.000	$ -	$ -	$ -	$ 480.000	$ 46.053.292				
	ABONO INTERESES CC ACTIVA	$ 53.622	30/10/2024	0	0	0	ABONO INTERESES A CUENTA EN AGOSTO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.106.914				
	RETENCION EN LA FUENTE CC	$ -	30/10/2024	0	0	0	RETENCION EN LA FUENTE CC AGOSTO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.340	$ 46.103.574				
	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	$ -	30/10/2024	0	0	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO	JAC CACHIPAYAL	800010670	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.103.574				
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	21/11/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N°	39	FE812	8 UNIDADES DE CEMENTO GRIS ESTRUCTURAL MAX 42,5 K	ISAAC FONTECHA PEÑA	5665248	CR 4 4 49 LA BELLEZA	3104808655		$ 7.004.117	$ 1.330.781	$ 8.334.898	$ -	$ 338.677	$ -	$ 7.996.221	$ 38.107.353				
3	COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	20/11/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 37	40		REEMBOLOSO DE PLANILLA DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE	JUAN PABLO OVALLE PINEDA	5771781	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ 6.233.600	$ -	$ 6.233.600	$ -	$ -	$ -	$ 6.233.600	$ 31.873.753				
3	COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	20/11/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 39	42	4910880408801	REEMBOLSO RETENCION EN LA FUENTE DE OCTUBRE	JUAN PABLO OVALLE PINEDA	5771781	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ 1.186.000	$ -	$ 1.186.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.186.000	$ 30.687.753				
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	22/11/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 40	43	CUENTA DE COBRO	ALQUILER DE VIBRO COMPACTADOR	ANA PRISCILA GOMEZ BARBOSA	63370359	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3115143978	ana.gomezbarbosa@hotmail.com	$ 1.300.000	$ -	$ 1.300.000	$ -	$ 52.000	$ -	$ 1.248.000	$ 29.439.753				
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	20/11/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 41	44	LIQUIDACION	REEMBOLSO LIQUIDACION DE TRABAJADORES	JUAN PABLO OVALLE PINEDA	5771781	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ 3.813.110	$ -	$ 3.813.110	$ -	$ -	$ -	$ 3.813.110	$ 25.626.643				
3	COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	20/11/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 43	46	CUENTA DE COBRO	SALARIO DE INGENIERO RESIDENTE DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE	JORGE EDUARDO HURTADO PEDRA	1049634413	FLORIAN, SANTANDER	3208212170		$ 1.750.000	$ -	$ 1.750.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.750.000	$ 23.876.643				
3	COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	20/11/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 44	47	CUENTA DE COBRO	SALARIO CONTADORA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE	DIANA MILENA GONZALEZ RODRIGUEZ	1014220726	VILLA CAMPESTRE, LA BELLEZA	3507107316	milenitagr2@gmail.com	$ 980.000	$ -	$ 980.000	$ -	$ -	$ -	$ 980.000	$ 22.896.643				
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	20/11/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 45	48	FEBE8978	REEMBOLSO 170 CEMENTOS	JUAN PABLO OVALLE PINEDA	5771781	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ 4.428.571	$ 841.428	$ 5.269.999	$ -	$ -	$ -	$ 5.269.999	$ 17.626.644				
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	20/11/2024	COMPROBANTE DE EGRESO N° 38	49	CUENTA DE COBRO	SERVICIO DE TOPOGRAFIA	DAIRO ARCENIO ARIZA TELLEZ	1097664661	LA BELLEZA			$ 3.900.000	$ -	$ 3.900.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.900.000	$ 13.726.644				
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	16/1/2025	COMPROBANTE DE EGRESO N° 46	51	FE929	5 PERFILES RECTANGULARES Y 8 TEJAS ARQUITECTONICAS 26*6	ISAAC FONTECHA PEÑA	5665248	CR 4 4 49 LA BELLEZA	3104808655	isaacfontecha1047@hotmail.com	$ 1.697.910	$ 290.428	$ 1.988.338	$ -	$ -	$ -	$ 1.988.338	$ 11.738.306				
3	COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	16/1/2025	COMPROBANTE DE EGRESO N° 47	52		IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	JUAN PABLO OVALLE PINEDA	5771781	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ 169.000	$ -	$ 169.000	$ -	$ -	$ -	$ 169.000	$ 11.569.306				
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	16/1/2025	COMPROBANTE DE EGRESO N° 48	53	CUENTA DE COBRO	REEMBOLSO ALMUERZO COMUNITARIO	JUAN PABLO OVALLE PINEDA	5771781	VDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA	3212490133	ovallepinedap@gmail.com	$ 2.728.428	$ -	$ 2.728.428	$ -	$ -	$ -	$ 2.728.428	$ 8.840.878				
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ -	1/16/2025	COMPROBANTE DE EGRESO N° 49	54	LB17	SUMINISTRO DE SUBBASE 42,25 M3	ASOCIACION DE MINEROS AGROIN	901378352	CR 4 3 124 BRR LA UNION	3107800504	asomineroslb@gmail.com	$ 3.612.394	$ 686.355	$ 4.298.749	$ -	$ -	$ -	$ 4.298.749	$ 4.542.129				
		$ 920.591																						

Firma:
Nombre: Juan Pablo Ovalle Pineda

Firma:
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO

Representante Legal
Organización de Acción Comunal

Firma:

Nombre: Diana Milena Gonzalez Rodriguez
Contador de la OAC
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 280783-T

Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Firma:

Nombre: Jorge Eduardo Hurtado Pedraza
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 041037-0547416

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No. (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ORGANOS

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
6	ADMINISTRATIVOS	10-sept-24	Comprob. Egresp	000012	FE-175	Cheque 012 pago de reembolso de poliza 3001994 y 1014746, viaticos al dignatario, asiganncion de caja menor y anticipo para adecuacion de bodega para convenio 4490 de 2023 con INVIAS	LEIDY CARANTON CARANTON	1099342608	VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO SUCRE	3138699825	cominto1001@hotmail.com	$ 2.561.218,00	$ -	$ 2.561.218,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.561.218,00		
6	ADMINISTRATIVOS	10-sept-24	Comprob. Egresp	000002	CC-01	cheque 002 desembolso para pago de Honorarios Ingeniero Residente de Obra mes de agosto la ejecución del convenio N°4490 de 2023 con INVIAS	CRISTIAN IVAN MARIN QUITIAN	11011785035	CL 6 3 70 BRR COMUNEROS	3107426014	cristianmarin-10@hotmail.com	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 3.472.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS	10-sept-24	Comprob. Egresp	000003	4	cheque 003Desembolso para pago de Honorarios como Contador correspondiente al mes de agosto de 2024 para la ejecución del convenio N°4490 de 2023 con INVIAS	LEILA MARIA REYES MOSQUERA	63438463	vereda el amarillo	3102576800	leydereyes@hotmail.com	$ 1.960.000,00	$ -	$ 1.960.000,00	$ -	$ 15.680,00	$ -	$ 1.944.320,00		
6	ADMINISTRATIVOS	10-sept-24	Comprob. Egresp	000004		cheque 004 Para pago de adquisicion de elementos de Protección Personal para la elaboracion de placa huella segun convenio N°4490 de 2023 con INVIAS	HELI ALBERTO PAEZ TORRES	91016543	CR 10 12 25 BRR SAN JORGE	3115382490	extinpaez@yahoo.com	$ 2.620.417,00	$ -	$ 2.620.417,00	$ -	$ 65.512,00	$ -	$ 2.554.905,00		
6	ADMINISTRATIVOS	10-sept-24	Comprob. Egresp	000005	3	cheque 005 Para pago de adquisicion de valla informativa de placa huella segun convenio N°4490 de 2023 con INVIAS	CLAUDIA XIMENA PARRA PALOMINO	11016866745	CL 9B D7 8 URB SAN JERONIMO	3132496435	cximena.parra@gmail.com	$ 200.000,00	$ -	$ 200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 200.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS	10-sept-24	Comprob. Egresp	000006		cheque 006 Para pago de reembolso de Exámenes de ingreso personal nómina para la obra de placa huella segun convenio N°4490 de 2023 con INVIAS	LEIDY CARANTON CARANTON	1099342608	VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO SUCRE	3138699825	comito1001@hotmail.com	$ 280.000,00	$ -	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 280.000,00		
2	MATERIALES	10-sept-24	Comprob. Egresp	000007	N/A	cheque 007 Anticipo para pago de adquisicion de materiales (subase- triturado y rajon) para la obra de placa huella segun convenio N°4490 de 2023 con INVIAS	TECNOCONSTRUCTORES LIMITADA	8040036128	CR 4 6 19 P 2 BRR LA PRIMAVERA	3203499371	gerardomarinlb@yahoo.com	$ 9.625.000,00	$ 1.828.750,00	$ 11.453.750,00	$ -		$ -	$ 11.453.750,00		
2	MATERIALES	10-sept-24	Comprob. Egresp	000008	24	cheque 008 Para pago de adquisicion de materiales (1.300 Varillas de 3/8" - 20 Varillas de 1/2" - 100 kg Alambre de amarre) para la obra de placa huella segun convenio N°4490 de 2023 con INVIAS	COOMULTRASAN	8902010636	CR 35 A 48 57 59 BRR CABECERA	6434204	gerencia@comultrasan.com.co	$ 19.664.000,00	$ -	$ 19.664.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 19.664.000,00		
2	MATERIALES	10-sept-24	Comprob. Egresp	000009	FV 26	Cheque 009 Pago pago de adquisicion de materiales (Cemento Estructural de 42.5 kg) para la obra de placa huella segun convenio N°4490 de 2023 con INVIAS	FABIAN LEONARDO PAEZ LANCHEROS	744392311	CR 12 10 03	3212076190	plh1@hotmail.com	$ 12.925.000,00	$ -	$ 12.925.000,00	$ -	$ 271.534,00	$ -	$ 12.653.466,00		
2	MATERIALES	10-sept-24	Comprob. Egresp	000010	FE675	cheque 010 Para pago de adquisicion de materiales (tabla de 14 cm x 2 1/2" x 3 formaleta en madera - Tabla de 14 cm x 2 1/2" x 3 formaleta en madera) para la obra de placa huella segun convenio N°4490 de 2023 con INVIAS	MIGUEL ANTONIO DUARTE VELEZCO	57874317	TV 3 5 91	7485041	maderaslumjay@hotmail.com	$ 1.320.000,00	$ -	$ 1.320.000,00	$ -	$ 33.000,00	$ -	$ 1.287.000,00		
2	MATERIALES	10-sept-24	Comprob. Egresp	000011	FV7658	Cheque 011 Para pago de adquisicion de materiales (Arena Lavada - Puntilla coriente de 2 1/2" y 3"- Disco pulidora de 9" corte de acero - Tela Verde - Plastico Negro) para la obra de placa huella segun convenio N° 4490 de 2023 con INVIAS	YEIMI CASTILLO GALEANO	1097638939	KM 1 VIA CITE SECTOR LA REVUELTA	3102576160	castillo.yeimi@yahoo.es	$ 4.052.000,00	$ -	$ 4.052.000,00	$ -	$ 85.126,00	$ -	$ 3.966.874,00		
6	ADMINISTRATIVOS	17-sept-24	Comprob. Egresp	000015	31	Cheque 015 Para pago de anticipo de servicio de Topografia, estudios y diseños para Contrucción de placa huella correspondiente al convenio N°4490 de 2023 con INVIAS	JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA	7321156	CL 19 9 28	3118508140	contador-acr10@gmail.com	$ 2.350.000,00	$ -	$ 2.350.000,00	$ -		$ -	$ 2.350.000,00		
4	TRANSPORTES	2/10/2024	Comprob. Egresp	000016	26	Reembolso Transporte de Varilla y un Mesclladora en la Turbo de placa QFZ - 062 de Barbosa a Sucre, Alimentación operarios maquinaria amarilla, combustible para maquinaria amarilla, adecuación bodega septiembre, gastos de caja menor del mes de septiembre y subsidio al dignatario para el mes de septiembre para Construcción de placa huella correspondiente al convenio N°4490 de 2023 con INVIAS	LEYDY JOHANA GARANTON GARANTON	1099342608	VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO SUCRE	3138699825	comito1001@hotmail.com	$ 1.907.943,00	$ -	$ 1.907.943,00	$ -	$ 4.343,00	$ -	$ 1.903.600,00	$ -	
4	TRANSPORTES	2/10/2024	Comprob. Egresp	000017	NoT205	Para pago de Transporte de material para el sector La Peña Municipio de Sucre desde Barbosa, Santander, por viaje de volqueta sencilla para construcción de placa huella correspondiente al convenio N°4490 de 2023 con INVIAS	TRANSPORTES DE VOLQUETAS EN SANTANDER LTDA	901345981	CARRERA 6 3 52 BRR LA BOMBA	318 5029826	travosai2020@hotmail.com	$ 1.880.000,00	$ -	$ 1.880.000,00	$ -	$ 18.800,00	$ -	$ 1.861.200,00	$ -	
4	TRANSPORTES	2/10/2024	Comprob. Egresp	000018	JACO5	Para pago de transporte de materiales pétreos de la Cantera Peña Blanca Tecnoconstructores al sitio de la Construcción de placa huella correspondiente al convenio N°4490 de 2023 con INVIAS de acuerdo a la relación de la cuenta de cobro 1 del 10 de septiembre al 18 de septiembre de 2024	DUVAN ALBERTO QUIROGA SANCHEZ	5771730	CORR LA GRANJA	3114928070	albeiroquiroga43@gmail.com	$ 9.910.000,00	$ -	$ 9.910.000,00	$ -	$ 99.100,00	$ -	$ 9.810.900,00	$ -	
2	MATERIALES	2/10/2024	Comprob. Egresp	000019	NoE257	Para pago de material pétreo arena de la Cantera Peña Blanca Tecnoconstructores placa de placa huella correspondiente al convenio N°4490 de 2023 con INVIASPara pago de material pétreo arena de la Cantera Peña Blanca Tecnoconstructores de placa huella correspondiente al convenio N°4490 de 2023 con INVIAS	TECNOCONSTRUCTORES LTDA	80040036128	CR 4 6 19 P 2 BRR LA PRIMAVERA	3203499371	gerardomarinlb@yahoo.com	$ 2.332.400,00	$ -	$ 2.332.400,00	$ -	$ 58.310,00	$ -	$ 2.274.090,00	$ -	
4	TRANSPORTES	2/10/2024	Comprob. Egresp	000020	ASOP169	Para pago de transporte de materiales pétreos de Puerto Berrio Antioquia al sitio de la Construcción de placa huella correspondiente al convenio N°4490 de 2023 con INVIAS	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA	90110713609	LUGAR KM 1 VIA LA BELLEZA JESUS MARIA VDA SITIO NUEVO FCA LA ESPERANZA	3112029923		$ 8.680.000,00	$ -	$ 8.680.000,00	$ -	$ 86.800,00	$ -	$ 8.593.200,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS	2/10/2024	Comprob. Egresp	000021	FEA-342	PARA PAGO DE NOMINA MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTE A 21 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONVENIO 4490 DE 2023	JORGE ALIRIO BAREÑO MATEUS	1101019878	VEREDA ORGANOS	3223636264	jorgeabareno@gmail.com	$ 1.624.000,00	$ -	$ 1.624.000,00	$ -	$ 129.920,00	$ -	$ 1.494.080,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	2/10/2024	Comprob. Egresp	000022	N/A	PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 21 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONVENIO 4490 DE 2023	SEGUNDO ALEJANDRO MATEUS MATEUS	5772227	VEREDA ORGANOS	3212543442	jhojanstivenmateusmoreno@gmail.com	$ 910.000,00	$ -	$ 910.000,00	$ -	$ 72.800,00	$ -	$ 837.200,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	2/10/2024	Comprob. Egresp	000023	N/A	PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 21 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONVENIO 4490 DE 2023	CARLOS HERNAN FRANCO URREGO	5772005	VEREDA ORGANOS	3153371812	comito1001@hotmail.com	$ 910.000,00	$ -	$ 910.000,00	$ -	$ 72.800,00	$ -	$ 837.200,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	2/10/2024	Comprob. Egresp	000024	N/A	PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 16 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONVENIO 4490 DE 2023	OSCAR ANDRES MATEUS MATEUS	1101020406	VEREDA ORGANOS	3226117109	andresmateus401@gmail.com	$ 693.333,00	$ -	$ 693.333,00	$ -	$ 55.466,00	$ -	$ 637.867,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	2/10/2024	Comprob. Egresp	000025	N/A	PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONVENIO 4490 DE 2023	ADOLFO QUIROGA				comito1001@hotmail.com	$ 606.667,00	$ -	$ 606.667,00	$ -	$ 48.534,00	$ -	$ 558.133,00	$ -	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	15/10/2024	Comprob. Egresp	000026	JACO7	CUENTA DE COBRO ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1.5 BULTOS PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA CORRESPONDIENTE AL CONVENIO N° 4490 DE 2023 CON INVIAS	YILMER GONZALO MARIN	1101177653	CALLE 9B N° D7-8 PUENTE NACIONAL	3142999301	yilmarmarin@hotmail.com	$ 1.200.000,00	$ -	$ 1.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS	15/10/2024	Comprob. Egresp	000027	JACO8	HONORARIOS DEL 17 DE JUNIO AL 30 DE JULIO Y DE 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE - INGENIERO RESIDENTE de OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO N°4490 DE 2023 CON INVIAS	CRISTIAN IVAN MARIN QUITIAN	11011785035	CL 6 3 70 BRR COMUNEROS	3107426014	cristianmarin-10@hotmail.com	$ 4.500.000,00	$ -	$ 4.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.500.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS	15/10/2024	Comprob. Egresp	000028	CUENTA DE COBRO	HONORARIOS DEL 17 DE JUNIO AL 30 DE JULIO Y DE 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE - DE CONTADOR PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO N°4490 DE 2023	LEILA MARIA REYES MOSQUERA	63438463	VEREDA EL AMARILLO	3102576800	leydereyes@hotmail.com	$ 2.940.000,00	$ -	$ 2.940.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.940.000,00	$ -	
2	MATERIALES	15/10/2024	Comprob. Egresp	000029	FVEM 267	PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES (TABLA DE 14 X 2 1/2" X 3) PARA LA OBRA DE PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO N°4490 DE 2023 CON INVIAS	MIGUEL ANTONIO DUARTE VELEZCO	57874317	TV 3 5 91	7485041	maderaslumjay@hotmail.com	$ 600.000,00	$ -	$ 600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 600.000,00	$ -	
2	MATERIALES	15/10/2024	Comprob. Egresp	000030	MC1-1384	ADQUISICION DE PLASTICO, DISCO DE CORTE Y PUNTILLA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO N° 4490 DE 2023 CON INVIAS	YEIMI CASTILLO GALEANO	1097638939	KM 1 VIA CITE SECTOR LA REVUELTA	3102576160	castillo.yeimi@yahoo.es	$ 461.000,00	$ -	$ 461.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 461.000,00	$ -	
2	MATERIALES	15/10/2024	Comprob. Egresp	000031	FEI 70306	COMPRA DE CEMENTO 2 VIAJES 460 BULTOS PARA EJECUCION DE OBRA PLACA HUELLA CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	FABIAN LEONARDO PAEZ LANCHEROS	744392311	CR 12 10 03	3212076190	plh1@hotmail.com	$ 12.925.000,00	$ -	$ 12.925.000,00	$ -	$ 271.533,00	$ -	$ 12.653.467,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS	15/10/2024	Comprob. Egresp	000032	FE-282	PAGO ENSAYO DE LABORATORIO, DENSIDAD DE LA SUBBASE Y CILINDROS PARA EJECUCION DE PLACA HUELLA CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	FWF GEOINGENIERIA S.A.S	900730123	CR 7 5 C 43 LC 1	3103257287	fwfgeoingenieria@gmail.com	$ 594.881,00	$ -	$ 594.881,00	$ -	$ 19.996,00	$ -	$ 574.885,00	$ -	
2	MATERIALES	15/10/2024	Comprob. Egresp	000033	E 256	PARA PAGO DE MATERIAL PÉTREO SUBBASE, TRITURADO Y RAJON DE LA CANTERA PEÑA BLANCA TECNOCONSTRUCTORES DE PLACA HUELLA CORRESPONDIENTE AL CONVENIO N°4490 DE 2023 CON INVIAS	TECNOCONSTRUCTORES	80040036128	CR 4 6 19 P 2 BRR LA PRIMAVERA	3203499371	gerardomarinlb@yahoo.com	$ 5.206.250,00	$ -	$ 5.206.250,00	$ -	$ 350.000,00	$ -	$ 4.856.250,00	$ -	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	15/10/2024	Comprob. Egresp	000034	JACO12	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2024 PARA EJECUCION DE LA OBRA DE PLACA HUELLA CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	XIMENA PARRA	11016866745	CL 9B D7 8 URB SAN JERONIMO	3132496435	cximena.parra@gmail.com	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS	15/10/2024	Comprob. Egresp	000035	24	PARA PAGO DE NOMINA MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024, CONVENIO 4490 DE 2023	JORGE ALIRIO BAREÑO MATEUS	1101019878	VEREDA ORGANOS	3223636264	jorgeabareno@gmail.com	$ 1.992.400,00	$ -	$ 1.992.400,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.992.400,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	15/10/2024	Comprob. Egresp	000036	FE-9	PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024, CONVENIO 4490 DE 2023	SEGUNDO ALEJANDRO MATEUS MATEUS	5772227	VEREDA ORGANOS	3212543452	jhojanstivenmateusmoreno@gmail.com	$ 792.400,00	$ -	$ 792.400,00	$ -	$ -	$ -	$ 792.400,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	15/10/2024	Comprob. Egresp	000037	N/A	PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024, CONVENIO 4490 DE 2023	CARLOS HERNAN FRANCO URREGO	5772005	VEREDA ORGANOS	3153371812	comito1001@hotmail.com	$ 792.400,00	$ -	$ 792.400,00	$ -	$ -	$ -	$ 792.400,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	15/10/2024	Comprob. Egresp	000038	N/A	PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024, CONVENIO 4490 DE 2023	OSCAR ANDRES MATEUS MATEUS	1101020406	VEREDA ORGANOS	3226117109	andresmateus401@gmail.com	$ 765.400,00	$ -	$ 765.400,00	$ -	$ -	$ -	$ 765.400,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	15/10/2024	Comprob. Egresp	000039	N/A	PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024, CONVENIO 4490 DE 2023	ADOLFO QUIROGA		CORR LA GRANJA		comito1001@hotmail.com	$ 528.267,00	$ -	$ 528.267,00	$ -	$ -	$ -	$ 528.267,00	$ -	

5	MANO DE OBRA	15/10/2024	Comprob. Egresp	000040	YS-7	PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024, CONVENIO 4490 DE 2023	CRISTIAN JULIAN FRANCO	1101018767	VEREDA ORGANOS		comito1001@hotmail.com	$ 1.176.933,00	$ -	$ 1.176.933,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.176.933,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	15/10/2024	Comprob. Egresp	000041	N/A	PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DE 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024, CONVENIO 4490 DE 2023	OSCAR SAIN ARIZA	1101019180	VEREDA ORGANOS		comito1001@hotmail.com	$ 1.176.933,00	$ -	$ 1.176.933,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.176.933,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	15/10/2024	Comprob. Egresp	000042	N/A	PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024, CONVENIO 4490 DE 2023	MARCO TULIO ARIZA	91452879	VEREDA ORGANOS		comito1001@hotmail.com	$ 860.067,00	$ -	$ 860.067,00	$ -	$ -	$ -	$ 860.067,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	15/10/2024	Comprob. Egresp	000043	N/A	LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES PARA EMPLEADO DE OBRA PLACA HUELLA CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	ADOLFO QUIROGA		VEREDA ORGANOS		comito1001@hotmail.com	$ 239.047,00	$ -	$ 239.047,00	$ -	$ -	$ -	$ 239.047,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	22/10/2024	Comprob. Egresp	000044	PLANILLA PAGA	REGISTRO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	EPS FAMISANAR	830003564-7	calle 78 n° 13A - 07	3078069	servicioalcliente@famisanar.com.co	$ 1.948.500,00	$ -	$ 1.948.500,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.948.500,00	$ -	
0	PAGO DE IMPUESTOS	22/10/2024	Comprob. Egresp	000044	RECIBO OFICIAL PAGO IMPUESTO NACIONAL	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	DIAN	800.197.268-4	Sede principal | Bogotá, Nivel Central, carrera 8 N° 6C - 38 Edificio San Agustí	310 3158107		$ 455.000,00	$ -	$ 455.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 455.000,00	$ -	
4	TRANSPORTES	22/10/2024	Comprob. Egresp	000044	CUENTA DE COBRO	REEMBOLSO DE TRASPORTE DE MADERA DESDE BARBOSA HASTA EL SECTOR LA PEÑA DE ÓRGANOS MUNICIPIO DE SUCRE EN EL VEHÍCULO DE PLACAS FSB124 PARA OBRA PLACA	DUVAN ALBEIRO QUIROGA SANCHEZ	5.771.730	CORR LA GRANJA	3114928070	albeiroquiroga43@gmail.com	$ 170.000,00	$ -	$ 170.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 170.000,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	29/10/2024	Comprob. Egresp	000045	NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 18 DIAS MES DE OCTUBRE, CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	EDWAR ARBEY MARIN MATEUS					$ 807.024,00	$ -	$ 807.024,00	$ -	$ -	$ -	$ 807.024,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS	29/10/2024	Comprob. Egresp	000046	CUENTA DE COBRO	REEMBOLSO ADECUACION DE BODEGA MES DE OCTUBRE, CAJA MENOR MES DE OCTUBRE Y SUBSIDIO AL DIGNATARIO DEL MES DE OCTUBRE PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	LEIDY JOHANA CARANTON CARANTON	1099342608	VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO SUCRE	3138699825	cominito1001@hotmail.com	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS	5-nov-24	Comprob. Egresp	000047	N/A	PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, MAESTRO DE OBRA CONVENIO 4490 DE 2023	JORGE ALIRIO BAREÑO MATEUS	1101019878	VEREDA ORGANOS	3223636264	jorgeabareno@gmail.com	$ 1.635.399,00	$ -	$ 1.635.399,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.635.399,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	5-nov-24	Comprob. Egresp	000048	N/A	PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, CONVENIO 4490 DE 2023	CARLOS HERNAN FRANCO URREGO	5772005	VEREDA ORGANOS	3153371812	comito1001@hotmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	5-nov-24	Comprob. Egresp	000049	N/A	PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, CONVENIO 4490 DE 2023	SEGUNDO ALEJANDRO MATEUS MATEUS	5772227	VEREDA ORGANOS	3212543452	jhojanstivenmateusmoreno@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	5-nov-24	Comprob. Egresp	000050	N/A	PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, CONVENIO 4490 DE 2023	OSCAR ANDRES MATEUS MATEUS	1101020406	VEREDA ORGANOS	3226117109	andresmateus401@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	5-nov-24	Comprob. Egresp	000051	N/A	PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, CONVENIO 4490 DE 2023	CRISTIAN JULIÁN FRANCO	1101018767	VEREDA ORGANOS		comito1001@hotmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	5-nov-24	Comprob. Egresp	000052	N/A	PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL AL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024 Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2024, CONVENIO 4490 DE 2023	OSCAR SAIN ARIZA	1101019180	VEREDA ORGANOS		comito1001@hotmail.com	$ 314.304,00	$ -	$ 314.304,00	$ -	$ -	$ -	$ 314.304,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS	5-nov-24	Comprob. Egresp	000053	CUENTA DE COBRO	HONORARIOS COMO CONTADOR PARA LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ORGANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PARA LA ASESORIA CONTABLE EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 4490 DEL 2023	LEILA MARIA REYES MOSQUERA	63438463	VEREDA EL AMARILLO	3102576800	leydereyes@hotmail.com	$ 1.920.000,00	$ -	$ 1.920.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.920.000,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	5-nov-24	Comprob. Egresp	000054	N/A	PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, CONVENIO 4490 DE 2023	MARCO TULIO ARIZA	91452879	VEREDA ORGANOS		comito1001@hotmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS	5-nov-24	Comprob. Egresp	000055	CUENTA DE COBRO	HONORARIOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE - INGENIERO RESIDENTE DE OBRA DURANTE LAEJECUCION DEL CONVENIO N°4490 DE 2023 CON INVIAS	CRISTIAN IVAN MARIN QUITIAN	1101785035	CL 6 3 70 BRR COMUNEROS	3107426014	cristianmarin-10@hotmail.com	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS	5-nov-24	Comprob. Egresp	000056	N/A	ADQUISICION DE 216 VARILLAS DE 3/8 Y 26 KILOS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA OBRA DE PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER	890201063	CARRERA 35 A 48 57 59 BARRIO CABEZERA BUCARAMANGA	6434204	servicialcliente@coomultrasan.com.co	$ 2.670.035,44	$ 507.306,73	$ 3.177.342,17	$ -	$ 66.750,89	$ -	$ 3.110.591,29	$ -	SE DEVOLVIO LA RETENCION
2	MATERIALES	5-nov-24	Comprob. Egresp	000057	E-267	ADQUISICION DE MATERIAL PETREO 14 METROS DE TRITURADO, 21 METROS DE SUBBASE Y 14 METROS DE ARENA LAVADA PARA OBRA DE PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	TECNOCONSTRUCTORES LTDA	804003612	CARRERA 4 6 19 P2 BARRIO LA PRIMAVERA	3203499371	gerardomarinlb@yahoo.com	$ 3.010.000,00	$ 571.900,00	$ 3.581.900,00	$ -	$ 75.250,00	$ -	$ 3.506.650,00	$ -	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	19-nov-24	Comprob. Egresp	000058	CUENTA DE COBRO	ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1.5 BULTOS DEL 23 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024	YILMAR GONZALO MARIN QUITIAN	1101177653	CALLE 9B N° D7-8 PUENTE NACIONAL	3142999301	yilmarmarin@hotmail.com	$ 1.600.000,00	$ -	$ 1.600.000,00	$ -	$ 112.000,00	$ -	$ 1.488.000,00	$ -	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	19-nov-24	Comprob. Egresp	000059	CUENTA DE COBRO	ALQUILER DE PLACA COMPACTADORA TIPO RANA, DEL 01 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	INGRID JOHENNY GARZÓN VELASCO	1005460897	CL 6 #5-09		johenny1999@gmail.com	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -	$ 60.000,00	$ -	$ 1.440.000,00	$ -	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	19-nov-24	Comprob. Egresp	000060	CUENTA DE COBRO	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA DEL 10 DE OCTUBRE DE 2024 A 23 DE NOVIEMBRE DE 2024	XIMENA PARRA	11016866745	CL 9B D7 8 URB SAN JERONIMO	3132496435	cximena.parra@gmail.com	$ 1.300.000,00	$ -	$ 1.300.000,00	$ -	$ 52.000,00	$ -	$ 1.248.000,00	$ -	
4	TRANSPORTES	19-nov-24	Comprob. Egresp	000061	CUENTA DE COBRO	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO DESDE DE LA CANTERA LA BELLEZA TECNOCONSTRUCTORES A LA PEÑA DE ÓRGANOS	DUVAN ALBEIRO QUIROGA SANCHEZ	5771730	CORR LA GRANJA	3114928070	albeiroquiroga43@gmail.com	$ 6.629.260,00	$ -	$ 6.629.260,00	$ -	$ 66.292,00	$ -	$ 6.562.968,00	$ -	
0	PAGO DE IMPUESTOS	19-nov-24	Comprob. Egresp	000062	RECIBO 490	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE OCTUBRE	DIAN	800.197.268-4	Sede principal | Bogotá, Nivel Central, carrera 8 N° 6C - 38 Edificio San Agustí	310 3158107	recaudo@dian.gov.co	$ 909.000,00	$ -	$ 909.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 909.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS	19-nov-24	Comprob. Egresp	000063	N/A	PAGO DE NOMINA DE 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 MAESTRO DE OBRA , CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	JORGE ALIRIO BAREÑO MATEUS	1101019878	VEREDA ORGANOS	3223636264	jorgeabareno@gmail.com	$ 1.895.240,00	$ -	$ 1.895.240,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.895.240,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	19-nov-24	Comprob. Egresp	000064	N/A	PAGO DE NOMINA DE 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	SEGUNDO ALEJANDRO MATEUS MATEUS	5772227	VEREDA ORGANOS	3212543452	jhojanstivenmateusmoreno@gmail.com	$ 855.799,00	$ -	$ 855.799,00	$ -	$ -	$ -	$ 855.799,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	19-nov-24	Comprob. Egresp	000065	N/A	PAGO DE NOMINA DE 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	CARLOS HERNAN FRANCO URREGO	5772005	VEREDA ORGANOS	3153371812	comito1001@hotmail.com	$ 751.800,00	$ -	$ 751.800,00	$ -	$ -	$ -	$ 751.800,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	19-nov-24	Comprob. Egresp	000066	N/A	PAGO DE NOMINA DE 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	OSCAR ANDRES MATEUS MATEUS	1101020406	VEREDA ORGANOS	3226117109	andresmateus401@gmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	19-nov-24	Comprob. Egresp	000067	N/A	PAGO DE NOMINA DE 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	CRISTIAN JULIÁN FRANCO	1101018767	VEREDA ORGANOS		comito1001@hotmail.com	$ 751.800,00	$ -	$ 751.800,00	$ -	$ -	$ -	$ 751.800,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	19-nov-24	Comprob. Egresp	000068	N/A	PAGO DE NOMINA DE 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	MARCO TULIO ARIZA	91452879	VEREDA ORGANOS		comito1001@hotmail.com	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	19-nov-24	Comprob. Egresp	000069	N/A	PAGO DE NOMINA DE 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	EDWAR ARBEY MARIN MATEUS					$ 824.600,00	$ -	$ 824.600,00	$ -	$ -	$ -	$ 824.600,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	19-nov-24	Comprob. Egresp	000070	No PLANILLA 31634955	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE APORTES PARAFISCALES.	Eps Famisanar	830003564-7	calle 78 n° 13A - 07	3078069	servicioalcliente@famisanar.com.co	$ 869.300,00	$ -	$ 869.300,00	$ -	$ -	$ -	$ 869.300,00	$ -	
2	MATERIALES	19-nov-24	Comprob. Egresp	000071	CUENTA DE COBRO	REEMBOLSO ADQUISICION DE 20 BULTOS DE CEMENTO Y TRANSPORTE DEL MISMO PARA OBRA DE PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	LEIDY JOHANA CARANTON CARANTON	1099342608	VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO SUCRE	3138699825	cominito1001@hotmail.com	$ 670.000,00	$ -	$ 670.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 670.000,00	$ -	PROVEEDOR YULI MARLEN ROJAS CC: 28192335 CR 4 DG 4 30 SEC EL COGOLLO
6	ADMINISTRATIVOS	25-nov-24	Comprob. Egresp	000072	N/A	PAGO NOMINA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y PRESTACIONES SOCIALES DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 MAESTRO DE OBRA , CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	JORGE ALIRIO BAREÑO MATEUS	1101019878	VEREDA ORGANOS	3223636264	jorgeabareno@gmail.com	$ 2.490.412,00	$ -	$ 2.490.412,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.490.412,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	25-nov-24	Comprob. Egresp	000073	N/A	PAGO NOMINA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y PRESTACIONES SOCIALES DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA OBRA PLACA HUELLA CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	SEGUNDO ALEJANDRO MATEUS MATEUS	5772227	VEREDA ORGANOS	3212543452	jhojanstivenmateusmoreno@gmail.com	$ 1.280.863,00	$ -	$ 1.280.863,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.280.863,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	25-nov-24	Comprob. Egresp	000074	N/A	PAGO NOMINA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y PRESTACIONES SOCIALES DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA OBRA PLACA HUELLA CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	CARLOS HERNAN FRANCO URREGO	5772005	VEREDA ORGANOS	3153371812	comito1001@hotmail.com	$ 1.280.863,00	$ -	$ 1.280.863,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.280.863,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	25-nov-24	Comprob. Egresp	000075	N/A	PAGO NOMINA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y PRESTACIONES SOCIALES DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA OBRA PLACA HUELLA CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	OSCAR ANDRES MATEUS MATEUS	1101020406	VEREDA ORGANOS	3226117109	andresmateus401@gmail.com	$ 1.299.586,00	$ -	$ 1.240.352,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.240.352,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	25-nov-24	Comprob. Egresp	000076	N/A	PAGO NOMINA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y PRESTACIONES SOCIALES DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA OBRA PLACA HUELLA CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	CRISTIAN JULIÁN FRANCO	1101018767	VEREDA ORGANOS		comito1001@hotmail.com	$ 1.189.771,00	$ -	$ 1.189.771,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.189.771,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	25-nov-24	Comprob. Egresp	000077	N/A	PAGO NOMINA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y PRESTACIONES SOCIALES DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA OBRA PLACA HUELLA CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	MARCO TULIO ARIZA	91452879	VEREDA ORGANOS		comito1001@hotmail.com	$ 1.108.986,00	$ -	$ 1.108.986,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.108.986,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	25-nov-24	Comprob. Egresp	000078	N/A	PAGO NOMINA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y PRESTACIONES SOCIALES DEL 12 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA OBRA PLACA HUELLA CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	EDWAR ARBEY MARIN MATEUS					$ 957.977,00	$ -	$ 957.977,00	$ -	$ -	$ -	$ 957.977,00	$ -	
5	MANO DE OBRA	25-nov-24	Comprob. Egresp	000079	PLANILLA	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 EMPLEADOS OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4490 DE 2023	Eps Famisanar	830003564-7	calle 78 n° 13A - 07	3078069	servicioalcliente@famisanar.com.co	$ 4.827.500,00	$ -	$ 4.827.500,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.827.500,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS	25-nov-24	Comprob. Egresp	000080	CUENTA DE COBRO	HONORARIOS DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE – COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO N°4490 DE 2023	CRISTIAN IVAN MARIN QUITIAN	1101785035	CL 6 3 70 BRR COMUNEROS	3107426014	cristianmarin-10@hotmail.com	$ 2.500.000,00	$ -	$ 2.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.500.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS	25-nov-24	Comprob. Egresp	000081	CUENTA DE COBRO	PAGO HONORARIOS COMO CONTADOR PARA LA JUNTA DE ACCION DE ORGANOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.	LEILA MARIA REYES MOSQUERA	63438463	VEREDA EL AMARILLO	3102576800	leydereyes@hotmail.com	$ 1.020.000,00	$ -	$ 1.020.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.020.000,00	$ -	

6	ADMINISTRATIVOS	25-nov-24	Comprob. Egresp	000082	CUENTA DE COBRO	SUBSIDIO AL DIGNATARIO PARA TRANSPORTE (VIATICOS) MES DE NOVIEMBRE DE 2024. COMPRA DE CEMENTO PARA ADECUACIONES DE BORDILLO Y TAPA DISIPADOR Y REEMBOLSO DE PAGO DE TRANSPORTE PARA DEVOLVER LA MAQUINARIA ALQUILADA Y REEMBOLSO DEVOLUCION DE RETENCION EN LA FUENTE COOMULTRASAN EN EJECUCION DEL CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	LEIDY JOHANA CARANTON CARANTON	1099342608	VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO SUCRE	3138699825	cominito1001@hotmail.com	$ 759.753,00	$ -	$ 759.753,00	$ -	$ -	$ -	$ 759.753,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS	2-dic-24	Comprob. Egresp	000083	CUENTA DE COBRO	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIMBRE DE 2024 EN EJECUCION DE CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	LEIDY JOHANA CARANTON CARANTON	1099342608	VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO SUCRE	3138699825	cominito1001@hotmail.com	$ 3.752.500,00	$ -	$ 3.752.500,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.752.500,00		
0	PAGO DE IMPUESTOS	2-dic-24	Comprob. Egresp	000084	N/A	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE NOVIEMBRE	DIAN	800.197.268-4	Sede principal | Bogotá, Nivel Central, carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustí	309 3158107	recaudo@dian.gov.co	$ 365.000,00	$ -	$ 365.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 365.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS	2-dic-24	Comprob. Egresp	000085	N/A	PAGO DE POLIZA 116837501 Y 116839401 PARA CONVENIO 4490 DE 2023 CON INVIAS	LEIDY JOHANA CARANTON CARANTON	1099342608	VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO SUCRE	3138699825	cominito1001@hotmail.com	$ 814.103,00	$ -	$ 814.103,00	$ -	$ -	$ -	$ 814.103,00	$ -	
7	PAGA	18-dic-24	Comprob. Egresp	000086	N/A	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS RUBRO: PAGA	Yuli Marlen Rojas	28192335-7		3143820464	yulimar25@outlook.es	$ 465.000,00	$ -	$ 465.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 465.000,00	$ -	
7	PAGA	18-dic-24	Comprob. Egresp	000088		COMPRA DE MANGUERA RUBRO: PAGA	Ferretería Todohierros	901670760-1		(607)3112342003		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CHEQUE ANULADO
7	PAGA	18-dic-24	Comprob. Egresp	000089	CUENTA DE COBRO	ALMUERZOS RUBRO: PAGA	LEIDY JOHANA CARANTON CARANTON	1099342608	VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO SUCRE	3138699825	cominito1001@hotmail.com	$ 2.248.439,00	$ -	$ 2.248.439,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.248.439,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS	18-dic-24	Comprob. Egresp	000090	CUENTA DE COBRO	SALDO ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONVENIO RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS	JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA	7321156	CL 19 9 28	3118508140	contador-acr10@gmail.com	$ 523.140,00	$ -	$ 523.140,00	$ -	$ -	$ -	$ 523.140,00	$ -	
7	PAGA	16-ene-25	Comprob. Egresp	000091	N/A	ADQUISICIÓN DE MANGUERA COMO PARTE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL DEL PAGA	EDGAR ARBEY GONZÁLEZ	79517277-0	CRA 6 N° 4-61	3203404457	elgaarbeyg@gmail.com	$ 1.771.000,00		$ 1.809.000,00		$ 38.000,00		$ 1.771.000,00		ESTE CHEQUE REEMPLAZA EL CHEQUE N° 000088
0	PAGO DE IMPUESTOS	16-ene-25	Comprob. Egresp	000092	RECIBO OFICIAL PAGO IMPUESTO NACIONAL	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	DIAN	800.197.268-4	Sede principal | Bogotá, Nivel Central, carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustí	310 3158107	recaudo@dian.gov.co	$ 38.000,00		$ 38.000,00				$ 38.000,00		
0	PAGO DE IMPUESTOS	16-ene-25	Comprob. Egresp	000093	RECIBO OFICIAL PAGO IMPUESTO NACIONAL	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	DIAN	800.197.268-4	Sede principal | Bogotá, Nivel Central, carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustí	310 3158107	recaudo@dian.gov.co	$ 38.000,00	$ -	$ 38.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 38.000,00	$ -	
																		$ 198.363.086,29		

Nombre: Leidy Johana Caranton Caranton
Representante Legal
Contratista

Nombre: Leila Maria Reyes Mosquera
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 233326-T

Firma:
Nombre: Jorge Hernando Forero Forero
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No. 25202-61517 CND

Firma:
Nombre: Cristian Ivan Marin Quitian
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.

erventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
ratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No. 4357-2023 (Indicar número y año) **ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL** JUANTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
6	ADMINISTRATIVOS		10-sept-2024	Comprobante de egreso	0001	DS1	Servicios profesionales como contador de la junta de Accion Comunal de la Vereda Tubavita del convenio 4357 de 2023, correspondiente al 01 de Agosto al 31 De Agosto de 2024	ALBA RUTH SANTAMARIA ARIZA	63437843	CALLE 10 4 37	3115700626	ruthmauro1109@gmail.com	$ 1.960.000,00	$ -	$ 1.960.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.960.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		10-sept-2024	Comprobante de egreso	0002	DS5	Servicios profesionales como ingeniera civil de la junta de Accion Comunal de la Vereda Tubavita del convenio 4357 de 2023, Correspondiente al 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2024	MARIA CAMILA DÍAZ CARRASCO	1101758682	CRA 3 # 7 - 83	3219942418	mariaca9588@gmail.com	$ 3.500.000,00		$ 3.500.000,00				$ 3.500.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS	$107.520,00	10-sept-2024	Comprobante de egreso	0003	DS3	Anticipio estudios y diseños para el mejoramiento de la via Terciaria mediante ala construcción junta de Accion Comunal de la Vereda Tubavita del convenio 4357 de 2023	JOHANNA EMIRA ANGULO VANEGAS	63436382	carrera 4 Nº 13A -114	3124723735	joempipa@gmail.com	$ 4.680.000,00		$ 4.680.000,00	$ 3.276.000,00			$ 3.276.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		10-sept-2024	Comprobante de egreso	0004	DS4	Viaticos del presidente de la Junta de Accion Comunal de la Vereda Tubavita del convenio 4357 de 2023, correspondiente al Mes de Agosto	GLADYS CHACON HERNANDEZ	63434698	VEREDA TUBAVITA	3138886679	gladyschaconher@hotmail.com	$ 400.000,00		$ 400.000,00				$ 400.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		10-sept-2024	Comprobante de egreso	0005	3001997-0	Poliza N° 1014749-0 y N° 3001997-0 de la Junta de Accion Comunal de la Vereda Tubavita del convenio 4357 de 2023	GLADYS CHACON HERNANDEZ	63434698	VEREDA TUBAVITA	3138886679	gladyschaconher@hotmail.com	$ 1.557.644,00		$ 1.557.644,00				$ 1.557.644,00		
6	ADMINISTRATIVOS		2-oct-2024	Comprobante de egreso	006	DS6	Pago honorarios como ingeniera civil del convenio 4357 del 2023 por el periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre del año 2024, cheque 0007 del bancoagrario	MARIA CAMILA DÍAZ CARRASCO	1101758682	CRA 3 # 7 - 83	3219942418	mariaca9588@gmail.com	$ 994.800,00		$ 994.800,00				$ 994.800,00		
6	ADMINISTRATIVOS		2-oct-2024	Comprobante de egreso	009	DS9	Viaticos del presidente de la Junta de Accion Comunal de la Vereda Tubavita del convenio 4357 de 2023, correspondiente al Mes de Agosto	GLADYS CHACON HERNANDEZ	63434698	VEREDA TUBAVITA	3138886679	gladyschaconher@hotmail.com	$ 400.000,00		$ 400.000,00				$ 400.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		2-oct-2024	Comprobante de egreso	011	FV3	BANNER (PENDON TIPO VALLA) IMPRESION A COLORPLASTIFICADA TAMAÑO 200X100CM	JENNIFER PAOLA GUZMAN REMOLINA	1098697939	Calle 9 382	3114808612		$ 120.000,00		$ 120.000,00				$ 120.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		15-oct-2024	Comprobante de egreso	007	DS7	Pago honorarios residente del convenio 4357 del 2023 por el periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre del año 2024, cheque 0007 del bancoagrario	MARIA CAMILA DÍAZ CARRASCO	1101758682	CRA 3 # 7 - 83	3219942418	mariaca9588@gmail.com	$ 3.500.000,00		$ 3.500.000,00			$ 28.000,00	$ 3.472.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		15-oct-2024	Comprobante de egreso	010	DS10	Servicios profesionales como contador de la junta de Accion Comunal de la Vereda Tubavita del convenio 4357 de 2023, correspondiente al 01 de Agosto al 31 De Agosto de 2024	ALBA RUTH SANTAMARIA	63437843	CALLE 10 4 37	3115700626	ruthmauro1109@gmail.com	$ 1.960.000,00		$ 1.960.000,00			$ 15.680,00	$ 1.944.320,00		
6	ADMINISTRATIVOS		15-oct-2024	Comprobante de egreso	013	FVEH-361	Dotación personal de obra convenio-canecas - otros	PAEZ TORRES HELI ALBERTO	91016543	CR 10 12 25 BRR SAN JORGE	3115382490	extinpaez@yahoo.com	$ 1.979.284,00		$ 1.979.284,00		$ 50.482,00		$ 1.928.802,00		
6	ADMINISTRATIVOS		15-oct-2024	Comprobante de egreso	012	DS11	EXAMEN OCUPACIONAL	LILIANA PATRICIA PLATA VILLAREAL	63527432	CL 35 34 43 AP 104	3125728840	patriciaplatav@hotmail.com	$ 150.000,00		$ 150.000,00				$ 150.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		29-oct-2024	Comprobante de egreso	014	JESS-206	Gastos de papeleria de la junta accion comunal	JESSICA PAOLA MARULANDA	1101757575	CL 9 3 10 BRR CENTRO	3102970560	danielf2004.a@gmail.com	$ 300.100,00		$ 300.100,00				$ 300.100,00		
6	ADMINISTRATIVOS		29-oct-2024	Comprobante de egreso	015	FVEH-369-FVEH-365	Compra dotación botas, guantes empleados	HELI ALBERTO PAEZ TORREZ	91016543	CR 10 12 25 BRR SAN JORGE	3115382490	extinpaez@yahoo.com	$ 690.060,00		$ 690.060,00				$ 690.060,00		
4	TRANSPOTE		29-oct-2024	Comprobante de egreso	016	DS13	Reintegro combustible	GLADYS CHACON HERNANDEZ	63434698	VEREDA TUBAVITA	3138886679	gladyschaconher@hotmail.com	$ 240.000,00		$ 240.000,00				$ 240.000,00		
2	MATERIALES		29-oct-2024	Comprobante de egreso	017	FE 1335	COMPRA DE MATERIALES	CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA S.A.S	900414198	KM 14 + 500 VIA BARBOSA -MONIQUIRA	3105759087	calmineral.co@gmail.com	$ 5.740.000,00	$ 1.090.600,00	$ 6.830.600,00		$ 143.500,00		$ 6.687.100,00		
2	MATERIALES		29-oct-2024	Comprobante de egreso	018	DS12	TUBOS DE 36 PULGADAS EN CONHCRETO REFORZADO	TOBIAS MALAGON GUERRERO	74244480	KM 2 VIA BARBOSA-MONIQUIRA	3143522365	tobiasmalagon1976@gmail.com	$ 1.700.000,00		$ 1.700.000,00		$ 42.500,00		$ 1.657.500,00		
2	MATERIALES		29-oct-2024	Comprobante de egreso	019	FECA 80	MATERIALES DE OBRA	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CR 6 5 A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	$ 10.585.148,00	$ 2.011.178,12	$ 12.596.326,12		$ 264.628,70	$ 21.170,30	$ 12.310.527,12		
4	TRANSPORTE		29-oct-2024	Comprobante de egreso	020	FECA79	TRASPORTE DEMATERIALES	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CR 6 5 A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	$ 3.800.000,00		$ 3.800.000,00		$ 38.000,00	$ 19.000,00	$ 3.743.000,00		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		29-oct-2024	Comprobante de egreso	021	PRV 10	ALQUILER DE MAQUINARIA	PROINSO VELEZ S.A.S	901598620	CR 3 10 57 BRR CENTRO	3229037245	proinsovelez@gmail.com	$ 2.556.000,00	$ 485.640,00	$ 3.041.640,00		$ 89.460,00	$ 12.780,00	$ 2.939.400,00		
2	MATERIALES		29-oct-2024	Comprobante de egreso	022	FECN-88	COMPRA DE MADERA	CRISTIAN JESUS NIEVES	1101755630	CL 12 5 12 BRR LA ESPERANZA	3124844762	nievescristian1990@gmail.com	$ 430.000,00		$ 430.000,00				$ 430.000,00		
2	MATERIALES		5-nov-2024	Comprobante de egreso	023	FECA-87, FECA-86	MATERIALES DE OBRA	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CR 6 5 A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	$ 4.180.000,00		$ 4.180.000,00		$ 41.800,00	$ 20.900,00	$ 4.117.300,00		
2	MATERIALES		5-nov-2024	Comprobante de egreso	024	DS14	REINTEGRO DE COMBUSTIBLE	GLADYS CHACON HERNANDEZ	63434698	VEREDA TUBAVITA	3138886679	gladyschaconher@hotmail.com	$ 643.010,00		$ 643.010,00				$ 643.010,00		
2	MATERIALES		5-nov-2024	Comprobante de egreso	025	FE-1350	COMPRA DE MATERIALES	CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA S.A.S	900414198	KM 14 + 500 VIA BARBOSA -MONIQUIRA	3105759087	calmineral.co@gmail.com	$ 4.620.000,00	$ 877.800,00	$ 5.497.800,00		$ 115.500,00		$ 5.382.300,00		
6	ADMINISTRATIVOS		12-nov-2024	Comprobante de egreso	026	DS16	PAGO SUBSIDIO	GLADYS CHACON HERNANDEZ	63434698	VEREDA TUBAVITA	3138886679	gladyschaconher@hotmail.com	$ 400.000,00		$ 400.000,00				$ 400.000,00		
0	PAGO DE IMPUESTOS		12-nov-2024	Comprobante de egreso	027	3510611014271	PAGO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE	DIRRECION DE IMPUESTOS Y ADUNAS NACIONALES					$ 630.000,00		$ 630.000,00				$ 630.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		12-nov-2024	Comprobante de egreso	029	DS15	DESEEMBOLSO PAPELERIA	GLADYS CHACON HERNANDEZ	63434698	VEREDA TUBAVITA	3138886679	gladyschaconher@hotmail.com	$ 600.000,00		$ 600.000,00				$ 600.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		12-nov-2024	Comprobante de egreso	030	DS17	Servicios profesionales como contador de la junta de Accion Comunal de la Vereda Tubavita del convenio 4357 de 2023	ALBA RUTH SANTAMARIA ARIZA	63437843	CALLE 10 4 37	3115700626	ruthmauro1109@gmail.com	$ 980.000,00		$ 980.000,00				$ 980.000,00		
5	MANO DE OBRA		12-nov-2024	Comprobante de egreso	031	NOMINA	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE	DIEGO LEONARDO BARBOSA ARIZA	1101753321	VRDA TUBAVITA	3132360371		$ 1.132.333,00		$ 1.132.333,00				$ 1.132.333,00		
5	MANO DE OBRA		12-nov-2024	Comprobante de egreso	032	NOMINA	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE	LUIS ARIEL DIAZ ARIZA	13956736	VRDA TUBAVITA	3125651126		$ 1.390.000,00		$ 1.390.000,00				$ 1.390.000,00		
5	MANO DE OBRA		12-nov-2024	Comprobante de egreso	033	NOMINA	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE	EDILBERTO CUBIDES	13956198	VRDA TUBAVITA	3144357377		$ 1.132.333,00		$ 1.132.333,00				$ 1.132.333,00		
6	ADMINISTRATIVOS		12-nov-2024	Comprobante de egreso	034	NOMINA	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE MAESTRO DE OBRA	RAMIRO DIAZ QUIROGA	13955127	CALLE 13a 6-64	3112382961		$ 1.897.667,00		$ 1.897.667,00				$ 1.897.667,00		
5	MANO DE OBRA		12-nov-2024	Comprobante de egreso	035	NOMINA	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE	JUAN PABLO MORALES CASTILLO	1070922552	VRDA TUBAVITA	3133613917		$ 1.132.333,00		$ 1.132.333,00				$ 1.132.333,00		
5	MANO DE OBRA		12-nov-2024	Comprobante de egreso	036	NOMINA	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE	JAVIER GALEANO HERNANDEZ	7171930	VRDA TUBAVITA	3227906277		$ 1.132.333,00		$ 1.132.333,00				$ 1.132.333,00		
5	MANO DE OBRA		12-nov-2024	Comprobante de egreso	037	Planillas 31568011	PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE OCUBRE	GLADYS CHACON HERNANDEZ	63434698	VEREDA TUBAVITA	3138886679	gladyschaconher@hotmail.com	$ 1.356.300,00		$ 1.356.300,00				$ 1.356.300,00		
6	ADMINISTRATIVOS		12-nov-2024	Comprobante de egreso	038		TOMA DE ENSAYOS DE LABORATORIO	JHON JAIRO CAMACHO AVILA	1054679289	CL 18 No. 7- 65	3124709472		$ 270.000,00		$ 270.000,00				$ 270.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		25-nov-2024	Comprobante de egreso	039	DS18	PAGO DE HONORARIOS INGENIERO CIVIL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	MARIA CAMILA DIAZ CARRASCO	1101758682	CRA 3 # 7 - 83	3219942418	mariaca9588@gmail.com	$ 3.500.000,00		$ 3.500.000,00			$ 14.000,00	$ 3.486.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		25-nov-2024	Comprobante de egreso	040	DS19	PAGO DE HONORARIOS CONTADOR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	ALBA RUTH SANTAMARIA ARIZA	63437843	CALLE 10 4 37	3115700626	ruthmauro1109@gmail.com	$ 1.960.000,00		$ 1.960.000,00			$ 7.840,00	$ 1.952.160,00		
2	MATERIALES		25-nov-2024	Comprobante de egreso	041	FECA-89	PAGO FACTURA FECA-89 COMPRA DE MATIALES VARILLA, CEMENTO Y OTROS MATERIALES	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CR 6 5 A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	$ 11.116.676,00	$ 2.112.168,44	$ 13.228.844,44		$ 277.916,90	$ 44.466,00	$ 12.906.461,54		
4	TRANSPORTE		25-nov-2024	Comprobante de egreso	042	FECA-88	PAGO FACTURA DE TRANSPORTE DE MATERIALES, GRAVILLA,RAJON	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CR 6 5 A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	$ 1.520.000,00		$ 1.520.000,00		$ 15.200,00	$ 7.600,00	$ 1.497.200,00		
2	MATERIALES		25-nov-2024	Comprobante de egreso	043	FECN-91 y FECN-92	COMPRA DE MADERA Y ALQUILER DE CAMILLAS	CRISTIAN JESUS NIEVES SERRANO	1101755630	CL 12 5 12 BRR LA ESPERANZA	3124844762	nievescristian1990@gmail.com	$ 620.000,00		$ 620.000,00				$ 620.000,00		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		25-nov-2024	Comprobante de egreso	044	PRV 12	ALQUILER DE RETROEXCABADORA	PROINSO VELEZ S.A.S	901598620	CR 3 10 57 BRR CENTRO	3229037245	proinsovelez@gmail.com	$ 564.000,00	$ 107.160,00	$ 671.160,00				$ 671.160,00		
0	PAGO DE IMPUESTOS		26-nov-2024	N/A	045	No Retención: 666	PAGO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	MUNICIPIO VELEZ SANTANDER	890205677	calle 9 2 37		secretariahacienda@velez-santander.gov.co	$ 97.000,00		$ 97.000,00				$ 97.000,00		
6	ADMINISTRATIVOS		25-nov-2024	Comprobante de egreso	008	DS	SERVICIOS TOPOGRAFICOS	JOHANNA EMIRA ANGULO VANEGAS	63436382	CR 4 13A -114	3124723735		$ 1.404.000,00		$ 1.404.000,00			$ 18.720,00	$ 1.385.280,00		
5	MANO DE OBRA		2-dic-2024	Comprobante de egreso	046	NOMINA	PAGO NOMINA DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE	JAVIER GALEANO HERNANDEZ	7171930	VRDA TUBAVITA	3227906277		679.000		679.000				679.000		
5	MANO DE OBRA		2-dic-2024	Comprobante de egreso	047	NOMINA	PAGO NOMINA DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE	JUAN PABLO MORALES CASTILLO	1070922552	VRDA TUBAVITA	3133613917		679.000		679.000				679.000		
6	ADMINISTRATIVOS		2-dic-2024	Comprobante de egreso	048	NOMINA	PAGO NOMINA DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE	RAMIRO DIAZ QUIROGA	13955127	CALLE 13a 6-64	3112382961		1.139.000		1.139.000				1.139.000		
5	MANO DE OBRA		2-dic-2024	Comprobante de egreso	049	NOMINA	PAGO NOMINA DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE	EDILBERTO CUBIDES	13956198	VRDA TUBAVITA	3144357377		679.000		679.000				679.000		
5	MANO DE OBRA		2-dic-2024	Comprobante de egreso	050	NOMINA	PAGO NOMINA DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE	LUIS ARIEL DIAZ ARIZA	13956736	VRDA TUBAVITA	3125651126		834.000		834.000				834.000		
5	MANO DE OBRA		2-dic-2024	Comprobante de egreso	051	NOMINA	PAGO NOMINA DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE	DIEGO LEONARDO BARBOSA ARIZA	1101753321	VRDA TUBAVITA	3132360371		679.000		679.000				679.000		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		2-dic-2024	Comprobante de egreso	052	DS20	ALQUILER DE MAQUINARIA VIBRO	YERALDIN PARDO HERREÑO	63436578	SEC SALIDA BARBOSA	3212058163	yeraldinpardo@gmail.com	885.000		885.000		35.400	1.770	847.830		

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

0	PAGO DE IMPUESTOS		2-dic-2024	Comprobante de egreso	053	3510614101 295	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE NOVIEMBRE	DIRECION DE IMPUESTOS Y ADUNAS NACIONALES	800197268	www.DIAN.GOV.CO		www.DIAN.GOV.CO	451.000		451.000				451.000		
5	Pago seguridad social mes de noviembre		2-dic-2024	Comprobante de egreso	054	31749037	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS	ASOPAGOS	900319291	CALLE 26 61 C21	3175020487		4.063.200		4.063.200				4.063.200		
6	ADMINISTRATIVOS		2-dic-2024	Comprobante de egreso	055	DS21	SUBSIDIO DE TRANSPORTE AL DIGNATARIO	GLADYS CHACON HERNANDEZ	63434698	VEREDA TUBAVITA	3138886679	gladyschaconher@hotmail.com	400.000		400.000				400.000		
2	MATERIALES		11-dic-2024	Comprobante de egreso	056	FE1395	COMPRA DE MATERIALES PETREOS	CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA S.AS	900414198	KM 14 500 VIA BARBOSA TUNJA	3105759087	calmineral.co@gmail.com	5.810.000	1.103.900	6.913.900		145.250		6.768.650		
6	ADMINISTRATIVOS		11-dic-2024	Comprobante de egreso	057	116954201-116936701	POLIZAS DE ASEGURAMIENTO	PREVISORA SEGUROS	860002400	Calle 57 No. 9-07	3485757	contactenos@previsora.gov.co	876.074		876.074				876.074		
4	TRANSPORTE		11-dic-2024	Comprobante de egreso	058	FECA100	TRANSPORTE DE MATERIALES	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CR 6 5A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	3.420.000		3.420.000		34.200	13.680	3.372.120		
2	MATERIALES		11-dic-2024	Comprobante de egreso	059	FECA101	SUMINISTRO DE MATERIALES	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CR 6 5A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	7.510.029	1.426.906	8.936.935		187.751	30.040	8.719.144		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		11-dic-2024	Comprobante de egreso	060	PRV 15	ALQUILER DE RETEOEXCAVADORA	PROINSO	901598620	CL 3 10 57	3229037245	paolaandrea228@hotmail.com	3.288.000	624.720	3.912.720		115.080	16.440	3.781.200		
6	ADMINISTRATIVOS		11-dic-2024	Comprobante de egreso	061	DS22	HONORARIOS CONTADOR	ALBA RUTH SANTAMARIA ARIZA	63437843	CALLE 10 4 37	3115700626	ruthmauro1109@gmail.com	980.000		980.000			3.920	976.080		
5	MANO DE OBRA		11-dic-2024	Comprobante de egreso	062	FELA224	DEMOLICION DEE PIEDRA	LUIS MARIA ARIZA DUARTE	79792972	VEREDA EJIDOS FC LIMOS	3193350589	luisariza1977@hotmail.com	150.000		150.000				150.000		
5	MANO DE OBRA		18-dic-2024	Comprobante de egreso	063	NOMINA	PAGGO NOMINA DEL 01 AL 15 DICIEMBRE	JAVIER GALEANO HERNANDEZ	7171930	VRDA TUBAVITA	3227906277		679.000		679.000				679.000		
5	MANO DE OBRA		18-dic-2024	Comprobante de egreso	064	NOMINA	PAGO NOMINA DEL 16 AL 23 -LIQUIDACION	JAVIER GALEANO HERNANDEZ	7171930	VRDA TUBAVITA	3227906277		1.014.669		1.014.669				1.014.669		
5	MANO DE OBRA		18-dic-2024	Comprobante de egreso	065	NOMINA	PAGGO NOMINA DEL 01 AL 15 DICIEMBRE	JUAN PABLO MORALES CASTILLO	1070922552	VRDA TUBAVITA	3133613917		679.000		679.000				679.000		
5	MANO DE OBRA		18-dic-2024	Comprobante de egreso	066	NOMINA	PAGO NOMINA DEL 16 AL 23 -LIQUIDACION	JUAN PABLO MORALES CASTILLO	1070922552	VRDA TUBAVITA	3133613917		1.014.769		1.014.769				1.014.769		
6	ADMINISTRATIVOS		18-dic-2024	Comprobante de egreso	067	NOMINA	PAGGO NOMINA DEL 01 AL 15 DICIEMBRE	RAMIRO DIAZ QUIROGA	13955127	CALLE 13a 6-64	3112382961		1.139.000		1.139.000				1.139.000		
6	ADMINISTRATIVOS		18-dic-2024	Comprobante de egreso	068	NOMINA	PAGO NOMINA DEL 16 AL 23 -LIQUIDACION	RAMIRO DIAZ QUIROGA	13955127	CALLE 13a 6-64	3112382961		1.844.792		1.844.792				1.844.792		
5	MANO DE OBRA		18-dic-2024	Comprobante de egreso	069	NOMINA	PAGGO NOMINA DEL 01 AL 15 DICIEMBRE	EDILBERTO CUBIDES	13956198	VRDA TUBAVITA	3144357377		679.000		679.000				679.000		
5	MANO DE OBRA		18-dic-2024	Comprobante de egreso	070	NOMINA	PAGO NOMINA DEL 16 AL 23 -LIQUIDACION	EDILBERTO CUBIDES	13956198	VRDA TUBAVITA	3144357377		1.014.669		1.014.669				1.014.669		
5	MANO DE OBRA		18-dic-2024	Comprobante de egreso	071	NOMINA	PAGGO NOMINA DEL 01 AL 15 DICIEMBRE	LUIS ARIEL DIAZ ARIZA	13956736	VRDA TUBAVITA	3125651126		834.000		834.000				834.000		
5	MANO DE OBRA		18-dic-2024	Comprobante de egreso	072	NOMINA	PAGO NOMINA DEL 16 AL 23 -LIQUIDACION	LUIS ARIEL DIAZ ARIZA	13956736	VRDA TUBAVITA	3125651126		1.251.315		1.251.315				1.251.315		
5	MANO DE OBRA		18-dic-2024	Comprobante de egreso	073	NOMINA	PAGGO NOMINA DEL 01 AL 15 DICIEMBRE	DIEGO LEONARDO BARBOSA ARIZA	1101753321	VRDA TUBAVITA	3132360371		679.000		679.000				679.000		
5	MANO DE OBRA		18-dic-2024	Comprobante de egreso	074	NOMINA	PAGO NOMINA DEL 16 AL 23 -LIQUIDACION	DIEGO LEONARDO BARBOSA ARIZA	1101753321	VRDA TUBAVITA	3132360371		1.014.669		1.014.669				1.014.669		
2	MATERIALES		18-dic-2024	Comprobante de egreso	075	FE1407	COMPRA DE MATERIALES PETREOS	CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA S.AS	900414198	KM 14 500 VIA BARBOSA TUNJA	3105759087	calmineral.co@gmail.com	2.940.000	558.600	3.498.600		73.500		3.425.100		
6	ADMINISTRATIVOS		18-dic-2024	Comprobante de egreso	076	DS24	HONORARIOS INGENIERO CIVIL	MARIA CAMILA DÍAZ CARRASCO	1101758682	CRA 3 # 7 - 83	3219942418	mariaca9588@gmail.com	2.505.200		2.505.200			10.020	2.495.180		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		18-dic-2024	Comprobante de egreso	077	PRV 16	ALQUILER RETROEXCAVADORA	PROINSO	901598620	CL 3 10 57	3229037245	paolaandrea228@hotmail.com	1.560.000	296.400	1.856.400		62.400		1.794.000		
2	MATERIALES		18-dic-2024	Comprobante de egreso	078	FECA 108	COMPRA DE MATERIALES	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CR 6 5A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	20.642.525	3.922.080	24.564.605		722.488	82.570	23.759.546		
4	TRANSPOTE		18-dic-2024	Comprobante de egreso	079	DS25	REINTEGRO COMBUSTIBLE	GLADYS CHACON HERNANDEZ	63434698	VEREDA TUBAVITA	3138886679	gladyschaconher@hotmail.com	709.000		709.000				709.000		
6	ADMINISTRATIVOS		18-dic-2024	Comprobante de egreso	080	DS23	SERVICIO DE PLANOS Y GEOTECNIA	JOHAN SEBASTIAN MARTINEZ GONZALEZ	1099213317	CR 2 39 A 59	3118444083	sebasmartinez48@hotmail.com	2.300.000		2.300.000			9.200	2.290.800		
4	TRANSPORTE		18-dic-2024	Comprobante de egreso	081	FECA 107	TRASPORTE DE MATERIALES	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CR 6 5A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	2.660.000		2.660.000		26.600	10.640	2.622.760		
5	MANO DE OBRA		18-dic-2024	Comprobante de egreso	082	31963516	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS	ASOPAGOS	900319291	CALLE 26 61 C21	3175020487		3.116.700		3.116.700				3.116.700		
6	ADMINISTRATIVOS		18-dic-2024	Comprobante de egreso	083	DS26	ENSAYOS DE LABORATORIO TRAMOS 2 Y 3	JHON JAIRO CAMACHO AVILA	1054679289	CL 18 No. 7- 65	3124709472	camacho.jairo@hotmail.com	498.000		498.000			19.920	478.080		
0	PAGO DE IMPUESTOS		18-dic-2024	Comprobante de egreso	084	AUXILIAR	RETENCIÓN EN LA FUENTE MES DE DICIEMBRE	DIRECION IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	www.DIAN.GOV.CO		www.DIAN.GOV.CO	1.423.000		1.423.000				1.423.000		
0	PAGO DE IMPUESTOS		18-dic-2024	Comprobante de egreso	085	FORMULARIO 6	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	MUNICIPIO VELEZ SANTANDER	890205677	calle 9 2 37		secretariahacienda@velez-santander.gov.co	273.000		273.000				273.000		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		10-ene-2025	Comprobante de egreso	087	DS28	ALQUILER DE (CANGURO) Y COMPRA DE INSUMOS REEBOLSO	GLADYS CHACON HERNANDEZ	63434698	VEREDA TUBAVITA	3138886679	gladyschaconher@hotmail.com	$ 200.000,00		200.000				200.000		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		10-ene-2025	Comprobante de egreso	088	DS27	ALQUILER DE VIBRO COMPACTADOR 3 HORAS X150.000	YERALDIN PARDO HERREÑO	63436578	SEC SALIDA BARBOSA	3212058163	yeraldinpardo@gmail.com	$ 450.000,00		450.000		$ 18.000,00	$ 900,00	431.100		
6	ADMINISTRATIVOS		10-ene-2025	Comprobante de egreso	089	NOMINA	PAGO NOMINA DEL 24 DIC AL 31 DIC	RAMIRO DIAZ QUIROGA	13955127	CALLE 13a 6-64	3112382961		$ 773.925,00		773.925				773.925		
5	MANO DE OBRA		10-ene-2025	Comprobante de egreso	090	NOMINA	PAGO NOMINA DEL 24 DIC AL 31 DIC	LUIS ARIEL DIAZ ARIZA	13956736	VRDA TUBAVITA	3125651126		$ 573.325,00		573.325				573.325		
5	MANO DE OBRA		10-ene-2025	Comprobante de egreso	091	NOMINA	PAGO NOMINA DEL 24 DIC AL 31 DIC	EDILBERTO CUBIDES	13956198	VRDA TUBAVITA	3144357377		$ 473.925,00		473.925				473.925		
2	MATERIALES		28-ene-2025	Comprobante de egreso	86	FECA112	COMPRA DE 115 VARILLAS 3/8,7m3 ARENA, 7m3 TRITURADO, 70 BULTOS DE CEMENTO	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CR 6 5A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	$ 6.912.539,00		6.912.539		$ 145.221,00		6.767.318		
4	TRANSPORTES		28-ene-2025	Comprobante de egreso	92	FECA 116	TRASPORTE DE MATERIALES	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CR 6 5A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	$ 800.000,00		800.000		$ 80.000,00		720.000		
0	PAGO DE IMPUESTOS		28-ene-2025	Comprobante de egreso	93		PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE ENERO	GLADYS CHACON HERNANDEZ	63434698	VEREDA TUBAVITA	3138886679	gladyschaconher@hotmail.com	$ 243.000,00		243.000				243.000		DIAN
2	MATERIALES		28-ene-2025	Comprobante de egreso	94	FE1437	COMPRA DE MATERIALES PETREOS(RECEBO 14m3 PARA RELLENOS)	CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA S.AS	900414198	KM 14 500 VIA BARBOSA TUNJA	3105759087	calmineral.co@gmail.com	$ 833.000,00		833.000				833.000		
													$ 183.774.346,00	$ 14.617.151,82	$ 198.391.497,82	$ 3.276.000,00	$ 2.724.877,70	$ 409.256,42	$ 193.853.363,70		

Firma:
Nombre:**GLADYS CHACON HERNANDEZ**
Representante Legal
Organización de Acción Comunal

Firma:
Nombre: JORGE FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Firma:
Nombre: **ALBA RUTH SANTAMARIA ARIZA**
Contador de la OAC
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.:269139-T

Firma:
Nombre: **MARIA CAMILA DÍAZ CARRASCO**
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 151037-0513350 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Santander

CONVENIO No. 4424 2023 (Indicar número y año) **ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL** Junta Accion Comunal Vereda Tebaida

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
		$ 199.996.240	15-feb-2024				DESMBOLSO				NA	NA		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
		$ 765.680	31-ago-2024				INTERESES AGOSTO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		6-sept-2024	Comprobate de Egreso	1	C.C. 001-24	REINTEGRO PAGO POLIZAS	NESTOR IDELFONSO FONTECHA SANDOVAL	13955098	VDA TEBAIDA	3132881905	juntaveredatebaida1954@gmail.com	$ 1.557.393	$ -	$ 1.557.393	$ -	$ -	$ -	$ 1.557.393	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS	$ 110.307	6-sept-2024	Comprobate de Egreso	2	C.C. 002-24	SUBSIDIO AL DIGNATARIO MES DE AGOSTO	NESTOR IDELFONSO FONTECHA SANDOVAL	13955098	VDA TEBAIDA	3132881905	juntaveredatebaida1954@gmail.com	$ 400.000	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		25-sept-2024	Comprobate de Egreso	3	FE 32	ANTICIPO DEL 50% DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL VALOR DE LA FACTURA	JEFFERSON CAMILO AGUILAR PARRA	7321156	CALLE 19 9 - 28 CHIQUINQUIRA	3118508140	juancap_d@hotmail.com	$ 4.800.000	$ 2.400.000	$ 4.800.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		8-oct-2024	Comprobate de Egreso	4	FE 18	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO RESIDENTE	MASMELA ZAPATA MIGUEL ANGEL		DG 7 5 - 53 PUENTE NACIONAL	3153683192	angelmasmela@hotmail.com	$ 3.500.000	$ -	$ 3.500.000	$ -	$ 350.000	$ 14.000	$ 3.136.000	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		8-oct-2024	Comprobate de Egreso	5	JACT 1	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO CONTADORA	GONZALEZ FONTECHA YANETH	63436292	CRA 4 5 19 VÉLEZ	3214425642	yanig.75@hotmail.com	$ 1.960.000	$ -	$ 1.960.000	$ -	$ -	$ 7.840	$ 1.952.160	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		8-oct-2024	Comprobate de Egreso	7	C.C. 003-24	SUBSIDIO AL DIGNATARIO MES DE SEPTIEMBRE	NESTOR IDELFONSO FONTECHA SANDOVAL	13955098	VDA TEBAIDA	3132881905	juntaveredatebaida1954@gmail.com	$ 400.000	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -	
2	MATERIALES		21-oct-2024	Comprobate de Egreso	8	FEVM 407	COMPRA TUBO EN CONCRETO	MACOINTH SAS	900451538-1	AV SEGUNDA 52 SEC LAS ESCALERAS PUENTE NACIONAL	3102227708	macointh.sas@gmail.com	$ 2.117.647	$ 402.353	$ 2.520.000	$ -	$ 52.941	$ -	$ 2.467.059	$ -	
2	MATERIALES	$ 109.248	21-oct-2024	Comprobate de Egreso	9	FE 1320	COMPRA DE SUB BASE GRAVA 3/4 RAJÓN	CALIZAS ¬ MINERALES DE COLOMBIA SAS	900414198-1	KM 14 500 VIA BARBOSA TUNJA	3105759087	calmineral.co@gamil.com	$ 13.670.000	$ 2.597.300	$ 16.267.300	$ -	$ 341.750	$ -	$ 15.925.550	$ -	
2	MATERIALES		22-oct-2024	Comprobate de Egreso	10	FMCR32879	VARILLA CORRUGADA - CEMENTO - ALAMBRE NEGRO	ELVIA EDDNA LILIANA SUAREZ SAAVEDRA	37944629-8	CALLE 8 16 24	3164647852	matpico@hotmail.com	$ 16.249.998	$ 3.087.499	$ 19.337.497	$ -	$ 406.250	$ -	$ 18.931.247	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		22-oct-2024	Comprobate de Egreso	11	JACT 2	VALLA PÚBLICITARIA	YORMAN ANDRÉS FONTECHA REYES	1101759866	CRA 4 11 44 VÉLEZ	3169397100	info@branlift.com.co	$ 100.000	$ -	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		22-oct-2024	Comprobate de Egreso	12	JACT 3	EXAMENES DE SALUD OCUPACIONAL	LILIANA PATRICIA PLATA VILLAREAL	63527432	CL 35 34 43	3125728840	patriciaplatav@hotmail.com	$ 150.000	$ -	$ 150.000	$ -	$ 15.000	$ 600	$ 134.400	$ -	
2	MATERIALES		22-oct-2024	Comprobate de Egreso	13	FECA 78	COMPRA ARENA	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510-2	CR 6 5A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	$ 3.058.824	$ 581.177	$ 3.640.001	$ -	$ 76.471	$ -	$ 3.563.530	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		22-oct-2024	Comprobate de Egreso	14	FVHE 364	ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y DOTACIÓN	HELI ALBERTO PAEZ TORRES	91016543	CR 10 12 25	311 5382490	extinpaez@yahoo.com	$ 1.562.103	$ -	$ 1.562.103	$ -	$ 39.053		$ 1.523.050	$ -	
6-2	ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES		5-nov-2024	Comprobate de Egreso	15	CC. 004-24	REEBOLSO PAGO COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y DOTACIÓN FVEH 366-ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y DOTACIÓN FED3312-TELA Y PLASTICONEGRO JACT 8-TRANSPORTE DE MATERIALES FEDL 2926-ELEMENTOS MEDIDAS AMBIENTALES CV 1505- COMPRA MATERIALES	NESTOR IDELFONSO FONTECHA S.	13955098	VDA TEBAIDA	3132881905	juntaveredatebaida1954@gmail.com	$ 1.903.031	$ -	$ 1.903.031	$ -	$ -	$ -	$ 1.903.031	$ -	
4	TRANSPORTES		5-nov-2024	Comprobate de Egreso	16	JACT 4	TRANSPORTE DE MATERIALES	JORGE LUIS WANDURRAGA SANCHEZ	1.096.906.796,00	CRA 4 4 56 CHIPATA	314 8333396	arq.wandurraga@gmail.com	$ 5.400.000	$ -	$ 5.400.000	$ -	$ 54.000		$ 5.346.000	$ -	
5	MANO DE OBRA		5-nov-2024	Comprobate de Egreso	17	CC. 005 -24	REEBOLSO PAGO DE SEGURIDAD EMPLEADOS MES DE OCTUBRE	NESTOR IDELFONSO FONTECHA S.	13955098	VDA TEBAIDA	3132881905	juntaveredatebaida1954@gmail.com	$ 526.800	$ -	$ 526.800	$ -			$ 526.800	$ -	
0	PAGO DE IMPUESTOS		19/112024	Comprobate de Egreso	18	C.C. 006-24	reembolso pago retencion en la fuente mes de octubre	NESTOR IDELFONSO FONTECHA SANDOVAL	13955098	VDA TEBAIDA	3132881905	juntaveredatebaida1954@gmail.com	$ 1.747.000	$ -	$ 1.747.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.747.000	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS	$ 83.157,00	19/112024	Comprobate de Egreso	19	JACT 5	ESTUDIO TOPOGRAFIA	MIGUEL ANGEL PARDO BARRERA	1101752935	CALLE 8 N 2 ESTE	3118974205	miguelpardotopografo@hotmail.com	$ 1.500.000	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ 150.000	$ -	$ 1.350.000		
5	MANO DE OBRA		25-nov-2024	Comprobate de Egreso	20	NOMINA	PAGO NOMINA 24 OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	OSMA PINZON JUAN BAUTISTA	1101755772	VDA TEBAIDA	321 4954233	juanbautistaosma@gmail.com	$ 1.464.512		$ 1.464.512				$ 1.464.512		
5	MANO DE OBRA		25-nov-2024	Comprobate de Egreso	21	NOMINA	PAGO NOMINA 24 OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE AYUDANTE OBRA	DIAZ MATEUS LUIS ANTONIO	1101755409	VDA TEBAIDA	3227217094	veredatebaida1954@gmail.com	$ 814.800		$ 814.800				$ 814.800		
5	MANO DE OBRA		25-nov-2024	Comprobate de Egreso	22	NOMINA	PAGO NOMINA 24 OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE AYUDANTE OBRA	HERNANDEZ MATEUS VLADIMIR	13958680	VDA TEBAIDA	3134840414	hernandezmateus65@gmail.com	$ 814.800		$ 814.800				$ 814.800		
5	MANO DE OBRA		25-nov-2024	Comprobate de Egreso	23	NOMINA	PAGO NOMINA 24 OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE AYUDANTE OBRA	TORRES FIGUEROA ABELARDO	5689273	VDA TEBAIDA	3133449781	abelardotorres1966@gmail.com	$ 905.333		$ 905.333				$ 905.333		
5	MANO DE OBRA		25-nov-2024	Comprobate de Egreso	24	NOMINA	PAGO NOMINA 24 OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE AYUDANTE OBRA	SERRANO SERRANO JOSE DE LA CRUZ	91011682	VDA TEBAIDA	3237409058	61joseserrano@gmail.com	$ 814.800		$ 814.800				$ 814.800		
5	MANO DE OBRA		25-nov-2024	Comprobate de Egreso	25	NOMINA	PAGO NOMINA 24 OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE MAESTRO	JUAN CARLOS CORTES SERRANO	1101755423	VDA TEBAIDA	3227261300	jolicacortes64@gmail.com	$ 1.431.573		$ 1.431.573				$ 1.431.573		
6	ADMINISTRATIVOS		3-dic-2024	Comprobate de Egreso	26	C.C. 007-24	SUBSIDIO AL DIGNATARIO MES DE SEPTIEMBRE	NESTOR IDELFONSO FONTECHA SANDOVAL	13955098	VDA TEBAIDA	3132881905	juntaveredatebaida1954@gmail.com	$ 400.000	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ 400.000		
5	MANO DE OBRA		3-dic-2024	Comprobate de Egreso	27	CC. 008 -24	REEBOLSO PAGO DE SEGURIDAD MAESTRO OFICIAL MES DE NOVIEMBRE - REEBOLSO PAGO DE SEGURIDAD EMPLEADOS MES DE NOVIEMBRE	NESTOR IDELFONSO FONTECHA S.	13955098	VDA TEBAIDA	3132881905	juntaveredatebaida1954@gmail.com	$ 4.204.800	$ -	$ 4.204.800	$ -	$ -	$ -	$ 4.204.800		
6	ADMINISTRATIVOS		3-dic-2024	Comprobate de Egreso	28	FE 22	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE RESIDENTE	MASMELA ZAPATA MIGUEL ANGEL		DG 7 5 - 53 PUENTE NACIONAL	3153683192	angelmasmela@hotmail.com	$ 3.500.000	$ -	$ 3.500.000	$ -	$ 350.000	$ 14.000	$ 3.136.000		
6	ADMINISTRATIVOS		3-dic-2024	Comprobate de Egreso	29	JACT 7	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE CONTADORA	GONZALEZ FONTECHA YANETH	63436292	CRA 4 5 19 VÉLEZ	3214425642	yanig.75@hotmail.com	$ 1.960.000	$ -	$ 1.960.000	$ -	$ -	$ 7.840	$ 1.952.160		
4	TRANSPORTES		3-dic-2024	Comprobate de Egreso	30	JACT 08	TRANSPORTE DE MATERIALES	MIGUEL ANTONIO BAREÑO BAREÑO	91018816-3	CRA 5 3 36	3202326567	miguelb19840813@gmail.com	$ 7.150.000	$ -	$ 7.150.000	$ -	$ 71.500		$ 7.078.500		
4	TRANSPORTES		3-dic-2024	Comprobate de Egreso	31	JACT 10	TRANSPORTE DE MATERIALES	JORGE LUIS WANDURRAGA SANCHEZ	1.096.906.796	CRA 4 4 56 CHIPATA	314 8333396	arq.wandurraga@gmail.com	$ 8.799.000	$ -	$ 8.799.000	$ -	$ 87.990		$ 8.711.010		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 41.446,00	11-dic-2024	Comprobate de Egreso	32	JACT 14	ALQUILER DE VIBRO	RENE MAURICIO GONZÁLEZ FANDIÑO	13.617.030	CLL 77 A 73	3118761253		$ 10.920.000		$ 10.920.000		$ 436.800		$ 10.483.200		
							FLETE VIBRO	RENE MAURICIO GONZÁLEZ FANDIÑO	13.617.030	CLL 77 A 74	3118761253		$ 1.000.000		$ 1.000.000		$ 10.000		$ 990.000		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		11-dic-2024	Comprobate de Egreso	33	JACT 11	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	MIGUEL ANTONIO BAREÑO BAREÑO	91018816-3	CRA 5 3 36	3202326567	miguelb19840813@gmail.com	$ 10.920.000	$ -	$ 10.920.000	$ -	$ 436.800		$ 10.483.200		
							ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	MIGUEL ANTONIO BAREÑO BAREÑO	91018816-3	CRA 5 3 36	3202326567	miguelb19840813@gmail.com	$ 1.200.000	$ -	$ 1.200.000	$ -	$ 12.000		$ 1.188.000		
							FLETE MATERIAL PETRO MONIQUIRA SITIO LA FLORIDA	MIGUEL ANTONIO BAREÑO BAREÑO	91018816-3	CRA 5 3 36	3202326567	miguelb19840813@gmail.com	$ 2.750.000	$ -	$ 2.750.000	$ -	$ 27.500		$ 2.722.500		
6	ADMINISTRATIVO		11-dic-2024	Comprobate de Egreso	34	JACT 12	ESTUDIO TOPOGRAFIA	MIGUEL ANGEL PARDO BARRERA	1101752935	CALLE 8 N 2 ESTE	3118974205	miguelpardotopografo@hotmail.com	$ 1.500.000	$ -	$ 1.500.000	$ -		$ 6.000	$ 1.494.000		
0	PAGO DE IMPUESTOS		11-dic-2024	Comprobate de Egreso	35	C.C. 009-24	reembolso pago retencion en la fuente mes de octubre	NESTOR IDELFONSO FONTECHA SANDOVAL	13955098	VDA TEBAIDA	3132881905	juntaveredatebaida1954@gmail.com	$ 647.000	$ -	$ 647.000	$ -	$ -	$ -	$ 647.000		
6	ADMINISTRATIVO		11-dic-2024	Comprobate de Egreso	37	FAC 303	ENSAYOS LABORATORIO	FWF GEOINGENIERIA SAS	900.730.123	CRA 7 C 43 LC 1	3103257287		$ 912.000	$ 173.280	$ 1.085.280		$ 36.480		$ 1.048.800		
5	MANO DE OBRA		19-dic-2024	Comprobate de Egreso	38	NOMINA	PAGO NOMINA AYUDANTE DE OBRA	OSMA PINZON JUAN BAUTISTA	1101755772	VDA TEBAIDA	321 4954233	juanbautistaosma@gmail.com	$ 1.790.827		$ 1.790.827				$ 1.790.827		
5	MANO DE OBRA		19-dic-2024	Comprobate de Egreso	39	NOMINA	PAGO NOMINA AYUDANTE OBRA	DIAZ MATEUS LUIS ANTONIO	1101755409	VDA TEBAIDA	3227217094	veredatebaida1954@gmail.com	$ 1.163.067		$ 1.163.067				$ 1.163.067		
5	MANO DE OBRA		19-dic-2024	Comprobate de Egreso	40	NOMINA	PAGO NOMINA AYUDANTE OBRA	HERNANDEZ MATEUS VLADIMIR	13958680	VDA TEBAIDA	3134840414	hernandezmateus65@gmail.com	$ 1.114.333		$ 1.114.333				$ 1.114.333		
5	MANO DE OBRA		19-dic-2024	Comprobate de Egreso	41	NOMINA	PAGO NOMINA AYUDANTE OBRA	TORRES FIGUEROA ABELARDO	5689273	VDA TEBAIDA	3133449781	abelardotorres1966@gmail.com	$ 1.163.067		$ 1.163.067				$ 1.163.067		
5	MANO DE OBRA		19-dic-2024	Comprobate de Egreso	42	NOMINA	PAGO NOMINA AYUDANTE OBRA	SERRANO SERRANO JOSE DE LA CRUZ	91011682	VDA TEBAIDA	3237409058	61joseserrano@gmail.com	$ 1.114.333		$ 1.114.333				$ 1.114.333		
6	ADMINISTRATIVO		19-dic-2024	Comprobate de Egreso	43	NOMINA	PAGO NOMINA MAESTRO OFICIAL	JUAN CARLOS CORTES SERRANO	1101755423	VDA TEBAIDA	3227261300	jolicacortes64@gmail.com	$ 1.915.360		$ 1.915.360				$ 1.915.360		
6	ADMINISTRATIVO		19-dic-2024	Comprobate de Egreso	44	FE 22	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE RESIDENTE	MASMELA ZAPATA MIGUEL ANGEL	13542131	DG 7 5 - 53 PUENTE NACIONAL	3153683192	angelmasmela@hotmail.com	$ 3.500.000	$ -	$ 3.500.000	$ -	$ 350.000	$ 14.000	$ 3.136.000		
6	ADMINISTRATIVO		19-dic-2024	Comprobate de Egreso	45	JACT 15	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE CONTADORA	GONZALEZ FONTECHA YANETH	63436292	CRA 4 5 19 VÉLEZ	3214425642	yanig.75@hotmail.com	$ 1.960.000	$ -	$ 1.960.000	$ -	$ -	$ 7.840	$ 1.952.160		
2	MATERIALES		19-dic-2024	Comprobate de Egreso	46	FMCR32879	VARILLA CORRUGADA - CEMENTO - ALAMBRE NEGRO	ELVIA EDDNA LILIANA SUAREZ SAAVEDRA	37944629-8	CALLE 8 16 24	3164647852	matpico@hotmail.com	$ 12.058.826	$ 2.291.177	$ 14.350.003	$ -	$ 301.471	$ -	$ 14.048.532		
2	AMATERIALES		19-dic-2024	Comprobate de Egreso	47	CV 1541	COMPRA MATERIALES	RODRIGO ANTONIO SIERRA LESMES	13954819-6	CL 10 4 51 57	3176490545	bodegasantahelena@hotmail.com	$ 1.821.555	$ 206.445,00	$ 2.028.000	$ -	$ 45.539	$ 3.643	$ 1.978.818		
6	ADMINISTRATIVO		19-dic-2024	Comprobate de Egreso	48	C.C. 010-24	CAJA MENOR (PAPELERIA)	NESTOR IDELFONSO FONTECHA SANDOVAL	13955098	VDA TEBAIDA	3132881905	juntaveredatebaida1954@gmail.com	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -	$ -	$ -	$ 300.000		
4	TRANSPORTES		19-dic-2024	Comprobate de Egreso	49	JACT 16	TRANSPORTE DE MATERIALES	JORGE LUIS WANDURRAGA SANCHEZ	1.096.906.796	CRA 4 4 56 CHIPATA	314 8333396	arq.wandurraga@gmail.com	$ 5.095.000	$ -	$ 5.095.000	$ -	$ 50.950		$ 5.044.050		
2	MATERIALES		19-dic-2024	Comprobate de Egreso	50	FECA 103	COMPRA ARENA	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510-2	CR 6 5A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	$ 1.638.660	$ 311.345	$ 1.950.005	$ -	$ 40.967	$ 3.277	$ 1.905.761		
5	MANO DE OBRA		19-dic-2024	Comprobate de Egreso	51	CC. 011 -24	REEBOLSO PAGO DE SEGURIDAD MAESTRO OFICIAL MES DE DICIEMBRE	NESTOR IDELFONSO FONTECHA S.	13955098	VDA TEBAIDA	3132881905	juntaveredatebaida1954@gmail.com	$ 4.609.500	$ -	$ 4.609.500	$ -	$ -	$ -	$ 4.609.500		

6	ADMINISTRATIVO		19-dic-2024	Comprobate de Egreso	52	C.C. 012-24	PAGO ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS	NESTOR IDELFONSO FONTECHA SANDOVAL	13955098	VDA TEBAIDA	3132881905	juntaveredatebaida1954@gmail.com	$ 876.026	$ -	$ 876.026	$ -	$ -	$ -	$ 876.026		
6	ADMINISTRATIVO		11-ene-2025	Comprobate de Egreso	53	NOMINA	PAGO NOMINA Y LIQUIDACIÓN AL 31 DIC MAESTRO OFICIAL	JUAN CARLOS CORTES SERRANO	1101755423	VDA TEBAIDA	3227261300	joticacortes64@gmail.com	$ 1.803.702	$ -	$ 1.803.702	$ -	$ -	$ -	$ 1.803.702		
5	COSTOS DIRECTOS		11-ene-2025	Comprobate de Egreso	54	NOMINA	PAGO NOMINA Y LIQUIDACIÓN AL 31 DIC MAESTRO DE OBRA	OSMA PINZON JUAN BAUTISTA	1101755772	VDA TEBAIDA	321 4954233	juanbautistaosma@gmail.com	$ 1.756.845	$ -	$ 1.756.845	$ -	$ -	$ -	$ 1.756.845		
5	COSTOS DIRECTOS		11-ene-2025	Comprobate de Egreso	55	NOMINA	PAGO NOMINA Y LIQUIDACIÓN AL 31 DE DIC AYUDANTE OBRA	DIAZ MATEUS LUIS ANTONIO	1101755409	VDA TEBAIDA	3227217094	veredatebaida1954@gmail.com	$ 1.103.400	$ -	$ 1.103.400	$ -	$ -	$ -	$ 1.103.400		
5	COSTOS DIRECTOS		11-ene-2025	Comprobate de Egreso	56	NOMINA	PAGO NOMINA Y LIQUIDACIÓN AL 31 DE DIC AYUDANTE OBRA	HERNANDEZ MATEUS VLADIMIR	13958680	VDA TEBAIDA	3134840414	hernandezmateus65@gmail.com	$ 1.093.323	$ -	$ 1.093.323	$ -	$ -	$ -	$ 1.093.323		
5	COSTOS DIRECTOS		11-ene-2025	Comprobate de Egreso	57	NOMINA	PAGO NOMINA Y LIQUIDACIÓN AL 31 DE DIC AYUDANTE OBRA	TORRES FIGUEROA ABELARDO	5689273	VDA TEBAIDA	3133449781	abelardotorres1966@gmail.com	$ 1.123.564	$ -	$ 1.123.564	$ -	$ -	$ -	$ 1.123.564		
5	COSTOS DIRECTOS		11-ene-2025	Comprobate de Egreso	58	NOMINA	PAGO NOMINA Y LIQUIDACIÓN AL 31 DE DIC AYUDANTE OBRA	SERRANO SERRANO JOSE DE LA CRUZ	91011682	VDA TEBAIDA	3237409058	61joseserrano@gmail.com	$ 1.093.323	$ -	$ 1.093.323	$ -	$ -	$ -	$ 1.093.323		
5	COSTOS DIRECTOS		11-ene-2025	Comprobate de Egreso	59	NOMINA	PAGO NOMINA Y LIQUIDACIÓN AL 31 DE DIC AYUDANTE OBRA	INGRIT TATIANA DIAZ FONTECHA	1101754164	VDA TEBAIDA	3239319707	diazingrit545@gmail.com	$ 1.104.429	$ -	$ 1.104.429	$ -	$ -	$ -	$ 1.104.429		
6	OTROS COSTOS		11-ene-2025	Comprobate de Egreso	60	FE 32	PAGO SALDO DEL 50% DEL VALOR DE LA FACTURA ESTUDIOS Y DISEÑOS	JEFFERSON CAMILO AGUILAR PARRA	7321156	CALLE 19 9 - 28 CHIQUINQUIRA	3118508140	juancap_d@hotmail.com	$ 1.920.000	$ -	$ 1.920.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.920.000		
0	PAGO DE IMPUESTOS		28-ene-2025	Comprobate de Egreso	61	Formulario 3510619710451, Comprobante Pago DBKU7V4EQQM (retefuente), Reporte Retención 810 No. De Pago 785 (Reteica)	REEMBOLSO RETENCIONES MES DE DICIEMBRE 2024	NESTOR IDELFONSO FONTECHA SANDOVAL	13955098	VDA TEBAIDA	3132881905	juntaveredatebaida1954@gmail.com	$ 1.986.000	$ -	$ 1.986.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.986.000		
5	MANO DE OBRA		28-ene-2025	Comprobate de Egreso	62	Cuenta de Cobro 014-24, Planilla (Seg Social) 8634621102 y Actualización Póliza 3001993-0, 1014745-0.	REEMBOLSO PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO DEL 2025 Y ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL	NESTOR IDELFONSO FONTECHA SANDOVAL	13955098	VDA TEBAIDA	3132881905	juntaveredatebaida1954@gmail.com	$ 1.894.150	$ -	$ 1.894.150	$ -	$ -	$ -	$ 1.894.150		
6	ADMINISTRATIVOS		30-ene-2025	Comprobate de Egreso	63	Cuenta de Cobro 015-24, Cuenta de Cobro 016-24	PAPELERÍA DICIEMBRE 2024 ($300.000) - SUBSIDIO DE TRANSPORTE PARA EL DIGNATARIO ENERO 2025 ($400.000).	NESTOR IDELFONSO FONTECHA SANDOVAL	13955098	VDA TEBAIDA	3132881905	juntaveredatebaida1954@gmail.com	$ 700.000	$ -	$ 700.000	$ -	$ -	$ -	$ 700.000		
5	MANO DE OBRA		28-ene-2025	Comprobate de Egreso	64	NOMINA	NOMINA DEL 07 de enero al 31 de enero de 2025	DIAZ MATEUS LUIS ANTONIO	1101755409	VDA TEBAIDA	3227217094	veredatebaida1954@gmail.com	$ 1.472.012	$ -	$ 1.472.012	$ -	$ -	$ -	$ 1.472.012		
5	MANO DE OBRA		28-ene-2025	Comprobate de Egreso	65	NOMINA	NOMINA DEL 07 de enero al 31 de enero de 2025	OSMA PINZON JUAN BAUTISTA	1101755772	VDA TEBAIDA	321 4954233	juanbautistaosma@gmail.com	$ 2.081.220	$ -	$ 2.081.220	$ -	$ -	$ -	$ 2.081.220		
5	MANO DE OBRA		28-ene-2025	Comprobate de Egreso	66	NOMINA	NOMINA DEL 07 de enero al 31 de enero de 2025	TORRES FIGUEROA ABELARDO	5689273	VDA TEBAIDA	3133449781	abelardotorres1966@gmail.com	$ 1.472.012	$ -	$ 1.472.012	$ -	$ -	$ -	$ 1.472.012		
5	MANO DE OBRA		28-ene-2025	Comprobate de Egreso	67	NOMINA	NOMINA DEL 07 de enero al 31 de enero de 2025	SERRANO SERRANO JOSE DE LA CRUZ	91011682	VDA TEBAIDA	3237409058	61joseserrano@gmail.com	$ 1.472.012	$ -	$ 1.472.012	$ -	$ -	$ -	$ 1.472.012		
5	MANO DE OBRA		28-ene-2025	Comprobate de Egreso	68	NOMINA	NOMINA DEL 07 de enero al 31 de enero de 2025	INGRIT TATIANA DIAZ FONTECHA	1101754164	VDA TEBAIDA	3239319707	diazingrit545@gmail.com	$ 1.472.012	$ -	$ 1.472.012	$ -	$ -	$ -	$ 1.472.012		
6	ADMINISTRATIVOS		28-ene-2025	Comprobate de Egreso	69	JACT17	PAGO HONORARIOS CONTADORA MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	GONZALEZ FONTECHA YANETH	63436292	CRA 4 5 19 VÉLEZ	3214425642	yanig.75@hotmail.com	$ 1.960.000	$ -	$ 1.960.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.960.000		
													$ 136.910.976	$ 9.650.576	$ 197.990.548	$ 2.400.000	$ 1.485.464	$ 22.440	$ 191.768.047		

Firma:
Nombre: NESTOR IDELFONSO FONTECHA SANDOVAL
Representante Legal OAC

Firma:
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Firma:
Nombre: YANETH GONZALEZ FONTECHA
Contador de la OAC
Tarjeta Profesional No.: 210981-T

Firma:
Nombre: MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No. 4367 de 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL GAITAL

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
6	ADMINISTRATIVOS	$0,00	10-sept-2024	Comprob. Egreso 01	000001	CUENTA DE COBRO	PAGO DE REEMBOLSO DE POLIZA Y REEMBOLSO DE SUBSIDIO AL DIGNATARIO PARA TRANSPORTE (VIÁTICOS) PARA CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	JAIRO GONZALEZ PINZON	79671968	VEREDA EL GAITAL	3185827702	jairogonzal@hotmail.com	$ 1.959.858,52	$ -	$ 1.959.858,52	$ -	$ -	$ -	$ 1.959.858,52	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		10-sept-2024	Comprob. Egreso 02	000003	JACG1	DESEMBOLSO PARA PAGO DE HONORARIOS CONTADOR MES DE AGOSTO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO N°4367 DE 2023 CON INVIAS	JUAN HARVEY RAMIREZ CAMACHO	91245968	CRA 9 # 27-15	3168582222	juarvey@gmail.com	$ 1.960.000,00	$ -	$ 1.960.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.960.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		2-oct-2024	Comprob. Egreso 03	000004	CUENTA DE COBRO	ANTICIPO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA CONVENIO N°4367 del 2023	JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA	7321156	CL 19 9 28	3118508140	contador-acr10@gmail.com	$ 2.400.000,00	$ -	$ 2.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		2-oct-2024	Comprob. Egreso 04	000005	CUENTA DE COBRO	PAGO DE HONORARIOS PARA MES Y MEDIO AGOSTO SEPTIEMBRE - INGENIERO RESIDENTE DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO N°4367 DE 2023 CON INVIAS	GUSTAVO ANDRES VARGAS GAMBOA	1101752990	Carrera 5 # 9-35	3184377041	gustavo.andres.vargas.gamboa@gmail.com	$ 5.250.000,00	$ -	$ 5.250.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.250.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		2-oct-2024	Comprob. Egreso 05	000006	CUENTA DE COBRO	SUBSIDIO AL DIGNATARIO PARA TRANSPORTE (VIATICOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA DESARROLLO DE EL CONVENIO 4367 DEL 2023	JAIRO GONZALEZ PINZON	79671968	VEREDA EL GAITAL	3185827702	jairogonzal@hotmail.com	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000,00	$ -	
2	MATERIALES		29-oct-2024	Comprob. Egreso 08	000007	fsaca-81	ADQUISICION DE MATERIAL PETREO 30 METROS DE ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS SEGUN CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CRA 6 SA 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	$ 1.008.403,36	$ 191.596,64	$ 1.200.000,00	$ -	$ 25.210,08	$ 2.016,00	$ 1.172.773,92	$ -	
2	MATERIALES		29-oct-2024	Comprob. Egreso 11	000008	fsaca-81	ADQUISICION DE 500 VARILLAS DE 3/8 Y 350 BULTOS DE CEMENTO GRIS ESTRUCTURAL PARA OBRA DE PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CRA 6 SA 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	$ 17.651.100,00	$ 3.353.709,00	$ 21.004.809,00	$ -	$ 416.277,50	$ 105.906,00	$ 20.482.625,50	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		29-oct-2024	Comprob. Egreso 06	000009	CUENTA DE COBRO	AQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - DOTACION Y SEÑALIZACION PARA LA OBRA DE PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO4367 DE 2023 CON INVIAS	HELI ALBERTO PAEZ TORRES	91016543	CR 10 12 25 BRR SAN JORGE	3115382490	eelinpaez@yahoo.com	$ 2.769.055,00	$ -	$ 2.769.055,00	$ -	$ 69.226,38	$ -	$ 2.699.828,63		
6	ADMINISTRATIVOS		29-oct-2024	Comprob. Egreso 14	000010	CUENTA DE COBRO	SUBSIDIO AL DIGNATARIO PARA TRANSPORTE (VIATICOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PARA DESARROLLO DE EL CONVENIO 4367 DEL 2023	JAIRO GONZALEZ PINZON	79671968	VEREDA EL GAITAL	3185827702	jairogonzal@hotmail.com	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		29-oct-2024	Comprob. Egreso 07	000011	DFEL-1173	PAGO EXAMENES MEDICO OCUPACIONAL PARA LOS EMPLEADOS PARA EJECUTAR OBRA DE PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	DAVID FRANCISCO CALA URIBE	79944418	CR 4 9 38	7564320	CASALUDIPS@YAHOO.COM	$ 350.000,00	$ -	$ 350.000,00	$ -	$ 35.000,00	$ -	$ 315.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		29-oct-2024	Comprob. Egreso 10	000012	COTIZACION 02 OCTUBRE 2024	PAGO ADQUISICION DE LA INFORMATIVA PARA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	JENNIFER PAOLA GUZMAN REMOLINA	1098697939	CL 9 3 82 BRR CENTRO	3222187171	pixelvelez@gmail.com	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 300.000,00	$ -	
2	MATERIALES		29-oct-2024	Comprob. Egreso 13	000013	COTIZACION	ADQUISICION DE 80 METROS DE SUB BASE PARA OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SAS	900414198	KM 14 500 VIA BARBOSA TUNJA	3115141765	calimineral.co@gmail.com	$ 4.800.000,00	$ 912.000,00	$ 5.712.000,00	$ -	$ 120.000,00	$ -	$ 5.592.000,00	$ -	
4	TRANSPORTES		29-oct-2024	Comprob. Egreso 09	000014	fsaca-81	PAGO TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO DE LA CANTERA METROPOLIS DE MONIQUIRA A SITIO DE OBRA PLACA HUELLA POR VALOR DE 13.600.000 SEGUN CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CRA 6 SA 70	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	$ 13.600.000,00	-	$ 13.600.000,00	$ -	$ 136.000,00	$ 68.000,00	$ 13.396.000,00	$ -	
2	MATERIALES		5-nov-2024	Comprob. Egreso	000015	CUENTA DE COBRO	COMPRA DE MADERA TABLA PARA ENCOFRADO DE MATERIAL PARA PLACA HUELLA	ALEXANDER GONZALEZ	13956823	VEREDA ABISINIA FCA EL TIGRE	3114705941	alexandergonzalez13956@gmail.com	$ 2.250.000,00	$ -	$ 2.250.000,00	$ -	$ 78.750,00	$ -	$ 2.171.250,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		12-nov-2024	Comprob. Egreso	000016	CUENTA DE COBRO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 22 DE OCTUBRE	SERGIO ALEJANDRO TELLEZ PARDO	1.101.758.588	DIRECCIÓN: Carrera 85L #63b-42	3133110040	alejostp@gmail.com	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000,00	$ -	
0	PAGO DE IMPUESTOS		19-nov-2024	Comprob. Egreso	000017	RECIBO DE ICA	REEMBOLSO DE PAGO DE RETEICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	MUNICIPIO DE VELEZ	890205677	Calle 9 No. 2-37	7565702	contactenos@velez-santander.gov.co	$ 143.000,00		$ 143.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 143.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		19-nov-2024	Comprob. Egreso	000018	NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA MAESTRO DE OBRA	JOHAN FERNANDO HERNANDEZ SILVA	7177533	VEREDA GAITAL	3136288948	jairogonzal@hotmail.com	$ 1.902.867,00		$ 1.902.867,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.902.867,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		19-nov-2024	Comprob. Egreso	000020	NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 11 DIAS LABORADOS DEL PERIODO DE 21 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	JORGE ENRIQUE DIAZ VILLAMIL	1101756589	VEREDA GAITAL	3219688762	diazvillamiljorgeenrique@gmail.com	$ 536.067,00		$ 536.067,00	$ -	$ -	$ -	$ 536.067,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		19-nov-2024	Comprob. Egreso	000021	NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA AYUDANTE DE OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	JOSE ALEJANDRO GONZALEZ SEDANO	1101752279	VEREDA GAITAL	3227571178	JGONZALEZSEDANO@GMAIL.COM	$ 487.333,00		$ 487.333,00	$ -	$ -	$ -	$ 487.333,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		19-nov-2024	Comprob. Egreso	000022	NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA AYUDANTE DE OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	MISAEL DIAZ QUIROGA	13954281	VEREDA GAITAL	3138894921	jairogonzal@hotmail.com	$ 877.200,00		$ 877.200,00	$ -	$ -	$ -	$ 877.200,00	$ -	
4	TRANSPORTES		1-dic-2024	Comprob. Egreso	000023	FECA-98	PAGO DE TRANSPORTE DE DE RAJON DESDE MONIQUIRA BOYACA CANTERA CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA A VEREDA EL GAITAL VELEZ SANTANDER CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CR 6 5 A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	$ 16.930.300,00		$ 16.930.300,00	$ -	$ -	$ -	$ 16.930.300,00	$ -	este se suma con el CE-19
0	PAGO DE IMPUESTOS		1-dic-2024	Comprob. Egreso	000024	RECIBO DE PAGO	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024 CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	carrera 8 N° 6C - 38	6014899000	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	$ 880.000,00		$ 880.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 880.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		1-dic-2024	Comprob. Egreso	000025	CUENTA DE COBRO	HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024 COMO CONTADOR PARA LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ, PARA LA ASESORIA CONTABLE EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 4367 DEL 2023 CON INVIAS	JUAN HARVEY RAMIREZ CAMACHO	91245968	CL 10 4 37 BRR CENTRO P 2	3102576800	contadorjuac2024@gmail.com	$ 1.960.000,00		$ 1.960.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.960.000,00	$ -	
2	MATERIALES		11-dic-2024	Comprob. Egreso	000026	FECA-102	COMPRA DE MATERIAL PETREO 14 MTS DE RAJON Y 7 METROS DE SUBBASE PARA OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO4367 DE 2023 CON INVIAS	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CR 6 5 A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	$ 1.400.000,00	$ 266.000,00	$ 1.666.000,00	$ -	$ 35.000,00	$ -	$ 1.631.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		11-dic-2024	Comprob. Egreso	000027	CUENTA DE COBRO	PAGO DE HONORARIOS INGENIERA RESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2024 PARAOBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	LAURA ALEJANDRA PINZON SILVA	1101756910	CALLE 10 # 1-69	3212500227	laupinzon1308@gmail.com	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		11-dic-2024	Comprob. Egreso	000028	CUENTA DE COBRO	RECURSOS PARA CAJA MENOR PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA DESARROLLO DE ELCONVENIO 4367 DEL 2023	JAIRO GONZALEZ PINZON	79671968	VEREDA EL GAITAL	3185827702	jairogonzal@hotmail.com	$ 300.000,00		$ 300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 300.000,00	$ -	
2	MATERIALES		11-dic-2024	Comprob. Egreso	000029	CUENTA DE COBRO	COMPRA DE MATERIAL PETREO 14 MTS DE RAJON PARA OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO4367 DE 2023 CON INVIAS	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CR 6 5 A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	$ 978.823,53	$ 185.976,47	$ 1.164.800,00	$ -	$ 24.470,59	$ -	$ 1.140.329,41	$ -	
4	TRANSPORTES		11-dic-2024	Comprob. Egreso	000030	CUENTA DE COBRO	TRANSPORTE DE MATERIAL CORRESPONDIENTE A 14 M^3 DE RAJÓN, VALOR UNITARIO POR M^3 DE $170.000 PARA OBRA PLACA HUELLASEGUN CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CR 6 5 A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	$ 2.380.000,00	$ -	$ 2.380.000,00	$ -	$ 23.800,00	$ -	$ 2.356.200,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		18-dic-2024	Comprob. Egreso	000031		Desembolso para pago de obligación de Seg Social del personal Afiliado por la JAC Octubre-Noviembre 2024	JAIRO GONZALEZ PINZON	79671968	VEREDA EL GAITAL	3185827702	jairogonzal@hotmail.com	$ 1.946.700,00		$ 1.946.700,00	$ -		$ -	$ 1.946.700,00		
5	MANO DE OBRA		17-dic-2024	Comprob. Egreso	000032	CUENTA DE COBRO	40.4 HORAS REALIZADAS EN LA VEREDA EL GAITAL POR PREPARACIÓN PARA ARREGLO DE PLACA-HUELLA DESDE EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 HASTA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	WILSON SANCHEZ DIAZ	13955008	CRA 8 6 23	3105716273	wilsonsanchez121@hotmail.com	$ 9.176.000,00	$ -	$ 9.176.000,00	$ -	$ 361.000,00	$ 18.952,00	$ 8.796.048,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		18-dic-2024	Comprob. Egreso	000033	CUENTA DE COBRO	HONORARIOS CONTADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	JUAN HARVEY RAMIREZ CAMACHO	91245968	CRA 9 # 27-15	3168582222	juarvey@gmail.com	$ 1.960.000,00		$ 1.960.000,00	$ -		$ 31.360,00	$ 1.928.640,00	$ -	
4	TRANSPORTES		18-dic-2024	Comprob. Egreso	000034	CUENTA DE COBRO	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVACIÓN EN EL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA DE PLACA SNJ-436 EN LA VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO VÉLEZ SANTANDER DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	EDUYN RENE DIAZ DIAZ	13957135	CRA 6	3106099531	eduynrene75@gmail.com	$ 510.000,00		$ 510.000,00	$ -	$ 5.100,00	$ -	$ 504.900,00	$ -	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		18-dic-2024	Comprob. Egreso	000035	CUENTA DE COBRO	ALQUILER DE BRISBRO COMPATADOR PARA OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	RENE MAURICIO GONZALEZ FANDIÑO	13617030	CL 77 A 73 36 AP 211	2985011	rene.mauricio16@gmail.com	$ 1.680.000,00	$ -	$ 1.680.000,00	$ -	$ 67.200,00	$ 3.360,00	$ 1.609.440,00	$ -	
4	TRANSPORTES		18-dic-2024	Comprob. Egreso	000036	FECA-109	PAGO DE TRANSPORTE TRANSPORTE DE SUB BASE DESDE MONIQUIRA BOYACA CANTERA CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA A VEREDA EL GAITAL VÉLEZ SANTANDER SEGUN CONVENIO 4367DE 2023 CON INVIAS	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CR 6 5 A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	$ 4.250.000,00	$ -	$ 4.250.000,00	$ -	$ 42.500,00	$ 21.250,00	$ 4.186.250,00	$ -	
2	MATERIALES		18-dic-2024	Comprob. Egreso	000037	CUENTA DE COBRO	REEMBOLSON POR ADQUISICION DE MATERIAL PETREO SUB BASE 25 METROS CUBICOSVELEZ SANTANDER PARA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	JAIRO GONZALEZ PINZON	79671968	VEREDA EL GAITAL	3185827702	jairogonzal@hotmail.com	$ 1.785.000,00		$ 1.785.000,00	$ -	$ 37.500,00		$ 1.747.500,00	$ -	

2	MATERIALES		18-dic-2024	Comprob. Egreso	000038	FECA-110	COMPRA DE MATERIALES TUBOS YE SANITARIA, FIBRA, DISCOS DE CORTE, PLASTICO, ALAMBRE, GEOTEXTIL, GUANTES, CEMENTO Y VARILLA PARA OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CR 6 5 A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	$	14.133.452,00	$	2.685.355,88	$	16.818.807,88	$ -	$	353.336,30	$	28.267,58	$	16.437.204,00	$ -	
2	MATERIALES		18-dic-2024	Comprob. Egreso	000039	CUENTA DE COBRO	ADQUISICION DE MATERIAL PETREO CORRESPONDIENTES A 20 M^3 DE ARENA DE RIO, VALOR UNITARIO POR M^3 A $40.000, COMPRADOS EN PUERTO BERRIO ANTIOQUIA PARA OBRA PLACA HUELLA CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CR 6 5 A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	$	672.268,91	$	127.731,09	$	800.000,00	$ -	$	-	$	1.600,00	$	798.400,00	$ -	
4	TRANSPORTES		18-dic-2024	Comprob. Egreso	000040	CUENTA DE COBRO	TRANSPORTE DE MATERIAL CORRESPONDIENTE A 50 M^3 DE ARENA DE RIO, VALOR UNITARIO POR M^3 DE $110.000 DESDE LA CIUDAD DE PUERTO BERRIO ANTIOQUIA HASTA LA VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ, SANTANDER, MATERIAL PUESTO EN OBRA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE SERVICIO PARA OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4367 DE 2023 CON INVIAS	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CR 6 5 A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	$	5.500.000,00			$	5.500.000,00	$ -	$	55.000,00	$	27.500,00	$	5.417.500,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		18-dic-2024	Comprob. Egreso	000041	NOMINA	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10 DE DICIEMBRE A 24 DE DICIEMBRE PARA OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4367 DE 2023	JOHAN FERNANDO HERNANDEZ SILVA	7177533	VEREDA GAITAL	3136288948	jairogonzal@hotmail.com	$	1.158.267,00			$	1.158.267,00	$ 86.614,00					$	1.071.653,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		18-dic-2024	Comprob. Egreso	000042	NOMINA	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10 DE DICIEMBRE A 24 DE DICIEMBRE PARA OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4367 DE 2023	JORGE ENRIQUE DIAZ VILLAMIL	1101756589	VEREDA GAITAL	3219688762	diazvillamilljorgeenrique@gmail.com	$	682.267,00			$	682.267,00	$ 48.534,00					$	633.733,00	$ -	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		18-dic-2024	Comprob. Egreso	000043	NOMINA	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10 DE DICIEMBRE A 24 DE DICIEMBRE PARA OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4367 DE 2023	JOSE ALEJANDRO GONZALEZ SEDANO	1101752279	VEREDA GAITAL	3227571178	JGONZALEZSEDANO@GMAIL.COM	$	682.267,00			$	682.267,00	$ 48.534,00					$	633.733,00	$ -	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		18-dic-2024	Comprob. Egreso	000044	NOMINA	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10 DE DICIEMBRE A 24 DE DICIEMBRE PARA OBRA PLACA HUELLA SEGUN CONVENIO 4367 DE 2023	MISAEL DIAZ QUIROGA	13954281	VEREDA GAITAL	3138894921	jairogonzal@hotmail.com	$	682.267,00			$	682.267,00	$ 48.534,00					$	633.733,00	$ -	
2	MATERIALES		10-ene-2025	Comprob. Egreso	000045	PENDIENTE	Adquisición de material Pétreo correspondiente a 14 m3 de Rajón y 63 m3 de de Triturado para la Obra	CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SAS	900414198	KM 14 500 VIA BARBOSA TUNJA	3115141765	calmineral.co@gmail.com	$	7.163.800,00			$	7.163.800,00		$	150.500,00			$	7.013.300,00		
6	ADMINISTRATIVOS		10-ene-2025	Comprob. Egreso	000046	PENDIENTE	Ensayos de Laboratorio (Densidades de campo método Cono de arena) para La Obra.	FWF GEOINGENIERÍA SAS	900730123	Carrera 7 No. 5C-43 LOCAL 1			$	285.600,00			$	285.600,00		$	26.400,00			$	259.200,00		
6	ADMINISTRATIVOS		10-ene-2025	Comprob. Egreso	000047	CUENTA DE COBRO N° 2	Honorarios Ing. Residente periodo del 07 de diciembre de 2024 al 06 de enero de 2025	LAURA ALEJANDRA PINZON SILVA	1101756910		321250027		$	3.500.000,00			$	3.500.000,00				$	14.000,00	$	3.486.000,00		
2	MATERIALES		10-ene-2025	Comprob. Egreso	000048	CUENTA DE COBRO	Reembolso por compra de material de Material Pétreo correspondiente a 14 m3 de Triturado para La Obra	JAIRO GONZALEZ PINZON	79671968	VEREDA EL GAITAL	3185827702	jairogonzal@hotmail.com	$	1.332.800,00			$	1.332.800,00						$	1.332.800,00		
5	MANO DE OBRA		10-ene-2025	Comprob. Egreso	000049	CUENTA DE COBRO	Reembolso por pago de Seguridad Social del personal de la Obra.	JAIRO GONZALEZ PINZON	79671968	VEREDA EL GAITAL	3185827702	jairogonzal@hotmail.com	$	1.383.100,00			$	1.383.100,00						$	1.383.100,00		
0	PAGO DE IMPUESTOS		10-ene-2025	Comprob. Egreso	000050	Formulkario N° 351061817715 1	Pago de Retención en La Fuente mes de diciembre de 2024	DIAN	800197268	DIAN		www.dian.gov.co	$	1.040.606,00			$	1.040.606,00						$	1.040.606,00		
4	TRANSPORTES		28-ene-2025	Comprob. Egreso	000051	JACG16	Transporte de triturado 1/2" (64m3) y Rajón (14m3) desde La Cantera hasta el Colegio Gaital	FERNANDO GONZÁLEZ MENDOZA	13957723-1	Carrera 6 5A-42			$	3.250.000,00			$	3.250.000,00		$	32.500,00	$	16.250,00	$	3.201.250,00		
4	TRANSPORTES		28-ene-2025	Comprob. Egreso	000052	JACG14	SOBREACARREO DE MATERIALES PETREOS (COLEGIO - OBRA) 63m3 Triturado + 14 m3 Rajón x 77m3	EDUYN RENÉ DÍAZ DÍAZ	13957135	Carrera 6			$	1.185.600,00			$	1.185.600,00		$	12.000,00	$	2.400,00	$	1.171.200,00		
4	TRANSPORTES		28-ene-2025	Comprob. Egreso	000053	Cuenta de Cobro 25 enero 2025	TRANSPORTE DE 14 M3 DE TRITURADO DESDE LA CANTERA DE MONQUIRÁ HASTA EL COLEGIO GAITAL (REALIZADO EN DICIEMBRE 2024)	CRISTIAN GERARDO ARIZA DUARTE	1101755510	CR 6 5 A 69	3114190113	cristianariza7380@gmail.com	$	1.400.000,00			$	1.400.000,00		$	14.000,00	$	7.000,00	$	1.379.000,00		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		28-ene-2025	Comprob. Egreso	000054	Cuenta de Cobro 24 enero 2025	Alquile de retro excavadora para cargue de material de sobreacarreo (78m3)	WILSON SÁNCHEZ DÍAZ	13955008	Carrera 8 No. 6-23 Vélez Santander			$	1.197.600,00			$	1.197.600,00						$	1.197.600,00		
6	ADMINISTRATIVOS		28-ene-2025	Comprob. Egreso	000055	Cuenta de Cobro	Saldo Estudios y Diseños del Convenio	JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA	800220791-3	Calle 19 No.9-28 Chiquinquirá	3118508140	juancao_d@hotmail.com	$	2.400.000,00			$	2.400.000,00						$	2.400.000,00		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		28-ene-2025	Comprob. Egreso	000056	JACG15	Alquiler de Mezcladora (DESDE EL 13 ENERO AL 12 FEBRERO 2025)	JOSE MANUEL GONZÁLEZ MENDOZA	1101757399	BRR LOS CEREZOS CA 55			$	1.630.000,00			$	1.630.000,00		$	57.000,00			$	1.573.000,00		
0	PAGO DE IMPUESTOS		28-ene-2025	Comprob. Egreso	000057	No. Retención 873 No. Pago 847	Retención Industria y Comercio (Reembolso	JAIRO GONZALEZ PINZON	79671968	VEREDA EL GAITAL	3185827702	jairogonzal@hotmail.com	$	132.289,58			$	132.289,58						$	132.289,58		
2	MATERIALES		28-ene-2025	Comprob. Egreso	000058	Cuenta de Cobro (JAC Gaital)	Saldo por Compra de materiales Pétreos (Adquisición de material Pétreo correspondiente a 14 m3 de Rajón y 63 m3 de de Triturado para la Obra) realizado el 10 enero 2025	CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA SAS	900414198	KM 14 500 VIA BARBOSA TUNJA	3115141765	calmineral.co@gmail.com	$	916.300,00			$	916.300,00		$	19.250,00			$	897.050,00		
6	ADMINISTRATIVOS		28-ene-2025	Comprob. Egreso	000059	Referencia de pago 117818301	Actualización pólizas del convenio (Pago anticipado) a la JAC	JAIRO GONZALEZ PINZON	79671968	VEREDA EL GAITAL	3185827702	jairogonzal@hotmail.com	$	893.542,00			$	893.542,00						$	893.542,00		
5	MANO DE OBRA		28-ene-2025	Comprob. Egreso	000060	NOMINA	NOMINA DEL 13 ENERO AL 27 DE ENERO 2026	JUAN ANGEL GAMBOA HERREÑO	1.101.755.923	VEREDA EL GAITAL			$	1.269.010,00			$	1.269.010,00						$	1.269.010,00		
5	MANO DE OBRA		28-ene-2025	Comprob. Egreso	000061	NOMINA	NOMINA DEL 13 ENERO AL 27 DE ENERO 2027	RODRIGO PIZON FONTECHA	13.957.042	VEREDA EL GAITAL			$	754.810,00			$	754.810,00						$	754.810,00		
5	MANO DE OBRA		28-ene-2025	Comprob. Egreso	000062	NOMINA	NOMINA DEL 13 ENERO AL 27 DE ENERO 2028	JOSE ALEJANDRO GONZALEZ SEDANO	1101752279	VEREDA GAITAL	3227571178	JGONZALEZSEDANO@GMAIL.COM	$	654.169,00			$	654.169,00						$	654.169,00		
5	MANO DE OBRA		28-ene-2025	Comprob. Egreso	000063	NOMINA	NOMINA DEL 13 ENERO AL 27 DE ENERO 2029	MISAEL DIAZ QUIROGA	13954281	VEREDA GAITAL	3138894921	jairogonzal@hotmail.com	$	704.489,00			$	704.489,00						$	704.489,00		
5	MANO DE OBRA		28-ene-2025	Comprob. Egreso	000064	NOMINA	NOMINA DEL 13 ENERO AL 27 DE ENERO 2030	JOHN JAIRO RODRIGUEZ	91.136.267	VEREDA EL GAITAL			$	150.000,00			$	150.000,00						$	150.000,00		
													$	164.936.211,90	$	7.722.369,08	$	172.658.580,98	$ 232.216,00	$	2.197.020,85	$	347.861,58	$	169.881.482,55		

Firma:
Nombre: Jairo Gonzalez Pinzon
Representante Legal
Contratista

Firma:
Nombre: Juan Harvey Ramirez Camacho
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 108394-T

Firma:
Nombre: Jorge Hernando Forero Forero
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No. 25202-61517 CND

Firma:
Nombre: LAURA ALEJANDRA PINZON
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No. 15202-3327 BYC

erventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
ratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No. 4565 de 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNALVEREDA LA PALMERA

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INCENTIVO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORIA
6	ADMINISTRATIVOS		9-sept-24	Comprob. Egresp	1	DSJP1	Pago Honorarios Contador mes de Agosto 2024	LAURA CAROLINA ARIZA NIEVES	1101756784	CARRERA 2 NO. 7-70	3204224687	asesorias2532@outlook.es	$ 1.960.000,00	$ -	$ 1.960.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.960.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		9-sept-24	Comprob. Egresp	2	N/A	Pago Poliza convenio en ejecucion No. 4565 de 2023	CARLOS AUGUSTO ARIZA SANTAMARIA	1101753207	VEREDA LA PLAMERA FINCA EL PORVENIR	3003629884	carjas731@gmail.com	$ 2.623.354,00	$ -	$ 2.623.354,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.623.354,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS	$ 107.939	9-sept-24	Comprob. Egresp	3	N/A	Pago subsidio de transporte mes de Agosto 2024	CARLOS AUGUSTO ARIZA SANTAMARIA	1101753207	VEREDA LA PLAMERA FINCA EL PORVENIR	3003629884	carjas731@gmail.com	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		9-sept-24	Comprob. Egresp	4	N/A	Pago Caja Menor mes de Agosto de 2024	CARLOS AUGUSTO ARIZA SANTAMARIA	1101753207	VEREDA LA PLAMERA FINCA EL PORVENIR	3003629884	carjas731@gmail.com	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 300.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		9-sept-24	Comprob. Egresp	5	DSJP2	Pago Honorarios Ingeniero Residente mes de Agosto 2024	JESUS ALBERTO DIAZ ARIZA	13957231	CARRERA 5 NO. 4A-04 BARRIO SANTATERESIRA	3132823322	jabat4111@gmail.com	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		8-oct-24	Comprob. Egresp	6	DSJP3	Pago Honorarios Contador mes de Septiembre 2024	LAURA CAROLINA ARIZA NIEVES	1101756784	CARRERA 2 NO. 7-70	3204224687	asesorias2532@outlook.es	$ 1.960.000,00	$ -	$ 1.960.000,00	$ -	$ -	$ 15.680,00	$ 1.944.320,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		8-oct-24	Comprob. Egresp	7	N/A	Pago subsidio de transporte mes de Septiembre 2024	CARLOS AUGUSTO ARIZA SANTAMARIA	1101753207	VEREDA LA PLAMERA FINCA EL PORVENIR	3003629884	carjas731@gmail.com	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		8-oct-24	Comprob. Egresp	8	N/A	Pago Caja Menor mes de Septiembre de 2024	CARLOS AUGUSTO ARIZA SANTAMARIA	1101753207	VEREDA LA PLAMERA FINCA EL PORVENIR	3003629884	carjas731@gmail.com	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 300.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		8-oct-24	Comprob. Egresp	9	DSJP4	Pago Honorarios Ingeniero Residente mes de Septiembre 2024	JESUS ALBERTO DIAZ ARIZA	13957231	CARRERA 5 NO. 4A-04 BARRIO SANTATERESIRA	3132823322	jabat4111@gmail.com	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	$ -	$ 28.000,00	$ 3.472.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		8-oct-24	Comprob. Egresp	10	DSJP5	Pago Elementos de Dotacion	ALFONSO CELIS RAMOS	79327735	CR 3 11 06 BRR LAS NIEVES	3026869927	celiselectricos@outlook.com	$ 1.240.000,00	$ -	$ 1.240.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.240.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		8-oct-24	Comprob. Egresp	12	DSJP7	Pago Examenes Ocupacionales	YENY CECILIA RODRIGUEZ VALLE	32763815	CALLE 11 NO. 5-114	3115922224	asesorias2532@hotmail.com	$ 150.000,00	$ -	$ 150.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 150.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		8-oct-24	Comprob. Egresp	13	N/A	Antiopo 50% Estudios y Diseños Convenio 4565 de 2023	JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA	7321156	CALLE 19 NO. 9 28	3118508140	juanvaca-id@hotmail.com	$ 2.150.000,00	$ -	$ 2.150.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.150.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS	$ 109.596	21-oct-24	Comprob. Egresp	14	RFE119	Valla del Convenio 4565 de 2023	CARLOS ALBERTO MOGOLLON ARIZA	13958087	CR 3 10 55	6077564821	latidolarte@hotmail.com	$ 170.000,00	$ -	$ 170.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 170.000,00	$ -	
2	MATERIALES		21-oct-24	Comprob. Egresp	15	N/A	Compra de Sub Base	CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA S.A.S.	900414198	KM 14 + 500 VIA BARBOSA TUNJA	3105759087	celimineral.co@gmail.com	$ 5.040.000,00	$ 957.600,00	$ 5.997.600,00	$ -	$ 126.000,00	$ -	$ 5.871.600,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		29-oct-24	Comprob. Egresp	18	DSJP8	Pago Honorarios Contador meses de junio - Julio 2024	LAURA CAROLINA ARIZA NIEVES	1101756784	CARRERA 2 NO. 7-70	3204224687	asesorias2532@outlook.es	$ 980.000,00	$ -	$ 980.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 980.000,00	$ -	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		29-oct-24	Comprob. Egresp	17	DSJP9	Demolicion de Cinta Huella	JOSE MIGUEL GONZALEZ MENDOZA	1101757399	BARRIO LOS CEREZOS CASA 55		NO TIENE	$ 3.900.000,00	$ -	$ 3.900.000,00	$ -	$ 156.000,00	$ 7.800,00	$ 3.736.200,00	$ -	
4	TRANSPORTES		29-oct-24	Comprob. Egresp	20	DSJP10	Servicio denTransporte	MIGUEL ANTONIO BAREÑO BAREÑO	91018816	CR 5 3 36		NO TIENE	$ 3.360.000,00	$ -	$ 3.360.000,00	$ -	$ 33.600,00	$ -	$ 3.326.400,00	$ -	
4	TRANSPORTES		29-oct-24	Comprob. Egresp	21	DSJP11	Servicio denTransporte	ALIRIO RODRIGUEZ ROJAS	91450072	URB SAN CARLOS DEL RIO LOTE 15	3118591113	rodriguezalirio785@gmail.com	$ 1.680.000,00	$ -	$ 1.680.000,00	$ -	$ 16.800,00	$ -	$ 1.663.200,00	$ -	
2	MATERIALES		29-oct-24	Comprob. Egresp	19	FE1386	Compra de Sub Base	CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA S.A.S.	900414198	KM 14 + 500 VIA BARBOSA TUNJA	3105759087	celimineral.co@gmail.com	$ 5.040.000,00	$ 957.600,00	$ 5.997.600,00	$ -	$ 126.000,00	$ -	$ 5.871.600,00	$ -	
2	MATERIALES		29-oct-24	Comprob. Egresp	22	CV1504	Compra de materiales	RODRIGO ANTONIO SIERRA LESMES	13954819	CALLE 10 NO. 4-51	7565984	bodegaserlahelena@hotmail.com	$ 7.352.941,00	$ 1.397.058,00	$ 8.749.999,00	$ -	$ 183.823,53	$ 44.118,00	$ 8.522.057,47	$ -	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		5-nov-24	Comprob. Egresp	23	PRV 11	Alquiler de Retroexcavadora	PROINSO VELEZ S.A.S.	901598520	CL 3 10 57	3229037245	paolaandrea228@hotmail.com	$ 4.524.000,00	$ 859.560,00	$ 5.383.560,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.383.560,00	$ -	
2	MATERIALES		5-nov-24	Comprob. Egresp	24	QBH3029	Compra de Cemento	HECTOR QUINTANILLA BALAGUERA	13887576	CARRERA 6 NO. 7-65	3117349879	ferreteriatrespelos7@hotmail.com	$ 8.067.226,00	$ 1.532.773,00	$ 9.599.999,00	$ -	$ 201.680,00	$ 80.672,00	$ 9.317.647,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		5-nov-24	Comprob. Egresp	25	DSJP12	Servicio de Topografia	MIGUEL ANGEL PARDO BARRERA	1101758052	CL 8 2 este sa 34 brr la rosita	3118074205	miguelangeltopografo@hotmail.com	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -	$ -	$ 3.000,00	$ 1.497.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		12-nov-24	Comprob. Egresp	26	Cuenta de cobro	Pago subsidio de transporte mes de Octubre 2024	CARLOS AUGUSTO ARIZA SANTAMARIA	1101753207	VEREDA LA PLAMERA FINCA EL PORVENIR	3003629884	carjas731@gmail.com	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		12-nov-24	Comprob. Egresp	27	DSJP13	Pago Honorarios Ingeniero Residente mes de Octubre 2024	JESUS ALBERTO DIAZ ARIZA	13957231	CARRERA 5 NO. 4A-04 BARRIO SANTATERESIRA	3132823322	jabat4111@gmail.com	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	$ -	$ 14.000,00	$ 3.486.000,00	$ -	
7	ADMINISTRATIVOS		12-nov-24	Comprob. Egresp	28	DSJP14	Pago Elementos de Dotacion	ALFONSO CELIS RAMOS	79327735	CR 3 11 06 BRR LAS NIEVES	3026869927	celiselectricos@outlook.com	$ 600.000,00	$ -	$ 600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 600.000,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		12-nov-24	Comprob. Egresp	29	NOMINA	Salario Segunda Quincena de Octubre de 2024	RIGOBERTO ARIZA DUARTE	13953823	VEREDA LA PALMERA	3125317560	NO TIENE	$ 909.000,00	$ -	$ 909.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 909.000,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		12-nov-24	Comprob. Egresp	30	NOMINA	Salario Segunda Quincena de Octubre de 2024	MERARDO ALFONSO PARDO ARIZA	13957210	VEREDA LA PALMERA	3112800825	NO TIENE	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 679.000,00	$ -	
6	MANO DE OBRA		12-nov-24	Comprob. Egresp	33	N/A	Pago de seguridad social del mes de Octubre de 2024	CARLOS AUGUSTO ARIZA SANTAMARIA	1101753207	VEREDA LA PLAMERA FINCA EL PORVENIR	3003629884	carjas731@gmail.com	$ 844.100,00	$ -	$ 844.100,00	$ -	$ -	$ -	$ 844.100,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		12-nov-24	Comprob. Egresp	34	N/A	Pago de Poliza del convenio 4565 de 2023.	CARLOS AUGUSTO ARIZA SANTAMARIA	1101753207	VEREDA LA PLAMERA FINCA EL PORVENIR	3003629884	carjas731@gmail.com	$ 159.773,00	$ -	$ 159.773,00	$ -	$ -	$ -	$ 159.773,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		12-nov-24	Comprob. Egresp	35	DSJP15	Pago Examenes Ocupacionales	YENY CECILIA RODRIGUEZ VALLE	32763815	CALLE 11 NO. 5-114	3115922224	asesorias2532@hotmail.com	$ 120.000,00	$ -	$ 120.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 120.000,00	$ -	
0	PAGO DE IMPUESTOS		12-nov-24	Comprob. Egresp	36	N/A	Pago de Retencion en la Fuente mes de Octubre	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	800197268	carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustin	6013078064	NO APLICA	$ 642.000,00	$ -	$ 642.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 642.000,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		19-nov-24	Comprob. Egresp	37	NOMINA	Salario Primera Quincena de Noviembre de 2024	RIGOBERTO ARIZA DUARTE	13953823	VEREDA LA PALMERA	3125317560	NO TIENE	$ 909.000,00	$ -	$ 909.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 909.000,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		19-nov-24	Comprob. Egresp	38	N/A	Salario Primera Quincena de Noviembre de 2024 y Liquidacion	MERARDO ALFONSO PARDO ARIZA	13957210	VEREDA LA PALMERA	3112800825	NO TIENE	$ 912.772,00	$ -	$ 912.772,00	$ -	$ -	$ -	$ 912.772,00	$ -	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		25-nov-24	Comprob. Egresp	39	DSJP17	Servicio de Vibrocompactador	GILBERTO DURAN FRANCO	91015117	CL 12 a 3 b 34 BRR SAMAN	3114826537	gilbertoduf4@hotmail.com	$ 3.786.000,00	$ -	$ 3.786.000,00	$ -	$ 150.640,00	$ -	$ 3.615.360,00	$ -	
2	MATERIALES		25-nov-24	Comprob. Egresp	40	FE1389	Compra de Grava	CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA S.A.S.	900414198	KM 14 + 500 VIA BARBOSA TUNJA	3105759087	celimineral.co@gmail.com	$ 2.400.000,00	$ 456.000,00	$ 2.856.000,00	$ -	$ 60.000,00	$ -	$ 2.796.000,00	$ -	
2	MATERIALES		25-nov-24	Comprob. Egresp	41	CV1517	Compra de materiales	RODRIGO ANTONIO SIERRA LESMES	13954819	CALLE 10 NO. 4-51	7565984	bodegaserlahelena@hotmail.com	$ 4.638.655,00	$ 881.344,00	$ 5.519.999,00	$ -	$ 115.967,00	$ -	$ 5.404.032,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		25-nov-24	Comprob. Egresp	42	DSJP16	Pago Honorarios Contador mes de Octubre 2024	LAURA CAROLINA ARIZA NIEVES	1101756784	CARRERA 2 NO. 7-70	3204224687	asesorias2532@outlook.es	$ 1.960.000,00	$ -	$ 1.960.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.960.000,00	$ -	
2	MATERIALES		2-dic-24	Comprob. Egresp	43	FECN-06	Compra de Madera para Formaleta	CRISTIAN JESUS NIEVES SERRANO	1101755630	CL 12 5 12 BRR LA ESPERANZA	3124844762	nievescristian1999@gmail.com	$ 1.664.000,00	$ -	$ 1.664.000,00	$ -	$ 41.600,00	$ 3.328,00	$ 1.619.072,00	$ -	
2	EQUIPO Y HERRAMIENTA		2-dic-24	Comprob. Egresp	44	DSP-020	Servicio Retroexcavadora	LINDERMAN ARIZA MENDOZA	1098599550	CARRERA NO. 9-59	3212124913	NO TIENE	$ 3.892.000,00	$ -	$ 3.892.000,00	$ -	$ 97.300,00	$ 7.784,00	$ 3.726.536,00	$ -	
2	MATERIALES		2-dic-24	Comprob. Egresp	45	FE1385	Compra de Materiales Pétreos Grava, Piedra Rajón	CALIZAS Y MINERALES DE COLOMBIA S.A.S.	900414198	KM 14 + 500 VIA BARBOSA TUNJA	3105759087	celimineral.co@gmail.com	$ 5.150.000,00	$ 978.500,00	$ 6.128.500,00	$ -	$ 128.750,00	$ -	$ 5.999.750,00	$ -	
2	MATERIALES		2-dic-24	Comprob. Egresp	46	CV1519	Compra de Materiales 120 Varillas 3/8	RODRIGO ANTONIO SIERRA LESMES	13954819	CALLE 10 NO. 4-51	7565984	bodegaserlahelena@hotmail.com	$ 1.855.462,00	$ 352.537,78	$ 2.207.999,78	$ -	$ 46.386,00	$ 38.995,00	$ 2.122.648,78	$ -	
2	MATERIALES		2-dic-24	Comprob. Egresp	47	QBH3065	Compra de Materiales Cemento 300bultos	HECTOR QUINTANILLA BALAGUERA	13887576	CARRERA 6 NO. 7-65	3117349879	ferreteriatrespelos7@hotmail.com	$ 8.067.226,00	$ 1.532.772,94	$ 9.599.998,94	$ -	$ 201.680,00	$ 80.671,00	$ 9.317.647,94	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		2-dic-24	Comprob. Egresp	48	AEVL498	Papeleria MES NOVEMBRE 2024	ALVARO ERNESTO VELASCO LOPEZ	13955550	CALLE 10 4 29	31574507	alevelo@hotmail.com	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 300.000,00	$ -	
2	MATERIALES		2-dic-24	Comprob. Egresp	49	OM-298	Compra de Materiales Suministro y Cargue Arena	OM-VIAS SAS	804013405	CR 4 8 89	3155949804	gerviasa@hotmail.com	$ 2.352.000,00	$ 228.000,00	$ 2.580.000,00	$ -	$ 46.080,00	$ -	$ 2.533.920,00	$ -	
4	ADMINISTRATIVOS		2-dic-24	Comprob. Egresp	50	DSP-019	Dotacion	ALFONSO CELIS RAMOS	79327735	CR 3 11 06 BRR LAS NIEVES	3026869927	celiselectricos@outlook.com	$ 1.098.000,00	$ -	$ 1.098.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.098.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		2-dic-24	Comprob. Egresp	51	NO APLICA	Auxilio de Transportes para el dignatario MES NOVIEMBRE 2024	CARLOS AUGUSTO ARIZA SANTAMARIA	1101753207	VEREDA LA PLAMERA FINCA EL PORVENIR	3003629884	carjas731@gmail.com	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 400.000,00	$ -	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		2-dic-24	Comprob. Egresp	52	PRV 14	Alquiler Retroexcavadora	PROINSO VELEZ S.A.S.	901598520	CL 3 10 57	3229037245	paolaandrea228@hotmail.com	$ 708.000,00	$ 134.520,00	$ 842.520,00	$ -	$ -	$ -	$ 842.520,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		2-dic-24	Comprob. Egresp	53	NO APLICA	NOMINA 16 NOV-30NOV	ROBINSON SANTAMARIA ARIZA	13959325	CALLE 12 1E 66 BRR SANTANDER	3147077532	arqsasanta33@gmail.com	$ 459.280,00	$ -	$ 459.280,00	$ -	$ -	$ -	$ 459.280,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		2-dic-24	Comprob. Egresp	54	NO APLICA	NOMINA 16 NOV-30NOV	YOBANY GUIZA HERNANDEZ	13957092	VEREDA LA PLAMERA	3224708397	NO TIENE	$ 271.600,00	$ -	$ 271.600,00	$ -	$ -	$ -	$ 271.600,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		2-dic-24	Comprob. Egresp	55	NO APLICA	NOMINA 16 NOV-30NOV	DANIEL ALEJANDRO ESPITIA	1000137426	VEREDA LA PLAMERA	7565984	NO TIENE	$ 181.067,00	$ -	$ 181.067,00	$ -	$ -	$ -	$ 181.067,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		2-dic-24	Comprob. Egresp	56	NO APLICA	NOMINA 16 NOV-30NOV	EFREN RAMIREZ OLARTE	13954019	VEREDA LA PLAMERA	3043218678	NO TIENE	$ 363.600,00	$ -	$ 363.600,00	$ -	$ -	$ -	$ 363.600,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		2-dic-24	Comprob. Egresp	57	NO APLICA	NOMINA 16 NOV-30NOV	SAUL JEREZ HERNANDEZ	1007477730	VEREDA LA PLAMERA	3118108049	NO TIENE	$ 271.600,00	$ -	$ 271.600,00	$ -	$ -	$ -	$ 271.600,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		2-dic-24	Comprob. Egresp	58	NO APLICA	NOMINA 16 NOV-30NOV	LUIS OVIDIO DUARTE HERNANDEZ	1005196326	VEREDA LA PLAMERA	3102320968	NO TIENE	$ 271.600,00	$ -	$ 271.600,00	$ -	$ -	$ -	$ 271.600,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		2-dic-24	Comprob. Egresp	59	NO APLICA	NOMINA 16 NOV-30NOV	RIGOBERTO ARIZA DUARTE	13953823	VEREDA LA PALMERA	3125317560	NO TIENE	$ 909.000,00	$ -	$ 909.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 909.000,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		11-dic-24	Comprob. Egresp	60	NO APLICA	NOMINA 01 dic al 15 de 2024	RIGOBERTO ARIZA DUARTE	13953823	VEREDA LA PALMERA	3125317560	NO TIENE	$ 1.182.653,00	$ -	$ 1.182.653,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.182.653,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		11-dic-24	Comprob. Egresp	61	NO APLICA	NOMINA 01 dic al 15 de 2025	EFREN RAMIREZ OLARTE	13954019	VEREDA LA PLAMERA	3043218678	NO TIENE	$ 1.182.653,00	$ -	$ 1.182.653,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.182.653,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		11-dic-24	Comprob. Egresp	62	NO APLICA	NOMINA 01 dic al 15 de 2026	SAUL JEREZ HERNANDEZ	1007477730	VEREDA LA PLAMERA	3118108049	NO TIENE	$ 952.653,00	$ -	$ 952.653,00	$ -	$ -	$ -	$ 952.653,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		11-dic-24	Comprob. Egresp	63	NO APLICA	NOMINA 01 dic al 15 de 2027	LUIS OVIDIO DUARTE HERNANDEZ	1005196326	VEREDA LA PLAMERA	3102320968	NO TIENE	$ 952.653,00	$ -	$ 952.653,00	$ -	$ -	$ -	$ 952.653,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		11-dic-24	Comprob. Egresp	64	NO APLICA	NOMINA 01 dic al 15 de 2028	YOBANY GUIZA HERNANDEZ	13957092	VEREDA LA PLAMERA	3224708397	NO TIENE	$ 952.653,00	$ -	$ 952.653,00	$ -	$ -	$ -	$ 952.653,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		11-dic-24	Comprob. Egresp	65	NO APLICA	NOMINA 01 dic al 15 de 2029	CARLOS DANIEL QUIÑONEZ MAZA	1003040962	VEREDA LA PLAMERA	3173624633	NO TIENE	$ 952.653,00	$ -	$ 952.653,00	$ -	$ -	$ -	$ 952.653,00	$ -	
5	MANO DE OBRA		11-dic-24	Comprob. Egresp	66	NO APLICA	NOMINA 01 dic al 15 de 2030	LUIS ENRRIQUE LUCENA COLOMBO	7131661	VEREDA LA PLAMERA	3214901371	NO TIENE	$ 952.653,00	$ -	$ 952.653,00	$ -	$ -	$ -	$ 952.653,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		11-dic-24	Comprob. Egresp	67	NO APLICA	NOMINA 01 dic al 15 dic 2031	ROBINSON SANTAMARIA ARIZA	13959325	CALLE 12 1E 66 BRR SANTANDER	3147077532	arqsasanta33@gmail.com	$ 1.421.853,00	$ -	$ 1.421.853,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.421.853,00	$ -	
2	MATERIALES		11-dic-24	Comprob. Egresp	68	O 305	Materiales	830035082	830035082	CARRERA 5 A O 5 LC 2 ED ISABELLA	3126154540	DOTAMEQ LTDA	$ 2.712.562,00	$ 499.908,00	$ 3.212.500,00	$ -	$ 67.814,06	$ 16.276,00	$ 3.128.410,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		11-dic-24	Comprob. Egresp	69	DSPJ21	Servicio Topografia	MIGUEL ANGEL PARDO BARRERA	1101758052	CL 8 2 este sa 34 brr la rosita	3118074205	miguelangeltopografo@hotmail.com	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -	$ -	$ 3.000,00	$ 1.497.000,00	$ -	
4	TRANSPORTES		11-dic-24	Comprob. Egresp	70	DSPJ22	SERVICIO TRANSPORTE MAT PETREOS y CEMENTO	MIGUEL ANOTINIO BAREÑO BAREÑO	91018816	Carrera 5 no. 3-36	3118974205	miguelantoniobareno@hotmail.com	$ 11.854.000,00	$ -	$ 11.854.000,00	$ -	$ 118.540,00	$ -	$ 11.735.460,00	$ -	
4	TRANSPORTES		11-dic-24	Comprob. Egresp	71	DSPJ23	SERVICIO TRANSPORTE MAT PETREOS	ALIRIO RODRIGUEZ ROJAS	91450072	URB SAN CARLOS DEL RIO LOTE 15	91450072	rodriguezalirio785@hotmail.com	$ 4.770.000,00	$ -	$ 4.770.000,00	$ -	$ 47.700,00	$ -	$ 4.722.300,00	$ -	
4	TRANSPORTES		11-dic-24	Comprob. Egresp	72	DSPJ24	TRANSPORTE DE EQUIPOS, MEZCLADORA, PLANTA, E INSUMOS VARIOS	ROBINSON SANTAMARIA ARIZA	13959325	CALLE 12 1E 66 BRR SANTANDER	3147077532	arqsasanta33@gmail.com	$ 510.000,00	$ -	$ 510.000,00	$ -	$ 5.100,00	$ 2.550,00	$ 502.350,00	$ -	
4	TRANSPORTES		11-dic-24	Comprob. Egresp	73	NO APLICA	Reembolso compra de combustible ACPM y Gasolina para Rana, Mezclaodra, Planta Electrica y Saltarin.	CARLOS AUGUSTO ARIZA SANTAMARIA	1101753207	VEREDA LA PLAMERA FINCA EL PORVENIR	3003629884	carjas731@gmail.com	$ 148.200,00	$ -	$ 148.200,00	$ -	$ -	$ -	$ 148.200,00	$ -	
7	PAGA		11-dic-24	Comprob. Egresp	74	NO APLICA	PAGA	CARLOS AUGUSTO ARIZA SANTAMARIA	1101753207	VEREDA LA PLAMERA FINCA EL PORVENIR	3003629884	carjas731@gmail.com	$ 4.567.931,00	$ -	$ 4.567.931,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.567.931,00	$ -	
2	MATERIALES		18-dic-24	Comprob. Egresp	76	CUV1530	Materiales de Ferreteria	RODRIGO ANTONIO SIERRA LESMES	13954819	CALLE 10 NO. 4-51	7565984	bodegaserlahelena@hotmail.com	$ 438.000,00	$ -	$ 438.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 438.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		18-dic-24	Comprob. Egresp	77	DSPJ25	Honorarios Ingeniero Residente Mes de Noviembre	JESUS ALBERTO DIAZ ARIZA	13957231	CARRERA 5 NO. 4A-04 BARRIO SANTATERESIRA	3132823322	jabat4111@gmail.com	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	$ -	$ 14.000,00	$ 3.486.000,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		18-dic-24	Comprob. Egresp	78	NO APLICA	Actualizacion Poliza	CARLOS AUGUSTO ARIZA SANTAMARIA	1101753207	VEREDA LA PLAMERA FINCA EL PORVENIR	3003629884	carjas731@gmail.com	$ 148.694,00	$ -	$ 148.694,00	$ -	$ -	$ -	$ 148.694,00	$ -	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		18-dic-24	Comprob. Egresp	79	DSPJ32	Servicio de Vibrocompactador	RENE MAURICIO GONZALEZ FANDIÑO	13617030	CALLE 77 A 73 36 AP 211	3118761253	gmg.mauricio18@gmail.com	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	$ -	$ 10.000,00	$ -	$ 990.000,00	$ -	
7	ADMINISTRATIVOS		18-dic-24	Comprob. Egresp	80	FE3001	Servicio de Retroexcavadora S.A.S	WEF GEONGERIA S.A.S	900730123	CR 7 5 C 44 LC 1	3103257287	fefgeoingenieria@outlook.com	$ 1.249.500,00	$ -	$ 1.249.500,00	$ -	$ 42.000,00	$ -	$ 1.207.500,00	$ -	
6	ADMINISTRATIVOS		18-dic-24	Comprob. Egresp	81	DSPJ31	Servicio de Bodega para equipos, y materiales MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE	RIGOBERTO ARIZA DUARTE	13953823	VEREDA LA PALMERA	3125317560	NO TIENE	$ 500.000,00	$ -	$ 500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 500.000,00	$ -	
2	MATERIALES		18-dic-24	Comprob. Egresp	82	1286-1258	Elementos de Ferreteria	LUIS ANTONIO WILCHES ANZOLA	19270870	CLL 9 NO. 3-34	3245758665	ferreteria.michacon@gmail.com	$ 389.800,00	$ -	$ 389.800,00	$ -	$ -	$ -	$ 389.800,00	$ -	
2	MATERIALES		18-dic-24	Comprob. Egresp	83	FECN98	Compra de Madera	CRISTIAN JESUS NIEVES SERRANO	1101755630	CL 12 5 12 BRR LA ESPERANZA	3124844762	nievescristian1999@gmail.com	$ 570.000,00	$ -	$ 570.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 570.000,00	$ -	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		18-dic-24	Comprob. Egresp	84	DSPJ26	Alquiler de Mezcladora	ARNULFO GONZALEZ MENDOZA	13959668	BRR LOS ARRAYANES CASA 54	3132783034	arnulfogm1984@outlook.com	$ 1.800.000,00	$ -	$ 1.800.000,00	$ -	$ 72.000,00	$ 3.600,00	$ 1.724.400,00	$ -	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		18-dic-24	Comprob. Egresp	85	DSPJ28	Servicio de Vibrocompactador	JOHN JAIRO GOMEZ NIEVES	1101754674	DG 48 NO 3 E 24	3138124816	jairogomez1988@hotmail.com	$ 600.000,00	$ -	$ 600.000,00	$ -	$ 24.000,00	$ 1.200,00	$ 574.800,00	$ -	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		18-dic-24	Comprob.

ANEXO.
TOPOGRAFIA

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.

Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

INFORME TOPOGRAFÍA INTERVENTORIA
VISITA DE OBRA

TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S

INFORME TECNICO Y DESCRIPTIVO
ESTADO DE OBRA PLACA HUELLAS
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTANDER
VEREDA GUAMAL

TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420
Email: Topocadprofesionales@hotmail.com

Topógrafos Profesionales

BOLIVAR-SANTANDER
NOVIMBRE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción.....3
2. Objetivo 3
3. Localización 4
4. Descripción 6
5. Desarrollo del proceso…….....7
6. Conclusión ..... ….17

Topógrafos Profesionales

1. Introducción

A continuación, daremos a conocer datos relevantes a través de la información relacionada en cuanto a los parámetros topográficos del proyecto denominado **Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total**, localizado en la vereda Guamal jurisdicción del municipio de Bolívar Santander.
Interventoría a cargo de la empresa contratista **Terra Ingenieros Civiles S.A.S**

2. Objetivo

El objeto de la empresa Interventora a través del personal profesional en Topografía determina el seguimiento técnico a los estudios Topográficos realizados en campo y oficina por la firma contratista, en relación a:

1. Levantamiento Topográfico
2. Localización
3. Abscisado del alcance del proyecto
4. Verificación de niveles y pendientes
5. Cuantificación del avance de obra
6. Proporcionar asesoría técnica

Topógrafos Profesionales

3. Localización

El proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total vereda Guamal, se encuentra localizado al sur del departamento de Santander en jurisdicción del municipio de Bolívar, con coordenadas de Origen Nacional N 2219054.68 m – E 4913468.87m.

MAPA DE UBICACIÓN GENERAL



Topógrafos Profesionales


IMAGENES SATELITALES DE LOCALIZACION




Topógrafos Profesionales

4. Descripción

Proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total, con un alcance en longitud de 140 m y un ancho de calzada de 5 m, con especificaciones técnicas según diseño.

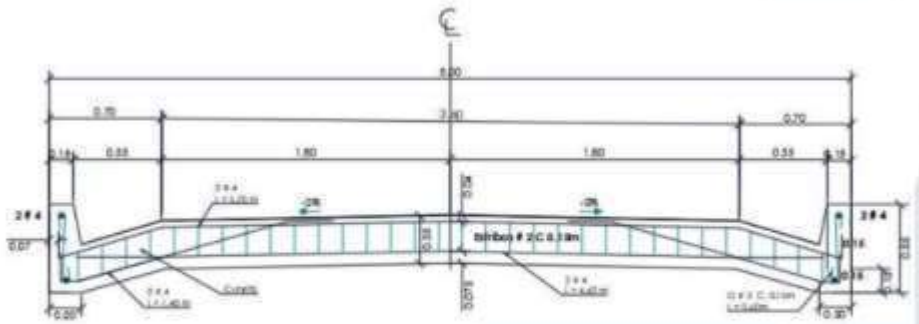

3.9 ILUSTRACION DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES

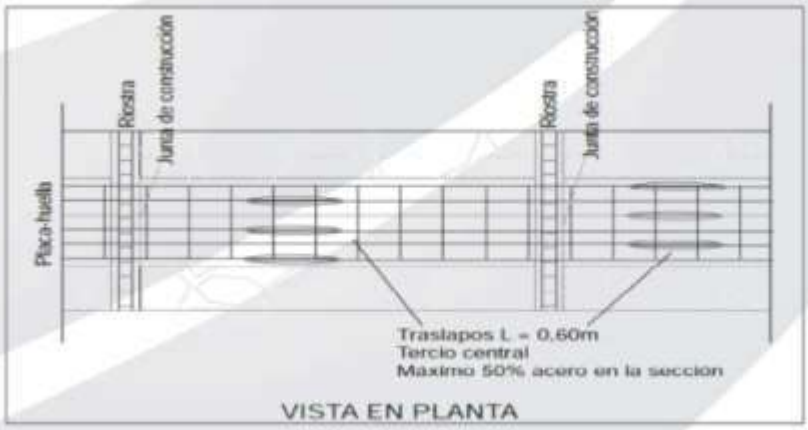

5. Desarrollo del proceso

Siendo las 12:40 a.m. del 7-11-2024, hizo arribo al sector la comisión topográfica por parte de la empresa Interventora **Terra Ingenieros Civiles S.A.S,** comisión compuesta por la Topógrafa y cadenero primero.

Luego del reconocimiento y localización geográfica del proyecto con coordenadas de Origen Nacional N 2219054.68 m – E 4913468.87 m, se pudo determinar los siguientes aspectos técnicos:

- La longitud determinada para el alcance de este proyecto fue calculada en 143 m inicialmente y un ancho promedio de 5 m.





- Al momento de la visita se observa compactación de base granular en espesor de 15 cm de espesor con ancho de la calzada de 4.10 m en 143 m de longitud





- Se evidencia personal en la obra, Ingeniero civil residente, Maestro de obra, oficial y ayudantes de Construcción, mescladora de concreto tipo trompo, adelantando labores de construcción de cinta en piedra pegada con un espesor de 15 cm por 90 cm ancho en sesiones de longitud de 2.80 m.
  El avance de esta actividad al momento de la visita es de 32 m.




TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda GUAMAL-BOLIVAR
07.11.2024 13:28
5.98206, -73.78209
Vía Sin Nombre


TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda GUAMAL-BOLIVAR
07.11.2024 13:28
5.98205, -73.78208
Vía Sin Nombre


TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S


TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda GUAMAL BOLIVAR
07.11.2024 13:22
5.98209 -73.78205
Vía Sin Nombre





- Se evidenció acopio de materiales (sub-base, arena, cemento, acero etc…)



- Hasta el momento esta obra no cuenta con Topografía de replanteo en su etapa de construcción, tampoco existe un abscisado que permita establecer principio y fin del proyecto.

- Al momento de esta visita se evidencia caída de peralte en uno de los tramos en construcción (piedra pegada) por esta razón y en el entendido que no se cuenta con un diseño geométrico que hiciera posible el replanteo, se solicitó al Ingeniero residente corregir el peralte aumentando el espesor del hombro derecho hasta alcanzar un peralte del 2.5%. Solicitud que fue aceptada por el Ing. Residente y se produjo su respectiva corrección.

Topógrafos Profesionales





topografos Profesionales


TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S


TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S


TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda GUAMAL-BOLIVAR
07 11 2024 13:29
5.98206, -73.78209
Vía Sin Nombre


TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

- Recomendaciones:

  Establecer por parte del contratista los puntos de referencia Topográficos (Deltas) y un abscisado técnico de principio a fin señalizado en estacas cuadradas previamente marcadas con intervalos de 10 m entre sí.

6. Conclusión

De esta manera se concluye la visita a la obra, en donde se da a conocer las diferentes variables en relación al proyecto y al avance de la obra en materia de ejecución, alistamiento de materiales y personal en obra; de igual manera se ofician recomendaciones técnicas necesarias para el desarrollo del proyecto.



TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420

INFORME TOPOGRAFÍA INTERVENTORIA
VISITA DE OBRA

TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S

INFORME TECNICO Y DESCRIPTIVO
ESTADO DE OBRA PLACA HUELLAS
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTANDER
VEREDA GUAMAL

TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420
Email: Topocadprofesionales@hotmail.com

BOLIVAR-SANTANDER
DICIEMBRE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción..... 3
2. Objetivo 3
3. Localización 4
4. Descripción 6
5. Desarrollo del proceso..... 7
6. Conclusión 13

Topógrafos Profesionales

1. Introducción

A continuación, daremos a conocer datos relevantes a través de la información relacionada en cuanto a los parámetros topográficos del proyecto denominado **Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total**, localizado en la vereda Guamal jurisdicción del municipio de Bolívar Santander. Interventoría a cargo de la empresa contratista **Terra Ingenieros Civiles S.A.S**

2. Objetivo

El objeto de la empresa Interventora a través del personal profesional en Topografía determina el seguimiento técnico a los estudios Topográficos realizados en campo y oficina por la firma contratista, en relación a:


1. Levantamiento Topográfico
2. Localización
3. Abscisado del alcance del proyecto
4. Verificación de niveles y pendientes
5. Cuantificación del avance de obra
6. Proporcionar asesoría técnica

Topógrafos Profesionales

3. Localización

El proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total vereda Guamal, se encuentra localizado al sur del departamento de Santander en jurisdicción del municipio de Bolívar, con coordenadas de **Origen Nacional N 2219054.68 m – E 4913468.87m.**

MAPA DE UBICACIÓN GENERAL

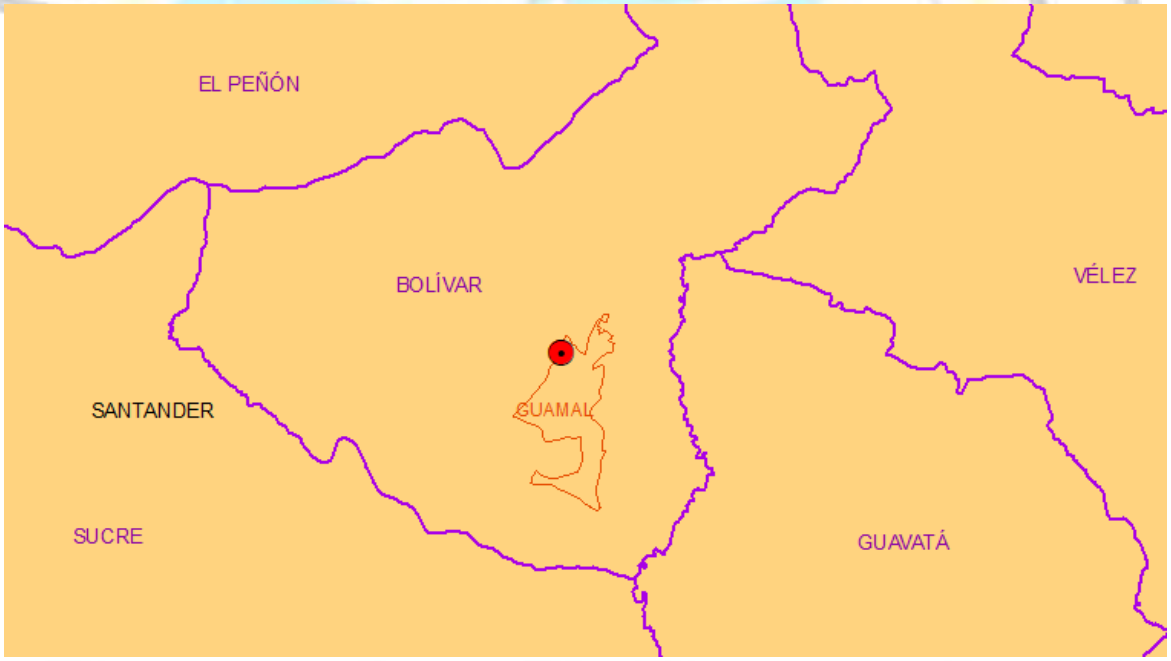

Topógrafos Profesionales


IMAGENES SATELITALES DE LOCALIZACION




Topógrafos Profesionales

4. Descripción

Proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total, con un alcance en longitud de 143 m y un ancho de calzada de 4.10 m, con especificaciones técnicas según diseño.

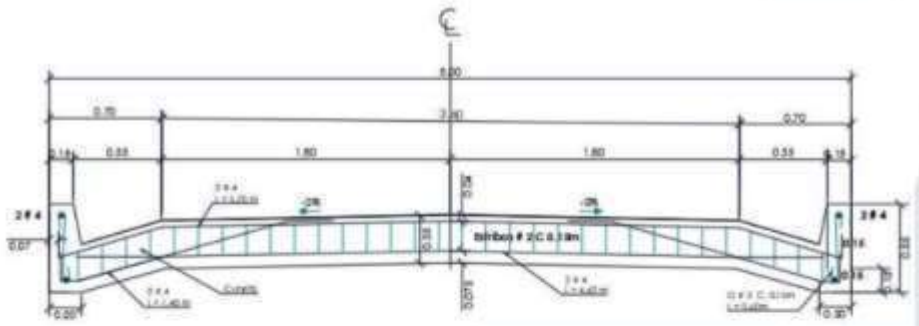

3.9 ILUSTRACION DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES

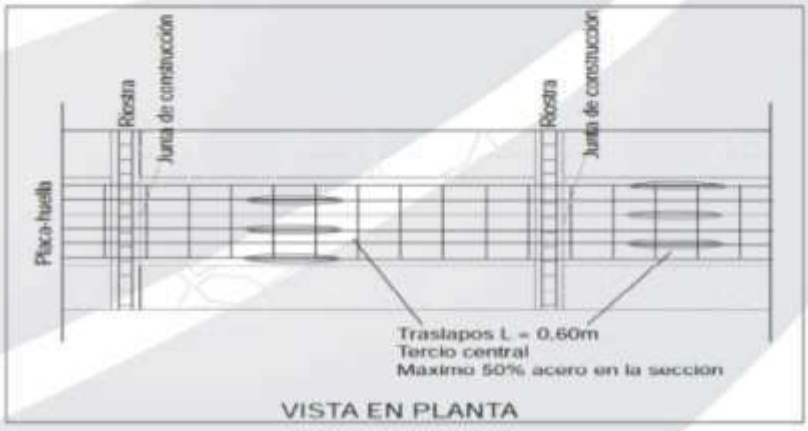

5. Desarrollo del proceso

Siendo las 10:40 a.m. del 19-12-2024, hizo arribo al sector la comisión topográfica por parte de la empresa Interventora Terra Ingenieros Civiles S.A.S, comisión compuesta por la Topógrafa y cadenero primero.

Luego del reconocimiento y localización geográfica del proyecto con coordenadas de Origen Nacional N 2219054.68 m – E 4913468.87 m, se pudo determinar lo siguiente:

Al momento de esta visita se pudo verificar y constatar que la obra fue culminada en su totalidad, con los siguientes aspectos técnicos:
Cinta huellas, vigas riostras, piedra pegada, cunetas y bordillos, rampas y batea según diseño establecido.

- La longitud 143 m y un ancho promedio de 4.10 m.

  - ✓ Instalación y compactación estructura sub - base granulada con un espesor de 0.15 m X ancho 4.10 m X 143 m de longitud.

  - ✓ Cinta huellas: Espesor 0.15 m X ancho 0.90 m X 255.6 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

  - ✓ Vigas riostras: Espesor 0.25 m X ancho 0.20 m X 4.10 m de longitud c/u, con intervalos de 3m entre sí.

  - ✓ Piedra pegada eje vial: Espesor 0.15 m X ancho 0.90 m X 127.8 m de longitud.

- ✓ Cunetas: Espesor 0.15 m X ancho 0.55 m X 255.6 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

- ✓ Bordillo: Espesor 0.30 m X ancho 0.15 m X 286 m de longitud en costado derecho e izquierdo de calzada.

- ✓ Rampas inicio y final: Espesor 0.15 m X ancho 4.10 m X 3 m de longitud.

- ✓ Batea: Espesor 0.15 m X ancho 4.10 m X 2.80 m de longitud.

- ✓ Estructura descole tipo disipador




TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S


TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S


TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda GUAMAL BOLIVAR
19.12.2024 11:05
5.98238, -73.78203
Vía Sin Nombre


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S



TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S

CANTIDADES DE OBRA				
ITEM	DIMENSIONES			CANTIDAD
	ESPESOR (m)	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	
INSTALACION Y COMPACTACION SUB-BASE GRANULADA	0.15	4.10	143	87.95 m3
CINTA HUELLA COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.90	255.6	34.51 m3
VIGAS RIOSTRAS TRANSVERSALES	0.25	0.20	192.7	9.64 m3
PIEDRA PEGADA EJE VIAL	0.15	0.90	127.8	17.25 m3
CUNETAS COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.55	255.6	21.09 m3
BORDILLO COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.30	0.15	286	12.87 m3
BATEA DE DESAGUE	0.15	4.10	2.8	1.72 m2
RAMPAS INICIO Y FINAL	0.15	4.10	3	1.85 m3

Topógrafos Profesionales

6. Conclusión

De esta manera se concluye la visita a la obra, en donde se da a conocer las diferentes variables en relación al proyecto y al avance de la obra en materia de ejecución, alistamiento de materiales y personal en obra; de igual manera se ofician recomendaciones técnicas necesarias para el desarrollo del proyecto.



TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420

Topógrafos Profesionales

INFORME TOPOGRAFÍA INTERVENTORIA
VISITA DE OBRA

TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S

INFORME TECNICO Y DESCRIPTIVO
ESTADO DE OBRA PLACA HUELLAS
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEL MUNICIPIO DE GUAVATA SANTANDER
VEREDA LA UNION

TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420
Email: Topocadprofesionales@hotmail.com

GUAVATA-SANTANDER
DICIEMBRE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción 3
2. Objetivo 3
3. Localización 4
4. Descripción 6
5. Desarrollo del proceso..... 7
6. Conclusión 16

Topógrafos Profesionales

1. Introducción

A continuación, daremos a conocer datos relevantes a través de la información relacionada en cuanto a los parámetros topográficos del proyecto denominado **Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total**, localizado en la vereda La Unión jurisdicción del municipio de Guavata Santander. Interventoría a cargo de la empresa contratista **Terra Ingenieros Civiles S.A.S**

2. Objetivo


El objeto de la empresa Interventora a través del personal profesional en Topografía determina el seguimiento técnico a los estudios Topográficos realizados en campo y oficina por la firma contratista, en relación a:

1. Levantamiento Topográfico
2. Localización
3. Abscisado del alcance del proyecto
4. Verificación de niveles y pendientes
5. Cuantificación del avance de obra
6. Proporcionar asesoría técnica


3. Localización

El proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total vereda La Unión, se encuentra localizado al sur del departamento de Santander en jurisdicción del municipio de Guavata, con coordenadas de Origen Nacional N 2212043.6499 m – E 4916486.0601m.

MAPA DE UBICACIÓN GENERAL

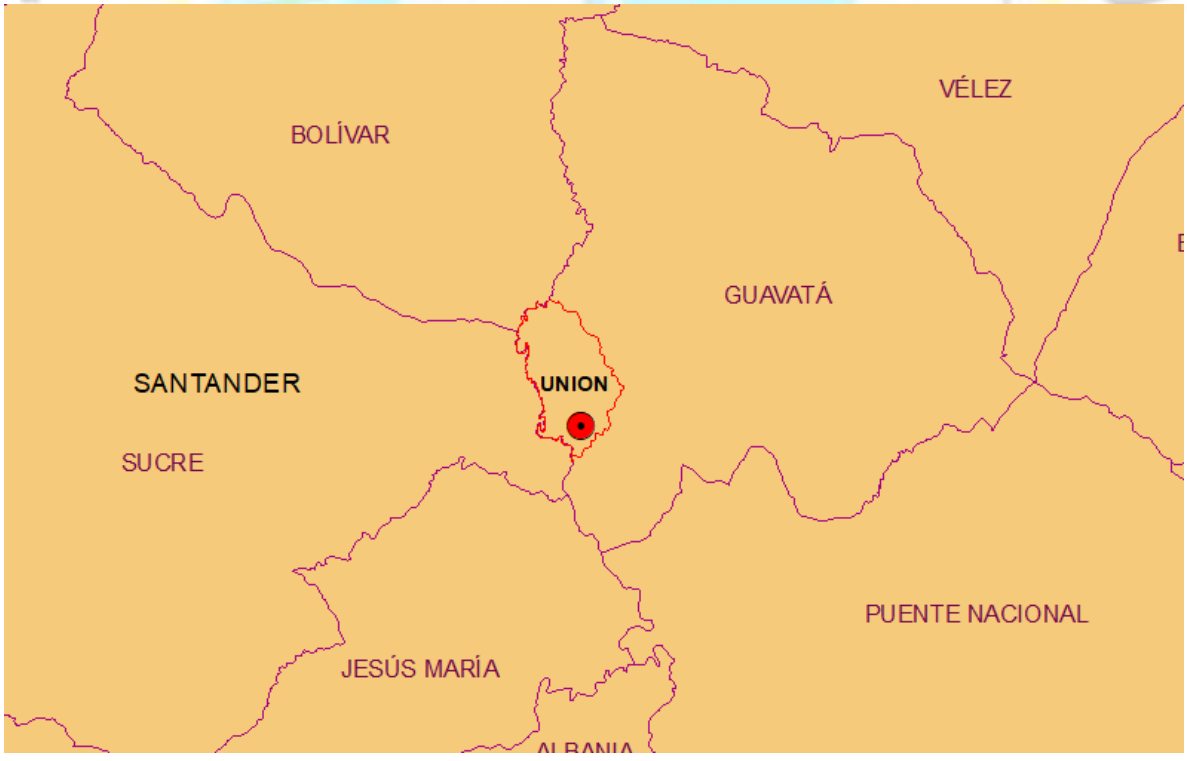


IMAGENES SATELITALES DE LOCALIZACION

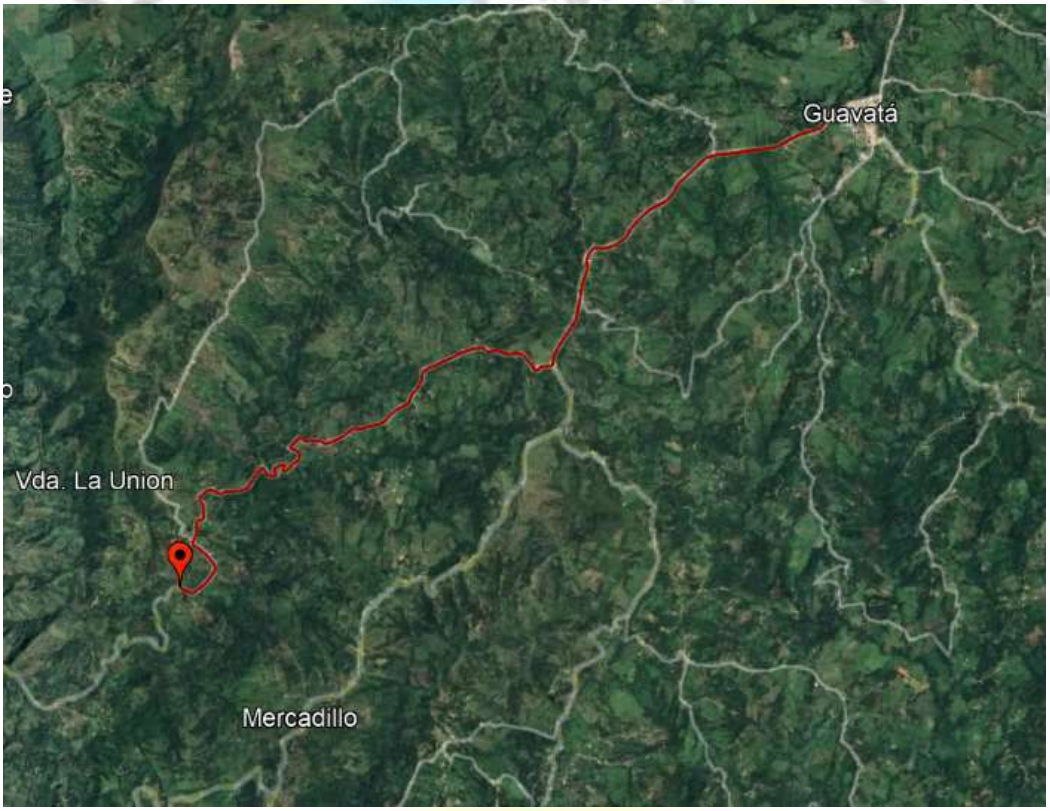

Topógrafos Profesionales

4. Descripción

Proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total, con un alcance en longitud de 106 m y un ancho de calzada de 5 m, con especificaciones técnicas según diseño, el proyecto contempla la construcción de una alcantarilla.

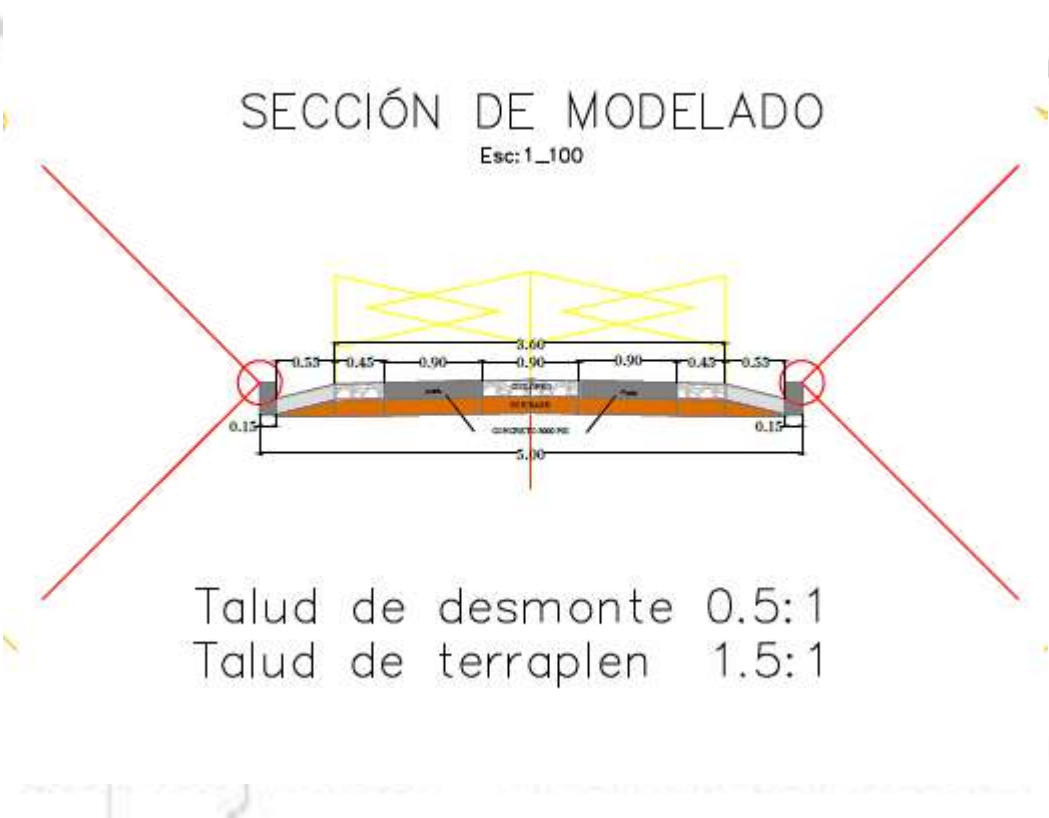

5. Desarrollo del proceso

Siendo las 10:20 a.m. del 17-12-2024, hizo arribo al sector la comisión topográfica por parte de la empresa Interventora **Terra Ingenieros Civiles S.A.S,** comisión compuesta por la Topógrafa y cadenero primero.

Luego del reconocimiento y localización geográfica del proyecto con coordenadas de Origen Nacional N 2212043.6499 m – E 4916486.0601 m, se pudo determinar los siguientes aspectos técnicos:

Al momento de esta visita se pudo verificar y constatar que la obra fue culminada en su totalidad, con los siguientes aspectos técnicos:
contempla cinta huellas, vigas riostras, piedra pegada, cunetas y bordillos según diseño establecido.

- La longitud construida en el desarrollo de este proyecto se determino en 112 m y un ancho promedio de 5 m.

  - ✓ Instalación y compactación estructura sub - base granulada con un espesor de 0.15 m X ancho 5 m X 112 m de longitud.

  - ✓ Cinta huellas: Espesor 0.15 m X ancho 0.90 m X 203.6 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

  - ✓ Vigas riostras: Espesor 0.25 m X ancho 0.20 m X 5 m de longitud c/u, con intervalos de 3 m entre sí.

  - ✓ Piedra pegada eje vial: Espesor 0.15 m X ancho 0.90 m X 101.8 m de longitud.

- ✓ Piedra pegada Berma: Espesor 0.15 m X ancho 0.45 m X 203.6 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

- ✓ Cunetas: Espesor 0.15 m X ancho 0.55 m X 209.6 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

- ✓ Bordillo: Espesor 0.30 m X ancho 0.15 m X 224 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

- ✓ Rampa de inicio y final: Espesor 0.15 m X ancho 3.60 m X 3 m de longitud

- ✓ Construcción de alcantarilla transversal de 5 m con tubería de 36" de diámetro, encole tipo caja y descole muro pantalla con aletas, obra terminada.

CANTIDADES DE OBRA				
ITEM	DIMENSIONES			CANTIDAD
	ESPESOR (m)	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	
INSTALACION Y COMPACTACION SUB-BASE GRANULADA	0.15	5	112	84 m3
CINTA HUELLA COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.90	203.6	27.49 m3
VIGAS RIOSTRAS TRANSVERSALES	0.25	0.20	180.0	9 m3
PIEDRA PEGADA EJE VIAL	0.15	0.90	101.8	13.74 m3
PIEDRA PEGADA BERMA COSADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.45	203.6	13.74 m3
CUNETAS COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.55	209.6	17.29 m3
BORDILLO COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.30	0.15	224	10.08 m3
RAMPAS INICIO	0.15	3.60	3	1.62 m3


DISEÑANDO Y SUPERVISANDO INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE 1972
TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda La Unión Guavata
17.12.2024 10:39
5.91808, -73.75391
Vía Sin Nombre


DISEÑANDO Y SUPERVISANDO INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE 1971
TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda La Unión Guavata
17.12.2024 10:51
5.9183, -73.75428
Vía Sin Nombre


DISEÑANDO Y SUPERVISANDO INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE 1974
TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda La Unión Guavata
17.12.2024 10:40
5.9182, -73.75415
Vía Sin Nombre


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda La Unión Guavata
17.12.2024 10:40
5.91819, -73.75412
Vía Sin Nombre


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S


DISEÑANDO Y SUPERVISANDO INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE 1974
TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda La Unión Guavata
17.12.2024 10:40
5.91834, -73.75418
Vía Sin Nombre


DISEÑANDO Y SUPERVISANDO INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE 1972
TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda La Unión Guavata
17.12.2024 10:51
5.91825, -73.75422
Vía Sin Nombre

6. Conclusión

De esta manera se concluye la visita a la obra, en donde se da a conocer las diferentes variables en relación al proyecto y al avance de la obra en materia de ejecución, definiendo en esta etapa la culminación total de lo propuesto en el proyecto.



TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420

INFORME TOPOGRAFÍA INTERVENTORIA
VISITA DE OBRA

TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S

INFORME TECNICO Y DESCRIPTIVO
ESTADO DE OBRA PLACA HUELLAS
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEL MUNICIPIO DE GUAVATA SANTANDER
VEREDA POPOA

TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420
Email: Topocadprofesionales@hotmail.com

GUAVATA-SANTANDER
DICIEMBRE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción 3
2. Objetivo 3
3. Localización 4
4. Descripción 6
5. Desarrollo del proceso 7
6. Conclusión 15

Topógrafos Profesionales

1. Introducción

A continuación, daremos a conocer datos relevantes a través de la información relacionada en cuanto a los parámetros topográficos del proyecto denominado **Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total**, localizado en la vereda Popoa jurisdicción del municipio de Guavata Santander.
Interventoría a cargo de la empresa contratista **Terra Ingenieros Civiles S.A.S**

2. Objetivo

El objeto de la empresa Interventora a través del personal profesional en Topografía determina el seguimiento técnico a los estudios Topográficos realizados en campo y oficina por la firma contratista, en relación a:

1. Levantamiento Topográfico
2. Localización
3. Abscisado del alcance del proyecto
4. Verificación de niveles y pendientes
5. Cuantificación del avance de obra
6. Proporcionar asesoría técnica

3. Localización

El proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total vereda Popoa, se encuentra localizado al sur del departamento de Santander en jurisdicción del municipio de Guavata, con coordenadas de Origen
Nacional N 2216174.3745 m – E 4921750.6683 m.

MAPA DE UBICACIÓN GENERAL




IMAGENES SATELITALES DE LOCALIZACION



Topógrafos Profesionales

4. Descripción

Proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total, con un alcance en longitud de 110 m y un ancho de calzada de 5 m, con especificaciones técnicas según diseño, el proyecto contempla la construcción de una alcantarilla.

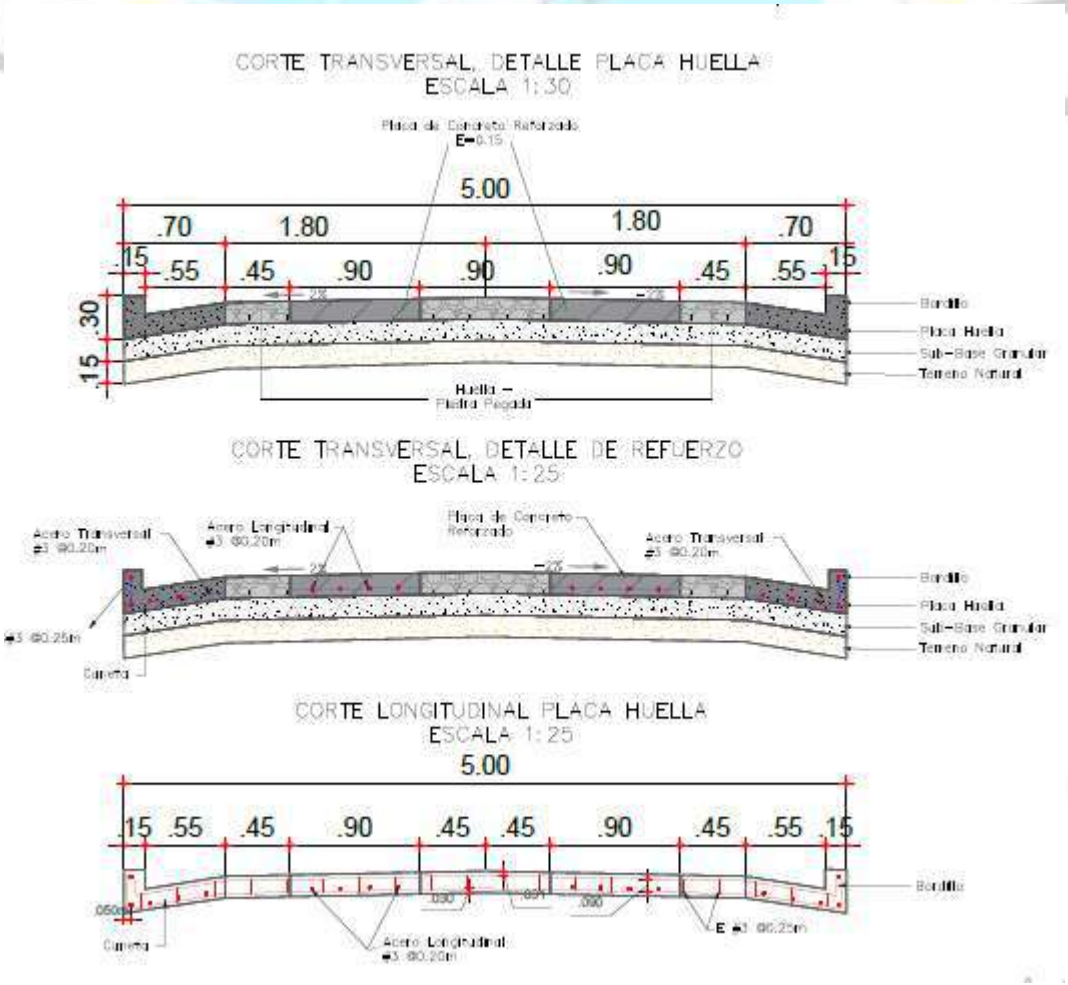

5. Desarrollo del proceso

Siendo las 9:40 a.m. del 17-12-2024, hizo arribo al sector la comisión topográfica por parte de la empresa Interventora **Terra Ingenieros Civiles S.A.S,** comisión compuesta por la Topógrafa y cadenero primero.

Luego del reconocimiento y localización geográfica del proyecto con coordenadas de Origen Nacional N 2216174.3745 m – E 4921750.6683 m, se pudo determinar los siguientes aspectos técnicos:

Al momento de esta visita se pudo verificar y constatar que la obra fue culminada en su totalidad, con los siguientes aspectos técnicos:
contempla cinta huellas, vigas riostras, piedra pegada, cunetas, bordillos, rampa y alcantarilla según diseño establecido.

- La longitud construida en el desarrollo de este proyecto se determinó en 105 m y un ancho promedio de 5 m.

  - ✓ Instalación y compactación estructura sub - base granulada con un espesor de 0.15 m X ancho 5 m X 105 m de longitud.

  - ✓ Cinta huellas: Espesor 0.15 m X ancho 0.90 m X 187 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

  - ✓ Vigas riostras: Espesor 0.25 m X ancho 0.20 m X 5 m de longitud c/u, con intervalos de 3 m entre sí.

- ✓ Piedra pegada eje vial: Espesor 0.15 m X ancho 0.90 m X 93.5 m de longitud.

- ✓ Piedra pegada Berma: Espesor 0.15 m X ancho 0.45 m X 187 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

- ✓ Cunetas: Espesor 0.15 m X ancho 0.55 m X 193 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

- ✓ Bordillo: Espesor 0.30 m X ancho 0.15 m X 210 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

- ✓ Rampa de inicio y final: Espesor 0.15 m X ancho 3.60 m X 3 m de longitud

- ✓ Construcción de alcantarilla transversal de 6 m con tubería de 36" de diámetro, encole tipo caja y descole muro pantalla con aletas, obra terminada.

CANTIDADES DE OBRA				
ITEM	DIMENSIONES			CANTIDAD
	ESPESOR (m)	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	
INSTALACION Y COMPACTACION SUB-BASE GRANULADA	0.15	5	105	78.75 m3
CINTA HUELLA COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.90	187	25.25 m3
VIGAS RIOSTRAS TRANSVERSALES	0.25	0.20	170.0	8.5 m3
PIEDRA PEGADA EJE VIAL	0.15	0.90	93.5	12.62 m3
PIEDRA PEGADA BERMA COSADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.45	187.0	12.62 m3
CUNETAS COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.55	193	15.92 m3
BORDILLO COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.30	0.15	210	9.45 m3
RAMPAS INICIO	0.15	3.60	3	1.62 m3



Topógrafos Profesionales


DISEÑANDO Y SUPERVISANDO INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE 1972
TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda Centro Guavata
17.12.2024 09:58
5.95593, -73.70722
Vía Sin Nombre



topógrafos Profesionales


DISEÑANDO Y SUPERVISANDO INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE 1972
TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda Centro Guavata
17.12.2024 09:59
5.95626, -73.70777
Vía Sin Nombre


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda Centro Guavata
17.12.2024 10:08
5.98513, -73.76526


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda Centro Guayatá
17.12.2024
5.95578
Jesus Maria - Guayata #31 - Guayata

6. Conclusión

De esta manera se concluye la visita a la obra, en donde se da a conocer las diferentes variables en relación al proyecto y al avance de la obra en materia de ejecución, definiendo en esta etapa la culminación total de lo propuesto en el proyecto



TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420

Topógrafos Profesionales

INFORME TOPOGRAFÍA INTERVENTORIA
VISITA DE OBRA

TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S

INFORME TECNICO Y DESCRIPTIVO
ESTADO DE OBRA PLACA HUELLAS
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA SANTANDER
VEREDA BERLIN

TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420
Email: Topocadprofesionales@hotmail.com

LA BELLEZA-SANTANDER
DICIEMBRE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción……3
2. Objetivo ……3
3. Localización……4
4. Descripción……6
5. Desarrollo del proceso……7
6. Conclusión ……12

Topógrafos Profesionales

1. Introducción

A continuación, daremos a conocer datos relevantes a través de la información relacionada en cuanto a los parámetros topográficos del proyecto denominado **Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total**, localizado en la vereda Berlín jurisdicción del municipio de La Belleza Santander.
Interventoría a cargo de la empresa contratista **Terra Ingenieros Civiles S.A.S**

2. Objetivo

El objeto de la empresa Interventora a través del personal profesional en Topografía determina el seguimiento técnico a los estudios Topográficos realizados en campo y oficina por la firma contratista, en relación a:

1. Levantamiento Topográfico
2. Localización
3. Abscisado del alcance del proyecto
4. Verificación de niveles y pendientes
5. Cuantificación del avance de obra
6. Proporcionar asesoría técnica

3. Localización


El proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total vereda Berlín, se encuentra localizado al sur del departamento de Santander en jurisdicción del municipio de La Belleza, con coordenadas de **Origen Nacional N 2210045.17 m – E 4894123.14 m.**

MAPA DE UBICACIÓN GENERAL



Topógrafos Profesionales


IMAGENES SATELITALES DE LOCALIZACION

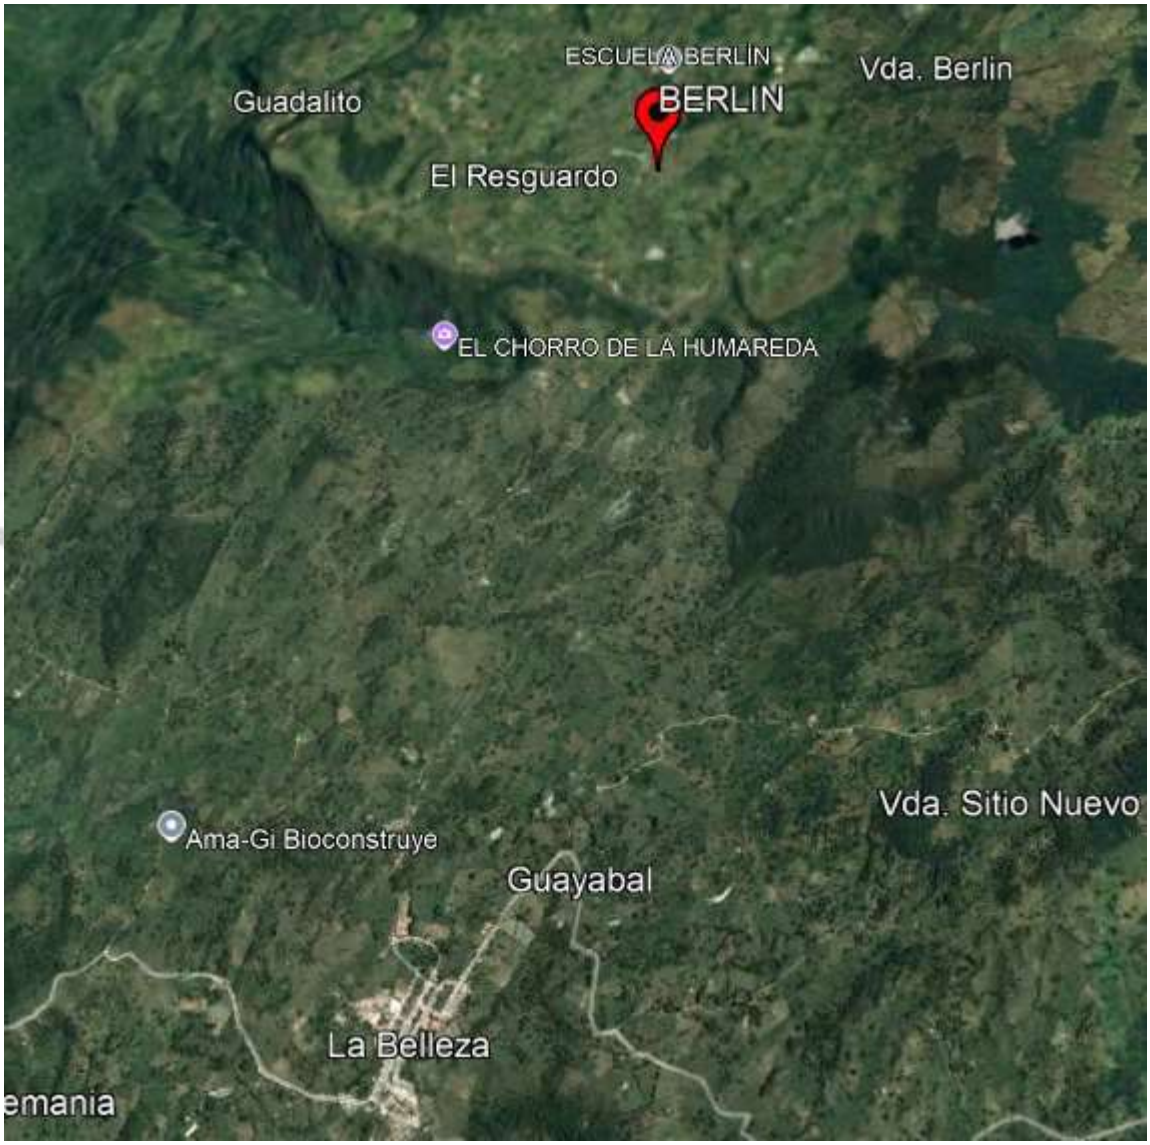


Topógrafos Profesionales

4. Descripción

Proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total, con un alcance en longitud de 155 m y un ancho de calzada de 4.10 m, con especificaciones técnicas según diseño.

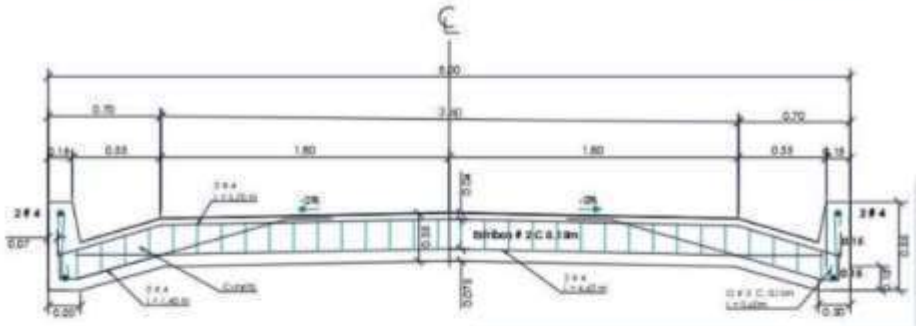

3.9 ILUSTRACION DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES

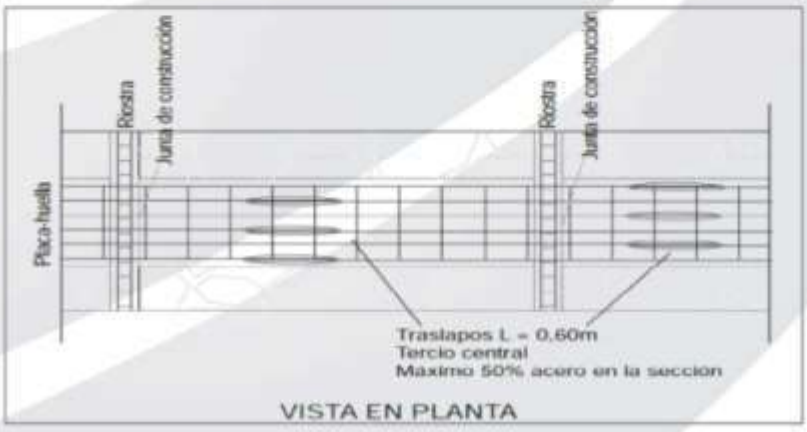

5. Desarrollo del proceso

Siendo las 5:00 a.m. del 23-12-2024, hizo arribo al sector la comisión topográfica por parte de la empresa Interventora Terra Ingenieros Civiles S.A.S, comisión compuesta por la Topógrafa y cadenero primero.

Luego del reconocimiento y localización geográfica del proyecto con coordenadas de Origen Nacional N 2210045.17 m – E 4894123.14 m, se pudo determinar los siguiente:

Al momento de esta visita se pudo verificar y constatar que la obra fue culminada en su totalidad, con los siguientes aspectos técnicos:
contempla cinta huellas, vigas riostras, piedra pegada, cunetas y bordillos según diseño establecido.

- La longitud 155 m y un ancho promedio de 4.10 m.

  - ✓ Instalación y compactación estructura sub -base granulada con un espesor de 0.15 m X ancho 4.10 m X 155 m de longitud.

  - ✓ Cinta huellas: Espesor 0.15 m X ancho 0.90 m X 282.2 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

  - ✓ Vigas riostras: Espesor 0.25 m X ancho 0.20 m X 4.10 m de longitud c/u con intervalos de 3 m entre sí.

  - ✓ Piedra pegada eje vial: Espesor 0.15 m X ancho 0.90 m X 141.1 m de longitud.

  - ✓ Cunetas: Espesor 0.15 m X ancho 0.55 m X 289.2 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

Topógrafos Profesionales

- ✓ Bordillo: Espesor 0.30 m X ancho 0.15 m X 151.5 m de longitud en costados derecho y 0.30 m X ancho 0.15 m X 143.5 m de longitud en costados izquierdo de calzada.

- ✓ Rampa de inicio: Espesor 0.15 m X ancho 3.50 m X 2 m de longitud

- ✓ Rampa final: Espesor 0.15 m X ancho 2.70 m X 1.5 m de longitud



Topógrafos Profesionales


TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda BERLIN- LA BELLEZA
23.12.2024 17:06
5.90061, -73.9564
Vía Sin Nombre


TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda BERLIN- LA BELLEZA
23.12.2024 17:06
5.90061, -73.9564
Vía Sin Nombre


TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda BERLIN- LA BELLEZA
23.12.2024 17:07
5.90151, -73.95603
Vía Sin Nombre



TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda BERLIN- LA BELLEZA
23.12.2024 17:06
5.90087, -73.95627
Vía Sin Nombre

CANTIDADES DE OBRA				
ITEM	DIMENSIONES			CANTIDAD
	ESPESOR (m)	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	
INSTALACION Y COMPACTACION SUB-BASE GRANULADA	0.15	4.10	155	95.33 m3
CINTA HUELLA COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.90	282.2	38.10 m3
VIGAS RIOSTRAS TRANSVERSALES	0.25	0.20	209.1	10.46 m3
PIEDRA PEGADA EJE VIAL	0.15	0.90	141.1	19.05 m3
CUNETAS COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.55	289.2	23.86 m3
BORDILLO COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.30	0.15	295	13.28 m3
RAMPAS INICIO Y FINAL	0.15	3.1	3.5	1.63 m3

Topógrafos Profesionales

6. Conclusión

De esta manera se concluye la visita a la obra, en donde se da a conocer las diferentes variables en relación al proyecto y al avance de la obra en materia de ejecución, definiendo en esta etapa la culminación total de lo propuesto en el proyecto.



TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420

Topógrafos Profesionales

INFORME TOPOGRAFÍA INTERVENTORIA
VISITA DE OBRA

TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S

INFORME TECNICO Y DESCRIPTIVO
ESTADO DE OBRA PLACA HUELLAS
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA SANTANDER
VEREDA CACHIPAYAL

TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420
Email: Topocadprofesionales@hotmail.com

LA BELLEZA-SANTANDER
DICIEMBRE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción 3
2. Objetivo 3
3. Localización 4
4. Descripción 6
5. Desarrollo del proceso..... 7
6. Conclusión 12

Topógrafos Profesionales

1. Introducción

A continuación, daremos a conocer datos relevantes a través de la información relacionada en cuanto a los parámetros topográficos del proyecto denominado **Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total**, localizado en la vereda Cachipayal jurisdicción del municipio de La Belleza Santander.
Interventoría a cargo de la empresa contratista **Terra Ingenieros Civiles S.A.S**

2. Objetivo

El objeto de la empresa Interventora a través del personal profesional en Topografía determina el seguimiento técnico a los estudios Topográficos realizados en campo y oficina por la firma contratista, en relación a:

1. Levantamiento Topográfico
2. Localización
3. Abscisado del alcance del proyecto
4. Verificación de niveles y pendientes
5. Cuantificación del avance de obra
6. Proporcionar asesoría técnica

3. Localización


El proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total vereda Cachipayal, se encuentra localizado al sur del departamento de Santander en jurisdicción del municipio de La Belleza, con coordenadas de **Origen Nacional N 2203599.51 m – E 4886229.77 m.**

MAPA DE UBICACIÓN GENERAL



Topógrafos Profesionales


IMAGENES SATELITALES DE LOCALIZACION

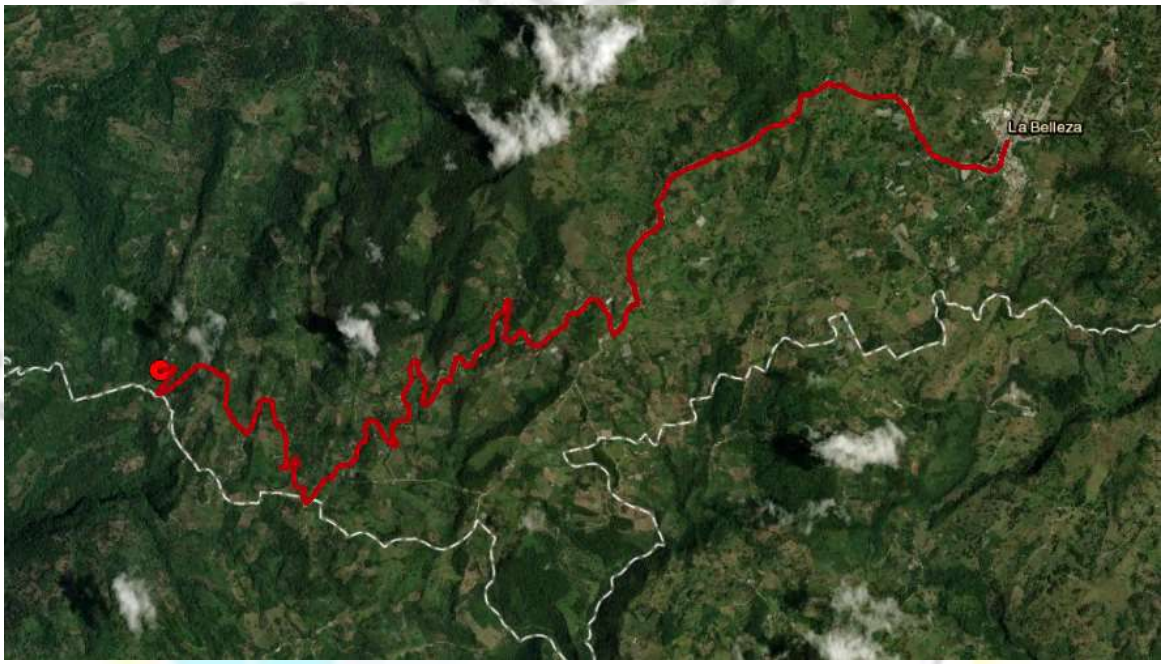

Topógrafos Profesionales

4. Descripción

Proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total, con un alcance en longitud de 142 m y un ancho de calzada de 5.0 m, con especificaciones técnicas según diseño.

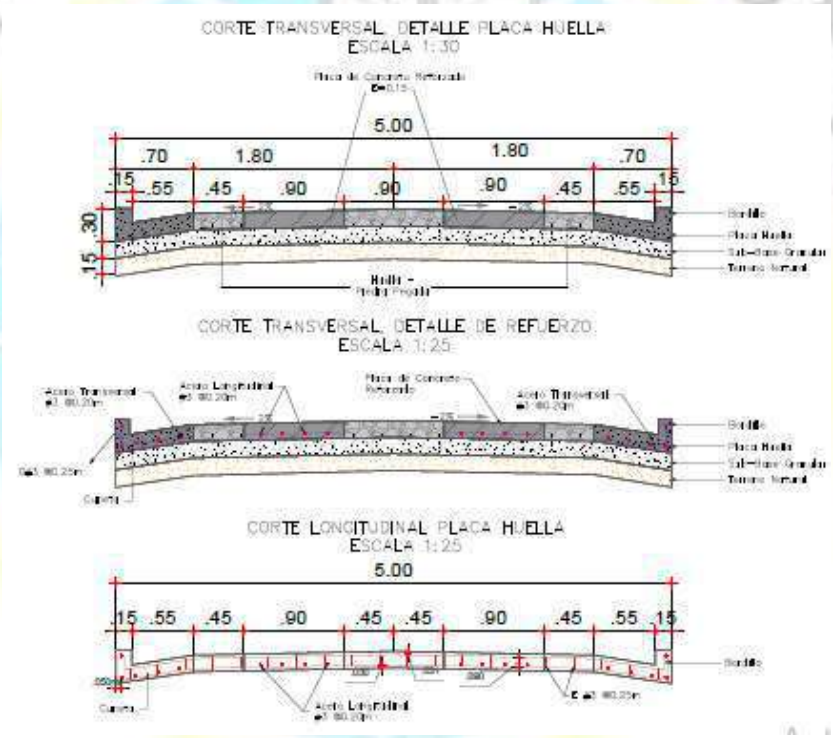

TOPO CAD
Topógrafos Profesionales

5. Desarrollo del proceso

Siendo las 3:30 p.m. del 23-12-2024, hizo arribo al sector la comisión topográfica por parte de la empresa Interventora **Terra Ingenieros Civiles S.A.S**, comisión compuesta por la Topógrafa y cadenero primero.

Luego del reconocimiento y localización geográfica del proyecto con coordenadas de Origen Nacional N 2203599.51 m – E 4886229.77 m, se pudo determinar los siguiente:

Al momento de esta visita se pudo verificar y constatar que la obra fue culminada en su totalidad, con los siguientes aspectos técnicos:
contempla cinta huellas, vigas riostras, piedra pegada, cunetas y bordillos según diseño establecido.

- La longitud 142 m y un ancho promedio de 5.0 m.

  - ✓ Instalación y compactación estructura sub -base granulada con un espesor de 0.15 m X ancho 5 m X 142 m de longitud.
  - ✓ Cinta huellas: Espesor 0.15 m X ancho 0.90 m X 258.8 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.
  - ✓ Vigas riostras: Espesor 0.25 m X ancho 0.20 m X 5 m de longitud c/u, con intervalos de 3 m entre sí.
  - ✓ Piedra pegada eje vial: Espesor 0.15 m X ancho 0.90 m X 129.4 m de longitud.

- ✓ Piedra pegada Berma: Espesor 0.15 m X ancho 0.45 m X 258.8 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

- ✓ Cunetas: Espesor 0.15 m X ancho 0.55 m X 258.8 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

- ✓ Bordillo: Espesor 0.30 m X ancho 0.15 m X 284 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

- ✓ Rampa de inicio y final: Espesor 0.15 m X ancho 5 m X 3 m de longitud

- ✓ Acceso de 1.85 m X 9.50m.




TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S


TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda GACHIPAYAL- LA BELLEZA
23.12.2024 15:50
5.84284, -74.02780
La Belleza



TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda GACHIPAYAL- LA BELLEZA
23.12.2024 15:50
5.84252, -74.02776
La Belleza



CANTIDADES DE OBRA				
ITEM	DIMENSIONES			CANTIDAD
	ESPESOR (m)	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	
INSTALACION Y COMPACTACION SUB-BASE GRANULADA	0.15	5	142	106.5 m3
CINTA HUELLA COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.90	258.8	34.94 m3
VIGAS RIOSTRAS TRANSVERSALES	0.25	0.20	235	11.75 m3
PIEDRA PEGADA EJE VIAL	0.15	0.90	129.4	17.47 m3
PIEDRA PEGADA BERMA COSADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.45	258.8	17.47 m3
CUNETAS COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.55	258.8	21.35 m3
BORDILLO COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.30	0.15	284	12.78m3
ACCESO	0.15	1.85	9.5	2.64 m3
RAMPAS INICIO Y FINAL	0.15	5	3	2.25 m3

6. Conclusión

De esta manera se concluye la visita a la obra, en donde se da a conocer las diferentes variables en relación al proyecto y al avance de la obra en materia de ejecución, definiendo en esta etapa la culminación total de lo propuesto en el proyecto.



TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420

Topógrafos Profesionales

INFORME TOPOGRAFÍA INTERVENTORIA
VISITA DE OBRA

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

INFORME TECNICO Y DESCRIPTIVO
ESTADO DE OBRA PLACA HUELLAS
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEL MUNICIPIO DE SUCRE SANTANDER
VEREDA ORGANOS

TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420
Email: Topocadprofesionales@hotmail.com

SUCRE-SANTANDER
DICIEMBRE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción 3
2. Objetivo 3
3. Localización 4
4. Descripción..... 6
5. Desarrollo del proceso.....7
6. Conclusión 10

Topógrafos Profesionales

1. Introducción

A continuación, daremos a conocer datos relevantes a través de la información relacionada en cuanto a los parámetros topográficos del proyecto denominado **Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total**, localizado en la vereda Órganos jurisdicción del municipio de Sucre Santander. Interventoría a cargo de la empresa contratista **Terra Ingenieros Civiles S.A.S**

2. Objetivo

El objeto de la empresa Interventora a través del personal profesional en Topografía determina el seguimiento técnico a los estudios Topográficos realizados en campo y oficina por la firma contratista, en relación a:

1. Levantamiento Topográfico
2. Localización
3. Abscisado del alcance del proyecto
4. Verificación de niveles y pendientes
5. Cuantificación del avance de obra
6. Proporcionar asesoría técnica

3. Localización

El proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total vereda Órganos, se encuentra localizado al sur del departamento de Santander en jurisdicción del municipio de Sucre, con coordenadas de **Origen Nacional N 2211294.27 m – E 4910786.41 m.**

MAPA DE UBICACIÓN GENERAL



IMAGENES SATELITALES DE LOCALIZACION



Topógrafos Profesionales

4. Descripción

Proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total, con un alcance en longitud de 176 m y un ancho promedio de calzada de 4.70 m, con especificaciones técnicas según diseño.

TOPOCAD
Topógrafos Profesionales

5. Desarrollo del proceso

Siendo las 12:30 p.m. del 23-12-2024, hizo arribo al sector la comisión topográfica por parte de la empresa Interventora Terra Ingenieros Civiles S.A.S, comisión compuesta por la Topógrafa y cadenero primero.

Luego del reconocimiento y localización geográfica del proyecto con coordenadas de Origen Nacional N 2211294.27 m – E 4910786.41 m, se pudo determinar lo siguientes:

Al momento de esta visita se pudo verificar y constatar que la obra fue culminada en su totalidad, con los siguientes aspectos técnicos:

- La longitud 176 m y un ancho promedio de 4.60 m.

  - ✓ Instalación y compactación estructura sub - base granulada con un espesor de 0.15 m X ancho 4.60 m X 176 m de longitud.

  - ✓ Cinta huellas: Espesor 0.15 m X ancho 0.90 m X 320.8 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

  - ✓ Vigas riostras: Espesor 0.25 m X ancho 0.20 m X 4.60 m de longitud c/u con intervalos de 3m entre sí.

  - ✓ Piedra pegada eje vial y bermas en promedio: Espesor 0.15 m X ancho 1.40 m X 160.4 m de longitud.

- ✓ Cunetas: Espesor 0.15 m X ancho 0.55 m X 328.8 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

- ✓ Bordillo: Espesor 0.30 m X ancho 0.15 m X 352 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

- ✓ Rampas de inicio y final: Espesor 0.10 m X ancho 3.20 m X 4 m de longitud.

- ✓ Estructura de encole y descole de aguas lluvias tipo disipador de energía costado derecho de la vía, según diseño



Topógrafos Profesionales


TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
23.12.2024
Via a Jesus Maria


TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S


TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S


TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S


TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda ORGANOS-SUCRE
23.12.2024 12:47
5.91177, -73.80644
Vía a Jesús María


TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda ORGANOS-SUCRE
23.12.2024 12:48
5.91175, -73.80644
Vía a Jesús María



CANTIDADES DE OBRA				
ITEM	DIMENSIONES			CANTIDAD
	ESPESOR (m)	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	
INSTALACION Y COMPACTACION SUB-BASE GRANULADA	0.15	4.60	176	121.44 m3
CINTA HUELLA COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.90	320.8	43.31 m3
VIGAS RIOSTRAS TRANSVERSALES	0.25	0.20	261.0	13.05 m3
PIEDRA PEGADA EJE VIAL Y BERMAS EN DIFERENTES SECTORES	0.15	1.40	160.4	33.68 m3
CUNETAS COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.55	328.8	27.13 m3
BORDILLO COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.30	0.15	352	15.84 m3
RAMPAS INICIO Y FINAL	0.15	4.6	4	2.76

6. Conclusión

De esta manera se concluye la visita a la obra, en donde se da a conocer las diferentes variables en relación al proyecto y al avance de la obra en materia de ejecución, definiendo en esta etapa la culminación total de lo propuesto en el proyecto.



TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420

Topógrafos Profesionales

INFORME TOPOGRAFÍA INTERVENTORIA
VISITA DE OBRA

TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S

INFORME TECNICO Y DESCRIPTIVO
ESTADO DE OBRA PLACA HUELLAS
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEL MUNICIPIO DE VELEZ SANTANDER
VEREDA TUBAVITA

TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420
Email: Topocadprofesionales@hotmail.com

VELEZ-SANTANDER
DICIEMBRE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción 3
2. Objetivo 3
3. Localización 4
4. Descripción 6
5. Desarrollo del proceso……..…..... 7
6. Conclusión ..... …..19

Topógrafos Profesionales

1. Introducción

A continuación, daremos a conocer datos relevantes a través de la información relacionada en cuanto a los parámetros topográficos del proyecto denominado **Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total**, localizado en la vereda Tubavita jurisdicción del municipio de Vélez Santander.
Interventoría a cargo de la empresa contratista **Terra Ingenieros Civiles S.A.S**

2. Objetivo


El objeto de la empresa Interventora a través del personal profesional en Topografía determina el seguimiento técnico a los estudios Topográficos realizados en campo y oficina por la firma contratista, en relación a:

1. Levantamiento Topográfico
2. Localización
3. Abscisado del alcance del proyecto
4. Verificación de niveles y pendientes
5. Cuantificación del avance de obra
6. Proporcionar asesoría técnica

3. Localización

El proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total vereda Tubavita, se encuentra localizado al sur del departamento de Santander en jurisdicción del municipio de Vélez, con coordenadas de Origen Nacional N 2223922.3401m – E 4926541.2891m.

MAPA DE UBICACIÓN GENERAL

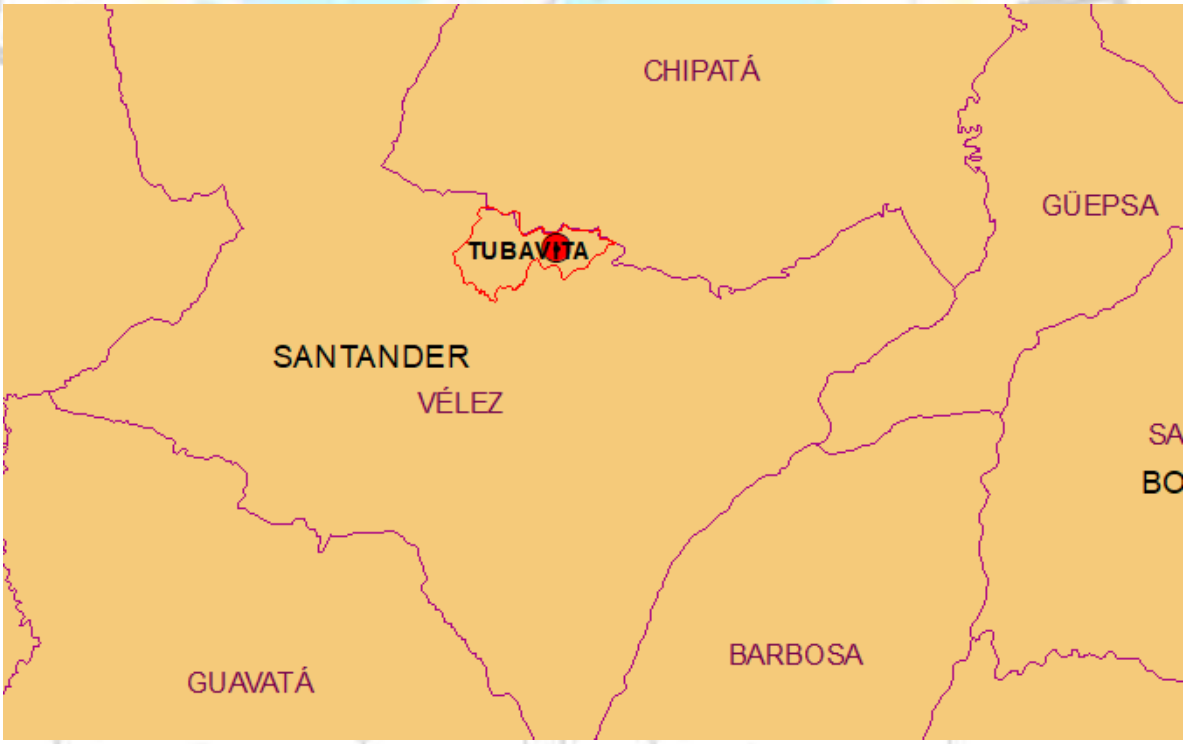

Topógrafos Profesionales


IMAGENES SATELITALES DE LOCALIZACION



Topógrafos Profesionales

4. Descripción

Proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total, con un alcance en longitud de 115 m y un ancho de calzada de 4.1 m, con especificaciones técnicas según diseño, el proyecto contempla la construcción de una alcantarilla

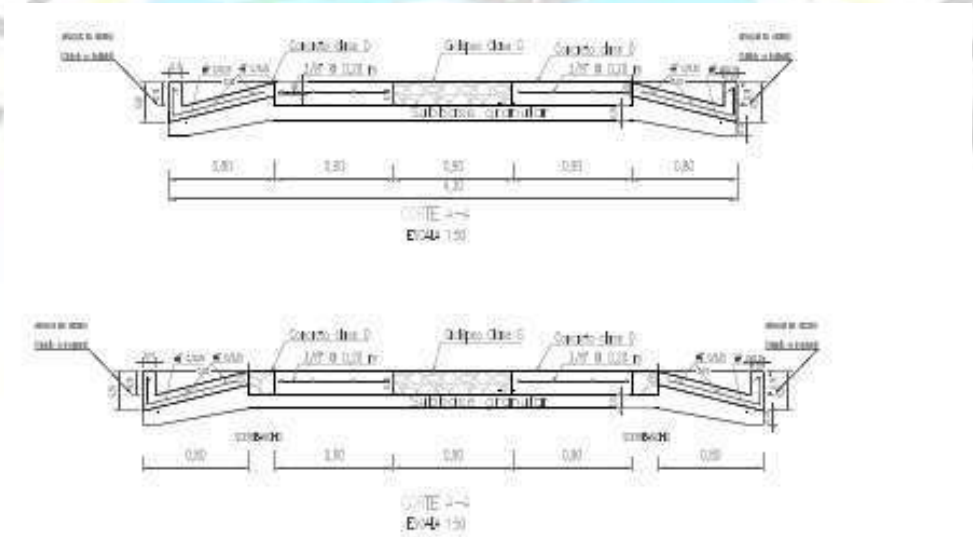

Topógrafos Profesionales

5. Desarrollo del proceso

Siendo las 1:00 p.m. del 13-12-2024, hizo arribo al sector la comisión topográfica por parte de la empresa Interventora **Terra Ingenieros Civiles S.A.S,** comisión compuesta por la Topógrafa y cadenero primero.

Luego del reconocimiento y localización geográfica del proyecto con coordenadas de Origen Nacional N 2223922.3401m – E 4926541.2891m, se pudo determinar los siguientes aspectos técnicos:

- La longitud determinada para el alcance de este proyecto fue calculada en 115 m que se dividen en 3 tramos y un ancho promedio de 4.1 m.

  En materia de obra al momento de esta visita se pudo verificar y constatar avances significativos por parte del contratista en las siguientes actividades:

- Construcción de alcantarilla de 5 m de ancho con tubería de 36” de diámetro, obra terminada.

Topógrafos Profesionales





❖ Tramo 1:

- Tramo de construcción terminado en longitud de 48.5 X 4.10 m, contempla cinta huellas, vigas riostras, piedra pegada, cunetas, bordillos y rampas según diseño establecido.

  - ✓ Cinta huellas: Espesor 0.15 m X ancho 0.90 m X 86 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

  - ✓ Vigas riostras: Espesor 0.25 m X ancho 0.20 m X 2.70 m de longitud c/u.

  - ✓ Piedra pegada eje vial: Espesor 0.15 m X ancho 0.90 m X 43 m de longitud.

  - ✓ Cunetas: Espesor 0.15 m X ancho 0.55 m X 97 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

  - ✓ Bordillo: Espesor 0.30 m X ancho 0.15 m X 97 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

  - ✓ Rampas de inicio y final: Espesor 0.15 m X ancho 2.70 m X 2.30 m.

- Construcción de 24 m de filtro tipo francés, en el costado derecho con

- dimensiones 0.60 m X 0.60 m, geotextil y tubo pvc 4”

Topógrafos Profesionales



Topógrafos Profesionales



Topógrafos Profesionales

CANTIDADES DE OBRA TRAMO 1				
ITEM	DIMENSIONES			CANTIDAD
	ESPESOR (m)	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	
CINTA HUELLA COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.90	86	11.61 m3
VIGAS RIOSTRAS TRANSVERSALES	0.25	0.20	43.2	2.16 m3
PIEDRA PEGADA EJE VIAL	0.15	0.90	43	5.81 m3
CUNETAS COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.55	97.0	8.00 m3
BORDILLO COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.30	0.15	97	4.37 m3
RAMPAS INICIO Y FINAL	0.15	2.70	2.3	0.93 m3

❖ Tramo 2:

- Tramo con avance de construcción en:
  Estructura sub-base granulada, cinta huellas, vigas riostras, piedra pegada, cunetas, bordillos, rampa y acceso de entrada según diseño establecido.

  ✓ Instalación y compactación estructura sub - base granulada con un espesor de 0.15 m X ancho 4.10 m X 39.5 m de longitud.

  ✓ Cinta huellas: Espesor 0.15 m X ancho 0.90 m X 65 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

  ✓ Vigas riostras: Espesor 0.25 m X ancho 0.20 m X 2.70 m de longitud c/u con intervalos de 3 m entre sí.

  ✓ Piedra pegada eje vial: Espesor 0.15 m X ancho 0.90 m X 19.6 m de longitud.

  ✓ Cunetas: Espesor 0.15 m X ancho 0.55 m X 27.6 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

- ✓ Bordillo: Espesor 0.30 m X ancho 0.15 m X 27.6 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

- ✓ Acceso de entrada: Espesor 0.15 m X ancho 1.45 m X 7.40 m de longitud.

- ✓ Rampa de inicio: Espesor 0.15 m X ancho 3.40 m X 0.90 m de longitud.

- ✓ Construcción de 20 m de filtro tipo francés, en el costado derecho con dimensiones 0.60 m X 0.60 m, geotextil y tubo pvc 4”

CANTIDADES DE OBRA TRAMO 2				
ITEM	DIMENSIONES			CANTIDAD
	ESPESOR (m)	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	
INSTALACION Y COMPACTACION SUB-BASE GRANULADA	0.15	4.10	39.5	24.29 m3
CINTA HUELLA COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.90	65	8.78 m3
VIGAS RIOSTRAS TRANSVERSALES	0.25	0.20	35.1	1.76 m3
PIEDRA PEGADA EJE VIAL	0.15	0.90	19.6	2.65 m3
CUNETAS COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.55	27.6	2.28 m3
BORDILLO COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.30	0.15	28	1.24 m3
ACCESO	0.15	1.45	7.4	1.61 m3
RAMPAS INICIO	0.15	3.40	0.9	0.46 m3

Topógrafos Profesionales


DISEÑANDO Y SUPERVISANDO INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE 1973
TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda Tubavita
13.12.2024 13:05
6.02576, -73.66525
Vélez-Chipatá


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda Tubavita
13.12.2024 13:06
6.02577, -73.66527
Vélez-Chipatá


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda Tubaviva
Vélez Cirpatá


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda Tubavita
13.12.2024 13:05
6.02564, -73.66543
Vélez-Chipatá

.

❖ Tramo 3:

- A la fecha se evidencia conformación del terreno (corte talud y descapote) e instalación de sub-base granular sin compactar en longitud de 34 m X 4.20 de ancho con un espesor de 0.15 m.

- Construcción de 20 m de filtro tipo francés, en el costado derecho con dimensiones 0.60 m X 0.60 m, geotextil y tubo pvc 4”

CANTIDADES DE OBRA TRAMO 3				
ITEM	DIMENSIONES			CANTIDAD
	ESPESOR (m)	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	
INSTALACION Y COMPACTACION SUB-BASE GRANULADA	0.15	4.10	34	20.91 m3

Topógrafos Profesionales

6. Conclusión

De esta manera se concluye la visita a la obra, en donde se da a conocer las diferentes variables en relación al proyecto y al avance de la obra.



TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420

TOPO CAD
Topógrafos Profesionales

INFORME TOPOGRAFÍA INTERVENTORIA
VISITA DE OBRA

TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S

INFORME TECNICO Y DESCRIPTIVO
ESTADO DE OBRA PLACA HUELLAS
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEL MUNICIPIO DE VELEZ SANTANDER
VEREDA GAITAL

TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420
Email: Topocadprofesionales@hotmail.com

VELEZ-SANTANDER
DICIEMBRE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción 3
2. Objetivo 3
3. Localización 4
4. Descripción 6
5. Desarrollo del proceso 7
6. Conclusión 14

Topógrafos Profesionales

1. Introducción

A continuación, daremos a conocer datos relevantes a través de la información relacionada en cuanto a los parámetros topográficos del proyecto denominado **Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total**, localizado en la vereda el Gaital jurisdicción del municipio de Vélez Santander.
Interventoría a cargo de la empresa contratista **Terra Ingenieros Civiles S.A.S**

2. Objetivo

El objeto de la empresa Interventora a través del personal profesional en Topografía determina el seguimiento técnico a los estudios Topográficos realizados en campo y oficina por la firma contratista, en relación a:

1. Levantamiento Topográfico
2. Localización
3. Abscisado del alcance del proyecto
4. Verificación de niveles y pendientes
5. Cuantificación del avance de obra
6. Proporcionar asesoría técnica

Topógrafos Profesionales

3. Localización


El proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total vereda el Gaital, se encuentra localizado al sur del departamento de Santander en jurisdicción del municipio de Vélez, con coordenadas de Origen Nacional N 2228707.662 m – E 4922424.890 m.

MAPA DE UBICACIÓN GENERAL



Topógrafos Profesionales

IMAGENES SATELITALES DE LOCALIZACION

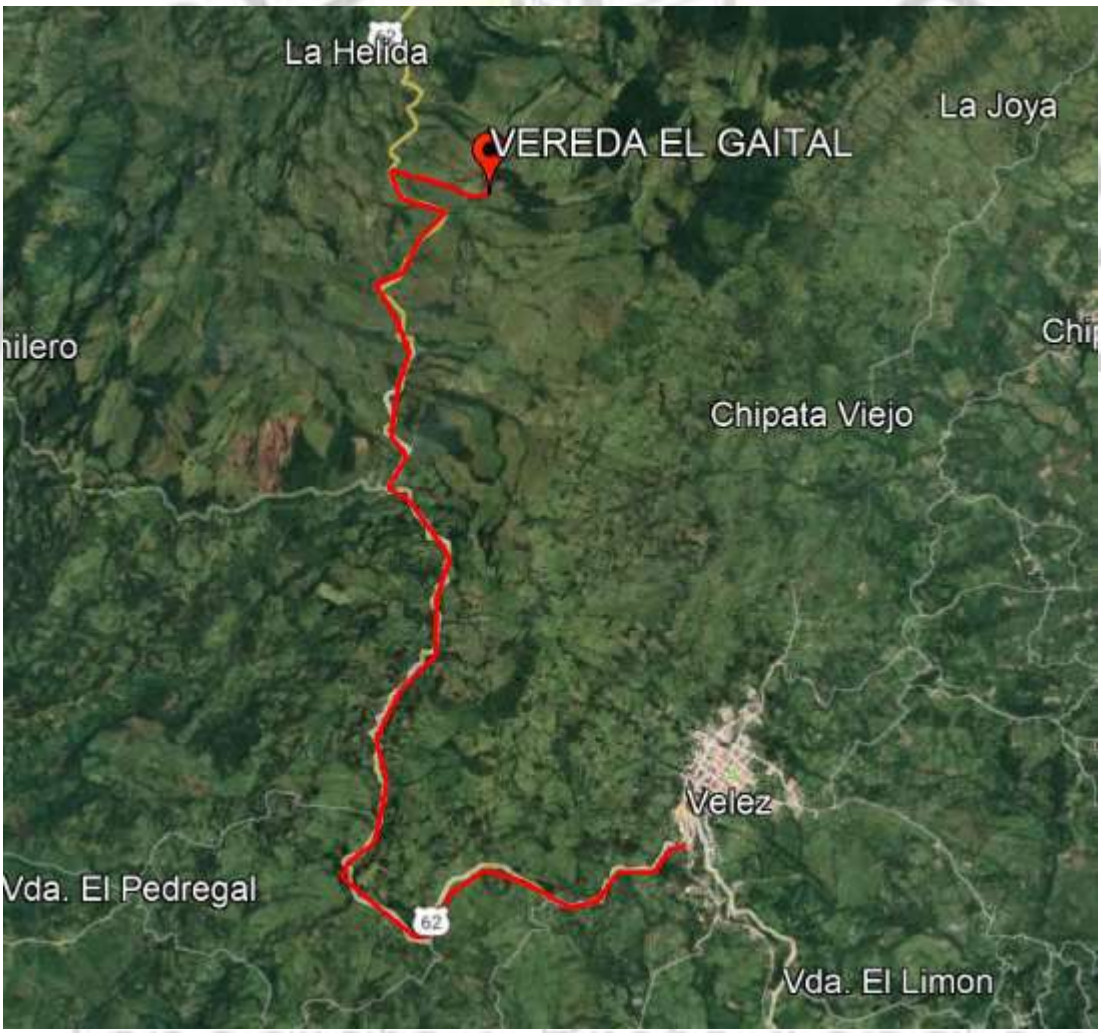


topografos forestales

4. Descripción

Proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total, con un alcance en longitud de 130 m y un ancho de calzada de 5 m, con especificaciones técnicas según diseño.


CORTE TRANSVERSAL DETALLE PLACA HUELLA
ESCALA 1:30

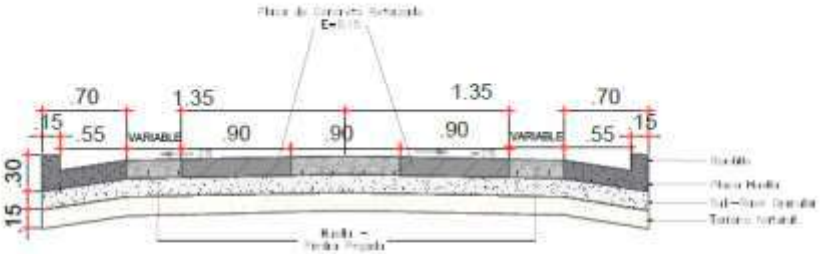

CORTE TRANSVERSAL DETALLE DE REFUERZO
ESCALA 1:25



CORTE LONGITUDINAL PLACA HUELLA
ESCALA 1:25



5. Desarrollo del proceso

Siendo las 9:30 a.m. del 10-12-2024, hizo arribo al sector la comisión topográfica por parte de la empresa Interventora **Terra Ingenieros Civiles S.A.S,** comisión compuesta por la Topógrafa y cadenero primero.

Luego del reconocimiento y localización geográfica del proyecto con coordenadas de Origen Nacional N 2228707.662 m – E 4922424.890 m, se pudo determinar los siguientes aspectos técnicos:

- La longitud determinada de acuerdo a un abscisado existente denota una longitud de 130 m aprox y un ancho promedio de 4.60 m.

- Al momento de esta visita no se evidenció ningún cambio sustancial en materia de avance de obra, sin embargo, esta comisión topográfica pudo participar de una mesa técnica con presencia del personal profesional por parte del contratista (Ingeniera residente y Topógrafo), personal profesional por parte de la interventoría (Ingenieros residentes, Ingeniera ambiental y comisión topográfica) además de la participación ciudadana por parte de la JAC. En esta mesa técnica se concertaron temas relevantes de topografía en materia de diseños geométricos, levantamientos topográficos y replanteos en campo.



- Avance de obra:
  Al momento de esta visita no se evidenció avances significativos en materia constructiva respecto de la visita anterior.

  Obras pendientes por iniciar:
  - Replanteo y mejoramiento vial
  - Instalación de sub-base granular

- Personal en la obra:
  Se evidencio al momento y hora personal en la obra de tipo profesional y auxiliares de construcción.

- Se evidenció acopio de material en obra.

- No se evidenció en el terreno mojones o deltas de topografía.

- No se evidenció maquinaria amarilla en la obra.




DISEÑANDO Y SUPERVISANDO INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE 1972
TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda Gaital
10.12.2024 11:04
6.06941, -73.70095
Vélez


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda Gaital
10 12 2024 11:05
6.0694, -73.70124
Vélez


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda Gaital
10.12.2024 11:02
6.06956 -73.7005
Vélez

❖ Recomendaciones:

Establecer por parte del contratista los puntos de referencia Topográficos (Deltas) y un abscisado técnico de principio a fin señalizado en estacas cuadradas previamente marcadas con intervalos de 10 m entre sí.

TOPO CAD
Topógrafos Profesionales

6. Conclusión

De esta manera se concluye la visita a la obra, en donde se da a conocer las diferentes variables en relación al proyecto y al avance de la obra en materia de ejecución, alistamiento de materiales, y personal en obra; de igual manera se ofician recomendaciones técnicas necesarias para el desarrollo del proyecto.



TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420

Topógrafos Profesionales

INFORME TOPOGRAFÍA INTERVENTORIA
VISITA DE OBRA

TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S

INFORME TECNICO Y DESCRIPTIVO
ESTADO DE OBRA PLACA HUELLAS
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEL MUNICIPIO DE VELEZ SANTANDER
VEREDA TEBAIDA

TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420
Email: Topocadprofesionales@hotmail.com

VELEZ-SANTANDER
DICIEMBRE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción 3
2. Objetivo 3
3. Localización 4
4. Descripción 6
5. Desarrollo del proceso 7
6. Conclusión 19

Topógrafos Profesionales

1. Introducción

A continuación, daremos a conocer datos relevantes a través de la información relacionada en cuanto a los parámetros topográficos del proyecto denominado **Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total**, localizado en la vereda Tebaida jurisdicción del municipio de Vélez Santander.
Interventoría a cargo de la empresa contratista **Terra Ingenieros Civiles S.A.S**

2. Objetivo

El objeto de la empresa Interventora a través del personal profesional en Topografía determina el seguimiento técnico a los estudios Topográficos realizados en campo y oficina por la firma contratista, en relación a:

1. Levantamiento Topográfico
2. Localización
3. Abscisado del alcance del proyecto
4. Verificación de niveles y pendientes
5. Cuantificación del avance de obra
6. Proporcionar asesoría técnica

Topógrafos Profesionales

3. Localización

El proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total vereda Tebaida, se encuentra localizado al sur del departamento de Santander en jurisdicción del municipio de Vélez, con coordenadas de Origen Nacional N 2228512.849 m – E 4919878.010 m.

MAPA DE UBICACIÓN GENERAL




IMAGENES SATELITALES DE LOCALIZACION



Topógrafos Profesionales

4. Descripción

Proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total, con un alcance en longitud de 120 m y un ancho de calzada de 5 m, con especificaciones técnicas según diseño, el proyecto contempla la construcción de una alcantarilla

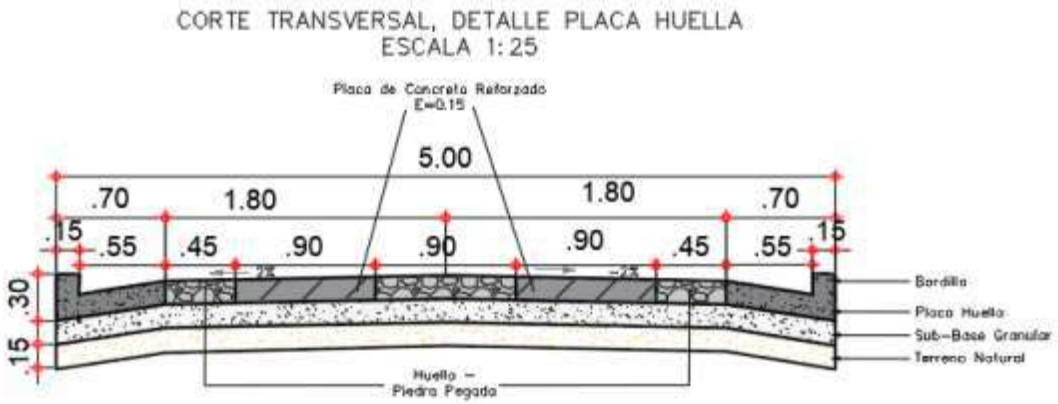

Topógrafos Profesionales

5. Desarrollo del proceso

Siendo las 11:30 a.m. del 10-12-2024, hizo arribo al sector la comisión topográfica por parte de la empresa Interventora **Terra Ingenieros Civiles S.A.S,** comisión compuesta por la Topógrafa y cadenero primero.

Luego del reconocimiento y localización geográfica del proyecto con coordenadas de Origen Nacional N 2228512.849 m – E 4919878.010 m, se pudo determinar los siguientes aspectos técnicos:

- La longitud determinada para el alcance de este proyecto inicialmente fue calculada en 130 m y un ancho promedio de 4.5 m, sin embargo, durante el proceso de ejecución se determinó reducir su alcance a 120 m en longitud en un ancho promedio de 4.10 m.

Topógrafos Profesionales



- En materia de topografía al momento de esta visita se pudo verificar y constatar avances significativos por parte del contratista en las siguientes actividades:

1. modificación y ajustes a la geometría del trazo (eje, cotas de nivel).

2. Señalización de abscisas con intervalos de 10 m entre sí, materializadas con estacas de madera con su respectivo (k+) a lo largo del proyecto.

3. Localización y Replanteo a través de estacas del eje y los costados viales con intervalos de 5 mts entre sí, en longitud del proyecto.

4. Nivelación de estacas del eje y los costados viales, demarcando el nivel de rasante de la sub-base en intervalos de 5 mts entre sí con señalización en banderolas a lo largo del proyecto.

De esta manera se pudo determinar que las actividades relacionadas anteriormente fueron realizadas acatando las recomendaciones solicitadas por esta interventoría.




0+080
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda Tesalia
10.12.2024 1:40
6.06731 -74.7...08
Via Sin Nombre


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda Tebarda
10.12.2024 11:31
5.067.66 -73.77.358
Valle

❖ Avance de obra.

Al momento de la visita se cuantificó el avance de obra en las siguientes actividades:

1. Instalación y compactación de estructura sub base granular con un espesor de 15 cm, ancho de 4.10 m en longitud de 120 m.

2. Figurado e instalación de acero según diseño, cinta huellas, cunetas y bordillos en longitud de 28 m.

3. Construcción de cinta huellas con un espesor de 15 cm y 90 cm de ancho, en longitud de 8 m en ambos costados de la vía.

El personal presente en esta vista por parte del contratista consta de:

- Ingeniero Residente
- Maestro de obra
- Oficial
- Ayudantes

Topógrafos Profesionales


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda Tebaida
10.12.2024 11:40
6.06755, -73.72409
Via Sin Nombre


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S


DISEÑANDO Y SUPERVISANDO INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE 1973
TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda Tebaida
10.12.2024 11:50
6.06752, -73.72484
Vía Sin Nombre


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda Tablida
10.12.2024 11:48
6.06756, -73.72472
Via Sin Nombre


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda Tebaida
10.12.2024 11:46
6.06756, -73.7245
Vía Sin Nombre


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda Tebaida
10-12-2024 11:16
6.08762, -73.72436
Vía Sin Nombre

6. Conclusión

De esta manera se concluye la visita a la obra, en donde se da a conocer las diferentes variables en relación al proyecto y al avance de la obra en materia de ejecución, acopio de materiales y personal en obra.



TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420

Topógrafos Profesionales

INFORME TOPOGRAFÍA INTERVENTORIA
VISITA DE OBRA

TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S

INFORME TECNICO Y DESCRIPTIVO
ESTADO DE OBRA PLACA HUELLAS
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL

DEL MUNICIPIO DE VELEZ SANTANDER
VEREDA LA PALMERA

TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420
Email: Topocadprofesionales@hotmail.com

VELEZ-SANTANDER
DICIEMBRE

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción 3
2. Objetivo 3
3. Localización 4
4. Descripción 6
5. Desarrollo del proceso 7
6. Conclusión 20

Topógrafos Profesionales

1. Introducción

A continuación, daremos a conocer datos relevantes a través de la información relacionada en cuanto a los parámetros topográficos del proyecto denominado **Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total**, localizado en la vereda La Palmera jurisdicción del municipio de Vélez Santander.
Interventoría a cargo de la empresa contratista **Terra Ingenieros Civiles S.A.S**

2. Objetivo

El objeto de la empresa Interventora a través del personal profesional en Topografía determina el seguimiento técnico a los estudios Topográficos realizados en campo y oficina por la firma contratista, en relación a:

1. Levantamiento Topográfico
2. Localización
3. Abscisado del alcance del proyecto
4. Verificación de niveles y pendientes
5. Cuantificación del avance de obra
6. Proporcionar asesoría técnica

Topógrafos Profesionales

3. Localización

El proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total vereda La Palmera, se encuentra localizado al sur del departamento de Santander en jurisdicción del municipio de Vélez, con coordenadas de Origen Nacional N 2222904.8113 m – E 4927153.0907 m.

MAPA DE UBICACIÓN GENERAL



Topógrafos Profesionales


IMAGENES SATELITALES DE LOCALIZACION




Topógrafos Profesionales

4. Descripción

Proyecto denominado Construcción placa huellas programa caminos comunitarios de la paz total, con un alcance final en longitud de 120 m y un ancho de calzada de 5 m, con especificaciones técnicas según diseño, el proyecto contempla la construcción de una alcantarilla

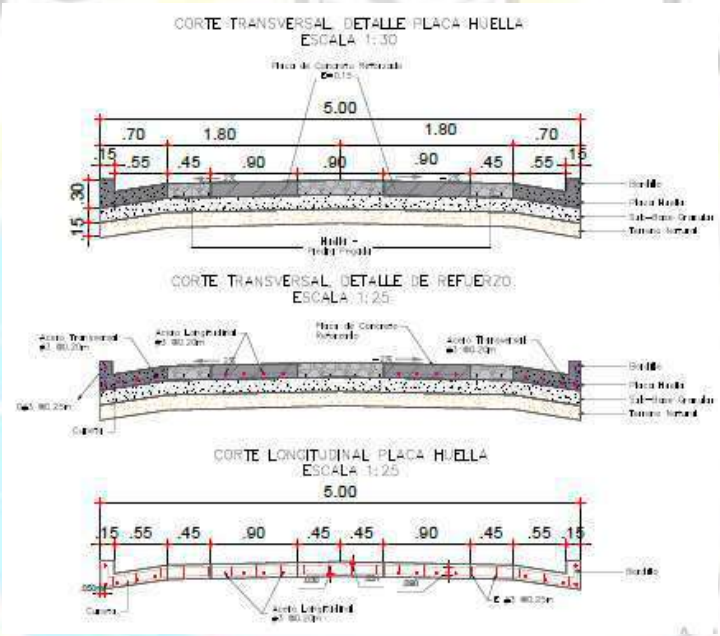

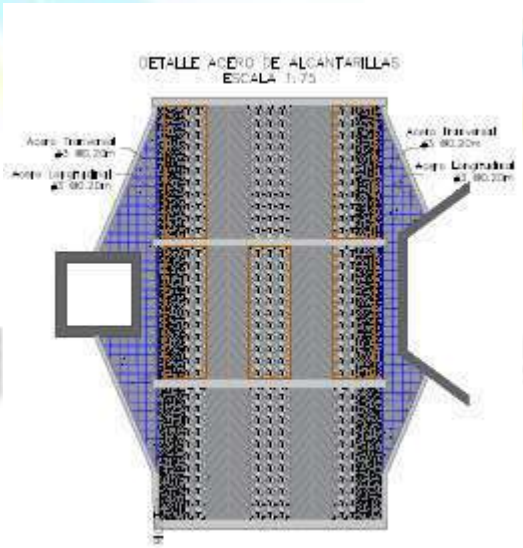

5. Desarrollo del proceso

Siendo las 3:50 p.m. del 28-10-2024, hizo arribo al sector la comisión topográfica por parte de la empresa Interventora **Terra Ingenieros Civiles S.A.S,** comisión compuesta por la Topógrafa y cadenero primero.

Luego del reconocimiento y localización geográfica del proyecto con coordenadas de Origen Nacional N 2222904.8113 m – E 4927153.0907 m, se pudo determinar los siguientes aspectos técnicos:

- La longitud determinada para el alcance de este proyecto fue calculada en 120 m aprox y un ancho promedio de 5 m.

- En materia de obra al momento de esta visita se pudo verificar y constatar avances significativos por parte del contratista en las siguientes actividades:

    - Instalación y compactación de estructura en sub-base granulada con un espesor de 0.15 m X 5 m de ancho en longitud de 120 m.

Topógrafos Profesionales



Topógrafos Profesionales

- Tramo placa huella construido en longitud de 50 m desde el K0 + 00 hasta K0 + 50, contempla cinta huellas, vigas riostras, piedra pegada, cunetas y bordillos según diseño establecido.

    - ✓ Cinta huellas: Espesor 0.15 m X ancho 0.90 m X 46.60 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

    - ✓ Vigas riostras: Espesor 0.25 m X ancho 0.20 m X 5 m de longitud c/u

    - ✓ Piedra pegada eje vial: Espesor 0.15 m X ancho 0.90 m X 46.60 m de longitud.

    - ✓ Piedra pegada Berma: Espesor 0.15 m X ancho 0.45 m X 46.60 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

    - ✓ Cunetas: Espesor 0.15 m X ancho 0.55 m X 46.60 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

    - ✓ Bordillo: Espesor 0.30 m X ancho 0.15 m X 50 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

Topógrafos Profesionales


DISEÑANDO Y SUPERVISANDO INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE 1972
TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda La Palmera
13.12.2024 14:34
6.01706, -73.65892
288V+R3, Velez


DISEÑANDO Y SUPERVISANDO INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE 1972
TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda La Palmera
13.12.2024 14:35
6.01711, -73.65913
288V+R3, Velez

- En construcción tramo de 26 m de cinta huella y cuneta desde el K0 + 50 hasta K0 + 76.

    - ✓ Cinta huellas: Espesor 0.15 m X ancho 0.90 m X 24.20 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.

    - ✓ Cunetas: Espesor 0.15 m X ancho 0.55 m X 24.20 m de longitud en costados derecho e izquierdo de calzada.



Topógrafos Profesionales


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda La Palmera
13.12.2024 14:35
6.0171, -73.65932
288V+R3, Velez


TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda La Palmera
13.12.2024 14:35
6.01709, -73.65903
288V+R3, Velez

CANTIDADES DE OBRA				
ITEM	DIMENSIONES			CANTIDAD
	ESPESOR (m)	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	
INSTALACION Y COMPACTACION SUB-BASE GRANULADA	0.15	5	120	90 m3
CINTA HUELLA COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.90	141.6	19.12 m3
VIGAS RIOSTRAS TRANSVERSALES	0.25	0.20	85	4.25 m3
PIEDRA PEGADA EJE VIAL	0.15	0.90	46.6	6.29 m3
PIEDRA PEGADA BERMA COSADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.45	93.2	6.29 m3
CUNETAS COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.15	0.55	141.6	11.68 m3
BORDILLO COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO	0.30	0.15	100	4.5 m3

- En materia de topografía al momento de esta visita se pudo verificar y constatar avances significativos por parte del contratista en las siguientes actividades.

  - modificación y ajustes a la geometría del trazo (eje, cotas de nivel).
  - Señalización de abscisas con intervalos de 10 m entre sí, materializadas con estacas de madera con su respectivo (k+) a lo largo del proyecto.
  - Localización y Replanteo a través de estacas del eje y los costados viales con intervalos de 5 mts entre sí, en longitud del proyecto.
  - Nivelación de estacas del eje y los costados viales, demarcando el nivel de rasante de la sub-base en intervalos de 5 mts entre sí con señalización en banderolas a lo largo del proyecto.



Topógrafos Profesionales



topografos forestonales


DISEÑANDO Y SUPERVISANDO INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE 1973
TERRA INGENIEROS
CIVILES S.A.S
FUERTE
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Vereda La Palmera
13.12.2024 14:40
6.01704, -73.65936
288V+R3, Velez


❖ El personal presente en esta vista por parte del contratista consta de:

- Ingeniero Residente
- Maestro de obra
- Oficial
- Ayudantes

TOPO CAD
Topógrafos Profesionales

6. Conclusión

De esta manera se concluye la visita a la obra, en donde se da a conocer las diferentes variables en relación al proyecto y al avance de la obra en materia de ejecución, alistamiento de materiales y personal en obra.



TOPOGRAFO
ADRIANA SOFIA ASMAR SANTAMARIA
Licencia profesional N° 01-14063 CPNT
CEL: 313 255 7420

Topógrafos Profesionales
