CDP. 740 - 2025

OBJETO: EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y URBANISMOS SAS.

INTERVENTORÍA: R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS.

PARQUE: MOLINOS.

DIRECTORA DE OBRA: ANA MARÍA URIBE

RESIDENTE DE OBRA: JAVIER CHARRY CORREA.

DIRECTORA DE INTERVENTORÍA: ING. MARGARITA GÓMEZ.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA: ING. BRENDA QUEVEDO.

Powered by CamScanner

MARZO 7 de 2025

PERSONAL: 2 AY.

CLIMA: NUBLADO.

ACTIVIDADES: "INSTALACIÓN CERRAMIENTO PROVISIONAL.

- REPLANTEO CON EQUIPO.

ING.

MARZO 21/2025.

PERSONAL: 1 OPERARIO.

CLIMA: NUBLADO, LLUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: LIMPIEZA EXCAVACIONES AL FRENTE DE VIAS.

ING.

MARZO 22/2025


PERSONAL: 1 MAESTRO + 1 AY.

CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE

ACTIVIDADES: REPLANTEO AREA INICIO DE EXCAVACIONES.

SE TOMAN MEDIDAS EN CAMPO PARA SEÑALIZACIÓN

POR LA COMUNIDAD PARA EVACUAR SU EJECUCIÓN.



ING.


Powered by CamScanner

MARTES 25/03/2025 (25/03/2025)

PERSONAL: 1 MAESTRO + 2 AYUNTES. + 1 OPERARIOS.

CLIMA: FUERTE LLUVIA EN LA TARDE

ACTIVIDAD: INICIO DE EXCAVACIÓN MECÁNICA (RETROEXCAVADORA) EN EL COSTADO ORIENTAL (PLAZOLETA). TENIENDO EN CUENTA QUE HAY UN SEMÁFORO CON LA CAJA DE SOM AL LADO, SE EXCAVA A LOS COSTADOS DEJANDO EL ÚLTIMO TRAMO AL NORORIENTE DE ESTOS ELEMENTOS PARA HACER EL MANTENIMIENTO DE FORMA MANUAL.

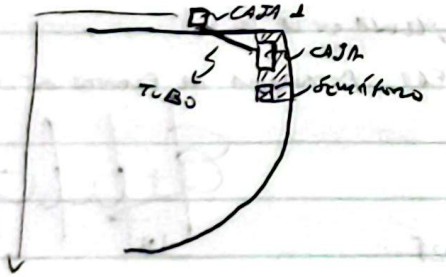

AL INSPECCIONAR LA CAJA 1 SE EVIDENCIA QUE TIENE CABLE DE RED SEMAFÓRICA. ESTÁ LA TAPA A 50cm DEL NIVEL DE ACABADO EN ESTE PUNTO. DURANTE LA EXCAVACIÓN APARECE UN TUBO DE CANALIZACIÓN ENTRE CAJAS DE LA SOM. SE EXCAVA Y DEJA PARA CUIDADO.

MIÉRCOLES 26/03/2025. (26/03/2025)

PERSONAL: 1 MAESTRO, 1 OF, 1 AY, 1 OPERARIO.

CLIMA: FUERTE LLUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: CONTINUACIÓN DE EXCAVACIÓN MECÁNICA DEL BORDILLO EN SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE. SE EXCAVA PARA LA ESTRUCTURA DE 25cm-SBC, 20cm-BC Y 10cm DE ACABADO.

EN LA PLAZOLETA, DADAS LAS CONDICIONES DE LA TOPOGRAFÍA, ES NECESARIO EXCAVAR EN ZONAS A 20cm DEL NIVEL DEL TERRENO, POR DEBAJO. ES DECIR, SE REQUERIRÁ REPERFILAR EL TERRENO, ESPECIALMENTE EN DONDE ESTÁ LA CAJA DE INSPECCIÓN (SOM).

PERFIL.



SR.

OCC. OR.

JUEVES 27/03/2025

PERSONAL: 1 MAESTRO, 1 OF, 2 AY, 3 OPERARIOS

EQUIPO: 1 EXCAVADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 RETROEXCAVADORA

Powered by CamScanner

CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: - LAS LLUVIAS DEL DÍA ANTERIOR AFECTAN EL TERRENO. SE DEBE DEJAR ORDEN EL TERRENO PARA PASAR EL COMPACTADOR Y PROCEDER CON LA INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y SUBBASE.

SE CONTINÚA CON EXCAVACIONES. A 10m DEL INICIO, HAY UN PUNTO ALTO EN EL TERRENO, POR LO QUE LAS PROFUNDIDADES DE EXCAVACIÓN ALCANZAN LOS 75cm, SOLO EN UNA LONGITUD DE 10m. SE RETIRARÉ BOZOTIL Y UNA CAPA DE SUBB.

- LLUEVE NUEVAMENTE EN LA TARDE OBLIGANDO A PARAR ACTIVIDADES. SE LOGRÓ PROTEGER LA SUBRASANTE.

VIERNES 28/03/2025

PERSONAL: 1 MAESTRO, 3 AYUDANTES, 1 OF, 2 AY.

CLIMA: SECO EN LA MAÑANA, LLUVIA EN LA TARDE.

EQUIPO: 1 EXCAVADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 MINICARGADOR.


ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA CON EXCAVACIONES MECÁNICAS.

- EN COMITÉ DE OBRA SE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DOS SENTIDOS EN CARRILES ORIENTE Y OCCIDENTE DEL PARQUE.


SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE CORREGIR VARIOS NIVELES DE ACABADO PARA EVITAR LLEVAR BAJO UN NIVEL DEL TERRENO. POSTERIOR AL COMITÉ, EN CONJUNTO, SE MODIFICAN NIVELES EL LOS EXTREMOS ORIENTE Y OCCIDENTE. SE CAMBIAN PENDIENTES Y SE DEFINEN POSICIONES O UBICACIONES DE LAS RAMPAS POR CAJAS Y CÁMARAS EXISTENTES QUE CONDICIONAN ESTO:

-PLAZOLETA ORIENTAL:

P

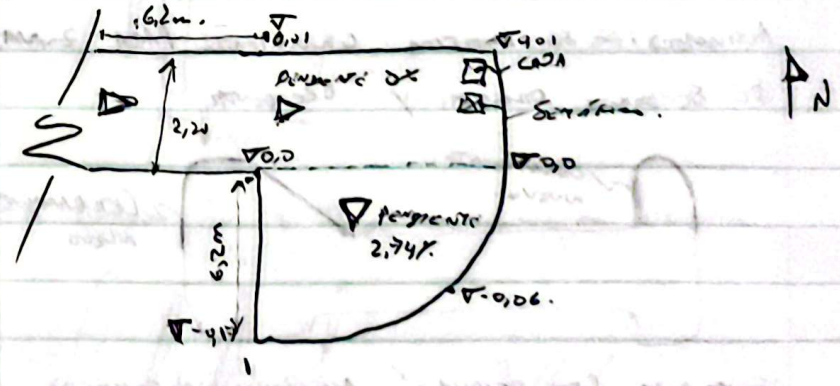


-TRAMO SENDERO



Norma
Norma
CamScanner
Powered by

- PLAZOLETA OCCIDENTAL.




SÁBADO 29/03/2025

PERSONAL: 1 MAESTRO, 1 OF, 2 AY, 2 OPERARIOS.

CLIMA: NUBLADO.

EQUIPO: 1 EXCAVADORA + 1 MINICARGADOR.

ACTIVIDADES: - SE MODIFICA CERRAMIENTO PARA ZONAS DE SENDEROS ORIENTAL Y OCCIDENTE.



- SE REALIZA CON EXCAVACIÓN MECÁNICA EN SENDERO HACIA EL OCCIDENTE.

LUNES. 31/03/2025

PERSONAL: 1 MAESTRO + 1 OF + 2 AY + 3 OPERARIOS.


CLIMA: LLUVIA DESDE LAS 7AM HASTA LAS 11AM Y DESDE LAS 2:30PM.

EQUIPO: 1 EXCAVADORA + 1 MINICARGADOR + 1 VIBROCOMPACTADOR.

ACTIVIDADES: - LAS LLUVIAS DEL FIN DE SEMANA AFECTARON LA SUBRASANTE Y PARTE DE LA SUBBASE YA EXTENDIDA.

- LA LLUVIA ES PERMANENTE Y NO PERMITE AVANCES EN LA MAÑANA (TODO EL DÍA).

- SE EXCAVA EL SENDERO OCCIDENTAL HASTA LAS 11AM.

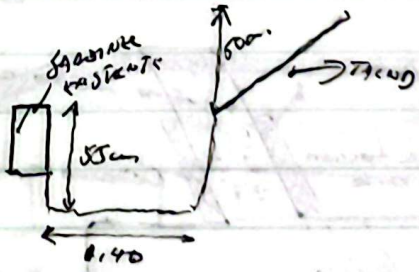

ES NECESARIO PERFILAR EL TALUD.

- SE EXCAVA EN EL TALUD EL SENDERO ORIENTAL.

Powered by CamScanner


Martes 1 de abril del 2025

Personal en obra: 1 maestro-layudante - 2 operarios maquinaria


Maquinaria: 1 minicargador - 1 compactador.

ACTIVIDADES: Se instala geotextil en sendero occidental, por otra parte, se inicia relleno de sendero con subbase granular


- Se realiza descapote en (Perfilacion talud senderos) en senderos oriental y occidental
- Se continua instalando sub base en sendero principal y compactadada de lo mismo

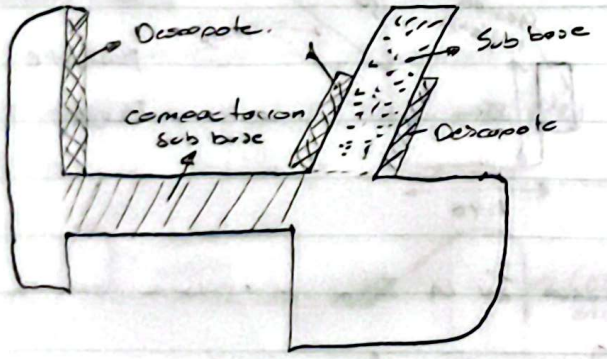

Descapote sendero occidental



Descapote sendero oriental




Sub base sendero principal



Sub base sendero oriental



En horas de la tarde se realiza recorrido de obra en presencia de interventoria y contratista, donde se revisan niveles del bordillo existente ubicado en el sendero occidental donde se puede evidenciar el bordillo en mal estado y desalineado. Se define retirar bordillo existente e instalar nuevo, con el fin de mejorar el acabado del sendero



Nelson Andres Ibañez

Miercoles 2 de abril del 2025


Personal en obra: 1 maestro-layudante - 2 operarios maquinaria

Maquinaria: 1 minicargador - 1 compactador.


ACTIVIDADES: Se finaliza la instalacion de sub base en los senderos del costado oriental y occidental Se continua con la instalacion de sub base en

Powered by CamScanner

Sendero principal, la última capa para realizar densidades
En hora de la tarde se realiza prueba de ensayo
en capa de subbase (Densidades).

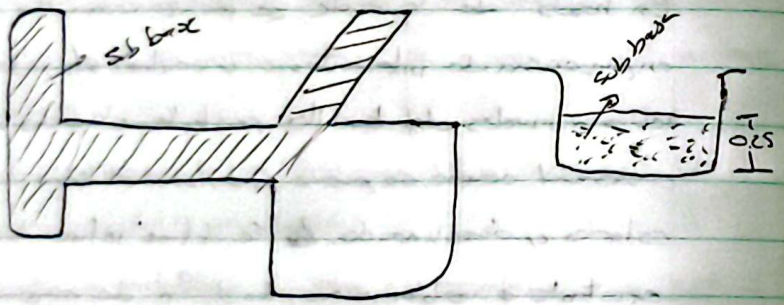

Densidades en subbase (4 puntos)

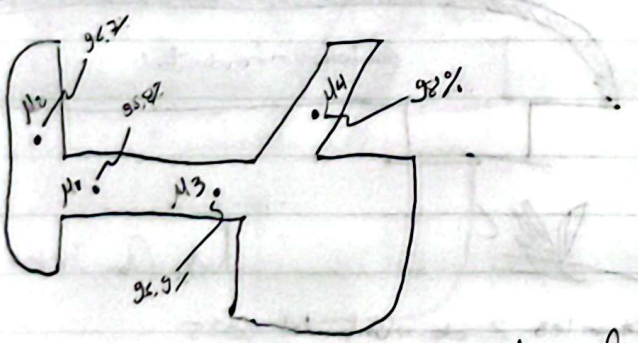



Jueves 3 de abril del 2025


Personal en obra: 1 maestro - 1 ayudante - 2 operarios maquinaria


Maquinaria: 1 minicargador 1 compactador

ACTIVIDADES: Se inicia la instalación de base granular en senderos orientales y occidental y principal. Se revisa sendero principal, el cual presenta fallos, el cual se le subsana con rajón reciclado (RCD)









Viernes 04 de Abril de 2025

Personal en obra: 1 maestro 1 ayudante. 2 operarios

Maquinaria: 1 minicargador - 1 compactador

ACTIVIDADES


Se realiza recorrido ambiental entre contratista e interventoría en donde se evidencian 3 árboles secos que deben ser reportados y protegidos.

Se instala punto ecológico, charla ambiental e inspección de protección en sumideros.

Sánchez


Se instala capa de base en sendero principal
En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes
Hora inicio: 2:30 Pm Hora fin 4:30 Pm






Nicolas Gn- Intern

Sabado 5 de abril del 2025
Personal obra: 1 maestro, 1 ayudante, 2 operarios mayores
Maquinaria: 1 minicargador - 1 compactador.
ACTIVIDADES: Se continua instalando Base granular en sendero principal.







Nicolas Gn- Intern

Lunes 7 de abril del 2025
Personal obra- 1 maestro, 1 ayudante- 2 operarios mayores


Maquinaria: 1 minicargador - 1 compactador
ACTIVIDADES = Se continua instalando capa de base granular en sendero principal.






Nicolas Gn- Intern

Martes 8 de abril del 2025
Personal en obra: 1 maestro, 1 ayudante - 2 operarios mayores
Maquinaria: 1 minicargador - 1 compactador.
ACTIVIDADES: Se inicio la instalacion de base granular en plataforma de acceso, ubicada al costado oriente





En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 12:30 Pm hora fin: 4:00 Pm

Nicolas Gn - Intern


Miercoles 9 de abril del 2025

Personal en obra: 1 maestro 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se inician excavaciones para bordillos en sendero principal.

En horas de la tarde se presentaron lluvias fuertes

Hora inicio 2:00 Pm hora fin 3:30 Pm.



Excavacion bordillo





Nicolas Ch - Interv

Jueves 10 de abril del 2025

Personal en obra: 1 maestro. 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continuan excavaciones para bordillos en sendero principal







Nicolas Ch - Interv

Viernes 11 de abril del 2025

Personal en obra. 1 maestro: 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continuan excavaciones para bordillos en senderos principal






Nicolas Ch - Interv

Sabado 12 de abril del 2025

Personal en obra: 1 maestro 1 ayudante

ACTIVIDADES- Se inicia instalacion de bordillo en sendero principal.





Nicolas Ch - Interv


~~Sabado~~ Lunes 14 de abril del 2025

Personal en obra: 1 maestro 1 ayudante

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES - Se continua instalando bordillo en sendero principal






Nelson Ch. Int


Martes 15 de abril del 2025

Personal obra - 1 maestro 1 ayudante

ACTIVIDADES - Se continuan con los excavaciones para bordillo en sendero principal.



Excavacion





Nelson Ch- Int

Miercoles 16 de abril del 2025

Personal obra - 1 maestro 1 ayudante

ACTIVIDADES - Se continua instalando bordillo en sendero principal






Nelson Ch - Int


Lunes 21 de abril del 2025

Personal obra - 1 maestro - 1 ayudantes

ACTIVIDADES - Se inician excavaciones para bordillo en sendero peatonal del costado ~~norte~~ oriente.




Excavacion bordillo




Martes 22 de abril del 2025

Personal obra - 1 maestro 1 ayudante

ACTIVIDADES - Se inicia instalacion de bordillo en sendero peatonal del costado oriente





Nelson Ch - Int.


Powered by CamScanner

Miercoles 23 de abril del 2025


Personal obra - 1 maestro - 1 oficial - 4 ayudantes

ACTIVIDADES - Se continua instalacion de bordillo en sendero oriental

- Se inicia la demolicion de bordillo existente en el sendero del costado occidental



• Instalacion bordillo



• Demolicion bordillo existente




Nicolas Ch - Int

Jueves 24 de abril del 2025


Personal obra: 1 maestro - 1 oficial - 4 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continuo con la demolicion de bordillo existente en el sendero occidental


- Se continua instalando bordillo en sendero oriental



• Demolicion bordillo



• Instalacion bordillo




Nicolas Ch - Int

Viernes 25 de abril del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 maestro - 4 ayudantes


ACTIVIDADES: se continuo instalando bordillo en sendero oriental

+ Se inicia excavacion para soldines en sendero occidente




Nicolas Ch - Int.

• Excavacion bordillo



• Instalacion bordillo




Sabado 26 de abril del 2025 Nicolas Ch- Int

Personal obra = 1oficial- 1maestro- 4oyudantes

ACTIVIDADES= Se continua con la excavacion para bordillo en sendero occidental


-se continua instalando bordillo en sendero oriental



• Excavacion bordillo



• Instalacion bordillo




• Nicolas Ch. Int

lunes 28 de abril del 2025


Personal obra: 1oficial- 1maestro- 3oyudantes

ACTIVIDADES se inicia la instalacion de sardinel en sendero del costado occidente


se inicia instalacion de adoquin en costado oriental



• Instalacion sardinel



• Instalacion Adoquin




Nicolas Ch-Int

Martes 29 de abril del 2025


Personal obra: 1oficial- 1maestro - 4oyudantes


ACTIVIDADES: Se continua instalando adoquin en sendero del costado oriental

• Se inician excavaciones para bordillo en sendero occ



•Excavacion badillo • Instalacion Adoquin






Nelly Ch - Int

Miercoles 30 de abril del 2025


Personal obra: 1maestro - 1oficial - 4 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continue instalando adoquin en sendero del costado oriental


-Se inicio instalacion de badillo en sendero del costado occidental



•Instalacion badillo



•Instalacion Adoquin




Nelly Ch - Int

Viernes 2 de mayo del 2025


Personal obra = 1oficial - 1maestro - 3 ayudantes


ACTIVIDADES = se continue con la excavacion para badillo en sendero principal del parque

- Se inicio instalacion de adoquin en sendero principal



•Excavacion para badillo • Instalacion Adoquin





Nelly Ch - Int

Sabado 3 de mayo del 2025

Personal obra: 1maestro - 1oficial - 4ayudantes

ACTIVIDADES = Se continua con la instalacion de adoquin en sendero principal


- Se continua con la instalacion de badillo en sendero principal

Powered by CamScanner


En horas dela mañana se presentan lluvias


Hora inicio: 8:00 Am Hora fin: 10:00 Am

Hora inicio: 11:00 Am Hora fin 12:00 Pm.



- Instalacion bordillo
- Instalacion Adoquin





Tst. Nicolás Ch. Jr.

Lunes 5 de mayo del 2025

Personal obra: 1oficial - 1maestro - 4ayudantes


ACTIVIDADES: Se continua excavacion e instalacion de bordillo en sendero principal

- Se continua instalando adoquin en sendero principal


En horas de la mañana se presentan lluvias


Hora inicio: 8:30 Am Hora fin: 11:30 Am


Hora inicio: 2:00 Pm Hora fin 4:00 Pm



- Instalacion bordillo
- Exquasion bordillo
- Instalacion Adoquin







Tst. Nicolás Ch. Jr.

Martes 6 de mayo del 2025

Personal obra: 1oficial - 1marshro - 2ayudantes


ACTIVIDADES: Se continua instalando adoquin en sendero principal del parque

- Se funden cintas en concreto en sendero principal y sendero oriental, para confinamiento del adoquin instalado


Powered by CamScanner


En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio: 12:30 Pm Hora fin: 2:00 Pm




• Instalacion Adoquin





• Cintas confinamientos



Nota Ch - Jmt.


Mayo 7/05/2025


Personal: 2 of +3 AY

Equipo: 1 Planta eléctrica, 1 pala, 1 pulidora.

Clima: lluvia hasta las 2pm; llovizna permanente.

Actividades: se realizan rampas de acceso en la vereda oriental y occidental

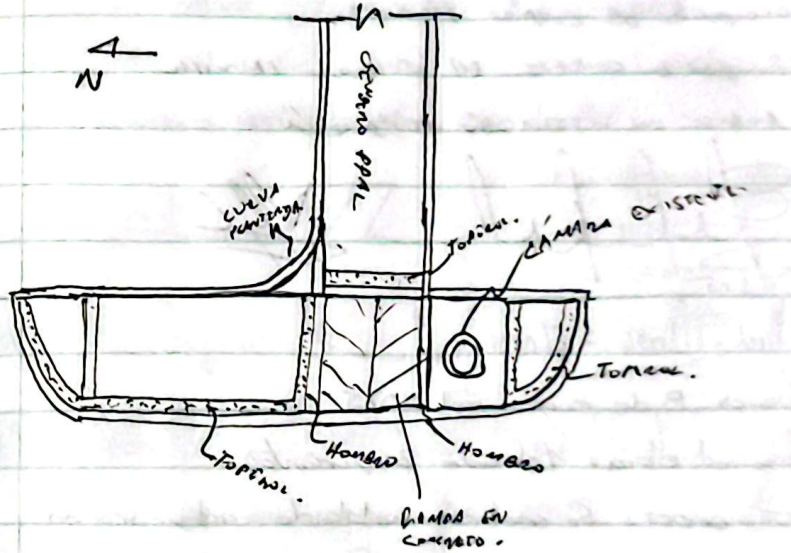

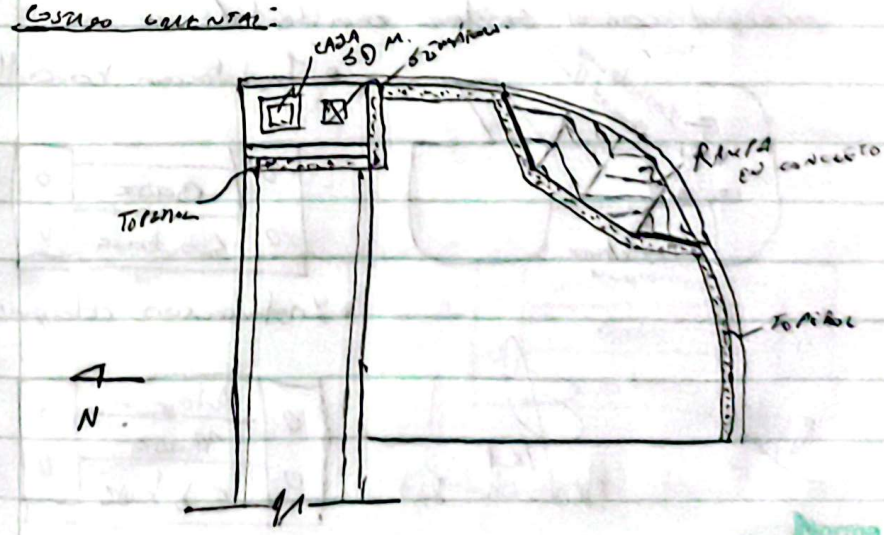

- AVANCE EN INSTALACIÓN DE BANQUETAS A-30 EN COSTADO OCCIDENTAL DEL SENDERO PRINCIPAL.
- FINALIZADO DE CONCRETAS EN SENDERO PRINCIPAL.
- AVANCE EN INSTALACIÓN DE TOPOCHÚN


Nadia Chairez - Inter.

Jueves 8 de mayo del 2025


Personal obra: 1oficial- 2ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua instalando adoquin en sendero principal costado occidental


- Se instalan bordillos que conecta el sendero principal con el sendero accidental



• Instalacion bordillo



• Instalacion adoquin




INT. - Nadia Ch. - Int.


Viernes 9 de mayo del 2025

Personal obra 2oficiales - 3 ayudantes

ACTIVIDADES. Se instala adoquin y locetas topocal en sendero del costado occidental



• Instalacion Adoquin Loceta Topocal




INT. - Nadia Ch. - In.


Sabado 10 de mayo del 2025

Personal obra: 2oficiales 3 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua instalando adoquin y loceta topocal en sendero accidental



• Instalacion Adoquin Loceta Topocal



INT. - Nadia Ch. Int.


Powered by CamScanner

Lunes 12 de mayo del 2025


Personal obra: 2 oficiales - 3 ayudantes


ACTIVIDADES: Se instala bordillo en sendero principal para conectar con zona de semaforo

Se instalo sardinel en costado del costado oriente

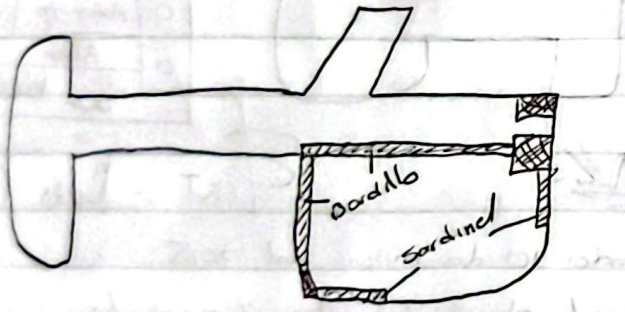

- Instalacion bordillo
- Instalacion Sardinel






En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes


Hora inicio 2:00 Pm Hora fin: 3:30 Pm

Martes 13 de mayo del 2025

Personal en obra: 1 oficial - 2 ayudantes

ACTIVIDADES: Se funde rampa en concreto en sendero peatonal del costado oriente






Miércoles 14/05/2025

Personal: 1 maestro, 1 of, 2 ay

Equipo: 1 Regla, 1 Palustre, 1 nivel


Clima: Lluvias en la mañana hasta las 10 am

Actividades: Se retiran cenefas en mal estado

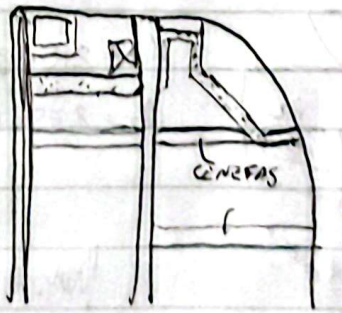

- Inicio de labores en actividad concreto y retiro de formaleta metálica.


Jueves 15 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial - 2 ayudantes
ACTIVIDADES: Se inicia instalacion de adoquin en plazoleta del costado oriental
En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 7:30 Am Hora fin 11:00 Am
Debido alas lluvias presentadas en horas dela mañana se vio afectada el area de trabajo, donde el adoquin que se instalo fue necesario desinstalarlo y retirar la arena por colmatacion de la misma
En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 2:00 Pm Hora fin 5:00 Pm

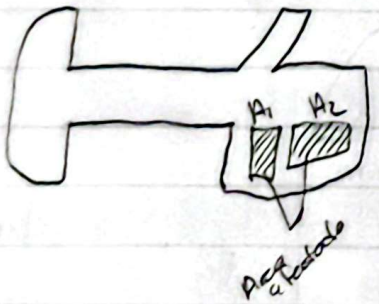


$A_1 = 2{,}15 \times 3{,}7$
$A_2 = 2{,}75 \times 4{,}97$

Ing. Civil

Viernes 16 de mayo del 2025
Personal obra: 2 oficiales - 2 ayudantes
ACTIVIDADES: Se funde anden en concreto ubicado al costado oriental "sendero"
- Se instalan locetas tapacol en rampa de acceso en plazoleta del costado oriental






En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio: 8:30 Am Hora fin 11:40 Am
Hora inicio 3:00 Pm Hora fin 4:00 Pm


Nicolas Ing. Civil

Sabado 17 de mayo del 2025
Personal obra: 2 oficiales 2 ayudantes
ACTIVIDADES: Se funden cintas en concreto para confinamiento de pasos de adoquin en sendero occidental

Powered by CamScanner


Se funden bordillos en sendero







En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 10:00 Am Hora fin 11:30 Am


Lunes 19 de mayo del 2025
Personal obra: 2 oficiales - 3 ayudantes
ACTIVIDADES: Se inicia fundida de rampa en concreto ubicada al costado oriente "sendero"
En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio: 7:30 Am Hora fin: 9:30 Am
Hora inicio 10:00 Am Hora fin 12:00 Pm
Hora inicio 2:00 Pm Hora fin - 4:30 Pm






Martes 20 de mayo del 2025
Personal obra. 2 oficiales - 3 ayudantes
ACTIVIDADES: Se instala adoquin en sendero peatonal del costado occidente
- Se funde cinta en concreto en caja de inspección ubicada al costado oriental
En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 9:30 Am Hora fin 11:00 Am
Hora inicio 1:00 Pm Hora fin 3:30 Pm





Miercoles 21 de mayo del 2025
Personal obra: 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se conforma taricos manualmente en perimetro de plazoleta del costado oriente
En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 7:00 Am Hora fin 11:00 Am
Hora inicio 2:30 Pm Hora fin 4:00 Pm

Powered by CamScanner



conformacion de terreno


Nicolas Ch - Int


Jueves 22 de mayo del 2025

Personal obra: 2 ayudantes - 1 ahad

ACTIVIDADES: Se continua conformando el terreno manualmente en sendero principal

- Se instala punto codigueo (Caneca para la basura)





conformacion terreno

En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 8:30 Am Hora fin 12:00 Pm


Hora inicio 2:00 Pm Hora fin 5:00 Pm

Nicolas Ch - Int

Viernes 23 de mayo del 2025

Personal obra: 2 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua replanteo manual de terreno en sendero principal.



En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes


Hora inicio: 7:00 Am Hora fin: 11:00 Am

Nicolas Ch - Int

Sabado 24 de mayo del 2025

Personal obra: 2 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua conformando terreno manualmente en sendero del costado occidente




En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 10:00 Am Hora fin 12:00 Pm

Nicolas Ch - Int

Powered by CamScanner


Lunes 26 de mayo del 2025
Personal obra: 2 ayudantes
ACTIVIDADES: Se inicia instalacion de cesped en perimetro de sendero principal




En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 7:00 Am Hora fin 10:00 Am
Hora inicio 2:00 Pm Hora fin 3:00 Pm

Nicolas Gr - Jnt

Martes 27 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial - 1 ayudantes
ACTIVIDADES: Se continua instalando cesped en perimetro del sendero oriental






En horas dela tarde se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 2:30 Pm Hora fin 4:00 Pm

Nicolas Gr - Jnt

Miercoles 28 de mayo del 2025
Personal obra = 1 oficial - 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se continua instalando cesped en perimetro de senderos y plazoleta del costado oriental






En horas dela tarde se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 1:00 Pm Hora fin 3:30 Pm


Nicolas Gr - Jnt

Jueves 29 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante - 2 instaladores mobiliario
ACTIVIDADES: Se continua instalando cesped en senderos peatonales del costado occidental
Se instalan puntos ecologicos y señaletica

Powered by CamScanner

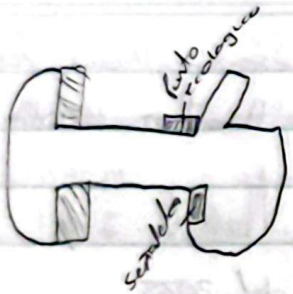


Instalacion cespead



instalacion punto ecologico

instalacion señaletica





En horas dela tarde se presentan lluvias fuertes


Hora inicio 3:00 Pm Hora fin 4:00 Pm

Nicolle Ch - Int. IM.

Viernes 30 de mayo del 2025

Personal obra : 2 instaladores mobiliario

ACTIVIDADES: Se instalan bolardos en ramoo de acceso ubicada en el costado oriental



En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 7:00 Am Hora fin 9:30 Am

Hora inicio 2:00 Pm Hora fin 3:30 Pm

Hora inicio 4:30 Pm Hora fin 5:00 Pm

Nicolle Ch - Int. IM.

Sabado 31 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se realiza orden y aseo en sectores peatonales y zonas verdes del parque.

En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 10:30 Am Hora fin: 11:30 Am

Nicolle Ch - Int. IM.

CIERRE BITACORA

Powered by CamScanner
