COP. 740/2024

OBJETO: "CONTRATAR A PRECIO UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LAS PARADAS DE TRANSMILENIO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."

CONTRATISTA: CONSORCIO USAQUÉN 005 2024

INTERVENTORÍA: R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS

DIRECTORA DE OBRA: ARQ. MAGDA UMAÑA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. MARCELA GÓMEZ

RESIDENTE DE OBRA: ING. DANIEL CHARRY

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA: ING. ESPERANZA OVIEDO.

FRENTE DE OBRA: PARQUE SAN PATRICIO

4 marzo del 2025 "Martes"
Personal en obra: 1 maestro 2 ayudantes
ACTIVIDADES: Se realizan levantamiento y/o ubicacion de puntos para senderos peatonales con la ayuda del equipo de topografia.
- Se inicia la construccion del cerramiento perimetral de la obra (Cinta verde/cinta peligro)
- llega a la obra. contenedor (campamento de obra) baño portatil, punto ecologico, camilla de primeros auxilios y botiquin.
- En horas de la tarde se presentan lluvias
Hora inicio 12:30 pm Hora fin 1:30 pm

5 marzo del 2025 "Miercoles"
Personal en obra: 1 maestro 2 ayudantes
ACTIVIDADES: se continua con la instalacion de cerramiento perimetral (Cinta verde)
En horas dela tarde se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 12:30 pm Hora fin 2:40 pm


Powered by CamScanner


Jueves 6 de Marzo del 2025
Personal en obra: 1 maestro 2 ayudantes
ACTIVIDADES: se realiza el levantamiento geografico para los senderos y plazoletas
- Se desmonta banca existente
- Se desmonta señalizacion
- Se desmontan 2 canecas para la basura
En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes
hora inicio 12:30pm Hora fin 5:00pm

Viernes 7 de Marzo del 2025
Personal en obra: 1 maestro 2 ayudantes
ACTIVIDADES: - Se protegen arboles existentes en obra, con malla en perimetro de los mismos.
- AVANCE EN REPLANTEO.
- INSTALACIÓN DE SEÑALES PMT.
- SE PRESENTAN CONTRATIEMPOS POR LAS LLUVIAS DEL DÍA ANTERIOR.
- CLIMA: NUBLADO.

SÁBADO 8 DE MARZO DE 2025.
PERSONAL: 1 MAESTRO, 2 AYUDANTES
CLIMA: NUBLADO.
ACTIVIDADES:
- CONTINÚA AFECTACIÓN POR LLUVIAS EN LOS PRIMEROS.
- SE TERMINA INSTALACIÓN DE SEÑALES PMT.

Lunes 10 de marzo del 2025
Personal en obra: 1 maestro 4 ayudantes 3 operarios maquina
ACTIVIDADES: Se inician actividades de excavacion para sendero peatonal del costado Nor oriente del parque, se instala geotextil en excavacion, esto con el fin de proteger la estructura del sendero. Se instala sub base granular en sendero peatonal



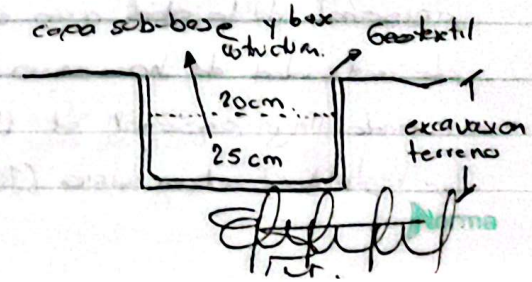


martes 11 de marzo del 2025

Personal en obra: 1 maestro, Hayudantes, 3 operarios maquinas

ACTIVIDADES: Se inician excavaciones para sendero peatonal ubicado al costado Nor occidente del parque

se empieza subbase de sendero peatonal ubicado al costado Nororiental del parque

En horas de la mañana siendo las 11:00 Am mientras se realizaban actividades de excavacion del sendero peatonal ubicado en el costado Noroccidente se ha afectado una tuberia del gas natural, la cual no estaba debidamente identificada (cinta peligro) y esta fue cortada accidentalmente. Una vez sucedido esto, se procede a llamar al personal del gas natural de emergencias (Vanti) para reportar el caso, Numero de radicado No. 102172525. Por recomendaciones del personal de emergencia fue necesario suspender actividades (Apagar maquinas y retirar personal de la obra a un sitio seguro) suspencion de actividad de hora inicio 11:00 Am hasta las 3:00 Pm cuando llego personal de Vanti, horas mas tarde se restablece el servicio (Informe No. 2344129)

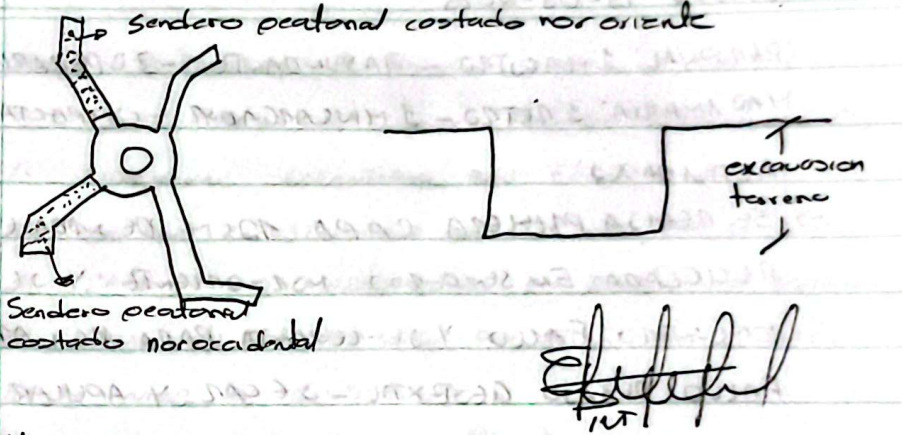


Miercoles 12 de marzo 2025

Personal de obra: 1 maestro, Hayudante, 3 operarios maquinas

ACTIVIDADES: - Se inician actividades de excavacion en sendero peatonal ubicado en el costado suroriente

Se instala sub-base en sendero peatonal del costado nor occidental

Se realiza tratamiento a tuberia del gas, en el cual se protege con arena de peña y cinta peligro

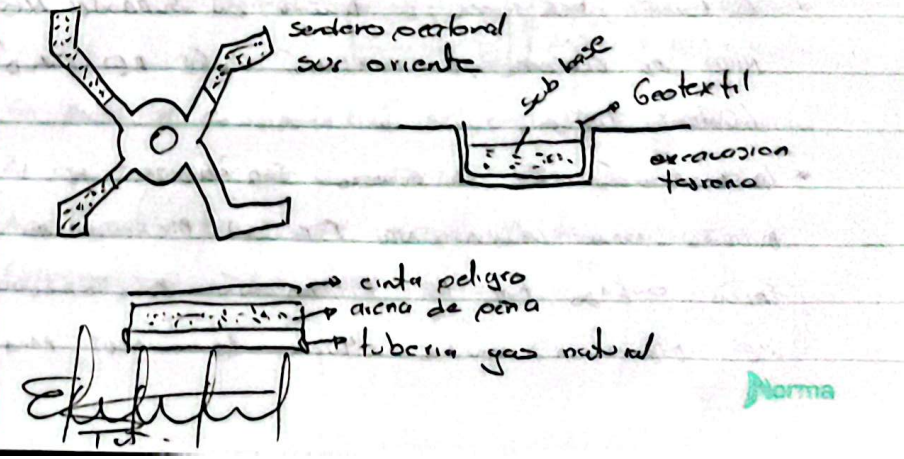

Powered by CamScanner

JUEVES 13-03-2025.


PERSONAL: 1 MAESTRO - 4 AYUDANTE - 3 OPERARIOS

MAQUINARIA: 1 RETRO - 1 CARGADOR - COMPACTADOR

ACTIVIDADES:

→ SE REVISA PRIMERA CAPA 12CM DE SUBBASE RECICLADA EN SENTIDO NOR-ORIENTE Y SE ENCUENTRA FALLO Y SE LEVANTA PARA REVISAR FALLO DEBAJO GEOTEXTIL - SECAR Y APLICAR CEMENTO Y CONFORMAR NUEVAMENTE ESTRUCTURA. SENTIDO - NOR-OCCIDENTE OK.


SE INICIA ACTIVIDAD DE EXCAVACION SENTIDO SUR-ORIENTE.




- SE LEVANTÓ, SECÓ, SE VERTIÓ EN SUBBASE HASTA NIVEL DE GEOTEXTIL, SE COMPACTÓ Y SE REINSTALÓ GEOTEXTIL TEJIDO.
- LA EXCAVACIÓN EN EL SENTIDO SUR ORIENTE SE DETIENE MOMENTÁNEAMENTE POR LA PRESENCIA DE UN FALLO CAUSADO POR LA SATURACIÓN DEL TERRENO. SE DECIDE EXCAVAR 40cm ADICIONALES PARA



PODER ESTABILIZAR EL TERRENO. DICHO A ORILLA EN ESTA ZONA HAY UNA CUNETA FORMADA NATURALMENTE, SE RECOMIENDA GARANTIZAR QUE ESTE EMPEDRADO NO DAÑARÁ LA ESTRUCTURA DEL TERRENO, POR LO QUE SE PROPONE UN MEJORAMIENTO EN RAZÓN O MATERIAL DE DEMOLICIÓN EN CONCRETO CON ACERO EN SUBBASE HASTA NIVEL DE GEOTEXTIL.

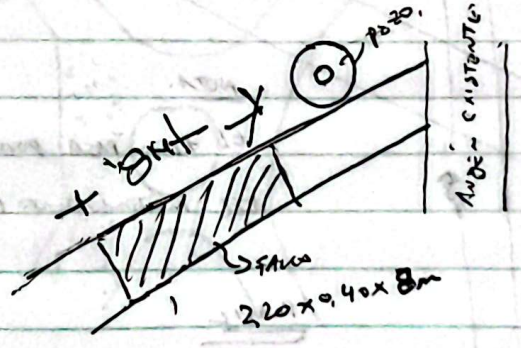



SE PROPONE:



SE DEJA A CONSIDERACIÓN DE ENTIDAD E INTERVENTORÍA LA CONSTRUCCIÓN DE UN FILTRO PARA DRENAR EL AGUA DE ESTE SECTOR HACIA EL POZO EXISTENTE. ESQUEMA EN LA SIGUIENTE PÁGINA.


Powered by CamScanner



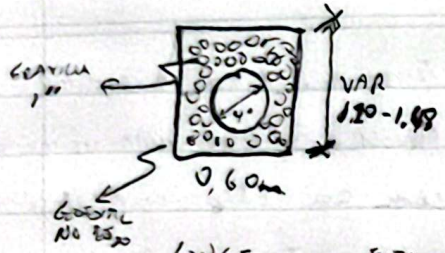

PENDIENTE 1%.

LONGITUD DEL FILTRO: 20m

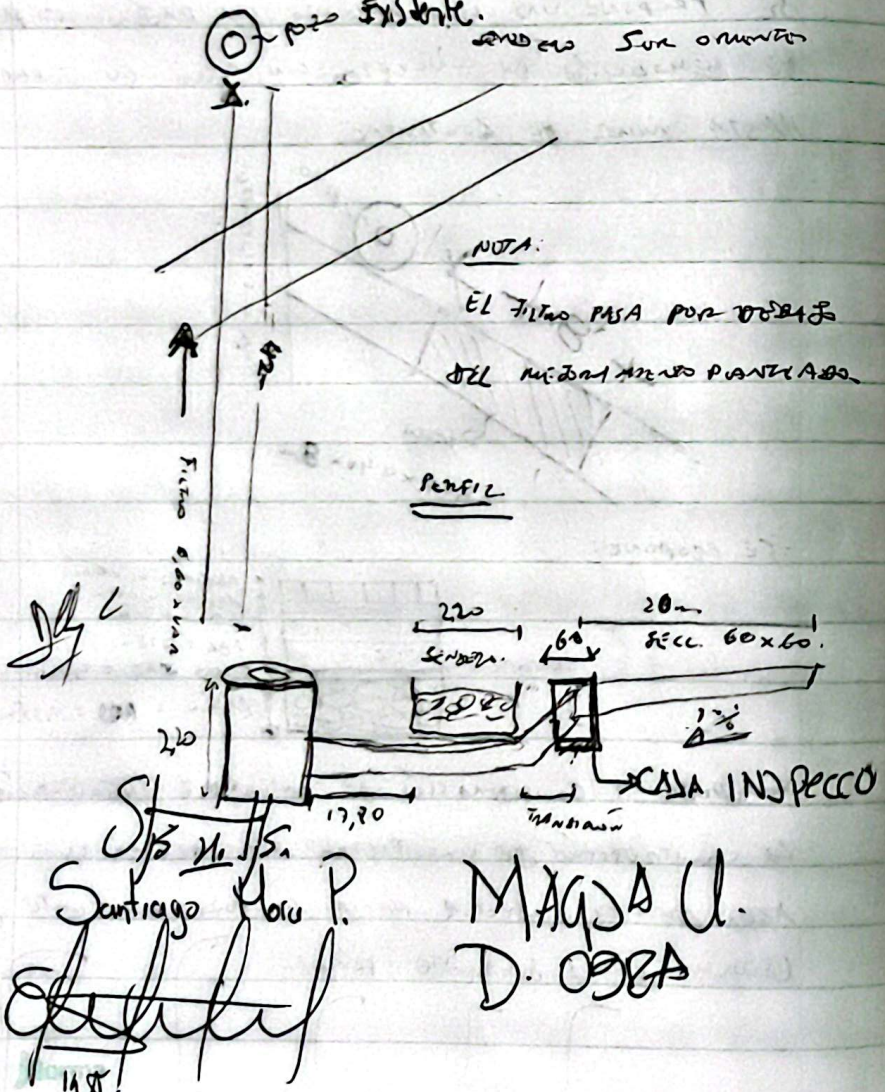

NOTA:

EL FILTRO PASA POR DEBAJO DEL SENDERO ANCHO PLANTEADO.

PERFIL

Santiago Flores P.

MAGSA U.
D. OBRA


Sábado 16 de Marzo del 2025

Personal en obra: 1 maestro 3 ayudantes

3 operarios maquina; CLIMA: LLUVIA A PARTIR DE LAS 11 AM.


Maquinaria: 1 retro - 1 mini cargador - 1 compactador

ACTIVIDADES: Se continua con las excavaciones para sendero y plazoleta.

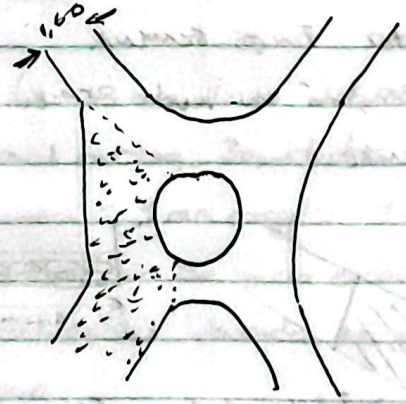

SE CONTINUAN NIVELES Y SE COMPACTA FONDO DE EXCAVACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.

EL SENDERO, MONUMENTAL, QUE TERMINA FRENTE AL RESTAURANTE, SE TUVO QUE DEJAR DE 1.60m DE ANCHO:



LO ANTERIOR DEBIDO A LOS ÁRBOLES DE LA ZONA.

Maria Ch. - Intern

Powered by CamScanner

LUNES 17 DE MARZO DE 2025


PERSONAL: 1 MAESTRO 3 AY + 3 OPERARIOS

MAQUINARIA: 1 EXCAVADORA, 1 MINICARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR.

CLIMA: LLUVIA DE 10AM A 1PM.

ACTIVIDADES: - LA JORNADA SE AFECTÓ POR LOS CONTINUOS LLUVIAS DEL FIN DE SEMANA.

- POR LO TANTO APARECIÓ UN NUEVO FALLO EN EL SENDERO SUR ORIENTAL.

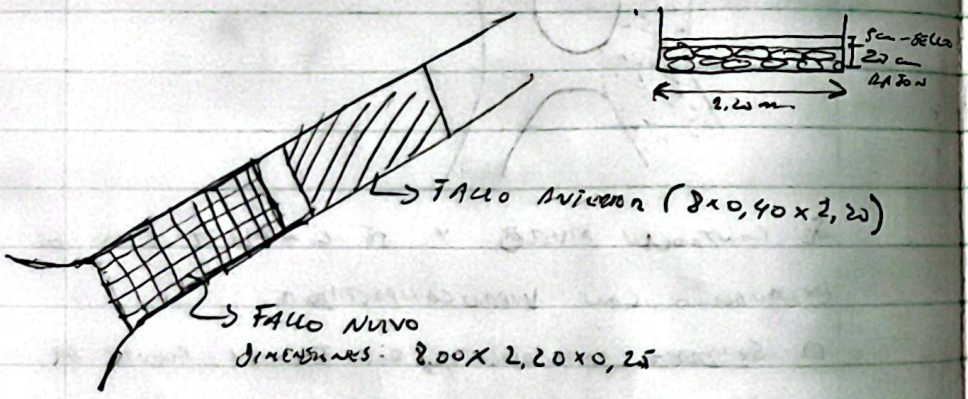

SE HIZO EL MISMO TRATAMIENTO DEL FALLO ANTERIOR, HACIENDO EL MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE DEMOLICIÓN PROVENIENTE DEL PARADERO ESTRELLA NORTE, DE ALLÍ HAN LLEGADO 3 VIAJES DE 7 M3. SE HAN UTILIZADO PARA LOS FALLOS MENCIONADOS Y PARA NIVELAR LA ENTRADA DE LA OBRA.

SE CONTINUÓ CON EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS Y TERMINACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA ROTONDA CENTRAL. SE INSTALA GEOTEXTIL Y SE INICIA EL RELLENO CON GBG.

Nicole Chang - Interventor


Martes 18 de Marzo del 2025


Personal en obra: 3 ayudantes 3 operarios maquinaria

Maquinaria: 1 mini cargador 1 vibrocompactador 1 excavadora

ACTIVIDADES:- Se inicia excavacion en zona de biosaludables ubicada en plazoleta central del parque.


- Se instala geotextil en zona de biosaludables ubicado en plazoleta central del parque

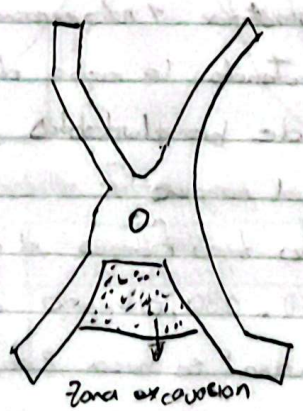

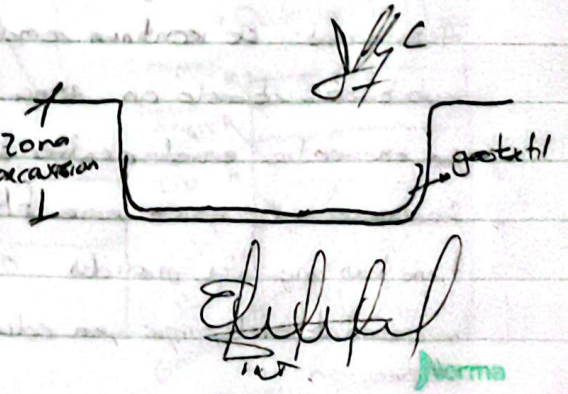

Powered by CamScanner

se instalo sub base granular, primera capa en zona de basaludables ubicado en plazoleta central del parque

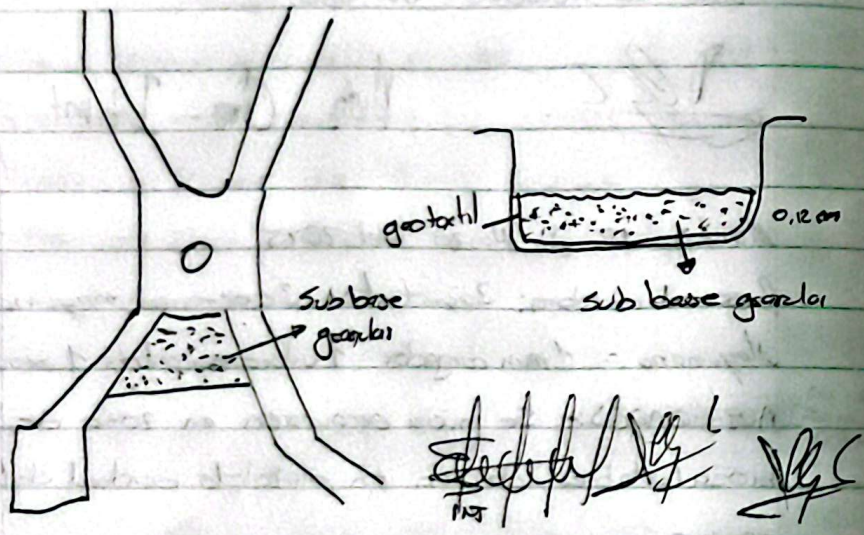


Miercoles 19 de Marzo del 2025


Personal en obra: 1 maestro, 3 ayudantes, 3 operarios maquinas

Maquinaria: 1 mini cargador 1 compactador 1 retroexcavadora


Actividades: se continua compactando la capa de sub base, ubicado en zona de basaludables que se encuentra en el centro del parque

Se inicia excavacion para filtro tipo frances el cual tiene las siguientes medidas 0,60 x 0,80, ubicado al costado sur oriente del parque, en adicional se hacen 2 cajas de inspeccion

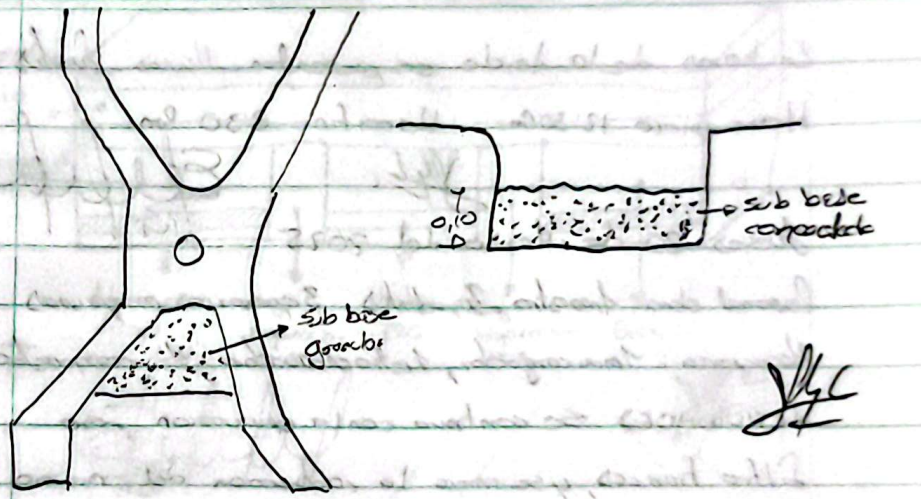


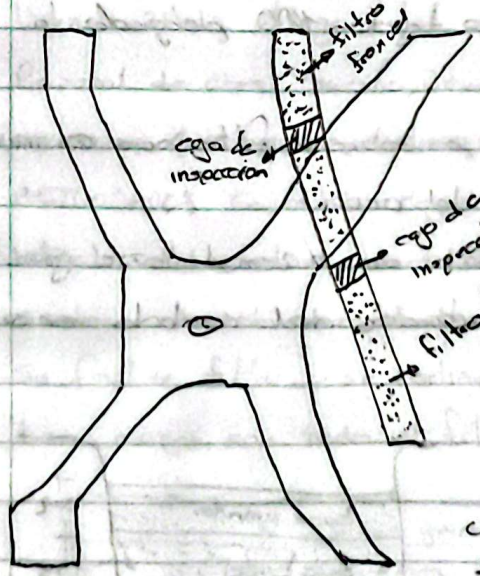


• Detalle caja de inspeccion

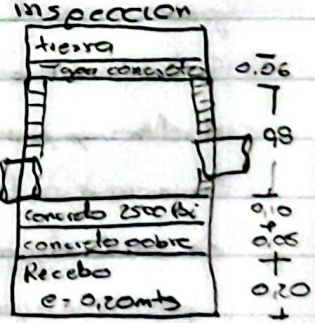

• Detalle filtro



• Detalle filtro

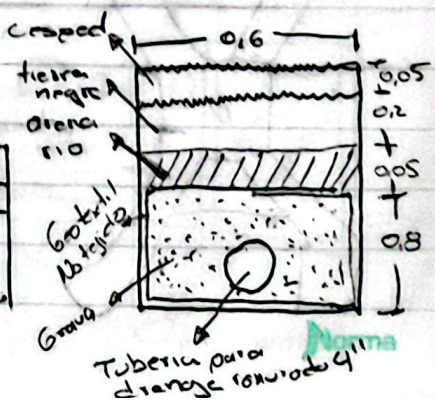

En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 12:30 Pm. Hora fin 3:30 Pm.

Jueves 20 de Marzo del 2025


Personal obra: 1maestro, 3ayudantes, 3operarios maquinas


Maquinaria: 1mini cargador, 1retroexcavadora, 1 compactador.

ACTIVIDADES. Se continua con la excavacion para filtro frances, y se inicia la construccion del mismo utilizando geotextil no tejido 1600 polegrado la grava.

Se instala arena dario para sobre el filtro para asi iniciar el relleno y paisajismo del area

Se inicia a instalar capa de 0,12cm de base granular en sendero peatonal ubicado en el costado nor oriente

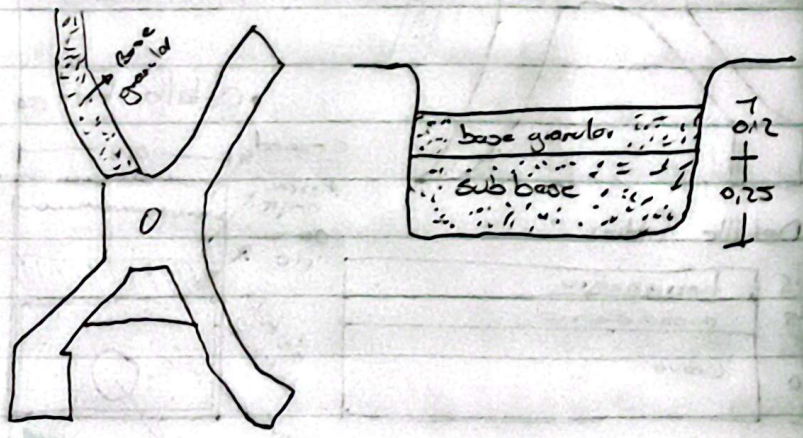

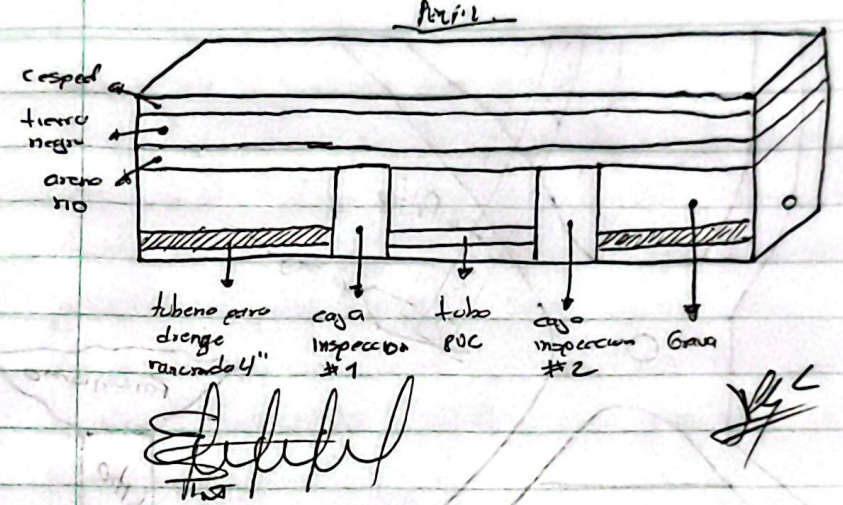


Viernes 21 de Marzo del 2025

Personal de obra: 1maestro, 3ayudantes, 3operarios maquinaria


maquinaria: 1mini cargador, 1retroexcavadora, 1 compactador

ACTIVIDADES. Se realizan cajas de inspeccion en los laterales del sendero, para donde pasa filtro, en sendero ubicado al costado sur oriente.

Se finaliza filtro, y se realiza paisajismo con tierra negra, por todo el filtro.

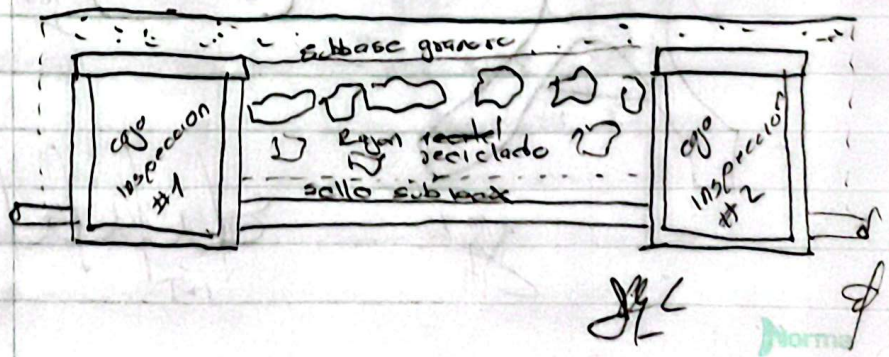



Powered by CamScanner

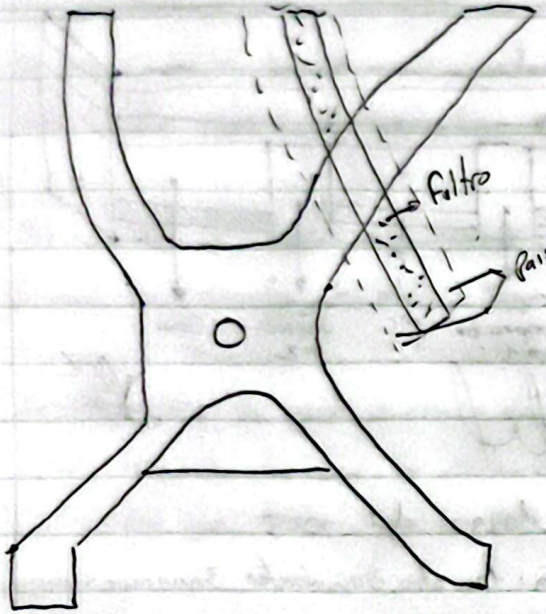




Se continua instalando capa de base granular en sendero ubicado al costado nor oriente del parque

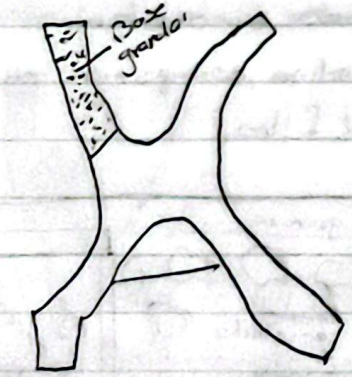





INT.


Sabado 22 de marzo del 2025.


Personal en obra: 1maestro, 3ayudantes, 3 operarios maquina


Maquinaria: 1retroexcavadora, 1mini cargador, 1compactador

ACTIVIDADES: Se continua instalando capa de base granular en sendero del costado nor oriente.

Se inician excavaciones para pedestales de senderos peatonales ubicados en el costado sur oriente del parque.

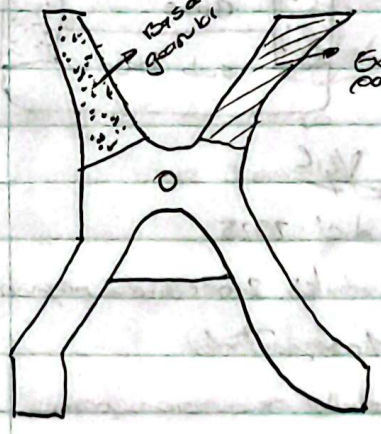





INT.

Martes 25 de marzo del 2025

Personal en obra: 1maestro, 3ayudantes, 3 operarios maquinaria


Maquinaria: 1minicargador, 1retroexcavadora, 1compactador


ACTIVIDADES: Se instala capa de base granular en la rotonda, ubicada en el centro del parque


Norma
Norma

Powered by CamScanner

Se continua con la excavacion para bordillos en el sendero peatonal ubicado al costado sur oriente del parque.

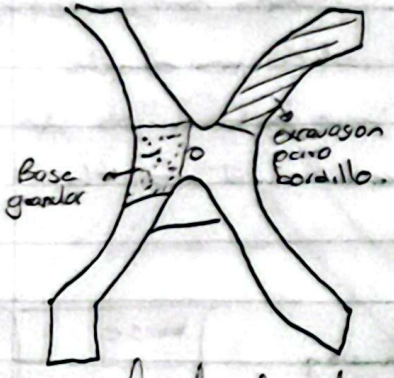



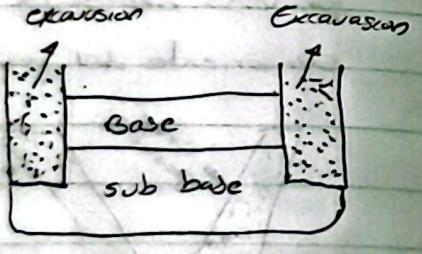


Miercoles 26 de marzo del 2025


Personal encargado: 1 maestro, 3 ayudantes, 2 operarios maquinas


Maquinaria: 1 mini cargador, 1 compactador

ACTIVIDADES: Se continua con la excavacion para bordillos en senderos peatonales, ubicados en los costados nor oriente y sur oriente

Se instala capa de base en rotonda sendero ubicado en el centro del parque.

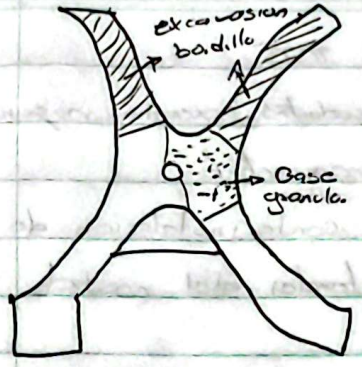





En hoy de la boarde se presentan lluvias fuertes

hora inicio 1:00 Pm hora fin 2:30 Pm


Jueves 27 de marzo del 2025


Personal obra: 3 maestro, 3 ayudantes: 2 operarios maquinas

Maquinaria: 1 mini cargador, 1 compactador

ACTIVIDADES: Se instala capa de base en sendero peatonal del costado sur occidente.

Se continua con la instalacion de bordillos en senderos peatonales del costado nor oriente y sur oriente

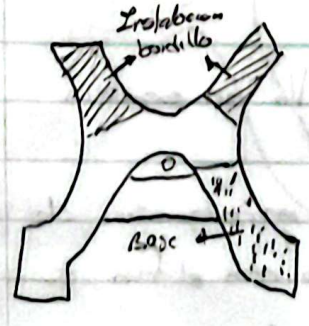



Viernes 28 de marzo del 2025

Personal obra: 3 maestros, 3 ayudantes, 2 operarios maquinaria: 1 minicargador, 1 compactador.

ACTIVIDADES: Se continua con la instalacion de bordillos en senderos peatonales del costado nor oriente y sur oriente.

Se instala capa de base granular en rotonda y plazoleta de biosaludables

En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 2:30 Pm Hora fin 5:00 Pm

Nicolas Ore. - Interventoria


Sabado 29 de marzo del 2025

Personal en obra. 3 maestros, 3 ayudantes, 2 operarios maquinaria. 1 minicargador 1 compactador.


ACTIVIDADES: Se finaliza la instalacion de capa de base en zona de biosaludables, ubicada en el centro del parque.

Se continua instalando bordillo en senderos del costado nor oriente.


Se realiza recorrido de obra en compañia de interventoria y contratista, esto con el fin de revisar los bordillos ya instalados en los senderos ubicados en los costados nor oriente y sur oriente, se revisan juntas y alineacion de los mismos y se da visto bueno por parte de interventoria para proceder a embogadillar.

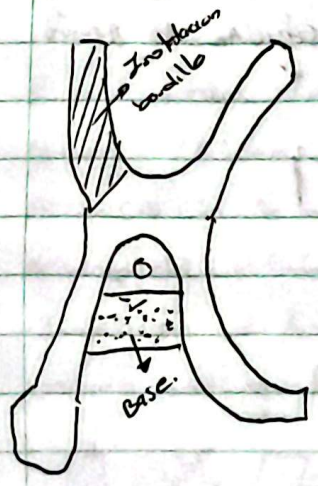


Instalacion base



Bordillo instalado



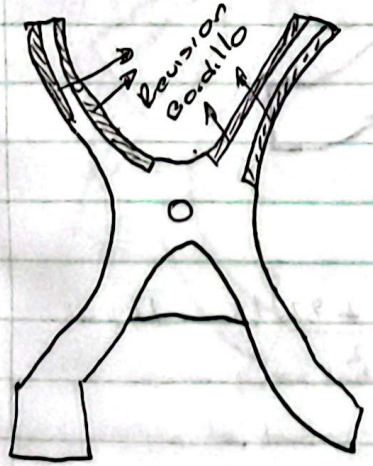

Esta Interventoria hace acompañamiento al contratista para la toma de ~~cantidades~~ cantidades respecto al bordillo instalado donde se le recomienda al contratista ajustar juntas para la embogadillada. 10 mm.

Powered by CamScanner


LUNES 31/03/2025.

PERSONAL: 1 MAESTRO, 3 OF, 5 AY

EQUIPO: 1 PLANTA, 1 PLANTA ELÉCTRICA

CLIMA: LLUVIA DE 7AM-11AM Y 2:30 PM EN ADELANTE.

ACTIVIDADES:- TRABAJO EN PLATAFORMA, CUNETA NORTE. ESTE ESPACIO SE AMPLIÓ PARA DEJARLO SIMILAR AL DISEÑO ARQUITECTÓNICO ORIGINAL.

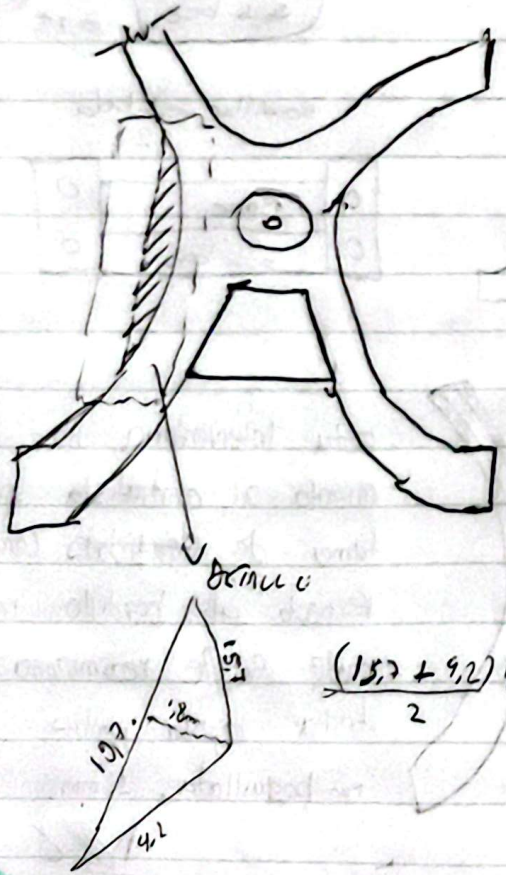

$$\frac{(15,3 + 9,2)1,8}{2} = 17,91 \text{ m2}.$$

- SE AVANZA CON BORDILLO EN SENDEROS NOR OCCIDENTAL Y SUR ORIENTE.


Martes 1 de abril del 2025

Personal en obra: 1 maestro, 3 oficiales, 5 ayudantes


Equipos: 1 Pulidora - 1 Planta electrica.

ACTIVIDADES: Se inician excavaciones para bordillos en sendero del costado nor occidente.


-Instalacion de bordillo en sendero peatonal del costado nor oriente.

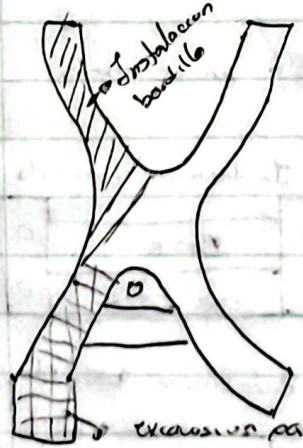


Instalacion bordillo



Excavacion bordillo



En horas de la tarde se realizan excavaciones en capa de base de los senderos peatonales (Densidades)

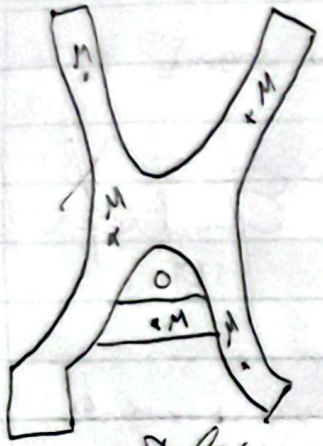

Resultados densidades

M= 94,7 %

M= 97,8 %

M= 96,4 %

M= 98,9 %

M= 95,8 %

Ing. Residente


Miercoles 2 de abril del 2025


Personal en obra: 1 maestro - 3 oficiales - 5 ayudantes


Equipos: 1 pulidora - 1 planta electrica

ACTIVIDADES: Se instala bordillo en sendero peatonal del costado noroccidente

Se inician excavaciones para bordillo en rotonda ubicado en centro del parque.

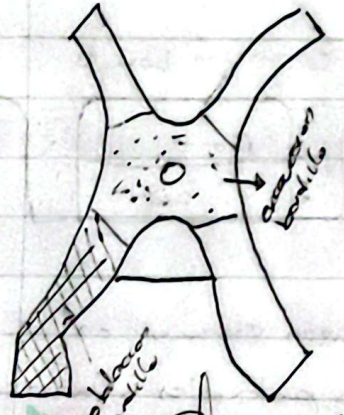





Ing. Residente


Jueves 3 de abril del 2025


Personal en obra: 1 maestro - 3 oficiales - 5 ayudantes

Equipos 1 pulidora - 1 planta electrica

ACTIVIDADES Se instala bordillo en rotonda de senderos ubicado en el centro del parque.

Se inician excavaciones para bordillo en zona de biosaludables, ubicada en el centro del parque

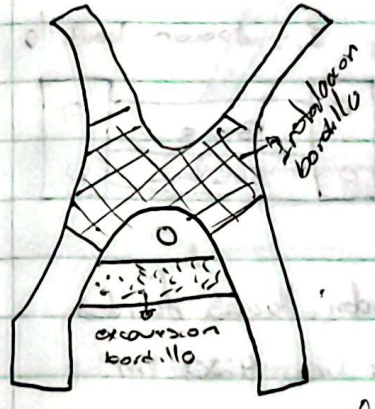

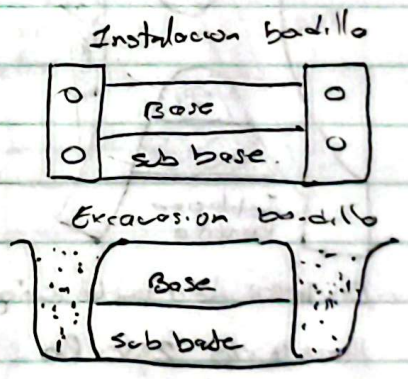

Ing. Residente

Viernes 4 de abril del 2025


Personal en obra: 1 maestro, 3 oficiales 2 ayudantes


Equipos: 1 pulidora - 1 planta electrica - 1 compactadora

ACTIVIDADES: Se instalan bordillos en zona de biosaludables ubicado en el centro del parque.

Se inicia paisajismo en rotonda y en senderos

Se realiza recorrido ambiental entre contratista e interventoria verificando: reutilización de materiales, protección de talud, punto ecológico. Se realiza charla ambiental

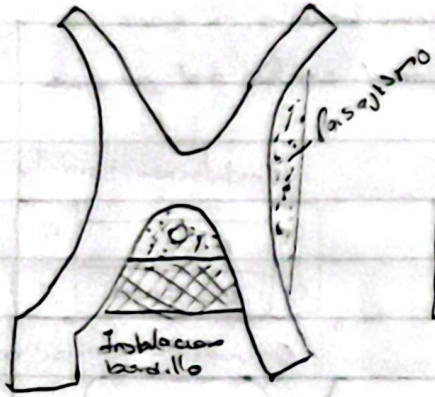




En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes Hora inicio 2:30 Pm hasta las 4:30 pm.

Sabado 5 de abril del 2025

Personal en obra: 1 maestro, 3 oficiales, 2 ayudantes

Equipos: 1 polidora, 1 planta electrica, 1 compactador

ACTIVIDADES: Se funde plaza loza en concreto 3000Psi en placa de losa dobles ubicada en el centro del parque

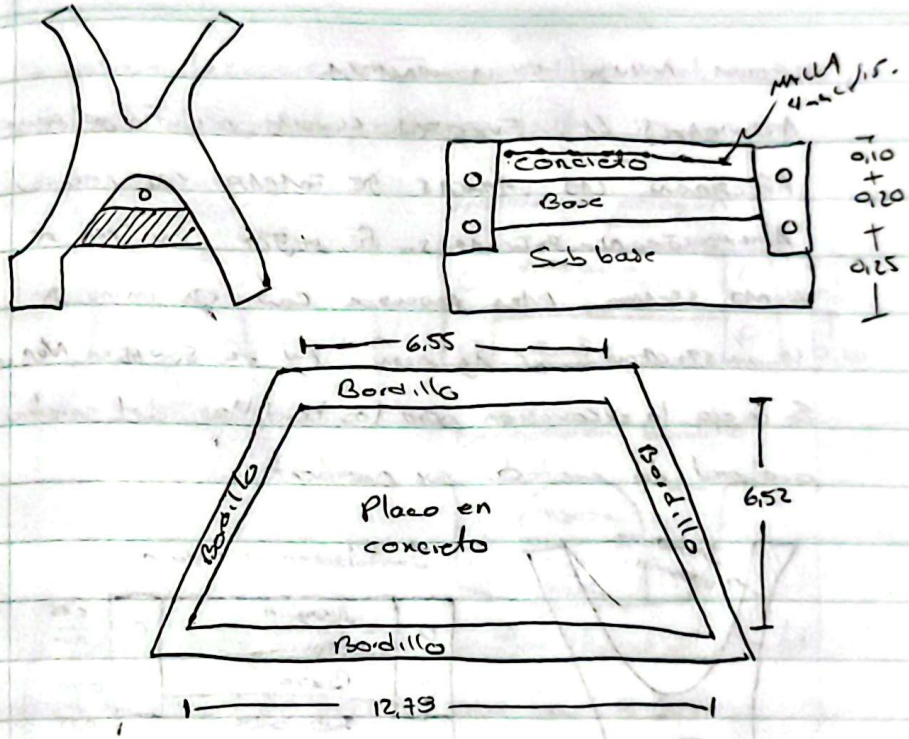

Se realizan muestras de concreto (04 cilindros) para enviar a laboratorio.

LAS LLUVIAS QUE SE PRESENTARON AFECTARON LA ROSETA PARA INSTALAR ADOQUIN. SE DEJARA PLACA EN HORAS DE LA TARDE.

LUNES 7 DE ABRIL DE 2025


PERSONAL EN OBRA: 1 MAESTRO + 3 OF, 2 AY

EQUIPO: 1 PULIDORA, 1 PLANTA ELÉCTRICA.


CLIMA: NUBLADO EN LA MAÑANA

ACTIVIDADES LAS FUERTES LLUVIAS DEL FIN DE SEMANA AFECTARON LAS ÁREAS DE TRABAJO LOS MATERIALES ALMACENADOS SE MOJARON UN PAR DE HUECOS CAVADOS PARA PREPARAR CON EL INICIO DE LA INSTALACIÓN DE ADOQUÍN EN EL SENDERO NOR ORIENTE.


Se inicia la excavacion para los bordillos del sendero peatonal del costado sur occidente.

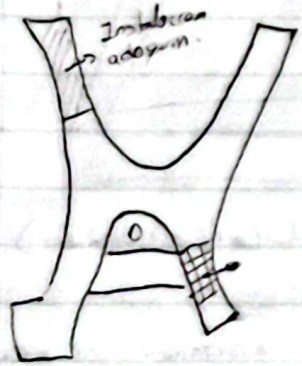

Instalacion adoquin



Excavacion bordillo




Nicolas Ospina Intern

Martes 8 de abril del 2025


Personal enobo: 1maestro 3ayudantes

ACTIVIDADES Se inicio la instalacion de adoquin en el sendero sur oriente

Se continua la excavacion para bordillos del sendero peatonal del costado sur occidente

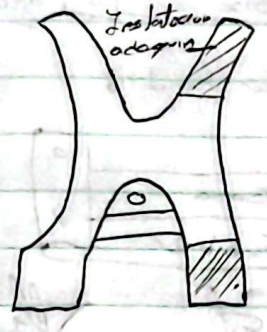

Instalacion adoquin



Excavacion bordillo



En horas dela tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 12:30 Pm Hora fin 4:00 Pm

Nicolas Ospina Intern

Miercoles 9 de abril del 2025

Personal enobo: 1maestro 3 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua instalando adoquin en sendero peatonal del costado sur oriente

Se inicia la instalacion del bordillo en el sendero del costado sur occidente


En horas dela tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 11:30 Am hora fin 2:00 Pm


Powered by CamScanner



Instalacion Adoquin



Instalacion bordillo



Nicolas Ortiz - Intern Ing. Civil


Jueves 10 de abril del 2025

Personal en obra: 1 maestro, 3 ayudantes

ACTIVIDADES Se continua instalando bordillo en el costado del costado oriente


Se inicia la instalacion del adoquin del costado nor occidente, Ademas PAVIMENTO DE ACCESO HACIA EL CENTRO

EQUIPO EN OBRA: 1 PLANTA ELÉCTRICA, 1 PLANCHA



SE INICIA INSTALACIÓN DE ADOQUÍN EN PLATAFORMA NORTE:

Norma

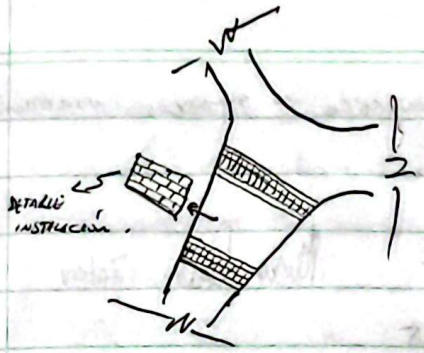

Nicolas Ortiz - Intern Ing. Civil

VIERNES 11/04/2025

PERSONAL: 1 MAESTRO, 1 OF, 3 AYUDANTES. CLIMA: SECO.

ACTIVIDADES: - CONTINUACIÓN DE SUMINISTRO DE ADOQUÍN Y BORDILLO ARENA EL COSTADO NOROCCIDENTE Y PLATAFORMA NORTE.

- TERMINACIÓN DE INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80 EN COSTADO SUROCCIDENTAL.

EQUIPO: 1 PLANCHA + 1 PLANTA ELÉCTRICA.

Nicolas Ortiz - Intern Ing. Civil

SÁBADO: 12/04/2025

PERSONAL: 1 MAESTRO, 1 OF, 3 AY.

EQUIPO: 1 PLANCHA, 1 PLANTA ELÉCTRICA.

CLIMA: SECO.

ACTIVIDADES: - AVANCE EN INSTALACIÓN DE ADOQUÍN EN PLATAFORMA CENTRAL, COSTADO NORTE.

Norma


Powered by CamScanner

-Fundida de cunetas en concreto en sardineles nuevos, Nivelaciones, Bordillos.

Lunes 14 de abril del 2025

Personal - 1maestro 3ayudante - 1oficial

ACTIVIDADES: Se continua instalando adoquin en plazoleta ubicada en el centro del parque

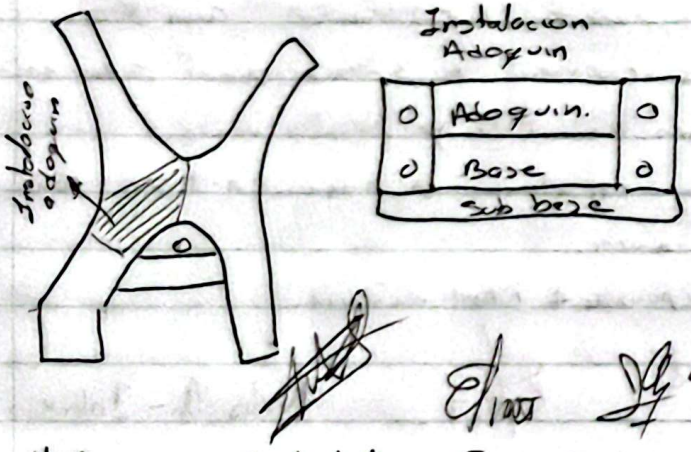

Martes 15 de abril del 2025


Personal - 1maestro - 1oficial - 3ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua instalando adoquin en plazoleta ubicada en el centro del parque

Miercoles 16 de abril del 2025

Personal - 1maestro - 1oficial - 3ayudantes


ACTIVIDADES: Se continua instalando adoquin en plazoleta ubicado en el centro del parque

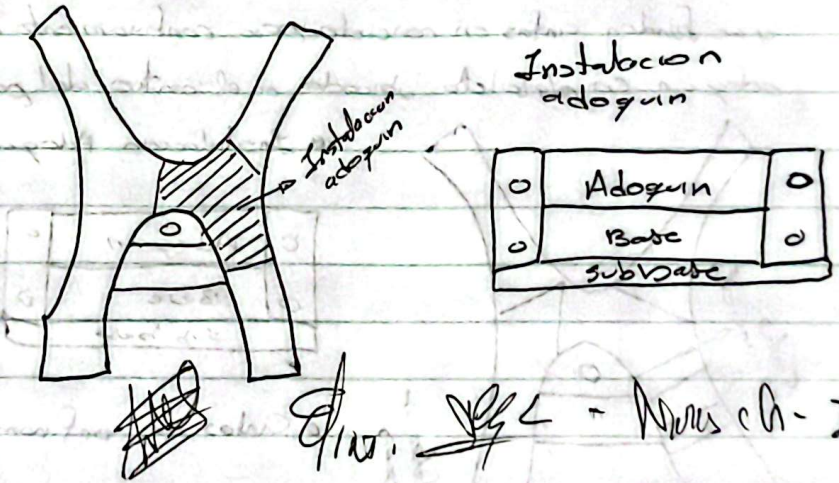

Lunes 21 de abril del 2025

Personal - 1maestro - 1oficial - 3ayudantes


ACTIVIDADES: Se continua instalando adoquin en sendero peatonal del costado sur occidente

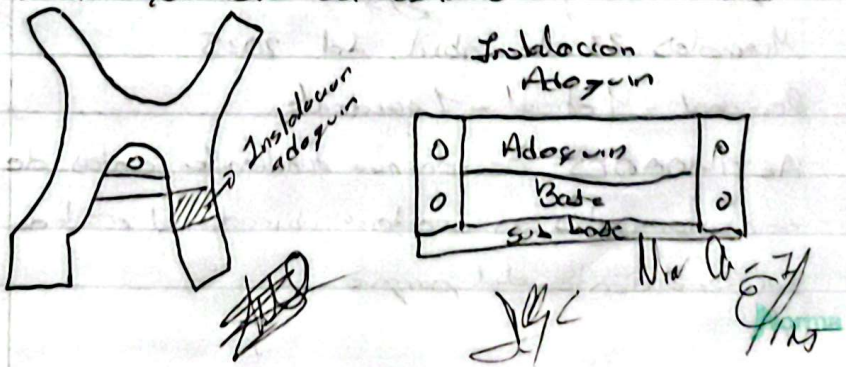


Martes 22 de abril del 2025

Personal - 1 maestro - 1 oficial - 3 ayudantes


ACTIVIDADES: Se continua instalando adoquin en sendero peatonal ubicado al costado sur occidental y se fundan cintas en concreto para confinamiento de adoquin en plazoleta ubicada en el centro del parque

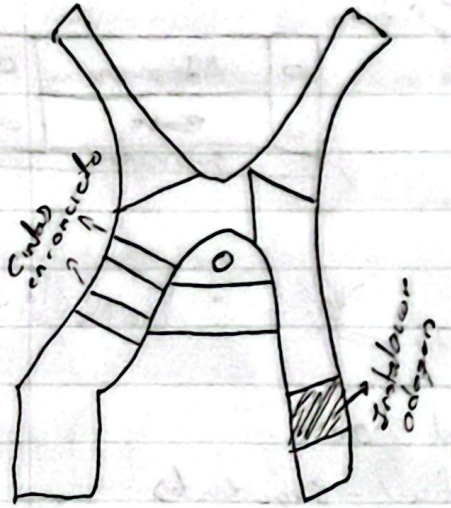

• Instalacion Adoquin



• Cintas de confinamiento




Ing. JG - Nicolas Ch - Ing

Miercoles 23 de abril del 2025

Personal - 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua fundiendo cintas de confinamiento en sendero ubicado al costado sur occidente del parque

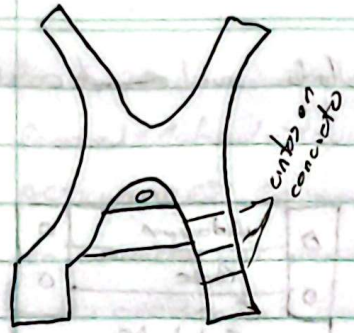

• Cinta de confinamiento





JG - Nicolas Ch - Ing

Jueves 24 de abril del 2025

Personal obra - 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua instalando adoquin en sendero peatonal del costado sur occidente

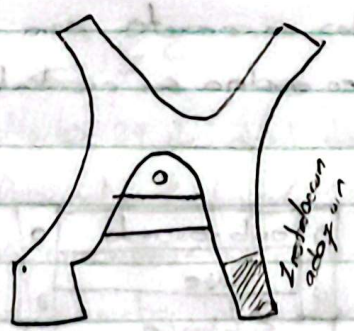



JG - Nicolas Ch - Ing


Viernes 25 de abril del 2025


Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua instalando adoquin

Powered by CamScanner

en sendero peatonal del costado sur ~~oriente~~ occidente

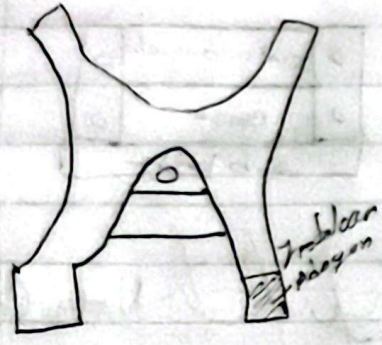





Nicolas Ch - Int

Sabado 26 de abril del 2025

Personal = 1oficial - 1ayudante

ACTIVIDADES: fundida cinta encontacto para confinamiento del adoquin en sendero sur occidente

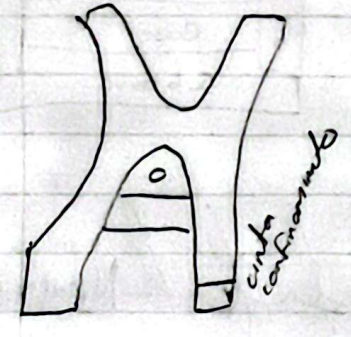




Nicolas Ch- Int.


lunes 28 de abril del 2025

Personal = 1oficial - 1ayudante

ACTIVIDADES: Se inicia la conformacion y empradizacion en perimetro del sendero ubicado al costado Nororiente y Noroccidente

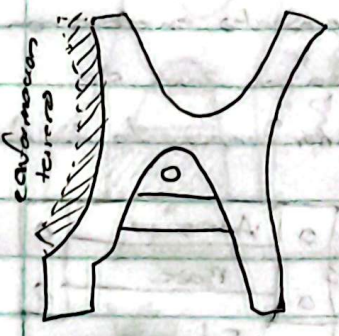

• Conformacion terreno




Nicolas Ch - I


Martes 29 de abril del 2025

Personal = 1oficial - 1ayudante

ACTIVIDADES: Se continua conformando manualmente el perimetro del sendero del costado nor oriente y glorieta.




• conformacion terreno



- Nicolas Ch. Int


Powered by CamScanner

Miercoles 30 de abril del 2025
Personal obra: 1oficial - 1ayudante - 1operario maquina
MAQUINARIA: 1 retroexcavadora
ACTIVIDADES: Se continua conformando perimetro manualmente en sendero nor-oriente y sur oriente
Se retira tierra y escombros presentes en obra con la ayuda de la retroexcavadora en zona de Biosaludables. Se retira container "compomento de obra"

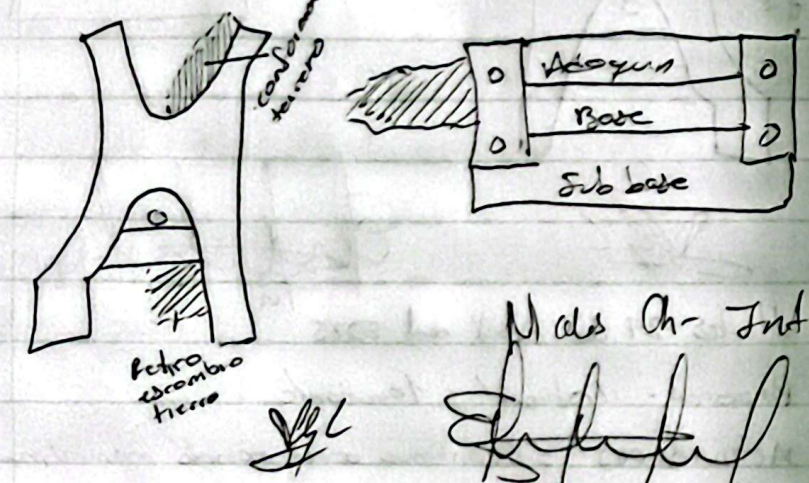

Nicolas Ch - Inst.

Viernes 2 de mayo del 2025
Personal obra: 1oficial - 1ayudante - 1 operario maquina
MAQUINARIA: 1 retroexcavadora
ACTIVIDADES: Se continua con la conformacion manual de terreno en perimetro del sendero al costado sur oriente y sur occidente
Se realiza conformacion de terreno con maquinaria en ingreso a obra y zona de biosaludables

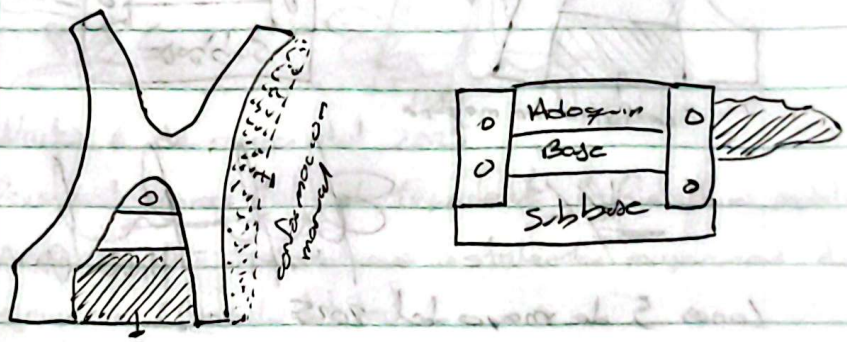



conformacion con maquina

Nicolas Ch - Inst.

Sabado 3 de mayo del 2025
Personal obra: 1oficial - 1ayudante - 1operario maquinaria
MAQUINARIA: 1 retroexcavadora
ACTIVIDADES: Se continua con la conformacion manual de terreno en perimetro del sendero sur oriente
Se continua con la conformacion de terreno con maquina en ingreso a obra y zona de biosaludables
En horas de la mañana se presentan lluvias
Hora inicio: 8:00 Am Hora fin 10:00 Am
Hora inicio 11:00 Am Hora fin 12:00 pm

Powered by CamScanner

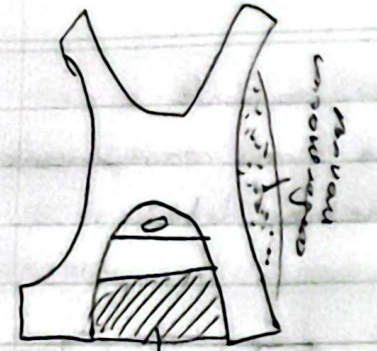




Nicolas Ch - Int

Lunes 5 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante - 2 instaladores mobiliario

ACTIVIDADES: Se continua con la conformacion manual del terreno en paramento del sendero sur occidente

- Se instalan 4 canecas para la basura, 2 maquinas de biosaludables - 1 señaletica

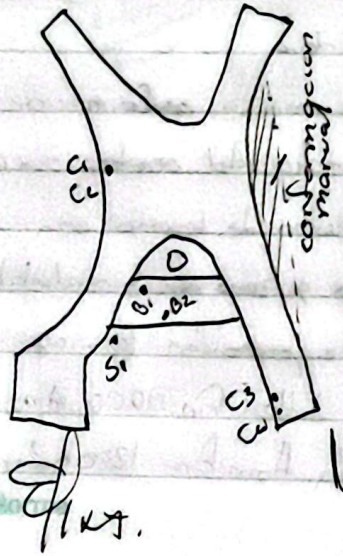

- C_1-C_2-C_3-C_4 (canecas basura)
- B_1-B_2 (Biosaludables mayores)
- S_1 (Señalizacion)

Nicolas Ch - Int

En horas de la mañana se presentan lluvias

Hora Inicio: 8:30 Am Hora fin 11:30 Am

Hora Inicio 2:00 Pm Hora fin 4:00 Pm


Nicolas Ch - Int

Martes 6 de mayo del 2025

Personal obra = 1 oficial - 1 ayudante - 2 instaladores mobiliario

ACTIVIDADES = Se continua instalando maquinas de ejercicio (Biosaludables)

- Se funden losas en concreto en juego existente (Juego infantil de madera)

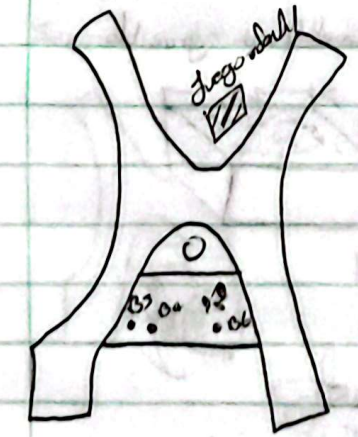

- B_3 B_4 B_5 B_6 Biosaludables

Nicolas Ch - Int.


Powered by CamScanner

Miercoles 7 de mayo del 2025


Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se instalan bordillo en sendero peatonal del costado occidente


- Se instala graulla en zona de juegos infantiles existente

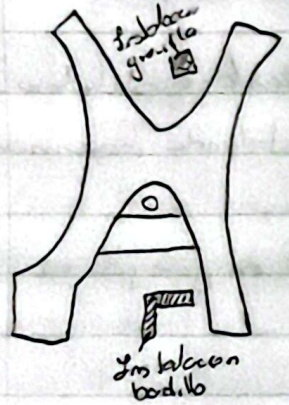

• Instalacion bordillo



• Instalacion graulla




Nicolas Ch - Int.

Int.


Jueves 8 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua instalando bordillo en sendero peatonal del costado occidente

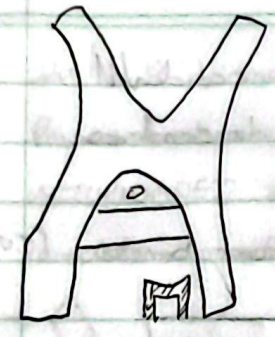

• Instalacion bordillo



Nicolas Ch - Int


Int.

Viernes 9 de mayo del 2025


Personal obra - 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES = Se continua instalando bordillo en sendero peatonal del costado occidental

Se inicia la instalacion de base sendero occidental



• Instalacion bordillo y Base



Int - Nicolas Ch - Int

Sabado 10 de mayo del 2025


Personal obra = 1 oficial + 1 ayudante - 2 instaladores mobiliario

ACTIVIDADES: Se finaliza instalacion de base


Powered by CamScanner

en sendero peatonal del costado occidental

Se instalan bancos en periodo de senderos

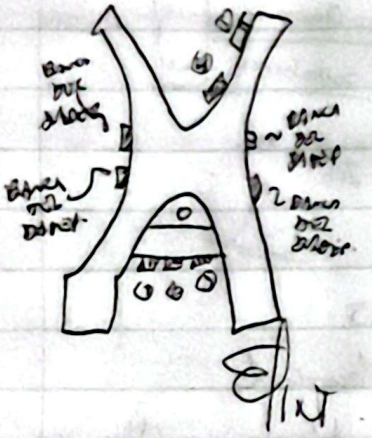

•Instalacion bancos (IUN.




Nals. Ch-Int.


Lunes 12 de mayo del 2025

Personal obra: 1oficial - 1ayudante

ACTIVIDADES: Se continua instalando bancos en senderos peatonales

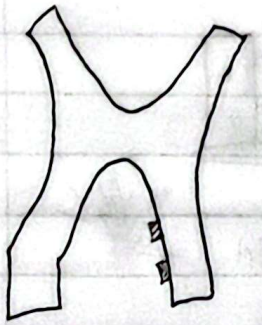

•Instalacion bancos




Nvans Ch- Int

Martes 13 de mayo del 2025


Personal obra: 1oficial - 2ayudantes

ACTIVIDADES: Se dinde sendero peatonal en concreto ubicado al costado occidental



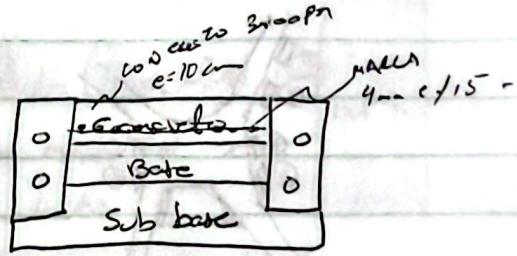

SE CONTINUA RAMPA DE ACCESO AL LADO NORTE DEL SUMIDERO EXISTENTE




RAMPA DE ACCESO.

Nicole Ch. - Int

NOTA COMPLEMENTARIA A LA DEL SABADO 10 DE MAYO DE 2025: EL DADEP, A TRAVÉS DE

UN CONTRATISTA, LE DONÓ A LA ALCALDÍA DE USAQUÉN UNOS BANCOS M-50 QUE SE INSTALARON A INSTALAR EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES:

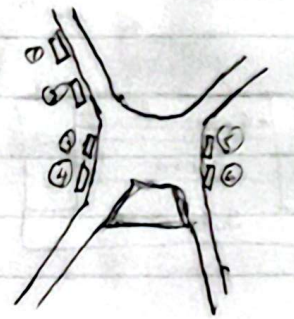

6 BANCOS EN TOTAL, DE LOS QUE FUNCIONAN HASTA LA FECHA LAS PLAZAS.


AL DÍA DE HOY, MARTES 13 DE MAYO DE 2025, NO LOS HAN INSTALADO, PERO EN CADA PUNTO DE INSTALACIÓN DEJARON EL ADOQUÍN INSTALADO DE EL CONTRATO USAQUÉN 005/2024 CON 'PEGOTES' DE CONCRETO.

INT.

Semana del 14 al 17 de mayo del 2025
Personal obra: 1 ayudantes
ACTIVIDADES: Se inicia conformacion manual de terreno en perimetros de Senderos peatonales

INT.

Semana 19 al 24 de mayo del 2025
Personal obra: 2 ayudantes
ACTIVIDADES: Se continua conformando terreno manualmente en perimetro de senderos peatonal

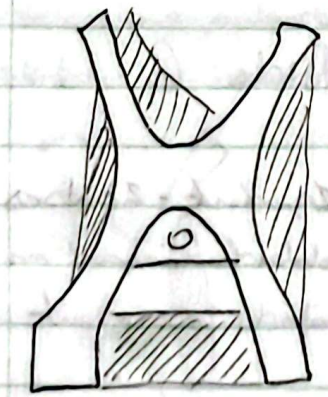



Lunes 26 de mayo del 2025
Personal obra. 1 oficial - 2 ayudantes
ACTIVIDADES: Se inicia instalacion de cajeal

INT.

Powered by CamScanner

en sendero peatonal del costado nor oriente

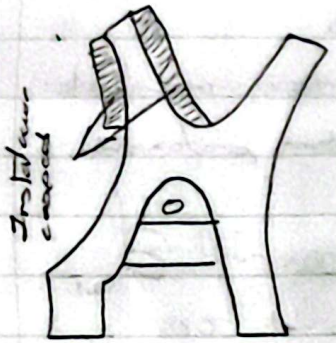



En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio: ~~7:00~~ 8 Am Hora fin 10:00 Am


Hora inicio 2:00 Pm Hora fin 3:00 Pm


Nicolas Ch- Ing Ind. Int.

Martes 27 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante - 2 peones

ACTIVIDADES: Se continua instalando cesped en perimetro de sendero del costado sur oriente

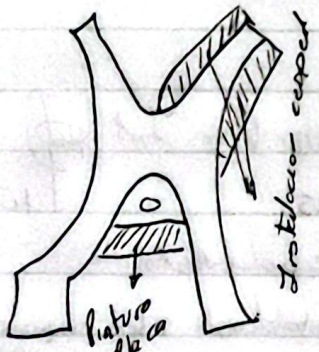



se inicia vaciado de placa en zona de bicicletas.

En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 2:30 Pm Hora fin 4:00 Pm


Nicolas Ch- Ing Ind. Int.


Miercoles 28 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 2 ayudantes - 2 peones

ACTIVIDADES: Se continua instalando cesped en perimetro de senderos peatonales

- Se continua vaciando placa de concreto ubicada en zona de bicicletas

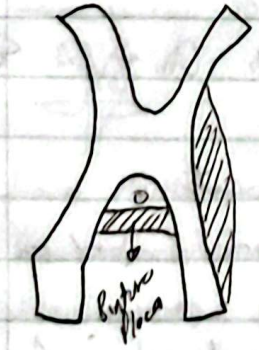




En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 1:00 Pm Hora fin 3:30 Pm

Nicolas Ch- Ing Ind. Int.

Powered by CamScanner


Jueves 29 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial 2 ayudantes - 2 enteros
ACTIVIDADES: Se continua con la instalacion de
cesped en zona aledaña a biosaludable
- Se finaliza entuco de placa en biosaludables

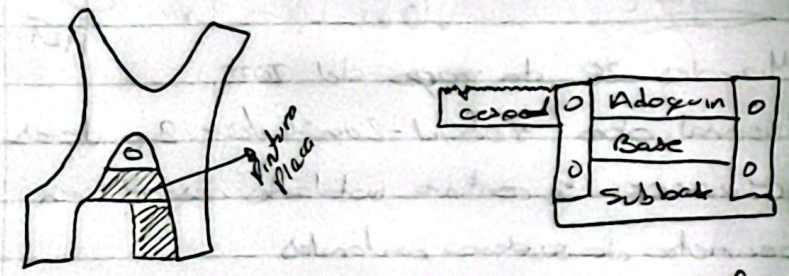

En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 3:00 Pm Hora fin 4:00 Pm

Nicolas Ch - Int

Viernes 30 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial - 2 ayudantes
ACTIVIDADES: Se continua instalando cesped en
zona aledaña a los biosaludables
En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 7:00 Am Hora fin 9:30 Am
Hora inicio 2:00 Pm Hora fin 3:30 Pm
Hora inicio 4:30 Pm Hora fin 5:00 Pm

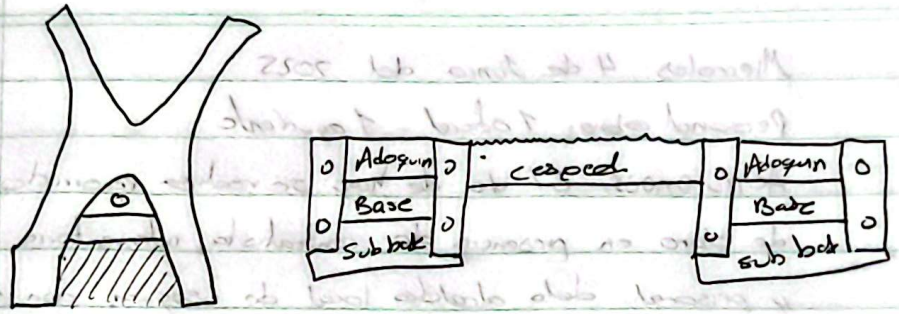

Sabado 31 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante.
ACTIVIDADES: Se continua con la instalacion de
cesped en zona aledaña a biosaludable
En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 10:30 Am Hora fin 11:30 Am

Nicolas Ch - Int

Lunes Martes 3 de Junio del 2025
Personal obra - 1 oficial - 1 ayudante
ACTIVIDADES. Se desmonta cerramiento de obra
(Cloro verde), y se inicio orden y aseo
en porque
En horas dela tarde se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 1:00 Pm Hora fin 5:00 Pm

Powered by CamScanner

Miercoles 4 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: El dia de hoy se realiza recorrido de obra en presencia de contratista, interventoria y personal dela alcaldia local de usaquen, con el fin de revisar detalles a subsanar en senderos peatonales y zonas verdes

En horas dela tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio: 2:30pm Hora fin. 4:00pm

Nales Ann 21 INT.

CIERRE BITACORA.

INT.

4-06-2025.

Powered by CamScanner
