PALO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS

NIT. 901.835.570-9

BITÁCORA SANTANDER

Centro Empresarial Suramericana, Carrera 27 # 36-38. Oficina 209,
Bucaramanga, Santander. E-mail: palo.arquitecturaingenieria@gmail.com

29 de Noviembre de 2025.

Aún no se cuenta con el plan de contingencia para saber la fecha programada de instalación de señaléticas e instalación de cinta antideslizante para completar el 100% de ejecución del contrato.

Astrid Patricia Rentón Soleto
Residente Interventora

01 de Diciembre de 2025.

El contratista aún no informa la fecha para la ejecución de las actividades pendientes, se solicita al contratista disponer de manera prioritaria para poder completar el 100% de ejecución del contrato.

Astrid Patricia Rentón Soleto
Residente Interventora.

Powered by CamScanner

02 de Diciembre de 2025.

El contratista aún no realizo la instalación de señaléticas ni la instalación de cinta antideslizante para completar el 100% de ejecución de obra.

Astrid Patricia Rendón Sotelo
Residente Interventoria.

Arquitecto Residente

03 de Diciembre de 2025.

A la fecha el contratista no ha informado la fecha para la instalación de los señaléticos y la cinta antideslizante para completar el 100% del contrato. Se le solicita informar la fecha y hora para la ejecución de lo pendiente.

Astrid Patricia Rendón Sotelo
Residente Interventoría.

Arquitecto Residente

04 de Diciembre de 2025.

De acuerdo a comunicación con el director de obra, el día de mañana 05 de Diciembre de 2025 se realizara la instalación de senaleticas y cinta antideslizante, por lo cual el día de mañana la interventoria estara en el sitio para la respectiva verificación.

Astrid Patricia Rondón Sotelo
Residente Interventoria.

Arquitecto Residente

Powered by CamScanner

06 de Diciembre de 2025

No se realizan actividades en obra.

Astrid Patricia Rendón Sotelo

09 de Diciembre de 2025.

El día de hoy se cumple el plazo adicional otorgado al contrato. A la fecha, se identifican las siguientes actividades pendientes, las cuales deben ser ejecutadas para viabilizar el recibo final de la obra por parte de interventoría:

- Instalación de diez (10) unidades de señalética conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.
- Instalación de 30ml de cinta antideslizante.
- Reinstalación de polisombra que fue retirada para la ejecución de las actividades en el patio 3.
- Terminación de la aplicación de graniplas en el muro lateral izquierdo de caseta de planta eléctrica, específicamente en el tramo ubicado debajo de la imagen de la virgen.
- Cambio de dos (2) fichas de piso en el patio 3, suministradas por la señora registradora y es un favor solicitado.
- Instalación del bajante de la canal de la caseta de la planta eléctrica, el cual fue retirado por el personal de obra durante la ejecución de los trabajos.
- Realizar un último retoque de pintura en el muro lateral izquierdo del patio 2, en la parte baja.

Todas estas adecuaciones deben ser ejecutadas para que la interventoría pueda efectuar el recibo de la obra a satisfacción, y se solicita al contratista realizar estas actividades lo más pronto posible.

Astrid Patricia Rendón Sotelo
Residente Interventoría.

PALO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS

NIT. 901.835.570-9

BITÁCORA SILVIA

Centro Empresarial Suramericana, Carrera 27 # 36-38. Oficina 209,
Bucaramanga, Santander. E-mail: palo.arquitecturaingenieria@gmail.com

01 de Diciembre de 2025.

Estado del Tiempo: Mañana: Soleada.
Tarde: Nublada.

Personal en Obra: Arq. Andres Morales (Residente de Obra).
Miller Certuche Guerrero (Maestro).
Jhon Burgos Certuche (Oficial)
William Ramiro Bravo (Ayudante).

Actividades Realizadas: El día de hoy se ejecuta la fragua del piso de gres en el área intervenida. Se continua con las labores de adecuación del sistema eléctrico, incluyendo la instalación de lámparas según las especificaciones del proyecto. Se finalizan los trabajos correspondientes a la adecuación de cajetas de puertas. Se deja constancia que se encuentra pendiente la entrega del plan de trabajo actualizado por parte del contratista documento necesario para realizar el seguimiento detallado de las actividades restantes dentro del tiempo adicional autorizado mediante prorroga, cuyo vencimiento está establecido para el 09 de diciembre de 2025.

Astrid Patricia Rondón Sotelo
Residente Interventoria.

Powered by CamScanner

02 de Diciembre de 2005.

Estado del tiempo: Mañana: Seco Tarde: Seco.
Personal en Obra: Arq. Andres Morales (Residente de Obra)
Miller Cañuche Guerrero (Maestro)
Jhan Burgos Cañuche (Oficial)
William Ramiro Bravo (Ayudante).
Actividades Realizadas: Las labores ejecutadas el día de hoy son resanes y estuco en sala de computo y se realizo pintura tambien de esta area, se

instalan baldosas como remplazo de las que fueron o estaban danadas, se continua con el acabado de canteras donde instalaron puertas de vidrio, pintura de bancas de patio principal.

Astrid Patricia Rondon Sotelo
Residente Interventoria.


Arquitecto Residente.









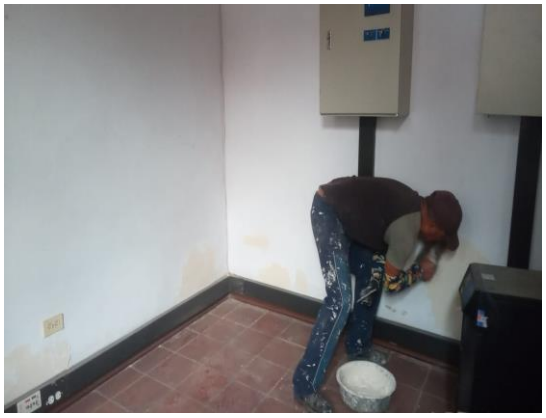



03 de Diciembre de 2025

Estado del tiempo: Mañana: Soleado

Tarde: Soleada.

Personal en Obra: Arq Andres Morales (Residente de Obra)

Miller Certuche Guerrero (Maestro)

Jhon Borgos Certuche (Oficial)

William Ramiro Bravo (Ayudante)

Actividades Realizados: El dia de hoy se instala cielo falso perimetral en patio principal, se termino de pintar sala de comedor y se realiza limpieza de este sitio y se realiza el traslado de cajas y elementos del patio principal a este sitio, se realiza la instalación de cielo falso en PVC en baño de patio principal.

Arquitecto Residente













04 de Diciembre de 2025.

Estado del tiempo: Mañana: Soleada.

Tarde: Soleada.

Personal en Obra: Arq. Andres Morales (Residente de Obra)

Miller Certuche Guerrero (Maestro).

Jhan Burgos Certuche (oficial)

William Ramiro Bravo (Ayudante).

BOSTON

Powered by CamScanner

Actividades Realizadas: El dia de hoy se realiza la instalación de planche en área donde se encuentra planta eléctrica, se realizo la instalación de lámparos, se comenzo a hacer la limpieza general del sitio con la limpeza del cielo raso, se realizo último bote de escombros

Astrid Patricia Rendón Sotelo
Residente Interventoria.

Arquitecto Residente

Powered by CamScanner













05 de Diciembre de 2025.

Estado del tiempo: Mañana. soleado Tarde: soleada

Personal en Obra: Arq. Andres Morales (Residente de Obra).
Miller Certuche Guerrero (Maestro).
Jhon Burgos Certuche (Oficial)
William Ramiro Bravo (Ayudante).

Actividades Realizadas: El dia de hoy se realizó la instalación del canal en el patio donde se encuentra ubicada la planta eléctrica, se finalizaron las actividades de instalación de lámparas y se realizo el aseo general, se continuo con la limpieza de piso. Con estas actividades se da por concluida la ejecución contractual La interventoría hará presencia el dia martes 09 de diciembre en la sede para la verificación de las actividades ejecutadas.

Ashid Patricia Rondon Sotelo
Residente Interventoria.

Powered by CamScanner













06 de Diciembre de 2025

Estado del tiempo: Mañana: Soleado Tarde: Soleado.
Personal en Obra: Miller Cortuche Guerrero (Maestro).
2. Ayudantes.
Actividades Realizadas: Se realiza el aseo general de la obra y se realiza la limpieza/mantenimiento de piso en greo.

Adrid Patricia Rendón Sotelo
Residente Interventoría.

09 de Diciembre de 2025.

Estado del tiempo: Mañana: Soleado Tarde: Soleado.
Personal en Obra: Miller Cortuche Guerrero (Maestro).
Jhon Burgos Cortuche (Oficial)
Actividades Realizadas: En la fecha de hoy el contratista ejecuta la instalación de guardaescobas en PVC en las oficinas de archivo, oficina registradora, área donde se encuentra planta eléctrica, patio principal y patio trasero de la OPIP. Asimismo, se recibe teja traslúcida correspondiente para su instalación en patio principal. A la fecha, se cumple el tiempo adicional otorgado al contrato; no obstante quedan actividades pendientes para verificación por parte de interventoría, las cuales se relacionan a continuación:
- Instalación de teja traslúcida en patio principal.
- Aplicación de pintura en canal instalado.
- Detalles finales de limpieza de piso.
- Instalación de señaléticas.

Se solicita al contratista adelantar estas actividades a la mayor brevedad posible, con el fin de permitir a la interventoría realizar la verificación para recibo final de obra.
Adrid Patricia Rendón Sotelo
Residente Interventoría.

BOSTON

Powered by CamScanner

PALO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS

NIT. 901.835.570-9


BITÁCORA CALI

Centro Empresarial Suramericana, Carrera 27 # 36-38. Oficina 209,
Bucaramanga, Santander. E-mail: palo.arquitecturaingenieria@gmail.com

59

Andres Granados, residente obra
Camilo Galindo, Director obra
Dayana Erazo, Profesional SST obra
Dany Cabezas, Profesional SST interventoria
Actividades: se realiza la pintura de los barandas de la cubierta y se realiza la instalación de estuco para nivelación en el area de instalación del Panel TIPO pista de atletismo en auditorio.

Julian Buitrago



01/12/2025

Clima: nublado,
Personal administrativo: Julian Buitrago residente int
Andres Granados, residente obra
Camilo Galindo, director obra
Dayana Erazo, Profesional SST obra
Dany Cabezas, Profesional SST interventoria
Personal operativo: Jose Leider Carvestro), Jaime

70


Anacona (ayudante)

Actividades: se instalan los divisiones en sala de lactancia, continuan con pintura de malla en acceso principal.

Observaciones:

El dia de hoy en la tarde no se permitio trabajar en la pintura de la malla exterior por los olores generados al interior de la oficina.

Julian Buitrago



Anacona (ayudante)

Actividades: se instalan los divisiones en sala de lactancia, continuan con pintura de malla en acceso Principal.

Observaciones:

El dia de hoy en la tarde no se permitio trabajar en la pintura de la malla exterior por los olores generados al interior de la oficina.

Julian Buitrago

02/12/2025

Clima: Soleado

Personal administrativo: Julian Buitrago, residente int

Andres Granados, residente Obra

Camilo Galindo, Director Obra

Dayana Anzola, Profesional SST Obra

Dany Cabezas, Profesional SST interventoria

Personal operativo: Jose Leider (maestro), Jaime Anacona

Norma

Powered by CamScanner

(ayudante), Carlos Carabal (instalador).

Actividades: Continuan actividades de resanes y detallados de pintura interiores, se realizan modificaciones en la puerta del deposito 1 ya que la instalación inical no permitia la instalación de paneles acanalados para completar el muro, en horas de la tarde tras finalizar jornada laboral continuan con pintura de malla al ingreso principal.

Julian Buitrago

03/11/2025

Clima: soleado

Personal administrativo: Julian Buitrago, residente ing. Andres Granados, residente obra

Camilo Galindo, Director obra

Dayana Erazo, Profesional SST obra

Dany Galeano, Profesional SST interventoria

Personal operativo: Jose Leider (maestro), Jaime Anaconda (oyudante), carlos Carabal (instalador).

Norma

Powered by CamScanner

Actividades: Al momento de intentar instalar el vinilo del piso sobre el estuco, se evidenció una textura en el estuco, por lo que se optó por corregirlo y pintar sobre el para evidenciar posibles desperfectos y se pospone la instalación del vinilo, se realiza la instalación de los resanes en marmol de los muebles en auditorio y sala de lactancia.

Julian Buitrago.

04/11/2025

Clima: soleado
personal administrativo: Julian Buitrago, residente ing
Andres Granados, residente obra
Camilo Calindo, Director Obra
Dayana Erazo, Profesional SST obra
Dany Cabezas, Profesional SST interventoria
Actividades: se realiza la pintura alrededor de la puerta en sala de lactancia, asi como los retoques en el cielo raso, se instalan y pintan los refuerzos en los barandas de las escaleras

Norma

Powered by CamScanner

de emergencia y en el exterior del auditorio, se realiza la instalación de luminarios adicionales en auditorio y un nuevo cambio en la puerta instalada en el depósito.

Julian Buitrago

Norma


Powered by CamScanner










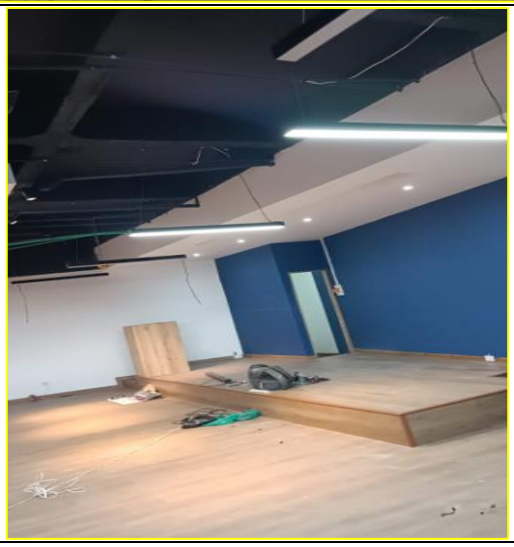


aquí tus ideas
Mucho



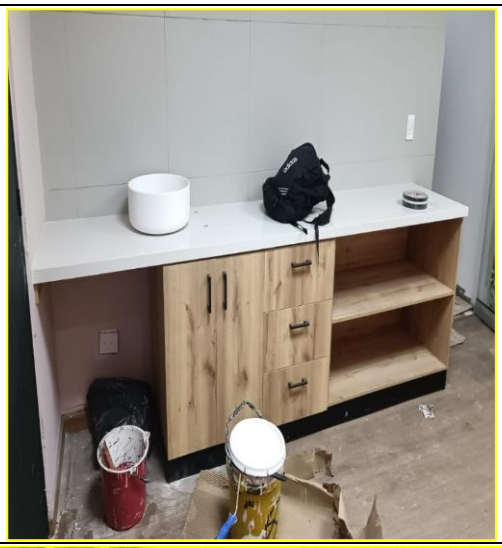




Santiago de Cali

de emergencia y en el exterior del auditorio, se realizo la instalacion de luminarios adicionales en auditorio y un nuevo cambio en la Puerta instalada en el deposito.


Julian Buitrago


05/12/2025

Clima: Soleado

Personal administrativo: Julian Buitrago, residente int
Andres granados, residente obra
Camilo salinda, Director obra
Daviana Erazo, Profesional SST obra
Dany Cabezas Profesional SST interventoria
Personal operativo: Jose leider (maestro), Jaine Anaconda (ayudante), Carlos Carabal (instalador).
Actividades: Se realiza la instalación de panel acanalado en puerta del deposito y resanes de pintura en el auditorio.

Julian Buitrago

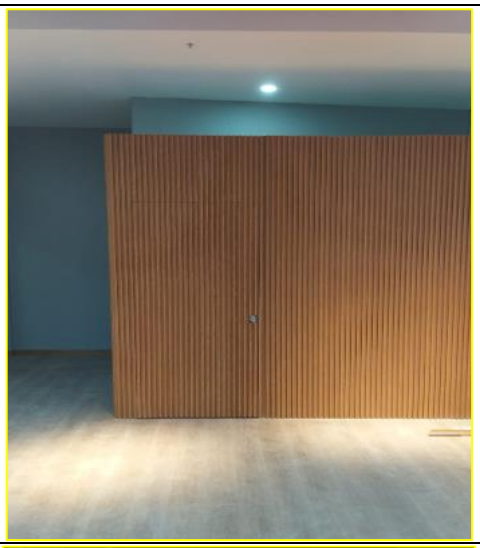

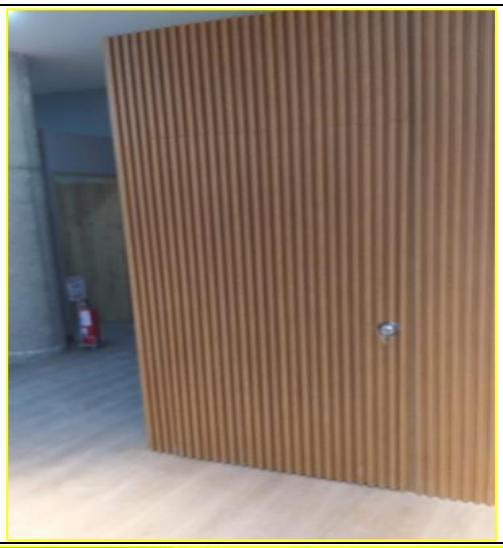








PALO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS

NIT. 901.835.570-9


BITÁCORA BUGA

Centro Empresarial Suramericana, Carrera 27 # 36-38. Oficina 209,
Bucaramanga, Santander. E-mail: palo.arquitecturaingenieria@gmail.com

Actividades: no se realizan actividades en obra
Scleima Gm



Domingo, 30 de noviembre del 2025
Clima: Soleado
Personal interventoria: Scleima Giran
Personal obra: Jean vasquez
Actividades: no se realizan actividades en obra.
Scleima Gm.



Lunes, 01 de diciembre del 2025

No se realizan actividades en obra
Scleima Gm

Norma

Powered by CamScanner

Martes 02 de diciembre del 2025

clima: ~~Sol~~ lluvioso
personal interventoria: Suleima Giron
Personal Obra: Juan Vasquez
Actividades: Se corrigen detalles de Pintura- Solici-
tados como correcciones tras ultima revisión de
la sede, el no se pudo realizar la intervención
en la cubierta central del ~~segundo~~ bloque
por lluvias.

Suleima Gm

miercoles 03 de diciembre del 2025

clima: soleado
Personal interventoria: Suleima Giron
personal obra: Juan Vasquez
actividades: se realiza el desmonte de la
cubierta arquitectonica y montaje de la teja
opalizada en la mitad del area a intervenir.
Suleima Gm

Norma

Powered by CamScanner

65

Jueves 04 de Diciembre de 2025

Clima soleado
Personal interventoria: Suleima Giron
Personal obra: Juan Vasquez
Actividades: se termina la instalación de la teja galizada en el bloque 2 y se realizan arreglos pendientes correspondientes a canalización de cableado.
Suleima GM

Viernes 05 de Diciembre de 2025

Clima soleado
No se presentan actividades en obra.
Suleima GM


PALO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS

NIT. 901.835.570-9

BITÁCORA PALMIRA

Centro Empresarial Suramericana, Carrera 27 # 36-38. Oficina 209,
Bucaramanga, Santander. E-mail: palo.arquitecturaingenieria@gmail.com

Nota: Se realizaron actividades de pintura interiores en la sede



Director de Obra

Lunes, 01 de diciembre de 2025

Clima: lluvioso

personal interventoria: Suleima Giron

personal obra: Juan Vasquez

Actividades: Se realizan actividades de resanes interiores en el corredor Por la zona del elevador.

Suleima Gm

Martes, 02 de diciembre de 2025

Clima lluvioso

personal interventoria. Suleima Giron

personal obra: Juan Vasquez

Actividades: Continuan actividades de resanes

Norma

Powered by CamScanner

y pintura al interior de la sede, en la zona de atención al público.
Suleima Gm

miercoles, 03 de diciembre de 2025

clima Soleado
Personal interventoria: Suleima Giron
Personal obra: Juan Vasquez
Actividades: Continuan labores de resane y pintura interior y resanes en el Patio interno

Suleima Gm

Jueves, 04 de diciembre de 2025

clima- Soleado
Personal interventoria. Suleima Giron
Personal obra: Juan Vasquez
Actividades: Continuan actividades de pintura interiores en los oficinas del segundo piso.
Suleima Gm

Powered by CamScanner

Viernes, 05 de diciembre de 2025

Clima: soleado

Personal interventoria: Suleima Giron

Personal obra: Juan Vasquez

Actividades: Continuan actividades de resanes y pintura interior y exterior en la sede, se le solicita al contratista corregir detalles de resanes en varias zonas, principalmente en filos de ventanas y elevador.

Suleima Gm

Norma

Powered by CamScanner













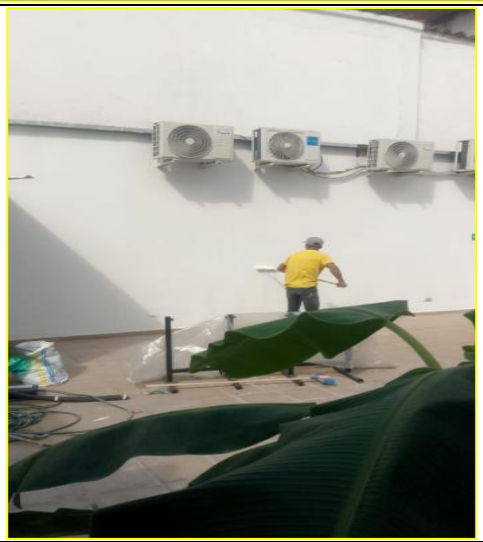

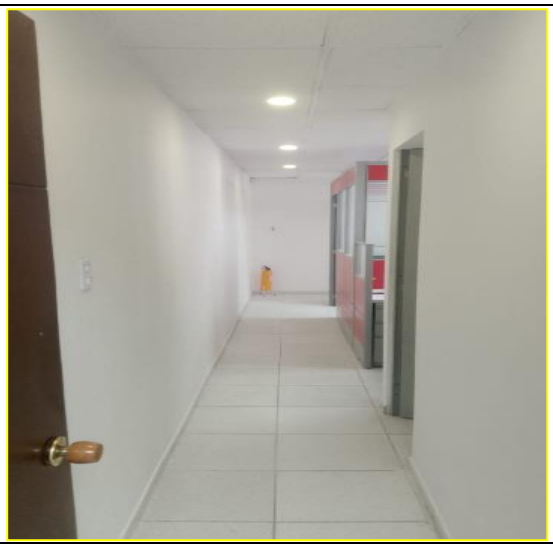PALO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS

NIT. 901.835.570-9

BITÁCORA PASTO

Centro Empresarial Suramericana, Carrera 27 # 36-38. Oficina 209,
Bucaramanga, Santander. E-mail: palo.arquitecturaingenieria@gmail.com

VIERNES. 28 DE NOVIEMBRE 2025 -

SE CONTINUA EN TALLER LA PINTURA FULL COLOR SOBRE PANELES METALICOS MICROPERFORADOS PARA FACHADA FLOTANTE TIPO HOOK.

~~MADARAS~~

RES. INTERVENTORIA.

SABADO, 29 DE NOVIEMBRE 2025

SE CONTINUA CON PINTURA FULL COLOR SOBRE PANELES METALICOS EN TALLER.

~~MADARAS~~

RES. INTERVENTORIA.

DOMINGO, 30 DE NOVIEMBRE 2025

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES.

~~MADARAS~~

RES. INTERVENTORIA.

LUNES, 01 DE DICIEMBRE 2025.

SE CONTINUA CON PINTURA FULL COLOR EN TALLER.

~~MADARAS~~

RES. INTERVENTORIA.

MARTES, 02 DE DICIEMBRE 2025.

SE CONTINUA CON PINTURA FULL COLOR EN TALLER

MADERAS.

RES. INTERVENTORIA.
