3007 POLIZAS DE OBRA

Tunja 7 de noviembre de 2025

CERTIFICACIÓN:

El Consorcio Tunja JI 2 titular del contrato 1639 de 2023, en cumplimiento de sus funciones como interventor del contrato 1557 de 2023 certifica bajo la gravedad de juramento, que las pólizas de Garantía Nº 3002310 anexo 14 y Póliza de Responsabilidad Nº 1008211 anexo 13 del contrato 1557 de 2023, emitidas por Previsora de Seguros, se encuentran vigentes y cumplen con los requisitos contractuales según la última modificación No 4 al contrato de obra y se encuentran aprobadas por la entidad contratante mediante acta de aprobación de pólizas del 11 de Julio de 2025 publicada en la página SECOP:

Tabla 1 Relación Pólizas del Contratista

Póliza No	Amparo	% Requerido	Valor Asegurado	Vigencia Requerida	Vigencia	
					Desde	Hasta
3002310 anexo 13	Cumplimiento	20% Contrato	2.825.789.562.00	Hasta Liquidación del Contrato	17-07-2023	07-05-2026
	Salarios y Prestaciones	20% Contrato	2.825.789.562.00	Plazo de contrato y 3 años mas	17-07-2023	07-11-2028
	Estabilidad y Calidad de la Obra	20% Contrato	2.825.789.562.00	5 años a partir del Recibo de la Obra	27-02-2025	27-02-2030
1008211 anexo 12	Predios Labores y Operaciones		711.750.000.00	Periodo de ejecución	18-09-2025	07-11-2025
	Daño Emergente		711.750.000.00		18-09-2025	07-11-2025
	Lucro Cesante		711.750.000.00		18-09-2025	07-11-2025
	RC Extracontractual Derivada	Deducible 10% del valor de la perdida	711.750.000.00		18-09-2025	07-11-2025
	Cobertura RC Contratistas y Subcontratistas	Deducible 10% del valor de la perdida	711.750.000.00 anual o 355.875.000 individual		18-09-2025	07-11-2025
	Cobertura Patronal	Deducible 10% del valor de la perdida	711.750.000.00 anual o 355.875.000 individual		18-09-2025	07-11-2025
	Cobertura RC Vehículos Propios y NO por	Deducible 10% del valor de la perdida	711.750.000.00 anual o 355.875.000 individual		18-09-2025	07-11-2025
	Gastos Médicos		213.525.000.00		18-09-2025	07-11-2025

Póliza No	Amparo	% Requerido	Valor Asegurado	Vigencia Requerida	Vigencia	
					Desde	Hasta
	Gastos Judiciales y de Defensa	Deducible 10% del valor de la perdida	711.750.000.00		18-09-2025	07-11-2025

Atentamente



César Augusto Palacios
Director de Interventoría
Cto. 1636 de 2023.

3009 CUMPLIMIENTO DE AFILIACIONES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES DE OBRA

Tunja 7 de noviembre de 2025

CERTIFICACIÓN:

El Consorcio Tunja JI 2 en su calidad de interventor mediante el contrato 1639 de 2023 certifica, bajo la gravedad de juramento que el consorcio Hayuelos ha cumplido con las afiliaciones y aportes de seguridad social, riesgos profesionales y parafiscales de conformidad con la normatividad vigente a la fecha, así mismo se indica que se revisó el cálculo el cálculo de la liquidación de los aportes por concepto de seguridad social y parafiscales a que está obligado el contratista, verificando que todo el personal vinculado al contrato 1557 de 2023 esté incluido dentro de dichas planillas y que aspectos como el del ingreso base de cotización que se registra en las planillas de pago de seguridad social corresponde al salario que efectiva y realmente se le está pagando:

Atentamente



Cesar Augusto Palacios
Director de Interventoría
Cto. 1636 de 2023.

3010 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Tunja 7 de noviembre de 2025

CERTIFICACIÓN:

El Consorcio Tunja JI 2 en su calidad de interventor mediante el contrato 1639 de 2023 da fe del cumplimiento de especificaciones técnicas, calidad de material y procesos constructivos de las actividades desarrolladas en obra a la fecha por parte del contratista de Obra Consorcio Hayuelos.

Atentamente



Cesar Augusto Palacios
Director de Interventoría
Cto. 1636 de 2023.

3011 CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

Tunja 7 de noviembre de 2025

CERTIFICACIÓN:

El Consorcio Tunja JI 2 en su calidad de interventor mediante el contrato 1639 de 2023 da fe que se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, uso de elementos de protección personal, etc.) para las actividades realizadas hasta la fecha.

Atentamente



Cesar Augusto Palacios
Director de Interventoría
Cto. 1636 de 2023.

3012 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

Tunja 7 de noviembre de 2025

CERTIFICACIÓN:

El Consorcio Tunja JI 2 en su calidad de interventor mediante el contrato 1639 de 2023 da fe que a la fecha se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales).

Atentamente



Cesar Augusto Palacios
Director de Interventoría
Cto. 1636 de 2023.

3013 CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO.

Tunja 7 de noviembre de 2025

CERTIFICACIÓN:

El Consorcio Tunja JI 2 en su calidad de interventor mediante el contrato 1639 de 2023 da fe que a la fecha se ha cumplido con la implementación y ejecución del Plan de Manejo de Trafico según lo aprobado por la secretaria de movilidad de Tunja por parte del contratista de Obra Consorcio Hayuelos.

Atentamente



Cesar Augusto Palacios
Director de Interventoría
Cto. 1636 de 2023.

3014 CUMPLIMIENTO DE PERFILES PROFESIONALES Y DEDICACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN ESTUDIO PREVIO, PLIEGO DE CONDICIONES, Y CONTRATO.CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO.

Tunja 7 de noviembre de 2025

CERTIFICACIÓN:

El Consorcio Tunja JI 2 en su calidad de interventor mediante el contrato 1639 de 2023 certifica que el consorcio Hayuelos, contratista de obra, a la fecha cuenta con el personal mínimo requerido en las dedicaciones y calidades profesionales de acuerdo a los requisitos exigidos en los estudios previos, los pliegos de condiciones y el contrato de obra 1557 de 2023, Adicionalmente y acorde con las actividades desarrolladas a la fecha se ha verificado en obra la presencia del personal técnico y operativo requerido para las actividades realizadas hasta la fecha.

Atentamente



Cesar Augusto Palacios
Director de Interventoría
Cto. 1636 de 2023.

3015 CUMPLIMIENTO DE DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN ESTUDIO PREVIO, PLIEGO DE CONDICIONES, Y CONTRATO.

Tunja 7 de noviembre de 2025

CERTIFICACIÓN:

El Consorcio Tunja JI 2 en su calidad de interventor mediante el contrato 1639 de 2023 da fe que a la fecha el contratista de obra Consorcio Hayuelos, cuenta con la disponibilidad de maquinaria y equipos, de acuerdo con los requisitos exigidos en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato 1557 de 2023.

Atentamente



Cesar Augusto Palacios
Director de Interventoría
Cto. 1636 de 2023.

3016 CONSTANCIA DE ENTREGA DE PLANOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES, ESTUDIOS, CÁLCULOS Y ESPECIFICACIONES AL CONTRATISTA, EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA.

(ACTUALMENTE NO PRESENTA MODIFICACIONES)

Tunja 7 de noviembre de 2025

CERTIFICACIÓN:

El Consorcio Tunja JI 2 en su calidad de interventor mediante el contrato 1639 de 2023 certifica que el contratista de obra, Consorcio Hayuelos, tiene en su poder los planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones vigentes, de los cuales a la fecha no se ha generado ningún ajuste ni complementación y que corresponden con las actividades de construcción desarrolladas y la base de los cálculos presupuestales del proyecto

Atentamente



Cesar Augusto Palacios
Director de Interventoría
Cto. 1636 de 2023.

3023 REGISTRO FOTOGRÁFICO

(FOLIO 95 DEL INFORME DE INTERVENTORIA)

Cargue y retiro de obra formaleta metálica	Suministro e instalación tableta toperol en espacio público del Eje 1, sector Postobón





Compactación capa de sub base en el espacio público del Eje 1, sector Postobón	Excavación para bordillo de confinamiento en el espacio público del Eje 1, sector Postobón





Suministro y descargue en obra adoquín prefabricado para el espacio público del Eje 1, sector Postobón	Compactación capa de sub base en la calzada sur del Eje 1, sector Intermedio





Suministro, instalación y amarre del acero de refuerzo sobre el tablero del puente de 30m, Eje 1	Demarcación y señalización provisional de obra junto al paso férreo Bogotá-Belencito





Demarcación y señalización provisional de obra junto al paso férreo Bogotá-Belencito	Suministro e instalación bordillo prefabricado en el espacio público del Eje 1, sector Postobón





SEMANA 88

(11 AGOSTO DE 2025 – 17 AGOSTO DE 2025)

Instalación loseta y adoquín sobre anden sur del Eje 1	Demarcación y señalización vial provisional de obra
	

Instalación y amarre acero de refuerzo tablero puente 30m	Instalación y barrido arena sobre acabado de anden Eje 1
	

Suministro en obra materiales granulares calzada sur Cl 59	Excavación para caja de vía en calzada sur Cl 59
	

Conformación capa de sub base en calzada sur Cl 59	Suministro en obra materiales granulares calzada sur Cl 59





Instalación y amarre acero de refuerzo tablero puente 30m	Conformación capa de sub base en calzada sur Cl 59





Instalación y amarre acero de refuerzo New Jersey Pte. 30m	Excavación sobre espacio publico calzada sur Cl 59, K0+080





Excavación sobre espacio público calzada sur Cl 59, K0+000	Conformación afirmado en espacio público Eje 1 Cl 59





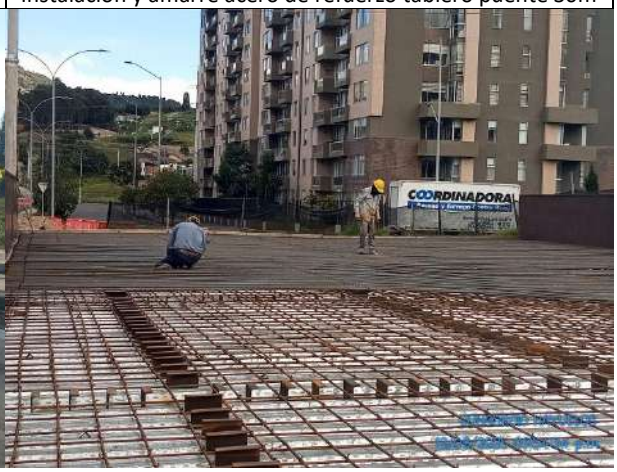
Conformación, extendida y compactación afirmado en espacio público Eje 1 Cl 59, K0+080



Compactación afirmado sobre anden sur del Eje 1	Desinfección y limpieza unidad sanitaria en obra





Desinfección y limpieza unidad sanitaria en obra	Instalación y amarre acero de refuerzo tablero puente 30m
	

Extendida afirmado en espacio público Eje 1 Cl 59, K0+000	Instalación loseta guía y toperol sobre anden sur del Eje 1
	

SEMANA 89

(18 AGOSTO DE 2025 – 24 AGOSTO DE 2025)

Mejoramiento subrasante natural con piedra rajón calzada sur calle 59, sector Hayuelos	Localización y replanteo calzada y espacio público sobre puente luz 30m
	

Retiro de cobertura vegetal sobre espacio público Eje 1	Visita Concesionario ANI paso a nivel Eje 1





Estampado del concreto en anden sobre Pte. luz 30m	Suministro en obra piedra rajón en Eje 1, sector Hayuelos





Reunión con propietario de predios sector Hayuelos	Suministro en obra afirmado en Eje 1, sector Hayuelos





Compactación capa mejoramiento Eje 1, sector Hayuelos	Desinfección y limpieza de unidad sanitaria en obra





Instalación bordillo A-80, anden Eje 1, sector Postobón	Afinado y terminado concreto tablero Pte. L=30m





Extendida capa mejoramiento Eje 1, sector Hayuelos	Jornada de orden y aseo en obra





Excavación manual en anden Eje 1, sector Postobón	Excavación para caja de vía en Eje 1, sector Hayuelos





Suministro en obra piedra rajón en Eje 1, sector Hayuelos	Extendida y nivelación concreto tablero Pte. L=30m





Estampado de concreto en ciclorruta puente luz 30m, Eje 1	Instalación ductos para drenaje del puente luz 30m, Eje 1





Suministro y bombeo concreto tablero Pte. L=30m, eje 1	Suministro y bombeo concreto tablero Pte. L=30m, eje 1





Control de calidad, muestras concreto 28MPa	Extendida y nivelación concreto tablero Pte. L=30m





Perfilado piso para solado de limpieza losas aproximación	Localización y replanteo new jersey puente luz 30m, Eje 1





Visita de obra Concesionario e Interventor de la ANI	Comité de seguimiento en obra N°86



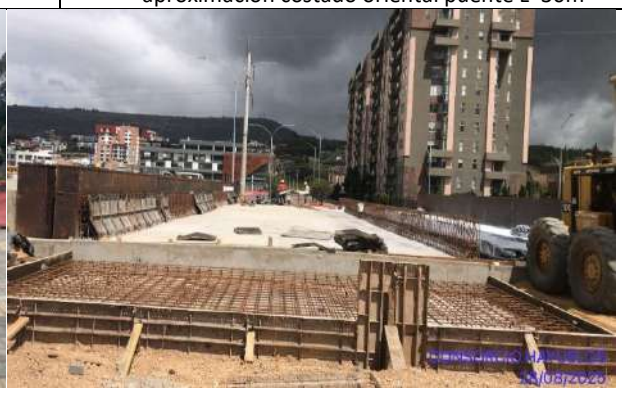


SEMANA 90

(25 AGOSTO DE 2025 – 31 AGOSTO DE 2025)

Visita y recorrido de obra con Personería y Secretaria de Infraestructura de Tunja	Encofrado para vaciado de concreto en losa de aproximación costado oriental puente L=30m



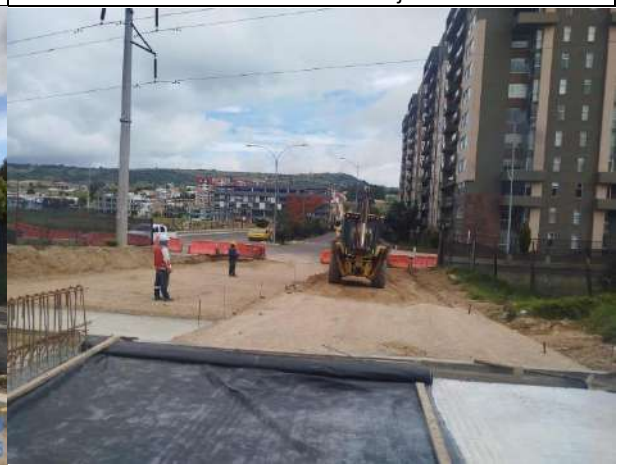


Instalación elementos prefabricados en anden aledaño a calzada sur de Cl 59	Vaciado de concreto para solado de limpieza en losa de aproximación costado oriental puente L=30m

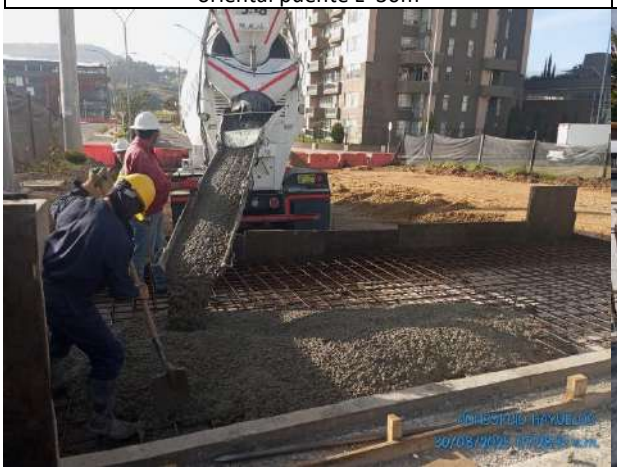




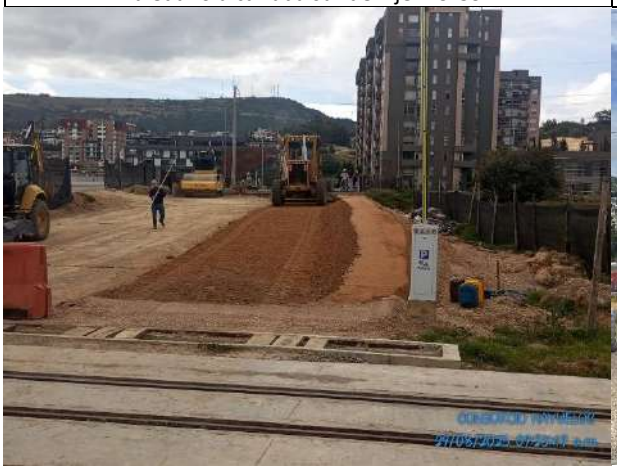
Instalación y amarre acero de refuerzo en losa de aproximación costado oriental puente L=30m	Instalación formaleta metálica para New Jersey del borde izquierdo de calzada sur en puente L=30m
	

Procedimiento para desinfección y limpieza de la unidad sanitaria portátil en obra	Extendida material de afirmado sobre espacio público aledaño a calzada sur del Eje 1 Cl 59
	

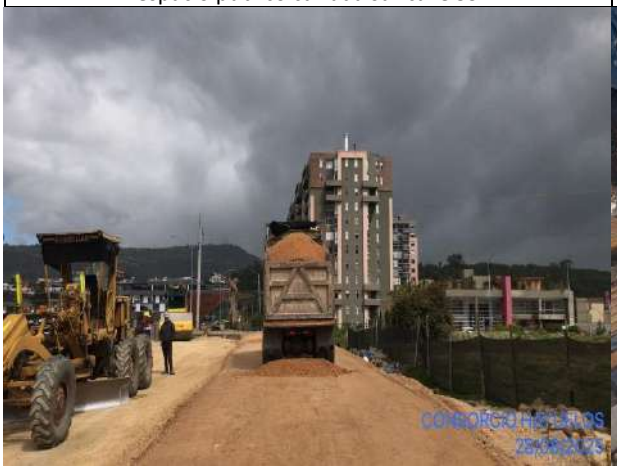
Extendida material de afirmado sobre espacio público aledaño a calzada sur del Eje 1 Cl 59	Instalación elementos prefabricados en anden aledaño a calzada sur de Cl 59
	

Vaciado de concreto para losa de aproximación costado oriental puente L=30m	Instalación y amarre acero de refuerzo en losa de aproximación costado oriental puente L=30m
	

Suministro en obra material granular tipo sub base, calzada sur calle 59	Compactación material de afirmado sobre espacio público aledaño a calzada sur del Eje 1 Cl 59
	

Extendida material de afirmado sobre espacio público aledaño a calzada sur del Eje 1 Cl 59	Suministro en obra material granular tipo afirmado, espacio público calzada sur calle 59
	

Procedimiento para desinfección y limpieza de la unidad sanitaria portátil en obra	Instalación formaleta metálica para New Jersey del borde izquierdo de calzada sur en puente L=30m
	

Suministro en obra material granular tipo afirmado, espacio público calzada sur calle 59	Instalación elementos prefabricados en anden aledaño a calzada sur de Cl 59
	

Visita y recorrido de obra con Personería y Secretaria de Infraestructura de Tunja	Nivelación y terminado de concreto en losa de aproximación costado oriental puente L=30m
	

Suministro y vaciado de concreto en losa de aproximación costado occidental puente L=30m	Vaciado de concreto para solado de limpieza en losa de aproximación costado occidental puente L=30m
	

Control de calidad mediante toma de densidades en terreno capas granulares	Compactación material de afirmado sobre espacio público aledaño a calzada sur del Eje 1 Cl 59
	

SEMANA 91

(01 SEPTIEMBRE DE 2025 – 07 SEPTIEMBRE DE 2025)

Realce cajas de inspección red semafórica en espacio público Eje 1, sector Postobón	Compactación capa de afirmado en espacio público Eje 1, sector Intermedio
	

Construcción New Jersey B. Izq. calzada Pte. 30m, en Eje 1	Compactación capa SBG calzada Eje 1, sector Hayuelos
	

Extendida SBG calzada Eje 1, sector Hayuelos	Toma densidades afirmado E. Pub. Eje 1, sector Intermedio
	

Intervención del espacio público Eje 1, sector Intermedio	Suministro de elementos prefabricados en obra
	

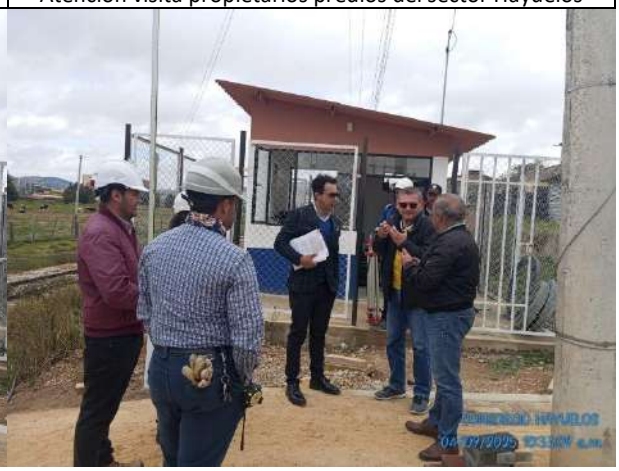
Intervención espacio público Eje 1, sector Postobón	Instalación capa de SBG en E. Pub. Eje 1, sector Hayuelos
	

Encofrado del New Jersey B. izq. calzada Pte. 30m, en Eje 1	Conformación capa SBG E. Pub. Eje 1, sector Postobón
	

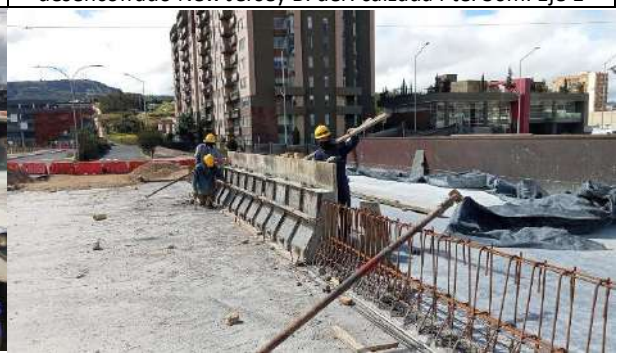
Intervención separador central Eje 1, sector Postobón	Conformación capa SBG calzada Eje 1, sector Hayuelos
	

Toma densidades SBG calzada Eje 1, sector Intermedio	Alistamiento del New Jersey B. der. calzada Pte. 30m. Eje 1
	

Encofrado del New Jersey B. der. calzada Pte. 30m. Eje 1	Intervención del espacio público Eje 1, sector Hayuelos
	

Atención visita propietarios predios del sector Hayuelos	Atención visita propietarios predios del sector Hayuelos
	

Intervención del espacio público Eje 1, sector Postobón	Compactación afirmado en calzada Eje 1, sector Hayuelos
	

Suministro de elementos prefabricados en obra	desencofrado New Jersey B. der. calzada Pte. 30m. Eje 1
	

SEMANA 92

(08 SEPTIEMBRE DE 2025 – 14 SEPTIEMBRE DE 2025)

A continuación, se relaciona la reseña fotográfica con lo expuesto anteriormente:

Construcción espacio público Eje 1, sector Postobón	Conformación capa de SBG en espacio público Eje 1, sector Intermedio
	

Instalación sardinel A-10 en espacio público Eje 1, sector Intermedio	Suministro de materiales prefabricados en obra para la construcción del espacio público en Cl 59





Instalación Geotextil y SBG en espacio público Eje 1, sector Intermedio	Suministro en obra material BG en calzada Eje 1, sector Intermedio

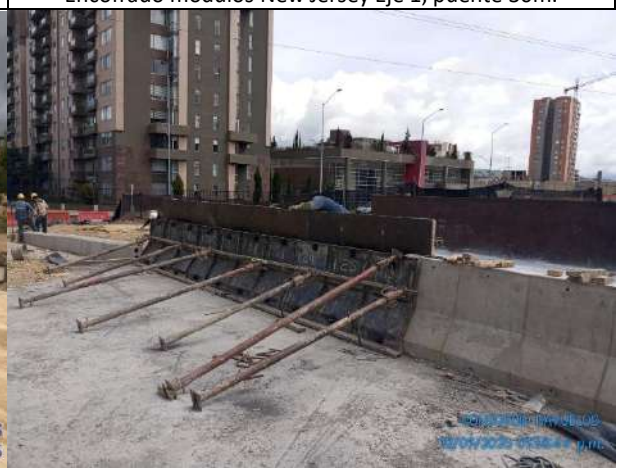




Construcción espacio público Eje 1, sector Hayuelos	Construcción New Jersey Eje 1, puente 30m.





Sopleteo espacio público Eje 1, sector Postobón	Encofrado módulos New Jersey Eje 1, puente 30m.
	

Suministro de materiales prefabricados en obra para la construcción del espacio público en Cl 59	Desinfección y limpieza unidad sanitaria móvil en obra calle 59
	

Desencofrado módulos New Jersey Eje 1, puente 30m.	Suministro en obra material BG en calzada Eje 1, sector Intermedio
	

Visita funcionarios Secretaría de Movilidad de Tunja y apoyo de la Supervisión del proyecto	Imprimación capa de SBG en ciclorruta del espacio público Eje 1, sector Postobón





Extendida y nivelación capa de MDC en ciclorruta del espacio público Eje 1, sector Postobón	Compactación capa de MDC en ciclorruta del espacio público Eje 1, sector Postobón





Instalación Bordillo A-80 en espacio público Eje 1, sector Intermedio	Construcción desagüe para sumidero BD Cl 59 Eje 1. K0+188





Corte pavimento desagüe sumidero en Cl 59 Eje 1. K0+188	Construcción del espacio público Eje 1, sector Intermedio
	

Excavación para desagüe y sumidero BD Cl 59 Eje 1. K0+188	Construcción desagüe para sumidero BD Cl 59 Eje 1. K0+188
	

Verificación cumplimiento y avance de obra civil para semaforización de la calle 59	Suministro en obra MDC para carpeta de ciclorruta en espacio público Eje 1, sector Postobón
	

SEMANA 93

(15 SEPTIEMBRE DE 2025 – 21 SEPTIEMBRE DE 2025)

Construcción anden peatonal en el espacio público Eje 1, sector Hayuelos	Visita de obra Supervisores del Contrato 1557-2023 y Convenio Interadministrativo 1940-2025





Suministro en obra materiales granulares, sector Hayuelos	Instalación sardinel prefabricad A-10, sector Intermedio





Construcción New Jersey B. Derecho Puente 30m en Eje 1	Conformación capa BG, calzada Eje 1- Sector Intermedio





Desencofrado New Jersey puente 30m., Eje 1	Excavación para bordillo ciclorruta Eje 1, sector Intermedio





Instalación bordillo A-80 ciclorruta Eje 1, sector Intermedio	Instalación loseta guía anden Eje 1, sector Hayuelos





Encofrado del New Jersey sobre puente 30m., Eje 1	Construcción anden espacio público Eje 1, sector Hayuelos





Encofrado del New Jersey sobre puente 30m., Eje 1	Desinfección y limpieza unidad sanitaria móvil





Construcción lleno estructural sobre drenaje para el sumidero del Eje 1, sector Hayuelos	Acopio de material granular tipo BG en obra





Compactación capa de SBG en el espacio público Eje 1, sector Intermedio	Visita de obra Concesionario e Interventor del proyecto ferroviario Bogotá-Belencito





Compactación capa de BG en la calzada del Eje 1, sector Intermedio	Construcción sumidero lateral B. Izquierdo calzada del Eje 1-K0+188





Instalación sardinel A-10 Borde Izquierdo calzada Eje 1, sector Intermedio	Control de calidad mediante toma de muestras de concreto en obra





Desinfección y limpieza unidad sanitaria móvil	Cargue y retiro de obra elementos de formaleta metálica





SEMANA 94

(22 SEPTIEMBRE DE 2025 – 28 SEPTIEMBRE DE 2025)

Construcción caja de inspección para canalización red semafórica calzada sur (Eje 1), sector Hayuelos	Construcción del espacio público aledaño a la calzada sur (Eje 1) de la calle 59
	

Construcción caja del sumidero en B. Derecho calzada sur (Eje 1), sector Hayuelos	Preparación en obra mezcla de concreto en volúmenes menores
	

Compactación capa de Base Granular en calzada sur (Eje 1) de Cl 59, sector Intermedio	Instalación sardinel A-10 en B. Izquierdo calzada sur (Eje 1), sector Hayuelos
	

Conformación y cereo capa de Base Granular en calzada sur (Eje 1), sector Intermedio


Desinfección y limpieza unidad sanitaria móvil en obra	Construcción caja del sumidero en B. Derecho calzada sur (Eje 1), sector Hayuelos
	

Humectación capa de Base Granular en calzada sur (Eje 1) de Cl 59, sector Intermedio	Construcción del espacio público aledaño a la calzada sur (Eje 1) de la calle 59
	

Instalación bordillo de confinamiento A-80 ciclorruta del espacio publico eje 1, sector Intermedio	Conformación capa de Base Granular junto al paso a nivel en la calzada sur (Eje 1) de la calle 59





Conformación y cereo capa de Base Granular en calzada sur (Eje 1), sector Intermedio	Suministro en obra baranda metálica para New Jersey en puente de luz 30m





Construcción caja del sumidero en B. Derecho calzada sur (Eje 1), sector Hayuelos	Construcción caja de inspección para canalización red semafórica calzada sur (Eje 1), sector Hayuelos





Construcción caja del sumidero en B. Derecho calzada sur (Eje 1), sector Hayuelos



SEMANA 95

(29 SEPTIEMBRE DE 2025 – 05 OCTUBRE DE 2025)

Suministro Base Granular en obra calzada sur Cl 59	Instalación baranda metálica en New Jersey Pte. 30m





Excavación para sardinel A-10 calzada sur Cl 59	Instalación Bordillo A-80 en espacio público sur de Calle 59





Verificación cumplimiento cronograma de obra	Conformación materiales granulares espacio publico Cl 59
	

Limpieza caja eléctrica existente en Eje 1, sector Hayuelos	Conformación materiales granulares calzada sur Cl 59
	

Llenos estructurales junto a caja eléctrica Esp. Publ. Cl 59	Aprovechamiento del material RDC
	

Conformación materiales granulares calzada sur Cl 59	Jornadas de limpieza, orden y aseo en obra Cl 59
	

Construcción espacio publico en Eje 1 de la Cl 59	Aprovechamiento del material RDC
	

Construcción espacio público en Eje 1 de la Cl 59	Aprovechamiento del material RDC
	

Aprovechamiento del material RDC	Construcción espacio público en Eje 1 de la Cl 59
	

Construcción espacio público en Eje 1 de la Cl 59	Construcción espacio público en Eje 1 de la Cl 59
	

Aprovechamiento del material RDC	Humectación capa de Base Granular en Eje 1 de Cl 59
	

Aprovechamiento del material RDC	Aprovechamiento del material RDC
	

Construcción espacio público en Eje 1 de la Cl 59	Construcción separador central en Ejes 1 y 2 de la Cl 59
	

Llenos estructurales sumidero y descole K0+188 del Eje 1	Reconstrucción caja y canalización red eléctrica Hayuelos
	

SEMANA 96

(06 OCTUBRE DE 2025 – 12 OCTUBRE DE 2025)

Aseo, limpieza y sopleteo áreas a pavimentar calzada Eje 1	Imprimación capa BG Cl 59 Sector Hayuelos Eje 1
	

Reinstalación poste de Alumbrado Público separador Cl 59	Corte de pavimento flexible para empalmes nuevos
	

Aseo, limpieza y desinfección unidad sanitaria móvil Cl 59	Construcción andenes espacio público calzada sur, eje 1
	

Construcción andenes espacio público calzada sur, eje 1	Aseo, limpieza y sopleteo áreas a pavimentar calzada Eje 1
	

Construcción andenes espacio público calzada sur, eje 1	Extendida y nivelación carpeta con mezcla asfáltica Cl 59
	

Acabado final concreto estampado espacio Publ. Pte. 30m	Sello y compactación carpeta con mezcla asfáltica Cl 59
	

Construcción andenes espacio público calzada sur, eje 1	Suministro en obra volco con mezcla asfáltica para Eje 1
	
Imprimación capa BG Cl 59 Sector Intermedio Eje 1	Extendida carpeta con mezcla asfáltica Sector Intermedio
	
Toma de densidades en campo capa de BG Cl 59, Eje 1	Construcción andenes espacio público calzada sur, eje 1
	

Construcción andenes espacio público calzada sur, eje 1	Limpieza concreto estampado espacio público Pte. 30m
	

SEMANA 97

(13 OCTUBRE DE 2025 – 19 OCTUBRE DE 2025)

Visita y recorrido de obra con supervisores del proyecto	Construcción espacio público Eje 1 de Cl 59, Hayuelos
	

Aseo, desinfección y limpieza unidad sanitaria móvil	Construcción espacio público Eje 1 de Cl 59, Hayuelos
	

Conformación capa SBG ciclorruta espacio público Eje 1	Construcción espacio público sector Intermedio Eje 1, Cl 59
	
Compactación capa SBG ciclorruta espacio público Eje 1	Compactación capa SBG ciclorruta espacio público Eje 1
	
Construcción espacio público Eje 1 de Cl 59, Hayuelos	Imprimación losa puente 30m., Eje 1 Cl 59
	

Suministro en obra mezcla asfáltica para rodadura Cl 59	Extendida mezcla asfáltica capa rodadura en Pte. 30m





Compactación mezcla asfáltica capa rodadura en Pte. 30m	Extendida mezcla asfáltica ciclorruta sector Intermedio





Compactación mezcla asfáltica ciclorruta sector Intermedio	Construcción resalto parabólico sector Hayuelos Cl 59





ELABORO:

Javier Mauricio Rodríguez Rivera
Residente de Obra

REVISO:

Richard Alexander Acosta
Residente de interventoría
