INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 8



CONSORCIO INGENIO VIAL

CONTRATO DE OBRA STM-LP-008-2025

Versión 1

PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE

BOGOTÁ, D.C OCTUBRE DEL 2025

Revisión	Descripción	Numerales que cambian de la anterior revisión	Fecha
1	Primera versión del informe mensual	Versión 1	06/11/2025
2	Segunda versión del informe mensual	Versión 2	10/12/2025




Firma			
Nombre	Ing. Daniel Castilla	Ing. Alexander Gómez	Ing. Héctor Gómez
Cargo	Ingeniero Residente	Especialista En Tránsito y Transporte	Director de Obra
	Elaboró	**Elaboró**	**Revisó**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 6

2.1. ENTIDAD CONTRATANTE 6
2.2. CONTRATISTA 7
2.3. INTERVENTORÍA 7

3. PERIODO DE REPORTE 7

4. BALANCE TÉCNICO DEL CONTRATO 8

4.1. ESTADO DE AVANCE DE LAS FASES Y PRODUCTOS REQUERIDOS DEL CONTRATO. 8
4.2. AVANCE DE VISITAS TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO A LOS PUNTOS ASIGNADOS 11
4.3. GESTIÓN, AVANCES Y PARTICULARIDADES SOBRE LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO TRAMITADOS POR PUNTO/TRAMO. 12
4.4. ESTADO (POR EJECUTAR, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS) Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PUNTO/TRAMO. 12
4.5. RESULTADO DE LAS MATRICES DE DURACIÓN EXIGIBLE POR PUNTO A INTERVENIR. 13
4.6. REPORTE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y FORMATOS DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS EQUIPOS, MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE CONTROL DE OBRA. 13
4.7. REPORTE DE LA SEÑALIZACIÓN RETIRADA DE VÍA Y ENTREGADA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES. 14
4.8. INVENTARIO DETALLADO Y LISTADO DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS CON SUS CANTIDADES, DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM, Y OBSERVACIONES. 14
4.9. REPORTE ESTADÍSTICO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR MUNICIPIO E INSTITUCIÓN BENEFICIADA. 15
4.10. ASPECTOS TÉCNICOS, MODIFICACIONES SURGIDAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS. 18
4.11. COPIA DE BITÁCORA 18

5. BALANCE AMBIENTAL Y SST 18

5.1. PERMISOS LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES AMBIENTALES 18
5.2. REPORTE DE INCIDENTES Y ACONTECIMIENTOS 19
5.3. INFORME AMBIENTAL Y SST 19
5.4. SOPORTE DE PAGO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL 19

6. BALANCE SOCIAL 19

6.1. VINCULACIÓN POBLACIÓN VULNERABLE 20
6.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 21

7. BALANCE FINANCIERO 23

7.1. META CONTRACTUAL Y SU ESTADO FINANCIERO 26

8. BALANCE JURÍDICO 27

8.1. ESTADO DE LAS PÓLIZAS 27
8.2. ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES 27

9. BALANCE ADMINISTRATIVO 29

9.1. ACTAS DE REUNIÓN 29

9.2. COMITÉS DE SEGUIMIENTO 29
9.3. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 29
9.4. PQR´S TRAMITADOS 33

10. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 34

11. ANEXOS 34

LISTA DE TABLAS

TABLA 1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 6
TABLA 2 DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 6
TABLA 3 DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA 7
TABLA 4 DATOS GENERALES DE LA INTERVENTORÍA 7
TABLA 5 ESTADO DE AVANCE DE LAS FASES Y PRODUCTOS REQUERIDOS 8
TABLA 6 MUNICIPIOS VISITADOS Y SUS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS 11
TABLA 7 PMT TRAMITADO 12
TABLA 8 VISITAS Y EJECUTADO 12
TABLA 9 CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS 13
TABLA 10 ACCIONES REALIZADAS VS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 15
TABLA 11 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LO IMPLEMENTADO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 16
TABLA 12 POBLACIÓN VINCULADA PARA EL CONTRATO PERTENECIENTE AL CONSORCIO INGENIO VIAL 20
TABLA 13 SOCIALIZACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 22
TABLA 14 CIERRE DE SOCIALIZACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 22
TABLA 15 ESTADO FINANCIERO DEL COMPONENTE DE OBRA 23
TABLA 16 META CONTRACTUAL Y SU ESTADO FINANCIERO 26
TABLA 17 ESTADO DE LAS PÓLIZAS 27
TABLA 18 MODIFICACIONES EN LOS DISEÑOS 28
TABLA 19 COMITÉS DE SEGUIMIENTO 29
TABLA 20 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 30
TABLA 21 PQRS 34

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1 MATRICES DE GARANTÍAS 34
ANEXO 2 BITÁCORA 34
ANEXO 3 INFORME AMBIENTAL 34
ANEXO 4 ACTAS DE REUNIÓN 34
ANEXO 5 PAGO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL 34
ANEXO 6 INFORME SG-SST 34
ANEXO 7 REGISTRO DE LLUVIAS 34
ANEXO 8 INFORMES SEMANALES 34
ANEXO 9 SEGUIMIENTO DE EQUIPOS 34
ANEXO 10 ACTAS DE SEÑALIZACIÓN RETIRADA EN VÍA 35
ANEXO 11 ACTAS DE MAYORES Y MENORES 35
ANEXO 12 ENSAYOS DE CALIDAD 35

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Movilidad Contemporánea (SMC), tiene como misión orientar y liderar la formulación de las políticas del sistema de movilidad y asegurar la organización y mantenimiento del orden en materia de tránsito y transporte, garantizando la preservación y mejoramiento de la seguridad y la calidad de vida de la comunidad en el Departamento de Cundinamarca.

Por lo anterior la SMC por medio del proceso de licitación STM-LP-286-2024, cuyo objeto es ***"IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."*** adjudicó al **CONSORCIO INGENIO VIAL** el **LOTE 2 - ZONA OCCIDENTE** y posteriormente celebró el contrato No. STM-LP-008-2025 con dicho consorcio. El mencionado contrato de obra tiene como alcance implementar la señalización de los diseños, y esquemas priorizados de los puntos con mayor accidentalidad del departamento.

Como parte de sus obligaciones contractuales, el CONSORCIO INGENIO VIAL debe presentar informes mensuales con la información de avance de obras, ejecución financiera, legal, contable y administrativa según lo requerido en el Anexo Técnico.

El presente documento contiene el Informe de las actividades realizadas durante el **octavo mes** de ejecución, comprendido entre el 21 de septiembre y el 20 de octubre del 2025.

Este documento detalla de manera específica las actividades realizadas dentro de cada una de las líneas estratégicas y programas establecidos en el Anexo Técnico del contrato, los cuales son clave para cumplir con los estándares de transparencia, participación y sostenibilidad social. A lo largo de este informe, se presentarán los componentes trabajados durante la ejecución del proyecto, los cuales abarcan aspectos fundamentales del mismo, como son; estado de las etapas, avance de visitas técnicas, Planes de Manejo de Tránsito, estado de ejecución, resultado de matrices de garantías, certificados de calibración y formato de estado de equipos, reporte de señalización retirada, inventario detallado y medidas implementadas, reporte de las actividades realizadas por municipio, aspectos técnicos, copia bitácora, balance ambiental y SST, balance social, balance financiero, balance jurídico, balance administrativo, comentarios y conclusiones y anexos.

De esta manera lo que se desea es mostrar un avance general del contrato con cada una de las características que ocurran durante la ejecución del mismo, para que la entidad Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca (SMC) tenga información actualizada y pertinente del avance del contrato.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se muestran en la Tabla 1 los datos generales del contrato:

Tabla 1 Información General Contrato de Obra

Ficha Informativa Contrato De Obra	
Contrato de obra N°	STM-LP-008-2025
Objeto	IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Entidad contratante	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA
Contratista	CONSORCIO INGENIO VIAL
NIT	901.900.361– 4
Valor del contrato	TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS ($3.480.023.139)
Plazo inicial	DIEZ (10) MESES
Fecha de inicio	21 de febrero de 2025

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

2.1. ENTIDAD CONTRATANTE

En la Tabla 2 se describen los datos generales de la entidad contratante, la cual corresponde al Departamento de Cundinamarca - Secretaria de Movilidad Contemporánea.

Tabla 2 Datos generales de la entidad contratante

Datos Generales De La Entidad Contratante	
Nombre o razón social	Departamento De Cundinamarca – Secretaría De Movilidad Contemporánea
Supervisor	Juan David Heredia Castiblanco

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

2.2. CONTRATISTA

En la Tabla 3 se relacionan los datos generales del contratista que ejecutará el contrato N° STM-LP-008-2025, el cual fue adjudicado por medio de licitación pública.

Tabla 3 Datos generales del contratista

Datos Generales Del Contratista	
Nombre o razón social	CONSORCIO INGENIO VIAL
NIT	901.900.361 – 4
Dirección	Carrera 73A # 75A - 29 Santa María del Lago
Teléfono	PBX: (4) 444 2249
Correo electrónico	consorcioingeniovial@gmail.com
Plazo del contrato	DIEZ (10) MESES
Fecha de inicio	21 de febrero de 2025
Fecha de terminación	20 de diciembre de 2025

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

2.3. INTERVENTORÍA

En la Tabla 4 se relacionan los datos generales de la interventoría quien hará la vigilancia y control al contrato.

Tabla 4 Datos generales de la interventoría

Datos Generales De La Interventoría	
Nombre o razón social	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL
NIT	901.902.065-8
Dirección	CARRERA 70D No.48-40 Normandía
Teléfono	715 0016
Correo electrónico	intseguridadvial@gmail.com
Plazo del contrato	ONCE (11) MESES
Fecha de inicio	21 de febrero de 2025
Fecha de terminación	20 de enero de 2026

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

3. PERIODO DE REPORTE

El periodo a reportar del informe mensual corresponde desde el 21 de septiembre del 2025 hasta el 20 de octubre del 2025.

4. BALANCE TÉCNICO DEL CONTRATO

En el presente numeral se muestra el avance técnico general del contrato STM-LP-008-2025.

4.1. ESTADO DE AVANCE DE LAS FASES Y PRODUCTOS REQUERIDOS DEL CONTRATO.

En el presente numeral se muestra el avance de las fases y productos requeridos en la ejecución de los municipios con corte al 20/10/2025 cuya información está consolidada en la Tabla 5.

Tabla 5 Estado de avance de las fases y productos requeridos

Codificación	Municipio	Estado De Informe Visita Inicial	Fecha Aprobación Informe	Fecha De Acta De Apropiación	Estado Actual
25001_CN_01	AGUA DE DIOS	APROBADO	20/06/2025	19/06/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25001_CN_02	AGUA DE DIOS	APROBADO	20/06/2025	19/06/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25019_CN_01	ALBAN	APROBADO	05/08/2025	02/08/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25019_CN_02	ALBAN	APROBADO	05/08/2025	01/08/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25019_CN_03	ALBAN	APROBADO	05/08/2025	01/08/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25040_CN_01	ANOLAIMA	APROBADO	23/05/2025	23/05/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25040_CN_02	ANOLAIMA	APROBADO	30/05/2025	30/05/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25599_CN_01	APULO	APROBADO	03/09/2025	02/09/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25599_CN_02	APULO	APROBADO	17/09/2025	16/09/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25148_CN_01	CAPARRAPI	APROBADO	21/08/2025	20/08/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25148_CN_02	CAPARRAPI	APROBADO	21/08/2025	20/08/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25168_CN_01	CHAGUANI	APROBADO	27/08/2025	26/08/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25168_CN_02	CHAGUANI	APROBADO	27/08/2025	26/08/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25168_CN_03	CHAGUANI	APROBADO	27/08/2025	26/08/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25168_CN_04	CHAGUANI	APROBADO	27/08/2025	26/08/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25320_CN_01	GUADUAS	APROBADO	7/07/2025	2/07/2025	VISITADO
25320_CN_02	GUADUAS	APROBADO	7/07/2025	2/07/2025	VISITADO

Codificación	Municipio	Estado De Informe Visita Inicial	Fecha Aprobación Informe	Fecha De Acta De Apropiación	Estado Actual
25328_CN_01	GUAYABAL DE SIQUIMA	APROBADO	7/07/2025	3/07/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25328_CN_02	GUAYABAL DE SIQUIMA	APROBADO	7/07/2025	3/07/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25328_CN_03	GUAYABAL DE SIQUIMA	APROBADO	7/07/2025	3/07/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25402_CN_01	LA VEGA	APROBADO	7/07/2025	5/07/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25402_CN_02	LA VEGA	APROBADO	7/07/2025	5/07/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25488_CN_01	NILO	APROBADO	22/07/2025	16/07/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25488_CN_02	NILO	APROBADO	22/07/2025	13/07/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25488_CN_03	NILO	APROBADO	28/07/2025	24/07/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25489_CN_01	NIMAIMA	APROBADO	29/05/2025	27/05/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25489_CN_02	NIMAIMA	APROBADO	29/05/2025	27/05/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25489_CN_03	NIMAIMA	APROBADO	10/06/2025	9/06/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25572_CN_02	PUERTO SALGAR	APROBADO	18/06/2025	18/06/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25572_CN_03	PUERTO SALGAR	APROBADO	18/06/2025	18/06/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25580_CN_01	PULI	APROBADO	9/07/2025	6/07/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25823_CN_01	TOPAIPI	APROBADO	21/08/2025	20/08/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25823_CN_02	TOPAIPI	APROBADO	21/08/2025	20/08/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25862_CN_01	VERGARA	APROBADO	12/05/2025	10/05/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25862_CN_02	VERGARA	APROBADO	12/05/2025	10/05/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25862_CN_03	VERGARA	APROBADO	12/05/2025	10/05/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25862_CN_04	VERGARA	APROBADO	12/05/2025	10/05/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25862_CN_05	VERGARA	APROBADO	12/05/2025	10/05/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25867_CN_01	VIANI	APROBADO	17/06/2025	13/06/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25867_CN_02	VIANI	APROBADO	17/06/2025	13/06/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25867_CN_03	VIANI	APROBADO	17/06/2025	13/06/2025	TERMINADO Y RECIBIDO

Codificación	Municipio	Estado De Informe Visita Inicial	Fecha Aprobación Informe	Fecha De Acta De Apropiación	Estado Actual
Restricción carga	VILLETA	N/A	N/A	N/A	TERMINADO Y RECIBIDO
25878_CN_01	VIOTÁ	APROBADO	8/07/2025	03/07/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25035_CN_01	ANAPOIMA	APROBADO	17/06/2025	17/06/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25885_CN_01 25885_CN_02	YACOPI	APROBADO	05/09/2025	01/09/2025	TERMINADO
25898_CN_01	ZIPACÓN	APROBADO	30/05/2025	6/06/2025	VISITADO
25898_CN_02	ZIPACÓN	APROBADO	30/05/2025	6/06/2025	VISITADO
25898_CN_03	ZIPACÓN	APROBADO	30/05/2025	6/06/2025	VISITADO
25875_CN_01	VILLETA	APROBADO	22/07/2025	18/07/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25875_CN_02	VILLETA	APROBADO	08/08/2025	06/08/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25245_CN_01	EL COLEGIO	APROBADO	08/08/2025	06/08/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25245_CN_02	EL COLEGIO	APROBADO	08/08/2025	06/08/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25245_CN_03	EL COLEGIO	APROBADO	11/08/2025	09/08/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25035_CN_02	ANAPOIMA	APROBADO	31/07/2025	30/07/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25035_CN_03	ANAPOIMA	APROBADO	31/07/2025	30/07/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25035_CN_04	ANAPOIMA	APROBADO	31/07/2025	30/07/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25123_CN_01	CACHIPAY	APROBADO	18/07/2025	14/07/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25123_CN_02	CACHIPAY	APROBADO	18/07/2025	14/07/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25123_CN_03	CACHIPAY	APROBADO	31/07/2025	28/07/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25123_CN_04	CACHIPAY	APROBADO	31/07/2025	28/07/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25260_CN_01	EL ROSAL	APROBADO	31/07/2025	28/07/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25260_CN_02	EL ROSAL	APROBADO	31/07/2025	28/07/2025	TERMINADO Y RECIBIDO
25898_CN_04	ZIPACÓN	APROBADO	8/07/2025	5/07/2025	VISITADO
25612_CN_01	RICAURTE	APROBADO	03/10/2025	02/10/2025	EN EJECUCIÓN
25612_CN_02	RICAURTE	APROBADO	03/10/2025	02/10/2025	TERMINADO

Codificación	Municipio	Estado De Informe Visita Inicial	Fecha Aprobación Informe	Fecha De Acta De Apropiación	Estado Actual
25612_CN_03	RICAURTE	APROBADO	03/10/2025	02/10/2025	TERMINADO
25662_CN_01	SAN JUAN DE RIO SECO	APROBADO	03/10/2025	02/10/2025	VISITADO
25662_CN_02	SAN JUAN DE RIO SECO	APROBADO	03/10/2025	02/10/2025	VISITADO
25662_CN_03	SAN JUAN DE RIO SECO	APROBADO	03/10/2025	02/10/2025	VISITADO
25662_CN_04	SAN JUAN DE RIO SECO	EN REVISIÓN			VISITADO
25769_CN_01	SUBACHOQUE	APROBADO	19/09/2025	18/09/2025	EN EJECUCIÓN
25769_CN_02	SUBACHOQUE	APROBADO	19/09/2025	18/09/2025	EN EJECUCIÓN
25769_CN_03	SUBACHOQUE	APROBADO	19/09/2025	18/09/2025	EN EJECUCIÓN
25286_CN_01	FUNZA	APROBADO	14/10/2025	11/10/2025	EN EJECUCIÓN

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

4.2. AVANCE DE VISITAS TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO A LOS PUNTOS ASIGNADOS.

Inicialmente, se realizó una revisión detallada de los documentos precontractuales asociados al contrato, con el propósito de garantizar un adecuado proceso de firma del acta de inicio del proyecto. Una vez formalizada dicha firma, se inició la ejecución de los documentos requeridos para la siguiente fase, los cuales fueron desarrollados por el Consorcio y se mantuvo informada a la Interventoría mediante la realización de mesas de trabajo. Asimismo, mediante el oficio DPC-0102025-732-2025, enviado por la interventoría consorcio INT Seguridad Vial el 1 de octubre del 2025, se recibió de manera formal la entrega de los diseños correspondientes a la fase 2 en los cuales se detallan las intervenciones planificadas para la implementación de medidas de seguridad vial, así como los formatos asociados a esta etapa.
El 26 de septiembre del 2025 se recibe por parte de la interventoría el traslado de: ENTREGA DISEÑO SEÑALES INFORMATIVAS A INSTALAR EN EL MUNICIPIO DE VERGARA, LOTE 2.

De esta manera se recibió la siguiente información resumida en la Tabla 6:

Tabla 6 Municipios visitados y sus respectivos presupuestos

Municipio	Puntos Priorizados	Presupuesto Inicial
Vergara solo señales verticales	-	-

Municipio	Puntos Priorizados	Presupuesto Inicial
La Mesa	1	$ 215.418.508

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaron las visitas iniciales para los puntos priorizados dejando el siguiente balance contemplado en la Tabla 6:

Tabla 6 Balance de visitas

TOTAL PUNTOS	1
PUNTOS VISITADOS	1
PORCENTAJE DE AVANCE EN VISITAS	100%

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

4.3. GESTIÓN, AVANCES Y PARTICULARIDADES SOBRE LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO TRAMITADOS POR PUNTO/TRAMO.

En cuanto al trámite del PMT se tiene el siguiente estado a corte del presente informe, el cual se observa en la Tabla 7.

Tabla 7 PMT tramitado

Fecha	Consecutivo	Asunto	Remitente
23/09/2025	CIV-188-2025	CIV-188-2025 - ALCANCE RADICADO PMT ZIPACÓN	Consorcio INT Seguridad Vial
14/10/2025	DPC-0102025-759-2025	CONTRATO DE OBRA No. STM-LP-008-2025. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO MUNICIPIO DE FUNZA	Consorcio INT Seguridad Vial
15/10/2025	Correo electrónico	DOCUMENTO TÉCNICO PARA EL PMT DE LA MESA	Consorcio Ingenio Vial
16/10/2025	GOB-E-CR-2025-0082885	ALCANCE OFICIO CIV-035-2025 DEL 11042025 – SOLICITUD APROBACIÓN PMT – ENTREGA 11	Consorcio Ingenio Vial
20/10/2025	CIV-209-2025	RADICACIÓN SOLICITUD DE PMT – LA MESA	Consorcio Ingenio Vial

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

4.4. ESTADO (POR EJECUTAR, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS) Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PUNTO/TRAMO.

En la siguiente Tabla 8 se evidencia el estado de las visitas a los municipios asignados en la Fase 2 y 3 del contrato:

Tabla 8 Visitas y ejecutado

Municipio	Diseño	Estado Visita	Fecha

Vergara	Tramo de solo señales	No requiere visita	-
La Mesa	25386_CN_01 calle 8 DG 4 y Cl4	Visitado	07/10/2025

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

4.5. RESULTADO DE LAS MATRICES DE DURACIÓN EXIGIBLE POR PUNTO A INTERVENIR.

En el Anexo 1 se encuentran las matrices de duración exigible por punto a intervenir.

4.6. REPORTE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y FORMATOS DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS EQUIPOS, MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE CONTROL DE OBRA.

A continuación, en la Tabla 9 se muestran los certificados de mantenimiento, calibración y seguimiento de los equipos y maquinarias de la obra, por otra parte, se en el Anexo 9 se encuentra el seguimiento al estado de los equipos:

Tabla 9 Certificados de calibración, mantenimiento de los equipos y maquinarias

Fecha	Tipo De Certificado	Equipo	Evidencia
06/09/2025	Factura	SNR 528	
04/08/2025	Factura	Vehículo LRR556	

02/09/2025	Factura	Vehículo LRR556	
17/10/2025	Mantenimiento	Vehículo Renault	

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

4.7. REPORTE DE LA SEÑALIZACIÓN RETIRADA DE VÍA Y ENTREGADA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES.

En el Anexo 10 Se encuentran las actas de entrega de señalización a los municipios.

4.8. INVENTARIO DETALLADO Y LISTADO DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS CON SUS CANTIDADES, DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM, Y OBSERVACIONES.

Durante el periodo de ejecución del presente informe se han realizado implementaciones en los municipios de: Caparrapí, Topaipí y Ricaurte. El inventario, listado de medidas implementadas y su respectiva descripción están en el Anexo 11.

4.9. REPORTE ESTADÍSTICO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR MUNICIPIO E INSTITUCIÓN BENEFICIADA.

Durante el periodo de ejecución del presente informe se observan en la Tabla 10 las acciones ejecutadas por municipio e institución beneficiada:


Tabla 10 Acciones realizadas vs Instituciones educativas


Municipio	Código Del Punto	Institución Educativa	# Estudiantes	Acciones Realizadas
Topaipí	25823_CN_01	I.E.D Topaipí – Sede Términos	19	Se realiza implementación de señalización vertical del tipo reglamentaria, informativa y preventiva. En Cuanto a la señalización horizontal se implementa: pictogramas de zona escolar, cruce de cebra e instalación de resaltos portátiles con sus respectivas tachas reflectivas.
	25823_CN_02	I.E.D Colegio Departamental Topaipí	380	Se realiza implementación de señalización vertical del tipo reglamentaria, informativa y preventiva. En Cuanto a la señalización horizontal se implementa: pictogramas de zona escolar, instalación de resaltos portátiles con sus respectivas tachas reflectivas e hitos.
Ricaurte	25612_CN_01	Escuela Antonio Ricaurte	10	Se realiza implementación de señalización vertical del tipo reglamentaria, informativa y preventiva. En Cuanto a la señalización horizontal se implementa: pictogramas de zona escolar, cruce de cebra, instalación de resaltos portátiles con sus respectivas tachas reflectivas y demarcación de línea de eje.
Caparrapí	25148_CN_01	Polideportivo Bocademonte	Se aclara que como tal no es una institución educativa, pero si asisten al lugar varios niños.	Se realiza implementación de señalización vertical del tipo reglamentaria, informativa y preventiva.

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

En la Tabla 11 se evidencia el registro fotográfico de zonas escolares implementadas a corte del presente informe.

Tabla 11 Registro fotográfico de lo implementado en las instituciones educativas

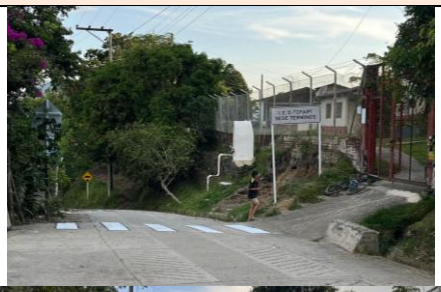Municipio Y Código Del Punto	Institución Educativa	Registro Fotográfico
Topaipí, 25823_CN_01	I.E.D Topaipí – Sede Términos	 
Topaipí, 25823_CN_02	I.E.D Colegio Departamental Topaipí	 

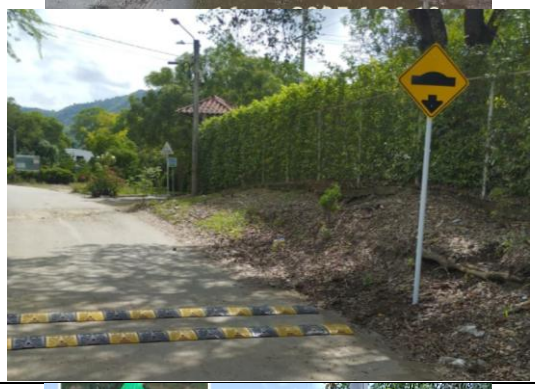Municipio Y Código Del Punto	Institución Educativa	Registro Fotográfico
Ricaurte, 25612_CN_01	Escuela Antonio Ricaurte	 
Caparrapí, 25148_CN_01	Polideportivo Bocademonte	 

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

4.10. ASPECTOS TÉCNICOS, MODIFICACIONES SURGIDAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS.

El 23 de septiembre se reciben observaciones frente a la cuenta de cobro No. 2, por parte de la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca:

- Quedamos atentos a la radicación física, imprimir pantallazo de secop con el soporte de cargue de la cuenta.

El 26 de septiembre se recibe una solicitud: Contrato De Obra Stm-Lp-008-2025 –Solicitud Plan De Contingencia Para Cumplimiento De La Meta Contractual Del 20 De octubre 2025, la cual es enviada por parte de la interventoría.

- Se solicita crear y compartir el plan de contingencia por el atraso en las implementaciones.

El 17 de octubre se reciben observaciones para la cuenta de cobro No.3: Civ-204-2025 - Remisión Documentos Para Cuenta De Cobro No. 3 De Obra, la cual es enviad por parte de la interventoría. Las observaciones fueron:

- la carpeta anexo 1 factura de venta está vacía
- las carpetas anexo 14 y anexo 15 están vacía
- Faltan planillas de pago de seguridad social del mes de septiembre 2025 periodo del informe No.7 de los profesionales aprobados por la interventoría
- Faltan planillas de pago de seguridad social del personal operativo mes de agosto 2025 periodo del informe No.7
- falta aprobación informe mensual No.7

4.11. COPIA DE BITÁCORA

En el Anexo 2. se encuentra la bitácora escaneada de obra para la ejecución del presente informe.

5. BALANCE AMBIENTAL Y SST

En este numeral se reúne la información relacionada al componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo relacionada al contrato STM-LP-008-2025.

5.1. PERMISOS LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES AMBIENTALES

Acorde a las características del contrato STM-LP-008-2025, cuyo objetivo es "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A

CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" no es necesario realizar trámites ambientales hasta la fecha del presente documento, todo ello en base al Decreto 1076 del 2015 en donde se define:

- En el capítulo 5 en el artículo 2.2.2.5.1.1 se establecen las actividades terrestre-carretero que están exentas de solicitar la licencia ambiental, en el numeral 19. *"La instalación de señalización vertical y horizontal, barreras y defensas metálicas."*
- En el capítulo 1 en el artículo 2.2.1.1.9.6 se establecen las actividades o proyectos que requieren de licencia ambiental o plan de manejo ambiental. *"Cuando para la ejecución de proyectos, obras o actividades sometidas al régimen de licencia ambiental o plan de manejo ambiental, se requiera de la remoción de árboles aislados en un volumen igual o menor a veinte metros cúbicos (20 m3), no se requerirá de ningún permiso, concesión o autorización, bastarán las obligaciones y medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación, impuestas en la licencia ambiental, o contempladas en el plan de manejo ambiental. Sin perjuicio, en este último caso, de las obligaciones adicionales que pueda imponer la autoridad ambiental competente."*

Adicionalmente, como no se van a realizar actividades en puentes o que influyan directamente con un cuerpo de agua no es necesario el permiso de ocupación de cauce.

5.2. REPORTE DE INCIDENTES Y ACONTECIMIENTOS

Si bien ya se está realizando implementaciones no se han presentado en campo ni en oficina incidentes o acontecimientos que afecten a los trabajadores, destacando las buenas practicas al momento de realizar las actividades.

5.3. INFORME AMBIENTAL Y SST

El avance en el componente ambiental y sst del contrato está recopilado en los informes mensuales correspondientes, los cuales son visibles en el Anexo 3 para el informe ambiental y en el Anexo 6 el Informe SG-SST.

5.4. SOPORTE DE PAGO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

En el Anexo 5 se evidencia los pagos parafiscales y seguridad social que aplican al presente contrato.

6. BALANCE SOCIAL

En este numeral se reúne la información relacionada al componente social del contrato STM-LP-008-2025.

6.1. VINCULACIÓN POBLACIÓN VULNERABLE

Para el desarrollo del presente contrato se han llevado a cabo las siguientes acciones encaminadas a la vinculación de población vulnerable:

Para el periodo no se realizó contratación de personal nuevo para el contrato, Sin embargo, a la fecha se han contratado 9 personas que pertenecen a mano de obra no calificada y dos de ellos residen en Bogotá.

Se adjunta el listado de personal contratado, en el cual se encuentra subrayado el personal perteneciente a la categoría de MONC vinculado al proyecto.

Tabla 12 Población vinculada para el contrato perteneciente al Consorcio ingenio Vial

N.	Nombres Y Apellidos Completos	Cargo	Número De Identificación	Consorcio Al Que Pertenece	Lugar De Residencia	Personal MONC o MOC
1	DANIEL SEBASTIAN CASTILLA JIMENEZ	Ingeniero Residente De Obra	1030679007	Consorcio Ingenio Vial	Cartagena	MOC
2	JORGE EDUARDO PARDO ARIZA	Ingeniero Ambiental	1072715381	Consorcio Ingenio Vial	Bogotá	MOC
3	CATHERIN CORTES GUZMAN	Ingeniera Residente De Obra	1020794877	Consorcio Ingenio Vial	Bogotá	MOC
4	NATALIA CASTILLO CORTES	Profesional Social	1020842830	Consorcio Ingenio Vial	Bogotá	MOC
5	INGRID YHOANA CEPEDA BUSTOS	Representante Legal Suplente	53039950	Consorcio Ingenio Vial	Bogotá	MOC
6	ALEXANDER GÓMEZ	Especialista Transito	98557282	Consorcio Ingenio Vial	Medellín	MOC
7	ANDRÉS FELIPE QUINTANA ROLDAN	Auxiliar De Señalización Vial	3414885	Consorcio Ingenio Vial	Medellín	MONC
8	JERSON RODRIGUEZ SARMIENTO	Auxiliar De Señalización Vial	1010044553	Consorcio ingenio vial	No refiere	MONC
9	LUIS ENRIQUE MARTINEZ HERRERA	Auxiliar De Señalización Vial	85203629	Consorcio Ingenio vial	Bogotá	MONC
10	CRISTIAN ANDRES	Auxiliar De Señalización Vial	1036398954	Consorcio Ingenio Vial	No refiere	MONC

N.	Nombres Y Apellidos Completos	Cargo	Número De Identificación	Consorcio Al Que Pertenece	Lugar De Residencia	Personal MONC o MOC
	GIRALDO HERRERA					
11	LIZETTE TATIANA SABOGAL RICO	Profesional SST	1010199370	Consorcio Ingenio Vial	No refiere	MOC
12	BENITO ANTONIO BLANCO BURGOS	Auxiliar De Señalización	11038456	Consorcio Ingenio Vial - Contratista Trafico	No refiere	MONC
13	JESUS MARIA OSPINA ROSERO	Auxiliar De Señalización	1075224216	Consorcio Ingenio Vial - Contratista Trafico	No refiere	MONC
14	JOSE LIZARDO CARABALI QUIÑONEZ	Auxiliar De Señalización	1080365636	Consorcio Ingenio Vial - Contratista Trafico	Bogotá	MONC
15	JUAN PABLO CARABALI QUIÑONEZ	Auxiliar De Señalización	1117931061	Consorcio Ingenio Vial - Contratista Trafico	No refiere	MONC
16	OSCAR EMIDIO ESPITIA BLANCO	Conductor / Auxiliar De Señalización	10942824	Consorcio Ingenio Vial - Contratista Trafico	No refiere	MONC
17	RICARDO JORGE PARDO	Conductor / Auxiliar De Señalización	1072715381	Consorcio Ingenio Vial - Contratista Trafico	Bogotá	MONC

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

6.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

De los 59 municipios contemplados por la Secretaria de Movilidad Contemporánea, se han asignado 29 municipios al consorcio ingenio vial. Hasta la fecha 29 directorios de actores sociales se han realizado, el cual 1 de ellos se realizaron en el periodo correspondiente al presente informe que corresponden a lo municipio de La Mesa. No se cuenta el municipio de Funza ya que este fue visitado en el periodo del informe No. 7. La Secretaria de Movilidad Contemporánea asigno un nuevo punto en ese mismo municipio el cual fue visitado en este periodo.

En el periodo del 21 de septiembre de 2025 al 20 de octubre de 2025 se realizó caracterización del área de influencia en 4 puntos, los cuales a la fecha se lleva un total de 78 caracterizaciones. No se realiza actividades sociales en el punto restricción de carga del municipio de Villeta por directrices de la Secretaria de Movilidad Contemporánea.

.

Tabla 13 Socializaciones correspondientes al periodo

Socializaciones De Inicio En El Periodo			
Fecha	**Municipio**	**Sector Socializado**	**Evidencia Fotográfica**
7/10/2025	**La Mesa**	Sector intersección La virgen Sector Liceo Campestre Thomas de Iriarte Sector La cuesta	
8/10/2025	**Funza**	Sector calle 15 entre cra 9 conjunto residencial San Isidro	

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

Tabla 14 Cierre de socializaciones correspondientes al periodo

Socializaciones De Cierre En El Periodo			
Fecha	**Municipio**	**Sector Socializado**	**Evidencia Fotográfica**
24/09/2025	**Guayabal de siquima**	Escuela el Rodeo IED El Trigo Sector centro El poblado	

Socializaciones De Cierre En El Periodo			
Fecha	**Municipio**	**Sector Socializado**	**Evidencia Fotográfica**
24/09/2025	**Chaguaní**	Intersección la Virgen Escuela Rural la Polonia Intersección la Estrella Escuela rural Campoalegre	

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

7. BALANCE FINANCIERO

En este numeral se reúne la información relacionada al balance financiero del contrato STM-LP-008-2025.

Los siguientes son los valores del componente obra y suministros.

Tabla 15 Estado financiero del componente de obra

VALOR INICIAL OBRA	**$ 3.480.023.139**
VALOR EJECUTADO	**$ 2.105.411.274**
VALOR TOTAL POR EJECUTAR	**$ 1.374.611.865**

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

Durante el sexto mes de ejecución, se ha realizado la intervención de los municipios de: Vergara, Anolaima, Nimaima, Viani, Agua de Dios, La Vega, Nilo, Puerto Salgar, Pulí, Anapoima, Villeta, Cachipay, Guayabal de Siquima, El Rosal, Albán, Apulo, Chaguaní, Colegio, Caparrapí, Topaipí y Ricaurte con lo cual se ha implementado $2.105.411.274 del presupuesto.

En cuanto a la facturación del contrato se ha realizado los siguientes trámites:

Cuenta No.1:

MUNICIPIO	***SUBTOTAL***	***AIU***	***TOTAL***
VERGARA			
25862_CN_01	$ 29.918.244,00	$ 9.573.838,00	$ 39.492.082,00
25862_CN_02	$ 49.841.252,00	$ 15.949.201,00	$ 65.790.453,00
25862_CN_03	$ 29.422.012,00	$ 9.415.044,00	$ 38.837.056,00
25862_CN_04	$ 13.064.500,00	$ 4.180.640,00	$ 17.245.140,00
25862_CN_05	$ 16.539.357,00	$ 5.292.594,00	$ 21.831.951,00
NIMAIMA			
25489_CN_01	$ 20.371.289,00	$ 6.518.812,00	$ 26.890.101,00
25489_CN_02	$ 36.000.710,00	$ 11.520.228,00	$ 47.520.938,00
25489_CN_03	$ 27.055.746,93	$ 8.657.839,00	$ 35.713.585,93
VILLETA			
RESTR CARGA	$ 4.040.967,00	$ 1.293.109,00	$ 5.334.076,00

Se facturó un total de: $298.655.382 para un total del 8.58% del valor total del contrato. A corte del presente informe, esta acta ya se encuentra pagada.

Cuenta No.2:

MUNICIPIO	***SUBTOTAL***	***AIU***	***TOTAL***
ANOLAIMA			
25040_CN_01	$ 26.223.852,00	$ 8.391.633,00	$ 34.615.485,00
25040_CN_02	$ 36.988.928,00	$ 11.836.457,00	$ 48.825.385,00
VIANÍ			
25867_CN_01	$ 29.326.752,00	$ 9.384.561,00	$ 38.711.313,00
25867_CN_02	$ 4.746.247,00	$ 1.518.799,00	$ 6.265.046,00
25867_CN_02	$ 3.771.978,00	$ 1.207.034,00	$ 4.979.012,00
PUERTO SALGAR			
25572_CN_02	$ 36.627.280,00	$ 11.720.730,00	$ 48.348.010,00
25572_CN_03	$ 24.723.982,00	$ 7.911.675,00	$ 32.635.657,00
VIOTÁ			
25878_CN_01	$ 45.070.796,00	$ 14.422.655,00	$ 59.493.451,00
AGUA DE DIOS			
25001_CN_01	$ 39.334.359,00	$ 12.586.995,00	$ 51.921.354,00
25001_CN_02	$ 12.519.997,00	$ 4.006.399,00	$ 16.526.396,00
ANOPAIMA			

MUNICIPIO	***SUBTOTAL***	***AIU***	***TOTAL***
25035_CN_01	$ 77.652.021,00	$ 24.848.646,00	$ 102.500.667,00
LA VEGA			
25402_CN_01	$ 10.627.477,00	$ 3.400.793,00	$ 14.028.270,00
25402_CN_02	$ 8.015.736,00	$ 2.565.036,00	$ 10.580.772,00
VILLETA			
25875_CN_01	$ 46.645.209,00	$ 14.926.466,00	$ 61.571.675,00

Se facturó un total de: $531.002.493 para un total del 15.26% del valor total del contrato y un 23.84% acumulado.

Cuenta No.3:

LOTE 2	**SUBTOTAL**	**AIU**	**TOTAL**
ALBAN			
25019_CN_01	$ 12.631.823,00	$ 4.042.183,00	$ 16.674.006,00
25019_CN_02	$ 12.906.332,00	$ 4.130.027,00	$ 17.036.359,00
25019_CN_03	$ 12.233.022,00	$ 3.914.567,00	$ 16.147.589,00
ANAPOIMA			
25035_CN_02	$ 47.429.055,00	$ 15.177.298,00	$ 62.606.353,00
25035_CN_03	$ 32.612.385,00	$ 10.435.963,00	$ 43.048.348,00
25035_CN_04	$ 30.818.536,00	$ 9.861.932,00	$ 40.680.468,00
APULO			
25599_CN_01	$ 4.644.956,00	$ 1.486.386,00	$ 6.131.342,00
25599_CN_02	$ 4.618.226,00	$ 1.477.833,00	$ 6.096.059,00
CACHIPAY			
25123_CN_01	$ 20.903.420,00	$ 6.689.094,00	$ 27.592.514,00
25123_CN_02	$ 67.115.826,00	$ 21.477.065,00	$ 88.592.891,00
25123_CN_03	$ 31.796.004,00	$ 10.174.721,00	$ 41.970.725,00
25123_CN_04	$ 33.374.615,00	$ 10.679.877,00	$ 44.054.492,00
EL COLEGIO			
25245_CN_01	$ 31.320.141,00	$ 10.022.445,00	$ 41.342.586,00
25245_CN_02	$ 46.410.739,00	$ 14.851.437,00	$ 61.262.176,00
25245_CN_03	$ 31.834.553,00	$ 10.187.057,00	$ 42.021.610,00
EL ROSAL			
25260_CN_01	$ 27.187.230,18	$ 8.699.915,00	$ 35.887.145,18
25260_CN_02	$ 6.725.457,00	$ 2.152.146,00	$ 8.877.603,00
GUAYABAL DE SIQUIMA			
25328_CN_01	$ 6.486.882,00	$ 2.075.803,00	$ 8.562.685,00
25328_CN_02	$ 5.408.298,00	$ 1.730.656,00	$ 7.138.954,00

25328_CN_03	$ 23.092.773,00	$ 7.389.687,00	$ 30.482.460,00
NILO			
25488_CN_01	$ 20.964.119,00	$ 6.708.518,00	$ 27.672.637,00
25488_CN_02	$ 22.425.904,00	$ 7.176.289,00	$ 29.602.193,00
25488_CN_03	$ 15.416.625,00	$ 4.933.320,00	$ 20.349.945,00
PULI			
25580_CN_01	$ 26.263.854,00	$ 8.404.434,00	$ 34.668.288,00
VILLETA			
25875_CN_02	$ 129.655.842,00	$ 41.489.870,00	$ 171.145.712,00

Se desea facturar un total de: $ 929.645.140,18 para un total del 26.71% del valor del contrato y un acumulado de 50.55%.

PV (Valor Planeado)	$	3.132.020.825
EV (Valor Ejecutado)	$	2.105.411.274
SV (Variación del Cronograma)	-$	1.026.609.551
SPI (Índice Desempeño del Cronograma)		0,67
Valor Facturado	$	829.657.876
Pendiente por Cobrar	$	1.275.753.398

7.1. META CONTRACTUAL Y SU ESTADO FINANCIERO

En este apartado se exponen las metas contractuales con respecto al estado financiero del contrato, la información está resumida en la

Tabla 16 Meta contractual y su estado financiero

Mes	Fecha de corte	Meta contractual (%)	Meta contractual ($)	Valor ejecutado y recibido a satisfacción ($)	Porcentaje ejecutado y recibido a satisfacción (%)
1	20-mar-25	0	0	-	-
2	20-abr-25	5	174.001.157	-	-
3	20-may-25	10	348.002.314	-	-
4	20-jun-25	20	696.004.628	432.051.623,93	12,42
5	20-jul-25	35	1.218.008.099	666.318.743,58	19,15
6	20-ago-25	50	1.740.011.570	831.654.503,47	23,90
7	20-sep-25	70	2.436.016.197	1.378.489.299,11	39,61
8	20-oct-25	90	3.132.020.825	1.859.056.204,11	53,42
9	20-nov-25	100	3.480.023.139		
10	20-dic-25	100	3.480.023.139		

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

8. BALANCE JURÍDICO

En este numeral se reúne la información relacionada al balance jurídico del contrato STM-LP-008-2025.
Al corte del presente informe se mantienen las condiciones iniciales del contrato, no se ha realizado ninguna modificación ni adición correspondiente.

8.1. ESTADO DE LAS PÓLIZAS

Mediante la Tabla 17 se muestra el estado actual de las pólizas:

Tabla 17 Estado de las pólizas

Contrato De Obra			
AMPARO	VIGENCIA (Fechas)		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	21/2/2025	20/4/2026	$ 1.044.006.941,70
PAGO DE SALARIO-PRESTACIONES SOCIALES LEGALES-INDEMNIZACIONES LABORALES	21/2/2025	20/12/2028	$ 348.002.313,90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS después desde la entrega de la obra o finalizado el contrato		$ 1.044.006.941,70
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL- RCE ASEGURADORA SOLIDARIA No. 496 74 994000008792	13/11/2025	20/12/2025	$ 711.750.000,00

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

8.2. ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES

A la fecha del presente informe no se identifican aspectos contractuales relevantes en relación al aspecto jurídico, con respecto a las metas contractuales se tiene la siguiente información:

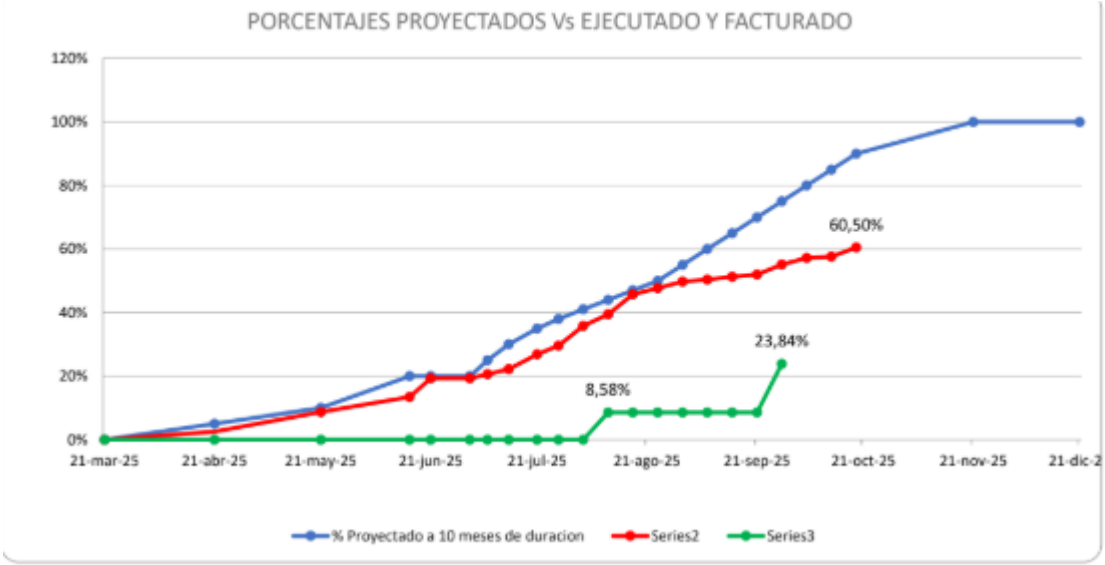


Ilustración 1 Metas contractuales vs el avance en obra

Con respecto a las modificaciones delos diseños originales se tiene la siguiente información resumida en la Tabla 18.

Tabla 18 Modificaciones en los diseños

Municipio	Código del punto	Cambios en el diseño
Caparrapí	25148_CN_01	Excluir dos señales SP48 preventivas (sitios de juego y recreación, adyacentes a la vía). En su reemplazo, se propone: Incluir dos señales informativas SI-27 "PRECAUCION PEATONES EN LA VIA", Incluir una señal informativa SI-27 "POLIDEPORTIVO BOCADEMONTE
	25148_CN_02	Incluir (6) delineadores de curva horizontal en curva pronunciada cercana a la intersección Alto de Brisas. Incluir una señal SR01 para regular prioridad de paso en la intersección.
Topaipí	25823_CN_01	No se presentan modificaciones al diseño original proporcionado por la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca (SMC).
	25823_CN_02	Mover SP25A al costado occidental, por insuficiencia de espacio en el costado oriental. Cambiar SP47A por SP47 por no incluir paso de cebra. Incluir SP30 previo a tramo inestable, por acceso sur. Incluir SP31 previo a tramo inestable, por acceso norte. Incluir tres delineadores tubulares en cada extremo, para alertar el tramo inestable. Incluir dos SR01 en intersecciones existentes en el área de influencia directa
Ricaurte	25612_CN_01	Incluir demarcación de la zona escolar: paso cebrado y pictogramas de aproximación. Complementar el diseño con señales preventivas para resaltos.
	25612_CN_02	Incluir cuatro parejas de delineadores de curva horizontal. Incluir 1 SR01 nueva

	25612_CN_03	No se presentan modificaciones al diseño original proporcionado por la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca (SMC).

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

Se aclara que en el desarrollo de las actividades las condiciones meteorológicas no fueron de todo favorables, puesto que se reportaron lluvias en Caparrapí y Topaipí.

9. BALANCE ADMINISTRATIVO

En este numeral se reúne la información relacionada al balance administrativo relacionado al contrato STM-LP-008-2025.

9.1. ACTAS DE REUNIÓN

En el Anexo 4 se evidencian las actas de reunión que se han realizado en el periodo contemplado del presente documento.

9.2. COMITÉS DE SEGUIMIENTO

A continuación, se muestra en la Tabla 19 los comités de seguimiento correspondientes al periodo 21 de septiembre del 2025 al 20 de octubre del 2025.

Tabla 19 Comités de seguimiento

Entidades	Fecha
Secretaría de Movilidad Contemporánea	25/09/2025
Consorcio Ingenio Vial	
Consorcio INT Seguridad Vial	
Secretaría de Movilidad Contemporánea	02/10/2025
Consorcio Ingenio Vial	
Consorcio INT Seguridad Vial	
Secretaría de Movilidad Contemporánea	09/10/2025
Consorcio Ingenio Vial	
Consorcio INT Seguridad Vial	
Secretaría de Movilidad Contemporánea	20/10/2025
Consorcio Ingenio Vial	
Consorcio INT Seguridad Vial	

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

9.3. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

En la Tabla 20 se encuentra la información resumida de la información recibida y enviada por parte del correo electrónico; consorcioingeniovial@gmail.com hacia las diferentes entidades relacionadas al contrato STM-LP-008-2025.

Tabla 20 Correspondencia enviada y recibida

Tipo de comunicación	Entidad	Fecha	Descripción
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	26/09/2025	Civ-193-2025 - Remisión Informe De Visita Inicial Ricaurt
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	26/09/2025	Civ-192-2025 Dificultad De Ingreso A Frentes Del Municipio De Caparrapí
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	29/09/2025	Civ-196-2025 - Remisión Informe De Visita Inicial San Juan De Rioseco
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	30/09/2025	Civ-198-2025 Cronograma Actualizado Informes Finales
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	01/10/2025	Civ-199-2025 - Respuesta A Requerimiento Gob-S-Cr-2025-0073938– Np-19, Rehabilitación De Resaltos Parabólicos Existentes
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	02/10/2025	Civ-200-2025 - Remisión De Planos Record Y Actas De Mayores Y Menores Cantidades – Yacopi
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	03/10/2025	Civ-202-2025 Informe Final Municipio De Viotá
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	03/10/2025	Civ-203-2025 - Remisión Cronograma Ejecución De Visitas Lote 2 – Entregas 11 Y 12
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	09/10/2025	Ajuste Informes Zipacón
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	14/10/2025	Civ-206-2025 - Remisión De Planos Record Y Actas De Mayores Y Menores Cantidades – Caparrapí
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	14/10/2025	Civ-207-2025 - Remisión De Planos Record Y Actas De Mayores Y Menores Cantidades – Topaipí
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	15/10/2025	Pmt La Mesa - Documento Técnico
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	16/10/2025	Civ-208-2025 - Alcance Oficio Civ-035-2025 Del 11042025 – Solicitud Aprobación Pmt – Entrega 11
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	20/10/2025	Civ-209-2025 - Radicación Solicitud De Pmt – La Mesa
Enviada	Consorcio INT Seguridad Vial	20/10/2025	Civ-187-2025 Asignaciones Meta Contractual Del 70% Contrato De Obra Stm-Lp-008-2025
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	22/09/2025	Dpc-0102025-610-2025. Remisión Del Informe Mensual Social No 6 V2
Recibida	SMC	23/09/2025	Ontrato De Obra No.Stm-Lp-008-2025- Cuenta De Cobro No.02 V2 Ingenio Vial
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	23/09/2025	Civ-190-2025 - Remisión De Planos Record Y Actas De Mayores Y Menores Cantidades – Chaguaní
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	23/09/2025	Civ-188-2025 - Alcance Radicado Pmt Zipacón

Tipo de comunicación	Entidad	Fecha	Descripción
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	23/09/2025	Contrato De Obra No. Stm-Lp-008-2025. Traslado Comunicación Gob-S-Cr-2025-0081875 Del 23de Septiembre 2025-Modificaciónalcance Intervención Punto 25286_Cn_01 – Municipio De Funza, Lote 2
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	24/09/2025	Contrato STM-CM-010-2025-ACTAS DE VISITA Y RECIBO De VILLETA BRIO-ANAPOIMA-EL COLEGIO-TOCANCIPA
Recibida	SMC	24/09/2025	Civ-186-2025 - Reiteración De Solicitud Informacion Contrato De Obras De Reparcheo
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	24/09/2025	Contrato De Obra No. Stm-Lp-008-2025 – Solicitud Respuesta Comunicación Gob-S-Cr-20250073938 Del 11 De Septiembre 2025 Requerimiento Justificación Técnica Y Económica Para Reconocimiento Según Apu Aprobado Ítem 65 Para La Actividad De Rehabilitación O Reparación De Resaltos Parabólicos Existentes
Recibida	SMC	25/09/2025	Contrato De Obra No.Stm-Lp-008-2025 – Entrega Acta De Cantidades Y Planos Record De Chaguani
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	26/09/2025	Contrato De Obra Stm-Lp-008-2025 –Solicitud Plan De Contingencia Para Cumplimiento De La Meta Contractual Del 20 De Octubre 2025
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	26/09/2025	Contrato De Obra No. Stm-Lp-008-2025. Traslado Comunicación Gob-S-Cr-2025-0084505 Del 25de Septiembre 2025 - Entrega Diseño Señales Informativas Ainstalar En El Municipio De Vergara, Lote 2
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	26/09/2025	Contrato De Obra No. Stm-Lp-008-2025. Entrega Consecutivos Etiquetas Municipio De Subachoque
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	29/09/2025	Cronograma De Visitas De Entrega - Lote 2
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	29/09/2025	Contrato De Obra No.Stm-Lp-008-2025 - Entrega Aval Informe Visita Preliminar Municipio Funza
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	30/09/2025	Contrato De Obra No. Stm-Lp-008-2025. Traslado Gob-S-Cr-2025-0086666 Del 29 De Septiembre 2025 - Entrega Diseños Fase 3 De 3 Puntos A Implementar Con Medidas De Seguridad Vial En Los Municipios De Arbeláez Y Funza, Lotes 1 Y 2
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	01/10/2025	Concepto Técnico Revisión Informe Visita Preliminar Punto 25286_Cn_01 - Municipio Funza
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	01/10/2025	Contrato De Obra No. Stm-Lp-008-2025. Traslado Gob-S-Cr-2025-0088453 Del 01 De Octubre 2025 - Entrega Diseñofase 2 De Punto A Implementar Con Medidas De Seguridad Vial En El Municipio

Tipo de comunicación	Entidad	Fecha	Descripción
			Dela Mesa, Lote 2
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	01/10/2025	Contrato De Obra No. Stm-Lp-008-2025. Solicitud Certificados De Calidad
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	02/10/2025	Contrato De Obra No.Stm-Lp-008-2025 - Entrega Aval Informe Visita Preliminar Municipio Ricaurte
Recibida	SMC	02/10/2025	Contrato De Obra No.Stm-Lp-008-2025 – Entrega Acta De Cantidades Y Planos Record De Yacopi
Recibida	SMC	03/10/2025	Contrato De Obra No.Stm-Lp-008-2025 - Entrega Aval Informe Visita Preliminar Municipio San Juan De Rioseco
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	03/10/2025	Contrato De Obra Stm-Lp-008-2025 – Aval Inicio Implementacion Municipiode Ricaurte
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	03/10/2025	Remisión Del Informe Mensual Social No 7. CIV-195-2025
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	03/10/2025	Civ- 201-2025 Informe Final Nimaima
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	03/10/2025	Contrato De Obra Stm-Lp-008-2025 – Aprobación Informes De Visita De Reconocimiento Y Envío Actas De Apropiación Y/O Aprobación De Diseños Del Municipio De San Juan De Rioseco
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	03/10/2025	Contrato De Obra Stm-Lp-008-2025 – Aval Inicio Implementacion Municipiode San Juan De Rioseco
Recibida	SMC	03/10/2025	Compromisos Comités 02 Octubre
Recibida	Alcaldía Rosal	06/10/2025	Solicitud De Revisión Y Firma De Actas De Entrega De Elementos Retirados MUNICIPIO DE EL ROSAL – Contrato STM-LP-008
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	07/10/2025	CONTRATO DE OBRA STM-LP-008-2025 – RESPUESTA GOB-S-CR-2025-0073938 DEL 11de Septiembre De 2025- REQUERIMIENTO JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA RECONOCIMIENTO SEGÚNAPU APROBADO ÍTEM 65 PARA LA ACTIVIDAD DE REHABILITACIÓN O REPARACIÓN DERESALTOS PARABÓLICOS EXISTENTES
Recibida	SMC	08/10/2025	Remisión Oficio Sald-2025-2622 Rta Entd-2025-7081 Solicitud Visita Inspeccion - Secretaria Movilidad
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	10/10/2025	Concepto Técnico Segunda Revisión Informe Visita Preliminar Punto 25286_Cn_01 - Municipio Funza
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	10/10/2025	Cronograma De Visitas De Entrega - Lote 2
Recibida	SMC	14/10/2025	Compromisos Comités 09 Octubre
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	14/10/2025	Formato Coi - Asignación De Municipios No. 11

Tipo de comunicación	Entidad	Fecha	Descripción
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	14/10/2025	Contrato De Obra Stm-Lp-008-2025 – Aprobación Informes De Visita De Reconocimiento Y Envío Actas De Apropiación Y/O Aprobación De Diseños Del Municipio De Funza Punto 25286_Cn_01
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	14/10/2025	Contrato De Obra Stm-Lp-008-2025 – Aval Inicio Implementación Municipio de Funza Punto 25286_Cn_01
Recibida	SMC	14/10/2025	Contrato De Obra No.Stm-Lp-008-2025 – Entrega Acta De Cantidades Y Planos Record De Caparrapi
Recibida	SMC	14/10/2025	Contrato De Obra No.Stm-Lp-008-2025 – Entrega Acta De Cantidades Y Planos Record De Topaipi
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	15/10/2025	Contrato De Obra No. Stm-Lp-008-2025. Observaciones Informe Visita Preliminar Zipacón Versión 2 Al Acta De Apropiación
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	15/10/2025	Solicitud Información De Terminación Obras En El Municipio De Guaduas
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	15/10/2025	Contrato De Obra No. Stm-Lp-008-2025. Plan De Manejo De Tránsito Municipio De La Mesa
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	15/10/2025	Civ-197-2025_-_Remisión_Informe_Mensual_De_Obra_No._7
Recibida	SMC	15/10/2025	GOB-E-CR-2025-0082885 - 15 Octubre 2025
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	16/10/2025	Civ-205-2025 -Remisión Informe De Visita Inicial San Juan De Rioseco – Punto 4
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	17/10/2025	Contrato De Obra No.Stm-Lp-008-2025 Solicitud De consecutivo Para Etiqueta Municipios De Ricaurte-San Juan De Rio Seco-Funza
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	17/10/2025	Contrato De Obra No.Stm-Lp-008-2025 - Entrega Aval Informe Visita Preliminar Municipio San Juan De Rioseco Punto 25662_Cn_04
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	17/10/2025	Civ-204-2025 - Remisión Documentos Para Cuenta De Cobro No. 3 De Obra
Recibida	Consorcio INT Seguridad Vial	17/10/2025	Contrato De Obra No. Stm-Lp-008-2025. Traslado Gob-S-Cr-2025-0100122 Del 17 De Octubre 2025 - Entrega Diseños fase 3 De 1 Punto A Implementar Con Medidas De Seguridad Vial En El Municipio de Tenjo, Lote 2

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

9.4. PQR´S TRAMITADOS

A continuación, en la Tabla 21 se listan los PQR´S que se han recibido por parte del Consorcio Ingenio Vial para el periodo 21 de septiembre del 2025 al 20 de octubre del 2025.

Tabla 21 PQRS

Número	Departamento/ Municipio	Fecha de Recepción	Tipo de Solicitud	Estado
01	Cundinamarca, Anolaima	01/10/2025	Petición	Abierta

Fuente: Consorcio Ingenio Vial, Contrato STM-LP-008-2025.

10. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- Con corte al 24 de agosto de 2025 se registró un 47,84% de ejecución, lo que representa una diferencia de 2,16% frente a la meta programada del 50%. Aunque no se alcanzó el porcentaje esperado en la fecha de corte, el retraso es mínimo y no compromete la programación general del proyecto. El Consorcio Ingenio Vial ratificó su compromiso de alcanzar la meta del 50% a más tardar el 31 de agosto de 2025, conforme a lo establecido en el anexo técnico contractual.

- Durante el período se atendieron requerimientos y observaciones de las entidades competentes, destacando la radicación de los oficios CIV-162-2025 y CIV-160-2025, en respuesta a comunicaciones formales y observaciones técnicas, lo cual refleja la atención oportuna a los compromisos contractuales y de seguimiento administrativo.

- Se avanzó en la gestión financiera con la radicación del oficio CIV-172-2025, mediante el cual se remitieron los documentos de soporte para la Cuenta de Cobro No. 2 de obra. Asimismo, se recibieron observaciones de la interventoría, que serán atendidas de manera diligente para dar continuidad al proceso de pago.

- Las actividades desarrolladas durante el período evidencian un manejo responsable tanto en el aspecto técnico de la obra como en la atención administrativa y financiera, lo cual contribuye al cumplimiento de las metas del contrato y garantiza el flujo adecuado de la ejecución del proyecto

11. ANEXOS

Anexo 1 Matrices de garantías
Anexo 2 Bitácora
Anexo 3 Informe ambiental
Anexo 4 Actas de reunión
Anexo 5 Pago parafiscales y seguridad social
Anexo 6 Informe SG-SST
Anexo 7 Registro de Lluvias
Anexo 8 Informes Semanales
Anexo 9 Seguimiento de equipos

Anexo 10 Actas de Señalización retirada en vía
Anexo 11 Actas de Mayores y Menores
Anexo 12 Ensayos de Calidad
