
CRONOGRAMA

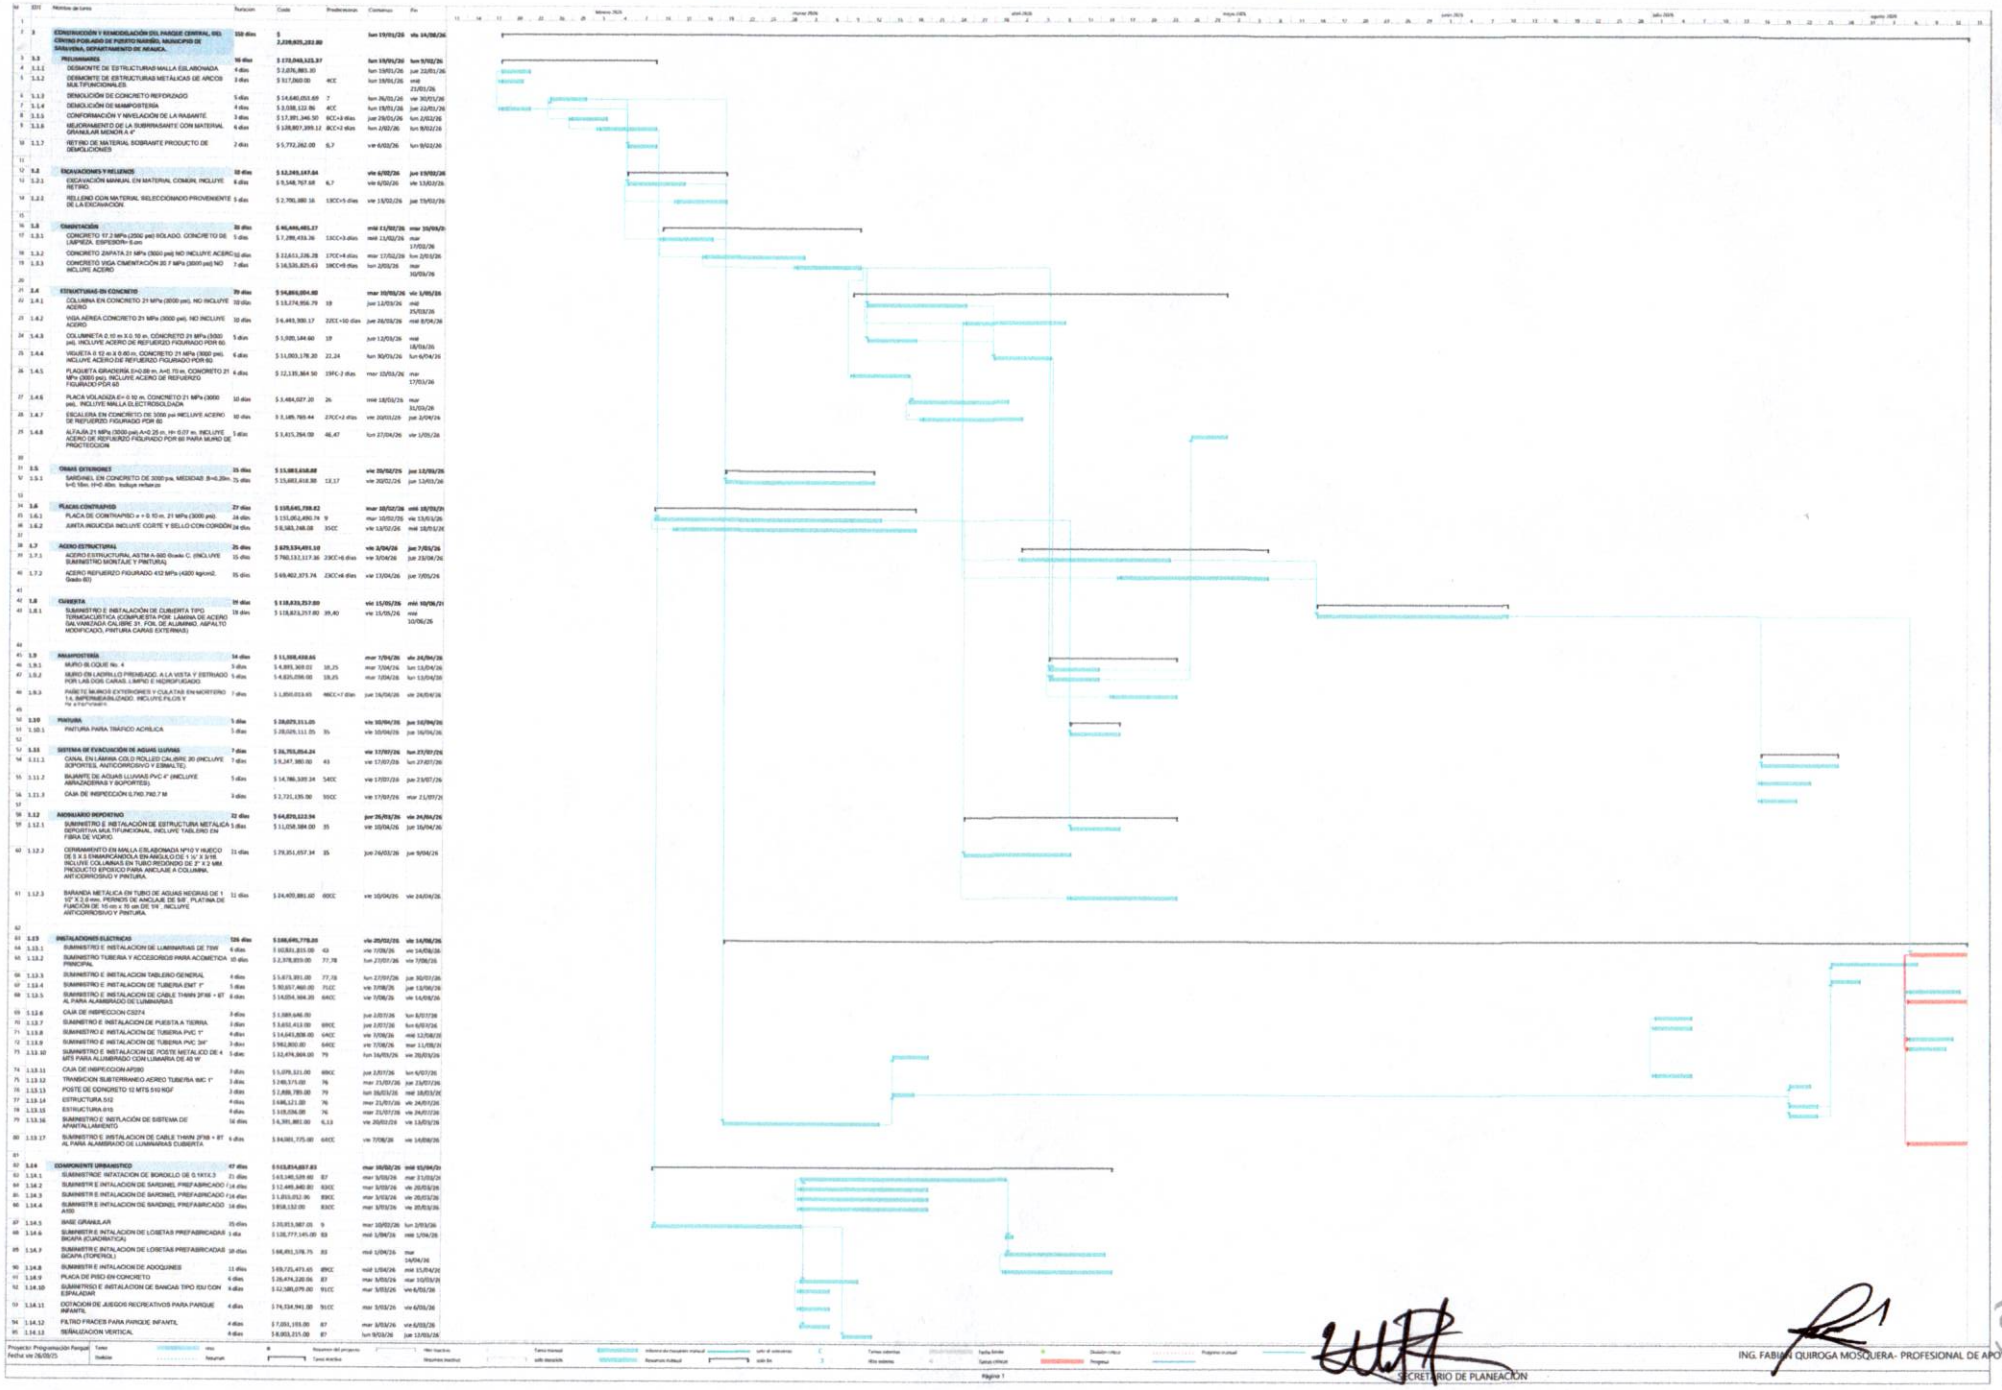

EDT	Nombre de tarea	Duración	Costo	Predecesoras	Comienzo	Fin
1						
2	**3 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO NARIÑO, MUNICIPIO DE SANTANDER, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.**	**350 días**	**$ 2,239,835,282.80**		**lun 19/01/26**	**vie 14/08/26**
3	**3.3 PRELIMINARES**	**10 días**	**$ 172,040,123.37**		**lun 19/01/26**	**lun 2/02/26**
4	1.1.1 DESMONTE DE ESTRUCTURAS MALLA ESLABONADA	4 días	$ 2,076,883.20		lun 19/01/26	jue 22/01/26
5	1.1.2 DESMONTE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE ARCOS MULTIFUNCIONALES	3 días	$ 917,000.00	4CE	lun 19/01/26	mié 21/01/26
6	1.1.3 DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO	5 días	$ 14,640,053.65	7	lun 26/01/26	vie 30/01/26
7	1.1.4 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA	4 días	$ 3,038,133.86	4CC	lun 19/01/26	jue 22/01/26
8	1.1.5 CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA RASANTE	3 días	$ 17,391,346.50	6CC+3 días	jue 29/01/26	lun 2/02/26
9	1.1.6 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR MENOR A 4"	4 días	$ 128,857,359.12	8CC+1 días	lun 2/02/26	lun 9/02/26
10	1.1.7 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE DEMOLICIONES	2 días	$ 5,772,262.00	6,7	vie 6/02/26	lun 9/02/26
11						
12	**3.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**10 días**	**$ 62,245,167.84**		**vie 6/02/26**	**jue 19/02/26**
13	1.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO.	4 días	$ 5,548,767.68	6,7	vie 6/02/26	vie 13/02/26
14	1.2.2 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	5 días	$ 2,700,380.16	13CC+5 días	vie 13/02/26	jue 19/02/26
15						
16	**3.3 CIMENTACIÓN**	**30 días**	**$ 46,446,485.17**		**mié 11/02/26**	**mar 31/03/26**
17	1.3.1 CONCRETO 17.2 MPa (2500 psi) RÓLADO. CONCRETO DE LIMPIEZA. ESPESOR= 5 cm	5 días	$ 7,299,439.36	13CC+3 días	mié 11/02/26	mar 17/03/26
18	1.3.2 CONCRETO ZAPATA 21 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO	12 días	$ 22,611,236.28	17CC+4 días	mar 17/02/26	lun 2/03/26
19	1.3.3 CONCRETO VIGA CIMENTACIÓN 20.7 MPa (3000 psi) NO INCLUYE ACERO	7 días	$ 16,535,825.63	18CC+5 días	lun 2/03/26	mar 10/03/26
20						
21	**3.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**70 días**	**$ 14,869,004.40**		**mar 10/03/26**	**vie 5/06/26**
22	1.4.1 COLUMNA EN CONCRETO 21 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO	10 días	$ 13,274,956.79	19	jue 12/03/26	mié 25/03/26
23	1.4.2 VIGA AÉREA CONCRETO 21 MPa (3000 psi), NO INCLUYE ACERO	10 días	$ 6,443,930.17	22CC+10 días	jue 26/03/26	mié 8/04/26
24	1.4.3 COLUMNETA 0.10 m X 0.10 m. CONCRETO 21 MPa (3000 psi). INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO POR 60	5 días	$ 1,020,144.60	19	jue 12/03/26	mié 18/03/26
25	1.4.4 VIGUETA 0.12 m X 0.60 m. CONCRETO 21 MPa (3000 psi). INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO POR 60	4 días	$ 11,003,178.20	22,24	lun 30/03/26	lun 6/04/26
26	1.4.5 PLAQUETA IDRADERA E=0.08 m. A=0.70 m. CONCRETO 21 MPa (3000 psi). INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60	4 días	$ 12,135,364.50	19FC-3 días	mar 10/03/26	mar 17/03/26
27	1.4.6 PLACA VOLADIZA E=1.0 m. CONCRETO 21 MPa (3000 psi). INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	10 días	$ 3,484,027.20	26	mié 18/03/26	mar 31/03/26
28	1.4.7 ESCALERA EN CONCRETO DE 3000 psi INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60	10 días	$ 3,185,769.44	27CC+2 días	vie 20/03/26	jue 2/04/26
29	1.4.8 ALFAJÍA 21 MPa (3000 psi) A=0.25 m. H= 0.07 m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60 PARA MURO DE PROTECCION	5 días	$ 3,415,764.09	46,47	lun 27/04/26	vie 1/05/26
30						
31	**3.5 OBRAS EXTERIORES**	**35 días**	**$ 15,085,618.88**		**vie 30/10/26**	**jue 17/09/26**
32	1.5.1 SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 psi, MEDIDAS: B=0.20m, b=0.10m, H=0.40m. Incluye refuerzo	75 días	$ 15,682,618.88	13,17	vie 20/02/26	jue 13/03/26
33						
34	**3.6 PLACAS CONTRAPISO**	**27 días**	**$ 115,641,759.62**		**mar 10/02/26**	**mié 18/03/26**
35	1.6.1 PLACA DE CONTRAPISO e = 0.10 m. 21 MPa (3000 psi)	24 días	$ 151,061,490.74	9	mar 10/02/26	vie 13/03/26
36	1.6.2 JUNTA INDUCIDA INCLUYE CORTE Y SELLO CON CORDÓN	24 días	$ 6,583,248.08	35CC	vie 13/02/26	mié 18/03/26
37						
38	**3.7 ACERO ESTRUCTURAL**	**25 días**	**$ 870,539,491.10**		**vie 3/04/26**	**jue 7/05/26**
39	1.7.1 ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 Grado C. (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	15 días	$ 760,133,117.36	23CC+6 días	vie 3/04/26	jue 23/04/26
40	1.7.2 ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60)	15 días	$ 69,402,373.74	23CC+6 días	vie 13/04/26	jue 7/05/26
41						
42	**3.8 CUBIERTA**	**39 días**	**$ 118,833,257.80**		**vie 15/05/26**	**mié 15/09/26**
43	1.8.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO TERMOACUSTICA COMPUESTA POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CALIBRE 31, FOIL DE ALUMINIO, ASFALTO MODIFICADO, PINTURA CARAS EXTERNAS)	19 días	$ 118,833,257.80	39,40	vie 15/05/26	mié 10/06/26
44						
45	**3.9 MAMPOSTERÍA**	**34 días**	**$ 11,508,438.66**		**mar 1/04/26**	**vie 24/04/26**
46	1.9.1 MURO BLOQUE No. 4	3 días	$ 4,893,369.03	38,25	mar 7/04/26	lun 13/04/26
47	1.9.2 MURO EN LADRILLO PRENSADO. A LA VISTA Y ESTRIADO POR LAS DOS CARAS. LIMPIO E HIDROFUGADO	5 días	$ 6,825,036.00	38,25	mar 7/04/26	lun 13/04/26
48	1.9.3 PAÑETE MUROS EXTERIORES Y CUALITAS EN MORTERO 1:4, IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FILOS Y [illegible]	7 días	$ 1,890,033.63	46CC+7 días	jue 15/04/26	vie 24/04/26
49						
50	**3.10 PINTURA**	**5 días**	**$ 28,079,311.05**		**vie 10/04/26**	**jue 16/04/26**
51	1.10.1 PINTURA PARA TRÁFICO ACRILICA	5 días	$ 28,029,111.05	35	vie 10/04/26	jue 16/04/26
52						
53	**3.11 SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS**	**7 días**	**$ 26,703,054.24**		**vie 17/07/26**	**lun 27/07/26**
54	1.11.1 CANAL EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 (INCLUYE SOPORTES, ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	7 días	$ 6,247,380.80	43	vie 17/07/26	lun 27/07/26
55	1.11.2 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE ABRAZADERAS Y SOPORTES)	5 días	$ 14,786,320.24	54CC	vie 17/07/26	jue 23/07/26
56	1.11.3 CAJA DE INSPECCIÓN ILTNO 760.7 M	3 días	$ 2,721,135.00	55CC	vie 17/07/26	mar 21/07/26
57						
58	**3.12 MOBILIARIO DEPORTIVO**	**22 días**	**$ 64,870,122.94**		**jue 29/01/26**	**vie 26/04/26**
59	1.12.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL, INCLUYE TABLERO EN FIBRA DE VIDRIO.	5 días	$ 11,058,384.00	35	vie 10/04/26	jue 16/04/26
60	1.12.2 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA NPI0 Y HUECO DE 2 X 2 ENMARCANDOLA EN ANGULO DE 1 1/ 2 X 3/16. INCLUYE COLUMNAS EN TUBO REDONDO DE 2" X 2 MM. PRODUCTO EPOXICO PARA ANCLAJE A COLUMNA. ANTICORROSIVO Y PINTURA.	31 días	$ 29,351,057.34	35	jue 26/03/26	jue 9/04/26
61	1.12.3 BARANDA METALICA EN TUBO DE AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" X 2.0 mm. PERNOS DE ANCLAJE DE 5/8", PLATINA DE FIJACION DE 10 cm x 10 cm DE 1/4", INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	11 días	$ 24,459,681.60	60CC	vie 10/04/26	vie 24/04/26
62						
63	**3.13 INSTALACIONES ELECTRICAS**	**126 días**	**$ 108,491,778.00**		**vie 20/02/26**	**vie 14/08/26**
64	1.13.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS DE 75W	6 días	$ 10,831,815.00	43	vie 7/08/26	vie 14/08/26
65	1.13.2 SUMINISTRO TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ACOMETIDA PRINCIPAL	10 días	$ 2,378,819.00	77,78	lun 27/07/26	vie 7/08/26
66	1.13.3 SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GENERAL	4 días	$ 5,673,391.00	77,78	lun 27/07/26	jue 30/07/26
67	1.13.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1"	5 días	$ 90,657,460.00	71CC	vie 7/08/26	jue 13/08/26
68	1.13.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THWN 2F#8 + 8T #8 PARA ALAMBRADO DE LUMINARIAS	6 días	$ 14,054,364.00	64CC	vie 7/08/26	vie 14/08/26
69	1.13.6 CAJA DE INSPECCION CS074	3 días	$ 1,589,646.00		jue 2/07/26	lun 6/07/26
70	1.13.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA	3 días	$ 5,632,412.00	69CC	jue 2/07/26	lun 6/07/26
71	1.13.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1"	4 días	$ 14,643,836.00	64CC	vie 7/08/26	mié 12/08/26
72	1.13.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4"	3 días	$ 963,800.00	64CC	vie 7/08/26	mar 11/08/26
73	1.13.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 4 MTS PARA ALUMBRADO CON LUMINARIA DE 40 W	5 días	$ 12,474,864.00	75	lun 14/09/26	vie 25/09/26
74	1.13.11 CAJA DE INSPECCION AP080	3 días	$ 1,079,331.00	69CC	jue 2/07/26	lun 6/07/26
75	1.13.12 TRANSICION SUBTERRANEO AEREO TUBERIA IMC 1"	3 días	$ 749,575.00	76	mar 21/07/26	jue 23/07/26
76	1.13.13 POSTE DE CONCRETO 12 MTS 510 RGF	3 días	$ 2,888,780.00	79	lun 28/03/26	mié 28/03/26
77	1.13.14 ESTRUCTURA 512	4 días	$ 686,121.00	76	mar 21/07/26	vie 24/07/26
78	1.13.15 ESTRUCTURA 515	4 días	$ 518,036.00	76	mar 21/07/26	vie 24/07/26
79	1.13.16 SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	14 días	$ 6,391,882.00	6,13	vie 20/02/26	vie 13/03/26
80	1.13.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THWN 2F#8 + 8T #8 PARA ALAMBRADO DE LUMINARIAS CUBIERTA	6 días	$ 14,061,775.00	64CC	vie 7/08/26	vie 14/08/26
81						
82	**3.14 COMPONENTE URBANISTICO**	**47 días**	**$ 113,814,657.83**		**mar 10/02/26**	**mié 15/04/26**
83	1.14.1 SUMINISTRO INTATACION DE BORDILLO DE 0.18X0.3	21 días	$ 63,146,539.60	87	mar 3/03/26	mar 31/03/26
84	1.14.2 SUMINISTRE E INTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO	14 días	$ 12,446,840.80	83CC	mar 3/03/26	vie 20/03/26
85	1.14.3 SUMINISTRE E INTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO	14 días	$ 1,015,052.36	89CC	mar 3/03/26	vie 20/03/26
86	1.14.4 SUMINISTRE E INTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO AISD	14 días	$ 858,132.00	83CC	mar 3/03/26	vie 20/03/26
87	1.14.5 BASE GRANULAR	35 días	$ 20,913,587.00	9	mar 10/02/26	lun 2/03/26
88	1.14.6 SUMINISTRE E INTALACION DE LOSETAS PREFABRICADAS (BICAPA (CUADRATICA)	1 día	$ 138,777,145.00	93	mié 1/04/26	mié 1/04/26
89	1.14.7 SUMINISTRE E INTALACION DE LOSETAS PREFABRICADAS (BICAPA (TOPERO))	10 días	$ 66,851,578.75	93	mié 1/04/26	mar 14/04/26
90	1.14.8 SUMINISTRE E INTALACION DE ADOQUINES	11 días	$ 69,725,473.45	89CC	mié 1/04/26	mié 15/04/26
91	1.14.9 PLACA DE PISO EN CONCRETO	4 días	$ 28,474,338.00	87	mar 3/03/26	mar 10/03/26
92	1.14.10 SUMINITRO E INTALACION DE BANCAS TIPO ISU CON ESPALDAR	4 días	$ 12,585,075.00	91CC	mar 3/03/26	vie 6/03/26
93	1.14.11 DOTACION DE JUEGOS RECREATIVOS PARA PARQUE INFANTIL	4 días	$ 74,734,941.00	91CC	mar 3/03/26	vie 6/03/26
94	1.14.12 FILTRO FRACES PARA PARQUE INFANTIL	4 días	$ 7,051,155.00	87	mar 3/03/26	vie 6/03/26
95	1.14.13 REFORESTACION VERTICAL	4 días	$ 8,053,231.00	87	lun 9/03/26	jue 12/03/26

Proyecto: Programación Parque
Fecha: vie 26/09/25

Página 1

SECRETARIO DE PLANEACIÓN

ING. FABIAN QUIROGA MOSQUERA- PROFESIONAL DE APOYO
