
ECONTAINERS S.A.S

SENA REGIONAL CALDAS - MANIZALES

Agrupar Por: Hitos Ver: Todo abierto Exportado El: 20/11/2025 05:00 p. m.

ID	Nombre De Tarea	Estado	Fecha De I...	Fecha De Vencimiento	Duración
	CONTENEDORES COWORKING 4X20FT	Activo	19/10/2025	28/11/2025	
	1. ABASTECIMIENTO CONTENEDOR... (1)		10/11/2025	21/11/2025	
SR3-T54	1.1. Abastecimiento	Abrir	10/11/2025 08	21/11/2025 06:00 PM (Quedan 1 días	10 días
	2. RESTAURACIÓN (4)		17/11/2025	26/11/2025	
SR3-T50	2.1. Latonería	Abrir	17/11/2025 08:	18/11/2025 06:00 PM (hace 1 días y 8	2 días
SR3-T51	2.2. Grateado	Abrir	19/11/2025 08	20/11/2025 06:00 PM (Quedan 1 hor	2 días
SR3-T52	2.3. Aplicación hueso duro	Abrir	21/11/2025 08	24/11/2025 06:00 PM (Quedan 2 día	2 días
SR3-T53	2.4. Lijado hueso duro	Abrir	25/11/2025 08	26/11/2025 06:00 PM (Quedan 4 día	2 días
	3. DETALLADO (3)		27/11/2025	03/12/2025	
SR3-T47	3.1. Fondeo con anticorrosivo	Abrir	27/11/2025 08	27/11/2025 06:00 PM (Quedan 5 día	1 día
SR3-T48	3.2. Aplicación masilla roja	Abrir	28/11/2025 08	01/12/2025 06:00 PM (Quedan 7 día	2 días
SR3-T49	3.3 Lijado masilla roja	Abrir	02/12/2025 0	03/12/2025 06:00 PM (Quedan 9 día	2 días
	4. ESTRUCTRUACIÓN PUERTAS Y ... (4)		24/11/2025	09/12/2025	
SR3-T39	4.1. Cimbrado y cortes de vanos puertas y...	Abrir	24/11/2025 08	25/11/2025 06:00 PM (Quedan 3 día	2 días
SR3-T40	4.2. Fabricación de marcos	Abrir	26/11/2025 08	01/12/2025 06:00 PM (Quedan 7 día	4 días
SR3-T41	4.3. Instalación marcos	Abrir	02/12/2025 0	03/12/2025 06:00 PM (Quedan 9 día	2 días
SR3-T42	4.4. Resoldado de marcos	Abrir	04/12/2025 0	09/12/2025 06:00 PM (Quedan 13 d	4 días
	5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS (6)		04/12/2025	16/12/2025	
SR3-T33	5.1. Instalación de cajas y soportes	Abrir	04/12/2025 0	04/12/2025 06:00 PM (Quedan 10 d	1 día
SR3-T34	5.2. Instalación tubería	Abrir	05/12/2025 0	08/12/2025 06:00 PM (Quedan 12 d	2 días
SR3-T35	5.3. Cableado	Abrir	09/12/2025 0	09/12/2025 06:00 PM (Quedan 13 d	1 día
SR3-T36	5.4. Instalación caja de circuitos	Abrir	10/12/2025 0	10/12/2025 06:00 PM (Quedan 14 dí	1 día
SR3-T37	5.5. Instalación apartaos y luminarias	Abrir	16/12/2025 08	16/12/2025 06:00 PM (Quedan 18 dí	1 día
SR3-T38	5.6. Instalación red voz y datos	Abrir	16/12/2025 08	16/12/2025 06:00 PM (Quedan 18 dí	1 día
	9. INSTALACIÓN DE PISO (2)		10/12/2025	17/12/2025	
SR3-T20	9.1. Reparación de piso	Abrir	10/12/2025 0	11/12/2025 06:00 PM (Quedan 15 día	2 días
SR3-T24	9.7. Instalación tapete	Abrir	12/12/2025 08	17/12/2025 06:00 PM (Quedan 19 día	4 días
	10. ACABADOS INTERNOS (3)		11/12/2025	15/12/2025	
SR3-T17	10.1. Alistamiento superficia	Abrir	11/12/2025 08	11/12/2025 06:00 PM (Quedan 15 día	1 día
SR3-T18	10.2. Empapelado superficie	Abrir	11/12/2025 08	11/12/2025 06:00 PM (Quedan 15 día	1 día
SR3-T19	10.3. Aplicación pintura final	Abrir	12/12/2025 08	15/12/2025 06:00 PM (Quedan 17 día	2 días
	11. ACABADOS EXTERNOS (3)		11/12/2025	15/12/2025	
SR3-T14	11.1. Alistamiento superficie	Abrir	11/12/2025 08	11/12/2025 06:00 PM (Quedan 15 día	1 día
SR3-T15	11.2. Empapelado superficie	Abrir	11/12/2025 08	11/12/2025 06:00 PM (Quedan 15 día	1 día
SR3-T16	11.3. Aplicación pintura final	Abrir	12/12/2025 08	15/12/2025 06:00 PM (Quedan 17 día	2 días
	13. REMATES Y VARIOS (6)		15/12/2025	15/12/2025	
SR3-T5	13.2. Sikado	Abrir	15/12/2025 08	15/12/2025 06:00 PM (Quedan 17 día	1 día
SR3-T6	13.3. Instalación toldos	Abrir	15/12/2025 08	15/12/2025 06:00 PM (Quedan 17 día	1 día
SR3-T7	13.4. Aseo final	Abrir	15/12/2025 08	15/12/2025 06:00 PM (Quedan 17 día	1 día
SR3-T8	13.6. Asegurado mobiliario	Abrir	15/12/2025 08	15/12/2025 06:00 PM (Quedan 17 día	1 día
SR3-T9	13.7. Instalación placa de producto en venta	Abrir	15/12/2025 08	15/12/2025 06:00 PM (Quedan 17 día	1 día
SR3-T10	13.8. Serial local	Abrir	15/12/2025 08	15/12/2025 06:00 PM (Quedan 17 día	1 día
	14. CUBIERTA (5)		02/12/2025	21/12/2025	
SR3-T1	14.1. Corte y fabricación de estructura	Abrir	02/12/2025 0	04/12/2025 06:00 PM (Quedan 10 d	3 días
SR3-T59	14.2. Presentación de estructura	Abrir	05/12/2025 0	09/12/2025 06:00 PM (Quedan 13 d	3 días
SR3-T60	14.3. Resoldado de estructura	Abrir	10/12/2025 0	12/12/2025 06:00 PM (Quedan 16 día	3 días
SR3-T61	14.4. Pintado de estructura	Abrir	15/12/2025 08	16/12/2025 06:00 PM (Quedan 18 dí	2 días
SR3-T62	14.5. Instalación de tejado y bajantes	Abrir	17/12/2025 08	21/12/2025 06:00 PM (Quedan 22 dí	4 días
	LOGISTICA Y TRANSPORTE	Activo	16/12/2025	19/12/2025	
	16. TRANSPORTE Y DESCARGUE (4)		16/12/2025	19/12/2025	
SR3-T55	16.1. Cargue contenedores en planta	Abrir	16/12/2025 08	16/12/2025 06:00 PM (Quedan 18 dí	1 día
SR3-T56	16.2. Transporte Bogota - Manizales	Abrir	16/12/2025 08	17/12/2025 06:00 PM (Quedan 19 día	2 días
SR3-T57	16.3. Descargue y posicionamiento	Abrir	18/12/2025 08	18/12/2025 06:00 PM (Quedan 20 d	1 día
SR3-T58	16.4. Entrega definitiva	Abrir	18/12/2025 08	19/12/2025 06:00 PM (Quedan 21 día	2 días

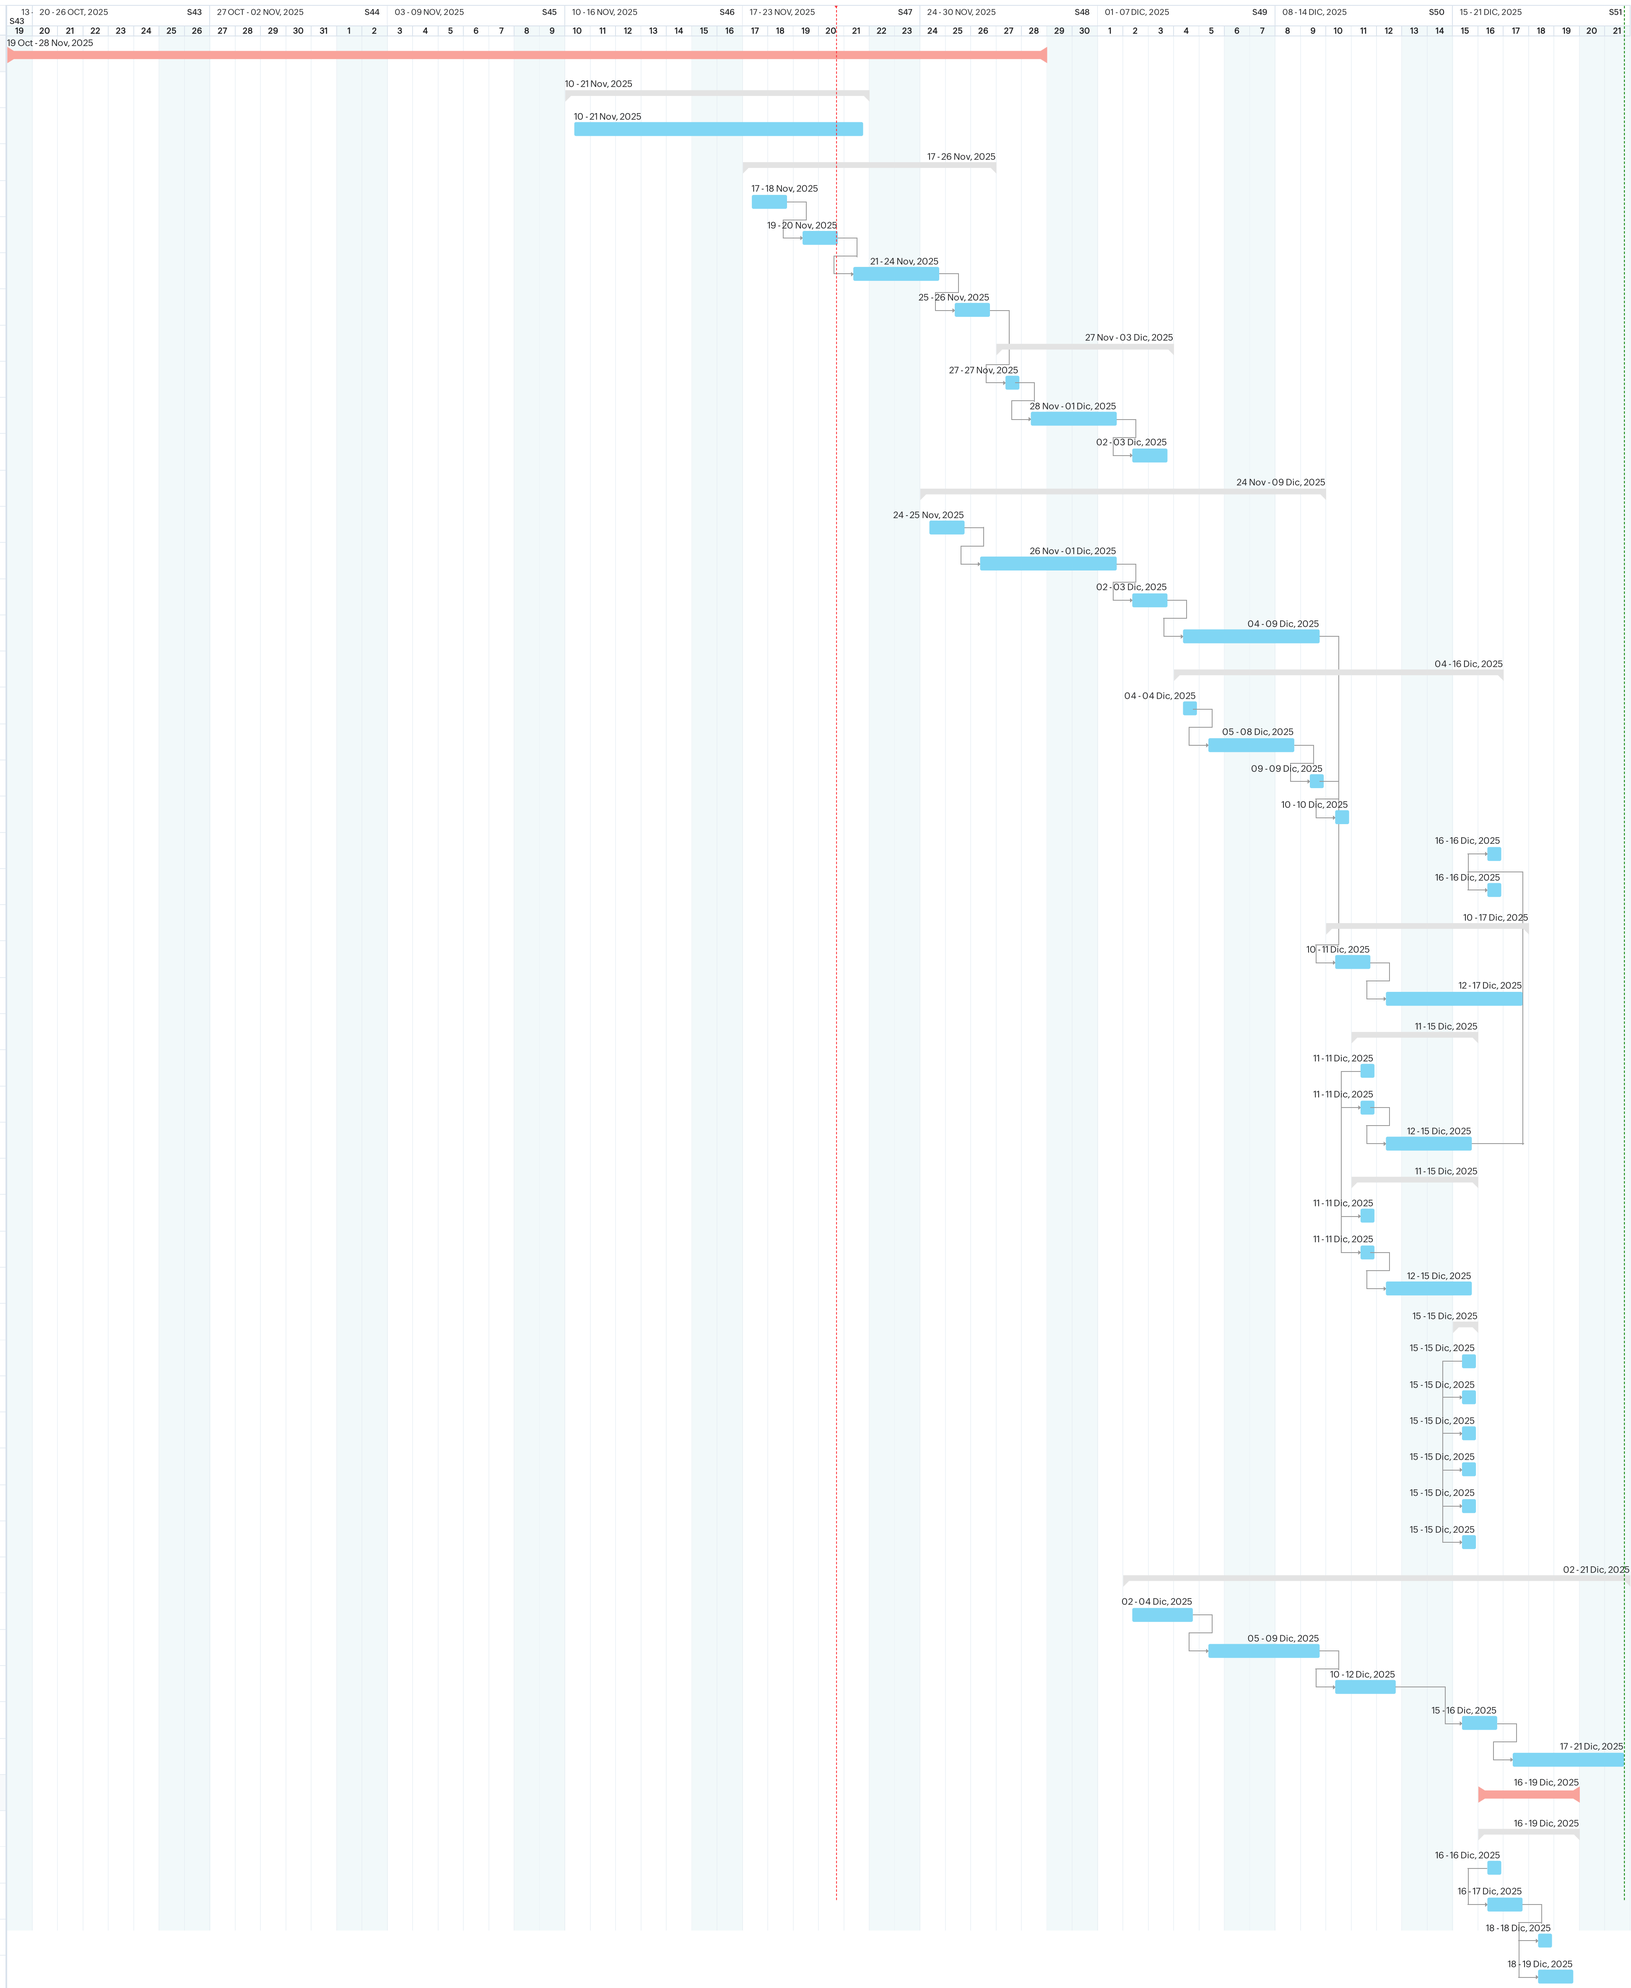

Leyendas

Hito · Listas de tareas · Tarea · Subtarea · Tarea con duración cero · Línea de fondo

Línea base y retraso · Ruta crítica · Retraso de Tarea · Tareas de consolidación · Subtareas de remonte · Tarea cerrada puntualmente

Tarea cerrada con retraso · Tarea cerrada antes del inicio

*Los colores de las barras de Tarea se pueden personalizar.
