

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% Progr	% Complet
1		LOTE 6	0 días	mar 23/04/24	mar 23/04/24		100,00%	100,00%
2		**INICIO**	**494,06 d**	**mar 23/04/24**	**vie 30/01/26**	**1**	**125,56%**	**77,47%**
3		**ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**312,94 d**	**jue 25/07/24**	**mar 9/09/25**		**100,00%**	**100,00%**
4		ESTUDIO DE SUELOS CON TRES SONDEOS PARA CARECTIZACION	280 días	jue 25/07/24	sáb 26/07/25		100,00%	100,00%
5		DISEÑO ESTRUCTURAL	165,33 d	lun 2/09/24	sáb 6/09/25	4CC+1 día	100,00%	100,00%
6		DISEÑO HIDRAULICO	120 días	mié 7/08/24	sáb 6/09/25	4CC+10 días	100,00%	100,00%
7		APROBACION DE DISEÑO	1,78 días	sáb 6/09/25	mar 9/09/25	6	100,00%	100,00%
8		**ETAPA DE EJECUCION**	**494,06 d**	**mar 23/04/24**	**vie 30/01/26**		**125,57%**	**77,47%**
9		**Capitulo - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**447,83 días**	**mar 23/04/24**	**lun 1/12/25**		**100,00%**	**84,91%**
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)	41,44 días	mar 2/07/24	vie 31/10/25	7CC-45 días	100,00%	92,86%
11		DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	403,39 días	jue 2/05/24	lun 13/10/25	10CC+7 días	100,00%	95,17%
12		DEMOLICIONES GENERALES Y RETIRO DE MATERIAL	388,39 d	mar 21/05/24	lun 13/10/25	11CC+15 día	100,00%	66,67%
13		MANEJO DE AGUAS	24 días	mar 6/08/24	mar 30/09/25	6CC+2 días	100,00%	100,00%
14	✓	CONFORMACIÓN DE FONDO DE PIEDRA CICLOPEA COMPACTADA (ESTABILIACION TERRENO)	5 días	sáb 5/10/24	vie 11/10/24	13CF+28 días	100,00%	100,00%
15	✓	RELLENO DE PIEDRA CANTO DORADO PARA FILTRO	4 días	sáb 21/12/24	vie 27/12/24	92CC+61 día	100,00%	77,59%
16	✓	SUMINISTO E INSTALACION DE MALLA GEOTEXTIL NT 1600 PARA FILTRO	34 días	vie 20/12/24	lun 3/02/25	92CC+60 días	100,00%	92,11%
17	✓	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=2" PARA LLORADERO	8,72 días	vie 27/12/24	mar 7/01/25	15	100,00%	83,19%
18		DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	356,06 d	lun 6/05/24	vie 24/10/25	10CC+10 día	100,00%	64,70%
19		NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	297,72 d	mar 23/04/24	lun 1/12/25	10CC+10 día	100,00%	87,68%
20		DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25	385,78 días	lun 27/05/24	mié 15/10/25	19CC+10 días	100,00%	87,36%
21		DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	336,72 d	mar 30/07/24	mar 14/10/25	19CC+30 día	100,00%	28,36%
22		DEMOLICIÓN DE MURO BAJO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	333,56 días	jue 1/08/24	lun 13/10/25	19CC+32 días	100,00%	82,51%
23		DESMONTE DE MARCOS DE PORTERÍA DE CANCHA DEPORTIVA	380,94 días	lun 6/05/24	mié 26/11/25	10CC+10 días	100,00%	100,00%
24		EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA (ZONAS DURAS EN GENERAL)	302,07 días	mié 17/07/24	sáb 18/10/25	20CC+70 días	100,00%	78,11%
25		EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	214,78 días	lun 30/09/24	mar 4/11/25	20CC+180 días	100,00%	79,33%
26		EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	207,67 días	mié 17/07/24	vie 7/11/25	20CC+180 días	100,00%	91,99%
27		EXCAVACIÓN Y FUNDIDA DE ZAPATA DE 1.20 X 1.20 X 0.30 MTS, CON CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADA	275,66 días	mié 30/10/24	vie 7/11/25	93CC+10 días	100,00%	60,00%
28		RELLENO PARA CONFORMACIÓN DE GRADAS Y ESCALERAS, CON RELLENO EN MATERIAL GRANULAR PARA ESPALDON DE GEOSACOS, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA	245,17 días	mié 20/11/24	lun 1/12/25	93CC+20 días	100,00%	77,96%
29		**Capitulo - ESTRUCTURA**	**387,39 d**	**mié 4/09/24**	**sáb 24/01/26**		**100,96%**	**84,62%**
30		VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS	286,94 días	lun 25/11/24	vie 5/12/25	93CC+20 días	100,00%	71,81%
31		PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESRO PROMEDIO 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	328,72 días	mié 20/11/24	sáb 24/01/26		89,78%	88,57%
32		SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	317,17 d	mar 17/09/24	jue 6/11/25	26CC+20 día	100,00%	94,14%
33		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	305,39 días	mié 16/10/24	jue 20/11/25	92CC+10 días	100,00%	87,68%
34		COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.30 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	239,83 días	jue 30/01/25	mié 10/12/25	33CC+2 días	100,00%	93,85%
35		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0.15 X (0.30 - 0.50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).	306,5 días	mié 30/10/24	vie 5/12/25	92CC+10 días	100,00%	97,35%
36		PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	272,72 días	lun 18/11/24	mié 14/01/26	33CC+1 día	108,86%	64,18%
37	✓	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0.07 METROS, INCLUYE: PARRILLA DE ACERO DE D= 1/4" A CADA 0.50 METROS EN AMBOS SENTIDOS (VER DISEÑO).	186,5 días	mar 1/04/25	lun 1/12/25	34	100,00%	96,42%
38		CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE FORMALETA	342,77 días	mié 4/09/24	vie 12/12/25	32CC+2 días	103,21%	100,00%
39		JUNTA DE DILATACIÓN CON CINTA SIKA PVC DE UAN 0-22 Y SIKAFLEX DE 300 CC O SIMILAR	32,1 días	mié 4/09/24	mié 30/04/25	38CC+150 días	100,00%	100,00%
40		FONDO Y MUROS DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI; INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILADA, ARMADO DE ACERO, FORMALETA, VACIADO Y DESENCOFRE	154,72 días	lun 2/12/24	vie 19/12/25	33CC+80 días	185,00%	55,56%
41		REGISTRO EN CONCRETO DE 0.60 x 0.60 MTS.	147,01 d	lun 2/12/24	vie 12/12/25	40CC+140 d	194,69%	66,67%
42		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	206,67 d	mar 15/10/24	jue 30/10/25	32CC-5 días	100,00%	88,45%
43		**Capitulo - MAMPOSTERIA**	**354,5 día**	**mar 10/09/24**	**jue 18/12/25**		**1045,41%**	**83,81%**
44		LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4	290,42 días	mar 10/09/24	jue 4/12/25	36CC+1 día	100,00%	86,91%
45		LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D= 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARI	275,39 días	mié 20/11/24	sáb 15/11/25	44CC-40 días	100,00%	50,56%
46		FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	284,28 d	mié 11/12/24	jue 18/12/25	47CC+1 día	98,18%	82,92%
47		PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	5,34 días	jue 10/10/24	jue 18/12/25	45	6106,07%	86,05%
48		**Capitulo - ACABADOS**	**333,17 d**	**mié 20/11/24**	**vie 30/01/26**		**104,09%**	**87,37%**
49		PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	321,61 días	jue 5/12/24	vie 30/01/26	47CC+15 días	88,17%	84,57%
50		PINTURA EPÓXICA PARA PISO	246,5 día	jue 5/12/24	mié 24/12/25	36CC+60 día	114,85%	92,97%

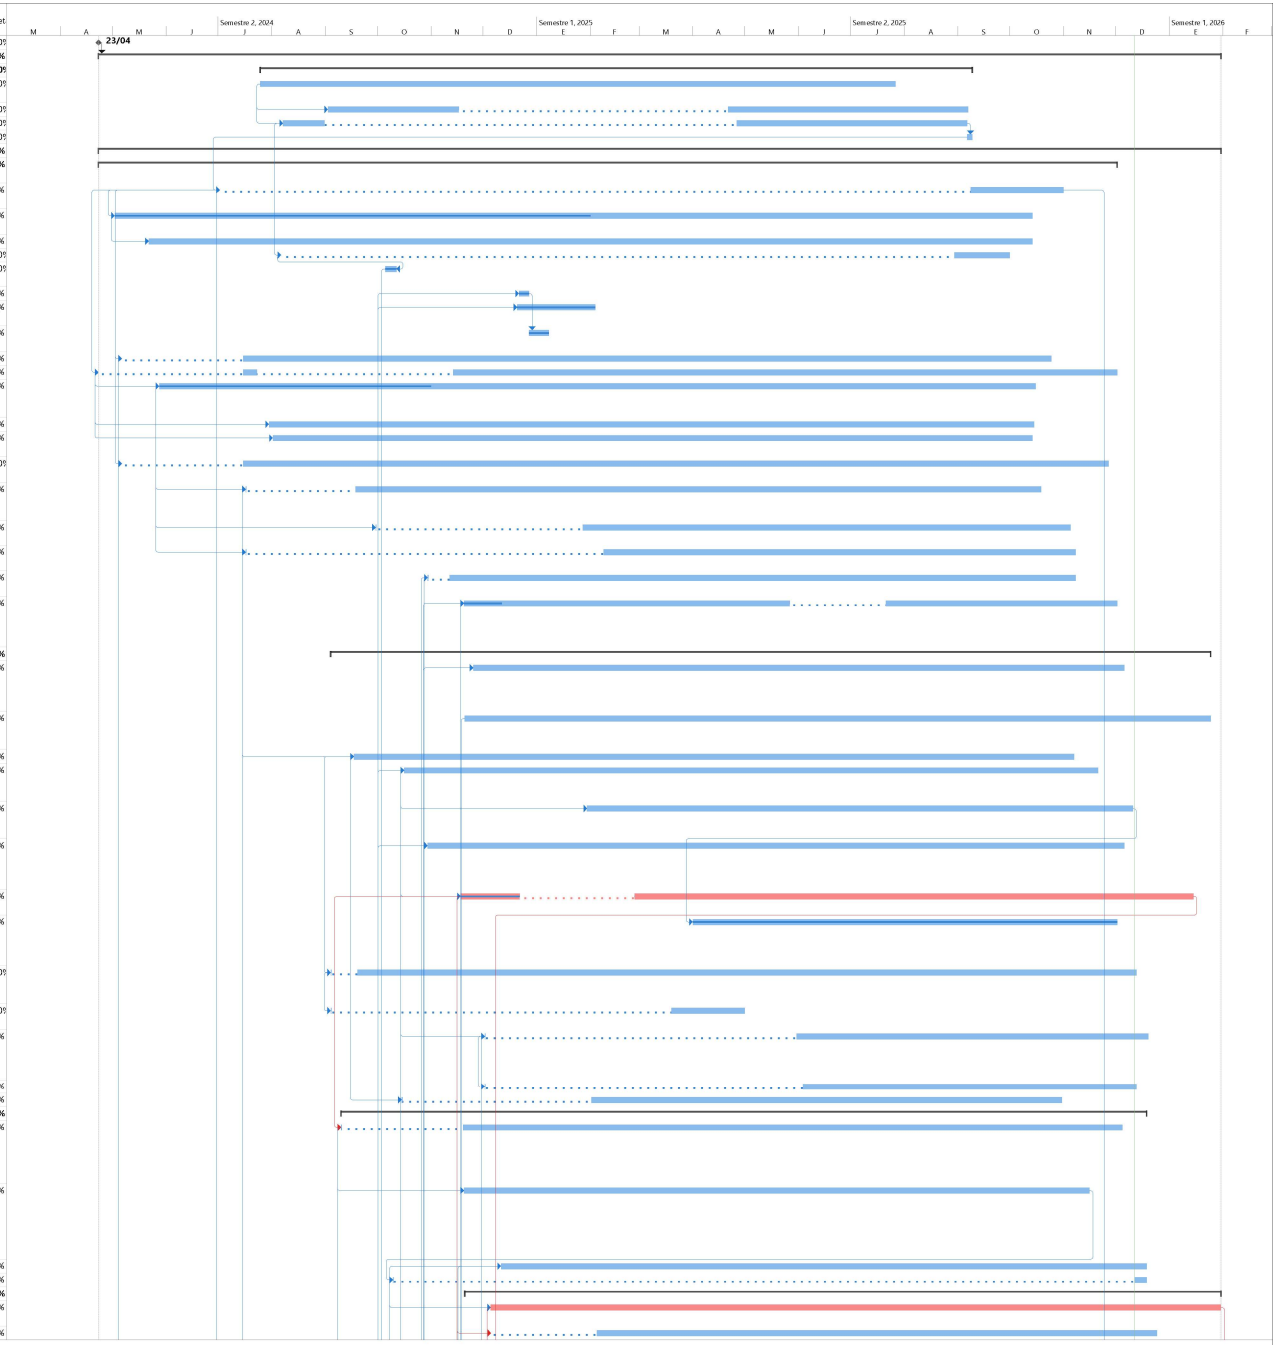

Proyecto: PROGRAMACION PO
Fecha: vie 12/12/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% Progr	% Complet
51		ALFAJIAS EN CONCRETO DE 0,20 X 0,08 , INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,25 METROS	298,5 días	mié 20/11/24	mar 16/12/25	46CC-20 días	98,86%	80,26%
52		**Capitulo - EQUIPAMENTO**	**318,06 d**	**lun 2/12/24**	**jue 22/01/26**		**239,98%**	**78,40%**
53		SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 4 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (VER DISEÑO).	38,06 días	mié 27/08/25	mié 15/10/25	36CC-10 días	100,00%	100,00%
54		SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 6 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (PARA ZONA DE PICNIC).	20,89 días	sáb 26/07/25	mié 29/10/25	53CC-1 día	100,00%	87,50%
55		SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO (VER DISEÑO)	281,19 días	lun 9/12/24	vie 19/12/25	31CC+20 días	99,89%	73,65%
56		JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MINIFUTBOL, CON MEDIDAS Y ALTURA REGLAMENTARIAS, LOS MARCOS EN TUBO DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR EN TUBO DE 2", PINTADOS, INSTALADOS Y CON SUS RESPECTIVAS MALLAS	148,67 días	jue 12/12/24	mié 17/12/25	85CC+30 días	187,14%	75,00%
57		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO SENCILLO CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DE 5 A 12 AÑOS (VER DISEÑO).CLASSIC SWING SENCILLO (2)	214,94 días	lun 2/12/24	mar 9/09/25	62CC+30 días	100,00%	100,00%
58		E- JUEGOS INFANTILES- SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS DE SISTEMA MULTLIPE O SIMILAR - SISTEMA TODDLER	7,4 días	jue 12/12/24	jue 22/01/26	36	3757,88%	66,67%
59		**Capitulo - JUEGOS INFANTILES**	**318,94 d**	**lun 25/11/24**	**vie 16/01/26**		**94,50%**	**75,33%**
60		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT.	302,94 días	lun 25/11/24	vie 26/12/25	33CC+30 días	96,24%	74,46%
61		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT.	318,94 días	lun 25/11/24	vie 16/01/26	33CC+30 días	91,41%	71,55%
62		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER, ALTURA 1.00 METRO, PARA CERRAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES ML	294,28 días	mar 26/11/24	vie 16/01/26	36CC+30 días	98,77%	87,86%
63		JUEGOS INFANTILES- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO DOBLE CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 5 A 15 AÑOS (VER DISEÑO)	301,83 días	jue 28/11/24	lun 29/12/25	62CC+2 días	95,64%	100,00%
64		SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO PEQUEÑO	2 días	mié 15/10/25	vie 17/10/25	62CC+1 día	100,00%	100,00%
65		E - JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRITO O DINOSAURIO (VER DISEÑO).	2 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25	64CC+1 día	0,00%	66,67%
66		SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS (ROCKY RIVER- GALVANIZADO EN CALIENTE)	45 días	mié 22/10/25	vie 19/12/25	62CC+90 días	86,54%	75,00%
67		**CAPITULO - GYM BIOSALUDABLE**	**313,61 d**	**lun 2/12/24**	**vie 16/01/26**		**117,29%**	**33,33%**
68		GYM BIOSALUDABLE ELIPTICA DOBLE ESTACION: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION (VER DISEÑO).	193,61 días	lun 2/12/24	mar 16/12/25	36CC+2 días	147,83%	25,00%
69		GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PECHO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	153,5 días	mar 3/12/24	sáb 25/10/25	68CC+1 día	100,00%	0,00%
70		GYM BIOSALUDABLE BANCO ABDOMINAL: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	159,11 días	mar 3/12/24	lun 27/10/25	68CC+1 día	100,00%	50,00%
71		GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	198,94 días	mar 3/12/24	mié 17/12/25	36CC+1 día	143,42%	0,00%
72		GYM BIOSALUDABLE CAMINADOR AEREO-ESTACION DOBLE: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	222 días	mar 3/12/24	vie 16/01/26	68CC+1 día	128,53%	40,00%
73		GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PIERNA: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 14 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	216,67 días	mar 3/12/24	vie 16/01/26	68CC+1 día	131,69%	40,00%
74		GYM BIOSALUDABLE GIRO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	150,06 días	lun 2/12/24	lun 27/10/25	68CC-3 días	100,00%	50,00%
75		GYM BIOSALUDABLE REMO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	212,28 días	lun 2/12/24	vie 16/01/26	68CC-3 días	134,83%	0,00%
76		GYM BIOSALUDABLE VOLANTES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	101,33 días	lun 2/12/24	sáb 23/08/25	68CC-3 días	100,00%	33,33%
77		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE BRAZOS	101,33 días	lun 2/12/24	sáb 23/08/25	68CC-3 días	100,00%	0,00%
78		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE TRICEPS	99,72 días	mar 3/12/24	sáb 23/08/25	68CC-3 días	100,00%	33,33%
79		GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA SQUAT	99,72 días	mar 3/12/24	sáb 23/08/25	68CC-3 días	100,00%	33,33%
80		GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA BANCA DE PECHO	99,72 días	mar 3/12/24	sáb 23/08/25	68CC-3 días	100,00%	100,00%
81		**CAPITULO - URBANISMO**	**382,06 d**	**mié 17/07/24**	**sáb 29/11/25**		**100,00%**	**82,99%**

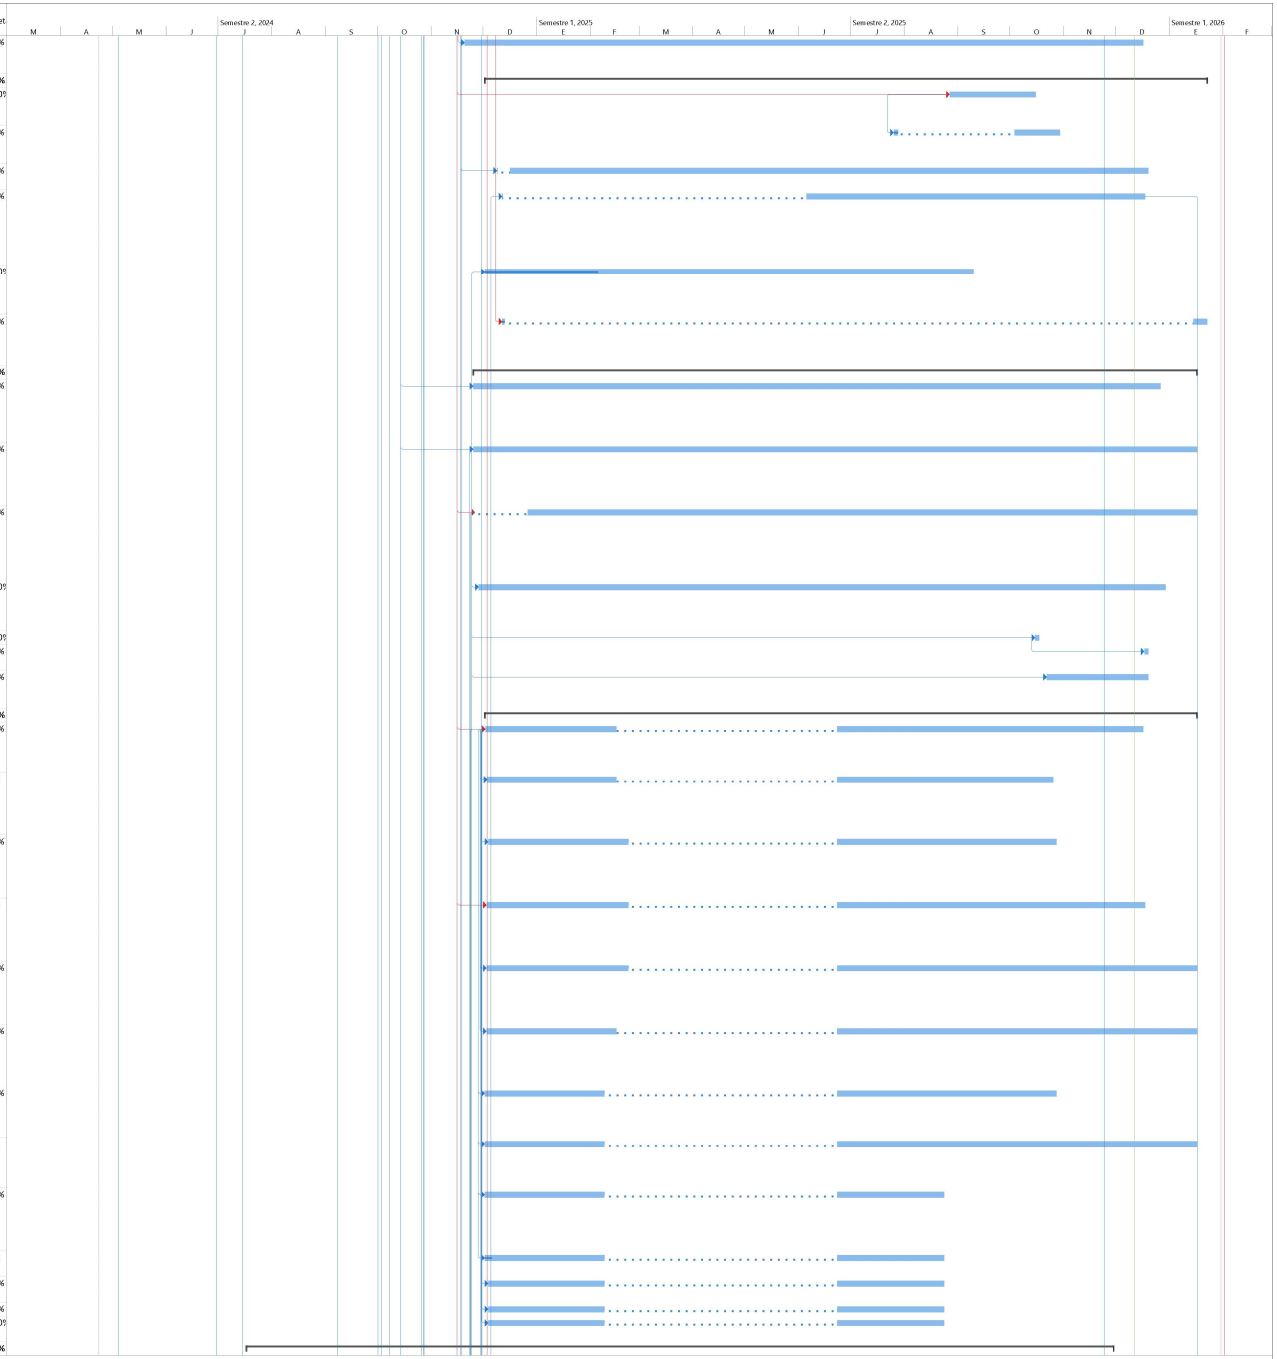

Proyecto: PROGRAMACION PO
Fecha: vie 12/12/25

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% Progr	% Complet
82		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M.	160 días	mié 17/07/24	mar 11/02/25	10CC-80 días	100,00%	33,33%
83		SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SEÑALIZACION DE 1.00 X 050 METROS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ESTRUCTURA DE SOPORTE - PARAL EN ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE: ESCRITO DE INFORMACION, L	2 días	jue 26/06/25	sáb 28/06/25	49CC+140 días	100,00%	90,00%
84		CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PERIMETRALES DE ANCHO= 0,40 METROS X ALTURA VARIABLE, INCLUYE: RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN GEOTEXTÍL NT 1800, TUBERÍA PERFORADA PARA FILTROS DIAMETRO 8" Y CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE DIAMETRO D=1"	15 días	vie 4/04/25	jue 24/04/25	92CC+140 días	100,00%	0,00%
85		CONSTRUCCIÓN DE FILTROS INTERIORES EN ESPINA DE PESCADO DE ANCHO= 0,40 METROS X ALTURA VARIABLE, INCLUYE: RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN GEOTEXTÍL NT 1800, TUBERÍA PERFORADA PARA FILTROS DIAMETRO 4" Y CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE DIAMETRO D=1"	272,5 días	sáb 7/12/24	sáb 29/11/25	92CC+50 días	100,00%	87,98%
86		**CAPITULO - NO PREVISTOS**	**414,06 d**	**mar 6/08/24**	**vie 30/01/26**		**96,40%**	**64,56%**
87		SUMINISTO Y APLICACIÓN DE IMPERMEBILIZANTE IGOL DENSO	303,83 días	mar 19/11/24	lun 22/12/25	47CC+2 días	97,42%	47,03%
88		SUMINISTRO E INSTALACION DE BANNER	223,11 d	mar 6/08/24	mar 4/11/25	10CC+80 días	100,00%	84,51%
89		DEMOLICIÓN DE GRADAS EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL	140,28 días	lun 2/12/24	vie 26/09/25	18CC+160 días	100,00%	11,61%
90		DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION DE GRADERIAS DE 0,60*0,40 MTS	20,28 días	lun 4/11/24	vie 29/11/24	89	100,00%	70,83%
91		DESMONTE DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO	50 días	vie 13/09/24	sáb 29/11/25	88	100,00%	43,48%
92		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PARA ESTABILIZACION DE TERRENO CON ESPECIFICACION ESTUDIO SUELO PARA AISLAR DE LAS ARCILLAS EXPANSIVAS, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	300,28 días	jue 3/10/24	vie 31/10/25	24CC+50 días	100,00%	79,08%
93		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, DE 0,30 X 0,55 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	170 días	mar 29/10/24	mié 10/12/25	92CC+160 días	100,00%	100,00%
94		JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA MULTIPLE EN TUBERÍA GALVANIZADA ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS TABLERO ACRILICO DE 20 MM Y ARO CON MALLA PARA BALONCESTO	15 días	sáb 5/04/25	vie 25/04/25	31CC+25 días	100,00%	100,00%
95		BASE MEJORADA CON SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO	315,56 días	vie 11/10/24	sáb 29/11/25	14CC+20 días	100,00%	101,35%
96		DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL	7 días	sáb 9/11/24	mar 19/11/24	10CC+100 días	100,00%	100,00%
97		DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EXISTENTE DE 0.30 X 0.30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL	8 días	lun 6/10/25	jue 16/10/25	96	100,00%	37,30%
98		CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA ANDENES,CANCHAS Y PISOS ESTAMPADOS	124,56 días	mié 14/05/25	vie 26/12/25	31CC+7 días	129,39%	61,13%
99		ESCALERAS Y GRADAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	15 días	lun 24/11/25	sáb 13/12/25	28CC+5 días	89,26%	100,00%
100		COLECTOR AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC DIAMETRO DIAMETRO 4"	138,11 días	jue 1/05/25	vie 28/11/25	85CC+1 día	100,00%	28,28%
101		COLECTOR AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC DIAMETRO DIAMETRO 6"	140 días	mar 29/04/25	vie 28/11/25	85CC+1 día	100,00%	104,57%
102		SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA 4 " PARA EMPALME FILTRO	246,83 días	lun 9/12/24	vie 28/11/25	85CC+1 día	100,00%	81,25%
103		RELLENO EN ARENA LAVADA BLANCA (TIPO SILICE) EN AREA DE CANCHA	49 días	vie 13/12/24	sáb 26/07/25	85CC+5 días	100,00%	100,00%
104		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TIC TOC	2 días	mié 27/11/24	vie 29/11/24	62CC+1 día	100,00%	33,33%
105		SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE SUBE Y BAJA SENCILLO	2 días	mié 27/11/24	vie 29/11/24	62CC+1 día	100,00%	33,33%
106		SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUCHO SINTETICO PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES E: 2CM TIPO TPV (TERMOPLASTICO VULCANIZADO)(10)	102,78 días	jue 13/02/25	vie 7/11/25	105	100,00%	93,74%
107		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ASCENSOR PRESS DE PECHO	182,94 días	mar 3/12/24	mié 17/12/25	68CC-3 días	155,97%	66,67%
108		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA BARRA ALTA	186,83 días	mié 27/11/24	mié 17/12/25	68CC-3 días	154,80%	66,67%
109		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BIOSALUDABLE CINTURA	78,83 días	vie 31/01/25	mar 28/10/25	68CC-3 días	100,00%	66,67%
110		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BIOSALUDABLE PARALELA	72,61 días	sáb 22/03/25	mié 17/12/25	68CC-3 días	277,36%	33,33%
111		SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON ESPALDAR DE 2.40 MT, BISCOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	43,56 días	jue 17/04/25	vie 26/12/25	31CC+5 días	416,70%	48,00%
112		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS EN CONCRETO BICOLOR MATE DE 40*40 RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	57,78 días	sáb 19/04/25	vie 26/12/25	31CC+5 días	311,05%	113,73%
113		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALA URBANA DE 3 PUESTOS CON MESA DE CENTRO, ACABADO MATE,PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO(11)	7 días	vie 27/06/25	sáb 5/07/25	31CC+5 días	100,00%	0,00%
114		SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS Y PORTONES EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER	109,17 días	jue 26/12/24	jue 15/01/26	36CC+2 días	245,09%	75,70%
115		PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS , CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE (NO INCLUYE CORTE NI SELL	15 días	mar 14/01/25	jue 18/09/25	114CC+15 días	100,00%	23,54%
116		EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRENO SATURADO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y CONTROL AGUAS DE NIVEL FREATICO	178,5 días?	lun 9/09/24	mié 30/04/25	24CC+1 día	100,00%	61,06%
117		LIMPIEZA EN ARROYOS CANALIZADOS Y RETIRO DE MATERIAL	164,28 días	vie 27/09/24	mié 30/04/25	116CC+2 días	100,00%	33,46%
118		ANCLAJE DE 3/8" CON EPOXICO	150 días	mié 28/05/25	mié 10/12/25	33CC+15 días	100,00%	38,38%
119		REPARACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS	60 días	jue 25/09/25	vie 12/12/25	92CC+15 días	98,80%	60,84%
120		DEMARCACION CANCHA MULTPLE	14 días	mié 13/08/25	sáb 30/08/25	61CC+45 días	100,00%	140,91%

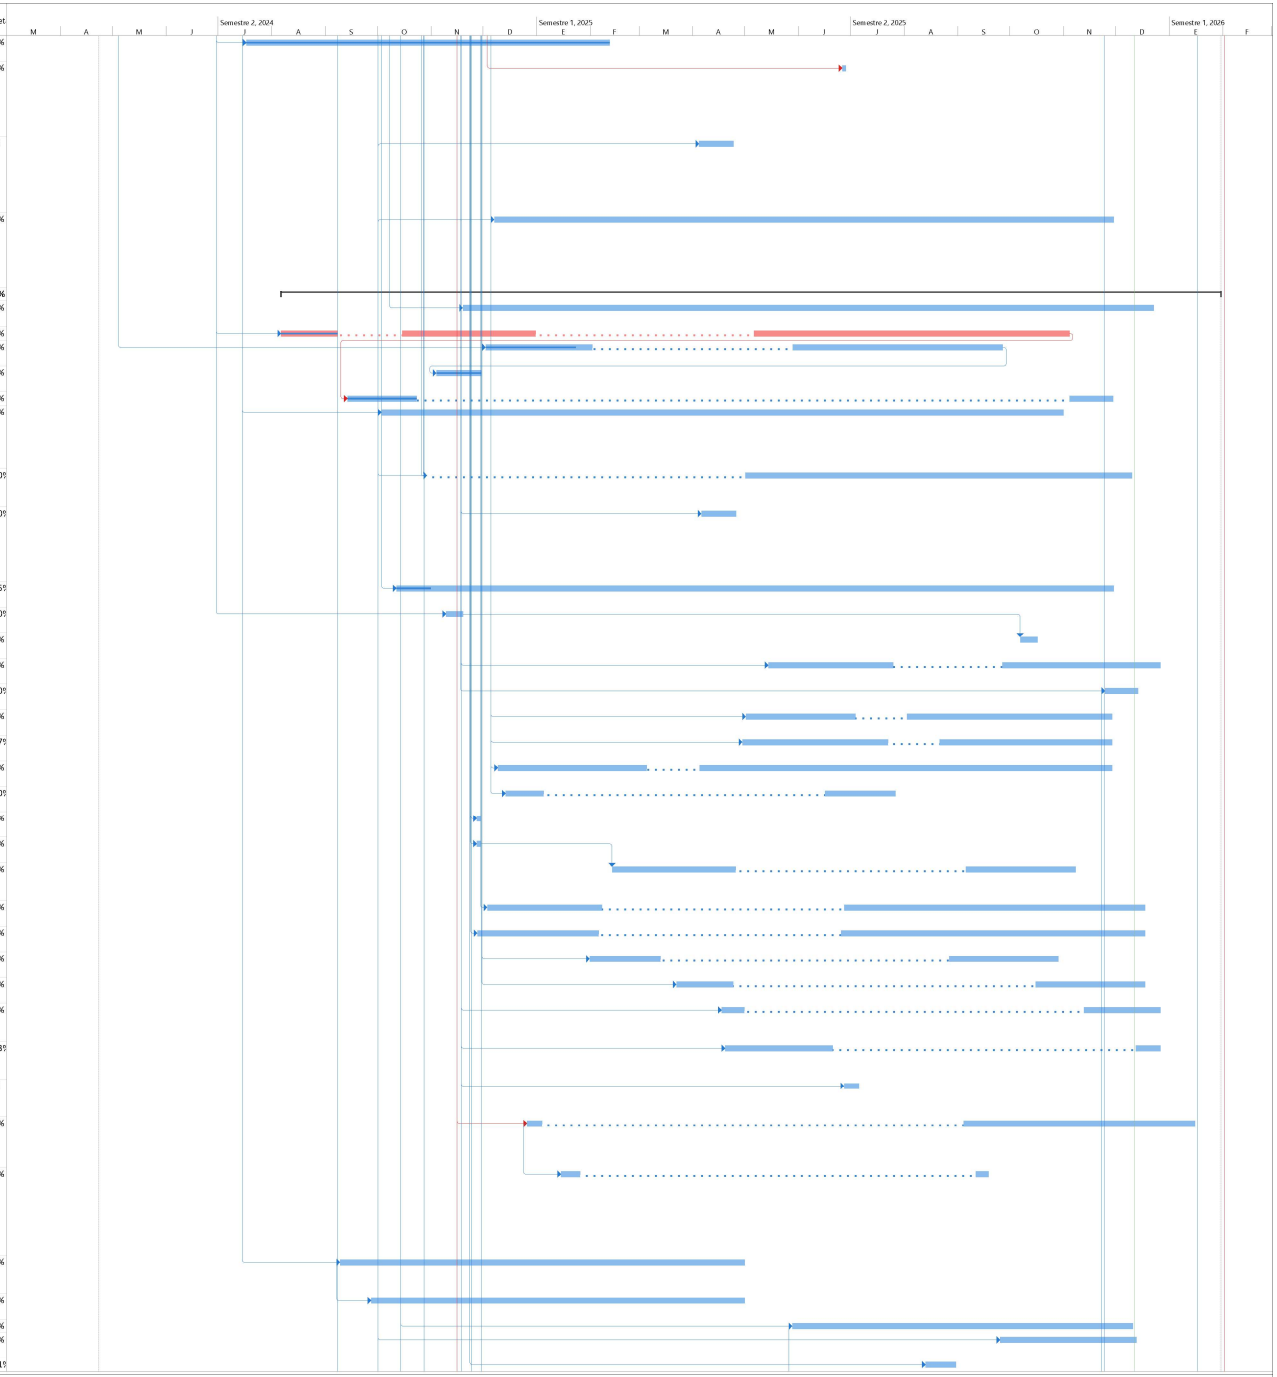

Proyecto: PROGRAMACION PO
Fecha: vie 12/12/25

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% Progr	% Complet
121		ALLANADO MECANICO PISO CANCHA MULTIPLE	60 días	mié 30/04/25	sáb 29/11/25	36CC+125 d	100,00%	32,71%
122		PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	201 días	lun 12/05/25	vie 30/01/26	51CC+15 días	81,07%	77,59%
123		CANALIZACION PARA ACOMETIDA ELECTRICA, INCLUYE SUMINISTRO DE UN TUBO CONDUIT PVC D 2"	2 días	lun 11/11/24	mié 13/11/24	92CC+30 días	100,00%	28,57%
124		BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,15X0,30MTS, INCLUY 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 0,20 MTS	150 días	mié 4/06/25	mié 17/12/25	118CC+5 días	97,15%	24,35%
125		REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO REFORZADO DE FIBRA SINTETICA PARA CARCAMO 60X50X7 CMS	90 días	vie 30/05/25	mié 10/12/25	118CC+2 días	100,00%	39,60%
126		SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA CAL 14 DE 2" PARA RODAMANOS, 4 REFUERZOS INTERMEDIOS EN TUBERIA DE 1 1/2", GALVANIZADA CAL 14, CON POYOS EN FLANCHES DE 15 CM X 25 CM, E= 3/8". ALTURA 1.2 ML. TODAS LAS PIEZAS SON GALVANIZADAS MAS	5 días	lun 8/12/25	sáb 13/12/25	99CC+10 días	67,78%	100,00%
127		SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL TIPO AMAZONAS DE PVC	2 días	sáb 1/02/25	mar 4/02/25	62CC+1 día	100,00%	100,00%
128		SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE TIPO AMAZONAS	2 días	sáb 1/02/25	mar 4/02/25	62CC+1 día	100,00%	100,00%
129		DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES	255 días	jue 9/01/25	mié 10/12/25	44CC+3 días	100,00%	81,94%
130		ESTRUCTURA METALICA	45 días	sáb 22/11/25	mar 20/01/26	27CC+2 días	33,21%	62,59%
131		CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA UPVC	20 días	lun 24/11/25	mié 21/01/26	130CC+1 día	69,72%	66,67%
132		ALISTADO EN MORTERO DE NIVELACION 1:3 IMPERMEABILIZADO	15 días	mié 19/11/25	mar 9/12/25	40CC+75 días	100,00%	100,00%
133		PEDESTAL EN CONCRETO 3500 PSI , NO INLCLUYE ACERO DE REFUERZO	10 días	vie 2/01/26	jue 15/01/26	27CC+16 días	0,00%	100,00%
134		RELLENO DE CELDAS CON GROUTING	255 días	jue 9/01/25	mié 10/12/25	44CC+3 días	100,00%	91,04%
135		IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	1 día	mar 29/07/25	mié 30/07/25		100,00%	100,00%
136		SUMINISTRO E INSTALACION PLASTICO COMO PROTECCION DE HUMEDAD EN LOSA DE CONCRETO	150,33 días	vie 24/01/25	sáb 6/12/25	92CC+7 días	100,00%	59,00%
137		SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, PARA CANCHA ,HIBRIDA MONO-FIBRILADA DE 50 MM DE ESPESOR CON RELLENO EN CASARILLA DE COC, CAUCHO Y ARENA DE CUARZO	7 días	sáb 17/01/26	lun 26/01/26	56	0,00%	0,00%
138		ANCLAJE DE 1/2" CON EPOXICO	228,67 d	mar 5/11/24	vie 12/12/25	33CC+15 día	134,06%	80,65%
139		SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA HD CB D400 24" ARO 10CM PARA POZO DE INSPECCION	3 días	jue 4/09/25	lun 8/09/25	138FF-75 días	100,00%	0,00%
140		DEMOLICIÓN DE BANCAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	4 días	sáb 15/11/25	jue 20/11/25	10FF+15 días	100,00%	0,00%
141		DEMOLICION MANUAL DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	7 días	mié 10/12/25	vie 19/12/25	140	13,49%	0,00%
142		FIN DEL PROYECTO	0 días	vie 30/01/26	vie 30/01/26	49	0,00%	0,00%

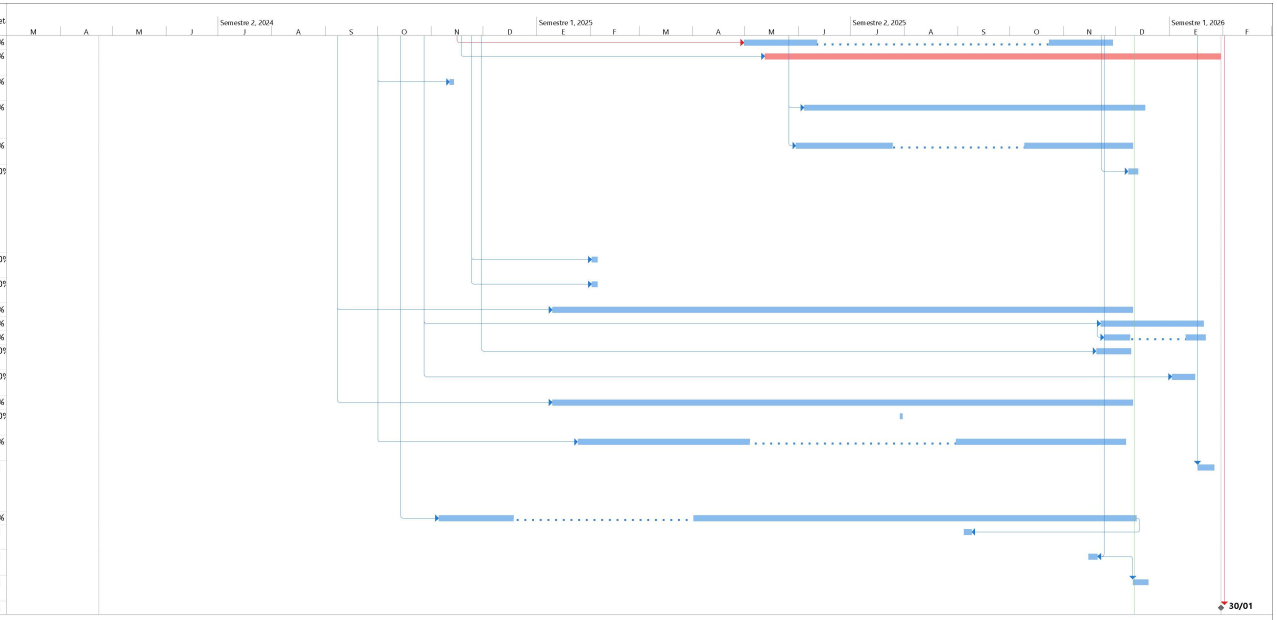

Proyecto: PROGRAMACION PO
Fecha: vie 12/12/25

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual
