INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ICCU

CONSORCIO CAMINOS IP

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. ICCU – CTO 258 DE 2025

OBJETO

CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. ICCU – CTO 287 DE 2025

INFORME MENSUAL DE CONSULTORÍA No. 3

PERIODO

20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2025

BOGOTÁ D.C, AGOSTO DE 2025

CONTROL DE IDENTIFICACIÓN, REVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO: IM3_ICCU_493_F3_TR_VI_NAP_IGN_0000
Versión 1
FECHA: 26 de agosto de 2025

Responsable Elaboración	**Nombre**	**Diego Peñaranda Torres**
	Cargo	Ingeniero de Apoyo Coordinación
Responsable Elaboración	**Nombre**	**William Malaver**
	Cargo	Coordinador de Consultoría
Responsable Revisión	**Nombre**	**Santiago Páez Talero**
	Cargo	Director de Consultoría
	Firma	

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento han sido entregadas a las siguientes dependencias:

Entidad y/o Dependencia	No. Ejemplares
Consorcio Litoral MC -Interventoría	Una copia digital.

Las observaciones de su revisión deben ser informadas a la Dirección del Proyecto para realizar sus modificaciones

INDICE DE MODIFICACIONES

No.	FECHA	SECCIÓN MODIFICADA	OBSERVACIONES

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 6
2 ANTECENDENTES DEL CONTRATO 7
3 GENERALIDADES 8
4 FICHA TÉCNICA CONTRATO DE CONSULTORÍA 258 DE 2025 13
4.1 Datos generales del Contrato 13
4.2 Garantías del Contrato 14
4.3 Ejecución financiera 15
4.4 Plantilla de Profesionales Responsables. 15
5 FICHA TÉCNICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 287 de 2025 16
5.1 Datos generales del Contrato 16
5.2 Cumplimiento de entregables 17
6 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 17
6.1 Conceptos y comunicaciones emitidas 17
6.2 Requerimientos y comunicaciones recibidas 19
6.3 Actividades Ejecutadas por la Consultoría 19
6.4 Indicadores de Gestión. 28
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 29

ANEXOS

Anexo 1. Certificación de aportes parafiscales y seguridad social – Consultoría

Anexo 2. Cronograma de trabajo

Anexo 3. Informes semanales – Consultoría

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información Contrato Consultoría 13

Tabla 2. Distribución Actas de Pago Consultoría 14

Tabla 3. Información Pólizas Consultoría 14

Tabla 4. Detalle Financiero Consultoría 15

Tabla 5. Personal de Consultoría 16

Tabla 6. Información Contrato Interventoría 16

Tabla 7. Comunicados Enviados. 17

Tabla 8. Comunicados Recibidos 19

Tabla 9. Actividades de exploración geotécnica Cáqueza 19

Tabla 10. Actividades de exploración geotécnica Madrid 21

Tabla 11. Actividades de exploración geotécnica Madrid 21

Tabla 12. Cantidad de ensayos realizados y por ejecutar 23

Tabla 13. Indicadores de Calidad 28

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización General – Corredor vial Madrid hacia Puente Piedra 9

Ilustración 2. Localización General – Corredor vial La Magdalena hacia Quebradanegra 10

Ilustración 3. Localización General – Corredor vial Cáqueza hacia sector Placitas 12

LISTA DE FOTOGRAFÍA

Fotografía 1. Ejecución línea sísmica LS1 – Cáqueza - 19 de agosto de 2025 20
Fotografía 2. Ejecución línea sísmica LS2 – Cáqueza - 19 de agosto de 2025 20
Fotografía 3. Ejecución trabajos geotecnia Barreno 24 – Quebradanegra – 11 de agosto 22
Fotografía 4. Muestras recuperadas BR-24 - Quebradanegra 22
Fotografía 5. Nivelación y contranivelación geométrica Madrid 24
Fotografía 6. Instalación Placa topográfica Madrid 24
Fotografía 7. Nivelación y contranivelación geométrica Cáqueza 25
Fotografía 8. Levantamiento topográfico Cáqueza..... 25
Fotografía 9. Cámaras instaladas - Madrid 26
Fotografía 10. Cámara instalada - Cáqueza..... 26
Fotografía 11. Visita de reconocimiento - Madrid 27
Fotografía 12. Visita de reconocimiento - Cáqueza..... 27

1 INTRODUCCIÓN

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) llevó a cabo el proceso de contratación No. ICCU–CM-044 de 2024 para la realización de estudios y diseños de corredores viales en el departamento de Cundinamarca. Como resultado de la evaluación de las ofertas, el ICCU adjudicó el contrato de Consultoría por medio de la resolución No. 125 de 2025, correspondiente a los corredores contemplados al Lote 2 al Consorcio CAMINOS IP.

El objeto del contrato es la ejecución de estudios y diseños para la vía desde el casco urbano de Madrid hasta la inspección Puente Piedra, la vía desde la inspección La Magdalena hasta el casco urbano del municipio de Quebradanegra y la vía desde el casco urbano de Cáqueza al sector Placitas. La duración del contrato será de ocho meses.

El Consorcio CAMINOS IP está conformado por Ingeniería, Consultoría y Planeación S.A. (60%) y Pavimentos y Geotecnia S.A.S. (40%), quienes asumirán la responsabilidad de desarrollar los estudios en los términos y condiciones definidos por el ICCU. Esta adjudicación garantiza el cumplimiento de los requisitos técnicos y económicos exigidos, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura vial en Cundinamarca.

En este contexto, los Estudios y Diseños a desarrollar a nivel de Fase III, se adelantarán de conformidad con lo estipulado en los Términos de Referencia, en el Anexo Técnico, así como en todos los demás documentos que forman parte del proceso licitatorio y de los escritos que hacen parte integral del Contrato, así como en los manuales y guías de diseño elaborados y/o adoptados por el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

El presente documento corresponde al **Informe Mensual No. 3 del periodo del 20 de julio al 19 de agosto de 2025**, documento que presenta el seguimiento a las actividades ejecutadas por la Consultoría en el periodo indicado.

2 ANTECENDENTES DEL CONTRATO

El 20 de mayo de 2025 se formalizó el acta de inicio del presente contrato. Según el cronograma de trabajo y el contrato de Consultoría, con un plazo de ocho (8) meses y/o al 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

Con el fin de dar la respectiva ejecución del contrato de Consultoría, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) celebró el contrato ICCU - 258 de 2025 (CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS) – lote 2 con la firma CONSORCIO CAMINOS IP.

3 GENERALIDADES


I. Corredor Vial Madrid – Puente Piedra.

El corredor vial entre el municipio de Madrid y la inspección de Puente Piedra es una ruta clave en el departamento de Cundinamarca, que conecta el municipio de Madrid con la zona rural de Puente Piedra, facilitando el transporte tanto de pasajeros como de carga. Esta vía, de aproximadamente 13.0 kilómetros de longitud, atraviesa un paisaje predominantemente agrícola, con cultivos de flores, papa y hortalizas, que son la base económica de la región. Su importancia radica en su rol como enlace entre la Sabana de Occidente y Bogotá, permitiendo el flujo de productos locales hacia los mercados urbanos.

La vía presenta una mezcla de tramos pavimentados y en afirmado. En épocas de lluvia, algunos sectores pueden deteriorarse, afectando la movilidad, especialmente en zonas rurales donde el tránsito de maquinaria agrícola es frecuente. A pesar de esto, el corredor es fundamental para el transporte público, con servicios de busetas y colectivos que cubren la ruta, así como para el tráfico de camiones que transportan mercancías desde las fincas y empresas floricultoras de la zona.

En los últimos años, se han llevado a cabo proyectos de mantenimiento y mejoramiento por parte de la Gobernación de Cundinamarca y las administraciones locales, buscando optimizar la conectividad y seguridad vial. Sin embargo, el desarrollo de esta vía es crucial para impulsar la economía regional y garantizar una movilidad eficiente para los habitantes y comerciantes de la zona.

Ilustración 1. Localización General – Corredor vial Madrid hacia Puente Piedra

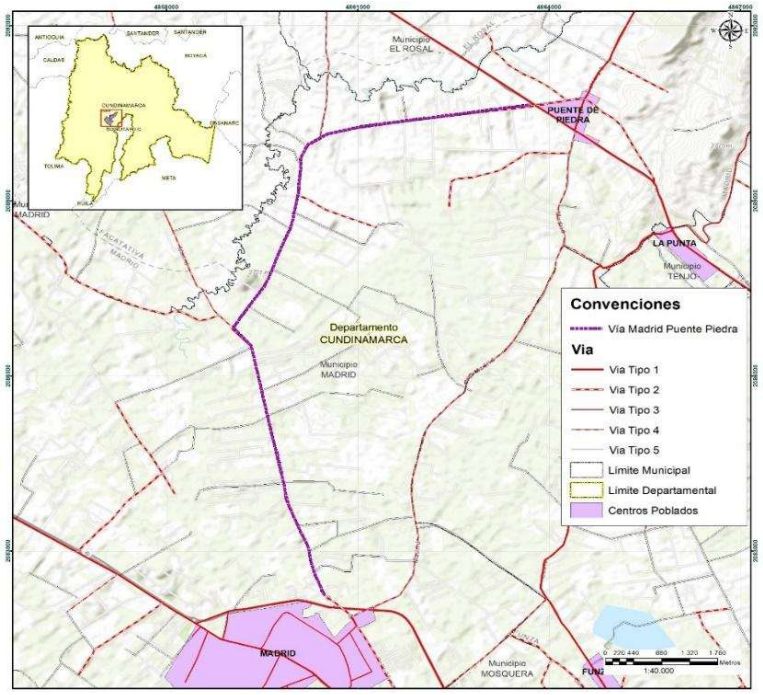

Fuente: Elaboración Propia.


II. Corredor Vial Magdalena – Quebradanegra.

El corredor vial entre la Inspección de La Magdalena y el municipio de Quebradanegra constituye una importante ruta de conexión en el occidente de Cundinamarca, atravesando un territorio de topografía quebrada característico de la región del Tequendama. Esta vía, de aproximadamente 5.2 kilómetros de longitud, facilita el transporte de pasajeros y productos agrícolas entre zonas rurales y urbanas. Su trazado serpenteante discurre por paisajes de bosque andino y áreas de cultivo, donde predominan actividades como la caficultura, la producción de plátano y la ganadería de pequeña escala.

La infraestructura vial presenta condiciones variables a lo largo de su recorrido, la geomorfología montañosa del área exige mantenimiento constante para prevenir derrumbes y garantizar la transitabilidad, particularmente en zonas de pendientes pronunciadas. El corredor es vital para las comunidades aledañas, siendo utilizado principalmente por transporte público informal (jeeps y camperos) que movilizan a los habitantes de veredas dispersas hacia el centro municipal de Quebradanegra.

Desde la perspectiva socioeconómica, esta vía reviste gran importancia para el desarrollo local al constituir el principal eje de conexión para el comercio de productos agropecuarios y el acceso a servicios básicos. No obstante, presenta desafíos significativos en materia de seguridad vial e infraestructura, especialmente durante épocas de lluvias cuando aumentan los riesgos de deslizamientos. Su mejoramiento representaría un avance crucial para dinamizar la economía rural y potencializar el turismo ecológico en la región, aprovechando los atractivos naturales como cascadas y senderos que caracterizan este territorio montañoso de Cundinamarca.

Ilustración 2. Localización General – Corredor vial La Magdalena hacia Quebradanegra

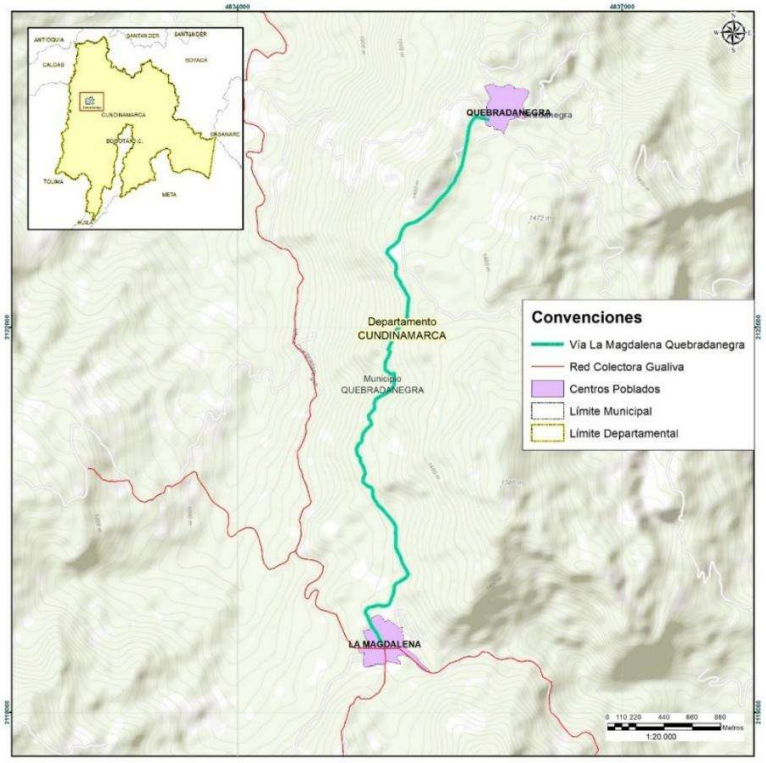

Fuente: Elaboración Propia.


III. Corredor Vial Cáqueza – Placitas.

El corredor vial de 2 kilómetros que conecta el casco urbano de Cáqueza con la vía principal nacional constituye un enlace estratégico para la movilidad y desarrollo del municipio. Aunque de corta extensión, esta ruta cumple una función vital al integrar la zona urbana con la red nacional de carreteras, facilitando el flujo de pasajeros, mercancías y el acceso a servicios esenciales. El trayecto atraviesa un entorno periurbano caracterizado por la transición entre áreas residenciales, pequeños comercios y zonas de cultivo, reflejando la dinámica socioeconómica propia de municipios intermedios en la región.

La vía presenta características adecuadas para su función, una topografía con pendientes fuertes. El tráfico vehicular es moderado, con predominio de transporte público (busetas y camperos), vehículos particulares y motocicletas que utilizan este corredor como principal conexión con la red vial nacional.

La importancia socioeconómica de este corredor desproporcionada a su corta longitud, ya que funciona como eje articulador del comercio local, permitiendo el transporte eficiente de productos agrícolas y manufacturados hacia los mercados regionales. Además, facilita el acceso de la población a servicios fundamentales como salud y educación. Las intervenciones a proponer garantizarán la funcionalidad permanente de este enlace vial estratégico que, pese a sus solo 2 kilómetros de extensión, representa la principal conexión de Cáqueza con el sistema vial nacional y el desarrollo regional.

Ilustración 3. Localización General – Corredor vial Cáqueza hacia sector Placitas

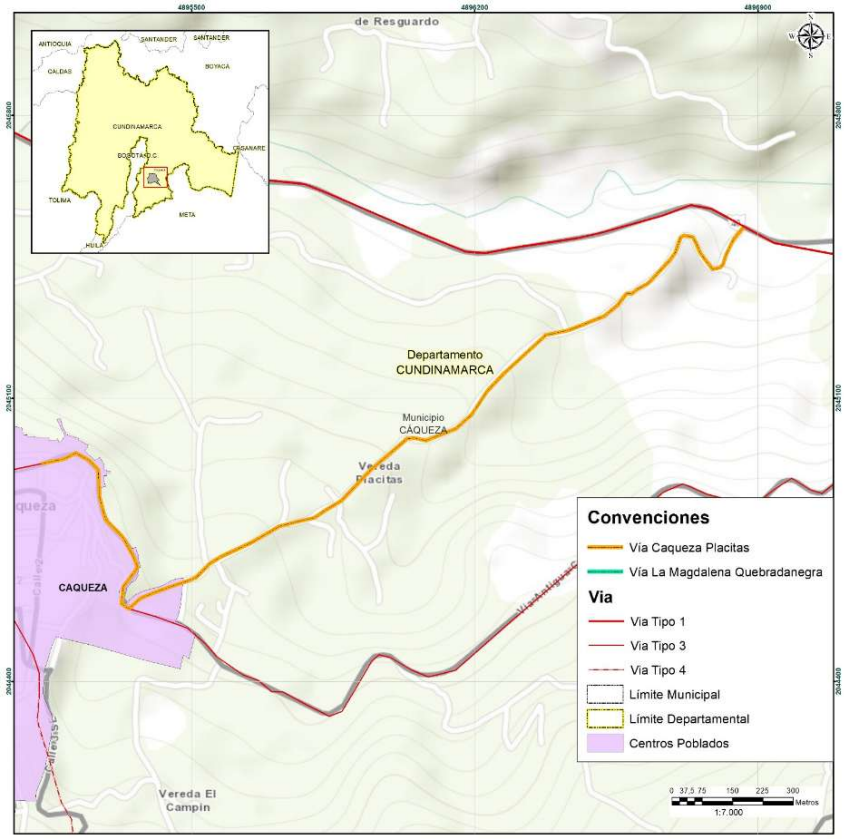

Fuente: Elaboración Propia.

4 FICHA TÉCNICA CONTRATO DE CONSULTORÍA 258 DE 2025

4.1 Datos generales del Contrato

A continuación, se relacionan los datos básicos del contrato de consultoría.

Tabla 1. Información Contrato Consultoría

Tipo de Contrato:	Consultoría
Contrato:	ICCU – CTO 258 DE 2025
Objeto:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS
Contratista	CONSORCIO CAMINOS IP
NIT	901.917.475-1
Supervisor	LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ
Apoyo a Supervisión	JHON WILLIAM ARDILA BACCA
Plazo de ejecución:	8 meses y/o 31 de diciembre de 2025
Fecha de inicio:	20 de mayo de 2025
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2025
Valor del contrato:	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 2.430.458.478,00)

Fuente: Elaboración Propia.

Forma de pago:

La forma de pago establecida contemplaba un anticipo, en donde el CONSORCIO CAMINOS IP tomó la decisión de desistir del mismo, A continuación, se relaciona la forma de pago

Tabla 2. Distribución Actas de Pago Consultoría

No. De Pago	Valor (IVA Incluido)	%Avance Contrato	Producto entregado y aprobado
Primer pago	$ 364.568.772,00	15%	PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO
Segundo pago	$ 364.568.772,00	15%	Ejecución del 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo
Tercer pago	$ 486.091.695,00	20%	Ejecución del restante 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo
Cuarto pago	$ 972.183.391,00	40%	El 40% de cada volumen se pagará en pagos parciales por volúmenes independientes una vez, entregado y aprobado cada volumen por la interventoría y la supervisión.
Quinto pago	$ 243.045.848,00	10%	Una vez suscrita el acta de liquidación por parte de la entidad previa aprobación de la supervisión e interventoría
Total	**$ 2.430.458.478,00**	**100%**	

Fuente: Elaboración Propia.

4.2 Garantías del Contrato

Tabla 3. Información Pólizas Consultoría

Póliza		Amparo	Vigencia		
			Desde	Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento	310 47 99400001 5204	Cumplimiento del contrato	25/03/2025	30/06/2026	$ 243.045.847.8
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	25/03/2025	31/12/2028	$ 486.091.695,6
		Calidad del Servicio	31/12/2025	31/12/2030	$ 729.137.543,4

Fuente: Elaboración Propia.

4.3 Ejecución financiera

Tabla 4. Detalle Financiero Consultoría

Descripción	Valor ($)	%
Valor del Contrato (IVA incluido):	$ 2.430.458.478,00	100,00%
Valor facturado:	$ 364.568.772,00	15,00%
Valor facturado pagado:	$ 0,00	0,00%
Saldo por facturar:	$ 2.065.889.706,00	85,00%

No. Pago	Concepto	Valor Facturado	Valor Acumulado	% Ejec. Acumulado
1	Primer pago.		$ 0	0,00%
2	Segundon pago		$ 0	0,00%
	Total	**$ 0**		

Fuente: Elaboración Propia.

A la fecha del periodo de reporte ya se realizó el proceso de radicación del primer pago correspondiente al Acta de Costos Consultoría No. 1_CAMINOS_IP por un valor de trescientos sesenta y cuatro millones quinientos sesenta y ocho mil setecientos setenta y dos pesos ($ 364.568.772,00), en este momento ya fue avalada por la interventoría y se encuentra en proceso de revisión por la supervisión del contrato.

4.4 Plantilla de Profesionales Responsables.

La Consultoría remitió las hojas de vida de los profesionales para revisión de la interventoría Consorcio Litoral MC por medio de los comunicados No. 2025-493-ICU-1402, 2025-493-ICU-1661, 2025-493-ICU-1706 y 2025-493-ICU-2000. Se relacionan a continuación los siguientes profesionales:

Tabla 5. Personal de Consultoría

CARGO	PROFESIONAL
DIRECTOR DE PROYECTO	Santiago Páez Talero
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	Miguel García Fajardo
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	Fabian Tafur Sánchez
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL	Dayana Alexandra Betancourt
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	Francisco Montes Buritica
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	Fabio Villamil Páez
ESPECIALISTA BIM	José Joaquín Cortés
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Raúl Lozano Mora
ESPECIALISTA FORESTAL	José Luis Torres Acosta
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Milena García Pastor
ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	Andrés Galarza Guzmán
GEÓLOGO	Justo Padilla Acosta
PROFESIONAL GESTOR SOCIAL	Diana Milena Hurtado
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	Jorge Iván Arias López
INGENIERO RESIDENTE - APOYO CONSULTORÍA	Daniel Steven León
INGENIERO CATRASTRAL Y GEODESTA	Paola Sánchez Rodríguez
ABOGADO	Edicson Pérez Jiménez
AVALUADOR	Jorge Arturo Pardo

Fuente: Elaboración Propia.

5 FICHA TÉCNICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 287 de 2025

5.1 Datos generales del Contrato

Tabla 6. Información Contrato Interventoría

Tipo de Contrato:	Interventoría
Contrato:	ICCU – CTO 287 DE 2025
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CORREDORES VIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1- - INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMCA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECGTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA), LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE

	QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CAQUEZÁ AL SECTOR PLACITAS.
Contratista	Consorcio Litoral MC
NIT	901.935.455-9
Supervisor	LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ
Plazo de ejecución:	8 meses y/o 31 de diciembre de 2025
Fecha de inicio:	20 de mayo de 2025
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2025
Valor del contrato:	MIL VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 1.027.469.324,00)

Fuente: Elaboración Propia.

5.2 Cumplimiento de entregables

A continuación, se presenta el cronograma de trabajo (pdf y mpp), el cual corresponde a una segunda versión, toda vez que, se recibieron observaciones por parte de la Interventoría por medio del comunicado CLM.287.25-0007 del 16 de junio de 2025 y recomendaciones mediante el oficio No. CLM.287.25-0012 del 15 de julio de 2025, con respuesta por parte del Consorcio Caminos IP mediante el comunicado 2025-493-ICU-2086 del 17 de julio en donde se entregaron los cronogramas actualizados para cada tramo de estudio, en este momento se están ejecutando los trabajos de campo para la consolidación de la información y correspondiente entrega de los volúmenes correspondientes.

6 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

6.1 Conceptos y comunicaciones emitidas

A continuación, se relacionan los comunicados generados por parte de la consultoría.

Tabla 7. Comunicados Enviados.

FECHA	CONSECUTIVO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO
22/07/2025	2025-493-ICU-2143	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Alcance comunicado 2025-493-ICU-2073. Respuesta a su comunicación por medio de vía correo electrónico del 14 de julio de 2025. Presentación Especialista en Seguridad Vial.

FECHA	CONSECUTIVO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO
23/07/2025	2025-493-ICU-2156	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega de documentos acta parcial No. 01 correspondiente al 15% del valor del contrato en el periodo del 20 de mayo al 19 de junio de 2025. Contrato ICCU-258 de 2025.
31/07/2025	2025-493-ICU-2254	CONSORCIO CAMINOS IP	Alcaldía Municipal de Cáqueza	Solicitud de información del EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) del municipio de Cáqueza y acompañamiento de visita
04/08/2025	2025-493-ICU-2297	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega de documentos acta parcial No. 01 correspondiente al 15% del valor del contrato en el periodo del 20 de mayo al 19 de junio de 2025. Contrato ICCU-258 de 2025.
08/08/2025	2025-493-ICU-2342	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega de Plan de Exploración (Versión 2) – Volumen VI. Estudio Geotécnico para el corredor vial desde la inspección la Magdalena hasta el casco urbano del municipio de Quebradanegra.
12/08/2025	2025-493-ICU-2398	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega del Informe Cálculo del PCI del pavimento - vía desde el Casco Urbano de Cáqueza al Sector Placitas
12/08/2025	2025-493-ICU-2399	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega del Informe Índice de Condición del Pavimento vía desde el casco urbano Madrid hasta la inspección Puente Piedra.
12/08/2025	2025-493-ICU-2400	CONSORCIO CAMINOS IP	Consorcio Litoral MC - Interventoría	Entrega del Informe Índice de Condición del Pavimento vía desde La Inspección La Magdalena hasta el casco urbano del municipio de Quebradanegra.
15/08/2025	2025-493-ICU-2444	CONSORCIO CAMINOS IP	Alcaldía Municipal de Madrid	Solicitud de información de catastro de redes de servicios públicos y obras proyectadas en la vía desde el Casco Urbano de Madrid hasta la Inspección Puente Piedra
15/08/2025	2025-493-ICU-2459	CONSORCIO CAMINOS IP	CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE S.A.S	Solicitud de información reserva vial en zona de intersección de la Autopista Bogotá – Villeta con el sector de la Inspección Puente Piedra que hace parte del corredor priorizado por la Gobernación de Cundinamarca desde el caso urbano Madrid hasta la inspección Puente Piedra

Fuente: Elaboración Propia.

6.2 Requerimientos y comunicaciones recibidas

A continuación, se relacionan los comunicados recibidos por parte de la Interventoría.

Tabla 8. Comunicados Recibidos

FECHA	CONSECUTIVO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
22/08/2025	O.A.P. 397	Alcaldía de Cáqueza	Consorcio Caminos IP	Respuesta solicitud de información. Radicado 2025-110-002037-2 Alcaldía de Cáqueza.

Fuente: Elaboración Propia.

6.3 Actividades Ejecutadas por la Consultoría

- Se terminan las labores de campo del componente de geotecnia relacionado con líneas sísmicas en el tramo de vía desde el casco urbano de Cáqueza al sector Placitas con un porcentaje de ejecución del 100,00%.

Tabla 9. Actividades de exploración geotécnica Cáqueza

DESCRIPCIÓN	PERFORACIÓN PROPUESTA	PERFORACIÓN EJECUTADA
	CÁQUEZA	CÁQUEZA
Apiques	13	14
Barrenos	12	12
Trincheras	2	2
Sondeos	3	0
Núcleos	9	7
Líneas Sísmicas	1	3
	AVANCE (%)	100

Fuente: Pavimentos y Geotecnia S.A.S.

Fotografía 1. Ejecución línea sísmica LS1 – Cáqueza - 19 de agosto de 2025



Fuente: Pavimentos y Geotecnia S.A.S

Fotografía 2. Ejecución línea sísmica LS2 – Cáqueza - 19 de agosto de 2025



Fuente: Pavimentos y Geotecnia S.A.S

- Se continúan las labores de campo del componente de geotecnia en el tramo de vía desde el casco urbano de Madrid hasta la inspección Puente Piedra hasta el 25 de julio con un porcentaje de ejecución del 97,14%.

Tabla 10. Actividades de exploración geotécnica Madrid

DESCRIPCIÓN	PERFORACIÓN PROPUESTA	PERFORACIÓN EJECUTADA
	MADRID	MADRID
Apiques	48	48
Barrenos	48	48
Trincheras	-	-
Sondeos	-	-
Núcleos	40	40
Líneas Sísmicas	4	0
		97,14

Fuente: Elaboración Propia.

- Se inician las labores de campo del componente de geotecnia en el tramo de vía desde la inspección La Magdalena hasta el casco urbano del municipio de Quebradanegra entre el 06 de agosto y el 15 de agosto de 2025, con un porcentaje de ejecución del 26,25%.

Tabla 11. Actividades de exploración geotécnica Madrid

DESCRIPCIÓN	PERFORACIÓN PROPUESTA	PERFORACIÓN EJECUTADA
	QNEGRA	QNEGRA
Apiques	21	9
Barrenos	24	12
Trincheras	0	0
Sondeos	15	0
Núcleos	9	0
Líneas Sísmicas	11	0
		26,25


Fuente: Elaboración Propia.

Fotografía 3. Ejecución trabajos geotecnia Barreno 24 – Quebradanegra – 11 de agosto



Fuente: Pavimentos y Geotecnia S.A.S

Fotografía 4. Muestras recuperadas BR-24 - Quebradanegra

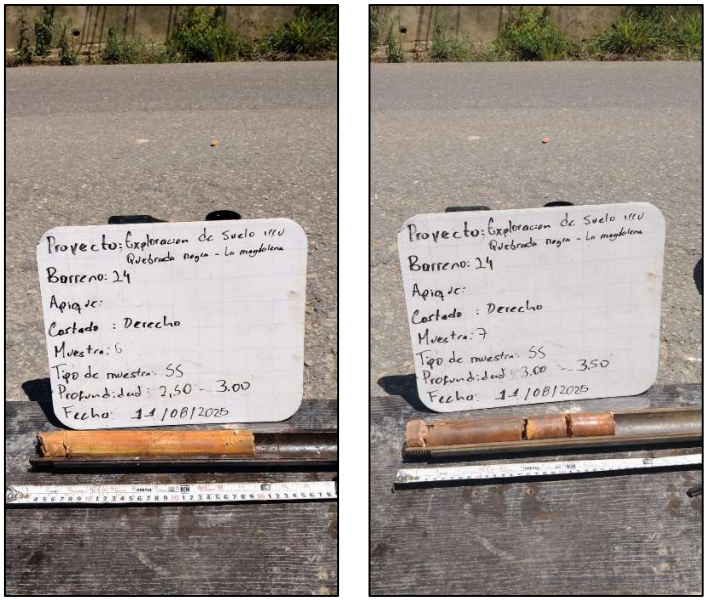

Fuente: Pavimentos y Geotecnia S.A.S

- Con las muestras recuperadas en los trabajos de campo de geotecnia ya se comenzaron a realizar los ensayos de laboratorios correspondientes. A continuación, se muestra el avance para cada corredor, para un avance del 85.23% para el municipio de Cáqueza y del 14.88% para el municipio de Madrid.

Tabla 12. Cantidad de ensayos realizados y por ejecutar

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES EN ORDEN DE ENSAYOS	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES EN ORDEN DE ENSAYOS	CANTIDADES EJECUTADAS
		CÁQUEZA	CÁQUEZA	MADRID	MADRID
Humedades	UN	84	78	191	16
Límites	UN	84	62	191	16
Granulometrías	UN	84	76	105	16
Tamiz 200	UN	-	-	86	0
Materia Orgánica	UN	27	25	60	0
PDC	UN	14	14	43	43
CBR	UN	13	13	43	34
Compresión inconfinada en muestras de suelo. INV E-152-13.	UN	9	9	58	0
Peso unitario.	UN	10	0	58	0
Ensayo Proctor modificado INV E-142-13	UN	-	-	5	0
	TOTALES	**325**	**277**	**840**	**125**
	AVANCE (%)	**85,23**		**14,88**	

- Se terminan los trabajos de topografía en la vía desde el casco urbano de Madrid hasta la inspección Puente Piedra, relacionados con la Nivelación y contranivelación geométrica y posicionamiento de placas topográficas y en los próximos días se tiene programado el inicio del levantamiento topográfico de detalle.

Fotografía 5. Nivelación y contranivelación geométrica Madrid



Fuente: Consultoría.

Fotografía 6. Instalación Placa topográfica Madrid



Fuente: Consultoría.

- Se terminan los trabajos de topografía en la vía desde el casco urbano de Cáqueza al sector Placitas, relacionados con la Nivelación y contranivelación geométrica y posicionamiento de placas topográficas y se está realizando el levantamiento topográfico de detalle.

Fotografía 7. Nivelación y contranivelación geométrica Cáqueza



Fuente: Consultoría.


Fotografía 8. Levantamiento topográfico Cáqueza



Fuente: Consultoría.

- En el área de tránsito se realizó la instalación de tres cámaras el 9 de agosto para la ejecución de los aforos en los siguientes sitios: En cercanías a la conexión con vía Bogotá – Medellín, Ye en una tienda y en cercanía a Pactia - Centro Industrial Madrid, las cámaras se retiraron el 17 de agosto.

Fotografía 9. Cámaras instaladas - Madrid

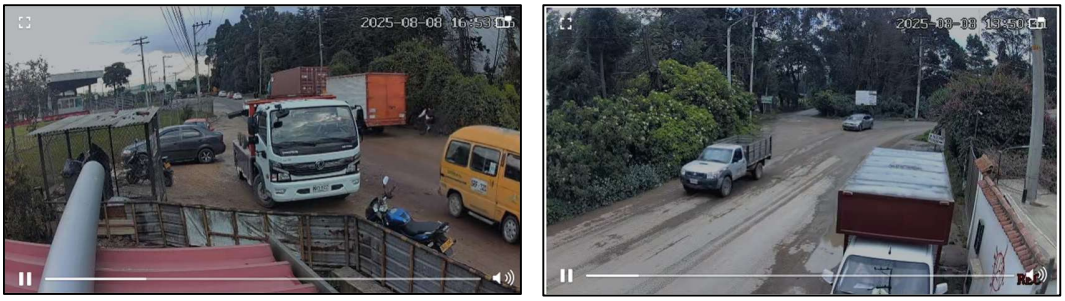

Fuente: Consultoría.

- Se realizó la instalación de una cámara el 05 de agosto para la ejecución de los aforos en el punto establecido como K0+000 y se retiró el 15 de agosto.

Fotografía 10. Cámara instalada - Cáqueza



Fuente: Consultoría.

- En el área ambiental y social se realizó visita de campo para recopilación de información primaria abiótica y biótica y reconocimiento del área de influencia, contacto con administración municipal de los municipios de Cáqueza, Madrid y Quebradanegra.

- Se realizó visita de verificación de las condiciones encontradas en el tramo vial desde el casco urbano de Madrid hasta la inspección Puente Piedra junto con la supervisión y la interventoría el 31 de julio de 2025.

Fotografía 11. Visita de reconocimiento - Madrid



Fuente: Consultoría.

- Se realizó visita de verificación de las condiciones encontradas en el tramo vial desde el casco urbano de Cáqueza al sector Placitas junto con la supervisión y la interventoría el 05 de agosto de 2025.

Fotografía 12. Visita de reconocimiento - Cáqueza



Fuente: Consultoría.

- Se realizó reunión virtual con funcionarios de la alcaldía de Quebradanegra el 14 de agosto de 2025, en donde se presentaron las condiciones encontradas en este corredor por el componente de geología y geotecnia y se programó visita para el 20 de agosto de 2025, con el acompañamiento de la supervisión y la interventoría.

- La Consultoría continuará con la gestión ante las entidades correspondientes para la recopilación de la información necesaria para complementar la debida diligencia documental.

- Adicionalmente, se continuarán los trabajos de campo definidos para topografía, geología, geotecnia y área ambiental y social.

6.4 Indicadores de Gestión.

A continuación, se relacionan los indicadores de gestión del contrato.

Tabla 13. Indicadores de Calidad

Indicador	Fórmula	Periodicidad de medición	Resultado	Detalle
Nivel de cumplimiento de obligaciones pactadas	(50 Obligaciones Cubiertas / Total 50 Obligaciones) x 100	Mensual	100%	Se considera en total 50 obligaciones teniendo en cuenta las 20 generales detalladas en clausula 9 del contrato y las 30 especificas detalladas en la cláusula 10. Con corte al 19 de agosto de 2025 no se han presentado desviaciones en las obligaciones contractuales
Nivel de cumplimiento de los doce volúmenes pactados	(0 Volúmenes aprobados / Total Volúmenes al corte) x 100	Incremental (Avance según cronograma)	0%	En este tercer mes del contrato se implementaron la Metodología, el Plan de Campo y Cronograma, se continuaron trabajos de geología y geotecnia y se iniciaron los trabajos de campo a los volúmenes I y II y X, que corresponde a tránsito, topografía y gestión ambiental y social.
Valoración de la supervisión del contrato	Resultado encuesta de satisfacción	Trimestral	0%	Esta medición se realiza de manera trimestral, por tal motivo se reportará en el siguiente informe una vez nos reporten la valoración correspondiente.
Cumplimiento de ejecución presupuestal	Valor pagado / Valor programado	Mensual	15%	En este tercer mes del contrato se radicó el Acta de Costos Consultoría No. 1_CAMINOS_IP por un valor de $ 364.568.772,00.
Nivel de Cubrimiento del cronograma de actividades	(Actividades finalizadas al corte / Actividades vencidas al corte) x 1000	Mensual	100%	En este tercer mes del contrato se continúan las actividades de campo y de procesamiento de la información.

Fuente: Elaboración Propia.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Consultoría e Interventoría, de forma conjunta realizaron la revisión de términos de referencia con los cuales cuenta el presente proyecto y se definieron los lineamientos a seguir desde el punto de vista técnico, ambiental y socioeconómico; llegando a acuerdos procedimentales que faciliten la recopilación y compilación de datos para llevar a feliz término las respectivas gestiones.
- Se comenzaron los trabajos de campo relacionados con topografía, tránsito y ambiental y social, y se continuaron las actividades de geotecnia y pavimentos en los tres sectores priorizados.
- El Consorcio Caminos IP ha realizado las actividades correspondientes, definidas en el cronograma, para realizar la consultoría de los sectores viales priorizados.
- Se realizaron las visitas de reconocimiento en los sectores priorizados en el municipio de Madrid y Cáqueza con el acompañamiento de la supervisión e interventoría del contrato.
- Se realizó presentación virtual a funcionario de la alcaldía de Quebradanegra de las condiciones geológicas y geotécnicas encontradas en el corredor y se programó visita al sitio para el próximo 20 de agosto.
- Se continuará con la programación y logística de los trabajos de campo definidos dentro del contrato.


IDC-493-19-CRC-0002-Overlookmaps.mpp

	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Terminado	% completado	Predecesoras
0	0		**Overlook Maps**	**$ 779,347,357.17**	**13 días**	**mar 20/05/25**	**0 %**	
1	1		**1 PRELIMINARES**	**$ 779,347,357.17**	**13 días**	**mar 20/05/25**	**0 %**	
2	2		**1.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS - MICROMINERO ACTA DE INICIO**	**$ 267,174,247.50**	**4 días**	**lun 9/06/25**	**0 %**	
3	3		**1.1.1 Volumen 1 Estudio de Tuneles**	**$ 80,174,244.75**	**4 días**	**lun 9/06/25**	**0 %**	
4	4		**1.1.1.1 Metodología y Plan de Campo**	**$ 4,096,974.31**	**4 días**	**lun 9/06/25**	**0 %**	
5	5		Desarrollo Metodología de Intervención	$ 4,096,974	4 días	lun 9/06/25	0 %	
6	6		Revisión 1. Entrega de Observaciones e Ajustes	$ 0	0 días	mar 25/06/25	0 %	
7	7		Revisión 2. Entrega de Observaciones e/o Aprobación	$ 0	0 días	mié 25/06/25	0 %	
8	8		**1.1.1.2 Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**0 días**	**mar 1/07/25**	**0 %**	
9	9		Consultoría	$ 0	0 días	mar 1/07/25	0 %	
10	10		Entrega Volumen	$ 0	0 días	vie 4/07/25	0 %	
11	11		Observaciones e/o Aprobación	$ 0	0 días	vie 4/07/25	0 %	
12	12		**1.1.1.3 Atención de Observaciones**	**$ 0**	**0 días**	**mar 8/07/25**	**0 %**	
13	13		Consultoría	$ 0	0 días	mar 8/07/25	0 %	
14	14		Aprobación Metodología	$ 0	0 días	lun 14/07/25	0 %	
15	15		**1.1.1.4 Elaboración Volumen**	**$ 54,224,874.94**	**14 días**	**lun 14/07/25**	**0 %**	
16	16		Abras de Tuneo	$ 54,224,874	14 días	lun 14/07/25	0 %	
17	17		**1.1.1.5 Revisión 1. Entrega de Observaciones e/o Aprobación**	**$ 21,851,298**	**4 días**	**vie 18/07/25**	**0 %**	
18	18		**2.1.1.4 Entrega y Revisión de Observaciones**	**$ 0**	**0 días**	**vie 18/07/25**	**0 %**	
19	19		Entrega Volumen	$ 0	0 días	vie 18/07/25	0 %	
20	20		Revisión 1. Entrega de Observaciones e/o Aprobación	$ 0	0 días	vie 18/07/25	0 %	
21	21		**2.1.1.6 Atención de Observaciones**	**$ 812,850**	**4 días**	**mié 23/07/25**	**0 %**	
22	22		Consultoría	$ 812,850	4 días	mié 23/07/25	0 %	
23	23		Aprobación Volumen	$ 0	0 días	vie 25/07/25	0 %	
24	24		**2.1.1 Volumen II. Estudio Topográfico, Geológico, Geotécnico y Sísmico**	**$ 132,238,727.09**	**4 días**	**lun 4/08/25**	**0 %**	
25	25		**2.1.1.1 Metodología y Plan de Campo**	**$ 20,206,453.33**	**4 días**	**lun 4/08/25**	**0 %**	
26	26		Desarrollo Metodología de Intervención	$ 20,206,453	4 días	lun 4/08/25	0 %	
27	27		Revisión 1. Entrega de Observaciones e/o Aprobación	$ 0	0 días	mié 20/08/25	0 %	
28	28		**2.1.1.3 Atención de Observaciones**	**$ 0**	**0 días**	**mar 12/07/25**	**0 %**	
29	29		Revisión 2. Entrega de Observaciones e/o Aprobación	$ 0	0 días	vie 4/07/25	0 %	
30	30		**2.1.1.5 Atención de Observaciones**	**$ 0**	**0 días**	**mar 8/07/25**	**0 %**	
31	31		Consultoría	$ 0	0 días	mar 8/07/25	0 %	
32	32		Aprobación Metodología	$ 0	0 días	lun 14/07/25	0 %	
33	33		**2.1.1.7 Elaboración Volumen**	**$ 47,148,308.51**	**4 días**	**lun 14/07/25**	**0 %**	
34	34		**2.1.1.8 Elaboración Volumen**	**$ 45,491,486.45**	**4 días**	**jue 31/07/25**	**0 %**	
35	35		**2.1.1.9 Entrega y Revisión de Observaciones**	**$ 5,188,388.14**	**4 días**	**lun 28/07/25**	**0 %**	
36	36		Entrega Volumen	$ 0	0 días	lun 28/07/25	0 %	
37	37		Revisión 1. Entrega de Observaciones e/o Aprobación	$ 0	0 días	lun 28/07/25	0 %	
38	38		Revisión 2. Entrega de Observaciones e/o Aprobación	$ 0	0 días	mié 20/08/25	0 %	
39	39		**2.1.1.10 Atención de Observaciones**	**$ 2,694,194**	**4 días**	**mié 20/08/25**	**0 %**	
40	40		Consultoría	$ 2,694,194	4 días	mié 20/08/25	0 %	
41	41		Aprobación Volumen	$ 0	0 días	jue 21/08/25	0 %	
42	42		**2.1.1.11 Volumen III. Estudio de Fuentes de Materiales**	**$ 21,694,194.00**	**4 días**	**lun 4/08/25**	**0 %**	
43	43		**MAGDALENA - QUEBRADANEGA**	**$ 21,694,194.00**	**4 días**	**lun 4/08/25**	**0 %**	
44	44		**2.1.1 Metodología y Plan de Campo**	**$ 4,550,331.19**	**4 días**	**lun 4/08/25**	**0 %**	
45	45		Desarrollo Metodología de Intervención	$ 4,550,331	4 días	lun 4/08/25	0 %	
46	46		Revisión 1. Entrega de Observaciones e/o Aprobación	$ 0	0 días	mié 20/08/25	0 %	
47	47		**2.1.1.2 Atención de Observaciones**	**$ 2,694,194**	**4 días**	**mié 20/08/25**	**0 %**	
48	48		Consultoría	$ 2,694,194	4 días	jue 21/08/25	0 %	
49	49		Aprobación Volumen	$ 0	0 días	vie 22/08/25	0 %	
50	50		**2.1.1.3 Atención de Observaciones**	**$ 0**	**0 días**	**mar 8/07/25**	**0 %**	
51	51		Aprobación Metodología	$ 0	0 días	lun 14/07/25	0 %	
52	52		**2.1.1.4 Elaboración Volumen**	**$ 10,617,969.64**	**4 días**	**lun 14/07/25**	**0 %**	
53	53		**2.1.1.5 Entrega y Revisión de Observaciones**	**$ 3,837,990**	**4 días**	**lun 28/07/25**	**0 %**	
54	54		**2.1.1.6 Elaboración Volumen**	**$ 10,921,272.73**	**4 días**	**mar 22/07/25**	**0 %**	
55	55		**2.1.1.7 Entrega y Revisión de Observaciones**	**$ 1,213,474.14**	**4 días**	**lun 25/08/25**	**0 %**	
56	56		Entrega Volumen	$ 0	0 días	lun 25/08/25	0 %	
57	57		Revisión 1. Entrega de Observaciones e/o Aprobación	$ 0	0 días	lun 25/08/25	0 %	
58	58		**2.1.1.8 Atención de Observaciones**	**$ 606,737**	**4 días**	**mié 10/09/25**	**0 %**	
59	59		Revisión 2. Entrega de Observaciones e/o Aprobación	$ 0	0 días	mié 10/09/25	0 %	
60	60		Consultoría	$ 606,737	4 días	mié 10/09/25	0 %	
61	61		Aprobación Volumen	$ 0	0 días	jue 11/09/25	0 %	
62	62		**2.1.1.9 Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención**	**$ 21,265,359.13**	**4 días**	**lun 4/08/25**	**0 %**	
63	63		**2.1.1 MAGDALENA - QUEBRADANEGA**	**$ 21,265,359.13**	**4 días**	**lun 4/08/25**	**0 %**	
64	64		**2.1.1 Metodología y Plan de Campo**	**$ 4,550,331.19**	**4 días**	**lun 4/08/25**	**0 %**	
65	65		Desarrollo Metodología de Intervención	$ 4,550,331	4 días	lun 4/08/25	0 %	
66	66		Revisión 1. Entrega de Observaciones e/o Aprobación	$ 0	0 días	mié 20/08/25	0 %	
67	67		**2.1.1.2 Atención de Observaciones**	**$ 2,694,194**	**4 días**	**mié 20/08/25**	**0 %**	
68	68		Consultoría	$ 2,694,194	4 días	jue 21/08/25	0 %	
69	69		Aprobación Volumen	$ 0	0 días	vie 22/08/25	0 %	
70	70		**2.1.1.3 Atención de Observaciones**	**$ 0**	**0 días**	**mar 8/07/25**	**0 %**	
71	71		Aprobación Metodología	$ 0	0 días	lun 14/07/25	0 %	
72	72		**2.1.1.4 Elaboración Volumen**	**$ 90,146,019.48**	**4 días**	**lun 14/07/25**	**0 %**	
73	73		**2.1.1.5 Entrega y Revisión de Observaciones**	**$ 10,617,969.64**	**4 días**	**lun 28/07/25**	**0 %**	
74	74		Entrega Volumen	$ 92,722,114.98	4 días	lun 28/07/25	0 %	
75	75		Revisión 1. Entrega de Observaciones e/o Aprobación	$ 0	0 días	lun 28/07/25	0 %	
76	76		**2.1.1.6 Atención de Observaciones**	**$ 0**	**0 días**	**mié 10/09/25**	**0 %**	
77	77		Revisión 2. Entrega de Observaciones e/o Aprobación	$ 0	0 días	mié 10/09/25	0 %	
78	78		Consultoría	$ 5,532,328	4 días	jue 11/09/25	0 %	
79	79		Aprobación Volumen	$ 0	0 días	jue 11/09/25	0 %	
80	80		**2.1.1.7 Elaboración Volumen**	**$ 5,131,230**	**4 días**	**jue 25/09/25**	**0 %**	
81	81		Aprobación Volumen	$ 0	0 días	jue 25/09/25	0 %	
82	82		**2.1.1.8 Volumen V. Estudio de Canteras y Estabilización de Taludes**	**$ 20,171,494.59**	**4 días**	**lun 4/08/25**	**0 %**	
83	83		**2.1.1 MAGDALENA - QUEBRADANEGA**	**$ 20,171,494.59**	**4 días**	**lun 4/08/25**	**0 %**	
84	84		**2.1.1.1 Metodología y Plan de Campo**	**$ 4,096,249.31**	**4 días**	**lun 4/08/25**	**0 %**	
85	85		Desarrollo Metodología de Intervención	$ 4,096,249	4 días	lun 4/08/25	0 %	
86	86		Revisión 1. Entrega de Observaciones e/o Aprobación	$ 0	0 días	mié 20/08/25	0 %	
87	87		**2.1.1.2 Atención de Observaciones**	**$ 2,694,194**	**4 días**	**mié 20/08/25**	**0 %**	
88	88		Consultoría	$ 2,694,194	4 días	jue 21/08/25	0 %	
89	89		Aprobación Volumen	$ 0	0 días	vie 22/08/25	0 %	
90	90		**2.1.1.3 Atención de Observaciones**	**$ 0**	**0 días**	**mar 8/07/25**	**0 %**	
91	91		Aprobación Metodología	$ 0	0 días	lun 14/07/25	0 %	
92	92		**2.1.1.4 Elaboración Volumen**	**$ 10,617,969.64**	**4 días**	**lun 14/07/25**	**0 %**	
93	93		**2.1.1.5 Entrega y Revisión de Observaciones**	**$ 3,837,990**	**4 días**	**lun 28/07/25**	**0 %**	
94	94		**2.1.1.6 Elaboración Volumen**	**$ 11,246,559.40**	**4 días**	**mar 5/08/25**	**0 %**	
95	95		**2.1.1.7 Entrega y Revisión de Observaciones**	**$ 1,252,848.14**	**4 días**	**lun 11/08/25**	**0 %**	
96	96		Entrega Volumen	$ 0	0 días	lun 11/08/25	0 %	
97	97		Revisión 1. Entrega de Observaciones e/o Aprobación	$ 0	0 días	lun 11/08/25	0 %	
98	98		**2.1.1.8 Atención de Observaciones**	**$ 626,033**	**4 días**	**mié 20/08/25**	**0 %**	
99	99		Consultoría	$ 626,033	4 días	mié 20/08/25	0 %	
100	100		Aprobación Volumen	$ 0	0 días	jue 21/08/25	0 %	
101	101		**2.1.1.9 Volumen VI. Estudio de Fuentes de Materiales**	**$ 626,033**	**4 días**	**lun 4/08/25**	**0 %**	
102	102		**2.1.1 MAGDALENA - QUEBRADANEGA**	**$ 626,033**	**4 días**	**lun 4/08/25**	**0 %**	
103	103		**2.1.1.1 Metodología y Plan de Campo**	**$ 626,033**	**4 días**	**lun 4/08/25**	**0 %**	
104	104		Desarrollo Metodología de Intervención	$ 626,033	4 días	lun 4/08/25	0 %	
105	105		Revisión 1. Entrega de Observaciones e/o Aprobación	$ 0	0 días	mié 20/08/25	0 %	
106	106		**2.1.1.2 Atención de Observaciones**	**$ 0**	**0 días**	**mié 20/08/25**	**0 %**	
107	107		Consultoría	$ 0	0 días	mié 20/08/25	0 %	
108	108		Aprobación Volumen	$ 0	0 días	jue 21/08/25	0 %	
109	109		**2.1.1.3 Atención de Observaciones**	**$ 0**	**0 días**	**mar 8/07/25**	**0 %**	
110	110		Aprobación Metodología	$ 0	0 días	lun 14/07/25	0 %	
111	111		**2.1.1.4 Elaboración Volumen**	**$ 11,968,613.40**	**4 días**	**lun 14/07/25**	**0 %**	
112	112		**2.1.1.5 Entrega y Revisión de Observaciones**	**$ 1,252,848.14**	**4 días**	**lun 28/07/25**	**0 %**	
113	113		**2.1.1.6 Elaboración Volumen**	**$ 12,310,572.12**	**4 días**	**jue 28/08/25**	**0 %**	
114	114		**2.1.1.7 Entrega y Revisión de Observaciones**	**$ 1,252,848.14**	**4 días**	**jue 4/09/25**	**0 %**	
115	115		Entrega Volumen	$ 12,310,572	4 días	jue 28/08/25	0 %	
116	116		Revisión 1. Entrega de Observaciones e/o Aprobación	$ 0	0 días	jue 11/09/25	0 %	
117	117		**2.1.1.8 Atención de Observaciones**	**$ 0**	**0 días**	**mié 17/09/25**	**0 %**	
118	118		Revisión 2. Entrega de Observaciones e/o Aprobación	$ 0	0 días	jue 11/09/25	0 %	
119	119		**2.1.1.9 Atención de Observaciones**	**$ 683,921**	**4 días**	**mié 17/09/25**	**0 %**	
120	120		Consultoría	$ 683,921	4 días	mié 24/09/25	0 %	
121	121		Aprobación Volumen	$ 0	0 días	vie 26/09/25	0 %	
122	122		**2.1.1.10 Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales**	**$ 683,921**	**4 días**	**mié 24/09/25**	**0 %**	
123	123		**2.1.1 MAGDALENA - QUEBRADANEGA**	**$ 683,921**	**4 días**	**mié 24/09/25**	**0 %**	
124	124		**2.1.1 Metodología y Plan de Campo**	**$ 683,921**	**4 días**	**mié 24/09/25**	**0 %**	
125	125		**2.1.1.1 MAGDALENA - QUEBRADANEGA**	**$ 683,921**	**4 días**	**mié 24/09/25**	**0 %**	
126	126		**2.1.1.1 Metodología y Plan de Campo**	**$ 683,921**	**4 días**	**mié 24/09/25**	**0 %**	
127	127		Desarrollo Metodología de Intervención	$ 683,921	4 días	mié 24/09/25	0 %	
128	128		Revisión 1. Entrega de Observaciones e/o Aprobación	$ 0	0 días	mié 1/10/25	0 %	
129	129		**2.1.1.2 Atención de Observaciones**	**$ 0**	**0 días**	**mié 1/10/25**	**0 %**	
130	130		Consultoría	$ 0	0 días	mié 1/10/25	0 %	
131	131		Aprobación Volumen	$ 0	0 días	jue 2/10/25	0 %	
132	132		**2.1.1.3 Atención de Observaciones**	**$ 0**	**0 días**	**mar 8/07/25**	**0 %**	
133	133		Aprobación Metodología	$ 0	0 días	lun 14/07/25	0 %	
134	134		**2.1.1.4 Elaboración Volumen**	**$ 11,968,613.40**	**4 días**	**lun 14/07/25**	**0 %**	
135	135		**2.1.1.5 Entrega y Revisión de Observaciones**	**$ 1,252,848.14**	**4 días**	**lun 28/07/25**	**0 %**	
136	136		**2.1.1.6 Elaboración Volumen**	**$ 12,310,572.12**	**4 días**	**jue 28/08/25**	**0 %**	
137	137		**2.1.1.7 Entrega y Revisión de Observaciones**	**$ 1,252,848.14**	**4 días**	**jue 4/09/25**	**0 %**	
138	138		Entrega Volumen	$ 12,310,572	4 días	jue 28/08/25	0 %	
139	139		Revisión 1. Entrega de Observaciones e/o Aprobación	$ 0	0 días	jue 11/09/25	0 %	
140	140		**2.1.1.8 Atención de Observaciones**	**$ 0**	**0 días**	**mié 17/09/25**	**0 %**	
141	141		Revisión 2. Entrega de Observaciones e/o Aprobación	$ 0	0 días	jue 11/09/25	0 %	
142	142		**2.1.1.9 Atención de Observaciones**	**$ 683,921**	**4 días**	**mié 17/09/25**	**0 %**	
143	143		Consultoría	$ 683,921	4 días	mié 24/09/25	0 %	
144	144		Aprobación Volumen	$ 0	0 días	vie 26/09/25	0 %	
145	145		**2.1.1.10 Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales**	**$ 683,921**	**4 días**	**mié 24/09/25**	**0 %**	
146	146		**2.1.1 MAGDALENA - QUEBRADANEGA**	**$ 683,921**	**4 días**	**mié 24/09/25**	**0 %**	
147	147		**2.1.1 Metodología y Plan de Campo**	**$ 683,921**	**4 días**	**mié 24/09/25**	**0 %**	

Tareas inactivas · Resumen inactivo · Progreso de la tarea · Tarea · División · Progreso del resumen · Resumen · Tarea manual · Resumen manual · Límite de progreso · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas inactivas · Hitos inactivos · Resumen inactivo · Hito inactivo · Tareas manuales · Hito manual · Tareas solo duración · Hito solo duración · Fecha límite de la tarea · Hito de fecha límite · Progreso manual · Fecha límite

Página 1


Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo fijo	Costo	Duración	Comienzo
126	2.7.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 5,441,530	$ 5,441,530	15 días	lun 9/06/25
127	2.7.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.5 días	mié 25/06/25
128	2.7.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0		0.3 días	mar 1/07/25
129	2.7.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.3 días	vie 4/07/25
130	2.7.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0		0.5 días	mar 8/07/25
131	2.7.1.1.6		Aprobación Metodología	$ 0		0.0 días	lun 14/07/25
132	**2.7.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 12,696,903**	**40 días**	**lun 14/07/25**
133	2.7.1.2.1		Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	$ 12,696,903	$ 12,696,903	40 días	lun 14/07/25
134	**2.7.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 13,059,673**	**12 días**	**jue 28/08/25**
135	2.7.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 13,059,673	$ 13,059,673	12 días	jue 28/08/25
136	**2.7.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoria**	**$ 0**	**$ 1,451,074**	**14 días**	**jue 11/09/25**
137	2.7.1.4.1		Entrega Volumen	$ 0		0.0 días	jue 11/09/25
138	2.7.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.5 días	jue 11/09/25
139	2.7.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 725,537	$ 725,537	3 días	mié 17/09/25
140	2.7.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.3 días	sáb 20/09/25
141	2.7.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 725,537	$ 725,537	3 días	mié 24/09/25
142	2.7.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0		0.0 días	vie 26/09/25
143	**2.8**		**Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación**	**$ 0**	**$ 39,459,568**	**82 días**	**lun 9/06/25**
144	**2.8.1**		**MAGDALENA - QUEBRADANEGRA**	**$ 0**	**$ 39,459,568**	**82 días**	**lun 9/06/25**
145	**2.8.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 6,576,595**	**31 días**	**lun 9/06/25**
146	2.8.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 6,576,595	$ 6,576,595	15 días	lun 9/06/25
147	2.8.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.5 días	mié 25/06/25
148	2.8.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0		0.3 días	mar 1/07/25
149	2.8.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.3 días	vie 4/07/25
150	2.8.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0		0.5 días	mar 8/07/25
151	2.8.1.1.6		Aprobación Metodología	$ 0		0.0 días	lun 14/07/25
152	**2.8.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 15,345,387**	**7 días**	**lun 14/07/25**
153	2.8.1.2.1		Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	$ 15,345,387	$ 15,345,387	7 días	lun 14/07/25
154	**2.8.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 15,783,828**	**30 días**	**mar 22/07/25**
155	2.8.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 15,783,828	$ 15,783,828	30 días	mar 22/07/25
156	**2.8.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoria**	**$ 0**	**$ 1,753,758**	**14 días**	**lun 25/08/25**
157	2.8.1.4.1		Entrega Volumen	$ 0		0.0 días	lun 25/08/25
158	2.8.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.5 días	lun 25/08/25
159	2.8.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 876,879	$ 876,879	3 días	sáb 30/08/25
160	2.8.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.3 días	mié 3/09/25
161	2.8.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 876,879	$ 876,879	3 días	sáb 6/09/25
162	2.8.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0		0.0 días	mié 10/09/25
163	**2.9**		**Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras**	**$ 0**	**$ 34,388,114**	**97 días**	**lun 9/06/25**
164	**2.9.1**		**MAGDALENA - QUEBRADANEGRA**	**$ 0**	**$ 34,388,114**	**97 días**	**lun 9/06/25**
165	**2.9.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 5,731,353**	**31 días**	**lun 9/06/25**
166	2.9.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 5,731,353	$ 5,731,353	15 días	lun 9/06/25
167	2.9.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.5 días	mié 25/06/25
168	2.9.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0		0.3 días	mar 1/07/25
169	2.9.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.3 días	vie 4/07/25
170	2.9.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0		0.5 días	mar 8/07/25
171	2.9.1.1.6		Aprobación Metodología	$ 0		0.0 días	lun 14/07/25
172	**2.9.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 13,373,155**	**$ 13,373,155**	**7 días**	**lun 14/07/25**
173	2.9.1.2.1		Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	$ 13,373,155	$ 13,373,155	7 días	lun 14/07/25
174	**2.9.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 13,755,246**	**45 días**	**mar 22/07/25**
175	2.9.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 13,755,246	$ 13,755,246	45 días	mar 22/07/25
176	**2.9.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoria**	**$ 0**	**$ 1,528,360**	**14 días**	**jue 11/09/25**
177	2.9.1.4.1		Entrega Volumen	$ 0		0.0 días	jue 11/09/25
178	2.9.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.5 días	jue 11/09/25
179	2.9.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 764,180	$ 764,180	3 días	mié 17/09/25
180	2.9.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.3 días	sáb 20/09/25
181	2.9.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 764,180	$ 764,180	3 días	mié 24/09/25
182	2.9.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0		0.0 días	vie 26/09/25
183	**2.10**		**Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social**	**$ 0**	**$ 52,503,971**	**119 días**	**lun 9/06/25**
184	**2.10.1**		**MAGDALENA - QUEBRADANEGRA**	**$ 0**	**$ 52,503,971**	**119 días**	**lun 9/06/25**
185	**2.10.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 8,750,662**	**31 días**	**lun 9/06/25**
186	2.10.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 8,750,662	$ 8,750,662	15 días	lun 9/06/25
187	2.10.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.5 días	mié 25/06/25
188	2.10.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0		0.3 días	mar 1/07/25
189	2.10.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.3 días	vie 4/07/25
190	2.10.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0		0.5 días	mar 8/07/25
191	2.10.1.1.6		Aprobación Metodología	$ 0		0.0 días	lun 14/07/25
192	**2.10.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 20,418,211**	**7 días**	**mar 22/07/25**
193	2.10.1.2.1		Inventario en Campo e Inventario Forestal	$ 20,418,211	$ 20,418,211	7 días	mar 22/07/25
194	**2.10.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 21,001,588**	**60 días**	**mié 30/07/25**
195	2.10.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 21,001,588	$ 21,001,588	60 días	mié 30/07/25
196	**2.10.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoria**	**$ 0**	**$ 2,333,510**	**14 días**	**lun 6/10/25**
197	2.10.1.4.1		Entrega Volumen	$ 0		0.0 días	lun 6/10/25
198	2.10.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.5 días	lun 6/10/25
199	2.10.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 1,166,755	$ 1,166,755	3 días	sáb 11/10/25
200	2.10.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.3 días	mié 15/10/25
201	2.10.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 1,166,755	$ 1,166,755	3 días	sáb 18/10/25
202	2.10.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0		0.0 días	mié 22/10/25
203	**2.11**		**Volumen XI. Estudio de Predial**	**$ 0**	**$ 38,018,536**	**125 días**	**lun 9/06/25**
204	**2.11.1**		**MAGDALENA - QUEBRADANEGRA**	**$ 0**	**$ 38,018,536**	**125 días**	**lun 9/06/25**
205	**2.11.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 6,336,423**	**31 días**	**lun 9/06/25**
206	2.11.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 6,336,423	$ 6,336,423	15 días	lun 9/06/25
207	2.11.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.5 días	mié 25/06/25
208	2.11.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0		0.3 días	mar 1/07/25
209	2.11.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.3 días	vie 4/07/25
210	2.11.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0		0.5 días	mar 8/07/25
211	2.11.1.1.6		Aprobación Metodología	$ 0		0.0 días	lun 14/07/25
212	**2.11.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 14,784,986**	**$ 14,784,986**	**20 días**	**sáb 19/07/25**
213	2.11.1.2.1		Inventario en Campo y Conteo Forestal	$ 14,784,986	$ 14,784,986	20 días	sáb 19/07/25
214	**2.11.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 15,207,415**	**55 días**	**lun 11/08/25**
215	2.11.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 15,207,415	$ 15,207,415	55 días	lun 11/08/25
216	**2.11.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoria**	**$ 0**	**$ 1,689,712**	**14 días**	**lun 13/10/25**
217	2.11.1.4.1		Entrega Volumen	$ 0		0.0 días	lun 13/10/25
218	2.11.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.5 días	lun 13/10/25
219	2.11.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 844,856	$ 844,856	3 días	sáb 18/10/25
220	2.11.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.3 días	mié 22/10/25
221	2.11.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 844,856	$ 844,856	3 días	sáb 25/10/25
222	2.11.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0		0.0 días	mié 29/10/25
223	**2.12**		**Volumen XII. Estudio de Presupuestos**	**$ 0**	**$ 25,820,274**	**107 días**	**lun 9/06/25**
224	**2.12.1**		**MAGDALENA - QUEBRADANEGRA**	**$ 0**	**$ 25,820,274**	**107 días**	**lun 9/06/25**
225	**2.12.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 4,303,379**	**31 días**	**lun 9/06/25**
226	2.12.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 4,303,379	$ 4,303,379	15 días	lun 9/06/25
227	2.12.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.5 días	mié 25/06/25
228	2.12.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0		0.3 días	mar 1/07/25
229	2.12.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.3 días	vie 4/07/25
230	2.12.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0		0.5 días	mar 8/07/25
231	2.12.1.1.6		Aprobación Metodología	$ 0		0.0 días	lun 14/07/25
232	**2.12.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 10,041,218**	**7 días**	**lun 14/07/25**
233	2.12.1.2.1		Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios)	$ 10,041,218	$ 10,041,218	7 días	lun 14/07/25
234	**2.12.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 10,328,109**	**55 días**	**mar 22/07/25**
235	2.12.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 10,328,109	$ 10,328,109	55 días	mar 22/07/25
236	**2.12.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoria**	**$ 0**	**$ 1,147,568**	**14 días**	**lun 22/09/25**
237	2.12.1.4.1		Entrega Volumen	$ 0		0.0 días	lun 22/09/25
238	2.12.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.5 días	mar 23/09/25
239	2.12.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 573,784	$ 573,784	3 días	lun 29/09/25
240	2.12.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.3 días	mié 1/10/25
241	2.12.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 573,784	$ 573,784	3 días	sáb 4/10/25
242	2.12.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0		0.0 días	mié 8/10/25
243	**2.13**		**Volumen XIII. Informe Final Ejecutivo**	**$ 0**	**$ 0**	**26 días**	**mié 29/10/25**
244	2.13.1		Elaboración Informe Final	$ 0		0.0 días	mié 29/10/25
245	2.13.2		Entrega Informe Final	$ 0		0.0 días	jue 20/11/25
246	2.13.3		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0		0.3 días	vie 21/11/25
247	2.13.4		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0		0.3 días	lun 24/11/25
248	2.13.5		Aprobación Volumen	$ 0		0.0 días	jue 27/11/25
249	2.14		Acta de Recibo Final	$ 77,634,783	$ 77,634,783	0 días	jue 27/11/25

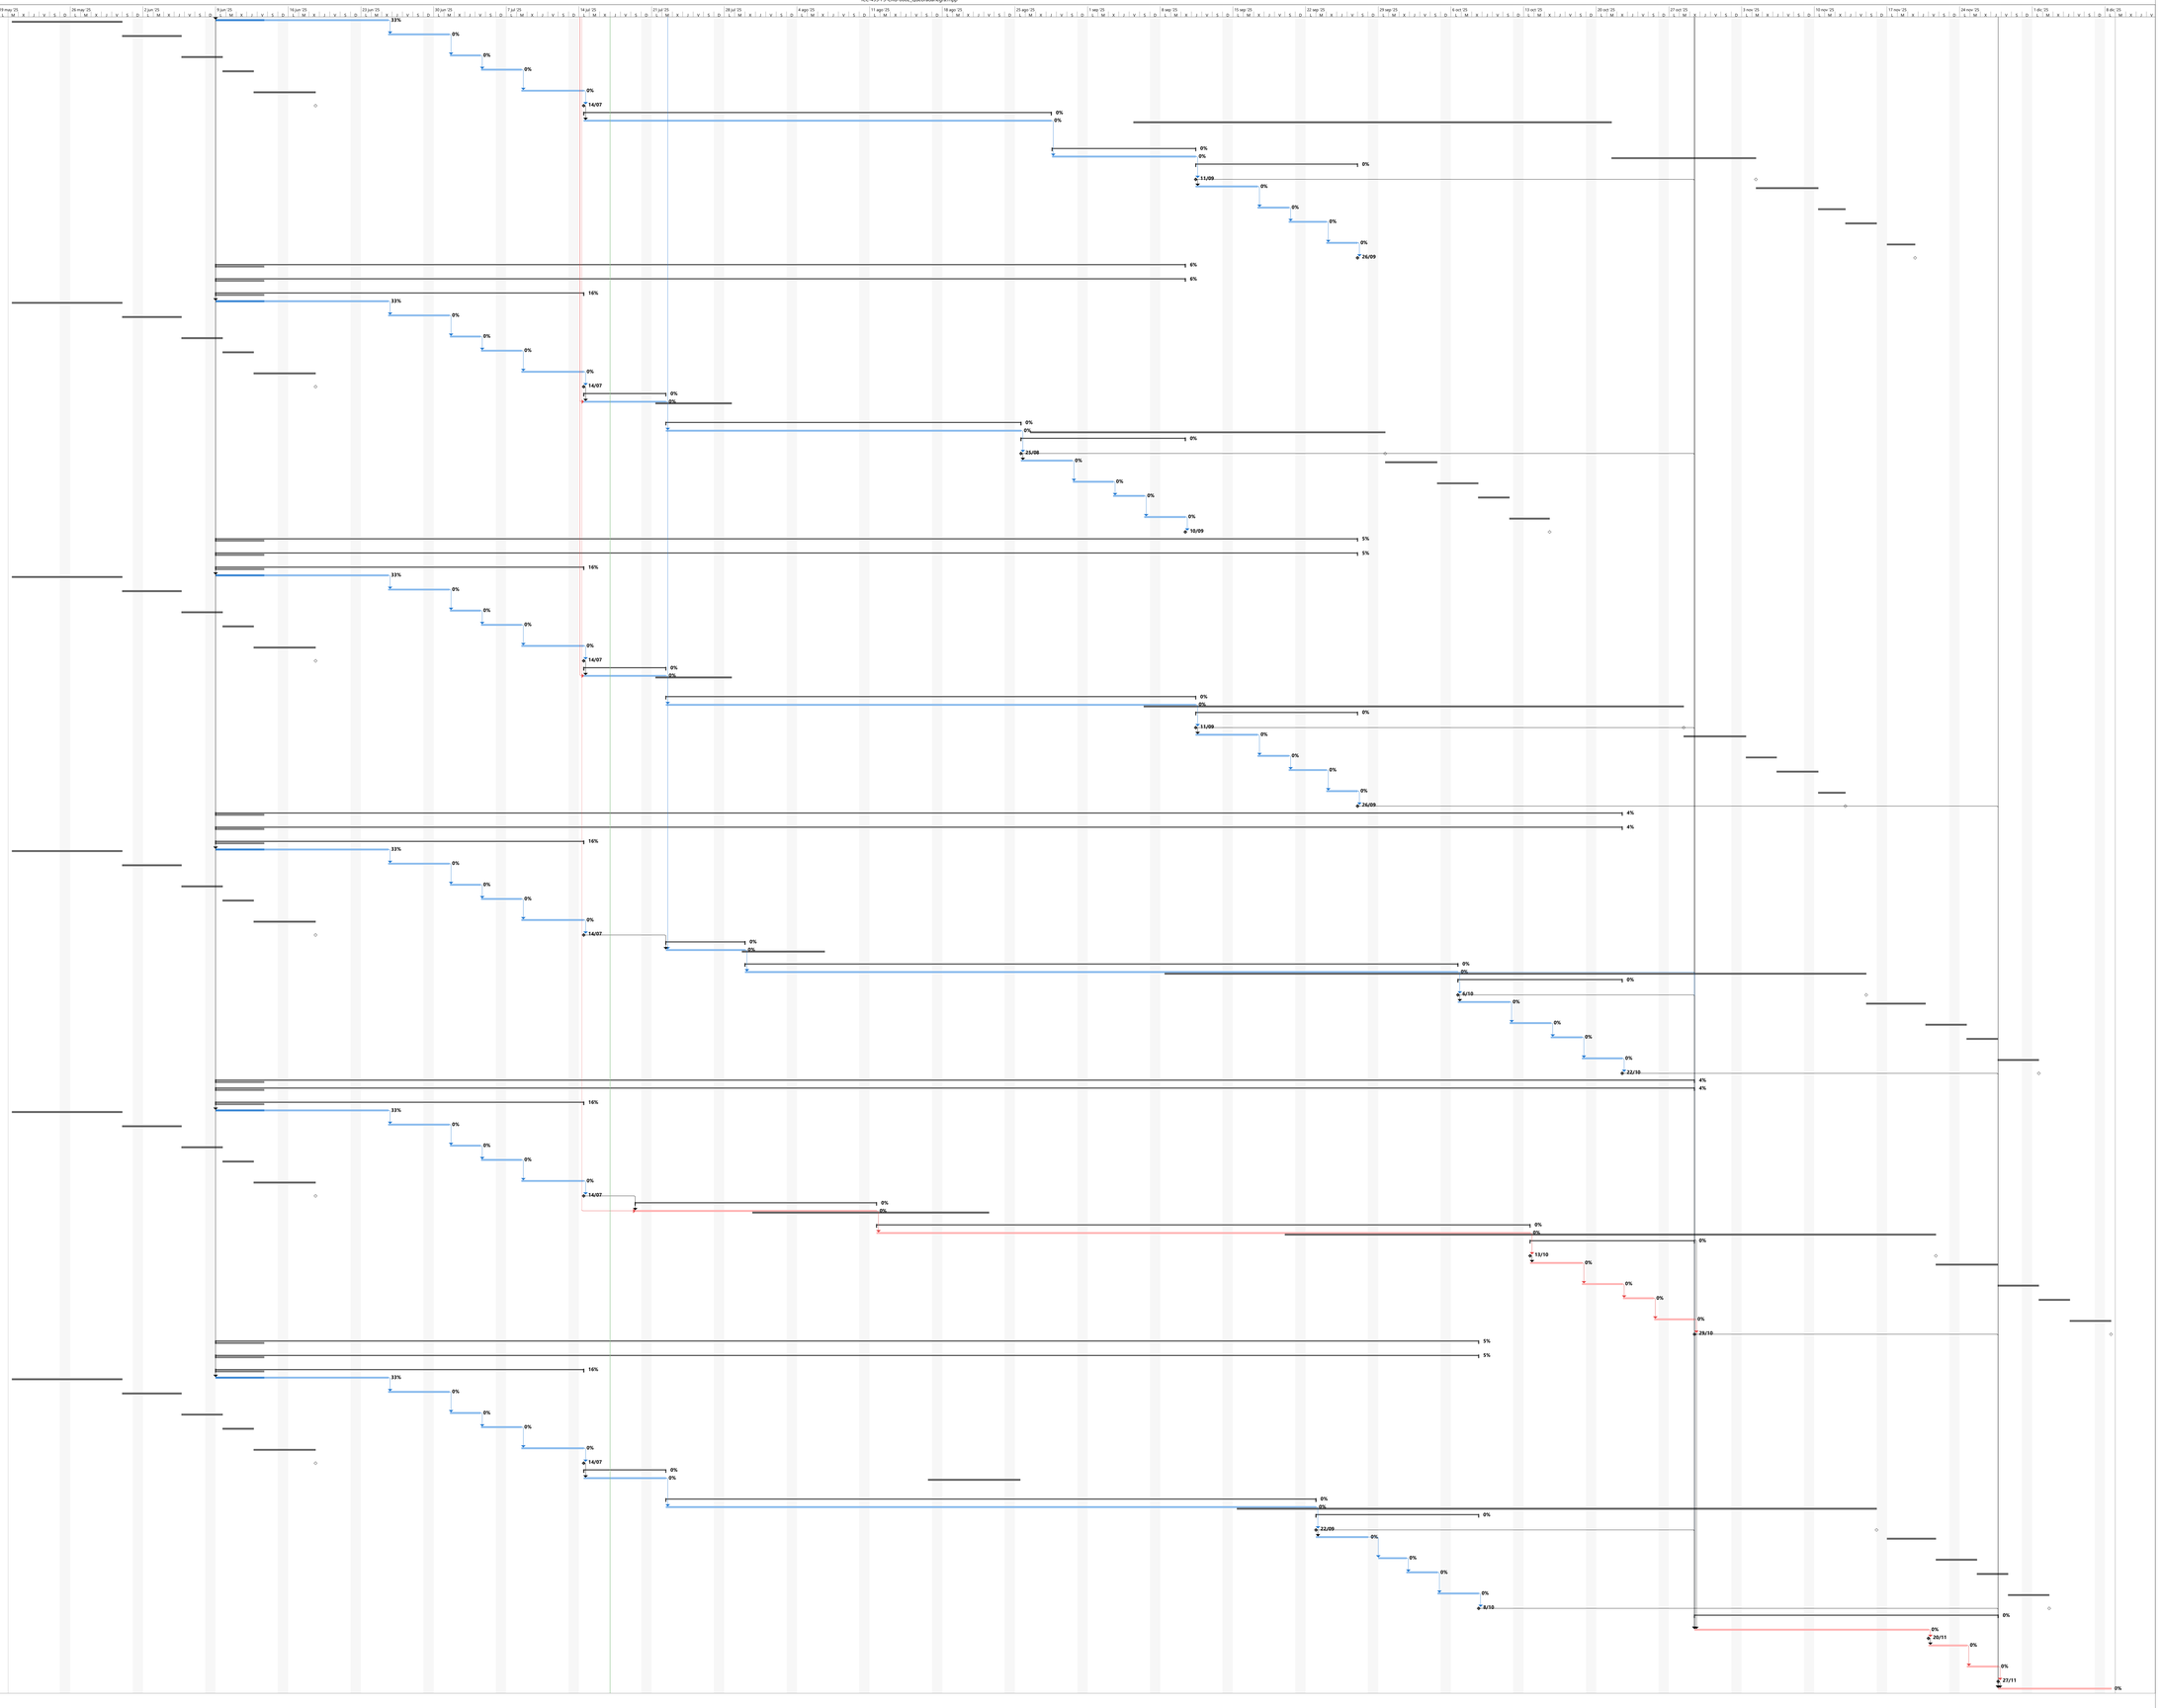

Tareas criticas | División crítica | Progreso de tarea crítica | Tarea | División | Progreso de tarea | Tarea manual | solo el comienzo | solo fin | solo duración | Línea base | División de la línea base | Hito de línea base | Hito | Progreso del resumen | Resumen | Resumen manual | Resumen del proyecto | Tareas externas | Hito externo | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Fecha límite


ICC-493-F3-CRG-0002_Caqueza.mpp

Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo fijo	Costo	Duración	Comienzo	Fin
0	**0**		**ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO - ICCU - CAQUEZA PLACITAS**	**$ 0**	**$ 480,356,534**	**157.13 días**	**mar 20/05/25**	**sáb 15/11/25**
1	1		ACTA DE INICIO	$ 0	$ 0	0 días	mar 20/05/25	mar 20/05/25
2	**2**		**ESTUDIOS Y DISEÑOS - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN**	**$ 0**	**$ 480,356,534**	**140 días**	**lun 9/06/25**	**sáb 15/11/25**
3	**2.1**		**Volumen I. Estudio de Transito**	**$ 0**	**$ 34,452,419**	**66 días**	**lun 9/06/25**	**vie 22/08/25**
4	**2.1.1**		**CAQUEZA - PLACITAS**	**$ 0**	**$ 34,452,419**	**66 días**	**lun 9/06/25**	**vie 22/08/25**
5	**2.1.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 5,742,070**	**31 días**	**lun 9/06/25**	**lun 14/07/25**
6	2.1.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 5,742,070	$ 5,742,070	15 días	lun 9/06/25	mié 25/06/25
7	2.1.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	mié 25/06/25	mar 1/07/25
8	2.1.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	3 días	mar 1/07/25	vie 4/07/25
9	2.1.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	vie 4/07/25	mar 8/07/25
10	2.1.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	5 días	mar 8/07/25	lun 14/07/25
11	2.1.1.1.6		Aprobación Metodologia	$ 0	$ 0	0 días	lun 14/07/25	lun 14/07/25
12	**2.1.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 13,398,163**	**7 días**	**lun 14/07/25**	**mar 22/07/25**
13	2.1.1.2.1		Aforos de Trafico	$ 13,398,163	$ 13,398,163	7 días	lun 14/07/25	mar 22/07/25
14	**2.1.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 13,780,968**	**14 días**	**mar 22/07/25**	**mié 6/08/25**
15	2.1.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 13,780,968	$ 13,780,968	14 días	mar 22/07/25	mié 6/08/25
16	**2.1.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoría**	**$ 0**	**$ 1,531,218**	**14 días**	**mié 6/08/25**	**vie 22/08/25**
17	2.1.1.4.1		Entrega Volumen	$ 0	$ 0	0 días	mié 6/08/25	mié 6/08/25
18	2.1.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	mié 6/08/25	mar 12/08/25
19	2.1.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 765,609	$ 765,609	3 días	mar 12/08/25	vie 15/08/25
20	2.1.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	vie 15/08/25	mar 19/08/25
21	2.1.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 765,609	$ 765,609	3 días	mar 19/08/25	vie 22/08/25
22	2.1.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0	0 días	vie 22/08/25	vie 22/08/25
23	**2.2**		**Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT**	**$ 0**	**$ 73,615,470**	**77 días**	**lun 9/06/25**	**jue 4/09/25**
24	**2.2.1**		**CAQUEZA - PLACITAS**	**$ 0**	**$ 73,615,470**	**77 días**	**lun 9/06/25**	**jue 4/09/25**
25	**2.2.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 12,269,244**	**31 días**	**lun 9/06/25**	**lun 14/07/25**
26	2.2.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 12,269,244	$ 12,269,244	15 días	lun 9/06/25	mié 25/06/25
27	2.2.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	mié 25/06/25	mar 1/07/25
28	2.2.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	3 días	mar 1/07/25	vie 4/07/25
29	2.2.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	vie 4/07/25	mar 8/07/25
30	2.2.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	5 días	mar 8/07/25	lun 14/07/25
31	2.2.1.1.6		Aprobación Metodologia	$ 0	$ 0	0 días	lun 14/07/25	lun 14/07/25
32	**2.2.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 28,628,239**	**12 días**	**lun 14/07/25**	**lun 28/07/25**
33	2.2.1.2.1		Topografia y Red Geodesica	$ 28,628,239	$ 28,628,239	12 días	lun 14/07/25	lun 28/07/25
34	**2.2.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 29,446,189**	**20 días**	**lun 28/07/25**	**mar 19/08/25**
35	2.2.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 29,446,189	$ 29,446,189	20 días	lun 28/07/25	mar 19/08/25
36	**2.2.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoría**	**$ 0**	**$ 3,271,798**	**14 días**	**mar 19/08/25**	**jue 4/09/25**
37	2.2.1.4.1		Entrega Volumen	$ 0	$ 0	0 días	mar 19/08/25	mar 19/08/25
38	2.2.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	mar 19/08/25	lun 25/08/25
39	2.2.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 1,635,899	$ 1,635,899	3 días	lun 25/08/25	jue 28/08/25
40	2.2.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	jue 28/08/25	lun 1/09/25
41	2.2.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 1,635,899	$ 1,635,899	3 días	lun 1/09/25	jue 4/09/25
42	2.2.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0	0 días	jue 4/09/25	jue 4/09/25
43	**2.3**		**Volumen III. Geología para Ingeniería**	**$ 0**	**$ 23,440,728**	**79 días**	**lun 9/06/25**	**sáb 6/09/25**
44	**2.3.1**		**CAQUEZA - PLACITAS**	**$ 0**	**$ 23,440,728**	**79 días**	**lun 9/06/25**	**sáb 6/09/25**
45	**2.3.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 3,906,788**	**31 días**	**lun 9/06/25**	**lun 14/07/25**
46	2.3.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 3,906,788	$ 3,906,788	15 días	lun 9/06/25	mié 25/06/25
47	2.3.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	mié 25/06/25	mar 1/07/25
48	2.3.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	3 días	mar 1/07/25	vie 4/07/25
49	2.3.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	vie 4/07/25	mar 8/07/25
50	2.3.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	5 días	mar 8/07/25	lun 14/07/25
51	2.3.1.1.6		Aprobación Metodologia	$ 0	$ 0	0 días	lun 14/07/25	lun 14/07/25
52	**2.3.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 9,115,839**	**14 días**	**lun 14/07/25**	**mar 29/07/25**
53	2.3.1.2.1		Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos	$ 9,115,839	$ 9,115,839	14 días	lun 14/07/25	mar 29/07/25
54	**2.3.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 9,376,291**	**20 días**	**mié 30/07/25**	**jue 21/08/25**
55	2.3.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 9,376,291	$ 9,376,291	20 días	mié 30/07/25	jue 21/08/25
56	**2.3.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoría**	**$ 0**	**$ 1,041,810**	**14 días**	**jue 21/08/25**	**sáb 6/09/25**
57	2.3.1.4.1		Entrega Volumen	$ 0	$ 0	0 días	jue 21/08/25	jue 21/08/25
58	2.3.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	jue 21/08/25	mié 27/08/25
59	2.3.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 520,905	$ 520,905	3 días	mié 27/08/25	sáb 30/08/25
60	2.3.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	sáb 30/08/25	mié 3/09/25
61	2.3.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 520,905	$ 520,905	3 días	mié 3/09/25	sáb 6/09/25
62	2.3.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0	0 días	sáb 6/09/25	sáb 6/09/25
63	**2.4**		**Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención**	**$ 0**	**$ 60,926,068**	**100 días**	**lun 9/06/25**	**mar 30/09/25**
64	**2.4.1**		**CAQUEZA - PLACITAS**	**$ 0**	**$ 60,926,068**	**100 días**	**lun 9/06/25**	**mar 30/09/25**
65	**2.4.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 10,154,345**	**31 días**	**lun 9/06/25**	**lun 14/07/25**
66	2.4.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 10,154,345	$ 10,154,345	15 días	lun 9/06/25	mié 25/06/25
67	2.4.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	mié 25/06/25	mar 1/07/25
68	2.4.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	3 días	mar 1/07/25	vie 4/07/25
69	2.4.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	vie 4/07/25	mar 8/07/25
70	2.4.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	5 días	mar 8/07/25	lun 14/07/25
71	2.4.1.1.6		Aprobación Metodologia	$ 0	$ 0	0 días	lun 14/07/25	lun 14/07/25
72	**2.4.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 23,693,471**	**25 días**	**lun 14/07/25**	**lun 11/08/25**
73	2.4.1.2.1		Campaña Geotecnica	$ 23,693,471	$ 23,693,471	25 días	lun 14/07/25	lun 11/08/25
74	**2.4.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 24,370,426**	**30 días**	**lun 11/08/25**	**lun 15/09/25**
75	2.4.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 24,370,426	$ 24,370,426	30 días	lun 11/08/25	lun 15/09/25
76	**2.4.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoría**	**$ 0**	**$ 2,707,826**	**14 días**	**lun 15/09/25**	**mar 30/09/25**
77	2.4.1.4.1		Entrega Volumen	$ 0	$ 0	0 días	lun 15/09/25	lun 15/09/25
78	2.4.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	lun 15/09/25	sáb 20/09/25
79	2.4.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 1,353,913	$ 1,353,913	3 días	sáb 20/09/25	mar 23/09/25
80	2.4.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	mié 24/09/25	vie 26/09/25
81	2.4.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 1,353,913	$ 1,353,913	3 días	sáb 27/09/25	mar 30/09/25
82	2.4.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0	0 días	mar 30/09/25	mar 30/09/25
83	**2.5**		**Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes**	**$ 0**	**$ 20,835,788**	**85 días**	**lun 9/06/25**	**sáb 13/09/25**
84	**2.5.1**		**CAQUEZA - PLACITAS**	**$ 0**	**$ 20,835,788**	**85 días**	**lun 9/06/25**	**sáb 13/09/25**
85	**2.5.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 3,472,632**	**31 días**	**lun 9/06/25**	**lun 14/07/25**
86	2.5.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 3,472,632	$ 3,472,632	15 días	lun 9/06/25	mié 25/06/25

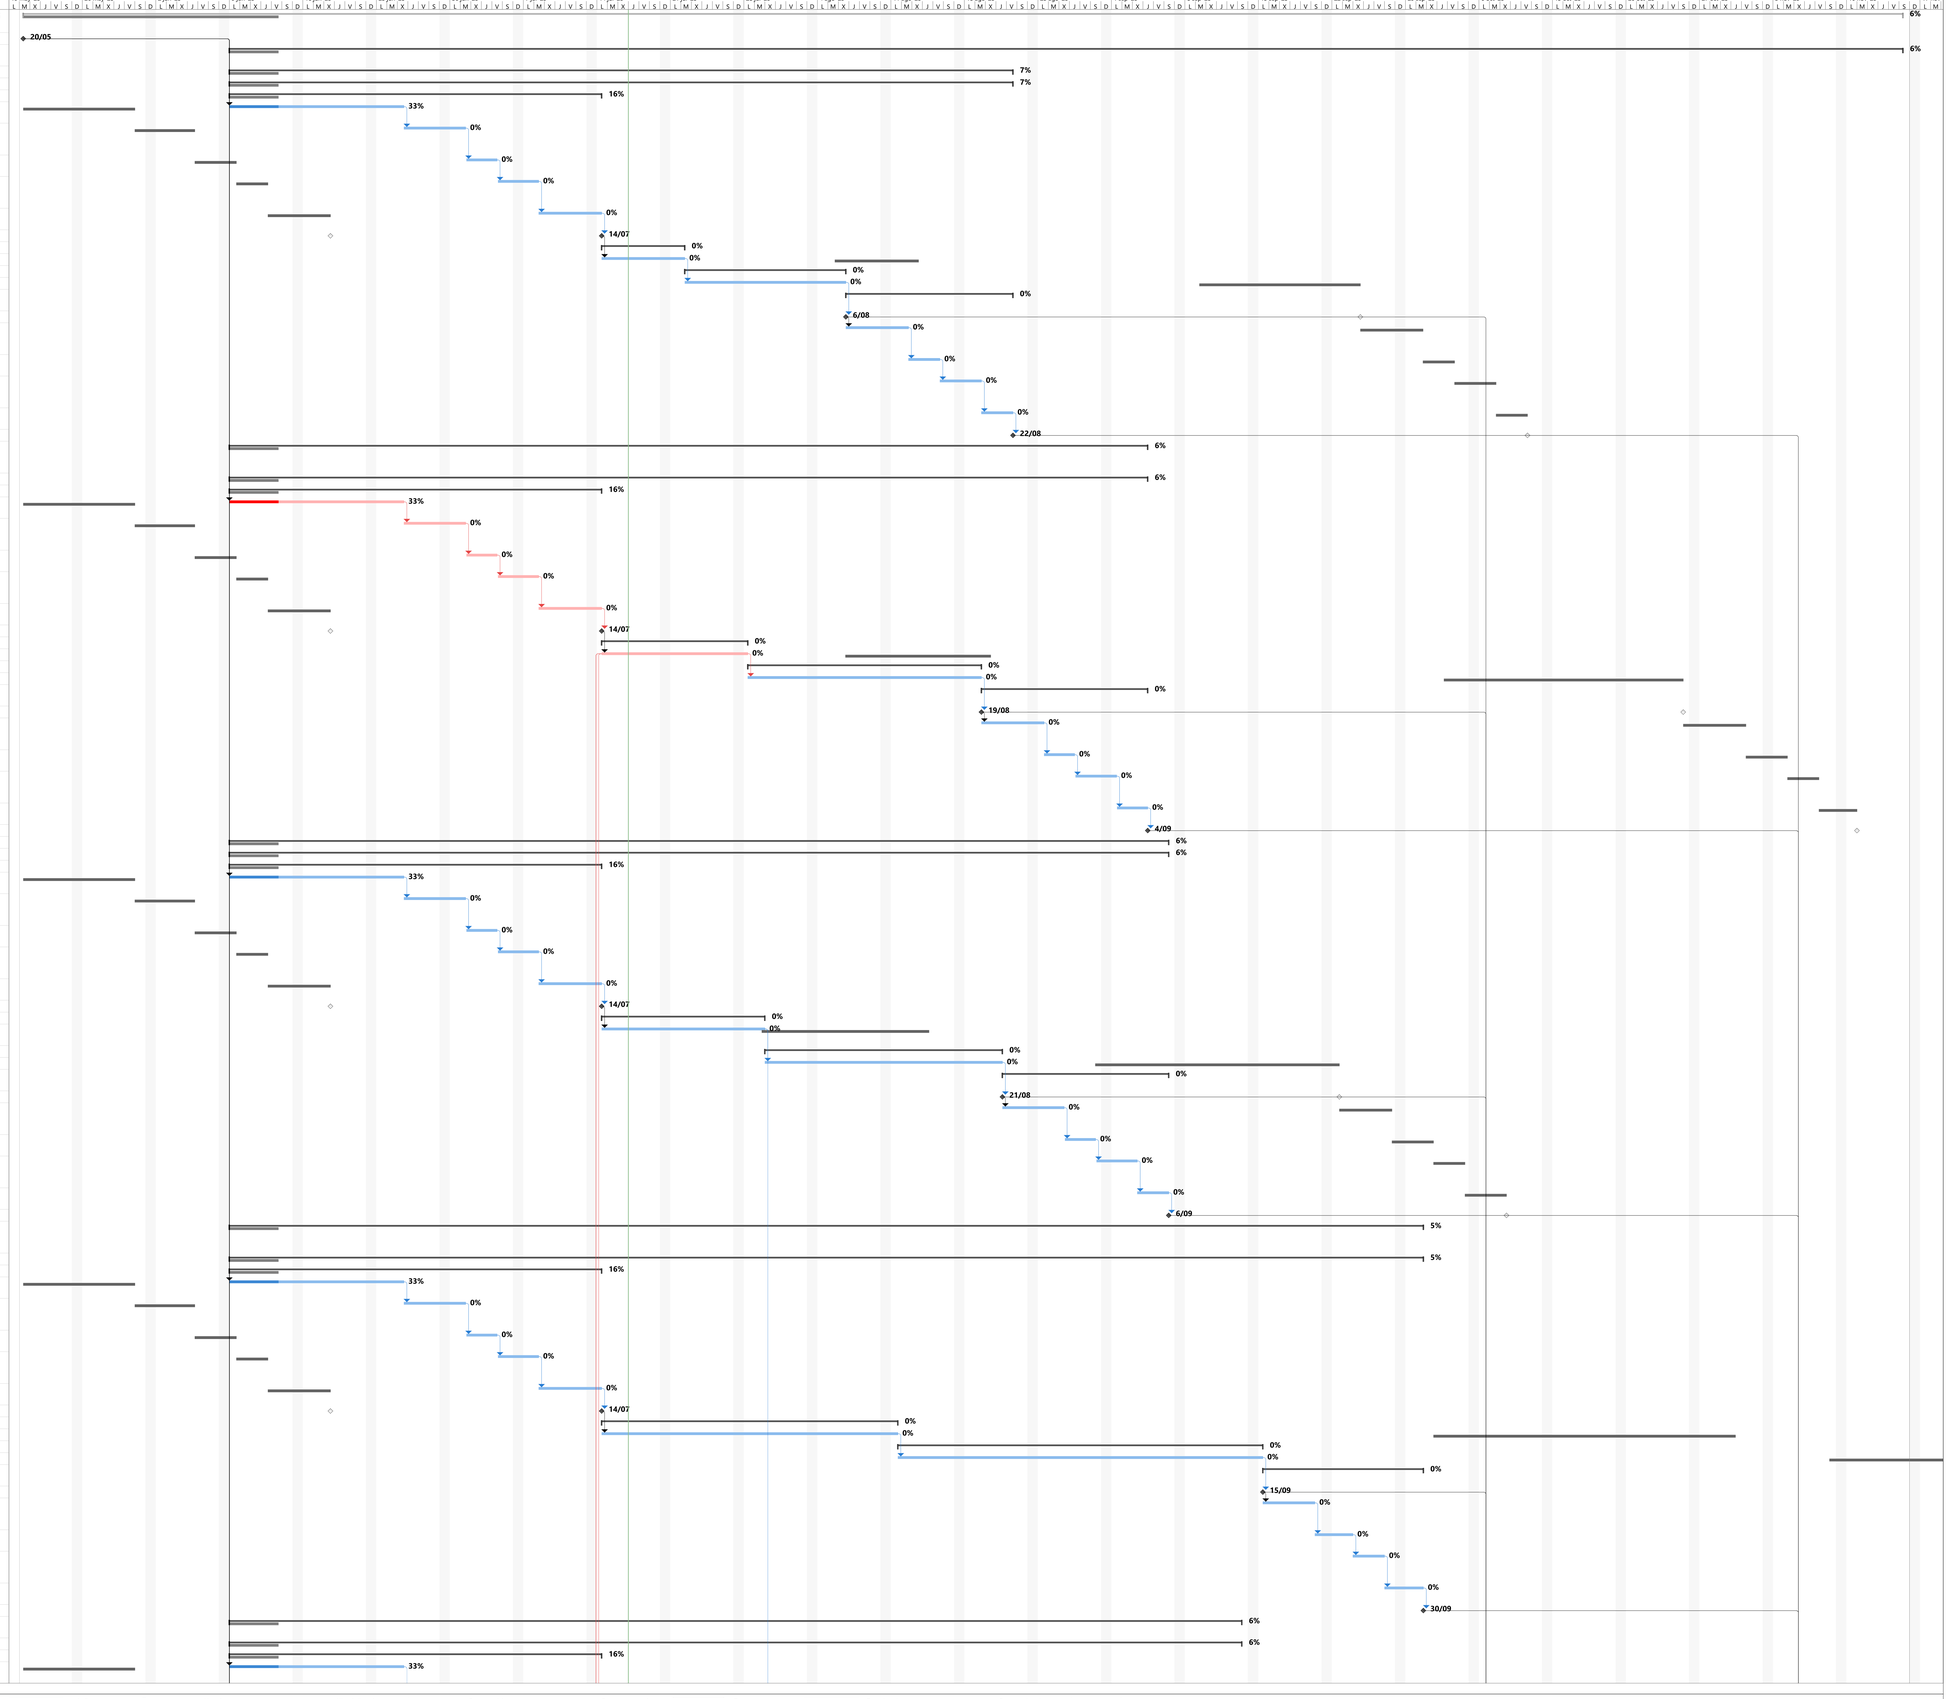


Tareas criticas | Progreso de tarea crítica | División | Tarea manual | solo fin | Línea base | Hito de línea base | Progreso del resumen | Resumen manual | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo
División crítica | Tarea | Progreso de tarea | solo el comienzo | solo duración | División de la línea base | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Fecha límite

Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo fijo	Costo	Duración	Comienzo	Fin
87	2.5.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	mié 25/06/25	mar 1/07/25
88	2.5.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	3 días	mar 1/07/25	vie 4/07/25
89	2.5.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	vie 4/07/25	mar 8/07/25
90	2.5.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	5 días	mar 8/07/25	lun 14/07/25
91	2.5.1.1.6		Aprobación Metodologia	$ 0	$ 0	0 días	lun 14/07/25	lun 14/07/25
92	**2.5.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 8,102,806**	**15 días**	**lun 14/07/25**	**mié 30/07/25**
93	2.5.1.2.1		Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio	$ 8,102,806	$ 8,102,806	15 días	lun 14/07/25	mié 30/07/25
94	**2.5.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 8,334,314**	**25 días**	**jue 31/07/25**	**jue 28/08/25**
95	2.5.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 8,334,314	$ 8,334,314	25 días	jue 31/07/25	jue 28/08/25
96	**2.5.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoría**	**$ 0**	**$ 926,036**	**14 días**	**jue 28/08/25**	**sáb 13/09/25**
97	2.5.1.4.1		Entrega Volumen	$ 0	$ 0	0 días	jue 28/08/25	jue 28/08/25
98	2.5.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	jue 28/08/25	mié 3/09/25
99	2.5.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 463,018	$ 463,018	3 días	mié 3/09/25	sáb 6/09/25
100	2.5.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	sáb 6/09/25	mié 10/09/25
101	2.5.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 463,018	$ 463,018	3 días	mié 10/09/25	sáb 13/09/25
102	2.5.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0	0 días	sáb 13/09/25	sáb 13/09/25
103	**2.6**		**Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento**	**$ 0**	**$ 26,045,667**	**80 días**	**lun 9/06/25**	**lun 8/09/25**
104	**2.6.1**		**CAQUEZA - PLACITAS**	**$ 0**	**$ 26,045,667**	**80 días**	**lun 9/06/25**	**lun 8/09/25**
105	**2.6.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 4,340,945**	**31 días**	**lun 9/06/25**	**lun 14/07/25**
106	2.6.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 4,340,945	$ 4,340,945	15 días	lun 9/06/25	mié 25/06/25
107	2.6.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	mié 25/06/25	mar 1/07/25
108	2.6.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	3 días	mar 1/07/25	vie 4/07/25
109	2.6.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	vie 4/07/25	mar 8/07/25
110	2.6.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	5 días	mar 8/07/25	lun 14/07/25
111	2.6.1.1.6		Aprobación Metodologia	$ 0	$ 0	0 días	lun 14/07/25	lun 14/07/25
112	**2.6.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 10,128,870**	**25 días**	**lun 14/07/25**	**lun 11/08/25**
113	2.6.1.2.1		Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio	$ 10,128,870	$ 10,128,870	25 días	lun 14/07/25	lun 11/08/25
114	**2.6.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 10,418,266**	**10 días**	**lun 11/08/25**	**vie 22/08/25**
115	2.6.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 10,418,266	$ 10,418,266	10 días	lun 11/08/25	vie 22/08/25
116	**2.6.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoría**	**$ 0**	**$ 1,157,586**	**14 días**	**vie 22/08/25**	**lun 8/09/25**
117	2.6.1.4.1		Entrega Volumen	$ 0	$ 0	0 días	vie 22/08/25	vie 22/08/25
118	2.6.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	vie 22/08/25	jue 28/08/25
119	2.6.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 578,793	$ 578,793	3 días	jue 28/08/25	lun 1/09/25
120	2.6.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	lun 1/09/25	jue 4/09/25
121	2.6.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 578,793	$ 578,793	3 días	jue 4/09/25	lun 8/09/25
122	2.6.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25
123	**2.7**		**Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales**	**$ 0**	**$ 28,786,726**	**80 días**	**lun 9/06/25**	**lun 8/09/25**
124	**2.7.1**		**CAQUEZA - PLACITAS**	**$ 0**	**$ 28,786,726**	**80 días**	**lun 9/06/25**	**lun 8/09/25**
125	**2.7.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 4,797,788**	**31 días**	**lun 9/06/25**	**lun 14/07/25**
126	2.7.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 4,797,788	$ 4,797,788	15 días	lun 9/06/25	mié 25/06/25
127	2.7.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	mié 25/06/25	mar 1/07/25
128	2.7.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	3 días	mar 1/07/25	vie 4/07/25
129	2.7.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	vie 4/07/25	mar 8/07/25
130	2.7.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	5 días	mar 8/07/25	lun 14/07/25
131	2.7.1.1.6		Aprobación Metodologia	$ 0	$ 0	0 días	lun 14/07/25	lun 14/07/25
132	**2.7.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 11,194,838**	**25 días**	**lun 14/07/25**	**lun 11/08/25**
133	2.7.1.2.1		Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	$ 11,194,838	$ 11,194,838	25 días	lun 14/07/25	lun 11/08/25
134	**2.7.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 11,514,690**	**10 días**	**lun 11/08/25**	**vie 22/08/25**
135	2.7.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 11,514,690	$ 11,514,690	10 días	lun 11/08/25	vie 22/08/25
136	**2.7.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoría**	**$ 0**	**$ 1,279,410**	**14 días**	**vie 22/08/25**	**lun 8/09/25**
137	2.7.1.4.1		Entrega Volumen	$ 0	$ 0	0 días	vie 22/08/25	vie 22/08/25
138	2.7.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	vie 22/08/25	jue 28/08/25
139	2.7.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 639,705	$ 639,705	3 días	jue 28/08/25	lun 1/09/25
140	2.7.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	lun 1/09/25	jue 4/09/25
141	2.7.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 639,705	$ 639,705	3 días	jue 4/09/25	lun 8/09/25
142	2.7.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25
143	**2.8**		**Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación**	**$ 0**	**$ 33,860,487**	**77 días**	**lun 9/06/25**	**jue 4/09/25**
144	**2.8.1**		**CAQUEZA - PLACITAS**	**$ 0**	**$ 33,860,487**	**77 días**	**lun 9/06/25**	**jue 4/09/25**
145	**2.8.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 5,643,415**	**31 días**	**lun 9/06/25**	**lun 14/07/25**
146	2.8.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 5,643,415	$ 5,643,415	15 días	lun 9/06/25	mié 25/06/25
147	2.8.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	mié 25/06/25	mar 1/07/25
148	2.8.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	3 días	mar 1/07/25	vie 4/07/25
149	2.8.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	vie 4/07/25	mar 8/07/25
150	2.8.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	5 días	mar 8/07/25	lun 14/07/25
151	2.8.1.1.6		Aprobación Metodologia	$ 0	$ 0	0 días	lun 14/07/25	lun 14/07/25
152	**2.8.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 13,167,967**	**7 días**	**lun 14/07/25**	**mar 22/07/25**
153	2.8.1.2.1		Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	$ 13,167,967	$ 13,167,967	7 días	lun 14/07/25	mar 22/07/25
154	**2.8.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 13,544,195**	**25 días**	**mar 22/07/25**	**mar 19/08/25**
155	2.8.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 13,544,195	$ 13,544,195	25 días	mar 22/07/25	mar 19/08/25
156	**2.8.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoría**	**$ 0**	**$ 1,504,910**	**14 días**	**mar 19/08/25**	**jue 4/09/25**
157	2.8.1.4.1		Entrega Volumen	$ 0	$ 0	0 días	mar 19/08/25	mar 19/08/25
158	2.8.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	mar 19/08/25	lun 25/08/25
159	2.8.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 752,455	$ 752,455	3 días	lun 25/08/25	jue 28/08/25
160	2.8.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	jue 28/08/25	lun 1/09/25
161	2.8.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 752,455	$ 752,455	3 días	lun 1/09/25	jue 4/09/25
162	2.8.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0	0 días	jue 4/09/25	jue 4/09/25
163	**2.9**		**Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras**	**$ 0**	**$ 27,253,754**	**92 días**	**lun 9/06/25**	**lun 22/09/25**
164	**2.9.1**		**CAQUEZA - PLACITAS**	**$ 0**	**$ 27,253,754**	**92 días**	**lun 9/06/25**	**lun 22/09/25**
165	**2.9.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 4,542,293**	**31 días**	**lun 9/06/25**	**lun 14/07/25**
166	2.9.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 4,542,293	$ 4,542,293	15 días	lun 9/06/25	mié 25/06/25
167	2.9.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	mié 25/06/25	mar 1/07/25
168	2.9.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	3 días	mar 1/07/25	vie 4/07/25

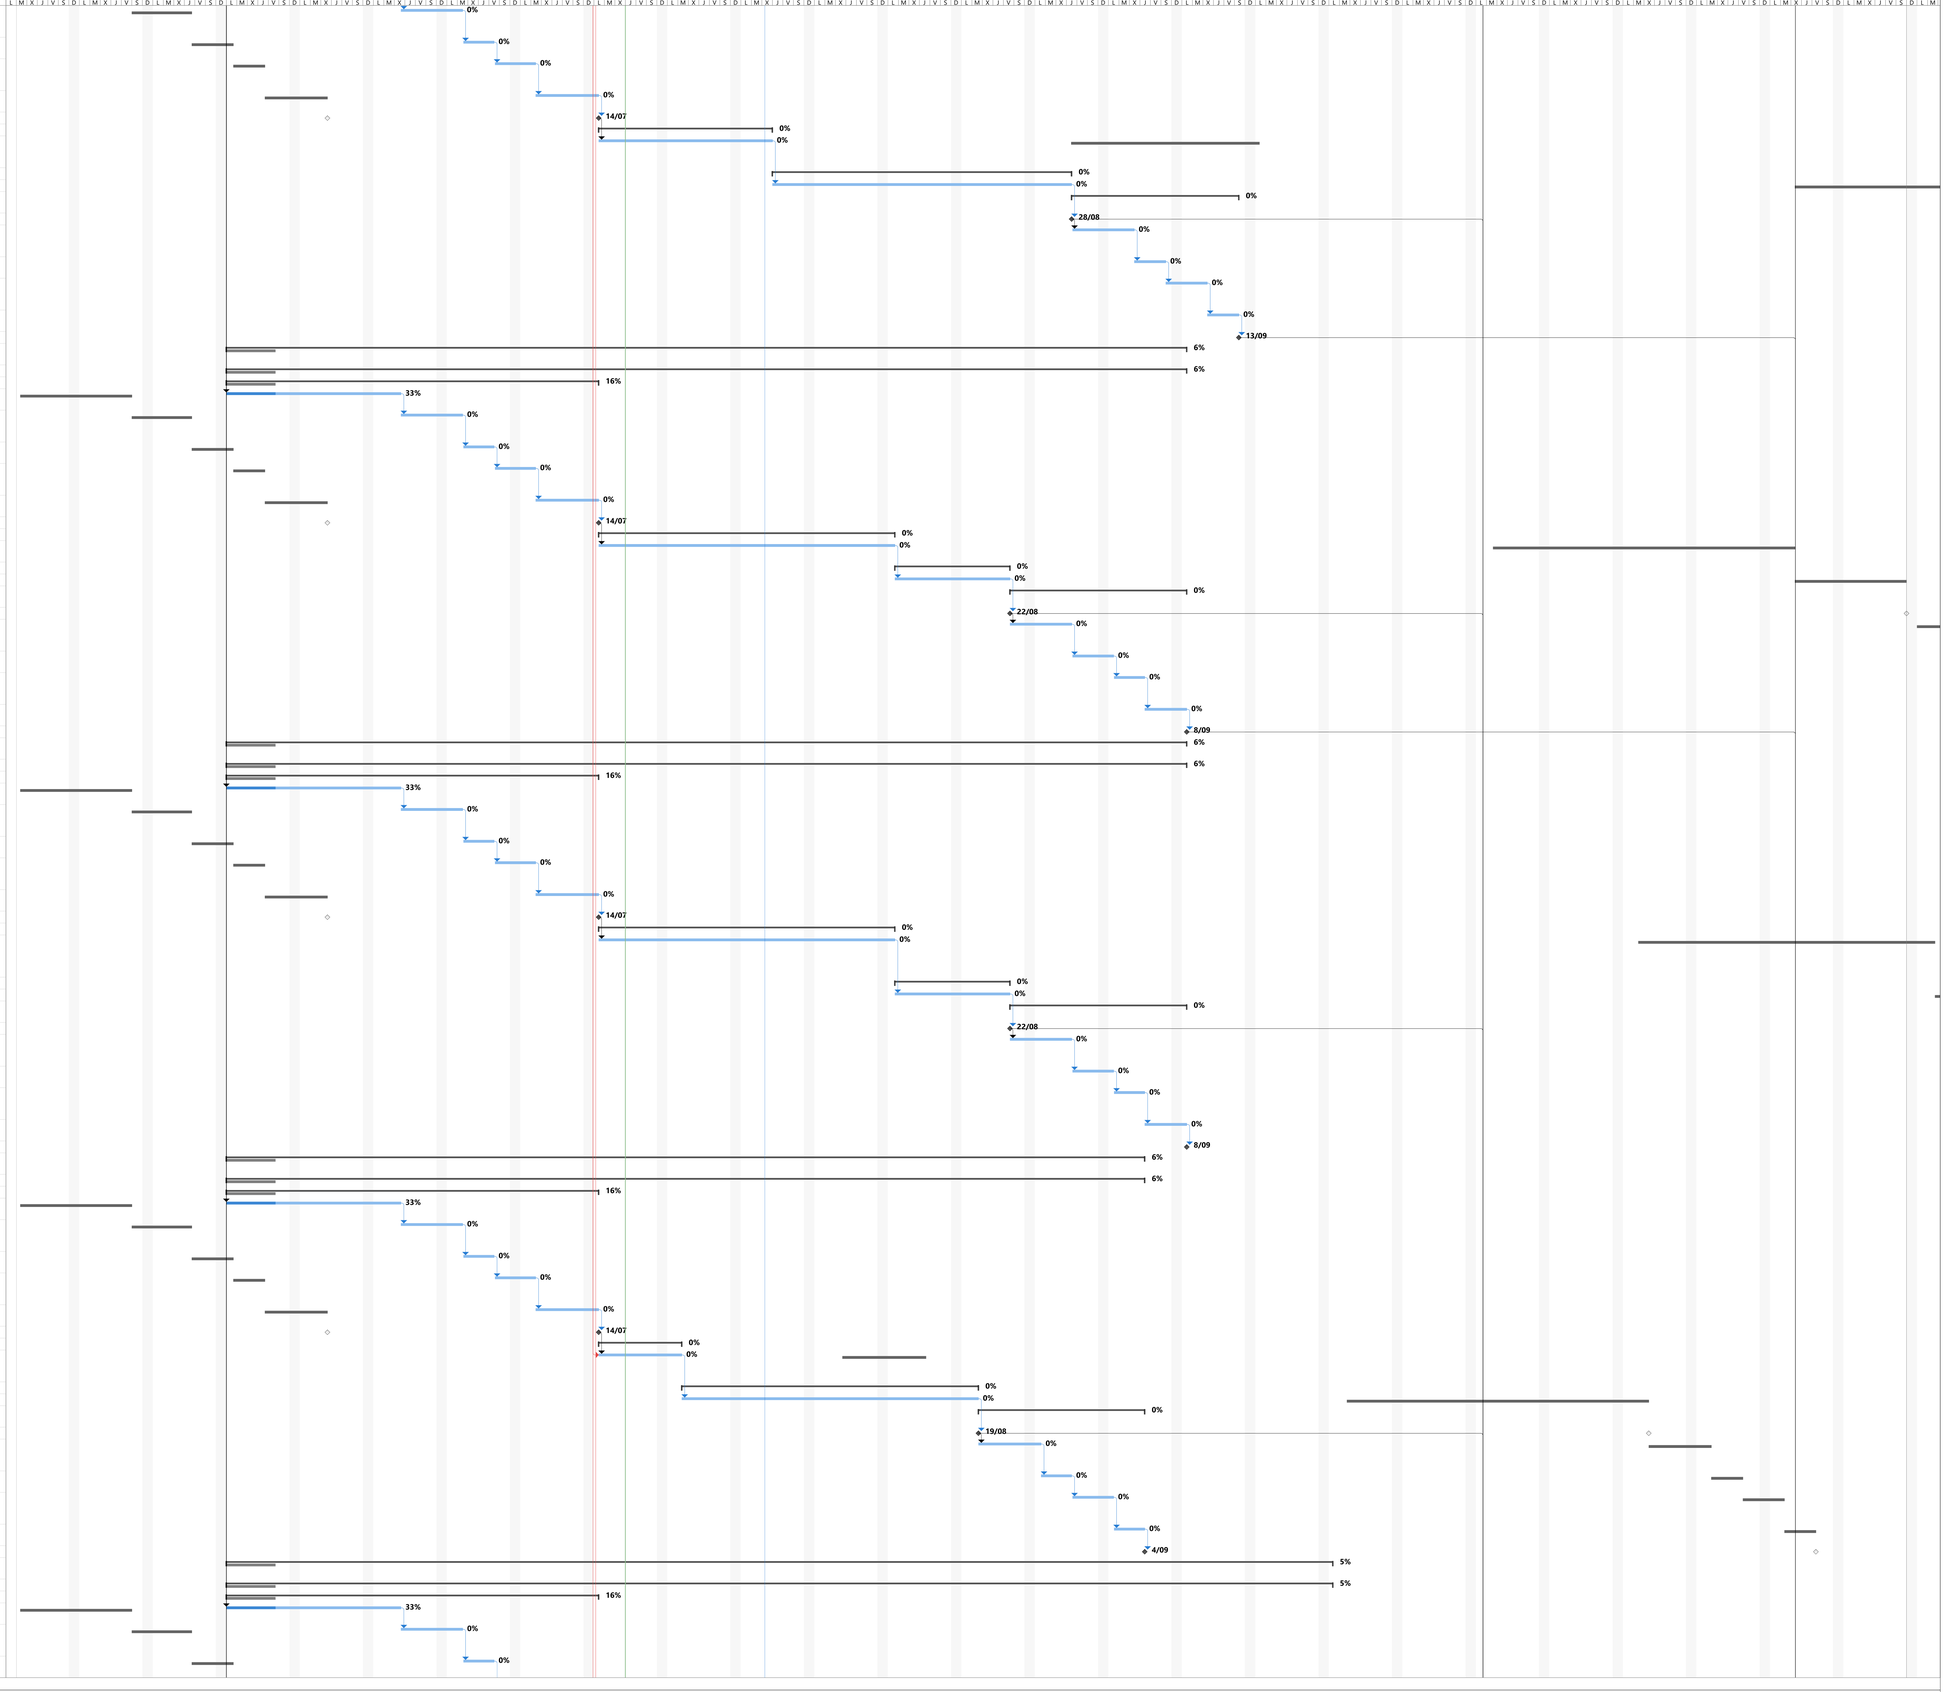

Tareas críticas | Progreso de tarea crítica | División | Tarea manual | solo fin | Línea base | Hito de línea base | Progreso del resumen | Resumen manual | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo
División crítica | Tarea | Progreso de tarea | solo el comienzo | solo duración | División de la línea base | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Fecha límite

Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo fijo	Costo	Duración	Comienzo	Fin
169	2.9.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	vie 4/07/25	mar 8/07/25
170	2.9.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	5 días	mar 8/07/25	lun 14/07/25
171	2.9.1.1.6		Aprobación Metodologia	$ 0	$ 0	0 días	lun 14/07/25	lun 14/07/25
172	**2.9.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 10,598,682**	**7 días**	**lun 14/07/25**	**mar 22/07/25**
173	2.9.1.2.1		Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	$ 10,598,682	$ 10,598,682	7 días	lun 14/07/25	mar 22/07/25
174	**2.9.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 10,901,501**	**40 días**	**mar 22/07/25**	**vie 5/09/25**
175	2.9.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 10,901,501	$ 10,901,501	40 días	mar 22/07/25	vie 5/09/25
176	**2.9.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoría**	**$ 0**	**$ 1,211,278**	**14 días**	**vie 5/09/25**	**lun 22/09/25**
177	2.9.1.4.1		Entrega Volumen	$ 0	$ 0	0 días	vie 5/09/25	vie 5/09/25
178	2.9.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	vie 5/09/25	jue 11/09/25
179	2.9.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 605,639	$ 605,639	3 días	jue 11/09/25	lun 15/09/25
180	2.9.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	lun 15/09/25	jue 18/09/25
181	2.9.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 605,639	$ 605,639	3 días	jue 18/09/25	lun 22/09/25
182	2.9.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0	0 días	lun 22/09/25	lun 22/09/25
183	**2.10**		**Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social**	**$ 0**	**$ 45,041,405**	**104 días**	**lun 9/06/25**	**sáb 4/10/25**
184	**2.10.1**		**CAQUEZA - PLACITAS**	**$ 0**	**$ 45,041,405**	**104 días**	**lun 9/06/25**	**sáb 4/10/25**
185	**2.10.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 7,506,901**	**31 días**	**lun 9/06/25**	**lun 14/07/25**
186	2.10.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 7,506,901	$ 7,506,901	15 días	lun 9/06/25	mié 25/06/25
187	2.10.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	mié 25/06/25	mar 1/07/25
188	2.10.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	3 días	mar 1/07/25	vie 4/07/25
189	2.10.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	vie 4/07/25	mar 8/07/25
190	2.10.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	5 días	mar 8/07/25	lun 14/07/25
191	2.10.1.1.6		Aprobación Metodologia	$ 0	$ 0	0 días	lun 14/07/25	lun 14/07/25
192	**2.10.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 17,516,102**	**5 días**	**mié 30/07/25**	**lun 4/08/25**
193	2.10.1.2.1		Inventario en Campo e Inventario Forestal	$ 17,516,102	$ 17,516,102	5 días	mié 30/07/25	lun 4/08/25
194	**2.10.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 18,016,562**	**40 días**	**lun 4/08/25**	**vie 19/09/25**
195	2.10.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 18,016,562	$ 18,016,562	40 días	lun 4/08/25	vie 19/09/25
196	**2.10.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoría**	**$ 0**	**$ 2,001,840**	**14 días**	**vie 19/09/25**	**sáb 4/10/25**
197	2.10.1.4.1		Entrega Volumen	$ 0	$ 0	0 días	vie 19/09/25	vie 19/09/25
198	2.10.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	vie 19/09/25	mié 24/09/25
199	2.10.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 1,000,920	$ 1,000,920	3 días	jue 25/09/25	sáb 27/09/25
200	2.10.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	lun 29/09/25	mié 1/10/25
201	2.10.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 1,000,920	$ 1,000,920	3 días	mié 1/10/25	sáb 4/10/25
202	2.10.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0	0 días	sáb 4/10/25	sáb 4/10/25
203	**2.11**		**Volumen XI. Estudio de Predial**	**$ 0**	**$ 35,892,707**	**105 días**	**lun 9/06/25**	**lun 6/10/25**
204	**2.11.1**		**CAQUEZA - PLACITAS**	**$ 0**	**$ 35,892,707**	**105 días**	**lun 9/06/25**	**lun 6/10/25**
205	**2.11.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 5,982,118**	**31 días**	**lun 9/06/25**	**lun 14/07/25**
206	2.11.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 5,982,118	$ 5,982,118	15 días	lun 9/06/25	mié 25/06/25
207	2.11.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	mié 25/06/25	mar 1/07/25
208	2.11.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	3 días	mar 1/07/25	vie 4/07/25
209	2.11.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	vie 4/07/25	mar 8/07/25
210	2.11.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	5 días	mar 8/07/25	lun 14/07/25
211	2.11.1.1.6		Aprobación Metodologia	$ 0	$ 0	0 días	lun 14/07/25	lun 14/07/25
212	**2.11.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 13,958,275**	**15 días**	**sáb 19/07/25**	**mar 5/08/25**
213	2.11.1.2.1		Inventario en Campo y Conteo Forestal	$ 13,958,275	$ 13,958,275	15 días	sáb 19/07/25	mar 5/08/25
214	**2.11.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 14,357,082**	**40 días**	**mar 5/08/25**	**sáb 20/09/25**
215	2.11.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 14,357,082	$ 14,357,082	40 días	mar 5/08/25	sáb 20/09/25
216	**2.11.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoría**	**$ 0**	**$ 1,595,232**	**14 días**	**sáb 20/09/25**	**lun 6/10/25**
217	2.11.1.4.1		Entrega Volumen	$ 0	$ 0	0 días	sáb 20/09/25	sáb 20/09/25
218	2.11.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	sáb 20/09/25	jue 25/09/25
219	2.11.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 797,616	$ 797,616	3 días	vie 26/09/25	lun 29/09/25
220	2.11.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	lun 29/09/25	jue 2/10/25
221	2.11.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 797,616	$ 797,616	3 días	jue 2/10/25	lun 6/10/25
222	2.11.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0	0 días	lun 6/10/25	lun 6/10/25
223	**2.12**		**Volumen XII. Estudio de Presupuestos**	**$ 0**	**$ 22,169,662**	**96 días**	**lun 9/06/25**	**jue 25/09/25**
224	**2.12.1**		**CAQUEZA - PLACITAS**	**$ 0**	**$ 22,169,662**	**96 días**	**lun 9/06/25**	**jue 25/09/25**
225	**2.12.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 3,694,944**	**31 días**	**lun 9/06/25**	**lun 14/07/25**
226	2.12.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 3,694,944	$ 3,694,944	15 días	lun 9/06/25	mié 25/06/25
227	2.12.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	mié 25/06/25	mar 1/07/25
228	2.12.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	3 días	mar 1/07/25	vie 4/07/25
229	2.12.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	vie 4/07/25	mar 8/07/25
230	2.12.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	5 días	mar 8/07/25	lun 14/07/25
231	2.12.1.1.6		Aprobación Metodologia	$ 0	$ 0	0 días	lun 14/07/25	lun 14/07/25
232	**2.12.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 8,621,535**	**7 días**	**lun 14/07/25**	**mar 22/07/25**
233	2.12.1.2.1		Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios)	$ 8,621,535	$ 8,621,535	7 días	lun 14/07/25	mar 22/07/25
234	**2.12.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 8,867,865**	**45 días**	**mar 22/07/25**	**jue 11/09/25**
235	2.12.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 8,867,865	$ 8,867,865	45 días	mar 22/07/25	jue 11/09/25
236	**2.12.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoría**	**$ 0**	**$ 985,318**	**13 días**	**jue 11/09/25**	**jue 25/09/25**
237	2.12.1.4.1		Entrega Volumen	$ 0	$ 0	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
238	2.12.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	5 días	jue 11/09/25	mié 17/09/25
239	2.12.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 492,659	$ 492,659	3 días	mié 17/09/25	sáb 20/09/25
240	2.12.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	sáb 20/09/25	mar 23/09/25
241	2.12.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 492,659	$ 492,659	2 días	mié 24/09/25	jue 25/09/25
242	2.12.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0	0 días	jue 25/09/25	jue 25/09/25
243	**2.13**		**Volumen XIII. Informe Final Ejecutivo**	**$ 0**	**$ 0**	**26 días**	**lun 6/10/25**	**mié 5/11/25**
244	2.13.1		Elaboración Informe Final	$ 0	$ 0	20 días	lun 6/10/25	mié 29/10/25
245	2.13.2		Entrega Informe Final	$ 0	$ 0	0 días	mié 29/10/25	mié 29/10/25
246	2.13.3		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	$ 0	$ 0	3 días	mié 29/10/25	sáb 1/11/25
247	2.13.4		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0	3 días	sáb 1/11/25	mié 5/11/25
248	2.13.5		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0	0 días	mié 5/11/25	mié 5/11/25
249	2.14		Acta de Recibo Final	$ 48,035,653	$ 48,035,653	9 días	mié 5/11/25	sáb 15/11/25

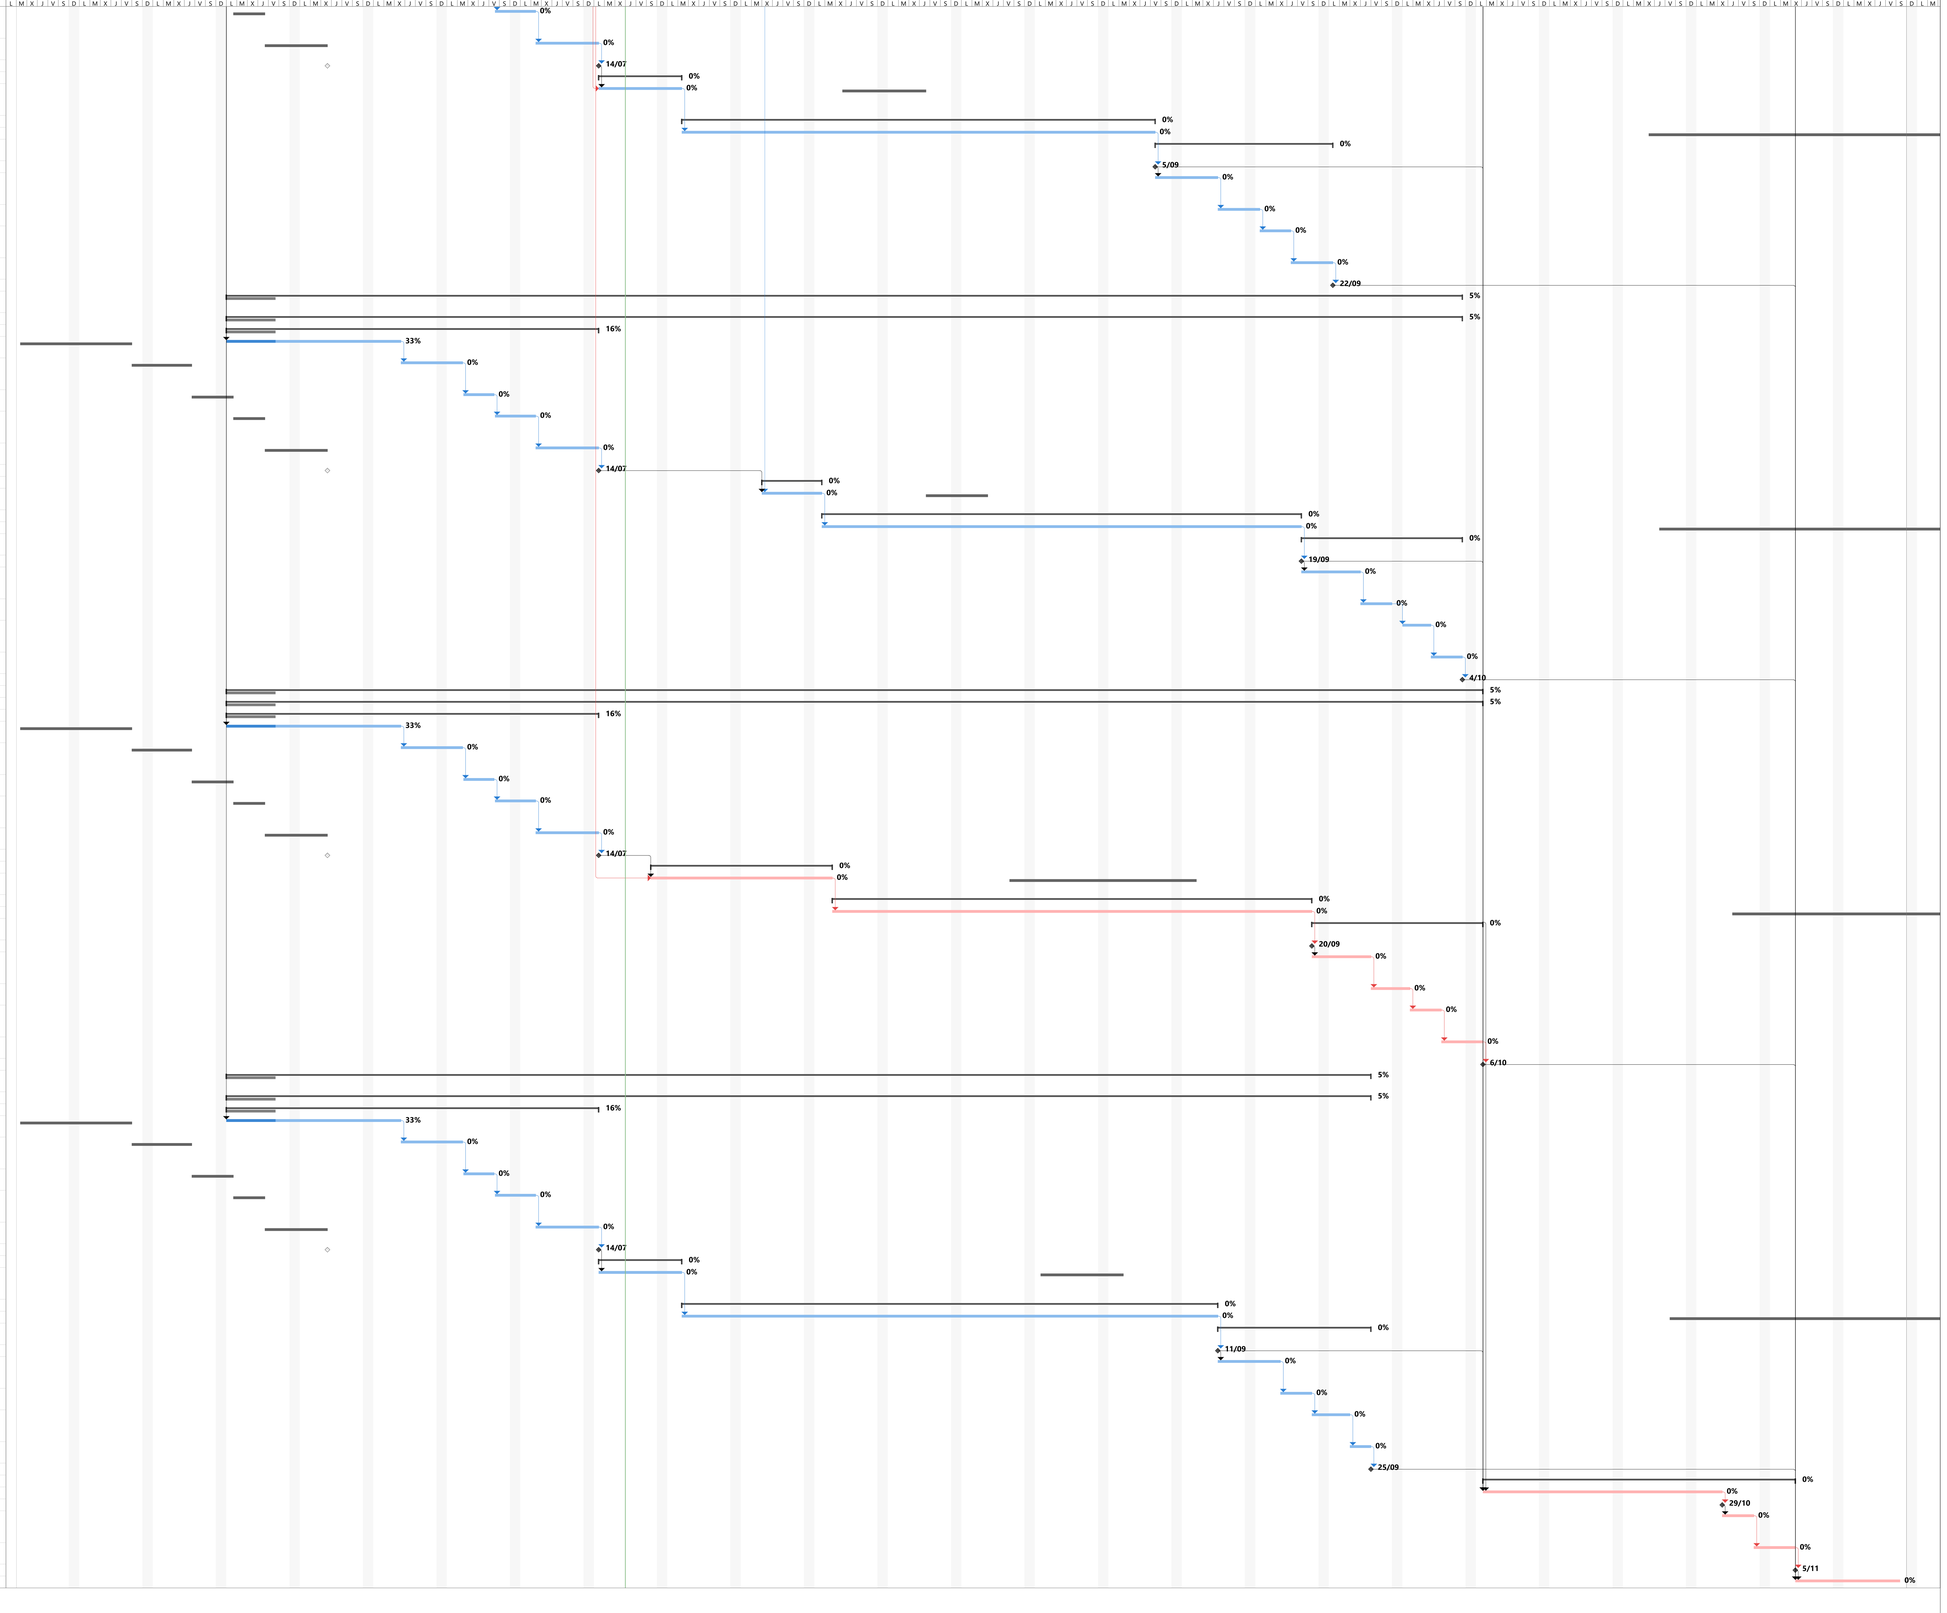


Tareas criticas | Progreso de tarea crítica | División | Tarea manual | solo fin | Línea base | Hito de línea base | Progreso del resumen | Resumen manual | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo
División crítica | Tarea | Progreso de tarea | solo el comienzo | solo duración | División de la línea base | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Fecha límite

Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo fijo	Costo	Duración	Comienzo
0	**0**		**ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO - ICCU MADRID - PUENTE PIEDRA**	**$ 0**	**$ 1,173,754,106**	**197.75 días**	**mar 20/05/25**
1	1		ACTA DE INICIO	$ 0	$ 0	0 días	mar 20/05/25
2	**2**		**ESTUDIOS Y DISEÑOS - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN**	**$ 0**	**$ 1,173,754,106**	**183 días**	**mar 20/05/25**
3	**2.1**		**Volumen I. Estudio de Transito**	**$ 0**	**$ 64,090,254**	**94 días**	**lun 9/06/25**
4	**2.1.1**		**MADRID - PUENTE PIEDRA**	**$ 0**	**$ 64,090,254**	**94 días**	**lun 9/06/25**
5	**2.1.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 10,681,709**	**31 días**	**lun 9/06/25**
6	2.1.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 10,681,709	$ 10,681,709	15 días	lun 9/06/25
7	2.1.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	5 días	mié 25/06/25
8	2.1.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0	$ 0	3 días	mar 1/07/25
9	2.1.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	3 días	vie 4/07/25
10	2.1.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0	$ 0	5 días	mar 8/07/25
11	2.1.1.1.6		Aprobación Metodologia	$ 0	$ 0	0 días	lun 14/07/25
12	**2.1.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 24,923,988**	**28 días**	**lun 14/07/25**
13	2.1.1.2.1		Programación Trabajos de Campo	$ 0	$ 0	12 días	lun 14/07/25
14	2.1.1.2.2		Aforos de Trafico	$ 24,923,988	$ 24,923,988	10 días	lun 4/08/25
15	**2.1.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 25,636,101**	**20 días**	**vie 15/08/25**
16	2.1.1.3.1		Desarrollo Volumen I	$ 25,636,101	$ 25,636,101	20 días	vie 15/08/25
17	**2.1.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoria**	**$ 0**	**$ 2,848,456**	**14 días**	**lun 8/09/25**
18	2.1.1.4.1		Entrega Volumen Madrid	$ 0	$ 0	0 días	lun 8/09/25
19	2.1.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	5 días	lun 8/09/25
20	2.1.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 1,424,228	$ 1,424,228	3 días	sáb 13/09/25
21	2.1.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	3 días	mié 17/09/25
22	2.1.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 1,424,228	$ 1,424,228	3 días	sáb 20/09/25
23	2.1.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0	0 días	mar 23/09/25
24	**2.2**		**Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT**	**$ 0**	**$ 224,692,660**	**118 días**	**lun 9/06/25**
25	**2.2.1**		**MADRID - PUENTE PIEDRA**	**$ 0**	**$ 224,692,660**	**118 días**	**lun 9/06/25**
26	**2.2.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 37,448,777**	**31 días**	**lun 9/06/25**
27	2.2.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 37,448,777	$ 37,448,777	15 días	lun 9/06/25
28	2.2.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	5 días	mié 25/06/25
29	2.2.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0	$ 0	3 días	mar 1/07/25
30	2.2.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	3 días	vie 4/07/25
31	2.2.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0	$ 0	5 días	mar 8/07/25
32	2.2.1.1.6		Aprobación Metodologia	$ 0	$ 0	0 días	lun 14/07/25
33	**2.2.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 87,380,478**	**28 días**	**lun 14/07/25**
34	2.2.1.2.1		Programacion de trabajos de Campo	$ 0	$ 0	12 días	lun 14/07/25
35	2.2.1.2.2		Visitas de campo KO	$ 0	$ 0	3 días	lun 28/07/25
36	2.2.1.2.3		Topografia y Red Geodesica	$ 87,380,478	$ 87,380,478	10 días	lun 4/08/25
37	**2.2.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 89,877,065**	**45 días**	**jue 14/08/25**
38	2.2.1.3.1		Desarrollo Volumen I	$ 89,877,065	$ 89,877,065	45 días	jue 14/08/25
39	**2.2.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoria**	**$ 0**	**$ 9,986,340**	**14 días**	**sáb 4/10/25**
40	2.2.1.4.1		Entrega Volumen Madrid	$ 0	$ 0	0 días	sáb 4/10/25
41	2.2.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	5 días	sáb 4/10/25
42	2.2.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 4,993,170	$ 4,993,170	3 días	vie 10/10/25
43	2.2.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	3 días	mar 14/10/25
44	2.2.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 4,993,170	$ 4,993,170	3 días	vie 17/10/25
45	2.2.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0	0 días	mar 21/10/25
46	**2.3**		**Volumen III. Geología para Ingeniería**	**$ 0**	**$ 37,448,926**	**94 días**	**lun 9/06/25**
47	**2.3.1**		**MADRID - PUENTE PIEDRA**	**$ 0**	**$ 37,448,926**	**94 días**	**lun 9/06/25**
48	**2.3.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 6,241,488**	**31 días**	**lun 9/06/25**
49	2.3.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 6,241,488	$ 6,241,488	15 días	lun 9/06/25
50	2.3.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	5 días	mié 25/06/25
51	2.3.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0	$ 0	3 días	mar 1/07/25
52	2.3.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	3 días	vie 4/07/25
53	2.3.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0	$ 0	5 días	mar 8/07/25
54	2.3.1.1.6		Aprobación Metodologia	$ 0	$ 0	0 días	lun 14/07/25
55	**2.3.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 14,563,471**	**29 días**	**lun 14/07/25**
56	2.3.1.2.1		Programacion de trabajos de campo	$ 0	$ 0	12 días	lun 14/07/25
57	2.3.1.2.2		Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos geológicos	$ 14,563,471	$ 14,563,471	7 días	jue 7/08/25
58	**2.3.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 14,979,571**	**20 días**	**vie 15/08/25**
59	2.3.1.3.1		Desarrollo Volumen I	$ 14,979,571	$ 14,979,571	20 días	vie 15/08/25
60	**2.3.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoria**	**$ 0**	**$ 1,664,396**	**14 días**	**lun 8/09/25**
61	2.3.1.4.1		Entrega Volumen Madrid	$ 0	$ 0	0 días	lun 8/09/25
62	2.3.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	5 días	lun 8/09/25
63	2.3.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 832,198	$ 832,198	3 días	sáb 13/09/25
64	2.3.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	3 días	mié 17/09/25
65	2.3.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 832,198	$ 832,198	3 días	sáb 20/09/25
66	2.3.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0	0 días	mar 23/09/25
67	**2.4**		**Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención**	**$ 0**	**$ 284,183,873**	**117 días**	**lun 9/06/25**
68	**2.4.1**		**MADRID - PUENTE PIEDRA**	**$ 0**	**$ 284,183,873**	**117 días**	**lun 9/06/25**
69	**2.4.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 47,363,979**	**31 días**	**lun 9/06/25**
70	2.4.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 47,363,979	$ 47,363,979	15 días	lun 9/06/25
71	2.4.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	5 días	mié 25/06/25
72	2.4.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0	$ 0	3 días	mar 1/07/25
73	2.4.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	3 días	vie 4/07/25
74	2.4.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0	$ 0	5 días	mar 8/07/25
75	2.4.1.1.6		Aprobación Metodologia	$ 0	$ 0	0 días	lun 14/07/25
76	**2.4.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 110,515,951**	**52 días**	**lun 14/07/25**
77	2.4.1.2.1		Programacion Trabajos de Campo	$ 0	$ 0	12 días	lun 14/07/25
78	2.4.1.2.2		Campaña Geotecnica	$ 110,515,951	$ 110,515,951	30 días	jue 7/08/25
79	**2.4.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 113,673,549**	**20 días**	**jue 11/09/25**
80	2.4.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 113,673,549	$ 113,673,549	20 días	jue 11/09/25
81	**2.4.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoria**	**$ 0**	**$ 12,630,394**	**14 días**	**vie 3/10/25**
82	2.4.1.4.1		Entrega Volumen Madrid	$ 0	$ 0	0 días	vie 3/10/25
83	2.4.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	5 días	vie 3/10/25
84	2.4.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 6,315,197	$ 6,315,197	3 días	jue 9/10/25
85	2.4.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	3 días	lun 13/10/25
86	2.4.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 6,315,197	$ 6,315,197	3 días	jue 16/10/25
87	2.4.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0	0 días	lun 20/10/25
88	**2.5**		**Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes**	**$ 0**	**$ 37,448,926**	**127 días**	**lun 9/06/25**
89	**2.5.1**		**MADRID - PUENTE PIEDRA**	**$ 0**	**$ 37,448,926**	**127 días**	**lun 9/06/25**
90	**2.5.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 6,241,488**	**31 días**	**lun 9/06/25**
91	2.5.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 6,241,488	$ 6,241,488	15 días	lun 9/06/25
92	2.5.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	5 días	mié 25/06/25
93	2.5.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0	$ 0	3 días	mar 1/07/25
94	2.5.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	3 días	vie 4/07/25
95	2.5.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0	$ 0	5 días	mar 8/07/25
96	2.5.1.1.6		Aprobación Metodologia	$ 0	$ 0	0 días	lun 14/07/25
97	**2.5.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 14,563,471**	**42 días**	**lun 14/07/25**
98	2.5.1.2.1		Programacion de trabajos de campo	$ 0	$ 0	12 días	lun 14/07/25
99	2.5.1.2.2		Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio	$ 14,563,471	$ 14,563,471	20 días	jue 7/08/25
100	**2.5.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 14,979,571**	**40 días**	**sáb 30/08/25**
101	2.5.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 14,979,571	$ 14,979,571	40 días	sáb 30/08/25
102	**2.5.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoria**	**$ 0**	**$ 1,664,396**	**14 días**	**mié 15/10/25**
103	2.5.1.4.1		Entrega Volumen Madrid	$ 0	$ 0	0 días	mié 15/10/25
104	2.5.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	5 días	mié 15/10/25
105	2.5.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 832,198	$ 832,198	3 días	mar 21/10/25
106	2.5.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	3 días	vie 24/10/25
107	2.5.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 832,198	$ 832,198	3 días	mar 28/10/25
108	2.5.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0	0 días	vie 31/10/25
109	**2.6**		**Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento**	**$ 0**	**$ 55,683,504**	**117 días**	**lun 9/06/25**
110	**2.6.1**		**MADRID - PUENTE PIEDRA**	**$ 0**	**$ 55,683,504**	**117 días**	**lun 9/06/25**
111	**2.6.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 9,280,584**	**31 días**	**lun 9/06/25**
112	2.6.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 9,280,584	$ 9,280,584	15 días	lun 9/06/25
113	2.6.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	5 días	mié 25/06/25
114	2.6.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0	$ 0	3 días	mar 1/07/25
115	2.6.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	3 días	vie 4/07/25
116	2.6.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 0	$ 0	5 días	mar 8/07/25
117	2.6.1.1.6		Aprobación Metodologia	$ 0	$ 0	0 días	lun 14/07/25
118	**2.6.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 21,654,696**	**57 días**	**lun 14/07/25**
119	2.6.1.2.1		Programación trabajos de campo	$ 0	$ 0	12 días	lun 14/07/25
120	2.6.1.2.2		Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio	$ 21,654,696	$ 21,654,696	40 días	sáb 2/08/25
121	**2.6.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 22,273,402**	**15 días**	**mié 17/09/25**
122	2.6.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 22,273,402	$ 22,273,402	15 días	mié 17/09/25
123	**2.6.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoria**	**$ 0**	**$ 2,474,822**	**14 días**	**vie 3/10/25**
124	2.6.1.4.1		Entrega Volumen Madrid	$ 0	$ 0	0 días	vie 3/10/25
125	2.6.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	5 días	vie 3/10/25
126	2.6.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 1,237,411	$ 1,237,411	3 días	jue 9/10/25
127	2.6.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0	3 días	lun 13/10/25
128	2.6.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoria	$ 1,237,411	$ 1,237,411	3 días	jue 16/10/25
129	2.6.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0	0 días	lun 20/10/25

Tareas críticas · División crítica · Tarea · Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · División · Tarea manual · solo el comienzo · solo fin · solo duración · Línea base · División de la línea base · Hito de línea base · Hito · Progreso del resumen · Resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Fecha límite

Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo fijo	Costo	Duración	Comienzo
130	**2.7**		**Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales**	**$ 0**	**$ 42,794,923 129 días**		**lun 9/06/25**
131	**2.7.1**		**MADRID - PUENTE PIEDRA**	**$ 0**	**$ 42,794,923 129 días**		**lun 9/06/25**
132	**2.7.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 7,132,487 31 días**		**lun 9/06/25**
133	2.7.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 7,132,487	$ 7,132,487 15 días		lun 9/06/25
134	2.7.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 5 días		mié 25/06/25
135	2.7.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0 3 días		mar 1/07/25
136	2.7.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 3 días		vie 4/07/25
137	2.7.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0 5 días		mar 8/07/25
138	2.7.1.1.6		Aprobación Metodología	$ 0	$ 0 0 días		lun 14/07/25
139	**2.7.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 16,642,470 49 días**		**mar 5/08/25**
140	2.7.1.2.1		Prograrmacion Trabajos de Campo	$ 0	$ 0 5 días		mar 5/08/25
141	2.7.1.2.2		Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	$ 16,642,470	$ 16,642,470 40 días		vie 15/08/25
142	**2.7.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 17,117,970 15 días**		**mar 30/09/25**
143	2.7.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 17,117,970	$ 17,117,970 15 días		mar 30/09/25
144	**2.7.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoria**	**$ 0**	**$ 1,901,996 14 días**		**vie 17/10/25**
145	2.7.1.4.1		Entrega Volumen Madrid	$ 0	$ 0 0 días		vie 17/10/25
146	2.7.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 5 días		vie 17/10/25
147	2.7.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 950,998	$ 950,998 3 días		jue 23/10/25
148	2.7.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 3 días		lun 27/10/25
149	2.7.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 950,998	$ 950,998 3 días		jue 30/10/25
150	2.7.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0 0 días		lun 3/11/25
151	**2.8**		**Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación**	**$ 0**	**$ 55,683,504 110 días**		**lun 9/06/25**
152	**2.8.1**		**MADRID - PUENTE PIEDRA**	**$ 0**	**$ 55,683,504 110 días**		**lun 9/06/25**
153	**2.8.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 9,280,584 31 días**		**lun 9/06/25**
154	2.8.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 9,280,584	$ 9,280,584 15 días		lun 9/06/25
155	2.8.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 5 días		mié 25/06/25
156	2.8.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0 3 días		mar 1/07/25
157	2.8.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 3 días		vie 4/07/25
158	2.8.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0 5 días		mar 8/07/25
159	2.8.1.1.6		Aprobación Metodología	$ 0	$ 0 0 días		lun 14/07/25
160	**2.8.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 21,654,696 7 días**		**lun 4/08/25**
161	2.8.1.2.1		Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	$ 21,654,696	$ 21,654,696 7 días		lun 4/08/25
162	**2.8.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 22,273,402 40 días**		**lun 11/08/25**
163	2.8.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 22,273,402	$ 22,273,402 40 días		lun 11/08/25
164	**2.8.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoria**	**$ 0**	**$ 2,474,822 14 días**		**jue 25/09/25**
165	2.8.1.4.1		Entrega Volumen Madrid	$ 0	$ 0 0 días		jue 25/09/25
166	2.8.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 5 días		vie 26/09/25
167	2.8.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 1,237,411	$ 1,237,411 3 días		mié 1/10/25
168	2.8.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 3 días		sáb 4/10/25
169	2.8.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 1,237,411	$ 1,237,411 3 días		mié 8/10/25
170	2.8.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0 0 días		sáb 11/10/25
171	**2.9**		**Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras**	**$ 0**	**$ 49,567,558 120 días**		**lun 9/06/25**
172	**2.9.1**		**MADRID - PUENTE PIEDRA**	**$ 0**	**$ 49,567,558 120 días**		**lun 9/06/25**
173	**2.9.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 8,261,260 31 días**		**lun 9/06/25**
174	2.9.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 8,261,260	$ 8,261,260 15 días		lun 9/06/25
175	2.9.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 5 días		mié 25/06/25
176	2.9.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0 3 días		mar 1/07/25
177	2.9.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 3 días		vie 4/07/25
178	2.9.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0 5 días		mar 8/07/25
179	2.9.1.1.6		Aprobación Metodología	$ 0	$ 0 0 días		lun 14/07/25
180	**2.9.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 19,276,272 7 días**		**lun 4/08/25**
181	2.9.1.2.1		Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	$ 19,276,272	$ 19,276,272 7 días		lun 4/08/25
182	**2.9.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 19,827,024 50 días**		**lun 11/08/25**
183	2.9.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 19,827,024	$ 19,827,024 50 días		lun 11/08/25
184	**2.9.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoria**	**$ 0**	**$ 2,203,002 14 días**		**mar 7/10/25**
185	2.9.1.4.1		Entrega Volumen Madrid	$ 0	$ 0 0 días		mar 7/10/25
186	2.9.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 5 días		mar 7/10/25
187	2.9.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 1,101,501	$ 1,101,501 3 días		lun 13/10/25
188	2.9.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 3 días		jue 16/10/25
189	2.9.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 1,101,501	$ 1,101,501 3 días		lun 20/10/25
190	2.9.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0 0 días		jue 23/10/25
191	**2.10**		**Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social**	**$ 0**	**$ 104,602,178 126 días**		**lun 9/06/25**
192	**2.10.1**		**MADRID - PUENTE PIEDRA**	**$ 0**	**$ 104,602,178 126 días**		**lun 9/06/25**
193	**2.10.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 17,433,696 31 días**		**lun 9/06/25**
194	2.10.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 17,433,696	$ 17,433,696 15 días		lun 9/06/25
195	2.10.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 5 días		mié 25/06/25
196	2.10.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0 3 días		mar 1/07/25
197	2.10.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 3 días		vie 4/07/25
198	2.10.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0 5 días		mar 8/07/25
199	2.10.1.1.6		Aprobación Metodología	$ 0	$ 0 0 días		lun 14/07/25
200	**2.10.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 40,678,625 7 días**		**vie 15/08/25**
201	2.10.1.2.1		Inventario en Campo e Inventario Forestal	$ 40,678,625	$ 40,678,625 7 días		vie 15/08/25
202	**2.10.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 41,840,871 45 días**		**sáb 23/08/25**
203	2.10.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 41,840,871	$ 41,840,871 45 días		sáb 23/08/25
204	**2.10.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoria**	**$ 0**	**$ 4,648,986 14 días**		**mar 14/10/25**
205	2.10.1.4.1		Entrega Volumen Madrid	$ 0	$ 0 0 días		mar 14/10/25
206	2.10.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 5 días		mar 14/10/25
207	2.10.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 2,324,493	$ 2,324,493 3 días		lun 20/10/25
208	2.10.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 3 días		jue 23/10/25
209	2.10.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 2,324,493	$ 2,324,493 3 días		lun 27/10/25
210	2.10.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0 0 días		jue 30/10/25
211	**2.11**		**Volumen XI. Estudio de Predial**	**$ 0**	**$ 64,957,827 137 días**		**lun 9/06/25**
212	**2.11.1**		**MADRID - PUENTE PIEDRA**	**$ 0**	**$ 64,957,827 137 días**		**lun 9/06/25**
213	**2.11.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 10,826,305 31 días**		**lun 9/06/25**
214	2.11.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 10,826,305	$ 10,826,305 15 días		lun 9/06/25
215	2.11.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 5 días		mié 25/06/25
216	2.11.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0 3 días		mar 1/07/25
217	2.11.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 3 días		vie 4/07/25
218	2.11.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0 5 días		mar 8/07/25
219	2.11.1.1.6		Aprobación Metodología	$ 0	$ 0 0 días		lun 14/07/25
220	**2.11.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 25,261,377 14 días**		**vie 8/08/25**
221	2.11.1.2.1		Levantamiento Topografico y Visita de Inspección Predio a Predio	$ 25,261,377	$ 25,261,377 14 días		vie 8/08/25
222	**2.11.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 25,983,131 55 días**		**lun 25/08/25**
223	2.11.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 25,983,131	$ 25,983,131 55 días		lun 25/08/25
224	**2.11.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoria**	**$ 0**	**$ 2,887,014 14 días**		**lun 27/10/25**
225	2.11.1.4.1		Entrega Volumen Madrid	$ 0	$ 0 0 días		lun 27/10/25
226	2.11.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 5 días		lun 27/10/25
227	2.11.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 1,443,507	$ 1,443,507 3 días		sáb 1/11/25
228	2.11.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 3 días		mié 5/11/25
229	2.11.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 1,443,507	$ 1,443,507 3 días		sáb 8/11/25
230	2.11.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0 0 días		mié 12/11/25
231	**2.12**		**Volumen XII. Estudio de Presupuestos**	**$ 0**	**$ 35,224,563 132 días**		**lun 9/06/25**
232	**2.12.1**		**MADRID - PUENTE PIEDRA**	**$ 0**	**$ 35,224,563 132 días**		**lun 9/06/25**
233	**2.12.1.1**		**Metodología y Plan de Campo**	**$ 0**	**$ 5,870,761 31 días**		**lun 9/06/25**
234	2.12.1.1.1		Desarrollo Metodología de Trabajo y Plan de Campo	$ 5,870,761	$ 5,870,761 15 días		lun 9/06/25
235	2.12.1.1.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 5 días		mié 25/06/25
236	2.12.1.1.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0 3 días		mar 1/07/25
237	2.12.1.1.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 3 días		vie 4/07/25
238	2.12.1.1.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0 5 días		mar 8/07/25
239	2.12.1.1.6		Aprobación Metodología	$ 0	$ 0 0 días		lun 14/07/25
240	**2.12.1.2**		**TRABAJOS DE CAMPO**	**$ 0**	**$ 13,698,442 7 días**		**lun 11/08/25**
241	2.12.1.2.1		Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios)	$ 13,698,442	$ 13,698,442 7 días		lun 11/08/25
242	**2.12.1.3**		**Elaboración Volumen**	**$ 0**	**$ 14,089,826 55 días**		**mar 19/08/25**
243	2.12.1.3.1		Desarrollo Volumen	$ 14,089,826	$ 14,089,826 55 días		mar 19/08/25
244	**2.12.1.4**		**Entrega y Revisión de Interventoria**	**$ 0**	**$ 1,565,534 14 días**		**mar 21/10/25**
245	2.12.1.4.1		Entrega Volumen Madrid	$ 0	$ 0 0 días		mar 21/10/25
246	2.12.1.4.2		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 5 días		mar 21/10/25
247	2.12.1.4.3		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 782,767	$ 782,767 3 días		lun 27/10/25
248	2.12.1.4.4		Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 3 días		jue 30/10/25
249	2.12.1.4.5		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 782,767	$ 782,767 3 días		lun 3/11/25
250	2.12.1.4.6		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0 0 días		jue 6/11/25
251	**2.13**		**Volumen XIII. Informe Final Ejecutivo**	**$ 0**	**$ 0 28 días**		**mié 12/11/25**
252	2.13.1		Elaboración Informe Final	$ 0	$ 0 20 días		mié 12/11/25
253	2.13.2		Entrega Informe Final	$ 0	$ 0 0 días		vie 5/12/25
254	2.13.3		Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoria	$ 0	$ 0 3 días		mar 9/12/25
255	2.13.4		Atención de Observaciones - Consultoría	$ 0	$ 0 3 días		jue 11/12/25
256	2.13.5		Aprobación Volumen	$ 0	$ 0 0 días		lun 15/12/25
257	2.14		Acta de Recibo Final	$ 117,375,410	$ 117,375,410 9 días		lun 22/12/25

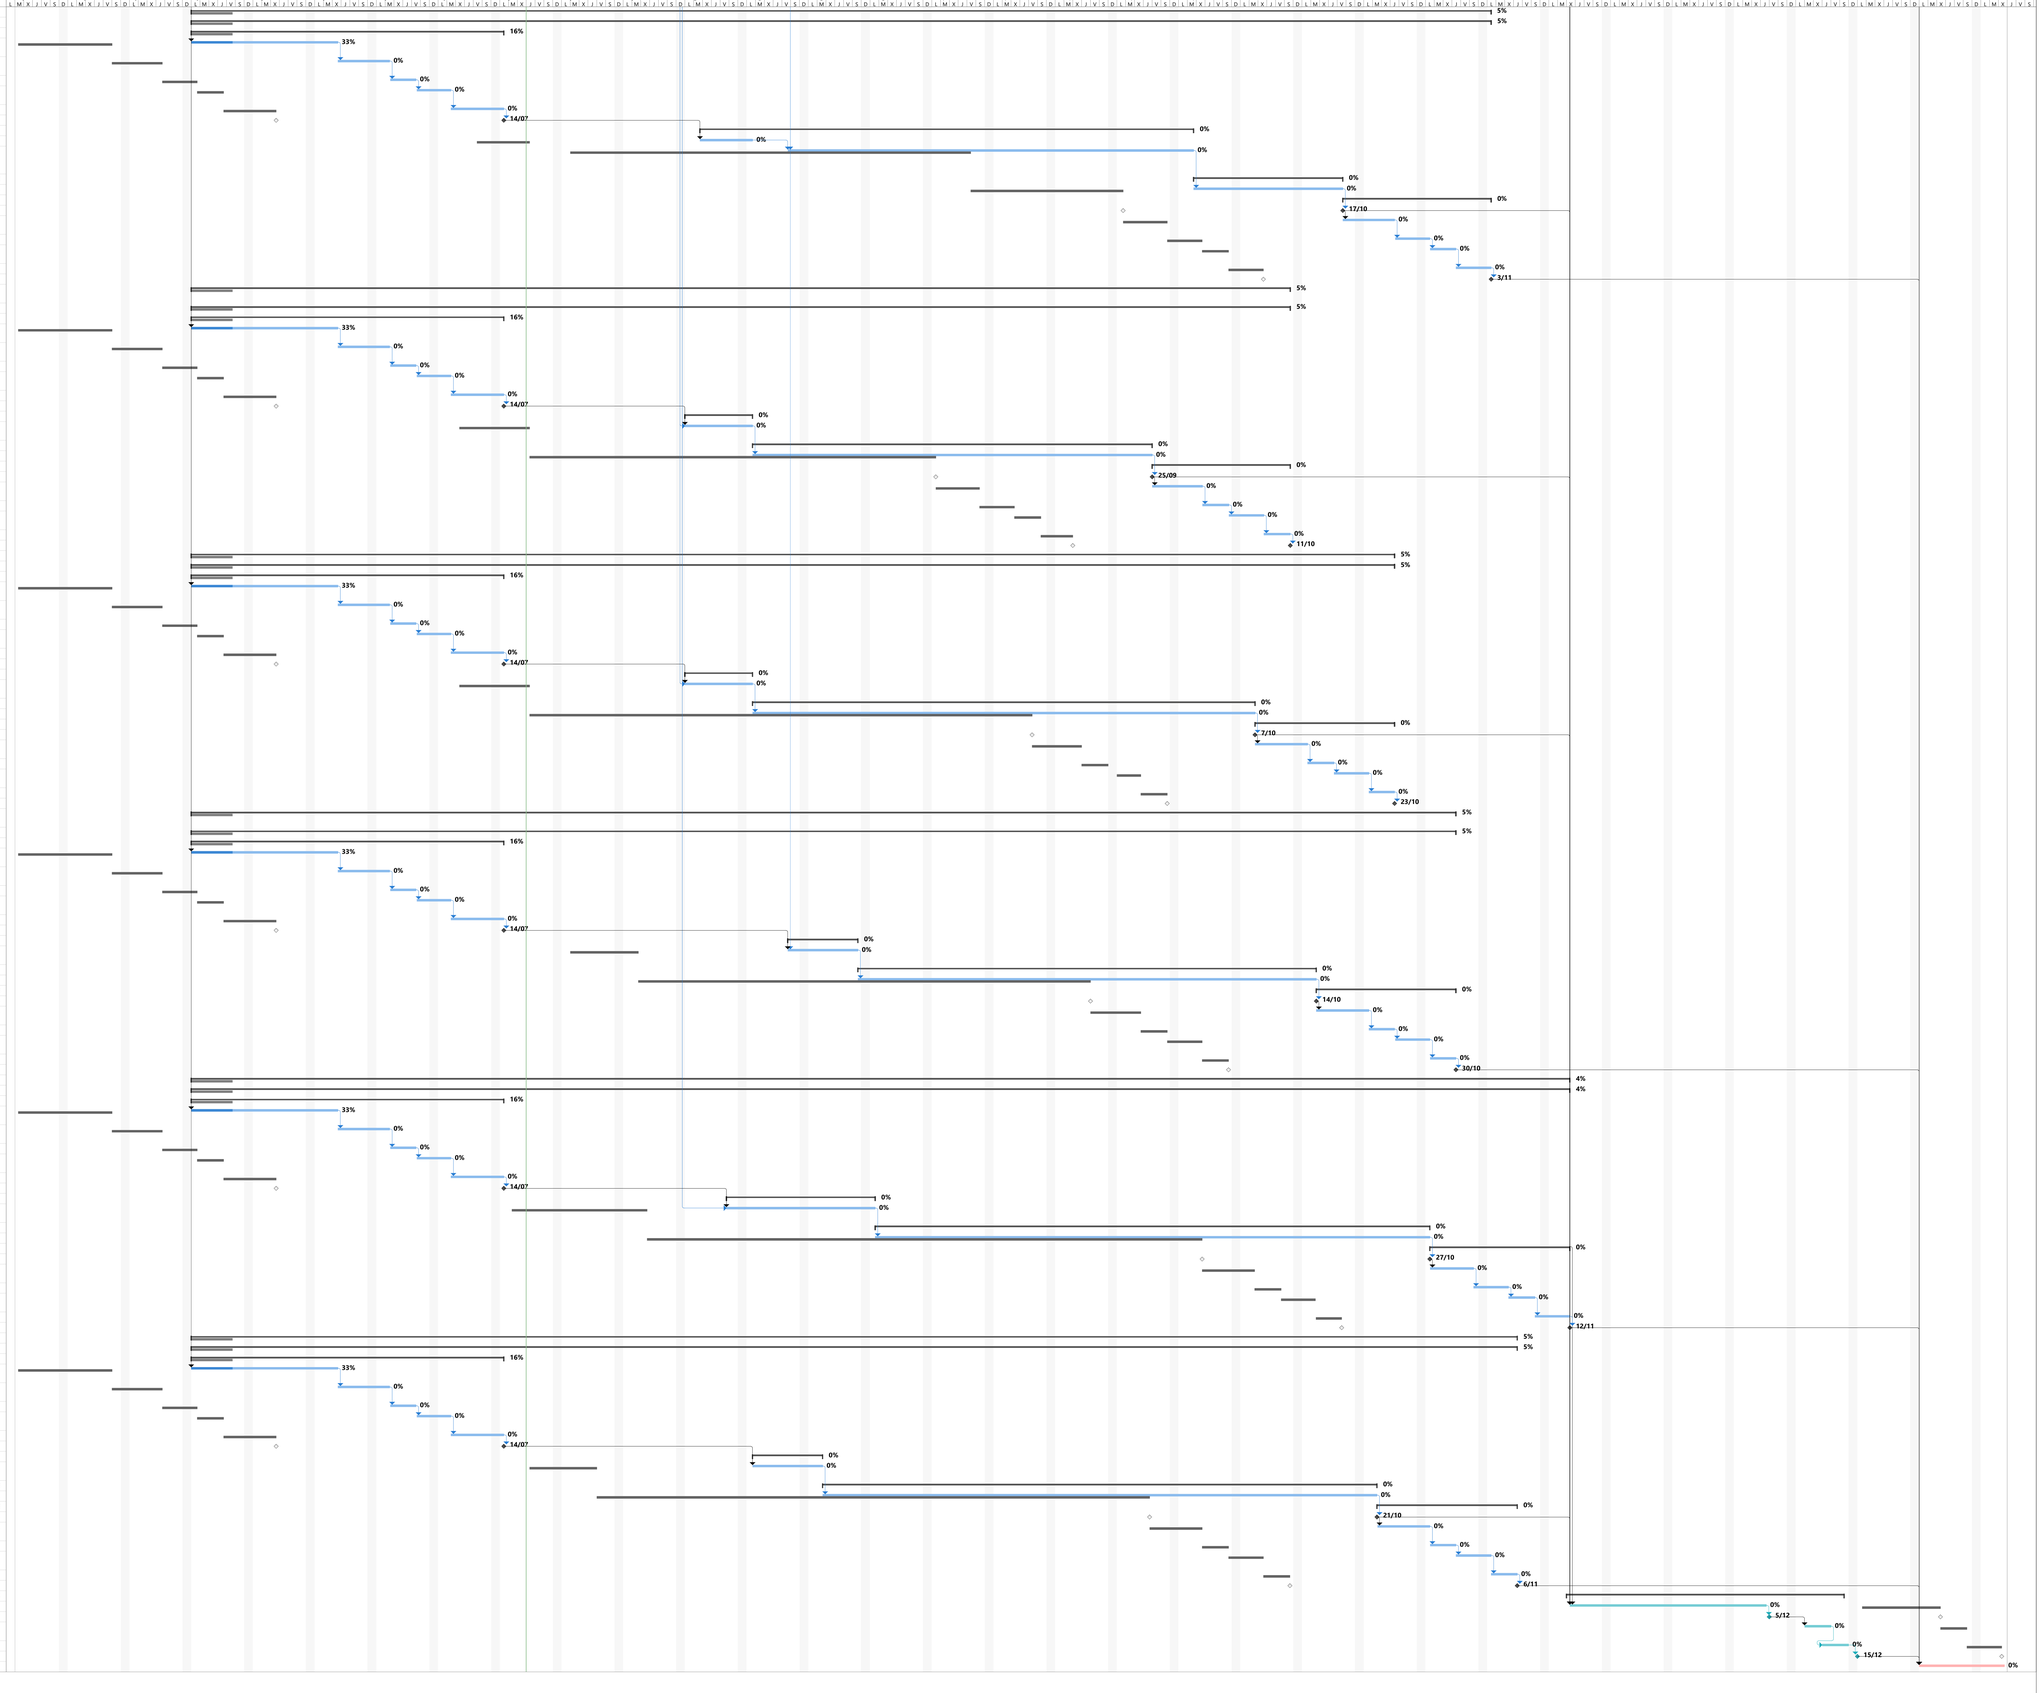

Tareas críticas · División crítica · Progreso de tarea crítica · Tarea · División · Progreso de tarea · Tarea manual · solo el comienzo · solo fin · solo duración · Línea base · División de la línea base · Hito de línea base · Hito · Progreso del resumen · Resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Fecha límite

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	29/07/2025		**Contrato:**	ICCU - 258 DE 2025	**Reporte N°:** 10
Semana:	del martes, 22 de julio de 2025	al	martes, 29 de julio de 2025		
Consultoría:	CONSORCIO CAMINOS IP				
Objeto:	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2				
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478				
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478			**Avance Programado:**	24.00%
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0			**Avance Ejecutado:**	26.00%
Vigencia fiscal 2024:	N/A				
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478			**Vigencia futura:**	
Fecha Acta de Inicio:	20-may-25			**Fecha de Terminación:**	31-dic-25
Duración Contrato (Días):	225		**Días Transcurridos:**	70 / 31.11%	**Días Faltantes:** 155
Facturación Acumulada:	$ -	0%	**N° de Facturas:**	0	**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**24%**	**26%**	
Acta de Inicio	20/05/2025	20/05/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Madrid - Puente Piedra	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**10%**	**35%**	Nota: El % Programado para cada uno de los volumenes contempla las actividades que se encuentran en desarrollo según el cronograma de trabajo, adicionalmente, se anota que las metodologias de trabajo se encuentran en revisión por parte de la Interventoría
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**27%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programación Trabajos de Campo	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/06/2025**	**21/10/2025**	**24%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Trabajo de campo:Visitas de campo K0	28/07/2025	30/07/2025	80%	90%	
Volumen III. Geología para Ingenieria	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**21%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**19%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/06/2025**	**31/10/2025**	**21%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**19%**	**38%**	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte: 29/07/2025 **Contrato:** ICCU - 258 DE 2025 **Reporte N°:** 10

Semana: del martes, 22 de julio de 2025 al martes, 29 de julio de 2025

Consultoría: CONSORCIO CAMINOS IP

Objeto: CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2

Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Programación trabajos de campo	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/06/2025**	**3/11/2025**	**22%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/06/2025**	**11/10/2025**	**23%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/06/2025**	**23/10/2025**	**20%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/06/2025**	**30/10/2025**	**20%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/06/2025**	**12/11/2025**	**18%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/06/2025**	**6/11/2025**	**19%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:
- Alcance comunicado 2025-493-ICU-2073. Respuesta a su comunicación por medio de vía correo electrónico del 14 de julio de 2025. Presentación Especialista en Seguridad Vial., mediante el oficio 2025-493-ICU-2143 del 22 de julio de 2025.
- Entrega de documentos acta parcial No. 01 correspondiente al 15% del valor del contrato en el periodo del 20 de mayo al 19 de junio de 2025. Contrato ICCU-258 de 2025, mediante el oficio 2025-493-ICU-2156 del 23 de julio de 2025

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES


Fecha de reporte:	29/07/2025	**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:**	10
Semana:	del martes, 22 de julio de 2025	al	martes, 29 de julio de 2025		
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**				
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**				

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 22 al 29 de julio de 2025 se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito se continua con el trabajo de campo
- Por parte del estudio de Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: se continua con trabajos de campo y visita de campo
- Por parte de Geología para Ingenieria: se realiza la programación Trabajos de Campo
- Por parte del Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento: se realiza la programación Trabajos de Campo

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

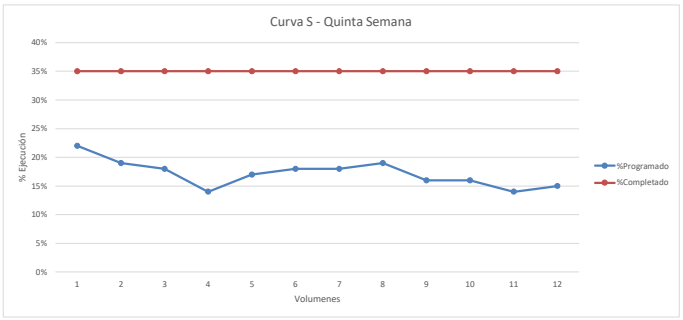

ANALISIS

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

RIESGOS	SEGUIMIENTO	SEMAFORO
No se han presentadno riesgos al contrato	**N.A**	

CONTROL DE CAMBIOS	APROBACION	FECHA
No se han solicitado modificaciones al contrato	**N.A**	**N.A**

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría	Supervisor ICCU	Control de proyectos
Nombre: CONSORCIO LITORAL MC	Nombre: Jhon Ardila	Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 29/07/2025	Fecha: 29/07/2025	Fecha: 29/07/2025

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	29/07/2025		**Contrato:**	ICCU - 258 DE 2025	**Reporte N°:** 10
Semana:	del martes, 22 de julio de 2025	al	martes, 29 de julio de 2025		
Consultoría:	CONSORCIO CAMINOS IP				
Objeto:	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2				
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478				
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478			**Avance Programado:**	24.00%
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0			**Avance Ejecutado:**	26.00%
Vigencia fiscal 2024:	N/A				
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478			**Vigencia futura:**	
Fecha Acta de Inicio:	20-may-25			**Fecha de Terminación:**	31-dic-25
Duración Contrato (Días):	225		**Días Transcurridos:**	70 / 31.11%	**Días Faltantes:** 155
Facturación Acumulada:	$ - / 0%		**N° de Facturas:**	0	**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**24%**	**26%**	
Acta de Inicio	20/05/2025	20/05/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**10%**	**35%**	
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**26%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Aforo de campo	14/07/2025	25/07/2025	60%	70%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/06/2025**	**21/10/2025**	**23%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Volumen III. Geología para Ingenieria	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**20%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	28/09/2025	50%	20%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**18%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/06/2025**	**31/10/2025**	**21%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**18%**	**35%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte: 29/07/2025 **Contrato:** ICCU - 258 DE 2025 **Reporte N°:** 10

Semana: del martes, 22 de julio de 2025 al martes, 29 de julio de 2025

Consultoría: CONSORCIO CAMINOS IP

Objeto: CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2

Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/06/2025**	**3/11/2025**	**18%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/06/2025**	**11/10/2025**	**20%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	28/09/2025	50%	20%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/06/2025**	**23/10/2025**	**17%**	**36%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	11/09/2025	50%	20%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/06/2025**	**30/10/2025**	**16%**	**35%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/06/2025**	**12/11/2025**	**14%**	**35%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: inventaro de campo y conteo forestal	19/07/2025	11/08/2025	50%	20%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/06/2025**	**6/11/2025**	**16%**	**36%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	22/09/2025	50%	20%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	29/07/2025		**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:** 10
Semana:	del martes, 22 de julio de 2025	al	martes, 29 de julio de 2025		
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**				
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**				

ACTIVIDADES REALIZADAS


1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:
- Alcance comunicado 2025-493-ICU-2073. Respuesta a su comunicación por medio de vía correo electrónico del 14 de julio de 2025. Presentación Especialista en Seguridad Vial., mediante el oficio 2025-493-ICU-2143 del 22 de julio de 2025.
- Entrega de documentos acta parcial No. 01 correspondiente al 15% del valor del contrato en el periodo del 20 de mayo al 19 de junio de 2025. Contrato ICCU-258 de 2025, mediante el oficio 2025-493-ICU-2156 del 23 de julio de 2025

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 15 al 22 de julio de 2025 se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito Trabajo de campo: se realiza aforo de campo
- Por parte del Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: elaboracion de volumen
- Por parte de del Geología para Ingenieria: desarrollo de volumen
- Por parte del Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento se realiza el Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio
-Por parte de Estudio de Fuentes de Materiales:Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio
- Por parte de Estudio de Predial: Trabajo de campo: inventaro de campo y conteo forestal

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

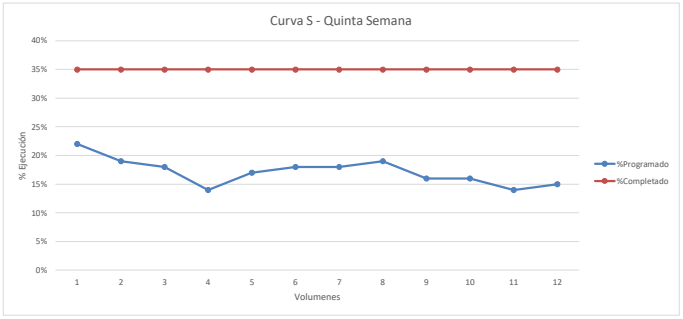

ANALISIS

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

RIESGOS	**SEGUIMIENTO**	**SEMAFORO**
No se han presentadno riesgos al contrato	**N.A**	

CONTROL DE CAMBIOS	**APROBACION**	**FECHA**
No se han solicitado modificaciones al contrato	**N.A**	**N.A**

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría	**Supervisor ICCU**	**Control de proyectos**
Nombre: CONSORCIO LITORAL MC	Nombre: Jhon Ardila	Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP / SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 29/07/2025	Fecha: 29/07/2025	Fecha: 29/07/2025

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	29/07/2025		**Contrato:**	ICCU - 258 DE 2025	**Reporte N°:** 10
Semana:	del martes, 22 de julio de 2025	al	martes, 29 de julio de 2025		
Consultoría:	CONSORCIO CAMINOS IP				
Objeto:	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2				
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478				
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478			**Avance Programado:**	24.00%
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0			**Avance Ejecutado:**	26.00%
Vigencia fiscal 2024:	N/A				
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478			**Vigencia futura:**	
Fecha Acta de Inicio:	20-may-25			**Fecha de Terminación:**	31-dic-25
Duración Contrato (Días):	225		**Días Transcurridos:**	70 / 31.11%	**Días Faltantes:** 155
Facturación Acumulada:	$ - / 0%		**N° de Facturas:**	0	**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**24%**	**26%**	
Acta de Inicio	20/05/2025	20/05/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**10%**	**35%**	
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**29%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	6/08/2025	50%	20%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/06/2025**	**21/10/2025**	**25%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/07/2025	19/08/2025	50%	20%	
Volumen III. Geología para Ingeniería	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**23%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/07/2025	19/08/2025	50%	20%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**20%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/06/2025**	**31/10/2025**	**23%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte: 29/07/2025 **Contrato:** ICCU - 258 DE 2025 **Reporte N°:** 10

Semana: del martes, 22 de julio de 2025 al martes, 29 de julio de 2025

Consultoría: CONSORCIO CAMINOS IP

Objeto: CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2

Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**23%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/06/2025**	**3/11/2025**	**18%**	**35%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/06/2025**	**11/10/2025**	**23%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/06/2025**	**23/10/2025**	**22%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Inventario en Campo y Conteo Forestal	19/07/2025	5/09/2025	50%	20%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/06/2025**	**30/10/2025**	**20%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/06/2025**	**12/11/2025**	**19%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/06/2025**	**6/11/2025**	**20%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	29/07/2025	**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:**	10
Semana:	del martes, 22 de julio de 2025	al	martes, 29 de julio de 2025		
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**				
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**				

Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	

ACTIVIDADES REALIZADAS


1. La Consultoría presentó las siguientes actiiades:
- Alcance comunicado 2025-493-ICU-2073. Respuesta a su comunicación por medio de vía correo electrónico del 14 de julio de 2025. Presentación Especialista en Seguridad Vial., mediante el oficio 2025-493-ICU-2143 del 22 de julio de 2025.
- Entrega de documentos acta parcial No. 01 correspondiente al 15% del valor del contrato en el periodo del 20 de mayo al 19 de junio de 2025. Contrato ICCU-258 de 2025, mediante el oficio 2025-493-ICU-2156 del 23 de julio de 2025

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 15 al 22 de julio de 2025 se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito Trabajo de campo: se realiza aforo de campo
- Por parte del Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: elaboracion de volumen
- Por parte de del Geología para Ingenieria: desarrollo de volumen
- Por parte del Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento se realiza el Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio
-Por parte de Estudio de Fuentes de Materiales:Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

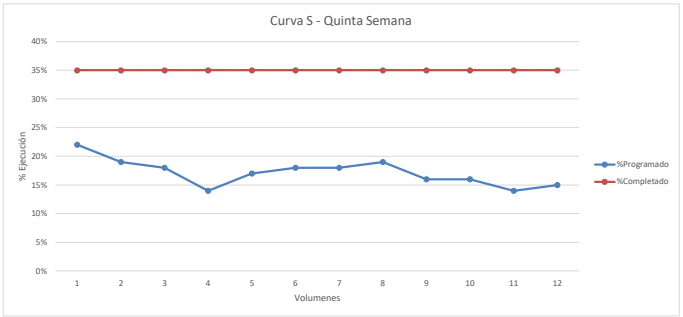

ANALISIS

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

RIESGOS	**SEGUIMIENTO**	**SEMAFORO**
No se han presentadno riesgos al contrato	**N.A**	

CONTROL DE CAMBIOS	**APROBACION**	**FECHA**
No se han solicitado modificaciones al contrato	**N.A**	**N.A**

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría	**Supervisor ICCU**	**Control de proyectos**
Nombre: CONSORCIO LITORAL MC	Nombre: Jhon Ardila	Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 29/07/2025	Fecha: 29/07/2025	Fecha: 29/07/2025

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	29/07/2025		**Contrato:**	ICCU - 258 DE 2025	**Reporte N°:** 10
Semana:	del martes, 22 de julio de 2025	al	martes, 29 de julio de 2025		
Consultoría:	CONSORCIO CAMINOS IP				
Objeto:	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2				
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478				
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478			**Avance Programado:**	24.00%
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0			**Avance Ejecutado:**	26.00%
Vigencia fiscal 2024:	N/A				
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478			**Vigencia futura:**	
Fecha Acta de Inicio:	20-may-25			**Fecha de Terminación:**	31-dic-25
Duración Contrato (Días):	225		**Días Transcurridos:**	70 / 31.11%	**Días Faltantes:** 155
Facturación Acumulada:	$ - / 0%		**N° de Facturas:**	0	**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**24%**	**26%**	
Acta de Inicio	20/05/2025	20/05/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**10%**	**35%**	
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**29%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	6/08/2025	50%	20%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/06/2025**	**21/10/2025**	**25%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/07/2025	19/08/2025	50%	20%	
Volumen III. Geología para Ingeniería	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**23%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/07/2025	19/08/2025	50%	20%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**20%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/06/2025**	**31/10/2025**	**23%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte: 29/07/2025 **Contrato:** ICCU - 258 DE 2025 **Reporte N°:** 10

Semana: del martes, 22 de julio de 2025 al martes, 29 de julio de 2025

Consultoría: CONSORCIO CAMINOS IP

Objeto: CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2

Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**23%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/06/2025**	**3/11/2025**	**18%**	**35%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/06/2025**	**11/10/2025**	**23%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/06/2025**	**23/10/2025**	**22%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Inventario en Campo y Conteo Forestal	19/07/2025	5/09/2025	50%	20%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/06/2025**	**30/10/2025**	**20%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/06/2025**	**12/11/2025**	**19%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/06/2025**	**6/11/2025**	**20%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	46%	80%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	29/07/2025	**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:**	10
Semana:	del martes, 22 de julio de 2025	al	martes, 29 de julio de 2025		
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**				
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**				

Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	

ACTIVIDADES REALIZADAS


1. La Consultoría presentó las siguientes actiiades:
- Alcance comunicado 2025-493-ICU-2073. Respuesta a su comunicación por medio de vía correo electrónico del 14 de julio de 2025. Presentación Especialista en Seguridad Vial., mediante el oficio 2025-493-ICU-2143 del 22 de julio de 2025.
- Entrega de documentos acta parcial No. 01 correspondiente al 15% del valor del contrato en el periodo del 20 de mayo al 19 de junio de 2025. Contrato ICCU-258 de 2025, mediante el oficio 2025-493-ICU-2156 del 23 de julio de 2025

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 15 al 22 de julio de 2025 se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito Trabajo de campo: se realiza aforo de campo
- Por parte del Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: elaboracion de volumen
- Por parte de del Geología para Ingenieria: desarrollo de volumen
- Por parte del Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento se realiza el Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio
-Por parte de Estudio de Fuentes de Materiales:Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

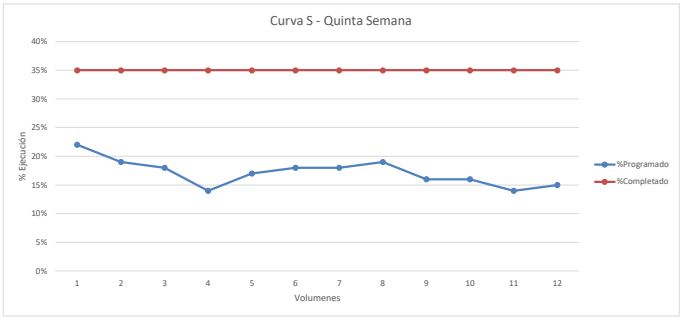

ANALISIS

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

RIESGOS	**SEGUIMIENTO**	**SEMAFORO**
No se han presentadno riesgos al contrato	**N.A**	

CONTROL DE CAMBIOS	**APROBACION**	**FECHA**
No se han solicitado modificaciones al contrato	**N.A**	**N.A**

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría	**Supervisor ICCU**	**Control de proyectos**
Nombre: CONSORCIO LITORAL MC	Nombre: Jhon Ardila	Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 29/07/2025	Fecha: 29/07/2025	Fecha: 29/07/2025

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	5/08/2025		**Contrato:**	ICCU - 258 DE 2025	**Reporte N°:** 11
Semana:	del martes, 29 de julio de 2025	al	martes, 5 de agosto de 2025		
Consultoría:	CONSORCIO CAMINOS IP				
Objeto:	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2				
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478				
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478			**Avance Programado:**	25.00%
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0			**Avance Ejecutado:**	27.00%
Vigencia fiscal 2024:	N/A				
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478			**Vigencia futura:**	
Fecha Acta de Inicio:	20-may-25			**Fecha de Terminación:**	31-dic-25
Duración Contrato (Días):	225		**Días Transcurridos:**	77 (34.22%)	**Días Faltantes:** 148
Facturación Acumulada:	$ -	0%	**N° de Facturas:**	0	**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**25%**	**27%**	
Acta de Inicio	20/05/2025	20/05/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Madrid - Puente Piedra	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**10%**	**35%**	Nota: El % Programado para cada uno de los volumenes contempla las actividades que se encuentran en desarrollo según el cronograma de trabajo, adicionalmente, se anota que las metodologias de trabajo se encuentran en revisión por parte de la Interventoría
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**27%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programación Trabajos de Campo	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/06/2025**	**21/10/2025**	**25%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Trabajo de campo:Visitas de campo K0	28/07/2025	30/07/2025	100%	100%	
Volumen III. Geología para Ingenieria	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**21%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**19%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/06/2025**	**31/10/2025**	**21%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Programacion de trabajos de campo	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**19%**	**38%**	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte: 5/08/2025 **Contrato:** ICCU - 258 DE 2025 **Reporte N°:** 11

Semana: del martes, 29 de julio de 2025 al martes, 5 de agosto de 2025

Consultoría: CONSORCIO CAMINOS IP

Objeto: CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2

Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Programación trabajos de campo	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio	2/08/2025	17/09/2025	20%	30%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/06/2025**	**3/11/2025**	**22%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Programa de trabajo	5/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/06/2025**	**11/10/2025**	**23%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	4/08/2025	11/08/2025	60%	80%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/06/2025**	**23/10/2025**	**20%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/06/2025**	**30/10/2025**	**20%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/06/2025**	**12/11/2025**	**18%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/06/2025**	**6/11/2025**	**19%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:

-Entrega de documentos acta parcial No. 01 correspondiente al 15% del valor del contrato en el periodo del 20 de mayo al 19 de junio de 2025. Contrato ICCU-258 de 2025, mediante el oficio 22025-493-ICU-2297 del 4 de agosto de 2025

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES


Fecha de reporte:	5/08/2025	**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:**	11
Semana:	del martes, 29 de julio de 2025	al	martes, 5 de agosto de 2025		
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**				
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**				

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 29 de julio de 5 de agosto de 2025 se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito se continua con el trabajo de campo
- Por parte del estudio de Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: se continua con trabajos de campo y visita de campo
- Por parte de Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención: trabajo de campo y campaña geotecnica
- Por parte de Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes: programa de trabajo y Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio
-Por parte de Estudio de Fuentes de Materiales; programación Trabajos de Campo
- Por parte de Geología para Ingenieria: se realiza la programación Trabajos de Campo
- Por parte del Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento: se realiza la programación Trabajos de Campo

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

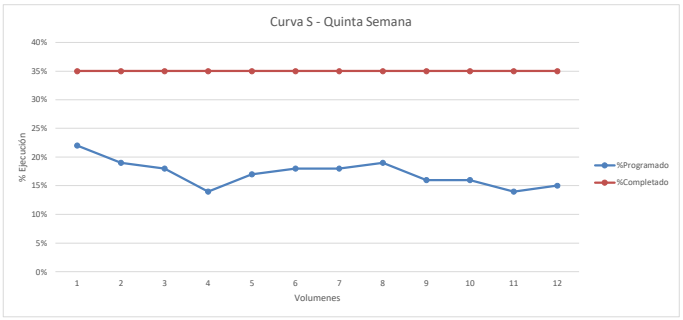

ANALISIS

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

RIESGOS	**SEGUIMIENTO**	**SEMAFORO**
No se han presentadno riesgos al contrato	**N.A**	

CONTROL DE CAMBIOS	**APROBACION**	**FECHA**
No se han solicitado modificaciones al contrato	**N.A**	**N.A**

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría	**Supervisor ICCU**	**Control de proyectos**
Nombre: CONSORCIO LITORAL MC	Nombre: Jhon Ardila	Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 5/08/2025	Fecha: 5/08/2025	Fecha: 5/08/2025

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	5/08/2025		**Contrato:**	ICCU - 258 DE 2025	**Reporte N°:** 11
Semana:	del martes, 29 de julio de 2025	al	martes, 5 de agosto de 2025		
Consultoría:	CONSORCIO CAMINOS IP				
Objeto:	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2				
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478				
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478			**Avance Programado:**	25.00%
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0			**Avance Ejecutado:**	27.00%
Vigencia fiscal 2024:	N/A				
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478			**Vigencia futura:**	
Fecha Acta de Inicio:	20-may-25			**Fecha de Terminación:**	31-dic-25
Duración Contrato (Días):	225		**Días Transcurridos:**	77 (34.22%)	**Días Faltantes:** 148
Facturación Acumulada:	$ - (0%)		**N° de Facturas:**	0	**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**25%**	**27%**	
Acta de Inicio	20/05/2025	20/05/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**10%**	**35%**	
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**26%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Aforo de campo	14/07/2025	25/07/2025	60%	70%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	25/07/2025	16/08/2025	60%	30%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/06/2025**	**21/10/2025**	**23%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	31/07/2025	20/09/2025	60%	30%	
Volumen III. Geología para Ingeniería	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**20%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	28/0982025	50%	20%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**18%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/06/2025**	**31/10/2025**	**21%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**18%**	**35%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte: 5/08/2025 **Contrato:** ICCU - 258 DE 2025 **Reporte N°:** 11

Semana: del martes, 29 de julio de 2025 al martes, 5 de agosto de 2025

Consultoría: CONSORCIO CAMINOS IP

Objeto: CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2

Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/06/2025**	**3/11/2025**	**18%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/06/2025**	**11/10/2025**	**20%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	28/0982025	50%	20%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/06/2025**	**23/10/2025**	**17%**	**36%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	11/09/2025	50%	20%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/06/2025**	**30/10/2025**	**16%**	**35%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	30/07/2025	6/10/2025	40%	15%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/06/2025**	**12/11/2025**	**14%**	**35%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: inventaro de campo y conteo forestal	19/07/2025	11/08/2025	50%	20%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/06/2025**	**6/11/2025**	**16%**	**36%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	22/09/2025	50%	20%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	5/08/2025	**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:**	11
Semana:	del martes, 29 de julio de 2025	al	martes, 5 de agosto de 2025		
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**				
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**				

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:


-Entrega de documentos acta parcial No. 01 correspondiente al 15% del valor del contrato en el periodo del 20 de mayo al 19 de junio de 2025. Contrato ICCU-258 de 2025, mediante el oficio 22025-493-ICU-2297 del 4 de agosto de 2025

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 29 de julio de 5 de agosto de 2025 se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito Trabajo de campo: se realiza aforo de campo y desarrollo de volumen
- Por parte del Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: elaboracion de volumen

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

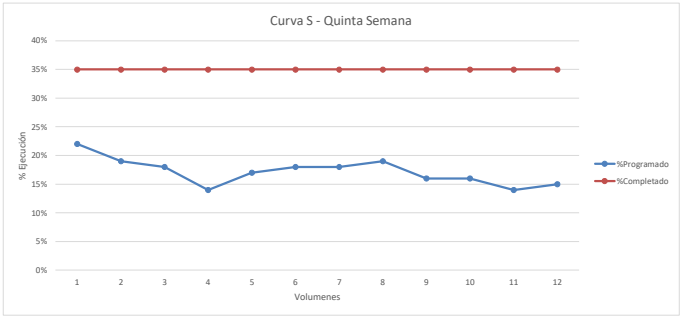

ANALISIS

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

RIESGOS	**SEGUIMIENTO**	**SEMAFORO**
No se han presentadno riesgos al contrato	**N.A**	

CONTROL DE CAMBIOS	**APROBACION**	**FECHA**
No se han solicitado modificaciones al contrato	**N.A**	**N.A**

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría	**Supervisor ICCU**	**Control de proyectos**
Nombre: CONSORCIO LITORAL MC	Nombre: Jhon Ardila	Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 5/08/2025	Fecha: 5/08/2025	Fecha: 5/08/2025

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	5/08/2025		**Contrato:**	ICCU - 258 DE 2025	**Reporte N°:** 11
Semana:	del martes, 29 de julio de 2025	al	martes, 5 de agosto de 2025		
Consultoría:	CONSORCIO CAMINOS IP				
Objeto:	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2				
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478				
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478			**Avance Programado:**	25.00%
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0			**Avance Ejecutado:**	27.00%
Vigencia fiscal 2024:	N/A				
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478			**Vigencia futura:**	
Fecha Acta de Inicio:	20-may-25			**Fecha de Terminación:**	31-dic-25
Duración Contrato (Días):	225		**Días Transcurridos:**	77 / 34.22%	**Días Faltantes:** 148
Facturación Acumulada:	$ - / 0%		**N° de Facturas:**	0	**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**25%**	**27%**	
Acta de Inicio	20/05/2025	20/05/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**10%**	**35%**	
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**29%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	6/08/2025	50%	20%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/06/2025**	**21/10/2025**	**25%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/07/2025	19/08/2025	50%	20%	
Volumen III. Geología para Ingeniería	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**23%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/07/2025	19/08/2025	50%	20%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**20%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/06/2025**	**31/10/2025**	**23%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte: 5/08/2025 **Contrato:** ICCU - 258 DE 2025 **Reporte N°:** 11

Semana: del martes, 29 de julio de 2025 al martes, 5 de agosto de 2025

Consultoría: CONSORCIO CAMINOS IP

Objeto: CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2

Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**23%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/06/2025**	**3/11/2025**	**18%**	**35%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/06/2025**	**11/10/2025**	**23%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	19/08/2025	40%	15%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/06/2025**	**23/10/2025**	**22%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Inventario en Campo y Conteo Forestal	19/07/2025	5/09/2025	50%	20%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	5/09/2025	40%	15%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/06/2025**	**30/10/2025**	**20%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Inventario en Campo y Conteo Forestal	30/07/2025	4/08/2025	40%	15%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/06/2025**	**12/11/2025**	**19%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/06/2025**	**6/11/2025**	**20%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	5/08/2025	**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:**	11
Semana:	del martes, 29 de julio de 2025	al	martes, 5 de agosto de 2025		
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**				
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**				

Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes actiiades:


- Solicitud de información del EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) del municipio de Cáqueza y acompañamiento de visita, mediante el oficio 2025-493-ICU-2254, del 31 de julio de 2025.
-Entrega de documentos acta parcial No. 01 correspondiente al 15% del valor del contrato en el periodo del 20 de mayo al 19 de junio de 2025. Contrato ICCU-258 de 2025, mediante el oficio 22025-493-ICU-2297 del 4 de agosto de 2025

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 29 de julio de 5 de agosto de 2025 se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito Trabajo de campo: se realiza aforo de campo
- Por parte del Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: elaboracion de volumen
- Por parte de Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, elaboración del volumen
- Por parte de Estudio y Diseños de Estructuras, se continua con Inventario en Campo y Conteo Forestal y elaboracion del volumen
- Estudio de Diagnostico Ambiental y Social: Inventario en Campo y Conteo Forestal

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

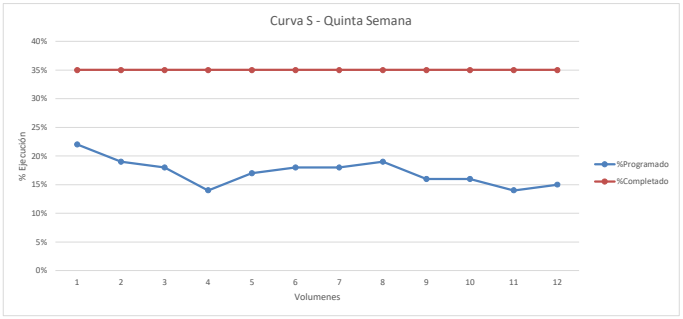

ANALISIS

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

RIESGOS	**SEGUIMIENTO**	**SEMAFORO**
No se han presentadno riesgos al contrato	**N.A**	

CONTROL DE CAMBIOS	**APROBACION**	**FECHA**
No se han solicitado modificaciones al contrato	**N.A**	**N.A**

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría	**Supervisor ICCU**	**Control de proyectos**
Nombre: CONSORCIO LITORAL MC	Nombre: Jhon Ardila	Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 5/08/2025	Fecha: 5/08/2025	Fecha: 5/08/2025

PAGINA 1 DE 1

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	12/08/2025		**Contrato:**	ICCU - 258 DE 2025	**Reporte N°:** 12
Semana:	del martes, 5 de agosto de 2025	al	martes, 12 de agosto de 2025		
Consultoría:	CONSORCIO CAMINOS IP				
Objeto:	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2				
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478				
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478			**Avance Programado:**	25.00%
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0			**Avance Ejecutado:**	27.00%
Vigencia fiscal 2024:	N/A				
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478			**Vigencia futura:**	
Fecha Acta de Inicio:	20-may-25			**Fecha de Terminación:**	31-dic-25
Duración Contrato (Días):	225		**Días Transcurridos:**	84 / 37.33%	**Días Faltantes:** 141
Facturación Acumulada:	$ -	0%	**N° de Facturas:**	0	**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**25%**	**27%**	
Acta de Inicio	20/05/2025	20/05/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Madrid - Puente Piedra	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**10%**	**35%**	Nota: El % Programado para cada uno de los volumenes contempla las actividades que se encuentran en desarrollo según el cronograma de trabajo, adicionalmente, se anota que las metodologias de trabajo se encuentran en revisión por parte de la Interventoría
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**27%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programación Trabajos de Campo	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Trabajo de campo: aforo de trafico	4/08/2025	28/08/2025	50%	40%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/06/2025**	**21/10/2025**	**25%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Trabajo de campo:Visitas de campo K0	28/07/2025	30/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo:Topografia y Red Geodesica	4/08/2025	30/08/2025	50%	25%	
Volumen III. Geología para Ingenieria	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**21%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/07/2025	28/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos	7/08/2025	28/09/2025	50%	40%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**19%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Campaña geotecnica	7/08/2025	11/09/2025	50%	10%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/06/2025**	**31/10/2025**	**21%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte: 12/08/2025 **Contrato:** ICCU - 258 DE 2025 **Reporte N°:** 12

Semana: del martes, 5 de agosto de 2025 al martes, 12 de agosto de 2025

Consultoría: CONSORCIO CAMINOS IP

Objeto: CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2

Programacion de trabajos de campo	14/07/2025	28/07/2025	100%	100%	
Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio	7/08/2025	30/09/2025	50%	25%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**19%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Programación trabajos de campo	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio	2/08/2025	17/09/2025	40%	35%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/06/2025**	**3/11/2025**	**22%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Programa de trabajo	5/08/2025	8/09/2025	100%	100%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/06/2025**	**11/10/2025**	**23%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	4/08/2025	11/08/2025	100%	100%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/06/2025**	**23/10/2025**	**20%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/06/2025**	**30/10/2025**	**20%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	4/08/2025	11/08/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/08/2025	21/09/2025	10%	5%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/06/2025**	**12/11/2025**	**18%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Levantamiento Topografico y Visita de Inspección Predio a Predio	8/08/2025	22/08/2025	60%	40%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/06/2025**	**6/11/2025**	**19%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	12/08/2025	**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:**	12
Semana:	del martes, 5 de agosto de 2025	al	martes, 12 de agosto de 2025		
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**				
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**				

Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios)	11/08/2025	18/08/2025	10%	5%	

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes actiiades:


-Entrega del Informe Índice de Condición del Pavimento vía desde el casco urbano Madrid hasta la inspección Puente Piedra, mediante el oficio 2025-493-ICU-2399 del12 de agosto de 2025

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 5 al 12 de agosto de 2025 se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito se continua con el trabajo de campo
- Por parte del estudio de Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: se continua con trabajos de campo, visita de campo y Topografia y Red Geodesica
- Por parte de Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención: trabajo de campo y campaña geoctenica
- Por parte de Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes: programa de trabajo y Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio
- Por parte de estudio de Diagnostico Ambiental y Social Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente
- Por parde de Estudio de Predial: Levantamiento Topografico y Visita de Inspección Predio a Predio
- Por parte de Estudio de Presupuestos: Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios)

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

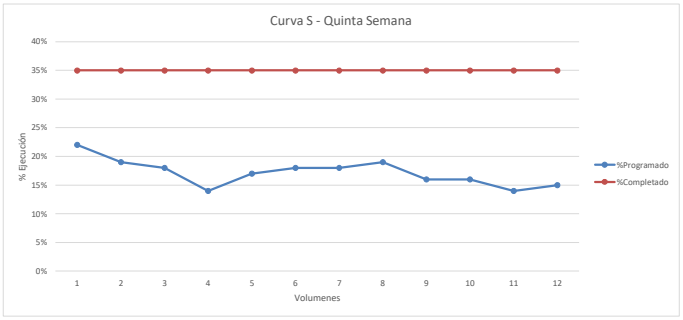

ANALISIS

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

RIESGOS	**SEGUIMIENTO**	**SEMAFORO**
No se han presentadno riesgos al contrato	**N.A**	

CONTROL DE CAMBIOS	**APROBACION**	**FECHA**
No se han solicitado modificaciones al contrato	**N.A**	**N.A**

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría	**Supervisor ICCU**	**Control de proyectos**
Nombre: CONSORCIO LITORAL MC	Nombre: Jhon Ardila	Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 12/08/2025	Fecha: 12/08/2025	Fecha: 12/08/2025

PAGINA 1 DE 1

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	12/08/2025	**Contrato:**	ICCU - 258 DE 2025	**Reporte N°:**	12
Semana:	del martes, 5 de agosto de 2025	al	martes, 12 de agosto de 2025		
Consultoría:	CONSORCIO CAMINOS IP				
Objeto:	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2				
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478				
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478		**Avance Programado:**	25.00%	
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0		**Avance Ejecutado:**	27.00%	
Vigencia fiscal 2024:	N/A				
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478		**Vigencia futura:**		
Fecha Acta de Inicio:	20-may-25		**Fecha de Terminación:**	31-dic-25	
Duración Contrato (Días):	225		**Días Transcurridos:**	84 (37.33%)	**Días Faltantes:** 141
Facturación Acumulada:	$ - (0%)		**N° de Facturas:**	0	**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**25%**	**27%**	
Acta de Inicio	20/05/2025	20/05/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**10%**	**35%**	
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**26%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Aforo de campo	14/07/2025	25/07/2025	60%	70%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	25/07/2025	16/08/2025	60%	30%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/06/2025**	**21/10/2025**	**23%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	31/07/2025	20/09/2025	60%	30%	
Volumen III. Geología para Ingeniería	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**20%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	28/0982025	50%	20%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**18%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/06/2025**	**31/10/2025**	**21%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	28/09/2025	40%	15%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**18%**	**35%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte: 12/08/2025 **Contrato:** ICCU - 258 DE 2025 **Reporte N°:** 12

Semana: del martes, 5 de agosto de 2025 al martes, 12 de agosto de 2025

Consultoría: CONSORCIO CAMINOS IP

Objeto: CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2

Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/06/2025**	**3/11/2025**	**18%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/06/2025**	**11/10/2025**	**20%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	28/0982025	50%	20%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/06/2025**	**23/10/2025**	**17%**	**36%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	11/09/2025	50%	20%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/06/2025**	**30/10/2025**	**16%**	**35%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	30/07/2025	6/10/2025	40%	20%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/06/2025**	**12/11/2025**	**14%**	**35%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	12/08/2025		**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:** 12
Semana:	del martes, 5 de agosto de 2025	al	martes, 12 de agosto de 2025		
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**				
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**				

Trabajo de campo: inventaro de campo y conteo forestal	19/07/2025	11/08/2025	50%	22%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/06/2025**	**6/11/2025**	**16%**	**36%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	22/09/2025	50%	22%	

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes actiiades:


-Entrega del Informe Índice de Condición del Pavimento vía desde La Inspección La Magdalena hasta el casco urbano del municipio de Quebradanegra, mediante el oficio 2025-493-ICU-2400 del 12 de agosto de 2025

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 5 al 12 de agosto de 2025 se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito Trabajo de campo: se realiza aforo de campo y desarrollo de volumen
- Por part del Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes: desarrollo del volumen
- Por parte del Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: elaboracion de volumen

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

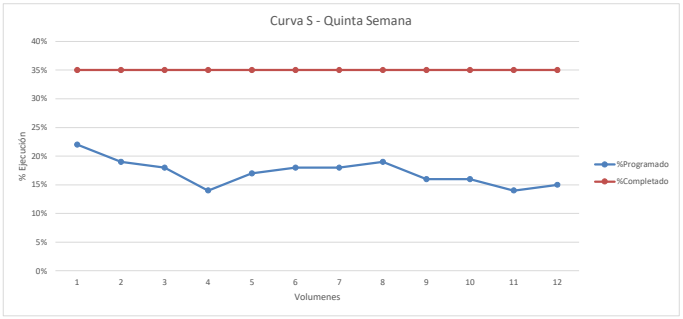

ANALISIS

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

RIESGOS	**SEGUIMIENTO**	**SEMAFORO**
No se han presentadno riesgos al contrato	**N.A**	

CONTROL DE CAMBIOS

	APROBACION	**FECHA**
No se han solicitado modificaciones al contrato	**N.A**	**N.A**

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría	**Supervisor ICCU**	**Control de proyectos**
Nombre: CONSORCIO LITORAL MC	Nombre: Jhon Ardila	Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 12/08/2025	Fecha: 12/08/2025	Fecha: 12/08/2025

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	12/08/2025		**Contrato:**	ICCU - 258 DE 2025	**Reporte N°:** 12
Semana:	del martes, 5 de agosto de 2025	al	martes, 12 de agosto de 2025		
Consultoría:	CONSORCIO CAMINOS IP				
Objeto:	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2				
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478				
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478			**Avance Programado:**	25.00%
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0			**Avance Ejecutado:**	27.00%
Vigencia fiscal 2024:	N/A				
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478			**Vigencia futura:**	
Fecha Acta de Inicio:	20-may-25			**Fecha de Terminación:**	31-dic-25
Duración Contrato (Días):	225		**Días Transcurridos:**	84 (37.33%)	**Días Faltantes:** 141
Facturación Acumulada:	$ -	0%	**N° de Facturas:**	0	**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**25%**	**27%**	
Acta de Inicio	20/05/2025	20/05/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**10%**	**35%**	
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**29%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	6/08/2025	50%	20%	
Entrega de volumen	22/07/2025	6/08/2025	100%	100%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/06/2025**	**21/10/2025**	**25%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/07/2025	19/08/2025	50%	20%	
Volumen III. Geología para Ingenieria	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**23%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/07/2025	19/08/2025	50%	20%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**20%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Campaña Geotecnica	14/07/2025	11/08/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/08/2025	15/09/2025	60%	20%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/06/2025**	**31/10/2025**	**23%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte: 12/08/2025 **Contrato:** ICCU - 258 DE 2025 **Reporte N°:** 12

Semana: del martes, 5 de agosto de 2025 al martes, 12 de agosto de 2025

Consultoría: CONSORCIO CAMINOS IP

Objeto: CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2

Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**23%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/08/2025	22/09/2025	60%	20%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/06/2025**	**3/11/2025**	**18%**	**35%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/08/2025	22/09/2025	60%	20%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/06/2025**	**11/10/2025**	**23%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	19/08/2025	40%	20%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/06/2025**	**23/10/2025**	**22%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Inventario en Campo y Conteo Forestal	19/07/2025	5/09/2025	50%	20%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	5/09/2025	40%	20%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/06/2025**	**30/10/2025**	**20%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Inventario en Campo y Conteo Forestal	30/07/2025	4/08/2025	40%	20%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/06/2025**	**12/11/2025**	**19%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	12/08/2025	**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:**	12
Semana:	del martes, 5 de agosto de 2025	al	martes, 12 de agosto de 2025		
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**				
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**				

Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/06/2025**	**6/11/2025**	**20%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:


-Entrega del Informe Cálculo del PCI del pavimento - vía desde el Casco Urbano de Cáqueza al Sector Placitas, mediante el oficio 2025-493-ICU-2398 del 12 de agosto de 2025

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 5 al 12 de agosto de 2025 de 2025 se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito Trabajo de campo: se realiza aforo de campo, desaroolo del volumen, entrega de volumen
- Por parte del Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: elaboracion de volumen
- Por parte de Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención:campaña de geotecnia, desarrollo de volumen
- Por parte de Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento: desarrollo del volumen
- Por parte de Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, elaboración del volumen
- Por parte de Estudio y Diseños de Estructuras, se continua con Inventario en Campo y Conteo Forestal y elaboracion del volumen
- Estudio de Diagnostico Ambiental y Social: Inventario en Campo y Conteo Forestal

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

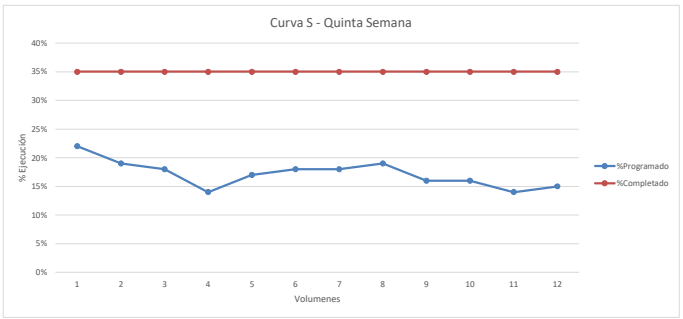

ANALISIS

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

RIESGOS	**SEGUIMIENTO**	**SEMAFORO**
No se han presentadno riesgos al contrato	**N.A**	

CONTROL DE CAMBIOS	**APROBACION**	**FECHA**
No se han solicitado modificaciones al contrato	**N.A**	**N.A**

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría	**Supervisor ICCU**	**Control de proyectos**
Nombre: CONSORCIO LITORAL MC	Nombre: Jhon Ardila	Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP / SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 12/08/2025	Fecha: 12/08/2025	Fecha: 12/08/2025

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	12/08/2025		**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:** 12
Semana:	del martes, 5 de agosto de 2025	al	martes, 12 de agosto de 2025		
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**				
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**				

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	19/08/2025		**Contrato:**	ICCU - 258 DE 2025	**Reporte N°:** 13
Semana:	del martes, 12 de agosto de 2025	al	martes, 19 de agosto de 2025		
Consultoría:	CONSORCIO CAMINOS IP				
Objeto:	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2				
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478				
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478			**Avance Programado:**	26.00%
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0			**Avance Ejecutado:**	28.00%
Vigencia fiscal 2024:	N/A				
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478			**Vigencia futura:**	
Fecha Acta de Inicio:	20-may-25			**Fecha de Terminación:**	31-dic-25
Duración Contrato (Días):	225		**Días Transcurridos:**	91 (40.44%)	**Días Faltantes:** 134
Facturación Acumulada:	$ -	0%	**N° de Facturas:**	0	**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**26%**	**28%**	
Acta de Inicio	20/05/2025	20/05/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Madrid - Puente Piedra	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**10%**	**35%**	Nota: El % Programado para cada uno de los volumenes contempla las actividades que se encuentran en desarrollo según el cronograma de trabajo, adicionalmente, se anota que las metodologias de trabajo se encuentran en revisión por parte de la Interventoría
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**27%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programación Trabajos de Campo	14/07/2025	28/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: aforo de trafico	4/08/2025	28/08/2025	80%	60%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/06/2025**	**21/10/2025**	**25%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/07/2025	28/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo:Visitas de campo K0	28/07/2025	30/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo:Topografia y Red Geodesica	4/08/2025	30/08/2025	50%	40%	
Volumen III. Geología para Ingenieria	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**21%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/07/2025	28/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Recolección de Muestras y Análisis de Riesgos	7/08/2025	28/09/2025	60%	45%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**19%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Programacion de trabajos de Campo	14/07/2025	28/07/2025	60%	70%	
Campaña geotecnica	7/08/2025	11/09/2025	60%	25%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/06/2025**	**31/10/2025**	**21%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte: 19/08/2025 **Contrato:** ICCU - 258 DE 2025 **Reporte N°:** 13

Semana: del martes, 12 de agosto de 2025 al martes, 19 de agosto de 2025

Consultoría: CONSORCIO CAMINOS IP

Objeto: CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2

Programacion de trabajos de campo	14/07/2025	28/07/2025	100%	100%	
Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio	7/08/2025	30/09/2025	55%	30%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**19%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Programación trabajos de campo	14/07/2025	28/07/2025	100%	100%	
Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio	2/08/2025	17/09/2025	50%	40%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/06/2025**	**3/11/2025**	**22%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Programa de trabajo	5/08/2025	8/09/2025	100%	100%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/06/2025**	**11/10/2025**	**23%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	4/08/2025	11/08/2025	100%	100%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/06/2025**	**23/10/2025**	**20%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/06/2025**	**30/10/2025**	**20%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente	4/08/2025	11/08/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/08/2025	21/09/2025	40%	15%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/06/2025**	**12/11/2025**	**18%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Levantamiento Topografico y Visita de Inspección Predio a Predio	8/08/2025	22/08/2025	80%	60%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/06/2025**	**6/11/2025**	**19%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	19/08/2025	**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:**	13
Semana:	del martes, 12 de agosto de 2025	al	martes, 19 de agosto de 2025		
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**				
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**				

Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios)	11/08/2025	18/08/2025	100%	100%	

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes actiiades:


-Entrega del Informe Índice de Condición del Pavimento vía desde el casco urbano Madrid hasta la inspección Puente Piedra, mediante el oficio 2025-493-ICU-2399 del12 de agosto de 2025.
-Solicitud de información de catastro de redes de servicios públicos y obras proyectadas en la vía desde el Casco Urbano de Madrid hasta la Inspección Puente Piedra mediante el oficio 2025-493-ICU-2444 del 15 de agosto de 2025.
-Solicitud de información reserva vial en zona de intersección de la Autopista Bogotá – Villeta con el sector de la Inspección Puente Piedra que hace parte del corredor priorizado por la Gobernación de Cundinamarca desde el caso urbano Madrid hasta la inspección Puente Piedra, mediante el oficio 2025-493-ICU-2459 del 15 de agosto de 2025.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 12 al 19 de agosto de 2025 se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito se continua con el trabajo de campo
- Por parte del estudio de Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: se continua con trabajos de campo, visita de campo y Topografia y Red Geodesica
- Por parte de Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención: trabajo de campo y campaña geoctenica
- Por parte de Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes: programa de trabajo y Inventario de Infraestructura Existente y Ensayos de Laboratorio
- Por parte de estudio de Diagnostico Ambiental y Social Inventario en Campo Diagnostico de Infraestructura Existente
- Por parde de Estudio de Predial: Levantamiento Topografico y Visita de Inspección Predio a Predio
- Por parte de Estudio de Presupuestos: Inspeccion del Corredor y Obtención de Cotizaciones (Precios Unitarios)

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

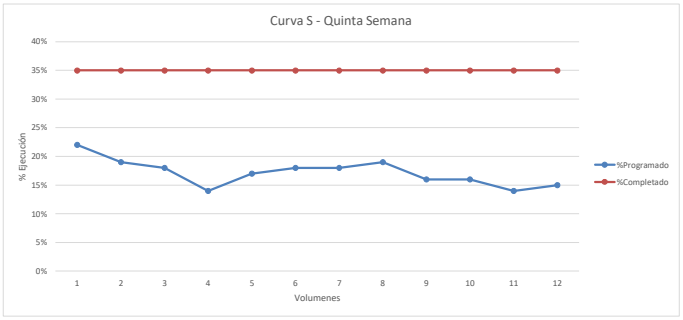

ANALISIS

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

RIESGOS	**SEGUIMIENTO**	**SEMAFORO**
No se han presentadno riesgos al contrato	**N.A**	

CONTROL DE CAMBIOS	**APROBACION**	**FECHA**
No se han solicitado modificaciones al contrato	**N.A**	**N.A**

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría	**Supervisor ICCU**	**Control de proyectos**
Nombre: CONSORCIO LITORAL MC	Nombre: Jhon Ardila	Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 19/08/2025	Fecha: 19/08/2025	Fecha: 19/08/2025

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	19/08/2025		**Contrato:**	ICCU - 258 DE 2025	**Reporte N°:** 13
Semana:	del martes, 12 de agosto de 2025	al	martes, 19 de agosto de 2025		
Consultoría:	CONSORCIO CAMINOS IP				
Objeto:	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2				
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478				
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478			**Avance Programado:**	26.00%
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0			**Avance Ejecutado:**	28.00%
Vigencia fiscal 2024:	N/A				
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478			**Vigencia futura:**	
Fecha Acta de Inicio:	20-may-25			**Fecha de Terminación:**	31-dic-25
Duración Contrato (Días):	225		**Días Transcurridos:**	91 (40.44%)	**Días Faltantes:** 134
Facturación Acumulada:	$ -	0%	**N° de Facturas:**	0	**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**26%**	**28%**	
Acta de Inicio	20/05/2025	20/05/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**10%**	**35%**	
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**26%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Aforo de campo	14/07/2025	25/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	25/07/2025	16/08/2025	100%	100%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/06/2025**	**21/10/2025**	**23%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	31/07/2025	20/09/2025	60%	30%	
Volumen III. Geología para Ingeniería	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**20%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	28/09/2025	60%	30%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**18%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/06/2025**	**31/10/2025**	**21%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	28/09/2025	60%	30%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**18%**	**35%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte: 19/08/2025 **Contrato:** ICCU - 258 DE 2025 **Reporte N°:** 13

Semana: del martes, 12 de agosto de 2025 al martes, 19 de agosto de 2025

Consultoría: CONSORCIO CAMINOS IP

Objeto: CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2

Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Trabajo de campo: Inventario de Campo y Ensayos de Laboratorio	14/07/2025	28/07/2025	100%	100%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/06/2025**	**3/11/2025**	**18%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Inventario de Campo, Caracterización Fuentes de Materiales y Ensayos de Laboratorio	14/07/2025	28/07/2025	100%	100%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/06/2025**	**11/10/2025**	**20%**	**37%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	28/09/2025	60%	30%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/06/2025**	**23/10/2025**	**17%**	**36%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	11/09/2025	60%	30%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/06/2025**	**30/10/2025**	**16%**	**35%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	30/07/2025	6/10/2025	45%	25%	
Volumen XI. Estudio de Predial	**9/06/2025**	**12/11/2025**	**14%**	**35%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	19/08/2025		**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:** 13
Semana:	del martes, 12 de agosto de 2025	al	martes, 19 de agosto de 2025		
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**				
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**				

Trabajo de campo: inventaro de campo y conteo forestal	19/07/2025	11/08/2025	60%	30%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/06/2025**	**6/11/2025**	**16%**	**36%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	22/09/2025	60%	30%	

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes actiiades:


-Entrega del Informe Índice de Condición del Pavimento vía desde La Inspección La Magdalena hasta el casco urbano del municipio de Quebradanegra, mediante el oficio 2025-493-ICU-2400 del 12 de agosto de 2025

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 12 al 19 de agosto de 2025 se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito Trabajo de campo: se realiza aforo de campo y desarrollo de volumen
- Por part del Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes: desarrollo del volumen
- Por parte del Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: elaboracion de volumen

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

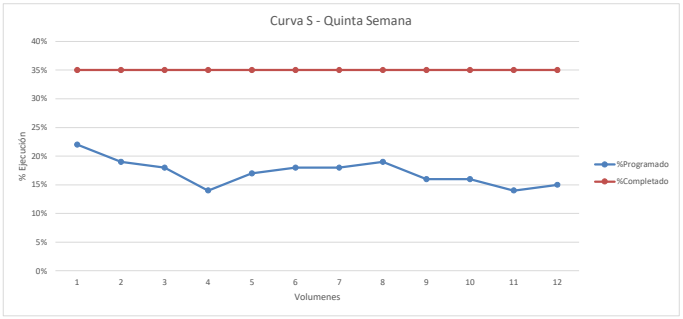

ANALISIS

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

RIESGOS	**SEGUIMIENTO**	**SEMAFORO**
No se han presentadno riesgos al contrato	**N.A**	

CONTROL DE CAMBIOS

	APROBACION	**FECHA**
No se han solicitado modificaciones al contrato	**N.A**	**N.A**

LECCIONES APRENDIDAS

Interventoría	**Supervisor ICCU**	**Control de proyectos**
Nombre: CONSORCIO LITORAL MC	Nombre: Jhon Ardila	Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 19/08/2025	Fecha: 19/08/2025	Fecha: 19/08/2025

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	19/08/2025		**Contrato:**	ICCU - 258 DE 2025	**Reporte N°:** 13
Semana:	del martes, 12 de agosto de 2025	al	martes, 19 de agosto de 2025		
Consultoría:	CONSORCIO CAMINOS IP				
Objeto:	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2				
Presupuesto Asignado con IVA:	$ 2,430,458,478				
Presupuesto Programado:	$ 2,430,458,478			**Avance Programado:**	26.00%
Presupuesto Real Ejecutado:	$ 0			**Avance Ejecutado:**	28.00%
Vigencia fiscal 2024:	N/A				
Vigencia fiscal 2025:	$ 2,430,458,478			**Vigencia futura:**	
Fecha Acta de Inicio:	20-may-25			**Fecha de Terminación:**	31-dic-25
Duración Contrato (Días):	225		**Días Transcurridos:**	91 (40.44%)	**Días Faltantes:** 134
Facturación Acumulada:	$ -	0%	**N° de Facturas:**	0	**% Facturado:** 0.0%

Actividades ejecutadas:

ENTREGABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	OBSERVACIONES
Contrato de Consultoría No. 258	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**26%**	**28%**	
Acta de Inicio	20/05/2025	20/05/2025	100%	100%	
Estructura de Desglose de Trabajo ICCU - Magdalena - Quebradanegra	**20/05/2025**	**31/12/2025**	**10%**	**35%**	
Volumen I. Estudio de Tránsito	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**30%**	**40%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	6/08/2025	100%	100%	
Entrega de volumen	22/07/2025	6/08/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	6/08/2025	12/08/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	12/08/2025	15/08/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	15/08/2025	19/08/2025	100%	100%	
Volumen II. Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT	**9/06/2025**	**21/10/2025**	**25%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/07/2025	19/08/2025	100%	100%	
Volumen III. Geología para Ingeniería	**9/06/2025**	**23/09/2025**	**23%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	28/07/2025	19/08/2025	100%	100%	
Volumen IV. Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**20%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Campaña Geotecnica	14/07/2025	11/08/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/08/2025	15/09/2025	60%	40%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte: 19/08/2025 **Contrato:** ICCU - 258 DE 2025 **Reporte N°:** 13

Semana: del martes, 12 de agosto de 2025 al martes, 19 de agosto de 2025

Consultoría: CONSORCIO CAMINOS IP

Objeto: CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2

Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes	**9/06/2025**	**31/10/2025**	**23%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen VI. Estudio de Geotecnia y Diseño del Pavimento	**9/06/2025**	**20/10/2025**	**23%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/08/2025	22/09/2025	60%	40%	
Volumen VII. Estudio de Fuentes de Materiales	**9/06/2025**	**3/11/2025**	**18%**	**35%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	11/08/2025	22/09/2025	60%	40%	
Volumen VIII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación	**9/06/2025**	**11/10/2025**	**23%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	19/08/2025	100%	100%	
Volumen IX. Estudio y Diseños de Estructuras	**9/06/2025**	**23/10/2025**	**22%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Inventario en Campo y Conteo Forestal	19/07/2025	5/09/2025	60%	40%	
Elaboracion de volumen: Desarrollo Volumen	22/07/2025	5/09/2025	60%	30%	
Volumen X. Estudio de Diagnostico Ambiental y Social	**9/06/2025**	**30/10/2025**	**20%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Inventario en Campo y Conteo Forestal	30/07/2025	4/08/2025	100%	100%	

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	19/08/2025		**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:** 13
Semana:	del martes, 12 de agosto de 2025	al	martes, 19 de agosto de 2025		
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**				
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**				

Volumen XI. Estudio de Predial	**9/06/2025**	**12/11/2025**	**19%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Volumen XII. Estudio de Presupuestos	**9/06/2025**	**6/11/2025**	**20%**	**38%**	
Metodología de Trabajo y Plan de Campo	9/06/2025	14/07/2025	100%	100%	
Revisión 1. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	25/06/2025	1/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	1/07/2025	4/07/2025	100%	100%	
Revisión 2. Entrega de Observaciones y/o Aprobación Interventoría	4/07/2025	8/07/2025	100%	100%	
Atención de Observaciones - Consultoría	8/07/2025	14/07/2025	100%	100%	
Aprobación Metodologia	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%	

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La Consultoría presentó las siguientes activiades:


-Entrega del Informe Cálculo del PCI del pavimento - vía desde el Casco Urbano de Cáqueza al Sector Placitas, mediante el oficio 2025-493-ICU-2498 del 12 de agosto de 2025

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para la semana comprendida entre el 12 al 19 de agosto de 2025 de 2025 se proyectan las siguientes actividades:

- Por parte del Estudio de Tránsito Trabajo de campo: se realiza aforo de campo, desaroolo del volumen, entrega de volumen, atencion a observaciones
- Por parte del Estudio Topografico, Trazado y Diseño geometrico, Seguridad Vial, Señalización y PMT: elaboracion de volumen
- Por parte de Estudio de Suelos para Fundaciones y Estructuras de Contención:campaña de geotecnia, desarrollo de volumen

GRAFICA DE CURVAS AVANCE DEL PROYECTO

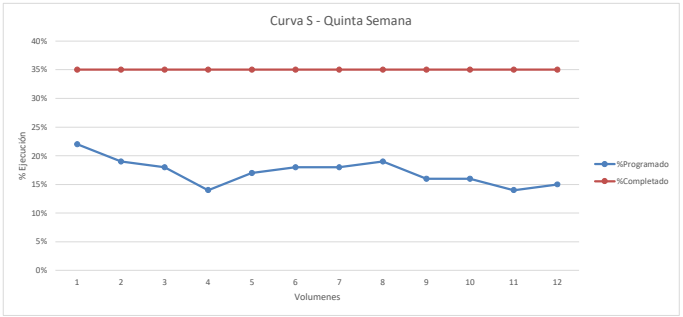

ANALISIS

En la quinta semana se presentó la atención a las observaciones a los volumenes I y II.

Adicionalmente, la Consultoría se encuentra a la espera de posibles observaciones a los documentos presentados, adicionalmente, se inician con los respectivos trabajos de programación y logística de los trabajos de campo definidos para los volumenes I, II y III, que corresponde a tránsito, topografía y geología.

RIESGOS	**SEGUIMIENTO**	**SEMAFORO**
No se han presentadno riesgos al contrato	**N.A**	

CONTROL DE CAMBIOS	**APROBACION**	**FECHA**
No se han solicitado modificaciones al contrato	**N.A**	**N.A**

LECCIONES APRENDIDAS

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Fecha de reporte:	19/08/2025	**Contrato:**	**ICCU - 258 DE 2025**	**Reporte N°:**	13
Semana:	del martes, 12 de agosto de 2025	al	martes, 19 de agosto de 2025		
Consultoría:	**CONSORCIO CAMINOS IP**				
Objeto:	**CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE MADRID HASTA LA INSPECCIÓN PUENTE PIEDRA, VÍA DESDE LA INSPECCIÓN LA MAGDALENA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Y VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CÁQUEZA AL SECTOR PLACITAS - LOTE 2**				

Interventoría	**Supervisor ICCU**	**Control de proyectos**
Nombre: CONSORCIO LITORAL MC	Nombre: Jhon Ardila	Nombre: CONSORCIO CAMINOS IP SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 19/08/2025	Fecha: 19/08/2025	Fecha: 19/08/2025

PAGINA 1 DE 1
