ACTAS DE VECINDAD

Gobernación de Boyacá

FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-023

FECHA: 17-09-2024

ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
CONTRATO: 001 DE 2023
CONTRATISTA: NYS CONSTRUCOL
ELABORÓ: Alvaro Jamir Prieto.

FECHA:
INTERVENTOR: INTEREMERGENCIAS NORTE
REVISÓ:

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA — Negativo N°



DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: José Ricardo Vargas.
Dirección: Vereda Floresta Vieja Carapachamosto.
Teléfono: 3132813816
long. Del frente (m): 8 metros
N° De pisos: 1
Estrato: 1

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energía	X		
teléfono		X	
gas	X		
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda	X	Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldío	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educación Sup.	
Sin edificar		Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

Estructura		concreto		mampostería	X	prefabricado		otra	X
paredes	X	bloque		ladrillo	X			otra	X
puertas	X	madera		metálicas	X			otra	
puertas		numero		calle		internas	X	garaje	X
cubierta	X	concreto		teja acrílica		asbesto cem.	X	otra	
N° de pisos	1								

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 17-09-2024

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La vivienda se encuentra habitada por su padres y 2 hijos, el 50% de la casa está construida en material y el otro 50% de la vivienda es en madera, sus puertas y ventanas se encuentran en buen estado el señor Ricardo es el dueño del predio donde se está realizando la intervención del muro en piedra armada. se deja constancia que no se le hace afectada su finca y se dejara todo limpio y organizado al terminar la ejecución de la obra.

Coordenadas: 5° 03' 02,6" N 73° 05' 27,1" W

PROPIETARIO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
Ing.Alvaro Benitez

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA
Ing.Jonnier Sanchez









Boyacá

FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-023

FECHA: 24/Jul/2019

ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA

FECHA DE LA PRESENTE ACTA
CONTRATO: 567 DE 2023
CONTRATISTA: INTEREMERGENCIAS NORTE
ELABORÓ

FECHA
INTERVENTOR: INTEREMERGENCIAS NORTE
REVISÓ

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA

Negativo N°



DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: FERNEY ALBERTO MEJIA - NIDIA RAQUEL GARCES
Dirección: CHITARAQUE VEREDA GACIO Y GALAPAI
Teléfono: 3102083260 - 3143020873
long. Del frente (m): 10X15
N° De pisos: 1 PISO
Estrato: 2

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua	X		
alcantarillado		X	
energía	X		
teléfono		X	
gas	X		NATURAL
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda	X	Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldío	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar		Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura	X	concreto	X	mamposteria		prefabricado	otra
paredes	X	bloque	X	ladrillo	X		otra
puertas	X	madera	X	metalicas			otra
puertas	X	numero		calle		internas	garaje
cubierta	X	concreto		teja acrilica		asbesto cem.	otra
N° de pisos	X						

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

EL PREDIO ESTA SITUADA EN LA VEREDA GACIO Y GALABAL EN LAS COORDENADAS 6°02'53,1" - 73°26'39,2" A 10 MINUTOS DE LA CARRETERA PRINCIPAL. DONDE CONSTA DE UNA VIVIENDA EN UN PISO Y LA HABITA LA RESPECTIVA. FAMILIA.

DENTRO DE ESTAS COORDENADAS NO HAY MAS PREDIOS QUE INHABILITEN U EL DESEMPEÑO DE LA OBRA A REALIZAR. CERCA A LA OBRA A REALIZAR EL MURO DE CONTECION. SE ENCUENTRAL A 200 METROS DOS BOX CULVERT. O ACALTARILLAS DE LADO DE ENTRADA Y SALIDA DE LA VEREDA EN LA VIA PRINCIPAL

Nydia Raquel Garcés
PROPIETARIO 23533263.

Jhonaton Meneses
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
Ing.Jhonatan Meneses

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA
Ing. Juan Francisco Pachón

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO		**FECHA: 24/Jul/2019**





GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO		**FECHA: 24/Jul/2019**





Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
		FECHA: 24/JUL/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA
CONTRATO
CONTRATISTA
ELABORÓ

	567 DE 2023
	INTERMAR AGENCIAS NORTE

FECHA
INTERVENTOR
REVISÓ

INTERMEDIARIOS NORTE

REGISTRO FOTOGRAFICO FACHADA — Registro N°

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: GONZALO LUIZ VARGAS
Dirección: EL COCUY VEREDA CARRITAL - 3118036482
Teléfono:
Mat. Del Predio (m): 9176782AS
N° De plano: 1
Estrato:

Servicios públicos	S	NO	OBSERVACIONES
agua	X		MANGUERA
alcantarillado		X	
energía	X		
teléfono	X		
gas		X	PUESTA A TIERRA
otros			

TIPO DE PREDIO

Mejoramiento nacional		Vivienda	X	Recreacional			
Interior conductivo		Comercial		Baldío			
Interior intermedio		Chozas		Inac. adicación Sup.			
Sin edificar		Institucional					
Reedificable		Parqueadero					

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

Estructura		concreto		mampostería	X	prefabricado		otra	
paredes	X	bloque	X	ladrillo	X			cual	
puertas	X	madera	X	metálicas		madera	X		
puertas	X	nuevo		cable		ninguna		grava	
cubierta		concreto		teja acrílica		teja arcilla	X	otra	
N° de pisos	1								

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA		FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

EN LAS COORDENADAS 6°20'13,2 -O 72°27'59,4" EN DONDE SE CONSTRUIRA. EL BOXT- CULVER HAY UN PREDIO A 200 M. DOBLE EL AREA DONDE SE VA EJUCATAR EL PROYECTO

LA VIVIENDA CONSTA DE UN PISO LA CUAL NO ESTA HABITABLE ESTA ESTA EDIFICADA EN BAREQUE, MADERA, BLOQUE, CONCRECTO EL PROPIETARIO FIRMA EL ACTA SIN PROBLEMA PARA EJECUTAR EL PROYECTO, YA QUE ES DUEÑO DE LOS PREDIOS DONDE SE DESARROLLARA LA OBRA.

xGonzalo Ruiz Roboto
4770-275
PROPIETARIO

Jhonatan Meneses
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
Ing.Jhonatan Meneses

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA
Ing. Juan Francisco Pachón

Gobernación de Boyacá

FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-023

FECHA: 18-09-2024

ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
CONTRATO	001 DE 2023
CONTRATISTA	NYS CONSTRUCOL
ELABORÓ	Alvaro Jose Beltrez

FECHA	
INTERVENTOR	INTEREMERGENCIAS NORTE
REVISÓ	

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA — Negativo N°



DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: Blanca Nieves Sanchez Espinosa
Dirección: Vereda Centro Páez
Teléfono: 3143796741
long. Del frente (m): 12 metros
N° De pisos: 1
Estrato: 1

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energía	X		
teléfono		X	
gas	X		
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda	X	Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldio	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar		Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

Estructura	X	concreto	X	mamposteria		prefabricado	otra
paredes	X	bloque	X	ladrillo			otra
puertas	X	madera	X	metalicas			otra
puertas	X	nuevo	X	calle		internas	X garaje
cubierta		concreto		teja acrilica	X	asbesto cem.	otra
N° de pisos	1						

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 12-09-2024

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La vivienda se encuentra en perfecto estado, no presenta ninguna irregularidad. El predio a intervenir o que se pueda ver afectado es de la misma dueña y solicita que no se le vaya a ser afectado; en lo posible que se mantenga de la misma manera, en la vivienda habitan unicamente la propietaria con sus dos hijos.

PROPIETARIO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
Ing.Alvaro Benitez

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA
Ing. Jonnier Sanchez

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO		FECHA: 24/Jul/2019









Boyacá

FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-023

ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA

FECHA: 18-09-2024

FECHA DE LA PRESENTE ACTA
CONTRATO: 001 DE 2023
CONTRATISTA: NYS CONSTRUCOL
ELABORÓ: Alvaro David Bautista B.

FECHA
INTERVENTOR: INTEREMERGENCIAS NORTE
REVISÓ

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA

Negativo N°



DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: Wilson Rolando Rodriguez Sanchez
Dirección: Vereda San Pablo Sector Sucre Sn Eduardo.
Teléfono: 3214628477
long. Del frente (m): 8 metros
N° De pisos: 1
Estrato:

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energía	X		
teléfono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda	X	Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldío	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar		Institucional			
Rectificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

Estructura	X	concreto	X	mamposteria	X	prefabricado	otra
paredes		bloque	X	ladrillo			otra
puertas		madera		metalicas	X		otra
puertas	X	numero		calle	X	internas	garaje
cubierta		concreto		teja acrilica	X	asbesto cem.	otra
N° de pisos	1						

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 18-09-2024

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La vivienda se encuentra en perfecto estado, se encuentra habitada por su pareja y sus 2 hijos, tiene una corvamda la cual se ha visto afectada por la creciente del caño a arreglar con su respectiva alcantarilla, ya pronto para intervenir el punto; sin intervenir por daños en su predio ahora que ese caño lo ha afectado durante 5 años; despues que se realizó la pavimentación en la llegada al municipio de San Eduardo. Coordenadas: 5° 13' 33.4" N 73° 06' 09.5" W

Wilson Pachuta Z
PROPIETARIO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
Ing.Alvaro Benitez

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA
Ing. Jonnier Sanchez

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO		**FECHA: 24/Jul/2019**









Boyacá

FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-023

FECHA: 17-04-2024

ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA

FECHA DE LA PRESENTE ACTA
CONTRATO: 001 DE 2023
CONTRATISTA: NJS CONSTRUCOL
ELABORÓ: Alcalde Fanny Becerra

FECHA
INTERVENTOR
REVISÓ

INTERMERGENCIAS NORTE

REGISTRO FOTOGRAFICO FACHADA

Negativo Nº



DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: Ana Jimena
Dirección: Vereda Cuitaseca Santa María
Teléfono: 312 55 [illegible]
long. Del frente (m):
Nº De pisos: 1
Estrato: 1

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energia	X		
teléfono		X	
gas		X	
otros			

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda	X	Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldío	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar		Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura	X	concreto		mamposteria		prefabricado	otra
paredes	X	bloque	X	ladrillo			otra
puertas	X	madera	X	metalicas			otra
puertas	X	numero		calle	X	Internas	garaje
cubierta		concreto	X	teja ecrica		asbesto cem.	otra
Nº de pisos	1						

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 17-09-2024

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

En la finca los Volcanes me encuentro con su propietaria Ana Fiorez dejando en existencia la construcción de la alcantarilla N2 sin desde en su predio; Se deja claro que todo el material será recogido y no se verá por ningún afectado de contaminación su respectivo predio. Coordenadas = 4° 49' 47,62" N 73° 15' 33,95" W

PROPIETARIO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
Ing.Alvaro Benitez

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA
Ing. Jonnier Sanchez

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO		**FECHA: 24/Jul/2019**









GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO		**FECHA: 24/Jul/2019**





Boyacá

FORMATO

VERSIÓN: 0
CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
FECHA: 19-09-2024

ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA

FECHA DE LA PRESENTE ACTA		FECHA	
CONTRATO	001 DE 2023	INTERVENTOR	INTEREMERGENCIAS NORTE
CONTRATISTA	NYS CONSTRUCOL	REVISÓ	
ELABORÓ	Alvaro Zamir Bautista		

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA — Negativo N°



DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: Misión de Vida
Dirección: Vereda Quitasol Puerto Boyaca Vía Cultura
Teléfono: 312 228 9024
long. Del frente (m): 8 Metros
N° De pisos: 1
Estrato: 1

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energía	X		
teléfono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda	X	Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldío	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar		Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

Estructura	X	concreto	X	mamposteria	X	prefabricado	otra
paredes	X	bloque	X	ladrillo			otra
puertas	X	madera		metalicas			otra
puertas	X	rustico		calle	X	internas	X garaje
cubierta		concreto	X	teja acrilica		asbesto cem.	otra
N° de pisos							

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 19-01-2024

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Me encuentro con la Señora Myriam en su respectivo predio el cual se encuentra ubicado en las coordenadas: 5°25'205"N 73°6'514"W, se le hace la explicación respecto a la ejecución que se va a realizar en su predio; el cual constara de la siguiente intervención: en la parte contra el talud se van a construir 120 metros lineales de filtro el cual va a descolar en la alcantarilla que se va a construir con una caja de descole y su respectivo descole en bolsa Cretos, el tubo a instalar es de 36 pulgadas Novafor, se realizara un mejoramiento con recebo para habilitar el trafico de manera atendida; finalmente se realizara el descole con una zanja de 99 metros lineales el cual atravesara su respectivo predio y el descole sera en la quebrada para de esta manera mitigar el daño ocasionado debito al nacimiento de agua presentado en el talud respecto a la vía, mencionan que esta problemática lleva más de cinco años y aún no se había dado una respectiva solución.

Finalmente su casa se ve afectada por un cuño y la construcción que si llegue a solicitar material al finalizar la construcción de la obra se le pueda ser entregado a ella para realizar un mejoramiento en su vivienda afectada de esta manera queda autorizada la intervención en su predio con esa respectiva ayuda que se pueda dar.

PROPIETARIO	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA
	Ing.Alvaro Benitez	Ing. Jonnier Sanchez

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**VERSIÓN: 0**
	CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	**FECHA: 24/Jul/2019**









Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	09-01-2026	FECHA	09-01-2026
CONTRATO	001 DE 2023	INTERVENTOR	INTERMERGENCIAS NORTE
CONTRATISTA	NYS CONSTRUCOL	REVISÓ	
ELABORÓ	Alvaro Javier Benitez A.		

REGISTRO FOTOGRAFICO FACHADA — Negativo N°

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: Blanca Nieves Sanchez Espinosa
Dirección: Vereda Estadal. Hoz.
Teléfono: 3163782861
long. Del frente (m): 10 Metros
N° De pisos: 1
Estrato: 1

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energía	X		
teléfono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda	X	Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Bahío	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar		Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto	X	mampostería	X	prefabricado	otra
paredes		bloque	X	ladrillo			otra
puertas		madera	X	metálicas			otra
puertas	X	marmo		calle	X	internas	garaje
cubierta		concreto	X	teja acrílica		asbesto cem.	otra
N° de pisos	1						

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
		FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)


Se realizó acta de cierre de vecindad con la propietaria Blanca Sanchez donde queda constancia de que no se afecto nada en su respectivo predio ni en su casa, queda la respectiva constancia de satisfacción y con la señora Blanca quedando en satisfacción ambas partes. vereda Cortadera Páez Boyacá.

Blanca Sánchez
PROPIETARIO

Jhonatan Herrera
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA



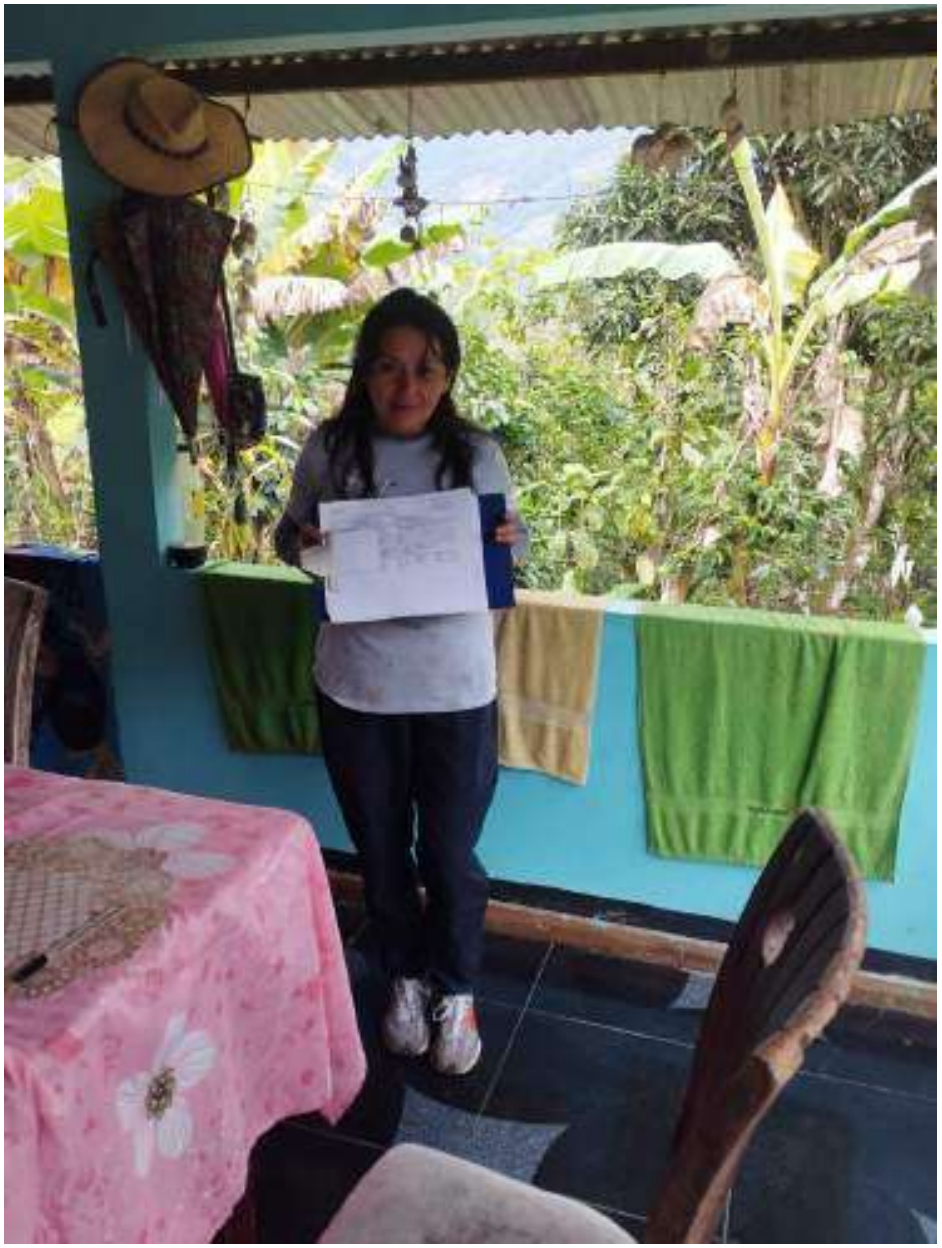

ACTAS DE ENTREGA A LA COMUNIDAD



MUNICIPIO DE VIRACACHA

boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-039
ACTA DE ENTREGA A LA COMUNIDAD		FECHA: 15/01/2025

FECHA PRESENTE ACTA	15 DE ENERO DEL 2025		
CONTRATO/CONVENIO No.	001 DE 2023	FECHA	4/01/2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA		
CONTRATISTA	NYS CONSTRUCOL S.A.S		
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE		
PLAZO	11 MESES Y 26 DÍAS		

En el municipio de viracachá a los (15) días del mes de Enero del 2025

se reunieron los señores : JHONATAN BRAYAN MENESES. en calidad de R/L de NYS construcol, contratista de Obra y JUAN FRANCISCO PACHON. En calidad de R/L de consorcio interemergencias norte, contratista de interventoria, los representantes de la entidad y comunidad del municipio de VIRACACHÁ - BOYACÁ. entre los municipios de Virachá y Clenega para suscribir la presente acta del contrato de referencia.

TEMAS TRATADOS

Considerando la imperativa necesidad de intervención en esta zona, se llevó a cabo una obra que incluyo la construcción de un alcantarillado de con tubería de PVC de 36" estas medidas tienen como objeto. garantizar un correcto flujo de agua en este elemento de drenaje

Obra Ejecutada:

- Construcción de una alcantarilla
- Construcción de un filtro hacia el talud
- Mejoramiento con material de afirmado, para la recuperación de la sección de la vía
- Se realiza con bolsacreto. las aletas y el muro de la alcantarilla del descole. así mismo se ejecuta la construcción de la zanja de descole desde donde termina la alcantarilla hasta llegar a una quebrada.

Es fundamental la colaboración del municipio y de la comunidad en general para llevar a cabo tareas de manteamiento rutinario, con el fin de preservar los elementos constructivos. Su apoyo es imprescindible para asegurar que estas infraestructuras continúen cumpliendo con su funcionalidad a lo largo del tiempo.

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Personería Municipal
Viracacha
HORA: 4:35
QUIEN RECIBE:
No. RADICADO: 005-2025
Recibido

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervenieron.

Firma:
Nombre: Francisco Pachch
INTERVENTOR/SUPERVISOR

Firma: Jhonaton Meneses
Nombre: Jhonaton Meneses
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Fredy G Pun Pucha
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO.

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y ENTIDAD (MUNICIPIO)

Nombre y Apellidos	N° de Cedula	Celular	Firma
Fredy G Pun Pucha	7198089	3127130267	
Cristian Andres Bravo Arce	1049648066	3144522130	
Edgar Eduardo Cano	19.075.007	3112527411	
Henry Vargas Silva	71392278	3219509702	
Maria Cristina Canaca	37671304	3106780201	

MUNICIPIO DE CHITARAQUE

DEPARTAMENTO BOYACÁ
MUNICIPIO CHITARAQUE
PERSONERÍA MUNICIPAL
FECHA 11/02/25
HORA 3:35pm
CONSECUTIVO No.
FOLIOS 24
RECIBIDO APB

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-039
ACTA DE ENTREGA A LA COMUNIDAD		FECHA: 07/02/2025

FECHA PRESENTE ACTA	07 DE FEBRERO DEL 2025		
CONTRATO/CONVENIO No.	001 DE 2023	FECHA	4/01/2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA		
CONTRATISTA	NYS CONSTRUCOL S.A.S		
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE		
PLAZO	11 MESES Y 26 DÍAS		

En el municipio de Chitaraque a los (7) días del mes de Febreo del 2025

se reunieron los señores: JHONATAN BRAYAN MENESES. en calidad de R/L de NYS construcol, contratista de Obra y JUAN FRANCISCO PACHON. En calidad de R/L de consorcio Interemergencias norte, contratista de interventoría. Los representantes de la entidad y comunidad del municipio, en las coordenadas 6°02'53,1"N 73°26'34,2"O. de la sección de vía principal hacia CHITARAQUE BOYACÁ. para suscribir la presente acta del contrato de referencia.

TEMAS TRATADOS

Considerando la imperativa necesidad de intervención esta zona, se lleva a cabo una obra que incluyo la construcción de un muro de contención de una longitud de 21 metro con una altura entre la pantalla, la zarpa y llave de 5.70m de alto. El cual se construye mediante los requerimientos que presenta del estudio de suelos y el tipo de topografía que se tiene en el área a intervenir.

Este proyecto se lleva a cabo con el propósito de garantizar la estabilidad del terreno y la seguridad de la vía. Debido a las altas precipitaciones en la región. El suelo alcanza un elevado grado de saturación, lo que provoca deslizamientos continuos de tierra y reduce el área efectiva de la carretera. Esto no solo pone en riesgo la infraestructura vial, sino que también representa un riesgo para la comunidad, el transporte y el eflujo socioeconómico de la región.

Obra Ejecutada:

- Muro de contención de 21m de longitud x 4.20m altura de pantalla con un espesor proyectado de 0.35m.

- Construcción de filtros y lloraderos en la parte interior y exterior del muro de contención. Para reducir la saturación que continuamente presenta el terreno intervenido

- Mejoramiento con material de afirmado, para la recuperación de la sección de la vía.

Es fundamental la colaboración del municipio y de la comunidad en general para llevar a cabo tareas de manteamiento rutinario, con el fin de preservar los elementos constructivos. Su apoyo es imprescindible para asegurar que estas infraestructuras continúen cumpliendo con su funcionalidad a lo largo del tiempo.

Powered by CamScanner

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____ Firma: Jhonatan Meneses

Nombre: Francisco Pacheco Nombre: Jhonatan meneses

INTERVENTOR/SUPERVISOR. CONTRATISTA.

Firma: _____

Nombre: Heiber Leonardo Niño

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO. secretario planeación

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y ENTIDAD (MUNICIPIO)

Nombre y Apellidos	Nº de Cedula	Celular	Firma
Cindy Silva Sánchez	1010183344	3115714447	Cindy Silva.
Ana Mercedes Cabrera	23533095	3219629156	
Elaiza Sanchez R.	23533347	3112078032	
Carolina Castellanos	1103714251	3208744234	
Johan Sandoval L.	1098216649	3204616007	
Jenny Sofía Guerrero U	23.533.654	3208602475	
Nikde Natalia Robles Rivera	1051288047	3213147593	
[illegible]	2353834	3115486277	
Yuli Paola Rojas M.	1.051.286.247	3212705906	

Powered by CamScanner



MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-039
ACTA DE ENTREGA A LA COMUNIDAD		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	19 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATO/CONVENIO No.	001 DE 2023	FECHA	4/01/2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA		
CONTRATISTA	NYS CONSTRUCOL S A S		
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE		
PLAZO	11 MESES Y 26 DÍAS		

En el municipio de Campohermoso en el corredor vial entre Páez y Campohermoso a los (19) días del mes de Diciembre del año 2024 se reunieron los señores JHONATAN BRAYAN MENESES en calidad de R/L de NYS Construcol, contratista obra y JUAN FRANCISCO PACHON En calidad de R/L de consorcio interemergencias norte, contratista interventoría los representantes de la entidad/comunidad del municipio de Campohermoso Boyacá, en el corredor vial entre los municipios de Páez y Campohermoso para suscribir la presente acta del contrato en referencia.

TEMAS TRATADOS

Considerando la imperativa necesidad de intervención en esta zona, se llevo a cabo una obra que incluyó la construcción de un muro en tierra armada con secciones de "5.00 m de largo, un ancho promedio de 1.70 m y 5.50 m de altura" y "5.00 m de largo, un ancho promedio de 3.70 m y 5.50 m de altura". Esta medida tiene como objetivo garantizar la recuperación de la aleta perdida del respectivo box culvert con este elemento de contención.
Obra ejecutada:
- muro en tierra armada.
Características técnicas:
Sección 1 longitud total del muro en tierra armada: 5.00 metros, Ancho total: 1.70 metros, Altura: 5.50 metros, Sección 2 longitud total: 5.00 metros, Ancho total: 3.70 metros, Altura: 5.50 metros. La obra permitio garantizar una correcta recuperación de la aleta perdida del respectivo box culvert.

Es fundamental la colaboración del municipio y de la comunidad en general para llevar acabo tareas de mantenimiento rutinario, con el fin de preservar y mejorar el estado de los elementos construidos. Su apoyo es imprescindible para asegurar que estas infraestructuras continúen cumpliendo con su funcionalidad a lo largo del tiempo, para tal fin se entrega junto con el acta un manual de mantenimiento y conservación.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: Francisco Pachón
INTERVENTOR/SUPERVISOR

Firma:
Nombre: Jhonatan Meneses
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Fabian Avila.
Representante MUNICIPIO

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y ENTIDAD (MUNICIPIO)

nombre y apellidos	firma y cédula	número celular

PERSONERIA MUNICIPAL
CAMPOHERMOSO BOY.
- 9 ENE. 2025
NIT. 820000474-2
RECIBIDO

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Bellanith Cueto	23339888	3107567981
Alvaro Perez Benitez M.	1030640187	3114741583
Joancer Samuel Sierra	1056506546	3114501169
Mary Jimenez	1048710875	3132696560
Gabriel Huertas	1075587	3161196174

PERSONERIA MUNICIPAL
CAMPOHERMOSO BOY.

- 9 ENE. 2025

NIT. 820000474-2
RECIBIDO

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-039
	ACTA DE ENTREGA A LA COMUNIDAD	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	19 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO/CONVENIO No	001 DE 2023 FECHA 4/01/2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA	NYS CONSTRUCOL S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
PLAZO	11 MESES Y 26 DIAS

En el municipio de Campohermoso en el corredor vial entre Páez y Campohermoso a los (19) días del mes de Diciembre del año 2024 se reunieron los señores JHONATAN BRAYAN MENESES en calidad de R/L de NYS Construcol, contratista obra y JUAN FRANCISCO PACHON En calidad de R/L de consorcio interemergencias norte, contratista interventoría los representantes de la entidad/comunidad del municipio de Campohermoso Boyacá, en el corredor vial entre los municipios de Páez y Campohermoso para suscribir la presente acta del contrato en referencia.

TEMAS TRATADOS

Considerando la imperativa necesidad de intervención en esta zona, se llevo a cabo una obra que incluyó la rehabilitación de un box culvert existente mediante la construcción de una placa de fondo de 0.25 m de altura, 4.50 m de largo y 2.60 m de ancho. Adicional se construyeron dos disipadores de energía con las siguientes medidas 1.) 2.00 m de alto, 2.60 m de ancho y 3.00 m de largo. 2.) 1.00 m de alto, 2.60 m de ancho y 1.50 m de largo. También, se recupero la placa superior del box culvert con una lamina de steeldeck la cual va soportada sobre unas vigas IPE y a la vez está va soportada sobre 6 columnas adicionales. Esta medida tiene como objetivo garantizar un correcto flujo de agua con este elemento de drenaje. Adicional de mejorar el paso vehicular que estaba afectado.

Obra ejecutada:

- rehabilitación box culvert.

Características técnicas:

Longitud total placa de fondo: 4.50 metros, 0.25 metros de altura y 2.60 metros de ancho. Disipadores de energía 1.) 2.00 metros de alto, 2.60 metros de ancho y 3.00 metros de largo. 2.) 1.00 metros de alto, 2.60 metros de ancho y 1.50 metros de largo. Placa con steeldeck: largo 2.60 metros, 3.00 metros de ancho y 0.10 metros de alto. La obra permitio garantizar un correcto manejo de disposición de las aguas superficiales en esta zona.

Es fundamental la colaboración del municipio y de la comunidad en general para llevar acabo tareas de mantenimiento rutinario, con el fin de preservar y mejorar el estado de los elementos construidos. Su apoyo es imprescindible para asegurar que estas infraestructuras continúen cumpliendo con su funcionalidad a lo largo del tiempo, para tal fin se entrega junto con el acta un manual de mantenimiento y conservación.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: Francisco Pachon
INTERVENTOR/SUPERVISOR

Firma:
Nombre: Jhonatan Meneses
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Fabian Avila.
Representante MUNICIPIO

PERSONERIA MUNICIPAL
CAMPOHERMOSO BOY.
- 9 ENE.
NIT. 820000474-2
RECIBIDO

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

18 de noviem...

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y ENTIDAD (MUNICIPIO)

nombre y apellidos	firma y cédula	número celular
Bellanith Cuesta.	23399888	3107567981
Gabriel Huertas	1075587	3161596174
Jennier Samuel Sierra	1056506586	3114501167
Maily Jimenez	1018710897	3132696560
Alvaro Javier Bonilla	1030690187	3114741583

PERSONERIA MUNICIPAL
CAMPOHERMOSO BOY.

- 9 ENE. 2025

NIT. 820000474-2
RECIBIDO

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



MUNICIPIO DE PÁEZ

PERSONERÍA MUNICIPAL PÁEZ
No. RADICADO: ____
FECHA: 10/03/2025
HORA 1:27 Pm
RECIBÍ:

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-039
ACTA DE ENTREGA A LA COMUNIDAD		FECHA: 10/03/2025

FECHA PRESENTE ACTA	10 DE MARZO DEL 2025		
CONTRATO/CONVENIO No.	001 DE 2023	FECHA	4/01/2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA		
CONTRATISTA	NYS CONSTRUCOL S.A.S		
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE		
PLAZO	11 MESES Y 26 DÍAS		

En el municipio de Páez a los (10) días del mes de Marzo del 2025

se reunieron los señores: JHONATAN BRAYAN MENESES. en calidad de R/L de NYS construcol, contratista de Obra y JUAN FRANCISCO PACHON. En calidad de R/L de consorcio Interemergencias norte, contratista de interventoría. Los representantes de la entidad y comunidad del municipio, en las coordenadas 5°05'39,5"N 73°03'50,5"O. en la sección de vía entre Paez y Campohermoso . para suscribir la presente acta del contrato de referencia.

TEMAS TRATADOS

Considerando la imperativa necesidad de intervención en esta zona, se lleva a cabo una obra que incluyo la construcción de un box culvert 2.50 m x 2.50m el cual se construye de acuerdo con las recomendaciones de la cartilla de obras menores del INVIAS. Tomando en cuenta las especificaciones técnicas.

Este proyecto se realiza con el objeto de Garantizar un correcto flujo de agua y una adecuada vía de comunicación entre el municipio de Páez y Campohermoso. Ya que la construcción anterior estaba parcialmente colapsada y la estructura contaba con bastantes grietas en los muros de los costados laterales. Lo que presentaba un riesgo constante para la comunidad y el trafico vehicular en épocas de lluvias. Por consiguiente se realiaza un box culvert el cual va ha garatizar un adecuado manejo del caudal en epocas de lluvias y una estabilidad optima en la via.

Obra Ejecutada:

- Construcción de Box culvert con sus correspondientes secciones.

- Construcción de placa superior en concreto reforzado

- Mejoramiento con material de afirmado, para la recuperación de la sección de la vía.

- Ampliación de las secciones de entrada y salida para la canalización del caudal.

Es fundamental la colaboración del municipio y de la comunidad en general para llevar a cabo tareas de manteamiento rutinario, con el fin de preservar los elementos constructivos. Su apoyo es imprescindible para asegurar que estas infraestructuras continúen cumpliendo con su funcionalidad a lo largo del tiempo.

Powered by CamScanner

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervenieron.

Firma: _____ Firma: Jhonathen Meneses

Nombre: Francisco Pacha Nombre: Jonathen Meneses

INTERVENTOR/SUPERVISOR. CONTRATISTA.

Firma: _____

Nombre: Yilbany Lancheros Moreno Ing. Apoyo

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO.

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y ENTIDAD (MUNICIPIO)

Nombre y Apellidos	N° de Cedula	Celular	Firma
Rigoberto Nuñez	9506085	3112872722	
Wilmer Alfonso	9506151	3133552741	
Reiner Andres Alfonso L.	9434290	3115965965	
Ricardo Fernandez	10175718	3103612399	
José Camilo Chaparro	1002721935	3206326925	
Paula Andrea Daza Acosta	1049655136	3105176193	
Yilbany Lancheros	1057436842	3227056211	

Powered by CamScanner

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-039
ACTA DE ENTREGA A LA COMUNIDAD		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	19 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO/CONVENIO No.	001 DE 2023 FECHA 4/01/2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA	NYS CONSTRUCOL S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
PLAZO	11 MESES Y 26 DIAS

En el municipio de Páez en el corredor vial entre Páez y Campohermoso a los (19) días del mes de Diciembre del año 2024 se reunieron los señores JHONATAN BRAYAN MENESES en calidad de R/L de NYS Construcol, contratista obra y JUAN FRANCISCO PACHON En calidad de R/L de consorcio interemergencias norte, contratista interventoría los representantes de la entidad/comunidad del municipio de Páez Boyacá, en el corredor vial entre los municipios de Páez y Campohermoso para suscribir la presente acta del contrato en referencia.

TEMAS TRATADOS

Considerando la imperativa necesidad de intervención en esta zona, se llevo a cabo una obra que incluyó la construcción de un muro en tierra armada con secciones de 4.00 m de largo, un ancho promedio de 4.90 m y 4.50 m de altura. Esta medida tiene como objetivo garantizar la recuperación de la aleta perdida del respectivo box culvert con este elemento de contención.

Obra ejecutada

- muro en tierra armada.

Características técnicas:

Longitud total del muro en tierra armada : 4.00 metros, Ancho total: 4.90 metros, Altura: 4.50 metros, la obra permitio garantizar una correcta recuperación de la aleta perdida del respectivo box culvert.

Es fundamental la colaboración del municipio y de la comunidad en general para llevar acabo tareas de mantenimiento rutinario, con el fin de preservar y mejorar el estado de los elementos construidos. Su apoyo es imprescindible para asegurar que estas infraestructuras continúen cumpliendo con su funcionalidad a lo largo del tiempo, para tal fin se entrega junto con el acta un manual de mantenimiento y conservación.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: Francisco Pacho
INTERVENTOR/SUPERVISOR

Firma:
Nombre: Jhonatan Meneses
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Gilbany Sanchez Moreno
Representante MUNICIPIO

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y ENTIDAD (MUNICIPIO)

nombre y apellidos	firma y cédula	número celular

PERSONERÍA MUNICIPAL PÁEZ
NO. RADICADO:
FECHA: 03/01/2025
HORA: 4:17 pm

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Manuel Alcides Fonseca	13628573	3234180776
Luis Alberto [illegible]	96046611	3228562814
Eudilberto Mesa	1950552	3194775227
Pedro Pinedos Vega	11'186.371	3104817075
Jonnier Samuel Silva	1058506906	3149301167
Alvaro Javier Bonilla M.	1030690187	3114741583

PERSONERÍA MUNICIPAL PÁEZ
NO. RADICADO:
FECHA: 08/01-2025
HORA: 9:42 Pm
RECIBÍ: Victor Flórez

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



MUNICIPIO DE SAN MATEO

CORRESPONDENCIA RADICADA
PERSONERÍA MUNICIPAL SAN MATEO (BOYACÁ)
FECHA RECIBIDO: 11-03-2025
PAD. No. 2025-032 HORA: 3:30 pm
No. DE FOLIOS: dos (2) folios
TRAMITE:
FUNCIONARIO QUE RECIBE:

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-039
ACTA DE ENTREGA A LA COMUNIDAD		FECHA: 11/03/2025

FECHA PRESENTE ACTA	11 DE MARZO DEL 2025		
CONTRATO/CONVENIO No.	001 DE 2023	FECHA	4/01/2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA		
CONTRATISTA	NYS CONSTRUCOL S.A.S		
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE		
PLAZO	11 MESES Y 26 DÍAS		

En el municipio de San Mateo a los (11) días del mes de Marzo del 2025

se reunieron los señores: JHONATAN BRAYAN MENESES. en calidad de R/L de NYS construcol, contratista de Obra y JUAN FRANCISCO PACHON. En calidad de R/L de consorcio Interemergencias norte, contratista de interventoría. Los representantes de la entidad y comunidad del municipio, en las coordenadas 6°23'37,95"N 72°33'30,3"O. en la sección de vía principal de entrada a San Mateo. para suscribir la presente acta del contrato de referencia.

TEMAS TRATADOS

Considerando la imperativa necesidad de intervención en esta zona, se lleva a cabo una obra que incluyo la construcción de un alcantarillado tomando como referencia el diseño tipo de la poceta de entrada, con tubería pvc de 36", el cabezal de descarga se conformará con bolsas rellenas de concreto, por otro lado, se construirán filtros drenantes por el costado del talud, adicionalmente se relazara la construcción de zanjas de coronación en el talud

Este proyecto se realiza con el objeto de Garantizar un correcto flujo de agua y una adecuada vía de comunicación. Ya que la construcción anterior esta totalmente colapsada. Debido a la saturación de agua que presenta el terreno en la época del invierno. Por lo que se procedió a realizar filtros y un manejo de aguas para evitar y controlar este tipo de inconvenientes.

Obra Ejecutada:

- Construcción de alcantarillados según lo estipulado en el proyecto.

- Construcción de zanja de coronación en la sección del encole y descoles del caudal

- Mejoramiento con material de afirmado, para la recuperación de la sección de la vía.

- Manejo de saturación de agua en el suelo, por medio de filtros de drenaje en la sección del encole del proyecto.

Es fundamental la colaboración del municipio y de la comunidad en general para llevar a cabo tareas de manteamiento rutinario, con el fin de preservar los elementos constructivos. Su apoyo es imprescindible para asegurar que estas infraestructuras continúen cumpliendo con su funcionalidad a lo largo del tiempo.

Powered by CamScanner

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervenieron.

Firma:
Nombre: Francisco Pachon
INTERVENTOR/SUPERVISOR.

Firma: Jhonathan Meneses
Nombre: Jhonathan Meneses
CONTRATISTA.

Firma:
Nombre: Carlos Rojas
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO.

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y ENTIDAD (MUNICIPIO)

Nombre y Apellidos	N° de Cedula	Celular	Firma
Yeison Mariño Diaz	1023960027	3228533682	
Carlos Guillermo R	6049655428	3144812709	
Andrea Maria Valencia	1049653632	3223646112	
Jessica Katia Barrera	1054227021	3112328245	
Mercedes Rojas R	24031004	3138921006	
Yeovanny Salamanca	74712641	3118728547	
Ivan fernando Bautista	1.044634400	314 2402143	

Powered by CamScanner



MUNICIPIO DE SAN EDUARDO

Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-039
ACTA DE ENTREGA A LA COMUNIDAD		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	21 DE JULIO DE 2025		
CONTRATO/CONVENIO No.	001 DE 2023	**FECHA**	4/01/2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATISTA	NYS CONSTRUCOL S.A.S		
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE		
PLAZO	11 MESES Y 26 DIAS		

En el municipio de San Eduardo en el corredor vial entre San Eduardo y Miraflores a los (21) días del mes de Julio del año 2025
se reunieron los señores JHONATAN BRAYAN MENESES en calidad de R/L de NYS Construcol, contratista obra
y JUAN FRANCISCO PACHON En calidad de R/L de consorcio interemergencias norte, contratista interventoría
los representantes de la entidad/comunidad del municipio de San Eduardo Boyacá, en el corredor vial entre los municipios de San Eduardo y Miraflores para suscribir la presente acta del contrato en referencia.

TEMAS TRATADOS

Considerando la imperativa necesidad de intervención en esta zona, se llevo a cabo una obra que incluyó la construcción de una alcantarilla con tubería en lámina galvanizada de 2.50 metros. adicional se construyeron las alteas de acompañamiento tanto en el encole como en el descole de la respectiva alcantarilla cada una con su placa de piso y dentellones para garantizar la estabilidad de la estructura. Esta medida tiene como objetivo garantizar un correcto flujo de agua con este elemento de drenaje.
Obra ejecutada:
- Alcantarilla con tubería en lámina galvanizada de diámetro 2.50 metros.
Características técnicas:
Longitud total de la alcantarilla: 7.00 metros, Ancho total con aletas para encole y descole: 7.90 metros, Altura: 3.40 metros, Espesor: 0.30 metros, la obra permitio garantizar un correcto manejo de disposición de las aguas superficiales y de la quebrada que cruza en esta zona.

Es fundamental la colaboración del municipio y de la comunidad en general para llevar acabo tareas de mantenimiento rutinario, con el fin de preservar y mejorar el estado de los elementos construidos. Su apoyo es imprescindible para asegurar que estas infraestructuras continúen cumpliendo con su funcionalidad a lo largo del tiempo, para tal fin se entrega junto con el acta un manual de mantenimiento y conservación.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervenieron.

Firma:	Firma: Jhonatan Meneses	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre: Yeison Alfonso Caitán
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONTRATISTA	Representante MUNICIPIO

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y ENTIDAD (MUNICIPIO)

Powered by CamScanner

nombre y apellidos	firma y cédula	número celular
Miguel Angel Albarracin	1057164449	3204214477
Aquilino Lopez B	4055570	3144305191
Eliana Camila Vargas R.	CVargas 1020752404	3142080370
Sibaute Martin	1057164241	3134748102
Yerson Alfonso V	1057164077	3102587789
Andres Camilo Mora V.	Camilo Mora 1058058985	3142295906

Powered by CamScanner



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-039
	ACTA DE ENTREGA A LA COMUNIDAD	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	20 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO/CONVENIO No	001 DE 2023 FECHA 4/01/2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA	NYS CONSTRUCOL S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
PLAZO	11 MESES Y 26 DIAS

En el municipio de Santa María en el corredor vial entre Santa María y Medina a los (20) días del mes de Diciembre del año 2024 se reunieron los señores JHONATAN BRAYAN MENESES en calidad de R/L de NYS Construcol, contratista obra y JUAN FRANCISCO PACHON En calidad de R/L de consorcio interemergencias norte, contratista interventoría los representantes de la entidad/comunidad del municipio de Santa María Boyacá, en el corredor vial entre los municipios de Santa María y Medina para suscribir la presente acta del contrato en referencia.

TEMAS TRATADOS

Considerando la imperativa necesidad de intervención en esta zona, se llevo a cabo una obra que incluyó la construcción de una alcantarilla de 36" con tubería de PVC. Esta medida tiene como objetivo garantizar un correcto flujo de agua con este elemento de drenaje.

Obra ejecutada:

- Cajas de encole y descole en concreto reforzado.

Características técnicas:

Longitud total de la tubería 6.50 metros, la obra permitio garantizar un correcto manejo de disposición de las aguas superficiales en esta zona.

Es fundamental la colaboración del municipio y de la comunidad en general para llevar acabo tareas de mantenimiento rutinario, con el fin de preservar y mejorar el estado de los elementos construidos. Su apoyo es imprescindible para asegurar que estas infraestructuras continúen cumpliendo con su funcionalidad a lo largo del tiempo, para tal fin se entrega junto con el acta un manual de mantenimiento y conservación.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervenieron.

Firma:
Nombre:
INTERVENTOR/SUPERVISOR

Firma: Jhonatan Meneses
Nombre: Jhonatan Meneses
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: GLORIA BERNAL OVALLOS
Representante MUNICIPIO

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y ENTIDAD (MUNICIPIO)

nombre y apellidos	firma y cédula	número celular

PERSONERIA MUNICIPAL
SANTA MARIA BOYACA
RADICADO
No. — Fecha 9-Ene-2025
Hora 2:50 pm Folio 2

Escaneado con CamScanner

Marcos Antonio Díaz	4279303 MARCO	3112856712
Jose Gabriel Cortes	7276237 MU2BYC	3213549708
Camilo Cadena	1022901591 Camilo	3166669823
Ruperto Arriaga	7413254728 Ruperto	3219141626
Rocio carrecho	1104774860 Rocio	3103252836
Lifonso Parra	7215712	3123680911
Jannier Samuel Serna	1056565656	3114501167
Diego Javier Bonilla M.	1030690187	3114741583

Escaneado con CamScanner

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-039
ACTA DE ENTREGA A LA COMUNIDAD		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	20 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO/CONVENIO No	001 DE 2023 FECHA 4/01/2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA	NYS CONSTRUCOL S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
PLAZO	11 MESES Y 26 DIAS

En el municipio de Santa María en el corredor vial entre Santa María y Medina a los (20) días del mes de Diciembre del año 2024

se reunieron los señores JHONATAN BRAYAN MENESES en calidad de R/L de NYS Construcol, contratista obra y JUAN FRANCISCO PACHON En calidad de R/L de consorcio interemergencias norte, contratista interventoría los representantes de la entidad/comunidad del municipio de Santa María Boyacá, en el corredor vial entre los municipios de Santa María y Medina para suscribir la presente acta del contrato en referencia.

TEMAS TRATADOS

Considerando la imperativa necesidad de intervención en esta zona, se llevo a cabo una obra que incluyó la construcción de una alcantarilla de 36" con tubería de PVC. Esta medida tiene como objetivo garantizar un correcto flujo de agua con este elemento de drenaje.

Obra ejecutada:

- Cajas de encole y descole en concreto reforzado.

Características técnicas.

Longitud total de la tubería 6.50 metros, la obra permitio garantizar un correcto manejo de disposición de las aguas superficiales en esta zona.

Es fundamental la colaboración del municipio y de la comunidad en general para llevar acabo tareas de mantenimiento rutinario, con el fin de preservar y mejorar el estado de los elementos construidos. Su apoyo es imprescindible para asegurar que estas infraestructuras continúen cumpliendo con su funcionalidad a lo largo del tiempo, para tal fin se entrega junto con el acta un manual de mantenimiento y conservación.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervenieron.

Firma:
Nombre: Francisco Pachon
INTERVENTOR/SUPERVISOR

Firma:
Nombre:
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
Representante MUNICIPIO

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y ENTIDAD (MUNICIPIO)

nombre y apellidos	firma y cédula	número celular

PERSONERIA MUNICIPAL
SANTA MARIA BOYACA
RADICADO
Fecha 9-Ca-2025
No. 6 Folio 7
Hora 2:30 pm

Escaneado con CamScanner

Marcos Antonio Diaz	7279303 MARCO	3112856712
Jose Gabriel Cortes	7276237 Muso	3213549108
Camilo Cadena	1072905815 Camilo C.	3166669823
Ruberto Arroyo	1143254728 Ruberto	3191911B926
Borja Sanchez	1144774860 Borja	3132533836
Alfonso Perilla	7319712	2123680211
Jeanneth Samuel Silva	1056506586	3114501167
Alvaro Jesus Benitez M.	1030690187	3114744583

Escaneado con CamScanner

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-039
ACTA DE ENTREGA A LA COMUNIDAD		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	20 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO/CONVENIO No	001 DE 2023 FECHA 4/01/2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA	NYS CONSTRUCOL S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
PLAZO	11 MESES Y 26 DIAS

En el municipio de Santa Maria en el corredor vial entre Santa Maria y Medina a los (20) días del mes de Diciembre del año 2024 se reunieron los señores JHONATAN BRAYAN MENESES en calidad de R/L de NYS Construcol, contratista obra y JUAN FRANCISCO PACHON En calidad de R/L de consorcio interemergencias norte, contratista interventoria los representantes de la entidad/comunidad del municipio de Santa Maria Boyaca, en el corredor vial entre los municipios de Santa Maria y Medina para suscribir la presente acta del contrato en referencia

TEMAS TRATADOS

Considerando la imperativa necesidad de intervención en esta zona, se llevo a cabo una obra que incluyó la construcción de un box culvert de sección interna de 2.00 m de base y 2.00 m de altura. Esta medida tiene como objetivo garantizar un correcto flujo de agua con este elemento de drenaje

Obra ejecutada

- box culvert concreto reforzado

Caracteristicas técnicas:

Longitud total de box culvert: 6.00 metros, Ancho total: 2.50 metros, Altura: 2.50 metros, la obra permite garantizar un correcto manejo de disposición de las aguas superficiales en esta zona

Es fundamental la colaboración del municipio y de la comunidad en general para llevar acabo tareas de mantenimiento rutinario, con el fin de preservar y mejorar el estado de los elementos construidos. Su apoyo es imprescindible para asegurar que estas infraestructuras continúen cumpliendo con su funcionalidad a lo largo del tiempo, para tal fin se entrega junto con el acta un manual de mantenimiento y conservación.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervenieron.

Firma
Nombre: Juan Francisco Pachon
INTERVENTOR/SUPERVISOR

Firma
Nombre: Jhonatan Meneses
CONTRATISTA

Firma
Nombre: Eduardo Barrera Ardila
Representante MUNICIPIO

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y ENTIDAD (MUNICIPIO)

nombre y apellidos	firma y cédula	número celular
	727303MGRC	3112856712

PERSONERIA MUNICIPAL
SANTA MARIA BOYACA
RADICADO
No. — Fecha 9-Ene-25
Hora 2:50 p.m. Folio 2
Firma

Escaneado con CamScanner

Jose Gabriel Cortes	7276731 Muzo	3213549108
Camilo Cadena	1023905395 Camilo C	3166669823
Ruperto Arrollo	74325117 Ruperto	3219118996
Rocio Camacho	1104774860 Rocio	7103255836
Lisandro Perilla	73167 12	3123680211
Jenner Samuel Sierra	1056506596	3145011 67
Alvaro Yair Contreras M.	1030690187	3114741583

Escaneado con CamScanner



MUNICIPIO DEL COCUY

	FORMATO	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-039
ACTA DE ENTREGA A LA COMUNIDAD		**FECHA: 04/02/2025**

FECHA PRESENTE ACTA	04 DE FEBRERO DEL 2025		
CONTRATO/CONVENIO No.	001 DE 2023	FECHA	4/01/2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA		
CONTRATISTA	NYS CONSTRUCOL S.A.S		
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE		
PLAZO	11 MESES Y 26 DÍAS		

En el municipio del Cocuy a los (4) días del mes de Febrero del 2025

se reunieron los señores : JHONATAN BRAYAN MENESES, en calidad de R/L de NYS construcol, contratista de Obra y JUAN FRANCISCO PACHON. En calidad de R/L de consorcio interemergencias norte, contratista de interventoria, los representantes de la entidad y comunidad del municipio del COCUY - BOYACA. entre la vía que comunica el Cocuy y chita en las coordenadas 6°20'13.2"N 72°27'57,4"O para suscribir la presente acta del contrato de referencia.

TEMAS TRATADOS

Considerando la imperativa necesidad de intervención en esta zona, se lleva a cabo una obra que incluyo la construcción de un box culvert 3.00m x 2.50m x 6.00m el cual se construye de acuerdo con las recomendaciones de la cartilla de obras menores del INVIAS. Tomando en cuenta las especificaciones técnicas.

Este proyecto se realiza con el objeto de Garantizar un correcto flujo de agua y una adecuad vía de comunicación entre el cocuy y chita Boyacá. Ya que la construccion anterior estaba parcialmente colapsada y contaba en la parte superior con unas vigas de madera las cuales (hacían de puente) entre los tramos de la vía. Cabe destacar que estas vigas presentaban deformaciones por el peso vehicular y descomposición en las puntas externas debido a la humedad del terreno siendo asi un peligro tanto para la comunidad como para el tráfico vehicular.

Obra Ejecutada:

- Construcción de Box culvert con sus correspondientes secciones.
- Construcción de placa superior en concreto. Remplazando las vigas de madera
- Mejoramiento con material de afirmado, para la recuperación de la sección de la vía.
- Ampliación de las secciones de entrada y salida para la canalización del caudal.

Es fundamental la colaboración del municipio y de la comunidad en general para llevar a cabo tareas de mantenimiento rutinario, con el fin de preservar los elementos constructivos. Su apoyo es imprescindible para asegurar que estas infraestructuras continúen cumpliendo con su funcionalidad a lo largo del tiempo.

PERSONERIA
MUNICIPAL DE EL COCUY BOYACA
Radicado 032 Folios 02
Fecha 04 Febrero 2025 Hora 4:30 pm Carpeta
Recibido

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron

Firma
Nombre
INTERVENTOR/SUPERVISOR

Firma Jhonton Menses
Nombre Jhonton Menses
CONTRATISTA

Firma
Nombre Luis Alejandro Vargas Ruda
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO.

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y ENTIDAD (MUNICIPIO)

Nombre y Apellidos	N° de Cedula	Celular	Firma
Boonis Alexander Perez	1030581687	3118016219	
Alvaro Garcia O	79315452	3113541787	
Gonzalo Ruiz Ruiz	3718076484		
Ruth Sandoval	1049413071	3134812638	
Luis VARGAS R.	1049658762	3153421661	

ACTAS DE CIERRE DE VECINDAD



ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

MUNICIPIO DE VIRACACHA

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	11/01/2025	FECHA	11/01/2025
CONTRATO	001 DE 2023	INTERVENTOR	Emergencias Norte
CONTRATISTA	NYS CONSTRUCOL	REVISÓ	
ELABORÓ			

REGISTRO FOTOGRAFICO FACHADA — Negativo N°

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: Miriam Velazco
Dirección: Vereda la boya - Viracacha.
Teléfono: 311 473 91 00
long. Del frente (m): 12 metros
N° De pisos: 1
Estrato: 1

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua	X		
alcantarillado	X		
energia	X		
telefono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda	X	Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldio	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar		Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto		mamposteria		prefabricado	otra
paredes	X	bloque	X	ladrillo			otra
puertas	X	madera		metalicas			otra
puertas		numero		calle		internas	garaje
cubierta	X	concreto		teja acrilica		asbesto cem.	otra
N° de pisos	1						

Powered by CamScanner

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA		FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se realiza acta de cierre de Vecinda, Con la señora miriam Velazco donde se deja constancia del optimo estado de la vivienda y donde se ejecuto proyecto de igual manera se da cumplimiento a lo acoidado en el acta de Vecindan de inicio. con el respectivo ducto

Maria Velasco.
PROPIETARIO

Jhontan Meneses
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

Powered by CamScanner



ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

MUNICIPIO DE CHITARAQUE

	FORMATO	VERSIÓN: 0
Gobernación de Boyacá		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - CIERRE	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	17-01-2025	FECHA	17-01-2025
CONTRATO	567 DE 2023	INTERVENTOR	INTEREMERGENCIAS NORTE
CONTRATISTA	INTEREMERGENCIAS NORTE	REVISÓ	
ELABORÓ	Alvaro Ramir Benitez M.		

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA — Negativo N°

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: Ferney Alberto Mejia – Nidia Raquel Garces.
Dirección: Chitaraque Vereda Gacio y Galapas.
Teléfono: 3102085260 – 3143020873
long. Del frente (m): 10 x 15 m.
N° De pisos: 1
Estrato: 2

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua	X		
alcantarillado		X	
energia	X		
telefono		X	
gas	X		Natural
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda	X	Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldio	
Valor Intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar		Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura	X	concreto	X	mamposteria		prefabricado		otra	
paredes	X	bloque	X	ladrillo	X			otra	
puertas	X	madera	X	metalicas				otra	
puertas	X	numero		calle		internas		garaje	
cubierta	X	concreto		teja acrilica		asbesto cem.		otra	
N° de pisos	1								

Powered by CamScanner

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - CIERRE	FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se realizó el acta de vecindad de cierre con los respectivos dueños de los predios donde se ejecuto la obra, se puede evidenciar el perfecto estado donde se construyo el muro y no se presento ningun reclamo de parte de los propietarios.

Nydia Raquel Garcés
PROPIETARIO 23533263

Jhonatan Meneses.
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

Powered by CamScanner



ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 09-01-2025
CONTRATO: [illegible] DE 2023
CONTRATISTA: NYS CONSTRUCTOR
ELABORÓ: Alvaro Ramiro Castro Mo

FECHA: 09-01-2025
INTERVENTOR:
REVISÓ:

INTERVENTORIAS NORTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO ESTADO PREVIO — Negativo N°

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: Bellarith Cuesta Monroy.
Dirección: Vereda Centro Pajal Campohermoso.
Teléfono: 3132813816.
Long. Del frente (m): 16 metros.
N° De pisos: 1
Estrato: 1

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energía	X		
teléfono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda	X	Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Balneo	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar		Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto		mamposteria		prefabricado	otra
paredes	X	bloque		ladrillo	X		otra
puertas	X	madera		metalicas	X		otra
puertas		numero		calle		externas	garaje
cubierta		concreto		teja acrilica	X	asbesto cem.	otra
N° de pisos	1						

Powered by CamScanner

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCION (Fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se realizó acta de cierre de Vecindad con la propietaria Bellanith; donde queda constancia que no se afecto ni su vivienda, ni el respectivo predio donde se realizó la ejecucion de la obra, queda constancia del cumplimiento acordado en la acta de vecindad inicial con la respectiva ducha.

Se deja aclaración que el esposo Jose Vargas, autoriza a su esposa para realizar el acta de cierre de Vecindad.

Bellanith Cuervo M
PROPIETARIO

Yhandra Henao
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner




Powered by CamScanner



ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

MUNICIPIO DE PAEZ

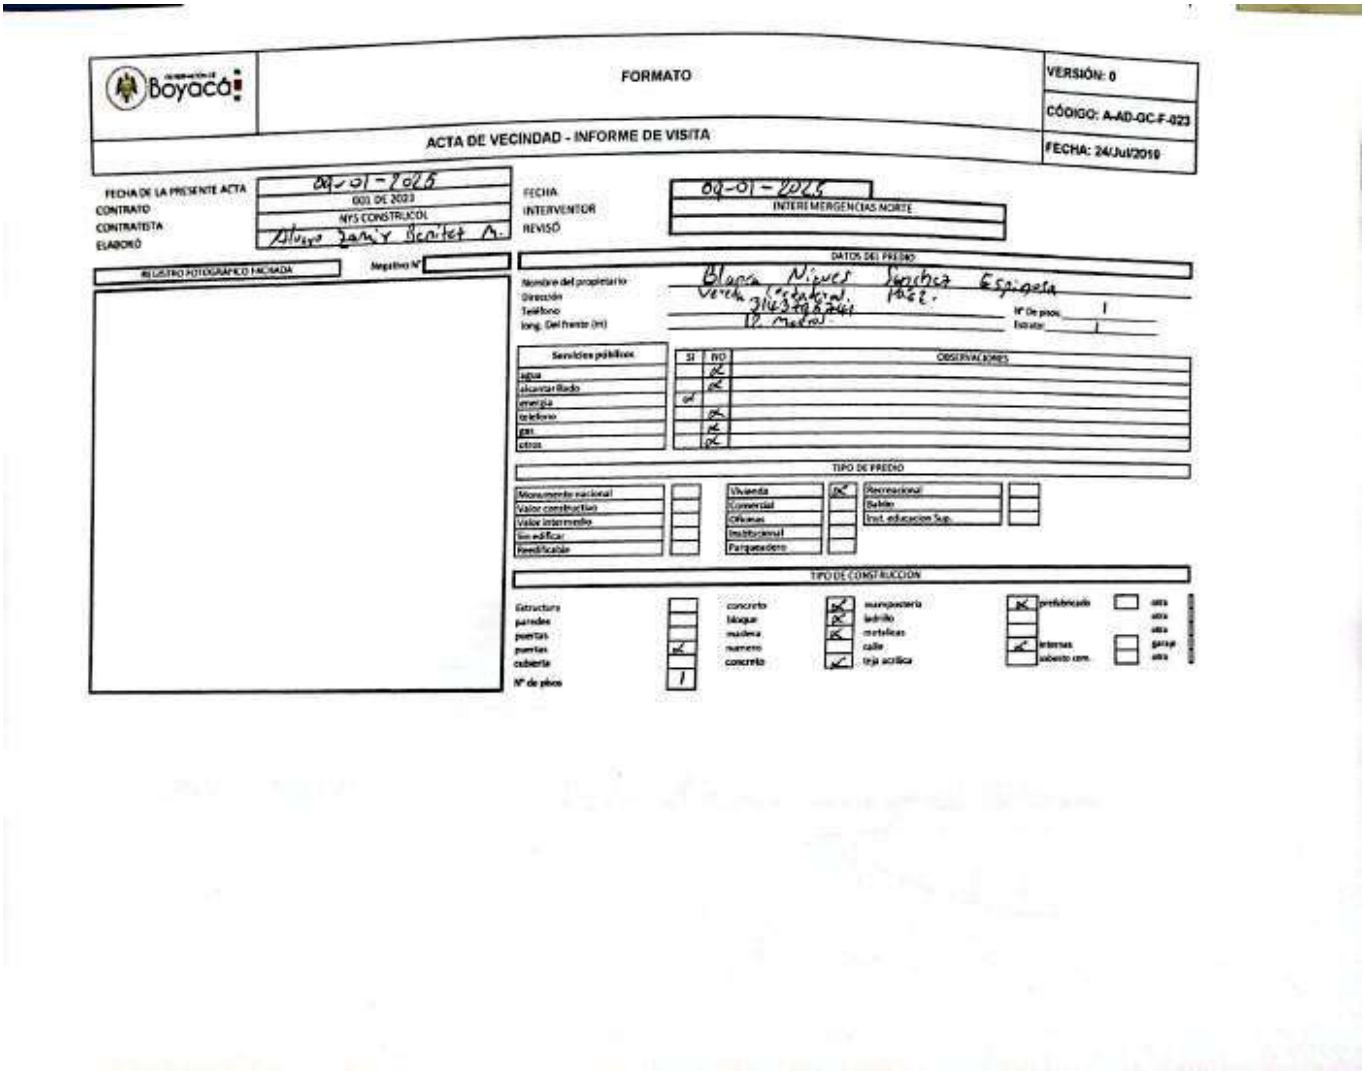

FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-023

FECHA: 24/Jul/2019

ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 09-01-2026
CONTRATO: 003 DE 2023
CONTRATISTA: NYS CONSTRUCOL
ELABORÓ: Alvaro Javier Bonilla B.

FECHA: 09-01-2026
INTERVENTOR: INTEREMERGENCIAS NORTE
REVISÓ:

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA

Negativo N°

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: Blanca Nives Sanchez Espinosa
Dirección: Vereda Ziquiza
Teléfono: 3163782441
long. Del frente (m): 12 Metros
N° De pisos: 1
Estrato: 1

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energía	X		
teléfono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda	X	Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Bahío	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
No edificar		Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto	X	mampostería	X	prefabricado	otra
paredes		bloque	X	ladrillo			otra
puertas		madera	X	metálicas			otra
puertas	X	numero		calle	X	Internas	garaje
cubierta		concreto	X	teja acrílica		asbesto cem.	otra
N° de pisos	1						

Powered by CamScanner

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
		FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se realizó acta de cierre de vecindad con la propietaria Blanca Sanchez donde queda constancia de que no se afecto nada en su respectivo predio. Al cerrar su casa queda la respectiva constancia de "Satisfacción" con la señora Blanca quedando en satisfacción ambas partes. "Vereda Cortadera" Páez Boyacá.

Blanca Sánchez
PROPIETARIO


Jonatan Herrera
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

amScanner



Powered by CamScanner

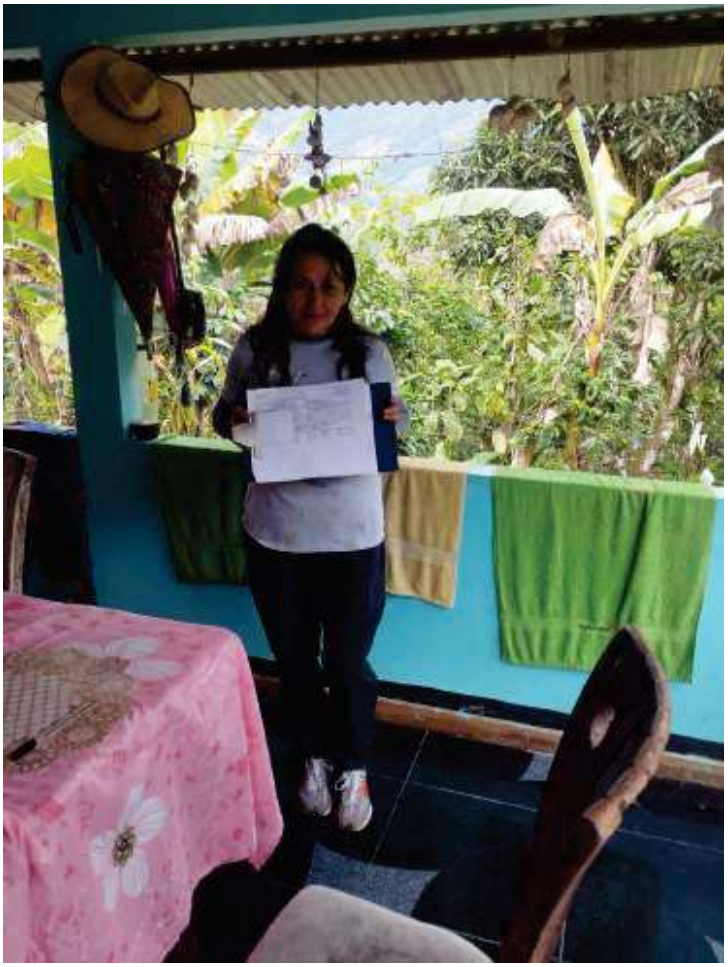

Powered by CamScanner



ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

MUNICIPIO DE SAN EDUARDO

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - CIERRE	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	21-07-2025	FECHA	21-07-2025
CONTRATO	567 DE 2023	INTERVENTOR	INTEREMERGENCIAS NORTE
CONTRATISTA	INTEREMERGENCIAS NORTE	REVISÓ	
ELABORÓ	Alvaro Enrique Benitez M.		

REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA Negativo N°

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: Wilson Rolando Rodriguez Sanchez.
Dirección: Vereda San Pablo Sector Sucre San Eduardo.
Teléfono: 3214488772
long. Del frente (m): 8 metros.
N° De pisos: 1
Estrato: 1

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energia	X		
telefono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda	X	Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldio	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar		Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura	X	concreto	X	mamposteria	X	prefabricado	otra
paredes		bloque	X	ladrillo			otra
puertas		madera		metalicas	X		otra
puertas	X	numero		calle	X	internas	garaje
cubierta		concreto		teja acrilica	X	asbesto cem.	otra
N° de pisos	1						

Powered by CamScanner

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - CIERRE	FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se realizo el acta de vecindad de cierre con el respectivo propietario Wilson Rodriguez; donde se puede evidenciar el perfecto estado de la vivienda, se logro mitigar el daño a la corriente del señor gracias a la construcción de la alcantarilla, lo cual deja conforme a don Wilson y queda agradecido por la solución.

Wilson Rodriguez	Jhonatan Menceses.	
PROPIETARIO	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

Powered by CamScanner



ACTA DE VECINDAD
DE CIERRE

MUNICIPIO DE
SANTA MARIA - 1

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 24-01-2025
CONTRATO: 003 DE 2025
CONTRATISTA: NYS CONSTRUCOL
ELABORÓ: Diana Ivon Beltran M.

FECHA: 24-01-2025
INTERVENTOR: INTEREMERGENCIAS NORTE
REVISÓ:

REGISTRO FOTOGRAFICO FACHADA

Negativo Nº:

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: Liliana Peralta
Dirección: Vereda Tabaquera Sector Mina
Teléfono: 317 368 0711
long. Del frente (m): 8 metros.
Nº De pisos: 1
Estrato: 1

Servicios públicos	SI	NO
agua		X
alcantarillado		X
energia		X
telefono		X
gas		X
otros		X

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda	X	Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldio	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar		Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto		mamposteria		prefabricada	X otra
paredes	X	bloque		ladrillo			otra
puertas		madera	X	metalicas			otra
puertas	X	marco		calle	X	internas	garaje
cubierta		concreto	X	teja acrilica			otra
Nº de pisos	1						

Powered by CamScanner

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se realizó acta de cierre de Vecindad con el propietario Litroso Peñita; donde queda constancia que no se afecto ni su vivienda ni el respectivo predio donde se realizó la ejecución de la obra, de tal manera se cumplió con lo acordado en la acta de vecindad inicial con el respectivo dueño.

PROPIETARIO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



ACTAS DE VECINDAD
DE CIERRE

MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA - 2

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	09-01-2023	FECHA	09-01-2023.
CONTRATO	001 DE 2023	INTERVENTOR	INTEREMERGENCIAS NORTE
CONTRATISTA	NYS CONSTRUCOL	REVISÓ	
ELABORÓ	Alvaro Franco Garcia M.		

REGISTRO FOTOGRAFICO FACHADA — Negativo N°

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: Jose Garcia
Dirección: Vereda Cartagena Santa Maria
Teléfono: 3123379509
Long. Del frente (m): Metros
N° De pisos: 1
Estrato:

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energia	X		
telefono		X	
gas		X	
otros		X	

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda	X	Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Ajidio	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar		Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura		concreto		mamposteria	X	prefabricado	otra
paredes	X	bloque		ladrillo			otra
puertas	X	madera	X	metalicas			otra
puertas		marmera		calle	X	internas	garaje
cubierta		concreto	X	teja acrilica		asbesto cem	otra
N° de pisos	1						

Powered by CamScanner

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se realizó acta de cierre de vecindad con el propietario Jose Garcia donde queda constancia que no se afecto ni su vivienda ni el respectivo predio donde se realizó la ejecución de la obra, de tal manera se cumplió con lo acordado en la acta de vecindad inicial con el respectivo dueño.

Jose Garzon
PROPIETARIO

Jhonatan Herrera
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

MUNICIPIO DE SANTA MARIA - PUNTO 3

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - CIERRE	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	04-01-2025	FECHA INTERVENTOR	04-01-2025
CONTRATO	567 DE 2023		
CONTRATISTA	INTEREMERGENCIAS NORTE		INTEREMERGENCIAS NORTE
ELABORÓ	Alvaro Ramiz Benitez M.	REVISÓ	

REGISTRO FOTOGRAFICO FACHADA — Negativo N°

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: Ana Jimenez.
Dirección: Vereda Carbonera Santa María.
Teléfono: 3125579509
long. Del frente (m): 10 Metros.
N° De pisos: 1
Estrato: 1

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	
energia	X		
telefono		X	
gas		X	
otros			

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda	X	Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldio	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup.	
Sin edificar		Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION

Estructura	X	concreto		mamposteria		prefabricado	otra
paredes	X	bloque	X	ladrillo			otra
puertas	X	madera	X	metalicas			otra
puertas	X	numero		calle	X	internas	garaje
cubierta		concreto	X	teja acrilica		asbesto cem.	otra
N° de pisos	1						

Powered by CamScanner

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - CIERRE	FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se realizo el acta de vecindad de cierre con la respectiva propietaria Ana Jimenez, donde se pude evidenciar el perfecto estado del predio donde se construyo la alcantarilla Se cumplio la peticion de que todo el material fuese removido para evitar la contaminacion del predio de esta manera ambas partes quedan conformes.

PROPIETARIO

Jhonatan Meneses.
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

Powered by CamScanner



ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

MUNICIPIO DEL COCUY

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	14/02/2025	FECHA	14/02/2025
CONTRATO	001 de 2023	INTERVENTOR	Emergencias Norte
CONTRATISTA	NYS constructor	REVISÓ	
ELABORÓ	Jhoneten Meneses		

REGISTRO FOTOGRAFICO FACHADA — Negativo Nº

DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario: Alvaro Garcia G
Dirección: Vereda el durazno Cocuy
Teléfono: 311 554 71 89
long. Del frente (m): 24 m. Ancho
Nº De pisos: 1
Estrato: 0

Servicios públicos	SI	NO	OBSERVACIONES
agua		X	
alcantarillado		X	es un predio donde se vi
energia		X	una vivienda en buen estado
telefono		X	
gas		X	Pero necesitan el tanque de Gas
otros		X	

Quebrada

TIPO DE PREDIO

Monumento nacional		Vivienda		Recreacional	
Valor constructivo		Comercial		Baldio	
Valor intermedio		Oficinas		Inst. educacion Sup	X
Sin edificar		Institucional			
Reedificable		Parqueadero			

TIPO DE CONSTRUCCION N/A -

Estructura		concreto		mamposteria		prefabricado	otra
paredes		bloque		ladrillo			otra
puertas		madera		metalicas			otra
puertas		numero		calle		internas	garaje
cubierta		concreto		teja acrilica		asbesto cem.	otra
Nº de pisos							

Powered by CamScanner

1.

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-023
	ACTA DE VECINDAD - INFORME DE VISITA	FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA OBRA (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se realiza acta de Cierre de Vecindad, con la señora Alvaro Garcia. Con el Cual se realiza un recorrido por la obra del box Culvert Indicandole el desarrollo de la Obra y dejando el terreno en Optimas Condiciones, de igual manera se le da Cumplimiento a lo Acordado en la Acta de Vecindad de Inicio, debido a que don Gonzalo Ruiz no se encuentra en el municipio autoriza al familiar Alvaro García para realizar el Cierre.

Gonzalo Alvaro.
PROPIETARIO

Jhoneiker Meneces
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

TRAMITES DE PQR



RECLAMACION POR LAMINA VIA PAEZ CAMPOHERMOSO

SPEI-OFIC N° 168-2024


Páez, 13 de diciembre de 2024

Ingeniero
JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA
Secretario de Infraestructura
Email: despacho.infraestructura@boyaca.gov.co, contactenos@boyaca.gov.co
Gobernacion de Boyacá
Tunja

Referencia: Solicitud de mitigación de riesgos en el sitio con coordenadas 5.0942744, -73.0639804 en la vía departamental zona urbana Páez y el puente el Cortaderal vía al municipio de Campohermoso.

Cordial saludo Ingeniero,

Por medio de la presente me permito ponerle en conocimiento la siguiente situación para que se gestione y se mitigue el riesgo que viene presentando en sitio con coordenadas 5.0942744, -73.0639804 en la vía departamental zona urbana Páez y el puente el Cortaderal vía al municipio de Campohermoso con la siguiente ubicación:

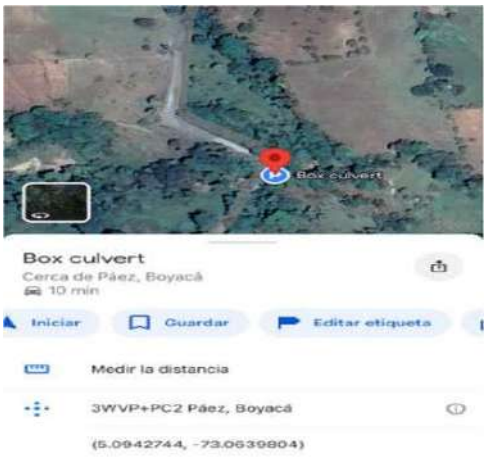



1. En dicho sitio existe un Box Coulvert en mal estado, que desde el año 2021 el municipio de Páez había solicitado a la Gobernación de Boyacá se construyera una nueva estructura, la cual fue contratada por parte de la Gobernación en el año 2023 con la empresa N&S CONSTRUCOL.

2. Que por el estado en el que se encontraba el municipio había gestionado para que la empresa Ocensa con su contratista ISMOCOL S.A, instalara de manera provisional una lamina sobre la placa del Box Coulvert averiado, el cual se encuentra hasta el momento.

3. Que la empresa N&S CONSTRUCOL en días pasados había socializado el alcance del proyecto que en dicho punto es la construcción de un Box Coulvert, para lo cual demolió parte de este, con el fin de dar cumplimiento a su objeto contractual.

4. Que desde el día 12 de diciembre de 2024, se ha presentado la situación que por el sitio están bajando aproximadamente 6 volquetas que transportan asfalto para la ejecución de un proyecto en el municipio de Campohermoso, donde 3 de ellas son dobletroque, esta situación fue expuesta ante el consejo municipal de gestión del riesgo del municipio de Páez el día de hoy 13 de diciembre de 2024 donde se tomó la decisión de informar al departamento teniendo en cuenta que la vía es departamental y el contrato de construcción del Box Coluvet también es del departamento a fin que se tomen las medidas pertinentes a fin de minimizar los riesgos de colapso de la lamina que es la que se encuentra soportante todo el peso.

5. Lo anterior se expone y se solicita ya que es la única vía de comunicación entre los municipios de Páez y Campohermoso y que al presentarse el colapso se perdería la comunicación poniendo en riesgo la salud, la economía de los habitantes de los dos municipios.

6. Es de aclarar que quienes transitan por el sector lo deben hacer bajo su propio riesgo ya que el municipio de Páez no tiene el alcance para gestionar y minimizar el riesgo en el sitio.

7. Para ampliar la información del sitio el municipio adjunta registro fotográfico y video del tránsito vehicular por el sitio antes mencionado.



Agradezco la mitigación del riesgo lo más pronto posible.

Atentamente,

JUAN DIEGO MORALES CALDERÓN
Alcalde Municipal

NIT: 901.306.834-9

Tunja, 19 de diciembre de 2024.

SPEI-OFCI N°168 - 2024

Ingeniero:
JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
Representante Legal.
Consorcio Interemergencias Norte.
Cc

Referencia: CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA

C.c.
JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA
Secretario de Infrastructura
Email: despacho.infrastructura@boyaca.gov.co
Gobernación de Boyacá
Tunja

ASUNTO: Respuesta a Solicitud de mitigación de riesgos SPEI – OFCI N°168-2024 en el sitio de implantación del box culvert con coordenadas (5° 05’ 43,9” N, 73°03’29,4” W) en la vía departamental que comunica los municipios de Páez – Campohermoso.

De acuerdo con la intervención del box culvert, se ha determinado que es necesario realizar la demolición de la estructura existente para reemplazarla. Esto implica intervenir la plataforma instalada sobre la placa superior del box culvert de manera provisional, la cual genera el paso vehicular entre Páez y Campohermoso.

La demolición de la estructura se ha realizado con retroexcavadora de manera progresiva, Sin embargo, se ha podido evidenciar que debido al tránsito de vehículos de carga pesada y de transporte púbico, la placa provisional a tenido un asentamiento en el lado de Páez, con el fin de mitigar este riesgo se planea realizar las siguientes actividades:

1. Instalación de señalización de riesgo en la zona, con el fin de advertir a la comunidad la contingencia que se presenta al transitar sobre la lámina provisional.

2. Intervención con maquinaria amarilla para la reacomodación de la placa y la instalación de pilotes de madera bajo la misma, con el fin de corregir los asentamientos presentados y evitar posibles asentamientos futuros. Programada el día 21 de diciembre del año en curso.

Debido a la imposibilidad de cerrar esta vía departamental, ya que es la única vía de comunicación entre los municipios de Páez y Campohermoso, se propone esta solución temporal, en tanto se construye la nueva estructura que reemplazara el box culvert en mal estado y la lámina de paso provisional. A continuación, adjunto registro fotográfico de las actividades de mitigación mencionadas anteriormente:






Jhonatan Meneses

N&S CONSTRUCOL S.A.S
R/L JHONATAN BRAYAN MENESES SANCHEZ



RECLAMACIONES
SANTA MARIA

PAZ Y SALVO TRABAJADORES PUNTO DE INTERVENCIÓN SANTA MARÍA BOYACÁ

REF: CONTRATO DE OBRA 001-2023 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIÉRREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

OBJETO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TERRACEO FILTRO EN LA CORONA DEL TALUD Y CONFORMACIÓN DE BANCA VÍA SANTA MARÍA "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIÉRREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Yo Pablo Darío Fajardo Camacho identificado con C.C 74.260.417 de San Pablo de Borbur, certifico que la empresa NYS CONSTRUCOL se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por las labores de obra ejecutadas en los frentes de trabajo de la construcción de dos alcantarillas y un box culvert en el municipio de Santa María en el departamento de Boyacá.

La presente se firma a los 19 días del mes de diciembre del año 2024.

Para constancia firma:

Yo Pablo Dario Fajardo Camacho

C.C 74.260.417 de San Pablo de Borbur

Trabajador

Jhonatan Meneses

NYS CONSTRUCOL SAS

R/L Jhonatan Meneses

Contratista de obra

Powered by CamScanner

NIT: 901.306.834-9

PAZ Y SALVO TRABAJADORES PUNTO DE INTERVENCIÓN SANTA MARÍA BOYACÁ

REF: CONTRATO DE OBRA 001-2023 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIÉRREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

OBJETO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS Y UN BOX CULVERT VÍA SANTA MARÍA-MEDINA. "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIÉRREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Yo Jose gabriel Cortes identificado con C.C. 7276231 de Muzo BYC., certifico que la empresa NYS CONSTRUCOL se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por las labores de obra ejecutadas en los frentes de trabajo de la construcción de dos alcantarillas y un box culvert en el municipio de Santa María en el departamento de Boyacá.

La presente se firma a los 20 días del mes de diciembre del año 2024.

Para constancia firma:

Jose gabriel Cortes
Yo Jose gabriel Cortes
C.C. 7276231 de Muzo BYC.
Trabajador

Jhonatan Meneses
NYS CONSTRUCOL SAS
R/L Jhonatan Meneses
Contratista de obra

Powered by CamScanner

NIT: 901.306.834-9

PAZ Y SALVO TRABAJADORES PUNTO DE INTERVENCIÓN SANTA MARÍA BOYACÁ

REF: CONTRATO DE OBRA 001-2023 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIÉRREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

OBJETO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS Y UN BOX CULVERT VÍA SANTA MARÍA-MEDINA. "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIÉRREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Yo Camilo Cadena identificado con C.C. 1023905595 de Bogota, certifico que la empresa NYS CONSTRUCOL se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por las labores de obra ejecutadas en los frentes de trabajo de la construcción de dos alcantarillas y un box culvert en el municipio de Santa María en el departamento de Boyacá.

La presente se firma a los 20 días del mes de diciembre del año 2024.

Para constancia firma:

Camilo C

Yo German Camilo Cadena
C.C. 1023905595 de Bogota.
Trabajador

Jhonatan Meneses

NYS CONSTRUCOL SAS
R/L Jhonatan Meneses
Contratista de obra

Cra 2B n 42A-32 correo: nysconstrucol.contable@gmail.com CELULAR 3112847686

Powered by CamScanner

NIT: 901.306.834-9

PAZ Y SALVO TRABAJADORES PUNTO DE INTERVENCIÓN SANTA MARÍA BOYACÁ

REF: CONTRATO DE OBRA 001-2023 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIÉRREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

OBJETO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS Y UN BOX CULVERT VÍA SANTA MARÍA-MEDINA. "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIÉRREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Yo Ruperto Amaya identificado con C.C. 74325478 de Santa María Boyacá, certifico que la empresa NYS CONSTRUCOL se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por las labores de obra ejecutadas en los frentes de trabajo de la construcción de dos alcantarillas y un box culvert en el municipio de Santa María en el departamento de Boyacá.

La presente se firma a los 20 días del mes de diciembre del año 2024.

Para constancia firma:

Ruperto Amaya

Yo Ruperto Amaya

C.C. 74325478 de Santa Boyacá.

Trabajador

Jhonatan Meneses

NYS CONSTRUCOL SAS

R/L Jhonatan Meneses

Contratista de obra

Cra 2B n 42A-32 correo: nysconstrucol.contable@gmail.com CELULAR 3112847686

Powered by CamScanner

NIT: 901.306.834-9

PAZ Y SALVO TRABAJADORES PUNTO DE INTERVENCIÓN SANTA MARÍA BOYACÁ

REF: CONTRATO DE OBRA 001-2023 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIÉRREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

OBJETO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS Y UN BOX CULVERT VÍA SANTA MARÍA-MEDINA. "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIÉRREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Yo Rocio Camacho identificado con C.C. 1104774860 de Bogota, certifico que la empresa NYS CONSTRUCOL se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por las labores de obra ejecutadas en los frentes de trabajo de la construcción de dos alcantarillas y un box culvert en el municipio de Santa María en el departamento de Boyacá.

La presente se firma a los 20 días del mes de diciembre del año 2024.

Para constancia firma:

Rocio Camacho

Yo Rocio Camacho
C.C. 1104774860 de Bogota
Trabajador

Jhonatan Meneses

NYS CONSTRUCOL SAS
R/L Jhonatan Meneses
Contratista de obra

Cra 2B n 42A-32 *correo: nysconstrucol.contable@gmail.com* *CELULAR 3112847686*

Powered by CamScanner

NIT: 901.306.834-9

PAZ Y SALVO TRABAJADORES PUNTO DE INTERVENCIÓN SANTA MARÍA BOYACÁ

REF: CONTRATO DE OBRA 001-2023 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIÉRREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

OBJETO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS Y UN BOX CULVERT VÍA SANTA MARÍA-MEDINA. "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIÉRREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Yo Lifonso Perilla identificado con C.C. 7315712 de Chiquinquira, certifico que la empresa NYS CONSTRUCOL se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por las labores de obra ejecutadas en los frentes de trabajo de la construcción de dos alcantarillas y un box culvert en el municipio de Santa María en el departamento de Boyacá.

La presente se firma a los 20 días del mes de diciembre del año 2024.

Para constancia firma:

Yo Lifonso Perilla
C.C. 7315712 de Chiquinquira
Trabajador

Jhonatan Meneses
NYS CONSTRUCOL SAS
R/L Jhonatan Meneses
Contratista de obra

Cra 2B n 42A-32 correo: nysconstrucol.contable@gmail.com CELULAR 3112847686

Powered by CamScanner

NIT: 901.306.834-9

PAZ Y SALVO TRABAJADORES PUNTO DE INTERVENCIÓN SANTA MARÍA BOYACÁ

REF: CONTRATO DE OBRA 001-2023 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIÉRREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

OBJETO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS Y UN BOX CULVERT VÍA SANTA MARÍA-MEDINA. "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIÉRREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Yo Milton Daza identificado con C.C. 7173211980 de Sta María, certifico que la empresa NYS CONSTRUCOL se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por las labores de obra ejecutadas en los frentes de trabajo de la construcción de dos alcantarillas y un box culvert en el municipio de Santa María en el departamento de Boyacá.

La presente se firma a los 20 días del mes de diciembre del año 2024.

Para constancia firma:

Yo Milton Daza.
C.C. 24324980 de Sta María.
Trabajador

Jhonatan Meneses
NYS CONSTRUCOL SAS
R/L Jhonatan Meneses
Contratista de obra

Cra 2B n 42A-32 correo: nysconstrucol.contable@gmail.com CELULAR 3112847686

Powered by CamScanner

NIT: 901.306.834-9

PAZ Y SALVO TRABAJADORES PUNTO DE INTERVENCIÓN SANTA MARÍA BOYACÁ

REF: CONTRATO DE OBRA 001-2023 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIÉRREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

OBJETO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS Y UN BOX CULVERT VÍA SANTA MARÍA-MEDINA. "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIÉRREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Yo Jorge Luis Polla identificado con C.C. 23 707 645 de ST Santa María certifico que la empresa NYS CONSTRUCOL se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por las labores de obra ejecutadas en los frentes de trabajo de la construcción de dos alcantarillas y un box culvert en el municipio de Santa María en el departamento de Boyacá.

La presente se firma a los 20 días del mes de diciembre del año 2024.

Para constancia firma:

Yo
C.C. 23 707 645 de
Trabajador ST

Jhonatan Meneses
NYS CONSTRUCOL SAS
R/L Jhonatan Meneses
Contratista de obra

Cra 2B n 42A-32 correo: nysconstrucol.contable@gmail.com CELULAR 3112847686

Powered by CamScanner

NIT: 901.306.834-9

PAZ Y SALVO TRABAJADORES PUNTO DE INTERVENCIÓN SANTA MARÍA BOYACÁ

REF: CONTRATO DE OBRA 001-2023 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIÉRREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

OBJETO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS Y UN BOX CULVERT VÍA SANTA MARÍA-MEDINA. "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIÉRREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Yo Marco Antonio Díaz identificado con C.C. 7279303 de Muzo, certifico que la empresa NYS CONSTRUCOL se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por las labores de obra ejecutadas en los frentes de trabajo de la construcción de dos alcantarillas y un box culvert en el municipio de Santa María en el departamento de Boyacá.

La presente se firma a los 20 días del mes de diciembre del año 2024.

Para constancia firma:

MARCO DIAZ

Yo Marco Antonio Díaz
C.C. 7.279.303 de Muzo.
Trabajador

Jhonatan Meneses

NYS CONSTRUCOL SAS
R/L Jhonatan Meneses
Contratista de obra

Powered by CamScanner

PAZ Y SALVO PERSONERIAS

CERTIFICACION No. 019/2025 PMV

LA SUSCRITA PERSONERA MUNICIPAL DE VIRACACHÁ - BOYACÁ
Nit: 820000386-2

CERTIFICA QUE:

Que revisadas las bases de datos y los archivos físicos de los expedientes contractuales que reposan en este despacho se constató que NO EXISTE QUEJA ALGUNA, en contra de la señora SONIA MALENA MARIN SOTELO representante legal de N&S CONSTRUCOL S.A.S, en la ejecución del contrato de obra No. 001-2023 cuyo objeto es "CINSTRUCCION DE OBRAS DE MITGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIASEN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAUTE, NEIRA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA"

La presente se expide a solicitud del interesado, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2025

MARIA CAROLINA CORREDOR NAVARRO
Personera Municipal

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Herlinda Velasco	María Carolina Corredor N	María Carolina Corredor N
Cargo:	Secretaria	Personera	Personera

La suscrita **CAMILA ANDREA ACOSTA CADENA**, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de **Personera Municipal (E)** del municipio de Chitaraque, Boyacá, en ejercicio de las funciones previstas en el artículo 118 de la Constitución Política y en los artículos 178 y siguientes de la Ley 136 de 1994,

CERTIFICA:

Que revisados los archivos, expedientes y registros de la **Personería Municipal de Chitaraque**, **no existen quejas, reclamaciones, denuncias ni actuaciones administrativas** relacionadas con la ejecución del **Contrato de Obra No. 001-2023**, suscrito con la empresa **N&S CONSTRUCOL S.A.S**, ni frente a su objeto o desarrollo dentro de la jurisdicción de este municipio.

La presente certificación se expide a solicitud de parte interesada, para los fines legales a que haya lugar, en el municipio de Chitaraque a los (17) días del mes de septiembre de 2025.

En Constancia Firma,

Camila Andrea Acosta C.

CAMILA ANDREA ACOSTA CADENA
Personera Municipal (E)

EL PERSONERO MUNICIPAL DE CAMPOHERMOSO-BOYACA

C E R T I F I C A

Que, ante el despacho de la Personera Municipal de Campohermoso, no se han instaurado quejas, reclamaciones o denuncias relacionadas con la ejecución del contrato de obra No. 001-2023 que tiene como objeto: Construcción de Obras de Mitigación sobre la Red Vial Departamental afectada en Temporada de Lluvias en municipios de la Provincia de Centro, Norte, Gutiérrez, Lengupa, Ricaurte, Neira Departamento de Boyacá.

La presente certificación se expide a solicitud de la firma NYS Construcol S.A. a los quince (15) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

JOSE PARMENIO CHAPARRO BUITRAGO
Personero Municipal

Firma		Firma		Firma	
Elaboró	Yamile Rodríguez Rodríguez	Revisó	Dr. José P. Chaparro B.	Aprobó	José P. Chaparro B.
Cargo	Auxiliar Administrativo Personería	Cargo	Personero Municipal	Cargo	Personero Municipal

Elaboró: JPCHB/Yamile R.R.

EL SUSCRITO PERSONERO MUNICIPAL DE PÁEZ - BOYACÁ
NIT. 820.000.424-4

CERTIFICA QUE:

En atención a su solicitud relacionada con el Contrato de Obra No. 001-2023, cuyo objeto es la "*Construcción de obras de mitigación sobre la red vial departamental afectada por temporada de lluvias en municipios de la provincia de Centro, Norte, Gutiérrez, Lengupá, Ricaurte, Neira, Departamento de Boyacá*", me permito informar que **en esta Personería Municipal no reposan quejas, reclamaciones ni denuncias relacionadas con la ejecución del mencionado contrato**.

Esta certificación se emite el día diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes.

Cordialmente,

VÍCTOR MANUEL IBÁÑEZ MORENO
Personero Municipal

EL SUSCRITO PERSONERO MUNICIPAL DE SAN MATEO BOYACÁ

C E R T I F I C A:

Que una vez revisado el archivo de esta dependencia, no se registra quejas, reclamaciones y/o solicitudes de conciliación en contra del Consorcio N&S CONSTRUCOL S.A.S representado legal por el señor SONIA MALENA MARIN SOTELO, identificado con número de Nit 901.306.834-9, representada por la señora Yudy Jimena Rocha Torres, identificado con número de cédula 52.898.667 expedida en Bogotá, en relación a obligaciones de origen laboral y/o suministro de materiales, a la fecha de expedición de esta certificación.

En el desarrollo del contrato de obra pública No. 001 suscrito entre el Departamento de Boyacá y la empresa N&S CONSTRUCOL S.A.S.

La presente se expide hoy diecinueve (19) de Septiembre de dos mil veinticinco (2025), a solicitud verbal del interesado.

Wilson Duván Valderrama Bohórquez

WILSON DUVÁN VALDERRAMA BOHÓRQUEZ
Personero Municipal

Transcriptor: Sandra Hernández

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO PUBLICO
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACA
NIT: 900.946.010-9

PERSONERÍA DE SAN EDUARDO
PROACTIVA Y GARANTE EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Personería Municipal

LA SUSCRITA PERSONERA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO BOYACA

CERTIFICA

Que, una vez revisado el archivo de la Personería, no se encontró quejas, reclamaciones o denuncias relacionadas con el contrato de obra No. 001-2023-OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Dada en el despacho de la Personería Municipal de San Eduardo, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

MAYRA ALEJANDRA MONTAÑEZ VARGAS
Personera Municipal

Calle 4 No. 3 - 6 1 Palacio Municipal
Código Postal 152601 S a n E d u a r d o B o y a c á
Celular: 3 2 1 4 5 3 1 9 6 5
e-mail: personeria@saneduardo-boyaca.gov.co

LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA – BOYACÁ, EN EJERCICIO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS POR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY

CERTIFICA:

Que, revisados los archivos físicos y digitales de este despacho, no reposan quejas, reclamaciones, denuncias ni trámite alguno relacionado con la ejecución del contrato de obra No. **001-2023**, cuyo objeto es la ***"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIÉRREZ, LENGUPÁ, RICAURTE Y NEIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ***".

En consecuencia, se expide el presente PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO, a solicitud de la parte interesada, para los fines pertinentes dentro de los procesos de supervisión, interventoría, control y seguimiento contractual.

Se firma en Santa María – Boyacá, a los 29 días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,

DARIO ERNESTO GALINDO MENDOZA
Personero Municipal
Santa María – Boyacá

El Cocuy, 16 de septiembre de 2025

PMC300-6.2/27/*0217-S*

LA SUSCRITA PERSONERA MUNICIPAL DE EL COCUY (BOYACÁ)

CERTIFICA:

Que hasta la fecha la Personería Municipal de El Cocuy (Boyacá) no ha recepcionado ninguna queja, reclamación o denuncia relacionada con la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 001 del 4 de enero de 2023, suscrito entre el Departamento de Boyacá, en calidad de Contratante, y NYS CONSTRUCOL S.A.S., identificada con NIT No. 901.306.834-9, en calidad de Contratista, el cual tiene como objeto. "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA".


La presente se expide a solicitud del Contratista y para los fines que legalmente correspondan.

Cordialmente,

PATRICIA ROBAYO NIETO
PERSONERA MUNICIPAL EL COCUY

3.18 PLANOS RECORD DE OBRA

PLANOS RECORD MUNICIPIO DE VIRACACHA

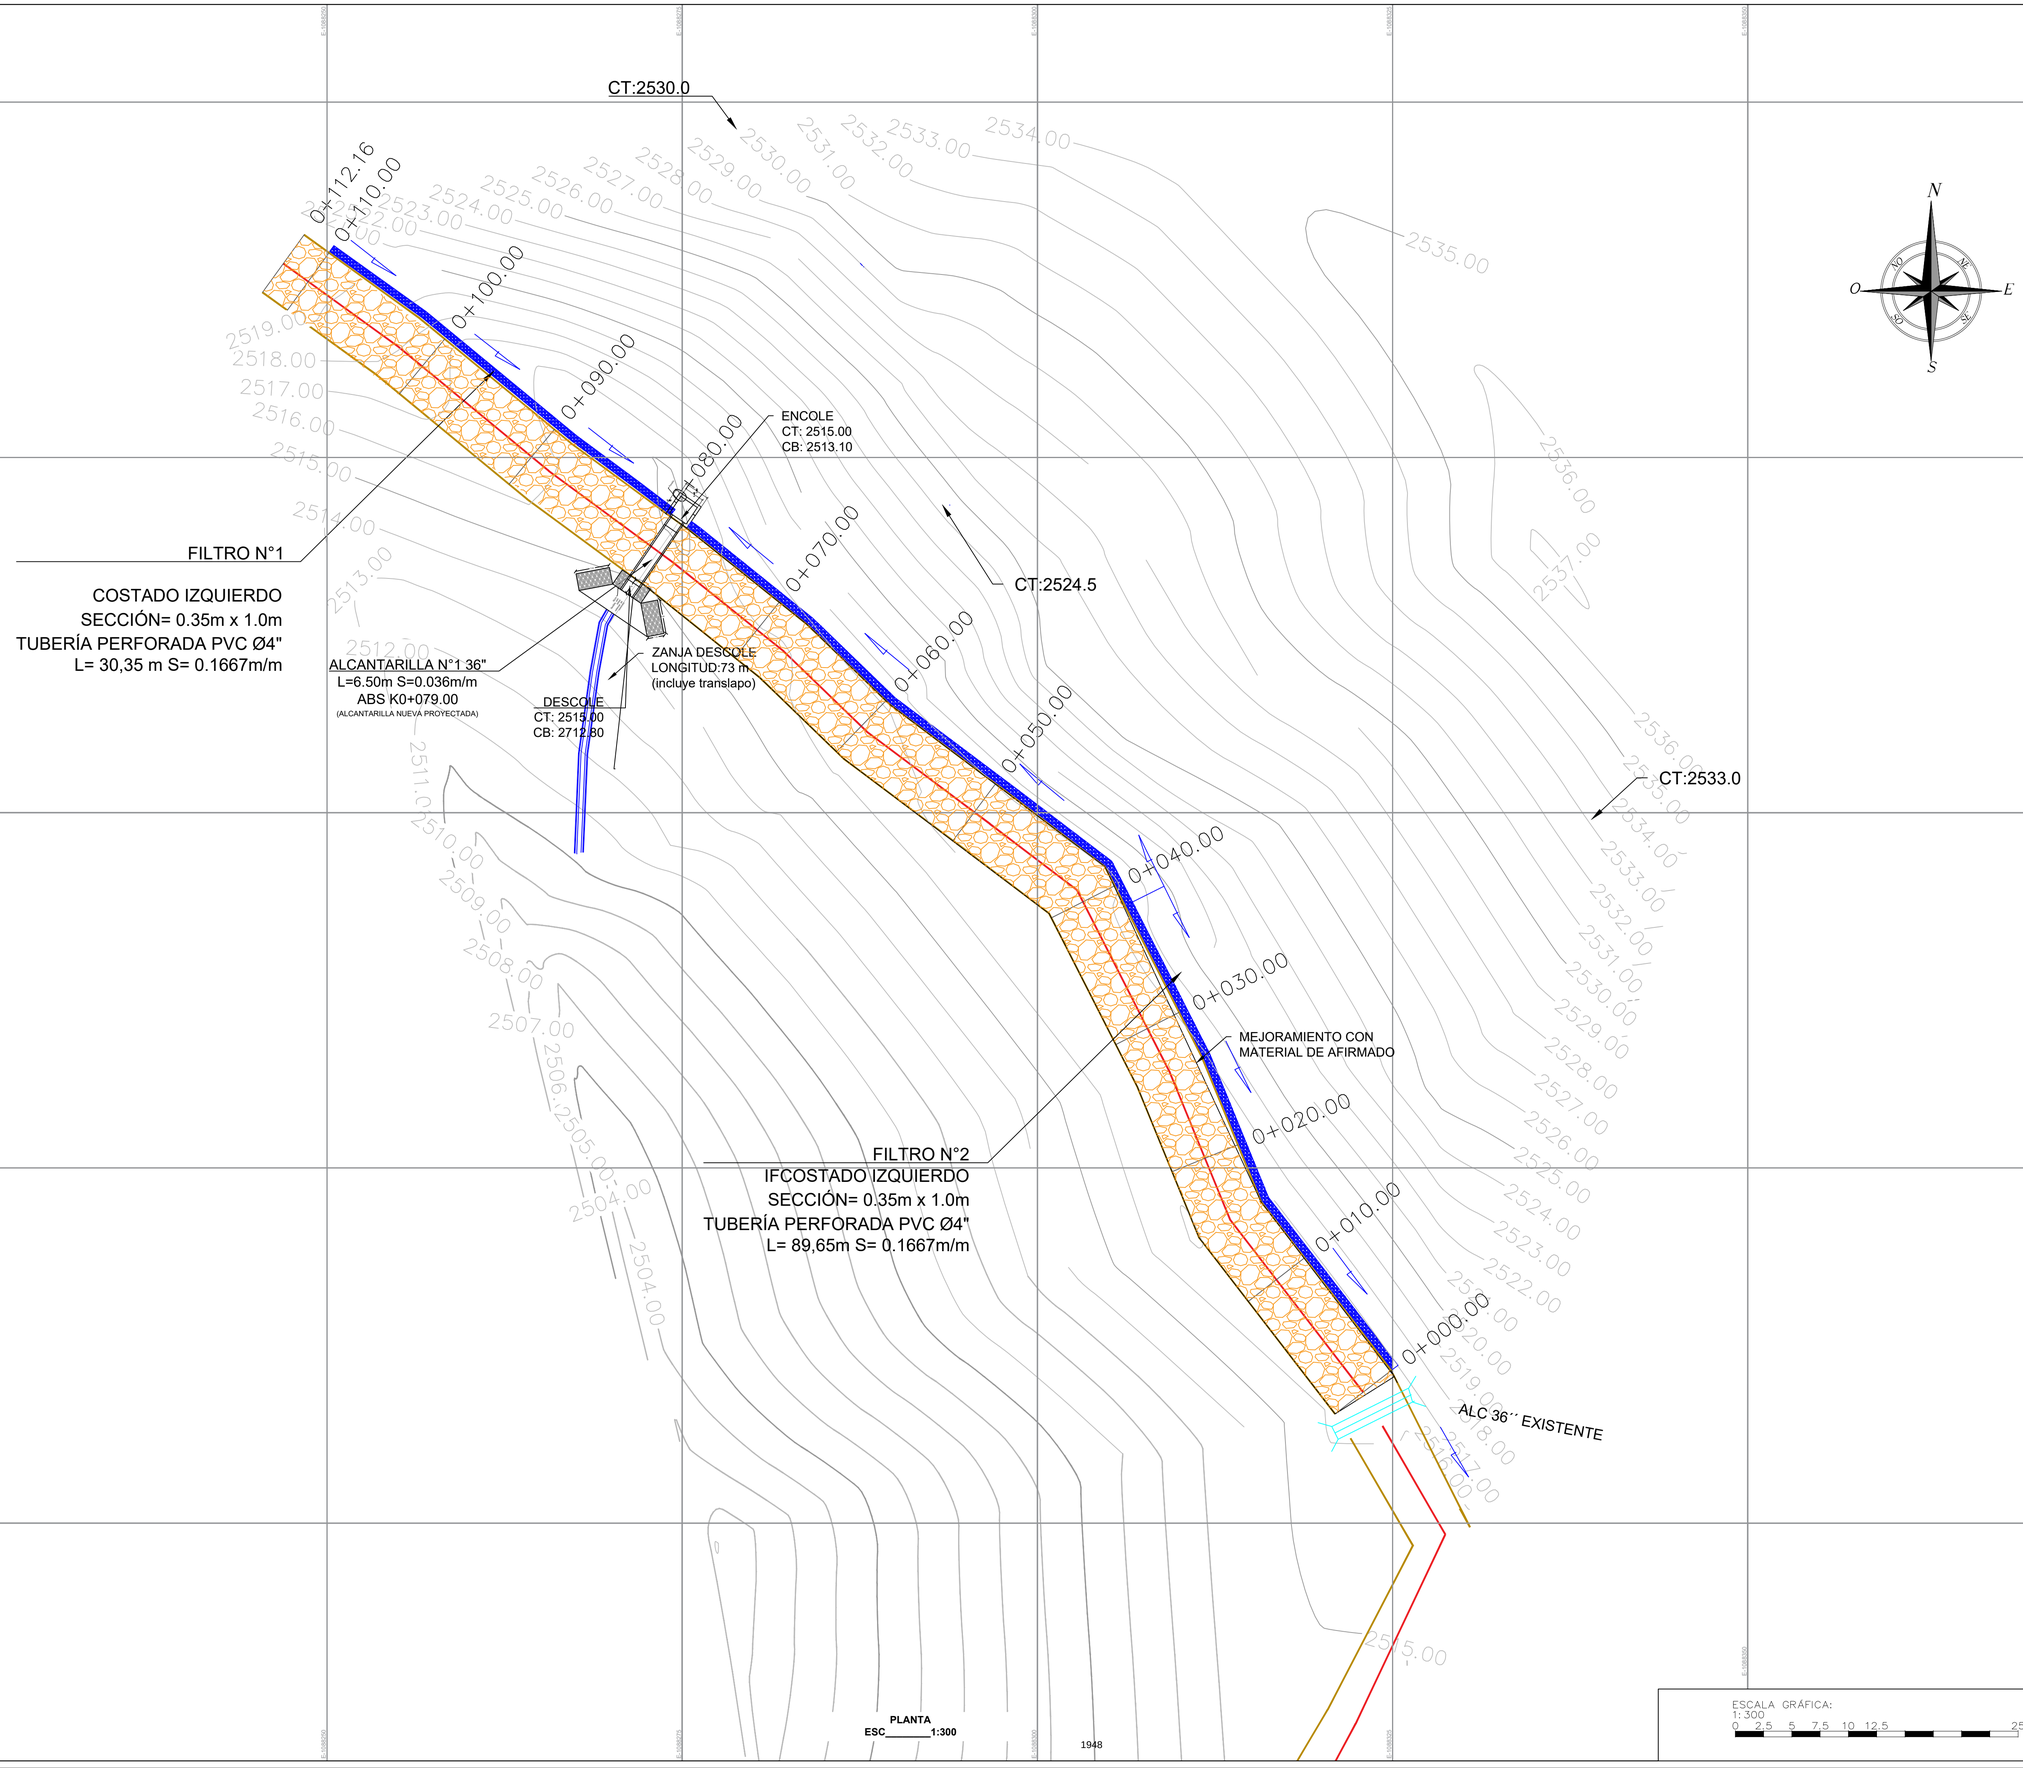

PLANTA
ESC_____1:300

1948

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA

MUNICIPIO DE VIRACACHÁ

CONTIENE:

- PLANO RECORD - PLANTA DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y LOCALIZACIÓN- MUNICIPIO DE VIRACACHA

REVISÓ:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834-0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTRE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



CONVENCIONES

- VÍAS
- CURVAS DE NIVEL
- ZANJA DE CORONACIÓN
- ALCANTARILLA PROYECTADA
- ALCANTARILLA EXISTENTE
- FILTRO PROYECTADO
- DIRECCIÓN DE FLUJO

DÍGITO :

ING. SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :

INDICADA


FECHA :


DICIEMBRE 2025


ARCHIVO DIGITAL :


PLANO RECORD VIRACACHA

PLANO Nº 1

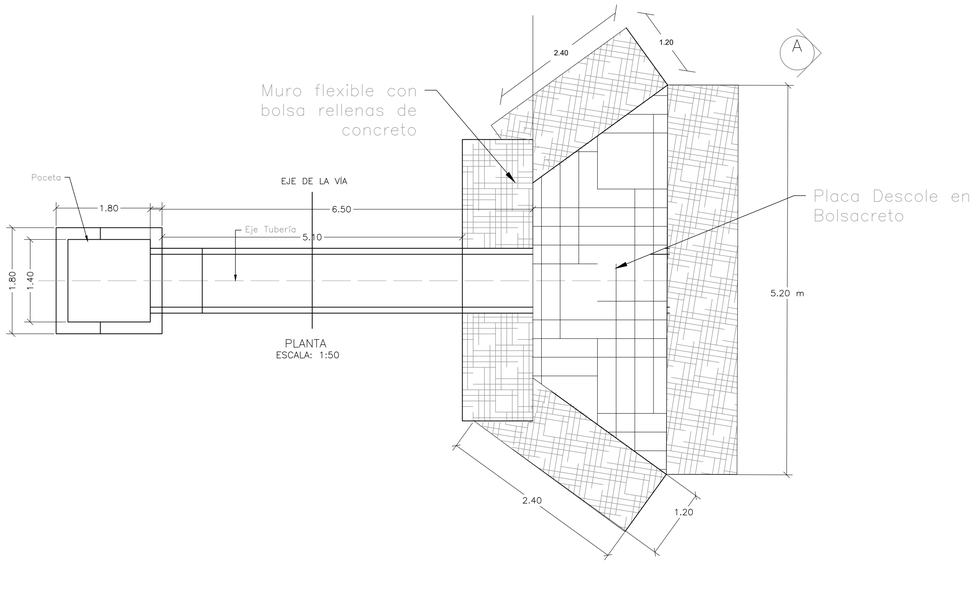





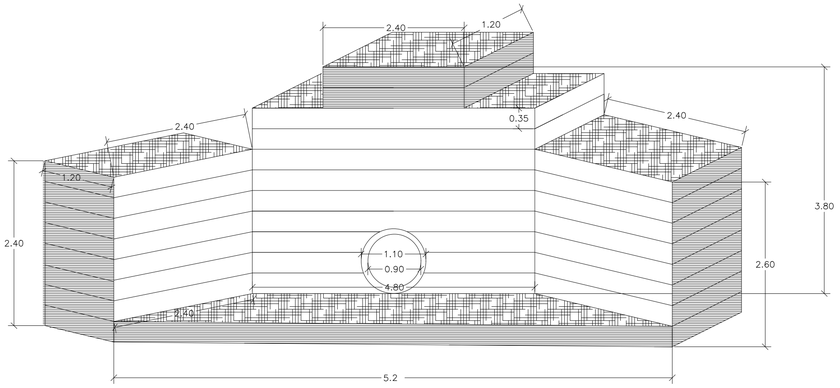

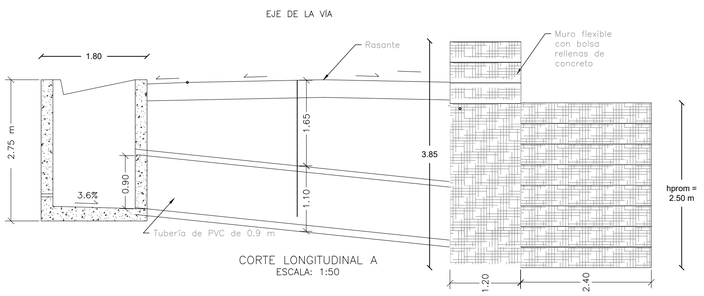


DETALLE DEL REFUERZO

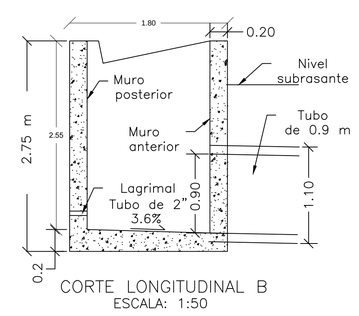

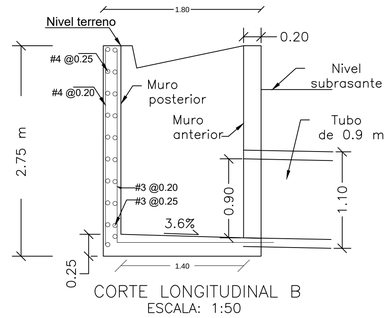


	REFUERZO POCETA			
ITEM	ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
POCETA	4	4.24	9	37.33
	3	3.90	9	19.66
	4	2.06	1	2.05
	3	1.86	1	1.04
	4	3.34	1	3.32
	3	2.94	1	1.65
	4	3.48	6	20.75
	3	5.80	6	19.49
	4	5.90	3	17.59
	3	4.70	3	7.90
	4	2.28	4	9.07
	3	2.28	4	5.11
	4	2.08	8	16.54
	3	2.08	8	9.32
	4	1.54	4	6.12
	4	1.36	4	5.41
	4	1.28	4	5.09
	SUBTOTAL			188.03


SECCIÓN ZANJA DE CORONACIÓN



SECCIÓN TRANSVERSAL ZANJA DE CORONACIÓN

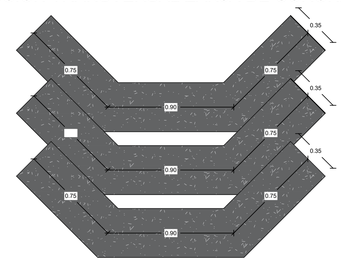

DETALLE DE ZANJA DE CORONACIÓN



GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA

MUNICIPIO DE VIRACACHÁ

CONTIENE:

- DETALLE CONSTRUCTIVO ALCANTARILLA.
- DETALLE CONSTRUCTIVO FILTRO FRANCÉS.
- DETALLE CONSTRUCTIVO ZANJA DE CORONACIÓN.

REVISÓ:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NYS CONSTRUCOL S.A.S
NIT:901.306.834-0
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



OBSERVACIONES:

DÍGITO :

ING. SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :

INDICADA

FECHA :


SEPTIEMBRE DE 2025

ARCHIVO DIGITAL :

PLANO RECORD VIRACACHA.DWG

PLANO Nº

PLANOS RECORD MUNICIPIO DE CHITARAQUE

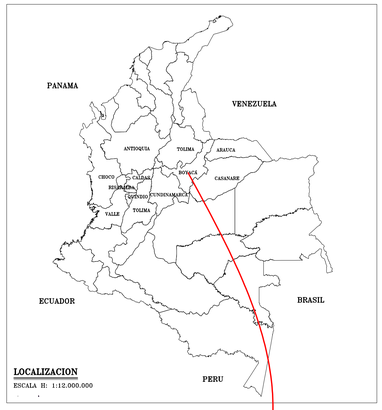



LOCALIZACION

ESCALA H: 1:12.000.000



MUNICIPIO DE CHITARAQUE

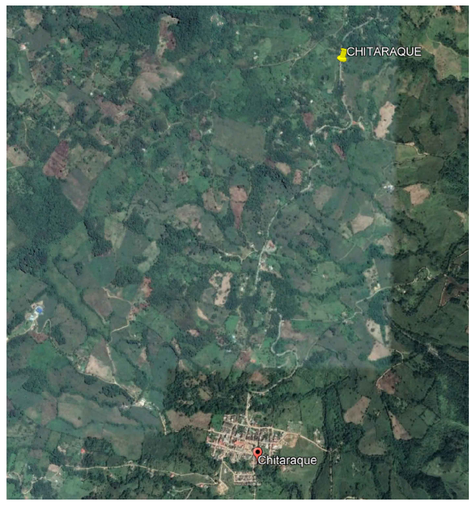

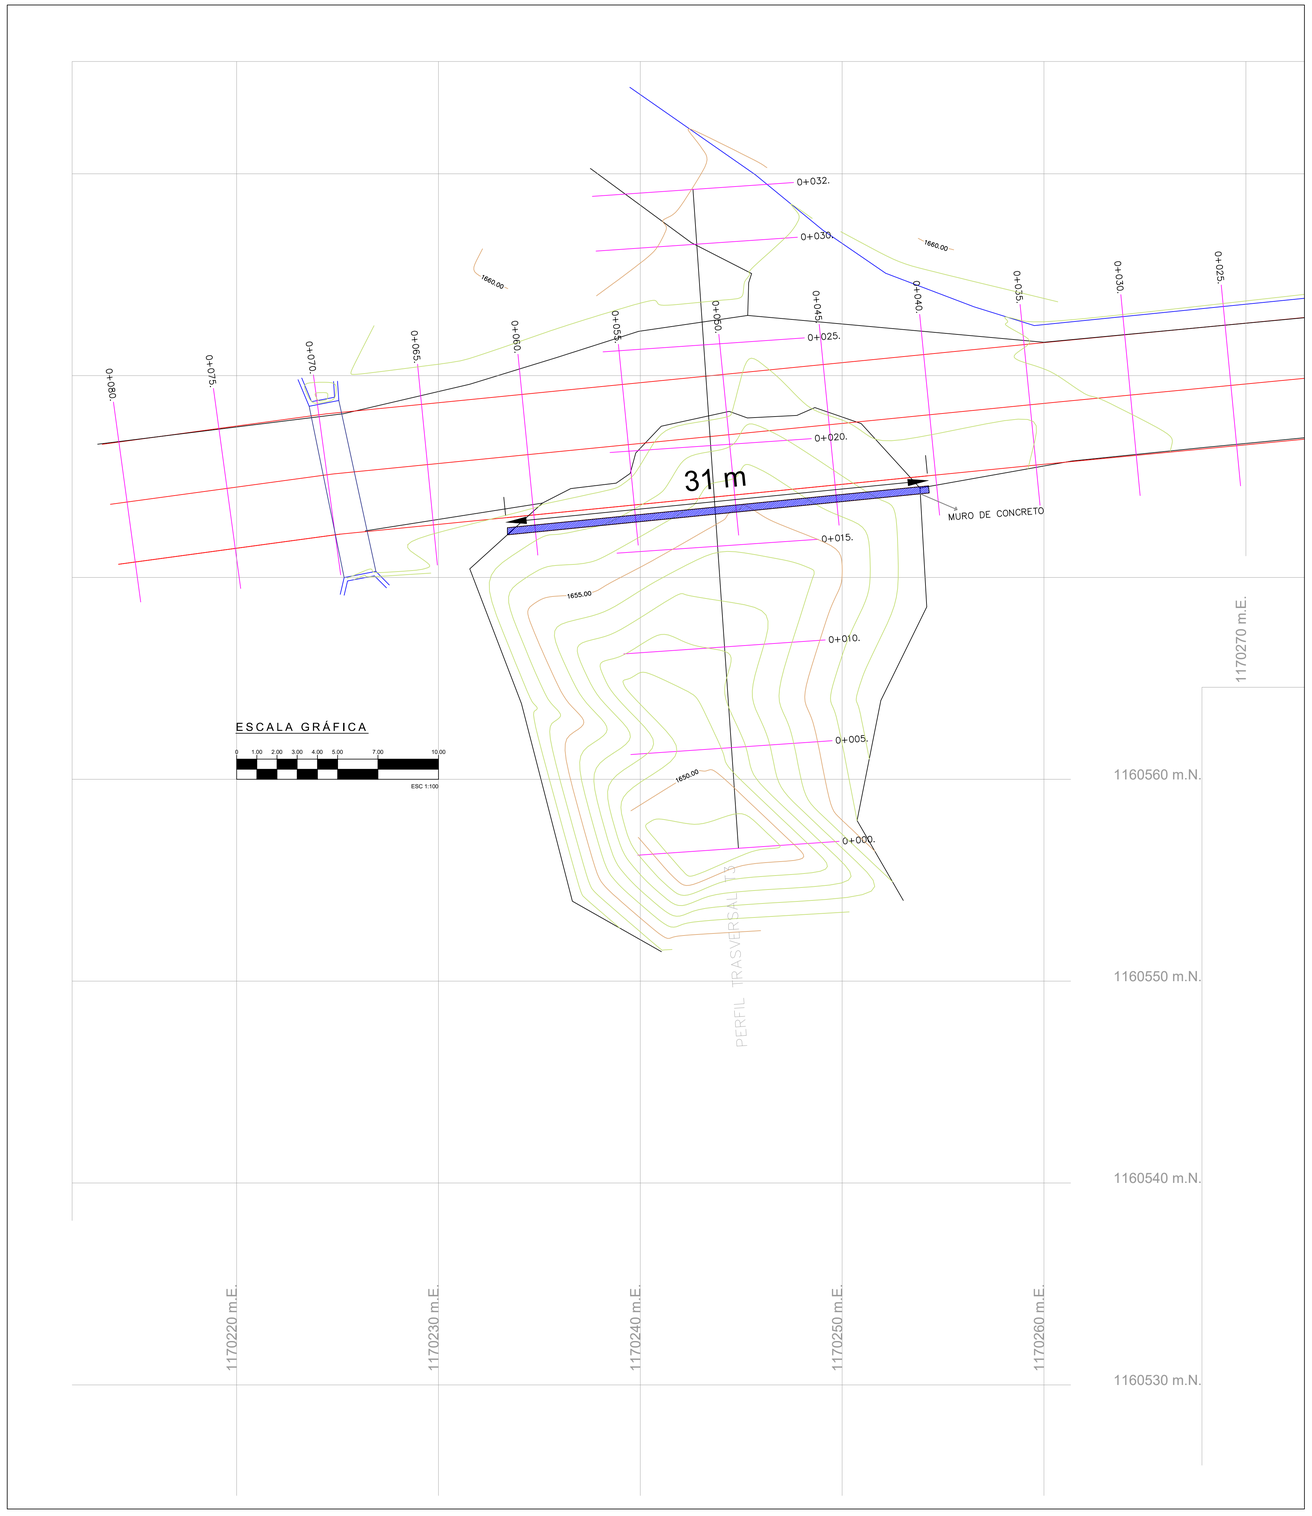

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS
PROVINCIA DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTIENE:

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
LOCALIZACION GENERAL - MUNICIPIO DE CHITARAQUE

REVISÓ:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NYS CONSTRUCOL S.A.S
NIT:901.306.834-0
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



CONVENCIONES

CARRETEABLE
RIO QUEBRADA
ESTACION P.K.

DÍGITO :

ING. SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :

INDICADA


FECHA :

DICIEMBRE 2025


ARCHIVO DIGITAL :

LOCALIZACION_CHITARAQUE.DWG


PLANO Nº DG DE

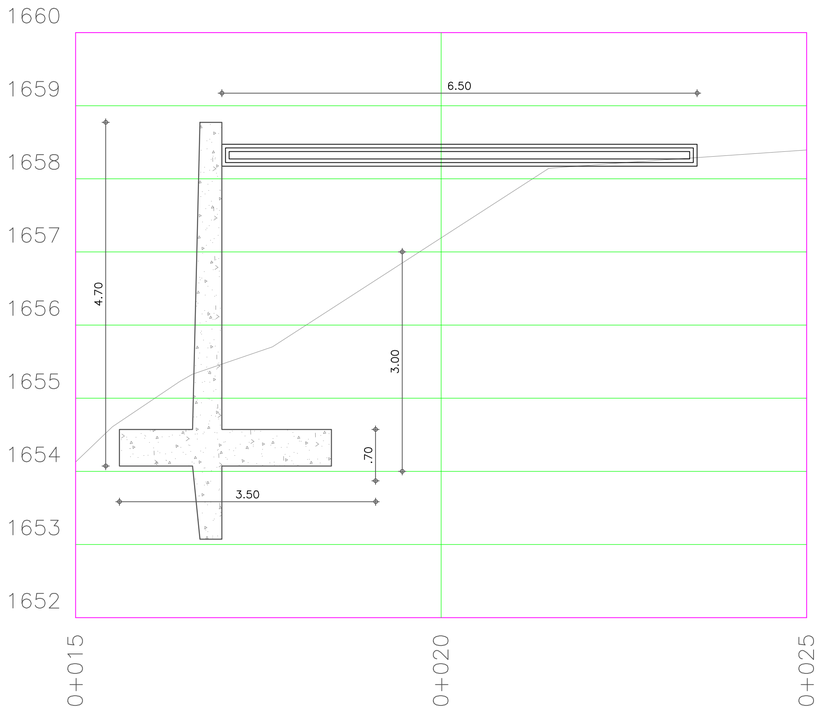


LOCALIZACION EN CORTE
MURO DE CONTENCION
ESCALA _____ 1 : 5 0

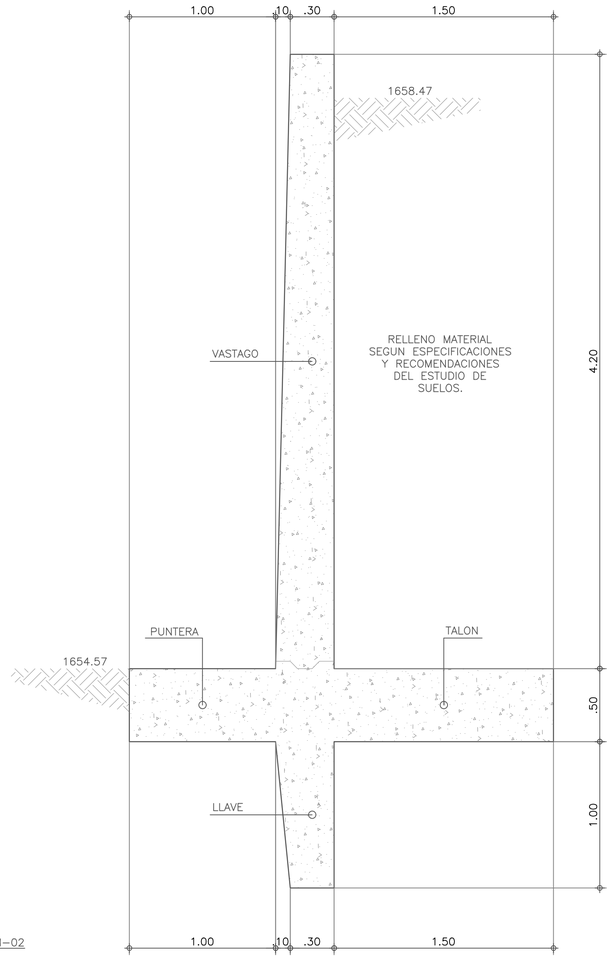


GEOMETRIA MURO DE CONTENCION
H=4.70m
ESCALA _____ 1 : 2 5

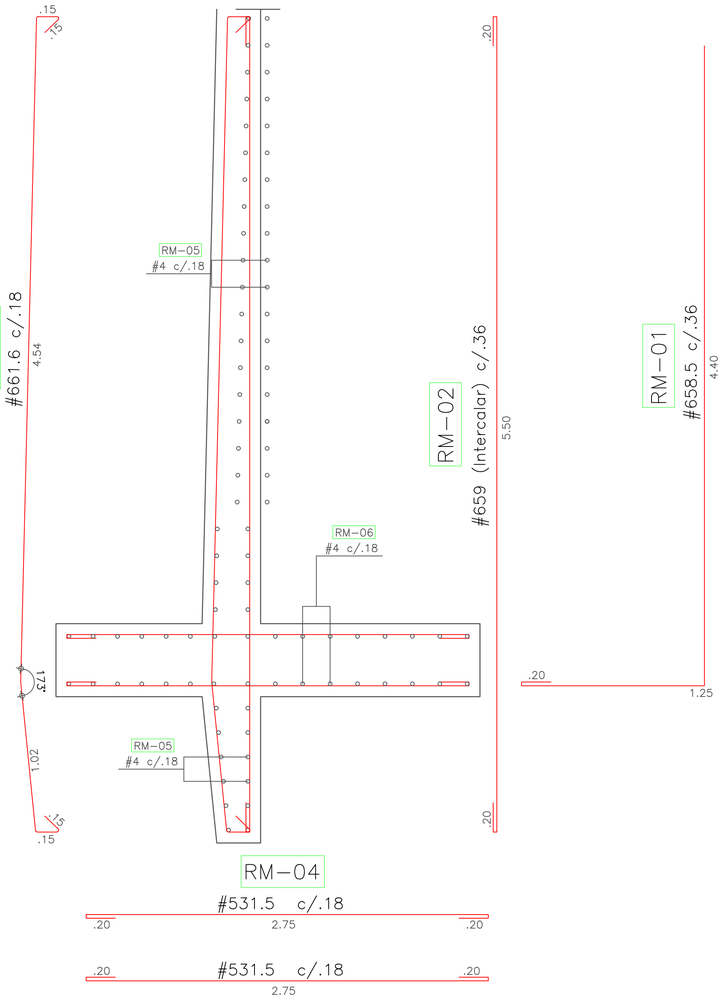

DISEÑO ESTRUCTURAL MURO CONTENCION
H=4.70m
ESCALA _____ 1 : 2 5



DETALLE JUNTA DE CONSTRUCCION
ESCALA _____ 1 : 5

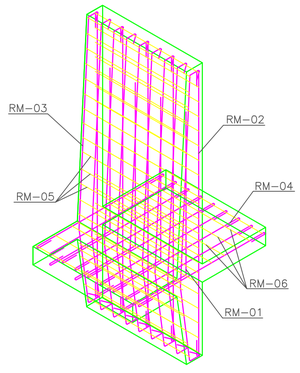

VISTA ISOMETRICA
DISTRIBUCION DE REFUERZO (1mL)
ESCALA _____ 1 : 5 0

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTIENE:
PLANO RECORD GEOMETRIA & REFUERZO MURO DE CONTENCION - MUNICIPIO DE CHITARRAQUE

REVISÓ:
JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834-0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:
JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:


CONVENCIONES
NOMENCLATURA DEL REFUERZO
Cantidad de Varillas
No Varilla en octavos de pulgada
#S6 /
Longitud en Decimetros


DÍGITO :
ING. SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :
1 : 50


FECHA :
DICIEMBRE 2025

ARCHIVO DIGITAL :
Plano Record Diseño Estructural Chitarraque.dwg


PLANO Nº

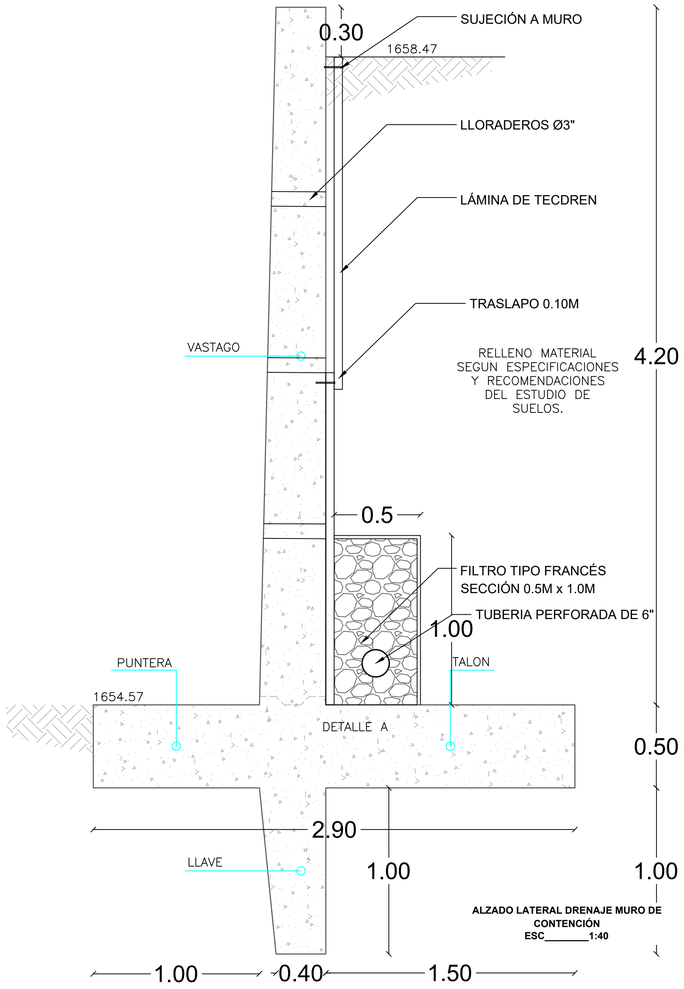


ALZADO LATERAL DRENAJE MURO DE CONTENCIÓN
ESC_____1:40

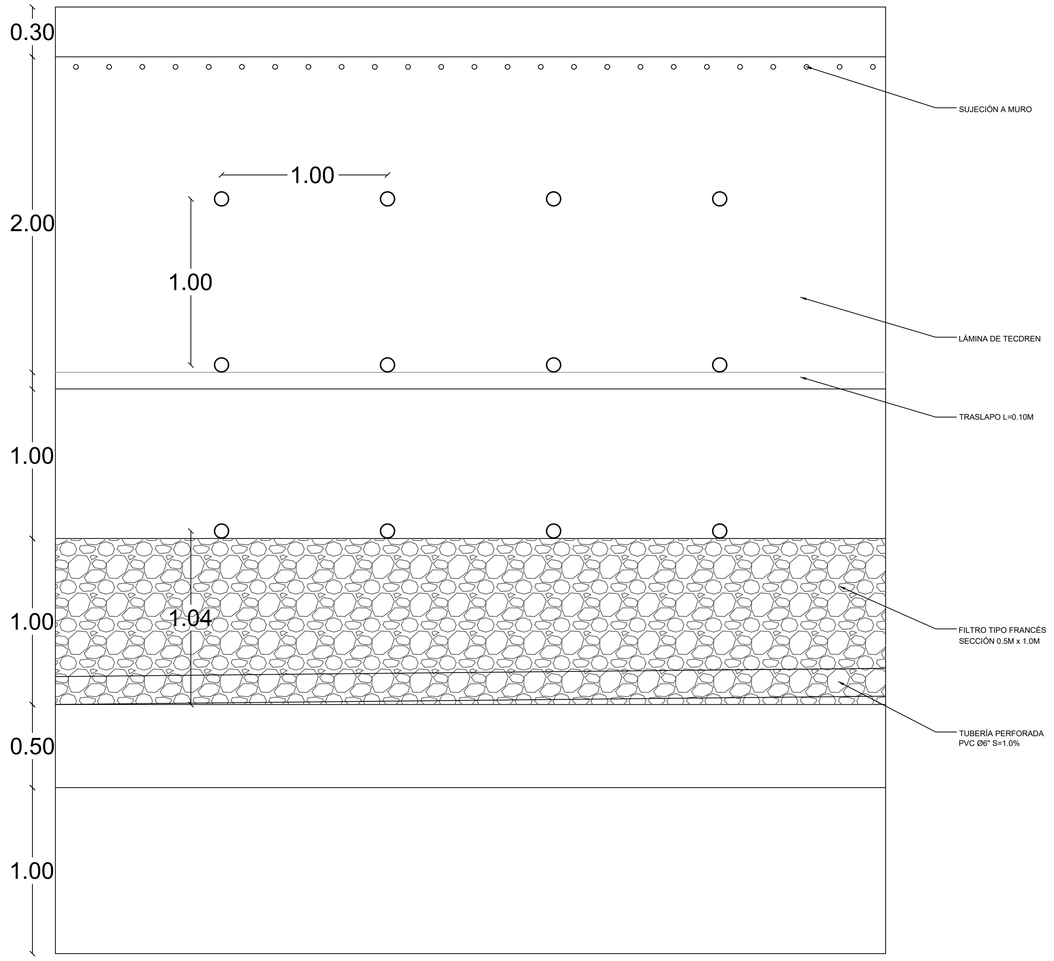


ALZADO FRONTAL DRENAJE MURO DE CONTENCIÓN
ESC_____1:40

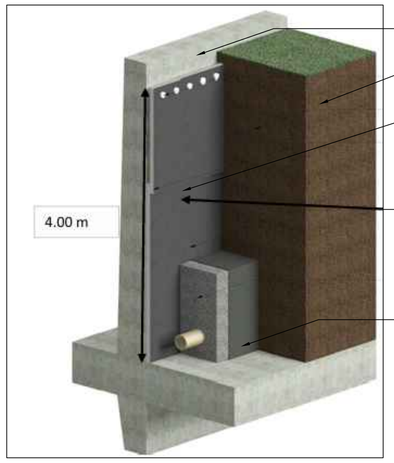

DETALLE ISOMÉTRICO DRENAJE MURO DE CONTENCIÓN
ESC_____S.E.

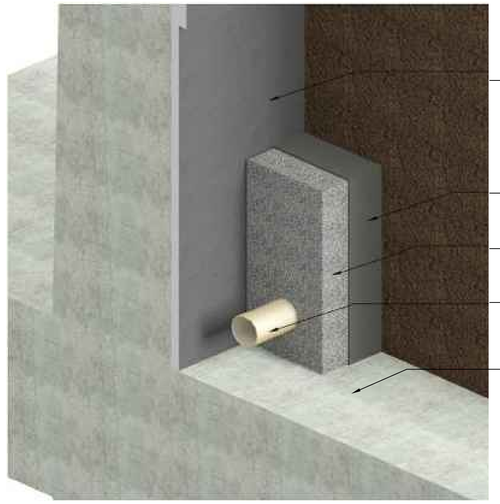

DETALLE A
ESC_____S.E.

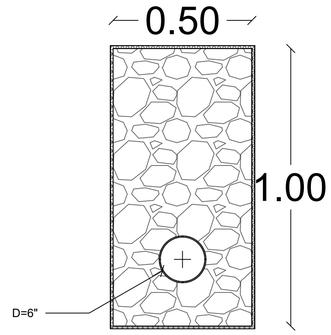

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA

MUNICIPIO DE CHITARAQUE

CONTIENE:

- PLANO RECORD:
- ALZADO LATERAL DRENAJE MURO DE CONTENCIÓN.
- ALZADO FRONTAL DRENAJE MURO DE CONTENCIÓN.
- DETALLE ISOMÉTRICO DRENAJE MURO DE CONTENCIÓN.
- DETALLE A.

REVISÓ:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTRE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

APROBO:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834-0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

LOCALIZACIÓN:



CONVENCIONES

DÍGITO :
ING. SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA


ESCALA :
INDICADA

FECHA :
DICIEMBRE DE 2025

ARCHIVO DIGITAL :
PLANO RECORD HIDRAULICO CHITARRAQUE.DWG

PLANO Nº

PLANOS RECORD MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO

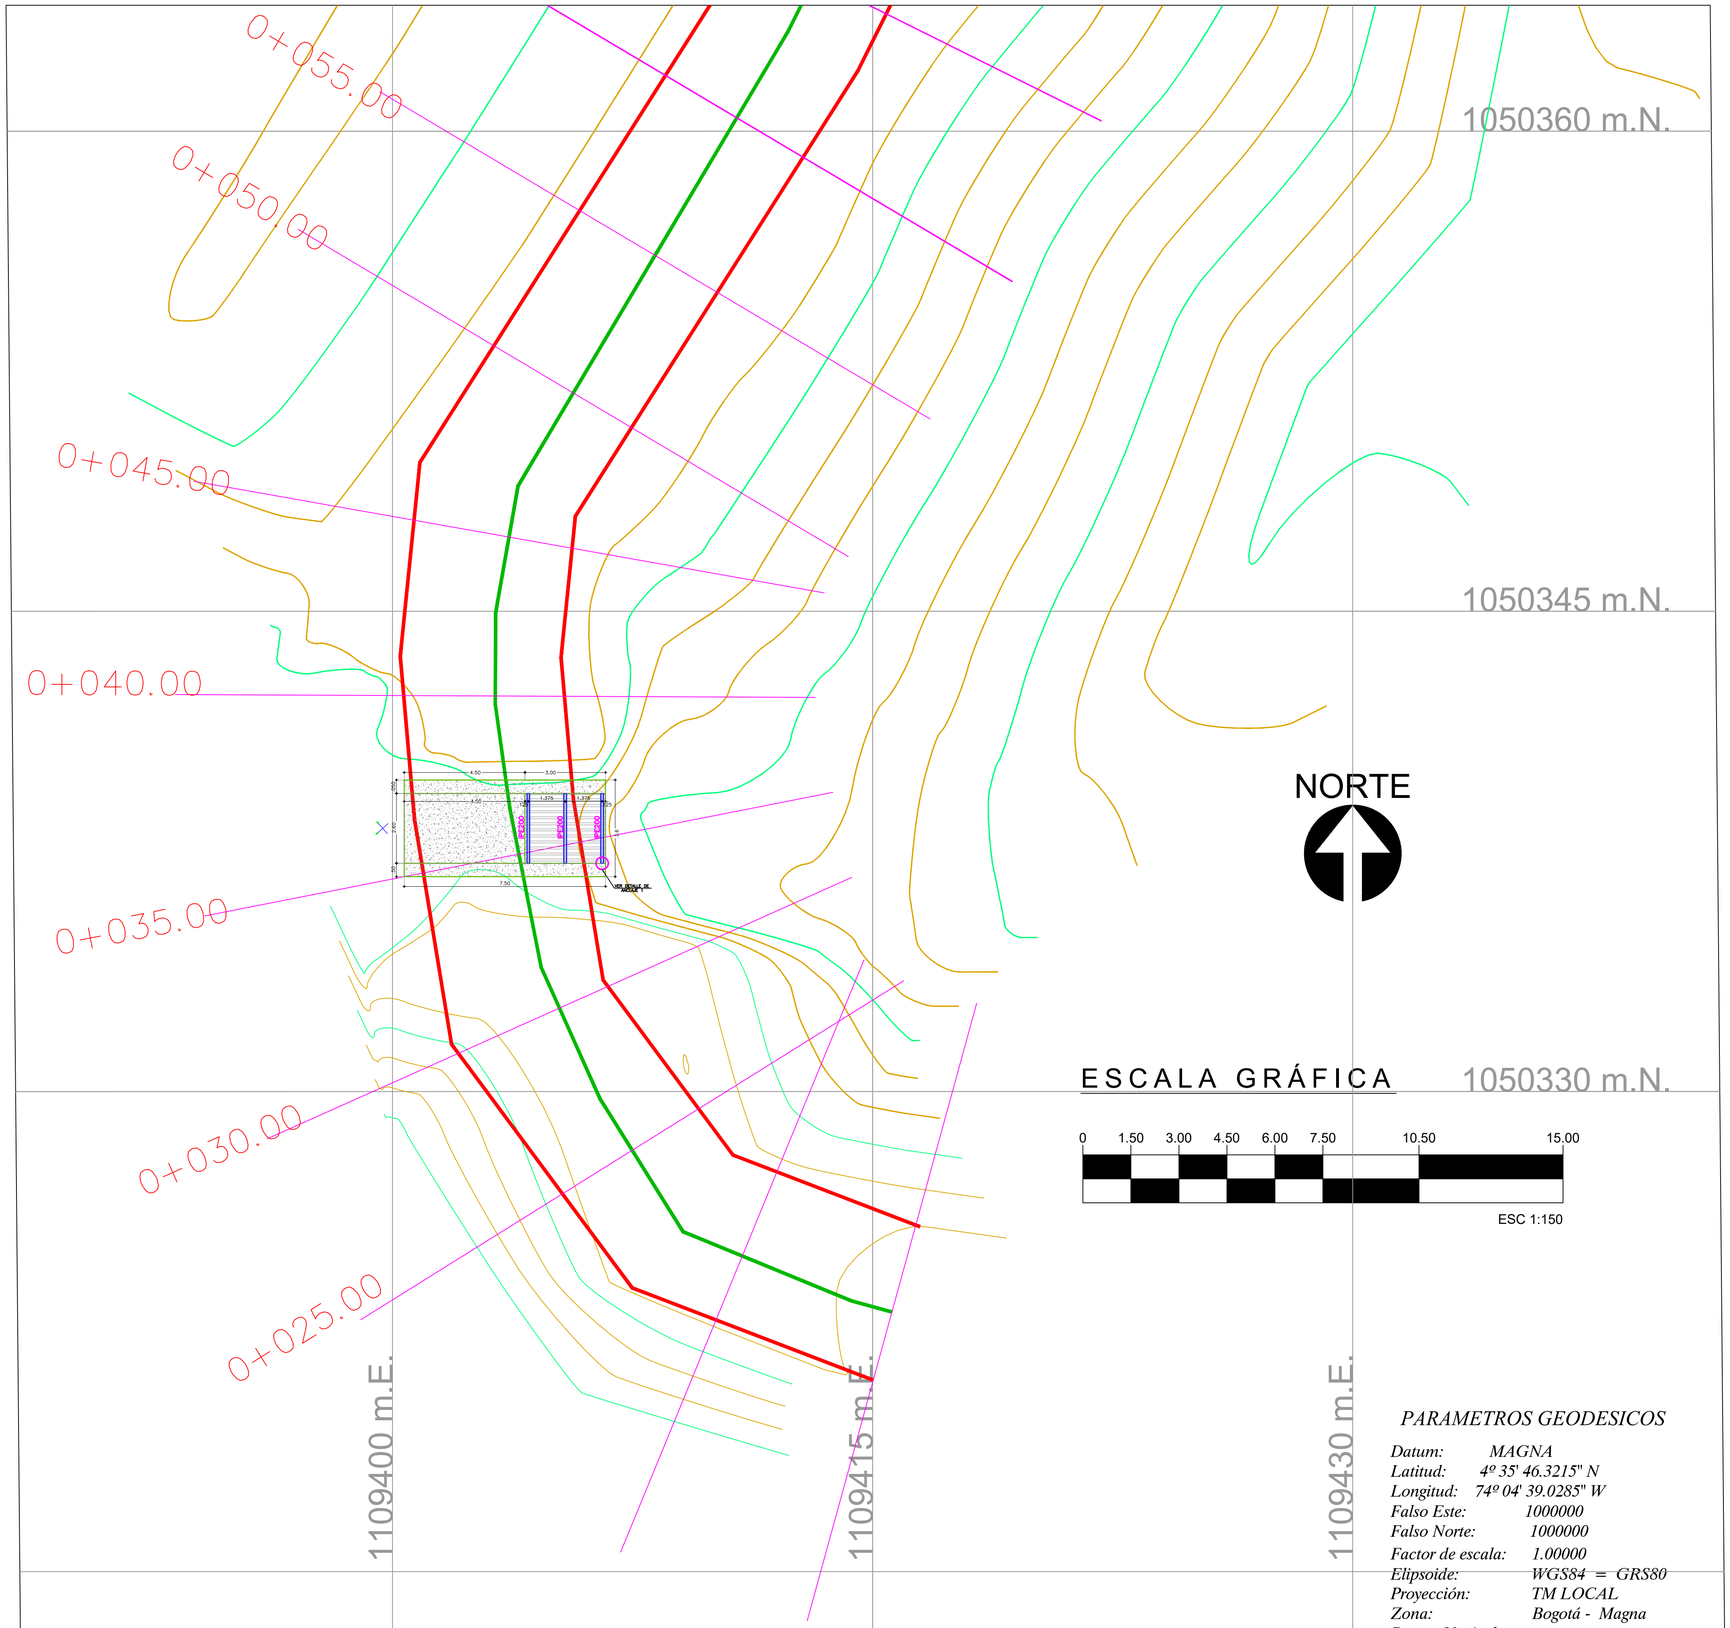


ESCALA GRÁFICA

0 1.50 3.00 4.50 6.00 7.50 10.50 15.00

ESC 1:150

PARAMETROS GEODESICOS

Datum: MAGNA
Latitud: 4º 35' 46.3215" N
Longitud: 74º 04' 39.0285" W
Falso Este: 1000000
Falso Norte: 1000000
Factor de escala: 1.00000
Elipsoide: WGS84 = GRS80
Proyección: TM LOCAL
Zona: Bogotá - Magna
Datum Vertical: m.s.n.m.m
Modelo Geoidal: EGM 96

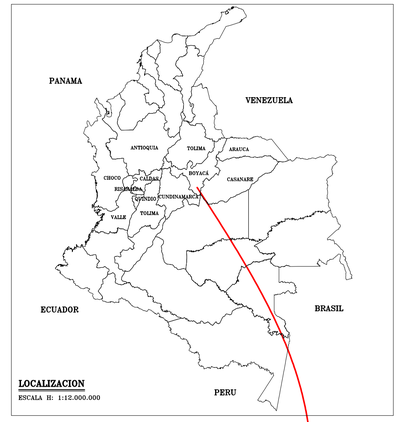


LOCALIZACION
ESCALA H: 1:12.000.000

LOCALIZACIÓN:

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ



MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO





GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTIENE:

PLANO RECORD - LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO TRAMO 2 CAMPOHERMOSO

REVISÓ:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834–0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERMEMERGENCIAS NORTE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



CONVENCIONES

- EJE PROYECTO
- CARRETEABLE
- ESTACION O P.K.
- SECCION TERRENO
- PERFIL TERRENO
- CURVA DE NIVEL

DÍGITO :

ING. SONIA MALENA SOTELO MARIN
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :

INDICADA

FECHA :

DICIEMBRE 2025

ARCHIVO DIGITAL :

PLANO RECORD_CAMPOHERMOSO.DWG

PLANO Nº DG DE

NORTE

ESCALA GRÁFICA

0 2 4 6 8 10 16

ESC 1:200

COORDENADAS BOX:
-VEREDA CORTADERAL
-LOCALIZACIÓN: 5° 05'43,9 N - 73°03'29,4 O

1160

1120

1080


1160

VISTA EN PLANTA

SECCIONES TRANSVERSALES

PARAMETROS GEODESICOS

Datum:	*MAGNA*
Latitud:	*5°03'02.6" N*
Longitud:	*73°05'27.1"W*
Falso Este:	*1000000*
Falso Norte:	*1000000*
Factor de escala:	*1.00000*
Elipsoide:	*WGS84 = GRS80*
Proyección:	*TM LOCAL*
Zona:	*Bogotá - Magna*
Datum Vertical:	*m.s.n.m.m*
Modelo Geoidal:	*EGM 96*

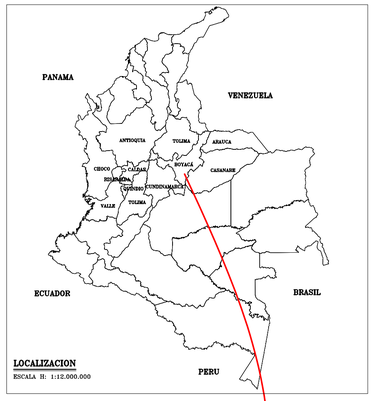


LOCALIZACION
ESCALA H: 1:12.000.000


LOCALIZACIÓN:

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ



MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO





GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS
PROVINCIA DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTIENE:

PLANO RECORD - LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
TRAMO 1 MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO - MURO EN TIERRA ARMADA

REVISÓ:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834-0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORIA BOYACA NORTE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



CONVENCIONES

- EJE PROYECTO
- CARRETEABLE
- ESTACION O P.K.
- SECCION TERRENO
- PERFIL TERRENO
- CURVA DE NIVEL

DÍGITO :

ING. SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :

INDICADA

FECHA :


DICIIEMBRE DE 2025

ARCHIVO DIGITAL :


LOC CAMPOHERMOSO MURO.DWG

PLANO Nº DG DE


DETALLES Y VISTAS DE BOX CULVERT EXISTENTE




PLANTA BOX CULVERT
Esc. 1 : 5 0

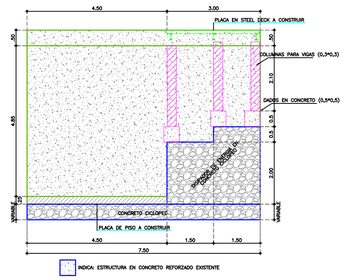


CORTE LONGITUDINAL
Esc. 1 : 5 0






CORTE A–A
Esc. 1 : 5 0

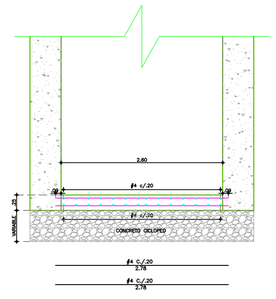


DETALLE REFUERZO DE PLACA DE PISO
Esc. 1 : 2 5


DETALLE LOSA DE STEEL DECK



DETALLE LOSA DE STEEL DECK



STEEL DECK 2" CALIBRE 20 (mm)
Esc. 1 : 5




VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL


DETALLE DE ANCLAJE TIPO 1
ESCALA _____ 1 : 10



PERFIL IPE 200
VIGAS METALICAS
ESCALA 1 : 5


DETALLE DE MURO EN TIERRA ARMADA

SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA MURO H=5.50m

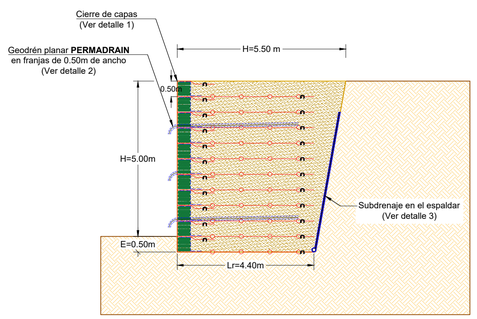


COLUMNAS PARA VIGAS (0,3*0,3)

DETALLE 1: CIERRE DE CAPAS
Esc_Sin




Gancho Metálico de Anclaje
Esc_Sin




DETALLES CONSTRUCTIVOS

DETALLE 2: ISOMÉTRICO SUBDRENAJE
Esc_Sin

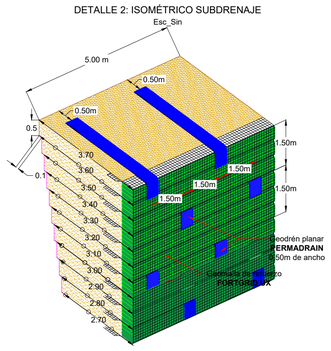

GEOMALLAS DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD CON RESISTENCIA DISPONIBLE DE:
27.5 KN/m (FORTGRID UX 50)

DETALLE 3
SUBDRENAJE EN EL ESPALDAR
Esc_Sin



GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO

CONTIENE:

- PLANO RECORD - PLANTA BOX, SECCION LONGITUDINAL, CORTES, DETALLES
- PLANO RECORD - SECCION TRANSVERSAL Y DETALLES DE MURO DE TIERRA ARMADA

REVISÓ:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834–0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBÓ:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
NIT:901.719.545-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



CONVENCIONES

NOMENCLATURA DEL REFUERZO
Cantidad de Varillas
No Varilla en octavos de pulgada
2#3 6.0
Longitud en Decimetros

DÍGITO :

ING. SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :

INDICADAS EN EL PLANO

FECHA :

SEPTIEMBRE DE 2025


ARCHIVO DIGITAL :

PLANO RECORD CAMPO HERMOSO.DWG

PLANO Nº

PLANOS RECORD
MUNICIPIO DE PAEZ

NORTE

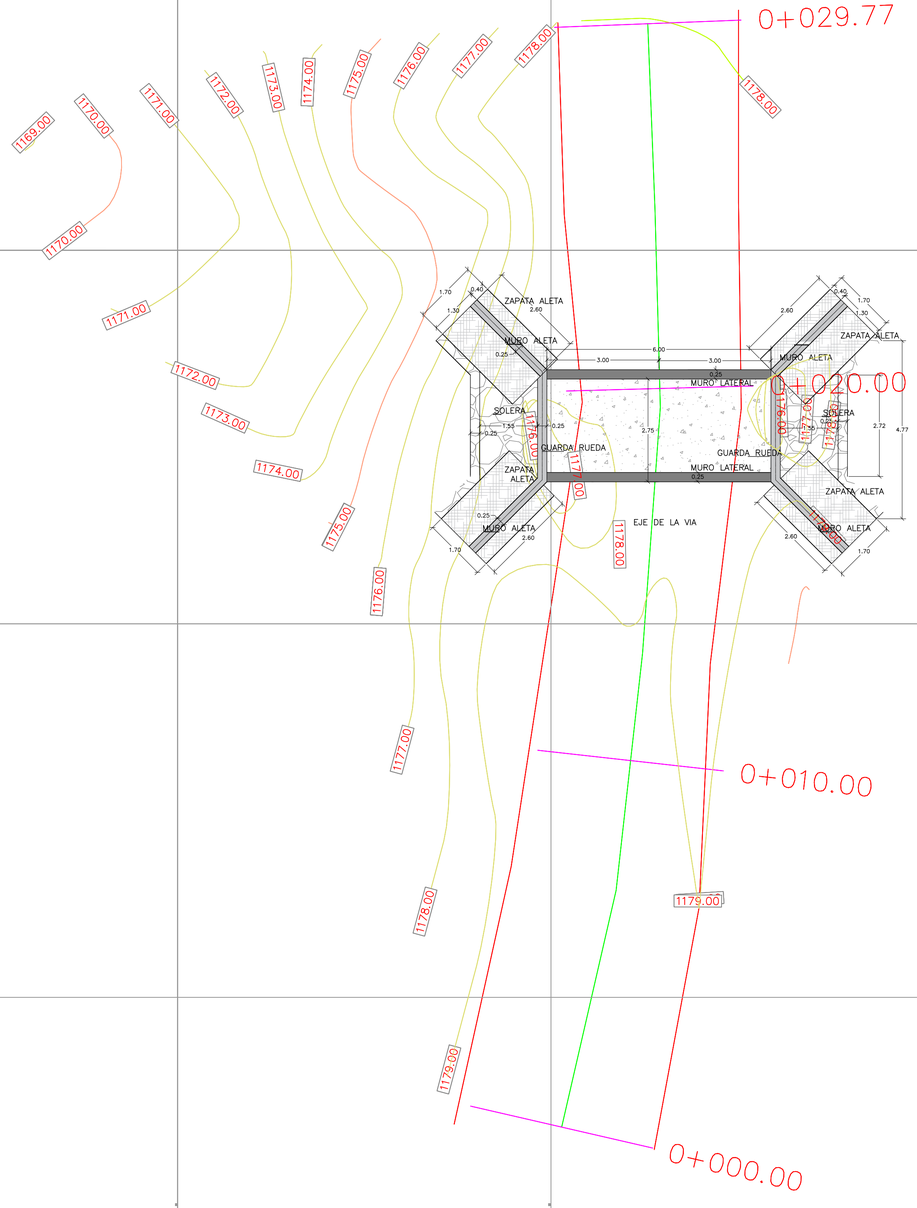

ESCALA GRÁFICA

0 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 7.00 10.00

ESC 1:100


COORDENADAS BOX:
-VEREDA CORTADERAL
-LOCALIZACIÓN: 5° 05'43,9 N - 73°03'29,4 O

1055320 m.N
1055310 m.N
1055300 m.N
1055290 m.N
1055280 m.N

1113030 m.E.
1113040 m.E.
1113050 m.E.
1113060 m.E.

PARAMETROS GEODESICOS

Datum:	*MAGNA*
Latitud:	*4º 35' 46.3215" N*
Longitud:	*74º 04' 39.0285" W*
Falso Este:	*1000000*
Falso Norte:	*1000000*
Factor de escala:	*1.00000*
Elipsoide:	*WGS84 = GRS80*
Proyección:	*TM LOCAL*
Zona:	*Bogotá - Magna*
Datum Vertical:	*m.s.n.m.m*
Modelo Geoidal:	*EGM 96*

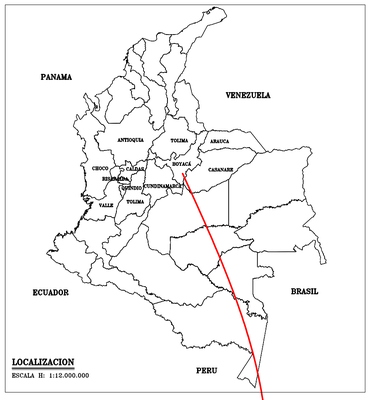

LOCALIZACIÓN:

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ



MUNICIPIO DE PAEZ





GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTIENE:

PLANO RECORD - LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO TRAMO 1 MUNICIPIO DE PAEZ - BOX CULVERT

LEVANTO:

Top. EDILBERTO GONZALEZ GALLO
L.P. 01-15626 CPNT

REVISÓ:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT.901.306.834-0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBÓ:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERMERGENCIAS NORTE
NIT.901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



CONVENCIONES

- EJE PROYECTO
- CARRETEABLE
- ESTACION O P.K.
- SECCION TERRENO
- PERFIL TERRENO
- CURVA DE NIVEL

DÍGITO :

Top. EDILBERTO GONZALEZ GALLO

ESCALA :

INDICADA


FECHA :


DICIEMBRE DE 2025

ARCHIVO DIGITAL :

LOC PAEZ BOX CULVERT.DWG

PLANO Nº DG DE

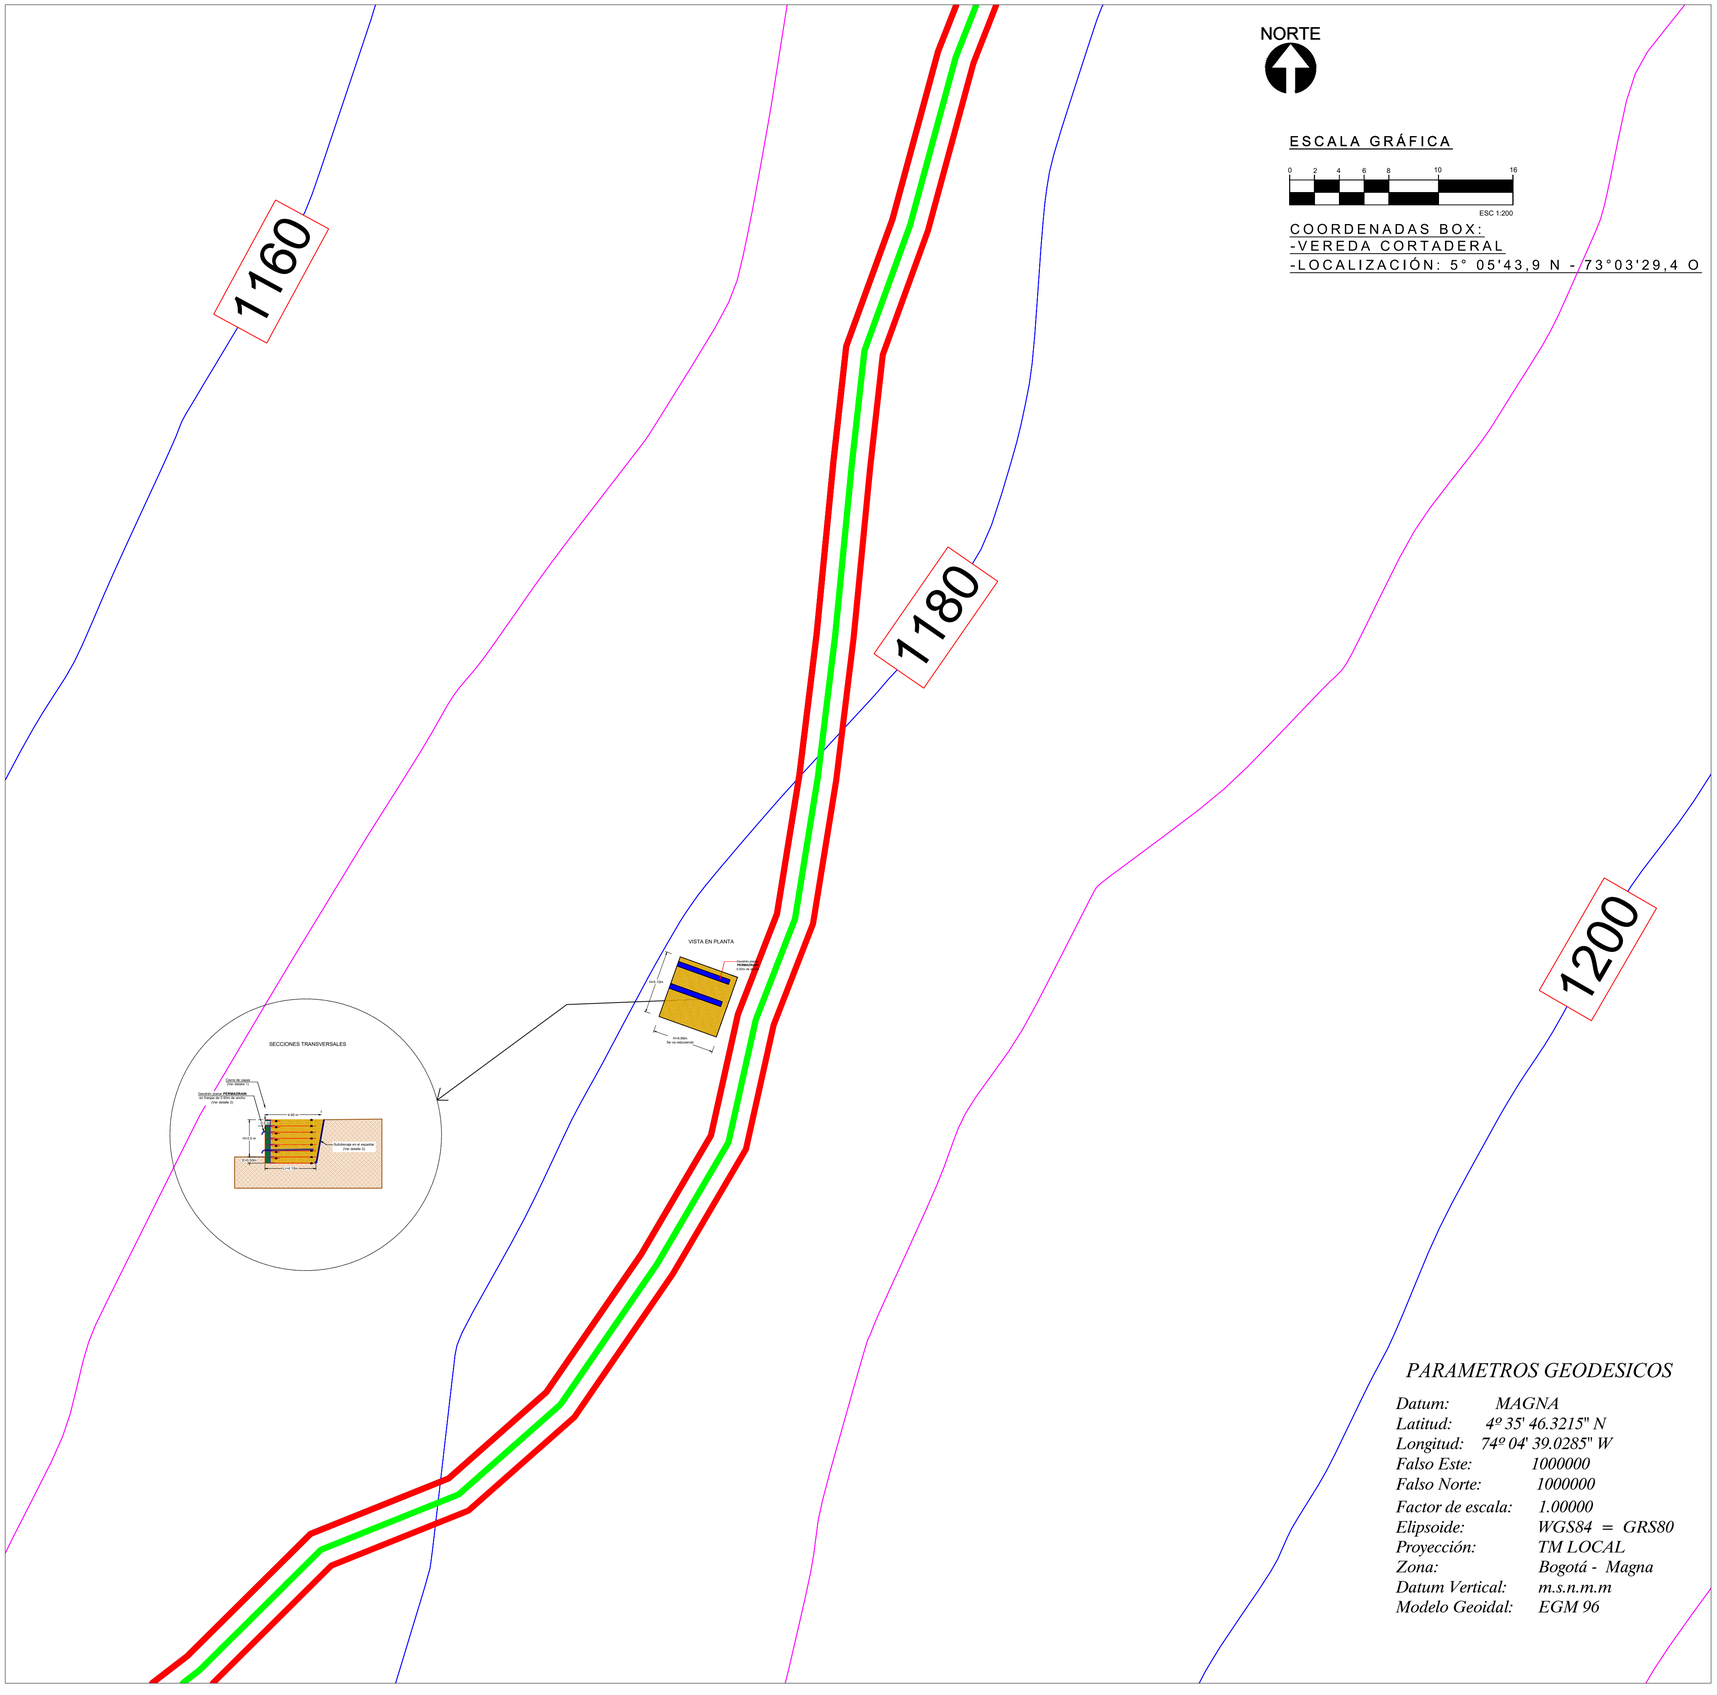

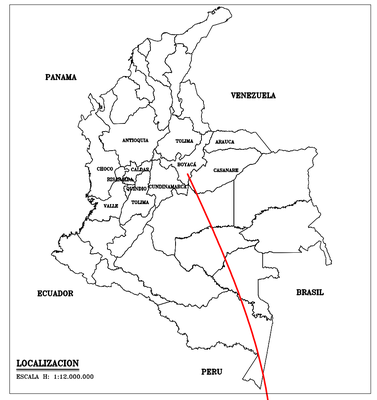







GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTIENE:

PLANO RECORD - LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO TRAMO 1 MUNICIPIO DE PAEZ - MURO EN TIERRA ARMADA

REVISÓ:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834-0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBÓ:

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



CONVENCIONES

- EJE PROYECTO
- CARRETEABLE
- ESTACION O P.K.
- SECCION TERRENO
- PERFIL TERRENO
- CURVA DE NIVEL

DÍGITO :

ING. SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :

INDICADA


FECHA :

DICIEMBRE DE 2025


ARCHIVO DIGITAL :

LOC PAEZ MURO EN TIERRA.DWG

PLANO Nº DG DE

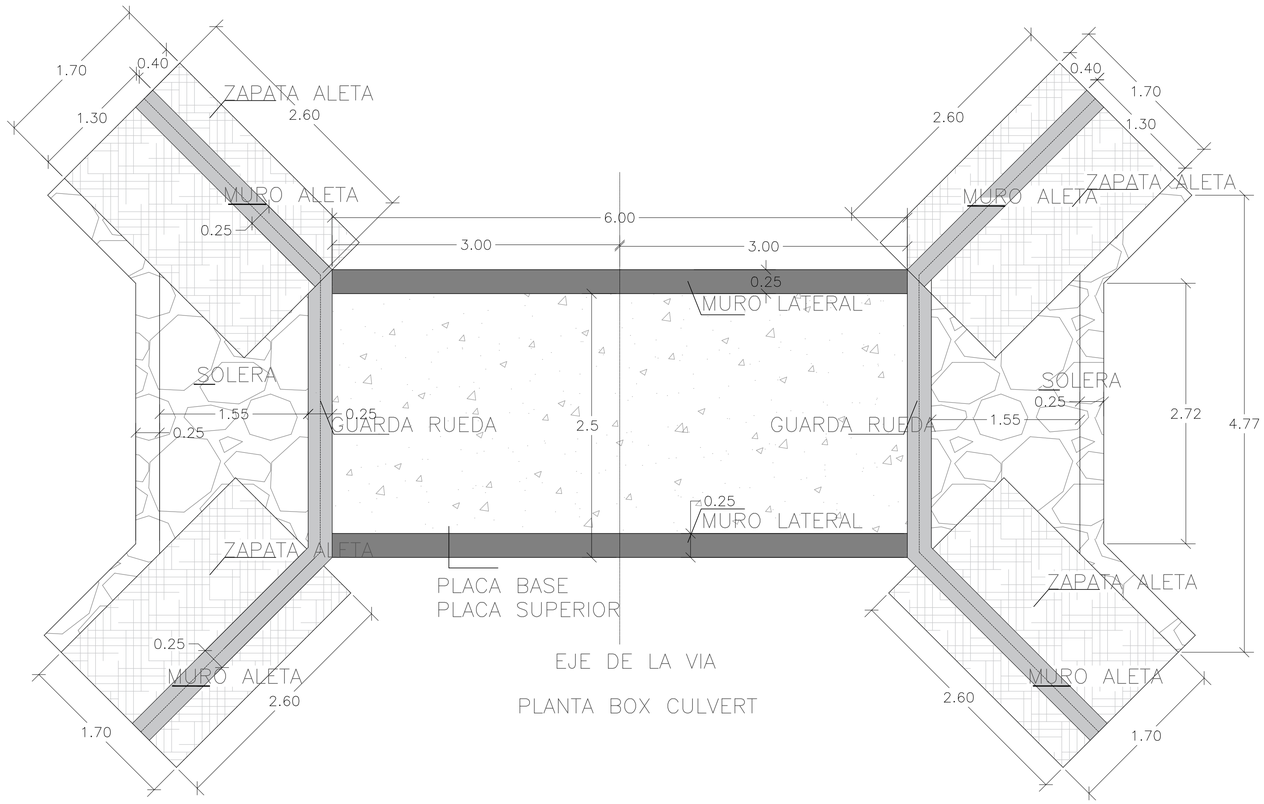


REFUERZO BOX CULVERT

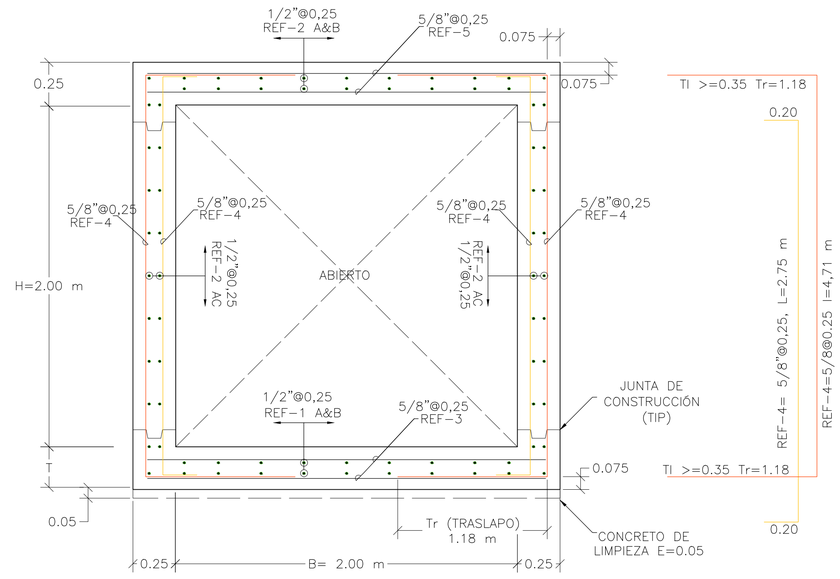

REF-3=5/8"@0,25 L=2,5 m


REF-5=5/8"@0,25 L=2 m


SECCIÓN TÍPICA A
ESCALA: 1:25

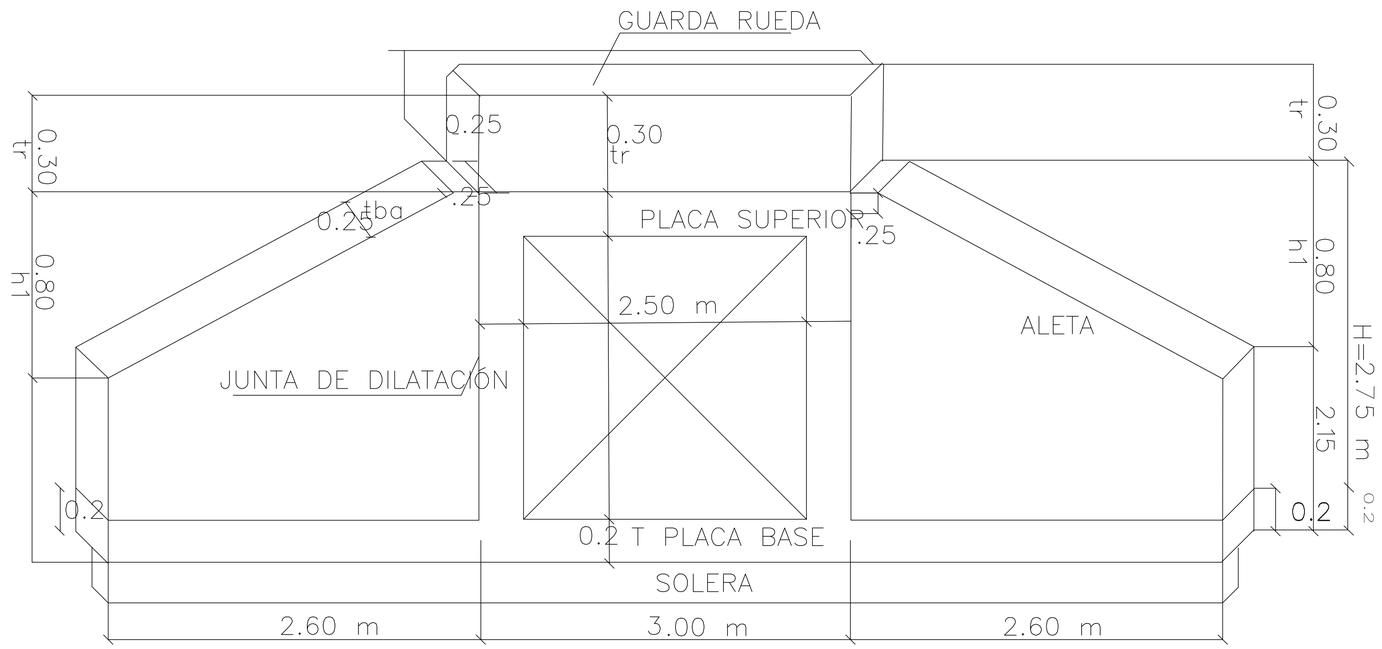

VISTA FRONTAL BOX CULVERT

MURO EN CONCRETO

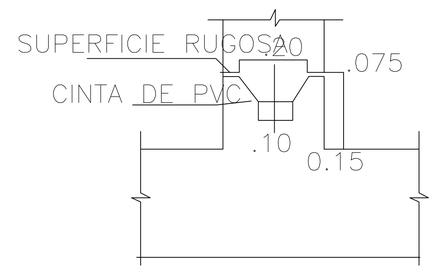

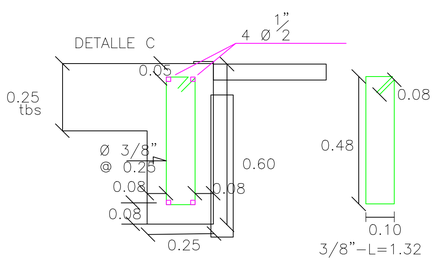

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTIENE:

PLANO RECORD DEL GEOMERTRIA BOX CULVERT - MUNICIPIO DE PAEZ

REVISIÓN:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834-0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



CONVENCIONES

DÍGITO :

ING.SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :

INDICADAS

FECHA :


DICIEMBRE 2025


ARCHIVO DIGITAL :

PLANO RECORD PAEZ.DWG


PLANO Nº DG

BOX CULVERT GEOMETRÍA GENERAL Y REFUERZO

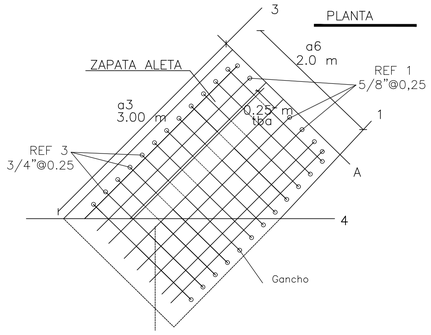

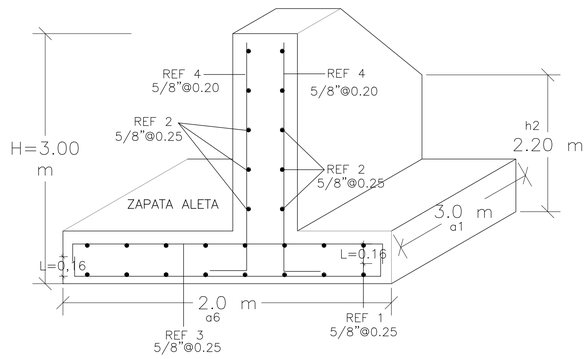


DETALLES GENERALES DEL REFUERZO			
ELEMENTO	REFUERZO	FORMA	d
PLACA BASE	REF 1 5/8"@0.25	d + L	3,325 m
PLACA BASE	REF 3 3/4"@0.25	L + d + L	1.85 m
ALETAS	REF 2 5/8"@0.25	$d_{Variable}$	Desde 2.925 m hasta 0.43
ALETAS	REF 4 3/4"@0.20	L + $d_{Variable}$	Desde 3.0 m hasta 2.125 m

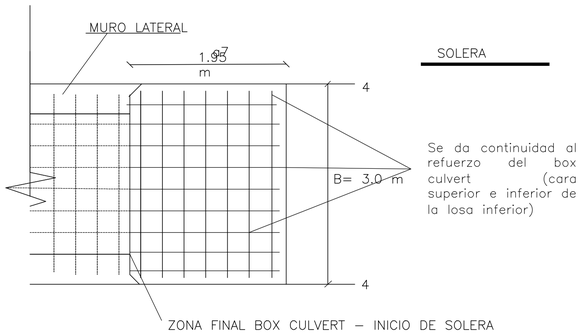


SOLERA

Se da continuidad al refuerzo del box culvert (cara superior e inferior de la losa inferior)

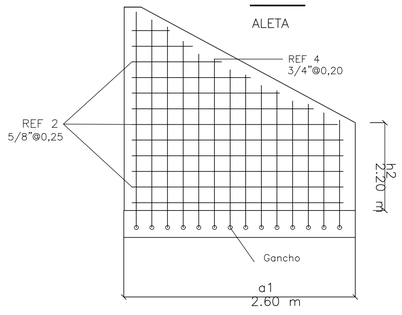

DETALLES GENERALES – REFUERZO LONGITUDINAL				
BARRA NO.	LONGITUD TRASLAPO (m)	L (m)	D (m)	PESO (kg/m)
2	0.37	0.11	0.04	0.25
3	0.54	0.16	0.06	0.56
4	0.72	0.22	0.08	0.99
5	0.90	0.28	0.10	1.56
6	1.09	0.33	0.12	2.24
7	1.58	0.39	0.13	3.05
8	1.81	0.44	0.15	3.98

GANCHO A 90°



GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTIENE:

PLANO RECORD DEL GEOMERTRIA BOX CULVERT Y CANTIDADES DE OBRA MUNICIPIO DE PAEZ

REVISIÓN:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834-0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



CONVENCIONES

DÍGITO :

ING.SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :

INDICADAS

FECHA :


DICIEMBRE 2025

ARCHIVO DIGITAL :

PLANO RECORD PAEZ.DWG

PLANO Nº DG

PLANOS RECORD
MUNICIPIO DE SAN MATEO

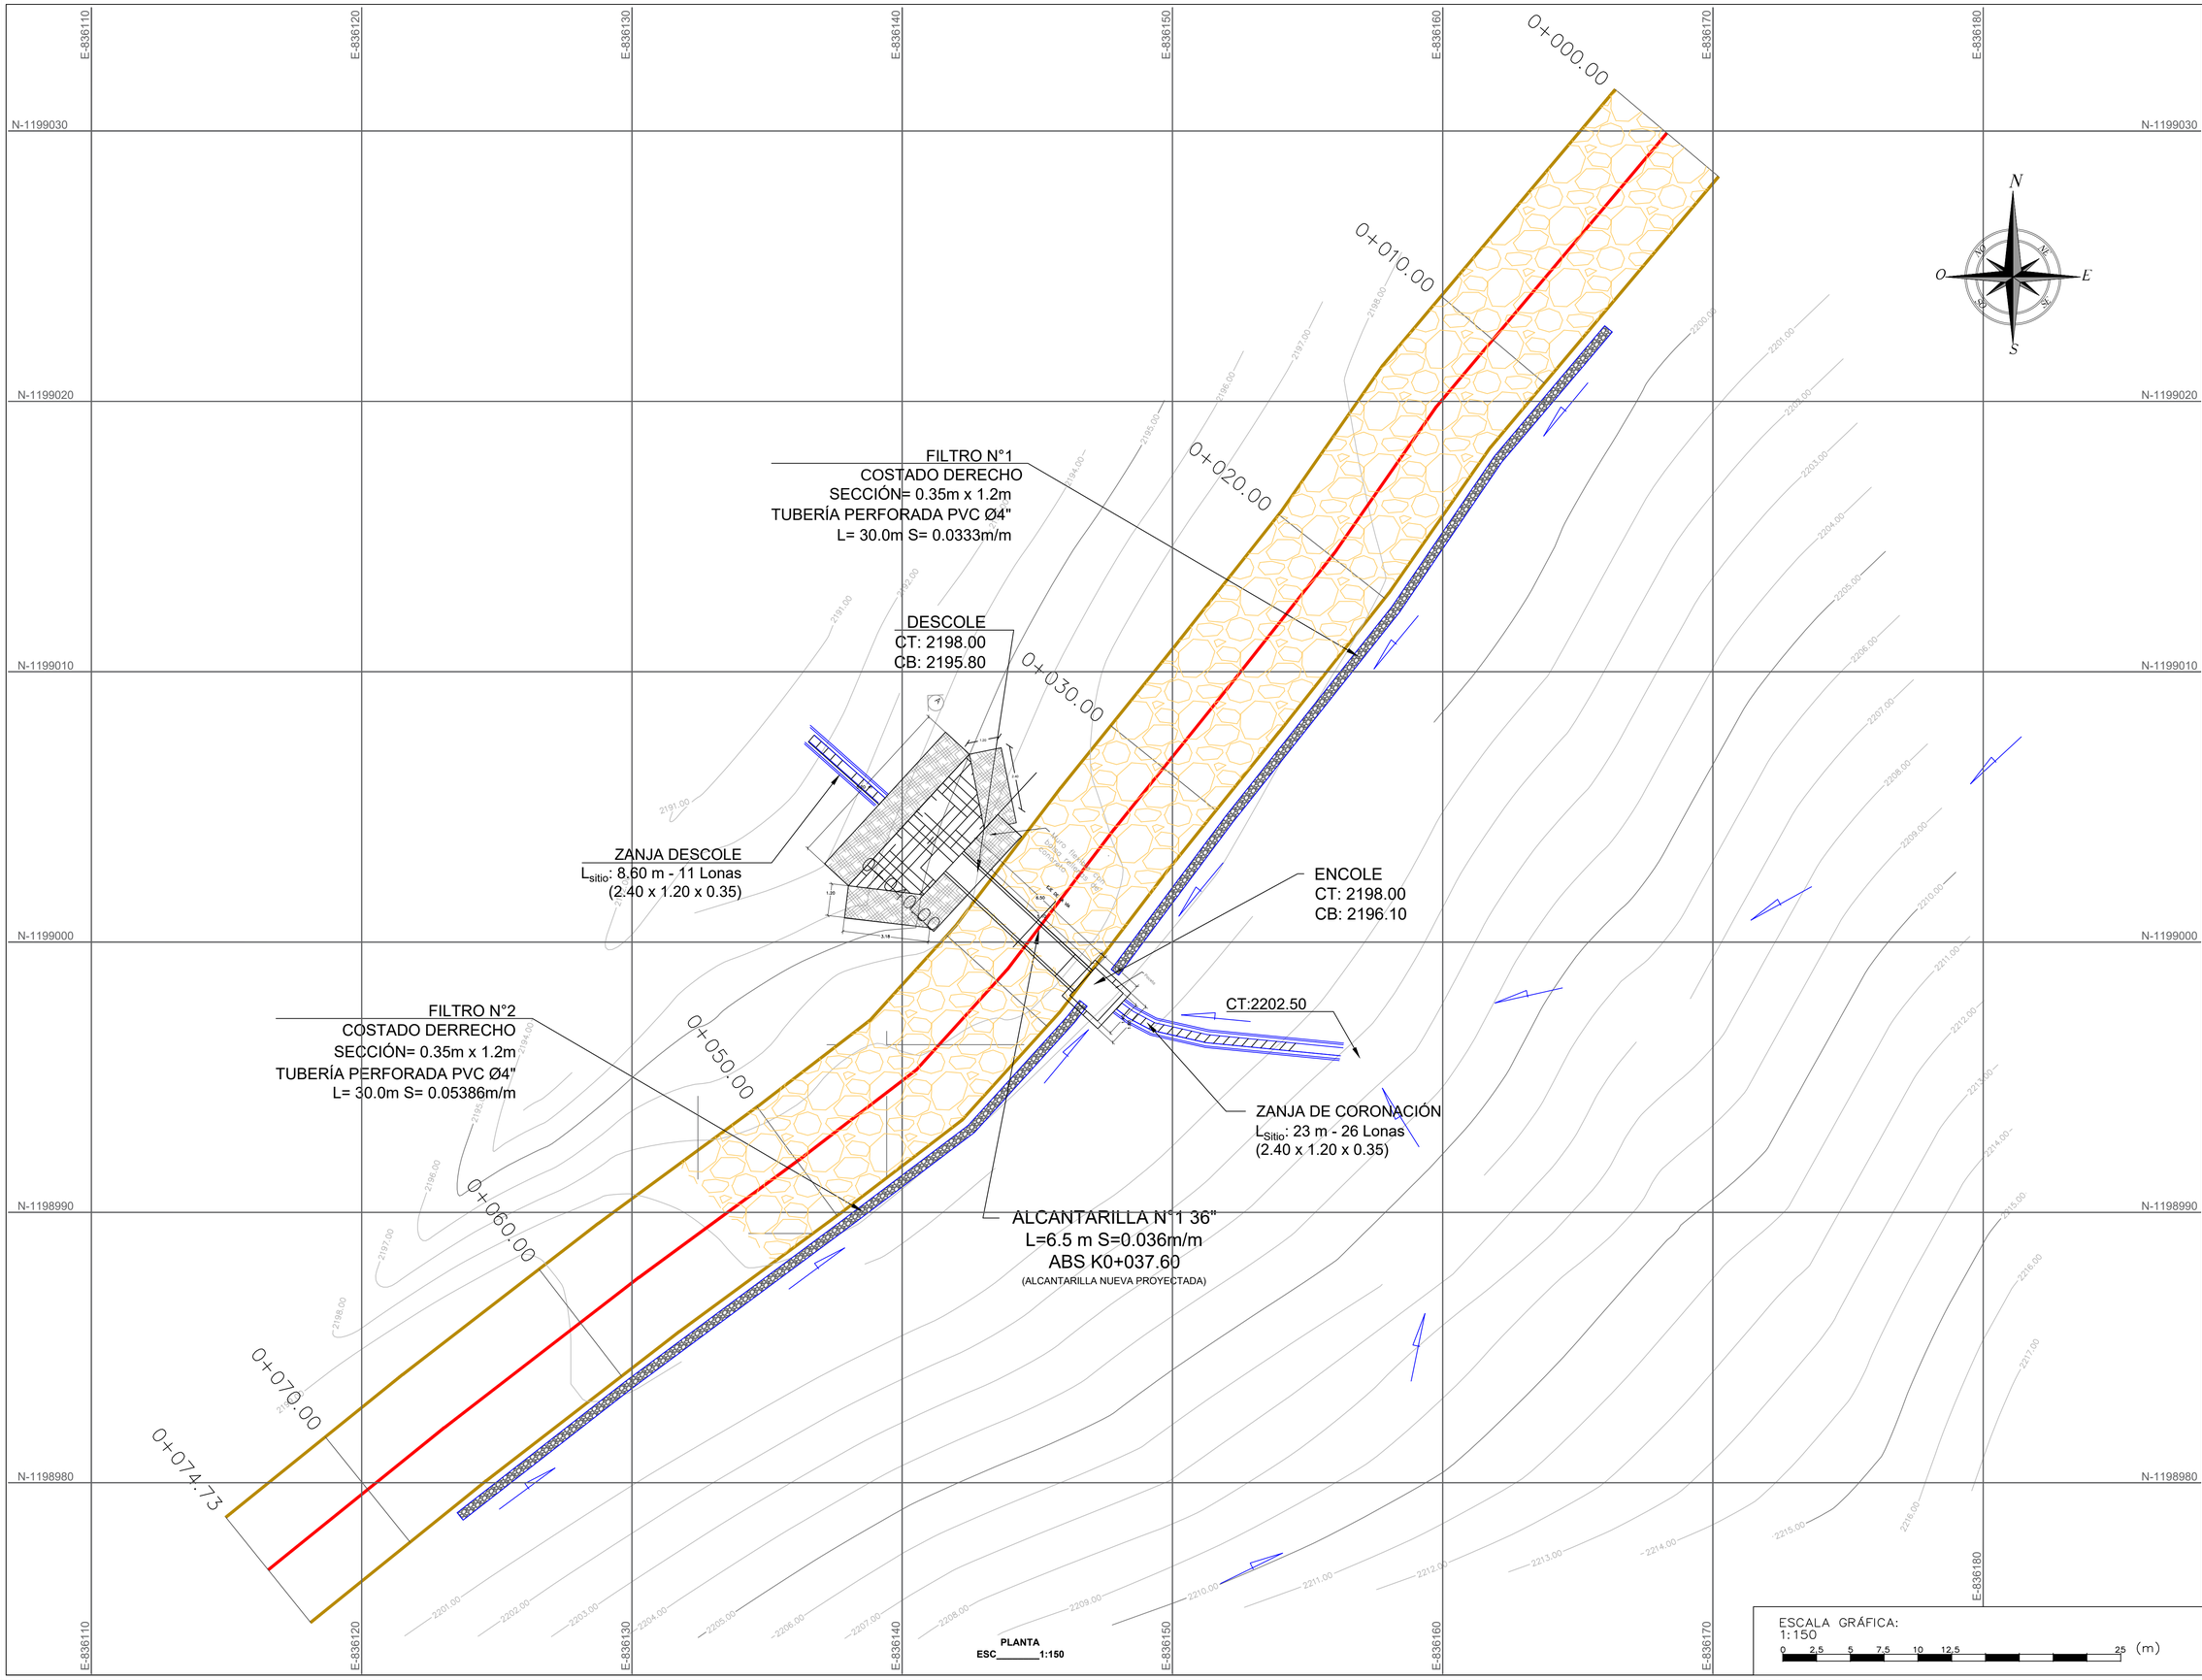

PLANTA
ESC_____1:150

ESCALA GRÁFICA:
1:150
0 2.5 5 7.5 10 12.5 25 (m)

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA

MUNICIPIO DE SAN MATEO

CONTIENE:

- PLANO RECORD PLANTA DE ESTRCUTURAS HIDRAULICAS

REVISÓ:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834-0
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:

ING. JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO - REPRESENTANTE LEGAL, NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



CONVENCIONES

- VÍAS
- CURVAS DE NIVEL
- ZANJA DE CORONACIÓN
- ALCANTARILLA PROYECTADA
- FILTRO PROYECTADO
- DIRECCIÓN DE FLUJO

DÍGITO :

ING. SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :

INDICADA


FECHA :


DICIEMBRE DE 2025


ARCHIVO DIGITAL :


LOCALIZACIÓN SAN MATEO.DWG

PLANO Nº DE

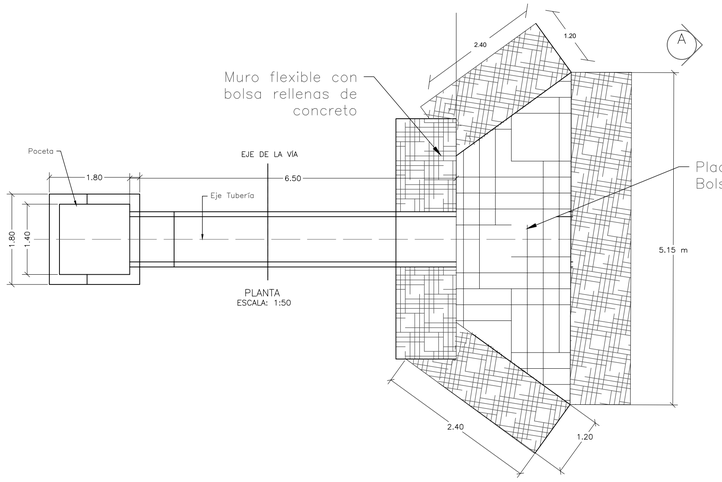





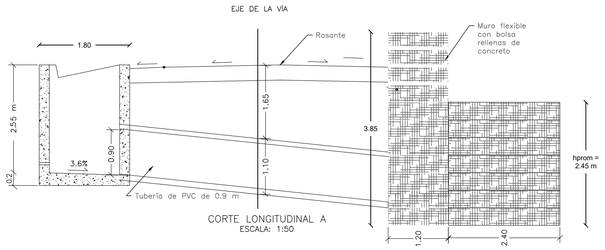

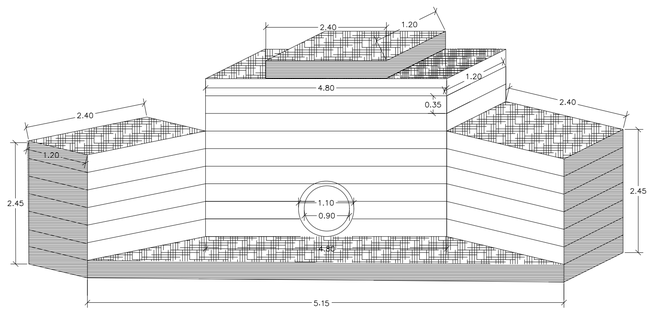


DETALLE DEL REFUERZO

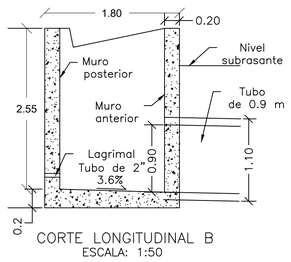

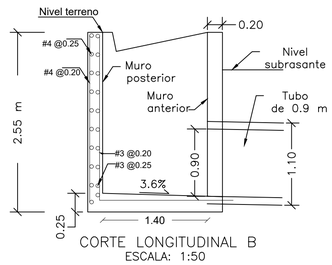


	REFUERZO POCETA			
ITEM	ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
POCETA	4	4.24	9	37.93
	3	3.90	9	19.66
	4	2.06	1	2.05
	3	1.86	1	1.04
	4	3.34	1	3.32
	3	2.94	1	1.65
	4	3.48	6	20.75
	3	5.80	6	19.49
	4	5.90	3	17.59
	3	4.70	3	7.90
	4	2.28	4	9.07
	3	2.28	4	5.11
	4	2.08	8	16.54
	3	2.08	8	9.32
	4	1.54	4	6.12
	4	1.36	4	5.41
	4	1.28	4	5.09
		SUBTOTAL		188.03

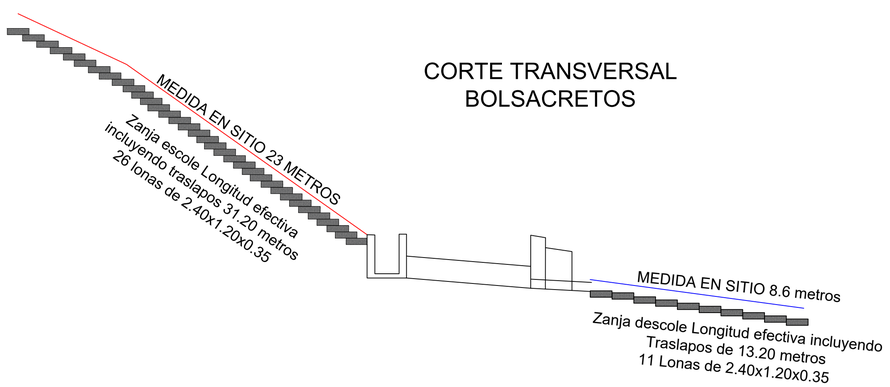


CORTE TRANSVERSAL BOLSACRETOS


ISOMETRICO FILTRO LATERAL TALUD




SECCIÓN ZANJA DE CORONACIÓN




SECCIÓN TRANSVERSAL ZANJA DE CORONACIÓN



DETALLE DE ZANJA DE CORONACIÓN



SECCIÓN FILTRO LATERAL TALUD

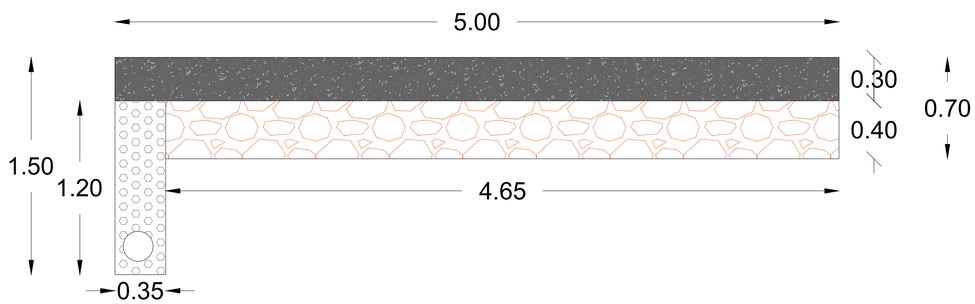

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA

MUNICIPIO DE SAN MATEO

CONTIENE:

- DETALLE CONSTRUCTIVO ALCANTARILLA.
- DETALLE CONSTRUCTIVO FILTRO FRANCES.
- DETALLE CONSTRUCTIVO ZANJA DE CORONACIÓN.

REVISÓ:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834-0
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



CONVENCIONES

DÍGITO :
ING. SONIA MALENA MARIN SOTELO

ESCALA :
INDICADA


FECHA :
DICIEMBRE 2025

ARCHIVO DIGITAL :
PLANO RECORD SAN MATEO

PLANO Nº

PLANOS RECORD MUNICIPIO DE SAN EDUARDO

1966

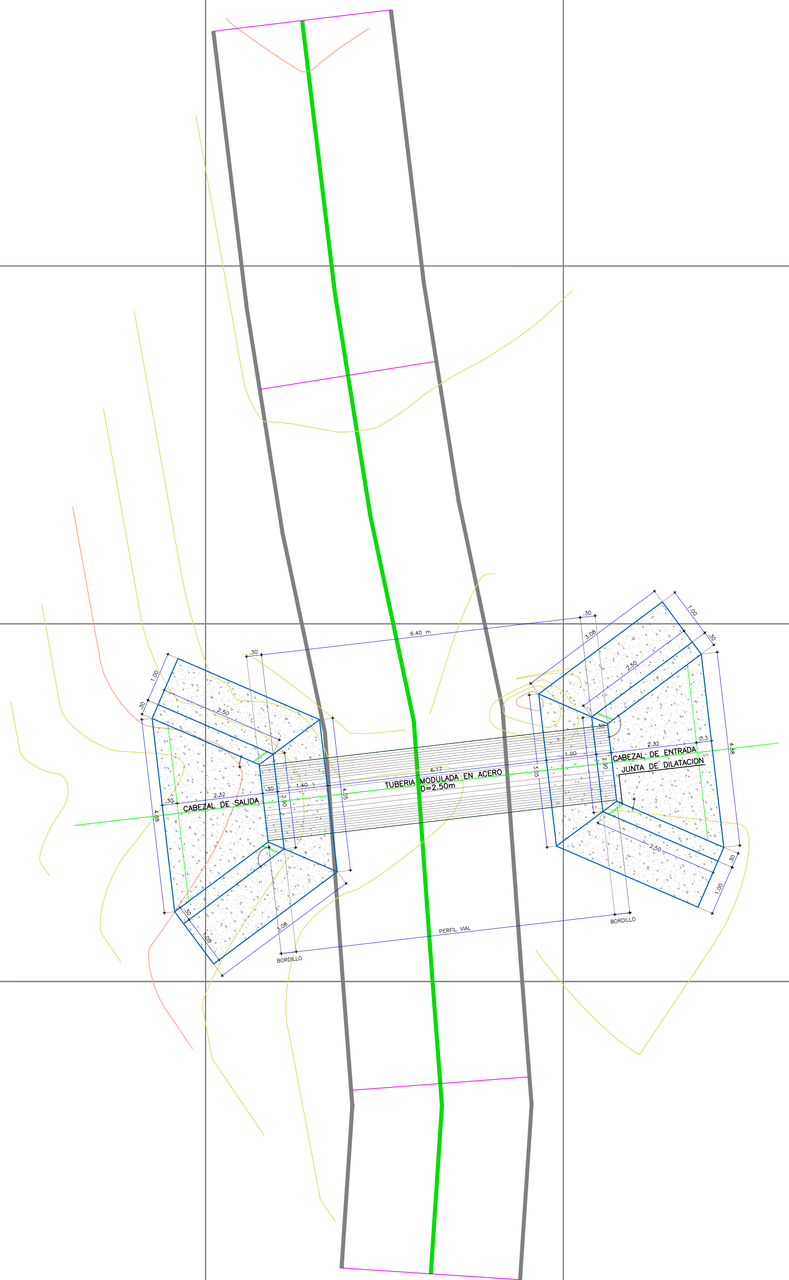

1069730 m.N.

1069720 m.N.

1069710 m.N.

NORTE

ESCALA GRÁFICA

0 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 7.00 10.00

ESC 1:100


1108080 m.E.

1108090 m.E.

1108100 m.E.

1108110 m.E.

1108120 m.E.

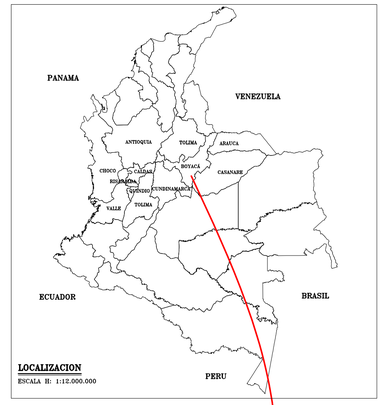

LOCALIZACION

ESCALA H: 1:12.000.000

LOCALIZACIÓN:

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ



MUNICIPIO DE SAN EDUARDO





GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTIENE:

LOZALIZACIÓN DE OBRAS EN ELMUNICIPIO DE SAN EDUARDO

REVISÓ:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834-0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBÓ:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



CONVENCIONES

CARRETEABLE

ESTACION P.K.

CURVA DE NIVEL

DIGITÓ:
ING. SONIA MALENA SOTELO MARIN
RESIDENTE DE OBRA


ESCALA :
INDICADA

FECHA :
DICIEMBRE 2025


ARCHIVO DIGITAL :
LOC_SAN_EDUARDO.DWG

PLANO Nº DG DE


1067

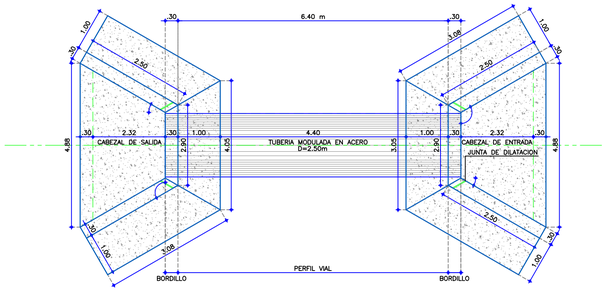


PLANTA ALCANTARILLA

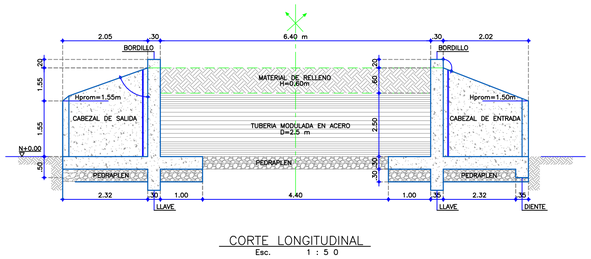


CORTE LONGITUDINAL
Esc. 1 : 5 0

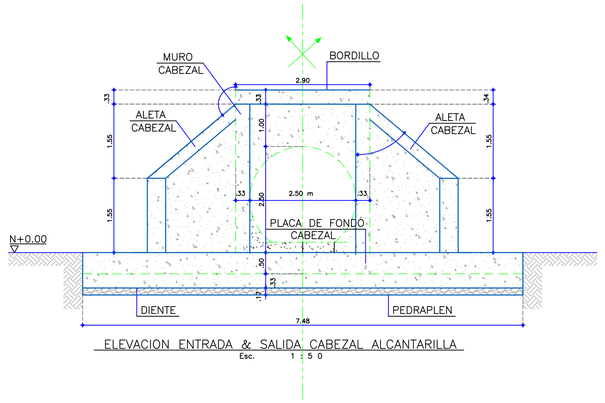


ELEVACION ENTRADA & SALIDA CABEZAL ALCANTARILLA
Esc. 1 : 5 0

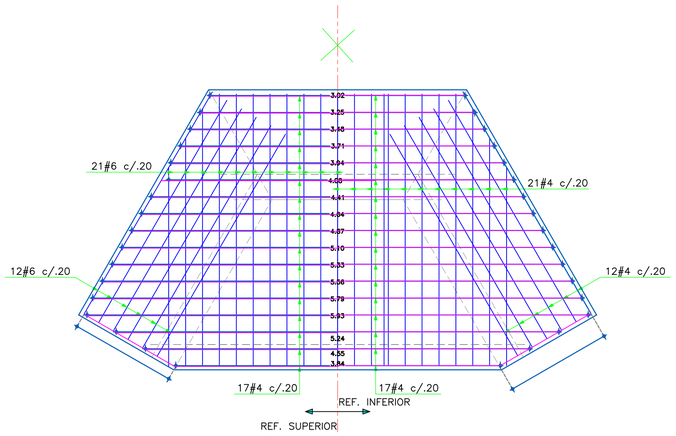


PLANTA REFUERZO PLACA DE FONDO CABEZAL
Esc. 1 : 2 5

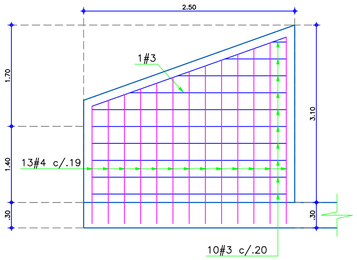

AMBAS CARAS
CONTRA EL RELLENO & CONTRA EL CANAL

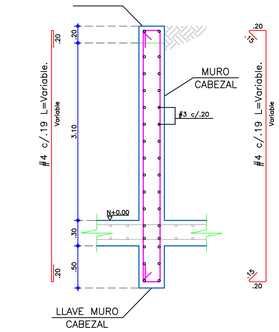


DETALLE REFUERZO MURO CABEZAL & LLAVE
Esc. 1 : 2 5

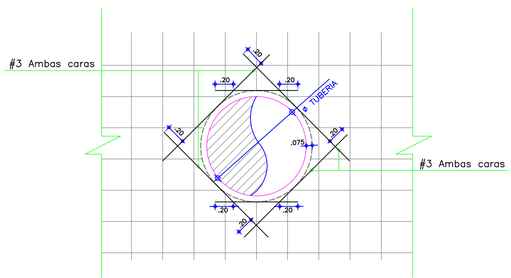


DETALLE PASE TUBERIAS
Esc. 1 : 2 5


ELEVACION REFUERZO ALETAS CABEZAL
Esc. 1 : 2 5



DETALLE REFUERZO DE DIENTE
Esc. 1 : 2 5



DETALLE JUNTA DE CONSTRUCCION
Esc. 1 : 1 2. 5



DETALLE JUNTA DE DILATACION
Esc. 1 : 2 5

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTIENE:

PLANO RECORD: PLANTA DE ALCANTARILLA D:2.5 m, SECCIÓN LONGITUDINAL, CORTES, DETALLES & REFUERZOS ESTRUCTURALES - MUNICIPIO DE SAN EDUARDO

REVISÓ:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834-0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



CONVENCIONES



DÍGITO :

ING SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :

INDICADA

FECHA :

DICIEMBRE 2025


ARCHIVO DIGITAL :

PLANO RECORD SAN EDUARDO.DWG


PLANO Nº DG

PLANOS RECORD MUNICIPIO DE SANTA MARIA

1969

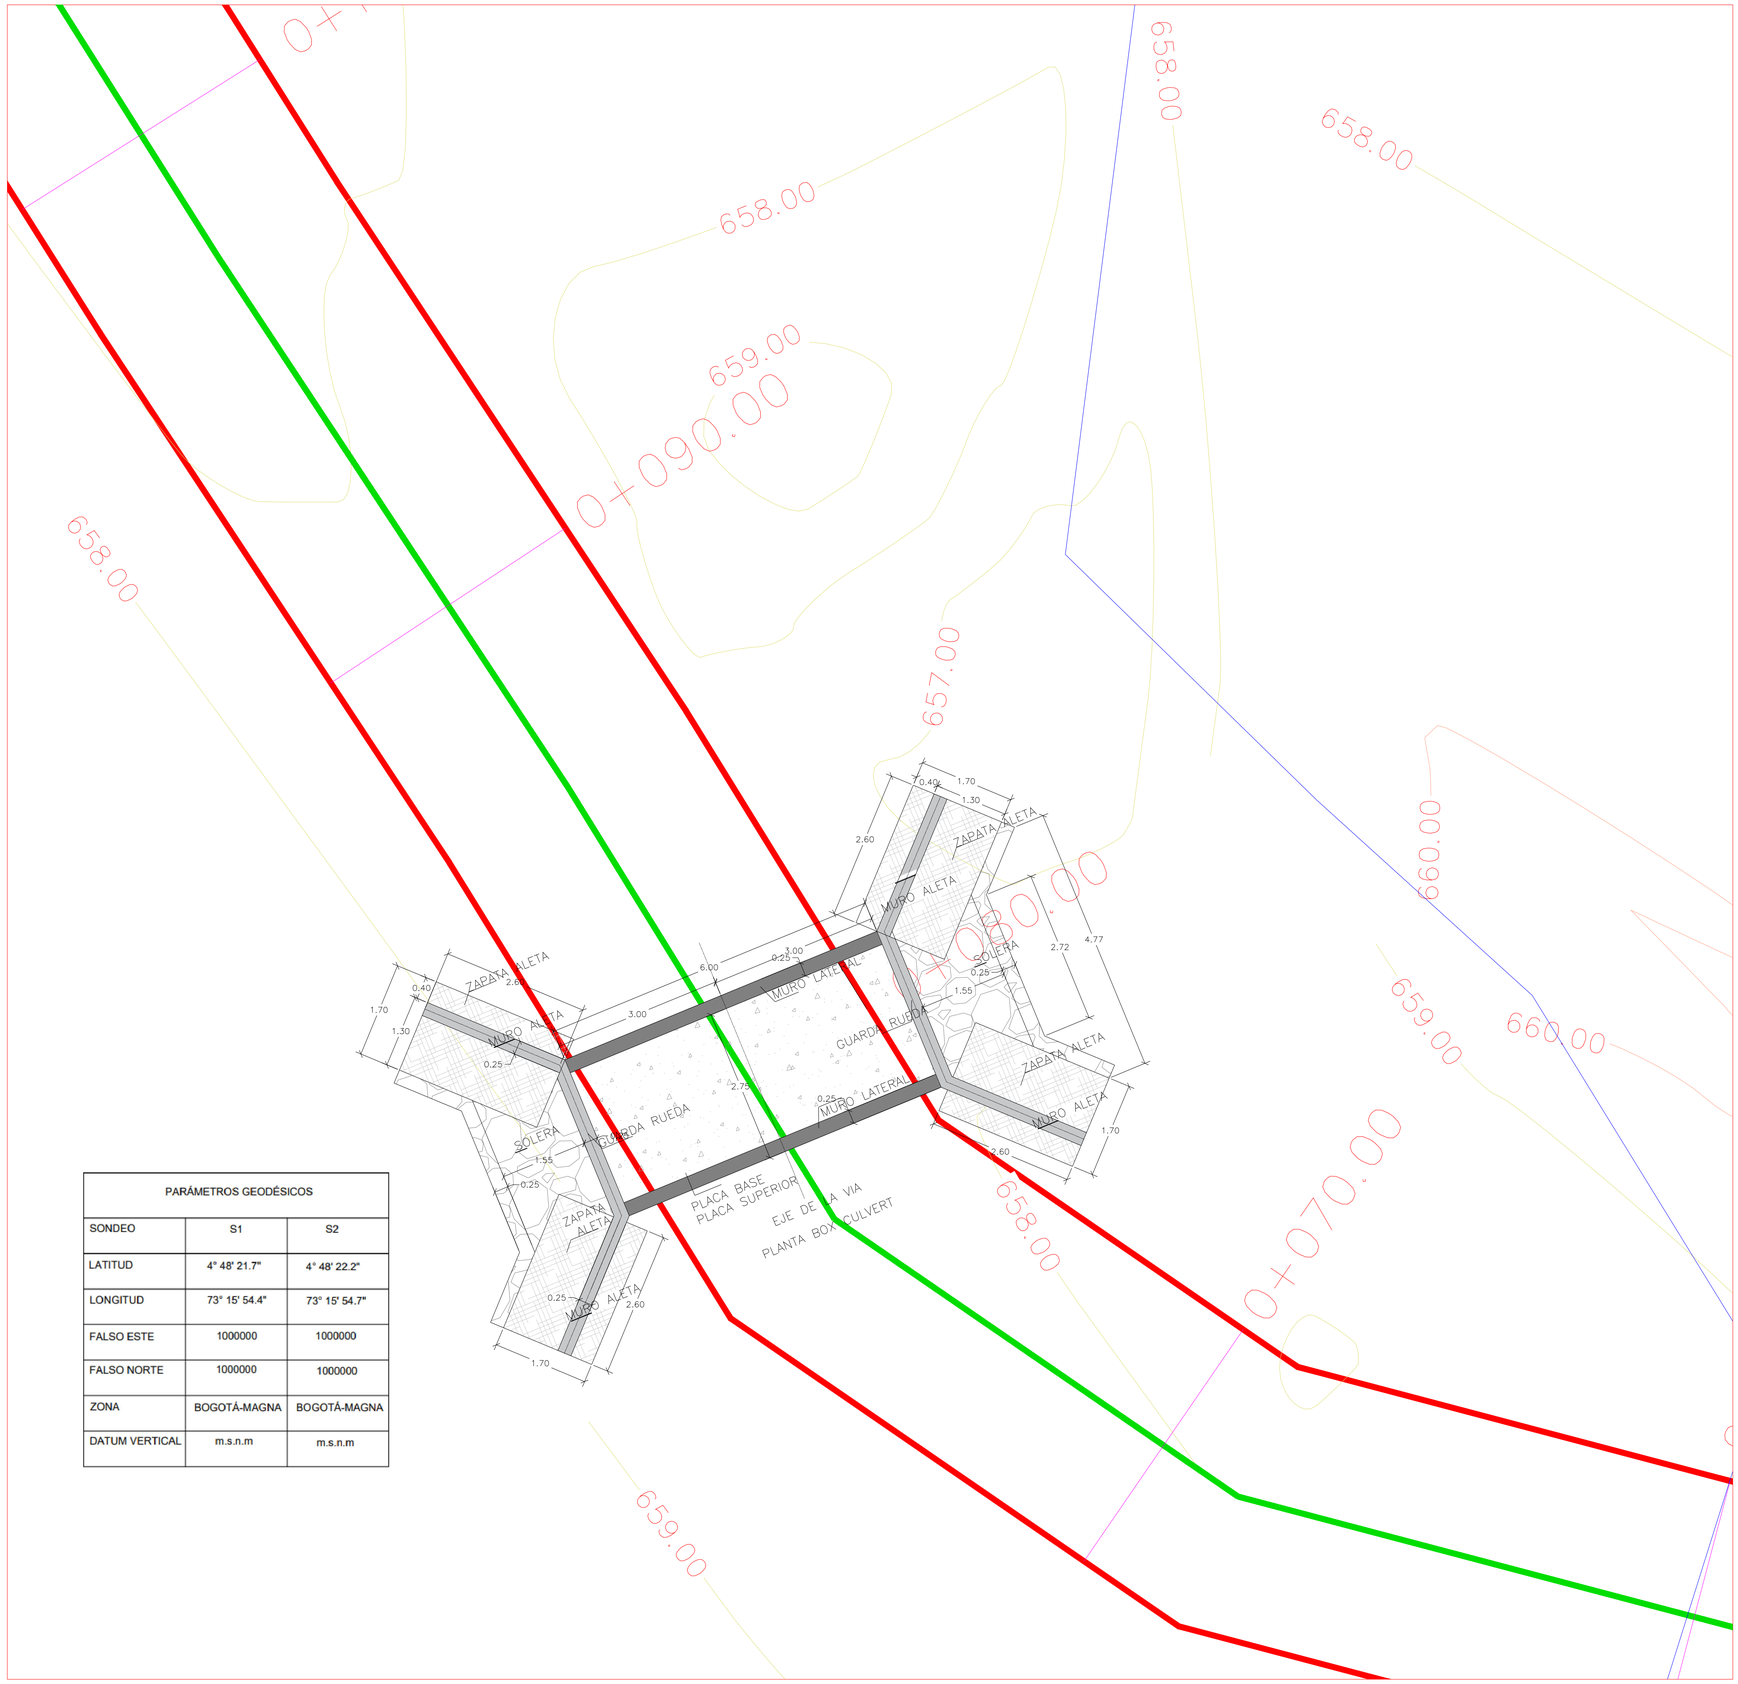

PARÁMETROS GEODÉSICOS		
SONDEO	S1	S2
LATITUD	4° 48' 21.7"	4° 48' 22.2"
LONGITUD	73° 15' 54.4"	73° 15' 54.7"
FALSO ESTE	1000000	1000000
FALSO NORTE	1000000	1000000
ZONA	BOGOTÁ-MAGNA	BOGOTÁ-MAGNA
DATUM VERTICAL	m.s.n.m	m.s.n.m

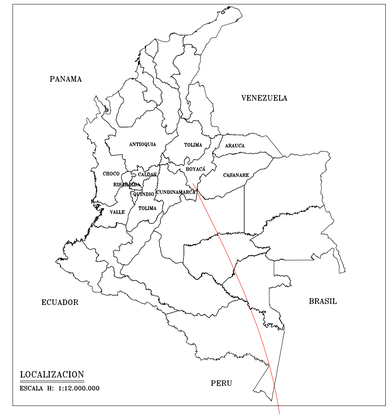

LOCALIZACIÓN:

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ



MUNICIPIO DE SANTA MARIA





GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTIENE:

GEORREFERENCIACION DE SONDEOS SANTA MARIA

REVISÓ:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT.901.306.834-0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
NIT.901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



CONVENCIONES

- EJE PROYECTO
- CARRETEABLE
- ESTACION O P.K.
- SECCION TERRENO
- PERFIL TERRENO
- CURVA DE NIVEL

DÍGITO :

SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :

INDICADA

FECHA :


DICIEMBRE 2025


ARCHIVO DIGITAL :

LOCALIZACIÓN_SANTA_MARIA_.DWG

PLANO Nº DG DE

REFUERZO BOX CULVERT

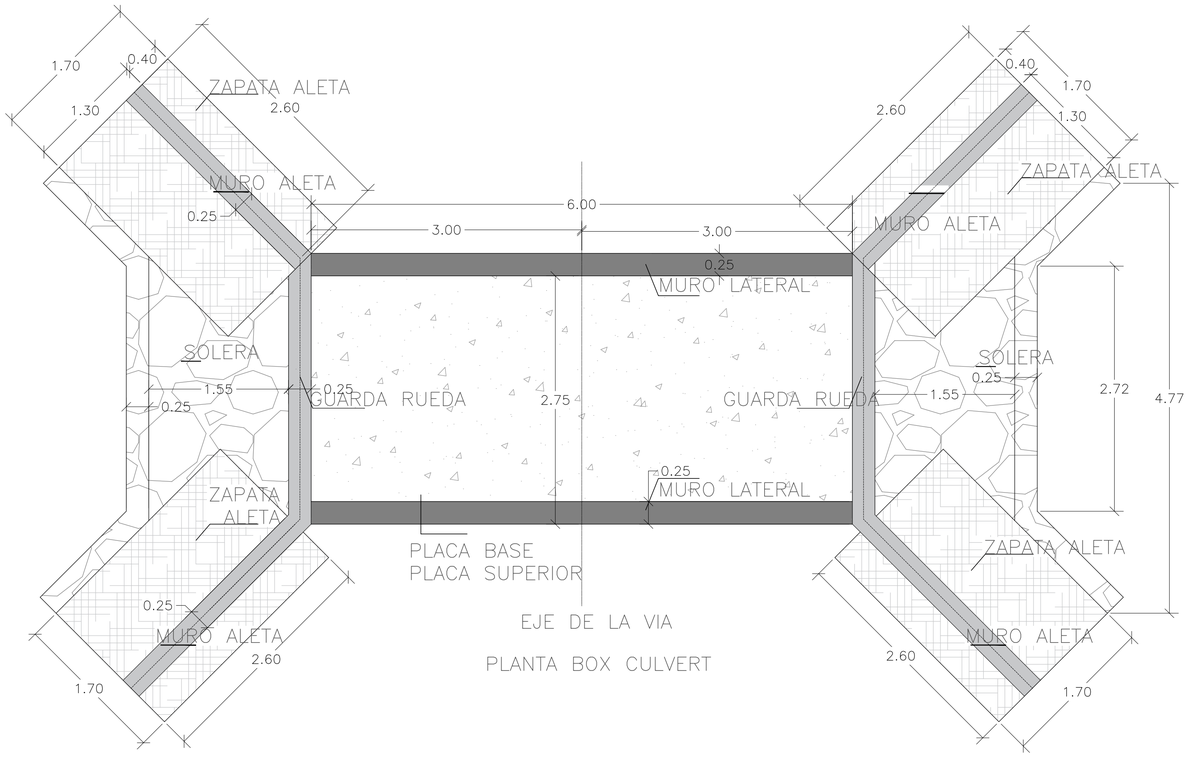


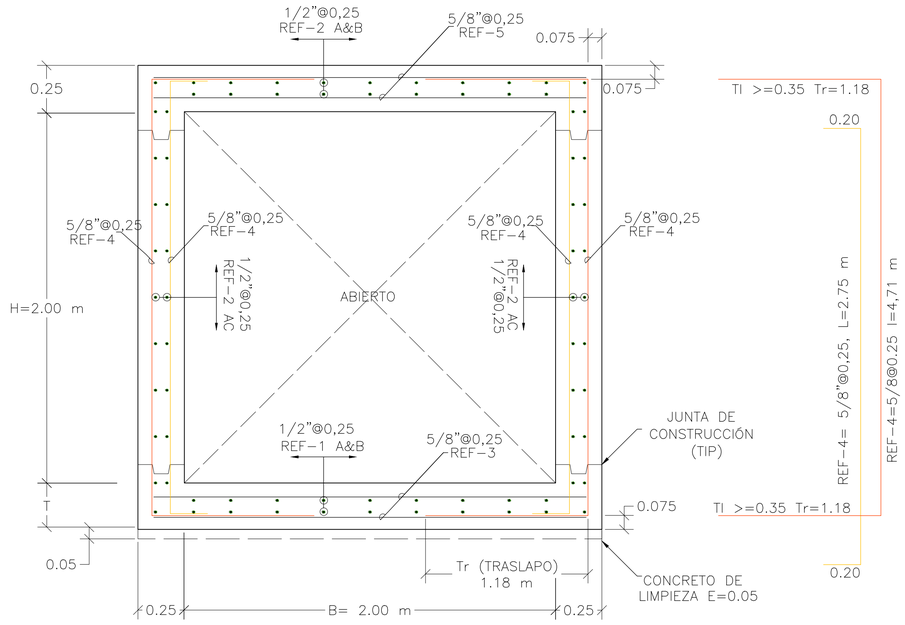


REF-3=5/8"@0,25 L=2,5 m


REF-5=5/8"@0,25 L=2 m

SECCIÓN TÍPICA A
ESCALA: 1:25

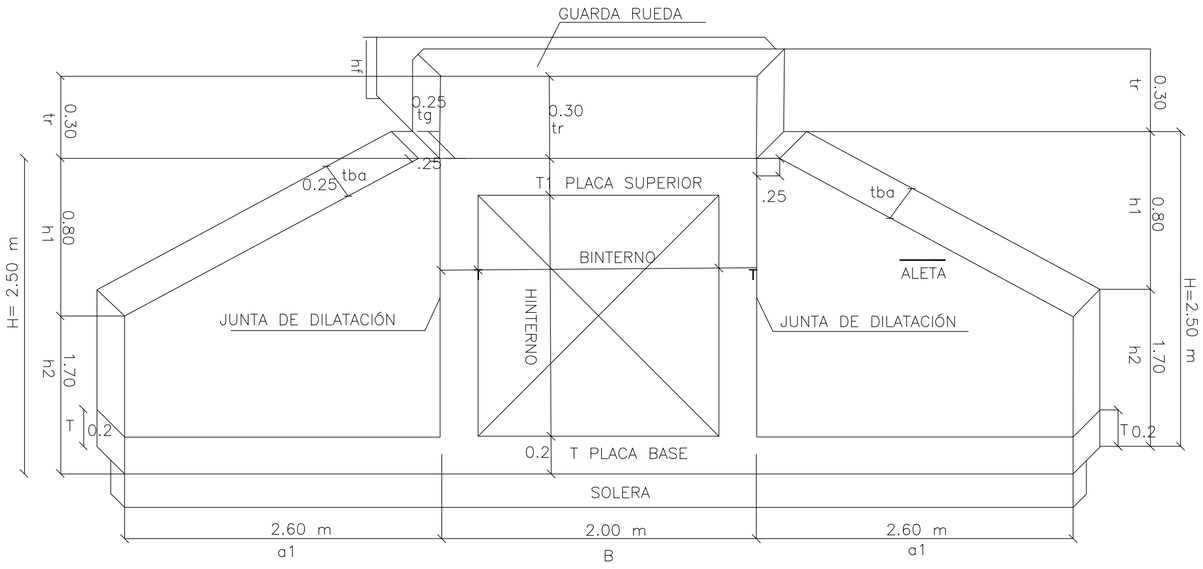

VISTA FRONTAL BOX CULVERT

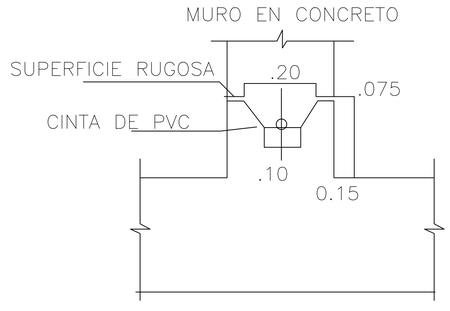

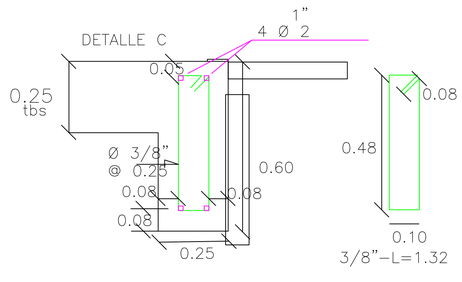

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTIENE:

PLANO RECORD DEL ACERO DE REFUERZO DEL BOX CULVERT- MUNICIPIO DE SANTA MARIA

REVISIÓN:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834-0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



OBSERVACIONES:

DÍGITO :

ING SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :

INDICADAS


FECHA :

DICIEMBRE 2025


ARCHIVO DIGITAL :

PLANO RECORD SANTA MARIA.DWG


PLANO Nº DG

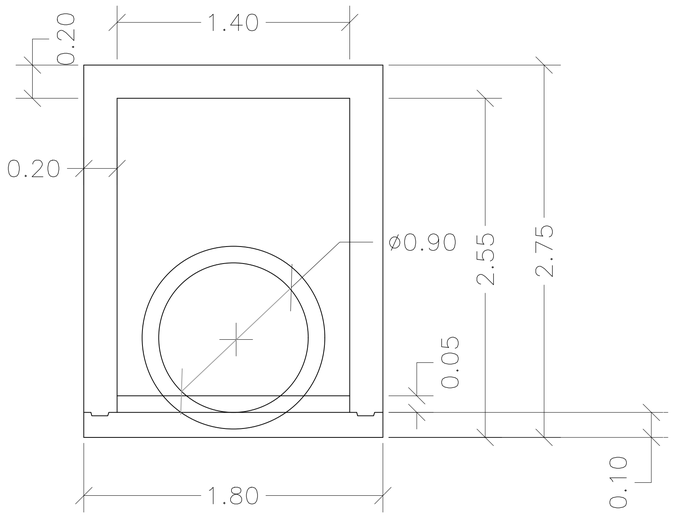


FRONTAL
ESCALA: 1:25

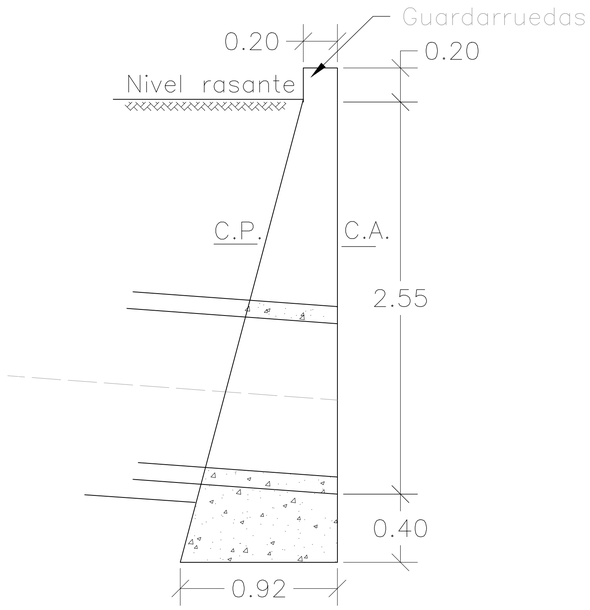

CORTE LONGITUDINAL C
ESCALA: 1:50

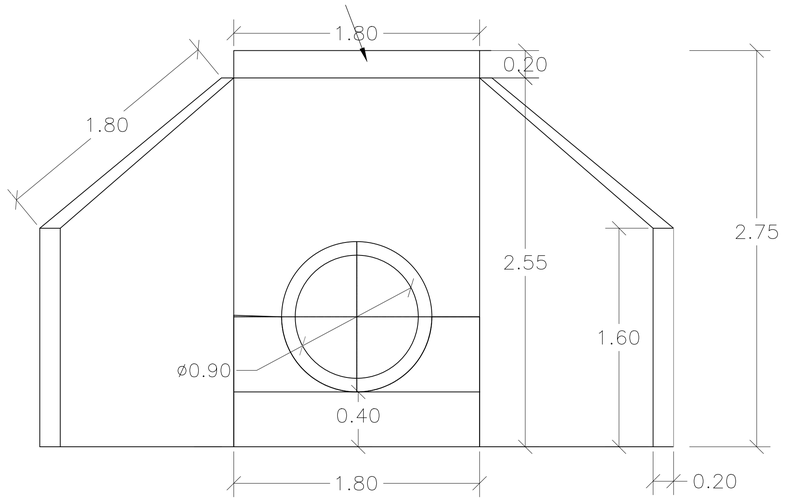

FRONTAL
ESCALA: 1:50

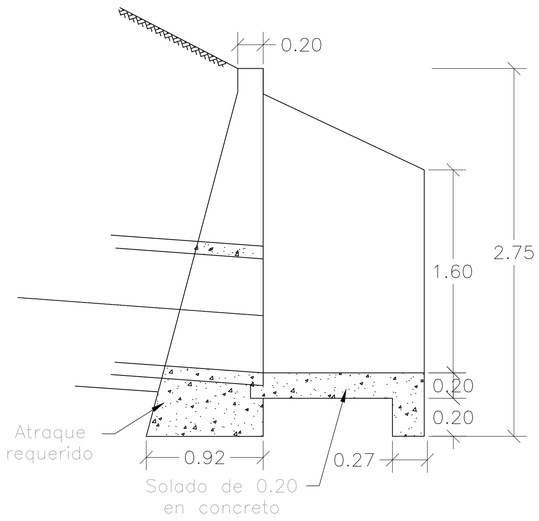

CORTE LONGITUDINAL D
ESCALA: 1:50

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTIENE:

PLANO RECORD DE LAS PLANTAS, CORTES Y SECCIONES DE LA ALCANTARILLA MUNICIPIO DE SANTA MARIA

REVISIÓN:

JUAN CARLOS VELASQUEZ
FOREROREPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834-0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



OBSERVACIONES:

SON 2 ALCANTARILLAS

DÍGITO :

ING SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :

INDICADAS


FECHA :

DICIEMBRE 2025


ARCHIVO DIGITAL :

PLANO RECORD SANTA MARIA.DWG


PLANO Nº DG

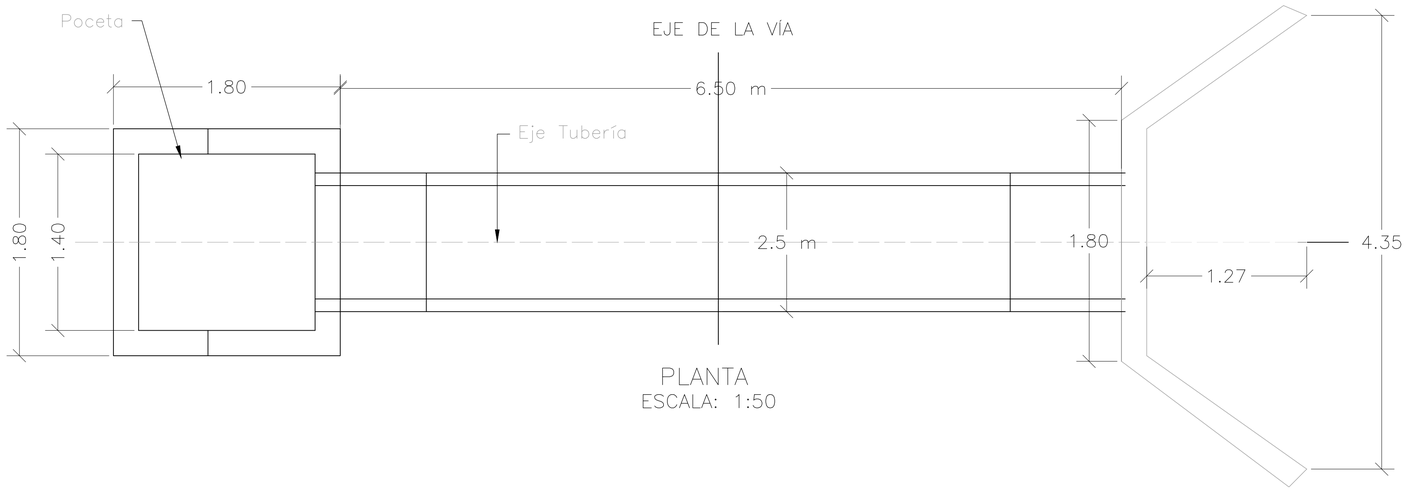


PLANTA
ESCALA: 1:50

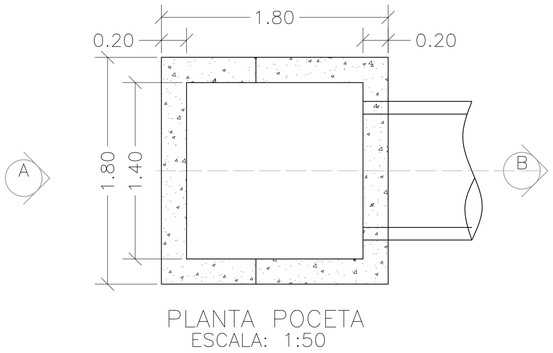


PLANTA POCETA
ESCALA: 1:50

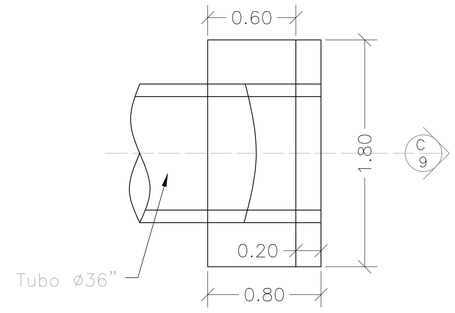

PLANTA CABEZAL
ESCALA: 1:50

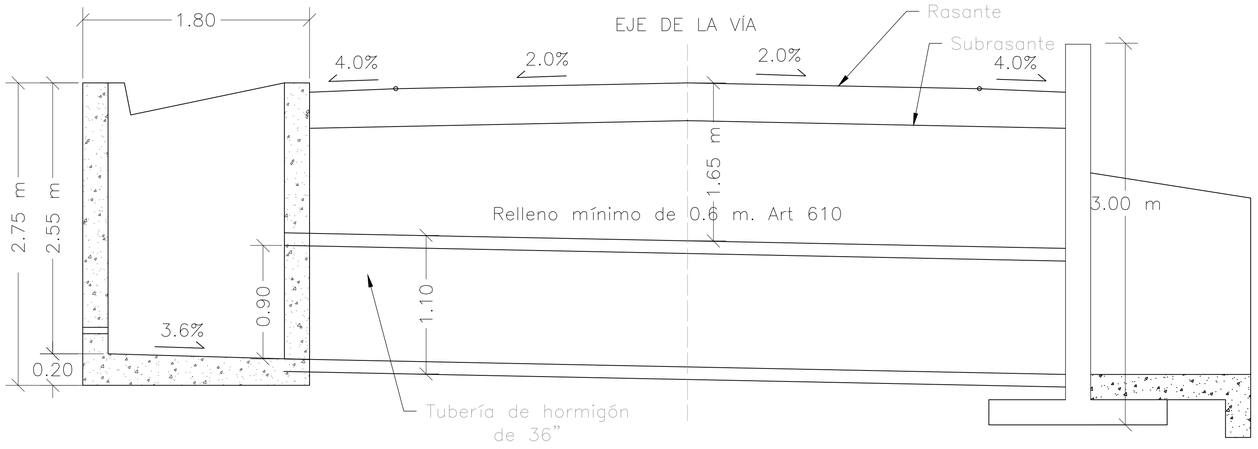

CORTE LONGITUDINAL A
ESCALA: 1:50

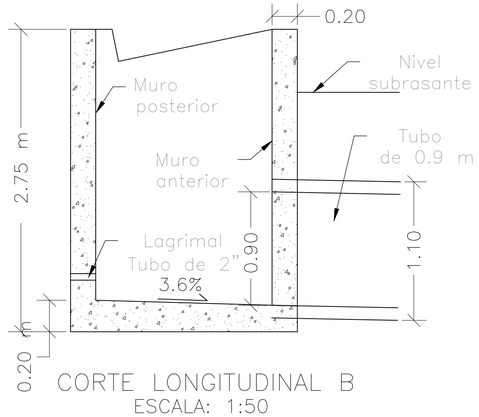

CORTE LONGITUDINAL B
ESCALA: 1:50

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTIENE:

PLANO RECORD DE LAS PLANTAS - SECCIONES DE LA ALCANTARILLA MUNICIPIO DE SANTA MARIA

REVISIÓN:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834-0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



OBSERVACIONES:

SON 2 ALCANTARILLAS


DÍGITO :
ING SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :
INDICADAS


FECHA :
DICIEMBRE 2025

ARCHIVO DIGITAL :
PLANO RECORD SANTA MARIA.DWG

PLANO Nº DG

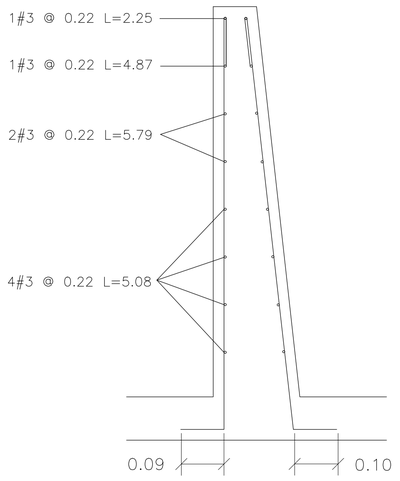


REFUERZO CORTE ALETAS
ESCALA: 1:25

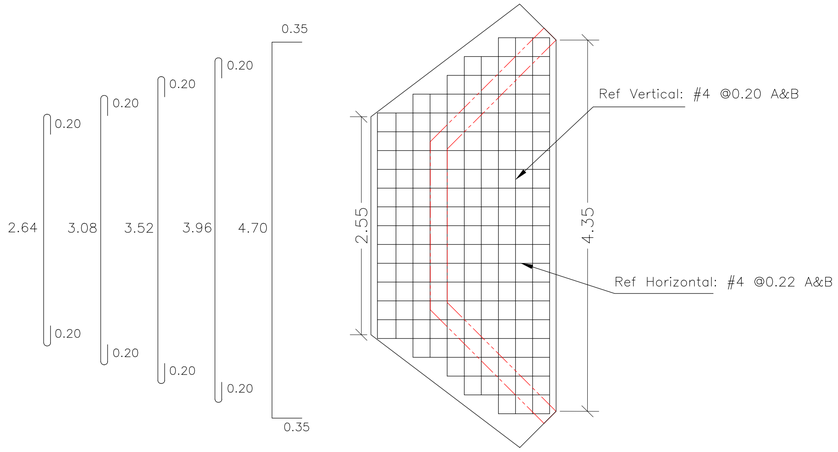


REFUERZO
PLACA DESCOLE
ESCALA: 1:25

REFUERZO HORIZONTAL ALETAS Y MURO				
ITEM	Ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
LADO INTERNO ALETAS	3	1.94	2	2.17
	3	2.25	1	1.26
	3	4.87	1	2.73
	3	5.79	2	6.48
	3	5.08	4	11.38
LADO EXTERNO ALETAS	3	2.30	1	1.29
	3	5.02	1	2.81
	3	5.90	2	6.61
	3	5.22	4	11.69
MURO	4	3.45	8	27.60
	4	1.60	8	12.80
		SUBTOTAL		86.82

REFUERZO PLACA DESCOLE				
ITEM	Ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
ACERO SUPERIOR (SUP) E INFERIOR (INF)	4(SUP)	3.04	2	6.04
	4(INF)	3.04	2	6.04
	4(SUP)	3.48	2	6.92
	4(INF)	3.48	2	6.92
	4(SUP)	3.92	1	3.90
	4(INF)	3.92	1	3.90
	4(SUP)	4.36	2	8.67
	4(INF)	4.36	2	8.67
	4(SUP)	5.40	4	21.47
	4(INF)	5.40	4	21.47
	4(SUP)	1.10	2	2.19
	4(SUP)	1.50	2	2.98
	4(SUP)	1.70	2	3.38
	4(SUP)	2.10	2	4.17
	4(SUP)	2.54	13	32.82
	4(INF)	1.10	2	2.19
	4(INF)	1.50	2	2.98
	4(INF)	1.70	2	3.38
	4(INF)	2.10	2	4.17
	4(INF)	2.54	13	32.82
	SUBTOTAL			185.06

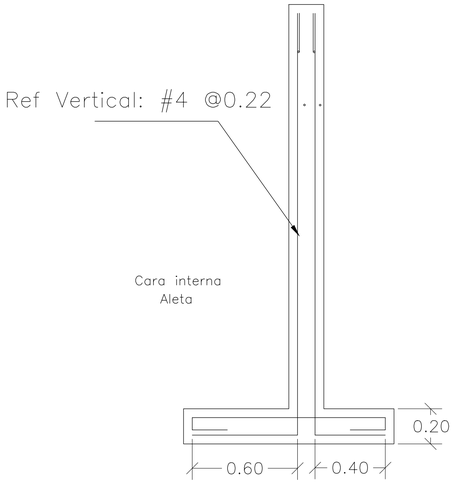


REFUERZO MURO PANTALLA
ESCALA: 1:25

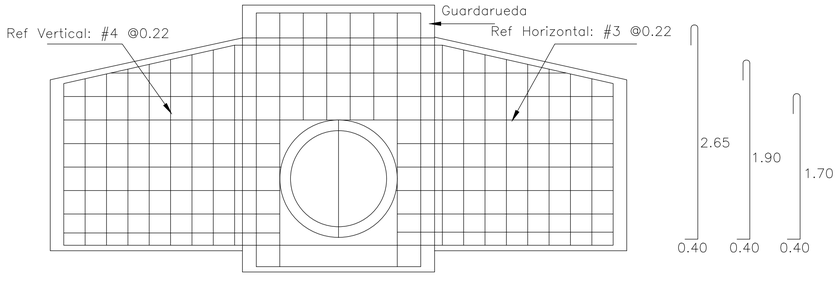

ACEROS VISTA FRONTAL
ACEROS ALETAS Y MURO PANTALLA
ESCALA: 1:25

DETALLES GENERALES – REFUERZO LONGITUDINAL				
BARRA NO.	LONGITUD TRASLAPO (m)	L (m)	D (m)	PESO (kg/m)
2	0.37	0.11	0.04	0.25
3	0.54	0.16	0.06	0.56
4	0.72	0.22	0.08	0.99
5	0.90	0.28	0.10	1.56
6	1.09	0.33	0.12	2.24
7	1.58	0.39	0.13	3.05
8	1.81	0.44	0.15	3.98

GANCHO A 90°



GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTIENE:

PLANO RECORD DEL ACERO DE REFUERZO DE LA ALCANTARILLA- MUNICIPIO DE SANTA MARIA

XCUHY

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834-0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



OBSERVACIONES:

SON 2 ALCANTARILLAS

DÍGITO :

ING SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :

INDICADAS


FECHA :

DICIEMBRE 2025


ARCHIVO DIGITAL :

PLANO RECORD SANTA MARIA.DWG


PLANO Nº DG

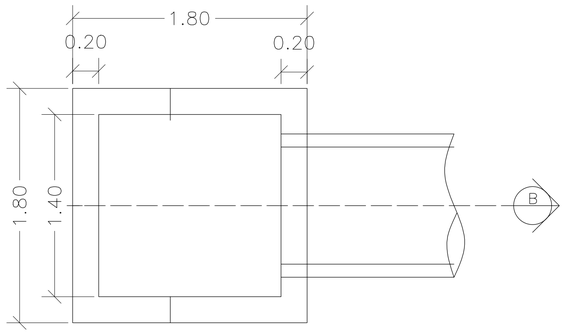


PLANTA POCETA
ESCALA: 1:25

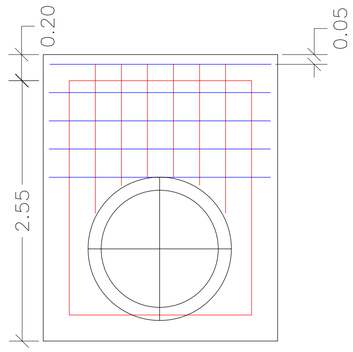

CORTE TRANSVERSAL
ESCALA: 1:25

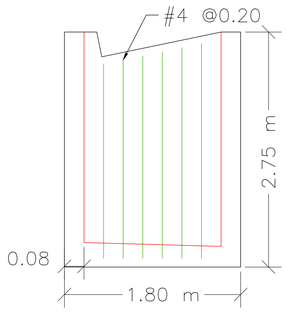

ACEROS VERTICALES MUROS LATERALES POCETA
LOS ACEROS INTERNOS SON #3 @ 0.20
ESCALA: 1:25

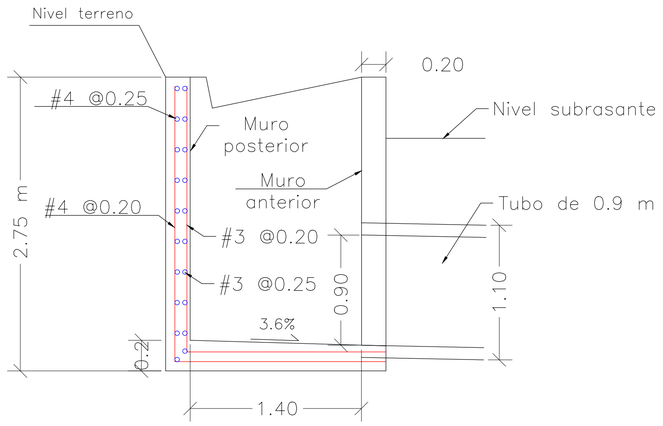

CORTE LONGITUDINAL B
ESCALA: 1:25

CANTIDADES OBRA ALCANTARILLA		
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
CONCRETO	m3	7.8
ACERO	Kg	578.9
SOLADO	m3	0.8
EXCAVACIÓN	m3	44
TUBERÍA	ml	7

REFUERZO VERTICAL ALETAS Y MURO				
ITEM	Ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
MURO	4	3.20	4	12.72
	4	3.00	4	11.93
	4	1.40	8	11.13
	3	1.64	8	7.35
ALETAS CARA INTERNA	4	2.26	2	4.49
	4	2.22	2	4.41
	4	2.18	2	4.33
	4	2.14	2	4.25
	4	2.10	2	4.17
	4	2.06	2	4.10
	4	2.02	2	4.02
	4	1.98	2	3.94
	4	1.94	2	3.86
ALETAS CARA EXTERNA	4	2.30	2	4.57
	4	2.26	2	4.49
	4	2.22	2	4.41
	4	2.18	2	4.33
	4	2.14	2	4.25
	4	2.10	2	4.17
	4	2.06	2	4.10
	4	2.02	2	4.02
	4	1.98	2	3.94
		SUBTOTAL		118.99

REFUERZO POCETA				
ITEM	Ø	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
POCETA	4	4.24	9	37.93
	3	3.90	9	19.66
	4	2.06	1	2.05
	3	1.86	1	1.04
	4	3.34	1	3.32
	3	2.94	1	1.65
	4	3.48	6	20.75
	3	5.80	6	19.49
	4	5.90	3	17.59
	3	4.70	3	7.90
	4	2.28	4	9.07
	3	2.28	4	5.11
	4	2.08	8	16.54
	3	2.08	8	9.32
	4	1.54	4	6.12
	4	1.36	4	5.41
	4	1.28	4	5.09
		SUBTOTAL		188.03

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTIENE:

PLANO RECORD DEI ACERO DE REFUERZO DE LA ALCANTARILLA- MUNICIPIO DE SANTA MARIA

REVISIÓN:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834-0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



OBSERVACIONES:

SON 2 ALCANTARILLAS

DÍGITO :

ING SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :

INDICADAS

FECHA :


DICIEMBRE 2025


ARCHIVO DIGITAL :

PLANO RECORD SAN MARIA.DWG

PLANO Nº DG

REFUERZO BOX CULVERT

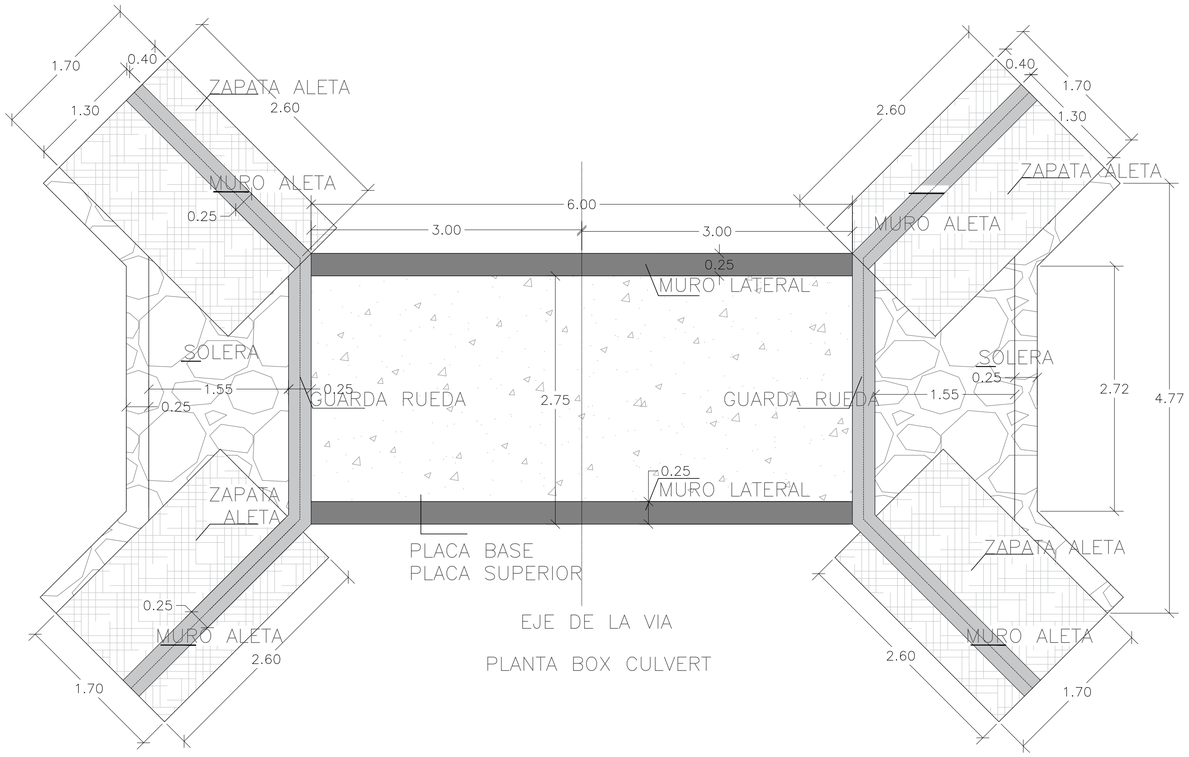


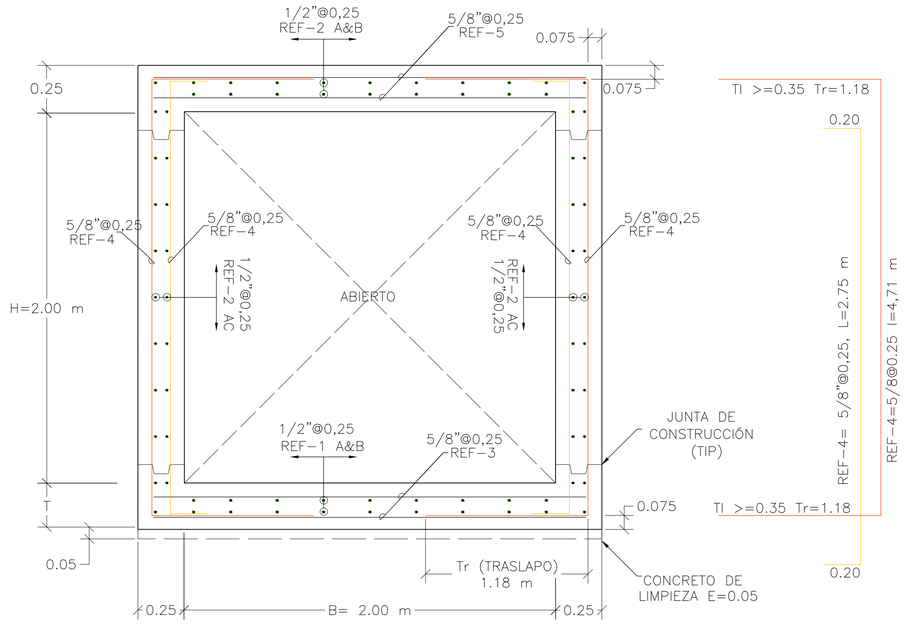


REF-3=5/8"@0,25 L=2,5 m


REF-5=5/8"@0,25 L=2 m

SECCIÓN TÍPICA A
ESCALA: 1:25

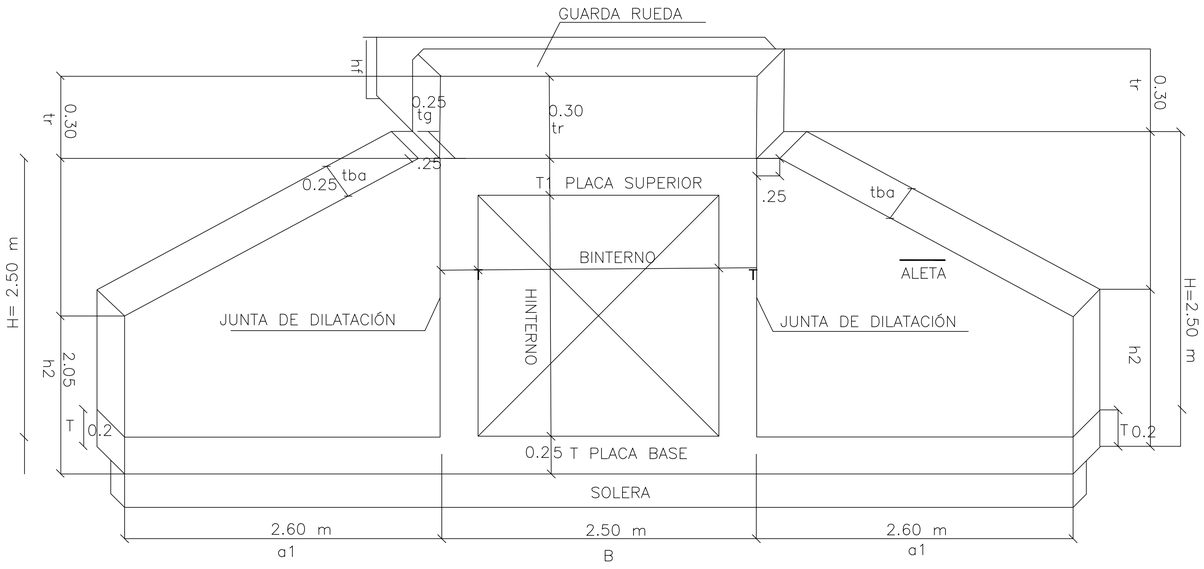

VISTA FRONTAL BOX CULVERT

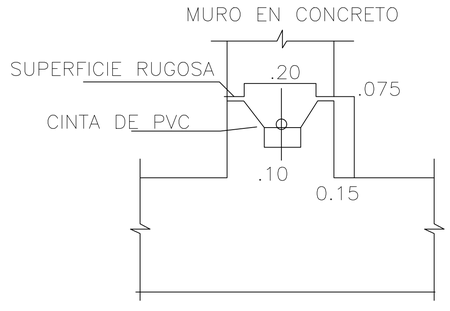

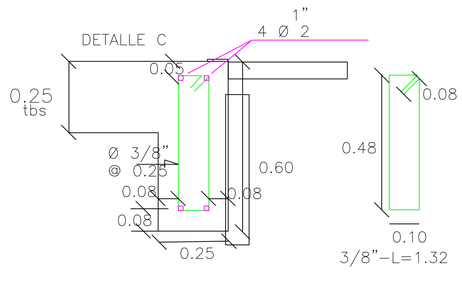

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTIENE:

PLANO RECORD DEL ACERO DE REFUERZO DEL BOX CULVERT- MUNICIPIO DE SANTA MARIA

REVISIÓN:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834-0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



OBSERVACIONES:

DÍGITO :

ING SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :

INDICADAS

FECHA :

DICIEMBRE 2025

ARCHIVO DIGITAL :


PLANO RECORD SANTA MARIA.DWG


PLANO Nº DG

GEOMETRÍA Y CANTIDADES DE OBRA


SECCIONES	GUARDARUEDAS		ALETAS					BASE ALETAS							REFUERZO				CANTIDADES DE OBRA		
	tg	tr	H externo	h1	h2	a1	tba	tbs	a2	a3	a4	a5	a6	a7	REF 1	REF 2	REF 3	REF 4	CONCRETO	SOLADO	ACERO
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m					m3	m3	kg
2.00 X 2.00	0.25	0.30	2.50	0.80	1.70	2.60	0.25	0.25	1.29	3.00	0.40	1.00	1.70	1.55	1/2" @0.25	1/2" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	10.87	1.61	1148.84

BOX CULVERT GEOMETRÍA GENERAL Y REFUERZO

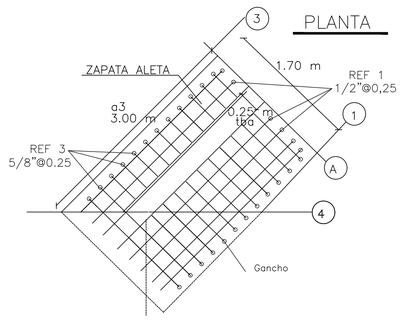

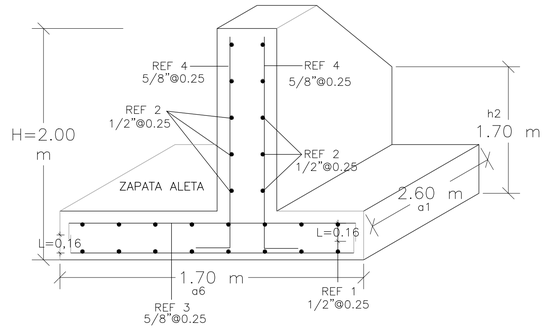


DETALLES GENERALES DEL REFUERZO			
ELEMENTO	REFUERZO	FORMA	d
PLACA BASE	REF 1 1/2"@0.25	d, L, L	3 m
PLACA BASE	REF 3 5/8"@0.25	d, L, L	1.55 m
ALETAS	REF 2 1/2"@0.25	$d_{Variable}$	Desde 2.5 m hasta 0.43
ALETAS	REF 4 5/8"@0.25	$d_{Variable}$, L, L	Desde 2.0 m hasta 1.63 m

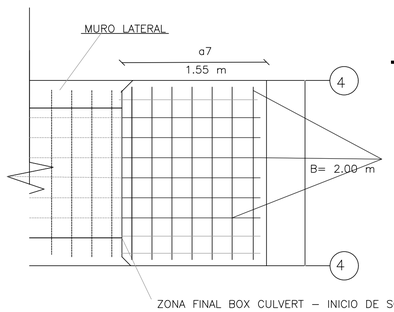


SOLERA

Se da continuidad al refuerzo del box culvert (cara superior e inferior de la losa inferior)

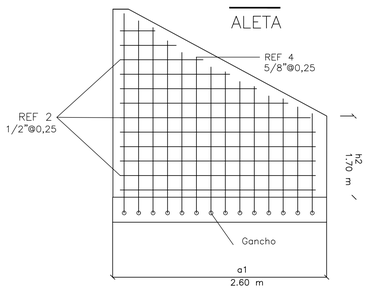

DETALLES GENERALES – REFUERZO LONGITUDINAL				
BARRA NO.	LONGITUD TRASLAPO (m)	L (m)	D (m)	PESO (kg/m)
2	0.37	0.11	0.04	0.25
3	0.54	0.16	0.06	0.56
4	0.72	0.22	0.08	0.99
5	0.90	0.28	0.10	1.56
6	1.09	0.33	0.12	2.24
7	1.58	0.39	0.13	3.05
8	1.81	0.44	0.15	3.98

GANCHO A 90°



GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTIENE:

PLANO RECORD DEL GEOMERTRIA BOX CULVERT Y CANTIDADES DE OBRA MUNICIPIO DE SANTA MARIA

REVISIÓN:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834-0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



OBSERVACIONES:

SON 2 ALCANTARILLAS

DÍGITO :

ING SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :

INDICADAS

FECHA :


DICIEMBRE 2025

ARCHIVO DIGITAL :


PLANO RECORD SANTA MARIA.DWG

PLANO Nº DG

PLANOS RECORD
MUNICIPIO DE COCUY

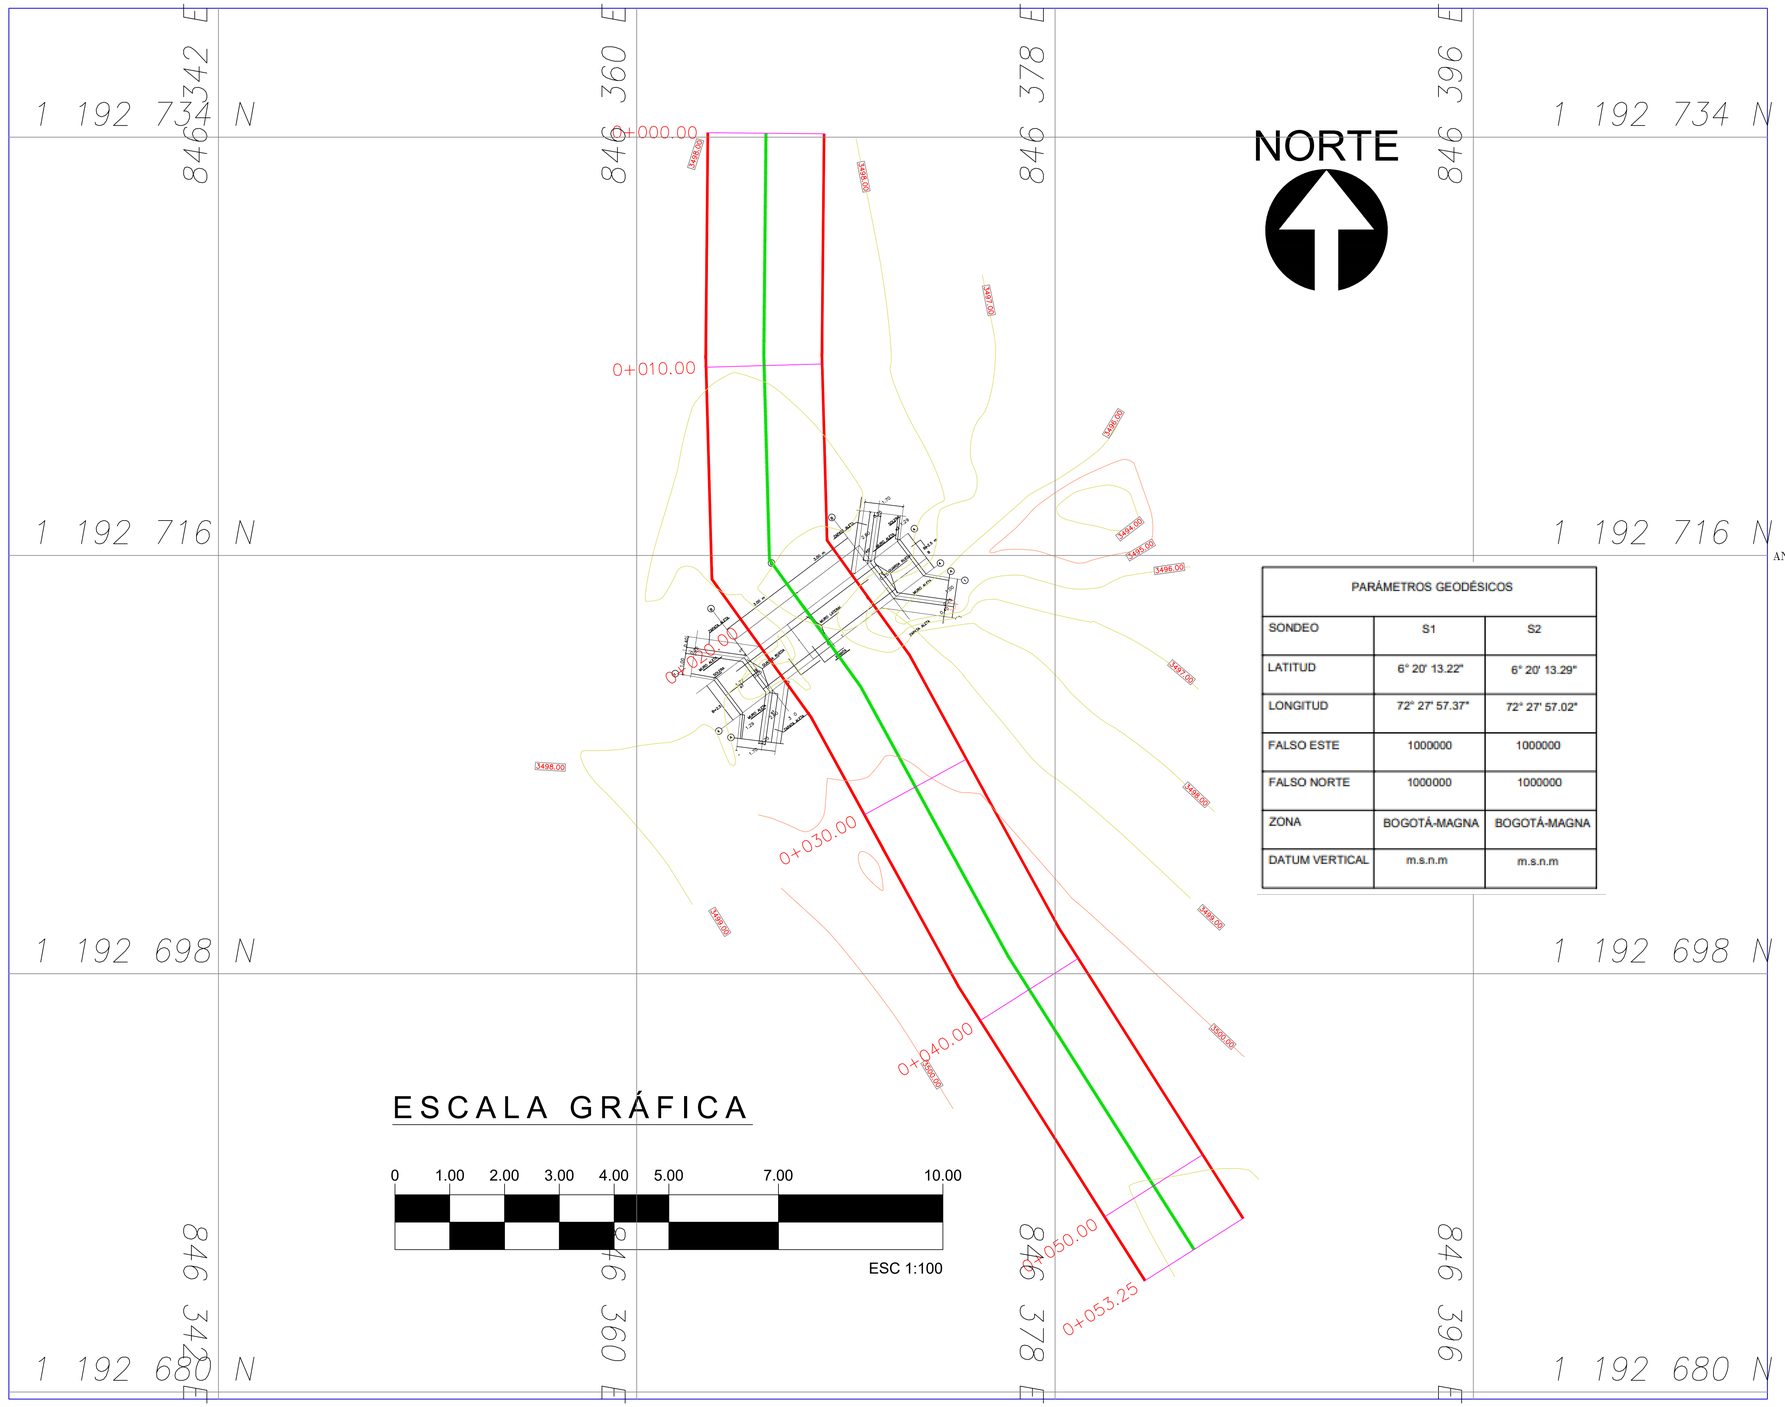

PARÁMETROS GEODÉSICOS		
SONDEO	S1	S2
LATITUD	6° 20' 13.22"	6° 20' 13.29"
LONGITUD	72° 27' 57.37"	72° 27' 57.02"
FALSO ESTE	1000000	1000000
FALSO NORTE	1000000	1000000
ZONA	BOGOTÁ-MAGNA	BOGOTÁ-MAGNA
DATUM VERTICAL	m.s.n.m	m.s.n.m

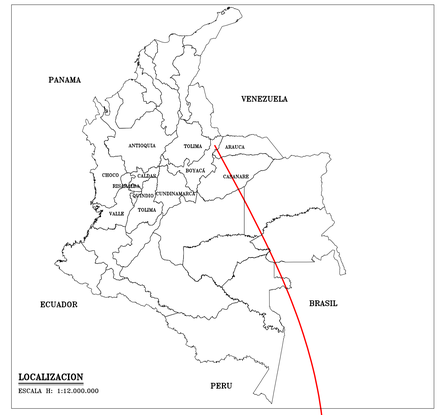

LOCALIZACIÓN:

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ



MUNICIPIO DEL COCUY





GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTIENE:

GEORREFERENCIACION DE SONDEOS TRAMO 1 EL COCUY

REVISÓ:

SONIA MALENA MARIN SOTELO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT.901.306.834-0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
NIT.901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



CONVENCIONES

- EJE PROYECTO
- CARRETEABLE
- ESTACION O P.K.
- SECCION TERRENO
- PERFIL TERRENO
- CURVA DE NIVEL

DÍGITO :

ING. SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :

INDICADAS


FECHA :

SEPTIEMBRE 2025


ARCHIVO DIGITAL :

LOCALIZACIÓN_EL_COCUY.DWG

PLANO Nº DG DE

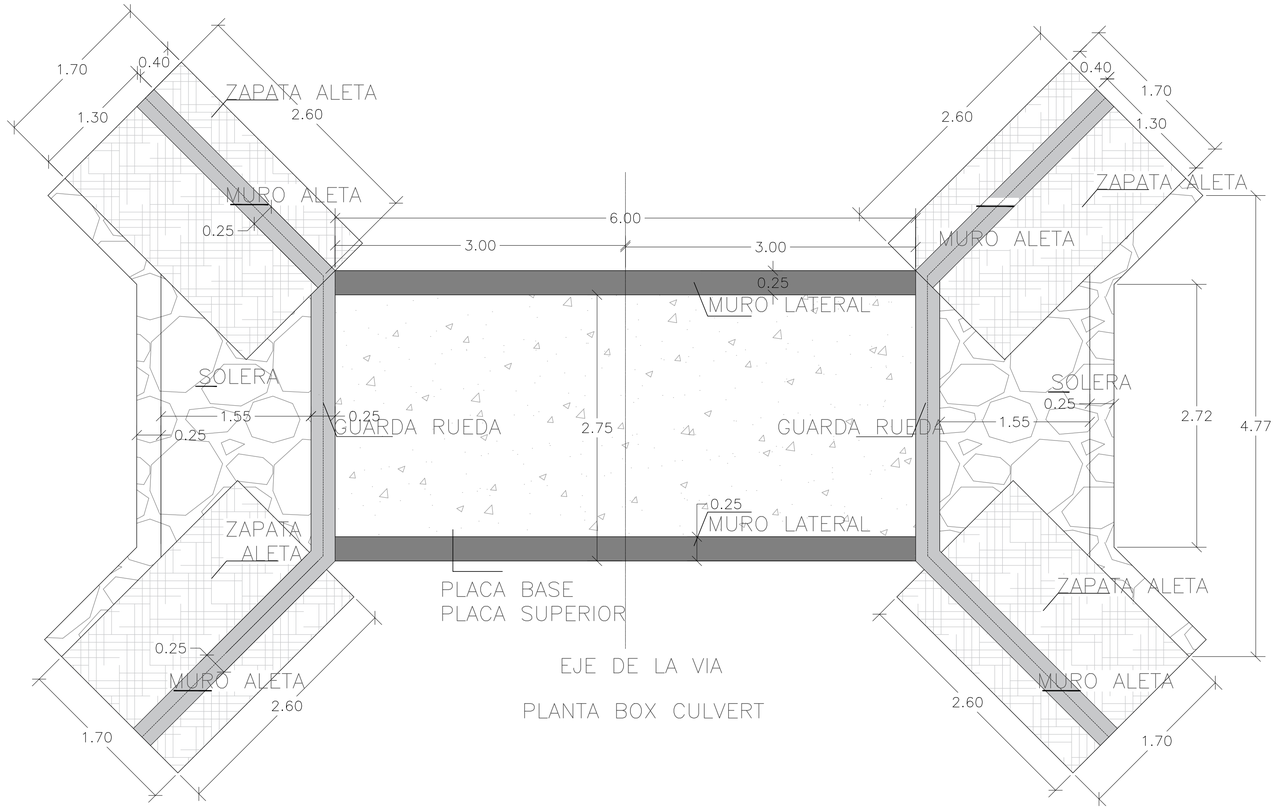


REFUERZO BOX CULVERT

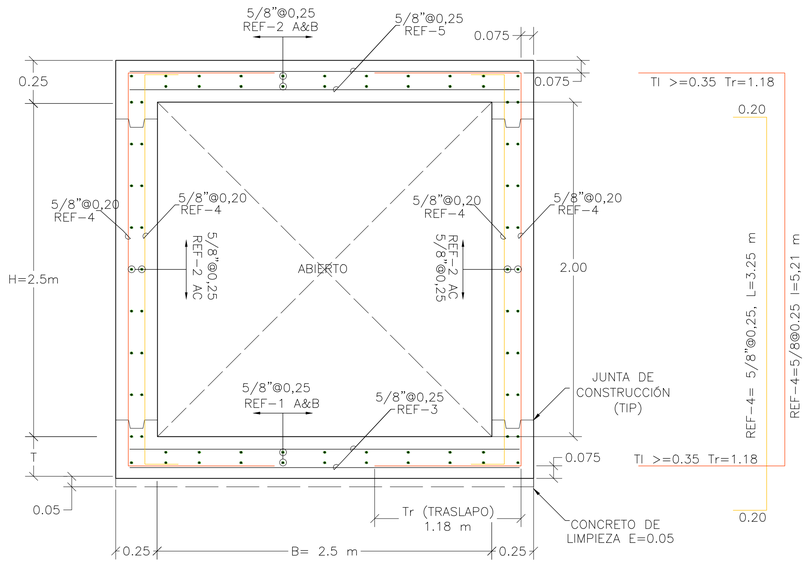


REF-3=5/8"@0,25 L=2,85 m


REF-5=5/8"@0,25 L=2.5m

SECCIÓN TÍPICA A
ESCALA: 1:25

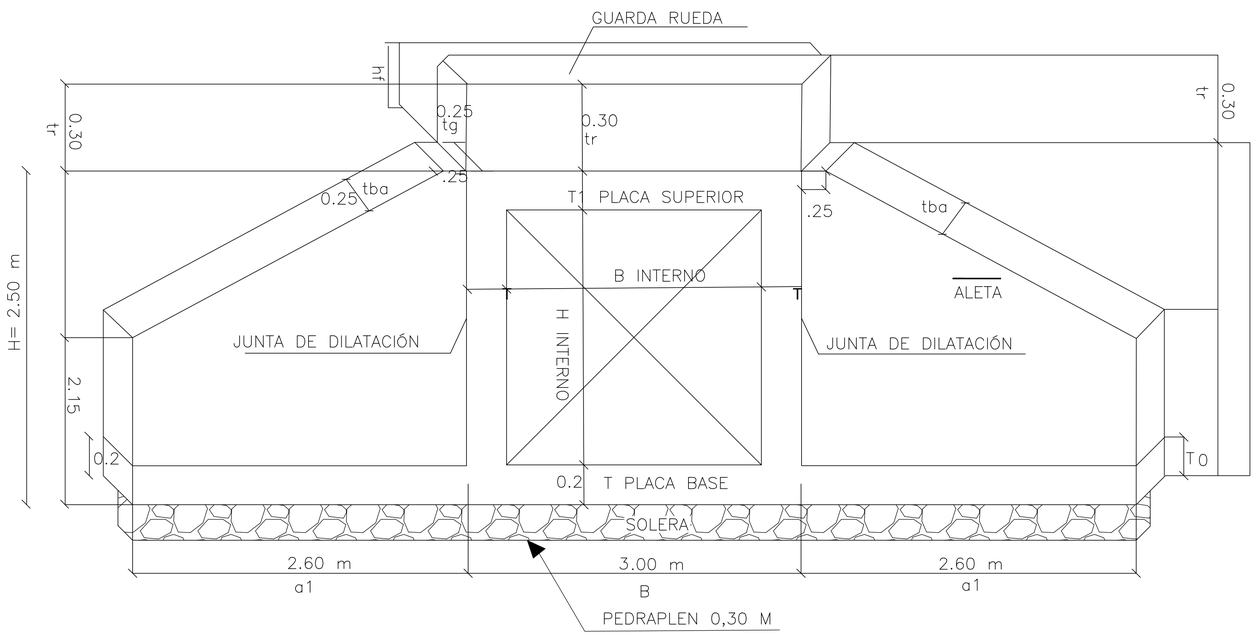


VISTA FRONTAL BOX CULVERT

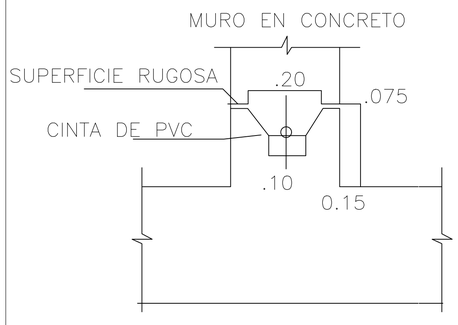

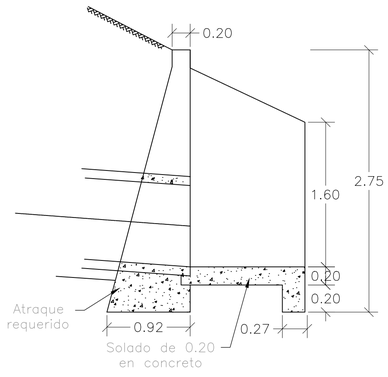

CORTE LONGITUDINAL D
ESCALA: 1:50

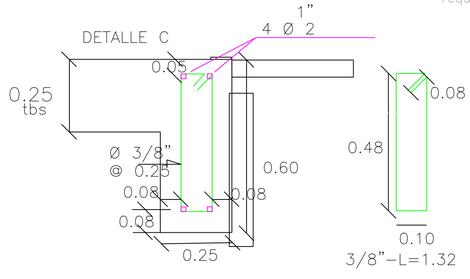

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTIENE:

PLANO RECORD DEL GEOMERTRIA BOX CULVERT - MUNICIPIO DE COCUY

REVISIÓN:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834-0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



OBSERVACIONES:

DÍGITO :

ING. SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :

INDICADAS

FECHA :

DICIEMBRE 2025

ARCHIVO DIGITAL :


PLANO RECORD COCUY.DWG


PLANO Nº DG

GEOMETRÍA Y CANTIDADES DE OBRA


SECCIONES	GUARDARUEDAS		ALETAS					BASE ALETAS							REFUERZO				CANTIDADES DE OBRA		
	tg	tr	H externo	h1	h2	a1	tba	tbs	a2	a3	a4	a5	a6	a7	REF 1	REF 2	REF 3	REF 4	CONCRETO	SOLADO	ACERO
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m					m3	m3	kg
2.50 X 2.50	0.25	0.30	3.00	0.80	2.20	2.60	0.25	0.25	1.29	3.00	0.40	1.00	1.70	1.55	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.25	5/8" @0.20	12.63	1.73	1681.50

BOX CULVERT GEOMETRÍA GENERAL Y REFUERZO

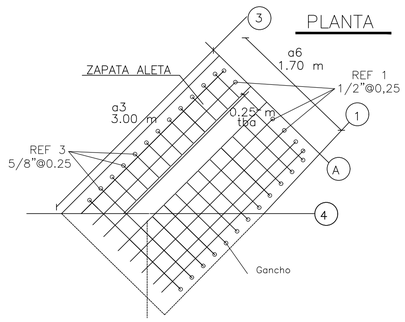

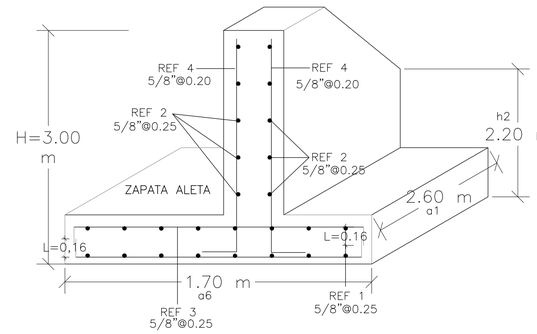


DETALLES GENERALES DEL REFUERZO			
ELEMENTO	REFUERZO	FORMA	d
PLACA BASE	REF 1 5/8"@0.25	d L L	2,925 m
PLACA BASE	REF 3 5/8"@0.25	d L L	1.55 m
ALETAS	REF 2 5/8"@0.25	$d_{Variable}$	Desde 2.5 m hasta 0.43
ALETAS	REF 4 5/8"@0.20	$d_{Variable}$ L	Desde 3.0 m hasta 2.125 m

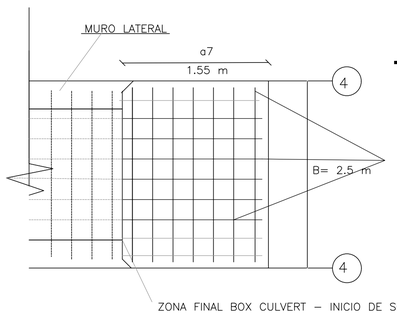


SOLERA

Se da continuidad al refuerzo del box culvert (cara superior e inferior de la losa inferior)

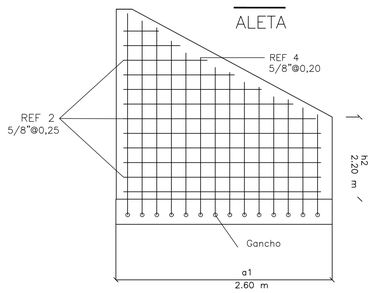

DETALLES GENERALES – REFUERZO LONGITUDINAL				
BARRA NO.	LONGITUD TRASLAPO (m)	L (m)	D (m)	PESO (kg/m)
2	0.37	0.11	0.04	0.25
3	0.54	0.16	0.06	0.56
4	0.72	0.22	0.08	0.99
5	0.90	0.28	0.10	1.56
6	1.09	0.33	0.12	2.24
7	1.58	0.39	0.13	3.05
8	1.81	0.44	0.15	3.98

GANCHO A 90°



GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTIENE:

PLANO RECORD DEL GEOMERTRIA BOX CULVERT Y CANTIDADES DE OBRA MUNICIPIO DE COCUY

REVISIÓN:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.306.834-0
NYSCONSTRUCOL S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO:

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
NIT:901.719.548-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN:



OBSERVACIONES:

DIGITO :

ING. SONIA MALENA MARIN SOTELO
RESIDENTE DE OBRA

ESCALA :

INDICADAS

FECHA :

DICIEMBRE 2025

ARCHIVO DIGITAL :

PLANO RECORD COCUY.DWG

PLANO Nº DG
