INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°8.



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 1682 DE 2024.
CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

1 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

Dirección: Cr 7 # 53- 53 Cel: 3118587090 Correo: ingeologia@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3720, 4689, 3780, 4347, 4775, 3850, 4575, 4563, 4343, 4441

Contratista: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA, MANCHEGO, LA LAJA SAN IGNACIO, LA CHOCOA, LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS, CORREGIMIENTO DE EL LIBANO, BETANIA, LAS ROCAS VEREDA LA AGUADA, SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE Y LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN

Contrato de Interventoría No. 1682/2024

Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE ARATOCÁ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7

MES O PERIODO: 1 al 16 de diciembre

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCION**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma:

Nombre: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No.1650 de fecha 15/05/2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 16/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** DIC DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO N° 4347 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA

PLAZO INICIAL:	17 Dias
FECHA DE INICIO:	14/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	30/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 AMPLIACION 1:	18/01/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 AMPLIACION 2:	6/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 AMPLIACION 3:	27/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 AMPLIACION 4:	21/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	27/05/2024
FECHA PRORROGA 1:	31/05/2024
FECHA PRORROGA 2:	28/09/2024
FECHA PRORROGA 2:	8/11/2024
FECHA DE VENCIMIENTO	16/12/2024
PLAZO ACUMULADO:	203,00 Dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 174.179.806,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 174.179.806,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1682-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	108
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Carcamo	UND	1
	Gaviones	M3	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	108	108
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Carcamo	UND	0	0
	Gaviones	M3		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 101.510.748,74	$ 19.287.042,26	$ 120.797.791,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.722.689,08	$ 897.310,92	$ 5.620.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 36.254.061,34	$ 6.888.271,66	$ 43.142.333,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3.041.749,58	$ 577.932,42	$ 3.619.682,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 145.529.248,74**	**$ 27.650.557,26**	**$ 173.179.806,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 81.208.598,99	$ 15.429.633,81	$ 96.638.232,80	$ 96.638.232,80
ADMINISTRATIVO	$ 27.905.966,13	$ 5.302.133,57	$ 33.208.099,70	$ 33.208.099,70
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -		$ -
PAGA	$ 3.041.749,58	$ 577.932,42	$ 3.619.682,00	$ 3.619.682,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.722.689,08	$ 897.310,92	$ 5.620.000,00	$ 5.620.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 116.879.003,78	$ 22.207.010,72	$ 139.086.014,50	$ 139.086.014,50


INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 96.638.232,80
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 96.638.232,80
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**11**

REGISTRO FOTOGRÁFICO











PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N°. 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 16/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER
PERIODO MES: DIC DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO N°3850 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE "EL LIBANO" DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO

PLAZO INICIAL:	18 Dias
FECHA DE INICIO:	13/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	27/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 AMPLIACION 1 :	9/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 AMPLIACION 2 :	21/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 AMPLIACION 3 :	25/04/2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	31/05/2024
FECHA DE PRORROGA 1	31/05/2024
FECHA DE PRORROGA 2	28/09/2024
FECHA DE PRORROGA 3	8/11/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	16/12/2024
PLAZO ACUMULADO:	199,00 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.066.699,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.066.699,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1682-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	154
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alcantarillas	UND	
	Gaviones	M3	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	154	154
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alcantarillas	UND		0
	Gaviones	M3		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 122.689.663,03	$ 23.311.035,97	146.000.699,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	6.500.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 36.134.453,78	$ 6.865.546,22	43.000.000,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3.836.974,79	$ 729.025,21	4.566.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 168.123.276,47**	**31.943.422,53**	**$ 200.066.699,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 122.689.663,03	$ 23.311.035,97	$ 146.000.699,00	$ 146.000.699,00
ADMINISTRATIVOS	$ 32.521.008,40	$ 6.178.991,60	$ 38.700.000,00	$ 38.700.000,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
PAGA	$ 3.836.974,79	$ 729.025,21	$ 4.566.000,00	$ 4.566.000,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 164.509.831,09**	**$ 31.256.867,91**	**$ 195.766.699,00**	**$ 195.766.699,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 146.000.699,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 146.000.699,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**13**

REGISTRO FOTOGRÁFICO









PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N°. 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 16/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** DIC DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO N° 4575 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BETANIA, DEL MUNICIPIO EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA, MUNICIPIO DE EL PLAYÓN

PLAZO INICIAL:	4 Dias
FECHA DE INICIO:	27/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 :	30/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 1	18/01/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 2	6/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 3	27/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 4	21/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	28/05/2024
FECHA DE PRORROGA 1	31/05/2024
FECHA DE PRORROGA 2	28/09/2024
FECHA DE PRORROGA 3	8/11/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	16/12/2024
PLAZO ACUMULADO:	199,00 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.662.720,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.662.720,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1682-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	175
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alcantarillas	UND	
	Gaviones	M3	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	175	175
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alcantarillas	UND		0
	Gaviones	M3		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 127.655.188,24	$ 24.254.485,76	$ 151.909.674,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 30.836.769,75	$ 5.858.986,25	$ 36.695.756,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3.829.655,46	$ 727.634,54	$ 4.557.290,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 167.783.798,32**	**$ 31.878.921,68**	**$ 199.662.720,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 114.889.669,41	$ 21.829.037,19	$ 136.718.706,60	$ 136.718.706,60
ADMINISTRATIVOS	$ 30.836.769,75	$ 5.858.986,25	$ 36.695.756,00	$ 36.695.756,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
PAGA	$ 3.829.655,46	$ 727.634,54	$ 4.557.290,00	$ 4.557.290,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 155.018.279,50**	**$ 29.453.473,10**	**$ 184.471.752,60**	**$ 184.471.752,60**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 121.527.739,20
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 121.527.739,20
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**13**

REGISTRO FOTOGRÁFICO








PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N°. 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 16/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** DIC DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO N° 4563 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA

PLAZO INICIAL:	10 Dias
FECHA DE INICIO:	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	30/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 1:	18/01/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 2:	6/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 3:	27/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 4:	21/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	28/05/2024
FECHA DE PRORROGA 1	31/05/2024
FECHA DE PRORROGA 2	28/09/2024
FECHA DE PRORROGA 3	8/11/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	16/12/2024
PLAZO ACUMULADO:	161,00 Dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.018.402,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.018.402,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1682-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	175
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alcantarillas	UND	
	Gaviones	M3	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	175	175
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alcantarillas	UND		0
	Gaviones	M3		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB		0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 127.944.252,10	$ 24.309.407,90	152.253.660,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	6.500.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 30.839.278,99	$ 5.859.463,01	36.698.742,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3.836.974,79	$ 729.025,21	4.566.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 168.082.690,76**	**$ 31.935.711,24**	**$ 200.018.402,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 115.149.826,89	$ 21.878.467,11	$ 137.028.294,00	$ 137.028.294,00
ADMIISTRATIVOS	$ 30.839.278,99	$ 5.859.463,01	$ 36.698.742,00	$ 36.698.742,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
PAGA	$ 3.836.974,79	$ 729.025,21	$ 4.566.000,00	$ 4.566.000,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 155.288.265,55	$ 29.504.770,45	$ 184.793.036,00	$ 184.793.036,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 137.028.294,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 137.028.294,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**13**

REGISTRO FOTOGRÁFICO











PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N°. 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN:

El Gobierno Nacional bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, estructuró el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, a través del cual se realizará la atención de las vías terciarias y secundarias del país, el cual está orientado a la atención de las necesidades viales presentadas por la comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad.

El Programa contempla tres (3) líneas de intervención para el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de 33.102 km transitables de vías regionales. Bajo este contexto, se presenta una primera línea intervención que consiste en la ejecución de obras menores con los organismos de acción comunal a través de la suscripción de convenios solidarios, instrumento legal definido en el Parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, así como el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021. A través del programa las comunidades y organizaciones tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participaron en la identificación de sus necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías.

De acuerdo con lo anterior, el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios solidarios con Organismos de Acción Comunal en los municipios de Bolívar, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Landázuri, Santa Helena del Opón, Vélez, Florián, Guavatá, La Belleza, Sucre, Aratoca, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches en el departamento de Santander, para lo cual se requiere realizar labores de control y seguimiento. Estos convenios se encuentran descritos en los anexos técnicos por lotes del proceso y dicha necesidad fue requerida por la Gerencia de Caminos Comunitarios de la Paz Total.


Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia de la persona que realizará las labores de interventoría.

Dentro del proceso de selección realizado por el INVIAS Interventores MOOL se presenta y se le asigna las OAC Juntas de Acción Comunal correspondientes a Lote 3 del proceso realizado las cuales quedan ubicadas en los municipios de Aratoca, San Juan Girón., Lebrija, El Playón y Puerto Wilches.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN


El proyecto se encuentra ubicado en las veredas de Cruz de piedra, Manchego y La Laja San Ignacio del municipio de Aratoca; Chocoa y Llano Grande del municipio de San Juan Girón; Betania, La aguada y Agua Caliente municipio del playón; El guayabo municipio de puerto Wilches y en el corregimiento de El Líbano del municipio de Lebrija todos en el departamento de Santander.

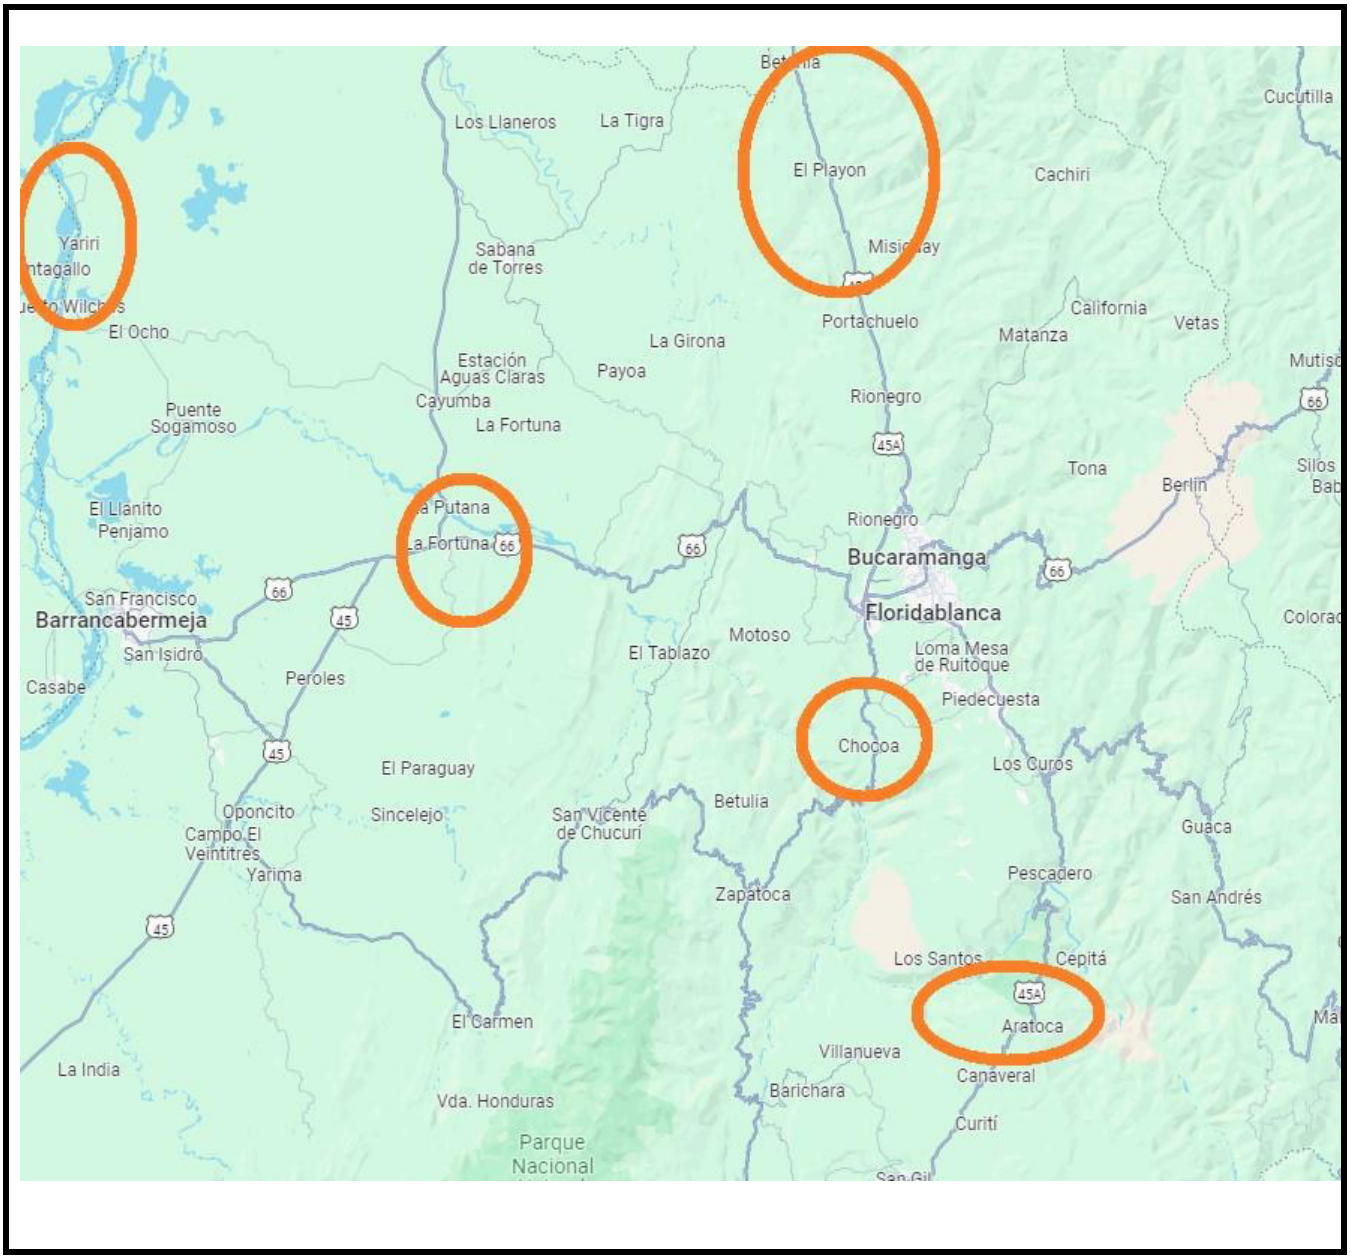


2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Los tramos por intervenir corresponden a vías terciarias que dan acceso a las diferentes veredas anteriormente descritas. Los tramos se encuentran en afirmado sobre pendientes que pueden superar el 10% y que en los periodos de invierno son pasos críticos para el normal tránsito de los vehículos.

Las veredas del municipio de Aratocá se encuentran sobre la vía de acceso al municipio de Jordán que parte desde la vía pavimentada Bucaramanga – San Gil, por tanto no solo se benefician estas veredas si no algunas veredas aledañas a la vía del municipio de Jordán. La grafica muestra en rojo el trazo que lleva la vía y que va a ser intervenida en tres veredas diferentes por las que atraviesa.

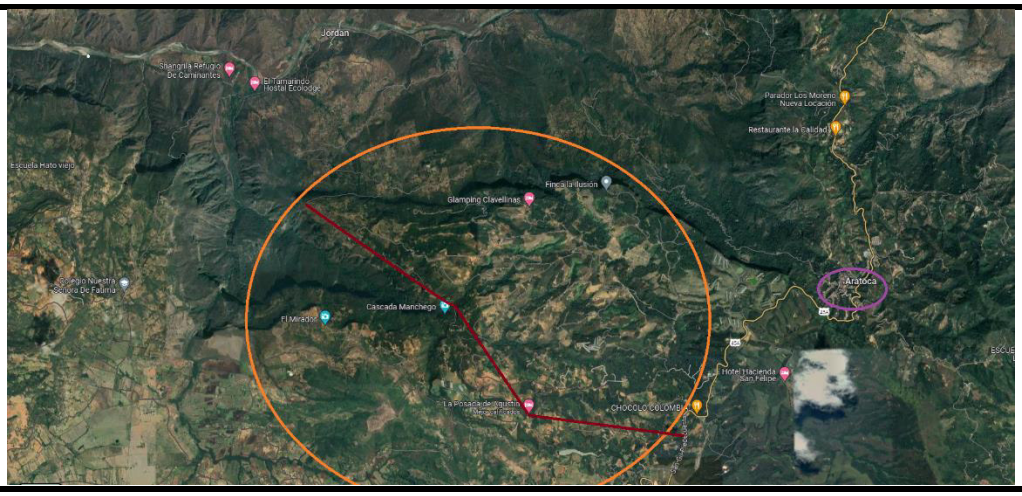


La vía conforma un ramal que parte de la vía Bucaramanga San Gil con el municipio de Jordán atraviesa las tres veredas a intervenir como son Laja San Ignacio, Manchego y Cruz de piedra entre otras, en la zona hace presencia empresas agroindustriales, además existen parcelas de pequeña extensión con cultivos.

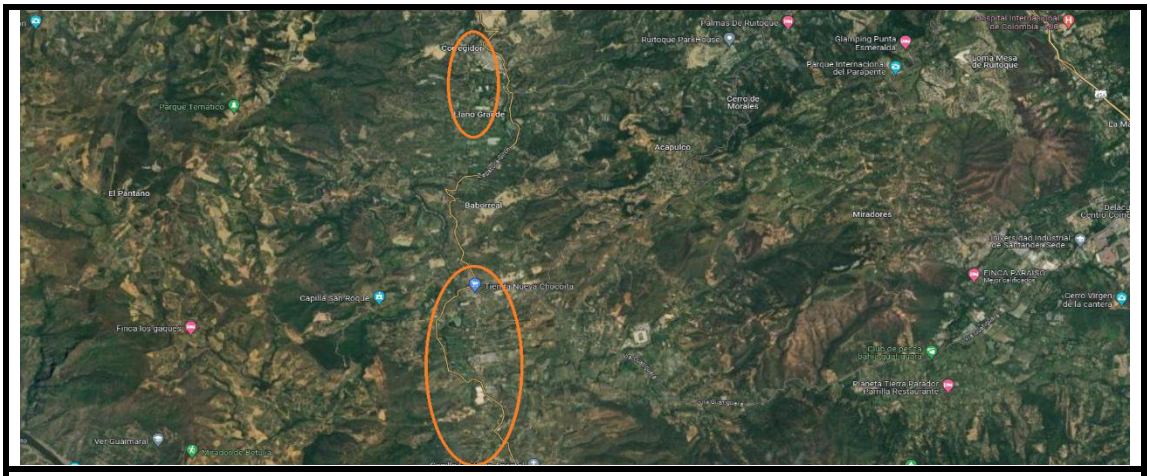


La grafica muestra la ubicación de las veredas beneficiadas con los dos proyectos a realizarse ambos en el municipio de san juan Girón sobre la vía que de este conduce a Zapatoca

El municipio de Lebrija (Azul-grafica) se encuentra sobre la vía Bucaramanga – Barrancabermeja, igual el corregimiento de El Líbano. la gráfica en color naranja muestra el área directa de influencia del proyecto. La comunidad propietaria de fincas de cultivos de pan coger se benefician de este proyecto ya que se facilita el acceso de los productos al centro poblado existente sobre la Vía principal.

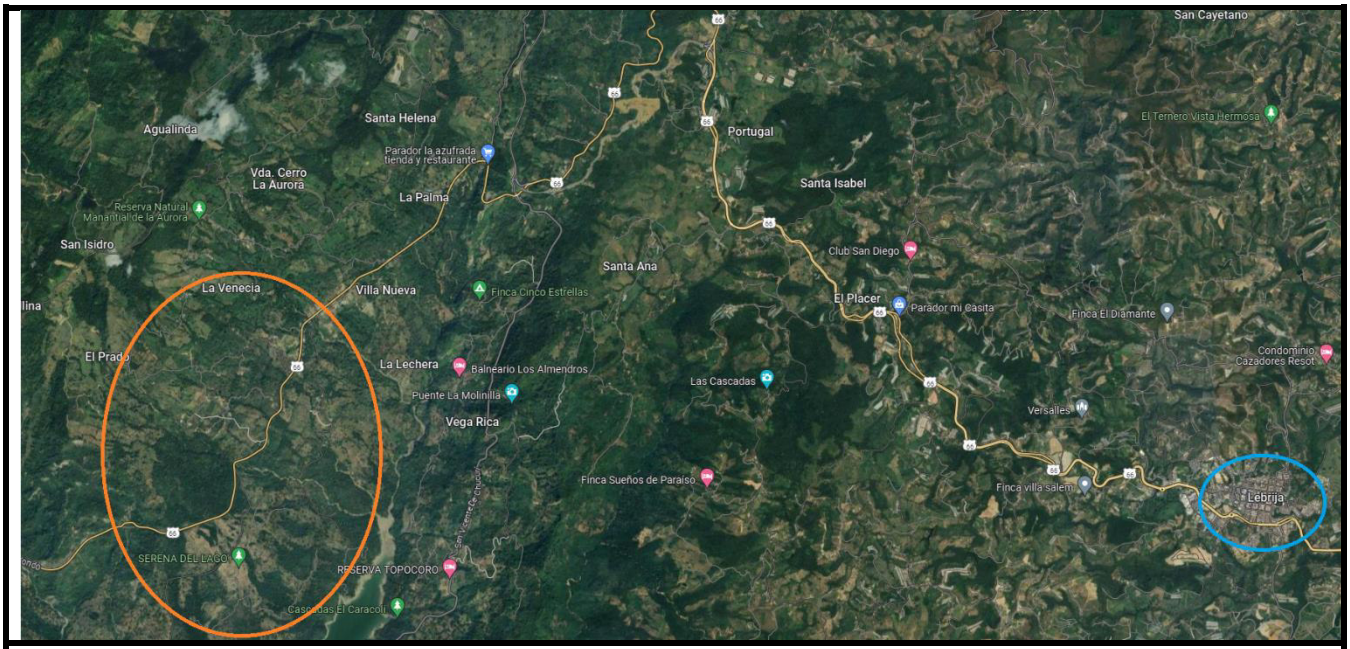


La zona se caracteriza por los cultivos varios que se comercializan directamente sobre la vía pavimentada existente Bucaramanga – Barrancabermeja

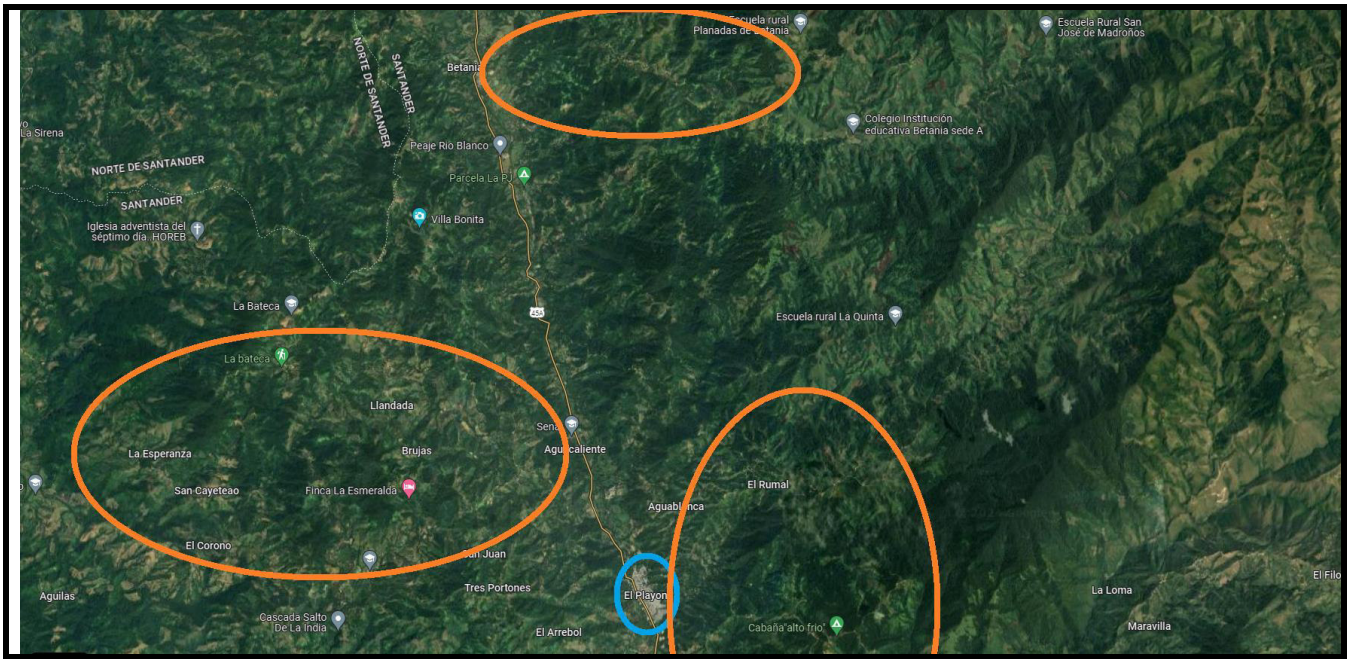

El municipio del playón se encuentra sobre la Bucaramanga a la costa atlántica, los tres proyectos dan acceso desde esta vía a las veredas ubicadas en las parte altas de las montañas.

En el Playón la vía de acceso a la vereda la aguada beneficia no solo a esta vereda también a las veredas que quedan posterior y dan acceso a la parte alta del costado sur oriental del municipio, igual situación se da para la vía a la vereda agua caliente que da acceso a las veredas ubicadas en la parte alta del costado nor-occidental del municipio. La tercera vía terciaría intervenida es la que da acceso al centro poblado de Betania. Las tres veredas son centros de cultivos que cubren la demanda del municipio y además sacan productos para Bucaramanga

En puerto Wilches el tramo corresponde al acceso al centro poblado denominado el Guayabo y que se encuentra totalmente incomunicado por vía terrestre, por tanto el único acceso directo que se presenta es por el río Magdalena. La otra acción es atravesar por ferry el rio hasta el sur del departamento de Bolívar y aprovechar la vía existente entre el municipio de Cantagallo y el centro poblado conocido como Cerro Burgos en Bolívar y una vez más atravesar nuevamente el magdalena en transporte pluvial.

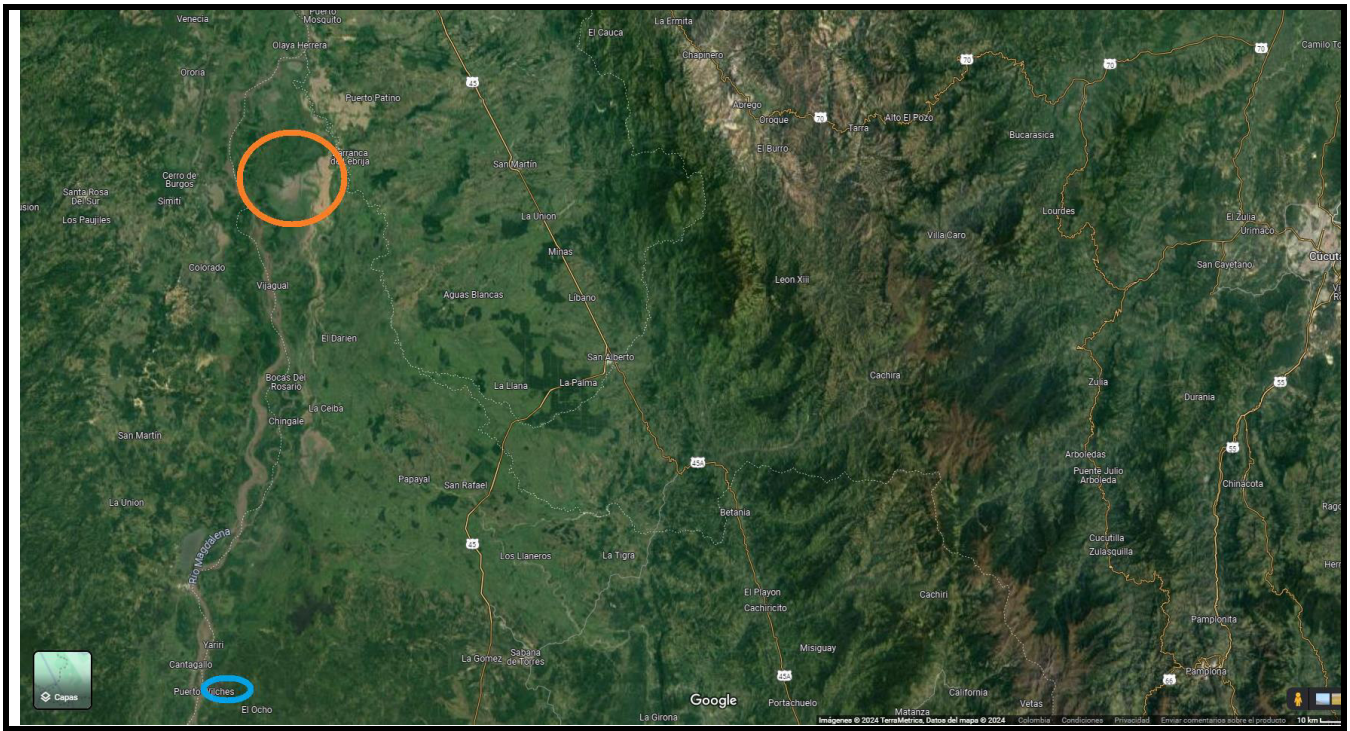

En azul el municipio de Puerto Wilches, Santander, en amarillo el centro poblado conocido como El Guayabo también sobre la ladera del río Magdalena.


2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.

Las vías terciarias que hacen parte de este proyecto en las 10 Juntas de acción comunal se encuentran en afirmado, no tienen conformada la calzada carecen de la conformación de cunetas, la mayor parte de estas se encuentran en pendiente, provocando que la escorrentía de la vía la atraviese y ocasionando en algunas partes cárcavas. Los puntos por intervenir corresponden a pequeños tramos críticos que en el periodo de lluvias no permite el flujo de vehículos por las condiciones en que queda la vía producto de la lluvia.

1. OAC JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA

	
Vereda Cruz de Piedra Municipio de Aratoca 6-07-2024	Vereda Cruz de Piedra culminado 30-10-2024

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Aratoca del departamento de Santander, en la vereda Clavellinas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 6,693627 y longitud -73,082427 y punto de referencia final el PR 0 + 320 con coordenadas latitud 6,693627 y longitud -73,083735, de la vía Cruz de Piedra, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial SANTANDER del INVIAS.

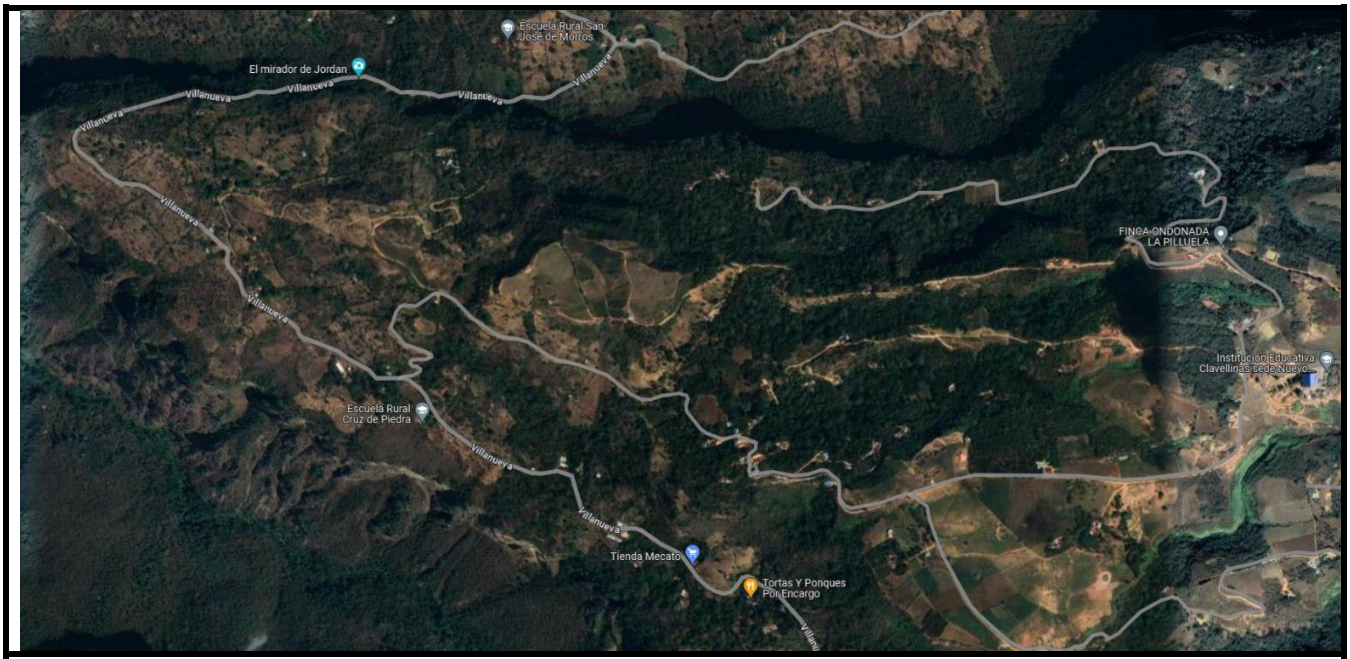


1- Vereda Cruz de piedra se puede observar el área de influencia directa del proyecto a ejecutar

2- OAC JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO

	
Vereda Manchego Municipio de Aratoca 6-07-2024	Vereda Manchego culminado 30-10-2024

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Aratoca del departamento de Santander, en la vereda Clavellinas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 6.679455 y longitud -73,07629 y punto de referencia final el PR 0 + 280 con coordenadas latitud 6,682033 y longitud -73,077277, de la vía Manchego, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial SANTANDER del INVIAS.

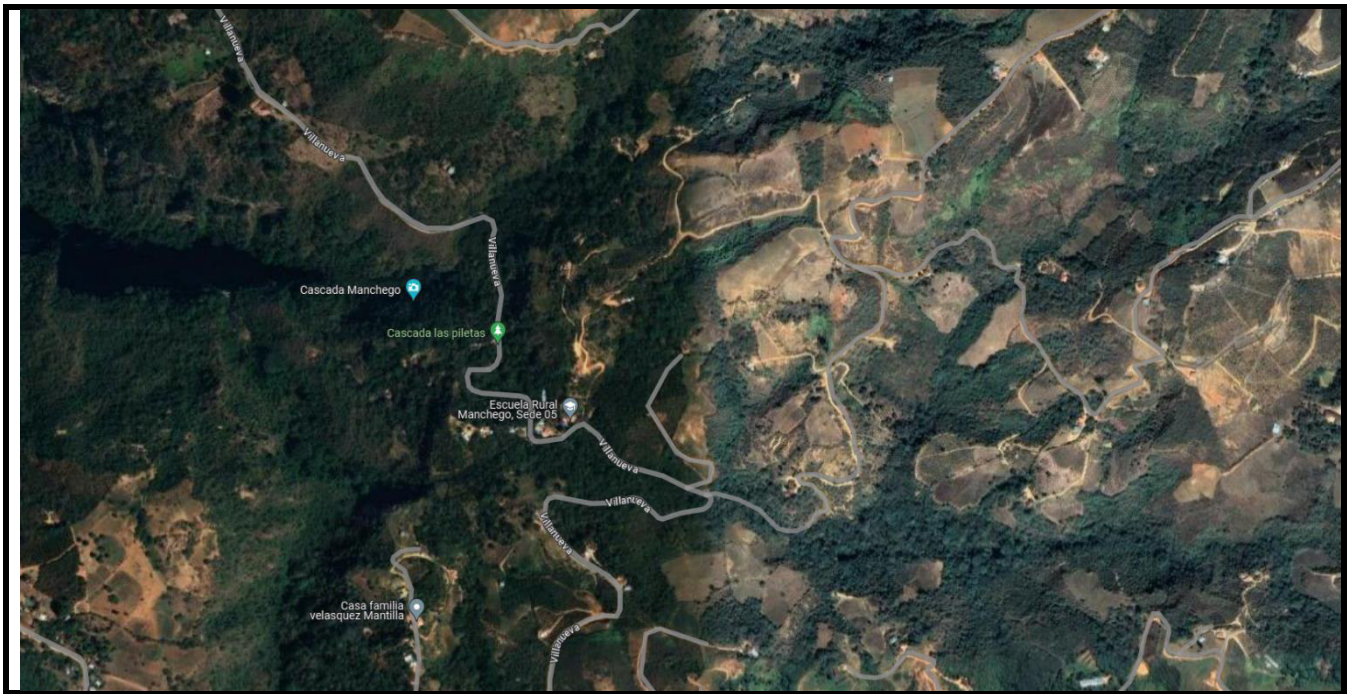

2- Vereda Manchego se puede observar el área de influencia directa del proyecto a ejecutar

3- OAC JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO.

	
Vereda La laja San Ignacio Municipio de Aratoca 6-06-2024	Vereda la Laja San Ignacio culminado 30/10/2024

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Aratoca del departamento de Santander, en la vereda Clavellinas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 6,678751 y longitud -73,074047 punto de referencia final el PR 0 + 200 con coordenadas latitud 6,678091 y longitud -73,07556 de la vía La Laja San Ignacio, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial SANTANDER del INVIAS.




3- Vereda La Laja San Ignacio se puede observar el área de influencia directa del proyecto a ejecutar

4- OAC JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHOCOA

	
Vereda Chocoa del Municipio de San Juan Girón, Departamento Santander 13-06-2024	A la entrega del presente informe se muestra evidencia fotográfica de la intervención de la via.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Girón del departamento de Santander, en la vereda Chocoa, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 Latitud: 7,0205438 Longitud: -73,16776845 y punto de referencia final el PR 1+400 Latitud: 7,0084907 Longitud: -73,17066991, de la vía Inmediaciones de la escuela vereda Chocoa conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS.

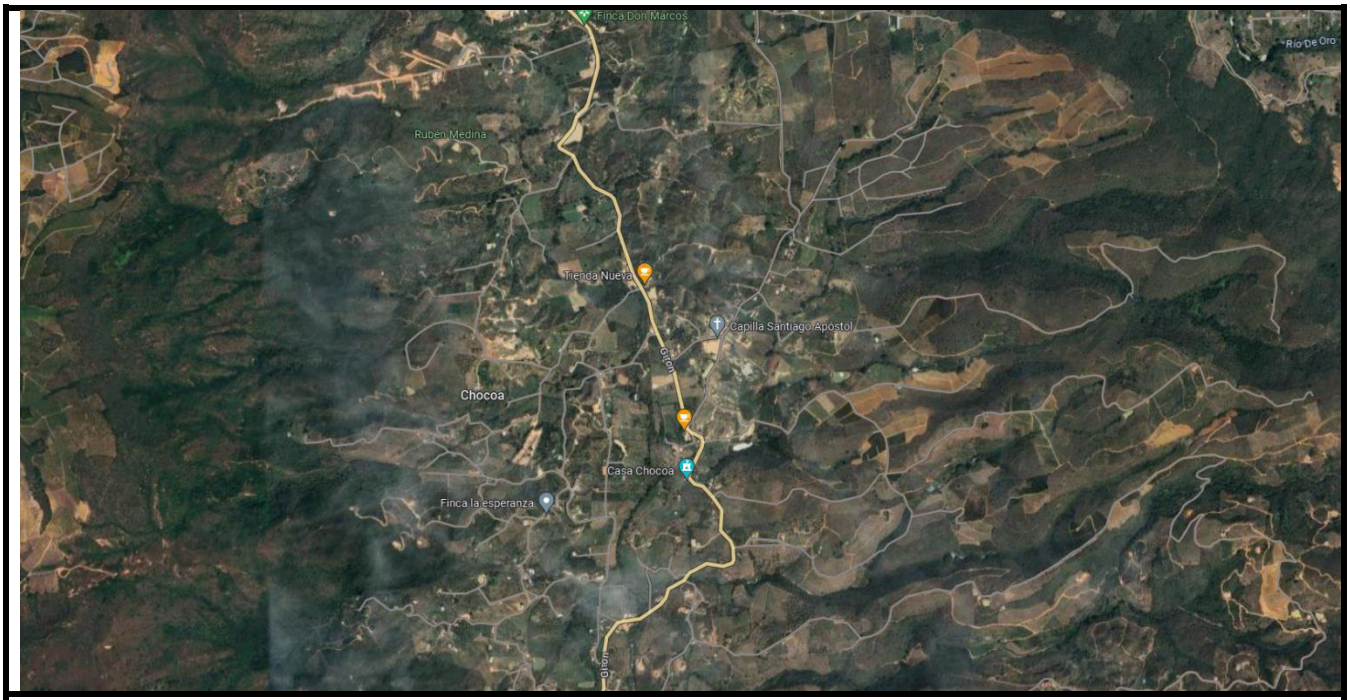

4- Vereda Chocoa se puede observar el área de influencia directa del proyecto a ejecutar

5- OAC JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS:

	
Vereda Llano Grande del Municipio de San Juan Girón, Departamento Santander 13-06-2024	Veredas De Corregidor, Llano Grande, Chocoa, Chocoita Y Peñas Culminado 23/11/2024

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Girón del departamento de Santander, en la vereda Llano Grande, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 Latitud: 7,0205438 Longitud: -73,1676845 y punto de referencia final el PR 1+400 Latitud: 7,0084907 Longitud: -73,17066991, de la vía Llano Grande, Batea El Zancudo, Corregidor conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS.



5- Vereda Llano Grande, se puede observar el área de influencia directa del proyecto a ejecutar

6- OAC JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO

	
Corregimiento El Líbano del Municipio de Lebrija, Departamento Santander 13-06-2024	A la entrega del presente informe se muestra evidencia fotográfica de la intervención de la via.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Lebrija del departamento de Santander, en la vereda El Líbano, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 7,170063 y longitud de -73,301655 y punto de referencia final el PR 0 + 352 con coordenadas latitud 7,171983 y longitud -73,300919, de la vía Ruta del Cacao, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial SANTANDER del INVIAS.



6- Corregimiento el Líbano, se puede observar el área de influencia directa del proyecto a ejecutar

7- OAC JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA

	
Vereda Betania del municipio del Playón, Departamento Santander 14-06-2024	A la entrega del presente informe se muestra evidencia fotográfica de la intervención de la via.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Playón, del departamento de Santander, en la vereda Betania, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 7,565096 y longitud -73,194394 y punto de referencia final el PR 0 + 650 con coordenadas latitud 7,564458 y longitud -73,190133, de la vía La Baticola, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial SANTANDER del INVIAS.



7- Vereda Betania, se puede observar el área de influencia directa del proyecto a ejecutar

8- OAC JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA

	
Vereda La Aguada del municipio del Playón, Departamento Santander 14-06-2024	A la entrega del presente informe se muestra evidencia fotográfica de la intervención de la via

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Playón del departamento de Santander, en la vereda Las Rocas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 7,41802 y longitud -73,185187 y punto de referencia final el PR 0 + 320 con coordenadas latitud 7,418531 y longitud -73,18684, de la vía La Nubia, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial SANTANDER del INVIAS.




8- Vereda La Aguada, se puede observar el área de influencia directa del proyecto a ejecutar

9- OAC JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA CALIENTE

	
Vereda Agua Caliente del municipio del Playón, Departamento Santander 20-06-2024	A la entrega del presente informe se muestra evidencia fotográfica de la intervención de la via.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Playón del departamento de Santander, en la vereda San Agustín Agua caliente, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 7,495391 y longitud -73,227792 y punto de referencia final el PR 0 + 500 con coordenadas latitud 7,49488 y longitud -73,223918, de la vía Sector La Ye, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial SANTANDER del INVIAS.

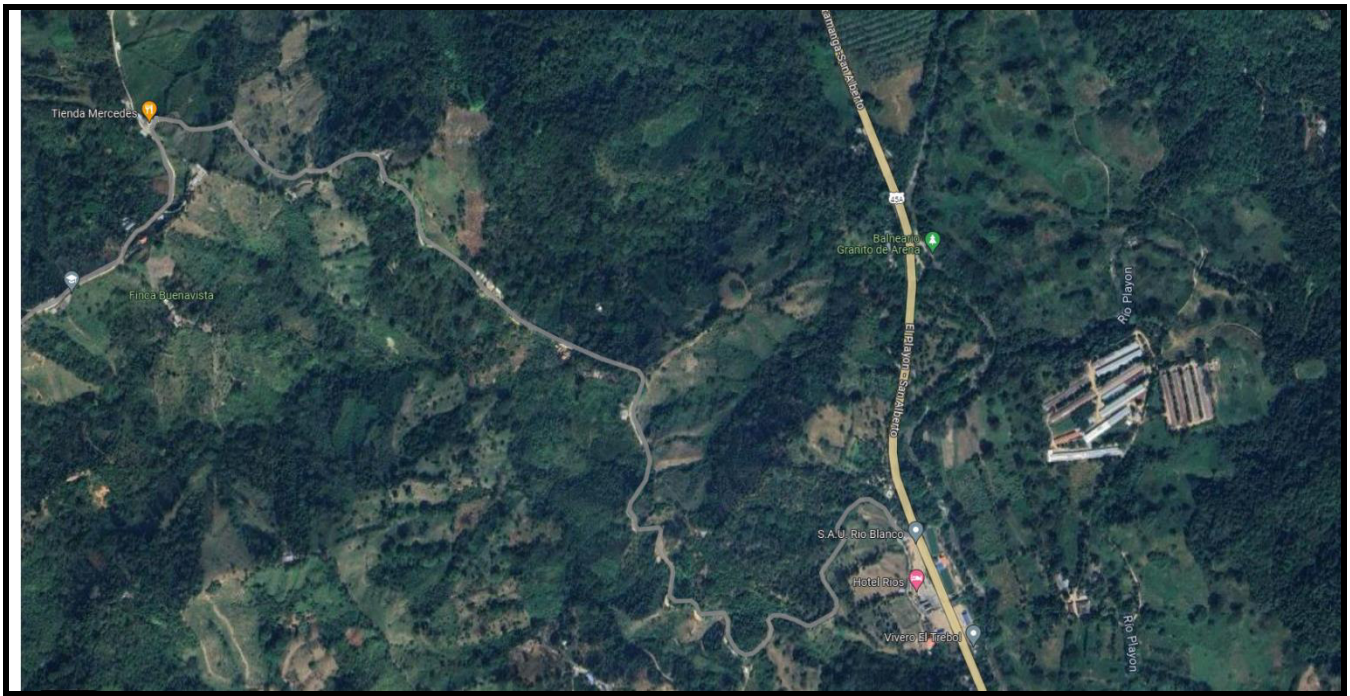

9- Vereda La Aguada, se puede observar el área de influencia directa del proyecto a ejecutar

9- OAC JUNTA DE ACCION COMUNAL JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN



Vereda El Guayabo del municipio de Puerto Wilches, Departamento Santander 20-06-2024



Vereda Ladera Santandereana Japrolasan Culminado 30/10/2024

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Puerto Wilches del departamento de Santander, en el corregimiento El Guayabo, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 Latitud: 7,9490822 Longitud: -73,8354142 y punto de referencia final el PR 0+200 Latitud: 7,950793 Longitud: -73,836171, de la vía El Guayabo - Badillo conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS.



10- Vereda La Aguada, se puede observar el área de influencia directa del proyecto a ejecutar

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cunetas una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas. Además, se construirán alcantarillas de 36" como se describe en la cartilla de obras menores de drenaje Versión 2022.

Para la materialización del proyecto se debe realizar una fase de estudios y diseños en la que se inicia con un levantamiento topográfico del tramo a intervenir y un estudio de suelos que nos permitan realizar un chequeo con respecta la cartilla del invias y de esta forma realizar el diseño geométrico, el diseño del punto crítico (Placa huella) y demás obras de drenaje que se requieran.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

3.1. INFORMACIÓN CONVENIOS

El proyecto consta de diez (10) convenios interadministrativos realizado entre el INVIAS y las OAC Juntas de Acción Comunales Veredales, la información de estos se describe en forma resumida en los siguientes cuadros:

NÚMERO ID DEL SECOP	SPSC-CD-CS-444-2023
NÚMERO DEL CONTRATO.	CONVENIO SOLIDARIO N° 3720 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	4/10/2023
OBJETO,	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA,	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA
NIT	901.437.866-6
VALOR INICIAL	$200.835.148
ADICIONES,	0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$200.835.148
MODIFICACIONES	N./A.
ACLARACIONES	N./A.
PLAZO,	28/09/2024
FECHA DE INICIO,	12/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	8/11/2024
DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO	VEREDA CRUZ DE PIEDRA MUNICIPIO DE ARATOCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER CEL.3143996145

NÚMERO ID DEL SECOP	SPSC-CD-CS-1048-2023
NÚMERO DEL CONTRATO.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4689 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	5/10/2023
OBJETO,	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA,	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO
NIT	NIT. 901.439.435-4
VALOR INICIAL	$200.967.757
ADICIONES,	0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$200.835.148
MODIFICACIONES	N./A.
ACLARACIONES	
PLAZO	28/09/2024
FECHA DE INICIO,	22/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	8/11/2024
DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO	VEREDA MACHENGO MUNICIPIO DE ARATOCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER CEL.3124889936

NÚMERO ID DEL SECOP	SPSC-CD-CS-488-2023
NÚMERO DEL CONTRATO.	CONVENIO SOLIDARIO N° 3780 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	5/10/2023
OBJETO,	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA,	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO
NIT	NIT. 800.041.101-3.
VALOR INICIAL	$200.986.561
ADICIONES,	0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$200.986.561
MODIFICACIONES	N./A.
ACLARACIONES	N./A.
PLAZO,	28/09/2024
FECHA DE INICIO,	20/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	8/11/2024
DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO MUNICIPIO DE ARATOCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER CEL.3124889936 CEL: 315 3494400

NÚMERO ID DEL SECOP	SPSC-CD-CS-825-2023
NÚMERO DEL CONTRATO.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4347 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/11/2023
OBJETO,	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA,	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA
NIT	NIT:901.456.488-6
VALOR INICIAL	$ 174.179.806
ADICIONES,	0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$ 174.179.806
MODIFICACIONES	N./A.
ACLARACIONES	N./A.
PLAZO,	28/09/2024
FECHA DE INICIO,	14/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	16/12/2024
DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO	VEREDA CHOCOA MUNICIPIO SAN JUAN GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER CEL.320 3271875

NÚMERO ID DEL SECOP	SPSC-CD-CS-1094-202
NÚMERO DEL CONTRATO.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4775 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	1/12/2023
OBJETO,	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS DEL MUNICIPIO DE GIRON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA,	J.A.C DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS
NIT	NIT. 901.517.838-3
VALOR INICIAL	$200.940.326
ADICIONES,	0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$200.940.326
MODIFICACIONES	N./A.
ACLARACIONES	N./A.
PLAZO,	28/09/2024
FECHA DE INICIO,	22/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	16/12/2024
DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO	VEREDA LLANO GRANDE MUNICIPIO SAN JUAN GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER CEL 3155519473

NÚMERO ID DEL SECOP	SPSC-CD-CS-529-2023
NÚMERO DEL CONTRATO.	CONVENIO SOLIDARIO N° 3850 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/10/2023
OBJETO,	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE "EL LIBANO" DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA,	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO
NIT	NIT. 804.002.324-7
VALOR INICIAL	$201’066.699,00
ADICIONES,	0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$201’066.699,00
MODIFICACIONES	N./A.
ACLARACIONES	N./A.
PLAZO,	28/09/2024
FECHA DE INICIO,	13/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	16/12/2024
DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO	CORREGIMIENTO EL LÍBANO, MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER CEL.

NÚMERO ID DEL SECOP	SPSC-CD-CS-969-2023
NÚMERO DEL CONTRATO.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4575 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/11/2023
OBJETO,	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BETANIA, DEL MUNICIPIO EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA,	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA, MUNICIPIO DE EL PLAYÓN
NIT	NIT. 901.046.202-8
VALOR INICIAL	$200.662.720,00
ADICIONES,	0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$200.662.720,00
MODIFICACIONES	N./A.
ACLARACIONES	N./A.
PLAZO,	27/09/2024
FECHA DE INICIO,	27/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	16/12/2024
DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO	VEREDA BETANIA, MUNICIPIO EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO SANTANDER CEL

NÚMERO ID DEL SECOP	SPSC-CD-CS-964-2023
NÚMERO DEL CONTRATO.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/11/2023
OBJETO,	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA,	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA.
NIT	NIT. 800.179.940-1
VALOR INICIAL	$201.018.402,00
ADICIONES,	0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$201.018.402,00
MODIFICACIONES	N./A.
ACLARACIONES	N./A.
PLAZO,	28/09/2024
FECHA DE INICIO,	21/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	16/12/2024
DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO	VEREDA LA AGUADA, MUNICIPIO EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO SANTANDER CEL:

NÚMERO ID DEL SECOP	SPSC-CD-CS-822-2023
NÚMERO DEL CONTRATO.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4343 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/11/2023
OBJETO,	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA,	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE
NIT	NIT. 900.239.754-7.
VALOR INICIAL	$200.366.430,00
ADICIONES,	0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$200.366.430,00
MODIFICACIONES	N./A.
ACLARACIONES	N./A.
PLAZO,	28/09/2024
FECHA DE INICIO,	27/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	16/12/2024
DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO	VEREDA AGUA CALIENTE, MUNICIPIO EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO SANTANDER CEL: 315 6548386


NÚMERO ID DEL SECOP	SPSC-CD-CS-887-2023
NÚMERO DEL CONTRATO.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4441 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/11/2023
OBJETO,	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA,	JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN
NIT	NIT:901.663.730-1
VALOR INICIAL	$200.999.183
ADICIONES,	0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$200.999.183
MODIFICACIONES	N./A.
ACLARACIONES	N./A.
PLAZO,	28/09/2024
FECHA DE INICIO,	18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	16/12/2024
DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO	VEREDA EL GUAYABO, MUNICIPIO PUERTO WILCHES, DEPARTAMENTO SANTANDER CEL: 310 5742479

3.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS OAC JUNTA DE ACCION COMUNAL:

Durante el periodo correspondiente al mes de este informe las actividades realizadas por las diez OAC que hace parte del lote 3. Realizaron las actividades que se describen a continuación:


CRUZ DE PIEDRA:

- Se culmina ejecución de la placa huella, a la presente fecha del informe donde su alcance final se muestra a continuación:
  1. Extensión y compactación de 174ml de sub base
  2. 2 Rampa de acceso de 2 ml
  3. Ejecución de placa huella completa desde la abscisa k0+000 hasta la abscisa k0+174

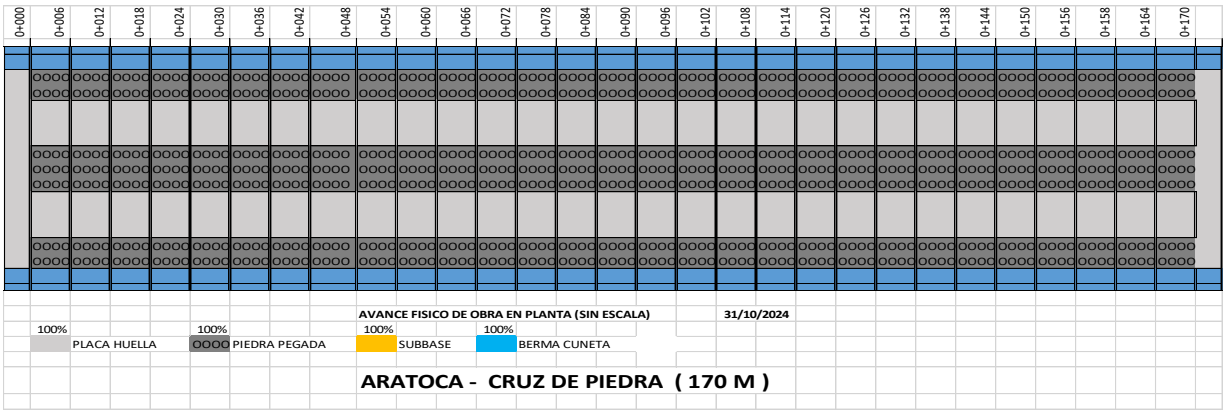


MANCHEGO:

- Se culmina ejecución de la placa huella, a la presente fecha del informe donde su alcance final se muestra a continuación:
  1. Extensión y compactación de 174ml de sub base
  2. 2 Rampa de acceso de 2 ml
  3. Ejecución de placa huella completa desde la abscisa k0+000 hasta la abscisa k0+174

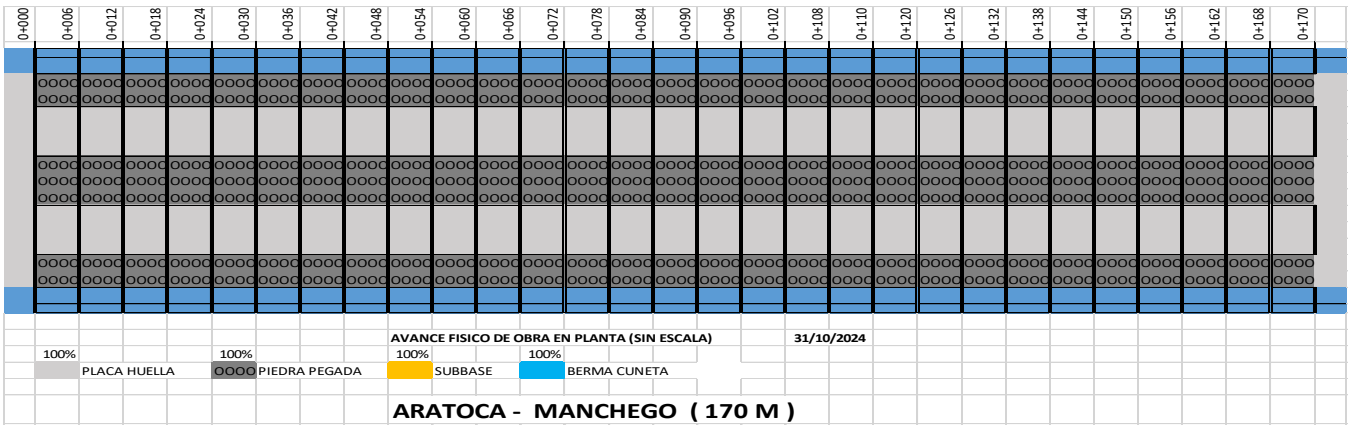

SAN IGNACIO:


- Se culmina ejecución de la placa huella, a la presente fecha del informe donde su alcance final se muestra a continuación:
  1. Extensión y compactación de 150ml de sub base
  2. 2 Rampa de acceso de 2 ml
  3. Ejecución de placa huella completa desde la abscisa k0+000 hasta la abscisa k0+150
  4. 1 alcantarilla tipo III (7 metros)

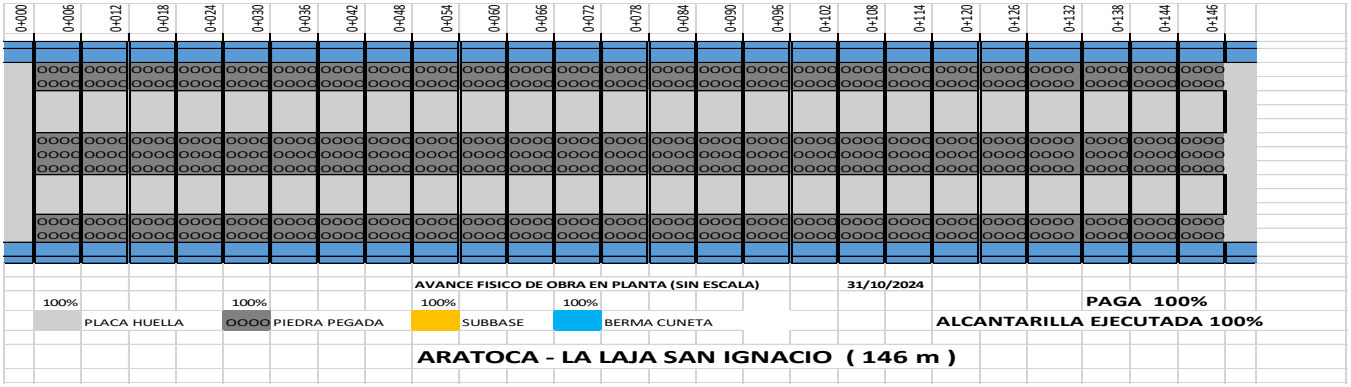

CHOCOA:

- Se realiza ejecución de la placa huella, a la presente fecha del informe se hace corte de obra, mostrando como ejecución la siguiente información:


  - Extensión y compactación de 150ml de sub base
  - 2 Rampa de acceso de 2 ml
  - Ejecución de placa huella completa desde la abscisa k0+000 hasta la abscisa k0+150

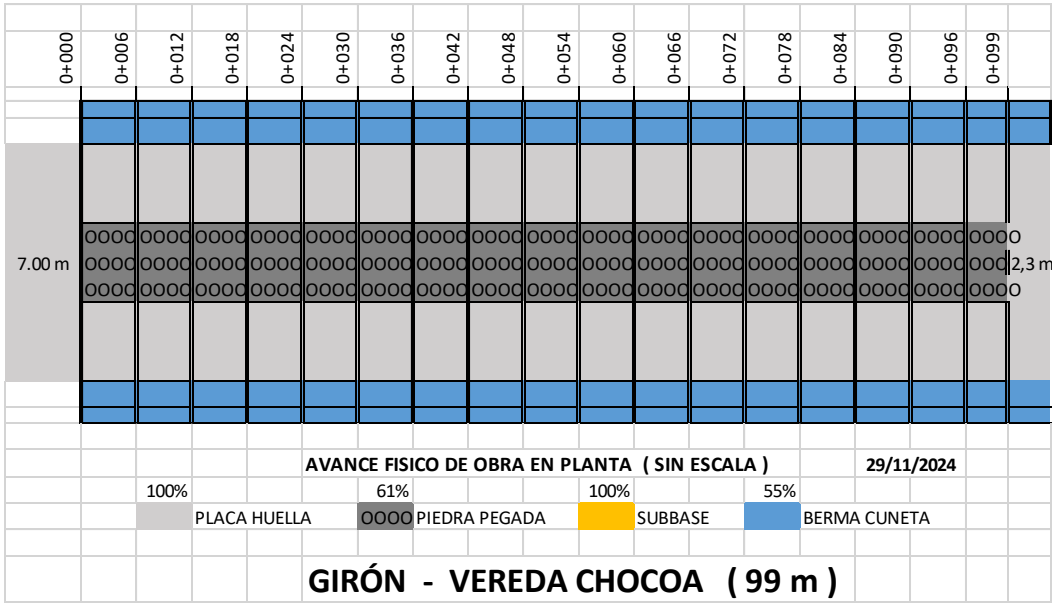

LLANO GRANDRE

- Se culmina ejecución de la placa huella, a la presente fecha del informe donde su alcance final se muestra a continuación:


1. Extensión y compactación de 160ml de sub base
2. 2 Rampa de acceso de 2 ml
3. Ejecución de placa huella completa desde la abscisa k0+000 hasta la abscisa k0+160

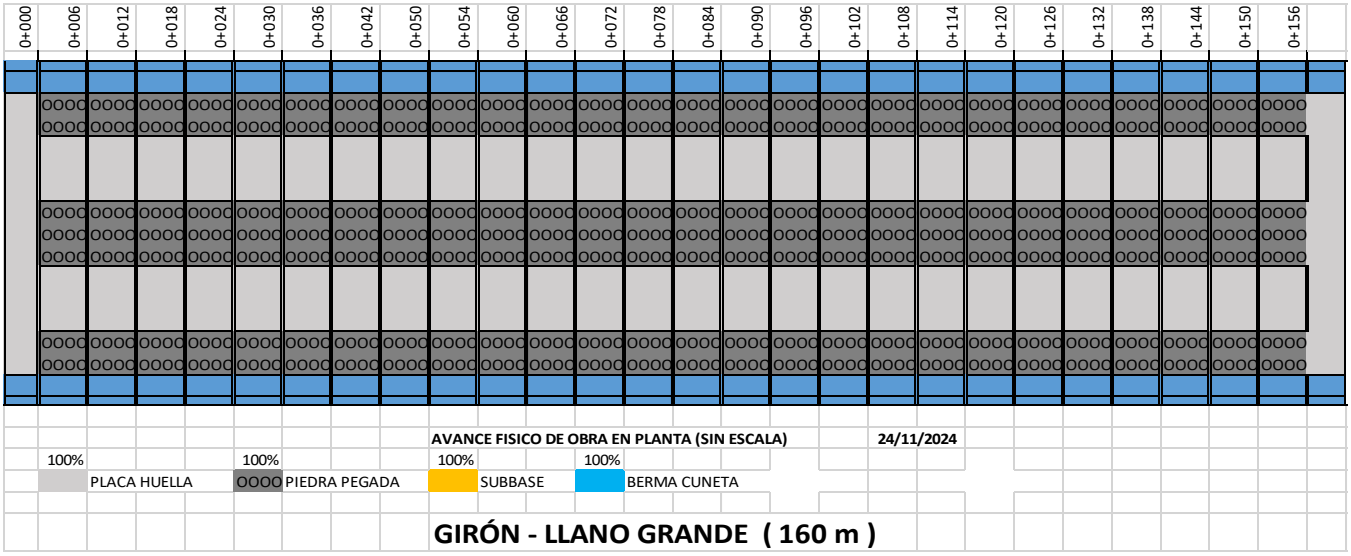


LIBANO:

- Se realiza ejecución de la placa huella, a la presente fecha del informe se hace corte de obra, mostrando como ejecución la siguiente información:

1. Extensión y compactación de 154 ml de sub base.
2. Ejecución de placa huella completa desde la abscisa k0+000 hasta la abscisa k0+0154
3. Rampa de acceso de 2 ml

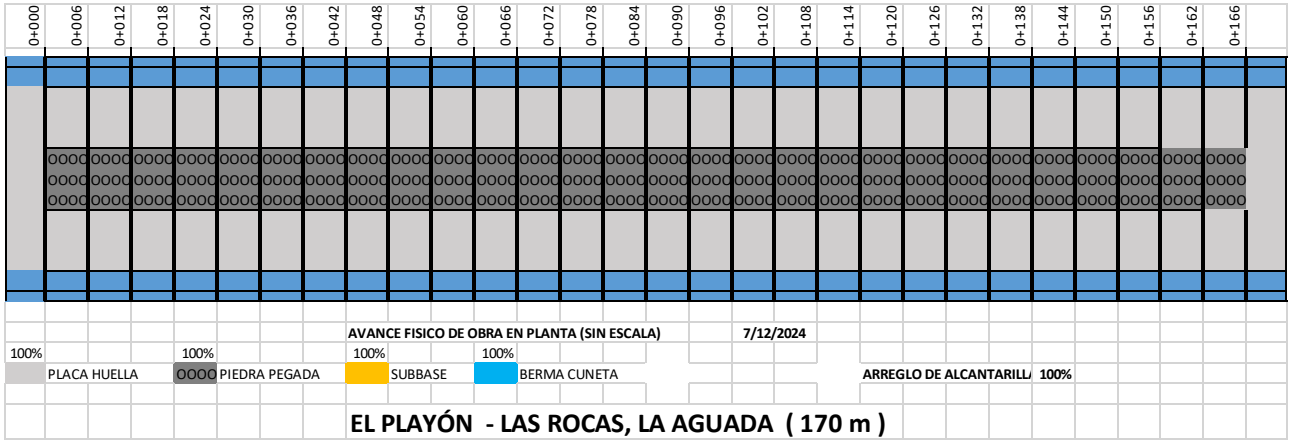


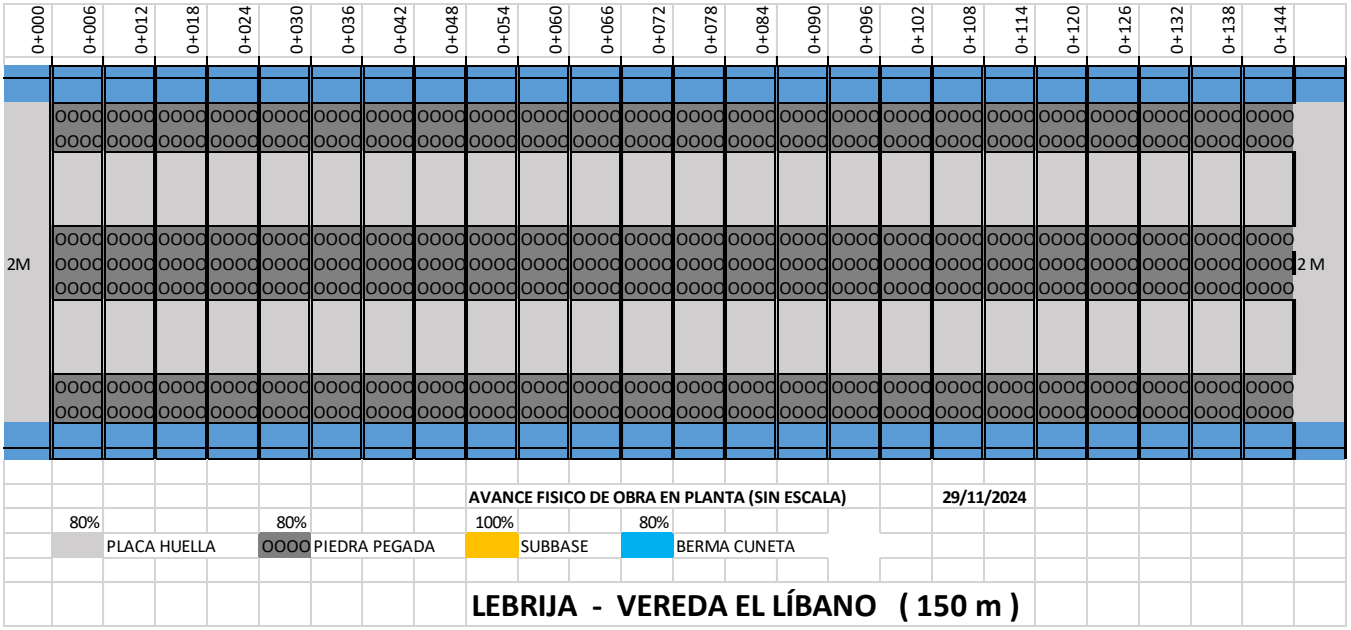

BETANIA:

- Se realiza ejecución de la placa huella, a la presente fecha del informe se hace corte de obra, mostrando como ejecución la siguiente información:

1. Extensión y compactación de 175 ml de sub base.
2. Ejecución de 2 rampas de acceso de 2 ml
3. Ejecución de placa huella completa desde la abscisa k0+000 hasta la abscisa k0+175

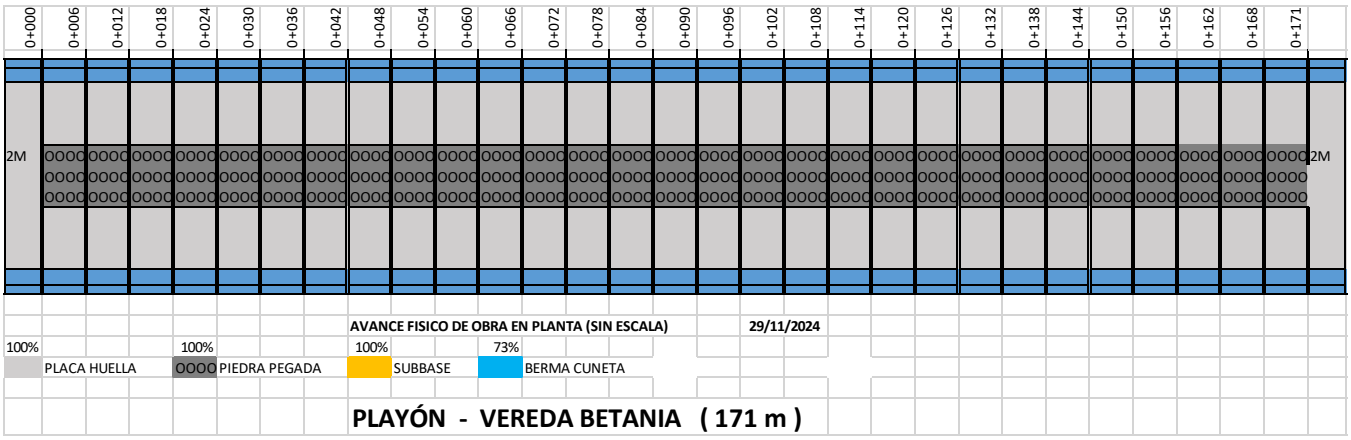

LAS ROCAS:


- Se realiza ejecución de la placa huella, a la presente fecha del informe se hace corte de obra, mostrando como ejecución la siguiente información:

1. Extensión y compactación de 175 ml de sub base.
2. Ejecución de placa huella completa desde la abscisa K0+000 hasta la abscisa K0+175
3. Ejecución de 2 rampas de acceso de 2 ml.

SAN AGUSTIN:

- Se culmina ejecución de la placa huella, a la presente fecha del informe donde su alcance final se muestra a continuación:


1. Extensión y compactación de 145 ml de sub base.
2. 2 Rampa de acceso de 2 ml.
3. Ejecución de placa huella completa desde la abscisa k0+000 hasta la abscisa k0+145

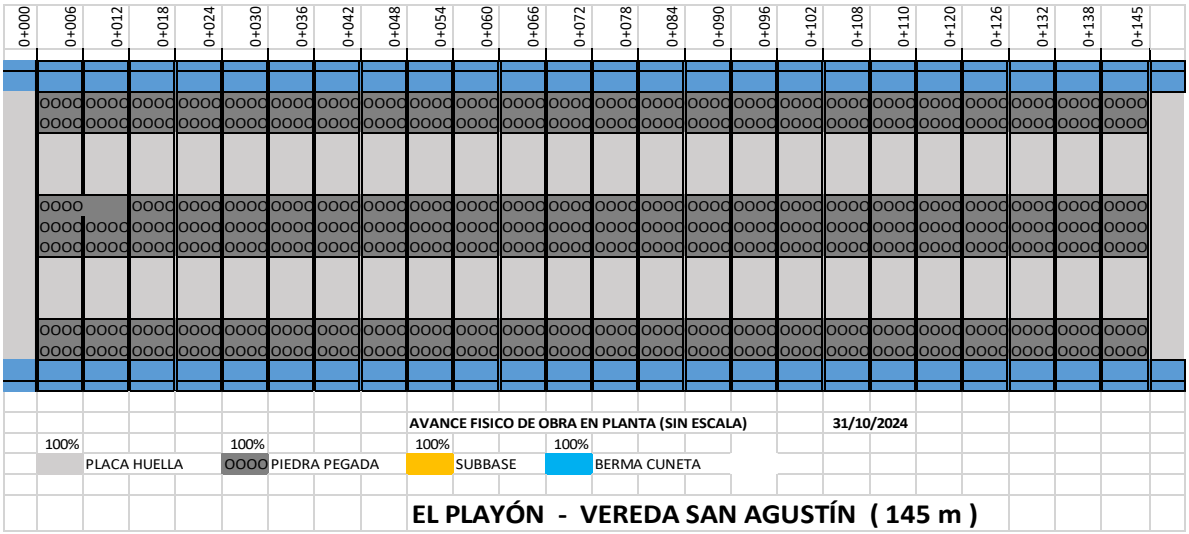

PUERTO WILCHES LADERA JAPROLASAN

- Se culmina ejecución de la placa huella, a la presente fecha del informe donde su alcance final se muestra a continuación:

4. Extensión y compactación de 155 ml de sub base.
5. 2 Rampa de acceso de 2 ml.
6. Ejecución de placa huella completa desde la abscisa k0+000 hasta la abscisa k0+155

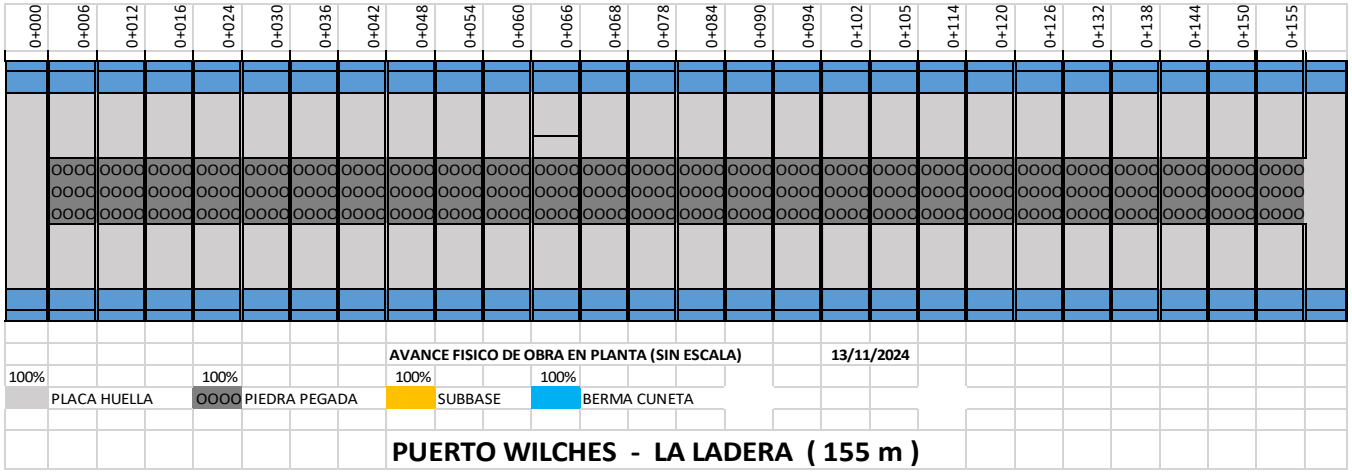

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.

Para el presente periodo esta actividad no aplica para ninguno de los 10 convenios solidarios a los que esta interventoría les realiza seguimiento.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

Durante el presente periodo se realizaron actividades preliminares de obra, otras donde vemos una ejecución de obra notoria, y a su vez expresamos que 4 de las juntas de acción comunal correspondientes al lote 3 ya culminaron actividades de obra, se realizaron en medio del proceso constructivo visitas de parte del INVIAS y la interventoría para mirar problemáticas presentadas en el proyecto, ver el avance de cada JAC, se realizaron comités donde se tocaron temas técnicos para cambio y aprobaciones, esta actividad se presentó en todas las 10 OAC Juntas de acción comunal que componen la interventoría Lote 3.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

En el presente informe se realizan actividades de obra razón por la cual se presenta la información en los cuadros respectivos, es de aclarar que para el frente de Puerto Wilches no se hizo uso de maquinaria amarilla.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/12/204 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 8

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO No. 4347

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1682/2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES NOVIEMBRE																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VIBRO CONCRETO				I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	I	I	I	I	I															
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
TOTAL ACTIVO					1	1	1	1	1	1		1	1																					
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO				1							1			1	1	1	1	1	1															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	1	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	1	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): En este proyecto se esta utiizando concreto premezclado, razon por la cual el quipo unicamente que se esta utilizando es vibro concreto y se encuentra activo en actividades de fundida, por lo de mas se aclara que los dias domingos y festivos tambien se encuentra inactivo.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:Culminando actividades de obra

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

albaConsueloaD

Firma
Nombre: ALBA AREVALO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA BELTRAN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520207170CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/12/204 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 8

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE "EL LIBANO" DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3850

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1682/2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES NOVIEMBRE																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VIBRO CONCRETO			LIBANO	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I														
MEZCLADORA			LIBANO	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I														
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2														
TOTAL ACTIVO					2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO				2							2						2	2	2														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): No se laboran los dias domingos ni festivos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se cumlina actividades de vaciado de fundida

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Diana Camila Troncoso Álvarez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA BELTRAN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520207170CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/12/204 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 8

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BETANIA, DEL MUNICIPIO EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONVENIO No. 4575

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA, MUNICIPIO DE EL PLAYÓN

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1682/2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES NOVIEMBRE																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
VIBRO CONCRETO			BETANIA	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I														
MEZCLADORA			BETANIA	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I														
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2														
TOTAL ACTIVO					2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO				2							2						2	2	2														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	4	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Se inician actividades el dia 2 de octubre, compplementando esto los dias domingos y festivos se encuentran inactivos los equipos.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se sulmina proceso de fundida

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: LINA MARIA GARCIA GUERRERO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA BELTRAN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520207170CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 8

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 4563

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1682/2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES NOVIEMBRE																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VIBRO CONCRETO			BETANIA	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I														
MEZCLADORA			BETANIA	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I														
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2														
TOTAL ACTIVO					2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO				2							2						2	2	2														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Se inician actividades el dia 2 de octubre, compplementando esto los dias domingos y festivos se encuentran inactivos los equipos.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se sulmina proceso de fundida

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: OSCAR FERNANDO VERA GONZALEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA BELTRAN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520207170CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

3.6. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

En el periodo del 1 al 15 de diciembre de 2024 las OAC Juntas de acción comunal correspondiente al LOTE-3, presentan los siguientes profesionales que se relacionan a continuación:

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA:

Nombre	Profesión	Tipo contrato
ALBA CONSUELO ARÉVALO DURAN	Ingeniera Civil	Prestación de Servicios
LUIS ENRIQUE INSUASTY RODRÍGUEZ	Contador	Prestación de Servicios
ORTEGA JORGE	Maestro	Nomina
DIAZ FIDEL	Maestro	Nomina
ANGULO JOSE	Ayudante	Nomina
BALLESTEROS CARLOS	Ayudante	Nomina
MURILLO JONATHAN	Ayudante	Nomina
DUARTE LUIS	Ayudante	Nomina

JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS:

Nombre	Profesión	Tipo contrato
ANYI ANDREA LOPEZ	Ingeniera Civil	Prestación de Servicios
KARENINA MARTÍNEZ	Contadora	Prestación de Servicios
FIDEL BRICEÑO ALVAREZ	Maestro	Nomina
ACEVEDO VILLAMIIZAR JOSE EDUARDO	Ayudante	Nomina
ARIAS RIVERA OMAR	Ayudante	Nomina
CASTRILLON JIMENEZ JOHN CARLOS	Ayudante	Nomina
GOMEZ ARIEL ANTONIO	Ayudante	Nomina
MACHADO VELANDIA FELIZ RAUKL	Ayudante	Nomina
RUEDA OLAVE ANDERSON FABIAN	Ayudante	Nomina

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LÍBANO:

Nombre	Profesión	Tipo contrato
DIANA CAMILA TRONCOSO	Ingeniero Civil	Prestación de Servicios
CLARA JOHANA ESPINEL	Contadora	Prestación de Servicios
FRANCO ANGARITA VICTOR MANUEL	Oficia	Nomina
FRANCO TORRES MANUEL	Maestro	Nomina
CASTELLANOS SOTO CRISTIAN EDUARDO	Ayudante	Nomina
PEREZ CASTILLO WILSON ALEXANDER	Ayudante	Nomina
ROBLES SANDOVAL ANA MILENA	Ayudante	Nomina
SANABRIA QUINTERO EDISON ALIRIO	Ayudante	Nomina
SIERRA ROJAS LUIS ALFREDO	Ayudante	Nomina
VENEZUELA MARTINEZ SANDRA CAROLINA	Ayudante	Nomina

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BETANIA:

Nombre	Profesión	Tipo contrato
LINA MARIA SIERRA GUERRERO	Ingeniero Civil	Prestación de Servicios
HAIDYN ALBERTO NIÑO PEREIRA	Contador	Prestación de Servicios
ALVARO HERNANDO	Maestro	Nomina
CARDENAS REY MARTIN	Oficial	Nomina
ESTEBAN PLIDOEXPEDITO	Ayudante	Nomina
MANTILLA PARADA EDUVANY	Ayudante	Nomina
MEDEL GIL CARLOS	Ayudante	Nomina
MORA ROPERO LIOS EMILIO	Ayudante	Nomina
PABON RODRIGUEZ JAVIER	Ayudante	Nomina

JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA:

Nombre	Profesión	Tipo contrato
OSCAR FERNANDO VERA GONZALEZ	Ingeniero Civil	Prestación de Servicios
MARIA ALEXANDRA LARROTA RODRIGUEZ	Contadora	Prestación de Servicios
CARVAJAL BAYONA RODRIGO	Ayudante	Nomina
DELGADO CARVAJAL ROINEY AGUSTO	Ayudante	Nomina
GARCIA MARIN VICTOR	Ayudante	Nomina
GARCIA PAEZ GIAN CARLOS	Ayudante	Nomina
GUITIERREZ RUA JUAN CARLOS	Ayudante	Nomina
MARTINEZ FIGUEROA IVAN ANDRES	Ayudante	Nomina
SANCHEZ MENDOZA JAIRO	Maestro	Nomina
SANDOVAL CARDENAS ANGEL MARIA	Ayudante	Nomina
VILLAMIZAR IZAQUITA FERNANDO	Maestro	Nomina

3.7. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

Se adjunta formatos donde se inició ejecución de obra de las 10 JAC hasta la fecha del presente informe.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO N° 3720 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1682 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1146823	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 199.835.148	
TOTAL						$ 199.835.148	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.835.148,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO ENRIQUE VARGAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 20202-410374

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO N° 4689 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1682 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1357623	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.967.757	
TOTAL						$ 199.967.757	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.967.757,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES PINTO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO N° 3780 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1149923	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.986.561	
TOTAL						$ 199.986.561	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.986.561,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:FEISAN JOSE GUTIERREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO N° 4347 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1283723	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 173.179.806	
TOTAL						$ 173.179.806	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 173.179.806,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

albaConsueloaD
Firma
Nombre: ALBA AREVALO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO N° 4775 DE 2023 **CONTRATISTA:** J.A.C DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1369723	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.940.326	
TOTAL						$ 199.940.326	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.940.326,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:ANYI LOPEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO N° 3850 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1195723	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.066.699	
TOTAL						$ 199.066.699	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.066.699,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:DIANA CAMILA TRONCOSO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO N° 4575 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA, MUNICIPIO DE EL PLAYÓN

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1682 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1332123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.662.720,00	
			TOTAL			$ 199.662.720,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.662.720,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: LINA MARIA GARCIA GUERRERO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO N° 4563 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1357923	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 200.018.402	
TOTAL						$ 200.018.402	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 200.018.402,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: OSCAR FERNANDO VERA GONZALEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO N° 4343 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	300723	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.366.430	
TOTAL						$ 199.366.430	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.366.430,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: YULY MARLEY GARCIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO N° 4441 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1307523	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.999.183	
TOTAL						$ 199.999.183	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.999.183,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN REYES
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

3.10. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

Durante el presente periodo no se realizan cambios en ninguno de los 10 convenios por tanto el estado que presentan las pólizas se describe en los cuadros siguientes:

1. **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA**

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA SEGUROS		**CONVENIO:**	**N° 3720 DE 2023**
Póliza Única de Cumplimiento No: 3001972	SUMA	**VIGENCIA**	
	ASEGURADA	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	40.167.030.00	31/10/2024	8/09/2025
PRESTACIONES	10.041.758.00	31/12/2026	8/11/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	60.250.545.00	28/09/2024	8/11/2029

2. **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO**

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		**CONVENIO:**	**N° 4689 DE 2023**
POLIZA	**N° 100043367**	**VIGENCIA**	
	VALOR	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	$ 40´193.551,40	27/09/2024	8/09/2025
PRESTACIONES	$ 10´048.387,85	27/09/2024	8/11/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 60´290.327,10	8/11/2024	8/11/2029

3. **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO**

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA SEGUROS		**CONVENIO:**	**N° 3780 DE 2023**
POLIZA	**N° 3001974**	**VIGENCIA**	
	VALOR	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	$ 40´197.313,00	28/07/2025	08/09/2025
PRESTACIONES	$ 10´049.329,00	28/09/2027	8/11/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 60´295.969,00	8/11/2024	8/11/2029

4. **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA**

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		**CONVENIO:**	**N° 4347 DE 2023**
POLIZA	**N° 100043367**	**VIGENCIA**	
	VALOR	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	$ 34´835.962,00	28/07/2025	08/09/2025
PRESTACIONES	$ 8.708.991,00	28/09/2027	08/11/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 52´253.942,00	08/11/2024	08/11/2029

5. **JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS**

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		CONVENIO:	N° 4775 DE 2023
POLIZA	N° 100299955	VIGENCIA	
	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$ 40´188.065,20	1/12/2023	8/09/2025
PRESTACIONES	$ 10´047.016,30	1/12/2023	8/11/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 60´282.097,80	31/12/2023	8/11/2029

6. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE "EL LÍBANO"

LA PREVISORA S.S. COMPAÑÍA DE SEGUROS		CONVENIO:	N°
POLIZA	N° 100043367	VIGENCIA	
	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$ 40´213.340,00	11/10/2023	8/09/2025
PRESTACIONES	$ 10´053.335,00	11/10/2023	8/11/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 60´320.010,00	31/12/2023	8/11/2029

7. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BETANIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		CONVENIO:	N° 4575 DE 2023
POLIZA	N° B-100043094	VIGENCIA	
	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO CONTRATO	$ 40´132.544,00	31/05/2024	8/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	$ 10´033.136,00	31/05/2024	8/11/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 60´198816,0021/	28/09/2024	8/11/2029

8. JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		CONVENIO:	N°
POLIZA	N° B-100043615	VIGENCIA	
	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$ 40´203.680.40	27/11/2023	8/09/2025
PRESTACIONES	$ 10´050.920,10	27/11/2023	8/11/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 60´305.520,60	31/12/2023	8/11/2029

9. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		CONVENIO:	N°
POLIZA	N° 100042731	VIGENCIA	
	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$ 40´073.286,00	31/05/2024	8/09/2025
PRESTACIONES	$ 10´018.321,50	31/05/2024	8/11/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 60´109.929,00	28/09/2024	8/11/2029

10. JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		CONVENIO:	N° 4441 DE 2023
POLIZA	N° 3001990	VIGENCIA	
	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$ 40´199.837,00	31/10/2024	8/09/2025
PRESTACIONES	$ 10´049.960,00	31/12/2026	8/11/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 60´299.755,00	28/09/2024	8/11/2029

3.12. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL:

En el periodo correspondiente al presente informe las actividades realizadas fueron el inicio de ejecución de obra razón por la cual se adjunta las actividades para cada seguimiento.

3.12.1. Seguimiento a la inversión del anticipo de obra.

Para los presentes convenios solidarios **NO SE REALIZÓ** anticipo de obra.

3.12.2. Seguimiento al programa de obra:

En el presente período, se realiza seguimiento a las 10 JAC.

3.12.3. Seguimiento al programa de inversiones.

En el presente período, se realiza seguimiento a las 10 JAC.

3.12.4. Actas suscritas

Para este tipo de contratos no se realizan actas de costos debido que es un manejo de desembolso más administrativo de parte de la interventoría.

4. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

4.1. CUADRO RESUMEN

PROCESO	CMA-DEO-SVR-CCPT-010-2024
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	1682 DE 2024.
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL
NIT	NIT: 901.829.872-3
REPRESENTANTE LEGAL	DAIRO DUEÑAS MORALES,
DIRECCIÓN	Carrera 7 N° 53-53 Ibagué, Tolima
TELEFONO	311 8587090
E-MAIL	Interventoriamool@gmail.com
ID SECOP	CO1.PCCNTR.6293461
MUNICIPIOS IMPACTADOS	Aratoca, San Juan Girón, Lebrija, El Playón Puerto Wilches
SUPERVISOR	Hernan Enrique Dulce Moreno
ESTADO	En Ejecución
VALOR INICIAL	$358.447.040.00
VALOR TOTAL ACUMULADO	$358.447.040.00
ADICIONAL N° 1	$ 67.885.216.00
PLAZO INICIAL	Cuatro (04) meses.
FECHA DE INICIO	27 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	27 de septiembre de 2024
PRORROGA N°1	Hasta el 8 de noviembre de 2024
PRORROGA N° 2	Hasta el 16 de diciembre de 2024
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN	16 de diciembre de 2024

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR:

La interventoría en cumplimiento de sus funciones contractuales ha realizado actividades concernientes a sus obligaciones, estas enmarcadas en velar el buen desarrollo de la obra y el cumplimiento del objeto contractual, a continuación, se describen.

- Visita a campo para verificar el estado de la obra en cada uno de los convenios, del mismo modo se aprovecha para hace la socialización final de los convenios que hicieron entrega de la obra.
- Se realizan comités técnicos para debatir diferentes temas para el mejor desarrollo de las obras
- Se realizan informes ambientales, sociales, de sst para dar cierre del mismo en los convenios que culminaron
- Se ejecutan actividades PAGA y se aclara que en muchos de los convenios la finalización de dichas de actividades es para el cierre y entrega de la obra.
- Se inician los cierres contables de las juntas que culminaron actividades para poder dar cancelación a las cuentas e iniciar con la liquidación de los contratos.

4.3. INFORMES DE ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES:

Para el presente periodo no se tiene actuación de los especialistas a ninguna de las 10 JAC.

4.4. INFORMES DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA

Realizando el control y evaluación de la programación mensual de los recursos a ejecutar en el presente convenio solidario y para el contrato de interventoría, se realiza comparación con la ejecución mensual para el presente mes.

TOTAL INVERSION	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
INTERVENTORÍA ACTA 1	$ 426.332.256,00	$ 0,00	0,00%
INTERVENTORÍA ACTA 2	$ 426.332.256,00	$ 30.315.726,00	7,11%
INTERVENTORÍA ACTA 3	$ 396.016.530,00	$ 63.683.564,00	16,08%
INTERVENTORIA ACTA 4	$ 332.332.966,00	$ 51.392.173,00	15,46%
INTERVENTORIA ACTA 5	$ 280.940.793,00	$ 79.568.993,00	28,32%
INTERVENTORIA ACTA 6	$ 201.371.800,00	$ 98.185.710,00	48,76%
INTERVENTORIA ACTA 7	$ 103.186.090,00	$ 79.053.723,00	76,61%
INTERVENTORIA ACTA 8	$ 24.132.367,00	$ 24.054.612,40	99,68%
TOTAL DE VALOR EJECUTADO		$ 426.254.501,40	99,98%

5.6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS PARA EL TRÁMITE Y APROBACIÓN DE LOS PLANOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO DE LOS PLANOS RÉCORD REALIZADOS POR EL CONTRATISTA.

A la fecha del presente informe se da aprobación a todas las juntas de acción comunal cerrando o culminando las actividades preliminares de los convenios, y en los convenios que se terminaron actividades de obra se entregan los planos records.

5. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

5.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

En el presente periodo del informe esta interventoría tiene el vehículo para ir a visitar los proyectos que ya culminaron y hacen entrega de la placa huella, para revisar la ejecución del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALESS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 8

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE ARATOCÁ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1682/2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

CONTRATO DE OBRA No. 3720, 4689, 3780, 4347, 4775, 3850, 4575, 4563, 4343, 4441

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA, MANCHEGO, LA LAJA SAN IGNACIO, LA CHOCOA, LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS, CORREGIMIENTO DE EL LIBANO, BETANIA, LAS ROCAS VEREDA LA AGUADA, SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE Y LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA	VISITA DE OBRA Y TRANPORTE A DISPOSICION DEL INVIAS	I	A	A	I	I	A	A	I	A	A	I	I	A	A	I	I															

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	16/12/2024 (Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.



Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202-087577

Firma

Nombre: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 52202-47079

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

5.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

En la ejecución de los trabajos de seguimiento y control que realiza la interventoría a los contratos de las diez OAC que componen este lote la Interventoría mantuvo el siguiente personal realizado las actividades propias de su especialización.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, muestra el control y los documentos pertinentes al personal de interventoría.

RELACIÓN PERSONAL	CÉDULA	CARGO	EPS	PENSIÓN	ARL
BONILLA CLAUDIA VANESSA	1.110.524.979	SOCIAL	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA
WILSON PEÑUELA BELTRAN	19.354.719	RESIDENTE	NUEVA EPS		SURA
SERRANO MONICA	1.101.691.277	AMBIENTAL	EPS SANITAS	COLPENSIONES	SURA
DUEÑAS DAIRO	93.385.314	DIRECTOR	FAMISANAR	COLFONDOS	SURA
DAVID DUEÑAS GARZON	1.110.576.128	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PIJAO SALUD	COLPENSIONES	SURA

5.3. INFORMACIÓN FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9, se muestra el control presupuestal de la ejecución del contrato de interventoría.

5.3.1. RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	RECURSO NO.	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CONTRATO	VALOR
2024	446124	34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	10	NACIÓN	Principal	$358.447.040
2024	204524	34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	10	NACIÓN	Principal	$ 67.885.216

5.3.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1682 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3"

CONVENIO No.: 3720, 3780, 3850, 4343, 4347, 4441, 4563, 4575, 4689, 4775 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA CRUZ DE PIEDRA, VEREDA MANCHEGO, VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO, VEREDA LA CHOCOA, LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS, CORREGIMIENTO DE EL LIBANO, DE BETANIA, COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA, COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE, PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN

NOMBRE ARL: ARL SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO SANTANDER

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	BONILLA CLAUDIA VANESSA	1110524979	SOCIAL	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																0,5	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	$ 1.500.000	$ 104.400	V	SALUD TOTAL	9479607248	$ 60.000	PORVENIR	9479607248	$ 240.000	$ 60.000	$ -	$ -	RETIRADO
2	WILSON PEÑUELA	19354719	RESIDENTE	$ 4.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																0,5	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	$ 2.450.000	$ 170.600	V	NUEVA EPS	9479607248	$ 98.000		9479607248		$ 98.000			RETIRADO
3	SERRANO MONICA	1101691277	AMBIENTAL	$ 3.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																0,165	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	$ 566.667	$ 39.500	V	EPS SANITAS	9479607248	$ 22.700	COLPENSIONES	9479607248	$ 38.400	$ 22.700			RETIRADO
5	LUIS DAVID GARZON	1110576128	AUXILIAR	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																0,5	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	$ 650.000	$ 57.400	I	PIJAO SALUD	9479607248	$ 33.000	COLPENSIONES	9479607248	$ 131.800	$ 33.000	$ -	$ -	RETIRADO
4	DUEÑAS DAIRO	93385314	DIRECTOR	$ 6.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																0,25	DAIRO DUEÑAS MORALES	$ 1.500.000	$ 7.900	I	FAMISANAR	9479608110	$ 187.500	COLFONDOS	9479608110	$ 240.000	$ -	$ -	$ -	INDEPENDIENTE
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 18.600.000																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: ING. DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-087577

Firma

Nombre: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-47079

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1682 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

CONVENIO No: 3720, 3780, 3850, 4343, 4347, 4441, 4563, 4575, 4689, 4775 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA CRUZ DE PIEDRA, VEREDA MANCHEGO, VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO, VEREDA LA CHOCOA, LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS, CORREGIMIENTO DE EL LIBANO, DE BETANIA, COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA, COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE, PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
21/05/2024	446124	34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	10	NACION	PRINCIPAL	$ 358.447.040	$ 24.132.367
6/11/2024	215424	34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS	10	NACION	PRINCIPAL	$ 67.885.216	
			TOTAL			$ 426.332.256	$ 24.132.367

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 426.332.256

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	MAYO DE 2024	$ -	$ -	$ -	0	0	0	446124	$ 426.332.256	$ 426.332.256	5/06/2024	
2	JUNIO DE 2024	$ 25.475.400,00	$ 4.840.326,00	$ 30.315.726,00	0	0	0	446124	$ 396.016.530	$ 396.016.530	5/07/2024	
3	JULIO DE 2024	$ 53.515.600,00	$ 10.167.964,00	$ 63.683.564,00	0	0	0	446124	$ 332.332.966	$ 332.332.966	5/08/2024	
4	AGOSTO DE 2024	$ 43.186.700,00	$ 8.205.473,00	$ 51.392.173,00	0	0	0	446124	$ 280.940.793	$ 280.940.793	5/09/2024	
5	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 66.864.700,00	$ 12.704.293,00	$ 79.568.993,00	0	0	0	446124	$ 201.371.800	$ 201.371.800	5/10/2024	
6	OCTUBRE DE 2024	$ 82.509.000,00	$ 15.676.710,00	$ 98.185.710,00	0	0	0	446124	$ 103.186.090	$ 103.186.090	5/11/2024	
7	NOVIEMBRE DE 2024	$ 66.431.700,00	$ 12.622.023,00	$ 79.053.723,00	0	0	0	204524	$ 24.132.367	$ 24.132.367	5/12/2024	
8	DICIMBE DE 2024	$ 20.213.960,00	$ 3.840.652,40	$ 24.054.612,40	0	0	0	204524	$ 77.755	$ 77.755	5/01/2025	
TOTALES		**$ 337.983.100,00**	**$ 64.216.789,00**	**$ 426.254.501,40**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.764.390.557**	**$ 1.764.390.557**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA DE COSTOS 01	$ -	$ -	$ -
ACTA DE COSTOS 02	$ 25.475.400	$ 4.840.326	$ 30.315.726
ACTA DE COSTOS 03	$ 53.515.600	$ 10.167.964	$ 63.683.564
ACTA DE COSTOS 04	$ 43.186.700	$ 8.205.473	$ 51.392.173
ACTA DE COSTOS 05	$ 66.864.700	$ 12.704.293	$ 79.568.993
ACTA DE COSTOS 06	$ 82.509.000	$ 15.676.710	$ 98.185.710
ACTA DE COSTOS 07	$ 66.431.700	$ 12.622.023	$ 79.053.723
ACTA DE COSTOS 08	$ 20.213.960	$ 3.840.652	$ 24.054.612
VALOR TOTAL	$ 358.197.060	$ 68.057.441	$ 426.254.501

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: ING. DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-087577

Firma
Nombre: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-47079

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTA NO.	MES/AÑO DE EJECUCIÓN	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA	VALOR DEL CONTRATO	SALDO DEL CONTRATO
1	MAYO DE 2024	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.447.040	$ 358.447.040
2	JUNIO DE 2024	$ 25.475.400,00	$ 4.840.326,00	$ 30.315.726,00	$ 358.447.040	$ 328.131.314
3	JULIO DE 2024	$ 53.515.600,00	$ 10.167.964,00	$ 63.683.564,00	$ 358.447.040	$ 294.763.476
4	AGOSTO DE 2024	$ 43.186.700,00	$ 8.205.473,00	$ 51.392.173,00	$ 358.447.040	$ 307.054.867
5	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 66.864.700,00	$ 12.704.293,00	$ 79.568.993,00	$ 358.447.040	$ 278.878.047
6	OCTUBRE DE 2024	$ 82.509.000,00	$ 15.676.710,00	$ 98.185.710,00	$ 358.447.040	$ 260.261.330
7	NOVIEMBRE DE 2024	$ 66.431.700,00	$ 12.622.023,00	$ 79.053.723,00	$ 358.447.040	$ 279.393.317
8	DICIEMBRE DE 2024	$ 20.213.960,00	$ 3.840.652,40	$ 24.054.612,40	$ 426.332.256	$ 402.277.644
TOTALES		$ 358.197.060,00	$ 68.057.441,40	$ 426.254.501,40	$ 426.332.256	$ 77.755

5.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

Se realiza seguimiento a las garantías y seguros del contrato de interventoría, a la fecha del presente informe ha transcurrido 4 periodos desde el 27 de mayo de 2024 fecha del acta de inicio, en ese orden se anexa el formato de seguimiento de garantías que amparan a la entidad INVIAS en el marco del presente contrato de interventoría, incluyendo la modificación de la prórroga N° 1 hasta el 8 de noviembre de 2024 y la prorroga N°2 que va hasta el 16 de diciembre de 2024.

5.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

Para garantizar el cumplimiento de este aspecto, se han implementado recursos técnicos y administrativos, acompañados de la supervisión constante del personal profesional designado con este propósito específico. Estas medidas se orientan a elevar la calidad de los proyectos, siguiendo rigurosamente los lineamientos establecidos por el sistema de gestión de calidad.

5.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL:

a fecha de entrega del presente informe 15 de diciembre de 2024, no se han registrado variaciones o cambios que destacar.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1682 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

FECHA DE INICIO: 27/05/2024

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 358.447.040,00

VALOR ACUMULADO: $ 358.447.040,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 35.744.704,00	10	5	2024	2	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 71.689.408,00	10	5	2024	2	4	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 71.689.408,00	10	5	2024	2	10	2027
Calidad del servicio	30%	$ 107.534.112,00	10	9	2024	15	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 25-44-101192175

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	13%	$ 45.633.225,00	10	5	2024	8	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	24%	$ 85.266.451,00	10	5	2024	8	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	24%	$ 85.266.451,00	10	5	2024	8	12	2027
Calidad del servicio	36%	$ 127.899.676,80	10	9	2024	15	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 25-44-101192175

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-087577

Firma
Nombre: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-47079

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: EL INTERVENTOR DEBE MANIFESTAR LAS CONCLUSIONES RELEVANTES SOBRE EL ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA.

El presente contrato de interventoría corresponde a un nuevo programa implementado por el gobierno nacional consistente en que la **OAC** Juntas de Acción Comunal de las distintas veredas y corregimientos de los municipios de país, sean las encargadas de realizar el mantenimiento de las vías que les dan acceso.

En la actualidad se avanza en la etapa como todo proyecto de Estudios y Diseños para los puntos críticos a intervenir para el contrato de interventoría N° 1682-2024, le corresponde diez puntos en igual número de veredas, distribuidos en cinco municipios, los cuales ya habían sido priorizados por el INVIAS.

Las actividades se inician el 27 de mayo de 2024, con una reunión entre los representantes del INVIAS y los representantes de los tres lotes en que se dividieron las interventorías para el departamento de Santander.

Se procede entonces a la organización de las diferentes comunidades que presentan convenios para realizar las reuniones de socialización en esta actividad se van dos semanas, debido a la dificultad para poder convocar el mayor número de representantes que participen en esta actividad.

Una vez informada la comunidad se procede a la consecución por parte de las OAC, del personal administrativo, situación que conllevo más de quince días, dado que los presidentes de juntas no habían realizado trámites previos, por la demora según manifestaron en el inicio que se tenía del convenio.

Posteriormente se inician las actividades de consecución de tres cotizaciones por cada actividad de los estudios y diseños que se deben realizar a la fecha se tienen parte de ellos pero según informan los presidentes de juntas es una situación que ellos consideran desgastante, puesto que a los proveedores que acuden dan las respuesta lentamente, pues al no ser contratistas no les toman en serio.

7. ANEXOS

8.1 RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA.

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL
NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-295

Ibagué, 3 de diciembre de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL BETANIA
Presidente
Playón

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: ACLARACIÓN Y APROBACIÓN PAGO DE TOPOGRAFIA.

Buen día estimada presidente

Teniendo en consideración la cuenta de cobro que se está solicitando para el pago de la topografía es de anotar lo siguiente:

- En la orden de servicio 1 se realizó un pago de $ 3.000.000 millones incluido el replanteo, se recuerda que el valor que se tenía para esta actividad es de $ 4.400.000 razón por la cual el saldo que tiene la junta para topografía final es de $1.400.000

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA
MUNICIPIO DE EL PLAYON
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
RESOLUCIÓN N°0372 DEL 01 DE MARZO 1989

ORDEN DE SERVICIO	
FECHA	22-jul-24
No DE ORDEN DE SERVICIOS	1
CLIENTE	
RAZON SOCIAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA
NIT	901.046.202-8
DIRECCION	CORR DE BETANIA, CRA 3 No 5-25
TELEFONO	3108456989
CORREO ELECTRONICO	juntadeaccioncomunaldebetania@gmail.com
PROVEEDOR	
RAZON SOCIAL	JOSE DAVID ORTIZ BERMUDEZ
NIT	1.095.823.544
DIRECCION	CR 20 No 158-40
TELEFONO	3503420854
CORREO ELECTRONICO	notificacionesbuilder@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE UNITARIO
1	TOPOGRAFÍA: Levantamiento topográfico y Georreferenciación	$ 1.500.000
	TOPOGRAFÍA: Replanteo	$ 1.500.000

Dirección: Cr 7 # 53- 53
Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com
Cel: 3118587090

Se deja la salvedad que, bajo el incumplimiento del primer proveedor en el replanteo de la topografía, el proveedor NICODEMUS acepto realizar el replanteo y la topografía record por el saldo que tiene la junta de acción comunal para dicha actividad, razón por la cual esta interventoría basado en problemáticas solo desembolsa el 50% para el replanteo y una vez entregada la topografía final el otro 50%, para ello a la cuenta de cobro debe anexar lo siguiente:

- **REPLANTEO**

Anexar informe con la ubicación del proyecto, describir las actividades realizadas, el equipo utilizado, mostrar las carteras de replanteo, y el debido registro fotográfico para la aprobación de la interventoría, se deja la anotación que en la cuenta de cobro solo se anexa un registro fotográfico.

REGISTRO FOTOGRÁFICO REPLANTEO



Razón por la cual se solicita actualizar la información, con lo anteriormente mencionado.

- **PLANOS RECORD**

Se reitera el oficio enviado por esta interventoría donde se describe los parámetros solicitados por esta interventoría para la entrega de los planos records:

➢ **GEOREFERENCIACION**

- Realizar la Georreferenciación de pareja de mojones GPS al sistema de coordenadas IGAC; con el fin de dar amarre de coordenadas a todos los puntos de detalle existentes en el proyecto.

- presentar informe del procedimiento realizado para el cálculo de los vértices posicionados, registro fotográfico de los vértices (mojones), certificado de calibración de los equipos utilizados con fecha vigente.

➢ **LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.**

- Presentar ajuste de poligonal en caso de realizar el levantamiento topográfico con estación total.
- Presentar crudos de las carteras topográficas del levantamiento realizado para los planos récord.
- Anexar en el informe topográfico, registro fotográfico de la actividad, personal utilizado, metodología del levantamiento topográfico.
- En los anexos presentar certificado de calibración vigente de los equipos utilizados en el levantamiento topográfico.
- Realizar el levantamiento topográfico a detalle de todo lo ejecutado en obra (placa huellas, obras transversales, disipadores, muros de contención, muros en gavión, etc.)

➢ **INFORMACION COMPLEMENTARIA EN LOS ROTULOS PARA PLANOS RECORD.**

- Presentar planta, perfil y secciones transversales de lo ejecutado en obra.
- Anexar el número del contrato, el objeto del contrato y el número del convenio.
- Anexar el logo del INVIAS y de la junta de acción comunal.
- Presentar los planos en formato DWG.
- Se anexa ejemplo de rotulo tipo INVIAS.

Cordialmente:

DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL
NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-296

Ibagué, 3 de diciembre de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS
Presidente
Playón

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: ACLARACIÓN Y APROBACIÓN PAGO DE TOPOGRAFIA.

Buen día estimado presidente

Teniendo en consideración la cuenta de cobro que se está solicitando para el pago de la topografía es de anotar lo siguiente:

- En la orden de servicio 1 se realizó un pago de $ 3.000.000 millones incluido el replanteo, se recuerda que el valor que se tenía para esta actividad es de $ 4.400.000 razón por la cual el saldo que tiene la junta para topografía final es de $1.400.000

JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS VEREDA LA AGUADA
MUNICIPIO DE EL PLAYON
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ORDEN DE SERVICIO	
FECHA	22-jul-24
No DE ORDEN DE SERVICIOS	1
CLIENTE	
RAZON SOCIAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA
NIT	800.179.940-1
DIRECCION	VEREDA LAS ROCAS FINCA SAN LUIS
TELEFONO	3212484915
CORREO ELECTRONICO	Jaclasrocas01@gmail.com
PROVEEDOR	
RAZON SOCIAL	JOSE DAVID ORTIZ BERMUDEZ
NIT	1.095.823.544
DIRECCION	CR 20 No 158-40
TELEFONO	3503420854
CORREO ELECTRONICO	notificacionesbuilder@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE UNITARIO
1	TOPOGRAFIA: levantamiento topográfico y Georreferenciación	1.500.000
1	TOPOGRAFIA: Replanteo	1.500.000

Dirección: Cr 7 # 53- 53
Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com
Cel: 3118587090

Se deja la salvedad que, bajo el incumplimiento del primer proveedor en el replanteo de la topografía, el proveedor NICODEMUS acepto realizar el replanteo y la topografía record por el saldo que tiene la junta de acción comunal para dicha actividad, razón por la cual esta interventoría basado en problemáticas solo desembolsa el 50% para el replanteo y una vez entregada la topografía final el otro 50%, para ello a la cuenta de cobro debe anexar lo siguiente:

- **REPLANTEO**

Anexar informe con la ubicación del proyecto, describir las actividades realizadas, el equipo utilizado, mostrar las carteras de replanteo, y el debido registro fotográfico para la aprobación de la interventoría, se deja la anotación que en la cuenta de cobro solo se anexa un registro fotográfico.

REGISTRO FOTOGRÁFICO REPLANTEO



Razón por la cual se solicita actualizar la información, con lo anteriormente mencionado.

- **PLANOS RECORD**

Se reitera el oficio enviado por esta interventoría donde se describe los parámetros solicitados por esta interventoría para la entrega de los planos records:

- **GEOREFERENCIACION**

- Realizar la Georreferenciación de pareja de mojones GPS al sistema de coordenadas IGAC; con el fin de dar amarre de coordenadas a todos los puntos de detalle existentes en el proyecto.
- presentar informe del procedimiento realizado para el cálculo de los vértices posicionados, registro fotográfico de los vértices (mojones), certificado de calibración de los equipos utilizados con fecha vigente.

➢ **LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.**

- Presentar ajuste de poligonal en caso de realizar el levantamiento topográfico con estación total.
- Presentar crudos de las carteras topográficas del levantamiento realizado para los planos récord.
- Anexar en el informe topográfico, registro fotográfico de la actividad, personal utilizado, metodología del levantamiento topográfico.
- En los anexos presentar certificado de calibración vigente de los equipos utilizados en el levantamiento topográfico.
- Realizar el levantamiento topográfico a detalle de todo lo ejecutado en obra (placa huellas, obras transversales, disipadores, muros de contención, muros en gavión, etc.)

➢ **INFORMACION COMPLEMENTARIA EN LOS ROTULOS PARA PLANOS RECORD.**

- Presentar planta, perfil y secciones transversales de lo ejecutado en obra.
- Anexar el número del contrato, el objeto del contrato y el número del convenio.
- Anexar el logo del INVIAS y de la junta de acción comunal.
- Presentar los planos en formato DWG.
- Se anexa ejemplo de rotulo tipo INVIAS.

Cordialmente:

DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-294

Ibagué, 2 de diciembre de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL CHOCOA
Presidenta de junta

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: RETRASO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Con bastante preocupación vemos que a la fecha del presente comunicado la ejecución de la obra muestra un atraso significativo de acuerdo al cronograma estrago por la residente de obra , es de anotar que todos los materiales y pagos se han desembolsado en el tiempo solicitado para que el proyecto no presente retrasos; ante lo anterior se solicita se realice un plan de contingencia para la terminación de dicha obra en el tiempo estimado , ya que el convenio no tiene recursos para pagos administrativos adicionales generados por la falta de coordinación y operación del profesional a cargo. Es de aclarar que es responsabilidad de la junta de acción comunal velar por los trabajos ejecutados y calidad de la misma; los trabajos se debieron haber terminado el 18 nov como plazo máximo el 23 nov, según programación entregada a esta interventoría, razón por la cual se está incumpliendo con la cláusula decima cuarta, lo que conlleva a hacer efectivas las clausulas decima quinta y decima sexta.

Agradezco la atención prestada, cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL
NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-297

Ibagué, 5 de diciembre de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL LADERA SANTANDEREADA JAPROLASAN
Presidente
Puerto Wilches

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: SOLICITUD DE CIERRE CONTABLE Y CUENTAS BANCARIAS.

Buen día estimado presidente

Cordialmente:

Teniendo en cuenta que el plazo del contrato de interventoría esta en aras de terminar, se solicita a la contadora entregar toda la información contable que se ha solicitado de parte de la interventoría desde la culminación de la obra, dicho lo anterior reitero que la obra se terminó el 15 de noviembre de 2024 y se entregó a la comunidad el día 1 de diciembre de 2024, por eso es de carácter urgente que demos cierre a las cuentas e información financiera, para la debida liquidación del convenio.

Quedo atento a su pronta respuesta, cordialmente:

DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53
Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com
Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL
NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-298

Ibagué, 5 de diciembre de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL
Presidentes
Santander

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: SOLICITUD DE CIERRE CONTABLE Y CUENTAS BANCARIAS.

Buen día estimados presidentes

Teniendo en cuenta que el plazo del contrato de interventoría va hasta el 15 diciembre, se solicita a los contadores entregar toda la información contable que se ha solicitado de parte de la interventoría desde la culminación de la obra, dicho lo anterior, reitero que es de carácter urgente que demos cierre a las cuentas e información financiera, para la debida liquidación del convenio.

Quedo atento a su pronta respuesta, cordialmente:

DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53
Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com
Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-299

Ibagué, 12 de diciembre de 2024

Señores
INVIAS
Calle 25 G No. 73B - 90
Bogotá Distrito Capital de Colombia

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: OFICIO REMISORIO POLIZAS ACTUALIZADAS

Respetados señores:

Por medio de la presente me permito remitir para su conocimiento y fines pertinente póliza N° 25-44-101192175 actualizada con la compañía seguros del estado anexo 5 y 6 según prorroga N° 02 y adición N° 1, lo anterior para su respectiva revisión y aprobación.

Cordialmente

DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-277

Ibagué, 17 de diciembre de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN, BETANIA, LAS ROCAS, CRUZ DE PIDRA, SAN IGNACIO, LIBANO, CHOCOA, SAN AGUSTIN Y MANCHEGO.
Presidentes y contadores.

ASUNTO: CIERRE FINANCIERO

Respetados señores:

En vista que los convenios de las juntas que ustedes representan vencieron el pasado 16 de diciembre de 2024, le solicito muy cordialmente hacer los cierres contables y solicitar a esta interventoría el retiro de los recursos sobrantes y del mismo modo los rendimientos financieros los cuales deberán ser consignados cada uno a las siguientes cuentas:

CUENTA PARA CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS:

Rendimientos financieros de Convenios
Banco: Banco de la República
Tipo de Cuenta: Corriente
Cuenta Bancaria Número: 61011094
Nombre de la Cuenta: **DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS**
Código Portafolio: 270
Código de Transacción SEBRA: 137

CUENTA PARA CONSIGNACION DE DEVOLUCION DEL RECURSO:

Reintegro recursos no ejecutados de Convenios
Banco: Banco de la República
Tipo de Cuenta: Corriente
Cuenta Bancaria Número: 61011573
Nombre de la Cuenta: **DTN - REINTEGROS DE GASTOS DE INVERSION**
Código Portafolio: 270
Código de Transacción SEBRA: 137

Es de anotar que el contrato de interventoría también termino su tiempo de vigencia el 16 de diciembre de 2024, razón por la cual estamos en la entrega final de los convenios para su respectiva liquidación del cual tenemos plazo hasta el 20 de diciembre de 2024; Razón por la cual necesitamos de carácter urgente cerrar todo el tema contable.


Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

Anexo el instructivo de parte del INVIAS, por favor leer detalladamente sus indicaciones e información. Quedo atenta a sus inquietudes.

Agradezco la atención prestada y una pronta respuesta cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-278

Bucaramanga, 18 de noviembre de 2024

Señores
ING JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Subdirector de sostenibilidad actual
Bogotá Distrito Capital de Colombia

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Asunto: INFORME AMBIENTAL JAC SAN AGUSTIN

Por medio de la presente se hace entrega del INFORME AMBIENTAL de La Junta de Acción comunal SAN AGUSTIN del municipio de EL PLAYÓN para su respectiva aprobación, el cual se anexa

1. FORMATO RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
2. FORMATO DE PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL
3. PGA DEL CONVENIO
4. ANEXO DE DOCUMENTOS DE MATERIAL DE CANTERA
5. ANEXO CERTIFICADO DE ACUEDUCTO
6. ANEXO CHARLAS AMBIENTALES
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-279

Bucaramanga, 18 de noviembre de 2024

Señores
ING JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Subdirector de sostenibilidad actual
Bogotá Distrito Capital de Colombia

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Asunto: INFORME AMBIENTAL JAC BETANIA

Por medio de la presente se hace entrega del INFORME AMBIENTAL de La Junta de Acción comunal de BETANIA del municipio de EL PLAYÓN para su respectiva aprobación, el cual se anexa

1. FORMATO RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
2. FORMATO DE PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL
3. PGA DEL CONVENIO
4. ANEXO DE DOCUMENTOS DE MATERIAL DE CANTERA
5. ANEXO INDUCCIONES Y CHARLAS AMBIENTALES
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-280

Bucaramanga, 18 de noviembre de 2024

Señores
ING JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Subdirector de sostenibilidad actual
Bogotá Distrito Capital de Colombia

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Asunto: INFORME AMBIENTAL JAC LAS ROCAS

Por medio de la presente se hace entrega del INFORME AMBIENTAL de La Junta de Acción comunal LAS ROCAS del municipio de EL PLAYÓN para su respectiva aprobación, el cual se anexa

1. FORMATO RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
2. FORMATO DE PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL
3. PGA DEL CONVENIO
4. ANEXO DE DOCUMENTOS DE MATERIAL DE CANTERA
5. ANEXO INDUCCIONES Y CHARLAS AMBIENTALES
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-281

Bucaramanga, 18 de noviembre de 2024

Señores
ING JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Subdirector de sostenibilidad actual
Bogotá Distrito Capital de Colombia

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Asunto: INFORME AMBIENTAL JAC LLANO GRANDE

Por medio de la presente se hace entrega del INFORME AMBIENTAL de La Junta de Acción comunal LAS ROCAS del municipio de EL PLAYÓN para su respectiva aprobación, el cual se anexa

1. FORMATO RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
2. FORMATO DE PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL
3. PGA DEL CONVENIO
4. ANEXO DE DOCUMENTOS DE MATERIAL DE CANTERA
5. REGISTRO DE CHARLAS AMBIENTALES
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-282

Bucaramanga, 22 de Noviembre de 2024

Señores
Dra Claudia Gómez
Profesional Social
INVIAS
Calle 25 G No. 73B - 90
Bogotá Distrito Capital de Colombia

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Asunto: RESPUESTA RADICADO **2024S-VBOG-087692 del 2024-11-22 14:06:31 COMPONENTE AMBIENTAL**

Respetados señores:

En cumplimiento de nuestras funciones como interventoría envío documentos pendientes para su NO OBJECIÓN respecto a la documentación ambiental del convenio 4775 de *la Junta de Acción Comunal de las Veredas de Corregidor, Llano Grande, Chocoa, Chocoita y Peñas del Municipio de Girón, en el departamento de Santander, para el mejoramiento vial en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total"*

1. Informe de seguimiento y cumplimiento de indicadores ambientales
2. Anexos de cada subprograma del PGA del convenio
3. Formato acta de radicación y actualización
4. Formato Plan de Inversión ambiental
5. Certificado de NO PAGA
6. PGA del convenio

Cordialmente:

DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-284

Bucaramanga, 23 de Noviembre de 2024

Señores
Dra Claudia Gómez
Profesional Social
INVIAS
Calle 25 G No. 73B - 90
Bogotá Distrito Capital de Colombia

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".


Asunto: RESPUESTA RADICADO **2024S-VBOG-087602 Fecha: 2024-11-22 11:21:14**

Respetados señores:

En cumplimiento de nuestras funciones como interventoría envío documentos pendientes para su NO OBJECIÓN respecto a la documentación ambiental del convenio 4343 de *la Junta de Acción Comunal de Betania del Municipio de EL PLAYÓN, en el departamento de Santander, para el mejoramiento vial en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total"* el cual aún no ha finalizado las actividades de obra

1. Informe de seguimiento y cumplimiento de indicadores ambientales
2. Anexos de cada subprograma del PGA del convenio
3. Formato acta de radicación y actualización
4. Formato Plan de Inversión ambiental con las firmas correspondientes y en ceros como lo estipuló el profesional de INVIAS
5. Certificado de NO PAGA
6. Shapefile y localización del proyecto
7. PGA del convenio

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-284

Bucaramanga, 23 de Noviembre de 2024

Señores
Dra Claudia Gómez
Profesional Social
INVIAS
Calle 25 G No. 73B - 90
Bogotá Distrito Capital de Colombia

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".


Asunto: RESPUESTA RADICADO **2024S-VBOG-087607 Fecha: 2024-11-22 11:22:40**

Respetados señores:

En cumplimiento de nuestras funciones como interventoría envío documentos pendientes para su NO OBJECIÓN respecto a la documentación ambiental del convenio 4343 de *la Junta de Acción Comunal de Rocas Vereda la Aguada del Municipio de EL PLAYÓN, en el departamento de Santander, para el mejoramiento vial en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total"* el cual aún no ha finalizado las actividades de obra

1. Informe de seguimiento y cumplimiento de indicadores ambientales
2. Anexos de cada subprograma del PGA del convenio
3. Formato acta de radicación y actualización
4. Formato Plan de Inversión ambiental con las firmas correspondientes y en ceros como lo estipuló el profesional de INVIAS
5. Certificado de NO PAGA
6. Shapefile y localización del proyecto
7. PGA del convenio

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-284

Bucaramanga, 26 de Noviembre de 2024

Señores
Dra Claudia Gómez
Profesional Social
INVIAS
Calle 25 G No. 73B - 90
Bogotá Distrito Capital de Colombia

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Asunto: RESPUESTA RADICADO **2024S-VBOG-086780 - Fecha: 2024-11-20 15:21:00**

Respetados señores:

En cumplimiento de nuestras funciones como interventoría envío documentos su NO OBJECIÓN respecto a la documentación del componente ambiental del convenio 3720 de *la Junta de Acción Comunal de CRUZ DE PIEDRA del Municipio de ARATOCA, en el departamento de Santander, para el mejoramiento vial en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total"* el cual aún no ha finalizado las actividades de obra

1. Informe de seguimiento y cumplimiento de indicadores ambientales
2. Anexos de cada subprograma del PGA del convenio
3. Formato acta de radicación y actualización
4. Formato Plan de Inversión ambiental con las firmas correspondientes y en ceros como lo estipuló el profesional de INVIAS
5. Certificado de NO PAGA
6. Shapefile y localización del proyecto
7. PGA del convenio

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-287

Bucaramanga, 26 de Noviembre de 2024

Señores
Dra Claudia Gómez
Profesional Social
INVIAS
Calle 25 G No. 73B - 90
Bogotá Distrito Capital de Colombia

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Asunto: INFORME COMPONENTE AMBIENTAL JAC MANCHEGO

Respetados señores:

En cumplimiento de nuestras funciones como interventoría envío documentos su NO OBJECIÓN respecto a la documentación del componente ambiental del convenio 4689 de *la Junta de Acción Comunal de MANCHEGO del Municipio de ARATOCA, en el departamento de Santander, para el mejoramiento vial en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total"* el cual aún no ha finalizado las actividades de obra

1. Informe de seguimiento y cumplimiento de indicadores ambientales
2. Anexos de cada subprograma del PGA del convenio
3. Formato acta de radicación y actualización
4. Formato Plan de Inversión ambiental con las firmas correspondientes y en ceros como lo estipuló el profesional de INVIAS
5. Certificado de NO PAGA
6. Shapefile y localización del proyecto
7. PGA del convenio

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-288

Bucaramanga, 26 de Noviembre de 2024

Señores
Dra Claudia Gómez
Profesional Social
INVIAS
Calle 25 G No. 73B - 90
Bogotá Distrito Capital de Colombia

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".


Asunto: INFORME COMPONENTE AMBIENTAL JAC LA LADERA SANTANDEREANA

Respetados señores:

En cumplimiento de nuestras funciones como interventoría envío documentos su NO OBJECIÓN respecto a la documentación del componente ambiental del convenio 4689 de *la Junta de Acción Comunal de LA LADERA del Municipio de PUERTO WILCHES, en el departamento de Santander, para el mejoramiento vial en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total"* el cual aún no ha finalizado las actividades de obra

1. Informe de seguimiento y cumplimiento de indicadores ambientales
2. Anexos de cada subprograma del PGA del convenio
3. Formato acta de radicación y actualización
4. Formato Plan de Inversión ambiental con las firmas correspondientes y en ceros como lo estipuló el profesional de INVIAS
5. Formato Balance Ambiental
6. Certificado de NO PAGA
7. Shapefile y localización del proyecto
8. PGA del convenio

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-291

Bucaramanga, 28 de Noviembre de 2024

Señores
ING JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Subdirector de sostenibilidad actual
Bogotá Distrito Capital de Colombia

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".


Asunto: INFORME SOCIAL DE CIERRE DEL CONVENIO 4343JAC SAN AGUSTIN

Respetados señores:

En cumplimiento de nuestras funciones como interventoría adjuntamos los documentos de cierre, lo cual de parte de la entidad quedan aprobados y no queda ningún pendiente de parte del convenio 4343 de la JAC SAN AGUSTIN del municipio de El Playón Santander.

1. Fichas del componente social con sus anexos o soportes correspondientes
2. Formato de Balance social
3. Formato Preacta Mensual
4. Plan de Gestión Social

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090
