Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	21	7	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 122 **DEL:** 14/07/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 20/07/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

4.Se continuará con la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.	Las condiciones de humedad excesiva en la base dificultaron el proceso de nivelación y asentamiento de las piezas. A pesar de las labores de oreo, no se logró estabilizar el soporte para garantizar durabilidad y evitar asentamientos diferenciales.	SI		NO	X
5.Se continuará con la instalación de loseta táctil de alerta para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-55 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.	El encharcamiento generado por las lluvias afectó la firmeza de la cama de asiento, comprometiendo la adherencia y la estabilidad de las losetas.	SI		NO	X
6.Se continuará con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. Por ello, la interventoría revisará la preparación del terreno y la siembra conforme a planos y especificaciones técnicas.	Las lluvias persistentes ocasionaron anegamiento y compactación no controlada en el área de siembra, impidiendo el manejo adecuado del sustrato y el establecimiento de la vegetación en condiciones idóneas.	SI		NO	X
7.Se continuará con la instalación de subbase granular triturada en el urbanismo de la vía para la conformación de los senderos peatonales con loseta y en la conformación de la cicloruta, garantizando el extendido uniforme, el espesor y la compactación exigidos.	La saturación de la capa granular redujo la capacidad portante y dificultó alcanzar la densidad exigida. El tiempo disponible de oreo en los días soleados fue insuficiente para evacuar la humedad excedente.	SI		NO	X
8.Se continuará con la instalación de bordillo prefabricado para la definición de frentes entre calzada, cicloruta y senderos peatonales, incluyendo su asiento y fijación según detalle de diseño. Por ello, la interventoría revisará la alineación, el asentamiento y la fijación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado	El terreno de fundación se encontró inestable debido a la humedad acumulada, lo que afectó la correcta alineación y nivelación de los bordillos. Se suspendió la actividad para prevenir desplazamientos posteriores.	SI		NO	X

JUSTIFICACIÓN : Se presenta un retraso en la ejecución del -4.15% respecto de lo reprogramado con la suscripción de Prórroga No. 3 y con corte al presente informe.

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARTICULARES

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 80.000.059.959	$ 80.000.059.959	$ 88.565.120.175	86.19%	$ 14.188.018.700	13.81%
Obras Adicionales	0.0	$ 22.753.078.916.00	0.0	0%	0.0	0%
TOTAL	$ 80.000.059.959	$ 102.753.138.875.00				

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	21	7	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 122 **DEL:** 14/07/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 20/07/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO Nº 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Estos porcentajes de avance ejecutado y avance programado están basados en la programación de la Prórroga No. 3

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

4

L	M	M	J	V	S	D
21	22	23	24	25	26	27
LLUVIOSO	LLUVIOSO	LLUVIOSO	LLUVIOSO	SOLEADO	SOLEADO	LLUVIOSO

13- DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

FECHA DE REPORTE			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO NC	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD, PARA ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA PROBLEMÁTICA	RESPONSABLE
DD	MM	AA				

TIPO DE NO CONFORME (NC) Una no conformidad se puede llegar a presentar por: 1. Mano de Obra (Falta de Inducción, Competencia, experiencia...), 2. Maquinaria o Equipo (mal estado del equipo, equipo no calibrado...), 3. Material (proveedor no entrega a tiempo pedidos, mala calidad del material, material no cumple con especificaciones establecidas), 4. Método (Forma de programación de la obra, forma en la que se desarollan las diferentes actividades, falta de inspección), 5. Medio (Cultura del Cliente, estado del tiempo) 6. Medición (Falta de Inspección, Equipos de topografía o de laboratorios de ensayo no calibrados o verificados...)

Elaboró:

YERLY CHAPARRO LÓPEZ.

YERLY CHAPARRO LÓPEZ
Residente de Interventoría
Firma y posfirma

Revisó:

JORGE CASTELLANOS
Director de Interventoría
Firma y posfirma

acuatodos S.A. ESP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	4	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 123 **DEL:** 28/07/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 3/08/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO Nº 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato 130.20.10.044 de 2022 tuvo acta de inicio el día VEINTE (20) de diciembre de 2022, se realizaron los trámites pertinentes para el acta de entrega de anticipo el dia VEINTIUNO (21) de diciembre de 2022 y la fecha de terminación actual corresponde al día VEINTISIETE (27) de MARZO de 2026.

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
				Canguro	1	Director	1
				Herramienta menor	8	Residente	1
				Retroescavadora	1	Inspectores	2
				Retroescavadora de llantas	2	Maestro y Ayudantes	15
						TOTAL	19

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
0.0031%	86.21%	91.12%	-4.91%

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					91.12%
EJECUTADO																					86.21%

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO	
REDES DE ACUEDUCTO	85.58%
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	
COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO	96.90%
POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	67.70%

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	4	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 123 **DEL:** 28/07/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 3/08/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO Nº 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

CÁMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	**82.26%**
LÍNEA DE IMPULSIÓN	**92.82%**
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO	
ESTACIÓN DE BOMBEO	**50.95%**
CASETA ELÉCTRICA	**0.00%**
RED DE MEDIA TENSIÓN AÉREA	**0.00%**
RED MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA	**0.00%**
SUBESTACIÓN CAPSULADA	**0.00%**
CUARTO TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y TABLEROS CONTROL BOMBAS	**0.00%**
PLANTA DE EMERGENCIA	**0.00%**
INSTALACIONES INTERNAS	**0.00%**
OBRAS COMPLEMENTARIAS	
PRELIMINARES	**85.48%**
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**76.97%**
DRENAJE VÍA	**84.43%**
TRANSPORTE DE MATERIALES	**92.21%**
SEÑALIZACIÓN	**0.00%**
URBANISMO	**85.21%**

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	4	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 123 **DEL:** 28/07/2025 dd/mm/yyyy **AL:** 3/08/2025 dd/mm/yyyy

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"


FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 dd/mm/yyyy

RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV	**99.24%**
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	**99.42%**
SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	**0.00%**

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*1093*	*860*	*233*
Proyección	*1093*	*860*	*233*

5- REGISTRO FOTOGRAFICO

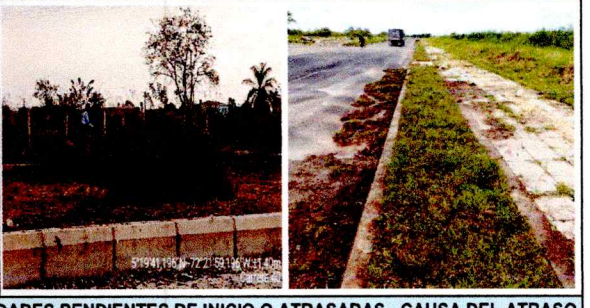

6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*27/03/2026*	*78.68%*
Semana Actual	*0*	*27/03/2026*	*78.68%*

7- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	8- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO				
	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
1. Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40, entre las calles 46 y calle 50. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.	La ejecución de la imprimación no fue posible debido a las lluvias continuas registradas entre el 1 y 3 de agosto, que mantuvieron la superficie con exceso de humedad. Este procedimiento requiere una base completamente seca para asegurar la adherencia del asfalto y evitar desprendimientos prematuros.	SI		NO	X
2. Se continuará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) sobre la calzada derecha de la carrera 40, entre las calle 46 y calle 50. Donde, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.	La instalación de la mezcla asfáltica se vio interrumpida por las precipitaciones, ya que la presencia de agua impide la correcta compactación del material y genera riesgo de fallas estructurales en el pavimento. Por esta razón, no fue viable avanzar en esta actividad durante la semana.	SI		NO	X

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	4	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 123 **DEL:** 28/07/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 3/08/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

3. Se continuará con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 × 40 × 6 cm) en los senderos peatonales contemplado sobre el separador y los cotados de la carrera 40, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a especificaciones técnicas.	La instalación de losetas prefabricadas no pudo desarrollarse con normalidad, dado que la base de arena de nivelación y el sello con arena fina requieren estabilidad y ausencia de humedad para garantizar el correcto asiento de las piezas y evitar desplazamientos posteriores.	SI		NO	X
4.Se continuará con la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.	El avance en la instalación de loseta táctil tipo A56 también se vio limitado por las lluvias, ya que la saturación del terreno afectó la uniformidad de la base y la adherencia del material de sello, comprometiendo la precisión en la instalación y la durabilidad del acabado.	SI		NO	X
5.Se continuará con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. Por ello, la interventoría revisará la preparación del terreno y la siembra conforme a planos y especificaciones técnicas.	Las lluvias ocasionaron encharcamientos en las áreas destinadas para la instalción de zonas verdes, lo que impidió la adecuada preparación del terreno y la nivelación de la capa de tierra negra abonada. Esta condición desfavorable imposibilitó la siembra de césped en condiciones óptimas.	SI		NO	X
6.Se continuará con la instalación de Sardinel prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoria verificará la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.	La instalación de sardineles prefabricados no se pudo ejecutar en su totalidad, debido a que el mortero de nivelación y pegue requiere superficies firmes y libres de humedad. Las lluvias constantes generaron pérdida de estabilidad en el terreno, dificultando la correcta alineación y nivelación de las piezas.	SI		NO	X

JUSTIFICACIÓN : Se presenta un retraso en la ejecución del -4.91% respecto de lo reprogramado con la suscripción de Prórroga No. 3 y con corte al presente informe.

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARTICULARES

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 80.000.059.959	$ 80.000.059.959	$ 88.579.732.022	86.21%	$ 14.173.406.853	13.79%
Obras Adicionales	0.0	$ 22.753.078.916.00	0.0	0%	0.0	0%
TOTAL	$ 80.000.059.959	$ 102.753.138.875.00				

acuatodos s.a. E.S.P

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	4	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 123 **DEL:** 28/07/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 3/08/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO Nº 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Estos porcentajes de avance ejecutado y avance programado están basados en la programación de la Prórroga No. 3

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

L	M	M	J	V	S	D
28	29	30	31	1	2	3
				LLUVIOSO	LLUVIOSO	LLUVIOSO

13- DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

FECHA DE REPORTE			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO NC	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD, PARA ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA PROBLEMÁTICA	RESPONSABLE
DD	MM	AA				

TIPO DE NO CONFORME (NC) Una no conformidad se puede llegar a presentar por: 1. Mano de Obra (Falta de Inducción, Competencia, experiencia...), 2. Maquinaria o Equipo (mal estado del equipo, equipo no calibrado...), 3. Material (proveedor no entrega a tiempo pedidos, mala calidad del material, material no cumple con especificaciones establecidas), 4. Método (Forma de programación de la obra, forma en la que se desarollan las diferentes actividades, falta de inspección), 5. Medio (Cultura del Cliente, estado del tiempo) 6. Medición (Falta de Inspección, Equipos de topografía o de laboratorios de ensayo no calibrados o verificados...)

Elaboró:	Revisó:
YERLY CHAPARRO LÓPEZ.	
YERLY CHAPARRO LÓPEZ	JORGE CASTELLANOS
Residente de Interventoría	**Director de Interventoría**
Firma y posfirma	Firma y posfirma

acuatodos s.a. E.S.P

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	11	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 124 **DEL:** 4/08/2025 dd/mm/yyyy **AL:** 10/08/2025 dd/mm/yyyy

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 dd/mm/yyyy

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato 130.20.10.044 de 2022 tuvo acta de inicio el día VEINTE (20) de diciembre de 2022, se realizaron los trámites pertinentes para el acta de entrega de anticipo el dia VEINTIUNO (21) de diciembre de 2022 y la fecha de terminación actual corresponde al día VEINTISIETE (27) de MARZO de 2026.

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
				Canguro	1	Director	1
				Herramienta menor	8	Residente	1
				Retroescavadora	1	Inspectores	2
				Retroescavadora de llantas	2	Maestro y Ayudantes	15
						TOTAL	19

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
0.0094%	**86.22%**	**92.29%**	**-6.07%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					**92.29%**
EJECUTADO																					**86.22%**

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO																					
REDES DE ACUEDUCTO																					**85.58%**
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO																					
COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO																					**96.90%**
POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO																					**67.70%**

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	11	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 124 **DEL:** 4/08/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 10/08/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

CÁMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	**82.26%**
LÍNEA DE IMPULSIÓN	**92.82%**
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO	
ESTACIÓN DE BOMBEO	**50.95%**
CASETA ELÉCTRICA	**0.00%**
RED DE MEDIA TENSIÓN AÉREA	**0.00%**
RED MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA	**0.00%**
SUBESTACIÓN CAPSULADA	**0.00%**
CUARTO TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y TABLEROS CONTROL BOMBAS	**0.00%**
PLANTA DE EMERGENCIA	**0.00%**
INSTALACIONES INTERNAS	**0.00%**
OBRAS COMPLEMENTARIAS	
PRELIMINARES	**85.48%**
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**77.06%**
DRENAJE VÍA	**84.43%**
TRANSPORTE DE MATERIALES	**92.21%**
SEÑALIZACIÓN	**0.00%**
URBANISMO	**85.07%**

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	11	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 124 **DEL:** 4/08/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 10/08/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"


FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV	**99.24%**
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	**99.42%**
SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	**0.00%**

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*1093*	*867*	*226*
Proyección	*1093*	*867*	*226*

5- REGISTRO FOTOGRAFICO

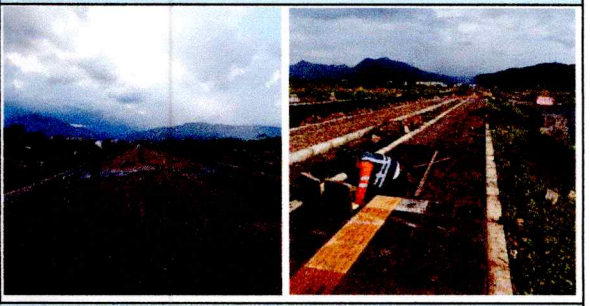

6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*27/03/2026*	*79.32%*
Semana Actual	*0*	*27/03/2026*	*79.32%*

7- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

8- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
1. Se continuó con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50. Donde, la interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.	La imprimación únicamente pudo programarse en los días 4 y 10 de agosto, cuando se registraron condiciones secas. Sin embargo, la continuidad del frente de trabajo se vio interrumpida por las lluvias de cinco días consecutivos, lo cual redujo la productividad y generó un atraso en la programación establecida para esta actividad.	SI		NO	X
2. Se continuó con la instalacion de Mezcla Asfaltca MDC-2 o 19 sobre la clazada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50, Donde la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.	La aplicación de mezcla asfáltica no fue posible en la mayoría de la semana, ya que la lluvia impidió la compactación adecuada y el extendido homogéneo del material. Aunque el día 4 se realizaron labores preliminares de preparación, las condiciones climáticas posteriores no permitieron avanzar con la instalación prevista.	SI		NO	X

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	11	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 124 **DEL:** 4/08/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 10/08/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

3.Se continuó con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 × 40 × 6 cm) en los senderos peatonales, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación.	El proceso de instalación de losetas se vio afectado por la humedad persistente, ya que la base de arena de nivelación no mantuvo la estabilidad requerida. Únicamente en los días soleados se pudieron adelantar tramos parciales, mientras que en los demás días fue necesario suspender labores para evitar asentamientos diferenciales.	SI		NO	X
4.Se continuó la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.	Al igual que en las losetas A50, la instalación de loseta táctil no pudo avanzar con normalidad debido a la saturación del terreno. La falta de condiciones secas en la mayoría de la semana limitó la posibilidad de ejecutar trabajos continuos, reduciendo el rendimiento previsto.	SI		NO	X
5.Se continuó con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. La presente interventoría verificó el procedimiento de preparación del terreno y siembra, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.	Las lluvias diarias generaron encharcamientos que dificultaron la nivelación del terreno y la adecuada colocación de la tierra negra abonada. Por tanto, la instalación de césped se pospuso para evitar daños en el crecimiento y compactación del área verde.	SI		NO	X
6. Se continuó con la instalación de Sardinel prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoria verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.	La colocación de sardineles también se retrasó, ya que el mortero de pegue no puede aplicarse sobre superficies húmedas. Aunque el día 4 permitió algunos avances, las lluvias posteriores impidieron continuar con la alineación y nivelación de las piezas, ocasionando acumulación de actividades para la semana siguiente.	SI		NO	X

JUSTIFICACIÓN : Se presenta un retraso en la ejecución del -6.07% respecto de lo reprogramado con la suscripción de Prórroga No. 3 y con corte al presente informe.

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARTICULARES

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 80.000.059.959	$ 80.000.059.959	$ 88.589.345.512	86.22%	$ 14.163.793.363	13.78%
Obras Adicionales	0.0	$ 22.753.078.916.00	0.0	0%	0.0	0%
TOTAL	$ 80.000.059.959	$ 102.753.138.875.00				

acuatodos s.a. E.S.P.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	11	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 124 **DEL:** 4/08/2025 dd/mm/yyyy **AL:** 10/08/2025 dd/mm/yyyy

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 dd/mm/yyyy

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Estos porcentajes de avance ejecutado y avance programado están basados en la programación de la Prórroga No. 3

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

L	M	M	J	V	S	D
4	5	6	7	8	9	10
						
SOLEDADO	LLUVIOSO	LLUVIOSO	LLUVIOSO	LLUVIOSO	LLUVIOSO	SOLEDADO

13- DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

FECHA DE REPORTE			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO NC	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD, PARA ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA PROBLEMÁTICA	RESPONSABLE
DD	MM	AA				

TIPO DE NO CONFORME (NC) Una no conformidad se puede llegar a presentar por: 1. Mano de Obra (Falta de Inducción, Competencia, experiencia...), 2. Maquinaria o Equipo (mal estado del equipo, equipo no calibrado...), 3. Material (proveedor no entrega a tiempo pedidos, mala calidad del material, material no cumple con especificaciones establecidas), 4. Método (Forma de programación de la obra, forma en la que se desarollan las diferentes actividades, falta de inspección), 5. Medio (Cultura del Cliente, estado del tiempo) 6. Medición (Falta de Inspección, Equipos de topografía o de laboratorios de ensayo no calibrados o verificados...)

Elaboró:	Revisó:
YERLY CHAPARRO LOPEZ.	
YERLY CHAPARRO LÓPEZ	JORGE CASTELLANOS
Residente de Interventoría	**Director de Interventoría**
Firma y posfirma	Firma y posfirma

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	18	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 125 **DEL:** 11/08/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 17/08/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato 130.20.10.044 de 2022 tuvo acta de inicio el día VEINTE (20) de diciembre de 2022, se realizaron los trámites pertinentes para el acta de entrega de anticipo el dia VEINTIUNO (21) de diciembre de 2022 y la fecha de terminación actual corresponde al día VEINTISIETE (27) de MARZO de 2026.

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
				Canguro	1	Director	1
				Herramienta menor	8	Residente	1
				Retroescavadora	1	Inspectores	2
				Retroescavadora de llantas	2	Maestro y Ayudantes	15
						TOTAL	19

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
0.0094%	86.23%	93.46%	-7.23%

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					93.46%
EJECUTADO																					86.23%

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO	
REDES DE ACUEDUCTO	85.58%
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	
COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO	96.90%
POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	67.70%

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	18	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 125 **DEL:** 11/08/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 17/08/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

CÁMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	**82.26%**
LÍNEA DE IMPULSIÓN	**92.82%**
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO	
ESTACIÓN DE BOMBEO	**50.95%**
CASETA ELÉCTRICA	**0.00%**
RED DE MEDIA TENSIÓN AÉREA	**0.00%**
RED MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA	**0.00%**
SUBESTACIÓN CAPSULADA	**0.00%**
CUARTO TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y TABLEROS CONTROL BOMBAS	**0.00%**
PLANTA DE EMERGENCIA	**0.00%**
INSTALACIONES INTERNAS	**0.00%**
OBRAS COMPLEMENTARIAS	
PRELIMINARES	**85.48%**
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**77.16%**
DRENAJE VÍA	**84.43%**
TRANSPORTE DE MATERIALES	**92.21%**
SEÑALIZACIÓN	**0.00%**
URBANISMO	**85.32%**

acuatodos s.a. E.S.P.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	18	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 125 **DEL:** 11/08/2025 dd/mm/yyyy **AL:** 17/08/2025 dd/mm/yyyy

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 dd/mm/yyyy

RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV	**99.24%**
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	**99.42%**
SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	**0.00%**

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*1093*	*874*	*219*
Proyección	*1093*	*874*	*219*

5- REGISTRO FOTOGRAFICO



6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*27/03/2026*	*79.96%*
Semana Actual	*0*	*27/03/2026*	*79.96%*

7- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	8- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO				
	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
1. Se continuó con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50. Donde, la interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.	La imprimación avanzó parcialmente en los días soleados, pero las lluvias intermitentes de la semana afectaron la preparación homogénea de la superficie. Esto obligó a suspender y reprogramar labores para garantizar la adherencia del material asfáltico, ocasionando pérdida de continuidad en la ejecución.	SI		NO	X
2. Se continuó con la instalacion de Mezcla Asfaltca MDC-2 o 19 sobre la clazada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50, Donde la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.	Las jornadas lluviosas impidieron la colocación continua de la mezcla asfaltica, ya que la humedad compromete la compactación y la calidad del pavimento. Aunque en algunos días secos se alcanzó a extender material, los cortes forzados redujeron el rendimiento planificado y afectaron el avance acumulado.	SI		NO	X

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	18	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 125 **DEL:** 11/08/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 17/08/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

3.Se continuó con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 × 40 × 6 cm) en los senderos peatonales, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación.	La colocación de losetas presentó demoras por la saturación de la base de arena en los días lluviosos, lo que imposibilitó asegurar la nivelación y el asiento de las piezas. A pesar de avances parciales en días soleados, no se logró cumplir con la meta semanal establecida.	SI		NO	X
4.Se continuó la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.	La ejecución de esta actividad también se limitó por la humedad en la superficie y la falta de estabilidad de la capa de nivelación. La alternancia entre lluvia y sol dificultó mantener un ritmo de trabajo constante, obligando a ralentizar la instalación para no comprometer la precisión y durabilidad del acabado.	SI		NO	X
5.Se continuó con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. La presente interventoría verificó el procedimiento de preparación del terreno y siembra, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.	Los encharcamientos derivados de las lluvias no permitieron realizar la preparación uniforme del terreno, lo que retrasó la instalación del césped. Esta situación redujo el rendimiento planificado y dejó pendiente la intervención de varios sectores que estaban programados para la semana.	SI		NO	X
6. Se continuó con la instalación de Sardinel prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoria verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.	El avance en la instalación de sardineles se limitó, ya que el mortero de pegue y nivelación requiere condiciones secas para garantizar su resistencia. Si bien se lograron algunos tramos en días soleados, la humedad del terreno y las interrupciones constantes provocaron retrasos acumulados.	SI		NO	X

JUSTIFICACIÓN : Se presenta un retraso en la ejecución del -7.23% respecto de lo reprogramado con la suscripción de Prórroga No. 3 y con corte al presente informe.

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARTICULARES

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 80.000.059.959	$ 80.000.059.959	$ 88.598.959.002	86.23%	$ 14.154.179.873	13.77%
Obras Adicionales	0.0	$ 22.753.078.916.00	0.0	0%	0.0	0%
TOTAL	$ 80.000.059.959	$ 102.753.138.875.00				

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	18	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 125 **DEL:** 11/08/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 17/08/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Estos porcentajes de avance ejecutado y avance programado están basados en la programación de la Prórroga No. 3

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:



13- DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

FECHA DE REPORTE			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO NC	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD, PARA ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA PROBLEMÁTICA	RESPONSABLE
DD	MM	AA				

TIPO DE NO CONFORME (NC) Una no conformidad se puede llegar a presentar por: 1. Mano de Obra (Falta de Inducción, Competencia, experiencia...), 2. Maquinaria o Equipo (mal estado del equipo, equipo no calibrado...), 3. Material (proveedor no entrega a tiempo pedidos, mala calidad del material, material no cumple con especificaciones establecidas), 4. Método (Forma de programación de la obra, forma en la que se desarollan las diferentes actividades, falta de inspección), 5. Medio (Cultura del Cliente, estado del tiempo) 6. Medición (Falta de Inspección, Equipos de topografía o de laboratorios de ensayo no calibrados o verificados...)

Elaboró:	Revisó:
YERLY CHAPARRO LÓPEZ.	
YERLY CHAPARRO LÓPEZ	JORGE CASTELLANOS
Residente de Interventoría	**Director de Interventoría**
Firma y posfirma	Firma y posfirma

acuatodos S.A. ESP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	25	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 126 **DEL:** 18/08/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 24/08/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato 130.20.10.044 de 2022 tuvo acta de inicio el día VEINTE (20) de diciembre de 2022, se realizaron los trámites pertinentes para el acta de entrega de anticipo el dia VEINTIUNO (21) de diciembre de 2022 y la fecha de terminación actual corresponde al día VEINTISIETE (27) de MARZO de 2026.

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
				Canguro	1	Director	1
				Herramienta menor	8	Residente	1
				Retroescavadora	1	Inspectores	2
				Retroescavadora de llantas	2	Maestro y Ayudantes	15
						TOTAL	19

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
0.0094%	**86.23%**	**94.63%**	**-8.40%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					**94.63%**
EJECUTADO																					**86.23%**

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO	
REDES DE ACUEDUCTO	**85.58%**
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	
COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO	**96.90%**
POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	**67.70%**

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	25	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 126 **DEL:** 18/08/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 24/08/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO Nº 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

CÁMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	**82.26%**
LÍNEA DE IMPULSIÓN	**92.82%**
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO	
ESTACIÓN DE BOMBEO	**50.95%**
CASETA ELÉCTRICA	**0.00%**
RED DE MEDIA TENSIÓN AÉREA	**0.00%**
RED MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA	**0.00%**
SUBESTACIÓN CAPSULADA	**0.00%**
CUARTO TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y TABLEROS CONTROL BOMBAS	**0.00%**
PLANTA DE EMERGENCIA	**0.00%**
INSTALACIONES INTERNAS	**0.00%**
OBRAS COMPLEMENTARIAS	
PRELIMINARES	**85.48%**
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**77.25%**
DRENAJE VÍA	**84.43%**
TRANSPORTE DE MATERIALES	**92.21%**
SEÑALIZACIÓN	**0.00%**
URBANISMO	**85.35%**

acuatodos S.A. E.S.P.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	25	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 126 **DEL:** 18/08/2025 dd/mm/yyyy **AL:** 24/08/2025 dd/mm/yyyy

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 dd/mm/yyyy

RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV	**99.24%**
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	**99.42%**
SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	**0.00%**

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*1093*	*881*	*212*
Proyección	*1093*	*881*	*212*

5- REGISTRO FOTOGRAFICO



6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*27/03/2026*	*80.60%*
Semana Actual	*0*	*27/03/2026*	*80.60%*

7- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

1. Se continuó con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50. Donde, la interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

2. Se continuó con la instalacion de Mezcla Asfaltca MDC-2 o 19 sobre la clazada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50, Donde la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

8- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
La imprimación no alcanzó el rendimiento programado debido a que las lluvias de los días 19, 22 y 24 impidieron aplicar el material sobre una superficie seca. Esto generó interrupciones en el frente de trabajo y obligó a reprogramar tramos pendientes.	SI		NO	X
La colocación de mezcla asfáltica solo se adelantó en jornadas soleadas, mientras que las lluvias obligaron a suspender labores para evitar fallas en la compactación. La falta de continuidad redujo la productividad y ocasionó un atraso en la meta de la semana.	SI		NO	X

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	25	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 126 **DEL:** 18/08/2025 dd/mm/yyyy **AL:** 24/08/2025 dd/mm/yyyy

CONTRATO Nº 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 dd/mm/yyyy

3.Se continuó con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 × 40 × 6 cm) en los senderos peatonales, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación.	El avance en la instalación de losetas se vio afectado por la humedad en los días lluviosos, que comprometió la estabilidad de la base de arena. Esto obligó a restringir la ejecución a los días secos, generando un desfase en el cronograma de esta actividad.	SI		NO	X
4.Se continuó la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.	La colocación de losetas táctiles se ralentizó debido a la imposibilidad de garantizar uniformidad en la base durante las jornadas lluviosas. Aunque se ejecutaron tramos en días secos, el rendimiento alcanzado no correspondió a lo programado, acumulando retraso.	SI		NO	X
5.Se continuó con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. La presente interventoría verificó el procedimiento de preparación del terreno y siembra, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.	Las lluvias provocaron saturación en el terreno destinado a zonas verdes, lo que impidió realizar la preparación y siembra en condiciones óptimas. Esta situación generó la necesidad de posponer sectores programados, disminuyendo el avance esperado.	SI		NO	X
6. Se continuó con la instalación de Sardinel prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoria verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.	El montaje de sardineles se retrasó por las lluvias intermitentes, ya que el mortero de pegue y nivelación no puede colocarse en superficies húmedas. A pesar de los avances en los días secos, la ejecución quedó por debajo del porcentaje programado para la semana	SI		NO	X

JUSTIFICACIÓN : Se presenta un retraso en la ejecución del -8.4% respecto de lo reprogramado con la suscripción de Prórroga No. 3 y con corte al presente informe.

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARTICULARES

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 80.000.059.959	$ 80.000.059.959	$ 88.608.572.492	86.23%	$ 14.144.566.383	13.77%
Obras Adicionales	0.0	$ 22.753.078.916.00	0.0	0%	0.0	0%
TOTAL	$ 80.000.059.959	$ 102.753.138.875.00				

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	25	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 126 **DEL:** 18/08/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 24/08/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO Nº 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Estos porcentajes de avance ejecutado y avance programado están basados en la programación de la Prórroga No. 3

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

L	M	M	J	V	S	D
18	19	20	21	22	23	24
SOLEDADO	LLUVIOSO	SOLEDADO	SOLEDADO	LLUVIOSO	SOLEDADO	LLUVIOSO

13- DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

FECHA DE REPORTE			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO NC	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD, PARA ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA PROBLEMÁTICA	RESPONSABLE
DD	MM	AA				

TIPO DE NO CONFORME (NC) Una no conformidad se puede llegar a presentar por: 1. Mano de Obra (Falta de Inducción, Competencia, experiencia...), 2. Maquinaria o Equipo (mal estado del equipo, equipo no calibrado...), 3. Material (proveedor no entrega a tiempo pedidos, mala calidad del material, material no cumple con especificaciones establecidas), 4. Método (Forma de programación de la obra, forma en la que se desarollan las diferentes actividades, falta de inspección), 5. Medio (Cultura del Cliente, estado del tiempo) 6. Medición (Falta de Inspección, Equipos de topografía o de laboratorios de ensayo no calibrados o verificados...)

Elaboró:	Revisó:
YERLY CHAPARRO LÓPEZ.	
YERLY CHAPARRO LÓPEZ	JORGE CASTELLANOS
Residente de Interventoría	**Director de Interventoría**
Firma y posfirma	Firma y posfirma

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	31	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 127 **DEL:** 25/08/2025 dd/mm/yyyy **AL:** 31/08/2025 dd/mm/yyyy

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 dd/mm/yyyy

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato 130.20.10.044 de 2022 tuvo acta de inicio el día VEINTE (20) de diciembre de 2022, se realizaron los trámites pertinentes para el acta de entrega de anticipo el dia VEINTIUNO (21) de diciembre de 2022 y la fecha de terminación actual corresponde al día VEINTISIETE (27) de MARZO de 2026.

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
				Canguro	1	Director	1
				Herramienta menor	8	Residente	1
				Retroescavadora	1	Inspectores	2
				Retroescavadora de llantas	2	Maestro y Ayudantes	15
						TOTAL	19

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
0.0094%	**86.24%**	**95.80%**	**-9.56%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					**95.80%**
EJECUTADO																					**86.24%**

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO																						
REDES DE ACUEDUCTO																						**85.58%**
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO																						
COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO																						**96.90%**
POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO																						**67.70%**

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	31	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 127 **DEL:** 25/08/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 31/08/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

CÁMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	**82.26%**
LÍNEA DE IMPULSIÓN	**92.82%**
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO	
ESTACIÓN DE BOMBEO	**50.95%**
CASETA ELÉCTRICA	**0.00%**
RED DE MEDIA TENSIÓN AÉREA	**0.00%**
RED MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA	**0.00%**
SUBESTACIÓN CAPSULADA	**0.00%**
CUARTO TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y TABLEROS CONTROL BOMBAS	**0.00%**
PLANTA DE EMERGENCIA	**0.00%**
INSTALACIONES INTERNAS	**0.00%**
OBRAS COMPLEMENTARIAS	
PRELIMINARES	**85.48%**
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**77.35%**
DRENAJE VÍA	**84.43%**
TRANSPORTE DE MATERIALES	**92.21%**
SEÑALIZACIÓN	**0.00%**
URBANISMO	**85.37%**

acuatodos S.A. E.S.P.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	31	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 127 **DEL:** 25/08/2025 dd/mm/yyyy **AL:** 31/08/2025 dd/mm/yyyy

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 dd/mm/yyyy


RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV	**99.24%**
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	**99.42%**
SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	**0.00%**

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*1093*	*888*	*205*
Proyección	*1093*	*888*	*205*

5- REGISTRO FOTOGRAFICO



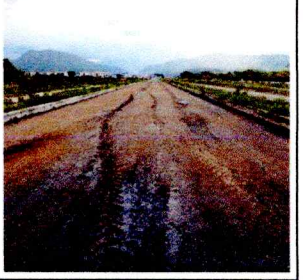

6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*27/03/2026*	*81.24%*
Semana Actual	*0*	*27/03/2026*	*81.24%*

7- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

1. Se continuó con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50. Donde, la interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

2. Se continuó con la instalacion de Mezcla Asfaltca MDC-2 o 19 sobre la clazada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50, Donde la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

8- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
Las condiciones climáticas de la semana afectaron la aplicación del riego de imprimación, ya que las lluvias constantes y la escasa presencia de un solo día seco impidieron garantizar la humedad superficial adecuada. Esta situación limitó la continuidad del proceso, provocando un retraso del -9,56% en el avance programado.	SI		NO	X
La ejecución de la mezcla asfáltica se restringió debido a las lluvias persistentes, que impidieron mantener la superficie en condiciones óptimas para la compactación. Solo se trabajó parcialmente durante el único día soleado, lo que redujo el rendimiento operativo y generó un retraso del -9,56% frente al cronograma establecido.	SI		NO	X

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	31	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 127 **DEL:** 25/08/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 31/08/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

3.Se continuó con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 × 40 × 6 cm) en los senderos peatonales, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación.	El avance en la instalación de losetas se vio comprometido por la humedad acumulada en la base de asiento, la cual impidió continuar con el proceso constructivo durante la mayor parte de la semana. Al contar únicamente con un día seco, la productividad fue limitada, reflejándose un atraso del -9,56% respecto al avance previsto.	SI		NO	X
4.Se continuó la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.	La alta frecuencia de lluvias ocasionó la suspensión casi total de las labores de instalación de losetas táctiles. La imposibilidad de garantizar una base estable y seca restringió la continuidad del trabajo, y aunque se adelantaron pequeñas secciones en la única jornada sin lluvia, el rendimiento no alcanzó lo programado, generando un retraso del -9,56%.	SI		NO	X
5.Se continuó con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. La presente interventoría verificó el procedimiento de preparación del terreno y siembra, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.	Las lluvias continuas mantuvieron saturado el terreno destinado a zonas verdes, impidiendo la preparación y nivelación del área para la siembra. Dadas las condiciones del clima, solo se logró intervenir de forma limitada en el único día soleado, provocando un retraso del -9,56% en el avance de esta actividad.	SI		NO	X
6. Se continuó con la instalación de Sardinel prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoria verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.	El proceso de instalación de sardineles presentó baja productividad debido a la humedad del terreno y a la imposibilidad de ejecutar labores de nivelación y pegue bajo lluvia. La falta de jornadas secas redujo significativamente el rendimiento, generando un atraso del -9,56% con respecto a la meta semanal.	SI		NO	X

JUSTIFICACIÓN : Se presenta un retraso en la ejecución del -9.56% respecto de lo reprogramado con la suscripción de Prórroga No. 3 y con corte al presente informe.

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARTICULARES

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 80.000.059.959	$ 80.000.059.959	$ 88.618.211.585	86.24%	$ 14.134.927.290	13.76%
Obras Adicionales	0.0	$ 22.753.078.916.00	0.0	0%	0.0	0%
TOTAL	$ 80.000.059.959	$ 102.753.138.875.00				

acuatodos S.A. E.S.P.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	31	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 127 **DEL:** 25/08/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 31/08/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Estos porcentajes de avance ejecutado y avance programado están basados en la programación de la Prórroga No. 3

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

L	M	M	J	V	S	D
25	26	27	28	29	30	31
LLUVIOSO	LLUVIOSO	LLUVIOSO	SOLEDADO	LLUVIOSO	LLUVIOSO	LLUVIOSO

13- DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

FECHA DE REPORTE			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO NC	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD, PARA ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA PROBLEMÁTICA	RESPONSABLE
DD	MM	AA				

TIPO DE NO CONFORME (NC) Una no conformidad se puede llegar a presentar por: 1. Mano de Obra (Falta de Inducción, Competencia, experiencia...), 2. Maquinaria o Equipo (mal estado del equipo, equipo no calibrado...), 3. Material (proveedor no entrega a tiempo pedidos, mala calidad del material, material no cumple con especificaciones establecidas), 4. Método (Forma de programación de la obra, forma en la que se desarollan las diferentes actividades, falta de inspección), 5. Medio (Cultura del Cliente, estado del tiempo) 6. Medición (Falta de Inspección, Equipos de topografía o de laboratorios de ensayo no calibrados o verificados...)

Elaboró:	Revisó:
YERLY CHAPARRO LÓPEZ.	
YERLY CHAPARRO LÓPEZ	JORGE CASTELLANOS
Residente de Interventoría	**Director de Interventoría**
Firma y posfirma	Firma y posfirma

acuatodos S.A. E.S.P.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	7	9	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 128 **DEL:** 1/09/2025 dd/mm/yyyy **AL:** 7/09/2025 dd/mm/yyyy

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 dd/mm/yyyy

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato 130.20.10.044 de 2022 tuvo acta de inicio el día VEINTE (20) de diciembre de 2022, se realizaron los trámites pertinentes para el acta de entrega de anticipo el dia VEINTIUNO (21) de diciembre de 2022 y la fecha de terminación actual corresponde al día VEINTISIETE (27) de MARZO de 2026.

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
				Canguro	1	Director	1
				Herramienta menor	8	Residente	1
				Retroescavadora	1	Inspectores	2
				Retroescavadora de llantas	2	Maestro y Ayudantes	15
						TOTAL	19

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
0.0094%	**86.26%**	**96.20%**	**-9.94%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					**96.20%**
EJECUTADO																					**86.26%**

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO																					
REDES DE ACUEDUCTO																					**85.58%**
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO																					
COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO																					**96.90%**
POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO																					**67.70%**

acuatodos S.A. E.S.P.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	7	9	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 128 **DEL:** 1/09/2025 dd/mm/yyyy **AL:** 7/09/2025 dd/mm/yyyy

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 dd/mm/yyyy

CÁMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	82.26%
LÍNEA DE IMPULSIÓN	92.82%
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO	
ESTACIÓN DE BOMBEO	50.95%
CASETA ELÉCTRICA	0.00%
RED DE MEDIA TENSIÓN AÉREA	0.00%
RED MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA	0.00%
SUBESTACIÓN CAPSULADA	0.00%
CUARTO TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y TABLEROS CONTROL BOMBAS	0.00%
PLANTA DE EMERGENCIA	0.00%
INSTALACIONES INTERNAS	0.00%
OBRAS COMPLEMENTARIAS	
PRELIMINARES	86.26%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	77.35%
DRENAJE VÍA	84.43%
TRANSPORTE DE MATERIALES	92.21%
SEÑALIZACIÓN	0.00%
URBANISMO	85.37%

acuatodos s.a. E.S.P.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	7	9	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 128 **DEL:** 1/09/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 7/09/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV	**99.24%**
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	**99.42%**
SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	**0.00%**

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*1093*	*895*	*198*
Proyección	*1093*	*895*	*198*

5- REGISTRO FOTOGRAFICO



6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*27/03/2026*	*81.88%*
Semana Actual	*0*	*27/03/2026*	*81.88%*

7- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

1. Se retomó la instalación de subbase granular seleccionada en zonas de estructuras complementarias. La interventoría verificó granulometría, disposición y compactación conforme a los parámetros de diseño y estándares de calidad.

8- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
La actividad correspondiente al ítem de preliminares – instalación de subbase granular seleccionada o clasificada presentó un atraso del -9,93% debido a las condiciones climáticas adversas registradas durante la primera semana de septiembre, en la cual solo se reportaron tres días soleados. Las lluvias continuas generaron saturación del terreno, impidiendo la adecuada compactación y control de humedad del material. A pesar de los esfuerzos por avanzar durante los días secos, la productividad se vio limitada, ocasionando que el rendimiento semanal quedara por debajo del porcentaje programado.	SI		NO	X

JUSTIFICACIÓN : Se presenta un retraso en la ejecución del -9.94% respecto de lo reprogramado con la suscripción de Prórroga No. 3 y con corte al presente informe.

acuatodos s.a. E.S.P

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	7	9	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 128 **DEL:** 1/09/2025 dd/mm/yyyy **AL:** 7/09/2025 dd/mm/yyyy

CONTRATO Nº 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 dd/mm/yyyy

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARTICULARES

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 80.000.059.959	$ 80.000.059.959	$ 88.634.857.594	86.26%	$ 14.118.281.281	13.74%
Obras Adicionales	0.0	$ 22.753.078.916.00	0.0	0%	0.0	0%
TOTAL	$ 80.000.059.959	$ 102.753.138.875.00				

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Estos porcentajes de avance ejecutado y avance programado están basados en la programación de la Prórroga No. 3

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:



13- DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

FECHA DE REPORTE			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO NC	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD, PARA ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA PROBLEMÁTICA	RESPONSABLE
DD	MM	AA				

TIPO DE NO CONFORME (NC) Una no conformidad se puede llegar a presentar por: 1. Mano de Obra (Falta de Inducción, Competencia, experiencia...), 2. Maquinaria o Equipo (mal estado del equipo, equipo no calibrado...), 3. Material (proveedor no entrega a tiempo pedidos, mala calidad del material, material no cumple con especificaciones establecidas), 4. Método (Forma de programación de la obra, forma en la que se desarollan las diferentes actividades, falta de inspección), 5. Medio (Cultura del Cliente, estado del tiempo) 6. Medición (Falta de Inspección, Equipos de topografía o de laboratorios de ensayo no calibrados o verificados...)

Elaboró:

YERLY CHAPARRO LÓPEZ.

YERLY CHAPARRO LÓPEZ
Residente de Interventoría
Firma y posfirma

Revisó:

JORGE CASTELLANOS
Director de Interventoría
Firma y posfirma

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	14	9	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 129 **DEL:** 8/09/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 14/09/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato 130.20.10.044 de 2022 tuvo acta de inicio el día VEINTE (20) de diciembre de 2022, se realizaron los trámites pertinentes para el acta de entrega de anticipo el dia VEINTIUNO (21) de diciembre de 2022 y la fecha de terminación actual corresponde al día VEINTISIETE (27) de MARZO de 2026.

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
				Canguro	1	Director	1
				Herramienta menor	8	Residente	1
				Retroescavadora	1	Inspectores	2
				Retroescavadora de llantas	2	Maestro y Ayudantes	15
						TOTAL	19

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
0.0094%	86.28%	96.59%	-10.31%

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					96.59%
EJECUTADO																					86.28%

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO	
REDES DE ACUEDUCTO	85.58%
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	
COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO	96.90%
POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	67.70%

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	14	9	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 129 **DEL:** 8/09/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 14/09/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO Nº 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

CÁMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	**82.26%**
LÍNEA DE IMPULSIÓN	**92.82%**
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO	
ESTACIÓN DE BOMBEO	**50.95%**
CASETA ELÉCTRICA	**0.00%**
RED DE MEDIA TENSIÓN AÉREA	**0.00%**
RED MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA	**0.00%**
SUBESTACIÓN CAPSULADA	**0.00%**
CUARTO TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y TABLEROS CONTROL BOMBAS	**0.00%**
PLANTA DE EMERGENCIA	**0.00%**
INSTALACIONES INTERNAS	**0.00%**
OBRAS COMPLEMENTARIAS	
PRELIMINARES	**87.04%**
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**77.35%**
DRENAJE VÍA	**84.43%**
TRANSPORTE DE MATERIALES	**92.21%**
SEÑALIZACIÓN	**0.00%**
URBANISMO	**85.37%**

acuatodos s.a. esp

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	14	9	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 129 **DEL:** 8/09/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 14/09/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)


RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV	**99.24%**
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	**99.42%**
SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	**0.00%**

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*1093*	*902*	*191*
Proyección	*1093*	*902*	*191*

5- REGISTRO FOTOGRAFICO



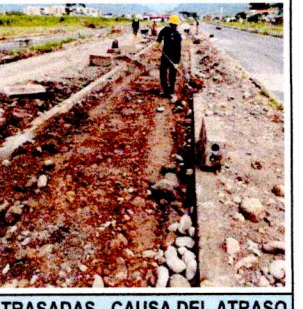

6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*27/03/2026*	*82.53%*
Semana Actual	*0*	*27/03/2026*	*82.53%*

7- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

1. Se retomó la instalación de subbase granular seleccionada en zonas de estructuras complementarias. La interventoría verificó granulometría, disposición y compactación conforme a los parámetros de diseño y estándares de calidad.

8- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
La actividad del ítem de preliminares, instalación de subbase granular seleccionada o clasificada presentó un atraso del -10,30% debido a las condiciones climáticas adversas de la segunda semana de septiembre, en la cual solo se registraron tres días aptos para laborar. Las lluvias constantes generaron saturación del terreno y pérdida de capacidad portante, impidiendo cumplir con los parámetros de compactación y reduciendo el rendimiento programado.	SI		NO	X

JUSTIFICACIÓN : Se presenta un retraso en la ejecución del -10.31% respecto de lo reprogramado con la suscripción de Prórroga No. 3 y con corte al presente informe.

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARTICULARES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	14	9	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 129 **DEL:** 8/09/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 14/09/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 80.000.059.959	$ 80.000.059.959	$ 88.658.799.075	86.28%	$ 14.094.339.800	13.72%
Obras Adicionales	0.0	$ 22.753.078.916.00	0.0	0%	0.0	0%
TOTAL	$ 80.000.059.959	$ 102.753.138.875.00				

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Estos porcentajes de avance ejecutado y avance programado están basados en la programación de la Prórroga No. 3

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

L	M	M	J	V	S	D
8	9	10	11	12	13	14
LLUVIOSO	SOLEDADO	LLUVIOSO	LLUVIOSO	SOLEDADO	LLUVIOSO	SOLEDADO

13- DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

FECHA DE REPORTE			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO NC	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD, PARA ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA PROBLEMÁTICA	RESPONSABLE
DD	MM	AA				

TIPO DE NO CONFORME (NC) Una no conformidad se puede llegar a presentar por: 1. Mano de Obra (Falta de Inducción, Competencia, experiencia...), 2. Maquinaria o Equipo (mal estado del equipo, equipo no calibrado...), 3. Material (proveedor no entrega a tiempo pedidos, mala calidad del material, material no cumple con especificaciones establecidas), 4. Método (Forma de programación de la obra, forma en la que se desarollan las diferentes actividades, falta de inspección), 5. Medio (Cultura del Cliente, estado del tiempo) 6. Medición (Falta de Inspección, Equipos de topografía o de laboratorios de ensayo no calibrados o verificados...)

Elaboró:	Revisó:
YERLY CHAPARRO LÓPEZ.	
YERLY CHAPARRO LÓPEZ	JORGE CASTELLANOS
Residente de Interventoría	**Director de Interventoría**
Firma y posfirma	Firma y posfirma

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	21	9	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 130 **DEL:** 15/09/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 21/09/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato 130.20.10.044 de 2022 tuvo acta de inicio el día VEINTE (20) de diciembre de 2022, se realizaron los trámites pertinentes para el acta de entrega de anticipo el dia VEINTIUNO (21) de diciembre de 2022 y la fecha de terminación actual corresponde al día VEINTISIETE (27) de MARZO de 2026.

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
				Canguro	1	Director	1
				Herramienta menor	8	Residente	1
				Retroescavadora	1	Inspectores	2
				Retroescavadora de llantas	2	Maestro y Ayudantes	15
						TOTAL	19

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
0.0094%	86.31%	96.99%	-10.68%

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					96.99%
EJECUTADO																					86.31%

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO	
REDES DE ACUEDUCTO	85.58%
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	
COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO	96.90%
POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	67.70%

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	21	9	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 130 **DEL:** 15/09/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 21/09/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

CÁMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	**82.26%**
LÍNEA DE IMPULSIÓN	**92.82%**
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO	
ESTACIÓN DE BOMBEO	**50.95%**
CASETA ELÉCTRICA	**0.00%**
RED DE MEDIA TENSIÓN AÉREA	**0.00%**
RED MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA	**0.00%**
SUBESTACIÓN CAPSULADA	**0.00%**
CUARTO TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y TABLEROS CONTROL BOMBAS	**0.00%**
PLANTA DE EMERGENCIA	**0.00%**
INSTALACIONES INTERNAS	**0.00%**
OBRAS COMPLEMENTARIAS	
PRELIMINARES	**87.82%**
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**77.35%**
DRENAJE VÍA	**84.43%**
TRANSPORTE DE MATERIALES	**92.21%**
SEÑALIZACIÓN	**0.00%**
URBANISMO	**85.37%**

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	21	9	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 130 **DEL:** 15/09/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 21/09/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV	**99.24%**
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	**99.42%**
SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	**0.00%**

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*1093*	*909*	*184*
Proyección	*1093*	*909*	*184*

5- REGISTRO FOTOGRAFICO



6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*27/03/2026*	*83.17%*
Semana Actual	*0*	*27/03/2026*	*83.17%*

7- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

1. se avanzó en la instalación de subbase granular seleccionada en las áreas destinadas a estructuras complementarias, consolidando la capa de soporte de los senderos peatonales y la cicloruta. La interventoría realizó el control de calidad del material, verificando su granulometría, extendido y compactación, conforme a los parámetros de diseño y a los estándares técnicos exigidos por el proyecto.

8- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
la instalación de la subbase granular seleccionada o clasificada evidenció un retraso del -10,68%, asociado a las condiciones climáticas variables que predominaron en el periodo, con solo cuatro días soleados. Las precipitaciones registradas generaron exceso de humedad y pérdida de capacidad portante en la superficie de apoyo, limitando el avance en las labores de extendido y compactación. Como resultado, la productividad de la actividad se vio reducida frente al cronograma previsto.	SI		NO	X

JUSTIFICACIÓN : Se presenta un retraso en la ejecución del -10.68% respecto de lo reprogramado con la suscripción de Prórroga No. 3 y con corte al presente informe.

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARTICULARES

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	21	9	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 130 **DEL:** 15/09/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 21/09/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 80.000.059.959	$ 80.000.059.959	$ 88.682.740.556	86.31%	$ 14.070.398.319	13.69%
Obras Adicionales	0.0	$ 22.753.078.916.00	0.0	0%	0.0	0%
TOTAL	$ 80.000.059.959	$ 102.753.138.875.00				

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Estos porcentajes de avance ejecutado y avance programado están basados en la programación de la Prórroga No. 3

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:



13- DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

FECHA DE REPORTE			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO NC	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD, PARA ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA PROBLEMÁTICA	RESPONSABLE
DD	MM	AA				

TIPO DE NO CONFORME (NC) Una no conformidad se puede llegar a presentar por: 1. Mano de Obra (Falta de Inducción, Competencia, experiencia...), 2. Maquinaria o Equipo (mal estado del equipo, equipo no calibrado...), 3. Material (proveedor no entrega a tiempo pedidos, mala calidad del material, material no cumple con especificaciones establecidas), 4. Método (Forma de programación de la obra, forma en la que se desarollan las diferentes actividades, falta de inspección), 5. Medio (Cultura del Cliente, estado del tiempo) 6. Medición (Falta de Inspección, Equipos de topografía o de laboratorios de ensayo no calibrados o verificados...)

Elaboró:	Revisó:
YERLY CHAPARRO LÓPEZ.	
YERLY CHAPARRO LÓPEZ	JORGE CASTELLANOS
Residente de Interventoría	**Director de Interventoría**
Firma y posfirma	Firma y posfirma

acuatodos s.a. ESP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	28	9	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 131 **DEL:** 22/09/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 28/09/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato 130.20.10.044 de 2022 tuvo acta de inicio el día VEINTE (20) de diciembre de 2022, se realizaron los trámites pertinentes para el acta de entrega de anticipo el dia VEINTIUNO (21) de diciembre de 2022 y la fecha de terminación actual corresponde al día VEINTISIETE (27) de MARZO de 2026.

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
				Canguro	1	Director	1
				Herramienta menor	8	Residente	1
				Retroescavadora	1	Inspectores	2
				Retroescavadora de llantas	2	Maestro y Ayudantes	15
						TOTAL	19

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
0,0233%	**86,33%**	**97,38%**	**-11,05%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					**97,38%**
EJECUTADO																					**86,33%**

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO	
REDES DE ACUEDUCTO	**85,58%**
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	
COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO	**96,90%**
POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	**67,70%**

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	28	9	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 131 **DEL:** 22/09/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 28/09/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

CÁMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	**82,26%**
LÍNEA DE IMPULSIÓN	**92,82%**
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO	
ESTACIÓN DE BOMBEO	**50,95%**
CASETA ELÉCTRICA	**0,00%**
RED DE MEDIA TENSIÓN AÉREA	**0,00%**
RED MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA	**0,00%**
SUBESTACIÓN CAPSULADA	**0,00%**
CUARTO TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y TABLEROS CONTROL BOMBAS	**0,00%**
PLANTA DE EMERGENCIA	**0,00%**
INSTALACIONES INTERNAS	**0,00%**
OBRAS COMPLEMENTARIAS	
PRELIMINARES	**88,60%**
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**77,35%**
DRENAJE VÍA	**84,43%**
TRANSPORTE DE MATERIALES	**92,21%**
SEÑALIZACIÓN	**0,00%**
URBANISMO	**85,37%**

acuatodos s.a. esp

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	28	9	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 131 **DEL:** 22/09/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 28/09/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV	**99,24%**
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	**99,42%**
SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	**0,00%**

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*1093*	*916*	*177*
Proyección	*1093*	*916*	*177*

5- REGISTRO FOTOGRAFICO



6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*27/03/2026*	*83,81%*
Semana Actual	*0*	*27/03/2026*	*83,81%*

7- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

1. se avanzó en la instalación de subbase granular seleccionada en las áreas destinadas a estructuras complementarias, consolidando la capa de soporte de los senderos peatonales y la cicloruta. La interventoría realizó el control de calidad del material, verificando su granulometría, extendido y compactación, conforme a los parámetros de diseño y a los estándares técnicos exigidos por el proyecto.

8- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
la instalación de la subbase granular seleccionada presentó un retraso del -11,05% debido a las condiciones climáticas adversas, ya que solo se registraron tres días soleados en el periodo. Las constantes precipitaciones generaron saturación del material y pérdida de capacidad portante, lo que impidió el adecuado extendido y compactación, afectando el rendimiento y el avance programado.	SI		NO	X

JUSTIFICACIÓN : Se presenta un retraso en la ejecución del -11,05% respecto de lo reprogramado con la suscripción de Prórroga No. 3 y con corte al presente informe.

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARTICULARES

acuatodos s.a. esp

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	28	9	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 131 **DEL:** 22/09/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 28/09/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 80.000.059.959	$ 80.000.059.959	$ 88.706.644.124	86,33%	$ 14.046.494.751	13,67%
Obras Adicionales	0,0	$ 22.753.078.916,00	0,0	0%	0,0	0%
TOTAL	$ 80.000.059.959	$ 102.753.138.875,00				

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Estos porcentajes de avance ejecutado y avance programado están basados en la programación de la Prórroga No. 3

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:



13- DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

FECHA DE REPORTE			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO NC	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD, PARA ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA PROBLEMÁTICA	RESPONSABLE
DD	MM	AA				

TIPO DE NO CONFORME (NC) Una no conformidad se puede llegar a presentar por: 1. Mano de Obra (Falta de Inducción, Competencia, experiencia...), 2. Maquinaria o Equipo (mal estado del equipo, equipo no calibrado...), 3. Material (proveedor no entrega a tiempo pedidos, mala calidad del material, material no cumple con especificaciones establecidas), 4. Método (Forma de programación de la obra, forma en la que se desarollan las diferentes actividades, falta de inspección), 5. Medio (Cultura del Cliente, estado del tiempo) 6. Medición (Falta de Inspección, Equipos de topografía o de laboratorios de ensayo no calibrados o verificados...)

Elaboró:	Revisó:
YERLY CHAPARRO LÓPEZ.	
YERLY CHAPARRO LÓPEZ	JORGE CASTELLANOS
Residente de Interventoría	**Director de Interventoría**
Firma y posfirma	Firma y posfirma

acuatodos s.a. E.S.P.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	5	10	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 132 **DEL:** 29/09/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 5/10/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato 130.20.10.044 de 2022 tuvo acta de inicio el día VEINTE (20) de diciembre de 2022, se realizaron los trámites pertinentes para el acta de entrega de anticipo el dia VEINTIUNO (21) de diciembre de 2022 y la fecha de terminación actual corresponde al día VEINTISIETE (27) de MARZO de 2026.

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
				Canguro	1	Director	1
				Herramienta menor	8	Residente	1
				Retroescavadora	1	Inspectores	2
				Retroescavadora de llantas	2	Maestro y Ayudantes	15
						TOTAL	19

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
0,0115%	86,34%	97,51%	-11,17%

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					97,51%
EJECUTADO																					86,34%

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO	
REDES DE ACUEDUCTO	85,58%
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	
COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO	96,90%
POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	67,70%

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	5	10	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 132 **DEL:** 29/09/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 5/10/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO Nº 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

CÁMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	**82,26%**
LÍNEA DE IMPULSIÓN	**92,82%**
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO	
ESTACIÓN DE BOMBEO	**50,95%**
CASETA ELÉCTRICA	**0,00%**
RED DE MEDIA TENSIÓN AÉREA	**0,00%**
RED MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA	**0,00%**
SUBESTACIÓN CAPSULADA	**0,00%**
CUARTO TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y TABLEROS CONTROL BOMBAS	**0,00%**
PLANTA DE EMERGENCIA	**0,00%**
INSTALACIONES INTERNAS	**0,00%**
OBRAS COMPLEMENTARIAS	
PRELIMINARES	**88,60%**
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**77,43%**
DRENAJE VÍA	**84,43%**
TRANSPORTE DE MATERIALES	**92,21%**
SEÑALIZACIÓN	**0,00%**
URBANISMO	**85,37%**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	5	10	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 132 **DEL:** 29/09/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 5/10/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV	**99,24%**
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	**99,42%**
SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	**0,00%**

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*1093*	*923*	*170*
Proyección	*1093*	*923*	*170*

5- REGISTRO FOTOGRAFICO





6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*27/03/2026*	*84,45%*
Semana Actual	*0*	*27/03/2026*	*84,45%*

7- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

1. se avanzó en la instalación de subbase granular seleccionada en las áreas destinadas a estructuras complementarias, consolidando la capa de soporte de los senderos peatonales y la cicloruta. La interventoría realizó el control de calidad del material, verificando su granulometría, extendido y compactación, conforme a los parámetros de diseño y a los estándares técnicos exigidos por el proyecto.

2. Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40, entre las calles 46 y calle 50. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

8- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
La instalación de la subbase granular seleccionada presentó un retraso del –11,17% debido a las lluvias constantes durante la semana, que solo permitió tres días soleados. La saturación del material impidió cumplir con el extendido y la compactación requerida, afectando el rendimiento previsto.	SI		NO	X
La imprimación con emulsión asfáltica presentó un retraso del –11,17% por las precipitaciones registradas, que redujeron los días aptos de trabajo. La humedad superficial impidió aplicar la emulsión de forma adecuada, generando disminución en el rendimiento y el avance programado.	SI		NO	X

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	5	10	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 132 **DEL:** 29/09/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 5/10/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

3. Se continuará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) sobre la calzada derecha de la carrera 40, entre las calle 46 y calle 50. Donde, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.	La instalación de la mezcla asfáltica MDC-2 presentó un retraso del –11,17% debido a la limitada disponibilidad de días secos. La lluvia impidió la colocación de la mezcla por riesgo de pérdida de calidad, afectando el ritmo de ejecución y el avance semanal.	SI		NO	X

JUSTIFICACIÓN:Se presenta un retraso en la ejecución del-11,17% respecto de lo reprogramado con la suscripción de Prórroga No.3 y con corte al presente informe.

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARTICULARES

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 80.000.059.959	$ 80.000.059.959	$ 88.718.481.820	86,34%	$ 14.034.657.055	13,66%
Obras Adicionales	0,0	$ 22.753.078.916,00	0,0	0%	0,0	0%
TOTAL	$ 80.000.059.959	$ 102.753.138.875,00				

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Estos porcentajes de avance ejecutado y avance programado están basados en la programación de la Prórroga No. 3

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

L	M	M	J	V	S	D
29	30	1	2	3	4	5
LLUVIOSO	LLUVIOSO	SOLEADO	LLUVIOSO	SOLEADO	LLUVIOSO	SOLEADO

13- DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

FECHA DE REPORTE			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO NC	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD, PARA ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA PROBLEMÁTICA	RESPONSABLE
DD	MM	AA				

TIPO DE NO CONFORME (NC) Una no conformidad se puede llegar a presentar por: 1. Mano de Obra (Falta de Inducción, Competencia, experiencia...), 2. Maquinaria o Equipo (mal estado del equipo, equipo no calibrado...), 3. Material (proveedor no entrega a tiempo pedidos, mala calidad del material, material no cumple con especificaciones establecidas), 4. Método (Forma de programación de la obra, forma en la que se desarollan las diferentes actividades, falta de inspección), 5. Medio (Cultura del Cliente, estado del tiempo) 6. Medición (Falta de Inspección, Equipos de topografía o de laboratorios de ensayo no calibrados o verificados...)

Elaboró:	Revisó:
YERLY CHAPARRO LÓPEZ.	
YERLY CHAPARRO LÓPEZ	JORGE CASTELLANOS
Residente de Interventoría	**Director de Interventoría**
Firma y posfirma	Firma y posfirma

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	12	10	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 133 **DEL:** 6/10/2025 dd/mm/yyyy **AL:** 12/10/2025 dd/mm/yyyy

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 dd/mm/yyyy

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato 130.20.10.044 de 2022 tuvo acta de inicio el día VEINTE (20) de diciembre de 2022, se realizaron los trámites pertinentes para el acta de entrega de anticipo el dia VEINTIUNO (21) de diciembre de 2022 y la fecha de terminación actual corresponde al día VEINTISIETE (27) de MARZO de 2026.

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
				Canguro	1	Director	1
				Herramienta menor	8	Residente	1
				Retroescavadora	1	Inspectores	2
				Retroescavadora de llantas	2	Maestro y Ayudantes	15
						TOTAL	19

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
0,0056%	86,35%	97,51%	-11,17%

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					97,51%
EJECUTADO																					86,35%

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO	
REDES DE ACUEDUCTO	85,58%
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	
COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO	96,90%
POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	67,70%

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	12	10	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 133 **DEL:** 6/10/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 12/10/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

CÁMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	**82,26%**
LÍNEA DE IMPULSIÓN	**92,82%**
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO	
ESTACIÓN DE BOMBEO	**50,95%**
CASETA ELÉCTRICA	**0,00%**
RED DE MEDIA TENSIÓN AÉREA	**0,00%**
RED MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA	**0,00%**
SUBESTACIÓN CAPSULADA	**0,00%**
CUARTO TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y TABLEROS CONTROL BOMBAS	**0,00%**
PLANTA DE EMERGENCIA	**0,00%**
INSTALACIONES INTERNAS	**0,00%**
OBRAS COMPLEMENTARIAS	
PRELIMINARES	**88,60%**
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**77,52%**
DRENAJE VÍA	**84,43%**
TRANSPORTE DE MATERIALES	**92,21%**
SEÑALIZACIÓN	**0,00%**
URBANISMO	**85,37%**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	12	10	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 133 **DEL:** 6/10/2025 dd/mm/yyyy **AL:** 12/10/2025 dd/mm/yyyy

CONTRATO Nº 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 dd/mm/yyyy

RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV	**99,24%**
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	**99,42%**
SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	**0,00%**

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*1093*	*930*	*163*
Proyección	*1093*	*930*	*163*

5- REGISTRO FOTOGRAFICO



6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*27/03/2026*	*85,09%*
Semana Actual	*0*	*27/03/2026*	*85,09%*

7- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

8- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
1. Se continua con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) en la calzada derecha de la carrera 40, entre calles 46 y 50. Se verificó temperatura, compactación y cumplimiento técnico del material instalado.	La imprimación con emulsión asfáltica presentó un retraso del –11,17% debido a que únicamente se contó con un día soleado en la semana. Las lluvias continuas mantuvieron la superficie húmeda, impidiendo la correcta aplicación de la emulsión y reduciendo significativamente el rendimiento programado.	SI		NO	X
2. Se continua con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40, entre las calles 46 y 50. Donde la interventoria verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.	La instalación de la mezcla asfáltica MDC-2 presentó un retraso del –11,17% ya que las lluvias persistentes solo permitieron un día apto para la ejecución. La humedad y precipitación impidieron la colocación de la mezcla sin comprometer su calidad, afectando el ritmo de trabajo y el avance semanal.	SI		NO	X

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	12	10	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 133 **DEL:** 6/10/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 12/10/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

JUSTIFICACIÓN:Se presenta un retraso en la ejecución del-11,17% respecto de lo reprogramado con la suscripción de Prórroga No.3 y con corte al presente informe.

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARTICULARES

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 80.000.059.959	$ 80.000.059.959	$ 88.724.286.580	86,35%	$ 14.028.852.294,58	13,65%
Obras Adicionales	0,0	$ 22.753.078.916,00	0,0	0%	0,0	0%
TOTAL	$ 80.000.059.959	$ 102.753.138.875,00				

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Estos porcentajes de avance ejecutado y avance programado están basados en la programación de la Prórroga No. 3

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

D	L	M	M	J	V	S
6	7	8	9	10	11	12
LLUVIOSO	LLUVIOSO	LLUVIOSO	LLUVIOSO	SOLEDADO	LLUVIOSO	LLUVIOSO

13- DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

FECHA DE REPORTE			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO NC	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD, PARA ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA PROBLEMÁTICA	RESPONSABLE
DD	MM	AA				

TIPO DE NO CONFORME (NC) Una no conformidad se puede llegar a presentar por: 1. Mano de Obra (Falta de Inducción, Competencia, experiencia...), 2. Maquinaria o Equipo (mal estado del equipo, equipo no calibrado...), 3. Material (proveedor no entrega a tiempo pedidos, mala calidad del material, material no cumple con especificaciones establecidas), 4. Método (Forma de programación de la obra, forma en la que se desarollan las diferentes actividades, falta de inspección), 5. Medio (Cultura del Cliente, estado del tiempo) 6. Medición (Falta de Inspección, Equipos de topografía o de laboratorios de ensayo no calibrados o verificados...)

Elaboró:	Revisó:
YERLY CHAPARRO LÓPEZ.	
YERLY CHAPARRO LÓPEZ	JORGE CASTELLANOS
Residente de Interventoría	**Director de Interventoría**
Firma y posfirma	Firma y posfirma

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	19	10	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 134 **DEL:** 13/10/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 19/10/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato 130.20.10.044 de 2022 tuvo acta de inicio el día VEINTE (20) de diciembre de 2022, se realizaron los trámites pertinentes para el acta de entrega de anticipo el dia VEINTIUNO (21) de diciembre de 2022 y la fecha de terminación actual corresponde al día VEINTISIETE (27) de MARZO de 2026.

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
				Canguro	1	Director	1
				Herramienta menor	8	Residente	1
				Retroescavadora	1	Inspectores	2
				Retroescavadora de llantas	2	Maestro y Ayudantes	15
						TOTAL	19

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
0,0056%	**86,35%**	**97,52%**	**-11,16%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					97,52%
EJECUTADO																					86,35%

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO	
REDES DE ACUEDUCTO	**85,58%**
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	
COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO	**96,90%**
POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	**67,70%**

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	19	10	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 134 **DEL:** 13/10/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 19/10/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

CÁMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	**82,26%**
LÍNEA DE IMPULSIÓN	**92,82%**
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO	
ESTACIÓN DE BOMBEO	**50,95%**
CASETA ELÉCTRICA	**0,00%**
RED DE MEDIA TENSIÓN AÉREA	**0,00%**
RED MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA	**0,00%**
SUBESTACIÓN CAPSULADA	**0,00%**
CUARTO TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y TABLEROS CONTROL BOMBAS	**0,00%**
PLANTA DE EMERGENCIA	**0,00%**
INSTALACIONES INTERNAS	**0,00%**
OBRAS COMPLEMENTARIAS	
PRELIMINARES	**88,60%**
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**77,61%**
DRENAJE VÍA	**84,43%**
TRANSPORTE DE MATERIALES	**92,21%**
SEÑALIZACIÓN	**0,00%**
URBANISMO	**85,37%**

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	19	10	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 134 **DEL:** 13/10/2025 dd/mm/yyyy **AL:** 19/10/2025 dd/mm/yyyy

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 dd/mm/yyyy

RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV	**99,24%**
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	**99,42%**
SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	**0,00%**

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*1093*	*937*	*156*
Proyección	*1093*	*937*	*156*

5- REGISTRO FOTOGRAFICO



6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*27/03/2026*	*85,73%*
Semana Actual	*0*	*27/03/2026*	*85,73%*

7- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

8- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
1. Se continua con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) en la calzada derecha de la carrera 40, entre calles 46 y 50. Se verificó temperatura, compactación y cumplimiento técnico del material instalado.	La imprimación con emulsión asfáltica presentó un retraso del –11,16% como consecuencia de las lluvias continuas registradas durante la mayor parte de la semana. La humedad superficial impidió aplicar la emulsión en condiciones adecuadas, limitando las jornadas productivas y reduciendo el avance programado.	SI		NO	X
2. Se continua con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40, entre las calles 46 y 50. Donde la interventoria verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.	La instalación de la mezcla asfáltica MDC-2 presentó un retraso del –11,16% debido a que las precipitaciones persistentes solo permitieron tres días aptos para la actividad. La humedad y la lluvia impidieron colocar la mezcla sin comprometer la calidad del pavimento, afectando el rendimiento y el avance semanal previsto.	SI		NO	X

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	19	10	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 134 **DEL:** 13/10/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 19/10/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

JUSTIFICACIÓN:Se presenta un retraso en la ejecución del-11,16% respecto de lo reprogramado con la suscripción de Prórroga No.3 y con corte al presente informe.

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARTICULARES

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 80.000.059.959	$ 80.000.059.959	$ 88.730.091.341	86,35%	$ 14.023.047.534,14	13,65%
Obras Adicionales	0,0	$ 22.753.078.916,00	0,0	0%	0,0	0%
TOTAL	$ 80.000.059.959	$ 102.753.138.875,00				

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Estos porcentajes de avance ejecutado y avance programado están basados en la programación de la Prórroga No. 3

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

D	L	M	M	J	V	S
13	14	15	16	17	18	19
SOLEDADO	SOLEDADO	LLUVIOSO	LLUVIOSO	LLUVIOSO	LLUVIOSO	SOLEDADO

13- DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

FECHA DE REPORTE			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO NC	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD, PARA ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA PROBLEMÁTICA	RESPONSABLE
DD	MM	AA				

TIPO DE NO CONFORME (NC) Una no conformidad se puede llegar a presentar por: 1. Mano de Obra (Falta de Inducción, Competencia, experiencia...), 2. Maquinaria o Equipo (mal estado del equipo, equipo no calibrado...), 3. Material (proveedor no entrega a tiempo pedidos, mala calidad del material, material no cumple con especificaciones establecidas), 4. Método (Forma de programación de la obra, forma en la que se desarollan las diferentes actividades, falta de inspección), 5. Medio (Cultura del Cliente, estado del tiempo) 6. Medición (Falta de Inspección, Equipos de topografía o de laboratorios de ensayo no calibrados o verificados...)

Elaboró:	Revisó:
YERLY CHAPARRO LÓPEZ.	
YERLY CHAPARRO LÓPEZ	JORGE CASTELLANOS
Residente de Interventoría	**Director de Interventoría**
Firma y posfirma	Firma y posfirma

acuatodos s.a. ESP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SIG MECA
GP-F-11
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	26	10	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 135 **DEL:** 20/10/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 26/10/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato 130.20.10.044 de 2022 tuvo acta de inicio el día VEINTE (20) de diciembre de 2022, se realizaron los trámites pertinentes para el acta de entrega de anticipo el dia VEINTIUNO (21) de diciembre de 2022 y la fecha de terminación actual corresponde al día VEINTISIETE (27) de MARZO de 2026.

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
				Canguro	1	Director	1
				Herramienta menor	8	Residente	1
				Retroescavadora	1	Inspectores	2
				Retroescavadora de llantas	2	Maestro y Ayudantes	15
						TOTAL	19

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
0,0056%	**86,36%**	**97,52%**	**-11,16%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					97,52%
EJECUTADO																					86,36%

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO	
REDES DE ACUEDUCTO	**85,58%**
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	
COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO	**96,90%**
POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	**67,70%**

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	26	10	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 135 **DEL:** 20/10/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 26/10/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO Nº 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

CÁMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	**82,26%**
LÍNEA DE IMPULSIÓN	**92,82%**
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO	
ESTACIÓN DE BOMBEO	**50,95%**
CASETA ELÉCTRICA	**0,00%**
RED DE MEDIA TENSIÓN AÉREA	**0,00%**
RED MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA	**0,00%**
SUBESTACIÓN CAPSULADA	**0,00%**
CUARTO TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y TABLEROS CONTROL BOMBAS	**0,00%**
PLANTA DE EMERGENCIA	**0,00%**
INSTALACIONES INTERNAS	**0,00%**
OBRAS COMPLEMENTARIAS	
PRELIMINARES	**88,60%**
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**77,69%**
DRENAJE VÍA	**84,43%**
TRANSPORTE DE MATERIALES	**92,21%**
SEÑALIZACIÓN	**0,00%**
URBANISMO	**85,37%**

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	26	10	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 135 **DEL:** 20/10/2025 dd/mm/yyyy **AL:** 26/10/2025 dd/mm/yyyy

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"


FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 dd/mm/yyyy

RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV	**99,24%**
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	**99,42%**
SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	**0,00%**

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*1093*	*944*	*149*
Proyección	*1093*	*944*	*149*

5- REGISTRO FOTOGRAFICO

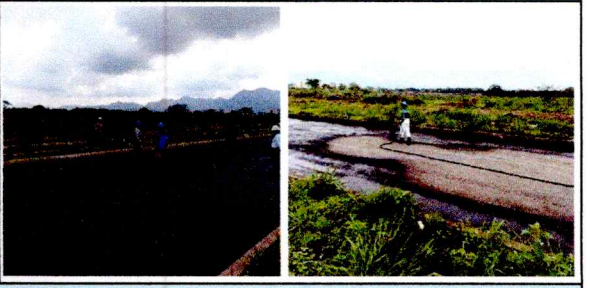

6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*27/03/2026*	*86,37%*
Semana Actual	*0*	*27/03/2026*	*86,37%*

7- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

8- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
1. Se continua con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) en la calzada derecha de la carrera 40, entre calles 46 y 50. Se verificó temperatura, compactación y cumplimiento técnico del material instalado.	La imprimación con emulsión asfáltica presentó un retraso del –11,16% como consecuencia de las lluvias continuas registradas durante la mayor parte de la semana. La humedad superficial impidió aplicar la emulsión en condiciones adecuadas, limitando las jornadas productivas y reduciendo el avance programado.	SI		NO	X
2. Se continua con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40, entre las calles 46 y 50. Donde la interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.	La instalación de la mezcla asfáltica MDC-2 presentó un retraso del –11,16% debido a que las precipitaciones persistentes solo permitieron tres días aptos para la actividad. La humedad y la lluvia impidieron colocar la mezcla sin comprometer la calidad del pavimento, afectando el rendimiento y el avance semanal previsto.	SI		NO	X

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	130.20.10.044 DE 2022
	26	10	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA N° 135 **DEL:** 20/10/2025 (dd/mm/yyyy) **AL:** 26/10/2025 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 130.20.10.044 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 27 DE MARZO DE 2026 (dd/mm/yyyy)

JUSTIFICACIÓN:Se presenta un retraso en la ejecución del-11,16% respecto de lo reprogramado con la suscripción de Prórroga No.3 y con corte al presente informe.

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARTICULARES

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 80.000.059.959	$ 80.000.059.959	$ 88.735.896.101	86,36%	$ 14.017.242.773,70	13,64%
Obras Adicionales	0,0	$ 22.753.078.916,00	0,0	0%	0,0	0%
TOTAL	$ 80.000.059.959	$ 102.753.138.875,00				

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Estos porcentajes de avance ejecutado y avance programado están basados en la programación de la Prórroga No. 3

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

D	L	M	M	J	V	S
20	21	22	23	24	25	26
SOLEDADO	SOLEDADO	LLUVIOSO	LLUVIOSO	LLUVIOSO	SOLEDADO	SOLEDADO

13- DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

FECHA DE REPORTE			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO NC	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD, PARA ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA PROBLEMÁTICA	RESPONSABLE
DD	MM	AA				

TIPO DE NO CONFORME (NC) Una no conformidad se puede llegar a presentar por: 1. Mano de Obra (Falta de Inducción, Competencia, experiencia...), 2. Maquinaria o Equipo (mal estado del equipo, equipo no calibrado...), 3. Material (proveedor no entrega a tiempo pedidos, mala calidad del material, material no cumple con especificaciones establecidas), 4. Método (Forma de programación de la obra, forma en la que se desarollan las diferentes actividades, falta de inspección), 5. Medio (Cultura del Cliente, estado del tiempo) 6. Medición (Falta de Inspección, Equipos de topografía o de laboratorios de ensayo no calibrados o verificados...)

Elaboró:	Revisó:
YERLY CHAPARRO LÓPEZ.	
YERLY CHAPARRO LÓPEZ	JORGE CASTELLANOS
Residente de Interventoría	**Director de Interventoría**
Firma y posfirma	Firma y posfirma

Consorcio Inter Nororiental

			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.7			046 - 2022		
			22	11	2025
PERIODO DEL	16/03/2025	16/11/2025	DD	MM	AA

REPORTES QUINCENALES

acuatodos s.a. esp	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **24/03/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **103-104** Del: **10-mar-25** Al: **23-mar-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **727** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959,00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916,00
Valor Total:	$ 102.753.138.875,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	DOCE (12) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (24) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2025

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	1,34%	97,97%	99,30%
Valor de la Obra programada:	$ 1.373.976.013,38	$ 100.664.695.336,67	$ 102.038.671.350,04

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	2,61%	80,97%	83,58%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 2.679.596.351,54	$ 83.199.517.805,73	$ 85.879.114.157,27

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Actividades realizadas:

1. Se continua con la instalacion de Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado sobre la construccion de la estacion de bombeo, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

2. Se continua con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas para la construccion de la estacion de bombeo, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

3. Se continua con la instalacion y amarre del acero de refuerzo sobre la construccion de la estacion de bombeo. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion y amarre, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos contructivos.

4. Se continua con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

5. Se continua con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de construccion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

6. Se continua relizando Transporte de material Petreo (via pavimentada). la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de trasporte, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos contructivos.

7. Se continua con la instalacion de Sub base granular triturada sobre los separadores de la carrera 40. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

8. Se continua con la instalacion de Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) sobre los separadores de la carrera 40. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

9. Se continua con la construccion he instalacion de rampas peatonales y escaleras en concreto de 3000 psi sobre los separadores de la carrera 40. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

10. Se continua con la instalacion de la Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

11. Se continua con la instalacion de la Loseta tactil guia discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-56 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

12. Se continua con el Replanteo en baja tension, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de replanteo, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

13. Se continua con la Apertura de hueco para poste o templete en M.T. de los postas de la red electrica a demas tambien se inicia con la instalacion de Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 kv, Estructura LA-476 para red compactada 13.2 kv, Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x Nº 2), Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 3/8" para red compacta, Espaciador angular 15KV, Espaciador angular 15KV y Puesta a tierra para cable mensajero de la red de media tension de 13,2v. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

acuatodos s.a.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **24/03/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **103-104** Del: **10-mar-25** Al: **23-mar-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **727** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

14. Se continua con la instalacion de Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 3", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit, Caja de inspeccion AP-274, Poste metálico decorativo galvanizado perfil redondo, Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 2", Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", instalación de acometida en conductor de aluminio S8000 3x4 AWG THW 600 V 75°, Empalme de baja tensión 91-B-1, 8 -14 derivación, instalación medidor de energía exclusivo de Alumbrado público 3 H 480/240, 10(100)A, Clase1, Luminaria 30-40 w, de 3.500 - 4.300 lm, corriente de alimentación hasta 1000mA, 120/277V y Luminaria 100 - 120 w, de 10.000 - 13000 lm corriente de alimentación hasta 1000mA, 120/277V del sistema de alumbrado publico. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

1. Continuar con la instalacion de Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado sobre la construccion de la estacion de bombeo.
2. Continuar con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas para la construccion de la estacion de bombeo.
3. Continuar con con la instalacion y amarre del acero de refuerzo sobre la construccion de la estacion de bombeo.
4. Continuar con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre la carrera 40 entre calle 40 y calle 50.
5. Continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la carrera 40 entre calle 40 y calle 50.
6. Continuar relizando Transporte de material Petreo (via pavimentada).
7. Continuar con la instalacion de Sub base granular triturada sobre los separadores de la carrera 40.
8. Continuar con la instalacion de Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) sobre los separadores de la carrera 40.
9. Continuar con la construccion he instalacion de rampas peatonales y escaleras en concreto de 3000 psi sobre los separadores de la carrera 40.
10. Continuar con la instalacion de la Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40.
11. Continuar con la instalacion de la Loseta tactil guia discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-56 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40.
12. Continuar con la Apertura de hueco para poste o templete en M.T. de los postas de la red electrica a demas tambien se inicia con la instalacion de Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 kv, Estructura LA-476 para red compactada 13.2 kv, Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x Nº 2), Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 3/8" para red compacta, Espaciador angular 15KV, Espaciador angular 15KV y Puesta a tierra para cable mensajero de la red de media tension de 13,2v.
13. Continuar con la instalacion de Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 3", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit, Caja de inspeccion AP-274, Poste metálico decorativo galvanizado perfil redondo, Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 2", Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", instalación de acometida en conductor de aluminio S8000 3x4 AWG THW 600 V 75°, Empalme de baja tensión 91-B-1, 8 -14 derivación, instalación medidor de energía exclusivo de Alumbrado público 3 H 480/240, 10(100)A, Clase1, Luminaria 30-40 w, de 3.500 - 4.300 lm, corriente de alimentación hasta 1000mA, 120/277V y Luminaria 100 - 120 w, de 10.000 - 13000 lm corriente de alimentación hasta 1000mA, 120/277V del sistema de alumbrado publico.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

AVANCE ILUSTRADO



INSTALACION DE IMPRIMACION SOBRE LA CARRERA 40



INSTALACION DE MEZCLA AZFALTICA MDC-2 O 19 SOBRE LA CARRERA 40

acuatodos s.a.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **24/03/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **103-104** Del: **10-mar-25** Al: **23-mar-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **727** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

	
INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA GRIS A-50 (40x40x6) Y LOSETA PREFABRICADA COLOR A-55 (40x40x6) SOBRE LA CARRERA 40	**INSTALACIO DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 (0,80x0,20x0,35) SOBRE LA CARRERA 40**

OBSERVACIONES	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
	YERLY CHAPARRO L	
	YERLY CHAPARRO LÓPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOESE CASTELLANO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

acuatodos S.A. E.S.P.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME**
			FECHA DEL INFORME
			7/04/2025

DATOS GENERALES

Semanas Número: **105-106** Del: **24-mar-25** Al: **6-abr-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **741** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959,00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916,00
Valor Total:	$ 102.753.138.875,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	1,60%	83,58%	85,18%
Valor de la Obra programada:	$ 1.648.566.250,38	$ 85.879.114.157,27	$ 87.527.680.407,65

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	1,63%	83,58%	85,21%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 1.675.995.970,96	$ 85.879.114.157,27	$ 87.555.110.128,23

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Actividades realizadas:

1. Se continua con la instalacion de Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado sobre la construccion de la estacion de bombeo, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

2. Se continua con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas para la construccion de la estacion de bombeo, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

3. Se continua con la instalacion y amarre del acero de refuerzo sobre la construccion de la estacion de bombeo para la fundida de los muros perimetrales. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion y amarre, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos

4. Se continua con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre las calzadas izquierda, derecha entre calle 40 y calle 50, ademas se inicia con la instalacion de la imprimiacion con emulsion asfaltica sobre cicloruta del separador entre calle 40 y calle 46 de la carrera 40, la presente interventoría realizó la verificación del

5. Se continua con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre las calzadas de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, seguidmente se inicia con la instalacion de Mezcla Asfaltca MDC-3 o 10 sobre la cicloruta ubicada sobre el separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46, La presente interventoría realizó la verificación del

6. Se continua relizando Transporte de material Petreo (via pavimentada). la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de trasporte, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos contructivos.

7. Se continua con la instalacion de Sub base granular triturada sobre los separadores de la carrera 40. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

8. Se continua con la instalacion de Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) sobre los separadores de la carrera 40. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

9. Se continua con la construccion he instalacion de rampas peatonales y escaleras en concreto de 3000 psi sobre los separadores de la carrera 40. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

10. Se continua con la instalacion de la Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

11. Se continua con la instalacion de la Loseta tactil guia discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-56 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

12. Se continua con el Replanteo en baja tension, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de replanteo, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

13. Se continua con la Apertura de hueco para poste o templete en M.T. de los postas de la red electrica a demas tambien se inicia con la instalacion de Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 kv, Estructura LA-476 para red compactada 13.2 kv, Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x Nº 2), Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 3/8" para red compacta, Espaciador angular 15KV, Espaciador angular 15KV y Puesta a tierra para cable mensajero de la red de media tension de 13,2v. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

14. Se continua con la instalacion de Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 3", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit, Caja de inspeccion AP-274, Poste metálico decorativo galvanizado perfil redondo, Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 2", Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", instalación de acometida en conductor de aluminio S8000 3x4 AWG THW 600 V 75°, Empalme de baja tensión 91-B-1, 8 -14 derivación, instalación medidor de energía exclusivo de Alumbrado público 3 H 480/240, 10(100)A, Clase1, Luminaria 30-40 w, de 3.500 - 4.300 lm, corriente de alimentación hasta 1000mA, 120/277V y Luminaria 100 - 120 w, de 10.000 - 13000 lm corriente de alimentación hasta 1000mA, 120/277V del sistema de alumbrado publico. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

acuatodos s.a. E.S.P.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **7/04/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **105-106** Del: **24-mar-25** Al: **6-abr-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **741** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA


"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO


1. Continuar con la instalacion de Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado sobre la construccion de la estacion de bombeo.
2. Continuar con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas sobre los muros perimerales de la construccion de la estacion de bombeo.
3. Continuar con con la instalacion y amarre del acero de refuerzo sobre los muros perimetrales de la construccion de la estacion de bombeo.
4. Continuar con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, de igual forma continuar con la instalacion de la imprimacion de la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
5. Continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, de igual continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
6. Continuar relizando Transporte de material Petreo (via pavimentada).
7. Continuar con la instalacion de Sub base granular triturada sobre los separadores de la carrera 40.
8. Continuar con la instalacion de Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) sobre los separadores de la carrera 40.
9. Continuar con la construccion he instalacion de rampas peatonales y escaleras en concreto de 3000 psi sobre los separadores de la carrera 40.
10. Continuar con la instalacion de la Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40.
11. Continuar con la instalacion de la Loseta tactil guia discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-56 (40x40x6) sobre el urbanismo de la carrera 40.
12. Continuar con la Apertura de hueco para poste o templete en M.T. de los postas de la red electrica a demas tambien se inicia con la instalacion de Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 kv, Estructura LA-476 para red compactada 13.2 kv, Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x Nº 2), Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 3/8" para red compacta, Espaciador angular 15KV, Espaciador angular 15KV y Puesta a tierra para cable mensajero de la red de media tension de 13,2v.
13. Continuar con la instalacion de Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 3", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit, Caja de inspeccion AP-274, Poste metálico decorativo galvanizado perfil redondo, Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 2", Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", instalación de acometida en conductor de aluminio S8000 3x4 AWG THW 600 V 75°, Empalme de baja tensión 91-B-1, 8 -14 derivación, instalación medidor de energía exclusivo de Alumbrado público 3 H 480/240, 10(100)A, Clase1, Luminaria 30-40 w, de 3.500 - 4.300 lm, corriente de alimentación hasta 1000mA, 120/277V y Luminaria 100 - 120 w, de 10.000 - 13000 lm corriente de alimentación hasta 1000mA, 120/277V del sistema de alumbrado publico.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

AVANCE ILUSTRADO

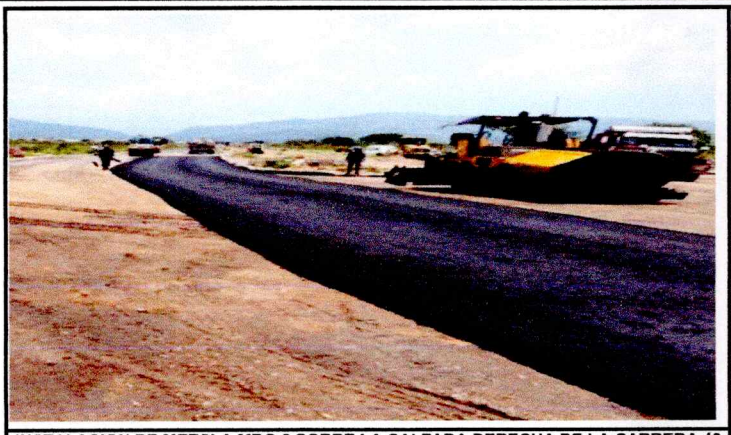

INSTALACION DE MEZCLA MDC-2 SOBRE LA CALZADA DERECHA DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50

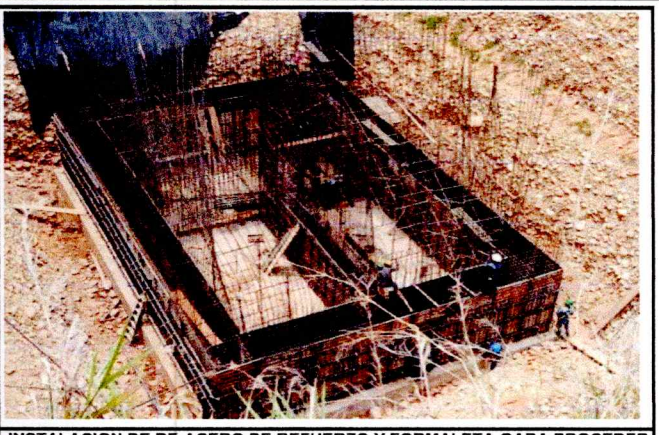

INSTALACION DE DE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA OARA PROCEDER FUNDIR MUROS PERIMETRALES DE LA ESTACION DE BOMBEO

acuatodos s.a. E.S.P.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **7/04/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **105-106** Del: **24-mar-25** Al: **6-abr-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **741** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"



INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA GRIS A-50 (40x40x6) Y LOSETA PREFABRICADA COLOR A-55 (40x40x6) SOBRE LA CARRERA 40



INSTALACIO DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 (0,80x0,20x0,35) SOBRE LA CARRERA 40

OBSERVACIONES	**CONSORCIO INTER NORORIENTAL**	**CONSORCIO INTER NORORIENTAL**
	YERLY CHAPARRO L	
	YERLY CHAPARRO LÓPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOEGE CASTELLANO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

acuatodos s.a.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME**
			FECHA DEL INFORME
			21/04/2025

DATOS GENERALES

Semanas Número: **107-108** Del: **7-abr-25** Al: **20-abr-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **755** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959,00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916,00
Valor Total:	$ 102.753.138.875,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	0,20%	85,18%	85,38%
Valor de la Obra programada:	$ 205.124.108,77	$ 87.527.680.407,65	$ 87.732.804.516,42

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0,26%	85,21%	85,47%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 270.955.438,15	$ 87.555.110.128,23	$ 87.826.065.566,38

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Actividades realizadas:

1. Se continua con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas para la construccion de los muros perimetrales de la estacion de bombeo, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.
2. Se continua con la instalacion y amarre del acero de refuerzo sobre los muros perimetrales de la estacion de bombeo para la fundida de los muros perimetrales. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion y amarre, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos contructivos.
3. Se continua con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre las calzada derecha entre calle 40 y calle 50, ademas se inicia con la instalacion de la imprimiacion con emulsion asfaltica sobre cicloruta del separador entre calle 40 y calle 46 de la carrera 40, la presente interventoría realizó la verificación del
4. Se continua con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y
5. Se continua con la instalacion de Mezcla Asfaltca MDC-3 o 10 sobre la cicloruta ubicada sobre el separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46, La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado,
6. Se continua relizando Transporte de material Petreo (via pavimentada). la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de trasporte, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos contructivos.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

1. Continuar con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas sobre los muros perimerales de la construccion de la estacion de bombeo.
2. Continuar con con la instalacion y amarre del acero de refuerzo sobre los muros perimetrales de la construccion de la estacion de bombeo.
3. Continuar con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, de igual forma continuar con la instalacion de la imprimacion de la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
4. Continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, de igual continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.
5. Continuar relizando Transporte de material Petreo (via pavimentada).

acuatodos s.a. E.S.P.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **21/04/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **107-108** Del: **7-abr-25** Al: **20-abr-25**


Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **755** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

AVANCE ILUSTRADO

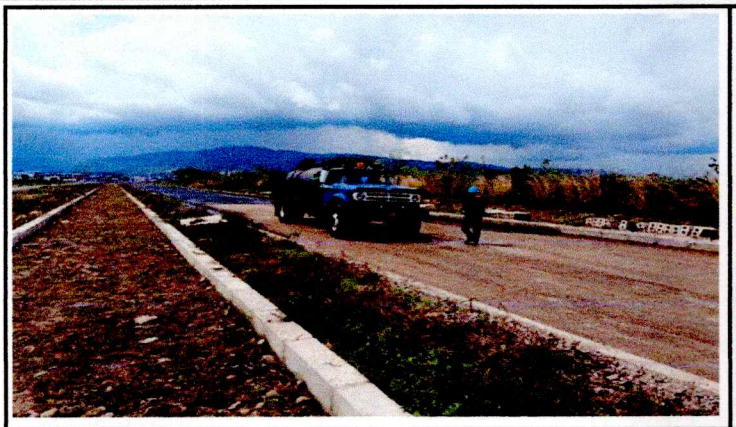

INSTALACION DE IMPRIMACION SOBRE LA CARRERA 40 CALZADA DERECHA ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50



INSTALACION DE MEZCLA AZFALTICA MDC-2 O 19 SOBRE LA CALZADA DERECHA DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50



INSTALACION DE IMPRIMACION SOBRE LA CICLORUTA DEL SEPARADOR DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 46



INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA MDC-3 O 10 SOBRE LA CICLORUTA DEL SEPARADOR DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 46

OBSERVACIONES	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
	YERLY CHAPARRO L	
	YERLY CHAPARRO LÓPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOEGE CASTELLANO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

acuatodos s.a.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME**
			FECHA DEL INFORME
			5/05/2025

DATOS GENERALES

Semanas Número: **109-110** Del: **21-abr-25** Al: **4-may-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **769** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959,00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916,00
Valor Total:	$ 102.753.138.875,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	0,27%	85,38%	85,65%
Valor de la Obra programada:	$ 279.017.750,35	$ 87.732.804.516,42	$ 88.011.822.266,77

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0,24%	85,47%	85,72%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 250.494.905,95	$ 87.826.065.566,38	$ 88.076.560.472,33

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Actividades realizadas:

1. Se continua con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas para la construccion de los muros perimetrales de la estacion de bombeo, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.
2. Se continua con la instalacion y amarre del acero de refuerzo sobre los muros perimetrales de la estacion de bombeo para la fundida de los muros perimetrales. la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion y amarre, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos contructivos.
3. Se continua con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre las calzada derecha entre calle 46 y calle 50, ademas se inicia con la instalacion de la imprimiacion con emulsion asfaltica sobre cicloruta del separador entre calle 40 y calle 46 de la carrera 40, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.
4. Se continua con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50, La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.
5. Se continua con la instalacion de Mezcla Asfaltca MDC-3 o 10 sobre la cicloruta ubicada sobre el separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46, La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.
6. Se continua relizando Transporte de material Petreo (via pavimentada). la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de trasporte, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos contructivos.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

1. Se continua con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas para la construccion de los muros perimetrales de la estacion de bombeo, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.
2. Se continua con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre las calzada derecha entre calle 46 y calle 50, ademas se inicia con la instalacion de la imprimiacion con emulsion asfaltica sobre cicloruta del separador entre calle 40 y calle 46 de la carrera 40, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.
3. Se continua con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50, La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.
4. Se continua con la instalacion de Mezcla Asfaltca MDC-3 o 10 sobre la cicloruta ubicada sobre el separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46, La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.
5. Se continua relizando Transporte de material Petreo (via pavimentada). la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de trasporte, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos contructivos.

acuatodos S.A. E.S.P.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **5/05/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **109-110** Del: **21-abr-25** Al: **4-may-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **769** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

AVANCE ILUSTRADO



PROCESO DE ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE MUROS PERIMETRALES DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PARA LA SEGUNDA ETAPA DE FUNDIDA



INSTALACIÓN MATERIAL PETREO (BASE) SOBRE LA CARRERA 40 PARA SU POSTERIOR NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.



PROCESO DE COLADO DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS MUROS PERIMETRALES DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO



INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA MDC-3 O 10 SOBRE LA CICLORUTA DEL SEPARADOR DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 46

OBSERVACIONES	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
	YERLY CHAPARRO L	
	YERLY CHAPARRO LÓPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOEGE CASTELLANO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

acuatodos S.A. E.S.P.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME**
			FECHA DEL INFORME
			19/05/2025

DATOS GENERALES

Semanas Número: **111-112** Del: **5-may-25** Al: **18-may-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **783** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959,00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916,00
Valor Total:	$ 102.753.138.875,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	0,49%	85,65%	86,14%
Valor de la Obra programada:	$ 500.698.675,11	$ 88.011.822.266,77	$ 88.512.520.941,89

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0,18%	85,72%	85,90%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 189.113.309,33	$ 88.076.560.472,33	$ 88.265.673.781,66

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Actividades realizadas:

1. Se continua con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas para la construccion de los muros perimetrales de la estacion de bombeo, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

2.Se continua con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre las calzada derecha entre calle 40 y calle 50, ademas se inicia con la instalacion de la imprimiacion con emulsion asfaltica sobre cicloruta del separador entre calle 40 y calle 46 de la carrera 40, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

3.Se continua con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

4. Se continua con la instalacion de Mezcla Asfaltca MDC-3 o 10 sobre la cicloruta ubicada sobre el separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46, La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

5. Se continua relizando Transporte de material Petreo (via pavimentada). la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de trasporte, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos contructivos.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

1. Continuar con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas sobre los muros perimerales de la construccion de la estacion de bombeo.

2. Continuar con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, de igual forma continuar con la instalacion de la imprimacion de la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.

3. Continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50, de igual continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.

4. Continuar relizando Transporte de material Petreo (via pavimentada).

acuatodos s.a. esp	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **19/05/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **111-112** Del: **5-may-25** Al: **18-may-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **783** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO


AVANCE ILUSTRADO




PROCESO DE COLADO DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS MUROS PERIMETRALES DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO



INSTALACIÓN MATERIAL PETREO (BASE) SOBRE LA CARRERA 40 PARA SU POSTERIOR NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.

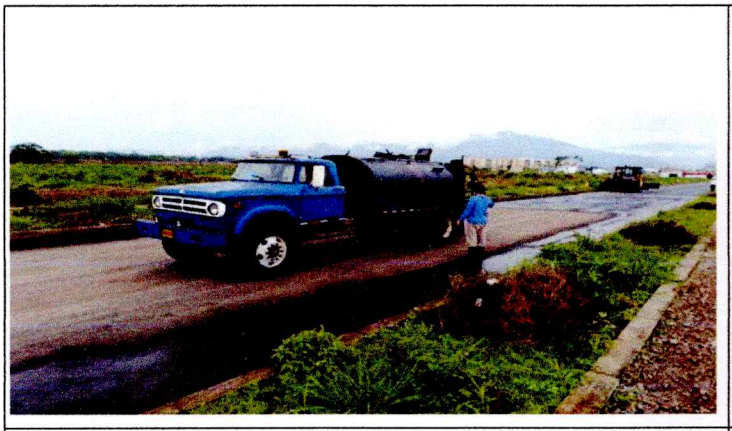

PROCESO DE INSTALACIÓN DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA SOBRE LA CARRERA 40 CALZADA DERECHA ENTRE CALLE 40 A CALLE 50

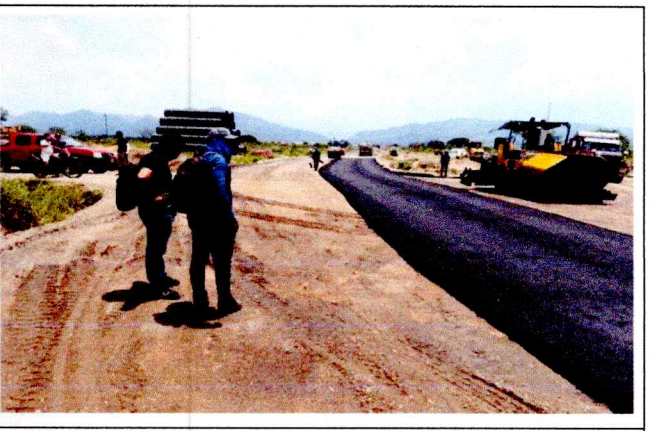

INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA MDC-2 O 19 SOBRE LA CALZADA DERECHA DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 46 Y CALLE 50

OBSERVACIONES	**CONSORCIO INTER NORORIENTAL**	**CONSORCIO INTER NORORIENTAL**
	YERLY CHAPARRO L	
	YERLY CHAPARRO LÓPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOEGE CASTELLANO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

acuatodos s.a. E.S.P.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME**
			FECHA DEL INFORME
			2/06/2025

DATOS GENERALES

Semanas Número: **113-114** Del: **19-may-25** Al: **1-jun-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **797** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959,00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916,00
Valor Total:	$ 102.753.138.875,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	0,49%	86,14%	86,63%
Valor de la Obra programada:	$ 500.698.675,11	$ 88.512.520.941,89	$ 89.013.219.617,00

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0,18%	85,90%	86,08%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 189.113.309,33	$ 88.265.673.781,66	$ 88.454.787.091,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Actividades realizadas:

1. Se continua con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas para la construccion de los muros perimetrales de la estacion de bombeo, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

2.Se continua con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre las calzada derecha entre calle 40 y calle 50, ademas se inicia con la instalacion de la imprimiacion con emulsion asfaltica sobre cicloruta del separador entre calle 40 y calle 46 de la carrera 40, la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

3.Se continua con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

4. Se continua con la instalacion de Mezcla Asfaltca MDC-3 o 10 sobre la cicloruta ubicada sobre el separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46, La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

5. Se continua relizando Transporte de material Petreo (via pavimentada). la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de trasporte, el cuales deben cumplir con lo requeridos en las especificaciones técnicas y metodos contructivos.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

1. Continuar con la instalacion de Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas sobre los muros perimerales de la construccion de la estacion de bombeo.

2. Continuar con la instalacion de Imprimacion con emulsion asfaltica sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, de igual forma continuar con la instalacion de la imprimacion de la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.

3. Continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19 sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50, de igual continuar con la instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-3 o 10 sobre la cicloruta del separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46.

4. Continuar relizando Transporte de material Petreo (via pavimentada).

acuatodos s.a. ESP	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **2/06/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **113-114** Del: **19-may-25** Al: **1-jun-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **797** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA


"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO


AVANCE ILUSTRADO



PROCESO DE COLADO DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS MUROS PERIMETRALES DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO

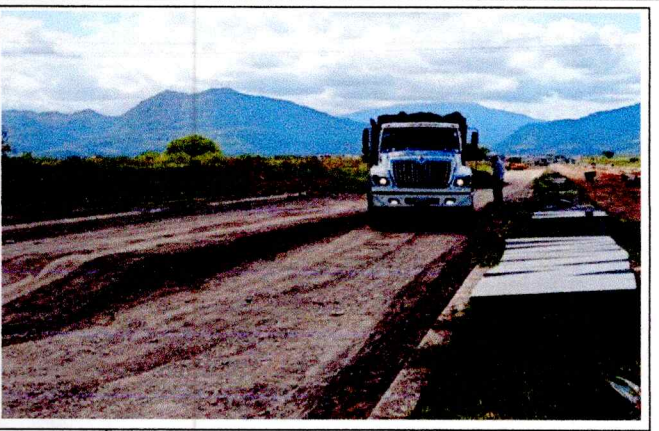

INSTALACIÓN MATERIAL PETREO (BASE) SOBRE LA CARRERA 40 PARA SU POSTERIOR NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.

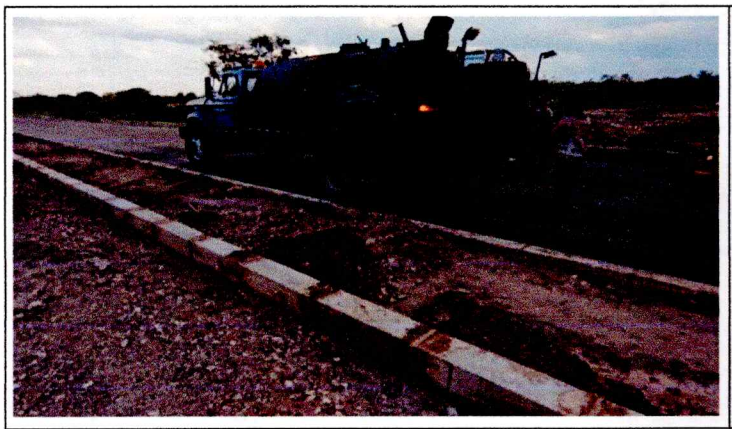

PROCESO DE INSTALACIÓN DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFALTICA SOBRE LA CALZADA DERECHA DE CARRERA 40 ENTRE CALLE 46 Y CALLE 50



INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA MDC-3 O 10 SOBRE LA CICLORUTA DEL SEPARADOR DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 40 CON CALLE 46

OBSERVACIONES	**CONSORCIO INTER NORORIENTAL**	**CONSORCIO INTER NORORIENTAL**
	YERLY CHAPARRO L	
	YERLY CHAPARRO LÓPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOEGE CASTELLANO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

acuatodos s.a. esp	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME**
			FECHA DEL INFORME
			16/06/2025

DATOS GENERALES

Semanas Número: **115-116** Del: **2-jun-25** Al: **15-jun-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **811** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959,00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916,00
Valor Total:	$ 102.753.138.875,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	0,73%	86,63%	87,36%
Valor de la Obra programada:	$ 747.548.213,28	$ 89.013.219.617,00	$ 89.760.767.830,28

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0,02%	86,08%	86,11%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 21.475.590,24	$ 88.454.787.091,00	$ 88.476.262.681,24

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Actividades realizadas:

1. Se continúa con la imprimación con emulsión asfáltica sobre la calzada derecha de la carrera 40, entre calles 46 y 50. Donde, la interventoría verificó la aplicación conforme al diseño, especificaciones y métodos constructivos.

2. Se continúa con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) en la calzada derecha de la carrera 40, entre calles 46 y 50. Se verificó temperatura, compactación y cumplimiento técnico.

3. Se instaló sardinel especial tipo A-100 (0,60 m x 0,20 m x 0,50 m) para rampas de acceso.Donde, la interventoría supervisó alineación y asentamiento según diseño.

4. Se continuó con la instalación de sardinel prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Y la interventoria verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

1. Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calles 46 y 50. Por tal motivo, la interventoría verificará su correcta aplicación conforme al diseño.

2. Se avanzará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calles 46 y 50. En consecuencia, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.

3. Se continuará la instalación de sardinel especial tipo A-100 para rampas de acceso. Por ello, la iinterventoria revisará la alineación y asentamiento conforme a planos.

4. Se continuará con la instalación de sardinel prefabricado tipo A-10 con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. En tal sentido, se verificará su correcta ubicación y nivel.

acuatodos S.A. ESP	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **16/06/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **115-116** Del: **2-jun-25** Al: **15-jun-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **811** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

AVANCE ILUSTRADO



PROCESO DE INSTALACIÓN DE SARDINEL TIPO A10 CON MORTERO DE PEGUE Y NIVELACIÓN DE 0,03 m.



INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA MDC-2 O 19 SOBRE LA CALZADA DERECHA DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 46 CON CALLE 50



PROCESO DE INSTALACIÓN DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFALTICA SOBRE LA CALZADA DERECHA DE CARRERA 40 ENTRE CALLE 46 Y CALLE 50



INSTALACIÓN DE SARDINEL ESPECIAL TIPO A-100 PARA RAMPAS DE ACCESO.

OBSERVACIONES	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
	YERLY CHAPARRO L	
	YERLY CHAPARRO LÓPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOEGE CASTELLANO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

acuatodos s.a. E.S.P.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **30/06/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **117-118** Del: **16-jun-25** Al: **29-jun-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **825** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959,00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916,00
Valor Total:	$ 102.753.138.875,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	0,73%	87,36%	88,08%
Valor de la Obra programada:	$ 747.548.213,28	$ 89.760.767.830,28	$ 90.508.316.043,56

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0,02%	86,11%	86,13%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 21.475.590,24	$ 88.476.262.681,24	$ 88.497.738.271,48

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Actividades realizadas:

1. Se continúa con la imprimación con emulsión asfáltica sobre la calzada derecha de la carrera 40, entre calles 46 y 50. Donde, la interventoría verificó la aplicación conforme al diseño, especificaciones y métodos constructivos.

2. Se continúa con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) en la calzada derecha de la carrera 40, entre calles 46 y 50. Se verificó temperatura, compactación y cumplimiento técnico.

3. Se instaló sardinel especial tipo A-100 (0,60 m x 0,20 m x 0,50 m) para rampas de acceso.Donde, la interventoría supervisó alineación y asentamiento según diseño.

4. Se continuó con la instalación de sardinel prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Y la interventoria verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

1. Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calles 46 y 50. Por tal motivo, la interventoría verificará su correcta aplicación conforme al diseño.

2. Se avanzará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) sobre la calzada derecha de la carrera 40 entre calles 46 y 50. En consecuencia, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.

3. Se continuará la instalación de sardinel especial tipo A-100 para rampas de acceso. Por ello, la iinterventoria revisará la alineación y asentamiento conforme a planos.

4. Se continuará con la instalación de sardinel prefabricado tipo A-10 con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. En tal sentido, se verificará su correcta ubicación y nivel.

acuatodos s.a. E.S.P.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **30/06/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **117-118** Del: **16-jun-25** Al: **29-jun-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **825** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

AVANCE ILUSTRADO



PROCESO DE INSTALACIÓN DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFALTICA SOBRE LA CALZADA DERECHA DE CARRERA 40 ENTRE CALLE 46 Y CALLE 50



INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA MDC-2 O 19 SOBRE LA CALZADA DERECHA DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 46 CON CALLE 50



INSTALACIÓN DE SARDINEL ESPECIAL TIPO A-100 PARA RAMPAS DE ACCESO.



PROCESO DE INSTALACIÓN DE SARDINEL TIPO A10 CON MORTERO DE PEGUE Y NIVELACIÓN DE 0,03 m.

OBSERVACIONES	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
	YERLY CHAPARRO L	
	YERLY CHAPARRO LÓPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOEGE CASTELLANO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

acuatodos S.A. E.S.P.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **14/07/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **119-120** Del: **30-jun-25** Al: **13-jul-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **839** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959,00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916,00
Valor Total:	$ 102.753.138.875,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	1,05%	88,08%	89,14%
Valor de la Obra programada:	$ 1.081.764.274,96	$ 90.508.316.043,56	$ 91.590.080.318,52

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0,03%	86,13%	86,16%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 31.370.212,30	$ 88.497.738.271,48	$ 88.529.108.483,77

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Actividades realizadas:

1. Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica de la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

2. Se avanzará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-3 (tipo 10) sobre la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.

3. Se continuará con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 × 40 × 6 cm) en los senderos peatonales contemplado sobre el separador y los cotados de la carrera 40, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.

4.Se continuará con la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.

5.Se continuará con la instalación de loseta táctil de alerta para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-55 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.

6.Se continuará con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. Por ello, la interventoría revisará la preparación del terreno y la siembra conforme a planos y especificaciones técnicas.

7.Se continuará con la instalación de subbase granular triturada en el urbanismo de la vía para la conformación de los senderos peatonales con loseta y en la conformación de la cicloruta, garantizando el extendido uniforme, el espesor y la compactación exigidos.

8.Se continuará con la instalación de bordillo prefabricado para la definición de frentes entre calzada, cicloruta y senderos peatonales, incluyendo su asiento y fijación según detalle de diseño. Por ello, la interventoría revisará la alineación, el asentamiento y la fijación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

1. Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica de la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

2. Se avanzará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-3 (tipo 10) sobre la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.

3. Se continuará con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 × 40 × 6 cm) en los senderos peatonales contemplado sobre el separador y los cotados de la carrera 40, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.

4.Se continuará con la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.

5.Se continuará con la instalación de loseta táctil de alerta para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-55 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.

6.Se continuará con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. Por ello, la interventoría revisará la preparación del terreno y la siembra conforme a planos y especificaciones técnicas.

7.Se continuará con la instalación de subbase granular triturada en el urbanismo de la vía para la conformación de los senderos peatonales con loseta y en la conformación de la cicloruta, garantizando el extendido uniforme, el espesor y la compactación exigidos.

8.Se continuará con la instalación de bordillo prefabricado para la definición de frentes entre calzada, cicloruta y senderos peatonales, incluyendo su asiento y fijación según detalle de diseño. Por ello, la interventoría revisará la alineación, el asentamiento y la fijación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

acuatodos S.A. E.S.P.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME**
			FECHA DEL INFORME
			14/07/2025

DATOS GENERALES

Semanas Número: **119-120** Del: **30-jun-25** Al: **13-jul-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **839** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959.00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916.00
Valor Total:	$ 102.753.138.875.00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	1.05%	88.08%	89.14%
Valor de la Obra programada:	$ 1.081.764.274.96	$ 90.508.316.043.56	$ 91.590.080.318.52

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0.03%	86.13%	86.16%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 31.370.212.30	$ 88.497.738.271.48	$ 88.529.108.483.77

AVANCE ILUSTRADO




PROCESO DE INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO TIPO A-80 (0,80 m x 0,20 m x 0,35m) CON MORTERO DE PEGA YNIVELACIÓN DE 0,03 m.



INSTALACIÓN DE LOSETA TACTIL TIPO A50, A55 Y A56 SOBRE LA ESTRUCTURA CONTEMPLADA COMO SENDERO PEATONAL A LOS COSTADOS Y EN EL SEPARADOR DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50



INSTALACIÓN DE ZONA VERDE, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE GRAMA EN CESPÉD SOBRE UNA CAPA DE TIERRA NEGRA ABONADA DE 0,08 m DE ESPESOR

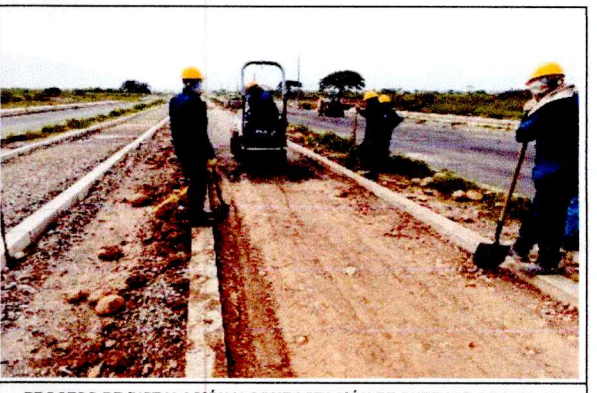

PROCESO DE INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TRITURADA.

OBSERVACIONES	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
	YERLY CHAPARRO L	
	YERLY CHAPARRO LÓPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOEGE CASTELLANO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

acuatodos S.A. E.S.P.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **28/07/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **121-122** Del: **14-jul-25** Al: **27-jul-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **853** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959.00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916.00
Valor Total:	$ 102.753.138.875.00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	1.15%	89.14%	90.28%
Valor de la Obra programada:	$ 1.180.106.481.78	$ 91.590.080.318.52	$ 92.770.186.800.30

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0.03%	86.16%	86.2%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 34.222.049.78	$ 88.529.108.483.77	$ 88.563.330.533.55

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Actividades realizadas:

1. Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica de la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

2. Se avanzará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-3 (tipo 10) sobre la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.

3. Se continuará con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 × 40 × 6 cm) en los senderos peatonales contemplado sobre el separador y los cotados de la carrera 40, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.

4.Se continuará con la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.

5.Se continuará con la instalación de loseta táctil de alerta para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-55 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.

6.Se continuará con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. Por ello, la interventoría revisará la preparación del terreno y la siembra conforme a planos y especificaciones técnicas.

7.Se continuará con la instalación de subbase granular triturada en el urbanismo de la vía para la conformación de los senderos peatonales con loseta y en la conformación de la cicloruta, garantizando el extendido uniforme, el espesor y la compactación exigidos.

8.Se continuará con la instalación de bordillo prefabricado para la definición de frentes entre calzada, cicloruta y senderos peatonales, incluyendo su asiento y fijación según detalle de diseño. Por ello, la interventoría revisará la alineación, el asentamiento y la fijación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

1. Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica de la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

2. Se avanzará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-3 (tipo 10) sobre la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.

3. Se continuará con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 × 40 × 6 cm) en los senderos peatonales contemplado sobre el separador y los cotados de la carrera 40, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.

4.Se continuará con la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.

5.Se continuará con la instalación de loseta táctil de alerta para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-55 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.

6.Se continuará con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. Por ello, la interventoría revisará la preparación del terreno y la siembra conforme a planos y especificaciones técnicas.

7.Se continuará con la instalación de subbase granular triturada en el urbanismo de la vía para la conformación de los senderos peatonales con loseta y en la conformación de la cicloruta, garantizando el extendido uniforme, el espesor y la compactación exigidos.

8.Se continuará con la instalación de bordillo prefabricado para la definición de frentes entre calzada, cicloruta y senderos peatonales, incluyendo su asiento y fijación según detalle de diseño. Por ello, la interventoría revisará la alineación, el asentamiento y la fijación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

acuatodos s.a. esp	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **28/07/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **121-122** Del: **14-jul-25** Al: **27-jul-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **853** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959.00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916.00
Valor Total:	$ 102.753.138.875.00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	1.15%	89.14%	90.28%
Valor de la Obra programada:	$ 1.180.106.481.78	$ 91.590.080.318.52	$ 92.770.186.800.30

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0.03%	86.16%	86.2%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 34.222.049.78	$ 88.529.108.483.77	$ 88.563.330.533.55

AVANCE ILUSTRADO




PROCESO DE INSTALACIÓN DE CAPA DE TIERRA NEGRA ABONADA 0,08m PARA LA CONFORMACIÓN DE CAPA ORGANICA PARA LA INSTALICÓN DE GRAMA EN CÉSPED.



INSTALACIÓN DE LOSETA TACTIL TIPO A50, A55 Y A56 SOBRE LA ESTRUCTURA CONTEMPLADA COMO SENDERO PEATONAL A LOS COSTADOS DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50



INSTALACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 0,03 m PARA LA POSTERIOR INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 (0,80x0,20x0,35) EL CUAL INCLUYE MORTERO DE PEGA

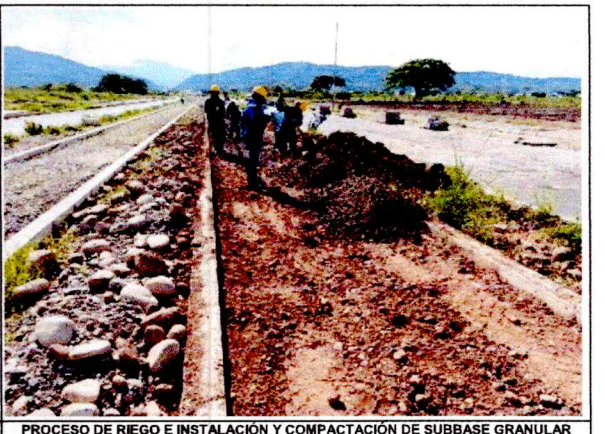

PROCESO DE RIEGO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TRITURADA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCUTRA DE SOPORTE EN LOS SENDEROS PEATONALES.

OBSERVACIONES	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
	YERLY CHAPARRO L	
	YERLY CHAPARRO LÓPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOEGE CASTELLANO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

acuatodos S.a E.S.P.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **11/08/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **123-124** Del: **28-jul-25** Al: **10-ago-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **867** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959.00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916.00
Valor Total:	$ 102.753.138.875.00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	1.17%	90.28%	91.46%
Valor de la Obra programada:	$ 1.203.025.175.08	$ 92.770.186.800.30	$ 93.973.211.975.37

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0.02%	86.19%	86.21%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 24.225.336.70	$ 88.563.330.533.55	$ 88.587.555.870.25

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Actividades realizadas:

1. Se continuó con la imprimación con emulsión asfáltica en la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46 y en la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

2. Se retoma la instalacion de Mezcla Asfaltca MDC-3 o 10 sobre la cicloruta ubicada sobre el separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46, La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

3.Se ejecutó la instalación de subbase granular triturada en la confromación de la estructura de las obras contempladas en el urbanismo de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, donde la interventoría verificó la correcta conformación de la capa, el espesor y la calidad del material, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los métodos constructivos aplicables.

4. Se continua con la instalación de bordillo prefabricado tipo A-80 (0,80 m x 0,20 m x 0,35 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoria verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.

5.Se continuó con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 × 40 × 6 cm) en los senderos peatonales, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación.

6.Se continuó la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

7.Se ejecutó la instalación de loseta táctil de alerta para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-55 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

8.Se continuó con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. La presente interventoría verificó el procedimiento de preparación del terreno y siembra, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

9. Se retomó la instalación de Sardinel prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoria verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

1. Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40, entre las calles 46 y calle 50. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

2. Se continuará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) sobre la calzada derecha de la carrera 40, entre las calle 46 y calle 50. Donde, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.

3. Se continuará con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 × 40 × 6 cm) en los senderos peatonales contemplado sobre el separador y los cotados de la carrera 40, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a especificaciones técnicas.

4.Se continuará con la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.

5.Se continuará con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. Por ello, la interventoría revisará la preparación del terreno y la siembra conforme a planos y especificaciones técnicas.

6.Se continuará con la instalación de Sardinel prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoria verificará la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

acuatodos s.a.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME**
			FECHA DEL INFORME
			11/08/2025

DATOS GENERALES

Semanas Número: **123-124** Del: **28-jul-25** Al: **10-ago-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **867** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959.00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916.00
Valor Total:	$ 102.753.138.875.00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	1.17%	90.28%	91.46%
Valor de la Obra programada:	$ 1.203.025.175.08	$ 92.770.186.800.30	$ 93.973.211.975.37

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0.02%	86.19%	86.21%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 24.225.336.70	$ 88.563.330.533.55	$ 88.587.555.870.25

AVANCE ILUSTRADO




PROCESO DE INSTALACIÓN DE CAPA DE TIERRA NEGRA ABONADA 0,08m PARA LA CONFORMACIÓN DE CAPA ORGANICA PARA LA INSTALICÓN DE GRAMA EN CÉSPED.



INSTALACIÓN DE LOSETA TACTIL TIPO A50 Y A56 SOBRE LA ESTRUCTURA CONTEMPLADA COMO SENDERO PEATONAL EN EL SEPARADOR DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50



INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 (0,80x0,20x0,50) EL CUAL INCLUYE MORTERO DE PEGA Y NIVELACIÓN DE 0.03m EN CAMA DE ARENA.

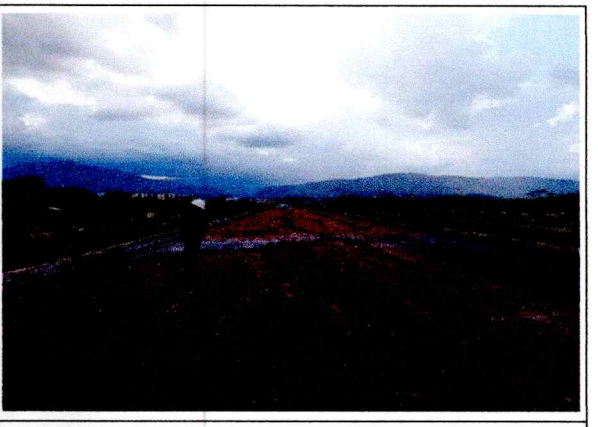

PROCESO DE RIEGO DE EMULSIÓN ASFALTICA SOBRE LA CAPA DE BASE GRANULAR PREVIAMENTE LIMPIA Y ADECUADA PARA EL RIEGO DEL MATERIAL BITUMINOSO.

OBSERVACIONES	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
	YERLY CHAPARRO L	
	YERLY CHAPARRO LÓPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOEGE CASTELLANO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

acuatodos S.A. E.S.P.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **25/08/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **125-126** Del: **11-ago-25** Al: **24-ago-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **881** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959.00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916.00
Valor Total:	$ 102.753.138.875.00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	2.34%	91.46%	93.80%
Valor de la Obra programada:	$ 2.406.050.350.15	$ 93.973.211.975.37	$ 96.379.262.325.53

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0.01%	86.21%	86.22%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 9.613.490.08	$ 88.587.555.870.25	$ 88.597.169.360.32

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Actividades realizadas:

1. Se continuó con la imprimación con emulsión asfáltica en la cicloruta ubicada en el separador de la carrera 40, entre las calles 40 y 46 y en la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

2. Se retoma la instalacion de Mezcla Asfaltca MDC-3 o 10 sobre la cicloruta ubicada sobre el separador de la carrera 40 entre calle 40 y calle 46, La presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

3.Se ejecutó la instalación de subbase granular triturada en la confromación de la estructura de las obras contempladas en el urbanismo de la carrera 40 entre calle 40 y calle 50, donde la interventoría verificó la correcta conformación de la capa, el espesor y la calidad del material, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los métodos constructivos aplicables.

4. Se continua con la instalación de bordillo prefabricado tipo A-80 (0,80 m x 0,20 m x 0,35 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoria verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.

5.Se continuó con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 × 40 × 6 cm) en los senderos peatonales, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación.

6.Se continuó la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

7.Se ejecutó la instalación de loseta táctil de alerta para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-55 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

8.Se continuó con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. La presente interventoría verificó el procedimiento de preparación del terreno y siembra, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

9. Se retomó la instalación de Sardinel prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoria verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

1. Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40, entre las calles 46 y calle 50. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

2. Se continuará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) sobre la calzada derecha de la carrera 40, entre las calle 46 y calle 50. Donde, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.

3. Se continuará con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 × 40 × 6 cm) en los senderos peatonales contemplado sobre el separador y los cotados de la carrera 40, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a especificaciones técnicas.

4.Se continuará con la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. Por ello, la interventoría revisará el procedimiento de instalación y nivelación conforme a planos y especificaciones técnicas.

5.Se continuará con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. Por ello, la interventoría revisará la preparación del terreno y la siembra conforme a planos y especificaciones técnicas.

6.Se continuará con la instalación de Sardinel prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoria verificará la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

acuatodos s.a.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **25/08/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **125-126** Del: **11-ago-25** Al: **24-ago-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **881** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:


Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959.00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916.00
Valor Total:	$ 102.753.138.875.00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	2.34%	91.46%	93.80%
Valor de la Obra programada:	$ 2.406.050.350.15	$ 93.973.211.975.37	$ 96.379.262.325.53

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0.01%	86.21%	86.22%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 9.613.490.08	$ 88.587.555.870.25	$ 88.597.169.360.32

AVANCE ILUSTRADO

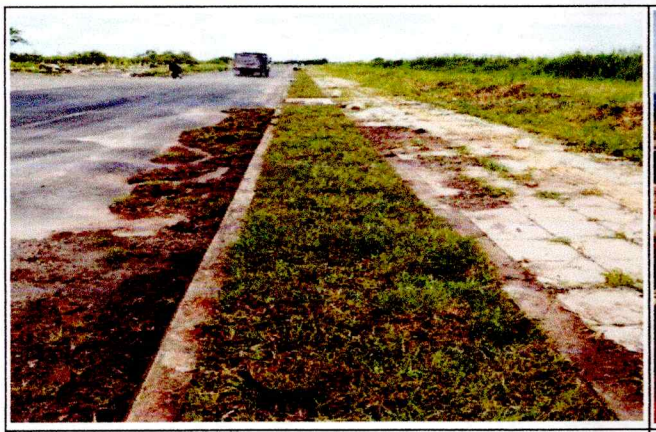

PROCESO DE INSTALACIÓN DE CAPA DE TIERRA NEGRA ABONADA 0,08m PARA LA CONFORMACIÓN DE CAPA ORGANICA PARA LA INSTALICÓN DE GRAMA EN CÉSPED.



INSTALACIÓN DE LOSETA TACTIL TIPO A50 Y A56 SOBRE LA ESTRUCTURA CONTEMPLADA COMO SENDERO PEATONAL EN EL SEPARADOR DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50



INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 (0,80x0,20x0,50) EL CUAL INCLUYE MORTERO DE PEGA Y NIVELACIÓN DE 0.03m EN CAMA DE ARENA.



PROCESO DE RIEGO DE EMULSIÓN ASFALTICA SOBRE LA CAPA DE BASE GRANULAR PREVIAMENTE LIMPIA Y ADECUADA PARA EL RIEGO DEL MATERIAL BITUMINOSO.

OBSERVACIONES	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
	YERLY CHAPARRO L	
	YERLY CHAPARRO LÓPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOEGE CASTELLANO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

acuatodos s.a.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **8/09/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **127-128** Del: **25-ago-25** Al: **7-sep-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **895** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959.00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916.00
Valor Total:	$ 102.753.138.875.00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	1.57%	93.80%	95.36%
Valor de la Obra programada:	$ 1.608.987.320.77	$ 96.379.262.325.53	$ 97.988.249.646.30

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0.03%	86.22%	86.26%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 33.554.971.43	$ 88.597.169.360.32	$ 88.630.724.331.76

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Actividades realizadas:

1. Se continuó con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50. Donde, la interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

2. Se continuó con la instalacion de Mezcla Asfaltca MDC-2 o 19 sobre la clazada derecha de la carrera 40 entre calle 46 y calle 50, Donde la presente interventoría realizó la verificación del procedimiento de instalacion, compactacion y temperatura, el cuales deben cumplir con lo requeridos por el diseño aprobado, especificaciones técnicas y metodos contructivos.

3.Se continuó con la instalación de loseta prefabricada gris tipo A-50 (40 × 40 × 6 cm) en los senderos peatonales, incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación.

4.Se continuó la instalación de loseta táctil guía para personas con discapacidad, en loseta prefabricada color A-56 (40 × 40 × 6 cm), incluyendo base de arena de nivelación de 4 cm y sello con arena fina. La presente interventoría verificó el procedimiento de instalación y nivelación, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

5.Se continuó con la conformación de zona verde, incluyendo la instalación de grama en césped sobre una capa de tierra negra abonada de 0,08 m de espesor. La presente interventoría verificó el procedimiento de preparación del terreno y siembra, los cuales deben cumplir con lo requerido por el diseño aprobado, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

6. Se continuó con la instalación de Sardinel prefabricado tipo A-10 (0,80 m x 0,20 m x 0,50 m), con mortero de pegue y nivelación de 0,03 m. Donde la interventoria verificó la correcta ubicación y nivel conforme a los diseños del proyecto.

1. Se retomó la instalación de subbase granular seleccionada en zonas de estructuras complementarias. La interventoría verificó granulometría, disposición y compactación conforme a los parámetros de diseño y estándares de calidad.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

1.Se continuará con la instalación de subbase granular seleccionada para conformar la estructura de soporte de las obras preliminares. La interventoría controlará la calidad del material y su cumplimiento con los parámetros de diseño.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

acuatodos S.A. E.S.P.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **8/09/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **127-128** Del: **25-ago-25** Al: **7-sep-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **895** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959,00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916,00
Valor Total:	$ 102.753.138.875,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA


	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	1.57%	93.80%	95.36%
Valor de la Obra programada:	$ 1.608.987.320,77	$ 96.379.262.325,53	$ 97.988.249.646,30

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0.03%	86.22%	86.26%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 33.554.971,43	$ 88.597.169.360,32	$ 88.630.724.331,76

AVANCE ILUSTRADO




PROCESO DE EXTENDIDO DE CAPA DE ARENA COMO SELLO DE JUNTA EN LA INSTALACIÓN DE LOSETAS EN LOS SENDEROS PEATONALES.

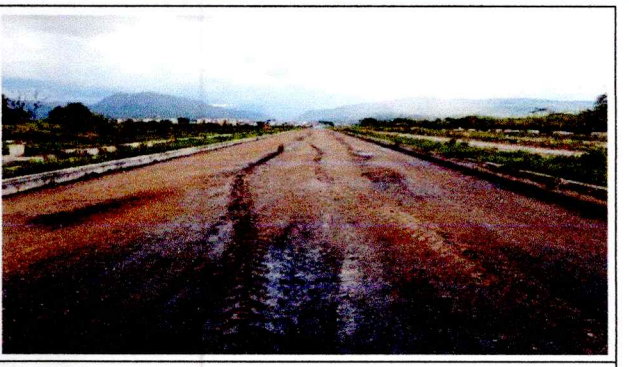

PROCESO DE RIEGO DE EMULSIÓN ASFALTICA SOBRE LA CAPA DE BASE GRANULAR PREVIAMENTE LIMPIA Y ADECUADA PARA EL RIEGO DEL MATERIAL BITUMINOSO.



PROCESO DE ADECUAMIENTO Y RIEGO DE SUBBASE GRANULAR SELECCIONADA O CLASIFICADA CON EQUIPO PESADO PARA LOGRAR UNA MEJOR CONFORMACIÓN DEL MATERIAL EN SITIO.

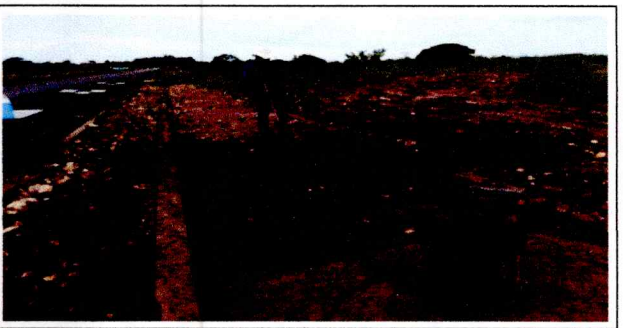

PROCESO DE RIEGO DE SUBBASE GRANULAR SELECCIONADA O CLASIFICADA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CAPA DE SOPORTE DE LAS LOS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS.

OBSERVACIONES	**CONSORCIO INTER NORORIENTAL**	**CONSORCIO INTER NORORIENTAL**
	YERLY CHAPARRO L	
	YERLY CHAPARRO LÓPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOEGE CASTELLANO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

acuatodos s.a.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **22/09/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **129-130** Del: **8-sep-25** Al: **21-sep-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **909** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959.00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916.00
Valor Total:	$ 102.753.138.875.00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	0.79%	95.36%	96.15%
Valor de la Obra programada:	$ 811.924.291.38	$ 97.988.249.646.30	$ 98.800.173.937.68

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0.05%	86.26%	86.31%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 47.882.962.72	$ 88.630.724.331.76	$ 88.678.607.294.47

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Actividades realizadas:

1. Se retomó la instalación de subbase granular seleccionada en zonas de estructuras complementarias. La interventoría verificó granulometría, disposición y compactación conforme a los parámetros de diseño y estándares de calidad.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

1.Se continuará con la instalación de subbase granular seleccionada para conformar la estructura de soporte de las obras preliminares. La interventoría controlará la calidad del material y su cumplimiento con los parámetros de diseño.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

AVANCE ILUSTRADO



PROCESO DE EXTENDIDO DE SUBBASE GRANULAR SELECCIONADA O CLASIFICADA CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER LA CAPA DE SOPORTE PARA EL SENDERO PEATONAL PREVISTO EN EL COSTADO DERECHO DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50.



PROCESO DE RIEGO DE SUBBASE GRANULAR SELECCIONADA O CLASIFICADA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CAPA DE SOPORTE DEL SENDERO PEATONAL PREVISTO SOBRE EL SEPARADOR DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50

acuatodos s.a.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME**
			FECHA DEL INFORME
			22/09/2025

DATOS GENERALES

Semanas Número: **129-130** Del: **8-sep-25** Al: **21-sep-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **909** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959.00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916.00
Valor Total:	$ 102.753.138.875.00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	0.79%	95.36%	96.15%
Valor de la Obra programada:	$ 811.924.291.38	$ 97.988.249.646.30	$ 98.800.173.937.68

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0.05%	86.26%	86.31%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 47.882.962.72	$ 88.630.724.331.76	$ 88.678.607.294.47



PROCESO DE ADECUAMIENTO Y RIEGO DE SUBBASE GRANULAR SELECCIONADA O CLASIFICADA PARA CONFORMAR LA CAPA DE SOPORTE DE LA ESTRUCTURA DEFINIDA PARA LA CICLO RUTA PREVISTA SOBRE EL SEPARADOR DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50



PROCESO DE RIEGO DE SUBBASE GRANULAR SELECCIONADA O CLASIFICADA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CAPA DE SOPORTE DEL SENDERO PEATONAL PREVISTO SOBRE EL SEPARADOR DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50

OBSERVACIONES	**CONSORCIO INTER NORORIENTAL**	**CONSORCIO INTER NORORIENTAL**
	YERLY CHAPARRO L	
	YERLY CHAPARRO LÓPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOEGE CASTELLANO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

acuatodos s.a.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME**
			FECHA DEL INFORME
			6/10/2025

DATOS GENERALES

Semanas Número: **131-132** Del: **22-sep-25** Al: **5-oct-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **923** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959,00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916,00
Valor Total:	$ 102.753.138.875,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	0,53%	96,15%	96,68%
Valor de la Obra programada:	$ 542.564.761,81	$ 98.800.173.937,68	$ 99.342.738.699,49

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0,03%	86,31%	86,34%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 35.741.263,68	$ 88.678.607.294,47	$ 88.714.348.558,15

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Actividades realizadas:

1. Se continua con el proceso de instalación de subbase granular seleccionada en zonas de estructuras complementarias con la finalidad conformar la estrucutra de soporte de dichas estrucutras tales como senderos peatonales y cicloruta. Por consiguiente, la interventoría verificó la granulometría del material, su disposición y compactación en campo conforme a los parámetros de diseño y estándares de calidad.

2. Se retomó la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) en la calzada derecha de la carrera 40, entre calles 46 y 50. Se verificó temperatura, compactación y cumplimiento técnico del material instalado.

3. Se retomó la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40, entre las calles 46 y 50. Donde la interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

1.Se continuará con la instalación de subbase granular seleccionada para conformar la estructura de soporte de las obras preliminares. La interventoría controlará la calidad del material y su cumplimiento con los parámetros de diseño.

3. Se continuará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) sobre la calzada derecha de la carrera 40, entre las calle 46 y calle 50. Donde, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

AVANCE ILUSTRADO



PROCESO DE RIEGO DE SUBBASE GRANULAR SELECCIONADA O CLASIFICADA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CAPA DE SOPORTE DEL SENDERO PEATONAL PREVISTO SOBRE EL SEPARADOR DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50



PROCESO DE COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR SELECCIONADA O CLASIFICADA CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER LA CAPA DE SOPORTE PARA EL SENDERO PEATONAL PREVISTO EN EL COSTADO DERECHO DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50.

acuatodos s.a.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **6/10/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **131-132** Del: **22-sep-25** Al: **5-oct-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **923** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959,00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916,00
Valor Total:	$ 102.753.138.875,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	0,53%	96,15%	96,68%
Valor de la Obra programada:	$ 542.564.761,81	$ 98.800.173.937,68	$ 99.342.738.699,49

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0,03%	86,31%	86,34%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 35.741.263,68	$ 88.678.607.294,47	$ 88.714.348.558,15



PROCESO DE INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA MDC-19 (TIPO 2) SOBRE LA CALDAZADA DERECHA DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 46 A LA CALLE 50.



PROCESO DE RIEGO DE EMULSIÓN ASFALTICA SOBRE LA CAPA DE BASE GRANULAR PREVIAMENTE LIMPIA Y ADECUADA PARA EL RIEGO DEL MATERIAL BITUMINOSO.

OBSERVACIONES	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
	YERLY CHAPARRO L	
	YERLY CHAPARRO LÓPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOEGE CASTELLANO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

acuatodos s.a.	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME** **FECHA DEL INFORME** **20/10/2025**

DATOS GENERALES

Semanas Número: **133-134** Del: **6-oct-25** Al: **19-oct-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **937** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959,00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916,00
Valor Total:	$ 102.753.138.875,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026

AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	0,00%	96,68%	96,68%
Valor de la Obra programada:	$ 3.845.702,67	$ 99.342.738.699,49	$ 99.346.584.402,16

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0,01%	86,34%	86,35%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 11.609.520,89	$ 88.714.348.558,15	$ 88.725.958.079,04

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Actividades realizadas:

1. Se continua con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) en la calzada derecha de la carrera 40, entre calles 46 y 50. Se verificó temperatura, compactación y cumplimiento técnico del material instalado.

2. Se continua con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40, entre las calles 46 y 50. Donde la interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

1. Se continuará con la imprimación con emulsión asfáltica en la calzada derecha de la carrera 40, entre las calles 46 y calle 50. La interventoría verificó que la aplicación se realizara conforme al diseño, las especificaciones técnicas y los métodos constructivos establecidos.

2. Se continuará con la instalación de mezcla asfáltica MDC-2 (tipo 19) sobre la calzada derecha de la carrera 40, entre las calle 46 y calle 50. Donde, la interventoría verificará temperatura, compactación y parámetros del diseño.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

AVANCE ILUSTRADO



PROCESO DE INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA MDC-19 (TIPO 2) SOBRE LA CALDAZADA DERECHA DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 46 A LA CALLE 50.



PROCESO DE SELLADO DE LA CAPA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ARENA LAVADA DE RÍO, CON EL FIN DE PROTEGER LA CAPA IMPRIMADA DE AGENTES EXTERNOS QUE PUEDAN ALTERAR SU ADHERENCIA O CONDICIÓN SUPERFICIAL

acuatodos s.a. esp	**REPORTE QUINCENAL INTERVENTORIA**	**Consorcio Inter Nororiental**	**INFORME**
			FECHA DEL INFORME
			20/10/2025

DATOS GENERALES

Semanas Número: **133-134** Del: **6-oct-25** Al: **19-oct-25**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **937** días

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Contrato No.	130.20.10.044 DE 2022
Valor:	$ 80.000.059.959,00
Valor Adicional:	$ 22.753.078.916,00
Valor Total:	$ 102.753.138.875,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Plazo Adicional:	VENTICUATRO (24) MESES
Plazo Actual:	VEINTICUATRO (32) MESES
Fecha de Iniciación:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Reinicio:	13 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Susp No. 2:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación Actual:	27 DE MARZO DE 2026


AVANCE DE OBRA

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%)	0,00%	96,68%	96,68%
Valor de la Obra programada:	$ 3.845.702,67	$ 99.342.738.699,49	$ 99.346.584.402,16

	QUINCENAL	ACUMULADO PERIODOD ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0,01%	86,34%	86,35%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 11.609.520,89	$ 88.714.348.558,15	$ 88.725.958.079,04



PROCESO DE RIEGO DE EMULSIÓN ASFALTICA SOBRE LA CAPA DE BASE GRANULAR PREVIAMENTE LIMPIA Y ADECUADA PARA EL RIEGO DEL MATERIAL BITUMINOSO.

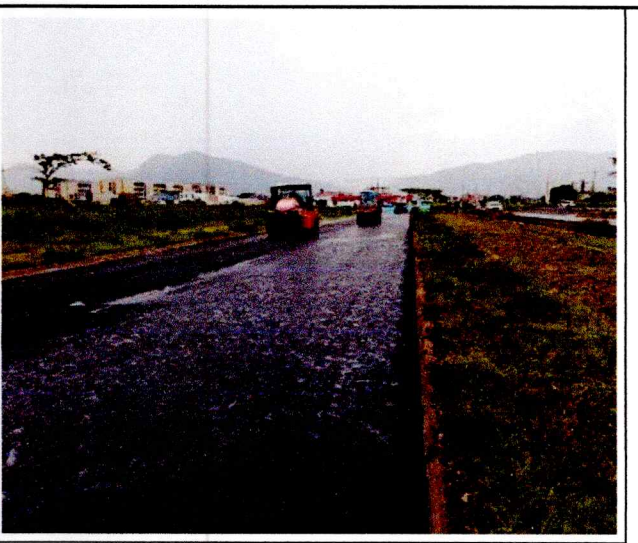

PROCESO DE INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA MDC-19 (TIPO 2) SOBRE LA CALDAZADA DERECHA DE LA CARRERA 40 ENTRE CALLE 46 A LA CALLE 50.

OBSERVACIONES	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
	YERLY CHAPARRO L	
	YERLY CHAPARRO LÓPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOEGE CASTELLANO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.7			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			22	11	2025
PERIODO DEL	16/03/2025	16/11/2025	DD	MM	AA

ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD

Consorcio Inter Nororiental

			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.7			046 - 2022		
			22	11	2025
PERIODO DEL	16/03/2025	16/11/2025	DD	MM	AA

5.0 INFORME FINANCIERO - CONTABLE

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.7			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			22	11	2025
PERIODO DEL	**16/03/2025**	**16/11/2025**	**DD**	**MM**	**AA**

5.1 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR CONTRATADO	VALOR ACTAS	VALOR GIROS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 102.753.138.875,00		
VALOR ANTICIPO TOTAL 50%			$ 51.376.569.437,50
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1		$ 32.011.194.291,00	$ 16.005.597.145,50
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2		$ 1.959.450.458,00	$ 979.725.229,00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3		$ 27.706.798.151,00	$ 13.853.399.075,50
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.4		$ 14.196.045.331,00	$ 7.098.022.665,50
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5		$ 3.238.703.221,00	$ 1.619.351.610,50
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.6		$ 8.010.725.106,00	$ 4.005.362.553,00
PRESENTE ACTA		$ 2.294.276.532,50	$ 1.147.138.266,25
VALOR POR FACTURAR		$ 13.335.945.784,50	
VALOR PENDIENTE POR GIRAR			$ 6.667.972.892,25
TOTAL	**$ 102.753.138.875,00**	**$ 102.753.138.875,00**	**$ 102.753.138.875,00**

El balance financiero indica que el valor total contratado corresponde a $ 102.753.138.875,00 del cual se ha girado la suma de $ 94.938.027.716,50 equivalente a un (93,51%) del monto aprobado, discriminado de la siguiente manera:

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.7			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			22	11	2025
PERIODO DEL	**16/03/2025**	**16/11/2025**	**DD**	**MM**	**AA**

*Giro del anticipo por $51.376.569.437,50 equivalente al 50% del valor total del contrato de obra.

*Valor girado en el Acta de Recibo Parcial de Obra No.1 por un monto de $ 16.005.597.145,50 teniendo en cuenta que el resto fue amortizado del valor del anticipo.

*Valor girado en el Acta de Recibo Parcial de Obra No.2 por un monto de $ 979.725.229,00 teniendo en cuenta que el resto fue amortizado del valor del anticipo.

*Valor girado en el Acta de Recibo Parcial de Obra No.3 por un monto de $ 13.853.399.075,50 teniendo en cuenta que el resto fue amortizado del valor del anticipo.

*Valor girado en el Acta de Recibo Parcial de Obra No.4 por un monto de $ 7.098.022.665,50 teniendo en cuenta que el resto fue amortizado del valor del anticipo.

*Valor girado en el Acta de Recibo Parcial de Obra No.5 por un monto de $ 1.619.351.610,50 teniendo en cuenta que el resto fue amortizado del valor del anticipo.

*Valor girado en el Acta de Recibo Parcial de Obra No.6 por un monto de $ 4.005.362.553,00 teniendo en cuenta que el resto fue amortizado del valor del anticipo.

*Valor girado en el Acta de Recibo Parcial de Obra No.7 por un monto de $ 1.147.138.266,25 teniendo en cuenta que el resto fue amortizado del valor del anticipo.

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.7			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			22	11	2025
PERIODO DEL	16/03/2025	16/11/2025	DD	MM	AA

5.2 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO INICIAL			
No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	
		VALOR	%
1	COMPRA DE MATERIALES	$ 24.000.017.987,70	60,00%
2	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 8.000.005.995,90	20,00%
3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 4.000.002.997,95	10,00%
4	MANO DE OBRA	$ 4.000.002.997,95	10,00%
TOTAL		**$ 40.000.029.979,50**	100,00%

VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$ 40.000.029.979,50

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ADICIONAL			
No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	
		VALOR	%
1	COMPRA DE MATERIALES	$ 6.825.923.674,80	60,00%
2	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 2.275.307.891,60	20,00%
3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 1.137.653.945,80	10,00%
4	MANO DE OBRA	$ 1.137.653.945,80	10,00%
TOTAL		**$ 11.376.539.458,00**	100,00%

VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$ 11.376.539.458,00

Consorcio Inter Nororiental

INFORME RECIBO PARCIAL DE OBRA No.7			CONTRATO DE INTERVENTORÍA 046 - 2022		
			22	11	2025
PERIODO DEL	16/03/2025	16/11/2025	DD	MM	AA

5.3 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

DESCRIPCIÓN	VALOR	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	102.753.138.875,00
VALOR DEL ANTICIPO INICIAL 50%	$	51.376.569.437,50

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1	$ 16.005.597.145,50	31,15%
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2	$ 979.725.229,00	1,91%
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3	$ 13.853.399.075,50	26,96%
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.4	$ 7.098.022.665,50	13,82%
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.5	$ 1.619.351.610,50	3,15%
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.6	$ 4.005.362.553,00	7,80%
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.7 (PRESENTE ACTA)	$ 1.147.138.266,25	2,23%
VALOR AMORTIZADO	**$ 44.708.596.545,25**	**87,02%**
SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	**$ 6.667.972.892,25**	**12,98%**

Considerando que, el 06 de octubre de 2023, se suscribió el Otro sí de Adición y Prórroga No.1 en el cual se estableció entregar el 50% del valor adicionado como un segundo anticipo al contrato de Obra, la amortización del anticipo corresponde a los dos valores mencionados anteriormente, cuyo monto total es de $ 51.376.569.437,50.

En ese orden de ideas, en la ejecución del contrato de obra se han suscrito 7 actas parciales, de las cuales el valor del anticipo amortizado es el siguiente: En el Acta de Recibo Parcial de Obra No.1 corresponde a la suma de $16.005.597.145,50 (31,15%); En el Acta de Recibo Parcial de Obra No.2 se amortizaron $979.725.229,00 (1,91%); En el Acta de Recibo Parcial de Obra No.3 se amortizaron la suma de $13.853.399.075,50 (26,96%); En el Acta de Recibo Parcial de Obra No.4 se amortizaron $7.098.022.665,50 (13,82%); En el Acta de Recibo Parcial de Obra No.5 se amortizaron $1.619.351.610,50 (3,15%); en el Acta de Recibo Parcial de Obra No.6 se amortizaron $4.005.362.553,25 (7.80%) y en el en el Acta de Recibo Parcial de Obra No.7 presente acta se amortizaron $1.147.138.266,25 (2,23%) para un total amortizado de $44.708.596.545,00 (87,02%) del anticipo total, quedando por amortizar $6.667.972.892,25 (12,98%)
