
AC2R INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S.
NIT. 830.123.577-7

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
1826-2019

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS DE APANTALLAMIENTO, PUESTA A TIERRA, TABLEROS, ACOMETIDAS Y DETECCIÓN DE INCENEDIO EN LA SEDE CALLE 13 DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD"

ELABORO	REVISO	APROBO
I.E. RICARDO OSPINA	I.C. CAMILO ROSARIO	DR. PAOLA A. CORONA
		

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
DEL 1 FEBRERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 No. 02
BOGOTÁ D.C. 2020

CARRERA 71A No. 52A – 17
PBX : 2109456 / 311 353 13 84 / 9602297
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

CONTENIDO

1. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3
2. ASPECTO ADMINISTRATIVO 3
1.2 ASPECTO JURÍDICO 3
1.3 RECURSOS UTILIZADOS INTERVENTORÍA 4
1.3.1 TRABAJOS EJECUTADOS 4
1.3.1.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD 4
1.3.1.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA AL CONSORCIO CONEXION TEMPORAL (CORREO ELECTRONICO) 5
1.3.1.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA 6
ANEXO 1. PRESUPUESTO APROBADO Y VALOR EJECUTADO 8
ANEXO 2. VALIDACIÓN SOPORTES GESTION AMBIENTAL CONTRATISTA Y DOCUMENTACION HSE 9
ANEXO 3. VALIDACIÓN CERTIFICADOS DE PRODUCTO 10
ANEXO 4. APROBACION DE IMPREVISTOS 11

1. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA	12 de agosto de 2020	PERIODO No.	2	DEL	**01/002/2020**	DEL	**29/002/2020**

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE BRA CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS DE APANTALLAMIENTO, PUESTA A TIERRA, TABLEROS, ACOMETIDAS Y DETECCIÓN DE INCENEDIO EN LA SEDE CALLE 13 DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD"
LOCALIZACION DEL PROYECTO	SECRETARIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C. – SEDE CALLE 13

CONTRATO DE INTERVENTORIA			
AC2R INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S. NIT. 830.123.577-7 ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO CC. 80.228.570 CARRERA 71A #52A -17 Bogotá +57 (1) 2 109456 – 311 353 1384 ac2ringenieria@gmail.com			
CONTRATO No. DE	N° 1826 de 2019		
FECHA DE SUSCRIPCION:	29 de noviembre de 2019		
PLAZO INICIAL:	5 meses		
FECHA DE INICIACIÓN:	09 de diciembre de 2019		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	9 de mayo de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO TOTAL	82 días	EQUIVALE AL	53.9%
VALOR INICIAL:	$73.726.450,00		
VALOR ACTUALIZADO:	$73.726.450,00		
VALOR ACTA No.1:	$10.068.341		
VALOR ACTA No.2:	$1.651.045		
VALOR POR PAGAR:	$62.007.064		

2. ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS ELABORADAS	
ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	09/011/2019
ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

1.2 ASPECTO JURÍDICO

LEGALIZACION DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. 1826 de 2019	29/11/2019
OTRO SI MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA

POLIZAS INICIALES					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/11/2019	29/04/2021	$14.475.290	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	29/04/2020	29/04/2021	$14.475.290	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/11/2019	29/04/2023	$7.372.645	APROBADO

1.3 RECURSOS UTILIZADOS INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona el personal utilizado.

ÍTEM	CARGO	NOMBRE	CEDULA
1	Director de Interventoría	Ricardo Ospina	75.091.899
2	Residente de Interventoría	Jhon Fredy Giraldo Noreña	75.090.700

1.3.1 TRABAJOS EJECUTADOS

1.3.1.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
FECHA	OFICIO	ASUNTO	DESTINATARIO	RADICACION N°
04/002/2020	Comunicado email	Actas SDM	jguerrero@movilidadbogota.gov.co	Email
07/002/2020	Comunicado email	Personal nuevo	jguerrero@movilidadbogota.gov.co	Email
10/002/2020	Oficio revisión presupuesto SDM	Revisión N.P. balance proyecto SDM	proyectos@wrussyingenieros.com jguerrero@movilidadbogota.gov.co	Email
17/002/2020	Comunicado email	Documentos para visita puntos de anclaje	jguerrero@movilidadbogota.gov.co	Email
18/002/2020	Comunicado email	Autorización ingreso inspector SISO	jguerrero@movilidadbogota.gov.co	Email
21/002/2020	Oficio No. 10	Copia oficio perdida equipo enfermería	jguerrero@movilidadbogota.gov.co	Email

1.3.1.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA AL CONSORCIO CONEXION TEMPORAL (CORREO ELECTRONICO)

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR CORREO ELECTRONICO				
FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONSORCIO	REMITE
11-002-2020	Documentos para cuentas	proyectos@wrussyingenieros.com	CONEXIÓN NACIONAL	I.E. JHON F. GIRALDO
11-002-2020	Corte de obra para revisión	proyectos@wrussyingenieros.com	CONEXIÓN NACIONAL	I.E. JHON F. GIRALDO
13-002-2020	Finalización ingeniería detalle	proyectos@wrussyingenieros.com	CONEXIÓN NACIONAL	I.E. JHON F. GIRALDO
13-002-2020	Solicitud comprobante de pago carro dañado	proyectos@wrussyingenieros.com	CONEXIÓN NACIONAL	I.E. JHON F. GIRALDO
14-002-2020	Suspensión temporal de actividades contrato por falta de personal SISO	proyectos@wrussyingenieros.com	CONEXIÓN NACIONAL	I.E. JHON F. GIRALDO
17-002-2020	Mov bog ajuste planos unifilares	Afg2jacolec@gmail.com	CONEXIÓN NACIONAL	I.E. JHON F. GIRALDO
20-002-2020	Sin asunto	proyectos@wrussyingenieros.com	CONEXIÓN NACIONAL	I.E. JHON F. GIRALDO
20-002-2020	Solicitud ingreso personal secretaria de movilidad Febrero	proyectos@wrussyingenieros.com	CONEXIÓN NACIONAL	I.E. JHON F. GIRALDO
20-002-2020	MEMO	Afg2jacolec@gmail.com	CONEXIÓN NACIONAL	I.E. JHON F. GIRALDO
20-002-2020	Sin asunto	Afg2jacolec@gmail.com	CONEXIÓN NACIONAL	I.E. JHON F. GIRALDO
20-002-2020	Revisión Oficio_004MOV_BOG ingeniería detalle	proyectos@wrussyingenieros.com	CONEXIÓN NACIONAL	I.E. JHON F. GIRALDO
21-002-2020	Solicitud plano de cubierta	proyectos@wrussyingenieros.com	CONEXIÓN NACIONAL	I.E. JHON F. GIRALDO
26-002-2020	Fichas técnicas aires Supercade	coviedo@endeco-com.co Afg2jacolec@gmail.com	CONEXIÓN NACIONAL	I.E. JHON F. GIRALDO

1.3.1.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1826	PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL
	53.9%

CONTRATO No.	N° 1826 de 2019
FECHA DE SUSCRIPCION:	29 de noviembre de 2019
PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	9 de diciembre de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	9 de mayo de 2020
FECHA DE FIRMA DE ADICION No1:	N/A
PLAZO ACTUALIZADO DE TERMINACION:	9 de mayo de 2020
VALOR INICIAL:	$73.726.450,00
VALOR ADICION(ES):	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$73.726.450
VALOR PAGADO AL ACTA No.2:	$11.719.386
VALOR POR PAGAR:	$62.007.064

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Validación actividades no previstas presentadas por el contratista.


Validación de actividades ejecutadas correspondientes a la ejecución del sistema de protección contra descargas atmosféricas.

Pendiente por respuesta de la entidad respecto a ejecución de anclajes en algunos sectores de la cubierta para poder ejecutar las actividades de manera segura.

Validación de pases en muros, regatas y construcción de cajas de inspección para el sistema de puesta a tierra del sistema de protección contra descargas atmosféricas.


PERIODO DEL 1 AL 9 DE FEBRERO



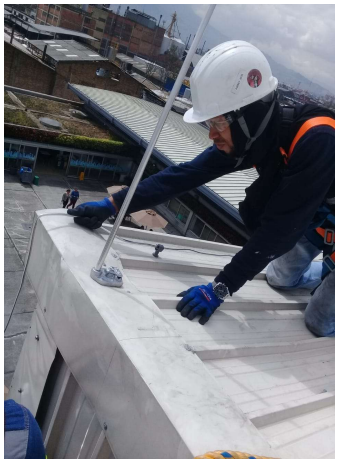


Contratista ejecuta anclajes y comienza tendido de alambrón SIPRA. Se valida conformidad de productos empleados.

PERIODO DEL 10 AL 16 DE FEBRERO

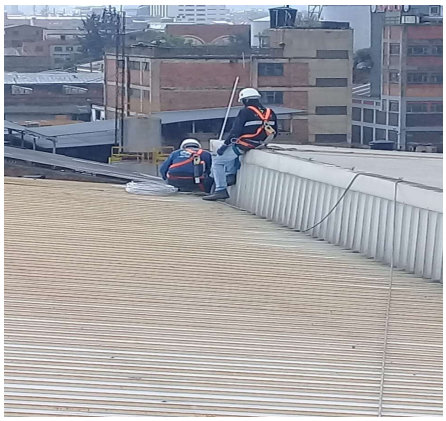

Contratista da continuidad a la ejecución de anclajes y tendido de alambrón SIPRA.

PERIODO DEL 17 AL 23 DE FEBRERO

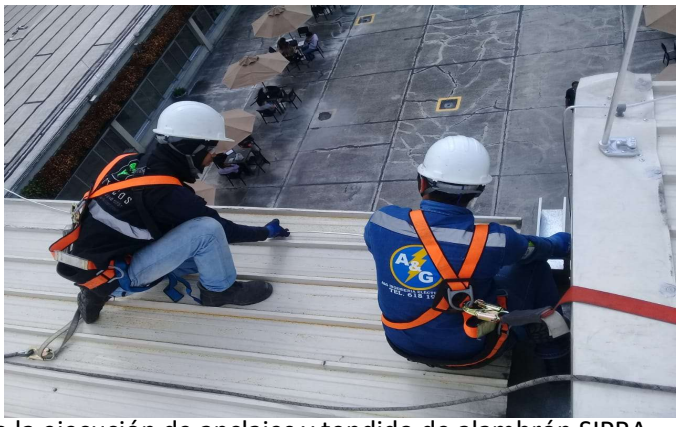

Contratista da continuidad a la ejecución de anclajes y tendido de alambrón SIPRA.

PERIODO DEL 24 AL 29 DE FEBRERO



Contratista da continuidad a la ejecución de anclajes, tendido de alambrón SIPRA, se comienza actividad de construcción cajas de inspección e instalación de electrodos para el Sistema de puesta a tierra.

ANEXO 1. PRESUPUESTO APROBADO Y VALOR EJECUTADO

RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA	12 de agosto de 2020	PERIODO No.	2	DEL	**01/002/2020**	DEL	**29/002/2020**

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS DE APANTALLAMIENTO, PUESTA A TIERRA, TABLEROS, ACOMETIDAS Y DETECCIÓN DE INCENDIOS EN LA SEDE CALLE3 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
LOCALIZACION DEL PROYECTO	SECRETARIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C. – SEDE CALLE 13

CONTRATO DE OBRA			
WRUSSY INGENIERIOS S.A.S NIT. 899.999.061-9 ING. WILVER RUSSY CC. 80.228.570 CALLE 8F #79-94 Bogotá +57 (1) 411 1513 – 313 860 0819 ingwilver@hotmail.com			
CONTRATO No. DE	N° 1797 de 2019		
FECHA DE SUSCRIPCION:	29 de noviembre de 2019		
PLAZO INICIAL:	5 meses		
FECHA DE INICIACIÓN:	09 de diciembre de 2019		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	9 de mayo de 2019		
PLAZO TRANSCURRIDO TOTAL	53 días	EQUIVALE AL	25%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	13,7%		
VALOR INICIAL:	$ 647.812.627		
VALOR ACTUALIZADO:	N/A		
VALOR ACTA No.1:	$ 88.467.549		
VALOR ACTA No.2:	$ 14.507.243		
VALOR POR PAGAR:	$ 544.837.836		

ANEXO 2. VALIDACIÓN SOPORTES GESTION AMBIENTAL CONTRATISTA Y DOCUMENTACION HSE

CARRERA 71A No. 52A – 17
PBX : 2109456 / 311 353 13 84 / 9602297
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

ANEXO 3. VALIDACIÓN CERTIFICADOS DE PRODUCTO

ANEXO 4. APROBACION DE IMPREVISTOS

CARRERA 71A No. 52A – 17
PBX : 2109456 / 311 353 13 84 / 9602297
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
