Nit: 900263189- 6
Dirección: Cra. 5 Calle 6 Edif. Mpal.
Teléfono: 6088382453
e-mail: gerencia@emseralsaespalgeciras.gov.co

Algeciras 3 de Diciembre del 2025.

Doctor
ALEXANDER MARTINEZ BALLESTEROS
Alcalde Municipal de Algeciras
Ingeniero
GEMPLER HERNÁN CORTES FARFÁN
Secretario de Planeación, Infraestructura y Obras Públicas
Algeciras - Huila

REF. **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 039 DE 2025**

Cordial saludo,

El suscrito gerente de Las Empresas Publicas de Algeciras EMSERAL S.A. E.S.P. por medio de la presente se permite presentar Plan de Inversiones del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 039 DE 2025 de **"AUNAR ESFUERZOS JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TECNÍCOS Y ECONOMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FASE I DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO CIUDADELA 20 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO DE HUILA"**. en los siguientes términos:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. °:	**039**	**DE: 2025**	**10 DE SEPTIEMBRE**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"AUNAR ESFUERZOS JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TECNÍCOS Y ECONOMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FASE I DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO CIUDADELA 20 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO DE HUILA"**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025PARÁGRAFO: El Convenio se considera vigente desde su legalización hasta la liquidación.		
VALOR DEL CONTRATO:	MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($1.323.238.739,00) M/CTE		
APORTE DEL MUNICIPIO	MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($1,119,806,049.62) M/CTE		
APORTE DE EMSERAL S.A. E.S.P.	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/CTE APORTE DE EMSERAL ESP en bienes y servicios que comprenden los costos operativos, logísticos y administrativos para apoyar, las diferentes actividades requeridas para cumplir con el objeto convenido. conforme a certificado de aportes y CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($178,432,689,38) M/CTE. Correspondiente a mano de obra no calificada		
VALOR DEL ANTICIPO:	**QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL VEINTICUATRO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS DE PESOS M/CTE ($559.903.024,81)**		
CONTRATISTA:	EMSERAL S.A. E.S.P.		
NIT:	900263189-6		

Nit: 900263189- 6
Dirección: Cra. 5 Calle 6 Edif. Mpal.
Teléfono: 6088382453
e-mail: gerencia@emseralsaespalgeciras.gov.co


emseral sa esp

En la siguiente tabla liste los ítems en los cuales se programa invertir el anticipo:

PROGRAMA DE INVERSION DEL ANTICIPO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039 DE 2025													
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 – REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO 20 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, HUILA"													
CONTRACTUAL								ANTICIPO					
ITEM	APU	DESRIPCIÓN	UND	CANT	VR/UNT.	VR/ TOTAL	(%) UNIT.	CANT.	PORCENTAJE (%)	VALOR	FECHA INICIO	DURACIÓN EN DIAS	FECHA FIN
1.1.1	APU 1.1.1	REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS	ML	3.093,220	$4.705	$14.554.590,00000	1,10	3.093,22	1,10	$14.554.590,00	8/11/25	2,00	10/11/25
1.1.2	APU 1.1.2	DESCAPOTE MANUAL TERRENO MAT. CONGLOMERADO	M2	328,870	$17.699	$5.820.742,00000	0,44	328,870	0,44	$5.820.742,00	10/11/25	4,00	14/11/25
1.1.3	APU 1.1.3	DESCAPOTE A MÁQUINA E=0.20M	M2	1.863,585	$8.510	$15.858.903,00000	1,20	1.863,585	1,20	$15.858.903,00	14/11/25	3,00	17/11/25
1.3.1	APU 1.3.1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	420,870	$31.864	$13.410.467,00000	1,01	201,12	0,48	$6.408.423,00	17/11/25	5,00	22/11/25
1.3.3	APU 1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHON DE GRAVA Y TRITURADO PARA DESCANSO DE TUBERÍA.	M3	72,215	$359.669	$25.973.519,00000	1,96	48,143669806014 4	1,31	$17.315.800,50	22/11/25	1,00	23/11/25
1.6.1	APU 1.6.1	ENTIBADO DISCONTINUO TIPO ED1, PARA CONTROL EN PROFUNDIDAD ENTRE 1.50 Y 2.50 METROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	309,320	$35.213	$10.892.215,00000	0,82	154,66	0,41	$5.446.108,00	23/11/25	2,00	25/11/25
1.5.1	APU 1.5.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD D=8".	ML	2.788,920	$89.564	$249.787.751,00000	18,88	2.788,920	18,88	$249.787.751,00	25/11/25	2,00	27/11/25
1.5.2	APU 1.5.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD D=10".	ML	608,600	$129.686	$78.926.717,00000	5,96	608,600	5,96	$78.926.717,00	25/11/25	2,00	27/11/25
1.8.3.3	APU 1.8.3.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD D=6".	ML	1.054,000	$81.594	$86.000.592,00000	6,50	1.054,000	6,50	$86.000.592,00	25/11/25	2,00	27/11/25
1.8.3.4	APU 1.8.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE D =6".	UN	176,000	$197.656	$34.787.368,00000	2,63	88,000	1,31	$17.393.684,00	25/11/25	2,00	27/11/25
1.3.5	APU 1.3.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE BASE. COMPACTADA. MATERIAL SELECCIONADO. INCLUYE ACARREO LIBRE	M3	172,325	$312.113	$53.784.923,00000	4,06	86,163	2,03	$26.892.461,00	27/11/25	2,00	29/11/25
1.3.6	APU 1.3.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE SUB-BASE. COMPACTADA. MATERIAL SELECCIONADO. INCLUYE ACARREO LIBRE	M3	172,325	$237.498	$40.926.874,00000	3,09	86,1625	1,55	$20.463.437,00	29/11/25	2,00	1/12/25
1.7.2	APU 1.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT2100	M2	108,570	$10.712	$1.162.958,00000	0,09	54,285	0,04	$581.479,00	1/12/25	2,00	3/12/25
1.7.6	APU 1.7.6	SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 60000PSI 420MPa	KG	5.764,680	$9.836	$56.702.257,00000	4,29	5.764,680	4,29	$56.702.257,00	3/12/25	1,00	4/12/25
1.3.2	APU 1.3.2	EXCAVACION MECANICA MATERIAL COMUN. INCLUYE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	3.787,815	$31.856	$120.663.763,00000	9,12		0,00	$0,00			
1.3.4	APU 1.3.4	AFIRMADO CON MATERIAL CRUDO DE RÍO T. MAX 3"	M3	1,530	$253.693	$388.150,00000	0,03		0,00	$0,00			
1.3.7	APU 1.3.7	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	3.791,815	$22.374	$84.837.235,00000	6,41		0,00	$0,00			
1.3.8	APU 1.3.8	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	M3	1.262,605	$18.553	$23.424.492,00000	1,77		0,00	$0,00			
1.4.1	APU 1.4.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD D=8".	ML	2.788,920	$14.112	$39.358.522,00000	2,97		0,00	$0,00			
1.4.2	APU 1.4.2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD D=10".	ML	608,600	$14.795	$9.004.383,00000	0,68		0,00	$0,00			
1.7.1	APU 1.7.1	SOLADO EN CONCRETO DE 14MPA (2000PSI) E=0.05M	M2	63,620	$33.426	$2.126.562,00000	0,16		0,00	$0,00			
1.7.3	APU 1.7.3	CARGUE PARA POZO DI=1.20M E=0.15M	UN	36,000	$437.358	$15.744.900,00000	1,19		0,00	$0,00			
1.7.4	APU 1.7.4	PLACA DE FONDO PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO DE f'c=28MPa (4000 PSI), Ø = 1.50M, E=0.20M Y IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE (FUNDIDA EN SITIO) (NO INC. ACERO DE REFUERZO)	UN	36,000	$265.860	$9.570.969,00000	0,72		0,00	$0,00			
1.7.5	APU 1.7.5	CUERPO CUERPO CÁMARA DE INSPECCIÓN Ø = 1.20M EN CONCRETO DE 28MPA, INCLUYE ESCALONES DE ACCESO EN TUBO DE 1" C/0.40M CON ANTICORROSIVO	ML	90,620	$686.829	$62.240.431,00000	4,70		0,00	$0,00			
1.7.7	APU 1.7.7	TAPA MANHOLE EN H.D. Ø 60 CM PARA TRAFICO PESADO 400 KN CON SISTEMA DE SEGURIDAD.	UN	36,000	$829.113	$29.848.084,00000	2,26		0,00	$0,00			
1.7.8	APU 1.7.9	CONO MANHOLE Ø = 1.20M EN CONCRETO REFORZADO DE 17MPa	UN	36,000	$647.606	$23.313.808,00000	1,76		0,00	$0,00			
1.8.3.2	APU 1.8.3.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD D=6".	ML	1.054,000	$11.480	$12.100.321,00000	0,91		0,00	$0,00			
		COSTOS DIRECTOS				**$ 706.496.436,00**	**84,73**		**45,51**	**$ 187.437.884,50**		26,00	
		ADMINISTRACION			25,0570610097175%	$ 177.027.243,00				$ 46.966.425,00			
		TOTAL AIU				**$ 177.027.243,00**	**13,38**		**3,55**	**$ 46.966.425,00**			
		COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (COSTOS DIRECTOS + AIU)				**$ 883.523.679,00**	**66,77**		**17,71**	**$ 234.404.309,50**		DIAS DE EJECUCION - ANTICIPO	
		SUBTOTAL SUMINISTROS				**$ 414.715.060,00**				**$ 414.715.060,00**			
		SUBTOTAL SUMINISTROS INCLUYE IVA DEL 19%				**$ 414.715.060,00**				**$ 414.715.060,00**			
		VALOR TOTAL A TODO COSTO				**$ 1.298.238.739,00**	**98,11**		**49,06**	**$ 649.119.369,50**			
		APORTE DE EMSERAL ESP en bienes y servicios que comprenden los costos operativos, logísticos y administrativos para apoyar, las diferentes actividades requeridas para cumplir con el objeto convenido. conforme a certificado de aportes				**$ 25.000.000,00**	**1,89**	**0,5**	**0,94**	**$ 12.500.000,00**	50% APORTE ENSERAL - ANTICIPO	
		VALOR TOTAL ALCANTARILLADO				**$ 1.323.238.739,00**	**100,00**		**50,00**	**$ 661.619.369,50**	50 % DEL VR. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039 DE 2025		
		APORTE DE EMSERAL ESP, MANO DE OBRA NO CALIFICADA				**$ 178.432.689,38**			**50,00**	**$ 89.216.344,69**	50% APORTE ENSERAL - ANTICIPO		
		APORTE MUNICIPO DE ALGECIRAS EN VALOR SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N.o 2025001004				**$ 1.119.806.049,62**			**50,00**	**$ 559.903.024,81**	50% APORTE MUNICIPIO - ANTICIPO		
		GRAN TOTAL DE APORTES PARA REALIZAR EL ANTICIPO DEL 50% , SEGÚN REALCION DE APORTES INICIALES				**$ 1.323.238.739,00**				**$ 661.619.369,50**	50 % DEL VR. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039 DE 2025		

Nit: 900263189- 6
Dirección: Cra. 5 Calle 6 Edif. Mpal.
Teléfono: 6088382453
e-mail: gerencia@emseralsaespalgeciras.gov.co

Progracion para la correcta inversion del anticipo:

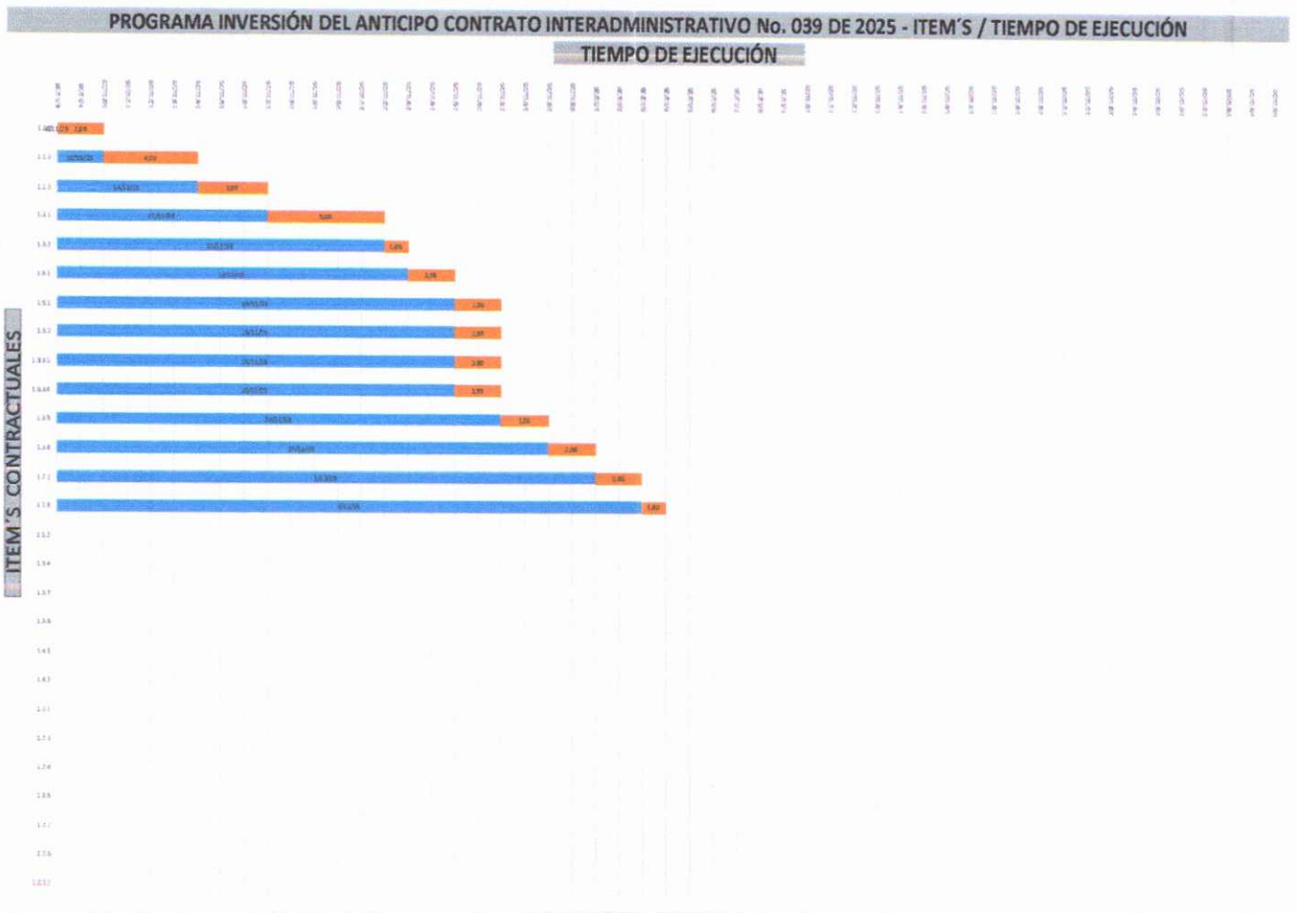

TOTAL, ANTICIPO QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL VEINTICUATRO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS DE PESOS M/CTE ($559.903.024,81)

Tenga en cuenta que:

1) Los procesos contractuales para la adjudicación del Contrato de Obra e Interventoría, se iniciarán, una vez los recursos del Convenio, sean desembolsados por El Municipio de Algeciras (H), en el porcentaje establecido del 50%.
2) En caso de presentar modificaciones a los ítems establecidos para la inversión del Anticipo, se allegará la correspondiente reprogramación de el mismo, debidamente firmada.

Nit: 900263189- 6
Dirección: Cra. 5 Calle 6 Edif. Mpal.
Teléfono: 6088382453
e-mail: gerencia@emseralsaespalgeciras.gov.co

3) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo, sin tener en cuenta los descuentos de ley.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente el tres (3) de diciembre de 2025.

LEONARDO AGUIRRE ARIAS
Gerente – EMSERAL S.A. E.S.P.
Contratista

Vo. Bo.
Asesor Jurídico Externo
RAFAEL RODRIGUEZ ORTIZ

PROGRAMA DE INVERSION DEL ANTICIPO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039 DE 2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 – REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO 20 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, HUILA"

CONTRACTUAL								ANTICIPO					
ITEM	APU	DESRIPCIÓN	UND	CANT	VR/UNT.	VR/ TOTAL	(%) UNIT.	CANT.	PORCENTAJE (%)	VALOR	FECHA INICIO	DURACIÓN EN DIAS	FECHA FIN
1.1.1	APU 1.1.1	REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS	ML	3.093,220	$4.705	$14.554.590,00000	1,10	3.093,22	1,10	$14.554.590,00	8/11/25	2,00	10/11/25
1.1.2	APU 1.1.2	DESCAPOTE MANUAL TERRENO MAT. CONGLOMERADO	M2	328,870	$17.699	$5.820.742,00000	0,44	328,870	0,44	$5.820.742,00	10/11/25	4,00	14/11/25
1.1.3	APU 1.1.3	DESCAPOTE A MÁQUINA E=0.20M	M2	1.863,585	$8.510	$15.858.903,00000	1,20	1.863,585	1,20	$15.858.903,00	14/11/25	3,00	17/11/25
1.3.1	APU 1.3.1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	420,870	$31.864	$13.410.467,00000	1,01	201,12	0,48	$6.408.423,00	17/11/25	5,00	22/11/25
1.3.3	APU 1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHON DE GRAVA Y TRITURADO PARA DESCANSO DE TUBERÍA.	M3	72,215	$359.669	$25.973.519,00000	1,96	48,1436698060144	1,31	$17.315.800,50	22/11/25	1,00	23/11/25
1.6.1	APU 1.6.1	ENTIBADO DISCONTINUO TIPO ED1, PARA CONTROL EN PROFUNDIDAD ENTRE 1.50 Y 2.50 METROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	309,320	$35.213	$10.892.215,00000	0,82	154,66	0,41	$5.446.108,00	23/11/25	2,00	25/11/25
1.5.1	APU 1.5.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD D=8".	ML	2.788,920	$89.564	$249.787.751,00000	18,88	2.788,920	18,88	$249.787.751,00	25/11/25	2,00	27/11/25
1.5.2	APU 1.5.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD D=10".	ML	608,600	$129.686	$78.926.717,00000	5,96	608,600	5,96	$78.926.717,00	25/11/25	2,00	27/11/25
1.8.3.3	APU 1.8.3.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD D=6".	ML	1.054,000	$81.594	$86.000.592,00000	6,50	1.054,000	6,50	$86.000.592,00	25/11/25	2,00	27/11/25
1.8.3.4	APU 1.8.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE D =6".	UN	176,000	$197.656	$34.787.368,00000	2,63	88,000	1,31	$17.393.684,00	25/11/25	2,00	27/11/25
1.3.5	APU 1.3.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE BASE. COMPACTADA. MATERIAL SELECCIONADO. INCLUYE ACARREO LIBRE	M3	172,325	$312.113	$53.784.923,00000	4,06	86,163	2,03	$26.892.461,00	27/11/25	2,00	29/11/25
1.3.6	APU 1.3.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE SUB-BASE. COMPACTADA. MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE ACARREO LIBRE	M3	172,325	$237.498	$40.926.874,00000	3,09	86,1625	1,55	$20.463.437,00	29/11/25	2,00	1/12/25
1.7.2	APU 1.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT2100	M2	108,570	$10.712	$1.162.958,00000	0,09	54,285	0,04	$581.479,00	1/12/25	2,00	3/12/25
1.7.6	APU 1.7.6	SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 60000PSI 420MPa	KG	5.764,680	$9.836	$56.702.257,00000	4,29	5.764,680	4,29	$56.702.257,00	3/12/25	1,00	4/12/25
1.3.2	APU 1.3.2	EXCAVACION MECANICA MATERIAL COMUN. INCLUYE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	3.787,815	$31.856	$120.663.763,00000	9,12		0,00	$0,00			
1.3.4	APU 1.3.4	AFIRMADO CON MATERIAL CRUDO DE RÍO T. MAX 3"	M3	1,530	$253.693	$388.150,00000	0,03		0,00	$0,00			
1.3.7	APU 1.3.7	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	3.791,815	$22.374	$84.837.235,00000	6,41		0,00	$0,00			
1.3.8	APU 1.3.8	CARGUE, RETIRO Y DISPOSIICÓN DE RESIDUOS	M3	1.262,605	$18.553	$23.424.492,00000	1,77		0,00	$0,00			
1.4.1	APU 1.4.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD D=8".	ML	2.788,920	$14.112	$39.358.522,00000	2,97		0,00	$0,00			
1.4.2	APU 1.4.2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD D=10".	ML	608,600	$14.795	$9.004.383,00000	0,68		0,00	$0,00			
1.7.1	APU 1.7.1	SOLADO EN CONCRETO DE 14MPA (2000PSI) E=0.05M	M2	63,620	$33.426	$2.126.562,00000	0,16		0,00	$0,00			
1.7.3	APU 1.7.3	CARGUE PARA POZO DI=1.20M E=0,15M	UN	36,000	$437.358	$15.744.900,00000	1,19		0,00	$0,00			
1.7.4	APU 1.7.4	PLACA DE FONDO PARA POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE f'c=28MPa (4000 PSI), Ø = 1.50M, E=0.20M Y IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE (FUNDIDA EN SITIO) (NO INC. ACERO DE REFUERZO)	UN	36,000	$265.860	$9.570.969,00000	0,72		0,00	$0,00			
1.7.5	APU 1.7.5	CUERPO CUERPO CÁMARA DE INSPECCIÓN Ø = 1.20M EN CONCRETO DE 28MPA, INCLUYE ESCALONES DE ACCESO EN TUBO DE 1" C/0.40M CON ANTICORROSIVO	ML	90,620	$686.829	$62.240.431,00000	4,70		0,00	$0,00			
1.7.7	APU 1.7.7	TAPA MANHOLE EN H.D. Ø 60 CM PARA TRAFICO PESADO 400 KN CON SISTEMA DE SEGURIDAD.	UN	36,000	$829.113	$29.848.084,00000	2,26		0,00	$0,00			
1.7.8	APU 1.7.9	CONO MANHOLE Ø = 1.20M EN CONCRETO REFORZADO DE 17MPa	UN	36,000	$647.606	$23.313.808,00000	1,76		0,00	$0,00			
1.8.3.2	APU 1.8.3.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD D=6".	ML	1.054,000	$11.480	$12.100.321,00000	0,91		0,00	$0,00			
		COSTOS DIRECTOS				**$ 706.496.436,00**	**84,73**		**45,51**	**$ 187.437.884,50**		**26,00**	
		ADMINISTRACION			25,0570610097175%	$ 177.027.243,00				$ 46.966.425,00			
		TOTAL AIU				**$ 177.027.243,00**	**13,38**		**3,55**	**$ 46.966.425,00**			
		COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (COSTOS DIRECTOS + AIU)				**$ 883.523.679,00**	**66,77**		**17,71**	**$ 234.404.309,50**			
		SUBTOTAL. SUMINISTROS				**$ 414.715.060,00**				**$ 414.715.060,00**			
		SUBTOTAL. SUMINISTROS INCLUYE IVA DEL 19%				**$ 414.715.060,00**				**$ 414.715.060,00**			
		VALOR TOTAL A TODO COSTO				**$ 1.298.238.739,00**	**98,11**		**49,06**	**$ 649.119.369,50**			
		APORTE DE EMSERAL ESP en bienes y servicios que comprenden los costos operativos, logísticos y administrativos para apoyar, las diferentes actividades requeridas para cumplir con el objeto convenido. conforme a certificado de aportes				**$ 25.000.000,00**	**1,89**	**0,5**	**0,94**	**$ 12.500.000,00**		
		VALOR TOTAL ALCANTARILLADO				**$ 1.323.238.739,00**	**100,00**		**50,00**	**$ 661.619.369,50**		
		APORTE DE EMSERAL ESP, MANO DE OBRA NO CALIFICADA				**$ 178.432.689,38**			**50,00**	**$ 89.216.344,69**		
		APORTE MUNICIPIO DE ALGECIRAS EN VALOR SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N.o 2025001004				**$ 1.119.806.049,62**			**50,00**	**$ 559.903.024,81**		
		GRAN TOTAL DE APORTES PARA REALIZAR EL ANTICIPO DEL 50% , SEGÚN REALCION DE APORTES INICIALES				**$ 1.323.238.739,00**				**$ 661.619.369,50**		

DIAS DE EJECUCION - ANTICIPO
50% APORTE ENSERAL - ANTICIPO
50 % DEL VR. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039 DE 2025
50% APORTE ENSERAL - ANTICIPO
50% APORTE MUNICIPIO - ANTICIPO
50 % DEL VR. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039 DE 2025

PROGRAMA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039 DE 2025 - ITEM´S / TIEMPO DE EJECUCIÓN

