CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 02 de octubre de 2025

Al responder cite:
766-278

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **Aprobación condicionada de Informe gerencial N° 4 (Julio 2025) CTO-138-2025 y respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-254.**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría de la entidad ICCU, se permite aprobar de forma condicionada el informe gerencial mensual N° 4 del contrato de obra ICCU-138-2025, el cual fue revisado y observado por esta interventoría, y por su parte subsanado parcialmente por el contratista Consorcio Sofán C-31, toda vez que a la fecha se encuentran asuntos pendientes del componente social que han sido observados de manera reiterativa por esta Interventoría. A continuación, se presenta brevemente la trazabilidad de la aprobación del informe mensual N° 4:

I. Informe gerencial mensual N° 4 julio del 2025. **APROBACIÓN CONDICIONADA.**

1. El informe fue recibido en su versión 1 el 12 de agosto del 2025 sin los anexos de los demás componentes. Este informe fue revisado y viabilizado parcialmente por interventoría el 11 de septiembre del 2025. Los anexos del informe se recibieron posteriormente.
2. El informe técnico N° 4 fue recibido el 7 de agosto de 2025 en su versión 1 sin los anexos correspondientes. Este informe fue revisado y viabilizado parcialmente por interventoría el 11 de septiembre del 2025. Los anexos del informe se recibieron posteriormente.
3. El componente de SST fue revisado en dos ocasiones en relación con el contenido del informe y sus anexos, revisión de anexos de seguridad social y documentos de personal

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

el día 9 de septiembre del 2025. Este componente fue viabilizado por la interventoría el 09 de septiembre.

4. El componente ambiental fue remitido el día 20 de agosto al ICCU y observado por la entidad por anexos y soportes faltantes. Dicha información fue remitida a la entidad el 1 de septiembre del 2025. Se realizó la aprobación de este componente, mediante oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-254 que atendió las observaciones realizadas al contratista mediante oficio 766-181 "*RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-168 OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL N° 4 JULIO 2025, CONTRATO 138 DE 2025"* remitido el 11 de septiembre del 2025. No obstante, esta interventoría deja constancia en el presente documento respecto al manejo y disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) durante el periodo reportado. Se aclara que la interventoría no asume responsabilidad alguna y mantiene en observación sobre la disposición efectuada, toda vez que en el mes de julio dichos RCD fueron entregados al señor Jorge Enrique Bejarano, residente en el municipio de Ubalá, sin que mediara autorización previa por parte de la supervisión y/o de esta interventoría.
5. El componente social fue recibido el 5 de agosto del 2025, y se acordó mesa de trabajo conjunta con el contratista para el día 12 de agosto con el fin de realizar observaciones y resolver inquietudes. Se realizó acta de reunión del 14 de agosto donde se establecieron las observaciones a realizar para los informes sociales y se adquirieron compromisos por parte del contratista. Actualmente se encuentra en revisión de la interventoría la última versión de este componente, que fue ajustado por el contratista mediante oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-289. Sin embargo, las actas de vecindad, actas de entorno y algunos formatos correspondientes del área social no han sido recibidos en físico, y por lo tanto esta Interventoría no ha podido realizar la revisión y firma de estos, por tal motivo, el informe gerencial N° 4 se aprueba de forma condicionada debido a la no subsanación a tiempo de este componente.

Se adjunta enlace drive para consulta y descarga de los anexos:

- Anexos 766-278.zip

Sin otro particular.

Cordialmente,

Cristian Camilo Moreno Arias
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Director de Interventoría

Anexo: Carpeta Informe N 4. JULIO
Preparó: Roberto C. López J.
Revisó: Cristian C. Moreno A.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: Archivo
ICCU

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2025

Al responder cite:

766-351-ICCU

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2**

ASUNTO: **RESPUESTA FOR-CO-03-359: APROBACIÓN INFORME MENSUAL No. 4 Versión 5 – Componente Social**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, se permite informar que, luego revisar la información y documentación entregada en el oficio del asunto, así como de realizadas las gestiones pertinentes con el contratista de obra CONSORCIO SOFAN C-031, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 1. Trazabilidad informe mensual No. 4 - Componente Social

Fecha	Actividad	Responsable	Canal de comunicación
5 de agosto	Envío del informe mensual No. 4 en versión 1	Consorcio SOFAN C-031	Correo electrónico
11 de agosto	Envío de observaciones del informe mensual No. 4 en versión 1 y programación de mesa de trabajo.	Consorcio Intervención AC	Correo electrónico
14 de agosto	Mesa de trabajo No. 20. Retroalimentar el Plan de Gestión Social del proyecto con el fin de explicar cómo se deben presentar los informes mensuales,	Consorcio SOFAN C-031 y Consorcio Intervención AC	Plataforma Teams
29 de agosto	Envío del informe mensual No. 4 Versión 2, para revisión de la Interventoría.	Consorcio SOFAN C-031	Correo electrónico
5 de septiembre	Envío de observaciones al informe mensual No. 4 Versión 2, para atención del Contratista	Consorcio Intervención AC	766-183-ICCU

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Fecha	Actividad	Responsable	Canal de comunicación
11 de septiembre	Envío del informe mensual No. 4 versión 3, para revisión de la Interventoría.	Consorcio SOFAN C-031	Correo electrónico
18 de septiembre	Envío de observaciones al informe mensual No. 4 en versión 3.	Consorcio Intervención AC	766-229-ICCU
28 de septiembre	Envío del informe mensual No. 4 versión 4, para revisión de la Interventoría.	Consorcio SOFAN C-031	SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-282
2 de octubre	Aprobación condicionada de Informe gerencial No. 4 (Julio 2025) CTO-138-2025 y respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-254.	Consorcio Intervención AC	766-278-ICCU
3 de octubre	Respuesta al comunicado SOFÁN-FOR-CO-03-282: llamado de atención por la NO atención integral a las observaciones del informe mensual No. 4, versión 4 – componente social.	Consorcio Intervención AC	766-287-ICCU
23 de octubre	FOR-CO-03-359 Respuesta al oficio No. 766-287-ICCU – Informe Mensual No. 4.	Consorcio SOFAN C-031	SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-359

Fuente: elaboración propia.

I. **Anexo 1. Trazabilidad informe mensual 4 – Componente social**

Se permite notificar de la **APROBACIÓN** del Informe Mensual No. 4 del componente social, en virtud de que cumple con los requerimientos contractuales establecidos para el Contrato ICCU No. 138 del 2025.

II. Anexo 2. Informe mensual No. 4 Versión 5

Se realiza la aprobación definitiva del informe integral N° 4 correspondiente al mes de julio del 2025.

Cordialmente,

Roberto Carlos López Julio
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director de la Interventoría Fase III

Anexo: Trazabilidad informe mensual 2 – Componente social
Informe mensual No. 2 Versión 4 – Componente social
Preparó: Laura Peñuela
Revisó: Cristian C. Moreno A.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: wloaiza@sofaningenieria.com – Ing. Wilson Loaiza
social138@sofaningenieria.com – TS Andrés Cañón
admoncto138@sofaningenieria.com
Archivo
ICCU

CONTRATO ICCU-138 DE 2025

INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INFORME MENSUAL No. 4

ÁREA GERENCIAL

CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

FOR-ADM-11

Bogotá - Cundinamarca, julio de 2025

CONTRATO DE OBRA ICCU-138 DE 2025

INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INFORME MENSUAL No. 4

ÁREA GERENCIAL

CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

ELABORO	REVISO	APROBÓ INTERVENTORÍA
CRISTIAN CAMILO GRIMALDO YANES Especialista PMP	**WILSON LOAIZA GALINDO** Director de Obra	**CRISTIAN MORENO ARIAS** Director Interventoría

Cristian Camilo Moreno Arias — Firmado digitalmente por Cristian Camilo Moreno Arias Fecha: 2025.09.11 14:04:25'00'

REGISTRO DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES

Contrato de Obra No.	**ICCU-CTO-138 DE 2025**	**Contratista:**	**CONSORCIO SOFAN C-031**
Contrato de Interventoría No.	**ICCU-CTO-219 DE 2025**	**Interventoría:**	**CONSORCIO INTERVENCIÓN AC**
Objeto Contrato de Obra: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA			
INFORME MENSUAL No.	**4**	**MES O PERIODO:**	JULIO

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1. LOCALIZACIÓN 5
2.2. CONECTIVIDAD, ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS 6
2.3. ESTADO INICIAL DE LA VÍA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 7
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 12
3.1. OBJETO DEL CONTRATO 12
3.2. DURACIÓN DEL CONTRATO 12
3.3. VALOR DEL CONTRATO 12
4. INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA 12
4.1. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA 12
4.2. ACTIVIDADES REALIZADAS 16
4.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO 18
4.4. PERSONAL DE OBRA 20
4.5. EQUIPO 22
4.6. INFORME FINANCIERO DEL PROYECTO 23
4.7. INVERSIÓN DEL ANTICIPO 24
5. CALIDAD DE LA OBRA 25
5.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS OBRAS 25
5.2. ENSAYOS DE LABORATORIO 25
5.3. GARANTÍAS Y SEGUROS 26

6. SEGUIMIENTO AL PAGA 27
6.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO AL PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL. 27
6.2. ACTIVIDADES PLAN AMBIENTAL 27
6.3. ACTIVIDADES PLAN SST 29
6.4. ACTIVIDADES PLAN SOCIAL. 29
7. SEGUIMIENTO A PLANES DE MANEJO DE TRAFICO 31
7.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO AL PLAN DE INVERSIÓN MANEJO DE TRÁFICO. 31
7.2. ACTIVIDADES PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO. 31
8. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO 32
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 33
10. ANEXOS 34

Ilustraciones

Ilustración 1. Mapa provincias de Cundinamarca ____ 5
Ilustración 2. Localización de Vías a intervenir durante el contrato en el Departamento ____ 6
Ilustración 3. Curva EVM Valor ganado_ Avance de obra mes de julio 2025 ____ 13

Listado Tablas

Tabla 1. Longitud de KM a intervenir por provincia ____ 6
Tabla 2. Longitud de KM a intervenir por municipio ____ 7
Tabla 3. Resumen seguimientos semanales durante el mes de julio 2025 ____ 13
Tabla 4. Porcentajes de avances por fases mes de julio 2025 ____ 14
Tabla 5. Porcentaje de avances por provincia mes de julio 2025 ____ 14
Tabla 6. Cantidades de ejecución por municipio en el mes de julio de 2025 ____ 18
Tabla 7. Personal del Contratista – Consorcio SOFAN C-031 ____ 20
Tabla 8. Personal del Subcontratista – Tecnisuelos Pavimentos y Concretos SAS ____ 21
Tabla 9. Personal del Subcontratista – Jefferson Enrique Amézquita Picón ____ 21
Tabla 10. Personal del Subcontratista – Urbanuz Construcciones ____ 21
Tabla 11. Personal del Subcontratista - Auscultar ____ 21
Tabla 12. Personal Retirado ____ 22
Tabla 13. Estado Financiero Contrato ____ 23

Anexos

ANEXO 1 – CORRESPONDENCIA JULIO

ANEXO 2 – CONTROL DE EQUIPOS

ANEXO 3 - SEGUIMIENTO PMT

ANEXO 4 – INFORME TÉCNICO NO. 4

ANEXO 5 - INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NO. 4

ANEXO 6 – INFORME AMBIENTAL NO. 4

ANEXO 7 – INFORME SOCIAL NO. 4

ANEXO 8 – SEGUIMIENTO MATRIZ 3 DE RIESGOS

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se presentan las actividades, el estado y la ejecución de las obras durante el mes de julio de 2025 para El proyecto “INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.

En consecuencia, el informe presenta, localización, descripción del alcance proyecto, registro fotográfico de las áreas a intervenir antes y después, los avances del proyecto, y componentes como calidad, Planes de manejo de tráfico y planes de manejo ambiental presentes durante la ejecución del proyecto en el mes de julio de 2025.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización

Las actividades de obra se realizarán en diferentes municipios del departamento de Cundinamarca, sobre los tramos priorizados como parte del Fondo de Caminos Vecinales.


Ilustración 1. Mapa provincias de Cundinamarca



2.2. Conectividad, área de influencia y beneficios

Al CONTRATO DE OBRA ICCU-138 DE 2025 le correspondió la zona oriental del departamento donde se llevarán a cabo la intervención de 136,12 km repartidos en 4 provincias, en donde se intervendrán vías veredales en 11 municipios, así:

Ilustración 2. Localización de Vías a intervenir durante el contrato en el Departamento

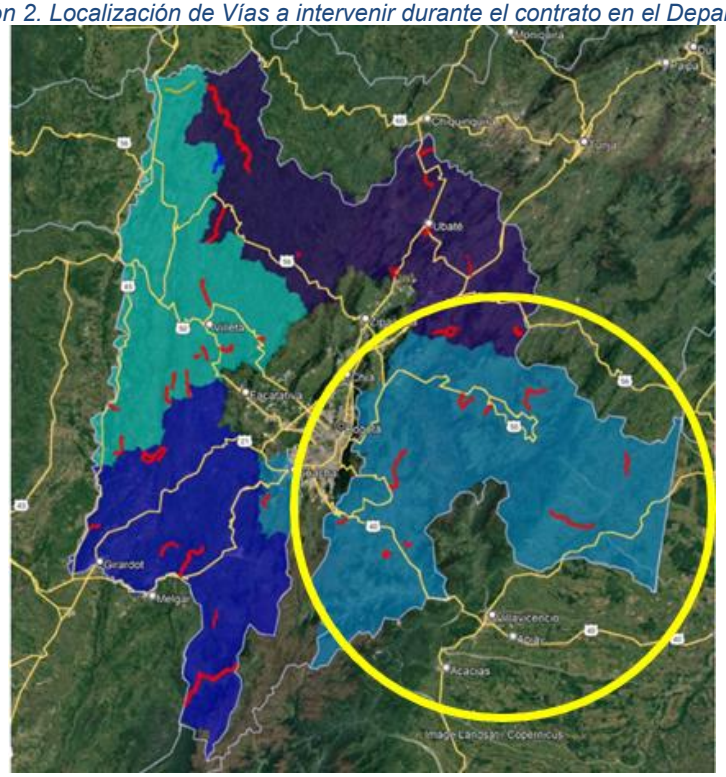

En la siguiente tabla se discrimina la cantidad de KM a intervenir en cada una de las provincias durante la ejecución del contrato.

Tabla 1. Longitud de KM a intervenir por provincia

	KM DE INTERVENCIÓN
LOTE 1	136,12
Medina	29,4
Guavio	40,22
Oriente	59,09
Soacha	7,41

Para mayor detalle, En la siguiente tabla se discrimina la cantidad de KM a intervenir en cada uno de los municipios pertenecientes a las provincias durante la ejecución del contrato

Tabla 2. Longitud de KM a intervenir por municipio

MUNICIPIO	LONG. (km)
GAMA	5,12
SUEVA	15,7
UBALA	19,4
MEDINA	20,3
PARATEBUENO	9,1
CHOACHI	21,5
FOSCA	8,25
CHIPAQUE	5,34
FOMEQUE	19
QUETAME	5
SOACHA	7,41

2.3. Estado inicial de la vía y características técnicas del proyecto

Previo al inicio formal de las actividades correspondientes a la Fase I (Diagnóstico y Caracterización Vial) y la Fase II (Caracterización de Materiales y Propuesta de Intervención), se realizaron recorridos técnicos preliminares en los 11 tramos objeto de intervención del contrato ICCU-138 de 2025. El propósito de estos reconocimientos fue identificar el estado inicial de la vía, documentando las condiciones existentes de geometría, estructura, drenaje, transitabilidad y posibles afectaciones visibles que pudieran incidir en la planificación técnica y operativa del proyecto.

A continuación, se presenta una síntesis organizada por provincia y municipio, que consolida los principales hallazgos observados durante dichos recorridos:

TRAMO	CONDICIONES OBSERVADAS	FOTO
Guavio – Gama Tramo: Clemente – Palenque – Río Sucio Longitud: 5,12 km	- Calzada angosta sin bermas - Superficie de afirmado erosionado - Falta de obras de drenaje - Zonas con cárcavas superficiales y pérdida de banca	
Guavio - Junín Tramo: Sueva – San Francisco – Valle – Junín Longitud: 15,7 km	- Vía con afirmado degradado - Subrasante con presencia de suelos plásticos - Escorrentía sobre calzada - Alcantarillas obstruidas o ausentes	
Guavio - Ubalá Tramo: Casa Rosada – San Luis – Laguna Azul Longitud: 19,4 km	- Trazado montañoso con curvas cerradas - Material granular natural - Taludes sin tratamiento - Cruces hidráulicos deficientes o inexistentes	
Oriente - Choachí Tramo: Resguardo Bajo – El Rosario Longitud: 21,5 km	- Afirmado irregular con pérdida de sección - Erosión en bordes de calzada - Inexistencia de cunetas funcionales - Alta vulnerabilidad en época de lluvia	

TRAMO	CONDICIONES OBSERVADAS	FOTO
Oriente - Fómeque Tramo: Fómeque – Cáqueza Longitud: 19,0 km	- Vía rural sin estructuras de control de agua - Alcantarillas colmatadas - Pendientes pronunciadas con escorrentía superficial	
Oriente – Fosca Tramo: Fosca – Quinchita – Sáname Longitud: 8,25 km	- Calzada en mal estado - Drenaje superficial deficiente - Materiales de baja resistencia en zonas bajas	
Oriente - Chipaque Tramo: Siecha – Potrero Grande Longitud: 5,34 km	- Presencia de barro y encharcamiento - Falta de canalización de aguas - Tramos con pérdida de banca por socavación	
Oriente – Quetame Tramo: Quetame – Yerbabuena hacia Fómeque Longitud: 5,00 km	- Tramo en afirmado sin compactación - Cruces de quebradas sin obras - Alto riesgo de aislamiento en época de lluvia	

TRAMO	CONDICIONES OBSERVADAS	FOTO
Medina – Medina Tramo: Humea San Cristóbal Gazatavena San Luis Del Retiro Longitud: 20,3 km	- Afirmado natural en mal estado - Calzada irregular y sin drenaje- - Sectores con encharcamientos persistentes	
Medina – Paratebueno Tramo: Buenavista Altorredondo - Engaño Longitud: 9,1 km	- Vía angosta con deformaciones - Material granular contaminado - Ausencia de cunetas y filtraciones en taludes	
Soacha – Sibaté Tramo: Vereda San Rafal - Vereda Altocharco - Sector Alto De La Virgen - Vereda La Unión. Longitud: 7,41 km	- Tramo con erosión superficial - Inexistencia de bermas y drenaje - Obstáculos naturales que afectan la transitabilidad	

El cuadro anterior resume las condiciones preexistentes de cada uno de los tramos del contrato, observadas antes del inicio de la caracterización técnica detallada. Este levantamiento preliminar es fundamental para comprender el punto de partida real de cada corredor, permitiendo anticipar problemáticas como erosión, pérdida de banca, deficiencias de drenaje y baja capacidad estructural, aspectos que deberán ser confirmados, cuantificados y abordados técnicamente en el desarrollo de las siguientes fases del proyecto. La documentación gráfica y los resultados de los ensayos de laboratorio complementarán posteriormente este diagnóstico visual inicial.

Las actividades y/o obras que se están ejecutando de acuerdo con el objeto del proyecto que se describe a continuación, obedeciendo al contenido de las actividades de orden general y algunas de orden específico, así como a las condiciones generales de ejecución en las que se

enmarca el contrato y sus apéndices. Así, sin perjuicio de las obligaciones específicas que se encuentran contenidas en los documentos antes enunciados, el contratista está realizando cada una de las actividades descritas en el anexo técnico. Las principales actividades que se encuentran en desarrollo son las siguientes:

- Caracterización del suelo de cada corredor vial que permita determinar las características físicas, químicas y mecánicas del material encontrado en cada tramo vial.
- Caracterización vial que permita determinar las características de los corredores a intervenir y los elementos que la componen (tramos en placa huella y su estado, obras de drenaje existentes, inestabilidades, colegios, centros de salud, inspecciones y los demás elementos que se identifiquen). Esta información debe quedar georreferenciada.
- Propuesta de posibles estabilizantes a utilizar, acorde con los productos ofrecidos en el mercado que tengan capacidad de suministro requerido por la vía, y que ofrezcan un comportamiento con el suelo existente adecuado a las necesidades y condiciones del corredor vial correspondiente, según su concentración, recomendaciones del fabricante y siguiendo la normatividad del INVIAS. Esta propuesta definirá tres opciones de intervención, mínimo dos propuestas.
- Intervención de las vías rurales definidas teniendo en cuenta los posibles estabilizantes a utilizar en la rasante, según las condiciones analizadas y que el contratista de obra garantice su estabilidad.
- Drenaje longitudinal y transversal compuesto por alcantarillas, cunetas en terreno natural, entre otros.
- Construcción de obras de confinamiento. El proyecto se desarrollará por fases simultaneas para que la intervención de las vías se realice en el plazo contractual.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. Objeto del contrato

Realizar la "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

3.2. Duración del contrato

El plazo máximo de acuerdo a las condiciones del contrato ICCU-138 de 2025 es de 11 meses o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que primero ocurra, para la ejecución total de las obras.

3.3. Valor del contrato

Es por la suma de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($35.350.235.228,00) MCTE, equivalentes a 21774 SMLMV para el año de suscripción del contrato [Año 2025].


4. INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA

4.1. Seguimiento al cronograma de obra

Fecha de inicio del contrato: 09 de abril de 2025
Fecha de terminación del contrato: 31 de diciembre de 2025

Para el mes de julio de 2025, se han realizado avances en las fases 1 y fases 2, caracterización y laboratorios, dando como resultado a corte 01-08-2025 avance programado de **14,99%** frente a un avance ejecutado de **4,32 %** para una variación negativa de **-10,67 %,** presentando entonces los siguientes registros:

Ilustración 3. Curva EVM Valor ganado_ Avance de obra mes de julio 2025

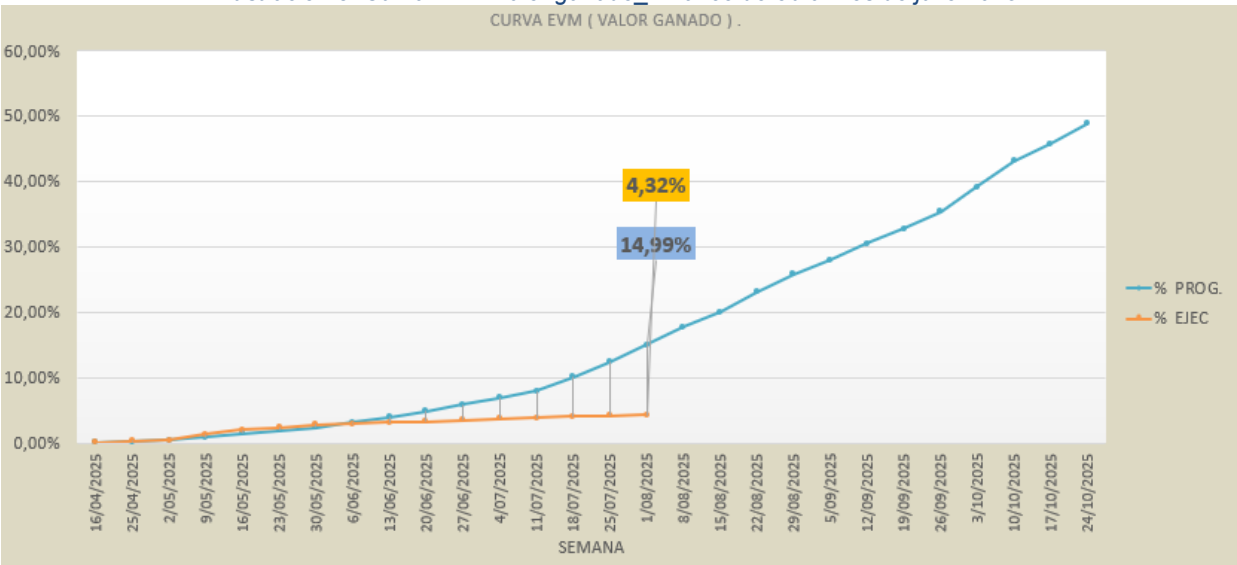

A continuación, presentamos la tabla resumen del avance semanal es presentes durante el mes del presente informe del mes de julio 2025.

Tabla 3. Resumen seguimientos semanales durante el mes de julio 2025

PROGRAMACION				EJECUCION		INDICADORES	
		TOTALES		TOTALES		VARIACION	IEP
No.	Fecha	CPTP(Millones)	% PROG.	CPTR (Millones)	% EJEC	% EJEC - % PROG.	CPTR/CPTP
semana 1	16/04/2025	$ 16,87	0,05%	$ 43,66	0,12%	0,08%	2,59
semana 2	25/04/2025	$ 87,99	0,25%	$ 105,27	0,30%	0,05%	1,20
semana 3	2/05/2025	$ 143,73	0,41%	$ 168,35	0,48%	0,07%	1,17
semana 4	9/05/2025	$ 301,07	0,85%	$ 464,75	1,31%	0,50%	1,54
semana 5	16/05/2025	$ 500,56	1,42%	$ 723,60	2,05%	0,69%	1,45
semana 6	23/05/2025	$ 667,31	1,89%	$ 849,59	2,40%	0,59%	1,27
semana 7	30/05/2025	$ 848,03	2,40%	$ 982,33	2,78%	0,46%	1,16
semana 8	6/06/2025	$ 1.129,36	3,19%	$ 1.023,81	2,90%	-0,21%	0,91
semana 9	13/06/2025	$ 1.389,85	3,93%	$ 1.122,37	3,18%	-0,76%	0,81
semana 10	20/06/2025	$ 1.722,39	4,87%	$ 1.179,33	3,34%	-1,54%	0,68
semana 11	27/06/2025	$ 2.095,93	5,93%	$ 1.247,17	3,53%	-2,40%	0,60
semana 12	4/07/2025	$ 2.467,33	6,98%	$ 1.317,75	3,73%	-3,25%	0,53
semana 13	11/07/2025	$ 2.811,93	7,95%	$ 1.365,29	3,86%	-4,09%	0,49
semana 14	18/07/2025	$ 3.571,32	10,10%	$ 1.445,01	4,09%	-6,01%	0,40
semana 15	25/07/2025	$ 4.394,19	12,43%	$ 1.493,65	4,23%	-8,21%	0,34
semana 16	1/08/2025	$ 5.300,34	14,99%	$ 1.527,31	4,32%	-10,67%	0,29

En la siguiente tabla se muestra los avances en cada una de las etapas del proyecto para el mes del presente informe, evidenciándose que en el mes se presenta ejecución en las fases 1 y fases 2, la fase 3 por programación debió iniciar el 9 de julio de 2025, sin embargo debido a que los resultados arrojados por los laboratorios, en la Fase 2 del proyecto, no dieron las

condiciones óptimas para que se pudiesen implementar las propuesta de posibles estabilizantes a utilizar no se ha logrado dar inicio a esta Fase 3. Por tanto, El ICCU ha solicitado al contratista detener la fase 2 mientras se analizan posibles soluciones y ha solicitado que se puedan hacer intervenciones parciales en la Fase 3 como limpieza y mantenimiento de alcantarillas.

Tabla 4. Porcentajes de avances por fases mes de julio 2025

ETAPA	VALOR	% PROG.	% EJEC.	FIN
FASE 1 - CARACTERIZACION	$ 1.111.555.238,40	100,00%	44,94%	8/07/2025
FASE 2 - LAB.	$ 1.667.332.857,60	96,80%	61,64%	20/08/2025
FASE 3 -OBRA	$ 31.555.957.252,00	7,62%	0,00%	31/12/2025
COMPONENTES	$ 1.015.389.880,00	16,71%	11,68%	31/12/2025

En la siguiente tabla se muestra los avances por provincias para las etapas en ejecución, fase 1 CARACTERIZACIÓN y fase 2 LABORATORIOS, presentando atraso en la fase 1 y en la Fase 2. y Fase 3.

Tabla 5. Porcentaje de avances por provincia mes de julio 2025

DESCRIPCION	unidad	cant.	Comienzo	Fin	% progr. Acum.	% Ejec. Acum.	Variacion
FASE 1 - CARACTERIZACION			10/04/2025	8/07/2025	100,00%	44,94%	-55,06%
GUAVIO	KM	40,22	10/04/2025	8/07/2025	100,00%	80,88%	-19,12%
MEDINA	KM	29,4	29/05/2025	8/07/2025	100,00%	2,40%	-97,60%
ORIENTE	KM	59,09	2/05/2025	8/07/2025	100,00%	46,40%	-53,60%
SOACHA	KM	7,41	9/06/2025	8/07/2025	100,00%	12,00%	-88,00%
FASE 2 - LABORATORIOS			17/04/2025	20/08/2025	96,80%	61,64%	-35,15%
GUAVIO	KM	40,22	17/04/2025	6/06/2025	100,00%	98,00%	-2,00%
MEDINA	KM	29,4	30/05/2025	9/07/2025	100,00%	21,71%	-78,29%
ORIENTE	KM	59,09	29/05/2025	16/07/2025	100,00%	59,40%	-40,60%
SOACHA	KM	7,41	9/07/2025	20/08/2025	38,40%	46,50%	8,10%
FASE 3 -OBRA			9/07/2025	31/12/2025	7,62%		-7,62%
PRELIMINARES			10/07/2025	21/07/2025			
GUAVIO	KM	40,22	9/07/2025	3/12/2025	8,53%		-8,53%
MEDINA	KM	29,4	4/12/2025	31/12/2025			
ORIENTE	KM	59,09	9/07/2025	30/12/2025	11,78%		-11,78%
SOACHA	KM	7,41	22/12/2025	31/12/2025			

ANÁLISIS CONTRACTUAL Y POSIBLES AJUSTES AL CRONOGRAMA

Durante el mes de julio de 2025, la ejecución del contrato ha enfrentado múltiples situaciones que han afectado el desarrollo normal de las actividades programadas. Entre los principales

factores que han impactado el avance se encuentran las condiciones climáticas adversas, la dificultad de acceso a las zonas de trabajo, los eventos sísmicos ocurridos en la provincia de Medina y las demoras asociadas a la importación de equipos especializados necesarios para el desarrollo de las actividades técnicas.

Adicionalmente, se ha presentado una situación crítica relacionada con el no desembolso del anticipo contractual por parte de la entidad contratante. Esta situación ha limitado la adquisición de equipos de nueva tecnología que son indispensables para iniciar la fase de intervención de vías. Cabe señalar que la inversión del anticipo fue estructurada precisamente para cubrir estas necesidades, por lo que su no disponibilidad ha afectado directamente la operatividad del proyecto.

Frente a este panorama, el contratista ha venido evaluando y estructurando diferentes alternativas que permitan mitigar los atrasos. Entre estas se contempla la reprogramación de las actividades correspondientes a las fases 1 y 2 (caracterización y laboratorio), cuya ejecución se ha visto directamente impactada por los factores ya expuestos.

De igual manera, el contratista analiza la viabilidad de solicitar una prórroga en el tiempo de ejecución del contrato, como consecuencia de la ampliación de las fases preliminares. Estas fases representan la base técnica del proyecto, ya que proporcionan la información esencial para la toma de decisiones en cuanto al diseño y tipo de intervención vial a implementar.

Finalmente, y en caso de que las condiciones climáticas lo permitan, se contempla la incorporación de una cuadrilla adicional de topografía con el fin de optimizar el avance físico de las actividades y recuperar parte del retraso acumulado. Con estas medidas, el contratista manifiesta su disposición de continuar con el cumplimiento del objeto contractual, sujeto a la articulación institucional que permita superar las limitaciones actuales.
Es así como se ha presentado una reprogramación a las actividades del contrato el cual se encuentra en análisis de la interventoría.

4.2. Actividades realizadas

En julio de 2025, las actividades ejecutadas se desarrollaron en el marco de las fases I y II del proyecto, priorizando el cierre de frentes de trabajo previamente iniciados y la apertura de nuevos sectores, de acuerdo con la programación establecida en el Anexo Técnico. Estas acciones han tenido como objetivo fortalecer el diagnóstico, la caracterización técnica y la evaluación de materiales de los corredores viales priorizados, consolidando la base de información necesaria para la definición de las intervenciones en etapas posteriores.

En la Fase I – Diagnóstico y Caracterización Vial, se culminaron los levantamientos topográficos y de capas geográficas en los tramos viales de los municipios de Junín y Choachí, con el procesamiento y validación de la información altimétrica y planimétrica correspondiente. Paralelamente, se inició el levantamiento en los tramos viales de Medina y Sibaté, registrando las condiciones geométricas, el inventario de alcantarillas y obras de drenaje, así como la identificación de puntos críticos por escorrentía. Asimismo, se finalizó el geoposicionamiento en el tramo vial del municipio de Fómeque, cerrando la cobertura prevista para esta actividad en el cronograma y asegurando que la totalidad de los sectores programados cuenten con su respectivo registro geoespacial.

En la Fase II – Caracterización de Materiales y Propuesta de Intervenciones, se avanzó en la ejecución de exploraciones geotécnicas mediante la apertura de apiques en los tramos viales de Fosca, Chipaque, Quetame y Sibaté, con profundidades promedio de 1,50 metros, siguiendo los lineamientos del Artículo 237-22 del Manual de Carreteras del INVÍAS y los términos de referencia del contrato ICCU-138 de 2025. Estos trabajos permitieron la recolección de muestras representativas para su análisis en laboratorio, fundamentales para determinar la capacidad portante de los suelos y su potencial de estabilización. Sin embargo, en el municipio de Quetame no fue posible concluir la totalidad de los apiques programados debido a condiciones climáticas adversas, lo que ha requerido la reprogramación de estas actividades para el siguiente ciclo. En paralelo, se desarrollaron ensayos de laboratorio sobre las muestras extraídas, incluyendo granulometría, límites de consistencia, CBR y pruebas con adición de estabilizantes, cuyos resultados servirán como insumo directo para la formulación de las alternativas de diseño.

De manera complementaria, y como adelanto a la Fase III – Intervención de las Vías, se ejecutaron labores puntuales de reparación y adecuación de alcantarillas en el municipio de

Ubalá, con el propósito de mejorar el drenaje transversal, garantizar la continuidad hidráulica y mitigar los riesgos asociados a la acumulación de agua en la calzada.

Es importante resaltar que las condiciones climáticas registradas durante el mes, caracterizadas por lluvias frecuentes y persistentes, han afectado de manera significativa el desarrollo de las actividades y el cumplimiento del cronograma establecido. Tal como se ha advertido en informes anteriores, la alta pluviosidad ha reducido la productividad en campo, dificultando el acceso a varios tramos y limitando la operación de maquinaria en zonas con suelos saturados. Estas restricciones han incidido directamente en la ejecución de actividades críticas como la apertura de apiques y la toma de muestras, generando retrasos acumulados que se reflejan en un avance físico por debajo de lo programado.

Aun con estas limitaciones, se han mantenido las acciones de coordinación con los equipos de campo y laboratorio, priorizando frentes de trabajo con mejores condiciones de acceso y reorganizando la secuencia de actividades para optimizar el uso de recursos. El seguimiento continuo de los indicadores de avance permitirá ajustar la programación y reorientar esfuerzos hacia los tramos con mayor viabilidad de ejecución, sin perder de vista la necesidad de recuperar el tiempo perdido una vez las condiciones climáticas lo permitan. Estas actividades, junto con los resultados obtenidos en campo y laboratorio, son fundamentales para establecer una base técnica sólida que sustente las decisiones de diseño e intervención previstas para la etapa final del proyecto.


Las métricas ejecutadas se relacionan en el siguiente cuadro resumen:

Tabla 6. Cantidades de ejecución por municipio en el mes de julio de 2025

PROVINCIA	MUNICIPIO	META FISICA		EJECUTADOS				
				CARACTERIZACIÓN		LABORATORIOS		
				TOPOGRAFIA		APIQUES	LABORATORIO A LOS APIQUES	ENSAYOS DE SUELOS ESTABILIZANTES
				GEOPOSICIONAMIENTO	LEV. CAPAS GEOGRAFICAS	KM	KM	KM
				40%	60%			
		KM	% POND.	KM	KM			
GUAVIO	UBALA	19.4	48.23%	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4
GUAVIO	GAMA	5.12	12.73%	5.12		5.12	5.12	5.1
GUAVIO	JUNIN	15.7	39.04%	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7
TOTALES		40.22	100.00%	40.22	35.1			
ORIENTE	CHOACHI	21.5	36.39%	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
ORIENTE	FOMEQUE	19	32.15%	19	7	17.1	9.5	
ORIENTE	FOSCA	8.25	13.96%	8.25		8.25	5.0	
ORIENTE	CHIPAQUE	5.34	9.04%	5.34		5.34	3.1	
ORIENTE	QUETAMA	5	8.46%	5		3.00	1.9	
TOTALES		59.09	100.00%	59.09	28.5			
MEDINA	MEDINA	20.3	69.05%		1.5			
MEDINA	PARATEBUENO	9.1	30.95%					
TOTALES		29.4	100.00%		1.5			
SOACHA	SIBATE	7.41	100.00%		2.5	7.41	4.1	
TOTALES		7.41	100.00%		2.5			


Para mayor detalle sobre la información técnica, reportes específicos y soportes documentales relacionados con esta sección, por favor remitirse al (**ANEXO 4 – INFORME TÉCNICO NO. 4**)

4.3. Registro fotográfico

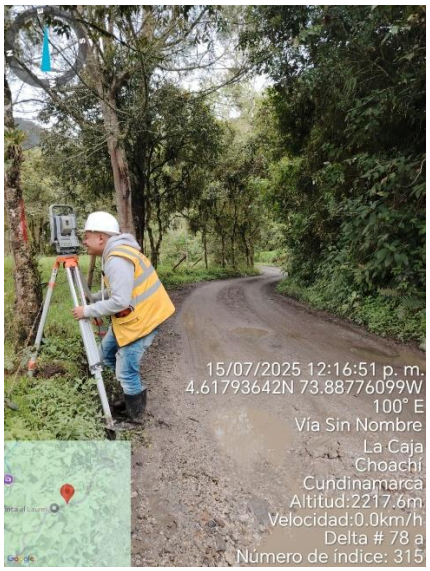

Registro fotográfico del proceso de levantamiento de capas geográficas como parte de la caracterización vial.

Durante julio de 2025 se finalizó el levantamiento de capas geográficas en los 21,5 km del tramo vial correspondiente al municipio de Choachí, de la provincia de Oriente, y en los 15,7 km del tramo vial del municipio de Junín, de la provincia de Guavio. Adicionalmente, se avanzó en el levantamiento hasta el kilómetro 1,5 del tramo vial en el municipio de Medina, de la provincia de Medina, y hasta el kilómetro 2,5 en el municipio de Sibaté, de la provincia de Soacha, consolidando el progreso de la caracterización técnica en estos frentes de trabajo.

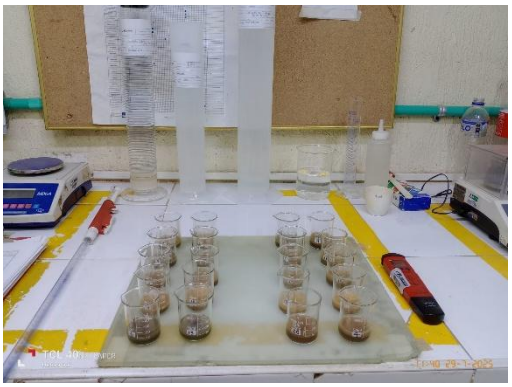	**Registro fotográfico del proceso de instalación de placa GNSS como parte de las actividades de geoposicionamiento.** Durante julio de 2025 se finalizó el geoposicionamiento en el municipio de Fómeque (tramo Fómeque – Cáqueza), realizando la instalación de la placa GNSS que se encontraba pendiente debido a las condiciones climáticas del mes anterior. Con esta actividad se completa la cobertura de puntos de referencia geoespacial programada para la provincia de Oriente, fortaleciendo la precisión y trazabilidad de la información topográfica y geográfica levantada en campo.
	**Registro fotográfico del proceso de ejecución de apiques como parte de la exploración geotécnica preliminar.** Durante julio de 2025 se ejecutó la apertura de apiques en Fosca, Chipaque, Quetame y Sibaté, alcanzando el 100 % de la meta en los tres primeros municipios y un 60 % en Quetame. Estas excavaciones, con profundidades promedio de 1,50 m, permitieron obtener muestras representativas de suelo para su análisis en laboratorio.
	**Registro fotográfico análisis de laboratorio del material extraído de los apiques.** Durante julio de 2025 se realizaron ensayos de laboratorio a las muestras obtenidas en Fosca, Chipaque, Quetame y Sibaté, alcanzando avances del 60 %, 58 %, 37 % y 55 % respectivamente. Estas pruebas incluyen análisis granulométricos, límites de consistencia y CBR, fundamentales para la propuesta de estabilización de suelos.

	**Registro fotográfico del proceso de instalación de alcantarillas.** Durante julio de 2025 se ejecutaron actividades de drenaje transversal en el tramo Casa Rosada – Laguna Azul del municipio de Ubalá, provincia de Guavio. Los trabajos incluyeron la limpieza de alcantarillas existentes y la construcción de dos nuevas estructuras en las abscisas K0+300 y K6+850, con instalación de tubería de concreto reforzado de 36 pulgadas y obras complementarias para optimizar la evacuación de aguas pluviales y preservar la estabilidad del corredor vial.

Para más fotos y especificaciones, por favor remitirse al **(ANEXO 4 – INFORME TÉCNICO NO. 4.)**

4.4. Personal de obra

Durante el mes de julio de 2025, el proyecto contó con el siguiente personal técnico y operativo vinculado al desarrollo de actividades de obra en las provincias

Tabla 7. Personal del Contratista – Consorcio SOFAN C-031

Nombre completo	Cargo	Fecha de ingreso
Wilson Gerardo Loaiza Galindo	Director de Obra	01/04/2025
Marcela Pinto Blanco	Residente SST	01/04/2025
Elizabeth Giovana Daza Socarrás	Residente Ambiental	22/04/2025
Stefania Aguilera Díaz	Residente Social	11/04/2025
Yesica Raigoso Díaz	Residente Técnico	01/04/2025
Edixon Eduardo Beltrán Calderón	Cadenero Segundo	15/04/2025
Luis Jaime Cruz Molano	Conductor	01/04/2025
José Manuel Pérez	Almacenista	6/05/2025
Fanny Acosta Bejarano	Insp. SST - MA	12/05/2025
Andrés Francisco Cañón Niño	Residente Social	18/05/2025
Jorge Sánchez	Espe. de Pavimentos	01/04/2025
Armando Ruiz	Espe. de Geotecnia	01/04/2025

Tabla 8. Personal del Subcontratista – Tecnisuelos Pavimentos y Concretos SAS

Nombre completo	Cargo	Fecha de ingreso
Camilo Andrés Pintor Torres	Laboratorista	01/04/2025
Wilson Efraín Pintor Bolívar	Laboratorista Inspector	01/04/2025
Luis Felipe Bermúdez Avendaño	Laboratorista	01/04/2025

Tabla 9. Personal del Subcontratista – Jefferson Enrique Amézquita Picón

Nombre completo	Cargo	Fecha de ingreso
Carlos Mauricio Cifuentes Riaño	Topógrafo	09/04/2025
Fabian Camilo Rodríguez Escamilla	Topógrafo	15/05/2025
Edwin Leonardo Morales Sierra	Cadenero Primero	20/05/2025
Cristhian Giovanni Díaz Cárdenas	Cadenero Segundo	22/05/2025
Cristian Iván García Medina	Dib. Cadenero 1ero	28/05/2025
Nelson Echeverry Córdoba	Cadenero Primero	17/06/2025
Miguel Ángel Loaiza Cadena	Cadenero Segundo	4/06/2025
Miguel Antonio Retavisca Atara	Cadenero Segundo	26/06/2025

Tabla 10. Personal del Subcontratista – Urbanuz Construcciones

Nombre completo	Cargo	Fecha de ingreso
Ángelo Wilmer Hernández Herrera	Ayudante	13/05/2025
Héctor Pablo Morales Vega	Ayudante	19/05/2025
Wilson Manuel Castellanos Hernández	Ayudante	19/05/2025
Nacianseno Sánchez Zamora	Ayudante	6/02/2024
Rafael Moreno Yépez	Ayudante	17/08/2023
Yeison Ronaldo Garzón Muse	Ayudante	18/01/2024
Eduardo Muñoz	Ayudante	27/12/2024

Tabla 11. Personal del Subcontratista - Auscultar

Nombre completo	Cargo	Fecha de ingreso
Douglas José Nieves Ramírez	A piquero Y Auxiliar De Tráfico	21/06/2025
Fernando Rodríguez Murcia	Coordinador De Laboratorio	24/01/2025
Jaider Iván Carrillo Gómez	A piquero Y Auxiliar De Tráfico	21/06/2025

Tabla 12. Personal Retirado

Nombre completo	Cargo	Fecha de Retiro
James Andrés Pérez Vanegas	Cadenero Primero	21/06/2025
Alejandro Grisales Pinzón	Cadenero Segundo	21/06/2025
Jorge Andrés Pérez Meneses	Dibu.-Cadenero Primero	01/06/2025
Diego Alexander Linares Linares	Auxiliar De Topografía	16/06/2025

Para mayor detalle sobre la información del personal, reportes específicos y soportes documentales relacionados con esta sección, por favor remitirse al (**ANEXO 5 – INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NO. 1**.)

4.5. Equipo

Con el propósito de asegurar una adecuada ejecución de las actividades de campo y laboratorio, durante el desarrollo del proyecto se utilizaron diversos equipos de inspección, medición y ensayo, que permitieron obtener información técnica confiable para la caracterización del terreno y el control de obra

Dentro de los equipos utilizados se encuentran:

- Camionetas
- Volqueta
- Retroexcavadora de Neumatico
- Estación total
- Nivel
- Receptor GNSS IMU-RTK
- Planta eléctrica
- Barra hoyadora
- Deflectómetro de impacto liviano
- Paladraga
- Tamices
- Balanzas Digitales
- Horno de Secado
- Cazuela metálica

- Termohigrómetro digital
- Marshall

Estos equipos fueron operados según las necesidades específicas del proyecto, contribuyendo a la correcta ejecución de las actividades de campo y al cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos.

Los demás equipos utilizados durante la fase de caracterización del terreno y en la realización de ensayos de laboratorio se encuentran debidamente registrados, con su respectiva información de identificación, estado, calibración y trazabilidad, en el documento técnico correspondiente.

Para mayor detalle, por favor remitirse al **(ANEXO 2 – CONTROL DE EQUIPOS).**

4.6. Informe financiero del proyecto

A la fecha de corte del presente informe, el estado financiero del proyecto es el siguiente:

Tabla 13. Estado Financiero Contrato

	DESCRIPCION					
CONCEPTO / ACTA	CARACTERIZACION VIAL	OBRA	PAGA	PMT	PROVISION AJUSTE VARIACION COSTO INSUMOS	TOTALES
VALOR TOTAL INICIAL (1)	$ 2,778,888,096.00	$ 31,555,957,252.00	$ 526,739,880.00	$ 333,650,000.00	$ 155,000,000.00	$ 35,350,235,228.00
						30%
Anticipo (2)	$ 833,666,428.80	$ 9,466,787,175.60	$ 158,021,964.00	$ 100,095,000.00	$ 46,500,000.00	$ 10,605,070,568.40
Cobro 25% caracterización de corredores viales y ensayos (3)	$ 694,722,024.00					$ 694,722,024.00
Amorizacion anticipo (4)						$ -
POR EJECUTAR (1-2-3+4)	$ 1,250,499,643.20	$ 22,089,170,076.40	$ 368,717,916.00	$ 233,555,000.00	$ 108,500,000.00	$ 24,050,442,635.60

Nota 1: De conformidad con lo establecido en las cláusulas contractuales, la Entidad Contratante gestionó la entrega de un anticipo correspondiente al treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato de obra ICCU-CTO-138 de 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades programadas en el marco del proyecto. La documentación requerida fue radicada ante el ICCU el 2 de abril de 2025, junto con la constitución del patrimonio autónomo y la suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable No. 3-1-124317 entre la Fiduciaria Bogotá S.A. y el Consorcio SOFAN C-031. El día 24 de julio de 2025 se efectuó el desembolso

del anticipo a la cuenta fiduciaria No. 0003201282 – FIDUBOGOTÁ S.A. PA – CONSORCIO SOFAN C-031. La ejecución de los recursos será administrada bajo las condiciones establecidas en el contrato fiduciario y el plan de inversión aprobado, y su amortización se realizará mediante deducciones proporcionales en las actas mensuales de obra, bajo la vigilancia directa de la interventoría. A la fecha de cierre del presente informe, el anticipo no ha sido utilizado ni amortizado.

Nota 2: El 30 de abril de 2025 se radicó ante el ICCU la solicitud de cobro del 25 % correspondiente a la caracterización de corredores viales y ensayos, con base en la aprobación del Plan de Campo, la Metodología de Trabajo y el Cronograma de Trabajo, conforme al Oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-055. La solicitud se encuentra en proceso de revisión y autorización por parte de la entidad.

4.7. Inversión del anticipo

De conformidad con lo estipulado en las cláusulas contractuales, el contrato contempla un anticipo equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato de obra ICCU-CTO-138 de 2025, destinado a garantizar la ejecución de las actividades programadas.

En cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad contratante, el contratista gestionó oportunamente todos los trámites administrativos, financieros y documentales exigidos para el desembolso, incluyendo la constitución del patrimonio autónomo y la suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable No. 3-1-124317 con la Fiduciaria Bogotá S.A.

El 24 de julio de 2025, la entidad contratante efectuó la transferencia del anticipo a la cuenta fiduciaria No. 003201282 – FIDUBOGOTÁ S.A. PA – CONSORCIO SOFAN C-031, por un valor de $10.116.500.361,00 MCTE, correspondiente al 30 % del valor contractual.

A la fecha de corte del presente informe, los recursos se encuentran disponibles en la cuenta fiduciaria para su ejecución conforme al plan de inversión aprobado y bajo la supervisión de la interventoría, en estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato fiduciario.

El detalle del movimiento bancario correspondiente al desembolso del anticipo se anexa al presente documento como **(ANEXO 9 – INFORME DE LA FIDUCIA).**

5. CALIDAD DE LA OBRA

5.1. Caracterización de las obras

Durante julio de 2025, las actividades de caracterización de los corredores viales priorizados se desarrollaron con un enfoque integral hacia el aseguramiento de la calidad, garantizando que la información topográfica y geoespacial recolectada cumpla con los estándares técnicos exigidos por la normativa vigente.

En el municipio de Ubalá, tramo Casa Rosada – San Luis – Laguna Azul, se efectuó la primera entrega formal del levantamiento topográfico, iniciando un proceso de revisión y ajuste en atención a las observaciones de la interventoría. Estas acciones incluyeron la verificación de capas geográficas, la corrección de posibles desviaciones y la validación en campo mediante estación topográfica, asegurando la precisión y confiabilidad de los datos.

Las actividades se ejecutaron bajo las metodologías establecidas en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (2018) y el Manual de Topografía para Proyectos Viales del INVIAS, fortaleciendo la base técnica para el diseño definitivo y garantizando que las decisiones de ingeniería se fundamenten en información real, precisa y verificada, con impacto directo en la durabilidad y funcionalidad de las intervenciones proyectadas.

5.2. Ensayos de laboratorio

Durante julio de 2025, se continuó con la ejecución de los ensayos de laboratorio correspondientes a la Fase II, orientados a verificar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el contrato ICCU-138 de 2025. Estas actividades se centraron en el análisis físico y mecánico de las muestras de suelo recolectadas en los tres tramos priorizados de la Provincia del Guavio, con el propósito de determinar sus propiedades y establecer la viabilidad de su uso en las estructuras de pavimento proyectadas.

Los ensayos realizados incluyeron granulometría, humedad natural, límites de Atterberg, peso específico y densidad seca máxima mediante Proctor estándar, siguiendo las normas técnicas INVIAS E-148-07, E-122 y E-141. Los resultados preliminares confirmaron la presencia de suelos clasificados como A-2-4, A-2-6 y A-2-7, con índices de plasticidad entre 12 % y 18 % y contenidos de finos superiores al 35 % en varios sectores, lo que indica baja capacidad portante

y alta sensibilidad a la humedad. Estas características sustentan la necesidad técnica de aplicar procesos de estabilización que garanticen el desempeño estructural de las vías.

En el marco de la evaluación de alternativas, se desarrollaron ensayos exploratorios con productos químicos no tradicionales para estabilización de suelos, considerando lo establecido en la Especificación INVIAS 237 de 2013. Sin embargo, a la fecha estos productos no cumplen con los requisitos exigidos en cuanto a certificaciones, ensayos de desempeño y documentación de respaldo técnico estipulados en el artículo 237-22.

Actualmente, los resultados se encuentran en análisis conjunto entre el especialista en pavimentos del contrato y el equipo técnico de la entidad, con el fin de definir el procedimiento más adecuado que asegure la estabilidad estructural de la vía y el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas. Este proceso permitirá tomar decisiones fundamentadas en datos verificables, garantizando la calidad y durabilidad de las soluciones constructivas.

5.3. Garantías y seguros

A continuación, se presenta la información correspondiente a las pólizas actualizadas con el acta de inicio, las cuales se encuentran debidamente aprobadas por la Entidad Contratante.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO
No. NB- 100367237
ANEXO 02

AMPAROS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR CUBIERTO
CUMPLIMIENTO	09/04/2025	10/09/2026	$7.070.047.045,60
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	09/04/2025	10/09/2026	$10.605.070.568,40
PRESTACIONES SOCIALES	09/04/2025	13/03/2029	$1.767.511.761,40
CALIDAD DEL SERVICIO	13/03/2026	13/03/2029	$694.722.024,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13/03/2026	12/03/2028	$9.771.404.140,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL No. NB- 100094891
ANEXO 02

AMPAROS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR CUBIERTO
RESPONSABILIDAD CIVIL	09/04/2025	13/03/2026	$1.767.511.761,00

6. SEGUIMIENTO AL PAGA

6.1. Seguimiento financiero al plan de inversión Ambiental.

Se tienen los costos asociados por la implementación del programa en cuanto a la disponibilidad de recursos para realizar todas las actividades de seguimiento y atención a las observaciones recibidas (estos incluyen recursos financieros, técnicos, humanos, tecnológicos y físicos como dotación, campamentos, computadores, carteleras, kits de derrames). Sin embargo, se contempla la discriminación de los costos por provincia de acuerdo con la formulación de los PAGA; no obstante, se tiene un presupuesto global ambiental para los PAGA de $526.739.880,00, el cual se ejecutará con el avance de las actividades constructivas.

CONCEPTO ACTA	PAGA	TOTALES
Valor Inicial	$ 526.739.880	$ 526.739.880
Anticipo	N/A	-
Ejecutado Presente mes		$ 0
Total, Ejecutado		$ 0
Por Ejecutar		$ 526.739.880

6.2. Actividades plan Ambiental

A continuación, se relaciona la lista de los programas a implementar y sus respectivos proyectos que le permitirá a CONSORCIO SOFAN C-031, realizar los Mejoramientos Rurales, contar con las herramientas de planificación ambiental requeridas para ejecutar las obras en cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

CONSORCIO SOFAN C-031 PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.			
PROYECTO 1. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL			
SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
Indicador	**Descripción del indicador**	**Indicador**	**Registro de cumplimiento**
Desempeño del PAGA	(N.º de profesionales contratados/ N.º de profesionales requeridos) *100%	$\frac{2}{2} X\ 100\% = 100\%$	Se cuenta con el personal contractual para dar cumplimiento a la conformación del equipo ambiental
	(No. de informes mensuales presentados y aprobados por la Interventoría) / (N° de informes mensuales contractuales) *100	$\frac{3}{3} X\ 100\% = 100\%$	Se presenta el informe mensual N3 correspondiente al mes de junio el cual cuenta con la aprobación de interventoría
Desempeño de Informes	(No. de observaciones recibidas) / (No. de observaciones atendidas) *100	$\frac{1}{1} X\ 100\% = 100\%$	Se presento la subsanación al informe N°3 correspondiente al mes de junio

PROYECTO 2. CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA			
SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
Indicador	**Descripción del indicador**	**Tipo de indicador**	**Registro de cumplimiento**
Capacitar el 100% del personal vinculado laboralmente al proyecto.	N.º de personal capacitado en temas ambientales / N.º de trabajadores * 100	$\frac{8}{8}\ X\ 100\% = 100\%$	Para el periodo se realiza la inducción al PAGA a la planta de personal activo en el proyecto
PROYECTO 3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES			
Indicador	**Descripción del indicador**	**Tipo de indicador**	**Registro de cumplimiento**
Mantener actualizado en PAGA y el compendio de normas ambientales que aplican al proyecto	N.º de programas actualizados y comunicados del PAGA / N.º total de programas del PAGA * 100	$\frac{1}{1}\ X\ 100\% = 100\%$	Para el periodo se reporta ejecución de la ficha con el desarrollo de inducción y la evaluación ambiental al PAGA

CONSORCIO SOFAN C-031				**PAC-2.3-06**
PROGRAMA 2 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.				
PROYECTO 3. DE SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES				
SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
Indicador	**Descripción del indicador**	**Tipo de indicador**	**Periodicidad de evaluación**	**Registro de cumplimiento**
Gestión e instalación señalización respectiva en el 100% de los sitios requeridos	Nº de señales implementadas en obra / Nº de señales establecidas en el PMT	$\frac{3}{3}\ X\ 100\% = 100\%$	Julio 2025	El proyecto se encuentra en fase de estudios y diseño, no obstante, se están ejecutando actividades de obras hidráulicas de drenaje, en aras de propender acciones de seguridad vial, se implementa señalización móvil en el frente de intervención.
	Nº de frentes de obras señalizados / Nº total de frentes de obra	$\frac{1}{1}\ X\ 100\% = 100\%$	Julio 2025	Se tiene un frente de obra en ejecución en el cual se implementó la señalización móvil.
PROYECTO 4. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS				
SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
Indicador	**Descripción del indicador**	**Tipo de indicador**	**Periodicidad de evaluación**	**Registro de cumplimiento**
Gestión de los escombros, de material sobrante o RCD´s aprovechables	Volumen de material de excavación = volumen de material reutilizado y aprovechado.	$\frac{38{,}8}{38{,}8}\ X\ 100\% = 100\%$	Julio 2025	El material producto de la excavación procedente de las obras hidráulicas de drenaje se dispuso en los predios en los que se estableció el acuerdo de recepción del material como donación. (ver actas)
Gestión de los escombros, de material sobrante o RCD´s y lodos generados por el proyecto	Volumen de material de escombros, de material sobrante o RCD´s y lodos extraído = volumen de material dispuesto en el sitio de disposición final establecido.	$\frac{0}{38{,}8}\ X\ 100\% = 0\%$	Julio 2025	Para el periodo no se reporta materias dispuesto en sitios autorizados, puesto que todo el material se entregó como donación a la comunidad.

Para mayor detalle sobre la información ambiental, reportes específicos y soportes documentales relacionados con esta sección, por favor remitirse al (**ANEXO 6 – INFORME AMBIENTAL NO. 4**)

6.3. Actividades plan SST

	ACTIVIDADES	DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES BÁSICAS	CALCULO	RESULTADO
PROGRAMA DESARROLLO APLICACIÓN Y GESTIÓN DEL ÁREA SST	AFILIACIONES DE PERSONAL EN EL PERIODO	$\frac{\text{Total de afiliaciones realizadas en el mes}}{\text{Total afiliaciones programas en el mes}} * 100$	$\frac{13}{13} * 100 =$	100%
	INDUCCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO	$\frac{\text{Total empleados socializados en el mes}}{\text{Total empleados programados en el mes}} * 100$	$\frac{13}{13} * 100 =$	100%
	PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	$\frac{Total\ de\ pagos\ realizados\ en\ el\ mes}{Total\ de\ pagos\ programados\ en\ el\ mes} * 100$	$\frac{45}{45} * 100 =$	100%
	EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO	$\frac{Total\ examenes\ realizadas\ en\ el\ mes}{Total\ examenes\ programados\ en\ el\ mes} * 100$	$\frac{13}{13} * 100 =$	100%
	VERIFICACIÓN DE USO DE EPPs	$\frac{sesiones\ realizadas\ en\ el\ mes}{sesiones\ \ programados\ en\ el\ mes} * 100$	$\frac{7}{7} * 100 =$	100%
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	$\frac{Total\ actividades\ realizadas\ en\ el\ mes}{Total\ actividades\ programadas\ en\ el\ mes} * 100$	$\frac{40}{50} * 100 =$	31.48%

6.4. Actividades plan Social.

Se brinda información detallada acerca de las actividades programadas e implementadas durante el periodo evaluado, incluyendo sus respectivos cálculos e indicadores de seguimiento. Esta información permitirá al Consorcio SOFAN C-031 validar los avances y dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Programa de Gestión Social del proyecto vigente.

La consolidación de estos datos garantiza la trazabilidad y el control mensual requerido por la interventoría y la entidad supervisora, facilitando así la toma de decisiones y el ajuste oportuno de las estrategias de intervención social en el territorio.

	PROGRAMA	ACTIVIDADES	
GESTIÓN SOCIAL	Atención a la comunidad	Atención de PQRS	No. De PQRSD – atendidas 0 No. De PQRSD – Recibidas 0
		Instalación de Punto SAU	1 punto SAU Instalado
		Buzones Satelitales.	3 número de buzones instalado
		Recorridos de obra.	3 recorridos
	Acciones de Información	Reuniones Preliminares	0 reuniones preliminares realizadas.
		Reunión de inicio	0 reuniones de inicio realizadas.
		Reuniones de Finalización	1 reuniones de extraordinarias realizadas
		Reuniones Extraordinarias	0 volantes informativos distribuidos
	Acciones de divulgación	Elaboración y distribución de Piezas de Comunicación	1 volantes informativos distribuidos
		Elaboración de cartas personalizadas	5 cartas personalizadas
		Banner punto SAU	1 banner instalados en los puntos
	Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos	Levantamiento de actas de vecindad de inicio	19 actas de inicio levantadas
		Levantamiento actas de vecindad de cierre	0 actas de cierre levantadas
		Levantamiento de Actas de Compromiso	0 actas de compromiso levantadas
		Formato de autorización para uso de predios	0 autorizaciones realizadas
	Cultura vial y participación comunitaria	Talleres pedagógicos	0 talleres pedagógicos realizados 0 personas que asistentes al taller
		Comité de participación comunitaria	0 integrantes por cada comité de participación 0 comités realizados
	Contratación mano de obra	Vinculación mano de obra	Número de MONC de obra local contratada *100 Número de MONC de obra contratada 4 x 100 = 30% 13 Número de mujeres contratadas *100 Total, de personal contratado 4 x 100 = 10% 38

Para mayor detalle sobre la información social, reportes específicos y soportes documentales relacionados con esta sección, por favor remitirse al (**ANEXO 7 – SOCIAL NO. 4**)

7. SEGUIMIENTO A PLANES DE MANEJO DE TRAFICO

7.1. Seguimiento financiero al plan de inversión manejo de tráfico.

Durante el mes de julio de 2025 se ejecutaron actividades de Plan de Manejo de Tráfico (PMT) en el tramo Casa Rosada – San Luis – Laguna Azul, municipio de Ubalá (Provincia del Guavio). No obstante, estas actividades aún no han sido objeto de facturación, por lo que no se registra movimiento financiero en este periodo.

Provincia	Valor presupuestado (MCTE)	Valor ejecutado (MCTE)	% Ejecución
Medina	$73.615.201	$0	0 %
Provincia del Guavio	$97.078.895	$0	0 %
Provincia de Oriente	$145.619.111	$0	0 %
Soacha	$17.336.793	$0	0 %
Total	**$333.650.000**	**$0**	**0 %**

Cabe resaltar que, aunque se desarrollaron actividades de PMT durante el periodo, estas no generaron pagos asociados en julio. En consecuencia, el **(ANEXO 3 – SEGUIMIENTO PMT)** mantiene el registro financiero en cero, dejando constancia de la ejecución física realizada.

7.2. Actividades plan de manejo de tráfico.

En el mes de julio de 2025 se realizaron actividades de PMT en el tramo Casa Rosada – San Luis – Laguna Azul (Ubalá – Provincia del Guavio), consistentes en:

- Instalación temporal de señalización preventiva y reglamentaria.
- Implementación de control de tráfico por personal autorizado (*paleteros*).
- Canalización y delimitación de zonas de trabajo.

Estas acciones se ejecutaron conforme a las especificaciones del PMT aprobado por la interventoría, garantizando la seguridad vial durante las labores en el frente de obra. Para mayor información, por favor remitirse al **(ANEXO 4 – INFORME TÉCNICO NO. 4).**

8. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO

Dando cumplimiento a lo establecido en el Pliego Definitivo del proceso ICCU-LP-031 de 2024, y en especial a la Matriz 3 de Riesgos contractuales, durante el mes de julio de 2025 se realizó el seguimiento correspondiente a los veinte (20) riesgos identificados para el contrato ICCU-CTO-138 de 2025.

La evaluación de dichos riesgos se llevó a cabo conforme a los lineamientos establecidos en la matriz oficial, incluyendo:

- Verificación del nivel de materialización de cada riesgo,
- Clasificación del nivel de impacto y probabilidad actualizado,
- Acciones de mitigación implementadas o proyectadas,
- Soportes disponibles y responsables asignados.

Al corte de julio, cuatro (4) riesgos se han materializado parcialmente, a saber:

- **Riesgo 8:** Dificultad para conseguir recursos financieros. Durante la primera parte del mes el contratista asumió gastos con recursos propios hasta la recepción del anticipo el 24 de julio, momento en que se inició su ejecución bajo el plan de inversión aprobado.
- **Riesgo 9:** Lluvias que impactaron tramos de Fómeque y Quetame, generando atrasos que repercutieron en la programación de todos los tramos. Se implementó reprogramación y ajustes operativos para mitigar el impacto.
- **Riesgo 17:** Imposibilidad de acceso de personal y equipos debido a cierres en Fómeque y Quetame, lo que ocasionó la suspensión temporal de actividades en esos tramos y la priorización de otros frentes hasta recuperar el acceso.
- **Riesgo 18:** Demoras en los pagos de actas parciales de avance de obra. Se radicó el 30 de abril de 2025 la solicitud del primer pago correspondiente al componente de caracterización de corredores viales y ensayos (Oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-055); al cierre de julio no se había recibido pronunciamiento por parte del ICCU. Se reorganizó el cronograma interno para mitigar la afectación en la disponibilidad financiera.

Los riesgos restantes no se han materializado y permanecen bajo monitoreo activo. Se han adoptado controles preventivos como el seguimiento climático semanal, revisión de condiciones geotécnicas, verificación jurídica de habilitación del contratista y vigilancia tributaria y normativa.

El detalle del seguimiento completo, estructurado por cada riesgo, con su respectivo análisis técnico y documental, se encuentra en el siguiente anexo **(ANEXO 8 – SEGUIMIENTO MATRIZ 3 DE RIESGOS**)

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el mes de julio de 2025 se avanzó en el desarrollo de las actividades correspondientes a la Fase I (Diagnóstico y Caracterización Vial) y Fase II (Caracterización de Materiales y Ensayos de Laboratorio), consolidando información clave sobre las condiciones iniciales de los corredores viales priorizados y las características físicas, químicas y mecánicas de los suelos. Estos resultados constituyen la base técnica para la definición de las alternativas de intervención en la etapa constructiva del proyecto.

No obstante, el avance de las fases mencionadas se vio condicionado por factores externos e internos que afectaron el ritmo previsto de ejecución. Entre estos se encuentra el desembolso tardío del anticipo contractual, recibido el 24 de julio, lo cual limitó la adquisición de equipos y la vinculación de personal adicional; las condiciones climáticas adversas, caracterizadas por lluvias persistentes que dificultaron el acceso y redujeron la productividad en campo; y restricciones de movilidad en municipios como Fómeque y Quetame, que ocasionaron suspensiones temporales y reprogramaciones de actividades. Adicionalmente, los resultados preliminares de laboratorio evidenciaron que los estabilizantes químicos no tradicionales evaluados no cumplen a la fecha con los requisitos establecidos en el artículo 237-22 del Manual de Carreteras del INVIAS, situación que requiere un análisis técnico y jurídico para definir su viabilidad de uso en el marco normativo y contractual vigente.

En este sentido, se recomienda a la Entidad contratante optimizar los tiempos de trámite y aprobación de las actas de pago y del flujo de recursos del anticipo, a fin de garantizar la continuidad operativa del contrato. De igual manera, se sugiere implementar la reprogramación de actividades priorizando tramos con mejores condiciones de acceso y menor afectación por

lluvias, así como evaluar la incorporación de cuadrillas adicionales de topografía y laboratorio para mitigar el atraso acumulado. Igualmente, se considera fundamental fortalecer el monitoreo de las condiciones climáticas y los protocolos de respuesta en tramos críticos, y coordinar con las autoridades locales las acciones necesarias para minimizar las afectaciones por cierres viales. Finalmente, se recomienda que las decisiones relacionadas con la selección de estabilizantes y soluciones constructivas sean respaldadas por análisis técnicos y jurídicos, garantizando así su funcionalidad, estabilidad y conformidad con las especificaciones contractuales y normativas vigentes.

10. ANEXOS

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FOR-CO-01
Versión 01

No.	CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	ASUNTO	PRESENTACION					ANEXOS O FOLIOS	RESPUESTA
					Fax.	Ofic.	Fact.	Med. Mag	Correo		RESPONSABLE
106	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-105	01 de Julio de 2025	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	Radicación de archivo – Levantamiento topográfico UBALÁ					X	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UBALÁ	JEFERSSON AMEZQUITA
107	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-106	01 de Julio de 2025	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	Radicación de archivo – GNSS GPS 12.1 y GPS 12.2					X	GNSS GPS 12.1 Y GPS 12.2	JEFERSSON AMEZQUITA
108	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-107	01 de Julio de 2025	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	Solicitud de reprogramación del Programa General Integral de Obra					X	Reporte de clima, Fomeque, Choachí y Junín Metodología Auscultar Cronograma Auscultar Oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-017 Oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-081 Reprogramación General del Contrato	WILSON LOAIZA
109	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-108	03 de Julio de 2025	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	Radicación de documentos técnicos y de laboratorio – Tramo Casa Rosada – San Luis y Ensayos suelo-cemento					X	Documentos técnicos y de laboratorio – Tramo Casa Rosada – San Luis y Ensayos suelo-cemento	JORGE SANCHEZ
110	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-109	07 de Julio de 2025	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	Radicación de documentos técnicos y de laboratorio – Tramo CLEMENTE – PALENQUE – RÍO SUCIO					X	Documentos técnicos y de laboratorio – Tramo CLEMENTE – PALENQUE – RÍO SUCIO	JORGE SANCHEZ
111	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-110	08 de julio del 2025	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	Radicación de observaciones de maquinaria y vehículos presentados para FASE 3– Contrato No. 138 de 2025.					X	MAQUINARIA 1. CERTIFICADO MANTENIMIENTO RETRO B95B 2. CERTIFICADO OPTIMAS CONDICIONES RETRO B95B 3. CERTIFICADO MANTENIMIENTO RETRO B95B 4. CERTIFICADO DE IDONEIDAD RETRO B95B 5. FACTURA NEW HOLLAND 6. TRAZABILIDAD DE MANTENIMIENTOS 7. FOR-MAQ-01 - HOJA DE VIDA RETRO 2014 VEHUCULO 1. SOAT WER-185-VIG. 2026 2-CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3. CERTIFICADO OPTIMAS CONDICIONES WER185 4. CERTIFICADO COMPROMISO MTTO WER185 5-TRAZABILIDAD DE MANTENIMIENTOS 6. HOJA DE VIDA VOLQUETA 7-FACTURAS MANTENIMIENTOS	MARCELA PINTO
112	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-111	08 de Julio de 2025	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	Radicación de documentación técnica – Respuesta a oficio 766-105-ICCU – Diseño de mezcla de concreto hidráulico.					X	Concepto Técnico No. 01 TS-FT-131-2025 CARTA INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO E	JORGE SANCHEZ
114	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-113	10 de Julio de 2025	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	Respuesta a oficio 766-102-ICCU – Topografía					X	GNSS Gps 12.1 y Gps 12.2 UBALA V1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UBALÁ V1	JEFERSSON AMEZQUITA
115	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-114	10 de julio del 2025	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	Radicación del Informe Social Mensual No. 2					X	INF. SOCIAL 2	ANDRES CAÑON NIÑO
116	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-115	10 de Julio de 2025	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	Respuesta a oficio 766-091-ICCU –Flujo de caja del contrato de obra					X	FLUJO DE CAJA ICCU 138 V2	CRISTIAN CAMILO GRIMALDO
117	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-116	11 de Julio de 2025	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	Reporte de condiciones climáticas y emergencias climática en el desarrollo de las actividades de la Fase I y Fase II del contrato.					X	Videos e imagenes de los tramos viales por municipio	YESICA RAIGOSO DÍAZ
118	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-117	11 de Julio de 2025	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	Corrección y complemento del oficio FOR-CO-03-107 – Reprogramación					X	ICCU-138-2025-CAMINOSVECINALES_CLB2_ REPROG. 1. 11072025	CRISTIAN CAMILO GRIMALDO
119	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-118	14 de julio del 2025	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU	Solicitud de pronunciamiento escrito sobre el estado del anticipo y del pago del primer 25% del componente de caracterización de corredores viales y ensayos.					X	NA	WILSON LOAIZA
120	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-119	15 de Julio de 2025	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	Reporte actualizado de dificultades de acceso a tramos viales – Emergencias climáticas y restricciones de movilidad al 15 de julio de 2025					X	NA	YESICA RAIGOSO DÍAZ
122	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-121	18 de Julio de 2025	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	Radicación de documentos técnicos y de laboratorio – Tramo SUEVA – SAN FRANCISCO – VALLE – JUNÍN					X	Documentos técnicos y de laboratorio – Tramo SUEVA - SAN FRANCISCO -VALLE JUNÍN	JORGE SANCHEZ
123	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-122	22 de julio del 2025	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU	Radicación de actualización de pólizas del contrato ICCU-138 de 2025		X				Anexo 03 de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB–100094891 Anexo 03 de la Póliza de Cumplimiento – Entidades Estatales Decreto 1082 No. NB–100367237.	YESICA RAIGOSO DÍAZ
124	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-123	23 de Julio de 2025	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	Respuesta al oficio 766-114-ICCU Topografía Ubalá Capas Geográficas					X	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UBALÁ V02	JEFERSSON AMEZQUITA
125	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-124	25 de julio del 2025	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	Radicación de remplazo de la HV del Profesional Social.					X	Hoja de Vida del Profesional Documento de identificación y/o Tarjeta Profesional. Título Pregrado o Posgrado requerido. Certificaciones de Experiencia. Certificado por la entidad supervisora del profesional. Carta de Intención firmada por el profesional. Verificación de cumplimiento del profesional con el perfil requerido.	MARCELA PINTO
126	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-125	25 de julio del 2025	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	Radicación Hoja de Vida Ingeniero Residente					X	Hoja de Vida del Profesional Documento de identificación y/o Tarjeta Profesional. Título Pregrado o Posgrado requerido. Certificaciones de Experiencia. Certificado por la entidad supervisora del profesional. Carta de Intención firmada por el profesional. Verificación de cumplimiento del profesional con el perfil requerido.	MARCELA PINTO
127	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-126	28 de julio del 2025	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	Respuesta la oficio No. 766-128-ICCU OBSERVACIONES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PRESENTADOS CONTRATO N° 138 DE 2025					X	Carpeta documental retroexcavadora B95B y volqueta WER-185	MARCELA PINTO
128	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-127	28 de Julio de 2025	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	Justificación técnica del retraso en la ejecución de actividades correspondientes a la Primera y Segunda Fase del contrato					X	Precipitaciones IDEAM Precipitaciones ClimateSERV Informe Técnico Diario IDEAM – SNGRD – SINA Predicción Climática IDEAM	YESICA RAIGOSO DÍAZ
129	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-128	29 de Julio de 2025	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	Respuesta a oficio 766-120 Reprogramación ajustada al plazo contractual vigente					X	ICCU-138-2025-CAMINOSVECINALES_CLB2_ REPROG. V2	CRISTIAN CAMILO GRIMALDO
130	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-129	31 de Julio de 2025	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	Respuesta a oficio 766-122 – Observaciones a documentos técnicos y de laboratorio – Tramo Casa Rosada – San Luis y ensayos suelo-cemento					X	FOR-ADM-10_INFORME_FINAL TRAMO_CASA_ROSADA_-_SAN_LUISv1 CARTA DE INTENCIÓN ING- ING. JORGE SANCHEZ- SOFAN	JORGE SANCHEZ

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FOR-CO-02
Versión 02

CONSEC.	FECHA RECIBIDO	PRESENTACION					REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ANEXOS O FOLIOS	REQUIERE RESPUESTA			RESPUESTA	
766-101	01 de julio de 2025					X	CONSORCIO INTERVENTORIA AC	CONSORCIO SOFAN C-031	Respuesta al oficio FOR-CO-03-ICCU031-100 solicitud de aplazamiento del inicio de actividades (Fase I y II)- provincia de medina	Folios 3		X			
766-102	02 de julio de 2025					X	CONSORCIO INTERVENTORIA AC	CONSORCIO SOFAN C-031	RESPUESTA A COMUNICADO SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-105 Radicación de archivo – Levantamiento topográfico UBALÁ y COMUNICADO SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-106 Radicación de archivo – GNSS GPS 12.1 y GPS 12.2	Folios 3	X		JEFERSSON AMEZQUITA PICON	10 de Julio de 2025	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-113
766-103-ICCU	02 de julio de 2025					X	CONSORCIO INTERVENTORIA AC	CONSORCIO SOFAN C-031	APROBACIÓN Y APERTURA DE ATENCIÓN EN EL PUNTO SAU – PROVINCIA DEL GUAVIO.	Folios 2 ANEXO 1. Consolidado de actividades relacionadas con el Punto SAU – Provincia del Guavio.		X			
766-105-ICCU	0 4 de julio de 2025					X	CONSORCIO INTERVENTORIA AC	CONSORCIO SOFAN C-031	RTA FOR-CO-003-61 – REVISIÓN DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO HIDRÁULICO	Folios 2 ANEXO MT-2458-CM467-2025. Revisión Diseño Mezclas concreto 2000, 3000 y 4000 PSI	X		JORGE ALBERTO SANCHEZ	08 de Julio de 2025	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-111
766-106-ICCU	04 de julio de 2025					X	CONSORCIO INTERVENTORIA AC	CONSORCIO SOFAN C-031	RTA FOR-CO-003-95 – ENTREGA DE CRITERIOS TÉCNICOS, METODOLOGÍAS Y ENSAYOS – COMPONENTE DE PAVIMENTOS Y GEOTECNIA	Folios 2 MT-2460-CM467-2025. Revisión Comunicación Sofan-095		X			
766-107-ICCU	10 de julio de 2025					X	CONSORCIO INTERVENTORIA AC	CONSORCIO SOFAN C-031	INICIO DE OBRAS HIDRÁULICAS TRAMO CASA ROSADA – LAGUNA AZUL MUNICIPIO DE UBALÁ – SOLICITUD TOPOGRÁFICA	Folios 2	X		WILSON LOAIZA GALINDO		
766-108-ICCU	08 de julio de 2025					X	CONSORCIO INTERVENTORIA AC	CONSORCIO SOFAN C-031	ALCANCE AL COMUNICADO FOR-CO-03-ICCU031-104 – VIABILIDAD TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REDUCCIÓN DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD A UN (1) AÑO	Folios 5		X			
766-111-ICCU	10 de julio de 2025					X	CONSORCIO INTERVENTORIA AC	CONSORCIO SOFAN C-031	LLAMADO DE ATENCIÓN POR INCUMPLIMIENTOS EN LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS PARA EL COMPONENTE SOCIAL	Folios 4 Anexo 1. Actividades realizadas fuera del tiempo establecido.					
766-113	10 de julio de 2025					X	CONSORCIO INTERVENTORIA AC	CONSORCIO SOFAN C-031	RESPUESTA AL COMUNICADO FOR-CO-03-ICCU031-074, INFORME CUMPLIMIENTO OBLIGACION CONTRACTUAL-CONSULTA A ARN SOBRE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL EN PROCESO DE REINCORPORACION	Folios 2		X			
766-114-ICCU	11 de julio de 2025					X	CONSORCIO INTERVENTORIA AC	CONSORCIO SOFAN C-031	RESPUESTA COMUNICADO FOR-CO-03-ICCU031-113 TOPOGRAFÍA UBALÁ CAPAS GEOGRÁFICAS	Folios 9	X		JEFERSSON AMEZQUITA PICON	23 de Julio de 2025	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-123
766-117-ICCU	14 de julio de 2025					X	CONSORCIO INTERVENTORIA AC	CONSORCIO SOFAN C-031	RESPUESTA FOR-CO-03-114: APROBACIÓN INFORME MENSUAL No. 2 Versión 4 – Componente Social	Folios 2		X			
766-120-ICCU	16 de julio de 2025					X	CONSORCIO INTERVENTORIA AC	CONSORCIO SOFAN C-031	Respuesta a: oficio FOR-CO-03-ICCU031-116, Reporte de condiciones y emergencias climáticas en el desarrollo de las actividades de la Fase I y Fase II del contrato; oficio FOR-CO-03-ICCU031-117 reprogramación corrección y complemento al oficio FOR-CO-03-107 y oficio FOR-CO-03-ICCU031-119.	Folios 2	X		CRISTIAN CAMILO GRIMALDOS YANES	29 de Julio de 2025	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-128
766-122-ICCU	17 de julio de 2025					X	CONSORCIO INTERVENTORIA AC	CONSORCIO SOFAN C-031	RESPUESTA FOR-CO-03-ICCU031-108 // OBSERVACIONES A DOCUMENTOS TÉCNICOS Y DE LABORATORIO – TRAMO CASA ROSADA – SAN LUIS Y ENSAYOS SUELO-CEMENTO	Folios 2 MT-2494-CM467-2025. Revisión Comunicación Sofan-108 Casa Rosada-San Luis	X		JORGE ALBERTO SANCHEZ	31 de Julio de 2025	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-129
766-123-ICCU	17 de julio de 2025					X	CONSORCIO INTERVENTORIA AC	CONSORCIO SOFAN C-031	RESPUESTA FOR-CO-03-ICCU031-109 // OBSERVACIONES A INFORME DE DISEÑO DE ESTABILIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PROVINCIA DEL GUAVIO - TRAMO CLEMENTE – PALENQUE – RÍO SUCIO – VERSIÓN 1"	Folios 2 MT-2495-CM467-2025. Revisión Comunicación Sofan-109 Clemente-Rio Sucio	X		JORGE ALBERTO SANCHEZ		
766-124-ICCU	21 de julio de 2025					X	CONSORCIO INTERVENTORIA AC	CONSORCIO SOFAN C-031	PRIMER LLAMADO DE ATENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA OPORTUNA DE LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL No. 3 - COMPONENTE SOCIAL	Folios 3					
766-125-ICCU	21 de julio de 2025					X	CONSORCIO INTERVENTORIA AC	CONSORCIO SOFAN C-031	Respuesta y aprobación al oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-115, Respuesta a oficio 766-091-ICCU –Flujo de caja del contrato de obra. FLUJO INVERSIÓN EJECUCIÓN	Folios 1		X			
766-126-ICCU	21 de julio de 2025					X	CONSORCIO INTERVENTORIA AC	CONSORCIO SOFAN C-031	TRASLADO DE SOLICITUD DE LA ENTIDAD AL CONSORCIO SOFÁN C-031 Y REQUERIMIENTO DE LA HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL SOCIAL.	Folios 2	X		AREA SOCIAL		
766-128-ICCU	25 de julio de 2025					X	CONSORCIO INTERVENTORIA AC	CONSORCIO SOFAN C-031	RESPUESTA FOR-CO-03-ICCU031-110 // SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PRESENTADOS CONTRATO N° 138 DE 2025	Folios 2	X		MARCELA PINTO BLANCO	28 de julio del 2025	SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-126
766-129-ICCU	25 de julio de 2025					X	CONSORCIO INTERVENTORIA AC	CONSORCIO SOFAN C-031	SOLICITUD DE REALIZACION DE LOS 4 PAGAS DE ACUERDO CON LAS PROVINCIAS GUAVIO, MEDINA, ORIENTE Y SOACHA.	Folios 2	X		ELIZABETH GIOVANA DAZA SOCARRAS		
766-130-ICCU	25 de julio de 2025					X	CONSORCIO INTERVENTORIA AC	CONSORCIO SOFAN C-031	RESPUESTA A OFICIO SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-123 TOPOGRAFÍA UBALÁ CAPAS GEOGRÁFICAS	Folios 2	X		JEFERSSON AMEZQUITA PICON		
766-133-ICCU	29 de julio de 2025					X	CONSORCIO INTERVENTORIA AC	CONSORCIO SOFAN C-031	RESPUESTA FOR-CO-03-ICCU031-121 // OBSERVACIONES A INFORME DE DISEÑO DE ESTABILIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PROVINCIA DEL GUAVIO – TRAMO SUEVA – SAN FRANCISCO – VALLE – JUNÍN – VERSIÓN 1"	Folios 2 Anexo MT-2518-CM467-2025. Revisión Comunicación Sofan-121 Sueva-San Francisco	X		JORGE ALBERTO SANCHEZ		

Consorcio SOFAN C-031	**CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO** FOR-LB-02 INTERNO Versión 01	
PERIODO:	1 JULIO DEL 2025 AL 31 DE JULIO DEL 2025	

NOMBRE DEL INSTRUMENTO O EQUIPO DE INSPECCION	MARCA	No. DE SERIE DEL EQUIPO	MODELO	UNIDAD	RANGO MINIMO	RANGO MAXIMO	FRECUENCIA DE CALIBRACION O VERIFICACIÓN RECOMENDADA POR PROVEEDOR EXTERNO	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO RECOMENDADA POR PROVEEDOR EXTERNO	FRECUENCIA DE VERIFICACION RECOMENDADA POR PROVEEDOR EXTERNO	VERIFICACIÓN INTERNA	CONDICIONES AMBIENTALES Y CONSERVACION	No. DE CERTIFICADO	FECHA DE CALIBRACIÓN	PROXIMA CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN
Estación Total	Gowin	8E7649	TKS-202	Sistema metrico decimal		5km	6 meses	6 meses	6 meses	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	2876	16/06/2025	16/12/2025
Estación Total	South	S50496	NTS-352R	Sistema metrico decimal		5km	6 meses	6 meses	6 meses	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	2693	8/03/2025	8/09/2025
Estación Total	Topcon	UL1381	UL1381	Sistema metrico decimal		5km	6 meses	6 meses	6 meses	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	2810	14/05/2025	14/11/2025
Estación Total	Topcon	285329	GTS-236W	Sistema metrico decimal		5km	6 meses	6 meses	6 meses	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	2831	29/05/2025	29/11/2025
Nivel	Topcon	WP012052	AT-B4A	Sistema metrico decimal	0.2mts	90mts	6 meses	6 meses	6 meses	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	306	28/03/2025	28/09/2025
Receptor GNSS IMU-RTK	ALLYNAV	N/A	R26L	GNSS (unidad de medición satelital)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	N/A	N/A	N/A
FLEXOMETRO	ZAJU TOOL	CM-01	BDHT36153	mm	0	3000	3 año	3 año	3 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	DID-148-1307	31/08/2023	31/08/2026
PIE DE REY DIGITAL	UBERMAN	13910760	NA	mm	0	150	3 año	3 año	3 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	DID-166-2426	4/04/2023	4/04/2026
BALANZA DIGITAL	KERN	5610128	EW300-2	kg	0.2	300	1 año	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	CM-3941	3/07/2024	3/07/2025
BALANZA DIGITAL	LEXUS	NT191012	OUSTON 22T	kg	0.2	30	1 año	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	CM-3942	3/07/2024	3/07/2025
BALANZA DIGITAL	TEXON	BZ-001	NA	kg	0.1	15	1 año	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	CM-3943	3/07/2024	3/07/2025
BALANZA DIGITAL	BBG	220500000242	S1	g	20	15000	1 año	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	CM-3944	3/07/2024	3/07/2025
BALANZA DIGITAL	BBG	220500000311	S1	g	20	15000	1 año	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	CM-3945	3/07/2024	3/07/2025
BALANZA DIGITAL	LEXUS	E005	MIX-H	g	0.2	600	1 año	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	CM-3946	3/07/2024	3/07/2025
BALANZA DIGITAL	LEXUS	E004	MIX-A	g	2	3000	1 año	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	CM-3947	3/07/2024	3/07/2025
BALANZA DIGITAL	ELECTRONIC BALANCE	2041903030	XY-1000B	g	5	1000	1 año	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	CM-3948	3/07/2024	3/07/2025
MÁQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN	MAQUISUELOS	006	MQH-4	kN	20	1000	1 año	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	CF-4211	3/07/2024	3/07/2025
MÁQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN-MARSHALL	PINZUAR	319	S050403	kN	0.2	50	1 año	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	CF-4212	4/07/2024	4/07/2025
MÁQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN-MARSHALL	PINZUAR	319	S050403	kN	0.2	5	1 año	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	CF-4213	4/07/2024	4/07/2025
HORNO DE SECADO	BLUE ELECTRIC	Q131	OV480	°C	20	250	1 año	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	CMT-0875-24	5/08/2024	4/08/2025
Cámara clímatica con sistema de recirculación de aire (Horno)	BLUE ELECTRIC	Q131	OV480	°C	20	250	1 año	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	LT-4324-24	4/07/2024	4/07/2025
Termohigrómetro digital	EBCHQ	24012181	94196	°C	0	50	1 año	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	LT-5770-24	14/08/2024	19/08/2025
DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO LIVIANO	TERRATEST	9000 LWD ASTM	E2583	mm, MPa, ms	0.1 mm	2.0 mm	1 año	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	20240901-0946-G1G2	1/09/2024	31/09/2025
Barra hoyadora)	N/A	N/A	BARRA-HOYA-RUTEL	N/A	N/A	N/A	N/A	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	N/A	N/A	N/A
Paladraga	COLIMA INCOLMA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	N/A	N/A	N/A
Planta electrica	HYUNDAI	N/A	HYG9250E	W	N/A	7500 W	N/A	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	N/A	N/A	N/A
Cazuela casa grande	PINZUAR	N/A	S020604	kg	N/A	N/A	N/A	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	N/A	N/A	N/A
Penetrómetro dinámico ligero (DPL) manual	PINZUAR	N/A	S010203	N/A	N/A	N/A	N/A	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	N/A	N/A	N/A
Mufla de materia organica	PINZUAR	N/A	G060501	°C	N/A	N/A	N/A	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	N/A	N/A	N/A
Ranudador	PINZUAR	N/A	S020607	N/A	N/A	N/A	N/A	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	N/A	N/A	N/A
Tamices	PINZUAR	N/A	G080201	N/A	N/A	N/A	N/A	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	N/A	N/A	N/A
Balanza de densidades	TRUMAX	YS230673	FENIX	g	20	15000	1 año	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	CC76489	26/08/2024	26/08/2025
Humedometro	DIRIMPEX	4326748	MC-405	N/A	N/A	N/A	1 año	1 año	1 año	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	N°839	8/11/2025	8/11/2026
Vibroapisonador	Wacker Neuson	N/A	DS70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	N/A	N/A	N/A
Martillo demoledor	BOSCH	N/A	GSH 27 VC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	N/A	N/A	N/A
Planta electrica	Honda	N/A	3300GLX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	VERIFICADO	BUENAS CONDICIONES	N/A	N/A	N/A

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Las condiciones técnicas previstas por el ICCU para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato.	1.Modificaciones presupuestales y prorrogas al contrato suscrito. 2.Declaratoria de Desierta del proceso	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA O ICCU	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	2	2	4	BAJO	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, en la etapa precontractual.	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL
2	GENERAL	INTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el mismo por no ser conveniente su adjudicación.	Revocatoria del Proceso de selección	1	1	2	BAJO	ICCU	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU	1	1	2	BAJO	NO	Gestores y/o Supervisores	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual.	EN TAPA PRECONTRACTUAL
3	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones.	Declaratoria de Desierta	2	1	3	BAJO	ICCU	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU	1	1	2	BAJO	NO	Gestores y/o Supervisores.	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual.	EN TAPA PRECONTRACTUAL
4	GENERAL	EXTERNA	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No firmarse el contrato por el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista	Selección de nuevo contratista	1	1	2	BAJO	ICCU	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU	1	1	2	BAJO	SI	Gestores y/o Supervisores.	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual.	EN TAPA PRECONTRACTUAL
5	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA E ICCU	-Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones. -Recopilar datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. - Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual. - Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	MENSUAL
6	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	ICCU	Es responsabilidad del contratista de obra junto con la Interventoría, únicamente de Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. El ICCU de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista de Obra e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.	1	1	2	BAJO	SI	GESTORES Y/O SUPERVISORES, INTERVENTOR-CONTRATISTA	Al inicio de la ocurrencia del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, del ICCU, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	CUANDO OCURRA EL EVENTO
7	GENERAL	INTERNA O/O EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	3	2	5	MEDIO	ICCU	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU	2	2	4	BAJO	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual.	MENSUAL
8	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Dificultad para conseguir recursos financieros por parte del contratista necesarios para lograr el objetivo del contrato, así como el valor adicional que representen plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones, causados con ocasión de los mismos.	Retrasos en la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Contar con la capacidad financiera contemplada en los términos de referencia del proceso de selección.	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Monitorear la capacidad financiera contemplada en los términos de referencia del proceso de selección	MENSUAL
9	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	3	2	5	MEDIO	ICCU	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados	DETERMINADAS POR LOS EXPERTOS DEL CONTRATISTA EN ESTA MATERIA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Afectaciones ambientales adicionales generadas por el contratista durante la ejecución del proyecto derivadas de las obligaciones técnicas y ambientales a que haya lugar, conforme la naturaleza de las actividades a desarrollar.	Posible variación del valor del contrato	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. Se cuenta con viabilidades y permisos, así como licencias.	1	1	2	BAJO	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisiones de expertos del contratista en cuanto se requieran los trámites necesarios para la obtención de permisos o licencia, lo anterior, previo a la ejecución de las actividades del contrato	MENSUAL
11	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista	Terminación del contrato	1	4	5	MEDIO	ICCU	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU	1	3	4	BAJO	SI	Gestores y/o Supervisores.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual.	CUANDO OCURRA EL EVENTO
12	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato	Imposición de multas y sanciones	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU	2	2	4	MEDIO	SI	Gestores y/o Supervisores. Interventor-Contratista	Etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual.	MENSUAL
13	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIA	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones a contratista	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	1	1	2	BAJO	ICCU	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	1	2	BAJO	NO	Gestores y/o Supervisores. Interventor-Contratista	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	MENSUAL
14	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes	Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial	2	2	4	BAJO	CONTRTISTA Y/O ICCU	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU	1	1	2	BAJO	SI	Gestores y/o Supervisores. Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual.	CUANDO OCURRA EL EVENTO
15	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIA	Modificación del régimen impositivo luego de celebrado el contrato.	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación del mismo	3	1	4	BAJO	ICCU	Realizar seguimiento al régimen impositivo aplicable al tipo de contrato	2	1	3	BAJO	SI	Gestores y/o Supervisores Interventor-Contratista	Etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Vigilancia de los cambios del régimen impositivo	MENSUAL
16	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variación de los precios del mercado; Precio fijo sin reajuste. No se cancelarán reajustes luego el contratista asume los cambios en el mercado y no reclamará ni pretenderá reajustes, así mismo, asume el riesgo de pago por unidad de medida y precio unitario, con excepción de la aplicación de la formula de reajuste contenida dentro del contrato y que solo aplica a los insumos del asfalto, cemento y acero, para lo cual se podrá solicitar el reajuste.	Incremento en el costo de las actividades de construcción	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA E ICCU	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	MENSUAL
17	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Imposibilidad de accesibilidad o desplazamientos de maquinaria y equipos para la ejecución de las obras en la zona de influencia del proyecto.	Incremento en el costo de las actividades de construcción	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA E ICCU	Monitoreo del corredor vial por parte del contratista; recomendar medidas preventivas, correctivas o de mitigación de las inestabilidades observadas. Análisis e implementación de medidas pertinentes con este fin.	2	2	4	MEDIO	EN EMERGENCIAS DE GRAN MAGNITUD PUEDE AFECTARSE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	Gestores y/o Supervisores. Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	El contratista conocerá en visita de obra el terreno. Análisis de Contratista e Interventor y si es necesario participación del ICCU, Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación, Informes respectivos, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO
18	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Pagos Por Avance De Obra: el proponente seleccionado deberá asumir la totalidad de los costos de la ejecución del contrato y se someterá a los trámites y requisitos para el pago definitivo, de acuerdo con la fuente de financiación del presente proceso.	Demoras en los pagos de las actas de avance parcial de obra.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU	2	2	4	MEDIO	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguir el procedimiento indicado en el manual de contratación del ICCU en la etapa precontractual.	MENSUAL
19	GENERAL	EXTERNA	PRECONTRACTUAL	CORRUPCIÓN	Posible conducta de colusión	1.Quejas y reclamos 2. Investigaciones disciplinarias 3. Afectación a la imagen institucional. 4. Retraso en el cumplimiento de metas. 5. Perjuicio a los recursos de del ICCU	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA/ICCU	Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Contratistas, Interventores, Supervisores, funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera diáfana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al ICCU.	2	3	5	MEDIO	SI	ratistas de Obra, de Estudios y Diseños, Interventor, Supervisores y/o Gestores y/o funcionarios ICCU	u Inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras.	PERMANENTE

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
						6. Baja calidad de los bienes o servicios adquiridos por ICCU												Cor int	A			
20	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgo de la Naturaleza	Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. El riesgo puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de márgenes de los rios, los cuales pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos. El ICCU asume el Riesgo por concepto de mayores cantidades de obra que sean necesarias, siempre y cuando no sean de responsabilidad del Contratista.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, Aumento de costos por necesidad de mayores cantidades de obra , y eventuales mayores plazos	3	3	6	Riesgo Alto	ICCU	Monitoreo del corredor vial por parte de Especialistas en Geotecnia para recomendar medidas preventivas, correctivas ó de mitigación de las inestabilidades observadas. Análisis e implementación de medidas pertinentes con este fin, contemplando de ser necesario la elaboración de estudios respectivos. En las emergencias que se presenten, atención inmediata de las mismas dando prioridad a las obras de transitabilidad y seguridad vial; recomendación de especialistas para solución definitiva, provisional ó de mitigación, análisis e implementación. En todos los casos, adoptar las medidas contractuales a que haya lugar, en cuanto a mayores cantidades de obra y plazos si fuere necesario.	2	2	4	Riesgo Medio	En emergencias de gran magnitud puede afectarse la ejecución del contrato.	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Visitas y recomendaciones de Especialistas, Análisis de Contratista e Interventor y si es necesario participación del ICCU, Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas ó de mitigación, Informes respectivos, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	A inicio del contrato, cuando se detecten nuevos sitios inestables, cuando se presenten emergencias.

(3 1 124317) 3 1 P124317 CONSORCIO SOFAN C 031

INFORME MENSUAL

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025080107CD2011150244



194896 79-2533

FIDUBOGOTA SA PA - CONSORCIO SOFAN C-031
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1034 Gerente Empresarial Bogotá 2
194896

FECHA EXTRACTO **Julio - Julio 2025**
Desde: Julio 01 Hasta: Julio 31
Cuenta Número: 003201282
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 1034
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**0.00**
Total 000001 Abonos:	10,116,500,361.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	**10,116,500,361.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
24/07	0106	Dispersion de fondo del Banco Avvillas Numero de identificacion NIT 000000900258711 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	002690	10,116,500,361.00	10,116,500,361.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2
