Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cali – Valle del Cauca

CONTRATISTA:		CONTRATANTE:				OBJETO:	
JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA				CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS A LAS SEDES JUDICIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO" Y SEDE JUDICIAL FAMILIA DE PALMIRA, PALACIO DE JUSTICIA "OSCAR TRUJILLO LERMA " DE ROLDANILLO Y PALACIO DE JUSTICA DE CARTAGO, INCLUYENDO MATERIALES A TODO COSTO.	
FECHA PRESENTE:							
29/11/25		CONTRATO No.	064 DE 2025				
FECHA ACTA DE INICIO:	1/08/25	VALOR CONTRATO:	$1.373.787.900,00				
Periodo Acta	26/08/25	VALOR ADICIÓN AL CONTRATO:	$ -	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 1:		VR.ACTA ACTUAL (1)	**$639.013.131,00**
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:		**VALOR TOTAL CONTRATO:**	**$ 1.373.787.900,00**	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 2:		TOTAL PAGADO	$639.013.131,00
31/12/25		ACTA No.	**1**	**TOTAL TIEMPO ADICIONES**	**$ -**	**SALDO ACTUAL CONTRATO**	**$734.774.769,00**

INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONTRATO INTERVENTORIA	VALOR CONTRATO:	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 1:	TIEMPO (DIAS) ADICIÓN 2:
MARIA CLAUDIA GARCIA CARDENAS	N/A	N/A	N/A	N/A

			CANTIDADES CONTRACTUALES				ACTA DE MAYORES / MENORES CANTIDADES / BALANCE		TOTAL A EJECUTAR		Acta 1 $639.013.131,00		Acta 2 #VALOR!	
ITEM	**ID**	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNITARIO ANTES DE AIU E IVA**	**VALOR**	**MAYORES Y MENORES**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
		CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA												
		Adecuación baño PMR												
1	PR-29	Retiro de tuberia hidráulica existinte de 1/2	ML	5,02	$ 10.009,00	$ 50.245,00	0,00	$ -	5,02	$ 50.245,00	0,00	$ -		$ -
2	PR-35	Regatas en muros	ML	1,00	$ 18.365,00	$ 18.365,00	0,00	$ -	1,00	$ 18.365,00	0,00	$ -		$ -
3	IH-23	Suministro e instalación de tapa registro de 15x15	UND	3,00	$ 37.333,00	$ 111.999,00	0,00	$ -	3,00	$ 111.999,00	0,00	$ -		$ -
4	PR-07	Demolición enchape cerámico, incluye retiro de escombros	M2	64,01	$ 40.336,00	$ 2.581.867,00	0,00	$ -	64,01	$ 2.581.867,00	74,27	$ 2.995.916,00		$ -
5	AC-10	Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad	M2	16,94	$ 129.622,00	$ 2.196.341,00	0,00	$ -	16,94	$ 2.196.341,00	0,00	$ -		$ -
6	AC-11	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	M2	21,56	$ 121.957,00	$ 2.629.661,00	0,00	$ -	21,56	$ 2.629.661,00	0,00	$ -		$ -
7	PR-23	Desmonte aparatos sanitarios	UND	6,00	$ 35.648,00	$ 213.888,00	0,00	$ -	6,00	$ 213.888,00	16,00	$ 570.368,00		$ -
8	PR-37	Reinstalación de aparatos sanitarios	UND	1,00	$ 63.782,00	$ 63.782,00	0,00	$ -	1,00	$ 63.782,00	0,00	$ -		$ -
9	AP-03	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal Milano Blanco (incluye griferia)	UND	1,00	$ 370.168,00	$ 370.168,00	0,00	$ -	1,00	$ 370.168,00	0,00	$ -		$ -
10	AC-52	Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante incluye base en aluminio	M2	1,00	$ 383.890,00	$ 383.890,00	0,00	$ -	1,00	$ 383.890,00	0,00	$ -		$ -
11	IH-01	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos y accesorios para su instalación	ML	5,10	$ 52.997,00	$ 270.285,00	0,00	$ -	5,10	$ 270.285,00	0,00	$ -		$ -
12	IH-20	Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación	UND	2,00	$ 74.138,00	$ 148.276,00	0,00	$ -	2,00	$ 148.276,00	0,00	$ -		$ -
13	IH-06	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios	ML	18,12	$ 32.388,00	$ 586.871,00	0,00	$ -	18,12	$ 586.871,00	0,00	$ -		$ -
14	IH-07	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1" incluye accesorios	ML	5,00	$ 42.126,00	$ 210.630,00	0,00	$ -	5,00	$ 210.630,00	0,00	$ -		$ -
15	IH-12	Suministro e instalación punto hidráulico 1/2"	UND	2,00	$ 70.623,00	$ 141.246,00	0,00	$ -	2,00	$ 141.246,00	0,00	$ -		$ -
16	AP-04	Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos	UND	1,00	$ 370.448,00	$ 370.448,00	0,00	$ -	1,00	$ 370.448,00	0,00	$ -		$ -
17	IH-19	Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2"	UND	1,00	$ 108.686,00	$ 108.686,00	0,00	$ -	1,00	$ 108.686,00	0,00	$ -		$ -
18	IH-15	Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario	UND	2,00	$ 57.558,00	$ 115.116,00	0,00	$ -	2,00	$ 115.116,00	0,00	$ -		$ -
19	DI-22	Alistado piso 4cm mortero 1:3	M2	21,56	$ 44.740,00	$ 964.693,00	0,00	$ -	21,56	$ 964.693,00	22,64	$ 1.013.070,00		$ -
20	PR-31	Desmontar y retiro las divisiones de baño existentes	UND	6,00	$ 71.858,00	$ 431.148,00	0,00	$ -	6,00	$ 431.148,00	6,00	$ 431.148,00		$ -
21	PR-13	Corte de piso en concreto con pulidora	ML	16,20	$ 16.436,00	$ 266.263,00	0,00	$ -	16,20	$ 266.263,00	20,00	$ 328.720,00		$ -
22	AC-19	Suministro e instalación de tableta de aress formato 30 x 30 (Aprox)	M2	21,56	$ 88.884,00	$ 1.916.535,00	0,00	$ -	21,56	$ 1.916.535,00	0,00	$ -		$ -
23	VA-01	Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	M3	22,40	$ 98.890,00	$ 2.215.136,00	0,00	$ -	22,40	$ 2.215.136,00	13,20	$ 1.305.694,00		$ -
24	AC-47	suministro y aplicación estuco relleno muros	M2	46,44	$ 21.655,00	$ 1.005.654,00	0,00	$ -	46,44	$ 1.005.654,00	37,14	$ 804.371,00		$ -
25	AC-50	suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados	JGO	1,00	$ 991.188,00	$ 991.188,00	0,00	$ -	1,00	$ 991.188,00	0,00	$ -		$ -
26	AP-05	suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad	UND	1,00	$ 1.337.014,00	$ 1.337.014,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.337.014,00	0,00	$ -		$ -
27	AP-07	suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte	UND	1,00	$ 1.136.407,00	$ 1.136.407,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.136.407,00	0,00	$ -		$ -
28	AC-44	Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.	UND	1,00	$ 276.297,00	$ 276.297,00	0,00	$ -	1,00	$ 276.297,00	0,00	$ -		$ -
29	CA-29	Suministro e instalación de puerta de 1.00 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular 177 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	1,00	$ 1.683.410,00	$ 1.683.410,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.683.410,00	0,00	$ -		$ -
30	CA-34	Suministro e instalación de división en aluminio para baños de 1.21x2 mts, fabricados en tubular 177 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación, seaún diseño	UND	2,00	$ 1.487.734,00	$ 2.975.468,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.975.468,00	0,00	$ -		$ -
31	CA-37	suministro e instalación de puerta de 0.80x2mts con pasador y manija, fabricados en tubular 177 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y	UND	1,00	$ 1.496.924,00	$ 1.496.924,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.496.924,00	0,00	$ -		$ -
32	IH-11	suministro e instalación de puntos sanitario de 4"	UND	2,00	$ 126.364,00	$ 252.728,00	0,00	$ -	2,00	$ 252.728,00	0,00	$ -		$ -
		Tratamiento impermeabilización terraza							0,00					
33	PR-49	Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros	M2	1411,77	$ 25.500,00	$ 36.000.135,00	0,00	$ -	1.411,77	$ 36.000.135,00	1.250,00	$ 31.875.000,00		$ -
34	PR-47	Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar material bituminoso)	M2	1411,77	$ 36.451,00	$ 51.460.428,00	0,00	$ -	1.411,77	$ 51.460.428,00	1.250,00	$ 45.563.750,00		$ -
35	DI-15	Resane de superficie de losa, (agrietamiento y fisuras) con material sellador elástico de poliuretano	ML	141,18	$ 19.524,00	$ 2.756.340,00	0,00	$ -	141,18	$ 2.756.340,00	0,00	$ -		$ -
36	RI-24	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm incluye media caña en mortero perimetral altura 10cm (superficie con pendiente)	M2	358,92	$ 44.057,00	$ 15.812.938,00	0,00	$ -	358,92	$ 15.812.938,00	129,96	$ 5.725.648,00		$ -
37	CC-22	Suministro y aplicación de pintura sellante elongable autonivelante.	M2	358,92	$ 66.775,00	$ 23.966.883,00	0,00	$ -	358,92	$ 23.966.883,00	0,00	$ -		$ -
38	RI-08	Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perfines de fijación)	M2	1052,85	$ 272.238,00	$ 286.625.778,00	0,00	$ -	1.052,85	$ 286.625.778,00	0,00	$ -		$ -
39	AC-19	Suministro e instalación de enchape antideslizante	M2	358,92	$ 147.015,00	$ 52.766.624,00	0,00	$ -	358,92	$ 52.766.624,00	0,00	$ -		$ -
		Arreglo y tratamiento de humedad en fachada Lateral							0,00					
40	PR-41	Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)	M2	116,49	$ 9.325,00	$ 1.086.245,00	0,00	$ -	116,49	$ 1.086.245,00	0,00	$ -		$ -
41	DI-26	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 10 mm, incluye masillada, filos, junta visible y pintura para exterior	M2	87,52	$ 161.612,00	$ 14.144.282,00	0,00	$ -	87,52	$ 14.144.282,00	69,00	$ 11.151.228,00		$ -
42	DI-27	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 10 mm, incluye masillada, filos, junta visible y pintura para exterior	ML	68,97	$ 113.262,00	$ 7.811.680,00	0,00	$ -	68,97	$ 7.811.680,00	69,00	$ 7.815.078,00		$ -
43	VA-07	Lavada de fachada con agua a chorro de aspersion con hipoclorito (incluye retiro de material extraño y piezas rotas)	M2	620,73	$ 13.789,00	$ 8.559.246,00	0,00	$ -	620,73	$ 8.559.246,00	621,00	$ 8.562.969,00		$ -
44	AC-02	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior a 3 manos - tipo 1	M2	620,73	$ 46.972,00	$ 29.156.930,00	0,00	$ -	620,73	$ 29.156.930,00	525,00	$ 24.660.300,00		$ -

45	RI-03	Suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio (impermeabilización, incluye emulsión asfáltica)	M2	68,97	$ 58.167,00	$ 4.011.778,00	0,00	$ -	68,97	$ 4.011.778,00	0,00	$ -		$ -				
		Tratamiento humedades internas							0,00									
46	PR-01	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	M2	20,91	$ 10.537,00	$ 220.329,00	0,00	$ -	20,91	$ 220.329,00	31,05	$ 327.174,00		$ -				
47	RI-09	Suministro y aplicación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	M2	20,91	$ 49.635,00	$ 1.037.868,00	0,00	$ -	20,91	$ 1.037.868,00	31,05	$ 1.541.167,00		$ -				
48	AC-01	Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones)	M2	83,64	$ 36.623,00	$ 3.063.148,00	0,00	$ -	83,64	$ 3.063.148,00	0,00	$ -		$ -				
49	AC-42	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)(Incluye filos y dilataciones)	M2	209,10	$ 19.441,00	$ 4.065.113,00	0,00	$ -	209,10	$ 4.065.113,00	0,00	$ -		$ -				
		otros							0,00									
50	DI-28	Suministro e instalación de fachaleta similiar a la existente, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y aplicación de hidrófugo	UND	30,00	$ 106.766,00	$ 3.202.980,00	0,00	$ -	30,00	$ 3.202.980,00	0,00	$ -		$ -				
51	CA-02	Desmonte de puerta metálica	M2	6,72	$ 49.327,00	$ 331.477,00	0,00	$ -	6,72	$ 331.477,00	0,00	$ -		$ -				
52	SH-18	Suministro e instalación de puerta corta fuego para la subestación eléctrica - Resistencia al fuego de 180 minutos bajo la norma americana norma UL10B-UL10C con Bisagra en acero de 4 ½" con balineras, manija de apertura exterior certificada UL, barra antipánico tipo push y cierrapuerta automático en aluminio resistente a la corrosión, nave en lamina cold rolled calibre 18, marco en lamina de cold rolled calibre 16, rellenos en honeycomb de papel kraf, junta intuintumescente en el marco	M2	6,72	$ 2.381.238,00	$ 16.001.919,00	0,00	$ -	6,72	$ 16.001.919,00	0,00	$ -		$ -				
53	CA-45	Suministro e instalación de reja metalica (puerta) metálica tubular 1"x1"x 1,2mm con parales de en tubo rectangular 90 x 50 x 2.0mm x 6m estructural HR50, incluye marco, perforación de muro, resanes, base o platina para pared, cerradura argolla para candado, acabado de pintura y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	2,08	$ 374.838,00	$ 779.663,00	0,00	$ -	2,08	$ 779.663,00	2,08	$ 779.663,00		$ -				
54	CA-16	Suministro e instalación de pasamanos metálico tipo mueble 2", incluye elementos de fijación (platinas, anclajes, otros), pintura anticorrosiva y pintura de esmalte color a definir	ML	12,80	$ 93.590,00	$ 1.197.952,00	0,00	$ -	12,80	$ 1.197.952,00	14,70	$ 1.375.773,00		$ -				
55	PR-27	Demolición muro en ladrillo (incluye retiro)	M2	1,00	$ 65.476,00	$ 65.476,00	0,00	$ -	1,00	$ 65.476,00	4,12	$ 269.761,00		$ -				
56	AC-21	Fundición de concreto estampado con color, espesor 10cm , incluye nivelación de piso y malla (color y diseño a definir en sitio)	M2	8,00	$ 154.117,00	$ 1.232.936,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.232.936,00	0,00	$ -		$ -				
57	CA-46	Mantenimiento de pasamanos existente, incluye lijada, masilla de relleno y acaabdo de pintura 3 en 1)	ML	22,40	$ 44.753,00	$ 1.002.467,00	0,00	$ -	22,40	$ 1.002.467,00	100,38	$ 4.492.400,00		$ -				
58	CA-20	Mantenimiento de reja metalica, incluye desmonte, cepillado, limpieza del elemento, cambio de partes afectadas, cambio de chapa donde se requiera, aplicación de pintura epóxica y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	80,80	$ 94.379,00	$ 7.625.823,00	0,00	$ -	80,80	$ 7.625.823,00	247,31	$ 23.341.059,00		$ -				
59	CA-47	Suministro e instalación de reja metálica tubular 1"x1"x 1,2mm con parales de en tubo rectangular 90 x 50 x 2.0mm x 6m estructural HR50, incluye soldadura, acabado con pintura 3 en 1 y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	9,50	$ 267.750,00	$ 2.543.625,00	0,00	$ -	9,50	$ 2.543.625,00	0,00	$ -		$ -				
60	CA-48	Desmonte y retiro de vidrio existente	M2	1,57	$ 50.106,00	$ 78.907,00	0,00	$ -	1,57	$ 78.907,00	0,00	$ -		$ -				
61	CA-49	Suministro e instalación de vidrio templado de seguridad 5 mm	M2	2,00	$ 297.570,00	$ 595.140,00	0,00	$ -	2,00	$ 595.140,00	0,00	$ -		$ -				
62	VA-05	Aseo general.	M2	214,80	$ 6.251,00	$ 1.342.715,00	0,00	$ -	214,80	$ 1.342.715,00	214,80	$ 1.342.715,00		$ -				
63	PR-13	Corte de piso en concreto con pulidora	MI	6,36	$ 16.436,00	$ 104.533,00	0,00	$ -	6,36	$ 104.533,00	0,00	$ -		$ -				
64	PR-07	Demolición enchape de piso, incluye retiro de sobrantes	M2	7,95	$ 40.336,00	$ 320.671,00	0,00	$ -	7,95	$ 320.671,00	0,00	$ -		$ -				
65	PR-24	Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros	M3	7,95	$ 497.309,00	$ 3.953.607,00	0,00	$ -	7,95	$ 3.953.607,00	0,00	$ -		$ -				
66	PR-48	Relleno con rocamuerta 95% PM	M3	4,77	$ 115.808,00	$ 552.404,00	0,00	$ -	4,77	$ 552.404,00	0,00	$ -		$ -				
67	DI-09	Contrapiso en concreto e=0,10m	M2	7,95	$ 109.996,00	$ 874.468,00	0,00	$ -	7,95	$ 874.468,00	0,00	$ -		$ -				
68	DI-22	Alistado piso 5cm mortero 1:3	M2	7,95	$ 55.965,00	$ 444.922,00	0,00	$ -	7,95	$ 444.922,00	0,00	$ -		$ -				
69	AC-64	Suministro e instalación de piso en tableta de gres estriaque de 7cms x 24cms,	M2	7,95	$ 127.374,00	$ 1.012.623,00	0,00	$ -	7,95	$ 1.012.623,00	0,00	$ -		$ -				
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 613.330.682,00**		**$ -**		**$ 613.330.682,00**		**$ 176.272.972,00**		**$ -**				
		ADMINISTRACION			27,00%	$ 165.599.284,00		$ -		$ 165.599.284,00		$ 47.593.702,00	27,00%	$ -				
		IMPREVISTO			1,00%	$ 6.133.307,00		$ -		$ 6.133.307,00		$ 1.762.730,00	1,00%	$ -				
		UTILIDAD			5,00%	$ 30.666.534,00		$ -		$ 30.666.534,00		$ 8.813.649,00	5,00%	$ -				
		IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	$ 5.826.641,00		$ -		$ 5.826.641,00		$ 1.674.593,00	19,00%	$ -				
		VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A)				**$ 821.556.448,00**		**$ -**		**$ 821.556.448,00**		**$ 236.117.646,00**		**$ -**				

CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

ITEM	*ID*	*DESCRIPCIÓN*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*VALOR UNITARIO*	*VALOR TOTAL*	*MAYORES Y MENORES*	*VALOR*	*CANT.*	*VALOR*	*CANT.*	*VALOR*	*CANT.*	*VALOR*
		Cubierta												
1	PR-62	Desmonte de teja en policarbonato , incluye estructura en mal estado y respectivo retiro	M2	171	$ 15.535,00	$ 2.656.485,00	0,00	$ -	171,00	$ 2.656.485,00	186,78	$ 2.901.627,00		$ -
2	PR-63	Desmonte de teja termoacustica , incluye retiro	M2	184	$ 16.885,00	$ 3.106.840,00	0,00	$ -	184,00	$ 3.106.840,00	0,00	$ -		$ -
3	DI-16	Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza	UND	43	$ 68.320,00	$ 2.937.760,00	0,00	$ -	43,00	$ 2.937.760,00	12,00	$ 819.840,00		$ -
4	CC-21	Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan entre 12cm a 15 cm de alto x 30 cm de ancho, incluye materiales complementarios de conexión, , corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos	UND	43	$ 70.697,00	$ 3.039.971,00	0,00	$ -	43,00	$ 3.039.971,00	24,00	$ 1.696.728,00		$ -
5	CC-24	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x100 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	158	$ 119.598,00	$ 18.896.484,00	0,00	$ -	158,00	$ 18.896.484,00	0,00	$ -		$ -
6	CC-13	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	122	$ 114.763,00	$ 14.001.086,00	0,00	$ -	122,00	$ 14.001.086,00	190,54	$ 21.866.942,00		$ -
7	CC-14	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	207,81	$ 107.532,00	$ 22.346.225,00	0,00	$ -	207,81	$ 22.346.225,00	436,10	$ 46.894.705,00		$ -
8	CC-17	Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementosa de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	332	$ 85.685,00	$ 28.447.420,00	0,00	$ -	332,00	$ 28.447.420,00	452,15	$ 38.742.387,00		$ -
9	PR-12	Demolición muro existente incluye retiro	M3	1	$ 198.421,00	$ 198.421,00	0,00	$ -	1,00	$ 198.421,00	0,40	$ 79.368,00		$ -
10	PR-46	Retiro de manto impermeabilizante foil	M2	10	$ 18.996,00	$ 189.960,00	0,00	$ -	10,00	$ 189.960,00	32,84	$ 623.829,00		$ -
11	DI-24	Fabricación muro en mamposteria e;10cm	M2	6,002	$ 152.856,00	$ 917.442,00	0,00	$ -	6,00	$ 917.442,00	11,91	$ 1.821.126,00		$ -
12	RI-01	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm	M2	6,002	$ 40.772,00	$ 244.714,00	0,00	$ -	6,00	$ 244.714,00	23,83	$ 971.515,00		$ -
13	DI-22	Alistado piso 4cm mortero 1:3	M2	66	$ 44.740,00	$ 2.952.840,00	0,00	$ -	66,00	$ 2.952.840,00	17,71	$ 792.345,00		$ -
14	RI-24	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente)	M2	66	$ 44.057,00	$ 2.907.762,00	0,00	$ -	66,00	$ 2.907.762,00	17,71	$ 780.249,00		$ -
15	PR-64	Sumnistro e instalación de cubierta provisional en plastico o lona, incluye cuerda perimetral,alambre, bastidor y todo lo necesario para su correcta instalación y su posterior retiro.	M2	332	$ 39.685,00	$ 13.175.420,00	0,00	$ -	332,00	$ 13.175.420,00	95,63	$ 3.795.235,00		$ -
16	CC-15	Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, ancho entre 30 y 45 cm ,incluye platina para soporte cana y todo lo necesario para su correcta instalación	ML	11,3	$ 94.212,00	$ 1.064.596,00	0,00	$ -	11,30	$ 1.064.596,00	0,00	$ -		$ -
17	CC-25	Suministro e instalación de caballete para teja upvc 2.5 mm, incluye accesorios para su correcta instalación	ML	16	$ 85.485,00	$ 1.367.760,00	0,00	$ -	16,00	$ 1.367.760,00	19,12	$ 1.634.473,00		$ -
18	PR-05	Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 4", incluye retiro	UND	4	$ 193.400,00	$ 773.600,00	0,00	$ -	4,00	$ 773.600,00	1,00	$ 193.400,00		$ -
19	IH-03	Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4", incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación	ML	15	$ 62.409,00	$ 936.135,00	0,00	$ -	15,00	$ 936.135,00	7,00	$ 436.863,00		$ -
20	CC-26	Suministro e instalación de gárgolas prefabricadas cuyas medidas son 8 x12x 21 cm , incluye todo lo necesario correcta instalación)	UND	4	$ 60.624,00	$ 242.496,00	0,00	$ -	4,00	$ 242.496,00	0,00	$ -		$ -
21	CC-27	Sumnistro e instalación de frescasa, incluye malla en alambre galvanizado de 20 cm x 20cm	M2	152	$ 52.478,00	$ 7.976.656,00	0,00	$ -	152,00	$ 7.976.656,00	0,00	$ -		$ -
22	RI-03	Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo	M2	10	$ 58.167,00	$ 581.670,00	0,00	$ -	10,00	$ 581.670,00	0,00	$ -		$ -

23	RI-04	Suministro e instalación de membrana liquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrilico base agua mejorado.	M2	24	$ 212.682,00	$ 5.104.368,00	0,00	$ -	24,00	$ 5.104.368,00	71,67	$ 15.242.919,00		$ -
		Arreglo Fachada (acceso)							0,00					
24	PR-50	Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales.	ML	8	$ 11.407,00	$ 91.256,00	0,00	$ -	8,00	$ 91.256,00	0,00	$ -		$ -
25	PR-41	Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)	M2	7	$ 9.325,00	$ 65.275,00	0,00	$ -	7,00	$ 65.275,00	0,00	$ -		$ -
26	PR-41	Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)	ML	33	$ 7.956,00	$ 262.548,00	0,00	$ -	33,00	$ 262.548,00	0,00	$ -		$ -
27	DI-21	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior	M2	6,88	$ 80.325,00	$ 552.636,00	0,00	$ -	6,88	$ 552.636,00	0,00	$ -		$ -
28	DI-21	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye estructura, masillada, filos y pintura para exterior 2 manos	ML	35,1	$ 47.878,00	$ 1.680.518,00	0,00	$ -	35,10	$ 1.680.518,00	0,00	$ -		$ -
29	AC-09	Suministro e instalación de perfil de dilatación tipo U	ML	15	$ 13.693,00	$ 205.395,00	0,00	$ -	15,00	$ 205.395,00	0,00	$ -		$ -
30	CA-42	Suministro e instalación de alfajía metálica, incluye desmonte de ventana, retiro de alfajía en mal estado, e instalación de nueva alfajía	ML	5,4	$ 75.137,00	$ 405.740,00	0,00	$ -	5,40	$ 405.740,00	0,00	$ -		$ -
31	VA-03	suministro y aplicación de adhesivo y/o sellador para exterior para elemento metálica	ML	12,5	$ 27.972,00	$ 349.650,00	0,00	$ -	12,50	$ 349.650,00	0,00	$ -		$ -
32	PR-01	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	M2	17	$ 10.537,00	$ 179.129,00	0,00	$ -	17,00	$ 179.129,00	0,00	$ -		$ -
33	AC-01	Suministro y aplicación de estuco plástico	M2	28	$ 23.186,00	$ 649.208,00	0,00	$ -	28,00	$ 649.208,00	0,00	$ -		$ -
34	VA-09	Suministro y aplicación de pintura acrílica a tres manos para exterior Tipo 1 - incluye filos y dilataciones	M2	55	$ 42.591,00	$ 2.342.505,00	0,00	$ -	55,00	$ 2.342.505,00	0,00	$ -		$ -
		Cuarto de residuos solidos							0,00					
35	DI-16	Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza	UND	2	$ 68.320,00	$ 136.640,00	0,00	$ -	2,00	$ 136.640,00	0,00	$ -		$ -
36	CC-21	Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan entre 10cm a 15 cm de alto x 15 a 20 cm de ancho, incluye materiales complementarios de conexión, , corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos	UND	4	$ 66.152,00	$ 264.608,00	0,00	$ -	4,00	$ 264.608,00	4,00	$ 264.608,00		$ -
37	CC-13	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	17,45	$ 114.763,00	$ 2.002.614,00	0,00	$ -	17,45	$ 2.002.614,00	18,35	$ 2.105.901,00		$ -
38	CC-14	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	12	$ 107.532,00	$ 1.290.384,00	0,00	$ -	12,00	$ 1.290.384,00	21,25	$ 2.285.055,00		$ -
39	CC-19	Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	13	$ 80.484,00	$ 1.046.292,00	0,00	$ -	13,00	$ 1.046.292,00	0,00	$ -		$ -
40	CC-15	Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte cana y todo lo necesario para su correcta instalación	ML	4	$ 94.212,00	$ 376.848,00	0,00	$ -	4,00	$ 376.848,00	0,00	$ -		$ -
41	CC-05	Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro	ML	6,32	$ 48.446,00	$ 306.179,00	0,00	$ -	6,32	$ 306.179,00	0,00	$ -		$ -
42	IH-03	Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4", incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación	ML	3,2	$ 62.409,00	$ 199.709,00	0,00	$ -	3,20	$ 199.709,00	0,00	$ -		$ -
43	RI-24	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente)	M2	13,05	$ 44.057,00	$ 574.979,00	0,00	$ -	13,05	$ 574.979,00	0,00	$ -		$ -
44	AC-48	Suministro y aplicación de pintura epoxica (2 capas)	M2	23,50	$ 42.111,00	$ 989.642,00	0,00	$ -	23,50	$ 989.642,00	0,00	$ -		$ -
45	CA-10	Instalación de puerta existente en aluminio 2,40 mt x2,80 mt), incluye todo lo necesario para su correcta instaalción	UND	1	$ 163.434,00	$ 163.434,00	0,00	$ -	1,00	$ 163.434,00	0,00	$ -		$ -
46	AC-10	Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad	M2	0,72	$ 129.622,00	$ 93.328,00	0,00	$ -	0,72	$ 93.328,00	0,00	$ -		$ -
47	DI-21	Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y pintura para exterior	M2	3,726	$ 80.325,00	$ 299.291,00	0,00	$ -	3,73	$ 299.291,00	0,00	$ -		$ -
		Adecuaciones Electricas							0,00					
48	IE-06	Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra	UND	7	$ 144.091,00	$ 1.008.637,00	0,00	$ -	7,00	$ 1.008.637,00	0,00	$ -		$ -
49	IE-01	Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado RETIE	ML	15	$ 79.313,00	$ 1.189.695,00	0,00	$ -	15,00	$ 1.189.695,00	0,00	$ -		$ -
50	IE-07	Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado	ML	10	$ 17.484,00	$ 174.840,00	0,00	$ -	10,00	$ 174.840,00	0,00	$ -		$ -
51	IE-02	Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación	UND	21	$ 36.606,00	$ 768.726,00	0,00	$ -	21,00	$ 768.726,00	0,00	$ -		$ -
52	IE-03	Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH	ML	158	$ 11.446,00	$ 1.808.468,00	0,00	$ -	158,00	$ 1.808.468,00	0,00	$ -		$ -
53	IE-50	Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación)	UND	7	$ 81.290,00	$ 569.030,00	0,00	$ -	7,00	$ 569.030,00	0,00	$ -		$ -
54	IE-04	Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS)	UND	7	$ 22.051,00	$ 154.357,00	0,00	$ -	7,00	$ 154.357,00	0,00	$ -		$ -
55	IE-22	Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A	UND	7	$ 41.103,00	$ 287.721,00	0,00	$ -	7,00	$ 287.721,00	0,00	$ -		$ -
56	IE-05	Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado	UND	7	$ 122.044,00	$ 854.308,00	0,00	$ -	7,00	$ 854.308,00	0,00	$ -		$ -
57	IE-16	Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T	UND	1	$ 3.195.955,00	$ 3.195.955,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.195.955,00	0,00	$ -		$ -
58	IE-23	Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación)	UND	1	$ 554.127,00	$ 554.127,00	0,00	$ -	1,00	$ 554.127,00	0,00	$ -		$ -
		Tratamiento de humedades internas												
59	PR-01	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	M2	4,55	$ 10.537,00	$ 47.943,00	0,00	$ -	4,55	$ 47.943,00	0,00	$ -		$ -
60	RI-09	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	M2	4,55	$ 46.495,00	$ 211.552,00	0,00	$ -	4,55	$ 211.552,00	0,00	$ -		$ -
61	AC-01	Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones)	M2	4,55	$ 34.790,00	$ 158.295,00	0,00	$ -	4,55	$ 158.295,00	0,00	$ -		$ -
62	AC-04	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos)(Incluye filos y dilataciones)	M2	11,375	$ 21.984,00	$ 250.068,00	0,00	$ -	11,38	$ 250.068,00	0,00	$ -		$ -
63	AC-06	Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 2	M2	29,5	$ 16.149,00	$ 476.396,00	0,00	$ -	29,50	$ 476.396,00	0,00	$ -		$ -
64	PR-28	Desmonte y retiro de cielo en panel yeso	M2	2,6	$ 17.596,00	$ 45.750,00	0,00	$ -	2,60	$ 45.750,00	0,00	$ -		$ -
		Baño PMR												
65	PR-23	Desmonte aparatos sanitarios, incluye todos los accesorios existentes y el respectivo retiro	UND	4	$ 35.648,00	$ 142.592,00	0,00	$ -	4,00	$ 142.592,00	0,00	$ -		$ -
66	PR-07	Demolición enchape de piso, incluye retiro, empaque y trasiego de escombros.	M2	12,6984	$ 40.336,00	$ 512.203,00	0,00	$ -	12,70	$ 512.203,00	0,00	$ -		$ -
67	PR-08	Demolición enchape de muro, incluye retiro, empaque y trasiego de escombros.	M2	36,64	$ 43.580,00	$ 1.596.771,00	0,00	$ -	36,64	$ 1.596.771,00	0,00	$ -		$ -
68	PR-61	Desmonte y retiro de espejo existente	UND	2	$ 35.615,00	$ 71.230,00	0,00	$ -	2,00	$ 71.230,00	0,00	$ -		$ -
69	AP-05	suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad	UND	2	$ 1.255.599,00	$ 2.511.198,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.511.198,00	0,00	$ -		$ -
70	AP-07	suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte	UND	2	$ 1.085.697,00	$ 2.171.394,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.171.394,00	0,00	$ -		$ -
71	AC-44	Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.	UND	2	$ 276.297,00	$ 552.594,00	0,00	$ -	2,00	$ 552.594,00	0,00	$ -		$ -
72	AC-51	suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados	JGO	2	$ 925.591,00	$ 1.851.182,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.851.182,00	0,00	$ -		$ -
		Otros												
73	SH-20	Desmonte de escalera tipo gato existente - Incluye retiro de material sobrante y disposición final	ML	3,8	$ 71.439,00	$ 271.468,00	0,00	$ -	3,80	$ 271.468,00	0,00	$ -		$ -
74	SH-01	Suministro e instalación de Escalera tipo gato - certificada - con sus respectivos accesorios,anclajes y demas certificados, que garantices su optima instalación y funcionamiento	ML	3,8	$ 1.170.671,00	$ 4.448.550,00	0,00	$ -	3,80	$ 4.448.550,00	0,00	$ -		$ -
75	VA-05	Aseo general.	M2	412,7	$ 5.868,00	$ 2.421.724,00	0,00	$ -	412,70	$ 2.421.724,00	412,70	$ 2.421.724,00		$ -
76	SH-03	Suministro e instalación de placa de identificación	UND	1	$ 284.381,00	$ 284.381,00	0,00	$ -	1,00	$ 284.381,00	0,00	$ -		$ -
77	SH-06	Entrega de certificado seaún Resolución 4272 de 2021.	UND	1	$ 2.752.740,00	$ 2.752.740,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.752.740,00	0,00	$ -		$ -

78	SN	Empaque de escombros en fibra	m3	3	$	96.265,00	$	288.795,00	0,00	$	-	3,00	$	288.795,00	6,00	$	577.590,00		$	-
79	SN	Cargue material manual	m3	6	$	13.333,00	$	79.998,00	0,00	$	-	6,00	$	79.998,00	6,00	$	79.998,00		$	-
80	SN	Retiro acarreo material volqueta kilom	m3k	6	$	2.350,00	$	14.100,00	0,00	$	-	6,00	$	14.100,00	6,00	$	14.100,00		$	-
81	SN	Disposición final de escombros y sobrantes	M3	6	$	4.578,00	$	27.468,00	0,00	$	-	6,00	$	27.468,00	6,00	$	27.468,00		$	-
82	SN	Movimiento vertical de materiales - escombros	KG	1149	$	149,00	$	171.201,00	0,00	$	-	1.149,00	$	171.201,00	4.749	$	707.576,00		$	-
SUBTOTAL COSTO DIRECTO							**$**	**180.519.376,00**		**$**	**-**		**$**	**180.519.376,00**		**$**	**147.777.571,00**		**$**	**-**
ADMINISTRACION						25,00%	$	45.129.844,00		$	-		$	45.129.844,00		$	36.944.393,00	25,00%	$	-
IMPREVISTO						2,00%	$	3.610.388,00		$	-		$	3.610.388,00		$	2.955.551,00	2,00%	$	-
UTILIDAD						5,00%	$	9.025.969,00		$	-		$	9.025.969,00		$	7.388.879,00	5,00%	$	-
IVA SOBRE UTILIDAD						19,00%	$	1.714.934,00		$	-		$	1.714.934,00		$	1.403.887,00	19,00%	$	-
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A)							**$**	**240.000.511,00**		**$**	**-**		**$**	**240.000.511,00**		**$**	**196.470.281,00**		**$**	**-**

CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO

ITEM	*ID*	*DESCRIPCIÓN*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*VALOR UNITARIO*	*VALOR TOTAL*	*MAYORES Y MENORES*	*VALOR*	*CANT.*	*VALOR*	*CANT.*	*VALOR*	*CANT.*	*VALOR*
		1. Baterías sanitarias - cocineta												
1,01	PR-24	Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros	M2	42,01	$ 69.430,00	$ 2.916.754,00	0,00	$ -	42,01	$ 2.916.754,00	42,01	$ 2.916.754,00		$ -
1,02	PR-25	Desmonte de puertas en madera	UND	6	$ 62.016,00	$ 372.096,00	0,00	$ -	6,00	$ 372.096,00	6,00	$ 372.096,00		$ -
1,03	PR-26	Demolicion meson en concreto	ML	6,02	$ 46.591,00	$ 280.478,00	0,00	$ -	6,02	$ 280.478,00	5,88	$ 273.955,00		$ -
1,04	PR-27	Demolición muros en ladrillo	M2	27,18	$ 26.991,00	$ 733.615,00	0,00	$ -	27,18	$ 733.615,00	5,19	$ 139.948,00		$ -
1,05	PR-28	Demolición de cieloraso	M2	15,87	$ 21.680,00	$ 344.062,00	0,00	$ -	15,87	$ 344.062,00	0,00	$ -		$ -
1,06	PR-30	Demolición enchape cerámico, incluye retiro de escombros	M2	50,65	$ 27.449,00	$ 1.390.292,00	0,00	$ -	50,65	$ 1.390.292,00	110,99	$ 3.046.482,00		$ -
1,07	PR-32	Corte de piso en concreto con pulidora	ML	40,52	$ 17.993,00	$ 729.076,00	0,00	$ -	40,52	$ 729.076,00	0,00	$ -		$ -
1,08	PR-33	corte de muro, incluye demolición, retiro, empaque y trasiego de escombros.	ML	9	$ 37.613,00	$ 338.517,00	0,00	$ -	9,00	$ 338.517,00	18,00	$ 677.034,00		$ -
1,09	PR-35	regatas en muros para tubo de 1/2" a 2" incluye retiro	ML	11	$ 10.870,00	$ 119.570,00	0,00	$ -	11,00	$ 119.570,00	12,00	$ 130.440,00		$ -
1,1	PR-23	Desmonte aparatos sanitarios	UND	13	$ 46.216,00	$ 600.808,00	0,00	$ -	13,00	$ 600.808,00	15,00	$ 693.240,00		$ -
1,11	DI-09	Contrapiso en concreto e=0,10m	M2	42,01	$ 82.477,00	$ 3.464.859,00	0,00	$ -	42,01	$ 3.464.859,00	32,10	$ 2.647.454,00		$ -
1,12	DI-22	Alistado piso 5cm mortero 1:3	M2	42,01	$ 47.974,00	$ 2.015.388,00	0,00	$ -	42,01	$ 2.015.388,00	30,40	$ 1.458.280,00		$ -
1,13	RI-01	Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado	M2	49,05	$ 41.029,00	$ 2.012.472,00	0,00	$ -	49,05	$ 2.012.472,00	109,34	$ 4.486.196,00		$ -
1,14	DI-10	cajas de inspección de concreto reforzado 60x60	UND	10	$ 884.762,00	$ 8.847.620,00	0,00	$ -	10,00	$ 8.847.620,00	5,00	$ 4.423.810,00		$ -
1,15	DI-02	suministro y fabricación de muro en perfilería de 90mm en super board de 8mm, doble cara, totalmente acabado.	M2	13,85	$ 148.796,00	$ 2.060.825,00	0,00	$ -	13,85	$ 2.060.825,00	13,00	$ 1.934.348,00		$ -
1,16	DI-05	Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo	ML	3	$ 62.454,00	$ 187.362,00	0,00	$ -	3,00	$ 187.362,00	0,00	$ -		$ -
1,17	DI-04	Suministro e instalación de alma en madera de 88mm	ML	3	$ 49.931,00	$ 149.793,00	0,00	$ -	3,00	$ 149.793,00	0,00	$ -		$ -
1,18	DI-12	Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye estructura.	M2	29,98	$ 90.735,00	$ 2.720.235,00	0,00	$ -	29,98	$ 2.720.235,00	0,00	$ -		$ -
1,19	AC-10	Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad	M2	66,87	$ 119.952,00	$ 8.021.190,00	0,00	$ -	66,87	$ 8.021.190,00	71,17	$ 8.536.864,00		$ -
1,2	AC-11	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	M2	21,75	$ 119.540,00	$ 2.599.995,00	0,00	$ -	21,75	$ 2.599.995,00	17,86	$ 2.134.566,00		$ -
1,21	AC-19	Suministro e instalación de tableta de gress formato 30 x 30 (Aprox)	M2	20,26	$ 105.806,00	$ 2.143.630,00	0,00	$ -	20,26	$ 2.143.630,00	8,20	$ 867.271,00		$ -
1,22	IH-01	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos y accesorios para su instalación	ML	15,14	$ 51.104,00	$ 773.715,00	0,00	$ -	15,14	$ 773.715,00	6,00	$ 306.624,00		$ -
1,23	IH-09	suministro e instalación de puntos sanitario de 2"	UND	8	$ 108.706,00	$ 869.648,00	0,00	$ -	8,00	$ 869.648,00	9,00	$ 978.354,00		$ -
1,24	IH-20	Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación	UND	5	$ 74.679,00	$ 373.395,00	0,00	$ -	5,00	$ 373.395,00	6,00	$ 448.074,00		$ -
1,25	IH-10	suministro e instalación de rejilla aluminio/plástica anti- insectos de 2"	UND	5	$ 27.544,00	$ 137.720,00	0,00	$ -	5,00	$ 137.720,00	6,00	$ 165.264,00		$ -
1,26	IH-03	suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación.	ML	55,28	$ 74.360,00	$ 4.110.621,00	0,00	$ -	55,28	$ 4.110.621,00	25,00	$ 1.859.000,00		$ -
1,27	IH-11	suministro e instalación de puntos sanitario de 4"	UND	6	$ 126.364,00	$ 758.184,00	0,00	$ -	6,00	$ 758.184,00	2,00	$ 252.728,00		$ -
1,28	IH-06	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios	ML	42,5	$ 28.734,00	$ 1.221.195,00	0,00	$ -	42,50	$ 1.221.195,00	12,00	$ 344.808,00		$ -
1,29	IH-12	Suministro e instalación punto hidráulico 1/2"	UND	14	$ 70.623,00	$ 988.722,00	0,00	$ -	14,00	$ 988.722,00	7,00	$ 494.361,00		$ -
1,3	IH-23	suministro e instalación de tapa registro de 15 x 15	UND	5	$ 34.915,00	$ 174.575,00	0,00	$ -	5,00	$ 174.575,00	3,00	$ 104.745,00		$ -
1,31	IH-19	Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2"	UND	5	$ 108.686,00	$ 543.430,00	0,00	$ -	5,00	$ 543.430,00	6,00	$ 652.116,00		$ -
1,32	AC-55	Suministro e instalación de mesón para lavamanos en mármol, e= 20 mm, ancho de 55 cms, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, babero de 15 cms y salpicadero de 10 cms.	ML	3,85	$ 1.000.961,00	$ 3.853.700,00	0,00	$ -	3,85	$ 3.853.700,00	1,93	$ 1.926.850,00		$ -
1,33	DI-07	suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación	ML	1,75	$ 306.701,00	$ 536.727,00	0,00	$ -	1,75	$ 536.727,00	0,00	$ -		$ -
1,34	AP-03	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer, porcelana blanca redondo u ovalado, certificado, incluye sifón.	UND	5	$ 439.566,00	$ 2.197.830,00	0,00	$ -	5,00	$ 2.197.830,00	2,00	$ 879.132,00		$ -
1,35	AP-07	suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte	UND	1	$ 1.136.407,00	$ 1.136.407,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.136.407,00	0,00	$ -		$ -
1,36	AP-02	Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts	UND	5	$ 719.169,00	$ 3.595.845,00	0,00	$ -	5,00	$ 3.595.845,00	1,00	$ 719.169,00		$ -
1,37	AP-05	Suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad	**UND**	**1**	$ 1.337.014,00	$ 1.337.014,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.337.014,00	1,00	$ 1.337.014,00		$ -
1,38	AP-08	Suministro e instalación de grifería sistema push en bronce para Orinal	**UND**	**2**	$ 477.009,00	$ 954.018,00	0,00	$ -	2,00	$ 954.018,00	1,00	$ 477.009,00		$ -
1,39	AC-44	Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante incluye base en aluminio	M2	2,7	$ 408.065,00	$ 1.101.776,00	0,00	$ -	2,70	$ 1.101.776,00	0,00	$ -		$ -
1,4	AP-04	Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos	UND	6	$ 355.943,00	$ 2.135.658,00	0,00	$ -	6,00	$ 2.135.658,00	3,00	$ 1.067.829,00		$ -
1,41	IH-15	Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario	UND	6	$ 57.558,00	$ 345.348,00	0,00	$ -	6,00	$ 345.348,00	2,00	$ 115.116,00		$ -
1,42	AC-50	suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados	JGO	1	$ 991.188,00	$ 991.188,00	0,00	$ -	1,00	$ 991.188,00	1,00	$ 991.188,00		$ -
1,43	AC-44	Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.	UND	1	$ 346.512,00	$ 346.512,00	0,00	$ -	1,00	$ 346.512,00	0,00	$ -		$ -
1,44	CA-38	Suministro e instalación de puerta de 1.00 x 2,4mts en madera maciza, inmunizada, pintura para madera color negro mate, diseño similar al existente, incluye marco, chapa tipo bola, bisagras y todos los elementos para su instalación y correcto funcionamiento	UND	2	$ 2.408.660,00	$ 4.817.320,00	0,00	$ -	2,00	$ 4.817.320,00	0,00	$ -		$ -
1,45	CA-36	Suministro e instalación de puerta de 0,55 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular 177 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	5	$ 876.659,00	$ 4.383.295,00	0,00	$ -	5,00	$ 4.383.295,00	3,00	$ 2.629.977,00		$ -
1,46	CA-34	suministro e instalación de división en aluminio para baños, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	M2	12,3	$ 834.615,00	$ 10.265.765,00	0,00	$ -	12,30	$ 10.265.765,00	2,00	$ 1.669.230,00		$ -
1,47	CA-34	suministro e instalación de división en aluminio para orinal de 0,45 x1 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	UND	2	$ 557.646,00	$ 1.115.292,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.115.292,00	1,00	$ 557.646,00		$ -
1,48	IE-06	Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra	UND	13	$ 125.536,00	$ 1.631.968,00	0,00	$ -	13,00	$ 1.631.968,00	0,00	$ -		$ -
1,49	IE-11	Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación	UND	5	$ 100.115,00	$ 500.575,00	0,00	$ -	5,00	$ 500.575,00	0,00	$ -		$ -
1,5	IE-09	Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6.500 K - horas mínimas de vida útil 25.000	UND	5	$ 101.820,00	$ 509.100,00	0,00	$ -	5,00	$ 509.100,00	0,00	$ -		$ -
1,51	IE-07	Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado	MI	30	$ 19.146,00	$ 574.380,00	0,00	$ -	30,00	$ 574.380,00	0,00	$ -		$ -
1,52	CA-15	suministro e instalacion de mueble inferior en melamina de 18mm, color a definir puertas con cierre lento, medidas ancho 0,55m x altura 0,60m, color similar al existente, incluye tapacantos rígido y sistema de instalación, accesorios para su correcto funcionamiento y encimera en acero inoxidable con pozuelo .	MI	1,7	$ 973.256,00	$ 1.654.535,00	0,00	$ -	1,70	$ 1.654.535,00	1,80	$ 1.751.861,00		$ -
1,53	IE-45	Suministro e instalación toma electrico GFCI	UND	3	$ 117.403,00	$ 352.209,00	0,00	$ -	3,00	$ 352.209,00	1,00	$ 117.403,00		$ -
1,54	VA-01	Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	M3	14,4	$ 87.992,00	$ 1.267.085,00	0,00	$ -	14,40	$ 1.267.085,00	8,00	$ 703.936,00		$ -

1,55	AP-01	Suministro e instalación orinal mediano blanco institucional, incluye todos los elementos para su fijación, instalación y correcto funcionamiento	UND	2	$ 475.809,00	$ 951.618,00	0,00	$ -	2,00	$ 951.618,00	0,00	$ -		$ -
		2. Losa tanques de agua												
2,01	CA-16	Suministro e instalación de pasamanos metálico tipo mueble 2", incluye elementos de fijación (platinas, anclajes, otros), pintura anticorrosiva y pintura de esmalte color a definir	ML	2	$ 103.260,00	$ 206.520,00	0,00	$ -	2,00	$ 206.520,00	0,00	$ -		$ -
2,02	DI-22	Alistado piso 5cm mortero 1:3	M2	9,02	$ 47.974,00	$ 432.725,00	0,00	$ -	9,02	$ 432.725,00	7,79	$ 373.717,00		$ -
2,03	AC-11	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	M2	9,02	$ 119.540,00	$ 1.078.251,00	0,00	$ -	9,02	$ 1.078.251,00	7,79	$ 931.217,00		$ -
2,04	IH-13	Desmonte y reinstalación tanques de almacenamiento de agua 500lts, incluye accesorios	Und	2	$ 169.660,00	$ 339.320,00	0,00	$ -	2,00	$ 339.320,00	3,00	$ 508.980,00		$ -
2,05	AC-13	Suministro e instalación de enchape cerámico para pared formato 20 cm x 20 cm	M2	13,19	$ 80.532,00	$ 1.062.217,00	0,00	$ -	13,19	$ 1.062.217,00	0,00	$ -		$ -
		3. Varios												
3,01	CA-31	Adecuación dintel de madera 0,05x0,50x1,80, inmunnizado y pintado color negro mate, incluye alzaprimada de muro/cubierta, retiro dintel existente, resane y pintura 3 vinilo manos en muro	UND	1	$ 481.980,00	$ 481.980,00	0,00	$ -	1,00	$ 481.980,00	0,00	$ -		$ -
3,02	CA-17	Cambio columna de madera 0,15x0,15x3,5, similar al existente inmunnizada y pintada color negro mate (similar al existente), incluye alzaprimada de cubierta, retiro de la columna existente y todo lo necesario para su correcta instalación	UND	8	$ 573.856,00	$ 4.590.848,00	0,00	$ -	8,00	$ 4.590.848,00	0,00	$ -		$ -
3,03	CA-18	Suministro e instalación de cerradura de sobreponer acorazada, con cobertura adicional contra apertura forzosa, bulón cuadrado de 35mm y cerrojo de tres (3) golpes para puerta en madera	UND	4	$ 265.780,00	$ 1.063.120,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.063.120,00	0,00	$ -		$ -
3,04	CA-40	Suministro e instalación de cerradura de doble cerrojo de 3 golpes con cilindro de llave plana reversibles, backset de 70Mm, para puerta de madera.	UND	1	$ 219.712,00	$ 219.712,00	0,00	$ -	1,00	$ 219.712,00	0,00	$ -		$ -
3,05	DI-02	Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo	M2	9	$ 148.796,00	$ 1.339.164,00	0,00	$ -	9,00	$ 1.339.164,00	0,00	$ -		$ -
3,06	VA-05	Aseo general	M2	42,01	$ 6.251,00	$ 262.605,00	0,00	$ -	42,01	$ 262.605,00	332,96	$ 2.081.333,00		$ -
		4. Cubierta												
4,01		Desmonte teja de barro (incluye el respectivo almacenamiento para conservar su estado y posterior reinstalación)	M2	150	$ 11.604,00	$ 1.740.600,00	0,00	$ -	150,00	$ 1.740.600,00	158,01	$ 1.833.563,00		$ -
4,02		Suministro e instalación manto techfiel 4 mm (el cual se instalará sobre la estructura de cubierta y por debajo de la teja de barro)	M2	150	$ 67.690,00	$ 10.153.500,00	0,00	$ -	150,00	$ 10.153.500,00	158,01	$ 10.695.785,00		$ -
4,03		Reinstalación de teja de barro existente, con fijación	M2	60	$ 17.406,00	$ 1.044.360,00	0,00	$ -	60,00	$ 1.044.360,00	0,00	$ -		$ -
4,04		Suministro e instalación de teja de barro	M2	22,5	$ 43.515,00	$ 979.088,00	0,00	$ -	22,50	$ 979.088,00	0,00	$ -		$ -
4,05	10	Suministro e instalación caballete Colonial articulado rojo, similar a la teja de barro, incluye accesorios para su correcta instalación.	ML	10	$ 62.855,00	$ 628.550,00	0,00	$ -	10,00	$ 628.550,00	50,00	$ 3.142.750,00		$ -
4,06	CC-15	Suministro e instalación de canal de aguas lluvias sección de 20 cm X 15 cm en lámina galvanizada calibre 22 (incluye los elementos de soporte y fijación)	ML	6	$ 87.030,00	$ 522.180,00	0,00	$ -	6,00	$ 522.180,00	0,00	$ -		$ -
4,07	IH-04	Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC de 3" con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento.	ML	6	$ 58.020,00	$ 348.120,00	0,00	$ -	6,00	$ 348.120,00	0,00	$ -		$ -
4,08		mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, incluir el retiro de escombros.	M2	50	$ 53.185,00	$ 2.659.250,00	0,00	$ -	50,00	$ 2.659.250,00	397,72	$ 21.152.924,00		$ -
4,09	CC-05	Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro	ML	6	$ 62.855,00	$ 377.130,00	0,00	$ -	6,00	$ 377.130,00	0,00	$ -		$ -
		5. Seguridad Humana												
5,01	SH-01	Suministro e instalación de Escalera tipo gato - certificada - con sus respectivos accesorios,anclajes y demas certificados, que garantices su optima instalación y funcionamiento	ML	4	$ 1.216.261,00	$ 4.865.044,00	0,00	$ -	4,00	$ 4.865.044,00	0,00	$ -		$ -
5,02	SH-03	Suministro e instalación de Placa de Identificación	UND	1	$ 284.381,00	$ 284.381,00	0,00	$ -	1,00	$ 284.381,00	0,00	$ -		$ -
5,03	SH-06	Entrega de Certificación según RESOLUCION 4272 DE 2021	UND	1	$ 4.054.978,00	$ 4.054.978,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.054.978,00	0,00	$ -		$ -
5,04	SH-20	Desmonte de escalera tipo gato existente - Incluye retiro de material sobrante y disposición final	ML	4	$ 100.449,00	$ 401.796,00	0,00	$ -	4,00	$ 401.796,00	0,00	$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 137.690.446,00**		**$ -**		**$ 137.690.446,00**		**$ 96.008.441,00**		**$ -**
		ADMINISTRACIÓN			23,00%	$ 31.668.803,00		$ -		$ 31.668.803,00		$ 22.081.941,00		$ -
		IMPREVISTO			1,00%	$ 1.376.904,00		$ -		$ 1.376.904,00		$ 960.084,00		$ -
		UTILIDAD			5,00%	$ 6.884.522,00		$ -		$ 6.884.522,00		$ 4.800.422,00		$ -
		IVA			19,00%	$ 1.308.059,00		$ -		$ 1.308.059,00		$ 912.080,00		$ -
		VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA				**$ 178.928.734,00**		**$ -**		**$ 178.928.734,00**		**$ 124.762.968,00**		**$ -**

CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO																	
ITEM	ID	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES Y MENORES	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
		1. Baterías sanitarias												
1,01	PR-24	Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros	M2	20,17	$ 69.430,00	$ 1.400.403,00	0,00	$ -	20,17	$ 1.400.403,00	27,52	$ 1.910.366,00		$ -
1,02	PR-25	Desmonte de puertas en madera	UND	1	$ 62.016,00	$ 62.016,00	0,00	$ -	1,00	$ 62.016,00	1,00	$ 62.016,00		$ -
1,03	PR-27	Demolición muros en ladrillo	M2	1,8	$ 37.822,00	$ 68.080,00	0,00	$ -	1,80	$ 68.080,00	1,75	$ 66.189,00		$ -
1,04	PR-30	Demolición enchape cerámico, incluye retiro de escombros	M2	20,34	$ 27.449,00	$ 558.313,00	0,00	$ -	20,34	$ 558.313,00	24,77	$ 679.912,00		$ -
1,05	PR-31	Desmontar y retirar las divisiones de baño existentes	UND	4	$ 79.110,00	$ 316.440,00	0,00	$ -	4,00	$ 316.440,00	5,00	$ 395.550,00		$ -
1,06	PR-32	Corte de piso en concreto con pulidora	ML	4	$ 21.377,00	$ 85.508,00	0,00	$ -	4,00	$ 85.508,00	4,00	$ 85.508,00		$ -
1,07	PR-33	corte de muro, incluye demolición, retiro, empaque y trasiego de escombros.	ML	1,8	$ 42.448,00	$ 76.406,00	0,00	$ -	1,80	$ 76.406,00	6,00	$ 254.688,00		$ -
1,08	PR-35	regatas en muros para tubo de 1/2" a 2" incluye retiro	ML	6	$ 18.365,00	$ 110.190,00	0,00	$ -	6,00	$ 110.190,00	2,50	$ 45.913,00		$ -
1,09	PR-34	Regata en piso para tubo de 1/2" a 2" incluye retiro	ML	18	$ 17.969,00	$ 323.442,00	0,00	$ -	18,00	$ 323.442,00	10,54	$ 189.393,00		$ -
1,1	PR-23	Desmonte aparatos sanitarios	UND	7	$ 46.216,00	$ 323.512,00	0,00	$ -	7,00	$ 323.512,00	6,00	$ 277.296,00		$ -
1,11	PR-37	Reinstalación de aparatos sanitarios	UND	2	$ 54.827,00	$ 109.654,00	0,00	$ -	2,00	$ 109.654,00	2,00	$ 109.654,00		$ -
1,12	DI-09	Contrapiso en concreto e=0,10m	M2	11,1	$ 82.477,00	$ 915.495,00	0,00	$ -	11,10	$ 915.495,00	27,52	$ 2.269.355,00		$ -
1,13	DI-22	Alistado piso 5cm mortero 1:3	M2	11,1	$ 47.974,00	$ 532.511,00	0,00	$ -	11,10	$ 532.511,00	27,52	$ 1.320.005,00		$ -
1,14	RI-01	Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado	M2	42,66	$ 41.029,00	$ 1.750.297,00	0,00	$ -	42,66	$ 1.750.297,00	37,74	$ 1.548.558,00		$ -
1,15	DI-02	suministro y fabricación de muro en pertilería de 90mm en super board de 8mm, doble cara, totalmente acabado.	M2	7,3	$ 148.796,00	$ 1.086.211,00	0,00	$ -	7,30	$ 1.086.211,00	7,60	$ 1.130.850,00		$ -
1,16	DI-05	Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematado, con acabado en pintura de vinilo	ML	3	$ 62.454,00	$ 187.362,00	0,00	$ -	3,00	$ 187.362,00	5,00	$ 312.270,00		$ -
1,17	DI-04	Suministro e instalación de alma en madera de 88mm	ML	3	$ 49.931,00	$ 149.793,00	0,00	$ -	3,00	$ 149.793,00	8,00	$ 399.448,00		$ -
1,18	DI-12	Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye nivelación de estructura.	M2	20,17	$ 90.735,00	$ 1.830.125,00	0,00	$ -	20,17	$ 1.830.125,00	0,00	$ -		$ -
1,19	AC-10	Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad	M2	42,66	$ 119.952,00	$ 5.117.152,00	0,00	$ -	42,66	$ 5.117.152,00	45,07	$ 5.405.877,00		$ -
1,2	AC-11	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	M2	20,17	$ 119.540,00	$ 2.411.122,00	0,00	$ -	20,17	$ 2.411.122,00	27,52	$ 3.289.143,00		$ -
1,21	IH-01	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos y accesorios para su instalación	ML	5,22	$ 51.104,00	$ 266.763,00	0,00	$ -	5,22	$ 266.763,00	6,00	$ 306.624,00		$ -
1,22	IH-09	suministro e instalación de puntos sanitario de 2"	UND	3	$ 108.706,00	$ 326.118,00	0,00	$ -	3,00	$ 326.118,00	4,00	$ 434.824,00		$ -
1,23	IH-20	Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación	UND	1	$ 74.679,00	$ 74.679,00	0,00	$ -	1,00	$ 74.679,00	1,00	$ 74.679,00		$ -
1,24	IH-10	suministro e instalación de rejilla aluminio/plástica anti- insectos de 2"	UND	2	$ 27.544,00	$ 55.088,00	0,00	$ -	2,00	$ 55.088,00	2,00	$ 55.088,00		$ -
1,25	IH-03	suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación.	ML	3,31	$ 74.360,00	$ 246.132,00	0,00	$ -	3,31	$ 246.132,00	15,00	$ 1.115.400,00		$ -
1,26	IH-11	suministro e instalación de puntos sanitario de 4"	UND	3	$ 126.364,00	$ 379.092,00	0,00	$ -	3,00	$ 379.092,00	3,00	$ 379.092,00		$ -
1,27	IH-06	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios	ML	10,73	$ 28.734,00	$ 308.316,00	0,00	$ -	10,73	$ 308.316,00	18,00	$ 517.212,00		$ -
1,28	IH-12	Suministro e instalación punto hidráulico 1/2"	UND	11	$ 70.623,00	$ 776.853,00	0,00	$ -	11,00	$ 776.853,00	12,00	$ 847.476,00		$ -
1,29	IH-23	suministro e instalación de tapa registro de 15 x 15	UND	2	$ 34.915,00	$ 69.830,00	0,00	$ -	2,00	$ 69.830,00	2,00	$ 69.830,00		$ -
1,3	IH-19	Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2"	UND	2	$ 108.686,00	$ 217.372,00	0,00	$ -	2,00	$ 217.372,00	2,00	$ 217.372,00		$ -
1,31	AC-55	Suministro e instalación de mesón para lavamanos en mármol, e= 20 mm, ancho de 55 cms, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, babero de 15 cms y salpicadero de 10 cms.	ML	2	$ 1.000.961,00	$ 2.001.922,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.001.922,00	0,00	$ -		$ -
1,32	AP-03	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer, porcelana blanca redondo u ovalado, certificado, incluye sifón.	UND	3	$ 439.566,00	$ 1.318.698,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.318.698,00	0,00	$ -		$ -
1,33	AP-02	Suministro e instalación de sanitario 4,8 lts	UND	5	$ 719.169,00	$ 3.595.845,00	0,00	$ -	5,00	$ 3.595.845,00	5,00	$ 3.595.845,00		$ -
1,34	AP-04	Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos	UND	5	$ 370.448,00	$ 1.852.240,00	0,00	$ -	5,00	$ 1.852.240,00	2,00	$ 740.896,00		$ -
1,35	IH-15	Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario	UND	5	$ 57.558,00	$ 287.790,00	0,00	$ -	5,00	$ 287.790,00	5,00	$ 287.790,00		$ -
1,36	AC-44	Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.	UND	4	$ 346.512,00	$ 1.386.048,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.386.048,00	0,00	$ -		$ -
1,37	CA-38	Suministro e instalación de puerta de 1,00 x 2,4mts en madera maciza, inmunizada, pintura para madera color negro mate, diseño similar al existente, incluye marco, chapa tipo bola, bisagras y todos los elementos para su instalacion y correcto funcionamiento	UND	2	$ 2.408.660,00	$ 4.817.320,00	0,00	$ -	2,00	$ 4.817.320,00	0,00	$ -		$ -
1,38	CA-36	Suministro e instalación de puerta de 0,55 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular 177 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	5	$ 876.659,00	$ 4.383.295,00	0,00	$ -	5,00	$ 4.383.295,00	0,00	$ -		$ -
1,39	CA-34	suministro e instalación de división en aluminio para baños, fabricados en tubular 177 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	M2	13,92	$ 834.615,00	$ 11.617.841,00	0,00	$ -	13,92	$ 11.617.841,00	0,00	$ -		$ -
1,4	CA-34	suministro e instalación de división en aluminio para orinal de 0,45 x1 mts, fabricados en tubular 177 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	UND	2	$ 557.646,00	$ 1.115.292,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.115.292,00	0,00	$ -		$ -
1,41	CA-29	suministro e instalación de puerta de 0,80x2mts con pasador y manija, fabricados en tubular 177 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	UND	5	$ 1.492.089,00	$ 7.460.445,00	0,00	$ -	5,00	$ 7.460.445,00	0,00	$ -		$ -
1,42	IE-06	Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra	UND	4	$ 125.536,00	$ 502.144,00	0,00	$ -	4,00	$ 502.144,00	0,00	$ -		$ -
1,43	IE-11	Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación	UND	2	$ 100.115,00	$ 200.230,00	0,00	$ -	2,00	$ 200.230,00	0,00	$ -		$ -
1,44	IE-09	Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000	UND	2	$ 101.820,00	$ 203.640,00	0,00	$ -	2,00	$ 203.640,00	0,00	$ -		$ -
1,45	IE-45	Suministro e instalación toma electrico GFCI	UND	1	$ 117.403,00	$ 117.403,00	0,00	$ -	1,00	$ 117.403,00	0,00	$ -		$ -
1,46	IE-07	Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado	MI	30	$ 19.146,00	$ 574.380,00	0,00	$ -	30,00	$ 574.380,00	0,00	$ -		$ -
1,47	VA-01	Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	M3	5,65	$ 90.410,00	$ 510.817,00	0,00	$ -	5,65	$ 510.817,00	6,10	$ 551.501,00		$ -
1,48	PR-04	Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 2", incluye retiro	UND	8	$ 118.253,00	$ 946.024,00	0,00	$ -	8,00	$ 946.024,00	2,00	$ 236.506,00		$ -
1,49	PR-05	Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 4", incluye retiro	UND	5	$ 161.641,00	$ 808.205,00	0,00	$ -	5,00	$ 808.205,00	3,00	$ 484.923,00		$ -
1,5	IH-14	Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 6", incluye retiro	UND	1	$ 216.868,00	$ 216.868,00	0,00	$ -	1,00	$ 216.868,00	0,00	$ -		$ -
1,51	AP-01	Suministro e instalación orinal mediano blanco institucional, incluye todos los elementos para su fijación, instalacion y correcto funcionamiento	UND	2	$ 475.809,00	$ 951.618,00	0,00	$ -	2,00	$ 951.618,00	2,00	$ 951.618,00		$ -
1,52	AP-08	Suministro e instalación de grifería sistema push en bronce para Orinal	UND	2	$ 477.009,00	$ 954.018,00	0,00	$ -	2,00	$ 954.018,00	2,00	$ 954.018,00		$ -
		2. Hundimiento hall de acceso												
2,01	PR-24	Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros	M2	49,35	$ 69.430,00	$ 3.426.371,00	0,00	$ -	49,35	$ 3.426.371,00	61,01	$ 4.235.737,00		$ -
2,02	PR-17	Excavación en tierra a mano	M3	67,09	$ 104.451,00	$ 7.007.618,00	0,00	$ -	67,09	$ 7.007.618,00	30,50	$ 3.186.137,00		$ -
2,03	PR-48	Relleno rocamuerta compactado 95%PM	M3	67,09	$ 93.764,00	$ 6.290.627,00	0,00	$ -	67,09	$ 6.290.627,00	30,50	$ 2.860.144,00		$ -
2,04	PR-32	Corte de piso en concreto con pulidora	ML	5,1	$ 21.377,00	$ 109.023,00	0,00	$ -	5,10	$ 109.023,00	0,00	$ -		$ -
2,05	DI-09	Contrapiso en concreto e=0,10m	M2	40,57	$ 82.477,00	$ 3.346.092,00	0,00	$ -	40,57	$ 3.346.092,00	61,01	$ 5.031.699,00		$ -
2,06	DI-22	Alistado piso 5cm mortero 1:3	M2	40,57	$ 47.974,00	$ 1.946.305,00	0,00	$ -	40,57	$ 1.946.305,00	61,01	$ 2.926.764,00		$ -
2,07	DI-10	cajas de inspección de concreto reforzado 60x60	UND	6	$ 884.762,00	$ 5.308.572,00	0,00	$ -	6,00	$ 5.308.572,00	2,00	$ 1.769.524,00		$ -
2,08	AC-11	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	M2	40,57	$ 119.540,00	$ 4.849.738,00	0,00	$ -	40,57	$ 4.849.738,00	61,01	$ 7.292.813,00		$ -
2,09	AC-16	Suministro e instalación guaradaescobas en PVC, color a definir por la Entidad	MI	26,19	$ 31.032,00	$ 812.728,00	0,00	$ -	26,19	$ 812.728,00	0,00	$ -		$ -
2,1	IH-18	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 6", con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento	ML	7,92	$ 84.123,00	$ 666.254,00	0,00	$ -	7,92	$ 666.254,00	3,00	$ 252.369,00		$ -

2,11	IH-03	suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación.	ML	9	$ 41.724,00	$ 375.516,00	0,00	$ -	9,00	$ 375.516,00	15,00	$ 625.860,00		$ -
2,12	IH-12	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios	ML	5,42	$ 28.734,00	$ 155.738,00	0,00	$ -	5,42	$ 155.738,00	0,00	$ -		$ -
2,13	IH-07	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1" incluye accesorios	ML	5,42	$ 33.453,00	$ 181.315,00	0,00	$ -	5,42	$ 181.315,00	0,00	$ -		$ -
2,14	VA-01	Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	M3	10,36	$ 87.992,00	$ 911.597,00	0,00	$ -	10,36	$ 911.597,00	28,80	$ 2.534.170,00		$ -
2,15	AC-42	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)	M2	38,01	$ 20.840,00	$ 792.128,00	0,00	$ -	38,01	$ 792.128,00	0,00	$ -		$ -
2,16	VA-05	Aseo general	M2	70,97	$ 6.251,00	$ 443.633,00	0,00	$ -	70,97	$ 443.633,00	88,53	$ 553.372,00		$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO						**$ 102.579.613,00**		**$ -**		**$ 102.579.613,00**		**$ 62.841.274,00**		**$ -**
ADMINISTRACIÓN					23,00%	$ 23.593.311,00		$ -		$ 23.593.311,00		$ 14.453.493,00		$ -
IMPREVISTO					1,00%	$ 1.025.796,00		$ -		$ 1.025.796,00		$ 628.413,00		$ -
UTILIDAD					5,00%	$ 5.128.981,00		$ -		$ 5.128.981,00		$ 3.142.064,00		$ -
IVA					19,00%	$ 974.506,00		$ -		$ 974.506,00		$ 596.992,00		$ -
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA						**$ 133.302.207,00**		**$ -**		**$ 133.302.207,00**		**$ 81.662.236,00**		**$ -**

SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.034.120.117,00**	**$ -**	**$ 1.034.120.117,00**		**$482.900.258,00**		**$0,00**	
ADMINISTRACION	18,50%	$ 265.991.242,00	$ -	$ 265.991.242,00		$121.073.529,00		$0,00	
IMPREVISTO	2,00%	$ 12.146.395,00	$ -	$ 12.146.395,00		$6.306.778,00		$0,00	
UTILIDAD	4,50%	$ 51.706.006,00	$ -	$ 51.706.006,00		$24.145.014,00		$0,00	
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$ 9.824.140,00	$ -	$ 9.824.140,00		$4.587.552,00		$0,00	
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A)		**$ 1.373.787.900,00**	**$ -**	**$ 1.373.787.900,00**		**$639.013.131,00**		**$0,00**	
						46,51%		**0,00%**	

JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
Representante Leagl - JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ

MARIA CLAUDIA GARCIA CARDENAS
Directora de Obra

CESAR AUGUSTO RENDÓN DÍAZ
Supervisión


JUAN JOSE MONSALVE OSPINA
Apoyo Supervisión

PIEDAD LORENA HERNANDEZ FERNANDEZ

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Demolición enchape cerámico, incluye retiro de escombros

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
4	74,27	M2		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños 1er piso	1		2,9	2,6	7,54
	Baños 1er piso	1		3,2	2,6	8,32
	Baños 1er piso	1		1,97	2,6	5,12
	Baños 1er piso	1		3,26	2,6	8,48
	Baños 1er piso	2		2,95	2,6	15,34
	MOCHETA ENTRADA Baños 1er piso	2		1,2	2,6	6,24
	MOCHETA LAVAMANOS Baños 1er piso	2		0,7	1,2	1,68
	Baños 1er piso	2		4,53	2,6	23,56
puerta	Baños 1er piso	-1		1	2	-2,00

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Desmonte aparatos sanitarios

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
7	16,00	UND		

DISCRIMINACIÓN



elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
INODOROS	Baños 1er piso	7				7
LAVAMANOS	Baños 1er piso	6				6
ORINALES	Baños 1er piso	3				3

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Alistado piso 4cm mortero 1:3

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
19	22,64	M2		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ENCHAPE PISO	Baños 1er piso		2,90	3,20		9,28
ENCHAPE PISO	Baños 1er piso		2,95	4,53		13,36

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Desmontar y retiro las divisiones de baño existentes

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
20	6	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños hombres y mujeres 1er piso	6				6

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Corte de piso en concreto con pulidora

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
21	20,00	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
REGATA ELEC.	ENFERMERIA	2		3,26		6,52
REGATA ELEC.	ENFERMERIA	2		1,25		2,50
REG.POTABLE	BAÑO BAÑO	2		3,19		6,38
REG.POTABLE	BAÑO BAÑO	2		2,30		4,60

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Clarcia Garcia
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
23	13,20	M3

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ESCOMBROS	PALACIO JUSTICIA BAÑOS ENCHAPE	1	2,9	2,60	0,10	0,75
	PALACIO JUSTICIA BAÑOS ENCHAPE	1	1,97	2,60	0,10	0,51
ESCOMBROS	PALACIO JUSTICIA BAÑOS ENCHAPE	1	3,2	2,60	0,10	0,83
ESCOMBROS	PALACIO JUSTICIA BAÑOS ENCHAPE	2	3,26	2,60	0,10	1,70
ESCOMBROS	PALACIO JUSTICIA BAÑOS ENCHAPE	2	2,95	2,60	0,10	1,53
ESCOMBROS	PALCIO JUASTICIA BAÑOS MOCHETA ENTRADA	1	1,2	2,60	0,30	0,94
ESCOMBROS	PALCIO JUASTICIA BAÑOS MOCHETA LAVAMANOS	1	0,7	2,60	0,30	0,55
ESCOMBROS	MEZON baños mujeres	1	0,6	4,53	0,20	0,54
ESCOMBROS	MEZON baños hombres	1	0,6	1,20	0,20	0,14
ESCOMBROS	baños mujeres enchape	1	4,53	2,6	0,1	1,1778
ESCOMBROS	placa piso hombres	1	3,2	2,9	0,2	1,856
ESCOMBROS	placa piso baños mujeres	1	4,53	2,95	0,2	2,67

PLANO DE CANTIDADES





REGISTRO FOTOGRAFICO



María Clarcia Garcia
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: suministro y aplicación estuco relleno muros

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
24	37,14	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños 1er piso	2		2,9	2,60	15,08
	Baños 1er piso	2		3,2	2,60	16,64
Puerta	Baños 1er piso	-1		1	2,00	-2,00
	Baños 1er piso	2		2,95	0,63	3,72
	Baños 1er piso	2		4,53	0,63	5,71
Puerta	Baños 1er piso	-1		1	2,00	-2,00

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Clarcia Garcia
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
33	1250	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Terraza	1	21	26,9		564,9
	vacio de cubierta	1	-6,4	12,8		-81,92
	punto fijo	1	-4,8	5,5		-26,4
	terraza	1	41,3	23,85		985,005
	vacio de cubierta	2	-6,8	4,3		-58,48
	vacio de cubierta	1	-5,7	3,1		-17,67
	ductos	14	-1,2	0,44		-7,435
	condensadoras	3	-6	6		-108

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Clarcia Garcia
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar material bituminoso)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
34	1250	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Terraza	1	21	26,9		564,9
	bacio de cubierta	1	-6,4	12,8		-81,92
	punto fijo	1	-4,8	5,5		-26,4
	terraza	1	41,3	23,85		985,005
	bacio de cubierta	2	-6,8	4,3		-58,48
	bacio de cubierta	1	-5,7	3,1		-17,67
	ductos	14	-1,2	0,44		-7,435
	condensadoras	3	-6	6		-108







María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

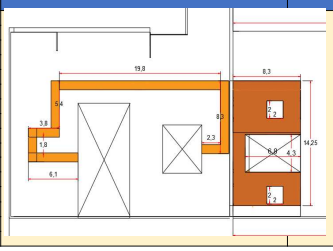
MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm incluye media caña en mortero perimetral altura 10cm (superficie con pendiente)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
36	129,96	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Terraza	1	1,03	6,1		6,28
	Terraza	1	1,03	1,8		1,85
	Terraza	1	1,03	3,8		3,91
	Terraza	1	1,03	5,4		5,56
	Terraza	1	1,03	19,8		20,39
	Terraza	1	1,03	8,3		8,55
	Terraza	1	1,03	2,3		2,37
	Terraza	1	8,3	14,25		118,28
	condensadoras	2	-2	4		-8,00
	bicio cubierta	1	-6,8	4,3		-29,24





María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA


DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de placa en fibrocemento 10 mm, incluye masillada, filos, junta visible y pintura para exterior

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
41	69	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	TERRAZA	1	1	69		69





María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de placa en fibrocemento 10 mm, incluye masillada, filos, junta visible y pintura para exterior

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES
42	69	ML	

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
fibrocemento	bordillo terraza	1		69		69






María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN	Lavada de fachada con agua a chorro de aspersion con hipoclorito (incluye retiro de material extraño y piezas rotas)							
ITEM		CANTIDAD	UNIDAD				PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
43		621	M2					
DISCRIMINACIÓN								
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total		
LAVADA	FACHADA LATERAL	1	69		9	621		






Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior a 3 manos - tipo 1							
ITEM		CANTIDAD TOTAL	UNIDAD				PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
44		525	M2					
DISCRIMINACIÓN								
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total		
PINTURA	FACHADA LATERAL	1	69		9	621		
	FACHADA LATERAL	1	12		-8	-96		





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado							
ITEM		CANTIDAD TOTAL	UNIDAD				PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
46		31,05	M2					
DISCRIMINACIÓN								
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total		
	muro lateral	1	1,13	5,38		6,08		
	muro lateral	1	0,98	8,75		8,58		
	muro lateral	1	2,46	3,61		8,88		
	muro lateral	1	1,78	4,22		7,51		





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN	Suministro y aplicación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco							
ITEM		CANTIDAD TOTAL	UNIDAD				PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
47		31,05	M2					
DISCRIMINACIÓN								
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total		
	muro lateral	1	1,13	5,38		6,08		
	muro lateral	1	0,98	8,75		8,58		
	muro lateral	1	2,46	3,61		8,88		
	muro lateral	1	1,78	4,22		7,51		





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de reja metalica (puerta) metálica tubular 1"x1"x 1,2mm con parales de en tubo rectangular 90 x 50 x 2.0mm x 6m estructural HR50, incluye marco, perforación de muro, resanes, base o platina para pared, cerradura argolla para candado, acabado de pintura y todo lo necesario para su correcta instalación							
ITEM		CANTIDAD TOTAL	UNIDAD				PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
53		2,08	M2					
DISCRIMINACIÓN								
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total		





	ARCHIVO	1	1		2,08	2,08





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

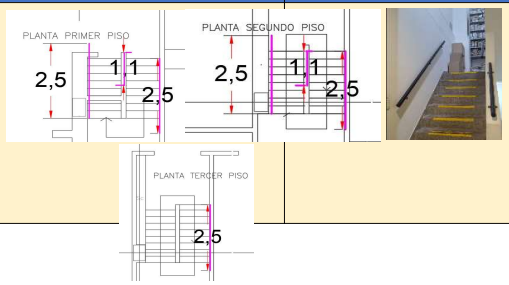
MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de pasamanos metálico tipo mueble 2", incluye elementos de fijación (platinas, anclajes, otros), pintura anticorrosiva y pintura de esmalte color a definir

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
54	14,7	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
pasamanos	ARCHIVO 1er piso	2		2,5		5
pasamanos	ARCHIVO 1er piso	1		1,1		1,1
pasamanos	ARCHIVO 2do piso	2		2,5		5
pasamanos	ARCHIVO 2do piso	1		1,1		1,1
pasamanos	ARCHIVO 3er piso	1		2,5		2,5



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN	Demolición muro en ladrillo (incluye retiro)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
55	4,12	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
DEMOLICION	mocheta baño damas	1	1,2		2,6	3,12
DEMOLICION	mocheta baño caballeros	1	0,8		1,25	1





Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN	Mantenimiento de pasamanos existente, incluye lijada, masilla de relleno y acaabdo de pintura 3 en 1)


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
57	100,38	ML		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PASAMANOS	VACIO 2do PISO	4		6,7		26,8
PASAMANOS	VACIO 2do PISO	4		4,2		16,8
PASAMANOS	VACIO 3er PISO	4		6,7		26,8
PASAMANOS	VARIO 3er PISO	4		4,2		16,8
PASAMANOS	ESCALERA CELDAS INTERNOS	4		3,00		12,00
PASAMANOS	ESCALERA CELDAS INTERNOS	1		1,18		1,18









Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA

DESCRIPCIÓN	Mantenimiento de reja metalica, incluye desmonte, cepillado, limpieza del elemento, cambio de partes afectadas, cambio de chapa donde se requiera, aplicación de pintura epóxica y todo lo necesario para su correcta instalación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO

58		247,31		M2		
DISCRIMINACIÓN						
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
reja exterior	costado derecho			25,40	2,6	66,04
reja exterior	fachada frontal			50,00	2,6	130,00
reja exterior	fachada frontal			1,22	2,6	3,17
reja exterior	costado izquierdo			1,75	2,6	4,55
reja exterior	costado izquierdo			15	2,6	39,00
reja exterior	costado izquierdo			1,75	2,6	4,55




Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA
DESCRIPCIÓN	Aseo general.		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
62	214,8	M2		

DISCRIMINACIÓN						
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ASEO	CUBIERTA	1	21,00	14,16		297,36
		1	-6,40	12,90		-82,56





Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN	Desmonte de teja en policarbonato , incluye estructura en mal estado y respectivo retiro

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	186,78	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
DESMONTE	Cubierta 3 acceso		6,6	11,5		75,9
DESMONTE	Cubierta 4 parte central		6,6	16,8		110,88





María Cristina García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
3	12,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
bases	Cubierta 1	6				6
bases	Cubierta 2	6				6





María Cristina García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA


DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan entre 12cm a 15 cm de alto x 30 cm de ancho, incluye materiales complementarios de conexión, , corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
4	24,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Cubierta 4 parte central	12				12
	cubierta 2	6				6
	cubierta 1	6				6





María Cristina García
Vo Bo Director Obra

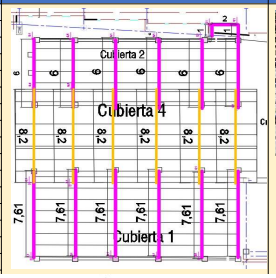
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
6	190,54	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	CUBIERTA 1	6		7,61		45,66
	PATAS CUBIERTA 1	6		0,60		3,60
	PATAS CUBIERTA 1	6		0,32		1,92
	CUBIERTA 2	6		6,00		36,00
	EXTENSIÓN DE CUBIERTA 2	1		2,00		2,00
	EXTENSIÓN DE CUBIERTA 2	2		1,00		2,00
	PATAS CUBIERTA 2	6		0,60		3,60
	PATAS CUBIERTA 2	6		0,32		1,92
	CUBIERTA 4	6		15,24		91,44
	TAPAS TUBOS	24		0,10		2,40







Cubierta 4 | Cubierta 1 | Cubierta 2

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	


ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
7	436,10	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	CUBIERTA 1	8		16,1		128,8
	CUBIERTA 2	7		16,1		112,7
	CUBIERTAS 4	10		19,12		191,2
	ALARGE CUBIERTA 2	34		0,1		3,4







María Cecilia García
Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementosa de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)	

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
8	452,15	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	CUBIERTA 1	1	16,10	7,61		122,52
	CUBIERTA 2	1	16,10	6,00		96,60
	CUBIERTA 3	1	6,60	11,34		74,84
	CUBIERTA 4	1	19,12	8,20		156,78
	ALARGUE CUBIERTA 2	1	0,70	2,00		1,40








María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN	Demolición muro existente incluye retiro

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
9	0,40	M3		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	MURO TERRAZA	2	0,25	0,8	1	0,4

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN	Retiro de manto impermeabilizante foil

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
10	32,84	M2		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Terraza fachada lateral derch.	1	1,6	16,1		25,76
	muro lateral derch.	1	0,4	16,1		6,44
	alargue sobre muro frontal y pc	2	1,6	0,2		0,64

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN	Fabricación muro en mamposteria e:10cm

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
11	11,91	M2		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
MURO	CUBIERTA 1	1		16,10	0,37	5,96
MURO	CUBIERTA 2	1		16,10	0,37	5,96

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN	Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
12	23,83	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
MORTERO MURO	CUBIERTA 1 - cara int y ext.	2		16,10	0,37	11,91
MORTERO MURO	CUBIERTA 2 - cara int y ext.	2		16,10	0,37	11,91

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

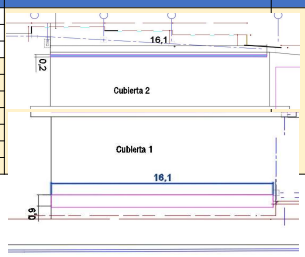
DESCRIPCIÓN: Alistado piso 4cm mortero 1:3

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
13	17,71	M2


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
alistado	Terraza fachada lateral derch.		0,9	16,1		14,49
descuento	Terraza fachada lateral iz		0,2	16,1		3,22

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

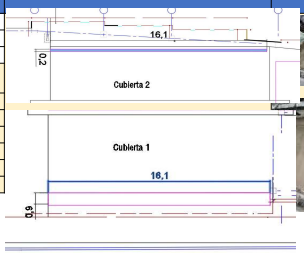
DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
14	17,71	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
MORTERO PISO	Terraza fachada lateral derech.		0,9	16,1		14,49
MORTERO PISO	Terraza fachada lateral izq.		0,2	16,1		3,22

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Sumnistro e instalación de cubierta provisional en plastico o lona, incluye cuerda perimetral,alambre, bastidor y todo lo necesario para su correcta instalación y su posterior retiro.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
15	95,63	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	cubierta 4		6,6	14,49		95,63

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de caballete para teja upvc 2.5 mm, incluye accesorios para su correcta instalación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
17	19,12	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Cubierta	1		19,12		19,12

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 4", incluye retiro

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
18	1,00	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
perforacion	muro lateral	1				1

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Yadira García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

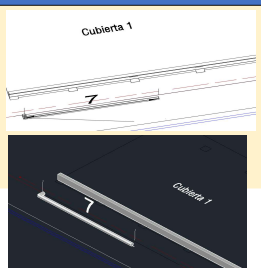
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4", incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
19	7,00	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
BAJANTES	TERRAZA	1		7		7

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Yadira García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
23	71,67	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	CUBIERTA 1	1	1,60	16,10		25,76
	CUBIERTA 1 SOBRE MUROS	2	0,25	16,10		8,05
	CUBIERTA 2	1	1,60	14,10		22,56
	CANAL	1	1,00	11,34		11,34
	FLANCHES	2	0,30	6,60		3,96

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Yadira García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan entre 10cm a 15 cm de alto x 15 a 20 cm de ancho, incluye materiales complementarios de conexión, , corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
36	4,00	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
PLATINAS	Patio (futuro Uars)	4				4

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO




María Yadira García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
37	18,35	ML		

DISCRIMINACIÓN



elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Patas inclinación	Patio (futuro Uars)	2		0,35		0,70
Latelares	Patio (futuro Uars)	2		4,00		8,00
Frontal	Patio (futuro Uars)	1		4,25		4,25
Piso a techo	Patio (futuro Uars)	2		2,70		5,40

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
38	21,25	ML		

DISCRIMINACIÓN


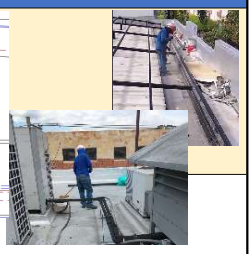
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Correas	Patio (futuro Uars)	5		4,25		21,25

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Aseo general.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
75	412,70	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ASEO	cubierta costado izq.	1,00	5,8	14,42		83,64
ASEO	1 y 2 piso parte interna	1,00	7,8	16,3		127,14
ASEO	cubierta costado derech.	1,00	8,59	15,3		131,43
ASEO	area de aires y tamques	1,00	21,88	6,19		135,44
ASEO	aires y tanques	1,00	-3	21,65		-64,94

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA

DESCRIPCIÓN: Empaque de escombros en fibra

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
78	6,00	M3		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
		6				6

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN							INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA
DESCRIPCIÓN	Cargue material manual							
ITEM		**CANTIDAD TOTAL**	**UNIDAD**				**PLANO DE CANTIDADES**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
79		**6,00**	**M3**					
DISCRIMINACIÓN								
elemento	**Ubicación**	**Cantidad**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**total**		
materiales	acopio familia	6				6		

María Cristina García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


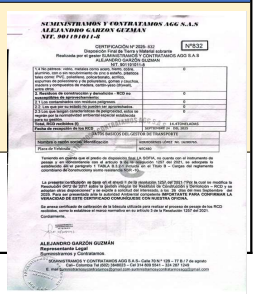
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN							INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA
DESCRIPCIÓN	Retiro acarreo material volqueta kilom							
ITEM		**CANTIDAD TOTAL**	**UNIDAD**				**PLANO DE CANTIDADES**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
80		**6,00**	**M3**					
DISCRIMINACIÓN								
elemento	**Ubicación**	**Cantidad**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**total**		
		6				6		

María Cristina García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN							INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA
DESCRIPCIÓN	Disposición final de escombros y sobrantes							
ITEM		**CANTIDAD TOTAL**	**UNIDAD**				**PLANO DE CANTIDADES**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
81		**6,00**	**M3**					
DISCRIMINACIÓN								
elemento	**Ubicación**	**Cantidad**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**total**		
escombros	centro de acopio	**6,00**				6		

María Cristina García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

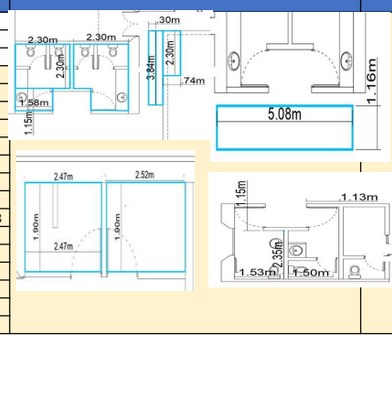
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN							INMUEBLE	CANTIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA
DESCRIPCIÓN	Movimiento vertical de materiales - escombros							
ITEM		**CANTIDAD TOTAL**	**UNIDAD**				**PLANO DE CANTIDADES**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
82		**4748,83**	**KG**					
DISCRIMINACIÓN								
elemento	**Ubicación**	**Cantidad**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**total**		
Tubo Rect 80*40	Estructura cubierta	3,716666667	kg		74	275,0333		
Tubo Rect 100*50	Estructura cubierta	4,65	kg		36	167,4		
Teja UPVC	cubierta	5	kg		454	2270		
Bloque	para mamposteria a lo largo de la losa (sendero) sobre el que reposa la teja	4,47	kg		120	536,4		
Arena	mortero losa (senderos)	1000	kg		1,5	1500		

María Cristina García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,01	42,01	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	LAVA TRAPEROS	1	1,90	2,47		4,69
	CAFETERIA	1	1,90	2,52		4,79
	BAÑO HOMBRES	1	2,35	1,50		3,53
	BAÑO MUJERES	1	2,35	1,53		3,60
	BAÑO MUJERES y mujeres	1	1,13	1,15		1,30
	ARREGLO TUBERIA	1	0,74	2,30		1,70
	filo pasillos	1	0,60	3,84		2,30
	pasillos canal	1	1,16	5,08		5,89
	baño hombres y mujeres	2	2,30	2,30		10,58
	baño hombres y mujeres	2	1,58	1,15		3,63

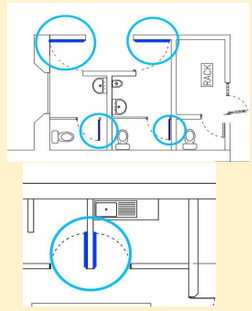

María Cecilia García

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Desmonte de puertas en madera		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,02	6,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños	5				5
	Cocineta	1				1



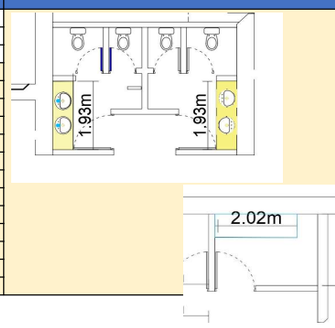
María Cecilia García

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Demolicion meson en concreto		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,03	5,88	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	COCINETA	1		2,02		2,02
	BAÑO DAMAS	1		1,93		1,93
	BAÑO CABALLEROS	1		1,93		1,93



María Cecilia García

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Demolición muros en ladrillo		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,04	5,19	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños	1	0,88		2,10	1,85
	Baños	1	0,85		2,10	1,79
	lavatraperos	1	1,42		0,60	0,85
	cocineta	1	0,70		1,00	0,70

María Cecilia García

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO

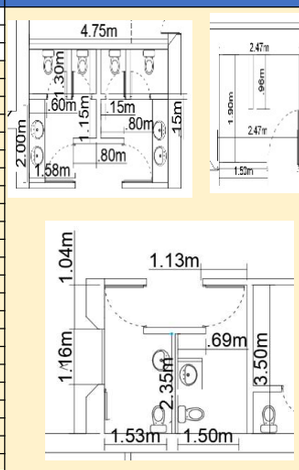
DESCRIPCIÓN Demolición enchape cerámico, incluye retiro de escombros

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,06	110,99	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	cocineta	1		2,52	2,05	5,17
	cocineta	1		1,90	2,05	3,90
	cocineta	1		1,55	2,05	3,18
	cocineta	1		1,90	2,05	3,90
	lava traperos	1		2,47	2,05	5,06
	lava traperos	1		1,90	2,05	3,90
	lava traperos	1		1,50	2,05	3,08
	acceso tanque	1		1,90	2,05	3,90
	lava traperos	2		0,96	2,05	3,94
	baños damas y caballeros	1		4,75	2,05	9,74
	baños damas y caballeros	8		1,30	2,05	21,32
	baños damas y caballeros	4		0,60	2,05	4,92
	baños damas y caballeros	2		1,15	2,05	4,72
	baños damas y caballeros	2		1,58	2,05	6,48
	banos publico	2		1,13	2,05	4,63
	banos publico	1		1,50	2,05	3,08
	banos publico	2		2,35	2,05	9,64
	banos publico	2		0,69	2,05	2,83
	banos publico	1		1,53	2,05	3,14
	banos publico	1		1,16	2,05	2,38
	banos publico	1		1,04	2,05	2,13

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



81,24

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO


DESCRIPCIÓN corte de muro, incluye demolición, retiro, empaque y trasiego de escombros.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,08	18,00	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	BAÑOS DAMAS	2		4,00		8,00
	BAÑOS CABALLEROS	2		4,00		8,00
	COCINETA	2		1,00		2,00

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO


DESCRIPCIÓN regatas en muros para tubo de 1/2" a 2" incluye retiro

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,09	12,00	ML

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	LAVATRAPEROS	2		1,5		3
	COCINETA	2		1		2
	BAÑOS PUBLICO	2		3,5		7

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO


DESCRIPCIÓN Desmonte aparatos sanitarios

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,10	15,00	UND

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	BAÑOS	15				15

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura

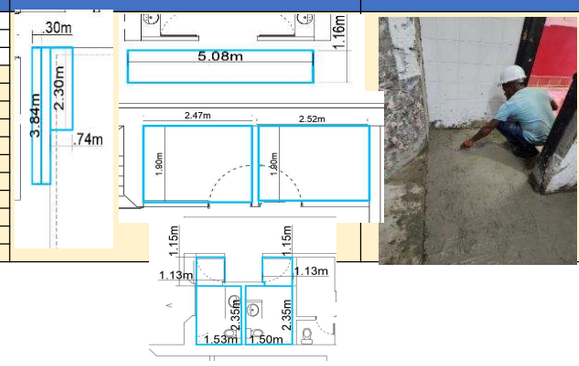
MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO

DESCRIPCIÓN Contrapiso en concreto e=0,10m

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,11	32,10	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	LAVA TRAPEROS	1	1,9	2,47		4,69
	CAFETERIA	1	1,9	2,52		4,79
	BAÑO HOMBRES	1	2,35	1,50		3,53
	BAÑO HOMBRES	1	1,15	1,13		1,30
	BAÑO MUJERES	1	2,35	1,53		3,60
	BAÑO MUJERES	1	1,15	1,13		1,30
PLACA	ARREGLO TUBERIA	1	1	3		3,00
	pasillos	1	1,16	5,08		5,89
	pasillos	1	0,6	3,84		2,30
	CANAL PASILLO	1	0,74	2,30		1,70



María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura

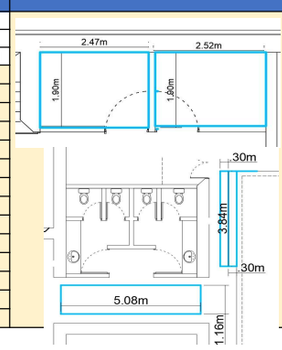
MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO


DESCRIPCIÓN Alistado piso 5cm mortero 1:3

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,12	30,40	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	LAVA TRAPEROS	1	1,9	2,47		4,69
	CAFETERIA	1	1,9	2,52		4,79
	BAÑO HOMBRES	1	2,35	1,50		3,53
	BAÑO HOMBRES	1	1,15	1,13		1,30
	BAÑO MUJERES	1	2,35	1,53		3,60
	BAÑO MUJERES	1	1,15	1,13		1,30
	ARREGLO TUBERIA	1	1	3		3,00
	pasillos	1	1,16	5,08		5,89
	pasillos	1	0,6	3,84		2,30







María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura

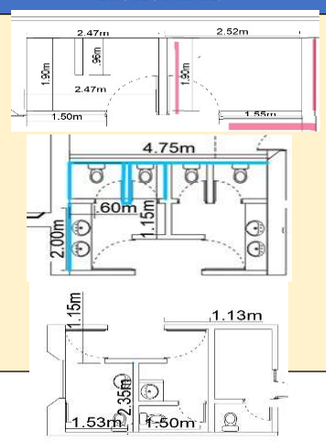
MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,13	109,34	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	1-BAÑOS H Y M	2	1,13		2,08	4,70
	1-BAÑOS H Y M	2	0,69		2,08	2,87
	1-BAÑOS H Y M	2	2,35		2,08	9,78
	1-BAÑOS H Y M	2	3,50		2,08	14,56
	1-BAÑOS H Y M	2	1,50		2,08	6,24
	1-BAÑOS H Y M	2	1,80		2,08	7,49
	2-BAÑOS H Y M	1	1,54		2,08	3,20
	2-BAÑOS H Y M	2	0,60		2,08	2,50
	2-BAÑOS H Y M	4	1,15		2,08	9,57
	2-BAÑOS H Y M	0,5	4,75		2,08	4,94
	2-BAÑOS H Y M	1	2		2,08	4,16
	2-BAÑOS H Y M	2	1,86		2,08	7,74
	LAVA TRAPEROS	2	0,96		2,08	3,99
	CAFETERIA	1	2,52		2,08	5,24
	CAFETERIA	1	1,55		2,08	3,22
	CAFETERIA	2	1,90		2,08	7,90
	TANQUES	1	11,24		1	11,24







María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO

DESCRIPCIÓN cajas de inspección de concreto reforzado 60x60

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,14	5,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños	1				1
	Lavatraperos	1				1
	Jardinera	3				3







María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

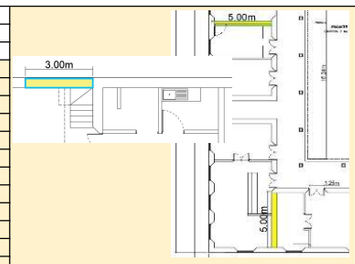
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca


MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN | **INMUEBLE** | CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO


DESCRIPCIÓN suministro y fabricación de muro en perfilería de 90mm en super board de 8mm, doble cara, totalmente acabado.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO

1,15		13,00	M2			
DISCRIMINACIÓN						
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	JUZGADO		5		1	5
	JUZGADO		5		1	5
CULATA	BODEGA		3		1	3











María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO

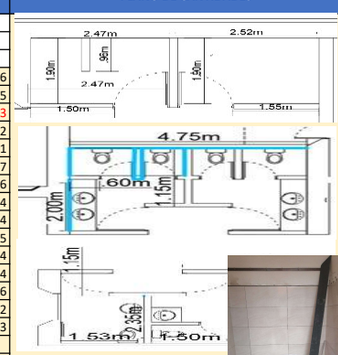
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,19	71,17	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	1-BAÑOS H Y M	2	1,13		2,15	4,86
	1-BAÑOS H Y M	2	3,5		2,15	15,05
	PMR PUERTA	1	1,3		-2,10	-2,73
	1-BAÑOS H Y M	2	1,54		2,15	6,62
	1-BAÑOS H Y M	2	2,35		2,15	10,11
	1-BAÑOS H Y M	2	0,69		2,15	2,97
	1-BAÑOS H Y M	2	0,2		2,15	0,86
	CAFETERIA	1	2,52		1,84	4,64
	CAFETERIA	2	1,86		1,84	6,84
	CAFETERIA	1	1,55		1,84	2,85
	LAVA TRAPEROS	1	2,47		1,84	4,54
	LAVA TRAPEROS	2	1,86		1,84	6,84
	LAVA TRAPEROS	1	1,50		1,84	2,76
	LAVA TRAPEROS	2	1,42		0,50	1,42
	LAVA TRAPEROS	2	0,96		1,84	3,53

PLANO DE CANTIDADES





REGISTRO FOTOGRAFICO



María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO

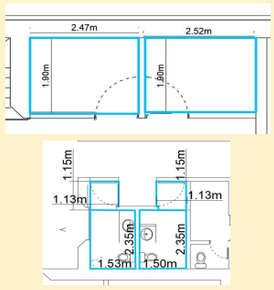
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,2	17,86	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	LAVA TRAPEROS	1	1,90	2,47		4,69
	CAFETERIA	1	1,90	2,52		4,79
	BAÑO HOMBRES	1	1,15	1,13		1,30
	BAÑO HOMBRES	1	2,35	1,50		3,53
	BAÑO DISCP.	1	1,15	1,13		1,30
	BAÑO DISCP.	1	2,35	1,53		3,60
LADRILLO	DESCUENTO	1	0,80	-1,68		-1,34

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO


DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de tableta de gress formato 30 x 30 (Aprox)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,21	8,20	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	PASILLO FRENTE A BAÑOS		1,16	5,08		5,89
	PASILLO FRENTE ALMACEN		0,6	3,84		2,30

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO




María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos y accesorios para su instalación		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,22	6,00	ML		

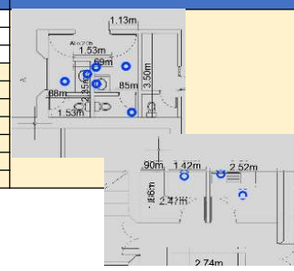
DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños	1		0,95		0,95
	Cocineta	1		5,05		5,05

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	suministro e instalación de puntos sanitario de 2"		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,23	9,00	UND		

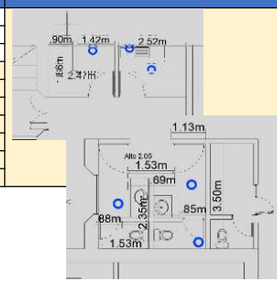
DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños	9				9

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,24	6,00	UND		

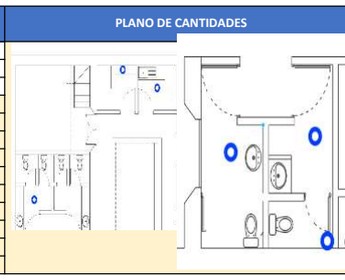
DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños					3
	Cocineta					2
	Lavatraperos					1

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	suministro e instalación de rejilla aluminio/plástica anti- insectos de 2"		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,25	6,00	UND		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños publ.	3				3
	Cocineta	1				1
	Lavatraperos	1				1
	Baños hombres funcionario	1				1

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación.		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,26	25,00	ML		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Jardinera y baños	25		25		25

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	suministro e instalación de puntos sanitario de 4"		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,27	2,00	UND		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños	2				2

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,28	12,00	ML		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
tuberia 3/4 y 1"	Tanque	12				12

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación punto hidráulico 1/2"		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,29	7,00	UND		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños publicos					5
	Lavatrapertos					1
	Cocineta					1

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	suministro e instalación de tapa registro de 15 x 15		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,3	3,00	UND		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños	2				2
	Lavatraperos	1				1

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2"		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,31	6,00	UND		



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	BAÑO	2				2
	LAVATRAPEROS	1				1
	TANQUES	3				3

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de mesón para lavamanos en mármol, e= 20 mm, ancho de 55 cms, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,32	1,93	ML		



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños funcionarios	1		1,93		1,93

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer, porcelana blanca redondo u ovalado, certificado, incluye sifón.		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,34	2,00	UND		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños funcionarios	2				2

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,36	1,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños					1

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,37	1,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños PMR					1

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de grifería sistema push en bronce para Orinal		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,38	1,00	UND		




DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
GRIFERIA	Baños					1

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,4	3,00	UND		 

DISCRIMINACIÓN



elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
GRIFERIA	Baños publico	1				1
	Baños funcionarios	2				2

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,41	2,00	UND		 

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños					2

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,42	1,00	JGO		


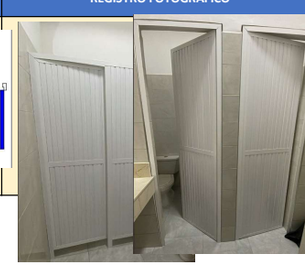
DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baño PMR					1

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de puerta de 0,55 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,45	3,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños funcionarios	2				2
	Baños hombres publico	1				1

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	suministro e instalación de división en aluminio para baños, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,46	2,00	M2		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños hombres publico	1	1		2	2

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	suministro e instalación de división en aluminio para orinal de 0,45 x1 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,47	1,00	UND		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños hombres publico	1				1

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	suministro e instalacion de mueble inferior en melamina de 18mm, color a definir puertas con cierre lento, medidas ancho 0,55m x altura 0,60m, color similar al		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,52	1,80	ML		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Cocineta	1		1,8		1,8

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación toma electrico GFCI		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,53	1,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Cocineta					1

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,54	8,00	M3	 	


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ESCOMBROS	COCINETA Y BAÑOS	8				8

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Alistado piso 5cm mortero 1:3		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
2,02	7,79	M2		



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
alistado mortero	Tanque	1	1,9	4,10		7,79

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
2,03	7,79	M2		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
ench,piso	Tanque	1	1,9	4,10		7,79

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Desmonte y reinstalación tanques de almacenamiento de agua 500lts, incluye accesorios		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
2,04	3,00	UND		

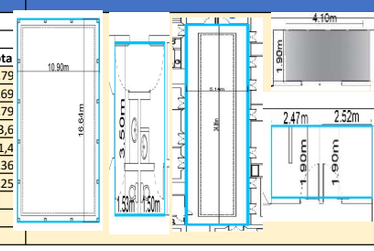
DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
DESMONTE	Tanques	3				3

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Aseo general		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
3,06	332,96	M2		


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	tota
	Areas tanques	1	1,9	4,1		7,79
	Areas lavatrap.	1	2,47	1,9		4,69
	Areas cocineta	1	2,52	1,9		4,79
	Areas comunes	1	5,14	24,06		123,6
	Areas comunes	1	10,9	16,64		181,4
	area baños publico	1	1,53	3,5		5,36
	area baños publico	1	1,5	3,5		5,25

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Desmonte teja de barro (incluye el respectivo almacenamiento para conservar su estado y posterior reinstalación)		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
4,01	158,01	M2		  


DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Cubierta		3,66	22,58	18,58	75,323
	Cubierta		5,9	18,58	9,45	82,689

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación manto techfiel 4 mm (el cual se instalará sobre la estructura de cubierta y por debajo de la teja de barro)		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
4,02	158,01	M2		 

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
MANTO	Cubierta		3,66	22,58	18,58	75,32
MANTO	Cubierta		5,90	18,58	9,45	82,69

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación caballete Colonial articulado rojo, similar a la teja de barro, incluye accesorios para su correcta instalación.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
4,05	50,00	ML		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
CABALLETE	Cubierta			6,79		6,79
CABALLETE	Cubierta			18,58		18,58
CABALLETE	Cubierta			24,63		24,63

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO

DESCRIPCIÓN mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, incluir el

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
4,08	397,72	M2		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
MANTENIMIENTO	Cubierta		5,90	28,29	15,24	128,41
MANTENIMIENTO	Cubierta		5,90	28,29	21,68	147,41
MANTENIMIENTO	Cubierta		3,70	10,42	2,80	24,46
MANTENIMIENTO	Cubierta		3,90	28,29	21,68	97,44

María Cecilia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,01	27,52	M2		 

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	piso 2 - bateria sanitaria a restaurar	1,00	2,45	3,70		9,07
	piso 2 - bateria sanitaria a nueva	1,00	3,00	6,15		18,45

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Desmonte de puertas en madera

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,02	1,00	UND		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	piso 2	1				1,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Demolición muros en ladrillo

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,03	1,75	M2		 

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	acceso baños nuevos piso 2,	1	0,7		2,5	1,75

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Demolición enchape cerámico, incluye retiro de escombros

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,04	24,77	M2		 

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	piso 2 - bateria sanitaria a restaurar	1		1,65	1,80	2,97
	piso 2 - bateria sanitaria a restaurar	2		3,70	1,80	13,32
	piso 2 - bateria sanitaria a restaurar	1		2,45	1,80	4,41
	piso 2 - bateria sanitaria a restaurar	1		3,70	1,10	4,07

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN Desmontar y retirar las divisiones de baño existentes

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,05	5,00	UND		 

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños	1				5,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN Corte de piso en concreto con pulidora

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,06	4,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

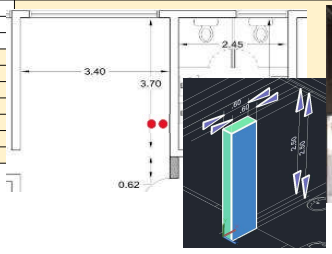

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	baño nuevo piso 2	1		1,57		1,57
	baño nuevo piso 2	1		2,43		2,43

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN corte de muro, incluye demolición, retiro, empaque y trasiego de escombros.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,07	6,00	ML		 

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	baño nuevo	2			2,50	5,00
	baño nuevo	2			0,5	1,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN regatas en muros para tubo de 1/2" a 2" incluye retiro

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,08	2,50	ML		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
0,5 POR	PARA PUNTO HIDRAULICO SANITARIO	3		0,50		1,50
	PASO DE TUBERIA	1		1,00		1,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Regata en piso para tubo de 1/2" a 2" incluye retiro

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,09	10,54	ML		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
REGATA	BAÑOS NUEVOS	1		1,52		1,52
		1		1,94		1,94
		3		0,40		1,20
		1		2,43		2,43
		1		1,70		1,70
		1		1,45		1,45
		3		0,10		0,30

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Desmonte aparatos sanitarios

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,1	6,00	UND		 

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Sanitarios	Bateria sanitaria existente piso 2	2				2,00
lavamanos	Bateria sanitaria existente piso 2	2				2,00
Orinal	Bateria sanitaria existente piso 2	2				2,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Reinstalación de aparatos sanitarios

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,11	2,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
lavamanos	Bateria sanitaria existente piso 2	2				2,00

Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Contrapiso en concreto e=0,10m

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO

1,12		27,52		M2			
DISCRIMINACIÓN							
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total	
	BANOS 2 PISO	1	2,45	3,7		9,07	
	BANOS 2 PISO	1	3	6,15		18,45	





María Claudia García
Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN	Alistado piso 5cm mortero 1:3

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,13	27,52	M2		

DISCRIMINACIÓN						
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	piso 2 - bateria sanitaria nueva	1	2,45	3,70		9,07
	piso 2 - bateria sanitaria nueva	1	3,00	6,15		18,45





María Claudia García
Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN	Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,14	37,74	M2		

DISCRIMINACIÓN						
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	piso 2 - bateria sanitaria a reparar	1		1,65	1,87	3,09
	piso 2 - bateria sanitaria a reparar	2		3,7	1,87	13,84
	piso 2 - bateria sanitaria a reparar	1		2,45	1,87	4,58
	piso 2 - bateria sanitaria nueva	2		3,7	1,87	13,84
	piso 2 - bateria sanitaria nueva	1		3	0,80	2,40







María Claudia García
Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN	suministro y fabricación de muro en perfilería de 90mm en super board de 8mm, doble cara, totalmente acabado.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,15	7,60	M2		

DISCRIMINACIÓN						
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	muro baño nuevo piso 2	1		3	3,1	9,30
	DINTEL encima de puerta	1		-0,85	2	-1,70







María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,16	5,00	ML		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	PUERTA	1		5		5

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de alma en madera de 88mm

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,17	8,00	ML		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	PUERTA	1		5		5
	REFUERZO MURO MESON	1		3		3

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,19	45,07	UND		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	piso 2 - bateria sanitaria a reparar	1		1,65	1,87	3,09
	piso 2 - bateria sanitaria a reparar	1		3,7	1,87	6,92
	piso 2 - bateria sanitaria a reparar	1		2,45	1,87	4,58
	piso 2 - bateria sanitaria a reparar	1		3,7	1,87	6,92
	piso 2 - bateria sanitaria nueva	1		3,7	1,87	6,92
	piso 2 - bateria sanitaria nueva	1		3,00	1,87	5,61
	piso 2 - bateria sanitaria nueva	1		3,70	1,87	6,92
	piso 2 - bateria sanitaria nueva	1		2,20	1,87	4,11

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,2	27,52	M2		

DISCRIMINACIÓN

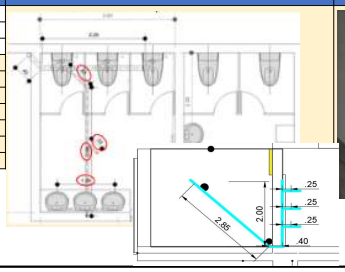
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baterias nuevas 2do piso	1		2,45	3,7	9,07
	Bateria sanitaria nueva - piso 2	1		3,00	6,15	18,45

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos y accesorios para su instalación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,21	6,00	ML		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baño nuevo piso 2	1		0,6		0,60
	Baño nuevo piso 2	1		0,5		0,50
	Baño nuevo piso 2	1		3,4		3,40
	Baño nuevo piso 2	1		1,5		1,50

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de puntos sanitario de 2"

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,22	4,00	UND		

DISCRIMINACIÓN



elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baño nuevo piso 2 - lavamanos	3				3
	Sifón	1				1

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,23	1,00	UND		

DISCRIMINACIÓN



elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baño nuevo piso 2 - sifón	1				1,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de rejilla aluminio/plástica anti- insectos de 2"

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,24	2,00	UND		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baño nuevo piso 2 - sifón	1				1,00
	Baño reparar piso 2 - sifón	1				1,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,25	15,00	ML		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Bateria sanitaria nueva - piso 2	1		3,5		3,50
	Bateria sanitaria nueva - piso 2	1		0,5		0,50
	Bateria sanitaria nueva - piso 2	4		0,5		2,00
	Araña	1		4		4,00
	Suplemento	1		5		5,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de puntos sanitario de 4"

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,26	3,00	UND		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Bateria sanitaria nueva - piso 2	3				3,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,27	18,00	ML		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Bateria sanitaria nueva - piso 2	1		2		2,00
	Bateria sanitaria nueva - piso 2	1		3		3,00
	Bateria sanitaria nueva - piso 2	1		4		4,00
	Bateria sanitaria nueva - piso 2	1		3		3,00
	TUBO AIRES	1		6		6

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación punto hidráulico 1/2"

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,28	12,00	UND		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Bateria sanitaria nueva piso 2 - lavamanos	3				3,00
	Bateria sanitaria nueva piso 2 - sanitario	3				3,00
	Bateria sanitaria a reparara piso 2 -	2				2,00
	Bateria sanitaria a reparara piso 2 -	2				2,00
	Bateria sanitaria a reparara piso 2 - poceta	1				1,00
	AIRE ACOND.	1				1

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN suministro e instalación de tapa registro de 15 x 15

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,29	2,00	UND		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Bateria sanitaria nueva - piso 2	1				1,00
	Bateria sanitaria a reparar piso 2	1				1,00

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2"

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,3	2,00	UND		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Bateria sanitaria nueva - piso 2	1				1,00
	Bateria sanitaria a reparar piso 2	1				1,00

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,33	5,00	UND		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	baño nuevo piso 2	3				3,00
	baño piso 2	2				2,00

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,34	2,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños a repara piso 2	2				2,00

María Claudia García
Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO


DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,35	5,00	UND

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	baño a reparar piso 2	2				2,00
	baño nuevo piso 2	3				3,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,47	6,10	M3

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	demolición contrapiso	21,65			0,2	4,33
	desmonte de mutante puerta	1,00			0,1	0,10
	demolción muros	1,80			0,15	0,27
	coeficiente de expanción					1,40

Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 2", incluye retiro

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,48	2,00	UND

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	BAÑOS 2 PISO	2				2,00

Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 4", incluye retiro

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
1,49	3,00	UND

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	baños nuevos piso 2	3				3,00

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación orinal mediano blanco institucional, incluye todos los elementos para su fijación, instalacion y correcto funcionamiento

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,51	2,00	UND		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños a reparar	2				2,00

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de grifería sistema push en bronce para Orinal

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1,52	2,00	UND		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños	2				2,00

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
2,01	61,01	M2		

DISCRIMINACIÓN

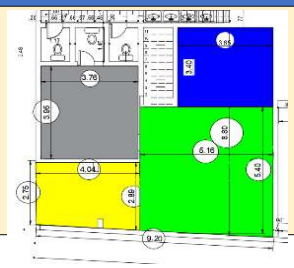
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Piso 1 - franja amarilla	1	2,82	3,42		9,64
	Piso 1 - franja verde	1	5,40	5,16		27,86
	Piso 1 - franja cian	1	3,40	3,65		12,41
	Piso 1 - franja blanca	1	2,95	3,759		11,09

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Excavación en tierra a mano

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
2,02	30,50	M3		

DISCRIMINACIÓN

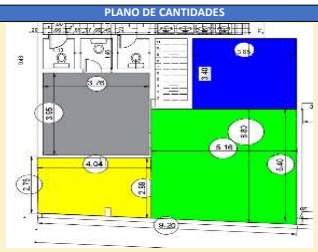
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Piso 1 - franja amarilla	1	2,82	3,42	0,5	4,82
	Piso 1 - franja verde	1	5,40	5,16	0,5	13,93
	Piso 1 - franja cian	1	3,40	3,65	0,5	6,21
	Piso 1 - franja blanca	1	2,95	3,76	0,5	5,54

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Relleno rocamuerta compactado 95%PM

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
2,03	30,50	M3		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Piso 1 - franja amarilla	1	2,82	3,42	0,5	4,82
	Piso 1 - franja verde	1	5,40	5,16	0,5	13,93
	Piso 1 - franja cian	1	3,40	3,65	0,5	6,20
	Piso 1 - franja blanca	1	2,95	3,76	0,5	5,55

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Contrapiso en concreto e=0,10m

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
2,05	61,01	M2		

DISCRIMINACIÓN

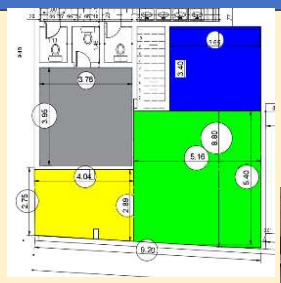
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Piso 1 - franja amarilla	1	2,82	3,42		9,64
	Piso 1 - franja verde	1	5,40	5,16		27,86
	Piso 1 - franja cian	1	3,40	3,65		12,41
	Piso 1 - franja blanca	1	2,95	3,76		11,09

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Alistado piso 5cm mortero 1:3

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
2,06	61,01	M2		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Piso 1 - franja amarilla	1	2,82	3,42		9,64
	Piso 1 - franja verde	1	5,40	5,16		27,86
	Piso 1 - franja cian	1	3,40	3,65		12,41
	Piso 1 - franja blanca	1	2,95	3,76		11,09

Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: cajas de inspección de concreto reforzado 60x60

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
2,07	2,00	UND		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	piso 1 hall de acceso	2				2,00

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
2,08	61,01	M2		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Piso 1 - franja amarilla	1	2,82	3,42		9,64
	Piso 1 - franja verde	1	5,40	5,16		27,86
	Piso 1 - franja cian	1	3,40	3,65		12,41
	Piso 1 - franja blanca	1	2,95	3,76		11,09

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 6", con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
2,1	3,00	ML		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	piso 1 entre cajas	1		3		3,00

María Claudia García
Vo Bo Director Obra

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
2,11	15,00	ML		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	bajante piso 2 a 1, enfermeria	1			3,7	3,70
	muñeco sanitarios	1		5,8		5,80
	entre cajas 3 y 5	1		3,5		3,50
	entre bajante y caja 5	1		2		2,00



Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO
DESCRIPCIÓN	Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
2,14	28,80	M3		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
RETIRO	HALL	28,8				28,80


GESTORES Y SOLUCIONES EL PACIFICO S.A.S

CERTIFICADO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION


GESTORES Y SOLUCIONES EL PACIFICO S.A.S





Vo Bo Director Obra


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	CANTIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO
DESCRIPCIÓN	Aseo general	

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
2,16	88,53	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
	Baños 2do piso	1	2,45	3,7		9,07
	Baños 2do piso	1	3	6,15		18,45
	Cuarto de Lactancia	1	2,95	3,76		11,09
	Acceso principal		2,82	3,42		9,64
	Zona de recepción		5,40	5,16		27,86
	Pasillo fente a baños		3,4	3,65		12,41









Vo Bo Director Obra
