INFORME DE INTERVENTORÍA NO 02
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

ID CONTRATO SECOPP II: CO1.PCCNTR.7175666

CONTRATO No: 3222 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 836 DE MARZO DE 2025: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

INTERVENTOR: CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLÍVAR.

PRESENTADO POR:

EQUIPO DE INTERVENTORIA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.1. Localización 7
2.2. Características técnicas del proyecto 8
2.2.1. Distribución de la obra 8
3. CONTRATO DE OBRA 12
3.1. Datos generales del contrato de obra 12
3.2. Aspectos financieros. 13
3.3. Actividades de obra en ejecución y por ejecutar. 14
3.4. Estados financieros del contrato de obra. 35
3.4.1. Garantías del contrato de obra 35
3.5. Actividades realizadas 37
3.6. Componente técnico 38
3.7. Personal del contratista 40
3.8. Maquinarias y equipos del contratista 41
3.9. Aspecto ambiental 41
3.10. Aspecto HSE 42
4. ASPECTO SOCIAL 42
5. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 43
5.1. Datos generales del contrato de interventoría 43
5.2. Aspectos financieros 44
5.3. Alcance del contrato de interventoría 45
5.4. Aspectos administrativos – contractuales de interventoría 45
5.4.1. Relación de documentos tramitados y plazos 46
5.5. Garantías del contrato de interventoría 46
6. DESARROLLO DE LA INTERVENTORÍA 47
6.1. Interventoría técnica 47

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

6.2. Actividades desarrolladas por la interventoría 48
6.3. Interventoría ambiental y salud ocupacional 49
6.4. Interventoría jurídica 50
6.5. Aspectos técnicos 51
6.6. Personal de interventoría 52
6.7. Equipos de interventoría 52
6.8. Estado financiero del contrato de interventoría 53
7. OBSERVACIONES 53
8. REGISTRO FOTOGRAFICO 54
9. BITÁCORA DE OBRA MES DE JUNIO 2025. 74
10. ANEXO 1. INFORME SST. 88
11. ANEXO 2. SEGURIDAD SOCIALESPECIALISTA HIDRAULICO YOVANI CASTRO. 179
12. ANEXO 3- SEGURIDAD SOCIAL ESPECIALISTA ELECTRICISTA FABER PARRA 181
13. ANEXO 4- SEGURIDAD SOCIAL ESPECIALISTA GEOTECNIA ORLANDO ELIAS GOMEZ. 182
14. ANEXO 5-RESULTADOS DE LABORATORIO MUESTRAS DE CONCRETO M-7 Y M-8, CON FECHAS DE VACIADO DE 19 Y 21 DE JUNIO RESPECTIVAMENTE. 184
..... 184
15. ANEXO 6- Solicitud de certificación sobre permisos ambientales requeridos para la ejecución del proyecto cuyo objeto "Construcción de la Infraestructura de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria, Municipio de Villanueva – Departamento de Bolívar, Lote 1" – Contrato No. 3222 de 2024. 185
16. CONCLUSIONES 189

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Representación de la ubicación del proyecto..... 7
Ilustración 2: Vaciado de concreto para zapatas de muro de cerramiento. 03 de junio. 54
Ilustración 3: Relleno con material seleccionado y colocación de capa de solado sobre fondos de zapatas Módulo 2. 03 de junio..... 55
Ilustración 4: Vaciado de concreto para Zapatas de Módulo 1. 04 de junio. 56
Ilustración 5: Momento HSEQ.05 de junio. 57
Ilustración 6: Excavación, relleno, solado, instalación de acero y vaciado de concreto para zapatas de muro de cerramiento.05 de junio..... 58
Ilustración 7: Definición de niveles, relleno y compactación, y solado para fondos de zapata Módulo 6. 06 de junio. 59
Ilustración 8: Momento HSEQ .07 de junio. 60
Ilustración 9: Instalación de acero y encofrado, vaciado con concreto zapatas de módulo 6 y toma de muestras M-4.07 de junio. 61
Ilustración 10: Excavación, relleno y compactación, y solado para fondos de zapata Módulo 6.09 de junio..... 62
Ilustración 11: Corte, figurado y armado de acero de refuerzo para elementos de cimentación tipo Zapatas y pedestales. 10 de junio. 63
Ilustración 12: Registro de fuerte lluvia desde las 12:30 hasta las 13:30. 10 de junio..... 64
Ilustración 13: Definición de niveles, excavación y relleno de fondos de zapata de Módulo 6. 12 de junio..... 65
Ilustración 14: Registro de fuerte lluvia desde las 13:20 hasta las 14:40. 12 de junio..... 66
Ilustración 15: Vaciado de concreto de 4000 psi para zapatas de módulo 6 y toma de muestras M-6. 14 de junio..... 67
Ilustración 16: Vaciado de concreto de 4000 psi para zapatas de módulo 2 y toma de muestras M-7. 19 de junio..... 68
Ilustración 17: Levante de muro de cerramiento. 20 de junio. 69
Ilustración 18: Definición de niveles, relleno y compactación, y solado sobre fondos de zapata de módulo 2. 20 de junio..... 69
Ilustración 19: Vaciado de concreto de 4000 psi para zapatas de módulo 2 y módulo 6 y toma de muestras M-8. 21 de junio. 70
Ilustración 20:Momento HSEQ. 24 de junio. 71
Ilustración 21:Momento HSEQ. 25 de junio. 71
Ilustración 22: Registro de fuerte lluvia desde las 15:00 hasta las 15:30. 26 de junio..... 72
Ilustración 23: Reunión con la Veeduría. 27 de junio. 72
Ilustración 24: vaciado de pedestales, solado de limpieza y vaciado de viga de arrastre, vaciado de columnas y levante de muro de cerramiento. 27 de junio. 73

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONTENIDO DE GRAFICAS

Grafica 1: Programación vs ejecución. 39

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1: Distribución Módulos 1, 2, 3 y 5. 8
Tabla 2: Distribución Módulo 4. 9
Tabla 3: Distribución Módulo 6. 9
Tabla 4: Distribución Módulo 7. 9
Tabla 5: Distribución Zonas exteriores y urbanismo. 10
Tabla 6: Distribución Zonas de Circulación abierta, generales y patios. 10
Tabla 7: Cuadro resumen de áreas totales. 11
Tabla 8: Datos generales contrato de obra 12
Tabla 9: Aspecto financiero contrato de obra 13
Tabla 10: Actividades de Obra. 34
Tabla 11: Informe financiero contrato obra 35
Tabla 11: Pólizas de cumplimiento 36
Tabla 12: Predios, labores y operaciones 36
Tabla 13: Avance de obra 37
Tabla 15: Personal contratista 40
Tabla 16: Maquinaria usada 41
Tabla 17: Datos generales contrato interventoría 43
Tabla 18: Aspecto financiero contra interventoría 44
Tabla 19: Plazos del contrato y relación de documentos 46
Tabla 20: Pólizas de cumplimiento de interventoría 46
Tabla 21: Aspectos técnicos, administrativos y financieros de interventoría 51
Tabla 22: Personal de interventoría 52
Tabla 23: Informe financiero contrato interventoría 53

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

El Depto. de Bolívar a través de la Secretaría de Planeación y haciendo uso de las facultades establecidas por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1150 de 2007, decreto reglamentario 1082 de 2015, ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. realizo la adjudicación del contrato **No: 3222 DE 2024, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR** al contratista CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024, por un valor total de **$ 25.088.711.401.**

Por lo anteriormente mencionado se realizaron por conducto de la mencionada dependencia los estudios previos y de costos encaminados a determinar la conveniencia y oportunidad de la contratación y a definir sus soportes técnicos, económicos y jurídicos.

De igual manera la secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar en uso de sus competencias legales, especialmente las atribuidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 381 de 2022, adjudica un contrato cuyo objeto es la **CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 836 DE MARZO DE 2025: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.**

Que revisadas las ofertas económicas por el comité evaluador manifiesta que el valor ofertado a cada grupo está acorde con las reglas fijadas en pliego de condiciones no superando el presupuesto oficial.

Como consecuencia de lo anterior, las partes quedaran así: El departamento de Bolívar como contratante y **CONSORCIO TRANFORMAR EDUCATIVO BOLÍVAR** como contratista, identificado con Nit. No. 901.928.289-3. Cuyo contrato esta por un valor de **$1.204.724.965,00**

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización

El proyecto se localiza en el Municipio de Villanueva Bolívar, departamento de Bolívar y corresponde a la CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

Longitud total de Municipio de Villanueva 225 Km2

Coordenadas: 10°26′39″N 75°16′29″O

Coordenadas de la Institución educativa técnica agropecuaria. Municipio de Villanueva - departamento de Bolívar: 10.446111, -75.2666692

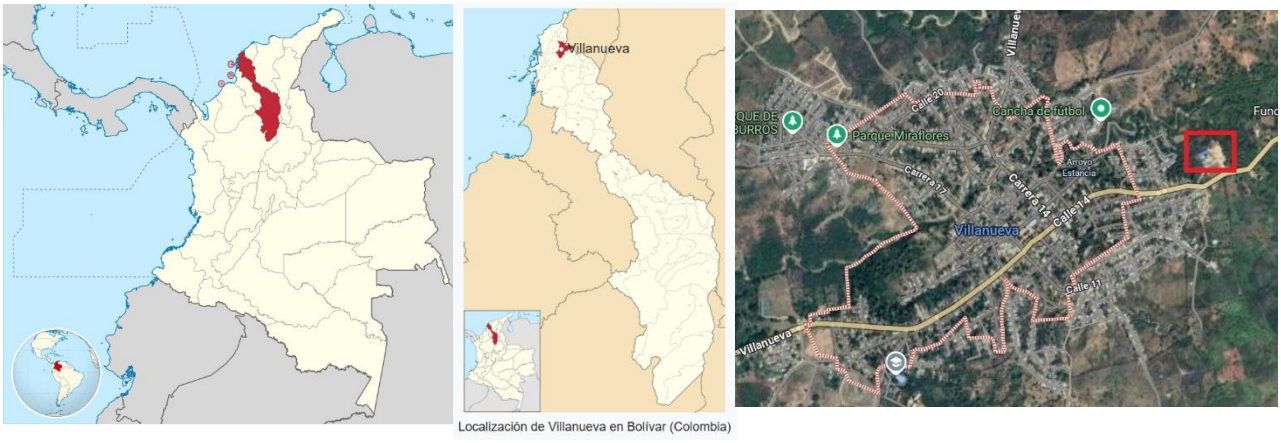


Ilustración 1: Representación de la ubicación del proyecto

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

2.2. Características técnicas del proyecto

El área total del lote es de 49.697 metros cuadrados, de esta área total, será intervenida un 15% la cual equivale a 7.273 metros cuadrados, esta estará distribuida en 7 módulos, una cancha multifuncional y zonas de urbanismo. El sistema constructivo de estos módulos consta de una cimentación en concreto reforzado de 4000 psi y unos pórticos en estructura metálica, con cubierta termoacústica. Este proyecto contempla un diseño teniendo en cuenta la norma sismorresistente NSR-10 y cumple con todas las áreas mínimas para los espacios que van a ser construidos.

2.2.1. Distribución de la obra

Módulo 1, 2, 3 y 5: Estos módulos están diseñados para aulas de clase, tecnología e innovación y bilingüismo, además de bienestar estudiantil, los cuales tendrán de construcción de 3.050,04 m2, los cuales se reparten como se mencionan a continuación:

TIPOS DE ESPACIOS	m2	Und	M2/u	Sub total	TOTALES
AMBIENTE A AULAS					2600,16
Transicion					
Aulas preescolar	0	2	40,14	80,28	
Aulas 1º primaria	0	0	0,00	0,00	
Baños preescolar (con ducha telef)	0	2	9,86	19,72	
Baños 1º Primaria	0	1	19,27	19,27	
Deposito	0	2	5,08	10,16	
Basica primaria					
Aulas (2 a 5)	0	12	66,37	796,44	
Bateria de Baños primaria	0	2	45,47	90,94	
Secundaria					
Aulas (6 a 11)	0	21	66,37	1393,77	
Bateria de Baños	0	2	45,47	90,94	
Bateria de Baños	0	2	49,32	98,64	
AMBIENTE B (centro de recursos)					400,35
Biblioteca	0	1	206,52	206,52	
Salon ludico Infantil	0	1	96,95	96,95	
Bilinguismo	0	1	96,88	96,88	
BIENESTAR ESTUDIANTIL					49,53
Enfemeria con Baño	0	1	26,43	26,43	
Tiendas escolares	0	3	7,70	23,10	

Tabla 1: Distribución Módulos 1, 2, 3 y 5.

Módulo 4: Este módulo es exclusivo para centro de recursos, laboratorios y talleres. Área= 410,06 m^2. los cuales se reparten como se mencionan a continuación:

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

AMBIENTE C (Laboratorios y talleres)					410,06
Laboratorio integrado 1	0	1	92,05	92,05	
Laboratorio integrado 2	0	1	93,11	93,11	
Tecnologia e Inovacion	0	1	101,90	101,90	
Aula polivalente (Ciencia y arte)	0	1	123,00	123,00	

Tabla 2: Distribución Módulo 4.

Módulo 6: En este módulo podemos encontrar la zona de restaurante escolar y servicios generales tales como, eléctricos, depósito de basuras y sistema de bombas hidráulicas. Área = 1022.7 m2. los cuales se reparten como se mencionan a continuación:

AMBIENTE D (Restaurante Escolar)					941,30
Comedor- Aula multiple (incluye complem	0	1	784,77	784,77	
Cocina	0	1	156,53	156,53	

SERVICIOS GENERALES					81,40
Area basuras, electricos, vestiers, etc	0	1	71,46	81,40	

Tabla 3: Distribución Módulo 6.

Módulo 7: En este módulo podemos encontrar zonas exclusivas para aulas administrativas, Área = 323.49 m^2.

AREA ADMINISTRATIVA					323,49
Area administrativa	0	1	323,49	323,49	

Tabla 4: Distribución Módulo 7.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

Zonas exteriores y urbanismo: cubiertas y muros. Área = 2467.1 m2.

SUB TOTAL AREA UTIL				
Muros				245,18
Circulacion cubierta 1 piso				1479,90
Circulacion cubierta 2 piso				742,02

Tabla 5: Distribución Zonas exteriores y urbanismo.

Circulación abierta, generales y patios.

CIRCULACIONES ABIERTAS GENERALES Y PATIOS					45228,70
Patios y Plazas				5209,66	
Area libres del lote y retiros				40019,04	

Tabla 6: Distribución Zonas de Circulación abierta, generales y patios.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

Cuadro resumen de áreas totales.

ELEMENTO	AREA (M2)	CANTIDAD	AREA TOTAL (M2)
AULA	72	33	2376
BAÑO AULAS	54	6	324
TECNOLOGIA E INNOVACION	99	1	99
EMISORA	9	1	9
DEPOSITO	9	1	9
BILINGUISMO	90	1	90
BIBLIOTECA	171	1	171
SALON LUDICO INFANTIL	99	1	99
OFICINA DE BIBLIOTECA	22,5	1	22,5
MATERIAL DE LECTURA	20,7	1	20,7
ENFERMERIA	27	1	27
SALA DE PROFESORES	52,3	2	104,6
BAÑO PROFESORES	24	2	48
ORIENTACION	54	1	54
RECTORIA	54	1	54
AYUDAS DIDACTICAS	24,75	1	24,75
DEPOSITO AP	7,2	2	14,4
AULA POLIVALENTE	115,2	1	115,2
LABORATORIO INTEGRAL	90	2	180
DEPOSITO LAB	3,78	4	15,12
AULA INFANTIL TIPO	49,7	2	99,4
BAÑO INFANTIL	9,66	2	19,32
COMEDOR MAS ESCENARIO	874	1	874
COCINA	189	1	189
ZONA ADMINISTRATIVA	65,625	1	65,625
PORTERIA	10,8	1	10,8
CANCHAS	465	2	930

Tabla 7: Cuadro resumen de áreas totales.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3. CONTRATO DE OBRA

3.1. Datos generales del contrato de obra

CONTRATO No.:	**3222 de 2024**
CONTRATANTE:	Gobernación de Bolívar
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
FECHA DEL CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024.
VALOR CONTRATO:	$ 25.088.711.401
FECHA DE INICIO:	12 DE MAYO DE 2025
PLAZO INICIAL:	CATORCE (14) MESES
INTERVENTORIA	CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR
SUPERVISION CONTRATO DE OBRA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – GOBERNACION DE BOLIVAR
SUPERVISION CONTRATO INTERVENTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – GOBERNACION DE BOLIVAR

Tabla 8: Datos generales contrato de obra

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.2. Aspectos financieros.

VALOR TOTAL		$ 25.088.711.401
RECURSOS		Los costos de la obra serán cubiertos por la Gobernación del Dpto. de Bolívar.
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES**	• Una primera transferencia a título de anticipo, correspondiente al 15 % del valor del contrato adjudicado, una vez se suscriba el contrato especifico, se apruebe la póliza, se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice incorporación de estos recursos en el presupuesto de la entidad ejecutora. • Una segunda transferencia, una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 30 por ciento (30%), el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. • De aquí en adelante una tercera y demás transferencias, una vez la ejecución del proyecto presente un avance físico no menor al 10 por ciento (10%), el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales.

Tabla 9: Aspecto financiero contrato de obra

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.3. Actividades de obra en ejecución y por ejecutar.

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.			
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS**
I			**CANTIDAD**
I.1	**SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA**		
I.1.1	Certificación Retie (Sobre costo Directo Costo Inst. Eléctricas)	GLB	1
I.1.2	Certificación Retilap (Sobre costo Directo Iluminación)	GLB	1
I.1.3	Tramites y diligencias para la conexión final	GLB	1
I.2	**SERVICIO AGUA POTABLE**		
I.2.1	Tramites y diligencias para la conexión final Acueducto	UND	1
I.2.2	Tramites y diligencias para la conexión final Alcantarillado	UND	1
II			
II.1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO**		
II.1.1	Localización y replanteo del Proyecto	M2	13388
II.2	**DESCAPOTE, LIMPIEZA Y CORTE**		
II.2.1	Descapote, Limpieza, cargue y retiro de sobrantes, incluye el desenraice si es necesario. Prof:0.30 mts	M2	9371.6
II.3	**CERRAMIENTO PROVISIONAL**		
II.3.1	Cerramiento provisional en plástico H=2.10	ML	831.25
II.4	**CAMPAMENTO PROVISIONAL**		

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

II.4.1	Campamento provisional, disposición y acondicionamiento de espacio para almacén de materiales, incluye su desmonte al finalizar el proyecto	MES	12.50
II.4.2	Baños provisionales	MES	12.50
II.4.3	Almacén y patio de materiales	GLB	1.00
II.5	**DEMOLICIONES EXISTENTES (PRIMERA PARTE)**		
II.5.1	Desmonte de cubiertas, puertas, ventanas y aparatos sanitarios	M2	632.00
II.5.2	Demolición de estructuras (columnas, vigas y muros)	M2	1,786.00
II.5.3	Demolición de cimientos	M2	690.00
II.6	**DEMOLICIONES EXISTENTES (SEGUNDA PARTE)**		
II.6.1	Desmonte de cubiertas, puertas, ventanas y aparatos sanitarios	M2	615.00
II.6.2	Demolición de estructuras (columnas, vigas y muros)	M2	1,765.00
II.6.3	Demolición de cimientos	M2	639.00
II.7	**PROVISIONAL SERVICIOS PUBLICOS**		
II.7.1	Provisional eléctrico (Incluye trámites ante entidad prestadora de servicios)	UND	1.00
II.7.2	Provisional hidráulico Incluye trámites ante entidad prestadora de servicios)	UND	1.00
II.7.3	Provisional alcantarillado (Incluye trámites ante entidad prestadora de servicios)	UND	1.00
III			
III.1	**EXCAVACIONES**		
III.1.1	Excavación manual y retiro de material Vigas	M3	157.64
III.1.2	Excavación manual y retiro de material Zapatas	M3	1538.25
III.1.3	Excavación mecánica y retiro de material	M3	
III.2	**RELLENOS**		
III.2.1	Relleno y compactación material seleccionado	M3	1830.11
III.2.2	Relleno piedra rajón	M3	0
III.2.3	Relleno y compactación material común	M3	120
III.2.4	Estabilización de taludes con geotextil	M2	217
IV			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

IV.1	**ZAPATAS**		
IV.1.1	Concreto pobre de limpieza 2000 psi E: 5cm	M2	734.28
IV.1.2	concreto zapatas 4000 psi	M3	269.52
IV.1.3	Acero de refuerzo zapatas fy 60000 psi	KG	10830
IV.2	**VIGAS DE AMARRE**		
IV.2.1	Concreto pobre de limpieza 2000 psi E: 5cm	M2	604.68
IV.2.2	concreto vigas de amarre 4000 psi	M3	216.41
IV.2.3	Acero de refuerzo vigas de amarre fy 60000 psi	KG	29053
IV.3	**PEDESTALES**		
IV.3.1	concreto pedestales 4000 psi	M3	52.47
IV.3.2	Acero de refuerzo pedestales fy 60000 psi	KG	13566.67
IV.3.3	Grouting de nivelación e=5 cm	M2	71.37
V			
V.1	**SUPERFICIE EN LOSA STEEL DECK**		
V.1.1	Losa Steel deck E:15cm 4000 psi	M2	2779.276
V.2	**COLUMNAS ACERO LAMINADO (HE)**		
V.2.1	Suministro e instalación de acero laminado (S355). Incluye imprimación de secado rápido.	Kg	70312.2
V.2.2	Platina de acero laminado. Incluye imprimación de secado rápido.	Kg	6,068
V.3	**VIGAS EN ACERO LAMINADO (IPE)**		
V.3.1	Suministro e instalación de acero laminado (S355). Incluye imprimación de secado rápido.	Kg	152413.98
V.3.2	Refuerzo estructural en acero laminado (Rigidizadores y chapas). Incluye imprimación de secado rápido y soldadura.	Kg	1138.55
V.4	**CUBIERTA EN ACERO LAMINADO Y CONFORMADO (HEA - IPE - UPE - Z -**		

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

V.4.1	Suministro e instalación de acero laminado (S355). Incluye imprimación de secado rápido.	Kg	64404.45
V.4.2	Suministro e instalación de acero conformado (S355). Incluye imprimación de secado rápido.	Kg	3807.51
V.4.3	Refuerzo estructural en acero laminado (Rigidizadores y chapas). Incluye imprimación de secado rápido y soldadura.	Kg	859.6
V.5	**ESCALERA EN ACERO LAMINADO Y CONFORMADO (L - HEA - IPE - UPE)**		
V.5.1	Suministro e instalación de acero laminado (S355). Incluye imprimación de secado rápido.	Kg	6601.3
V.5.2	Refuerzo estructural en acero laminado (Rigidizadores y chapas). Incluye imprimación de secado rápido y soldadura.	Kg	3032
V,5,3	Peldaño Escaleras	UN	40
V.6	**RAMPAS EN ACERO LAMINADO**		
V.6.1	Suministro e instalación de acero laminado (S355). Incluye imprimación de secado rápido.	Kg	4698.0336
V.6.2	Refuerzo estructural en acero laminado (Rigidizadores y chapas). Incluye imprimación de secado rápido y soldadura.	Kg	72.768
V.7	**ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS EN CONCRETO**		
V.7.1	Muros en concreto 4000 psi tanque subterráneo	M3	17.25

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

V.7.2	Placa base concreto 4000 psi tanque subterráneo (Incluye cinta PVC)	M3	11.7
V.7.3	Acero de refuerzo fy 60000 psi	KG	11325
V.7.4	Losa aligerada 4000 psi tapa tanque subterráneo	M3	7.02
VI			
VI.1	**MAMPOSTERIA**		
VI.1.1	Levante Muro en bloque de concreto liso No. 5, dimensiones 12*20*30 cm	M2	4838.61
VI.1.2	Dovelas en concreto de 3000 Psi incluye acero de refuerzo y anclaje.	ML	2635
VI.1.3	Alfajía en concreto de 3000 Psi ancho=0.18 m	ML	743
VI.1.4	Grafiles para muro cada 3 hiladas	ML	3150
VI.1.5	Impermeabilizante de muros en hidrofugo	M2	9677.22
VI.1.6	Calados de 20*40 cm	M2	16.48
VI.1.7	Dintel en block número #5 en block relleno en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo	ML	
VI.2	**PAÑETES**		
VI.2.1	Pañetes interiores mortero 1:4	M2	1243.38
VI.2.2	Pañetes con mortero 1:4 impermeabilizado	M2	746.66
VI.3	**MORTEROS**		
VI.3.1	Mortero de nivelación e: 5cm	M2	665.95
VII			
VII.1	**SALIDAS TOMAS**		
VII.1.1	Salida De Tomacorrientes En Tubería Emt Y PVC De 3/4" Y Cable Hffr-Ls #12+12+12T	UND	553
VII.1.2	Salidas para tomacorrientes Trifásico 220 v	UND	9
VII.1.3	Salida De Tomacorrientes Regulado En Tubería Emt Y PVC De 3/4" Y Cable Hffr-Ls #12+12+12T	UND	160
VII.1.4	Salida 220v De Minisplit En Tubería Emt 3/4" Y Cable 2 X #12 + 12T	UND	9
VII.1.5	Salida De Ventiladores En Tuberia Emt 3/4" Y Cable Hffr-Ls #12+12+12	UND	226

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

VII.1.6	Salida De Tomacorrientes Gfci En Tubería Emt Y PVC De 3/4" Y Cable Hffr-Ls #12+12+12T	UND	16
VII.2	**BREAKER E INTERRUPTORES**		
VII.2.1	Breakers de 3x40	UND	0
VII.2.2	Breakers de 2x30	UND	0
VII.2.3	Breakers de 2x20	UND	18
VII.2.4	Breakers de 1x20	UND	373
VII.2.5	Breaker Bipolar 2X40 Amp	UND	6
VII.2.6	Breaker Tripolar 3X40 Amp (Protección)	UND	0
VII.2.7	Breaker Tripolar 3X100 Amp	UND	0
VII.2.8	Breaker Tripolar 3X50 Amp	UND	6
VII.2.9	Breaker Tripolar 3X70 Amp	UND	0
VII.2.10	Breaker Tripolar 2X70 Amp	UND	0
VII.3	**SALIDAS ALUMBRADO**		
VII.3.1	Salida De Luminaria En Tubería Emt 3/4" Y Cable Hffr-Ls #12+12+12T	UND	120
VII.4	**LUMINARIAS Y DOTACION ELECTRICA**		
VII.4.1	Luminaria Hermética Led 2X16 W	UND	0
VII.4.2	Blasto De Emergencia	UND	0
VII.4.3	Balas Panel Ld De Incrustar 6" De 12 W	UND	0
VII.4.4	Balas Panel Led De Incrustar 8" De 18 W	UND	120
VII.4.5	Luminaria 48W 60X60	UND	0
VII.4.6	Aplique De Emergencia	UND	0
VII.4.7	Reflectores 100 W	UND	0
VII.4.8	Montaje Luminarias	UND	120
VII.5	**ACOMETIDAS Y CONDUCTORES**		
VII.5.1	Acometida, 208 Vt, 2X6+6(N)+10(T) Awg Libre Halógenos	ML	0
VII.5.2	Acometida, 208 Vt, 3X2+2(N)+8(T) Awg Cable Libre Halógenos	ML	0
VII.5.3	Acometida, 208 Vt, 3X1/0+1/0(N)+8(T) Awg Libre De Halógenos	ML	0
VII.5.4	Acometida, 208 Vt, 3X4+4(N)+8T) Awg Libre Halógenos	ML	0

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

VII.5.5	Acometida 208 V 2X8+8(N)+10(T) Awg Libre De Halógenos	ML	0
VII.5.6	Acometida 208 V 2X8+8(N)+8(T) Awg Libre De Halógenos	ML	0
VII.5.7	Acometida 208 V 3X8+8(N)+8(T) Awg Libre De Halógenos	ML	0
VII.5.8	Acometida, 208 Vt, 3X4+8T) Awg Libre Halógenos	ML	0
VII.5.9	Acometida, 208 Vt, 3X6+6(N)+10(T) Awg Libre Halógenos	ML	0
VII.5.10	Acometida, 208 Vt, 3X2/0+2/0(N)+8(T) Awg Libre De Halógenos	ML	0
VII.5.11	Acometida, 208 Vt, 3X4/0+4/0(N)+6(T) Awg Libre De Halógenos	ML	
VII.5.12	Tubería Emt 3"+ Accesorios	ML	0
VII.5.13	Tubería Emt 2" + Accesorios	ML	0
VII.5.14	Elementos Conexionado E Identificación	UND	
VII.5.15	Tubería Emt 1 1/2"+ Accesorios	ML	0
VII.6	**TABLEROS**		
VII.6.1	Tablero De Distribución 42 Circuitos, Trifásico, 208 V	UND	1
VII.6.2	Tablero De Distribución 36 Circuitos, Trifásico, 208 V	UND	0
VII.6.3	Tablero De Distribución 8 Circuitos, Bifásico, 208 V	UND	8
VII.6.4	Tablero De Distribución 24 Circuitos, Trifásico, 208 V	UND	3
VII.6.5	Tablero De Distribución 12 Circuitos, Trifásico, 208 V, Cp., T-Cocina,	UND	9

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

VII.6.6	Tablero De Distribución 12 Circuitos, Bifásico, 208 V, Cp., T-R	UND	4
VII.6.7	Tablero De Distribución 30 circuitos, Trifásico, 208 V	UND	6
VII.6.8	Tablero De Distribución 18 circuitos, Trifásico, 208 V	UND	3
VII.6.9	Tablero De Distribución 18 circuitos, Bifásico, 208 V	UND	0
VII.7	**POSTES Y CANALIZACIONES**		
VII.7.1	Elementos De Conexión Crucetas Y Herrajes	UND	1
VII.7.2	Poste De 12 Mts 800 Dan	UND	1
VII.7.3	Puentes Primarias	UND	1
VII.7.4	Puesta A Tierra Pararrayos	UND	1
VII.7.5	Protecciones Y Terminales	ML	1
VII.7.6	Suministro Y Montaje De Trafo Seco Encapsulado 300 Kva13200/208-120V,	UND	1
VII.7.7	Celda De Transformador De 300 Kva	UND	1
VII.7.8	Acometida En Media Tensión En Cable Xlpe 3X# 2 15Kv	ML	60
VII.7.9	Tubería Para Acometida En Media Tensión En PVC 3"	ML	100
VII.7.10	Tubería Imc 3" Para Subir Acometida A Poste	ML	9
VII.7.11	Curva Imc De 3" Para Acometida	UND	1
VII.7.12	Curva PVC De 3" Para Acometida Subterránea	UND	2
VII.7.13	Grapa Y Cinta Bandit	ML	10
VII.7.14	Terminal Encogible Exterior	JGO	1
VII.7.15	Terminal Encogible Interior	JGO	5
VII.7.16	Acometida Trafo A Tablero General Barra De Cobre De 1000 Amp Cobre	ML	20
VII.7.17	Tablero General	GLB	1
VII.7.18	Tubería PVC 2-3" De Trafo A Tg Y Principal	MTS	150
VII.7.19	Accesorio Para La Acometida	GL	1

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

VII.7.20	Excavación (General)	M3	40
VII.7.21	Aterrizaje De La Puerta Del Cuarto Eléctrico	GL	1
VII.7.22	Celda De Medida A 13.2 Kv	UND	1
VII.7.23	Celda De Seccionador Sf6 A 13.2 Kv	UND	1
VII.7.24	Tablero De Transferencia Automática Bomba Contra Incendio	UND	1
VII.7.25	Acometida De Bomba Contraincendios En 3X4/0+ 6T En Tubería Emt De 3"	ML	201
VII.8	**TIERRAS Y OTROS**		
VII.8.1	Malla De Puesta A Tierra	UND	1
VII.8.2	Sistema De Apantallamiento-Instalación De Dps En Cada Tablero Parcial	UND	1
VII.8.3	Interconexión Cable # 1/0 Awg Thwn Desnudo Malla Tierra Cuarto Eléctrico A Pararrayo De Línea	ML	151
VII.8.4	Planta De Emergencia 60 Kva 208 V	UND	1
VII.8.5	Cabina Planta	UND	1
VII.8.6	Accesorios Planta Eléctrica	UND	1
VII.8.7	Acometida, 208 V, 3X4/0+4/0(N)+2Awg Libre Halógenos De Transferencia A Planta De Emergencia	ML	40
VII.8.8	Tubería Pvc 3"+ Accesorios	ML	40
VII.8.9	Elementos Conexionado E Identificación	UND	3
VII.8.10	Tablero General Planta	UND	1
VII.8.11	Extensión de redes de media tensión	UND	1
VIII			
VIII.1	**PUNTOS SANITARIOS Y VENTILACION**		
VIII.1.1	Puntos Desagües A.N. ø 2" (Lavamanos, Duchas, orinales y sifones piso)	UND	189
VIII.1.2	Puntos Desagües A.N. ø 4" (Inodoros)	UND	67
VIII.1.3	Tubería ventilación ø 2"	ML	240
VIII.1.4	Tubería ventilación ø 3"	ML	288
VIII.1.5	Puntos Hidráulicos A.A. ø 3/4"	UND	
VIII.2	**TUBERIA BAJANTE SANITARIA**		
VIII.2.1	Tubería Bajantes de ø 4" PVC-Sanitaria	ML	36

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

VIII.2.2	Tubería Bajantes de ø 3" PVC-Sanitaria	ML	12
VIII.3	**TUBERIA SANITARIA COLECTORES ENTERRADOS**		
VIII.3.1	Tubería Colectores Enterrados De ø2" PVC - Sanitaria	ML	438
VIII.3.2	Tubería Colectores Enterrados De ø3" PVC - Sanitaria	ML	60
VIII.3.3	Tubería Colectores Enterrados De ø4" PVC - Sanitaria	ML	402
VIII.3.4	Tubería Colectores Enterrados De ø6" PVC - Sanitaria	ML	408
VIII.3.5	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Inc. Obras Civiles	UND	
VIII.3.6	Excavación material común	M3	78.48
VIII.3.7	Relleno material seleccionado tipo zahorra	M3	78.48
VIII.4	**REGISTROS**		
VIII.4.1	Registros en Mampostería de 0.60×0.60x0.90 metros - Sanitario	UND	49
VIII.4.2	Registros en Mampostería de 0.60×0.60x0.80 metros - Eléctrico	UND	0
VIII.4.3	Registros en Mampostería de 0.80×0.80x0.80 metros - Eléctrico	UND	0
VIII.4.4	Registros en Mampostería de 1.20×1.20×0.80 metros Eléctrico	UND	0
VIII.4.5	Registros en Mampostería de 0.40×0.40×0.60 metros Eléctrico	UND	0
IX			
IX.1	**PUNTOS AGUAS LLUVIAS**		
IX.1.1	Puntos Desagües A.LL. ø 3". Incluye cúpula tragante de 3" PVC	UND	103
IX.1.2	Puntos Desagües A.LL. ø 4". Incluye cúpula tragante de 4" PVC.	UND	0

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

IX.2	**TUBERIA BAJANTE AGUAS LLUVIAS**		
IX.2.1	Tubería Bajantes de ø 4" PVC-Sanitaria	ML	180
IX.2.2	Tubería Bajantes de ø 3" PVC-Sanitaria	ML	1026
IX.3	**TUBERIA AGUAS LLUVIAS COLECTORES ENTERRADOS**		
IX.3.1	Tubería colectores Enterrados de ø3" PVC - Aguas lluvias	ML	256
IX.3.2	Tubería colectores Enterrados de ø4" PVC - Aguas lluvias	ML	32
IX.3.3	Excavación material comun	M3	144.72
IX.3.4	Relleno material seleccionado tipo zahorra	M3	144.72
IX.3.5	Cárcamo en concreto 3000 psi con rejilla en concreto reforzado	ML	
X	**REDES SUMINISTRO DE AGUA**		
X.1	**TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5-21**		
X.1.1	Puntos Hidráulicos	UND	218
X.1.2	Válvulas de compuerta ø3/4"	UND	11
X.1.3	Válvulas de compuerta ø1"	UND	27
X.1.4	Válvulas de compuerta ø1-1/2"	UND	1
X.1.5	Válvulas de compuerta ø2"	UND	0
X.1.6	Válvulas de compuerta ø4"	UND	2
X.1.7	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø1/2"	ML	120
X.1.8	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø3/4"	ML	246

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

X.1.9	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø1"	ML	36
X.1.10	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø1-1/2"	ML	84
X.1.11	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø2"	ML	
X.1.12	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø2-1/2""	ML	24
X.1.13	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø3"	ML	51
X.1.14	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø4"	ML	24
X.2	**EXCAVACIONES Y RELLENO EN RED HIDRAULICA**		
X.2.1	Excavación manual en material común	M3	0
X.2.2	Relleno material seleccionado compactado tipo zahorra	M3	0
X.3	**SISTEMA DE BOMBEO**		
X.3.1	Sistema Completo de 2 Bombas de presión constante Q = 87 Gpm H = 28 m Pot = 4 Hp Presión 20-40 psi y 2 Tanques WM-WB25 incluye accesorios y Valvuleria con tablero de control Eléctrico	UND	1
X.3.2	Prueba Hidrostática Instalación Hidráulica	UND	1
XI	**APARATOS SANITARIOS**		
XI.1	**APARATOS**		
XI.1.1	Sanitarios de Tanque	UND	64
XI.1.2	Sanitarios Discapacitados	UND	3
XI.1.3	Barra ayuda discapacitados en acero inoxidable	UND	3
XI.1.4	Lavamanos con pedestal	UND	27
XI.1.5	Grifería de Ducha	UND	4
XI.1.6	Orinal de Fluxómetro	UND	14
XI.1.7	Lavaplatos en acero inoxidable	UND	5
XI.1.8	Pocetas Laboratorio en acero inoxidable	UND	6
XI.1.9	Lava trapero en granito pulido	UND	8
XI.1.10	Llave de Chorro	UND	93
XI.1.11	Rejilla de piso de 2"	UND	144

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XI.1.12	lavamanos corrido en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo, soporte en block #5 y enchape blanco de 20x20	ML	46.6
XII	**REDES CONTRAINCENDIO**		
XII.1	**RED DE SUMINISTROS**		
XII.1.1	Tubería CPVC 4" CORZAN	ML	12
XII.1.2	Tubería CPVC 3" CORZAN	ML	354
XII.2	**GABINETES Y ACCESORIOS**		
XII.2.1	Gabinete CI clase II 0.70m x 0.70m x 0.20m	UND	10
XII.3	**EQUIPOS ESPECIALES**		
XII.3.1	Conjunto bombas Contraincendios, bomba principal 100gpm, tablero principal de control y bomba jockey	UND	1
XIII			
XIII.1	**VOZ Y DATOS**		
XIII.1.1	salidas de datos-teléfono tubería PVC 3/4"	UND	163
XIII.1.2	salidas de televisión tubería PVC 3/4"	UND	39
XIII.1.3	certificación punto de datos	UND	202
XIII.1.4	registro metálico 30x30x15 cms	UND	5
XIII.1.5	Suministro e instalación de UPS	UND	1
XIV			
XIV.1	**AIRES TIPO MINI SPLIT**		
XIV.1.1	Suministro e instalación de equipo del tipo Minisplit PISOTECHO de 5 TR R410A	UND	0
XIV.1.2	Suministro e instalación de equipo del tipo Minisplit PISOTECHO de 3 TR R410A	UND	0

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XIV.1.3	Suministro e instalación de equipo del tipo Minisplit de Pared de 2 TR - R410A-INVERTER	UND	0
XIV.2	**EXTRACCIONES**		
XIV.2.1	Sistema de ventilación mecánica para la cocina	UND	1
XIV.2.2	Extractores de baños	UND	55
XV			
XV.1	**INSTALACION DE GAS**		
XV.1.1	Tubería Pealpe ø1/2" Red Interna	ML	55
XV.1.2	Punto de gas ø1/2"	UND	15
XV.1.3	Válvulas tipo Bola Mariposa	UND	15
XV.1.4	Válvulas tipo Bola Pealpe	UND	4
XV.1.5	Pipeta 40 Lb-100 Lb	UND	2
XVI			
XVI.1	**ACABADO DE MUROS**		
XVI.1.1	Pintura Fachada (Incluye viga de borde)	M2	0
XVI.1.2	Estuco Baños, interiores vacíos internos	M2	403.5
XVI.1.3	Pintura Baños, interiores vacíos internos	M2	403.5
XVI.1.4	Enchape en cerámica blanca de 20,5x20,5 referencia:10011 de Natal Blanco de Corona h=1.20m	M2	658.79
XVI.2	**ACABADO DE PISOS**		
XVI.2.1	Lístelo en Tableta 7x25 Etrusca Moca lisa en salones	ML	0
XVI.2.2	Zócalo en Tableta 7x25 Etrusca Moca lisa salones	ML	0
XVI.2.3	Piso en concreto de 3000 psi con espesor de 10 cms con juntas y endurecedor de pisos	M2	2518.52

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XVI.2.4	Endurecedor de pisos placas SteelDeck piso 2	M2	2779.276
XVI.2.5	Sello de juntas en poliuretano para placa de concreto, incluye cordón	ML	1857.08
XVI.3	**CARPINTERIA METALICA PUERTAS**		
XVI.3.1	Suministro e instalación de puerta P1A Dim: 0,96 x 3,00 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio o apariencia Yale 90044 ó similar, Panel superior 0,90 x 0,96 mts en persiana fija en lámina cold rolled, calibre 20	UND	31
XVI.3.2	Suministro e instalación de puerta P2 Dim: 0,86 x 3,00 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio o apariencia Yale 90044 ó similar, Panel superior 0,90 x 0,96 mts en persiana fija en lámina cold rolled, calibre 20	UND	8

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XVI.3.3	Suministro e instalación de puerta P3 Dim: 0,76 x 3,00 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio o apariencia Yale 90044 ó similar, Panel superior 0,90 x 0,96 mts en persiana fija en lamina cold rolled, calibre 20	UND	3
XVI.3.4	Suministro e instalación de puerta Doble Batiente P4 Dim: 1,86 x 3,00 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio o apariencia Yale 90044 ó similar, Panel superior 0,90 x 1,86 mts en persiana fija en lámina cold rolled, calibre 20	UND	3
XVI.3.5	Suministro e instalación de puerta P5 Dim: 0,96 x 2,10 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio o apariencia Yale 90044 ó similar.	UND	18

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XVI.3.6	Suministro e instalación de puerta Doble Batiente P6 Dim: 1,66 x 3,00 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio o apariencia Yale 90044 ó similar, Panel superior 0,90 x 1,66 mts en persiana fija en lámina cold rolled, calibre 20	UND	2
XVI.3.7	Suministro e instalación de puerta cuatro cuerpos corrediza P7 Dim: 3,66 x 3,00 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio o apariencia Yale 90044 ó similar, Panel superior 0,90 x 3,66 mts en persiana fija en lámina cold rolled, calibre 20	UND	2
XVI.3.8	Puerta R2	UND	1
XVI.3.9	Puerta R1	UND	1
XVI.3.10	Suministro e instalación de puerta P1 Dim: 0,96 x 3,00 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio, Panel superior 0,90 x 0,96 mts en ventana de vidrio 4 mm color natural, paneles laterales de vidrio como muestra en el diseño	UND	43
XVI.4	**CIELOS**		
XVI.4.1	Cielo raso en drywall + pintura a 2 manos	M2	1594.1228
XVI.5	**CARPINTERIA METLICA VENTANERIA Y BARANDAS**		

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XVI.5.1	Ventana tipo V1 Dim: 5,30 x 2,10 mts, 4 cuerpos corredizos sistema 5020, 2 cuerpos fijos, vidrio 4 mm color natral, cuerpo superior en persianas de aluminio 315 color natural o similar 0,90 x 5,30 mts	UND	10
XVI.5.2	Ventana tipo V2 Dim: 7,30 x 2,10 mts, 4 cuerpos corredizos sistema 5020, 2 cuerpos fijos, vidrio 4 mm color natral, cuerpo superior en persianas de aluminio 315 color natural o similar 0,90 x 7,30 mts	UND	35
XVI.5.3	Ventana tipo V3 Dim: 1,40 x 1,03 mts, 2 Cuerpos corredizos sistema 5020, vidrio 4 mm color natral.	UND	2
XVI.5.4	Ventana tipo V4 Dim: 3,60 x 2,10 mts, 2 cuerpos corredizos sistema 5020, 2 cuerpos fijos, vidrio 4 mm color natural, cuerpo superior en persianas de aluminio 315 color natural o similar 0,90 x 3,60 mts.	UND	48
XVI.5.5	Ventana tipo V5 Dim: 1,80 x 2,10 mts, 2 cuerpos corredizos sistema 5020, vidrio 4 mm color natural, cuerpo superior en persianas de aluminio 315 color natural o similar 0,90 x 1,80 mts.	UND	29
XVI.5.6	Ventana tipo V6 Dim: 0,60 x 0,60 mts, 1 Cuerpo proyectante sistema 5020, vidrio 4 mm color natral.	UND	5

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XVI.5.7	Ventana tipo V7 Dim: 1,80 x 1,20 mts, 2 cuerpos, sistema batiente perfil 1 1/2" x 3/4" aluminio color blanco o similar, vidrio 4 mm color natral.	UND	1
XVI.5.8	Ventana tipo V7A Dim: 0,80 x 1,20 mts, 1 cuerpo, sistema batiente perfil 1 1/2" x 3/4" aluminio color blanco o similar, vidrio 4 mm color natral.	UND	1
XVI.5.9	Celosía en aluminio tipo persiana de 1.2m*3.95m	UND	16
XVII			
XVII.1	**CUBIERTAS TERMOACUSTICAS**		
XVII.1.1	Cubierta Teja ECONOROOF panelmet	M2	4086.32
XVII.1.2	Caballete externo e interno	ML	282.53
XVII.1.3	Remates laterales y esquineros de cubierta	ML	1337.12
XVII.1.4	Canal en lámina galvanizada cal 20 con soporteria metálica en ángulos 2"	ML	558.66
XVII.1.5	Soscos metálicos 4" L=30 Cms	UND	0
XVII.1.6	Rejilla tipo cúpula 4"	UND	103
XVIII			
XVIII.1	**IMPERMEBAILIZACIONES EN CALIENTE**		
XVIII.1.1	Impermeabilización con manto edil 4 mm con foil de aluminio	M2	468.68
XVIII.2	**IMPERMEABILIZACIONES EN FRIO**		
XVII.2.1	Impermeabilización de baños y zonas húmedas con cemento marino	M2	331.79
XIX			
XIX.1	**LIMPIEZA Y ASEO**		
XIX.1.1	Limpieza y aseo fino, incluye suministro de insumos	M2	7333
XIX.2	**SEÑALIZACIONES**		

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XIX.2.1	Suministro e instalación de señalizaciones y nomenclaturas	UND	155
XX			
XX.1	**ZONAS VERDES**		
XX.1.1	Jardineras muros en bloque vibrado # 4 pañetado con mortero 1:4 h= 0,60 mts	ML	63
XX.1.2	Arborización	UND	20
XX.1.3	Siembra de arena negra	M3	120
XX.2	**PISOS EXTERIORES**		
XXI.2.1	Pisos en concreto 3000 psi allanado E:10cm	M2	2188.14
XXI.2.2	Piso en Tableta 7x25 Etrusca Moca lisa zonas peatonales	M2	0
XX.3	**CANCHA MULTIPLE**		
XX.3.1	Placa en concreto allanado 3000 psi e: 10cm incluye juntas de dilatación y reforzada con malla electrosoldada 20x20 4mm	M2	571.7
XX.3.2	Pintura tráfico peatonal y deportivo	M2	571.7
XX.3.3	Pintura tráfico peatonal y deportivo	ML	176
XX.3.4	Dotación cancha múltiple (Marcos múltiples Baloncesto y Microfutbol)	UND	2
XX.4	**MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL**		

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XX.4.2	Muro cerramiento perimetral con tubería negra 2 1/2" @ 0,15 mts con tapa metálica acabado con pintura de esmalte RAL 5015 en módulos de 2,55 y altura de 1,90 mts empotrada en muro en bloque # 5 de cemento altura 0,60 mts y columnas de confinamiento según NSR 10 y módulos de muros en bloque # 5 de cemento a la vista y columnas de confinamiento longitud 2,4 mts y altura de 2,50 mts.	ML	145.7
XX.4.3	Muro cerramiento perimetral según NSR 10 muros en bloque # 5 de cemento a la vista y columnas de confinamiento longitud 2,4 mts y altura de 2,50 mts.	ML	571
XX.5	**MURO DE CONTENCION**		
XX.5.1	Excavación manual	M3	0
XX.5.2	Muro de contención de tierras de base rectilínea, con puntera y talón.	ML	0
XX.6	**PARQUEADEROS**		
XX.6.1	Pavimento en concreto rígido e=0.15 mts	M2	896.33
XX.6.2	Bordillo en concreto 3000 PSI H=0.20 mts.	m	199.27
XX.6.3	Anden en concreto e=7.5 cms	M2	0
XX.6.4	Rampas en concreto e=0.15 mts	M2	0

Tabla 10: Actividades de Obra.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.4. Estados financieros del contrato de obra.

INFORME FINANIERO CONTRATO DE OBRA		
Valor actual del contrato de obra	**$ 25.088.711.401**	**100%**
Concepto	**Valor facturado**	**Porcentaje**
ACTA 1	$ 0	0%
TOTAL	$ 0	0.00%
SALDO	**$ 25.088.711.401**	**100.00%**

Tabla 11: Informe financiero contrato obra

3.4.1. Garantías del contrato de obra

El contrato obra cuenta con pólizas que garantizan el cumplimiento del contrato, el pago adecuado de salarios y prestaciones, la correcta inversión del anticipo y la estabilidad de la obra. Estas medidas aseguran la transparencia y calidad en la ejecución del proyecto, protegiendo los intereses de todas las partes involucradas.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

Póliza de cumplimiento No. 11-44-101245567
Aseguradora: Seguros del Estado S.A
Nit: 860.009.578-6

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del Contrato	12/05/2025	11/11/2026	$ 7.526.613.420,3
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/05/2025	12/07/2029	$ 1.254.435.570,05
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	12/05/2025	11/07/2026	$ 3.763.306.710,15
Estabilidad y calidad de la obra		5 años	$ 1.254.435.570,05

Tabla 12: Pólizas de cumplimiento

Póliza de cumplimiento No. 11-40-101072984
Aseguradora: Seguros del Estado S.A
Nit: 860.009.578-6

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Predios, labores y operaciones	12/05/2025	12/07/2026	$ 1.254.435.570,05
Contratistas y subcontratistas	12/05/2025	12/07/2026	$ 1.254.435.570,05
Vehículos propios y no propios	12/05/2025	12/07/2026	$ 1.254.435.570,05

Tabla 13: Predios, labores y operaciones

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.5. Actividades realizadas

Se discrimina las actividades realizadas en el periodo 01 – 30 de junio del 2025

- Localización y replanteo del área a intervenir.
- Corte, relleno y nivelación de terreno natural en las áreas del módulo 1,2,3 y 4.
- Excavaciones para zapatas de modulo 2 y 6.
- Relleno con material seleccionado en excavaciones para zapatas del módulo 2 y 6
- Corte, figuración y armado de acero para zapatas y pedestales de modulo 2, 3 y 6.
- Elaboración y colocación de solado de limpieza
- Fundida de zapatas del módulo 2 y 6
- Se realizo excavación para zapatas del muro de cerramiento.
- Se realizo levante en block #5 en el muro de cerramiento
- Se fundieron vigas de cimentación y columnas en el muro de cerramiento.

De acuerdo con estas actividades, se muestra en la siguiente tabla el avance del contrato de obra.

INFORME No	% EJECUTADO PRESENTE PERIODO	% ACUMULADO MES ANTERIOR	%TOTAL ACUMULADO
1	1,97%	0%	1,97 %
2	1,11%	1.97%	3,08%

Tabla 14: Avance de obra

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.6. Componente técnico


El presente informe contempla las actividades desarrollas del 01 al 30 de junio del presente año, en donde la interventoría realizó acompañamiento, verificación y supervisión al contratista CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024, en la ejecución de las actividades técnicas del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

En el desarrollo de las actividades del proyecto el residente de interventoría ha supervisado y verificado el avance de obra.

Este mes, se logró un avance del 1,11 %, esto nos ubica un 0,32% por encima del porcentaje programado.

Actualmente, se siguen desarrollando varias actividades clave que permitirán seguir avanzando mucho más en los próximos días. Estamos enfocados en aprovechar el tiempo y mantenernos firmes en el cumplimiento de los objetivos establecidos.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

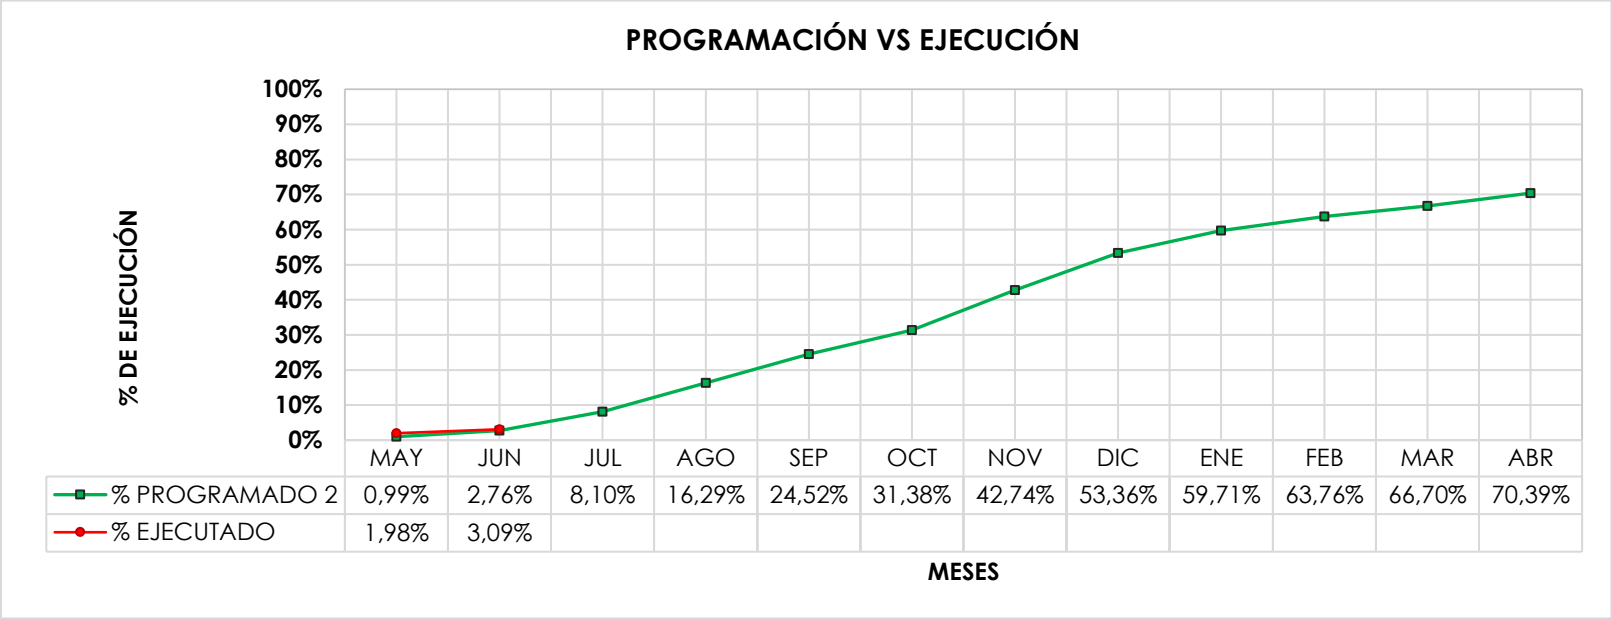

Grafica 1: Programación vs ejecución.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.7. Personal del contratista

Nombre	Cargo	Profesión
Víctor Buelvas	Director de Obra	Ingeniero Civil. Esp. En Estructuras.
Adrián Ortega	Ingeniero Residente	Ingeniero Civil
Rafael Altamiranda	Ingeniero Residente Administrativo y Esp. En Estructuras	Ingeniero Civil
Tommy España	Coordinador HSEQ	Ingeniero Industrial. Esp. En SST.
Susana Montes	Aux. HSEQ.	Técnico en seguridad industrial y salud ocupacional

CARGO	CANTIDAD (UND)
SUPERVISOR	5
AYUDANTE	16
OPERADOR DE MAQUINARIA	2

Tabla 15: Personal contratista

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

3.8. Maquinarias y equipos del contratista

MAQUINARIA/EQUIPOS	CANTIDAD (UN)
MINICARGADOR	1
RETRO EXCAVADOORA SOBRE ORUGA	1
RETRO EXCAVADOORA SOBRE LLANTA	1
MEZCLADORA	1
APISONADOR TIPO CANGURO	1
APISONADOR TIPO RANA	2
VIBRADOR DE CONCRETO	1

Tabla 16: Maquinaria usada

3.9. Aspecto ambiental

El contratista está implementando el Plan de Manejo Ambiental (PMA) como parte de sus responsabilidades ambientales en el proyecto. El PMA es un documento que establece las medidas y acciones que se deben tomar para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales asociados con las actividades de construcción. El contratista está llevando a cabo acciones como la gestión adecuada de los residuos generados durante la obra, el control de emisiones contaminantes, la protección de recursos naturales cercanos y la implementación de medidas para conservar la biodiversidad local. Además, el contratista está realizando monitoreos periódicos para evaluar el cumplimiento de las medidas establecidas en el PMA y garantizar que se estén tomando las medidas adecuadas para proteger el medio ambiente durante el desarrollo del proyecto.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

3.10. Aspecto HSE

En el presente periodo se ha desarrollado en obra el aspecto siso, haciendo entrega de los elementos de protección personal, señalización de lugares con alto grado de riesgo dentro de la obra, además colocando pare y siga (paleteros) durante el cargue y transporte con volquetas del material de excavación y demolición, y realizando el pago de la seguridad social a todos los trabajadores.

Además, para el personal de obra se realizan charlas diarias en temas de seguridad y salud en el trabajo, indicando normas básicas de seguridad industrial, normas de permanencia en obra y protocolos de bioseguridad, lineamientos frente a emergencias y salud en el trabajo.

4. ASPECTO SOCIAL

Se realizaron actividades propias de socialización con la comunidad, representantes de la veeduría y del concejo comunitario, por parte de la alcaldía, la interventoría y el contratista.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

5. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Datos generales del contrato de interventoría

CONTRATO No.	836 DE MARZO DE 2025
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE BOLIVAR
CONTRATISTA	CONSORCIO TRANSFROMAR EDUCATIVO BOLÍVAR
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER QUESADA TURIZO
OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÈCNICA AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"
FECHA DEL CONTRATO	28 DE MARZO DE 2025.
VALOR CONTRATO	$1.204.724.965.
FECHA DE INICIACIÓN	12 DE MAYO DE 2025.
PLAZO INICIAL	QUINCE MESES (15)
SUPERVISION CONTRATO DE INTERVETORÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – GOBERNACION DE BOLIVAR

Tabla 17: Datos generales contrato interventoría

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

5.2. Aspectos financieros

VALOR TOTAL	$ 1.204.724.965.	
RECURSOS	Los costos de la Interventoría serán cubiertos por la Gobernación del Departamento de Bolívar	
FORMA DE PAGO	ANTICIPO	N.A.
	PAGOS PARCIALES	**El DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR** pagará al Contratista el contrato a celebrar, a través de actas mensuales de interventoría, de manera proporcional al avance físico de las obras contempladas en el Contrato de obras al que se le va a realizar la interventoría, que deberán ser debidamente aprobadas por el supervisor del contrato y cuya sumatoria corresponderá al noventa por ciento (90 %) del valor de este. El último pago del valor del contrato corresponderá al diez por ciento (10 %) de su valor, y se hará efectivo con la presentación de las actas de recibo y de liquidación final. Cada acta mensual deberá ir acompañada de por lo menos **doce (12) fotografías**, donde se muestre el avance de cada una de las obras.

Tabla 18: Aspecto financiero contra interventoría

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

5.3. Alcance del contrato de interventoría

- Supervisión y control: El interventor puede tener la responsabilidad de supervisar y controlar el desarrollo y ejecución del proyecto, asegurándose de que se cumplan los plazos, presupuestos y estándares de calidad establecidos.
- Verificación de cumplimiento: El interventor puede estar encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, ambientales y de seguridad aplicables al proyecto.
- Coordinación de actividades: El interventor puede coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados en el proyecto, como contratistas, proveedores y personal interno de la organización.
- Informes y comunicación: El interventor puede ser responsable de generar informes periódicos sobre el avance del proyecto, así como de comunicar cualquier problema, riesgo o desviación significativa a las partes interesadas correspondientes.
- Control de costos y presupuesto: El interventor puede monitorear y controlar los costos del proyecto, revisando los presupuestos, autorizando pagos y gestionando las modificaciones presupuestarias necesarias.
- Gestión de riesgos: El interventor puede identificar y gestionar los riesgos asociados al proyecto, implementando medidas preventivas y correctivas para mitigarlos.
- Resolución de conflictos: En caso de surgir disputas o conflictos relacionados con el proyecto, el interventor puede desempeñar un papel en la resolución de estos, actuando como mediador o facilitador entre las partes involucradas.

5.4. Aspectos administrativos – contractuales de interventoría

En los aspectos administrativos el INTERVENTOR debe supervisar y controlar entre otros: el cronograma de ejecución y el desarrollo de las actividades programadas, las cantidades contratadas, los costos unitarios, alcance, y el cumplimiento de las condiciones y obligaciones contractuales de los trabajos objeto de la prestación del servicio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

5.4.1. Relación de documentos tramitados y plazos

El 12 de MAYO del 2025 se da inicio al plazo de ejecución de contrato de interventoría de obra pública.

PLAZO TOTAL	14 meses	Contrato No. 836 DE MARZO DE 2025		
ACTO	FECHA	TIEMPO		FECHA FINALIZACIÓN PROYECTADA
		ACUMULADO	QUEDAN	
Acta de Inicio	12/05/2025	426 días	407 días	12/07/2026

Tabla 19: Plazos del contrato y relación de documentos

5.5. Garantías del contrato de interventoría

El contrato de interventoría cuenta con pólizas que garantizan el cumplimiento del contrato, el pago adecuado de salarios y prestaciones y la estabilidad de la obra. Estas medidas aseguran la transparencia y calidad en la ejecución del proyecto, protegiendo los intereses de todas las partes involucradas.

Póliza de cumplimiento No. 11 – 44 – 101252615
Aseguradora: Seguros del estado
Nit: 860.009.578-6

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del Contrato	12/05/2025	12/11/2026	$120.472.496,50
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/05/2025	12/07/2029	$120.472.496,50
Calidad del servicio	12/07/2026	12/07/2031	$120.472.496,50

Tabla 20: Pólizas de cumplimiento de interventoría

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

6. DESARROLLO DE LA INTERVENTORÍA

6.1. Interventoría técnica

- Supervisión del diseño: El interventor técnico puede revisar y supervisar los planos, especificaciones y documentos técnicos relacionados con el diseño del proyecto para garantizar que cumplan con los estándares y requisitos establecidos.
- Control de calidad: El interventor técnico puede estar encargado de supervisar y asegurar la calidad de los materiales, equipos y trabajos ejecutados en el proyecto, verificando que cumplan con las especificaciones técnicas y normativas aplicables.
- Inspecciones y pruebas: El interventor técnico puede llevar a cabo inspecciones y pruebas periódicas durante la ejecución del proyecto para verificar el cumplimiento de los estándares técnicos y la correcta ejecución de los trabajos.
- Verificación de avance: El interventor técnico puede monitorear y verificar el avance de las obras o actividades técnicas del proyecto, asegurándose de que se cumplan los plazos establecidos y se realicen de acuerdo con los estándares técnicos requeridos.
- Evaluación de riesgos técnicos: El interventor técnico puede identificar y evaluar los riesgos técnicos asociados al proyecto, proponiendo medidas preventivas y correctivas para mitigarlos.
- Coordinación con contratistas y proveedores: El interventor técnico puede coordinar y colaborar estrechamente con los contratistas, proveedores y personal técnico involucrado en el proyecto, brindando orientación técnica, resolviendo consultas y asegurando el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos.
- Informes técnicos: El interventor técnico puede generar informes técnicos periódicos sobre el estado del proyecto, los avances, las desviaciones y las recomendaciones técnicas pertinentes.

Dentro del alcance del contrato de interventoría se tiene contemplado la ejecución de la INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

6.2. Actividades desarrolladas por la interventoría

La interventoría realiza las siguientes actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual:

- Supervisión del cumplimiento contractual: La interventoría se encarga de asegurar que todas las partes involucradas cumplan con los términos y condiciones establecidos en el contrato.
- Verificación del cumplimiento normativo: El interventor verifica que el proyecto cumpla con todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables, tanto en términos de diseño como de ejecución.
- Control de calidad: La interventoría se encarga de supervisar y controlar la calidad de los materiales, equipos y trabajos ejecutados en el proyecto, asegurando que se cumplan los estándares y especificaciones establecidos.
- Control de costos y presupuesto: La interventoría monitorea y controla los costos del proyecto, revisando los presupuestos, autorizando pagos y gestionando cualquier modificación presupuestaria necesaria.
- Programación y seguimiento: La interventoría se encarga de programar y hacer un seguimiento del avance del proyecto, asegurándose de que se cumplan los plazos establecidos y tomando las medidas necesarias para corregir desviaciones.
- Gestión de riesgos: La interventoría identifica y gestiona los riesgos asociados al proyecto, implementando medidas preventivas y correctivas para mitigarlos.
- Coordinación y comunicación: La interventoría se encarga de coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados en el proyecto, como contratistas, proveedores y personal interno de la organización. También mantiene una comunicación fluida con todas las partes interesadas, informando sobre el avance del proyecto y cualquier problema o desviación relevante.
- Generación de informes: La interventoría elabora informes periódicos sobre el avance del proyecto, incluyendo aspectos como el cumplimiento de objetivos, desviaciones, riesgos identificados y recomendaciones.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

6.3. Interventoría ambiental y salud ocupacional

La interventoría supervisa y controla los aspectos relacionados con el medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional en un proyecto. Estas son algunas actividades comunes que se desarrollan en la interventoría ambiental y de salud ocupacional: La interventoría vigila, exige y vela por el cumplimiento del Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del personal que viene utilizando el contratista, aportes al día, que constituyen requisito indispensable para que pueda proceder al pago alguno al contratista; e igual para el ejercicio de la Interventoría a cargo.

- Cumplimiento normativo: La interventoría se encarga de verificar el cumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas ambientales y de salud ocupacional aplicables al proyecto.
- Evaluación de impacto ambiental: La interventoría ambiental evalúa el impacto que el proyecto puede tener en el medio ambiente, identificando medidas preventivas y correctivas para minimizar dicho impacto.
- Control de emisiones y residuos: La interventoría se asegura de que se implementen adecuadas prácticas de manejo de emisiones y residuos, supervisando que se cumplan los estándares y regulaciones ambientales correspondientes.
- Monitoreo de calidad del aire, agua y suelos: La interventoría lleva a cabo monitoreos periódicos para evaluar la calidad del aire, agua y suelos, verificando que se mantengan dentro de los límites establecidos y tomando medidas correctivas si es necesario.
- Evaluación de riesgos ocupacionales: La interventoría de salud ocupacional identifica y evalúa los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores en el proyecto, proponiendo medidas preventivas y de control para minimizar dichos riesgos.
- Implementación de programas de seguridad y salud ocupacional: La interventoría se encarga de supervisar la implementación y cumplimiento de programas de seguridad y salud ocupacional, asegurando que se tomen las medidas necesarias para prevenir accidentes y enfermedades laborales.
- Capacitación y formación: La interventoría facilita capacitaciones y formación en temas ambientales y de salud ocupacional para los trabajadores, con el objetivo de mejorar su conocimiento y conciencia sobre estos aspectos.
- Inspecciones y auditorías: La interventoría realiza inspecciones y auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales y de salud ocupacional, identificando oportunidades de mejora y recomendando acciones correctivas.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

- Informes y comunicación: La interventoría genera informes periódicos sobre el desempeño ambiental y de salud ocupacional del proyecto, comunicando a las partes interesadas sobre los resultados y proponiendo acciones de mejora.

De manera permanente se verifica el estado y uso adecuado de los elementos de protección personal de acuerdo con la clasificación del riesgo y actividad realizada por los trabajadores en obra.

6.4. Interventoría jurídica

Se realizó la suscripción de pólizas del contrato de acuerdo con las fechas del acta de inicio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

6.5. Aspectos técnicos

ASPECTOS TÉCNICOS	
Gestión General	La interventoría controló y supervisó el cumplimiento de las obligaciones contractuales de orden Técnico, requeridas para el adecuado desarrollo del contrato de obra e Interventoría. Las actividades encaminadas para este fin se resumen a continuación
Contrato No. CMA-SI-002 - 2022	• Seguimiento de obra - bitácora de obra. • Revisión de los planos y diseños. • Revisión del presupuesto de obras y balance del contrato. • Control de calidad sobre los materiales y actividades a ejecutar. • Revisión y solicitud de las certificaciones de materiales previstos utilizar por el Contratista. • Verificación del personal y equipos del Contratista. • Verificación de dotación del personal que garantice la seguridad industrial
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	
Gestión General	La Interventoría controló y supervisó el cumplimiento de las obligaciones contractuales de orden Administrativo, requeridas para el adecuado desarrollo del contrato de obra e Interventoría. Las actividades encaminadas para este fin se resumen a continuación:
Contrato No. 836 DE MARZO DE 2025.	• Comunicaciones al Contratista de obra. • Ejecución del informe mensual • Coordinación de las reuniones de comités de obra y elaboración de las correspondientes actas. • Verificación de la vigencia de las pólizas que amparan el contrato. • Verificación de afiliación a la seguridad social de los trabajadores de la obra. • Seguimiento para la elaboración de actas. • Trámites para el desembolso de los recursos del contrato.
ASPECTOS FINANCIEROS	
Gestión General	La interventoría controló y supervisó el cumplimiento de las obligaciones contractuales de orden Financiero, requeridas para el adecuado desarrollo del contrato de obra e Interventoría.

Tabla 21: Aspectos técnicos, administrativos y financieros de interventoría

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

6.6. Personal de interventoría

A continuación, se detalla el Personal empleado por la interventoría en el presente mes para los trabajos de "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

NOMBRE	CARGO	PROFESIÓN
WILDER QUESADA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	INGENIERO CIVIL
KLISMAN ATENCIO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERO CIVIL

Tabla 22: Personal de interventoría

6.7. Equipos de interventoría

Para la ejecución del contrato No. 836 DE MARZO DE 2025, la Interventoría utiliza los siguientes Equipos:

- Oficina
- Equipo de Computación (Portátil)
- Equipo de Comunicaciones
- Elementos de Oficina
- Vehículos de desplazamiento

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

6.8. Estado financiero del contrato de interventoría

INFORME FINANIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA				
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA			$1.204.724.965,00	100%
ANTICIPO			$0	
CONCEPTO	**VALOR FACTURADO**	**%**	**VALOR NETO RECIBIDO**	**%**
ACTA 1	**$0**	**0%**	**$0**	**0%**
TOTAL	**$1.204.724.965,00**	**100%**	**$1.204.724.965,00**	**100%**

Tabla 23: Informe financiero contrato interventoría

7. OBSERVACIONES

Podemos observar que durante el presente mes de junio se ejecutó una cantidad de obra equivalente 1.11% de la obra con un porcentaje acumulado de 3.09 %. Las cuales al compararse con las cantidades programadas que equivalen a un 1.77% mensual y un 2.76% acumulado se puede observar que vamos de acuerdo con dicha programación y con los tiempos establecidos.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

8. REGISTRO FOTOGRAFICO



Ilustración 2: Vaciado de concreto para zapatas de muro de cerramiento. 03 de junio.



Ilustración 3: Relleno con material seleccionado y colocación de capa de solado sobre fondos de zapatas Módulo 2. 03 de junio.

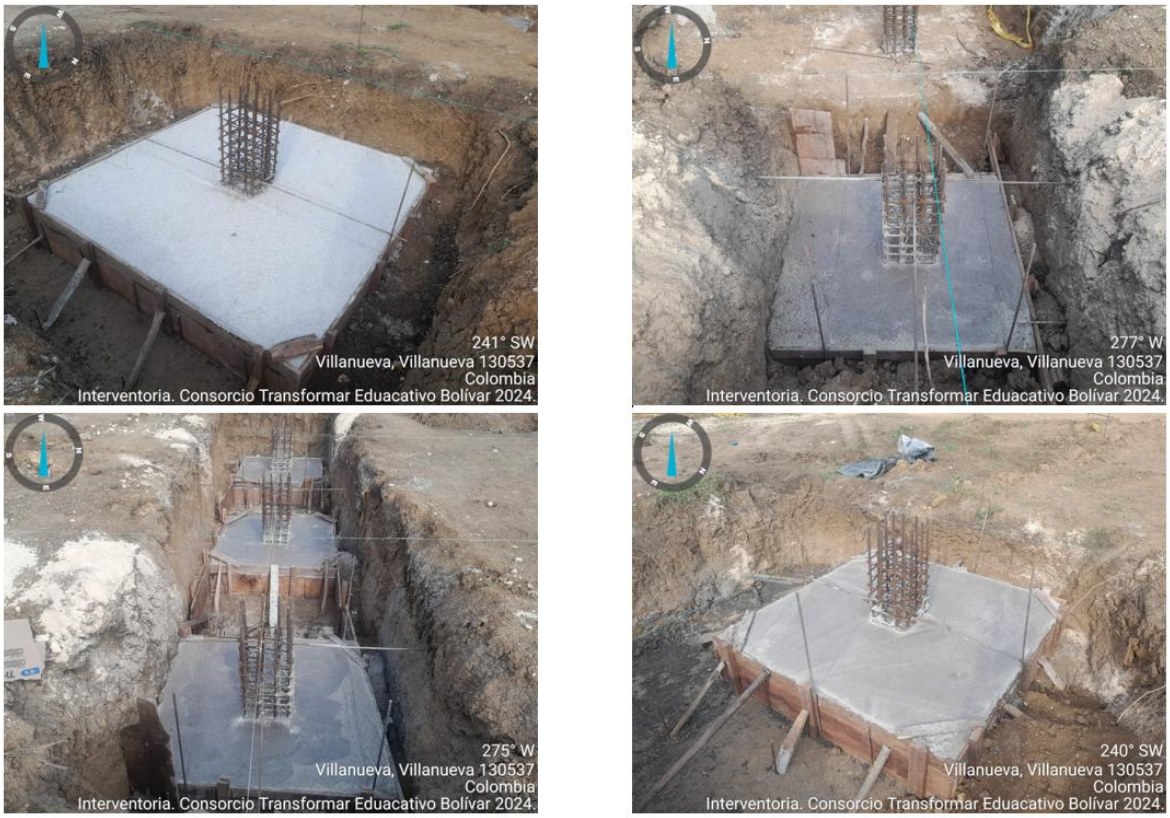


Ilustración 4: Vaciado de concreto para Zapatas de Módulo 1. 04 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 5: Momento HSEQ.05 de junio.

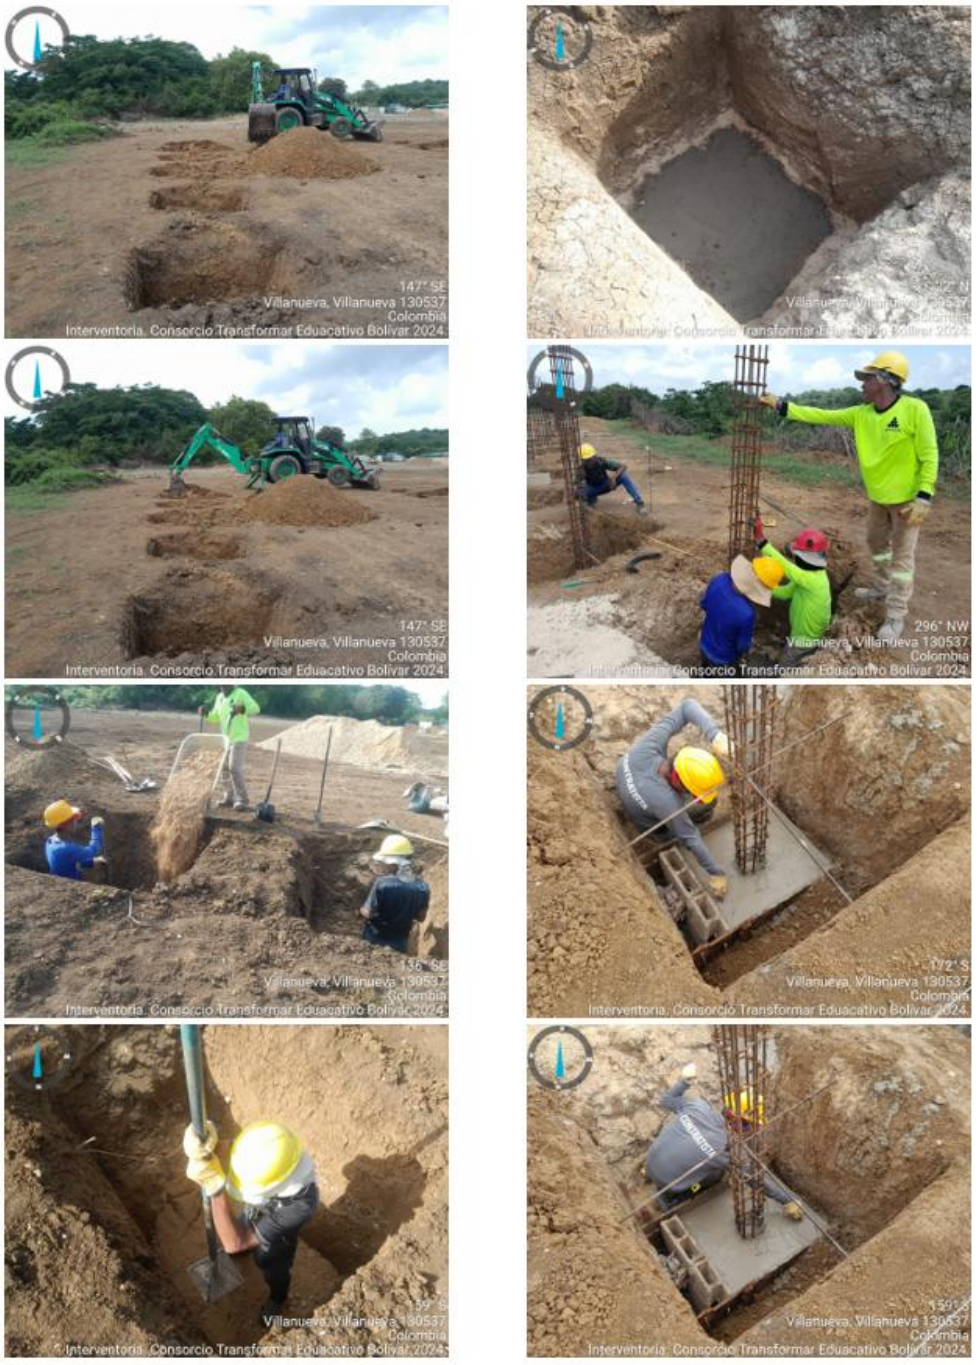


Ilustración 6: Excavación, relleno, solado, instalación de acero y vaciado de concreto para zapatas de muro de cerramiento.05 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 7: Definición de niveles, relleno y compactación, y solado para fondos de zapata Módulo 6. 06 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 8: Momento HSEQ .07 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 9: Instalación de acero y encofrado, vaciado con concreto zapatas de módulo 6 y toma de muestras M-4.07 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 10: Excavación, relleno y compactación, y solado para fondos de zapata Módulo 6.09 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 11: Corte, figurado y armado de acero de refuerzo para elementos de cimentación tipo Zapatas y pedestales. 10 de junio.



Ilustración 12: Registro de fuerte lluvia desde las 12:30 hasta las 13:30. 10 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 13: Definición de niveles, excavación y relleno de fondos de zapata de Módulo 6. 12 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 14: Registro de fuerte lluvia desde las 13:20 hasta las 14:40. 12 de junio.



Ilustración 15: Vaciado de concreto de 4000 psi para zapatas de módulo 6 y toma de muestras M-6. 14 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 16: Vaciado de concreto de 4000 psi para zapatas de módulo 2 y toma de muestras M-7. 19 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 17: Levante de muro de cerramiento. 20 de junio.



Ilustración 18: Definición de niveles, relleno y compactación, y solado sobre fondos de zapata de módulo 2. 20 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 19: Vaciado de concreto de 4000 psi para zapatas de módulo 2 y módulo 6 y toma de muestras M-8. 21 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 20:Momento HSEQ. 24 de junio.



Ilustración 21:Momento HSEQ. 25 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 22: Registro de fuerte lluvia desde las 15:00 hasta las 15:30. 26 de junio.



Ilustración 23: Reunión con la Veeduría. 27 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

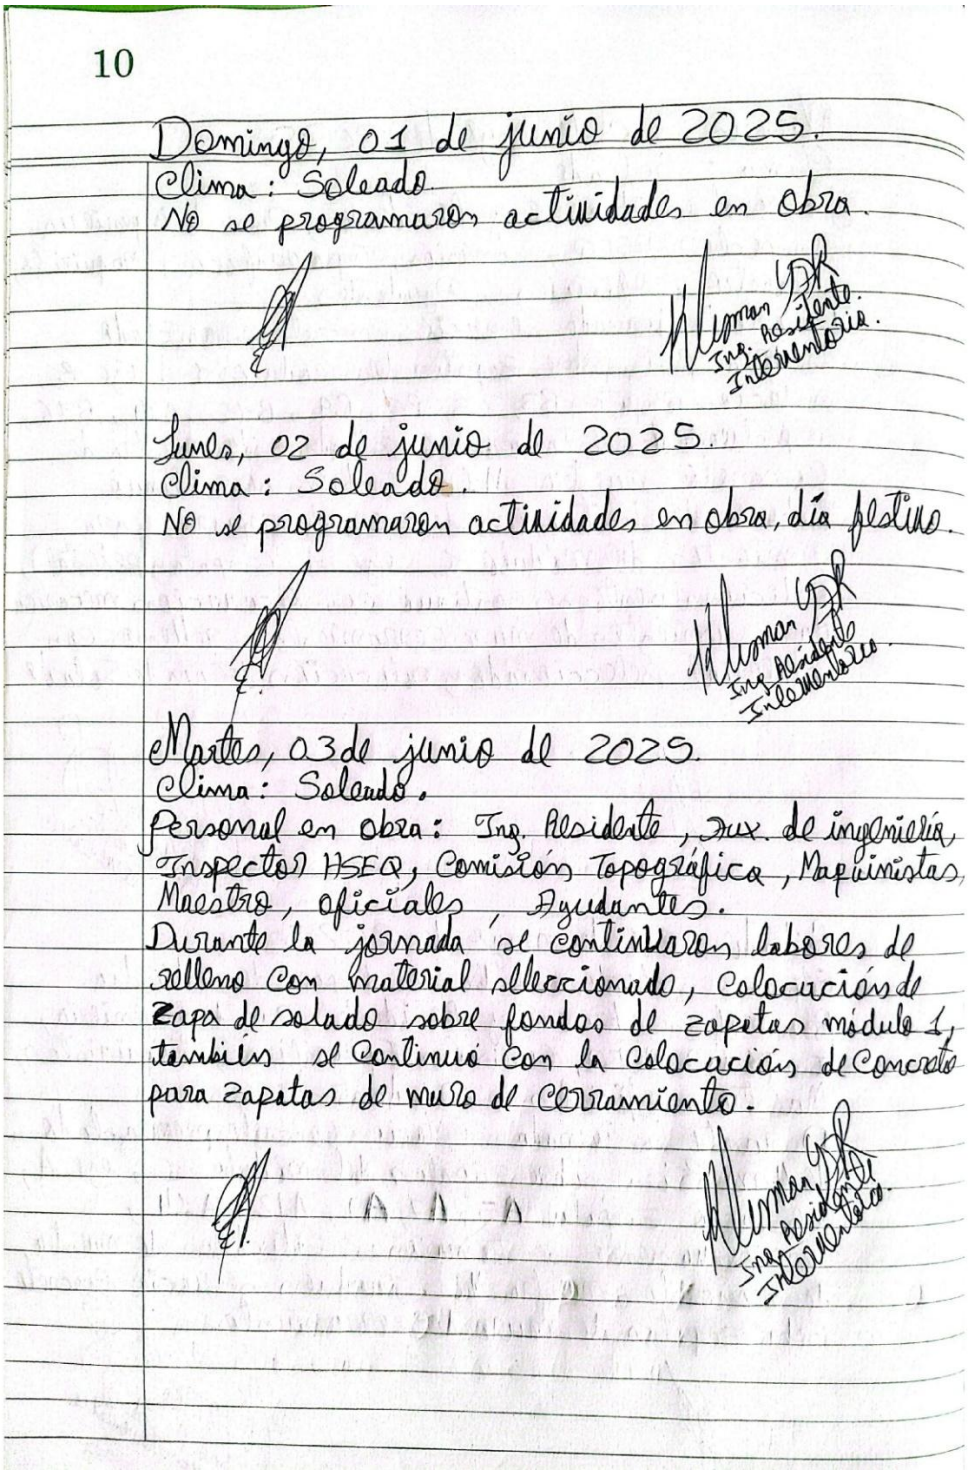


Ilustración 24: vaciado de pedestales, solado de limpieza y vaciado de viga de arrastre, vaciado de columnas y levante de muro de cerramiento. 27 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

9. BITÁCORA DE OBRA MES DE JUNIO 2025.



10

Domingo, 01 de junio de 2025.
Clima: Soleado
No se programaron actividades en obra.

Ing. Residente Interventoría.

Lunes, 02 de junio de 2025.
Clima: Soleado.
No se programaron actividades en obra, día festivo.

Ing. Residente Interventoría.

Martes, 03 de junio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron labores de relleno con material seleccionado, Colocación de capa de solado sobre fondos de zapatas módulo 1, también se continuó con la colocación de Concreto para zapatas de muro de cerramiento.

Ing. Residente Interventoría.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com


11

Miércoles, 04 de junio de 2025.
Clima: Soleado, Chubascos.
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron labores de vaciado de concreto premezclado de 4000 PSI para zapatas de módulo 1, eje A y eje B; se vaciaron las zapatas A1, A2, A16, A'16, A'16', A'17, B1 y B16', adicionalmente se continuó con la construcción del muro de cerramiento, se vaciaron 3 zapatas.

Ing. Residente
Interventoría

Jueves, 05 de junio de 2025.
Clima: Nublado, Chubascos.
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron labores de movimiento de tierra, se realizó excavación mecánica para cimiento de módulo 2, módulo 6 y muro de cerramiento, posteriormente se continuó con el relleno con material seleccionado y colocación de capa de solado, se continuó también con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo (zapatas y pedestales). Se recibió visita de obra por parte de supervisor de la gobernación de Bolívar, se realizó recorrido en obra y se revisó la programación de obra evidenciando un normal desarrollo de actividades.

Residente

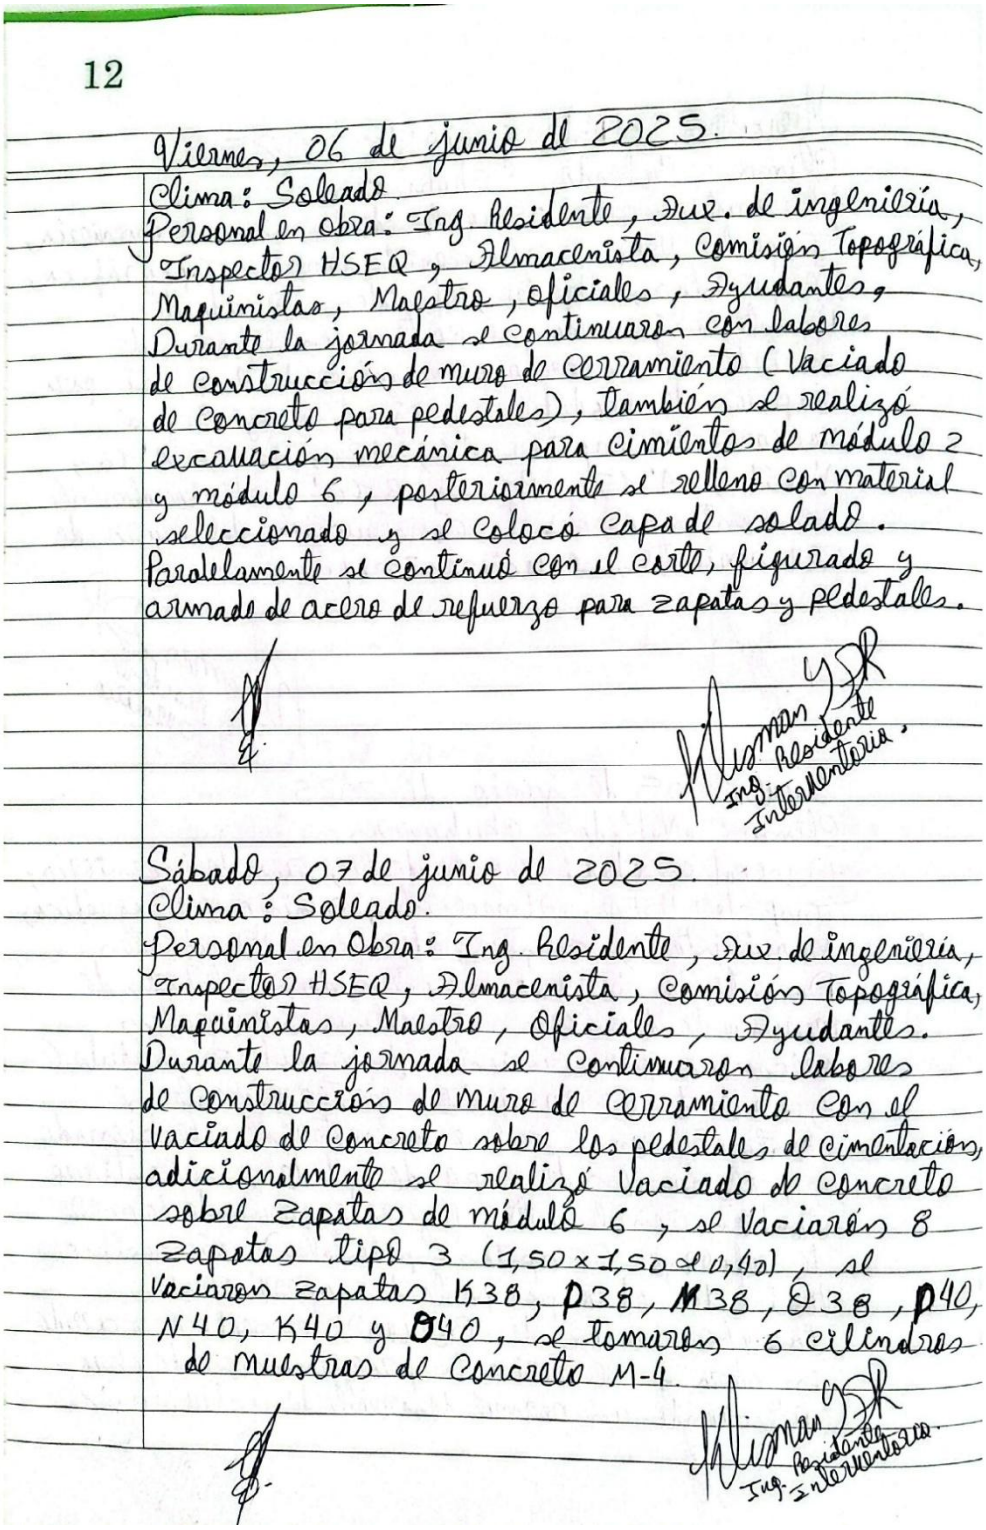

12

Viernes, 06 de junio de 2025.
Clima: Soleado
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron con labores de construcción de muro de cerramiento (Vaciado de concreto para pedestales), también se realizó excavación mecánica para cimientos de módulo 2 y módulo 6, posteriormente se relleno con material seleccionado y se colocó capa de solado. Paralelamente se continuó con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo para zapatas y pedestales.


Ing. Residente Interventoría.

Sábado, 07 de junio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron labores de construcción de muro de cerramiento con el vaciado de concreto sobre los pedestales de cimentación, adicionalmente se realizó vaciado de concreto sobre zapatas de módulo 6, se vaciaron 8 zapatas tipo 3 (1,50 x 1,50 x 0,40), se vaciaron zapatas K38, P38, M38, O38, P40, N40, K40 y O40, se tomaron 6 cilindros de muestras de concreto M-4.

Ing. Residente Interventoría.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

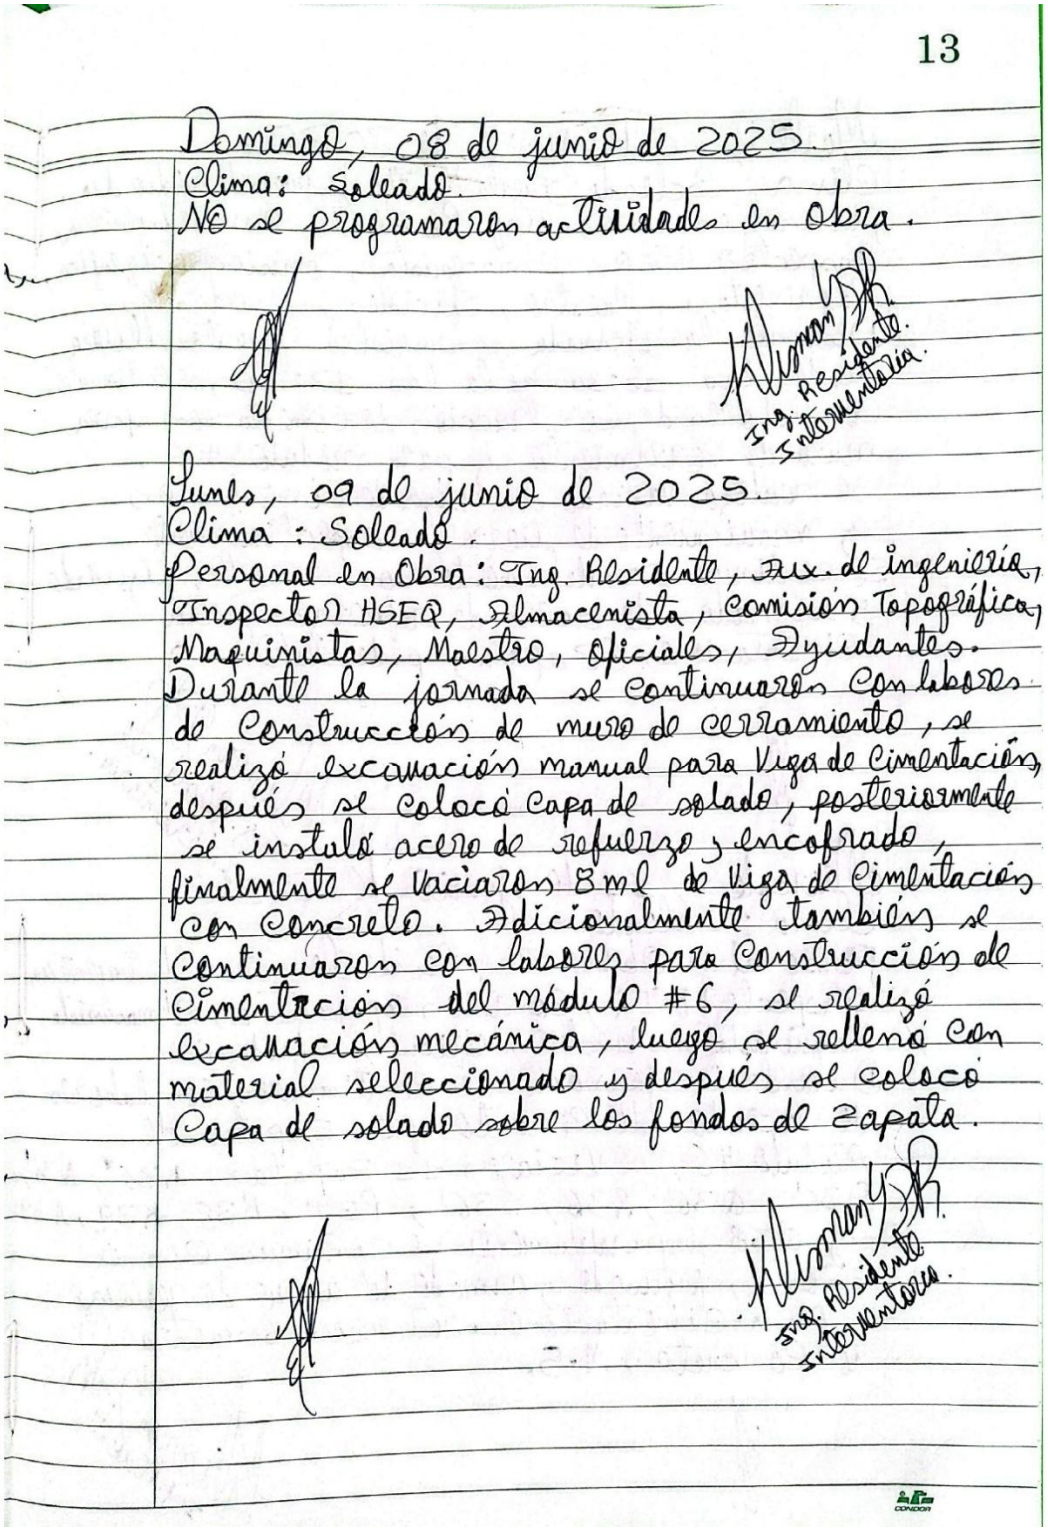

13

Domingo, 08 de junio de 2025.
Clima: Soleado.
No se programaron actividades en obra.


Ing. Residente Interventoría.

Lunes, 09 de junio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron con labores de Construcción de muro de cerramiento, se realizó excavación manual para Viga de Cimentación, después se colocó Capa de solado, posteriormente se instaló acero de refuerzo y encofrado, finalmente se vaciaron 8 ml de Viga de Cimentación con Concreto. Adicionalmente también se continuaron con labores para Construcción de Cimentación del módulo #6, se realizó excavación mecánica, luego se rellenó con material seleccionado y después se colocó Capa de solado sobre los fondos de zapata.

Ing. Residente Interventoría.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

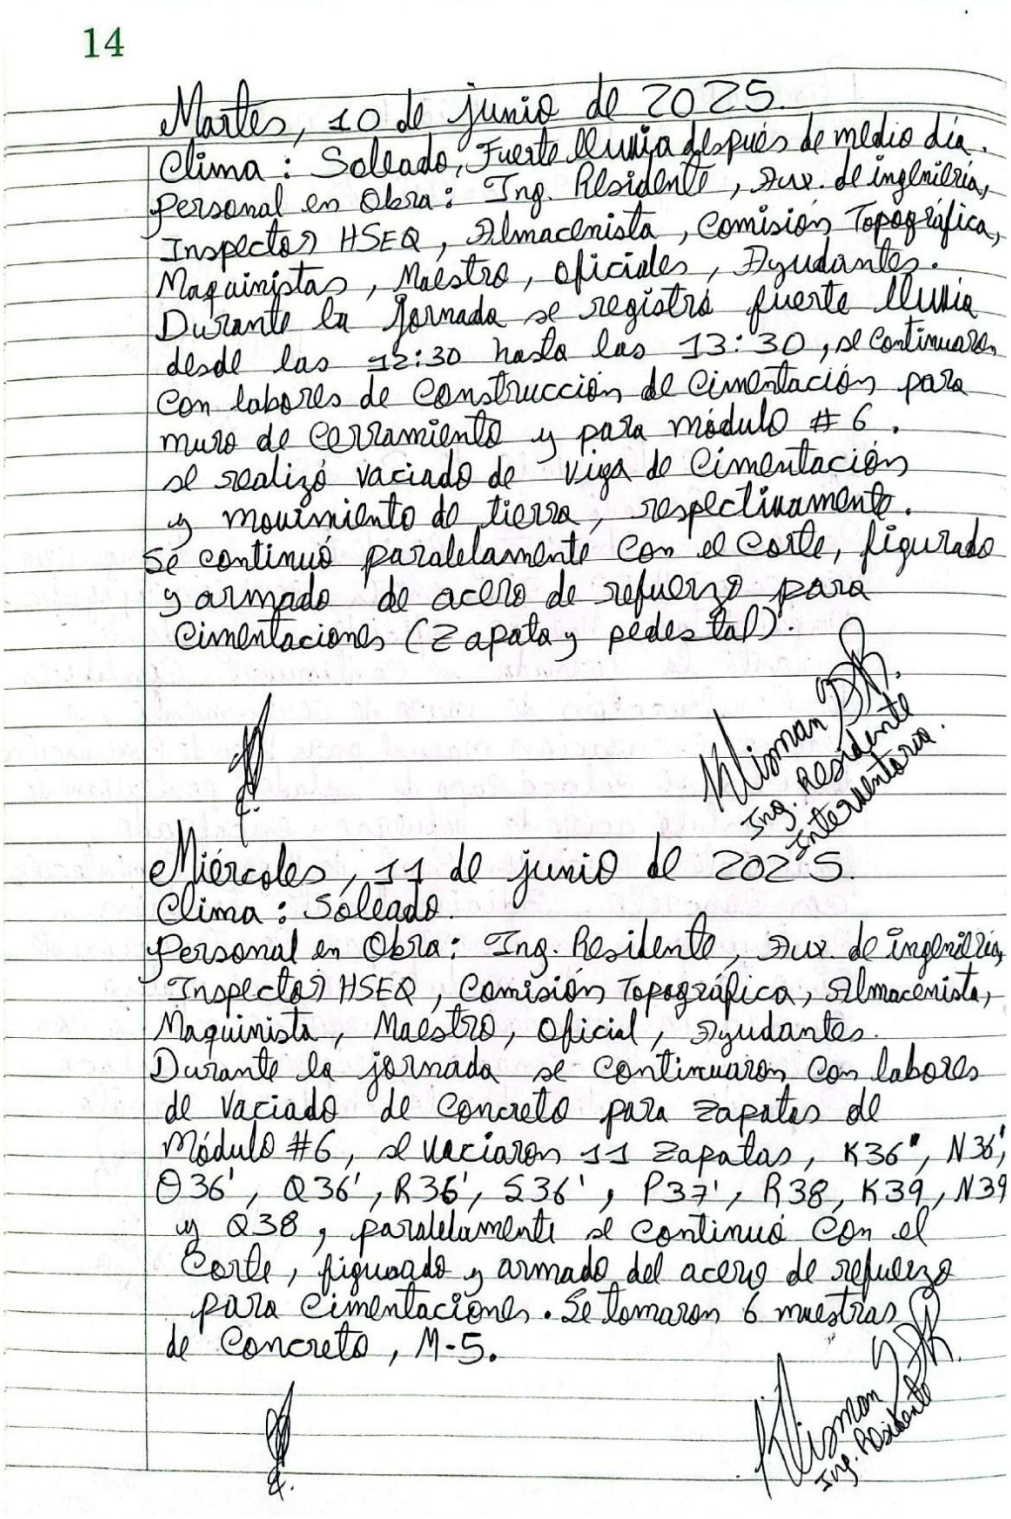

14

Martes, 10 de junio de 2025.
Clima: Soleado, Fuerte lluvia después de medio día.
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se registró fuerte lluvia desde las 12:30 hasta las 13:30, se continuaron con labores de construcción de cimentación para muro de cerramiento y para módulo #6.
se realizó vaciado de viga de cimentación y movimiento de tierra, respectivamente.
Se continuó paralelamente con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo para cimentaciones (Zapata y pedestal).


Ing. Residente Interventoría.

Miércoles, 11 de junio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Comisión Topográfica, Almacenista, Maquinista, Maestro, Oficial, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron con labores de vaciado de concreto para zapatas del Módulo #6, se vaciaron 11 zapatas, K36", N36', O36', Q36', R36', S36', P37', R38, K39, N39 y Q38, paralelamente se continuó con el corte, figurado y armado del acero de refuerzo para cimentaciones. Se tomaron 6 muestras de concreto, M-5.

Ing. Residente

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

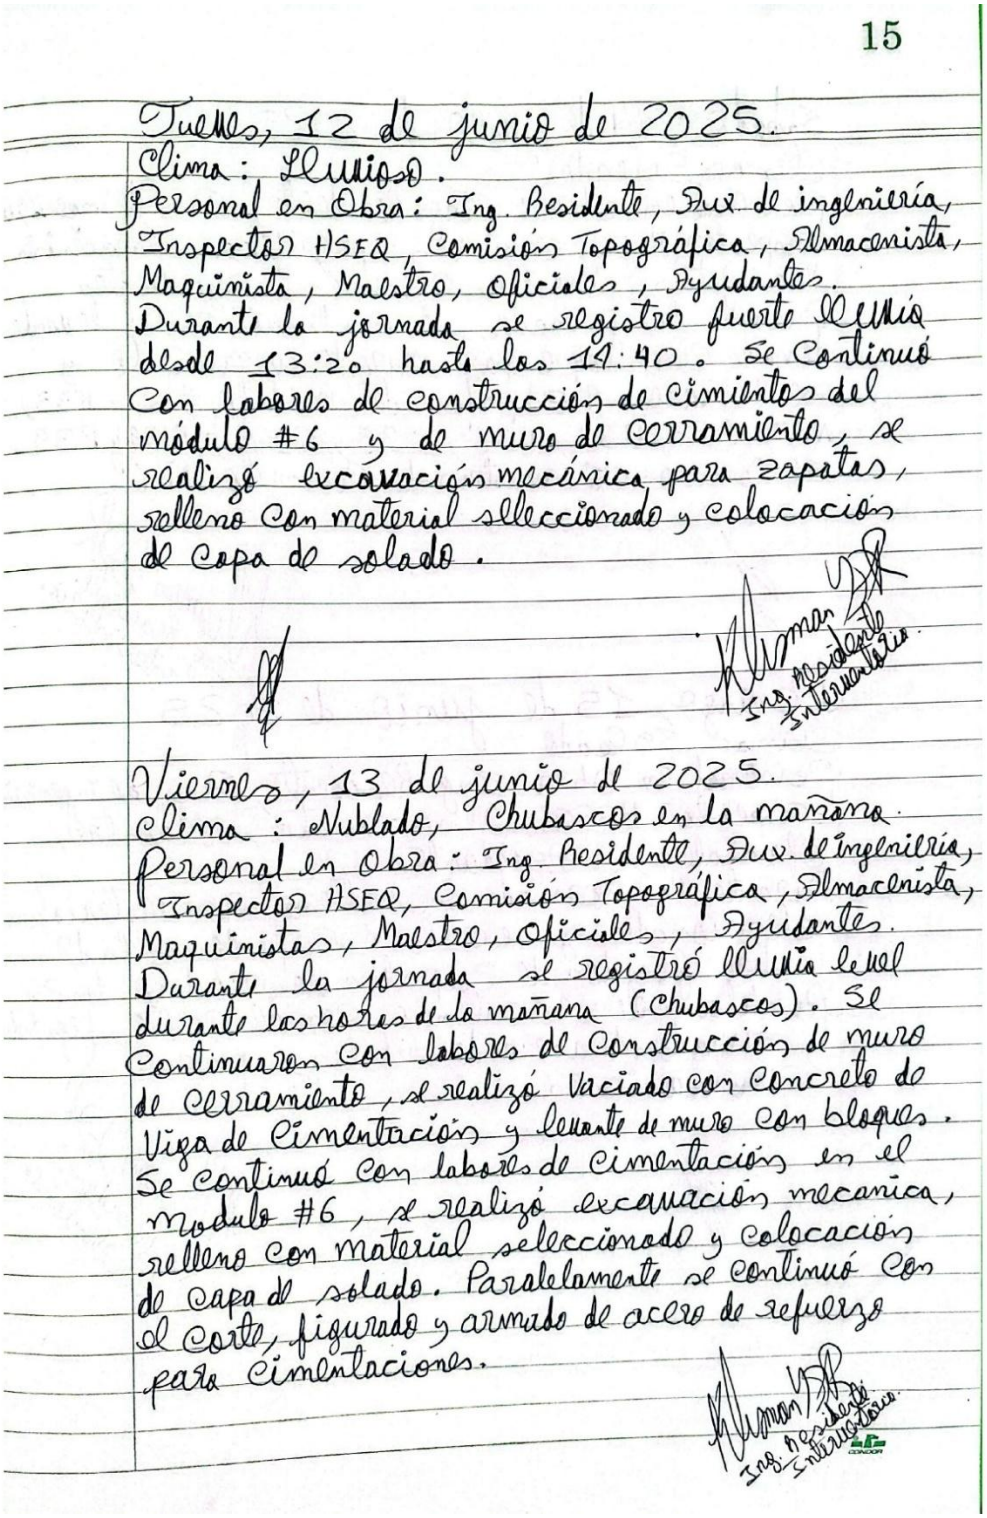

15

Tuchín, 12 de junio de 2025.
Clima: Lluvioso.
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux de ingeniería, Inspector HSEQ, Comisión Topográfica, Almacenista, Maquinista, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se registro fuerte lluvia desde 13:20 hasta las 14:40. Se continuó con labores de construcción de cimientos del módulo #6 y de muro de cerramiento, se realizó excavación mecánica para zapatas, relleno con material seleccionado y colocación de capa de solado.


Ing. Residente Interventoría

Viernes, 13 de junio de 2025.
Clima: Nublado, Chubascos en la mañana.
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux. de Ingeniería, Inspector HSEQ, Comisión Topográfica, Almacenista, Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se registró lluvia leve durante las horas de la mañana (Chubascos). Se Continuaron con labores de construcción de muro de cerramiento, se realizó Vaciado con Concreto de Viga de Cimentación y levante de muro con bloques. Se continuó con labores de cimentación en el modulo #6, se realizó excavación mecanica, relleno con material seleccionado y colocación de capa de solado. Paralelamente se continuó con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo para cimentaciones.

Ing. Residente Interventoría

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

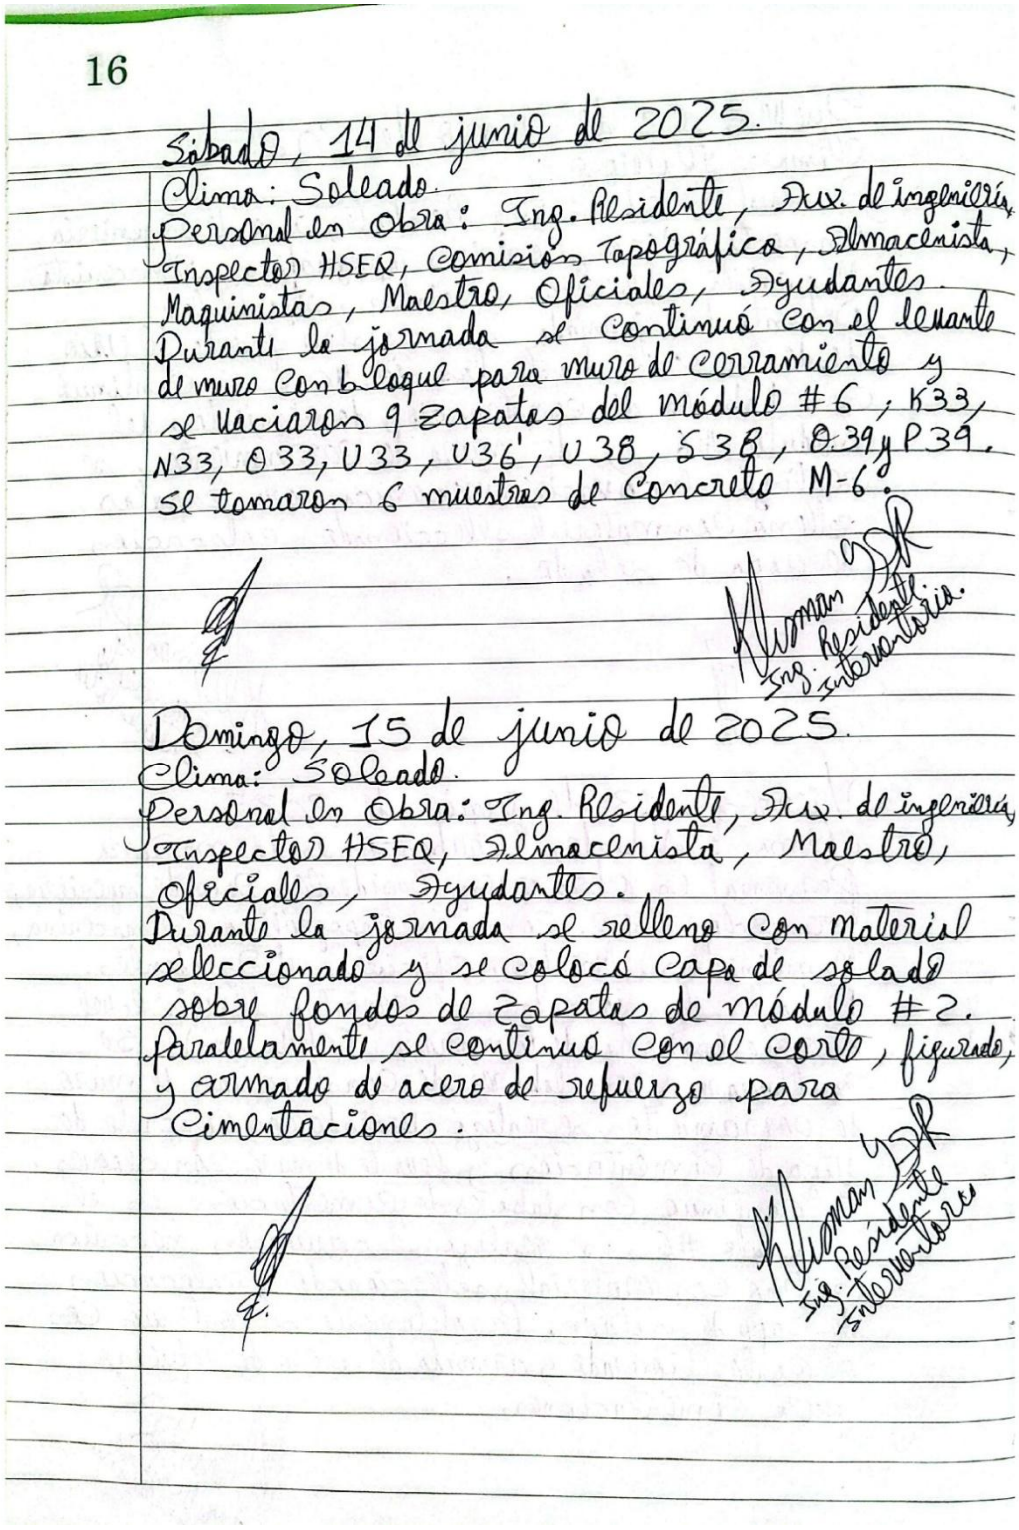

16

Sábado, 14 de junio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Comisión Topográfica, Almacenista, Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuó con el levante de muro con bloque para muro de cerramiento y se vaciaron 9 zapatas del módulo #6 ; K33, N33, O33, U33, U36, U38, S38, O39 y P39.
Se tomaron 6 muestras de Concreto M-6.


Ing. Residente Interventoría.

Domingo, 15 de junio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se relleno con material seleccionado y se colocó capa de solado sobre fondos de zapatas de módulo #2.
Paralelamente se continuo con el corte, figurado, y armado de acero de refuerzo para Cimentaciones.

Ing. Residente Interventoría.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

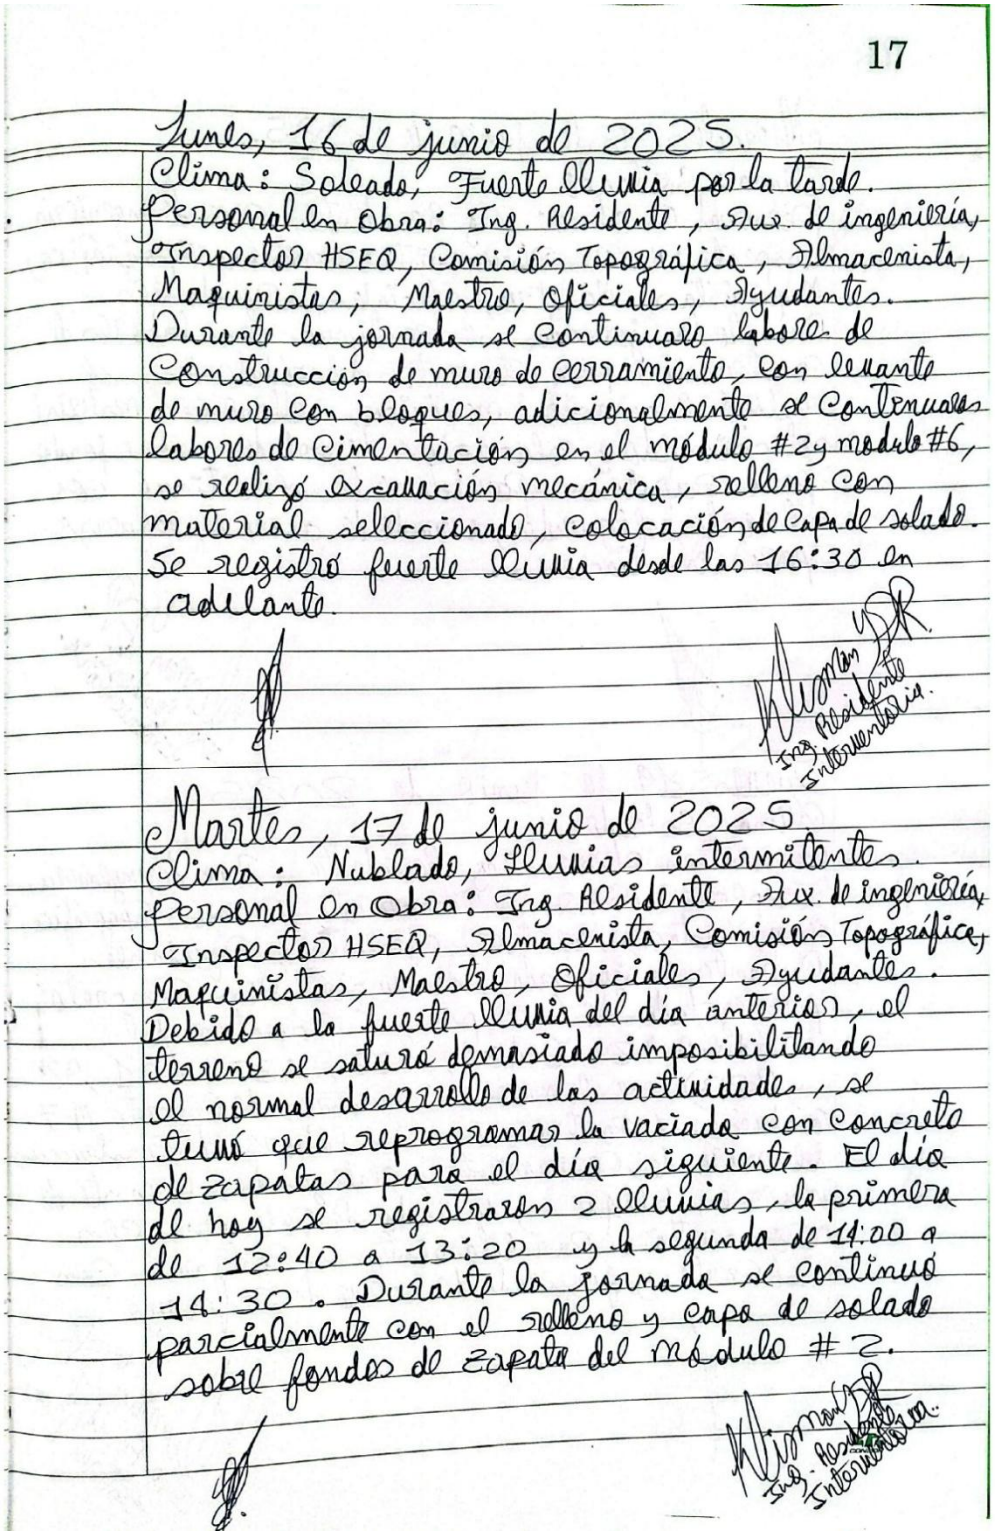

17

Lunes, 16 de junio de 2025.
Clima: Soleado, Fuerte lluvia por la tarde.
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Comisión Topográfica, Almacenista, Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron labores de Construcción de muro de cerramiento, con levante de muro con bloques, adicionalmente se continuaron labores de cimentación en el módulo #2 y modulo #6, se realizó excavación mecánica, relleno con material seleccionado, colocación de capa de solado.
Se registro fuerte lluvia desde las 16:30 en adelante.


Ing. Residente Interventoría.

Martes, 17 de junio de 2025
Clima: Nublado, lluvias intermitentes.
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Debido a la fuerte lluvia del día anterior, el terreno se saturó demasiado imposibilitando el normal desarrollo de las actividades, se tuvo que reprogramar la vaciada con concreto de zapatas para el día siguiente. El día de hoy se registraron 2 lluvias, la primera de 12:40 a 13:20 y la segunda de 14:00 a 14:30. Durante la jornada se continuó parcialmente con el relleno y capa de solado sobre fondos de zapata del módulo # 2.

Ing. Residente Interventoría.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

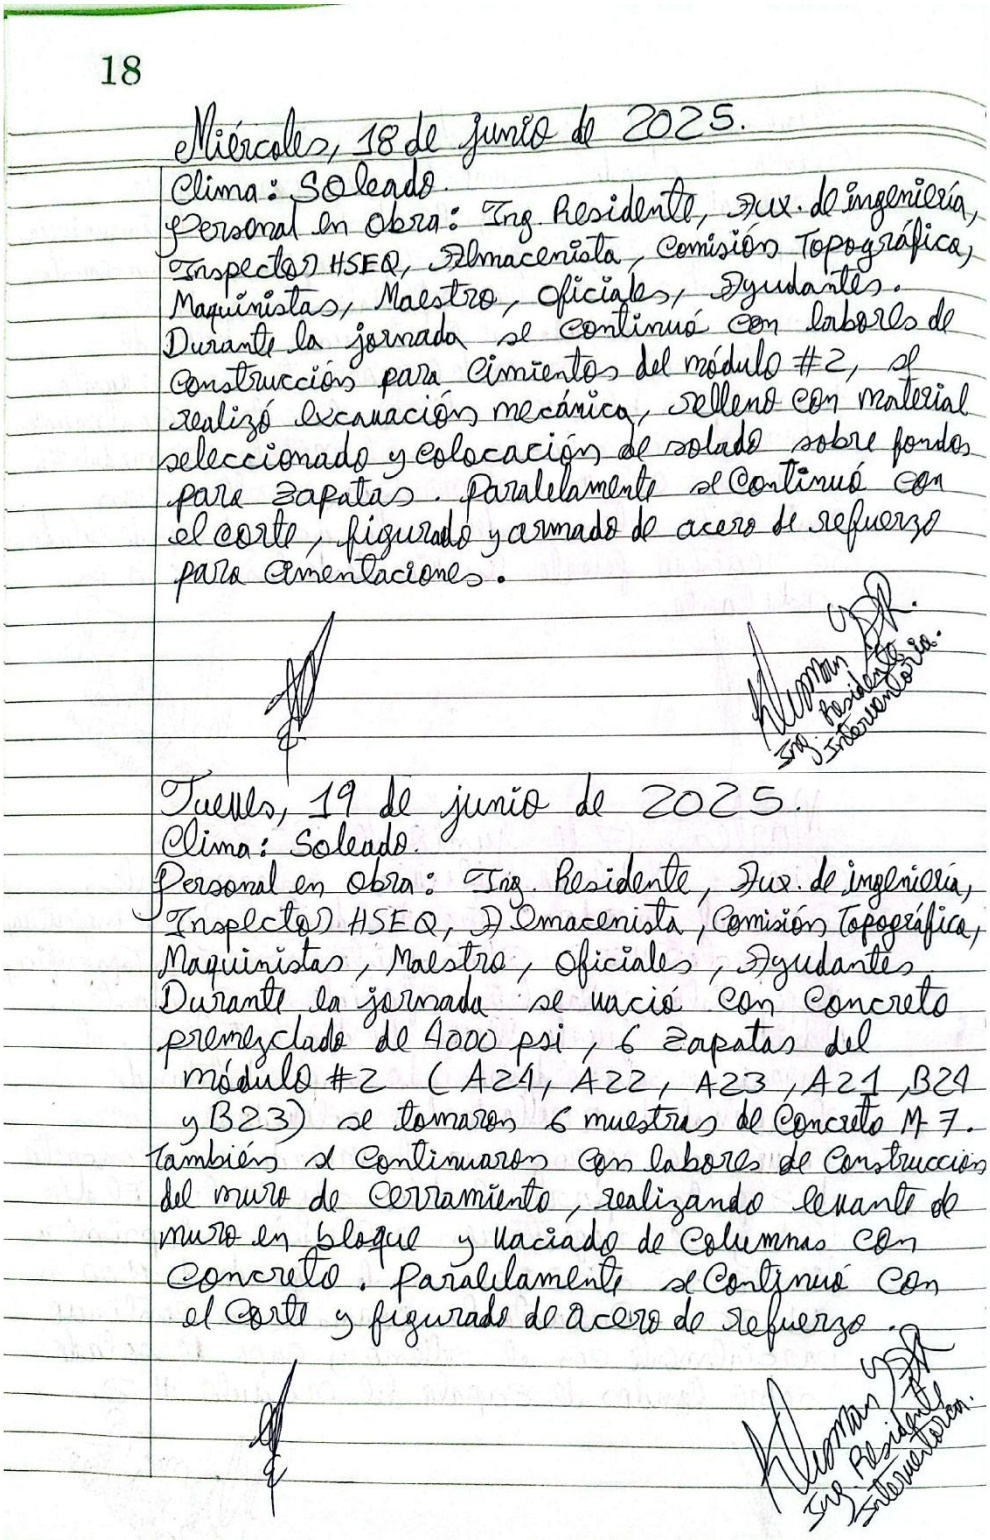

18

Miércoles, 18 de junio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuó con labores de Construcción para Cimientos del módulo #2, se realizó excavación mecánica, relleno con material seleccionado y colocación de solado sobre fondos para zapatas. Paralelamente se continuó con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo para cimentaciones.


Ing. Residente Interventoría.

Jueves, 19 de junio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se vació con concreto premezclado de 4000 psi, 6 zapatas del módulo #2 (A24, A22, A23, A21, B24 y B23) se tomaron 6 muestras de Concreto M-7. También se continuaron con labores de Construcción del muro de cerramiento, realizando levante de muro en bloque y vaciado de columnas con concreto. Paralelamente se continuó con el corte y figurado de acero de refuerzo.

Ing. Residente Interventoría.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

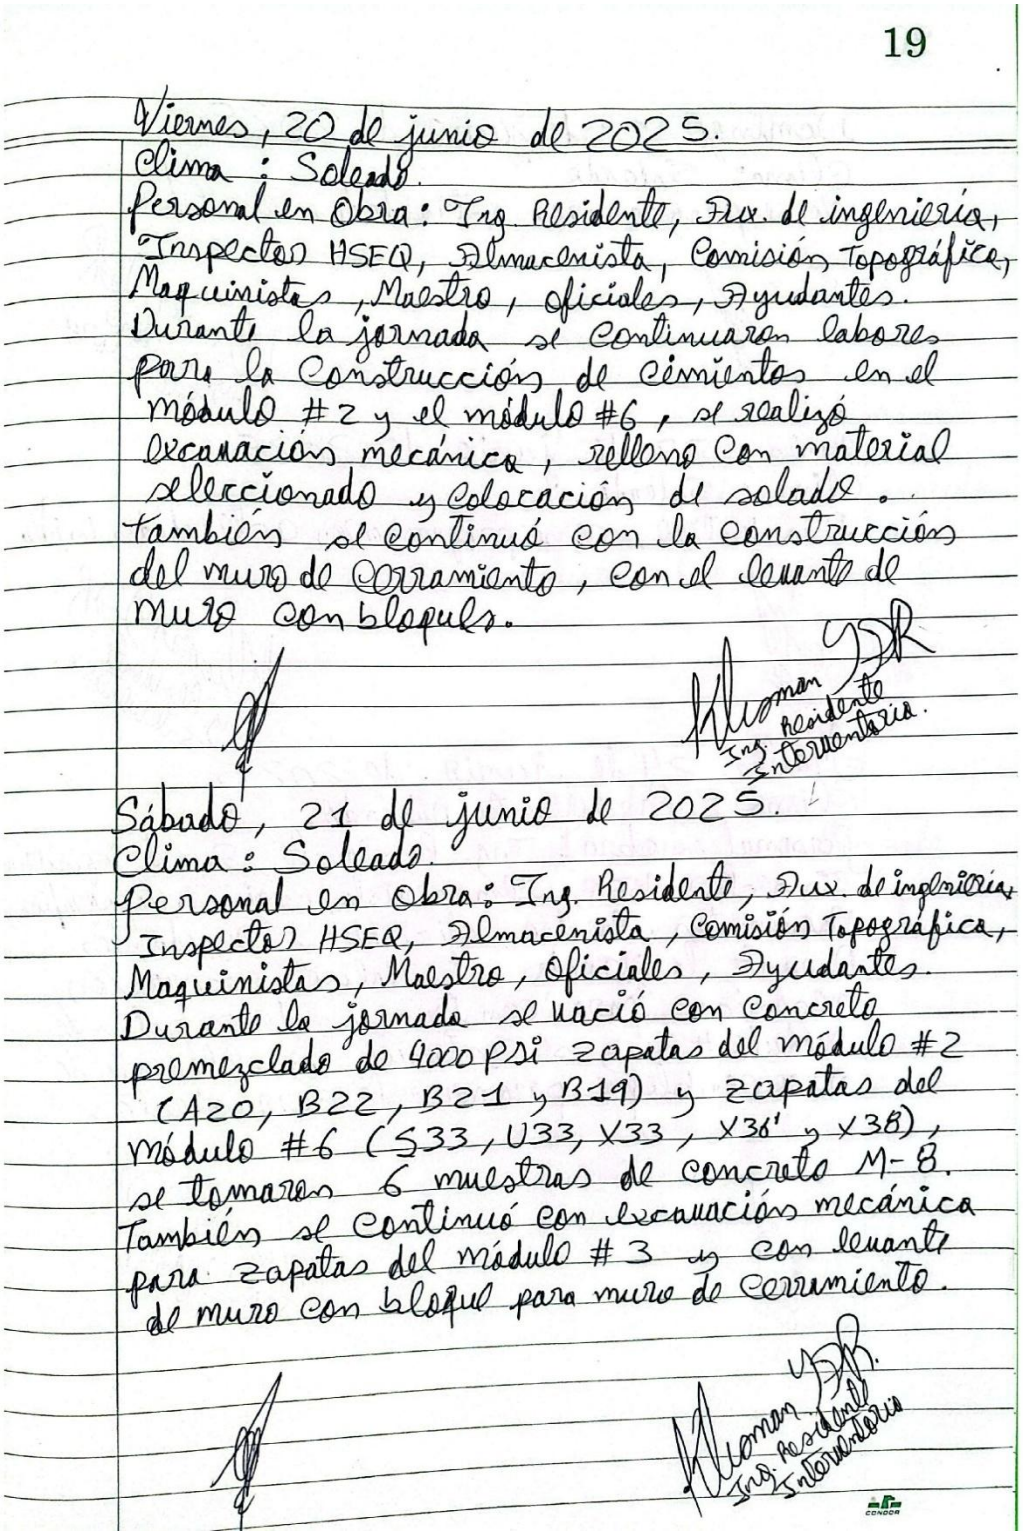

19

Viernes, 20 de junio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron labores para la Construcción de cimientos en el módulo #2 y el módulo #6, se realizó excavación mecánica, relleno con material seleccionado y colocación de solado. También se continuó con la construcción del muro de cerramiento, con el levante de muro con bloques.


Ing. Residente
Interventoría.

Sábado, 21 de junio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se hacio con concreto premezclado de 4000 psi zapatas del módulo #2 (A20, B22, B21 y B19) y zapatas del módulo #6 (S33, U33, X33, X36' y X38), se tomaron 6 muestras de concreto M-8. También se continuó con excavación mecánica para zapatas del módulo #3 y con levante de muro con bloque para muro de cerramiento.

Ing. Residente
Interventoría

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

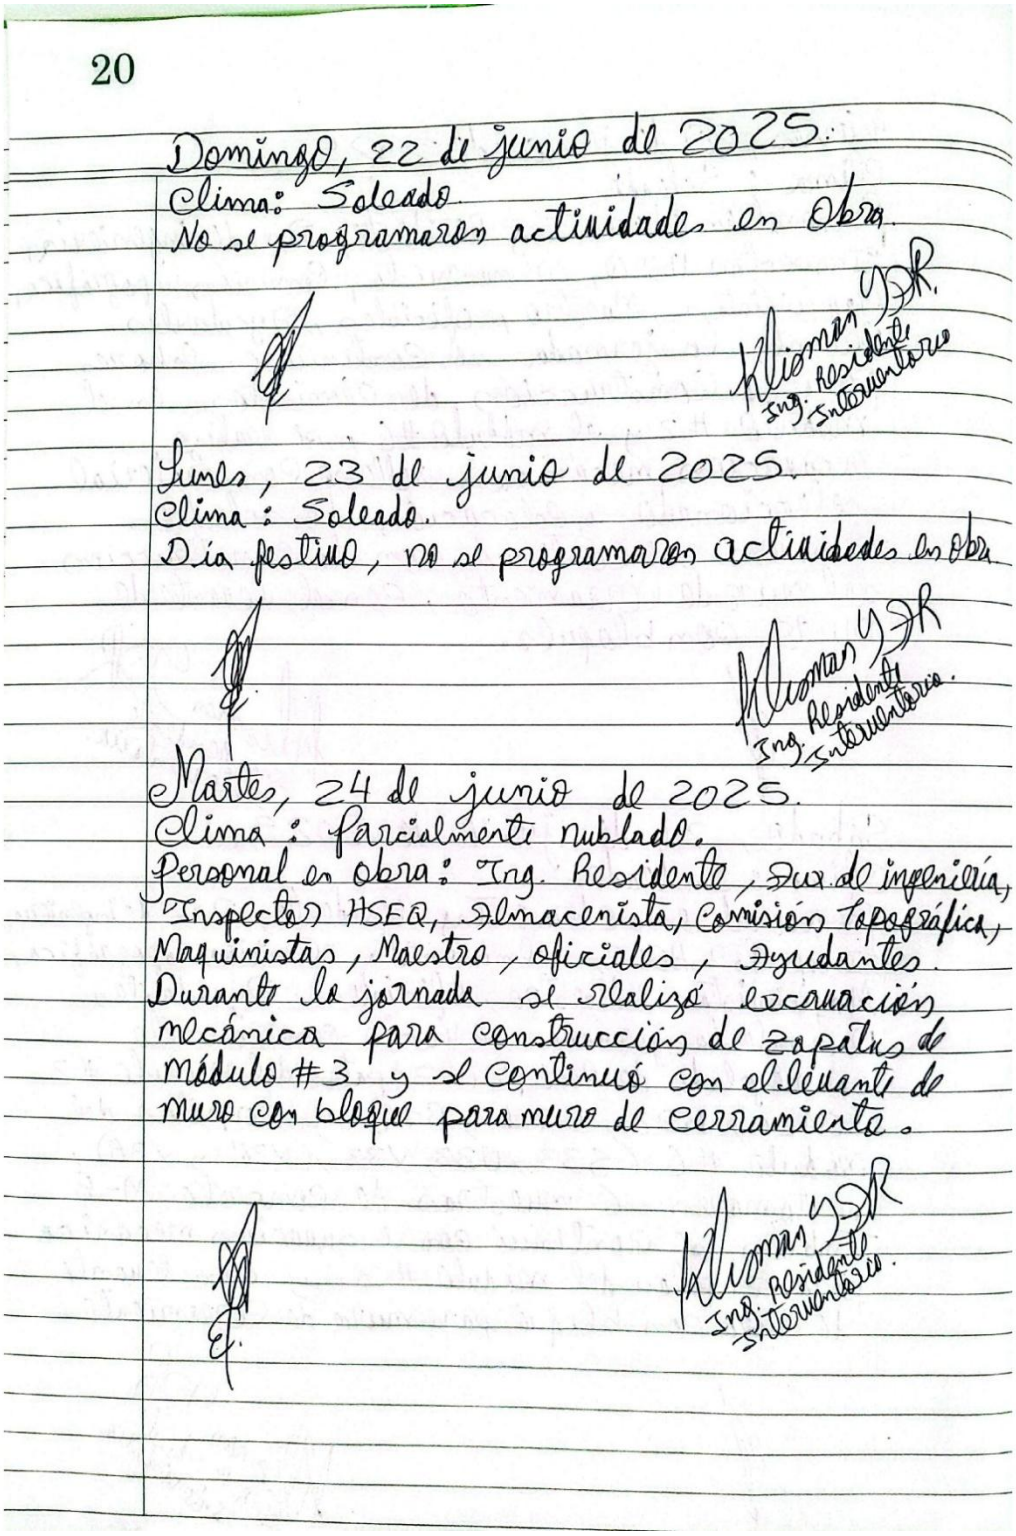

20

Domingo, 22 de junio de 2025.
Clima: Soleado
No se programaron actividades en Obra.

Ing. Residente Interventoría

Lunes, 23 de junio de 2025.
Clima: Soleado.
Día festivo, no se programaron actividades en obra


Ing. Residente Interventoría.

Martes, 24 de junio de 2025.
Clima: Parcialmente nublado.
Personal en obra: Ing. Residente, Aux de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se realizó excavación mecánica para construcción de zapatas de Módulo #3 y se continuó con el levante de muro con bloque para muro de cerramiento.

Ing. Residente Interventoría.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

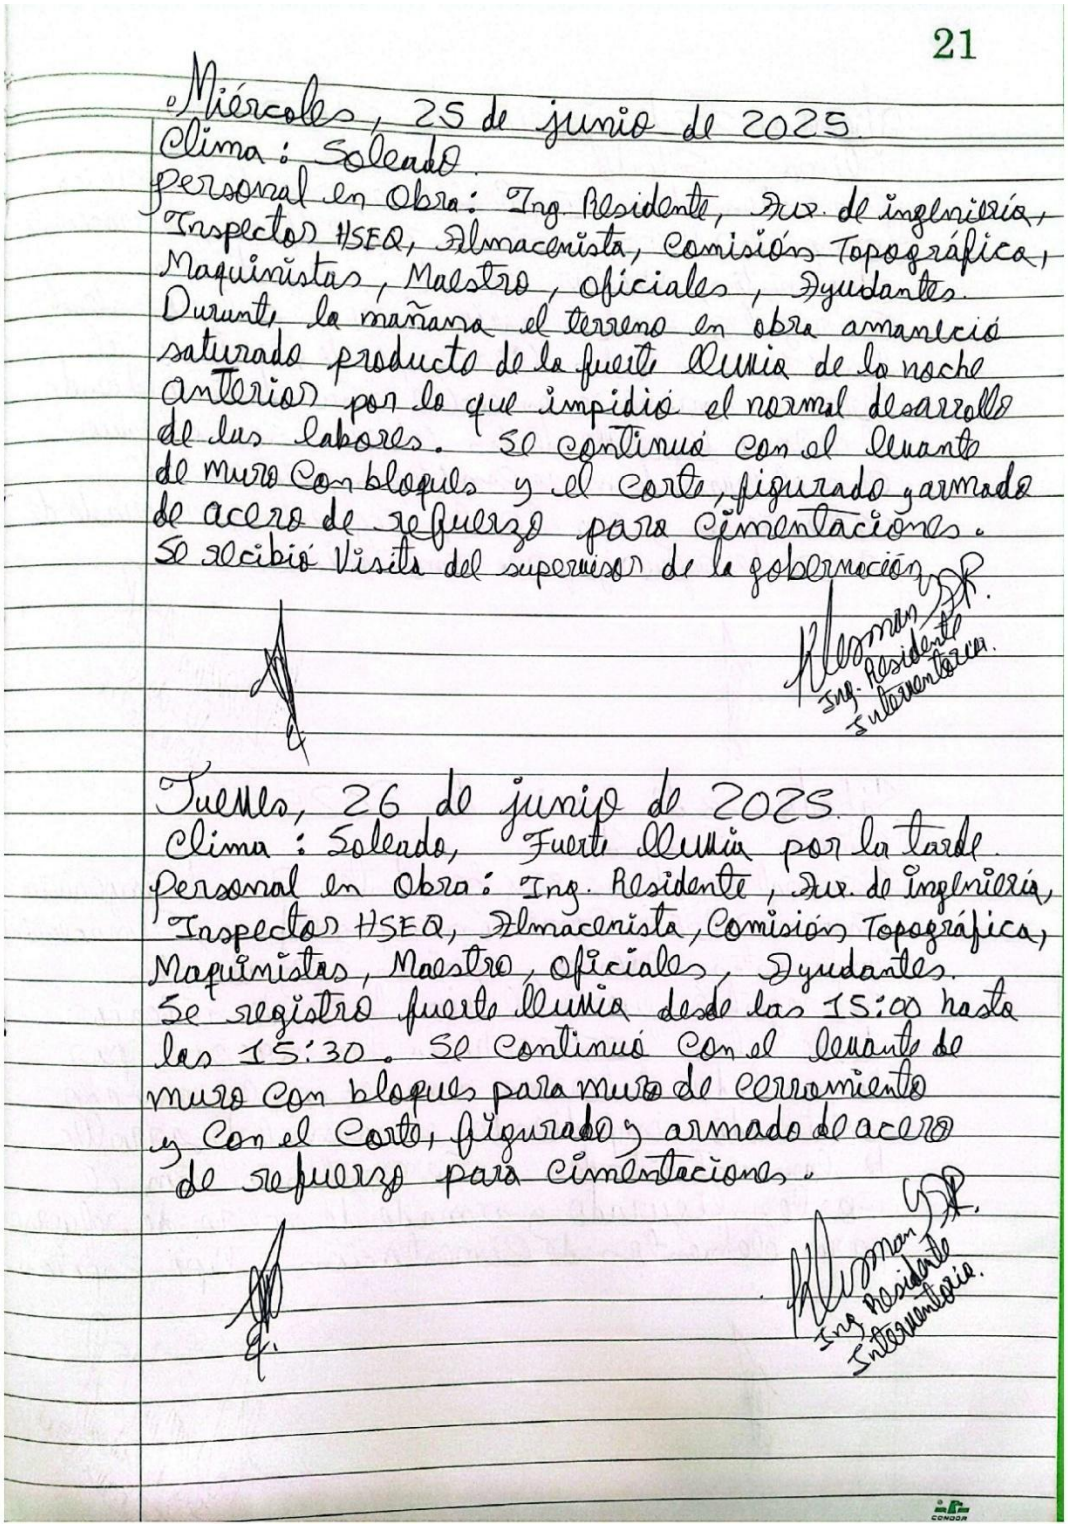

21

Miércoles, 25 de junio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, oficiales, Ayudantes.
Durante la mañana el terreno en obra amaneció saturado producto de la fuerte lluvia de la noche anterior por lo que impidió el normal desarrollo de las labores. Se continuó con el levante de muro con bloques y el corte, figurado y armado de acero de refuerzo para cimentaciones.
Se recibió visita del supervisor de la gobernación.


Ing. Residente Interventoría.

Jueves, 26 de junio de 2025.
Clima: Soleado, Fuerte lluvia por la tarde.
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux. de Ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, oficiales, Ayudantes.
Se registro fuerte lluvia desde las 15:00 hasta las 15:30. Se continuó con el levante de muro con bloques para muro de cerramiento y con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo para cimentaciones.

Ing. Residente Interventoría.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

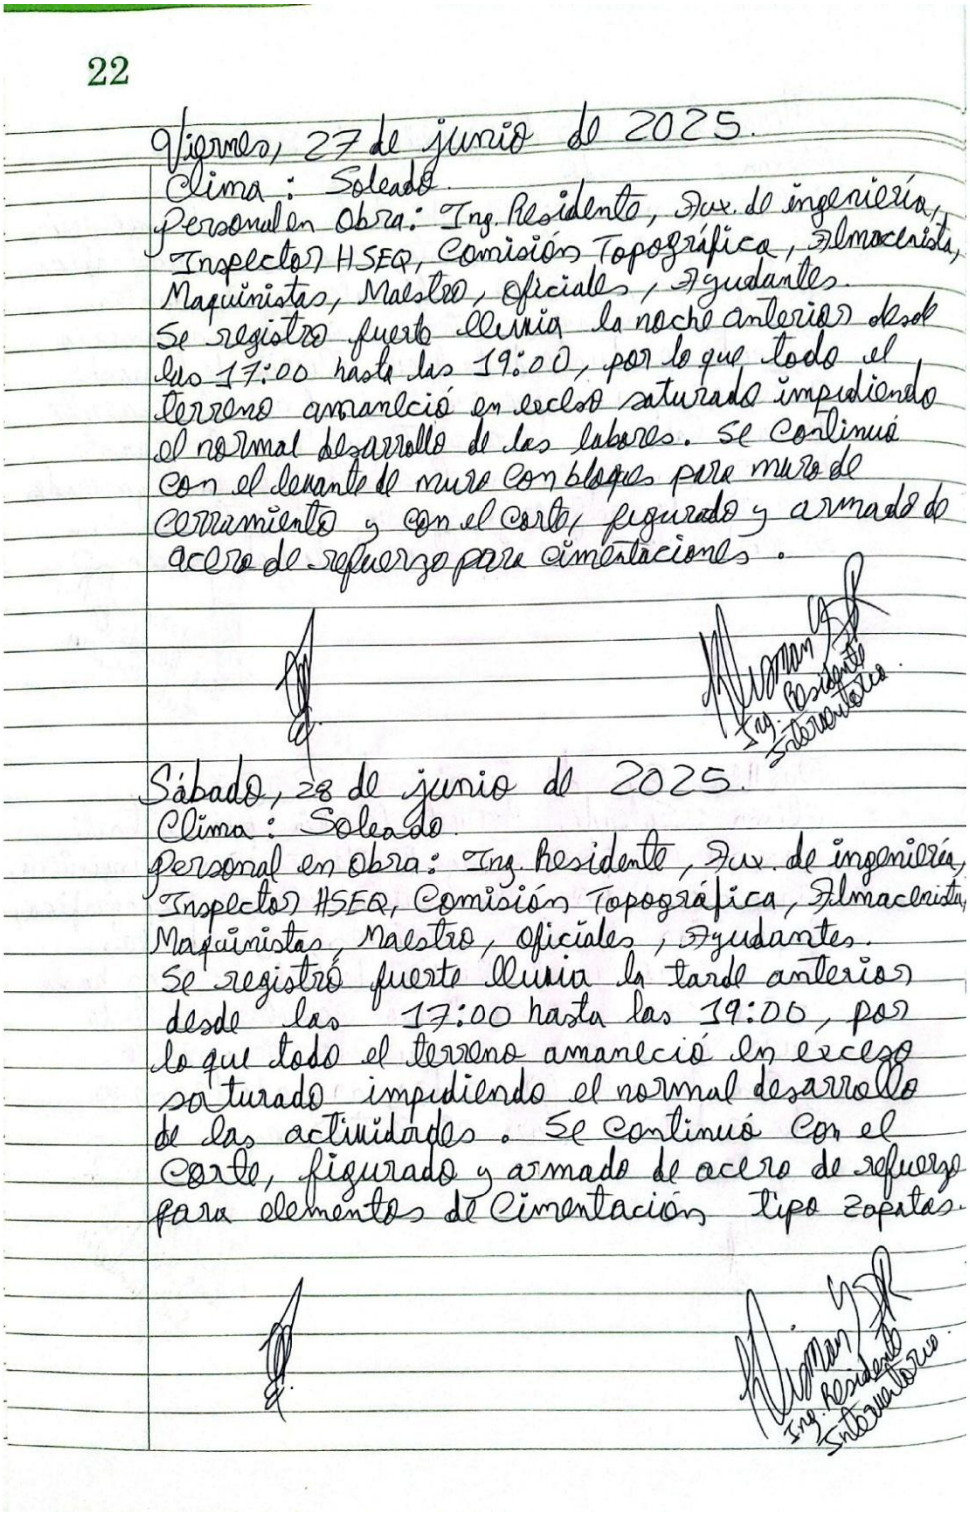

22

Viernes, 27 de junio de 2025.
Clima: Soleado
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Comisión Topográfica, Almacenista, Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Se registro fuerte lluvia la noche anterior desde las 17:00 hasta las 19:00, por lo que todo el terreno amaneció en exceso saturado impidiendo el normal desarrollo de las labores. Se continuó con el levante de muro con bloque para muro de cerramiento y con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo para cimentaciones.


Ing. Residente Interventoría

Sábado, 28 de junio de 2025.
Clima: Soleado
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Comisión Topográfica, Almacenista, Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Se registró fuerte lluvia la tarde anterior desde las 17:00 hasta las 19:00, por lo que todo el terreno amaneció en exceso saturado impidiendo el normal desarrollo de las actividades. Se continuó con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo para elementos de cimentación tipo zapatas.

Ing. Residente Interventoría

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

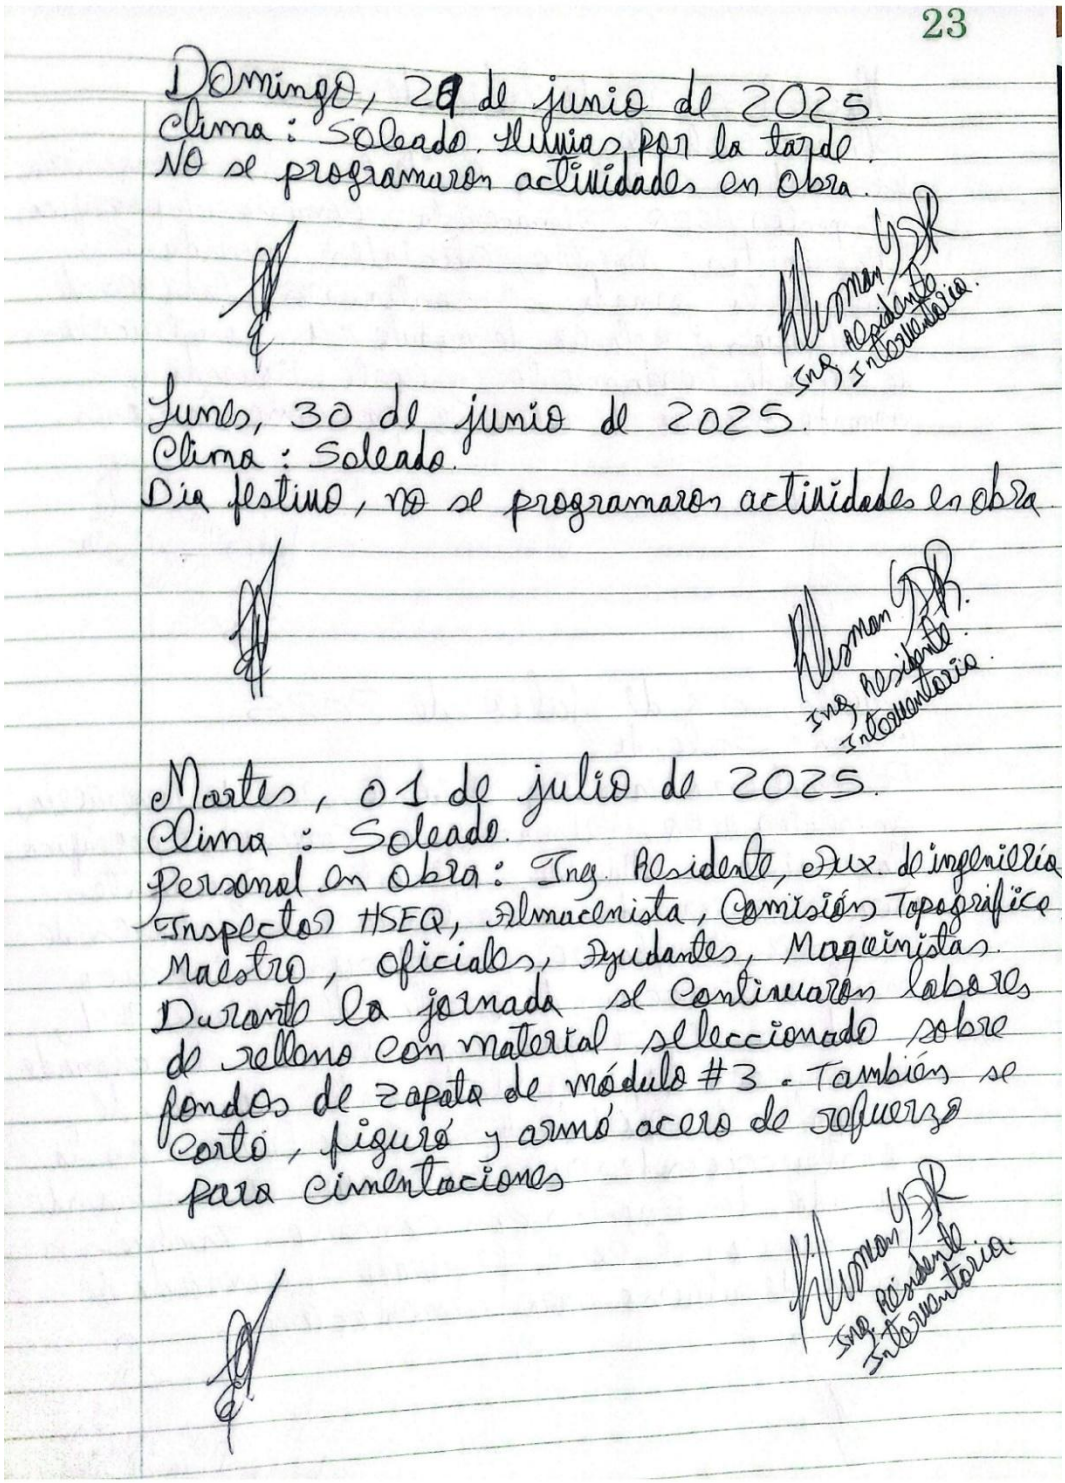

23

Domingo, 29 de junio de 2025.
Clima: Soleado. Lluvias por la tarde.
No se programaron actividades en obra.

Ing. Residente Interventoría.

Lunes, 30 de junio de 2025.
Clima: Soleado.
Dia festivo, no se programaron actividades en obra.

Ing. Residente Interventoría.

Martes, 01 de julio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maestro, oficiales, Ayudantes, Maquinistas.
Durante la jornada se continuaron labores de relleno con material seleccionado sobre fondos de zapata de módulo #3. También se cortó, figuró y armó acero de refuerzo para cimentaciones

Ing. Residente Interventoría.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

10. ANEXO 1. INFORME SST.

INFORME MENSUAL SST #2

DEL 3 AL 28 DE JUNIO 2025

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ACTIVIDADES DE OBRA DEL MES

Durante del mes se llevaron a cabo las siguientes actividades en el sitio de obra:

- **CORTE DE HIERRO Y FIGURACION DE HIERRO**

Durante el periodo se seporta que se realizaron las siquientes actividades Se refiere a la acción de doblar las barras de acero para crear las formas deseadas, como ganchos, curvas y ángulos. Se emplean máquinas dobladoras o herramientas manuales, como dobladoras de varillas, para lograr los dobleces necesarios. Considerando las siguientes condiciones de seguridad Se recomienda el uso de equipos de protección personal, como cascos, gafas, guantes de seguridad y calzado adecuado, para minimizar los riesgos laborales.

- **VIGA DE AMARRE DE ENCERRAMIENTO**

Durante el periodo se reporta la actividad la cual se realizó con todo los parámetro y condición de seguridad Se recomienda el uso de equipos de protección personal, como cascos, gafas, guantes de seguridad y calzado adecuado, para minimizar los riesgos laborales.

- **LEVANTE DE ENCERRAMIENTO**

Se realiza el levante del encerramiento con el objetivo de delimitar el área de trabajo, garantizar la seguridad de los trabajadores y transeúntes, controlar el acceso al sitio, aislar la zona de intervención y proteger los materiales almacenados. con todo los parámetro y condición de seguridad Se recomienda el uso de equipos de protección personal, como cascos, gafas, guantes de seguridad y calzado adecuado, para minimizar los riesgos laborales.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

- **EXCAVACIÓN DE ZAPATA**

Se excava el área donde se ubicará el pedestal, asegurándose de que cumpla con las dimensiones y profundidad especificadas en los planos se trabaja con todo los parámetro y condición de seguridad Se recomienda el uso de equipos de protección personal, como cascos, gafas, guantes de seguridad y calzado adecuado, para minimizar los riesgos laborales.

- **SOLADO**

Se realiza el solado es una capa delgada de concreto que se coloca en el fondo de las excavaciones (zapatas, losas de cimentación, etc.). Su función principal es nivelar el terreno y proteger la armadura (refuerzo de acero) de la cimentación contra la corrosión y otros agentes presentes en el suelo. se trabaja con todo los parámetro y condición de seguridad Se recomienda el uso de equipos de protección personal, como cascos, gafas, guantes de seguridad y calzado adecuado, para minimizar los riesgos laborales.


figuración de hierro


fundida de viga de amarre


levante de encerramiento


excavación de zapata


fundida de zapata



CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

ACTVIDADES REALIZADAS EN EL TEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).

Durante el mes de junio de 2025 se desarrollaron diversas actividades orientadas al cumplimiento del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de las obligaciones establecidas por la normatividad vigente y los lineamientos internos del proyecto.

Este informe presenta un resumen de las acciones implementadas, así como los soportes y evidencias que garantizan su ejecución y seguimiento.

1. **INDUCCIÓN DEL PERSONAL EN OBRA:** Durante el inicio del período reportado, se realizó la inducción de ingreso al personal que se vinculó a las actividades del proyecto, con el objetivo de brindar información clara y precisa sobre:

- Las condiciones de seguridad del sitio de obra,
- Los riesgos asociados a las labores a ejecutar,
- Las normas y procedimientos del SG-SST,
- El uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP),
- Las rutas de evacuación y puntos de encuentro,
- Y los canales de reporte de incidentes, actos o condiciones inseguras.

Evidencia ver anexo # 1

2. **DELIMITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN OBRA:** Durante el desarrollo de las actividades constructivas, se llevó a cabo la delimitación y señalización de los puntos críticos identificados en el sitio de obra, con el fin de prevenir accidentes e incidente o en su efecto una enfermedad laboral, garantizar la seguridad del personal y cumplir con los lineamientos del SG-SST.

Entre los puntos críticos intervenidos se destacan:

- **ZONAS DE EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS:** Se implementó señalización perimetral con cinta de peligro, avisos de advertencia y barreras físicas provisionales, para evitar caídas a distinto nivel y restringir el paso de personal no autorizado.



CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

- **PUNTOS DE ACOPIO DE MATERIALES:** Se delimitaron las áreas destinadas al almacenamiento temporal de materiales demolidos y escombros, así como de insumos de obra, a fin de evitar obstrucción de rutas de circulación, reducir el riesgo de golpes o tropiezos, y mantener el orden y limpieza en el entorno de trabajo.

3. **SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA:** En cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y como parte de las acciones preventivas del SG-SST, se implementó la señalización adecuada en el sitio de obra con el objetivo de orientar al personal, reducir riesgos y actuar oportunamente ante situaciones de emergencia.

Las señalizaciones instaladas incluyeron:

- **RUTA DE EVACUACIÓN:** Se identificaron e instalaron señales visibles que indican el recorrido seguro hacia las salidas de emergencia, garantizando su accesibilidad y libre tránsito en caso de evacuación.



- **PUNTO DE ENCUENTRO:** Se demarcó el sitio de concentración del personal ante emergencias, debidamente señalizado y ubicado en una zona segura, alejada de riesgos inmediatos. Con tamos con 2 punto de encuentro



CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

- **BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:** Se ubicó en un área visible y de fácil acceso, con señalización estandarizada. Su contenido es inspeccionado periódicamente según el protocolo de emergencias.



- **EXTINTOR:** Se señalizó la ubicación de los extintores portátiles con símbolos normalizados, garantizando que se encuentren libres de obstáculos y en condiciones operativas.



- **USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):** En puntos de ingreso a la obra y frentes de trabajo activos se colocaron avisos con la señalización de uso obligatorio de EPP como casco, botas, chaleco reflectivo, guantes y gafas, fomentando la cultura del autocuidado y la prevención de accidentes.



CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

4. **ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS):** Como parte de la gestión preventiva en el proyecto, se realizaron los **Análisis de Trabajo Seguro (ATS)** correspondientes a las diferentes actividades ejecutadas en obra durante el mes. Estos análisis permiten identificar los peligros asociados a cada tarea, evaluar los riesgos y definir las medidas de control necesarias para su mitigación.

Evidencia ver anexo # 4

Cada ATS fue elaborado previamente al inicio de la actividad y socializado con el personal operativo, garantizando que todos los trabajadores comprendieran los riesgos inherentes a su labor, así como los procedimientos seguros que debían aplicar. Esta socialización incluyó:

- Descripción de la tarea.
- Identificación de peligros.
- Medidas de prevención y control.
- Revisión del uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP).

5. **VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS:** Durante el desarrollo de las actividades del mes, se realizó la verificación preoperacional de la maquinaria y los equipos utilizados en obra, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento, prevenir fallas mecánicas y evitar accidentes laborales asociados a su uso.
   Estas inspecciones preoperacionales se llevaron a cabo diariamente antes del inicio de la jornada, siguiendo un formato estandarizado que incluye la revisión de:

- Niveles de aceite, combustible e hidráulico.
- Estado de llantas, mangueras y conexiones.
- Funcionamiento de frenos, luces, alarmas y controles.
- Elementos de seguridad (espejos, cinturones, extintores).
- Limpieza general y condiciones externas del equipo.

Los registros fueron diligenciados por el operador responsable y verificados por el área HSEQ. Ante la detección de cualquier anomalía, se procedió a la corrección inmediata o suspensión del uso del equipo hasta su mantenimiento.

Evidencia ver anexos #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

6. **CHARLAS DE SEGURIDAD:** Como parte del fortalecimiento de la cultura de prevención y del cumplimiento del cronograma del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizaron charlas de seguridad dirigidas al personal operativo y administrativo en obra.

Estas charlas tienen como objetivo sensibilizar y capacitar a los trabajadores en temas clave para la prevención de riesgos laborales, reforzar el cumplimiento de las normas de seguridad, y promover el autocuidado.

Evidencia ver anexo #12

Entre los temas abordados durante el mes se encuentran:

Cada charla fue registrada mediante formato de asistencia firmado por los participantes, como evidencia del cumplimiento de la actividad

Estas jornadas se llevaron a cabo antes del inicio de labores, en puntos estratégicos del sitio de obra, y fueron orientadas por el personal HSEQ, garantizando la participación de los trabajadores.





7. **PAUSAS ACTIVAS:** Durante el mes reportado, se implementaron pausas activas diarias con el personal en obra, como estrategia de promoción de la salud, prevención de trastornos osteomusculares y mejora del bienestar físico y mental de los trabajadores.

   Estas pausas se realizaron en jornadas de la tarde, con una duración promedio de 5 a 10 minutos, y estuvieron orientadas por el área HSEQ o personal designado. Las actividades incluyeron:

- Estiramientos musculares dirigidos a cuello, espalda, hombros, brazos y piernas.
- Movilidad articular y ejercicios de respiración.
- Breves mensajes de autocuidado, hidratación y ergonomía.

El desarrollo de estas pausas activas contribuyó a:

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

- Disminuir la fatiga laboral.
- Prevenir lesiones por esfuerzos repetitivos.
- Fortalecer el clima laboral y la motivación del equipo.
- Fomentar hábitos saludables en el entorno de trabajo.

Se dejó constancia de la actividad mediante registros fotográficos y listas de verificación diaria





Evidencia ver anexo # 13

INSPECCIONES DE BOTIQUÍN Y EXTINTORES: Se realizaron **inspecciones periódicas al botiquín de primeros auxilios y a los extintores instalados en el área de obra,** como parte de las acciones de control establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

- **BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS**

Se verificó que el botiquín se encontrara:

- Debidamente ubicado en una zona visible y accesible.
- Señalizado con pictograma de primeros auxilios.
- Con dotación completa y en condiciones adecuadas (vendas, guantes, antisépticos, apósitos, gasas, tijeras, entre otros).
- Sin elementos vencidos o deteriorados.

Cualquier elemento faltante fue reemplazado oportunamente para garantizar su disponibilidad ante una emergencia.

Evidencia ver anexo# 2

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

➢ **EXTINTORES**

Se inspeccionaron los extintores disponibles en la obra, verificando:

- Ubicación estratégica según el plan de emergencias.
- Accesibilidad y visibilidad sin obstrucciones.
- Señalización adecuada.
- Presión adecuada en el manómetro.
- Integridad física (sin abolladuras ni corrosión).
- Fecha de recarga vigente.

Estas inspecciones fueron registradas en los formatos correspondientes, quedando evidencia documental como soporte de las actividades realizadas

Evidencia ver anexo # 3

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL PERSONAL: Durante el mes de junio de 2025, se realizó el levantamiento y actualización del perfil sociodemográfico del personal vinculado al proyecto, con el fin de contar con información precisa que permita planificar acciones preventivas, adaptadas a las características de la población trabajadora y mejorar la gestión del riesgo en el entorno laboral.

Evidenciar anexo # 14

Evidenciar ver anexo 17

8. **EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO:** Durante el mes de junio se realizaron los exámenes médicos de ingreso al personal vinculado al proyecto, como parte del proceso de evaluación de condiciones de salud y en cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Estos exámenes tienen como finalidad:

- Determinar la aptitud médica del trabajador para el cargo que va a desempeñar.
- Identificar posibles restricciones o condiciones preexistentes que deban ser tenidas en cuenta al momento de asignar tareas.
- Establecer una línea base del estado de salud del trabajador al momento del ingreso, que sirva de referencia para seguimientos posteriores.
- Cumplir con la normatividad vigente, en especial lo dispuesto en la resolucion 1918 de 2009 del Ministerio de la Protección Social.

9. **PORCENTAJE DE ACCIDENTALIDAD:** Durante el mes de junio de 2025, no se presentó ningún accidente ni incidente laboral en el proyecto, lo cual evidencia el cumplimiento de las medidas preventivas implementadas y el compromiso del personal con la seguridad en el sitio de obra.

El porcentaje de accidentalidad correspondiente al mes es: **0 %**

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

Este resultado refleja el impacto positivo de las acciones desarrolladas en el marco del SG-SST, tales como:

- Ejecución de charlas diarias de seguridad.
- Supervisión continua de condiciones de trabajo.
- Uso obligatorio y adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Aplicación de Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
- Señalización y delimitación de zonas de riesgo.

10. **AFILIACIONES A LA ARL:** Durante el mes de junio se verificó el cumplimiento de las afiliaciones de todo el personal a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), como parte de los requisitos legales y contractuales del proyecto.

Esta gestión tiene como finalidad:

- Garantizar la cobertura en caso de accidente de trabajo o enfermedad laboral, brindando acceso a atención médica, prestaciones económicas y rehabilitación
- Cumplir con las obligaciones del empleador frente al Sistema General de Riesgos Laborales
- Asegurar la trazabilidad y validez de la afiliación, mediante la solicitud y revisión de los comprobantes de pago y planillas de aportes mensuales, tanto de trabajadores directos como de contratista.

11. **PUNTO ECOLÓGICO:** Como parte de las acciones de gestión ambiental y buenas prácticas en obra, se implementó un **punto ecológico** en el área de trabajo, con el objetivo de fomentar la **clasificación adecuada de los residuos generados** y promover una cultura de sostenibilidad entre los trabajadores.

El punto ecológico se encuentra debidamente señalizado y consta de recipientes diferenciados por colores, conforme al código de colores establecido en la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:

- **Verde:** Residuos orgánicos aprovechables.
- **Blanco:** Residuos aprovechables (plástico, papel, cartón, metales, vidrio).
- **Negro:** Residuos no aprovechables.



CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

12. ROTULADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD

Durante el mes de junio se realizó la verificación del cumplimiento de las medidas de **rotulado y manejo seguro de productos químicos** utilizados en el proyecto, conforme a lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), adoptado en Colombia a través del Decreto 1496 de 2018.


Se constató que: Todos los productos químicos presentes en obra (pegantes, pinturas, desmoldantes, combustibles, entre otros) cuentan con rótulos visibles y legibles, que indican el nombre del producto, pictogramas de peligro, advertencias de seguridad, instrucciones de manejo y recomendaciones de almacenamiento.

- Se encuentra disponible en obra la **Ficha Técnica de Seguridad (FDS)** de cada sustancia química, la cual incluye información detallada sobre:
    - Identificación del producto.
    - Riesgos para la salud y el ambiente.
    - Recomendaciones de primeros auxilios.
    - Medidas de protección personal.
    - Procedimientos ante derrames



CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

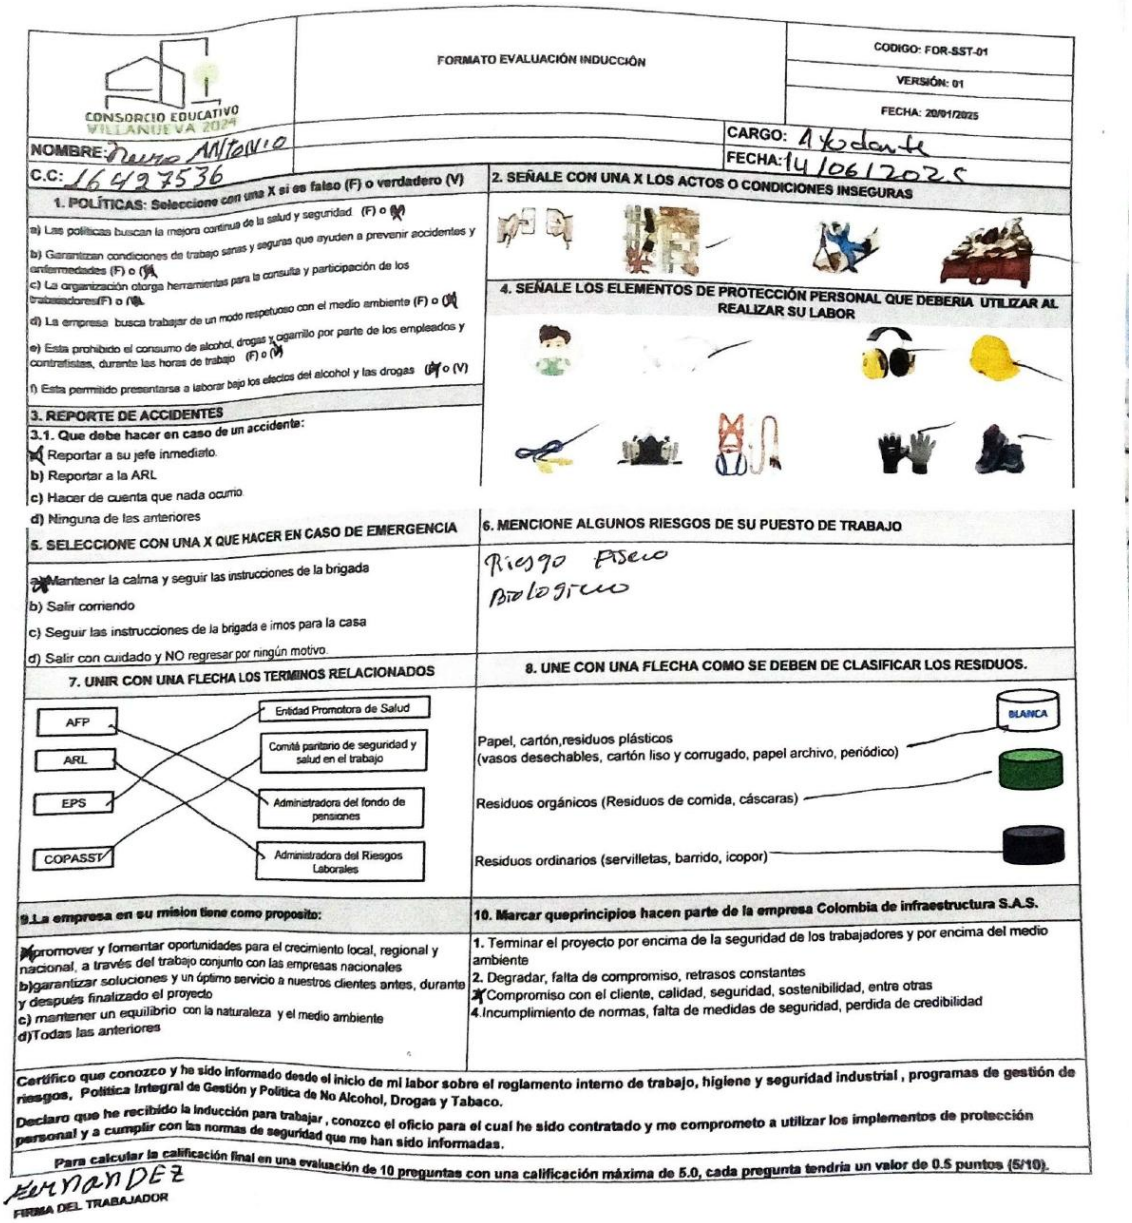

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN	CODIGO: FOR-SST-01
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 20/01/2025

NOMBRE: Duvis Antonio — CARGO: Ayudante

C.C: 16427536 — FECHA: 14/06/2025

1. POLÍTICAS: Seleccione con una X si es falso (F) o verdadero (V)

a) Las políticas buscan la mejora continua de la salud y seguridad (F) o (X)

b) Garantizan condiciones de trabajo sanas y seguras que ayuden a prevenir accidentes y enfermedades (F) o (X)

c) La organización otorga herramientas para la consulta y participación de los trabajadores(F) o (X)

d) La empresa busca trabajar de un modo respetuoso con el medio ambiente (F) o (X)

e) Esta prohibido el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo por parte de los empleados y contratistas, durante las horas de trabajo (F) o (X)

f) Esta permitido presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol y las drogas (F) o (V)

2. SEÑALE CON UNA X LOS ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS

3. REPORTE DE ACCIDENTES

3.1. Que debe hacer en caso de un accidente:

X a) Reportar a su jefe inmediato.

b) Reportar a la ARL

c) Hacer de cuenta que nada ocurrio

d) Ninguna de las anteriores

4. SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBERIA UTILIZAR AL REALIZAR SU LABOR

5. SELECCIONE CON UNA X QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

X a) Mantener la calma y seguir las instrucciones de la brigada

b) Salir corriendo

c) Seguir las instrucciones de la brigada e irnos para la casa

d) Salir con cuidado y NO regresar por ningún motivo.

6. MENCIONE ALGUNOS RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO

Riesgo Psico
Biologico

7. UNIR CON UNA FLECHA LOS TERMINOS RELACIONADOS

AFP	Entidad Promotora de Salud
ARL	Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
EPS	Administradora del fondo de pensiones
COPASST	Administradora del Riesgos Laborales

8. UNE CON UNA FLECHA COMO SE DEBEN DE CLASIFICAR LOS RESIDUOS.

Papel, cartón,residuos plásticos (vasos desechables, cartón liso y corrugado, papel archivo, periódico)	BLANCA
Residuos orgánicos (Residuos de comida, cáscaras)	
Residuos ordinarios (servilletas, barrido, icopor)	

9.La empresa en su mision tiene como proposito:

X a) promover y fomentar oportunidades para el crecimiento local, regional y nacional, a través del trabajo conjunto con las empresas nacionales

b) garantizar soluciones y un óptimo servicio a nuestros clientes antes, durante y después finalizado el proyecto

c) mantener un equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente

d) Todas las anteriores

10. Marcar queprincipios hacen parte de la empresa Colombia de infraestructura S.A.S.

1. Terminar el proyecto por encima de la seguridad de los trabajadores y por encima del medio ambiente
2. Degradar, falta de compromiso, retrasos constantes
3. X Compromiso con el cliente, calidad, seguridad, sostenibilidad, entre otras
4. Incumplimiento de normas, falta de medidas de seguridad, perdida de credibilidad

Certifico que conozco y he sido informado desde el inicio de mi labor sobre el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad industrial , programas de gestión de riesgos, Política Integral de Gestión y Política de No Alcohol, Drogas y Tabaco.

Declaro que he recibido la inducción para trabajar , conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas.


Para calcular la calificación final en una evaluación de 10 preguntas con una calificación máxima de 5.0, cada pregunta tendría un valor de 0.5 puntos (5/10).

Hernandez
FIRMA DEL TRABAJADOR

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO
TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

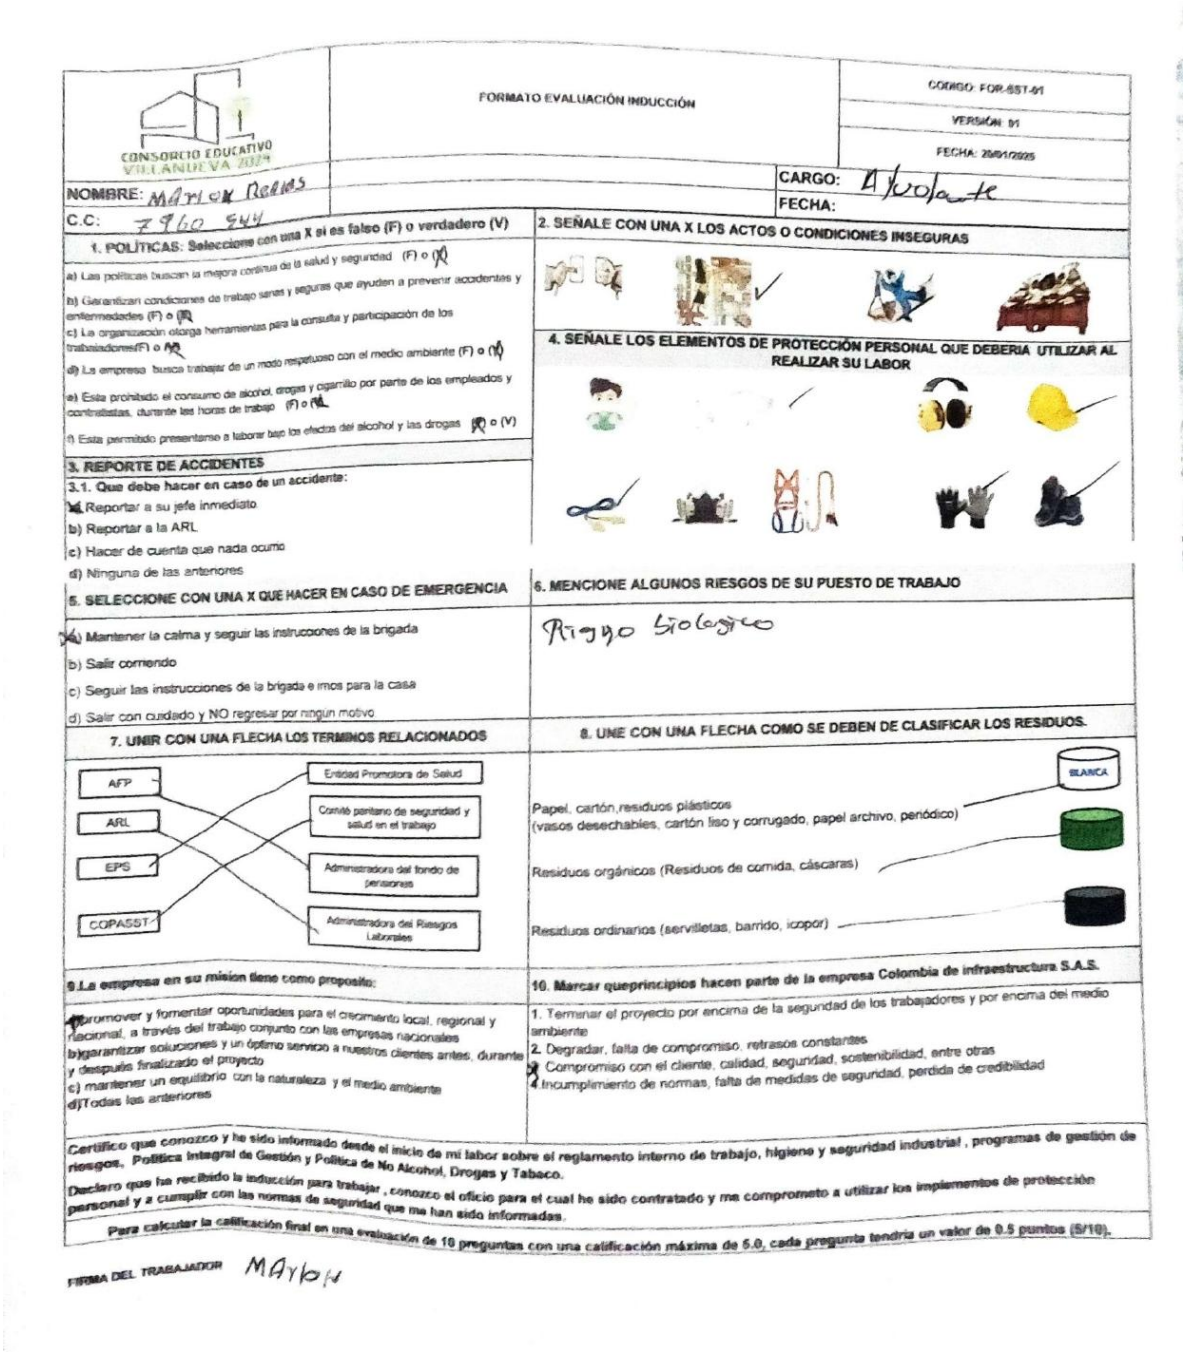

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN

CODIGO: FOR-SST-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 26/01/2025

NOMBRE: Mayor Reams
CARGO: Ayudante
C.C: 7960 544
FECHA:

1. POLÍTICAS: Seleccione con una X si es falso (F) o verdadero (V)

a) Las políticas buscan la mejora continua de la salud y seguridad (F) o (X)
b) Garantizan condiciones de trabajo sanas y seguras que ayuden a prevenir accidentes y enfermedades (F) o (X)
c) La organización otorga herramientas para la consulta y participación de los trabajadores(F) o (X)
d) La empresa busca trabajar de un modo respetuoso con el medio ambiente (F) o (X)
e) Esta prohibido el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo por parte de los empleados y contratistas, durante las horas de trabajo (F) o (X)
f) Esta permitido presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol y las drogas (X) o (V)

2. SEÑALE CON UNA X LOS ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS

3. REPORTE DE ACCIDENTES

3.1. Que debe hacer en caso de un accidente:

a) Reportar a su jefe inmediato
b) Reportar a la ARL
c) Hacer de cuenta que nada ocurrio
d) Ninguna de las anteriores

4. SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBERIA UTILIZAR AL REALIZAR SU LABOR

5. SELECCIONE CON UNA X QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

a) Mantener la calma y seguir las instrucciones de la brigada
b) Salir corriendo
c) Seguir las instrucciones de la brigada e irnos para la casa
d) Salir con cuidado y NO regresar por ningun motivo

6. MENCIONE ALGUNOS RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO

Riesgo biologico

7. UNIR CON UNA FLECHA LOS TERMINOS RELACIONADOS

AFP — Entidad Promotora de Salud
ARL — Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
EPS — Administradora del fondo de pensiones
COPASST — Administradora del Riesgos Laborales

8. UNE CON UNA FLECHA COMO SE DEBEN DE CLASIFICAR LOS RESIDUOS.

Papel, cartón,residuos plásticos (vasos desechables, cartón liso y corrugado, papel archivo, periódico) — BLANCA
Residuos orgánicos (Residuos de comida, cáscaras) — VERDE
Residuos ordinarios (servilletas, barrido, icopor) — NEGRA

9 La empresa en su mision tiene como proposito:

a) promover y fomentar oportunidades para el crecimiento local, regional y nacional, a través del trabajo conjunto con las empresas nacionales
b) garantizar soluciones y un óptimo servicio a nuestros clientes antes, durante y después finalizado el proyecto
c) mantener un equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente
d) Todas las anteriores

10. Marcar queprincipios hacen parte de la empresa Colombia de infraestructura S.A.S.

1. Terminar el proyecto por encima de la seguridad de los trabajadores y por encima del medio ambiente
2. Degradar, falta de compromiso, retrasos constantes
3. Compromiso con el cliente, calidad, seguridad, sostenibilidad, entre otras
4. Incumplimiento de normas, falta de medidas de seguridad, perdida de credibilidad

Certifico que conozco y he sido informado desde el inicio de mi labor sobre el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad industrial , programas de gestión de riesgos, Política Integral de Gestión y Política de No Alcohol, Droges y Tabaco.

Declaro que he recibido la inducción para trabajar , conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas.

Para calcular la calificación final en una evaluación de 10 preguntas con una calificación máxima de 5.0, cada pregunta tendría un valor de 0.5 puntos (5/10).

FIRMA DEL TRABAJADOR Mayor

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN


CODIGO: FOR-SST-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 20/01/2025

NOMBRE: Jose V Fuentes
CARGO: Ayudante
C.C: 7960101
FECHA: 14/06/2024

1. POLÍTICAS: Seleccione con una X si es falso (F) o verdadero (V)

a) Las políticas buscan la mejora continua de la salud y seguridad (F) o (X)
b) Garantizan condiciones de trabajo sanas y seguras que ayuden a prevenir accidentes y enfermedades (F) o (X)
c) La organización otorga herramientas para la consulta y participación de los trabajadores(F) o (X)
d) La empresa busca trabajar de un modo respetuoso con el medio ambiente (F) o (X)
e) Esta prohibido el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo por parte de los empleados y contratistas, durante las horas de trabajo (F) o (X)
f) Esta permitido presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol y las drogas (X) o (V)

2. SEÑALE CON UNA X LOS ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS



3. REPORTE DE ACCIDENTES

3.1. Que debe hacer en caso de un accidente:

X Reportar a su jefe inmediato
b) Reportar a la ARL
c) Hacer de cuenta que nada ocurrio
d) Ninguna de las anteriores

4. SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBERIA UTILIZAR AL REALIZAR SU LABOR




5. SELECCIONE CON UNA X QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

X Mantener la calma y seguir las instrucciones de la brigada
b) Salir corriendo
c) Seguir las instrucciones de la brigada e irnos para la casa
d) Salir con cuidado y NO regresar por ningún motivo


6. MENCIONE ALGUNOS RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO

Riesgo biologico
Riesgo fisico

7. UNIR CON UNA FLECHA LOS TERMINOS RELACIONADOS



8. UNE CON UNA FLECHA COMO SE DEBEN DE CLASIFICAR LOS RESIDUOS.



9.La empresa en su mision tiene como proposito:

X promover y fomentar oportunidades para el crecimiento local, regional y nacional, a través del trabajo conjunto con las empresas nacionales
b)garantizar soluciones y un óptimo servicio a nuestros clientes antes, durante y después finalizado el proyecto
c) mantener un equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente
d)Todas las anteriores

10. Marcar queprincipios hacen parte de la empresa Colombia de infraestructura S.A.S.

1. Terminar el proyecto por encima de la seguridad de los trabajadores y por encima del medio ambiente
2. Degradar, falta de compromiso, retrasos constantes
X Compromiso con el cliente, calidad, seguridad, sostenibilidad, entre otras
4 Incumplimiento de normas, falta de medidas de seguridad, perdida de credibilidad

Certifico que conozco y he sido informado desde el inicio de mi labor sobre el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad industrial , programas de gestión de riesgos, Política Integral de Gestión y Política de No Alcohol, Drogas y Tabaco.

Declaro que he recibido la inducción para trabajar , conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas.

Para calcular la calificación final en una evaluación de 10 preguntas con una calificación máxima de 5.0, cada pregunta tendría un valor de 0.5 puntos (5/10).

FIRMA DEL TRABAJADOR Jose V Fuentes

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

ANEXO 2: INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

INSPECCIÓN DE BOTIQUIN
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAO

CODIGO - 001
VERSION - 01
FECHA 11/02/2025


RESPONSABLE: Susana Montes
FECHA: 14/06/2025

ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO: BUENO	MALO	N/A	REPONER: NO	SI	CANTIDAD
SOLUCIÓN SALINA	✓					1
ALGODÓN	✓					1
CURAS	✓					10
GASA ESTERIL	✓					24
MICROPORO	✓					1
VENDA ELASTICA 2X5	✓					1
VENDA ELASTICA 3X5	✓					1
TIJERAS PUNTA ROMA	✓					1
ESPARADRAPO	–			✓		–
PARCHES OCULARES	✓					✓
BAJA LENGUAS	✓					4
ALCOHOL	✓					20
GUANTES EN LATEX	✓					1
APOSITO	–			✓		–
IMOVILIZADOR CERVICAL MULTI TALLA	✓					Lo
INMOVILADOR DE ESTREMIDADES SUPERIOR	–			✓		✓
INMOVILADOR DE ESTREMIDADES INFERIOR	–			✓		–
LINTERNA	✓			✓		–
BOLSA PLASTICA ROJA	–					1
TAPA BOCAS	–			✓		–
MANUAL DE PRIMER AUXILIOS	–			✓		–

Observaciones: Se observa que en el Botiquin le hace falta mucha cosa por favor reponerlo

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

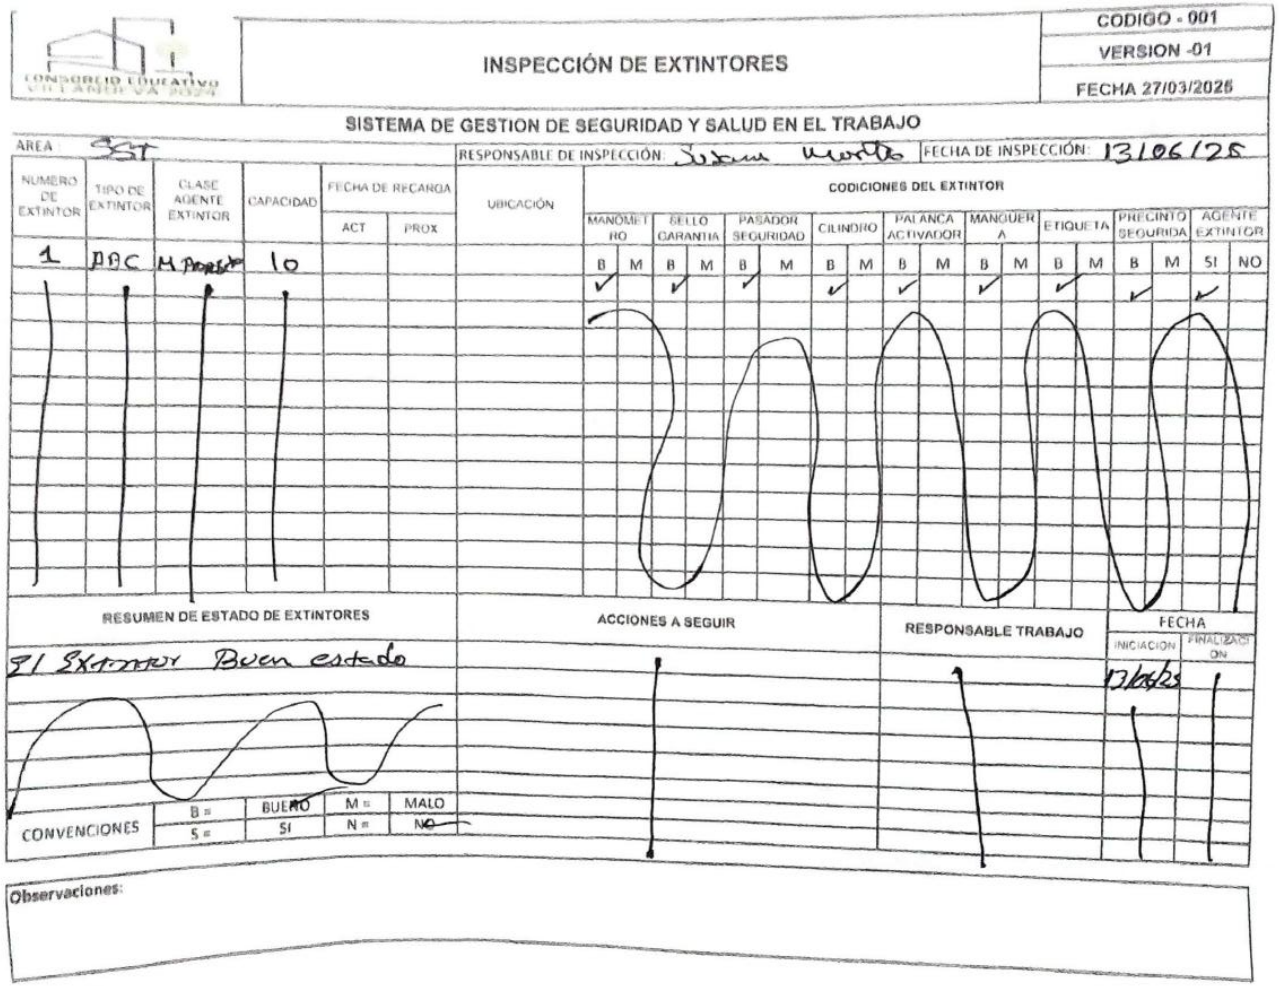

CONSORCIO EDUCATIVO CARTAGENA DE INDIAS 2024

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

CODIGO - 001
VERSION -01
FECHA 27/03/2025

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

AREA SST

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Juan Murillo

FECHA DE INSPECCIÓN: 13/06/25

NUMERO DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	CLASE AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA		UBICACIÓN	CODICIONES DEL EXTINTOR																		PRECINTO SEGURIDA		AGENTE EXTINTOR	
				ACT	PROX		MANÓMETRO		SELLO GARANTIA		PASADOR SEGURIDAD		CILINDRO		PALANCA ACTIVADOR		MANGUERA		ETIQUETA										
							B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	SI	NO
1	ABC	M Ponser	10				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓	

RESUMEN DE ESTADO DE EXTINTORES

SI Extintor Buen estado

ACCIONES A SEGUIR

RESPONSABLE TRABAJO

FECHA

	INICIACION	FINALIZACION
	13/06/25	

CONVENCIONES	B =	BUENO	M =	MALO
	S =	SI	N =	NO

Observaciones:

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS	Versión 1 Fecha: 07-03-2025

IDENTIFICACION		
Proyecto o Área: Colegio Villanueva	Inspector HSE: Susana Bonilla	Ciudad: Villanueva
Encargado/ supervisor contratista: Jhonny tapia	Semana de 03 Al 07 Año: Junio 2025	
Actividad a realizar: Fundida de viga de encerramiento encofrado de pedestal. Fundida de pedestal Excavacion	Herramientas y/o equipos: Pico, pala, Carretilla.	

ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)
Inspeccion de Herramienta	Caida al mismo nivel Tropezon	Orden y aseo No dejar los Materiales tirados
Fundida de viga de encerramiento	Caida de distintos niveles Golpe de calor	Orden y aseo pausas el trabajo, Hidratacion
encofrado de Pedestal	Caida de distintos niveles Golpe Lluvias	Orden y aseo Charlas de Seguridad parar el trabajo
Fundida de pedestal	Caida a distintos niveles Golpe de Calor Lluvias	Escalera, orden y aseo Hidratacion Parar el trabajo
Excavacion	Caida de distintos niveles Golpe de calor Lluvias Atropellamiento	Escalera, orden y aseo Hidratacion parar el trabajo señalizacion de paso de maquinaria Uso barrera o valla

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS	Versión 1 Fecha: 07-03-2025

ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO REQUERIDO PARA ESTA ACTIVIDAD

Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A	Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A
Casco de seguridad	✓		overol desechable		✓
Gafas de seguridad	✓		Delantal o peto		✓
Proteccion auditivo	✓		guantes de soldador		✓
Guantes de protección	✓		mascarilla medio rostro con filtro P100		✓
Botas de seguridad con puntera metálica	✓		careta de soldador		✓
Arnés de seguridad con linea de vida		✓	lentes de oxicorte		✓
Protección respiratoria		✓	eslinga en y con o sin absorbedor		✓

', Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS	Versión 1
		Fecha: 07-03-2025

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

Los firmantes de este documento declaran conocer los riesgos de la actividad asociada al permiso de trabajo y estar comprometidos a cumplir con las medidas de control y detener cualquier trabajo inseguro.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FIRMA
Kenell Yonel Muñoz	1052740188	Obrero	Kenell M
Luis Fernando	1052738161	obrero	Luis fernando
Gustavo Almeida	9202318	Obrero	Gustavo A
Jesus Villareal	9202314	Obrero	Jesus villarreal
Carlos E. O, 2	9203787	Obrero	Carlos E.
Cosme Parra	9201689	Obrero	Cosme P.
Oscar Teres	1052731541	obrero	Oscar T
Marlon Realph	7960344	Obrero	Marlon R
Ramiro Olivo	1052731486	obrero	Ramiro Olivo
Jorge Polo	6632964	Maestro	Jorge P.
Jaider Polo	1002475886	Obrero	Jaider P.
Junior Almeida	1002476451	Obrero	Junior A.
Wilson cuadrado	1052735489	Obrero	Wilson
Mauricio quintero	9209056	Obrero	Mauricio Q
Jesus Palacios	1052734797	Obrero	Jesus P
Nelvo Antonio	16427536	Obrero	Nelvo A
Pablo Estrada	9203235	Obrero	Polo
Deivis Rios	1192749613	obrero	Deivis R

Firma de quien reviso: Susana Monte P.


CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS	Versión 1
		Fecha: 07-03-2025

IDENTIFICACION		
Proyecto o Área: Colegio Villanueva	Inspector HSE: Susan Mesa	Ciudad: Cartagena
Encargado/ supervisor contratista: Jhony tapia	Semana de 03 Al 07 Año Junio 2025	
Actividad a realizar: Excavación de zapata Hadoloc y desplazamiento de material	Herramientas y/o equipos: Maquinaria = Retroexcavadora y minicargador	

Inspección de terreno	Caida de persona Al mismo nivel	Orden y aseo
Inicio de excavación	Choque objetos en movimiento	Cargar las señalizaciones
desplazamiento de Material.	Exposición de residuos y descarga de vida de Presión a Alta presión	Utilizar los Protectores auditivo
	Golpe de Calor	Hidratación

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

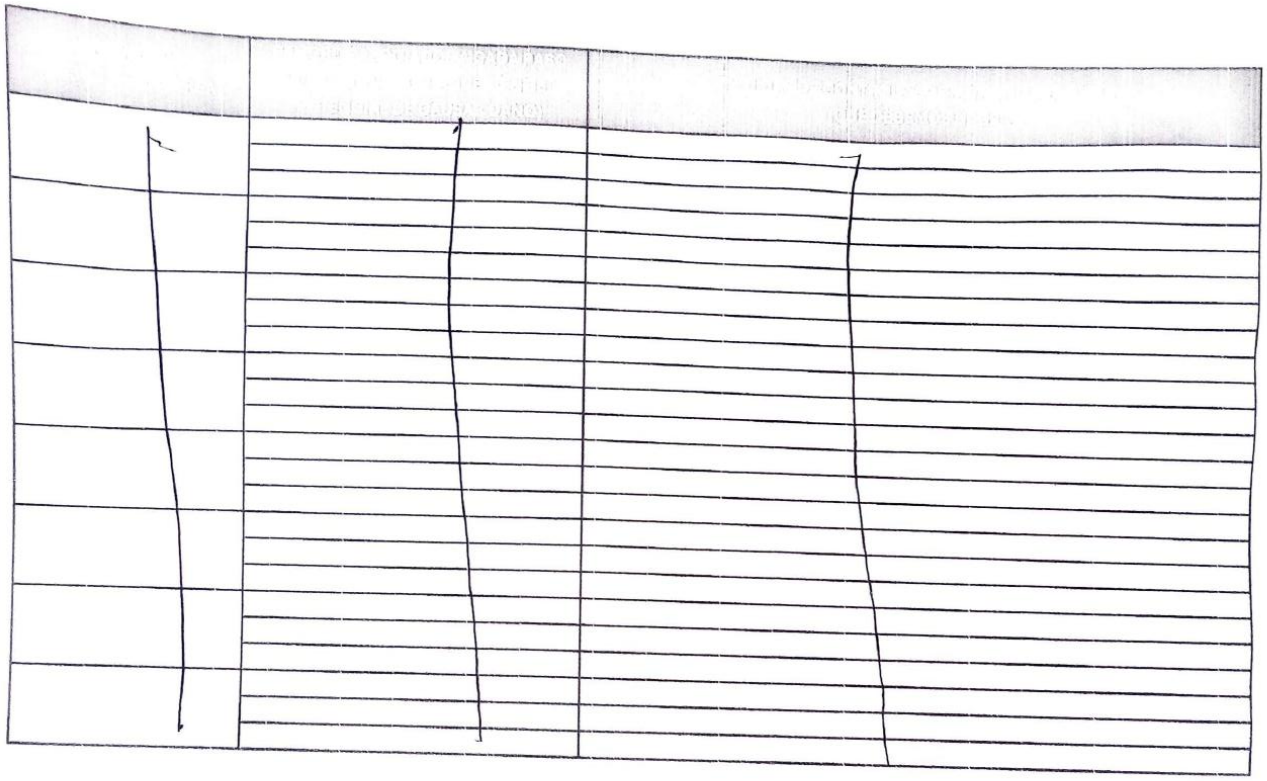

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Versión 1

Fecha: 07-03-2025

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

Los firmantes de este documento declaran conocer los riesgos de la actividad asociada al permiso de trabajo y estar comprometidos a cumplir con las medidas de control y detener cualquier trabajo inseguro.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FIRMA
Cristian Berrio	1148439263.	Operador	
Holman Salas	1049537253	Operador	

Firma quien reviso:

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS	Versión 1 Fecha: 07-03-2025

IDENTIFICACION		
Proyecto o Área: Colegio Villanueva	Inspector HSE: Susana Ch	Ciudad: Villanueva
Encargado/ supervisor contratista: Jhonny Tapia	Semana de 09 AL 14 Año 2025	
Actividad a realizar: Solado, excavacion, encofrado, Fundida de pedestal, viga de encerramiento	Herramientas y/o equipos: Pico, pala.	

ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)
Inspeccion de Herramientas	Caida al mismo nivel Tropezón	Orden y aseo No dejen los materiales tirado
Fundida de viga de encerramiento	Caida de distinto nivel Golpe de Calor Ruidos	Orden y aseo Hidratacion Revisar el trabajo
encofrado de pedestal.	Caida distinto nivel golpe de calor Ruidos	Orden y aseo Hidratacion, s Suspender el Trabajo
fundida de pedestal.	Caidas distinto nivel Golpe de Calor apoplejamiento por vehiculo	Orden y aseo, Revisar actividades Hidratacion Por parte las Señalizaciones
Excavacion	Golpe de Calor Ruidos	Hidratacion Suspender el trabajo

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS	Versión 1 Fecha: 07-03-2025
ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO REQUERIDO PARA ESTA ACTIVIDAD

Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A	Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A
Casco de seguridad	✓		overol desechable		✓
Gafas de seguridad	✓		Delantal o peto		✓
Proteccion auditivo	✓		guantes de soldador		✓
Guantes de protección	✓		mascarilla medio rostro con filtro P100		✓
Botas de seguridad con puntera metálica	✓		careta de soldador		✓
Arnés de seguridad con linea de vida		✓	lentes de oxicorte		✓
Protección respiratoria		✓	eslinga en y con o sin absorbedor		✓

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS

Versión 1

Fecha: 07-03-20

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

Los firmantes de este documento declaran conocer los riesgos de la actividad asociada al permiso de trabajo y estar comprometidos a cumplir con l medidas de control y detener cualquier trabajo inseguro.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FIRMA
Manuel. Cera Beleño	9203 768	Ayudante	Manuel
Pablo Caballa Herrera	92032735	Ayudante	
Deivis Rios Lamas	7792742673	Ayudante	Deivis Rios
Jesus A. Palacio Hugueijo	1052734797	Ayudante	
CARLOS E. D.Z	9203,767	Ayudante	
Henry Arrieta Villa	9204056	Oficial	
NEURO ANTONIO	1642,7536	~~ORNANDEZ~~	FERNANDEZ
MARION REALES	7960 544	Hosisdia	MARION

Firma de quien reviso:

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO
TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS

Versión 1
Fecha: 07-03-2025


IDENTIFICACION

Proyecto o Área: Colegio villanueva	Inspector HSE: Susan Mantilla Ciudad: Villanueva
Encargado/ supervisor contratista: Jhony tapia	Semana de 09 AL 14 Año 2025
Actividad a realizar: Corte de Hierro y Figuracion de hierro	Herramientas y/o equipos: Maquina trozadora de hierro

Inspeccion de Herramientas	Caida de personas al mismo nivel	Orden y aseo
Retirar las varillas	Atrapello o golpe con vehiculo Caida de personas al mismo nivel	Respeto a las señales Orden y aseo
Corte de Hierro	Sobre esfuerzo	Pausas activas y posturas ergonomicas
Figuracion de Hierro	Posturas prolongadas Lluvias	Pausas activas, Suspencion de trabajo por rayos Suspencion de trabajo

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

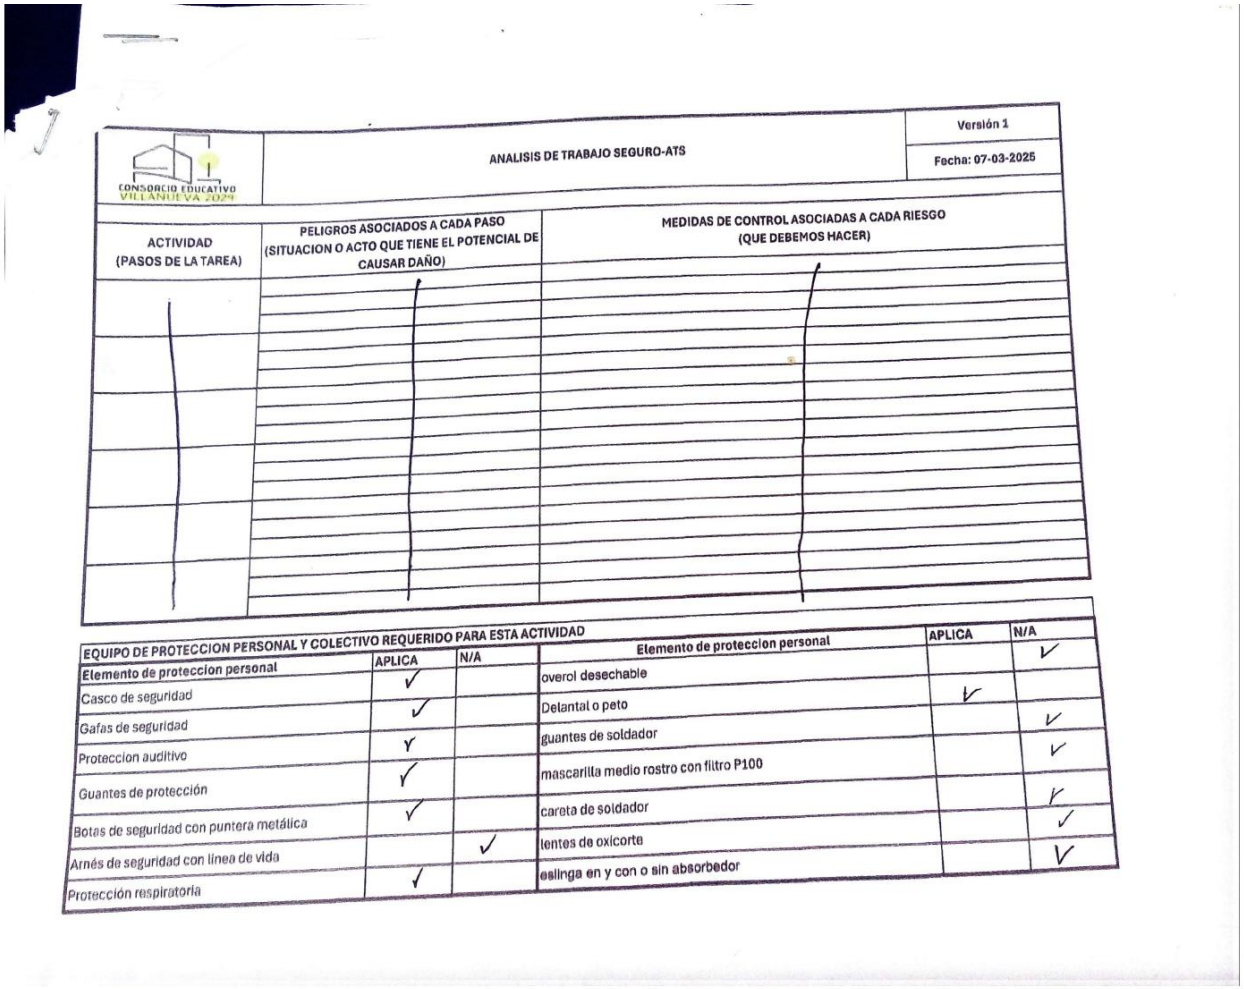

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS	Versión 1 Fecha: 07-03-2025

ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)


EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO REQUERIDO PARA ESTA ACTIVIDAD

Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A
Casco de seguridad	✓	
Gafas de seguridad	✓	
Proteccion auditivo	✓	
Guantes de protección	✓	
Botas de seguridad con puntera metálica	✓	
Arnés de seguridad con linea de vida		✓
Protección respiratoria	✓	

Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A
overol desechable		✓
Delantal o peto	✓	
guantes de soldador		✓
mascarilla medio rostro con filtro P100		✓
careta de soldador		✓
lentes de oxicorte		✓
eslinga en y con o sin absorbedor		✓

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

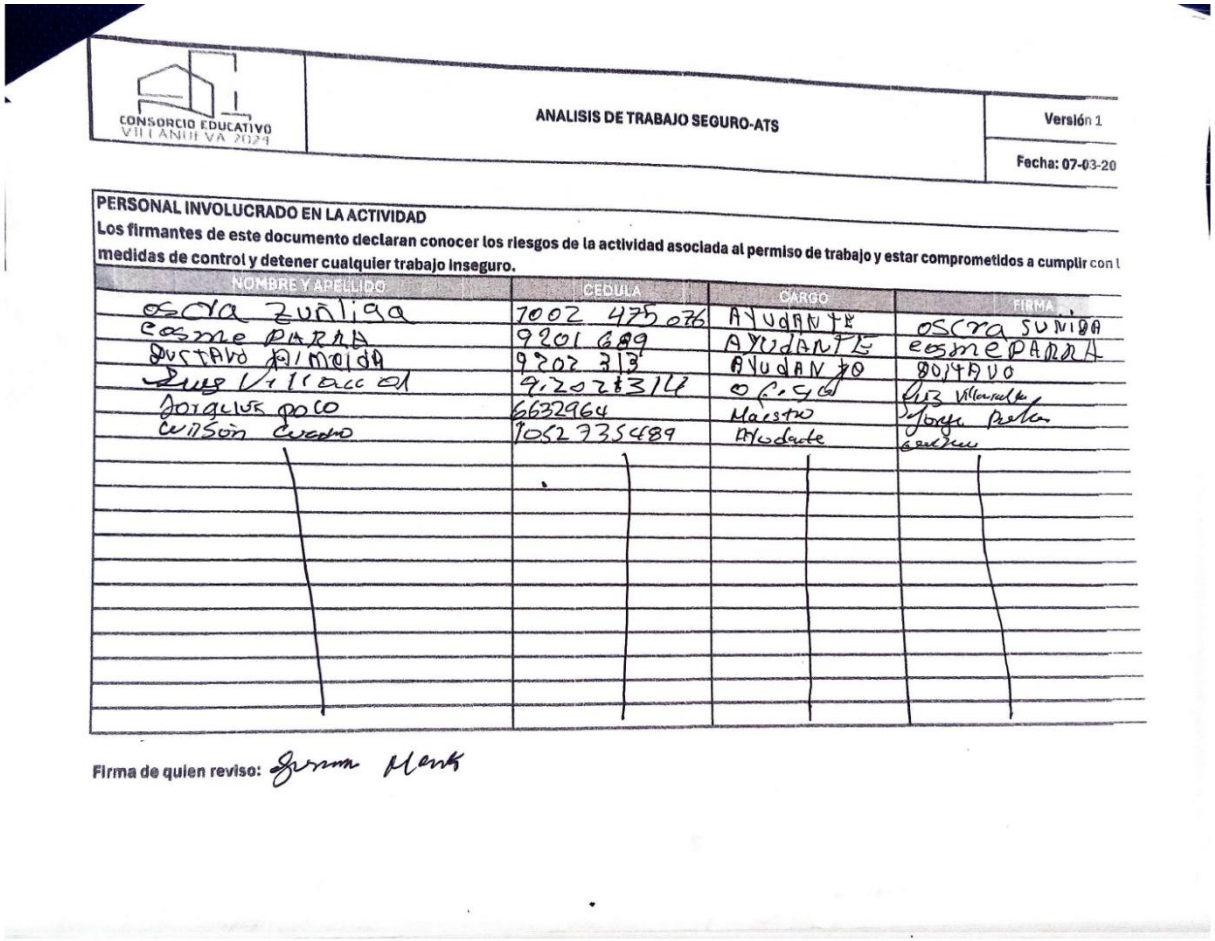

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS

Versión 1

Fecha: 07-03-20

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD


Los firmantes de este documento declaran conocer los riesgos de la actividad asociada al permiso de trabajo y estar comprometidos a cumplir con l medidas de control y detener cualquier trabajo inseguro.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FIRMA
Oscra Zuñiga	1002 475 076	AYUDANTE	oscra zuñiga
eosme PARRA	9201 689	AYUDANTE	eosmePARRA
Gustavo Olmeda	9202 313	AYUDANTE	GUSTAVO
Luis Villarreal	9.202.313	O.C.S.G	Luis Villarreal
Jorquivs pollo	6632964	Maestro	Jorge Pollo
Wilson Cuadro	1052 735 489	Mediador	

Firma de quien reviso:

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

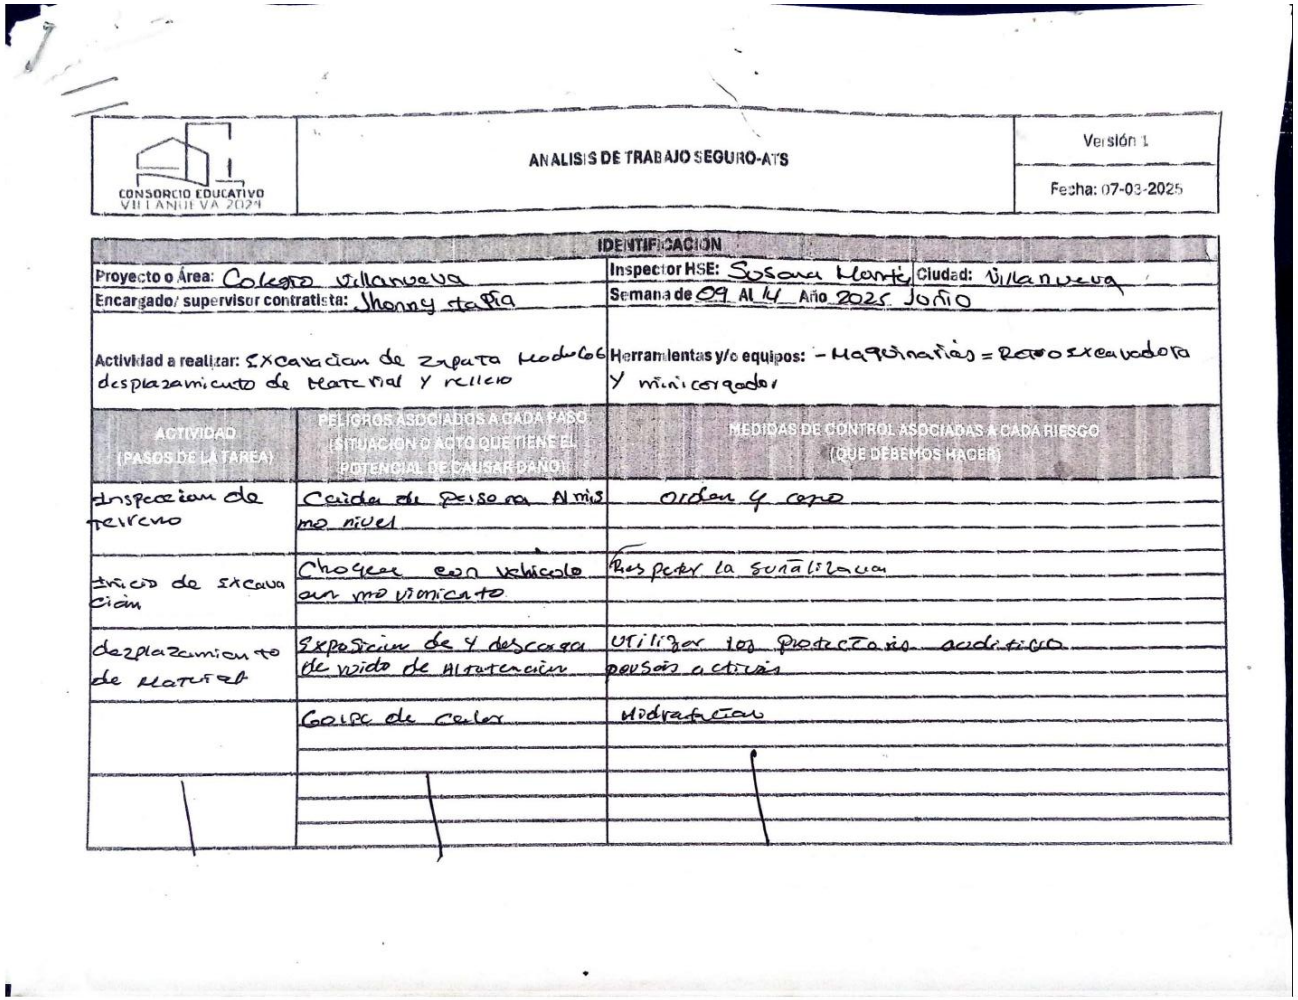

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS

Versión 1

Fecha: 07-03-2025

IDENTIFICACION

Proyecto o Área: Colegio villanueva — Inspector HSE: Susana Monte, Ciudad: Villanueva


Encargado/ supervisor contratista: Jhonny tapia — Semana de 09 AL 14 Año 2025 Junio

Actividad a realizar: Excavacion de zapata modulo 6 desplazamiento de material y relleno — Herramientas y/o equipos: - Maquinarias = Retro excavadora y minicargador

ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)
inspeccion de terreno	Caida de persona al mismo nivel	orden y aseo
inicio de excavacion	Chocar con vehiculo en movimiento	Respetar la señalizacion
desplazamiento de material	Exposicion de y descarga de vacio de alimentacion	Utilizar los protectores auditivos pausas activas
	Golpe de calor	Hidratacion

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

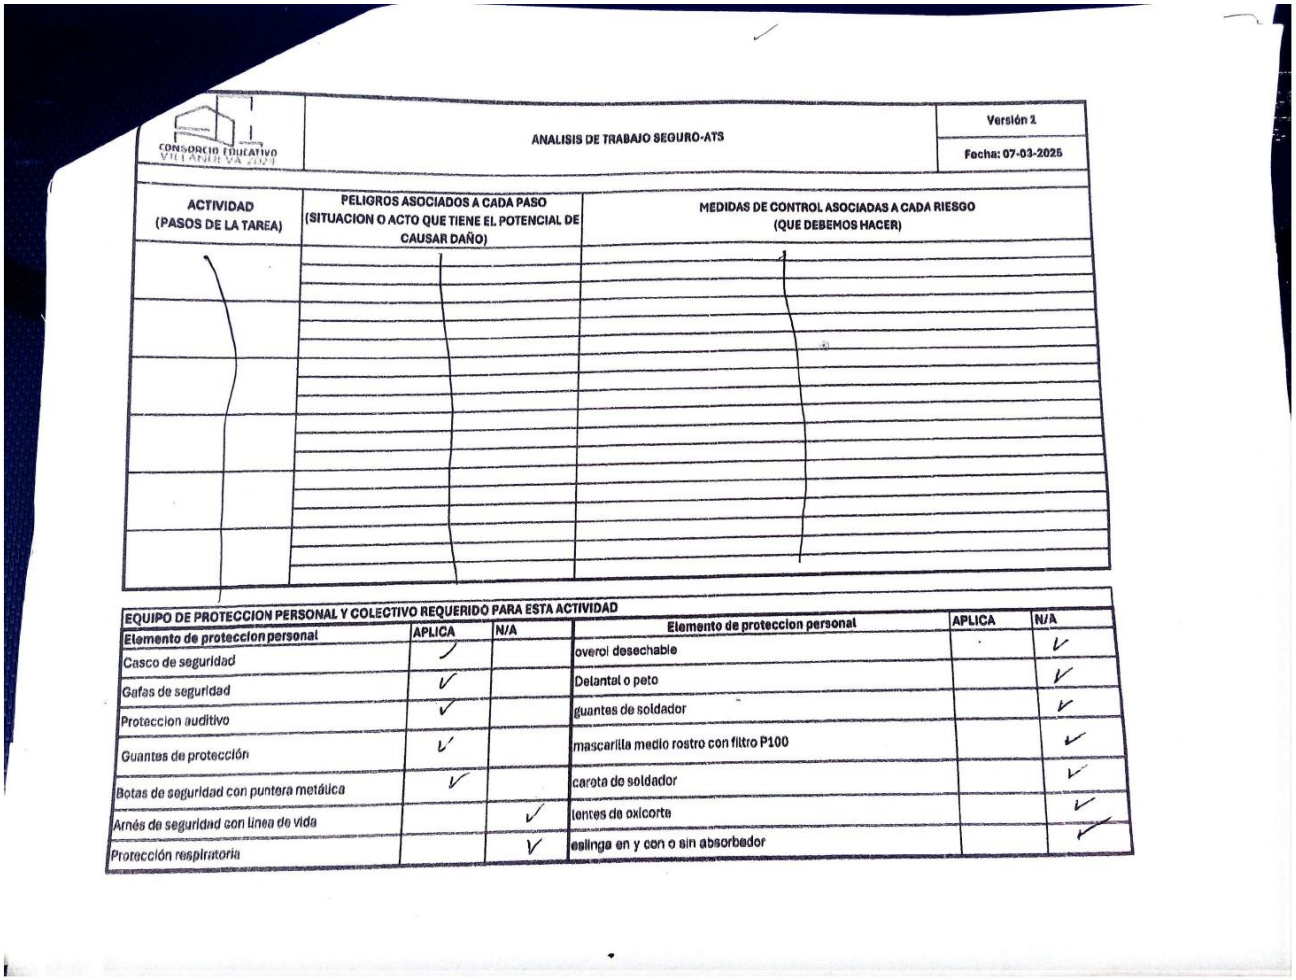

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS	Versión 1
	Fecha: 07-03-2025


ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO REQUERIDO PARA ESTA ACTIVIDAD

Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A	Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A
Casco de seguridad	✓		overol desechable		✓
Gafas de seguridad	✓		Delantal o peto		✓
Proteccion auditivo	✓		guantes de soldador		✓
Guantes de protección	✓		mascarilla medio rostro con filtro P100		✓
Botas de seguridad con puntera metálica	✓		careta de soldador		✓
Arnés de seguridad con linea de vida		✓	lentes de oxicorte		✓
Protección respiratoria		✓	eslinga en y con o sin absorbedor		✓

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

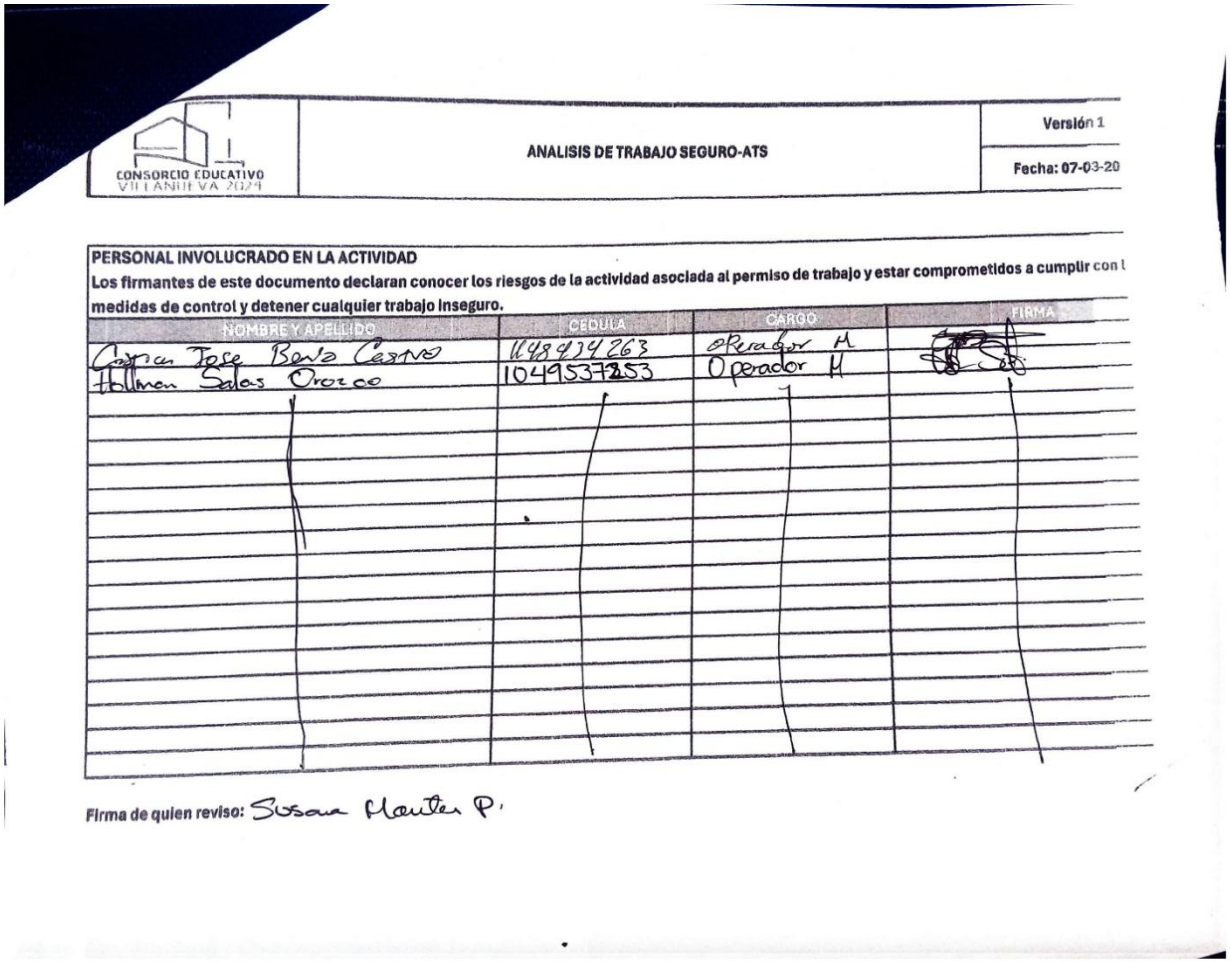

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS

Versión 1

Fecha: 07-03-20

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

Los firmantes de este documento declaran conocer los riesgos de la actividad asociada al permiso de trabajo y estar comprometidos a cumplir con l medidas de control y detener cualquier trabajo inseguro.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FIRMA
Carlos Jose Baez Castro	1148934263	Operador M	
Holman Salas Orozco	1049537253	Operador M	

Firma de quien reviso: Susana Montes P.

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO
TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS

Versión 1
Fecha: 07-03-2025

IDENTIFICACION

Proyecto o Área: Colegio Villanueva
Inspector HSE: Jhoan Mata Ciudad: Villanueva
Encargado/ supervisor contratista: Rafael Arteaga
Semana de 16 Al 21 Año 2025 Junio.
Actividad a realizar: Corte y figurado de Hierro.
Herramientas y/o equipos:, polidora, cortadora de hierro,

ACTIVIDAD (PASOS DE LA TÁREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)
Inspeccion de Herramientas	Caida al mismo nivel	Orden y aseo
Corte de hierro	Ruido Temperaturas extremas	Protector auditivo Hidratacion
Figurado	Posturas prolongadas Gases y Vapores Carga pesada	Pausas activas Epp Buena ventilacion Programa o manual de carga.

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO
TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS	Versión 1
		Fecha: 07-03-2025


ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO REQUERIDO PARA ESTA ACTIVIDAD

Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A	Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A
Casco de seguridad	✓		overol desechable		✓
Gafas de seguridad	✓		Delantal o peto	✓	
Proteccion auditivo	✓		guantes de soldador	✓	
Guantes de protección	✓		mascarilla medio rostro con filtro P100	✓	
Botas de seguridad con puntera metálica	✓		careta de soldador	✓	
Arnés de seguridad con linea de vida		✓	lentes de oxicorte	✓	
Protección respiratoria		✓	eslinga en y con o sin absorbedor		✓

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

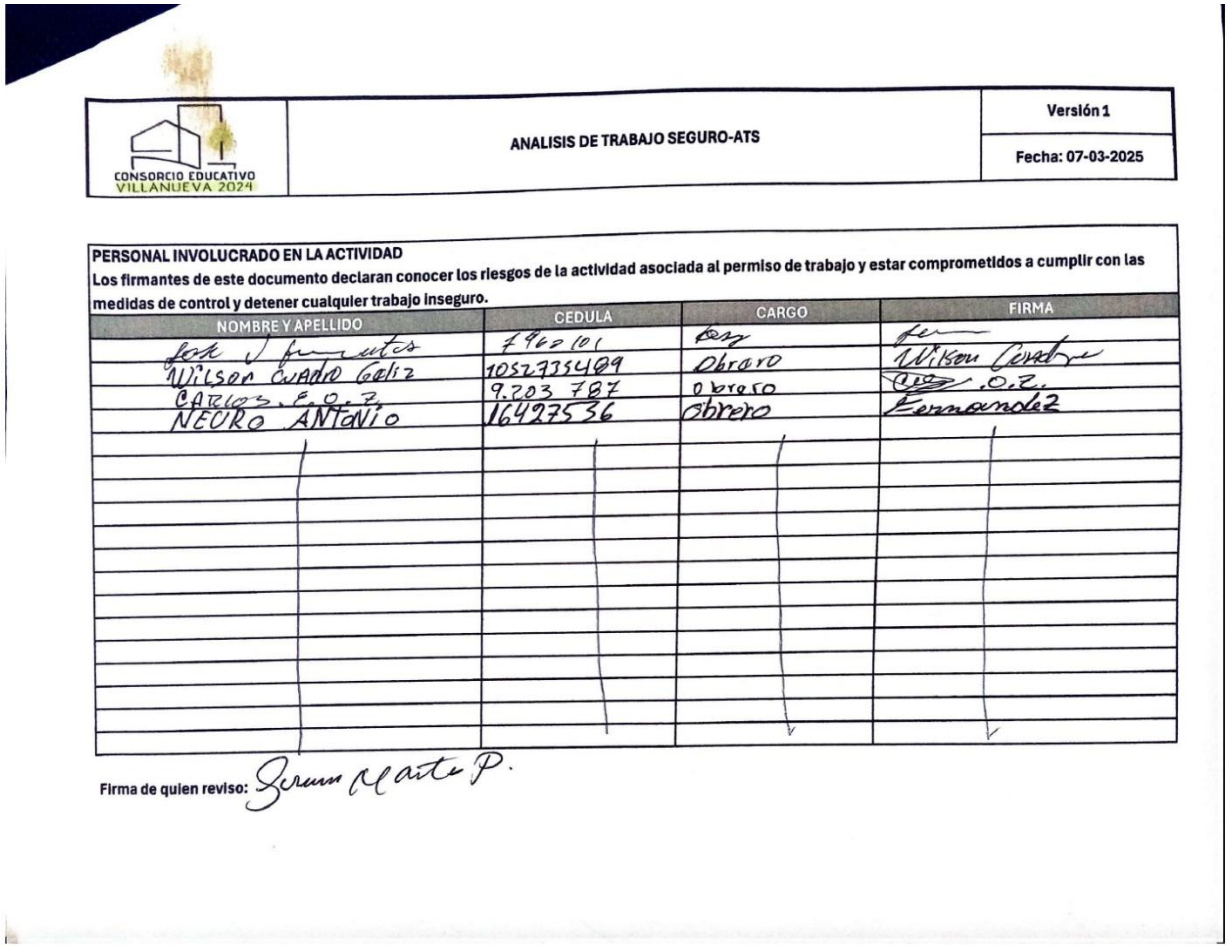

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS

Versión 1

Fecha: 07-03-2025

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

Los firmantes de este documento declaran conocer los riesgos de la actividad asociada al permiso de trabajo y estar comprometidos a cumplir con las medidas de control y detener cualquier trabajo inseguro.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FIRMA
José J. Fuentes	7962101	Jefe	
Wilson Cuadro Galiz	1052735409	Obrero	Wilson Cuadro
Carlos E. O. Z.	9.203 787	Obrero	C.O.Z.
NEURO ANTONIO	16427536	obrero	Fernandez

Firma de quien reviso: Jerum Mateo P.

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO
TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS

Versión 1

Fecha: 07-03-2025

IDENTIFICACION

Proyecto o Área: Colegio Villanueva
Inspector HSE: Sistem Mantis Ciudad: Villanueva
Encargado/ supervisor contratista:
Semana de 16 Al 21 Año 2025 Junio
Actividad a realizar: Excavación, retiro de Material y relleno de material.
Herramientas y/o equipos: Maquinaria: Retrocargador mini cargador

ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)
Excavación	Inspeccion de terreno Colisión de terceros	Orden y aseo Señalización de velocidad, Pitero.
Retiro de Material	Golpe de calor Lesiones potenciales	Hidratación Pausa en Trabajo
Relleno de Material.	Golpe de calor Postura inadecuada	Hidratación Pausa Activa Ergonomica

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS	Versión 1 Fecha: 07-03-2025


ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO REQUERIDO PARA ESTA ACTIVIDAD

Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A	Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A
Casco de seguridad	✓		overol desechable	✓	
Gafas de seguridad	✓		Delantal o peto		✓
Proteccion auditivo	✓		guantes de soldador		✓
Guantes de protección	✓		mascarilla medio rostro con filtro P100		✓
Botas de seguridad con puntera metálica	✓		careta de soldador		✓
Arnés de seguridad con linea de vida		✓	lentes de oxicorte		✓
Protección respiratoria		✓	eslinga en y con o sin absorbedor		✓

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

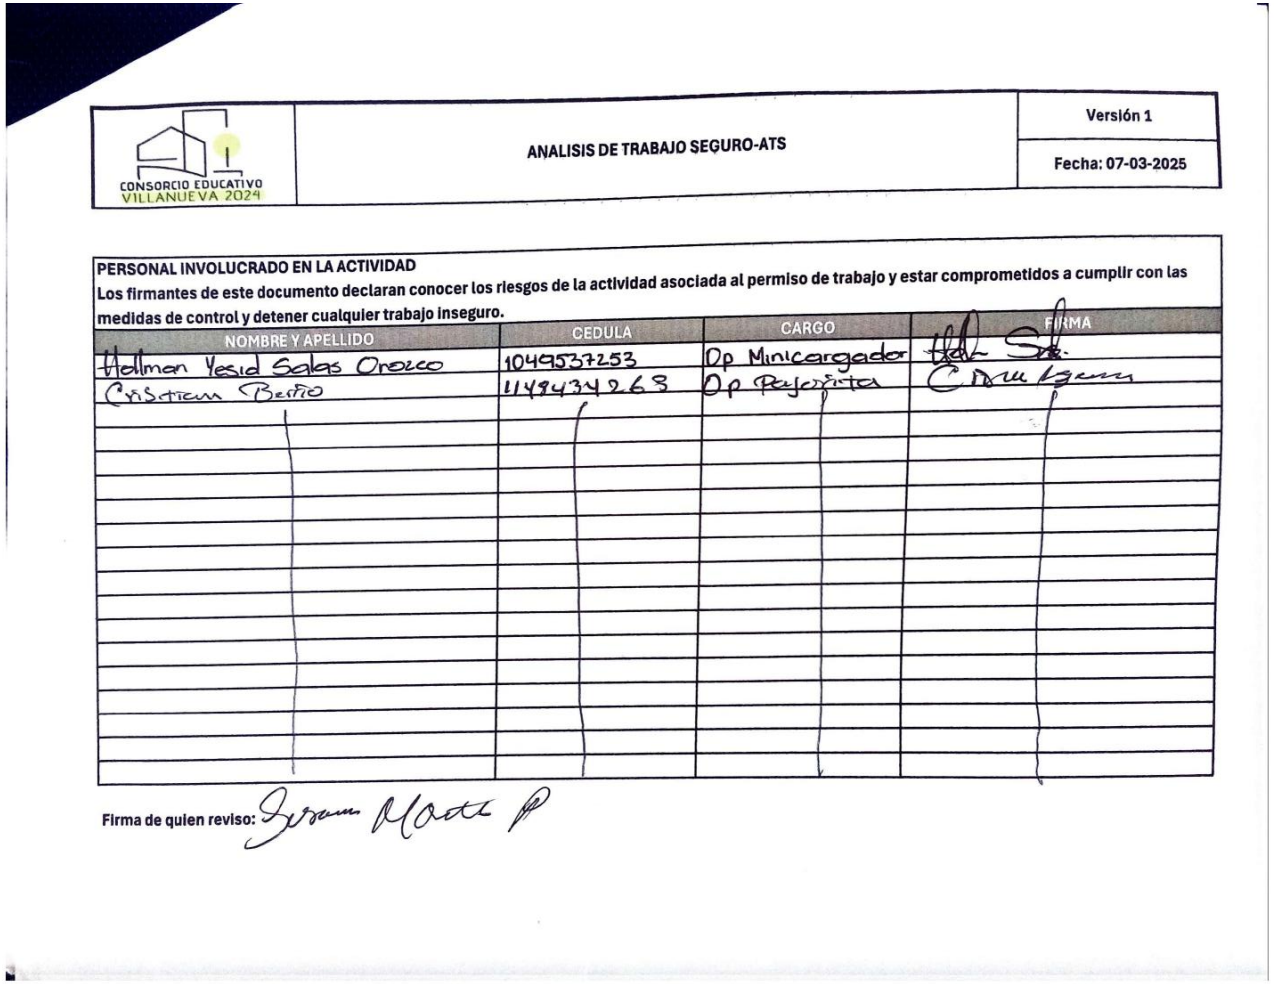

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS	Versión 1
	Fecha: 07-03-2025

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

Los firmantes de este documento declaran conocer los riesgos de la actividad asociada al permiso de trabajo y estar comprometidos a cumplir con las medidas de control y detener cualquier trabajo inseguro.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FIRMA
Hellman Yesid Salas Orozco	1049537253	Op Minicargador	
Cristian Bertio	1148434263	Op Retroexcavadora	

Firma de quien reviso:

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO
TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS	Versión 1
		Fecha: 07-03-2025


IDENTIFICACION

Proyecto o Área: Colegio Villanueva	Inspector HSE: Susana Nieto Ciudad: Cartagena
Encargado/ supervisor contratista: Dario el Altamiranda.	Semana de 24 Al 28 Año Junio 25
Actividad a realizar: levante de muro de encerramiento, Fundida, soldado Viga de encerramiento	Herramientas y/o equipos: Pico, Pala, bugui, Pedestal

ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)
Inspeccion de Herramientas	Caida de diferentes niveles	Orden y aseo
	Lluvias	Pausa a trabajo
	Golpe de calor	Hidratacion
Viga de encerramiento	Posturas inadecuadas	pausa activa
	Colicion de vehiculo	Reductor de velocidad
	Caida de objeto	inspeccion de herramientas
levante de muro de encerramiento	Caida de diferentes niveles	orden y aseo
	Lluvias	pausa al trabajo
	Golpe de calor	Hidratacion
Fundida de pedestal	Colicion de vehiculo	reductor de velocidad
	Caida de diferentes niveles	capacitacion
	Lluvia	pausa al trabajo
Soldado	Posturas inadecuadas	pausa activa
	Golpe de calor	Hidratacion
	Lluvias	pausa al trabajo

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

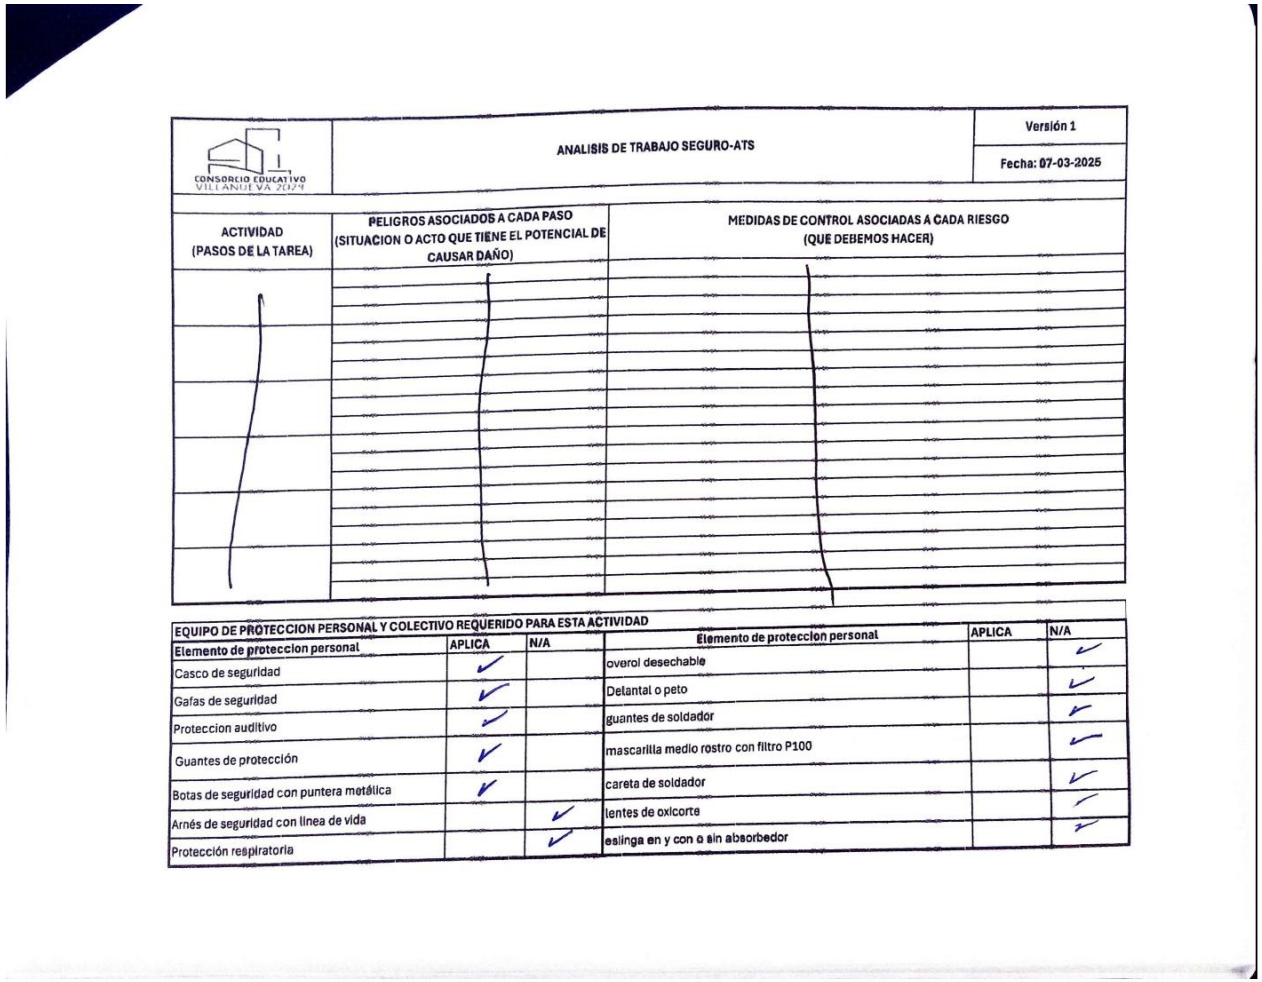

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS	Versión 1
	Fecha: 07-03-2025

ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO REQUERIDO PARA ESTA ACTIVIDAD

Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A	Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A
Casco de seguridad	✓		overol desechable		✓
Gafas de seguridad	✓		Delantal o peto		✓
Proteccion auditivo	✓		guantes de soldador		✓
Guantes de protección	✓		mascarilla medio rostro con filtro P100		✓
Botas de seguridad con puntera metálica	✓		careta de soldador		✓
Arnés de seguridad con linea de vida		✓	lentes de oxicorte		✓
Protección respiratoria		✓	eslinga en y con o sin absorbedor		✓

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO
TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS

Versión 1

Fecha: 07-03-2025

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

Los firmantes de este documento declaran conocer los riesgos de la actividad asociada al permiso de trabajo y estar comprometidos a cumplir con las medidas de control y detener cualquier trabajo inseguro.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FIRMA
MARION BEALES	7960 544	obrero	MARION
pablo Caballero Herrera	9203735	Obrero	
NEGRO ANTONIO	16927536	Obrero	
[illegible]	7960101	[illegible]	
Jesus A Palacio Melgarejo	1052734747	obrero	

Firma de quien reviso: [signature]

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

Nuevo

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS	Versión 1
		Fecha: 07-03-2025

IDENTIFICACION

Proyecto o Área: Colegio Villanueva	Inspector HSE: Jeison Plaste	Ciudad: Villanueva
Encargado/ supervisor contratista: Rafael Altamiranda	Semana de 24 Al 28 Año Junio 25	
Actividad a realizar: Figuracion de hierro, corte de hierro.	Herramientas y/o equipos: , Tronzadora, Polidora,	

ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)
Inspeccion de Herramientas	Caidas a distintos niveles	Orden y aseo
	Lluvias	Pausas activas
	Golpe de calor	Hidratacion
corte de Hierro	Material Particulado Humo	Gafas, Careta, Respirador, tapaboca.
	Sobre esfuerzo	Programa Osteomuscular
Figuracion de Hierro	Tarea Repetitiva Posturas inadecuadas	Pausas activas

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS	Versión 1 Fecha: 07-03-2025

ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO REQUERIDO PARA ESTA ACTIVIDAD

Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A	Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A
Casco de seguridad	✓		overol desechable		✓
Gafas de seguridad	✓		Delantal o peto	✓	
Proteccion auditivo	✓		guantes de soldador	✓	
Guantes de protección	✓		mascarilla medio rostro con filtro P100	✓	
Botas de seguridad con puntera metálica	✓		careta de soldador	✓	
Arnés de seguridad con linea de vida		✓	lentes de oxicorte	✓	
Protección respiratoria	✓		eslinga en y con o sin absorbedor		✓

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO
TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS

Versión 1

Fecha: 07-03-2025

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

Los firmantes de este documento declaran conocer los riesgos de la actividad asociada al permiso de trabajo y estar comprometidos a cumplir con las medidas de control y detener cualquier trabajo inseguro.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FIRMA
Dennis Reis Llamas	1192746773	Ayudante	Dennis Reis Llamas
Wilson Cuadro Galiz	1052735489	Almacenista	Wilson Cuadro
CARLOS E. OZ	9203787	Ayudante	
jorge polo	6632964	Oficial	jorge polo
jaider polo	1002475886	Oficial	jaider polo

Firma de quien reviso:

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS	Versión 1
		Fecha: 07-03-2025

IDENTIFICACION

Proyecto o Área: Colegio Villanueva	Inspector HSE: Sirdan Martes	Ciudad: Villanueva
Encargado/ supervisor contratista:	Semana de 24 Al 28 Año Junio 2025	
Actividad a realizar: Retiro de Material, Excavación, Relleno	Herramientas y/o equipos: mini cargador, Pulsonta	

ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)
Retiro de Material	Colisión de vehículos Golpe de calor lluvias	Reductor de velocidad Hidratación Suspensión de trabajo
Excavación	Postura prolongada Sobre esfuerzo Ruido	Pausas Activas Programa vistas visuales Protector auditivo
Relleno	Choque con objetos en movimientos	Capacitación

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS	Versión 1 Fecha: 07-03-2025


ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO REQUERIDO PARA ESTA ACTIVIDAD

Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A	Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A
Casco de seguridad	✓		overol desechable		✓
Gafas de seguridad	✓		Delantal o peto		✓
Proteccion auditivo	✓		guantes de soldador		✓
Guantes de protección	✓		mascarilla medio rostro con filtro P100		✓
Botas de seguridad con puntera metálica	✓		careta de soldador		✓
Arnés de seguridad con linea de vida		✓	lentes de oxicorte		✓
Protección respiratoria		✓	eslinga en y con o sin absorbedor		✓

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

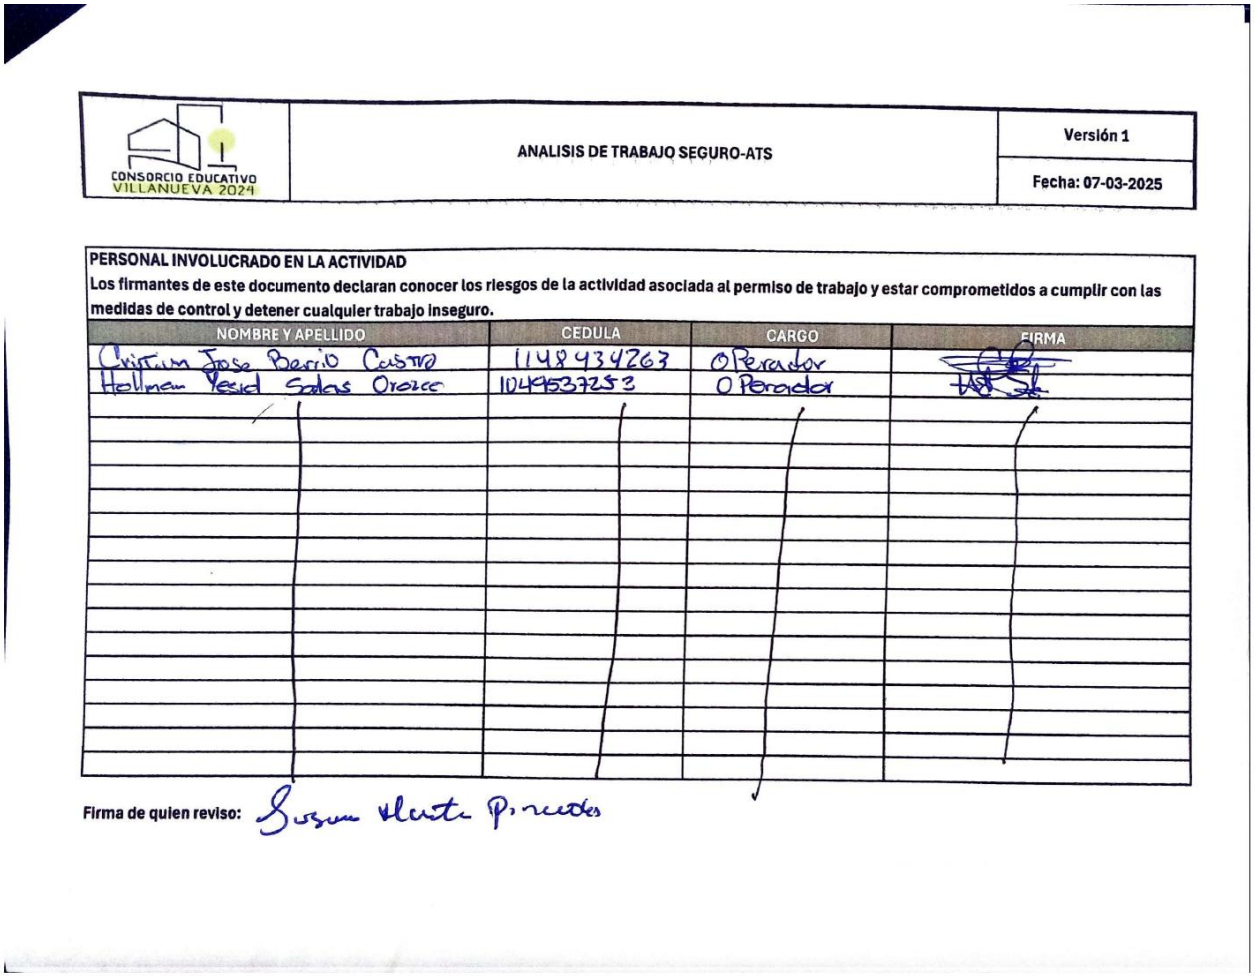

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS	Versión 1
	Fecha: 07-03-2025

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

Los firmantes de este documento declaran conocer los riesgos de la actividad asociada al permiso de trabajo y estar comprometidos a cumplir con las medidas de control y detener cualquier trabajo inseguro.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FIRMA
Cristian Jose Barrio Castro	1148434263	Operador	
Hollman Yesid Solas Orozco	1049537253	Operador	

Firma de quien reviso: Susana Maria Pineda

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

Listado del Personal en Obra

Durante el mes de junio de 2025, se contó con la presencia de personal operativo, técnico y administrativo en el sitio de obra, desempeñando diferentes funciones relacionadas con las actividades constructivas del proyecto.

A continuación, se presenta el listado general del personal que prestó sus servicios en obra durante el período reportado:

PERSONAL EN EL PROYECTO INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA-DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURA SAS						
IDENTIFICACION	**NOMBRE**	**APELLIDO**	**CARGO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**
1.047.509.878	Luis David	Flechas Dix	Auxiliar logístico y conductor	Sura	Salud total	Porvenir
8.167.129	Eduardo	Mena Martínez	Topógrafo	Sura	Mutual ser	Porvenir
1.049.537.253	Holman Yesid	Salas Orozco	Operador Minicargador	Sura	Coosalud	Porvenir
3.800.352	Daniel	Altamar	Conductor	Sura	Coosalud	Porvenir

Consorcio educativo Villanueva 2024						
1143385964	Adrián	Ortega	Ingeniero Residente	Sura	Coosalud	Porvenir
1053007128	Guillermo Enrique	Manrique Herrera	Ingeniero Auxiliar	Sura	Nueva EPS	Porvenir
1128057070	Susana Patricia	Montes Pineda	Auxiliar HSEQ	Sura	Salud total	Porvenir
1052738841	Roberto Luis	Junco Rodríguez	Vigilante	Sura	No aplica	No aplica
9203294	Luis Alfredo	Junco Ayola	Vigilante	Sura	No aplica	No aplica
1002475840	Luis Enrique	Ortiz Velasco	Oficios Varios	Sura	Mutual ser	Porvenir
9202271	José Gregorio	Pedroza Cera	Vigilante	Sura	Mutual ser	Porvenir
1048437853	Derlis Sídney	Jiménez Blanco	Almacenista	Sura	Nueva EPS	Porvenir
1143377901	Rafael enrique	Altamiranda González	Director de Obra	Sura	salud total	Porvenir

Cra 29B 29ª 81 Callejón Méndez, Brr Pie de la popa
(605) 665 7337 - 3214366620
consorcioeducativovillanueva@gmail.com

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR-INTERVENTORIA						
1143367505	Klisman York	Atencio Ruiz	Residente De Interventoría	Sura	Cajacopi	
1048601909	Farid Lenin	Orozco García	Auxiliar HSEQ Interventoría	Sura	Salud total	Porvenir
15023551	Wilder	Quezada	Director de interventoría	Sura	Sura	No aplica

CONTRATISTA JHONNY RAFAEL TAPIA MUÑOZ						
IDENTIFICACION	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	ARL	RIESGO	INICIO COBERTURA
9203787	Carlos Enrique	Orozco Zúñiga	Ayudante	Sura	5	10/06/2025
1052735489	Wilson	Cuadro Gelvez	Ayudante	Sura	5	10/06/2025
9204056	Mauricio	Quintero Velasco	Ayudante	Sura	5	10/06/2025
9203768	Manuel	Cera Beleño	Ayudante	Sura	5	10/06/2025
9203235	Pablo	sabalza Herrera	Ayudante	Sura	5	10/06/2025
1052731541	Oscar Enrique	Torres Geliz	Ayudante	Sura	5	10/06/2025
73230732	Jhonny Rafael	Tapia Muñoz	Ayudante	Sura	5	10/06/2025
73151526	Rafael Enrique	Altamiranda Goenaga	Ayudante	Sura	5	10/06/2025
9202313	Gustavo	Almeida Parra	Ayudante	Sura	5	10/06/2025
9201689	Cosme Damián	Parra Pérez	Ayudante	Sura	5	10/06/2025
1192742613	Deivis	Ríos llamas	Ayudante	Sura	5	10/06/2025
1052734797	Jesús Antonio	Palacio Melgarejo	Ayudante	Sura	5	10/06/2025
9202314	Luis Miguel	Villareal Zúñiga	Ayudante	Sura	5	10/06/2025
7960544	Marlon	Reales Pérez	Ayudante	Sura	5	10/06/2025
6632964	Jorge Luis	Polo Ligardo	Ayudante	Sura	5	10/06/2025
1002475886	Jaider Luis	Polo Liñán	Ayudante	Sura	5	10/06/2025
6198593	Neuro Antonio	Fernández Chacín	Ayudante	Sura	5	10/06/2025
1002475076	Oscar Eduardo	Zúñiga Cabarcas	Ayudante	Sura	5	10/06/2025
7960101	José Víctor	Fuentes Otero	Ayudante	Sura	5	10/06/2025
7960809	Luis Eduardo	Pertuz Cantillo	Ayudante	Sura	5	10/06/2025

EMPRESA PERSONA NATURAL LUIS MIGUEL GUTIERREZ BOLAÑOS						
IDENTIFICACION	NOMBRE	APELLIDO	CARGO	ARL	RIESGO	
1148434263	Cristian José	Berrio Castro	Operador Retroexcavadora	Positiva	5	11/04/2025

Cra 29B 29ª 81 Callejón Méndez, Brr Pie de la popa
(605) 665 7337 - 3214366620
consorcioeducativovillanueva@gmail.com

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CARACTERIZACION DEL PERSONAL

ITEM	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	APELLIDOS	GÉNERO	FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)	EDAD	LUGAR DE NACIMIENTO (Municipio)	NACIONALIDAD	LUGAR DE RESIDENCIA (Municipio)	DIRECCIÓN RESIDENCIA	FIJO/ CASO DE EMERGENCIA	CELULAR	FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)	FECHA DE RETTIRO	ANTIGÜEDAD	CARGO
1	16427536	NEURO ANTONIO	FERNANDEZ CHAZI	masculino	5/07/1976	51	villanueva-bolivar	VENEZOLANO	ARENAL	VIA SANTANA	0	3152395963	20/05/2025			OBRERO
2	9203787	CARLOS ENRRIQU	OROZCO ZUÑIGA	masculino	5/05/1979	46	villanueva-bolivar	COLOMBIANA	VILLANUEVA	BARRIO EL PUEBLO - INVACION 20 DE ENE	0	3002027056	20/05/2025			OBRERO
3	1052731541	OSCAR	TORRES GELIS	masculino	10/06/1987	38	villanueva-bolivar	COLOMBIANA	VILLANUEVA	BARRIO POZO ONDO	0	3044605618	20/05/2025			OBRERO
4	7960544	MARLON ENRRIQU	REALES PEREZ	masculino	17/10/1979	45	villanueva-bolivar	COLOMBIANA	ARENAL	RINCON JUAPO	0	3209000812	20/05/2025			OBRERO
5	1192742613	DEIVIS	RIOS LLAMA	masculino	24/02/1990	35	villanueva-bolivar	COLOMBIANA	VILLANUEVA	BARRIO POZO ONDO	0	3171866769	20/05/2025			OBRERO
6	1052734797	JESUS ANTONIO	PALACIO MELGAREJO	masculino	12/12/1988	36	villanueva-bolivar	COLOMBIANA	VILLANUEVA	URBANZACION VILLACAMILA	0	3507482701	20/05/2025			OBRERO
7	9203235	PABLO	SABALZA HERRERA	masculino	13/03/1976	48	villanueva-bolivar	COLOMBIANA	VILLANUEVA	URBANZACION VILLACAMILA	0	3136051907	20/05/2025			OBRERO
8	9203768	MANUEL	CERA BELEÑO	Masculino	14/08/1976	48	villanueva-bolivar	COLOMBIANA	VILLANUEVA	BARRIO POZO ONDO	0	3237307452	20/05/2025			OBRERO
9	9202313	GUSTAVO	ALMEIDA PARRA	Masculino	18/07/1971	53	villanueva-bolivar	COLOMBIANA	VILLANUEVA	BARRIO EL PUEBLO - INVACION 20 DE ENE	0	0000000000	20/05/2025			OBRERO
10	1052731486	RAMIRO	RODRIGO BELEÑO	Masculino	21/06/1986	38	villanueva-bolivar	COLOMBIANA	VILLANUEVA	BARRIO EL PUEBLO - INVACION 20 DE ENE	0	3242656168	20/05/2025			OBRERO
11	9201689	COSMEN DAMIAN	PARRA PEREZ	Masculino	23/02/1966	59	villanueva-bolivar	COLOMBIANA	VILLANUEVA	BARRIO EL PUEBLO - SEC LOMA FRESCA	0	3215076421	20/05/2025			OBRERO
12	9202314	LUIS MIGUEL	VILLAREAL ZUÑIGA	masculino	8/07/1963	63	villanueva-bolivar	COLOMBIANA	VILLANUEVA	BARRIO EL PUEBLO CALL PRINCIPAL	0	3236185927	20/05/2025			OBRERO
13	1002475076	OSCAR	ZUÑOGA CABARCA	masculino	3/01/1995	32	villanueva-bolivar	COLOMBIANA	VILLANUEVA	BARRIO EL PUEBLO - INVACION 20 DE ENE	0	3116269252	20/05/2025			OBRERO
14	6632964	JORGE LUIS	POLO LIGARDO	masculino	6/05/1968	57	villanueva-bolivar	COLOMBIANA	VILLANUEVA	BARRIO CAIMITO	0	3116269253	20/05/2025			OBRERO
15	1052735489	WILSON	CUADRO GELIS	masculino	3/11/1991	33	villanueva-bolivar	COLOMBIANA	VILLANUEVA	CONCOLON	0	3244425096	20/05/2025			OBRERO
16	9204056	MAURICI	QUINTERO VELAZQUE	masculino	08/08(1981	43	villanueva-bolivar	COLOMBIANA	VILLANUEVA	BARRIO MIRAFLORES	0	3004246592	20/05/2025			OBRERO

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

	FICHA INFORMACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO							
FECHA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 04-07-2025			NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA INFORMACIÓN: EQUIPO DE INTERVENTORIA					
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR							
PROYECTO	3222 DE 2024							
OBJETO	CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR							
ESPECIFICAR NÚMERO O NOMBRE DE LA CALLE QUE ESTA SIENDO INTERVENIDA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR							
CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR							
VALOR DE INTERVENTORIA	$ 1.204.724.965							
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024							
VALOR DE OBRA	$ 25.088.711.401							
PLAZO	CATORCE (14) MESES							
SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – GOBERNACION DE BOLIVAR							
ESTADO ACTUAL	EN EJECUCION							
NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS	22							
NÚMERO DE EMPLEOS LOCALES DE LA INTERVENCIÓN	16							
ORIGEN ETNICO DE LAS PERSONAS CONTRATADAS	INDIGENA	CANTID	AFRODECENDIENTES	CANTID	RAIZAL	CANTID	GITANOS	CANTIDA
				1		5		
CLASIFICACIÓN URBANISTICAS DE LAS PERSOBAS CONTRATADAS	RURAL	CANTIDAD	URBANO	CANTIDAD				
	16		8					
PERSONAS EN ESTADO DE DISCAPACIDAD	SI	CANTIDAD	NO	CANTIDAD				
	X	1						
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	SI	CANTIDAD	NO	CANTIDAD				
	X	4						

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

CÓDIGO: FOR-MT-017
VERSIÓN: 1
FECHA: 17/05/2024

PROYECTO: Colegio Villanueva — FECHA: 03/06/2025 - 07/06/2025

TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO: Bulldozer ☐ Retroexcavadora ☒ Cargador ☐ Minicargador ☐ Motoniveladora ☐ Excavadora ☐ Pisoteadora ☐ Paladraga ☐ Autohormigonera ☐ Vibrocompactador ☐ Otra ☐

PROPIETARIO: Mateo Duque — OPERADOR: Cristian Benio

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

1. ASPECTO A INSPECCIONAR	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Verificar nivel de aceite motor	X			
Verificar nivel de refrigerante	X			
Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X			
Verificar estado de las correas	X			
Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X			
Drenar filtro separador de agua			X	
Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X			
Verificar nivel de aceite hidraulico	X			
Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema	X			
Verificar funcionamiento de los mandos	X			
Verificar estado de los cilindros hidraulicos	X			
Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo,	X			
Verificar funcionamiento del tablero	X			
Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X			
Verificar estado de baterias y luces	X			
Verificar estado general de las llantas	X			
Verificar estado y funcionamiento de frenos	X			
Verificar el estado de la barra antivuelco			X	
Verificar estado de vidrios y espejos	X			
Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	X			
Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes,	X			
Verificar estado del rodillo y acoples	X			

2. AUTOHORMIGONERA	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Canal				
Hidrolavadora				
Bomba sube-baja canal				
Tanque de agua				
Pala de carga				
Tambor				
Tablero de mezcla				

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	X		
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo	X		
El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?			
Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST	Vo.Bo Operador
FIRMA NOMBRE		Cristian Benio
C.C		1148934263

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

CÓDIGO: FOR-MT-017
VERSIÓN: 1
FECHA: 17/06/2024

PROYECTO Colegio Villanueva **FECHA** 09/06/2025 AL 14/06/2025

TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO: Buldozer ☐ Retroexcavadora ☒ Cargador ☐ Minicargador ☐ Piloteadora ☐ Paladraga ☐ Motoniveladora ☐ Excavadora ☐ Mezcladora de trompo ☐ Vibrocompactador ☐ Otra ☐

PROPIETARIO **OPERADOR** Cristian

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

1. ASPECTO A INSPECCIONAR	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
1.1 Verificar nivel de aceite motor	X		X		X		X		X		X			
1.2 Verificar nivel de refrigerante	X		X		X		X		X		X			
1.3 Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X		X		X		X		X		X			
1.4 Verificar estado de las correas	X		X		X		X		X		X			
1.5 Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X		X		X		X		X		X			
1.6 Drenar filtro separador de agua	X		X		X		X		X		X			
1.7 Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
1.8 Verificar nivel de aceite hidraulico	X		X		X		X		X		X			
1.9 Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	X		X		X		X		X		X			
1.10 Verificar funcionamiento de los mandos	X		X		X		X		X		X			
1.11 Verificar estado de los cilindros hidraulicos	X		X		X		X		X		X			
1.12 Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tomamesa, etc)	X		X		X		X		X		X			
1.13 Verificar funcionamiento del tablero	X		X		X		X		X		X			
1.14 Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X		X		X		X		X		X			
1.15 Verificar estado de baterias y luces	X		X		X		X		X		X			
1.16 Verificar estado general de las llantas	X		X		X		X		X		X			
1.17 Verificar estado y funcionamiento de frenos	X		X		X		X		X		X			
1.18 Verificar el estado de la barra antivuelco	X		X		X		X		X		X			
1.19 Verificar estado de vidrios y espejos	X		X		X		X		X		X			
1.20 Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	X		X		X		X		X		X			
1.21 Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	X		X		X		X		X		X			
1.22 Verificar estado del rodillo y acoples	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
2. Mezcladora de Trompo														
2.1 Tolva de alimentacion														
2.2 Motor														
2.3 Tanque de agua														
2.4 Llantas														
2.5 canaleta														
2.7 trompo de mezcla														

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
3.1 Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3.2 El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo	✓		
3.3 El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	✓		
3.4 Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST	Vo.Bo Operador
FIRMA NOMBRE	Sixcen Martin	Cristian
C.C	1128053070	1148432673

PDF Scanner ACE Scanner

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

CÓDIGO: FOR-MT-017
VERSIÓN: 1
FECHA: 17/06/2024

PROYECTO	Colegio Villanueva	FECHA	016/06/2025 al 21/06/25
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ☐ Retroexcavadora ☒ Cargador ☐ Minicargador ☐ Piloteadora ☐ Paladraga ☐ Motoniveladora ☐ Excavadora ☐ Mezcladora de trompo ☐ Vibrocompactador ☐ Otra _____		
PROPIETARIO		OPERADOR	Cristian Bello

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

1. ASPECTO A INSPECCIONAR	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
1.1 Verificar nivel de aceite motor	X		X		X		X		X		X			
1.2 Verificar nivel de refrigerante	X		X		X		X		X		X			
1.3 Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X		X		X		X		X		X			
1.4 Verificar estado de las correas	X		X		X		X		X		X			
1.5 Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X		X		X		X		X		X			
1.6 Drenar filtro separador de agua	X		X		X		X		X		X			
1.7 Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
1.8 Verificar nivel de aceite hidraulico	X		X		X		X		X		X			
1.9 Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	X		X		X		X		X		X			
1.10 Verificar funcionamiento de los mandos	X		X		X		X		X		X			
1.11 Verificar estado de los cilindros hidraulicos	X		X		X		X		X		X			
1.12 Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, horquilla, etc)	X		X		X		X		X		X			
1.13 Verificar funcionamiento del tablero	X		X		X		X		X		X			
1.14 Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X		X		X		X		X		X			
1.15 Verificar estado de baterias y luces	X		X		X		X		X		X			
1.16 Verificar estado general de las llantas	X		X		X		X		X		X			
1.17 Verificar estado y funcionamiento de frenos	X		X		X		X		X		X			
1.18 Verificar el estado de la barra antivuelco	X		X		X		X		X		X			
1.19 Verificar estado de vidrios y espejos	X		X		X		X		X		X			
1.20 Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	X		X		X		X		X		X			
1.21 Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	X		X		X		X		X		X			
1.22 Verificar estado del rodillo y acoples	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
2. Mezcladora de Trompo														
2.1 Tolva de alimentacion							✓		✓					
2.2 Motor							✓		✓					
2.3 Tanque de agua							✓		✓					
2.4 Llantas							✓		✓					
2.5 canaleta							✓		✓					
2.6 trompo de mezcla							✓		✓					

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
3.1 Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3.2 El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo	✓		
3.3 El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	✓		
3.4 Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST	Vo.Bo Operador
FIRMA NOMBRE		Cristian Bello
C.C	1128053070	1148434763

PDF Scanner ACE Scanner

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

CÓDIGO: FOR-MT-017
VERSIÓN: 1
FECHA: 17/06/2024

PROYECTO	Colegio Villanueva	**FECHA**	24/06/2025 - 29/06/2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ☐ Retroexcavadora ☐ Cargador ☒ Minicargador ☐ Piloteadora ☐ Paladraga ☐ Motoniveladora ☐ Excavadora ☐ Mezcladora de trompo ☐ Vibrocompactador ☐ Otra ____		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Cristian Berrio

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

1. ASPECTO A INSPECCIONAR	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
1.1 Verificar nivel de aceite motor	X		X		X		X							
1.2 Verificar nivel de refrigerante	X		X		X		X							
1.3 Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X		X		X		X							
1.4 Verificar estado de las correas	X		X		X		X							
1.5 Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X		X		X		X							
1.6 Drenar filtro separador de agua	X		X		X		X							
1.7 Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X		X		X		X							
1.8 Verificar nivel de aceite hidraulico	X		X		X		X							
1.9 Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	X		X		X		X							
1.10 Verificar funcionamiento de los mandos	X		X		X		X							
1.11 Verificar estado de los cilindros hidraulicos	X		X		X		X							
1.12 Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	X		X		X		X							
1.13 Verificar funcionamiento del tablero	X		X		X		X							
1.14 Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X		X		X		X							
1.15 Verificar estado de baterias y luces	X		X		X		X							
1.16 Verificar estado general de las llantas	X		X		X		X							
1.17 Verificar estado y funcionamiento de frenos	X		X		X		X							
1.18 Verificar el estado de la barra antivuelco	N/A		N/A		N/A		N/A							
1.19 Verificar estado de vidrios y espejos	X		X		X		X							
1.20 Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	N/A		N/A		N/A		N/A							
1.21 Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	X		X		X		X							
1.22 Verificar estado del rodillo y acoples	N/A		N/A		N/A		N/A							

2. Mezcladora de Trompo	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
2.1 Tolva de alimentacion														
2.2 Motor														
2.3 Tanque de agua														
2.4 Llantas														
2.5 canaleta														
2.7 trompo de mezcla														

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
3.1 Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?			
3.2 El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo			
3.3 El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?			
3.4 Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?			

	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST	Vo.Bo Operador
FIRMA NOMBRE	Susana Mesa	Cristian Berrio
C.C	1128054070.	

ACE Scanner
consorciotransformareducativob@gmail.com

[redacted]

ANEXO 6: PRE OPERACIONAL MINICARGAFOR

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

PRE OPERACIONAL MINI CARGADOR

CÓDIGO: FOR-MT-014
VERSION: 01
FECHA: 17/07/2024

SEMANA DEL 03 AL 07 MES Mayo 2025 SERIE PROYECTO Colegio Villanueva

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Apoyo de material y movimiento de material

OPERADOR: Holman UBICACIÓN: Villanueva

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo NA: No aplica para ambas casilla

ITEM	PARÁMETRO A REVISAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras			✓		✓		✓		✓					
	Direccionales traseras			✓		✓		✓		✓					
	De trabajo delanteras														
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓					
	De frenado			✓		✓		✓		✓					
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)			✓		✓		✓		✓					
	Pito			✓		✓		✓		✓					
	Alarma retroceso									✓					
	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓					
	Frenos de servicio			✓		✓		✓		✓					
	Freno de parqueo			✓		✓		✓		✓					
	Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)			✓		✓		✓		✓					
	Extintor contra incendio														
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓					
	Espejos laterales														
	Espejo central convexo														
	Pasamanos de acceso														
	Dirección			✓		✓		✓		✓					
	Bateria y cables			✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓					
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro			✓		✓		✓		✓					
	Corona de tornameza en buen estado														
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓					
	Guardas														
	Llantas en buen estado			✓		✓		✓		✓					
	Estado del estabilizador														
FIRMAS	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE:	SI	NO	RESPONSABLE	FECHA
SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:				
REVISADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO:				
LLEVADO Y REVISADO AL ALMACÉN:				
OTRO:				

FIRMA DEL OPERARIO QUE REPORTA LA FALLA | FIRMA DEL SUPERVISOR SST

PDF Scanner ACE Scanner

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

PRE OPERACIONAL MINI CARGADOR

CÓDIGO: FOR-MT-014
VERSION: 01
FECHA: 17/07/2024

SEMANA DEL 09 AL 14 MES Junio 25 SERIE: _____ PROYECTO: Villanueva

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Retiro de material y Relleno

OPERADOR: Holman Salas Orozco UBICACIÓN: Villanueva

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

ITEM	PARÁMETRO A REVISAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras														
	Direccionales traseras														
	De trabajo delanteras	✓		✓		✓									
	De trabajo traseras	✓		✓		✓									
	De frenado	✓		✓		✓									
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓		0		0		6		0	
	Pito	✓		✓		✓									
	Alarma retroceso														
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓						6			
	Frenos de servicio	✓		✓		✓									
	Freno de parqueo	✓		✓		✓		0		0		0			
	Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor)	✓		✓		✓									
	Extintor contra incendio													0	
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓									
	Espejos laterales							0							
	Espejo central convexo									0					
	Pasamanos de acceso	✓		✓		✓									
	Dirección	✓		✓		✓						0			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		0						6	
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓									
	Estado pasadores	✓		✓		✓									
	Mecanismo de giro									0		0			
	Corona de tornameza en buen estado														
	Mandos de avance	✓		✓		✓								0	
	Guardas							0							
	Llantas en buen estado	✓		✓		✓				6		0			
	Estado del estibador														
FIRMAS	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE:	SI	NO	RESPONSABLE	FECHA
SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:				
REVISADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO:				
SEPARADO Y REMITIDO AL ALMACÉN:				
OTRO:				

FIRMA DEL OPERARIO QUE REPORTA LA FALLA	FIRMA DEL SUPERVISOR SST

PDF Scanner ACE Scanner

CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

PRE OPERACIONAL MINI CARGADOR

CÓDIGO: FOR-MT-014
VERSION: 01
FECHA: 17/07/2024

SEMANA DEL 16 AL 21 MES Junio 2025 SERIE: _____ PROYECTO: Colegio Villanueva

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Retiro y relleno de material. UBICACIÓN: villanueva.

OPERADOR: [illegible] Yesid Salas Orozco

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

ITÉM	PARÁMETRO A REVISAR	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES	Direccionales delanteras														
	Direccionales traseras			✓				✓	✓	✓		✓			
	De trabajo delanteras			✓				✓	✓	✓		✓			
	De trabajo traseras			✓				✓	✓	✓		✓			
	De frenado	G		✓				✓	✓	✓		✓		G	
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)			✓				✓	✓	✓		✓			
	Pito					O								G	
	Alarma retroceso							✓	✓	✓		✓			
	Cinturón de seguridad			✓				✓	✓	✓		✓			
	Frenos de servicio			✓				✓	✓	✓		✓			
	Freno de parqueo			✓				✓	✓	✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor)			✓				✓	✓	✓		✓			
	Extintor contra incendio			NO				NO	✓	NO		NO		G	
	Asiento en buen estado	G		✓		G				✓					
	Espejos laterales														
	Espejo central convexo														
	Pasamanos de acceso			✓				✓	✓	✓		✓			
	Dirección			✓				✓	✓	✓		✓		G	
	Batería y cables			✓				✓	✓	✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			✓				✓	✓	✓		✓			
	Estado pasadores			✓		G									
	Mecanismo de giro	G												G	
	Corona de tornameza en buen estado														
	Mandos de avance			✓				✓	✓	✓		✓			
	Guardas														
	Llantas en buen estado			✓				✓	✓	✓		✓			
	Estado del estibador														
FIRMAS	FIRMA OPERADOR			[signature]				[signature]	[signature]	[signature]		[signature]			
	FIRMA SUPERVISOR SST			[signature]											

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE:	SI	NO	RESPONSABLE	FECHA
SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:				
REVISADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO:				
SEPARADO Y REMITIDO AL ALMACÉN:				
OTRO:				

FIRMA DEL OPERARIO QUE REPORTA LA FALLA | **FIRMA DEL SUPERVISOR SST**

ACE Scanner

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 02
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

PRE OPERACIONAL MINI CARGADOR

CÓDIGO: FOR-MT-014
VERSION: 01
FECHA: 17/07/2024

SEMANA DEL 24 AL 28 MES 06 /25 SERIE: PROYECTO: Colegio Villanueva

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Retiro de Material Pellano UBICACIÓN: Villa Nueva

OPERADOR: Hellman Yesid Solas O

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

ITÉM	PARÁMETRO A REVISAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras														
	Direccionales traseras														
	De trabajo delanteras			✓		✓		✓							
	De trabajo traseras			✓		✓		✓							
	De frenado			✓		✓		✓							
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)			✓		✓		✓							
	Pito			✓		✓									
	Alarma retroceso														
	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓							
	Frenos de servicio			✓		✓		✓							
	Freno de parqueo			✓		✓		✓							
	Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor)			✓		✓		✓							
	Extintor contra incendio			NO		NO		NO							
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓							
	Espejos laterales														
	Espejo central convexo														
	Pasamanos de acceso			✓		✓		✓							
	Dirección			✓		✓		✓							
	Batería y cables			✓		✓		✓							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓							
	Estado pasadores			✓		✓		✓							
	Mecanismo de giro														
	Corona de tornameza en buen estado														
	Mandos de avance			✓		✓		✓							
	Guardas														
	Llantas en buen estado			✓		✓		✓							
	Estado del estibador														
FIRMAS	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE:	SI	NO	RESPONSABLE	FECHA
SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:				
REVISADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO:				
SEPARADO Y REMITIDO AL ALMACÉN:				
OTRO:				

FIRMA DEL OPERARIO QUE REPORTA LA FALLA	FIRMA DEL SUPERVISOR SST

PDF Scanner ACE Scanner

ANEXO 7: PRE OPERACIONAL PULIDORA

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	PRE - OPERACIONAL PULIDORA	CÓDIGO: FOR-MT-019
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 22/06/2024

Proyecto: Colegio Villanueva — Area/proceso: Levante de encerramiento

Mes/Año: 24/06/25 — Equipo Propio: — Contratista: Rafael — Otro:

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

Descripción	L	M	M	J	V	S	D
El equipo está limpio y sin residuos peligrosos		✓	✓	✓	✓	✓	
Etiquetas de advertencia visibles y legibles		✓	✓	✓	✓	✓	
Número de serie visible y sin alteraciones		✓	✓	✓	✓	✓	
Cable de alimentación en buen estado (sin cortes, empates ni peladuras)		✓	✓	✓	✓	✓	
Enchufe sin daños y con conexión a tierra		✓	✓	✓	✓	✓	
Interruptor de encendido/apagado funciona correctamente		✓	✓	✓	✓	✓	
Protector de disco ajustado y firme		✓	✓	✓	✓	✓	
Disco de corte/lijado en buen estado (sin grietas, astillas o desgaste excesivo)		✓	✓	✓	✓	✓	
Tornillos y piezas bien ajustadas y sin holguras		✓	✓	✓	✓	✓	
No se perciben olores extraños al encender		✓	✓	✓	✓	✓	
Nivel de ruido normal al encender (sin vibraciones excesivas)		✓	✓	✓	✓	✓	
Gafas o careta de protección facial		✓	✓	✓	✓	✓	
Guantes dieléctricos o mecánicos resistentes		✓	✓	✓	✓	✓	
Tapabocas o respirador (según el material a cortar)		✓	✓	✓	✓	✓	
Protectores auditivos		✓	✓	✓	✓	✓	
Botas de seguridad con punta reforzada		✓	✓	✓	✓	✓	
Área libre de materiales combustibles		✓	✓	✓	✓	✓	
Buenas condiciones de iluminación		✓	✓	✓	✓	✓	
Señalización de uso de herramientas rotativas		✓	✓	✓	✓	✓	
¿ÉL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?		✓	✓	✓	✓	✓	
INSPECCIONADO POR:		Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	
REVISÓ Y APROBÓ:		Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	

Obsevaciones arrojadas por las Inspecciones

PDF Scanner ACE Scanner

ANEXO 8: PRE OPERACIONAL TRONZADORA

PRE OPERACIONAL TRONZADORA

CÓDIGO: FOR-MT-015
VERSION: 01
FECHA: 17/07/2024

SEMANA DEL 05 AL 07 MES Mayo PROYECTO Colegio Villanueva
ACTIVIDAD Figuracion de Hierro.
OPERADOR Wilson Quadro Ortiz

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

ITEM	PARAMETRO A REVISAR	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIÉRCOLE B	MIÉRCOLE M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
EQUIPO	Guarda de protección del disco							✓							
	Disco apropiado rpm							✓							
	Suiche del seguro, encendido y apagado					O		✓						O	
	Instalaciones eléctricas y voltaje apropiado							✓		O		O			
	Estado del disco (verificar RPM, vida util, grietas)			O				✓							
	Cuerpo del equipo (fisuras, rupturas)							✓							
	Empuñadura libre de grasa y limpia	O						✓				O		O	
	Estado de las bridas y pernos					O		✓		O					
	Sentido de rotación del disco							✓							
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Verifique que el operario este libre de accesorios, ropa suelta y otros elementos que puedan ser atrapados por las partes móviles, area libre de obstáculos	O		O				✓				O		O	
	Estado de los anclajes a la mesa o superficie nivelada					O		✓		O					
	El operario observa el sentido de giro y la velocidad del disco, cumple con las especificaciones del fabricante							✓				O			
	El operario delimita, aisla o demarca el área de trabajo para que ninguna persona este cerca a la operación que se esta realizando	O		O				✓		O				O	
EPP	El operario utiliza la protección auditiva, visual y mascarilla para particulas de polvo, guantes de seguridad, careta para particulas							✓				O			
	UBICACIÓN														
	SERIE														
FIRMAS	FIRMA OPERADOR	Wilson		Jorth		Dilson		Gaspar							
	FIRMA SUPERVISOR SST	Bueno		Bueno		Bueno		Bueno		Bueno					


OBSERVACIONES

El Trabajo se Inicio el dia Jueves

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE:	SI	NO	RESPONSABLE	FECHA
SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR				
REVISADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO				
REPARADO Y REMITIDO AL ALMACÉN				

PDF Scanner ACE Scanner

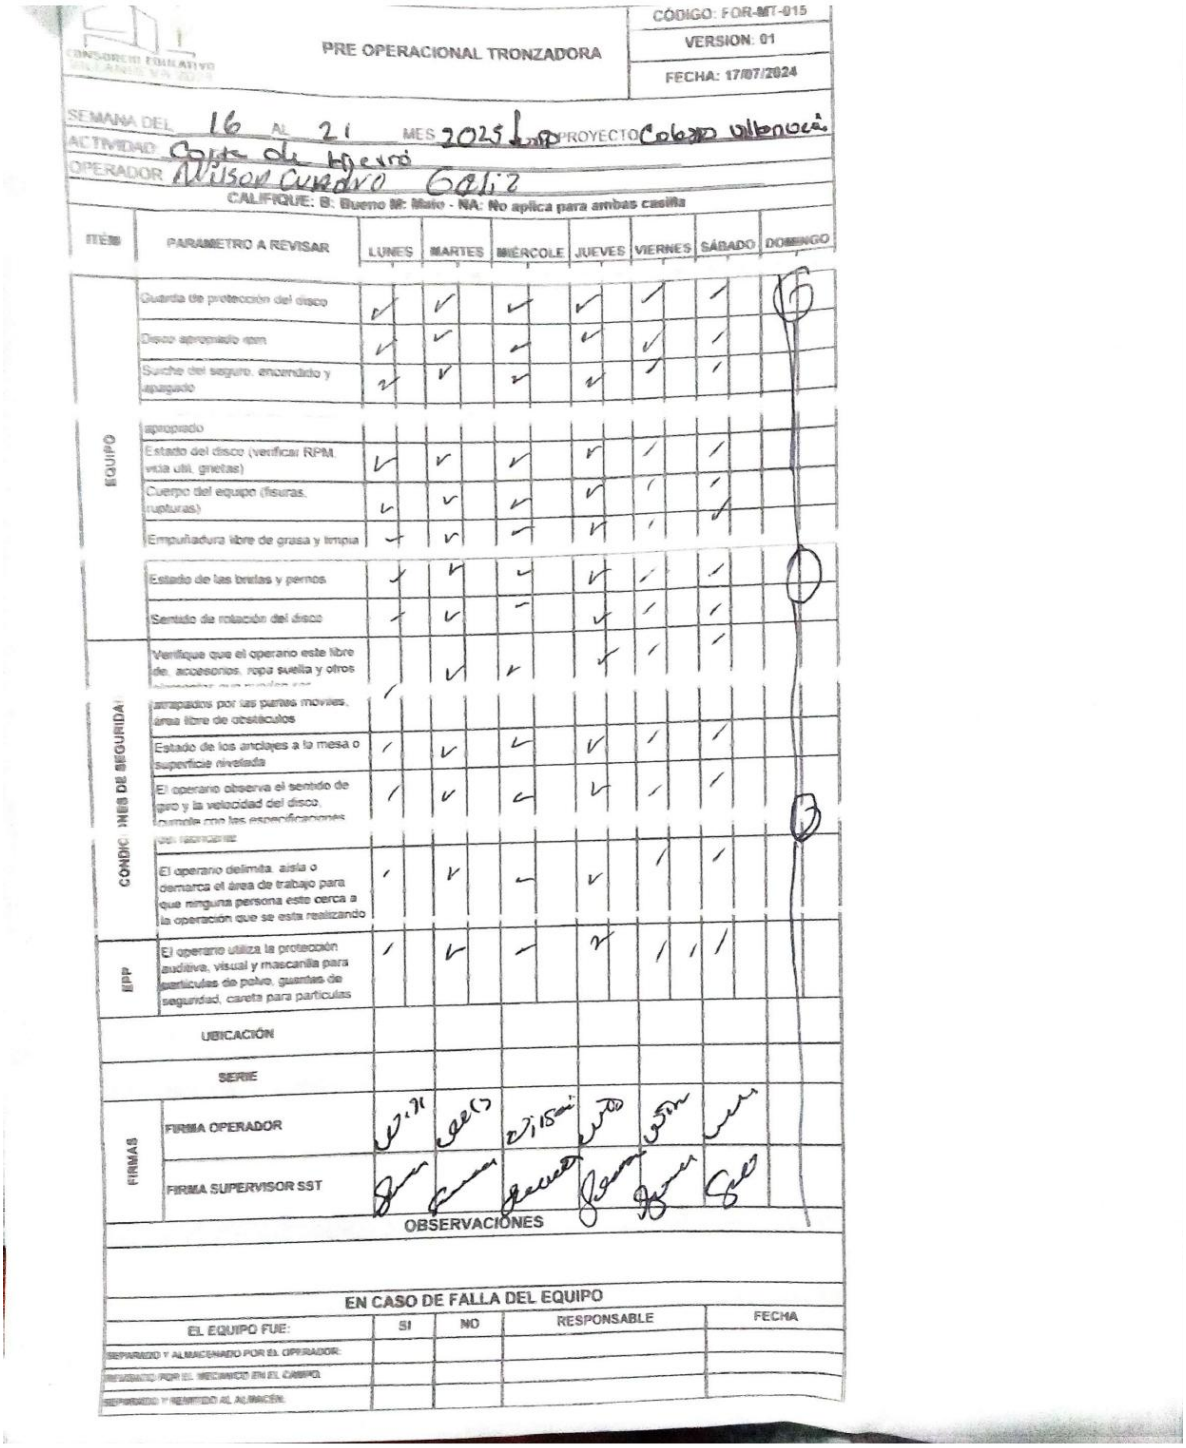

CONSORCIO EDUCATIVO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

PRE OPERACIONAL TRONZADORA

CÓDIGO: FOR-MT-015
VERSION: 01
FECHA: 17/07/2024

SEMANA DEL 16 AL 21 MES 2025 PROYECTO Colegio villanueva
ACTIVIDAD Corte de hierro
OPERADOR Wilson Cundar Galiz

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla


ITEM	PARAMETRO A REVISAR	LUNES	MARTES	MIÉRCOLE	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
EQUIPO	Guarda de protección del disco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Disco apropiado rpm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Suiche del seguro, encendido y apagado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	apropiado							
	Estado del disco (verificar RPM, vida útil, grietas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cuerpo del equipo (fisuras, rupturas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Empuñadura libre de grasa y limpia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de las bridas y pernos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sentido de rotación del disco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Verifique que el operario este libre de accesorios, ropa suelta y otros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	atrapados por las partes moviles, area libre de obstaculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de los anclajes a la mesa o superficie nivelada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	El operario observa el sentido de giro y la velocidad del disco cumple con las especificaciones del fabricante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	El operario delimita, aisla o demarca el área de trabajo para que ninguna persona este cerca a la operación que se esta realizando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EPP	El operario utiliza la protección auditiva, visual y mascarilla para particulas de polvo, guantes de seguridad, careta para particulas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UBICACIÓN								
SERIE								
FIRMAS	FIRMA OPERADOR							
	FIRMA SUPERVISOR SST							

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE:	SI	NO	RESPONSABLE	FECHA
REPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:				
REVISADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO.				
REPARADO Y REMITIDO AL ALMACEN.				

ACE Scanner

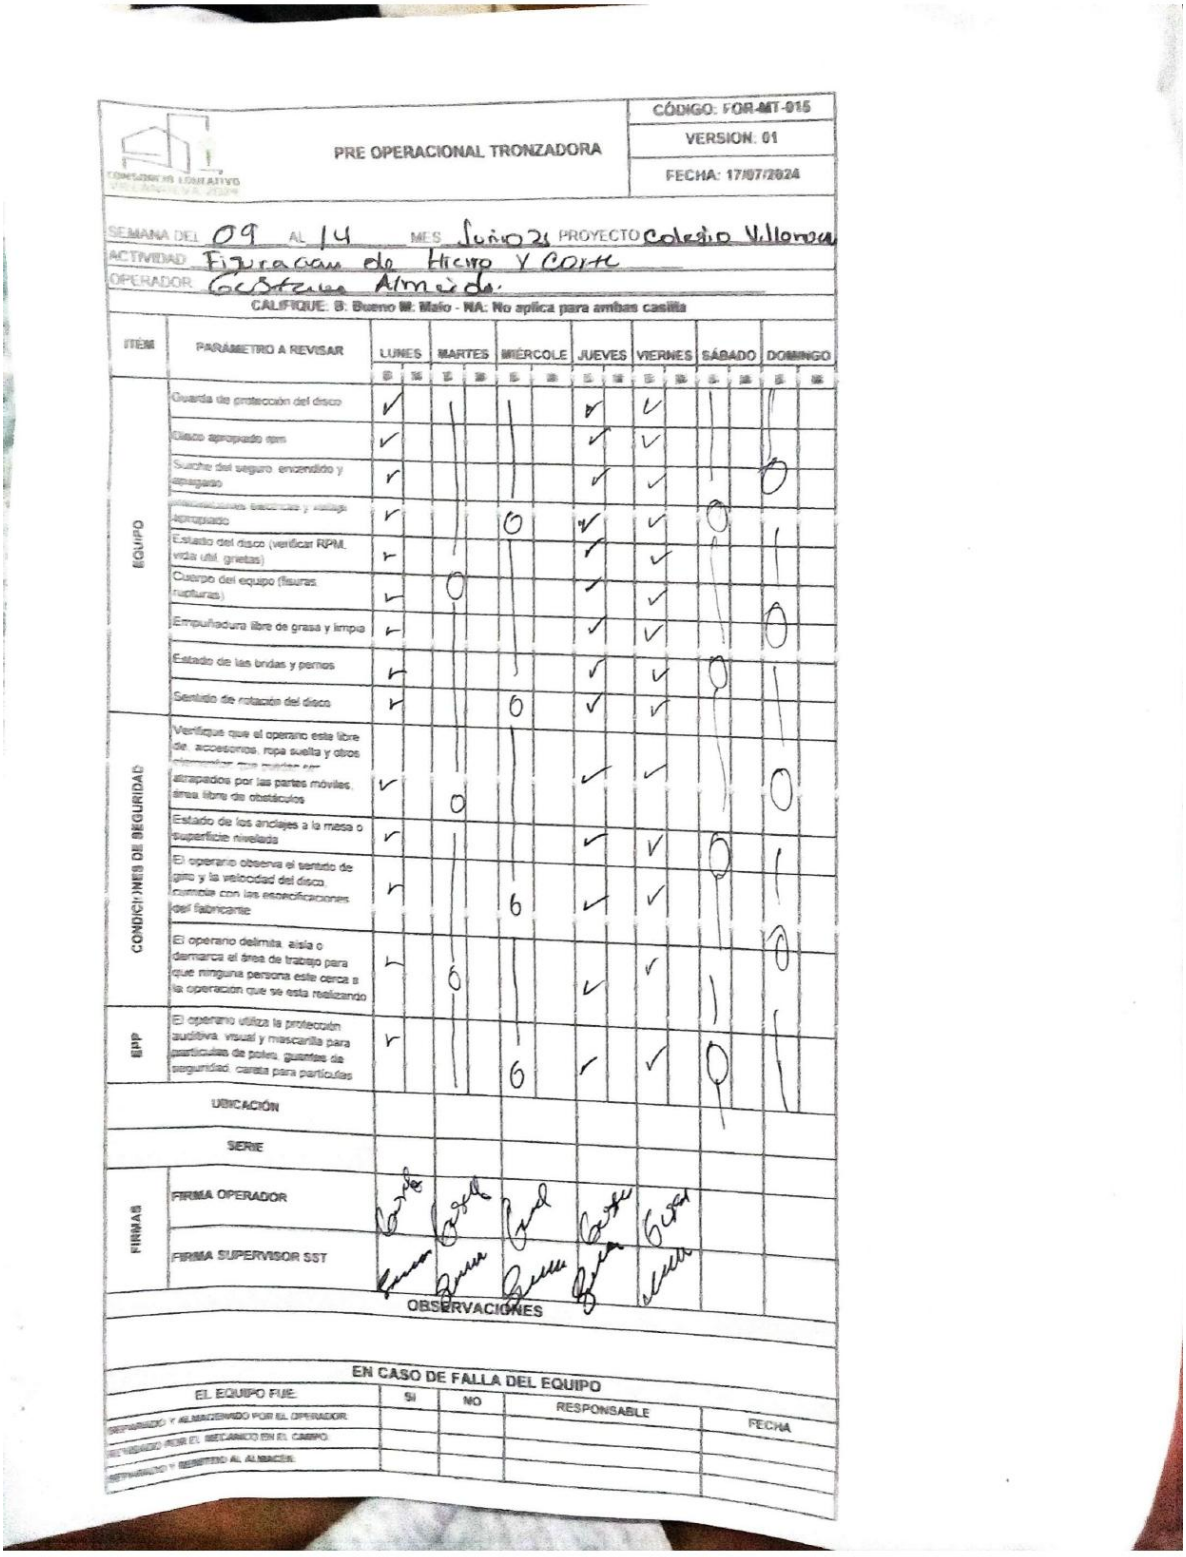

CONSORCIO EDUCATIVO

PRE OPERACIONAL TRONZADORA

CÓDIGO: FOR-MT-015
VERSION: 01
FECHA: 17/07/2024

SEMANA DEL 09 AL 14 MES Junio 25 PROYECTO Colegio Villanueva
ACTIVIDAD Figuracion de Hierro y Corte
OPERADOR Gustavo Almeida.

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

ITEM	PARAMETRO A REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLE		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO	Guarda de protección del disco	✓						✓		✓					
	Disco apropiado rpm	✓						✓		✓					
	Suiche del seguro encendido y apagado	✓						✓		✓					
	[illegible] apropiado	✓						✓		✓					
	Estado del disco (verificar RPM, vida util, grietas)	✓						✓		✓					
	Cuerpo del equipo (fisuras rupturas)	✓						✓		✓					
	Empuñadura libre de grasa y limpia	✓						✓		✓					
	Estado de las bridas y pernos	✓						✓		✓					
	Sentido de rotación del disco	✓						✓		✓					
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Verifique que el operario este libre de accesorios, ropa suelta y otros elementos que puedan ser atrapados por las partes móviles, area libre de obstáculos	✓						✓		✓					
	Estado de los anclajes a la mesa o superficie nivelada	✓						✓		✓					
	El operario observa el sentido de giro y la velocidad del disco, cumpla con las especificaciones del fabricante	✓						✓		✓					
	El operario delimita, aisla o demarca el área de trabajo para que ninguna persona este cerca a la operación que se esta realizando	✓						✓		✓					
EPP	El operario utiliza la protección auditiva, visual y mascarilla para particulas de polvo, guantes de seguridad, careta para particulas	✓						✓		✓					
	UBICACIÓN														
	SERIE														
FIRMAS	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE:	SI	NO	RESPONSABLE	FECHA
REPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR				
RETIRADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO				
RETIRADO Y REMITIDO AL ALMACEN				

PDF Scanner ACE Scanner

ANEXO 9: INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

FORMATO DE INSPECCION DE HERRAMIENTA MENOR | Version:01 | Fecha:21/05/25

IDENTIFICACION

Proyecto o Área: Colegio Villanueva | Inspector HSE: Susana | Ciudad: Villanueva
Encargado/ supervisor contratista: Jhonny Tapia | Semana de 03 Al 07 Año 2025


INSPECCION

Estado: escribir según corresponda: C: cumple, NC: no cumple

Herramientas	Estandares de seguridad	Lunes Estado	Martes Estado	Miercoles Estado	Jueves Estado	Viernes Estado	Sabado Estado	Domingo Estado
Martillo	Que la cabeza esté fija al mango, sin movimiento	✓	✓	✓	✓	✓		
	Que el material del mango (madera, fibra o metal) esté libre de astillas o deformaciones.	✓	✓	✓		✓		
	Que el martillo esté limpio y libre de residuos peligrosos (pegamento, concreto seco, aceite).	✓	✓	✓	✓	✓		
Destornillador	Que tenga superficie antideslizante o ergonómica (en destornilladores aislados o con recubrimiento).							
	eje o caña metalica Que no presente óxido ni desgaste excesivo.							
	Que no haya sido modificado artesanalmente (mangos improvisados, soldaduras).							
Cincel	Que esté recto, sin dobleces ni grietas.							
	Que no presente corrosión significativa que debilite la estructura.							
	Que no tenga bordes expandidos o rebabas que puedan causar lesiones o proyecciones de fragmentos.							
Pinzas	Mordazas que cierren correctamente y esten alineadas							
	Que tengan recubrimiento aislante (si aplica).							
	Que no tengan grietas, desgaste o partes sueltas.							
Pala	Hoja metalica afilado o sin deformaciones	✓	✓	✓	✓	✓		
	hoja metalica sin corrosion o doblado	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mango este fijo, sin astillas fisuras o deteriodo por humedad	✓	✓	✓	✓	✓		
Pica	Punta de corte esté centrada y bien conformada para golpear eficazmente	✓	✓	✓	✓	✓		
	Que no tenga deformaciones por golpes excesivos	✓	✓	✓	✓	✓		
Carretilla de Mano	Llantas que gire libremente y sin ruido, presion adecuada o sin desgastes	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bandeja que no tenga borden filosos ni rotura							
	Manijas que no esten sucias, sueltas o resbalosas							
Mazo	cabeza que esté bien fijada al mango.							
	mango que no tenga astillas, fisuras ni se encuentre flojo							
Llaves mixtas	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas							
	Que esté libre de grietas, dobleces o corrosión.							
		Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
REVISO Y APROBO:	Susana Yaite P							

Observaciones:

PDF Scanner ACE Scanner

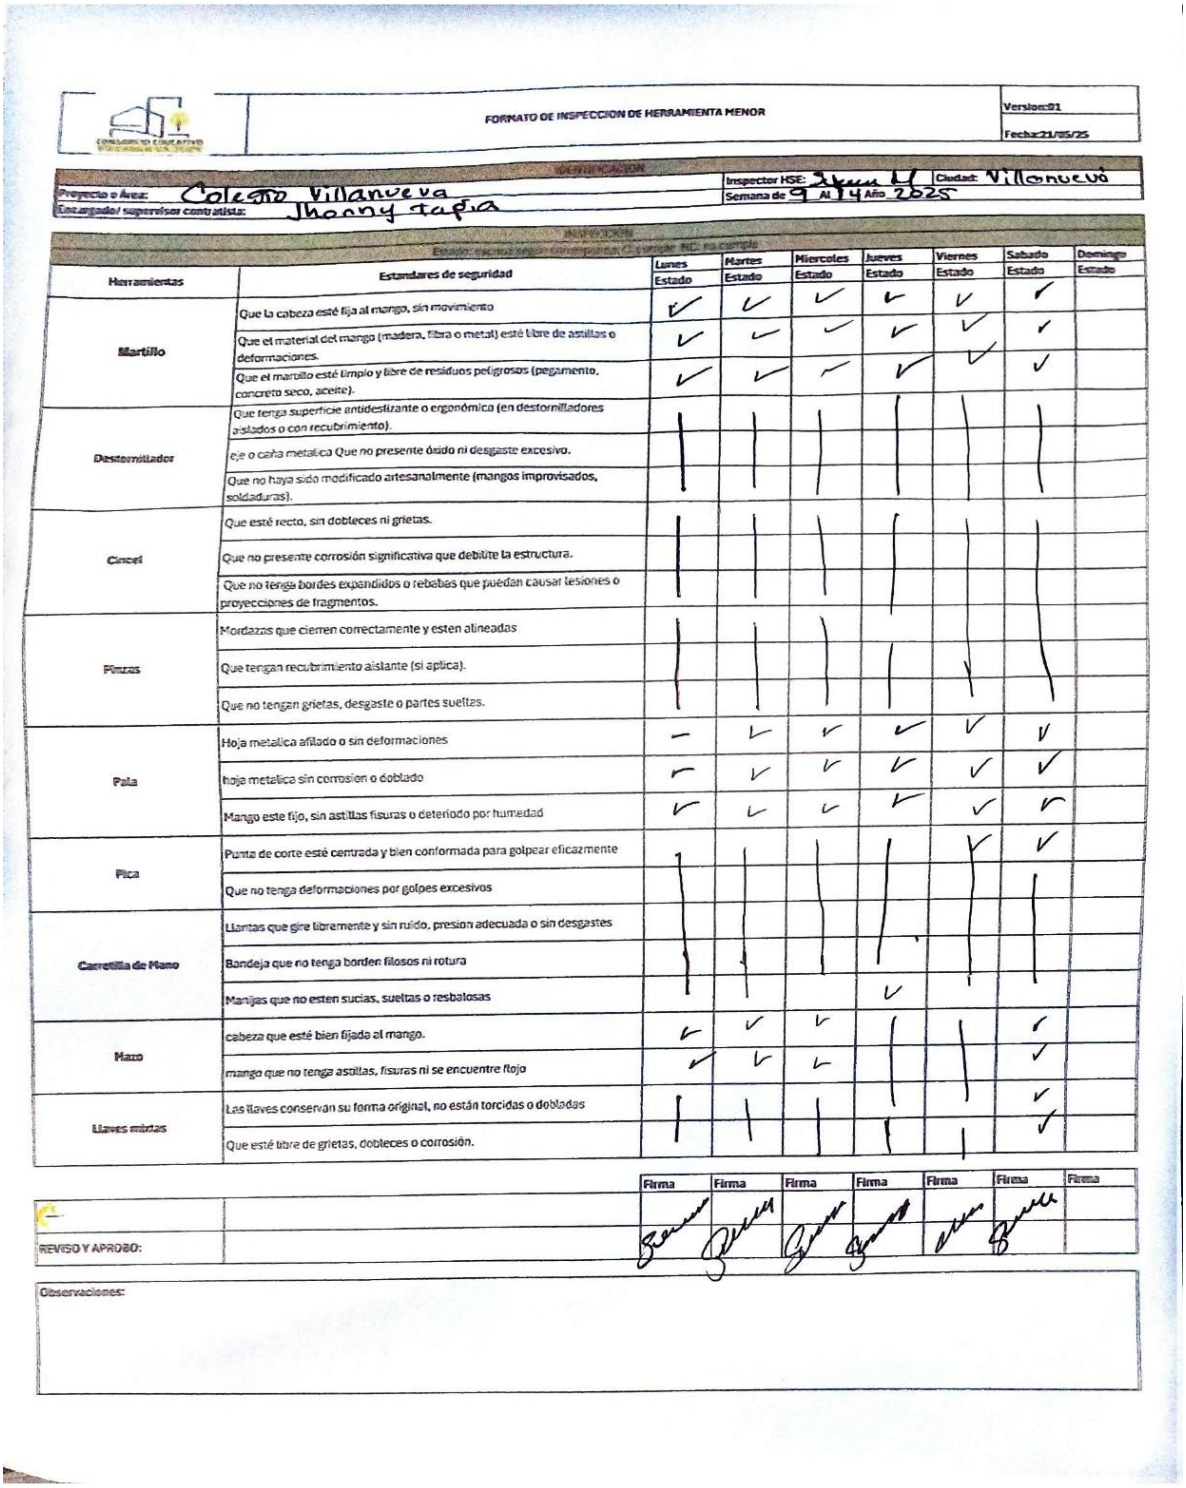

FORMATO DE INSPECCION DE HERRAMIENTA MENOR

Version:01
Fecha:21/05/25


Proyecto o Área: Colegio Villanueva
Encargado/ supervisor contratista: Jhonny Tapia
Inspector HSE: Jhon M
Ciudad: Villanueva
Semana de 9 AL 14 Año 2025

Herramientas	Estandares de seguridad	Lunes Estado	Martes Estado	Miercoles Estado	Jueves Estado	Viernes Estado	Sabado Estado	Domingo Estado
Martillo	Que la cabeza esté fija al mango, sin movimiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Que el material del mango (madera, fibra o metal) esté libre de astillas o deformaciones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Que el martillo esté limpio y libre de residuos peligrosos (pegamento, concreto seco, aceite).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Destornillador	Que tenga superficie antideslizante o ergonómica (en destornilladores aislados o con recubrimiento).	|	|	|	|	|	|	
	eje o caña metalica Que no presente óxido ni desgaste excesivo.	|	|	|	|	|	|	
	Que no haya sido modificado artesanalmente (mangos improvisados, soldaduras).	|	|	|	|	|	|	
Cincel	Que esté recto, sin dobleces ni grietas.	|	|	|	|	|	|	
	Que no presente corrosión significativa que debilite la estructura.	|	|	|	|	|	|	
	Que no tenga bordes expandidos o rebabas que puedan causar lesiones o proyecciones de fragmentos.	|	|	|	|	|	|	
Pinzas	Mordazas que cierren correctamente y esten alineadas	|	|	|	|	|	|	
	Que tengan recubrimiento aislante (si aplica).	|	|	|	|	|	|	
	Que no tengan grietas, desgaste o partes sueltas.	|	|	|	|	|	|	
Pala	Hoja metalica afilado o sin deformaciones	–	✓	✓	✓	✓	✓	
	hoja metalica sin corrosion o doblado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mango este fijo, sin astillas fisuras o deteriodo por humedad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pica	Punta de corte esté centrada y bien conformada para golpear eficazmente	|	|	|	|	|	✓	
	Que no tenga deformaciones por golpes excesivos	|	|	|	|	|	|	
Carretilla de Mano	Llantas que gire libremente y sin ruido, presion adecuada o sin desgastes	|	|	|	|	|	|	
	Bandeja que no tenga borden filosos ni rotura	|	|	|	|	|	|	
	Manijas que no esten sucias, sueltas o resbalosas	|	|		✓			
Mazo	cabeza que esté bien fijada al mango.	✓	✓	✓	|	|	✓	
	mango que no tenga astillas, fisuras ni se encuentre flojo	✓	✓	✓	|	|	✓	
Llaves mixtas	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas	|	|	|	|	|	✓	
	Que esté libre de grietas, dobleces o corrosión.	|	|	|	|	|	✓	

		Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
REVISO Y APROBO:								

Observaciones:

ACE Scanner

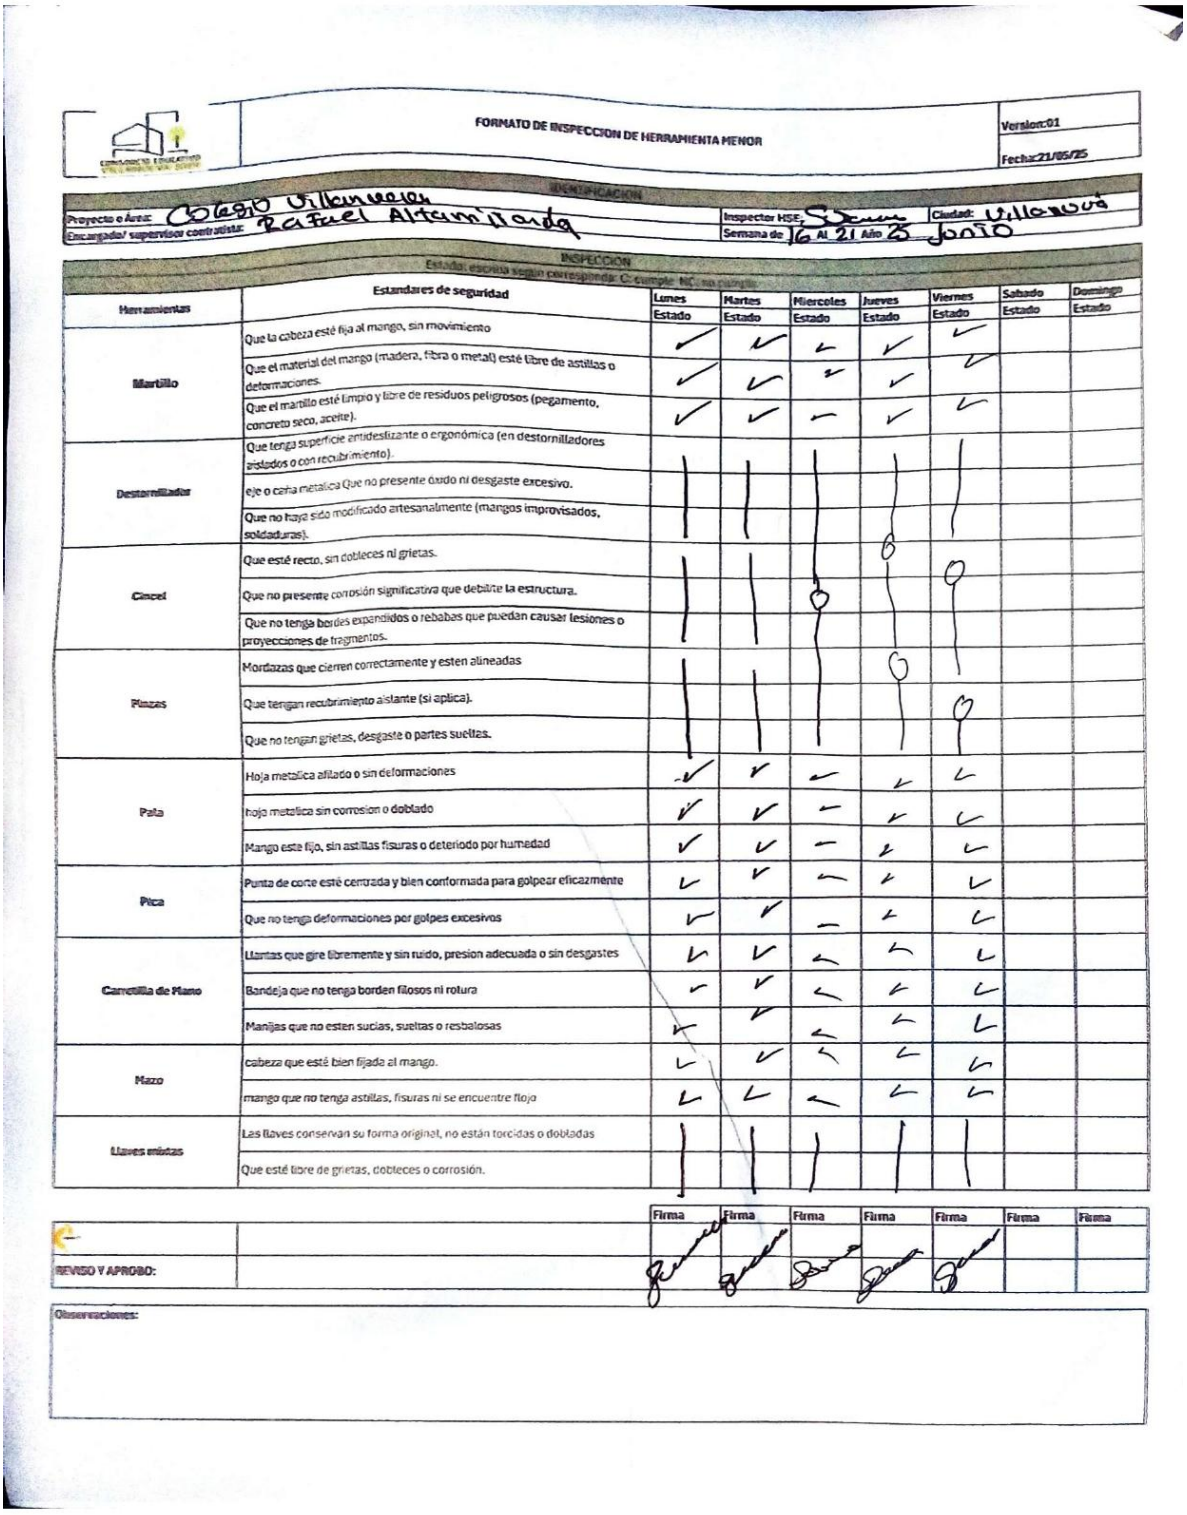

FORMATO DE INSPECCION DE HERRAMIENTA MENOR

Versión:01
Fecha:21/05/25

IDENTIFICACIÓN

Proyecto o Área: Colegio Villanueva — Inspector HSE: [illegible] — Ciudad: Villanueva
Encargado/ supervisor contratista: Rafael Altamiranda — Semana de 16 Al 21 Año 25 Junio


INSPECCION

Estado escrita según corresponda: C: cumple NC: no cumple

Herramientas	Estandares de seguridad	Lunes Estado	Martes Estado	Miercoles Estado	Jueves Estado	Viernes Estado	Sabado Estado	Domingo Estado
Martillo	Que la cabeza esté fija al mango, sin movimiento	✓	✓	✓	✓	✓		
	Que el material del mango (madera, fibra o metal) esté libre de astillas o deformaciones.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Que el martillo esté limpio y libre de residuos peligrosos (pegamento, concreto seco, aceite).	✓	✓	✓	✓	✓		
Destornillador	Que tenga superficie antideslizante o ergonómica (en destornilladores aislados o con recubrimiento).	|	|	|	|	|		
	eje o caña metalica Que no presente óxido ni desgaste excesivo.	|	|	|	|	|		
	Que no haya sido modificado artesanalmente (mangos improvisados, soldaduras).	|	|	|	|	|		
Cincel	Que esté recto, sin dobleces ni grietas.	|	|	|	|	|		
	Que no presente corrosión significativa que debilite la estructura.	|	|	|	|	|		
	Que no tenga bordes expandidos o rebabas que puedan causar lesiones o proyecciones de fragmentos.	|	|	|	|	|		
Pinzas	Mordazas que cierren correctamente y esten alineadas	|	|	|	|	|		
	Que tengan recubrimiento aislante (si aplica).	|	|	|	|	|		
	Que no tengan grietas, desgaste o partes sueltas.	|	|	|	|	|		
Pata	Hoja metalica afilado o sin deformaciones	✓	✓	✓	✓	✓		
	hoja metalica sin corresion o doblado	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mango este fijo, sin astillas fisuras o deteriodo por humedad	✓	✓	✓	✓	✓		
Pica	Punta de corte esté cerrada y bien conformada para golpear eficazmente	✓	✓	✓	✓	✓		
	Que no tenga deformaciones por golpes excesivos	✓	✓	✓	✓	✓		
Carretilla de Plano	Llantas que gire libremente y sin ruido, presion adecuada o sin desgastes	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bandeja que no tenga borden filosos ni rotura	✓	✓	✓	✓	✓		
	Manijas que no esten sucias, sueltas o resbalosas	✓	✓	✓	✓	✓		
Mazo	cabeza que esté bien fijada al mango.	✓	✓	✓	✓	✓		
	mango que no tenga astillas, fisuras ni se encuentre flojo	✓	✓	✓	✓	✓		
Llaves mixtas	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas	|	|	|	|	|		
	Que esté libre de grietas, dobleces o corrosión.	|	|	|	|	|		
		Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
REVISO Y APROBO:								

Observaciones:

PDF Scanner ACE Scanner

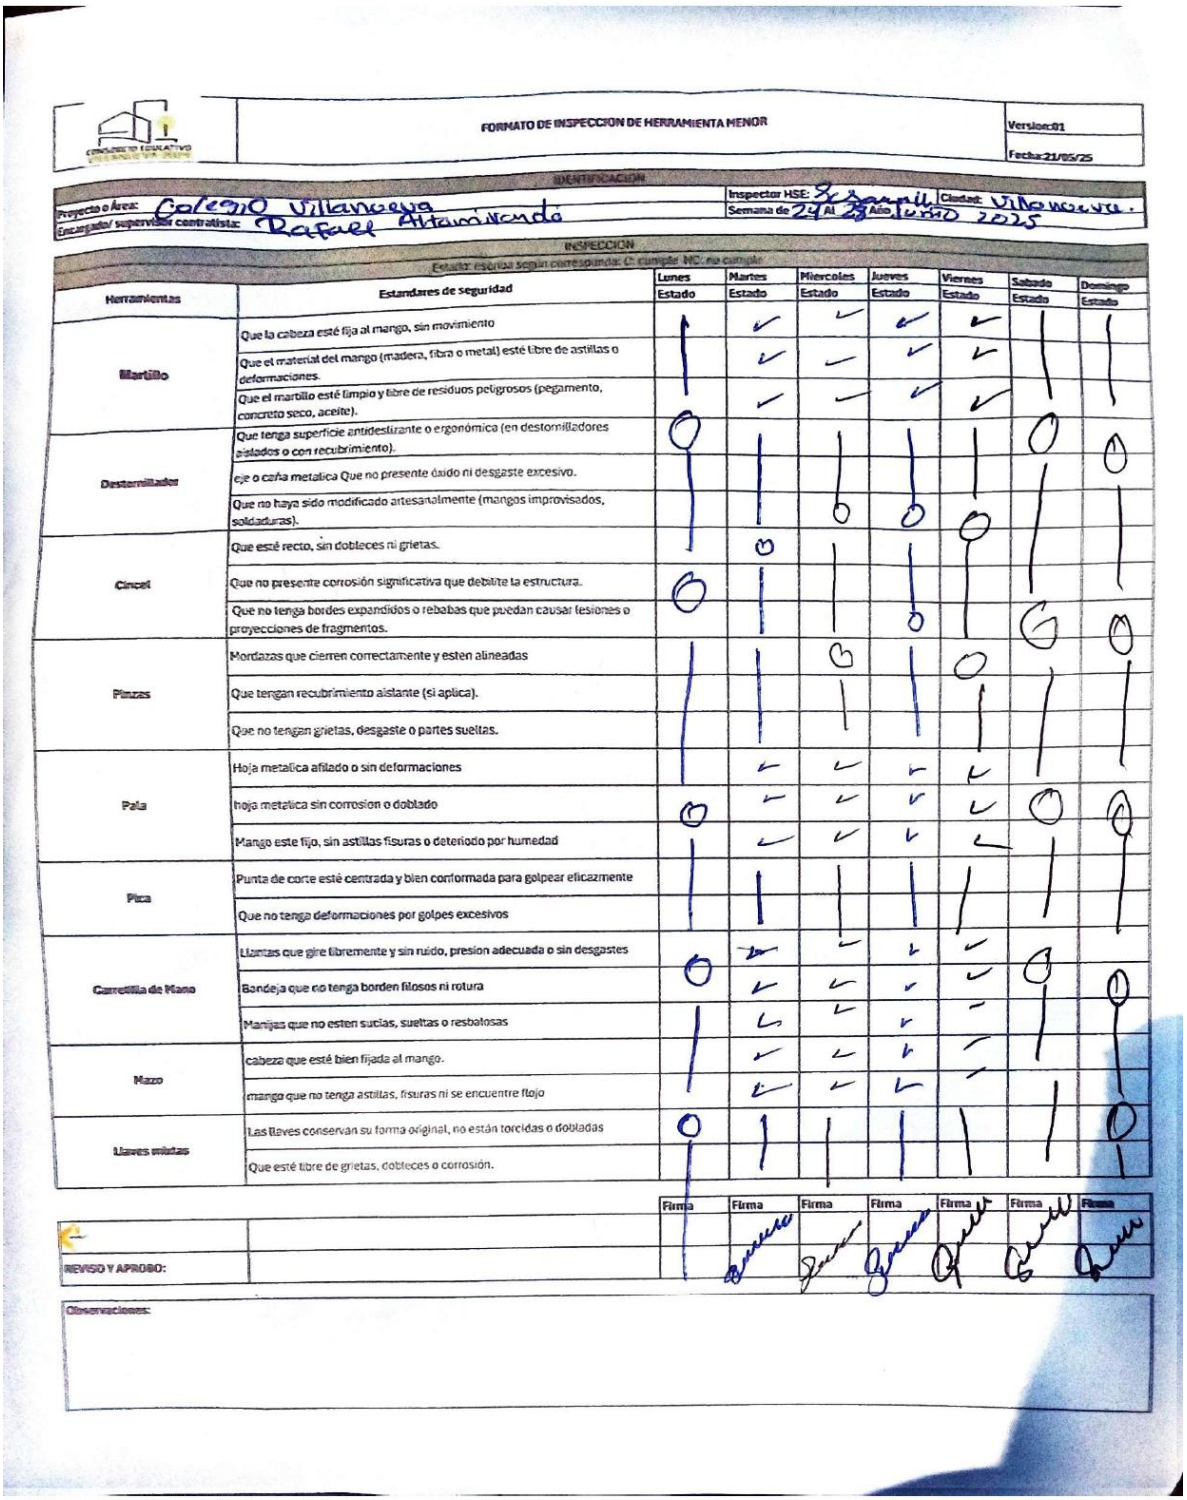

FORMATO DE INSPECCION DE HERRAMIENTA MENOR

Version:01
Fecha:21/05/25

IDENTIFICACION

Proyecto o Área: Colegio Villanueva
Encargado/ supervisor contratista: Rafael Altamiranda
Inspector HSE: [illegible]
Ciudad: Villanueva
Semana de 24 Al 28 Mes: Junio Año 2025

INSPECCION

Estado: escribir según corresponda: C: cumple NC: no cumple

Herramientas	Estandares de seguridad	Lunes Estado	Martes Estado	Miercoles Estado	Jueves Estado	Viernes Estado	Sabado Estado	Domingo Estado
Martillo	Que la cabeza esté fija al mango, sin movimiento							
	Que el material del mango (madera, fibra o metal) esté libre de astillas o deformaciones.							
	Que el martillo esté limpio y libre de residuos peligrosos (pegamento, concreto seco, aceite).							
Destornillador	Que tenga superficie antideslizante o ergonómica (en destornilladores aislados o con recubrimiento).							
	eje o caña metalica Que no presente óxido ni desgaste excesivo.							
	Que no haya sido modificado artesanalmente (mangos improvisados, soldaduras).							
Cincel	Que esté recto, sin dobleces ni grietas.							
	Que no presente corrosión significativa que debilite la estructura.							
	Que no tenga bordes expandidos o rebabas que puedan causar lesiones o proyecciones de fragmentos.							
Pinzas	Mordazas que cierren correctamente y esten alineadas							
	Que tengan recubrimiento aislante (si aplica).							
	Que no tengan grietas, desgaste o partes sueltas.							
Pala	Hoja metalica afilado o sin deformaciones							
	hoja metalica sin corrosion o doblado							
	Mango este fijo, sin astillas fisuras o deteriodo por humedad							
Pica	Punta de corte esté centrada y bien conformada para golpear eficazmente							
	Que no tenga deformaciones por golpes excesivos							
Carretilla de Mano	Llantas que gire libremente y sin ruido, presion adecuada o sin desgastes							
	Bandeja que no tenga borden filosos ni rotura							
	Manijas que no esten sucias, sueltas o resbalosas							
Mazo	cabeza que esté bien fijada al mango.							
	mango que no tenga astillas, fisuras ni se encuentre flojo							
Llaves mixtas	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas							
	Que esté libre de grietas, dobleces o corrosión.							
		Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
REVISO Y APROBO:								

Observaciones:

PDF Scanner ACE Scanner

ANEXO 10: PRE OPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	PREOPERACIONAL DE COMPACTADOR TIPO CANGURO	VERSIÓN 1
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 13/06/2025

PROYECTO U OBRA: Colegio villanueva SEMANA: 16 al 21 MES: Junio AÑO: 2025
EQUIPO: canguro MARCA:

C: CONFORME NC: NO CONFORME

INSPECCIÓN VISUAL		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
MOTOR	Verificar que se encuentre en buen estado, sin ruidos extraños ni partes sueltas			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ENCENDIDO	Verificar que encienda correctamente sin generar chispa ni ruidos anormales			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABLE EN BUEN ESTADO Y ENCAUCHETADOS	Verificar que se encuentre en buen estado sin roturas que permitan conexión con material aislante			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABLEADO Y CONECTORES EN BUEN ESTADO	Verificar que no existan cables pelados o conexiones sueltas, deben estar bien aislados			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTRUCTURA GENERAL DEL EQUIPO	Revisar que la carcasa esté sin fisuras, oxidación, abolladuras o tornillos sueltos			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA DE ESCAPE	Verificar que no esté obstruido, sucio ni presente fugas de gases			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FUGAS DE ACEITE	Inspeccionar que no existan derrames de aceite en ninguna parte del equipo			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
YOYO DE ENCENDIDO (IMPULSOR)	Verificar que el sistema de arranque manual esté operativo y sin daños			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MANILLAR Y SOPORTES	Asegurar que estén firmes, sin grietas ni elementos flojos			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ZAPATA (BASE DE GOLPEO)	Verificar que esté fija, sin desgaste excesivo o roturas			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VIBRACIÓN UNIFORME	Confirmar que durante la prueba el equipo vibre de forma uniforme, sin desviaciones			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GUARDAS DE PROTECCIÓN	Validar que estén instaladas y en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TORNILLERÍA Y UNIONES	Verificar que todos los tornillos y pernos estén ajustados y completos			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TEMPERATURA	Monitorear la temperatura durante la operación para evitar sobrecalentamientos			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones:

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD	POR NINGUN MOTIVO PERMITA QUE LA BOMBA TRABAJE EN SECO, ESTO PUEDE GENERAR RECALENTAMINETOS Y POSIBLES INCENDIOS.
	EL TRABAJDOR SE COMPROMETE A NO RETIRAR LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA HERRAMIENTA Y REPORTAR LAS FALLAS O MANTENIMIENTOS A QUE DIERA LUGAR

PERMISO OTORGADO A:

NOMBRE y FECHA	CEDULA	FIRMA
Johan Y Zapata	92230732	Johan

VERIFICADO Y AUTORIZADO POR SST:

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO

PDF Scanner ACE Scanner

ANEXO 11: PREOPERACIONAL SIERRA DE MADERA

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	PREOPERACIONAL DE SIERRA DE MADERA	VERSIÓN 1
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 13/06/2025

PROYECTO U OBRA EQUIPO: Colegio Villanueva Sierra de madera — SEMANA: 16 al 21 — MES: Junio — AÑO: 25 — MARCA:

C CONFORME NC NO CONFORME

DESCRIPCION		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
CONDICIONES GENERALES	**Estado físico general:** sin golpes, rajaduras o deformaciones.	✓		✓				✓		✓							
	Limpieza del equipo: libre de aserrín acumulado, grasa o residuos.	✓		✓				✓		✓							
	Fijación adecuada a la base o superficie de trabajo (si aplica)	✓		✓				✓		✓							
SISTEMA DE CORTE Y DISCO	**Disco de corte:** Sin dientes rotos, desgastados o mal alineados. Correctamente afilado. Fijación firme (tuerca o perno sin juego).	✓		✓				✓		✓							
	Protector del disco: Presente y en buen estado. Se mueve libremente y cubre completamente el disco cuando no está en uso.	✓		✓				✓		✓							
	Guías de corte (reglas, topes, rieles): Alineadas, sin holguras. Fáciles de ajustar y fijar firmemente.	✓		✓				✓		✓							
COMPONENETES MECANICOS Y DE SEGURIDAD	**Motor:** No emite ruidos anormales, vibraciones o sobrecalentamiento. Fijación firme al cuerpo de la máquina.	✓		✓				✓		✓							
	Correas (si aplica): Sin grietas, desgaste excesivo o aflojamiento.	✓		✓				✓		✓							
	Sistema de extracción de polvo (si tiene): Conectado y funcionando adecuadamente.	✓		✓				✓		✓							
	Freno de disco (si aplica): Verifica que detenga el disco tras apagarse.	✓		✓				✓		✓							
SISTEMA ELÉCTRICO	**Cableado.** Sin empalmes, cortes, peladuras o exposición de conductores. Longitud adecuada para evitar tracción o tropiezos.	✓		✓				✓		✓							
	Enchufe y clavijas. En buen estado, sin oxidación ni deformaciones.	✓		✓				✓		✓							
	Botón de encendido/apagado: Funciona correctamente. Accesible y visible.	✓		✓				✓		✓							

Observaciones:

PERMISO OTORGADO A:

NOMBRE y FECHA	CEDULA	FIRMA
Johan	1577[illegible]39	Johan

VERIFICADO Y AUTORIZADO POR SST.

LUNES ✓ MARTES ✓ MIERCOLES ✓ JUEVES ✓ VIERNES ✓ SABADO

PDF Scanner ACE Scanner

ANEXO 12: CHARLAS

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSION: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN | CHARLA DE 5 MINUTOS: X | REUNIÓN | FECHA: 03/06/25

HORA DE INICIO: 9:00 nm | HORA FINAL: 5:00pm | NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Susana Marte

LUGAR:

TEMA: Protección de Grasa y Aceite | FIRMA DEL INSTRUCTOR: Susana Marte

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Deivis Rios Ramas	7792742673	Deivis Rios R
2	Jesus A. Palacio M.	1052734797	
3	Cosme PARRA	9201689	
4	Cesar Cabeza.	1143378054	
5	Ulrison Cundar Celiz	1052735498	Ulrison Cundar
6	Manuel Cera Belerio	9203768	Manuel
7	Junior Almeida	1.002476451	
8	MARION Nieves	7960544	MARION
9	Pablo Sabalza Garcia	9203235	
10	RAMIRO OLIVO	1052731486	
11	Yaider polo	1002475866	Yaider polo.
12	Luis Villarreal	9202314	
13	GUSTAVO ALMEIDA	9.202.317	Gustavo A
14	OSCAR TORRES G	1.052731541	
15	CARLOS E. O.Z	9.203.787	O.Z.
16	Ricardo Cantero	9204056	
17	oscar zuñiga	7002 475076	
18	Yolima Sdas Orozco	1049537253	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

3183897212C

PDF Scanner ACE Scanner

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN	

FECHA: 04/06/2025

HORA DE INICIO: 7:00 am | HORA FINAL:

NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Susana Maria P

LUGAR: Colegio villanueva

TEMA: Corte de hierro con tronzadora

FIRMA DEL INSTRUCTOR: Susana Maria P.

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	MARION REALES	7960544	MARION
2	OSCAR Torres G	1.052731341	
3	Cosme PEREA	9201689	Cosme
4	CARLOS E. O.Z	9.203.787	O.Z
5	Luis Villacorta	9202314	Luis Villa
6	RAMIRO OLIVO	1052731486	Ramiro
7	Luis Fernando	1052738161	Luis
8	GUSTAVO ALMEIDA	9202313	Gustavo
9	Jaider polo	1002475886	Jaider P
10	Jorge polo	6632964	Jorge P
11	Kenell Yanez Muñoz	1.052740188	Kenell
12	Junior Almeida Muñoz	1.002476451	Junior
13	Wilson Cuadro Baliz	1052735409	Wilson
14	Mauricio Cantero V	9204056	
15	Jesus A. palacio M.	1052734797	
16	NEURO	16427536	FERNANDES
17	pablo Sobalka Herrera	9203235	
18	DEIVIS RIOS LLAMAS	1142746113	DEIVIS RIOS LLAMAS
19	Manuel coca Bolaño	9203768	Manuel
20			
21			
22			
23			
24			
25			

ACE Scanner

CONSORCIO
TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN		FECHA: 05/06/2025
HORA DE INICIO: 7:00 Am		HORA FINAL: 5:00 pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR		
LUGAR: Colegio Villanueva				Sesum Mateo		
TEMA: Prevención de incendio en obra				FIRMA DEL INSTRUCTOR		

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Wilson cuadro Cañiz	1052735489	Wilson Cuadro
2	NEURO ANTONIO	16427536	
3	Denis RIOS HAMAS	7792742673	Denis Rios H
4	Pablo Sabalza H.	9203233	
5		9209086	
6	Cristian Benio Castro	1148404263	
7	Rafael Altamiranda	73151526	
8	Fabian Y TAPIA muñoz	72276732	
9	Wellman Salas O	1049537253	
10	Gustavo Almeida	9202313	
11	Osca zuñiga	1002475076	
12	Cosme Parra	9201689	
13	Luis Villareal	9202634	
14	Jaider Polo	1002475886	
15	Jorge Luis Polo	6632969	
16	Derlis Jimenez	1048437853	Derlis Jimenez
17	Romio Oivo	1052731486	
18	Carlos Orozco zuñiga	9203787	
19	Oscar Yanez Gelis	1052731541	
20	Jesus Palacio	1052730797	
21	Yerlan Reales	79605460	
22	Junior Almeida	1002476451	
23	Kenner Yuñes Muñoz	1005274018	
24	Cesar Cabrera	1143378084	
25			

PDF Scanner ACE Scanner

CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	x	REUNIÓN	FECHA: 06/06/2025
HORA DE INICIO: 7:00 Am		HORA FINAL: 5:00 pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR	
LUGAR: Colegio villanueva				Sesenen Mateo P	
TEMA: Control de ruido y protección				FIRMA DEL INSTRUCTOR	

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Kenell Vanesa Muñoz	1.052 740 189	
2	Luis fernando	1.052738161	
3	GUSTAVO ALMEIDA	9202 719	
4	Luis Villa. cobos	9.202 314	
5	CARLOS.E. O,Z	9.203787	O.Z.
6	COSME PARRA	9201689	
7	OSCAR TORRES G	1.052731 541	
8	MARION REALES	7960544	
9	RAMIRO OLIVO	1052731486	
10	Jorge polo	6632964	
11	Jaiber polo	1002975886	
12	Junior Almeida	1.002476451	
13	Wilson Cendro Galiz	1052735409	
14	Ramiro Quintero V	9206952	
15	Jesus A. palacio M.	1052734797	
16	NEURO ANTONIO	16427536	FERNANDEZ
17	pablo Saboya Barrera	9203255	
18	DEIVIS RIOS LLAMAS	1192741673	DEIVIS RIOS LL
19	Manuel Cera Belerio	9203768	
20	Sabi Orozco	1049537253	
21	Daniel Alvarez Perez	3.800352	
22			
23			
24			
25			

PDF Scanner ACE Scanner

CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CODIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN	
FECHA: 07/06/2025					
HORA DE INICIO: 7:00 Am		HORA FINAL: 5:00 pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR	
LUGAR:				Sebastian Arce	
TEMA:	Herramientas menores estado y Almacenaje			FIRMA DEL INSTRUCTOR	

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Deivis Ríos Llamas	77927967	Deivis Ríos Ll
2	Jesus A palacio A	1052734797	
3	cosme PARRA	9201684	
4	Cesar Cabeza.	1143378054	
5	Alilson Cundo Coliz	1052735484	
6	Manuel Ceca Belerto	9203 768	Manuel
7	Junior Almeida	1.002476451	
8	MARION BEALES	7960544	MARION
9	Pablo Sabalza Hoyos	9203235	
10	RAMIRO OLIVO	1052731486	
11	Jaider polo	1002475886	Jaider polo.
12	Jesus V. Villarreal	9202354	
13	GUSTAVO ALMEIDA	9207317	
14	OSCAR Torres G.	1.052731541	
15	CARLOS.E. O.Z.	9.203 787	O.Z
16		9204056	
17	OSCAR ZURILA	7.002 475076	
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

PDF Scanner ACE Scanner

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN		FECHA: 09/06/2025
HORA DE INICIO: 7:00 Am		HORA FINAL: 3:00 pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR		
LUGAR: Colegio Villanueva				Susana Montes Pineda		
TEMA: Uso de equipo Electrico				FIRMA DEL INSTRUCTOR		
				Susana Monte Pineda.		

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Pablo Sabalza H	9203235	
2	Mauricio Cantero V	9204056	
3	Posme PANNA	9201689	Posme PANNA
4	JAIME Torres G	1052731541	
5	CARLOS.C. DZ.	9.203 787	DZ
6	Dervis Dios Ramos	1192743673	Dervis Dios R
7	Jesus A. palacio M.	1052734774	
8	MARION REALES	7960 544	MARION
9	NEVILO ANTONIO	16427536	
10	Luis Villa. cecil	9.202314	Luis Villa. cecil
11	GUSTAVO Almeida	9203313	Gustavo
12	Wilson CUADRO Goliz	1052735484	Wilson Cuad
13	Manuel cera Beleño	9203768	Manuel
14	oscar Zuñi	7.002475076	oscar Zuñi
15	JORELIS POLO	6639641	JORGE polo
16	RAMIRO OLIVO	1052731486	RAMIRO OLIVO
17	Johnny Tapia muñoz	7323073	
18	Hollman Yesid Salas	1049537252	
19	Dervis Jiménez Blanco	1048437853	Dervis Jiménez
20			
21			
22			
23			
24			
25			

ACE Scanner

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSION: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN	
FECHA: 10/06/25					
HORA DE INICIO: 7:00 Am	HORA FINAL: 5:00 pm	NOMBRE DEL INSTRUCTOR			
LUGAR: Colegio Villanueva		Susana Monte			
TEMA: Manejo manual de carga		FIRMA DEL INSTRUCTOR			
		Susana Monte			

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Mayerlis Cuadro Tarra	9204056	
2	Hellen Sulay Ortega	1049537253	
3	MARLON NEALES	7960 544	MARLON
4	CARLOS. E. O.Z	9.203 787	O.Z.
5	COSME PARRA	9201689	COSME
6	GUSTAVO ALMEIDA	9202 313	GUSTAVO
7	Jhoblo Sabalza Herrera	9203235	
8	Luis Villarreal	9202314	Luis Villarreal
9	Wilson Cuadro Goliz	1052733484	Wilson Cuadro
10	oscar zuñiga	7062470576	oscar
11	Jaider polo	1002475886	Jaider Polo.
12	Jorge polo	6632964	Jorge polo.
13	Jesus A polo M.	1052734799	
14	NEURO ANTONIO	16427536	FERNANDEZ
15	OSCAR Torres G	1.052731311	
16	Mandri cera Belesio	9203765	
17	DEIVIS RIOS LLAMAS	1192742673	DEIVIS RIOS LL
18	Jose J Fuentes	7960101	
19	Luis enrique cañiz Velasco	1002475840	
20	Derlis Jiménez	1048437853	Derlis Jimenez
21	Daniel Alvarez Jaraz	3.800352	
22	Luis David Flachas Dix	1047509870	Luis David Flachas Dix
23			
24			
25			

ACE Scanner

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-GH-002
	VERSIÓN: 01
	FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN		FECHA: 11/06/2025
HORA DE INICIO: 7:00 Am		HORA FINAL: 5:00 pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR		
LUGAR: Colegio Villanueva				Jesus Mantilla		
TEMA:	Uso correcto del Botiquín			FIRMA DEL INSTRUCTOR		
				Jesus Mantilla		

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	[illegible]	9204056	
2	[illegible] Soto Orozco	1049537253	
3	MAYION REALES	7960544	MAYION
4	CATHERINE O.Z.	9.203.787	O.Z.
5	COSME PARRA	9201689	COSME
6	GUSTAVO ALMEIDA	9202313	GUSTAVO
7	Pablo Sabalza Navarro	9203235	
8	Luis Villarreal	9202314	Luis Villarreal
9	Wilson Cuadro Cadiz	1052735480	Wilson Cuadro
10	OSCAR ZUÑIGA	7.002470576	OSCAR
11	Jaider Polo	1002475886	Jaider Polo.
12	Jorge Polo	6632964	Jorge Polo
13	Jesus A. Palacio M.	1052734997	
14	NEVRO ANTONIO	16492536	
15	OSCAR TORRES G	1.052731341	
16	Manuel Cera Beleño	9203768	Manuel
17	DENIS RIOS HAMAS	TI1027426773	DENIS RIOS H
18	Jose J [illegible]	7960104	
19	Luis Emilio Ortiz Velasco	1002475840	
20	DENIS JIMENEZ	1048437853	DENIS JIMENEZ
21			
22			
23			
24			
25			

ACE Scanner

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN | CHARLA DE 5 MINUTOS: X | REUNIÓN | FECHA: 12/06/25

HORA DE INICIO: 7:00 Am | HORA FINAL: 5:00 pm | NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Susana Hurtado

LUGAR: Colegio Villanueva | FIRMA DEL INSTRUCTOR: Susana Hurtado

TEMA: Actuación ante una Emergencia

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Rafael Miranda	73151526	
2	Francisco Cantero	9204056	
3	Pablo Sabalza Doria	9203235	
4	MARION REALES Perez	79600544	MARION
5	Manuel Cela Belen	9203768	Manuel
6	Cosme PARRA	9201689	Cosme
7	Deivis Rios Moreno	1192742628	Deivis Rios M
8	OSCAR TOCUS 6	1105273134	
9	CARLOS.C. O.Z.	9.203.787	C.O.Z.
10	Jesus A. palacio M.	1052734797	
11	Juan Villarreal	9202314	Juan
12	GUSTAVO ALMEIDA	9203713	GUSTAVO
13	Jorge Polo	6332964	Jorge Polo.
14	oscar Zuñiga	7.002475586	
15	Wilson Cuadro Cabiz	1052735484	Wilson Cuadro
16	NEURO ANTONIO	16427536	FERNANDEZ
17	Jorge Fuentes	7960101	Jorge
18	Deivis Jimenez	1048437883	Deivis Jimenez
19	Jaider Polo	1002475686	Jaider polo
20	Luis Enrique Cabiz Velasco	1002475840	Luis Cabiz
21	Fabian Trapiz Mesino	73230734	
22	Helena Salas Orozco	1049537253	
23			
24			
25			

PDF Scanner ACE Scanner

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN		FECHA: 14/06/2025
HORA DE INICIO: 7:00 Am		HORA FINAL: 5:00 pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR	Jesus Mantilla P
LUGAR: Colegio villanueva					
TEMA:	P. droga y alcohol, postintegral EPP, visión, misión inducción			FIRMA DEL INSTRUCTOR	Jesus Mantilla P

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Holman Salas Orozco	1049537253	
2	GUSTAVO ALMEIDA	9202717	
3	Wilson Cuadro Galiz	1052733489	
4	COSME PARRA	9201689	
5	MARION REALES	7960544	MARION
6	ALFONZO ANTONIO	16427536	FERNANDEZ
7	Manuel Cera Belerto	9203768	Manuel
8	Pablo Sabalza M	9203235	
9	oscar zuñiga	7.002475076	oscar zuñiga
10	Luis Villalba	9207314	Luis Villalba
11	DEIVIS RIOS HAMAS	7172742678	
12	JORGE POLO	6632964	
13	[illegible]	7960101	
14	Jesus A. palacio M.	1052734797	
15	CARLOS E. O.Z	9.203.787	.O.Z
16	[illegible]	9204056	
17	OSCAR TRIS C	1.052731544	
18	Cristian Bonilla	1148424265	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

PDF Scanner ACE Scanner

CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN		FECHA: 17/06/2025
HORA DE INICIO: 7:00 Am		HORA FINAL: 5:00 Pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR		
LUGAR: Colegio villanueva				Susana Montes P		
TEMA: Patrica droga y alcohol				FIRMA DEL INSTRUCTOR		

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Deivis Rios Ramos	1192742618	Deivis Rios R
2	CARLOS.E. O.Z	9.203787	.O.Z.
3	Nelvis Antonio	16427536	Fernandez
4	Jose V [illegible]	7960101	
5	Pablo Subilia Narvaez	9203735	
6	Cosme ANNA	9201689	Cosme
7	Jesus A. polucio M	1052734797	
8	Wilson cuadro Galiz	1052735481	Wilson
9	GUSTAVO Almeida	9207313	GustAvo
10	Luis Villa [illegible] d	9207314	Luis
11	MARION PERIES	7960544	MARION
12	Jaider polo	1002475886	Jaider polo
13	Jorge polo	6632964	Jorge polo
14	OSCAR TORRES G	1.052731341	
15	oscar zuñiga	7002475076	oscarzuñiga
16	Hallman Salas Arzoa	1049537253	Hall Sa
17	Luis David Flechas Di	1047509878	Luis David Flechas
18	Camilo Cruz Tem	9204056	
19	Johnny Tapias muñoz	7323073	Johnny
20	Luis Enrique Ortiz Cole.	1002475840	Luis
21	Deivis Jimenez Blanco	1048437853	Deivis Jimenez
22			
23			
24			
25			

PDF Scanner ACE Scanner

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN	
FECHA: 18/06/25					
HORA DE INICIO: 7:00 Am	HORA FINAL: 5:00 pm	NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Soraya Monte P.			
LUGAR: Colegio Villanueva		FIRMA DEL INSTRUCTOR			
TEMA: Comunicación asertiva					

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	GUSTAVO ALMEIDA	9202313	GUSTAVO
2	COSME PARRA	9201689	Cosme
3	Wilson Cuadro Celiz	1052735489	Wilson Cuadro
4	oscar zuñiga	7002475078	oscar
5	Luis Villarreal	9202314	Luis
6	Jesus A. Polo M.	1052734799	
7	Hellman Yesid Solas O	1049537253	
8	MARION REALES	7960544	MARION REALES
9	Jose J fuentes	7960101	
10	NEURO ANTONIO	16427536	FERNANDEZ
11	CARLOS.E.O.Z	9.203787	C.E.O.Z.
12	Jaider polo	1002475886	Jaider polo
13	Jorge polo	5632964	Jorge polo
14	Luis enrique Ortiz Lobo	1002475840	
15	Dexis Jiménez Blanco	1048437853	Dexis Jiménez
16		9204056	
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

PDF Scanner ACE Scanner

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN		FECHA: 19/06/2025
HORA DE INICIO: 7:00 AM		HORA FINAL: 3:00 pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Juana Maria P.		
LUGAR: Colegio villanueva				FIRMA DEL INSTRUCTOR: Juana Maria P.		
TEMA:	Combustible Manipulacion Segura de					

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	GUSTAVO ALMEIDA	9207913	
2	Luis Villarreal	9207314	
3	Heriberto Rocha V	920109	
4	COSME PARRA	9201689	
5	Jorge polo	C632964	
6	Jaider pol	1002495886	
7	Wilson Cuadr	1052733489	
8	MARION REALES	7960549	
9	Jose V Arrieta	7960105	
10	oscar zuñiga	1002475076	
11	NIEVES ANTONIO	16427536	
12	manuel cera Belerio	9203768	
13	pablo Sabalza M	9203235	
14	OSCAR TORRES G.	1052731341	
15	Mauricio Cantillo V.	9204056	
16	Luis enrique Cruz Velasco	1002475840	
17	CARLOS E. O.Z.	9.203.787	
18	Johnny Leiva Muñoz	7323073	
19	Wellman Sola. Orozco	1049537253	
20	Cristian Benito Castro	1148974263	
21			
22			
23			
24			
25			

PDF Scanner ACE Scanner
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN	
HORA DE INICIO: 7:00 Am		HORA FINAL: 5:00pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR	
LUGAR: Colegio Villanueva					
TEMA:	entorno laboral. Convivencia y Respeto en el			FIRMA DEL INSTRUCTOR	

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	GUSTAVO ALMEIDA	9207313	
2	Luis Villarreal	9202314	
3	Heiolee Ramos	9201091	
4	COSME PARRA	9201689	
5	Jorge polo	6632964	
6	Jaider polo	1002475886	
7	Wilson Cuadro	1052735489	
8	MARION REALES	7960544	
9	Jose J Fuentes	7960101	
10	oscar Zuñiga	7002475076	
11	Mauro ANTONIO	16427536	
12	Manuel cera Beleño	9203768	
13	Pablo Sobalza H	9203235	
14	OSCAR TORRES C	1.052731541	
15	Romulo Quintana	9204056	
16	Luis Emilio Vila Lobo	1002475840	
17	CARLOS E. O.Z	9.203.787	
18	Johnny Zapata Muñoz	7327a7321	
19	Hollman Soto Orozco	1049537253	
20	Cristian Benito Castro	1148434263	
21			
22			
23			
24			
25			

PDF Scanner ACE Scanner

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN	FECHA: 21/06/25
HORA DE INICIO: 2:00 pm		HORA FINAL: 5:00 pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR	
LUGAR: Colegio Villanueva					
TEMA: Revisión mensual EPP.				FIRMA DEL INSTRUCTOR	

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	GUSTAVO Almeida	9202313	
2	Jesus Villarreal	9202314	
3	Wilder Perez	9201091	
4	COSME PARRA	9201689	
5	Jorge polo	6632964	Jorge polo
6	Jaider polo	1002475886	Jaider polo
7	Wilson Cuadro Galiz	1052733489	Wilson
8	MARLON Reales	7960544	MARLON
9	Jesus J Fernandez	7960141	
10	OSCAR ZUÑIGA	1002475076	OSCAR
11	MIGUEL ANTONIO	16427536	FERNANDEZ
12	Manuel Cera Bel	9203768	Manuel
13	Pablo Subalza H	9203285	
14	OSCAR TORRES 6	1.052.731.541	
15	Junior Perez	9204056	
16	Luis Emilio estrada	6024758	
17	Edwin TAPIA MUÑOZ	7223752	
18	CARLOS E. O.Z	9203787	0,0.Z.
19	Adan Soto Ocon	1049537253	
20	Cristian Bendo Castro	1148434263	
21	Luis David Fachos Dix	1047504870	Luis David Fachos
22	Eduardo Mena	8167129	
23			
24			
25			

ACE Scanner

ANEXO 13: PAUSAS ACTIVAS

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	CONTROL DE ASISTENCIA				CÓDIGO: FOR-GH-002
					VERSIÓN: 01
					FECHA: 5/04/2024
CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN	FECHA: 13/06/2025
HORA DE INICIO: 7:00 Am		HORA FINAL: 5:00 pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR	
LUGAR: Colegio Villanueva				Sirum Marta P	
TEMA: Pausas Activas				FIRMA DEL INSTRUCTOR	

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Holman Salas Pierco	10495372 53	
2	GUSTAVO ALMEIDA	9202313	
3	Wilson Cuadro Goliz	1052735489	
4	COSME DARIO	9201689	
5	MARLON NEALES	7960544	
6	NELLO ANTONIO	1647753	
7	Manuel Cera Belerio	9203769	
8	Pablo Sabalza H	9203235	
9	oscar Zuñiga	1002475076	
10	Luis Villacorcal	9202314	
11	DEIVIS RIOS HAMAS	1192742673	
12	Jorje Polo	6632964	
13	Jose J	7960101	
14	Jesus A palmera M.	1052734797	
15	CARLOS E. O.Z.	9,203,787	
16		9204056	
17	OSCAR TORRES C.	1.057273.341	
18	Cristian Bermúdez	1148434263	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

ACE Scanner

CONSORCIO
TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN | CHARLA DE 5 MINUTOS: ✓ | REUNIÓN | FECHA: 16/06/2025

HORA DE INICIO: 7:00Am | HORA FINAL: 5:00pm | NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Yesenia Maite P

LUGAR: Colegio villanueva | FIRMA DEL INSTRUCTOR: Yesenia Maite P.

TEMA: Pausa activa

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Agustin Cuadro V.	9204056	
2	Luis Enrique Cadiz Ledesma	1002475840	
3	NEURO ANTONIO	16427536	FERNANDEZ
4	Jose Fuentes	1796101	
5	Jesus A policio M	1052734797	
6	pablo Sabalza P	920323	
7	Deivis Rios Ramos	1192746678	Deivis Rios M
8	GORTAVO Almeida	9202313	GUALO
9	Cosme PARRA	9201689	Cosme
10	Jaider polo	1002475886	Jaider Polo
11	Jorge polo	6632964	Jorge polo
12	MARION REALES	7960 544	MARION REALES
13	Luis Villanueva	9202314	Luis Villanueva
14	Wilson Cuadro Galiz	1052735489	Wilson Cuadro
15	CARLOS.E.O.Z.	9.203.787	O.Z
16	OSCAR ZUÑIGA	7.002475076	OSCAR ZUÑIGA
17	Heriberto Ramos V	9201091	Heriberto Ramos Vergara
18	OSCAR Torres G	1.052731541	
19	Manuel Cala Belcio	9203768	Manuel
20	Holmes Soles Orozco	1049557353	
21	Deivis Jimenez Blanco	1048437853	Deivis Jimenez
22			
23			
24			
25			

PDF Scanner ACE Scanner

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	x	REUNIÓN		FECHA: 17/06/2025
HORA DE INICIO: 7:00 am		HORA FINAL: 5:00 pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Yesenia Marte	
LUGAR:				FIRMA DEL INSTRUCTOR	
TEMA: Pausas Activas					

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Dcivis Dios Hernandez	7792742673	Dcivis Dios H
2	Deslis Jiménez Blanco	1048437883	Deslis Jiménez
3	Nayra Antonia	16427536	Fernandez
4	Jose J [illegible]	79160/01	
5	Pablo Sabatro Ha[illegible]	9203235	
6	COSME PITORA	9201689	COSME
7	Jesus A. Palao M.	1052734797	
8	Wilson Cuadro Galiz	1052735480	
9	GUSTAVO ALMEIDA	9202313	Gustavo
10	Luis Villa [illegible]	9202314	Luis
11	MARLON REALES	7960544	MARLON
12	Jaider polo	1002975886	Jaider polo
13	Jorge polo	6632964	Jorge polo
14	OSCAR TORRES 6	1.052731340	
15	CARLOS E. O.Z	9.203787	O.Z
16	[illegible]	9204056	
17	Yolima Sole [illegible]	1049557253	
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

ACE Scanner

CONSORCIO
TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS		REUNIÓN	X
FECHA: 24/06/25					
HORA DE INICIO: 7:00 Am		HORA FINAL: 5:00 pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR	Susana Monte Pineda
LUGAR: Colegio Villanueva				FIRMA DEL INSTRUCTOR	Susana Monte Pineda
TEMA: Pausas Activas					

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Eduardo Duran A	8167129	
2			
3	jorge polo	6632964	jorge polo
4	jaider polo	1002475896	jaider polo
5	oscar Zuñiga	7002 475 076	oscar
6	Jesus A. palacio M.	1052734797	
7	Pablo Sabalza Hanan	9203235	
8	Luis Villacorus	9207314	Luis
9	GUSTAVO ALMEIDA	9202313	
10	[illegible]	9204056	
11	[illegible]	7960101	
12	NIBALDO ANTONIO	16427536	FERNANDEZ
13	OSCAR TORRES G.	1.052731541	
14	Wilson Cuadro Galiz	1052735484	Wilson Cuadro
15	Deivis Rios Ramos	1192742673	Deivis Rios
16	Carlos E. O.Z.	9.203.787	O.Z.
17	MARION ROALES	7960 544	MARION
18	Hollman Salas Orozco	1049537253	
19	Deivis Jiménez Blanco	1048437853	Deivis Jiménez
20			
21			
22			
23			
24			
25			

PDF Scanner ACE Scanner

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN	

FECHA: 25/06/25

HORA DE INICIO: 7:00 Am
HORA FINAL: 5:00 pm
LUGAR: colegio Villanueva.
TEMA: Pausas Activas

NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Susana Maria P.
FIRMA DEL INSTRUCTOR: Susana Maria P.

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	OSCAR Torres G	1.052731541	
2	NEDRO ANTONIO	16427536	FERNANDEZ
3	Wilson Cuadro Cañiz	1052735489	Wilson Cuadro
4	Jose J Pinedo	7960101	Jose
5	CARLOS E. O.Z.	9.203.787	O.Z
6	DEIVIS DIOS MANAS	1192742673	DEIVIS DIOS M
7	Manuel ecro Belerio	9203768	Manuel
8	MARION REALES	7960544	MARION
9	Mauricio Cuadro Jaramillo	9204056	
10	Luis Enrique Diaz Lubesco	1052475840	
11	Deris Jiménez Blanco	1048437853	Deris Jiménez
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

ACE Scanner

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS		REUNIÓN		FECHA: 26/06/25
HORA DE INICIO: 7:00 Am		HORA FINAL: 5:??		NOMBRE DEL INSTRUCTOR		
LUGAR: Colegio Villanueva						
TEMA:	Pensión asistencia			FIRMA DEL INSTRUCTOR		

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Alcides Ramos Vargas	9201091	Alcides Ramos V.
2	GUSTAVO ALMEIDA	9.202.717	Gusto
3	COSME PARRA	9201684	Cosme
4	Pablo Sabalza Herrera	9203235	
5	Manuel Cera Bele	9203768	Manuel
6	OSCAR Torres G	1.032.751 Sca	
7	Jesus A. palacio M.	1052734797	
8	oscar zuñiga	7002475076	oscar zuñiga
9	Luis Villarreal	9207314	Luis V
10	Wilson Cuadro Gaviz	1052735484	Wilson Cuadro
11	Deivis Rios Ramos	1192742673	Deivis Rios R
12	Jorge I Granados	4960101	Jorge
13	CARLOS E. O.Z	9.203.787	O.Z.
14	MAYLON DeAles	7960 544	MAYLON
15	Jorge polo	6632964	Jorge polo
16	jaider polo	1002475886	jaider polo
17	NEURO ANTONIO	16427536	FERNANDEZ
18		9204086	
19	Denis Jiménez Blanco	1048437853	Denis Jiménez
20	Holman Yesid Salas O.	1049537253	
21	Cristian Jose Bernio Castro	1148434263	
22	Jhon Emilio Ortiz Velasco	1002475840	
23			
24			
25			

PDF Scanner ACE Scanner

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN	
HORA DE INICIO: 7:00 Am		HORA FINAL: 5:00pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR	Susana Monte P
LUGAR: Colegio Villanueva				FIRMA DEL INSTRUCTOR	Susana Monte P
TEMA:	Pausas Activas				

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Manuel cera Behenio	9203768	Manuel
2	CARLOS E. O. Z.	9.203.787	C. E. O. Z.
3	Wilson Cuadro Goliz	1052735480	Wilson
4	OSCAR Torres G.	1.052731541	
5	NEGRO ANTONIO	16427536	FERNANDEZ
6	Heddas Raul Jorge	9201 091	
7	MARION REALES	7960 540	MARION
8	[illegible]	796001	
9	Luis Enrique Ortiz Velasco	1002475840	
10	Luis Villarreal	9202314	Luis V.
11	GUSTAVO ALMEIDA	9202 313	Gustavo
12	Deivis Dios Ramas	1192742673	Deivis Dios R
13	Pablo Sabalza Barrios	9203235	
14	oscar zuñiga	1002475076	
15	Cosme PARRA	9201 689	cosme
16	Jesus A. palacio M.	1052734797	
17	jorge polo	6632964	jorge polo
18	jaider polo	1002775886	jaider polo.
19	Dagis Jiménez Blanco	1048537853	Dagis Jiménez
20	Holman Yesid Soto O.	1049537753	
21			
22			
23			
24			
25			

PDF Scanner ACE Scanner

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN		FECHA: 28/06/25
HORA DE INICIO: 7:00 Am		HORA FINAL: 5:00 pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR		
LUGAR: Susana Monte P.				Susana Monte		
TEMA: pausas activas				FIRMA DEL INSTRUCTOR		
				Susana Monte		
No.	NOMBRE		CEDULA		FIRMA	
1	OSCAR TORRES G		1.052733.541			
2	Jose V Fuentes		7960101			
3	Pablo Sabalza M		9203235			
4	Luis Enrique Ortiz Velasco		1002475840			
5	Deivis Rios Ramos		7792742673		Deivis Rios R	
6	MARLON REALES		7960 544		MARLON	
7	Jesus A. palacio M.		1052734797			
8	Manuel Cera Beleño		9203 768		Manuel	
9	OSCAR ZUÑIGA		7.002 475076		OSCAR	
10	NEDRO ANTONIO		16427536		FERNANDEZ	
11	Wilson Cuadro Goliz		1052735484		Wilson	
12	COSME PARRA		9201 689		cosme	
13	GUSTAVO ALMEIDA		9202 313		GUSTAVO	
14	Jorge polo		6632964		Jorge polo	
15	Jaider polo		1002 475886		Jaider polo	
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

PDF Scanner ACE Scanner

11. ANEXO 2. SEGURIDAD SOCIALESPECIALISTA HIDRAULICO YOVANI CASTRO.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3062155	NELSON YOVANI CASTRO LADINO	Calle 114 #56-54	3133497913	yovanicastro21@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	19/06/2025	87250041	$912.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	400.000	0		0		0	0	0	0	400.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	512.000	0	0	0	0	0	0		512.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	400.000	400.000
Pensión	1	512.000	512.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	912.000	912.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3062155	NELSON YOVANI CASTRO LADINO		Calle 114 #56-54	3133497913	yovanicastro21@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	19/06/2025	87250041	$912.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Dirección	Actividad	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	ISC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	ISC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	ISC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	ISC CCF	Aporte CCF	ISC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	3062155	CASTRO LADINO NELSON YOVANI	3	0			N															230201	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS008	3.200.000	400.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

12. ANEXO 3- SEGURIDAD SOCIAL ESPECIALISTA ELECTRICISTA FABER PARRA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1049611325

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	FABER ALI PARRA RAMIREZ		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	1049611325
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CARRERA 16 # 183-43 TORRE 4 APTO	Teléfono	4735619
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e ingeniería
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	**7973304873**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	junio / 2025	Periodo Cotización Salud	junio / 2025
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2025/06/16
Número Autorización	1557599467		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	FABER ALI	Apellidos	PARRA RAMIREZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1049611325
Tipo cotizante	INDEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 2.467.017	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.423.500
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 227.800
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 227.800**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Tarifa	12,500 %	IBC	$ 1.423.500
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 227.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 227.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 405.800**

2025/06/25 6:46 PM USUARIO: SOI - CC1049611325 PÁGINA 1 DE 1

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

13. ANEXO 4- SEGURIDAD SOCIAL ESPECIALISTA GEOTECNIA ORLANDO ELIAS GOMEZ.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018419289	ORLANDO ELIAS GOMEZ MALDONADO	Carrer14 89-03 apto 302	3716785	oegomezm@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	29/05/2025	86920210	$1.393.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	600.000	0		0		0	0	0	0	600.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	768.000	0	0	0	0	0	0		768.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	25.100				25.100	0	0	25.100			251	25.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	600.000	600.000
Pensión	1	768.000	768.000
Riesgos Laborales	1	25.100	25.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.393.100	1.393.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO
TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018419289	ORLANDO ELIAS GOMEZ MALDONADO	Carrer14 89-03 apto 302	3716765	oegomezm@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLEADOS	UPC	
					1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR		
2025-05	2025-05	I	29/05/2025	86920210	$1.393.100		

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Depend.	Extranjero	Colomb. en exterior	Estudiante	Tipo	IGE	LMA	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase Aportante	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018419289	GOMEZ MALDONADO ORLANDO ELIAS	57	0		N																	230301	4.800.000	768.000	0	0	0	0	EPS005	4.800.000	600.000	14-23	4.800.000	1	23.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

14. ANEXO 5-RESULTADOS DE LABORATORIO MUESTRAS DE CONCRETO M-7 Y M-8, CON FECHAS DE VACIADO DE 19 Y 21 DE JUNIO RESPECTIVAMENTE.

AC INGENIERIA S.A.S.
Asesorías y Consultorías
Antonio Cogollo Ingenieros SAS
Nit: 900.417.542-6

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
Barrio la Concepcion calle 1# 101 22 - Teléfono 6816248 Cartagena de Indias D.T. - Bolívar
Celular 3012332299 - email: claudiaserrano78@hotmail.com -ingantoniocogollo@hotmail.com

ENSAYO DE RESISTENCIA DEL CONCRETO A COMPRESION: AASHTO T22 / ASTM C39

PARA:	CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR	NIT:	Dimensiones de Cilindro
OBRA:	CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA MUNICIPIO VILLANUEVA		Alto 12,00 pulg
FECHA:	sábado, 5 de julio de 2025	RESISTENCIA DE DISEÑO : HOJA: 1	Diámetro 6,00 pulg

Muestra No.	Descripción Elemento	Res. Diseño PSI	Ubicación	Slump Pulg.	Fecha Fundida	Fecha Rotura	Dias	Carga KNw	Carga Kg	Carga Libras	Res. MPa	Res. kg/cm²	Res. PSI	% diseño
M-7					19-jun-25	26-jun-2025	7	384,40	39198	86417	21,1	215	3056	
M-7					19-jun-25	26-jun-2025	7	389,60	39728	87586	21,4	218	3098	
M-8					21-jun-25	28-jun-2025	7	516,30	52648	116069	28,3	289	4105	
M-8					21-jun-25	28-jun-2025	7	526,40	53678	118339	28,9	294	4185	

Observaciones: _____

CLAUDIA COGOLLO SERRANO
Ingeniera Civil - Universidad Tecnologica de Bolivar

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

15. ANEXO 6- Solicitud de certificación sobre permisos ambientales requeridos para la ejecución del proyecto cuyo objeto "Construcción de la Infraestructura de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria, Municipio de Villanueva – Departamento de Bolívar, Lote 1" – Contrato No. 3222 de 2024.

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

Cartagena, 17 de junio de 2025 Oficio No: CEV004-2025

Señores
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE
Atn: Gustavo Calderón
Cartagena

Asunto: Solicitud de certificación sobre permisos ambientales requeridos para la ejecución del proyecto cuyo objeto "Construcción de la Infraestructura de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria, Municipio de Villanueva – Departamento de Bolívar, Lote 1" – Contrato No. 3222 de 2024

Respetados señores:

Reciban un cordial saludo.

A través de la presente, en mi calidad de representante legal del proyecto cuyo Objeto es "Construcción de la Infraestructura de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria, Municipio de Villanueva – Departamento de Bolívar, Lote 1", vinculado al Contrato No. 3222 de 2024, me permito solicitar de manera comedida se nos informe, mediante concepto técnico o certificación oficial, si para la ejecución de las obras contempladas es necesario gestionar algún tipo de permiso, licencia o autorización ambiental ante esa Corporación.

Vale la pena precisar que en el desarrollo de las actividades previstas no se contempla la tala de árboles, no se efectuarán vertimientos a fuentes hídricas, las aguas residuales serán tratadas mediante un sistema de pozos sépticos y no se proyectan intervenciones sobre cauces hídricas.

En este sentido, agradeceríamos nos confirmen si, conforme a las condiciones expuestas, se requiere adelantar algún trámite ambiental o, en caso contrario, se expida la respectiva certificación que indique la inexistencia de obligación de trámite ambiental adicional ante CARDIQUE.

De igual forma, en caso de que se determine la necesidad de obtener alguna autorización o permiso, solicitamos amablemente se nos brinde la orientación pertinente sobre el procedimiento a seguir, los requisitos que deben cumplirse, la documentación que debe aportarse, los formatos aplicables y los tiempos estimados para su obtención, de manera que se pueda garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y la continuidad del proyecto sin contratiempos.

Cra 29B 29ª 81 Callejón Méndez, Brr Pie de la popa
(605) 665 7337 - 3214366620
consorcioeducativovillanueva@gmail.com

Agradezco de antemano la atención prestada a esta solicitud y quedo atento a cualquier información adicional que estimen pertinente.

Atentamente,

DIANA SOFÍA REYES GARCÍA
Representante Legal
Consorcio Educativo Villanueva 2024
C.C. No. 22.478.737 de Barranquilla

1/7/25, 10:17 CARDIQUE -Estado de PQRSD-

CARDIQUE
Corporación autónoma regional del canal del dique

Inicio | Solicitud PQRSD | Consulta PQRSD

Estado de la de petición, queja, reclamo, sugerencia o denuncia

Radicado	2025-05775
Asunto	Solicitud de certificación sobre permisos ambientales requeridos para la ejecución del proyecto cuyo objeto "Construcción de la Infraestructura de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria, Municipio de Villanueva
Medio de Re...	Correo electrónico
Medio de Ra...	Correo electrónico
# Solicitud	28918
Fecha Radica...	19/06/2025
Estado	RADICADA
Identificación	28124
Nombre Soli...	Consorcio Educativo Villanueva dos mil veinticuatro
Tipo	Petición

1 - 1

https://cardique.activosti.co/ords/f?p=250000:4:0:::4:P4_COD_SOLICITUD:28918 1/2

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CARDIQUE
Corporación autónoma regional del canal del dique

Inicio Solicitud PQRSD Consulta PQRSD

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

16. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de junio de 2025, se evidencia un avance representativo en las actividades de cimentación, destacando la instalación de 8.530,61 kg de acero de refuerzo entre zapatas y pedestales, así como la colocación de 448,38 m² de concreto de limpieza y 103.4 m³ de concreto estructural, lo que indica que las fases de fundida de zapatas están en desarrollo. También se han ejecutado 1278 m³ de excavación y 436 m³ de relleno con material seleccionado, reflejando el inicio de las etapas de conformación y compactación. Las cantidades reflejan un progreso sostenido en la ejecución del proyecto conforme a lo programado.

El avance físico fue del 1,11 %, no superando el programado para el mismo periodo (1,77 %), lo que evidencia que no se ha cumplido con la programación proyectada para este mes a pesar de que en el porcentaje acumulado si hallamos cumplido, por lo que se debe avanzar y reforzar las actividades con más personal con el fin de estar por encima de la programación y cumplir con los tiempos pactados. No obstante, se presenta la condición desfavorable de la lluvia que nos impide continuar con el transcurso normal de las actividades , debido a que el terreno es arcilloso y expansivo , lo que dificulta el acceso de maquinaria, además de ser un peligro para la seguridad de los trabajadores ya que al ser un terreno inestable, el personal técnico puede sufrir caídas o lesiones en las partes de su cuerpo si esta llega a ser al lado de las excavaciones las cuales suelen tener en promedio 2m de profundidad.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com
