ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

BOGOTÁ

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ZONA SUR ORIENTE

CTO SDM 2024-3653

INFORME MENSUAL No. 9

24 DE SEPTIEMBRE A 23 DE OCTUBRE

UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024

OCTUBRE 2025

ICOVÍAS INGENIERIA VIAL S.A.S.
UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
DISEÑÓ Y APROBÓ	Luis Fernando Rubiano Barrero	Director De Proyecto MSc. Planeación de Transporte e Ingeniería	
REALIZÓ	Alba Avendaño Cipagauta	Coordinadora	

INTERVENTORÍA JOYCO S.A.S

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	Ing. Sergio Valderrama Camargo	Director de interventoría	
APROBÓ	Ing. Julián Álvarez	Residente de interventoría	

MODIFICACIONES		

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
2.1 LOCALIZACIÓN 7
3. PERIODO DE REPORTE 9
4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO (VIGENTE/EN ACTUALIZACIÓN) 10
5. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 11
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 15
6.1 HORIZONTAL 15
6.2 VERTICAL 22
7. PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO 31
8. ASPECTOS TÉCNICOS 36
9. ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A CRUCE DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES 39
10. PLAN DE CALIDAD 40
11. PROTOCOLO DE MANEJOS DE RESIDUOS 41
12. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CORREDORES 42
13. REPORTE ESTADISTICO 43
13.1 EJECUCIÓN POR COMPONENTE 43
13.2 ZONAS ESCOLARES 44
14. CERTFICADOS DE CALIBRACIÓN, FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ESTADO DE LOS EQUIPOS 49
15. SEÑALIZACIÓN ENTREGADA A ALMACÉN 50
16. REPORTE DE SEÑALIZACIÓN RETIRADA EN VÍA Y ENTREGADA A ALMACÉN 58
17. ASPECTOS VARIOS 59
18. RECURSOS UTILIZADOS PARA EL CONTRATO DE OBRA 63

18.1 PERSONAL 63
18.2 EQUIPO 63
18.3 INSTRUMENTOS USADOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 63
19. VINCULACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE. 65
20. VINCULACIÓN DE PORCENTAJE DE MUJERES. 66
21. FACTOR SOCIAL 67
22. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 68
23. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS 69
24. PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO 70
25. CERTIFICACIÓN SALARIOS Y HONORARIOS 71
26. LISTADO DE PROVEEDORES 72
27. CERTIFICACIÓN PAGOS PROVEEDORES 73
28. ESTADO PRESUPUESTAL 74
29. PUNTAJE 78
30. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 79
31. ANEXOS 80

Gráfica 1 Gráfica Curva S 75

Ilustración 1 Localización Zona 7 8
Ilustración 2 Precipitación mes de octubre 37

Tabla de contenido (Tablas)

Tabla 1 Datos generales del Contrato 7
Tabla 2 UPZ localidades asignadas 8

Tabla 3 Vigencia Pólizas CTO 2024-3563 10
Tabla 4 Diseños Asignados para Implementación 11
Tabla 5 PMTs solicitados cuenta 8 31
Tabla 6 Inspecciones realizadas 36
Tabla 7 Actividades por componente 43
Tabla 8 Zonas Escolares Intervenidas 44
Tabla 9 Elementos de Señalización Vertical y Dispositivos de Control Implementados 50
Tabla 10 Estado Georeferenciación 59
Tabla 11 Personal mínimo 63
Tabla 12 Equipos empleados para la ejecución de las actividades 63
Tabla 13 Cantidades ejecutadas por ID 74
Tabla 14 Balance presupuestal 76

1. INTRODUCCIÓN

Con el propósito de atender las necesidades de señalización de la ciudad de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM, como autoridad de tránsito y en cumplimiento de sus funciones establecidas por el Decreto 672 del 22 de ENERO de 2018[1], se encarga de ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la señalización vertical y horizontal de la ciudad, así como los demás elementos y dispositivos que propendan por garantizar la seguridad vial, el buen uso del espacio público y la gestión del tránsito en la ciudad.

Es así que la SDM generó un programa para implementar las medidas necesarias y realizar el mantenimiento rutinario y correctivo de la señalización de la ciudad, que incluye la señalización de ciclorrutas, medidas de gestión, carriles preferenciales, carriles de alta ocupación vehicular, proyectos de urbanismo táctico, plazas, corredores verdes, distritos verdes, barrios vitales y mantener en condiciones óptimas de señalización para todos los usuarios de la vía; integrando por grupos las veinte (20) localidades y dividiendo el perímetro urbano y rural en siete (7) zonas y en catorce (14) corredores principales.

En marco de este programa la SDM celebro el contrato SDM-2024-3653 con la firma Unión Temporal Ecoseñalizacion 2024, el cual tiene por objeto "*Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. Zona Sur Oriente*", para la atención integral de las actividades de implementación de señalización, donde se incluye el suministro e instalación de la señalización vertical de pedestal, la aplicación de señalización horizontal y la implementación de otros dispositivos de señalización horizontal en la malla vial de las localidad de Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar y y en los corredores de la Av Boyacá (entre Rio Tunjuelito y KR 9 Bis) y La Via al Llano (CL 86 SUR CON KR 11 hasta Concesión Autopista al Llano), o en las zonas diferentes a la asignada en la ciudad, de acuerdo a la definición de puntos o actividades a desarrollarse que establezca el comité técnico.

En el siguiente informe mensual No 09, se presenta un resumen sobre las principales actividades de señalización vertical, horizontal e implementación y/o suministro de dispositivos viales, realizadas por la Unión Temporal Ecoseñalizacion 2024, durante el periodo 24 de septiembre al 23 de octubre de 2025, en cumplimiento de los compromisos contractuales del contrato de obra SDM-2024-3653.

[1] "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital, de Movilidad y se dictan otras disposiciones"

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 Datos generales del Contrato

Número de Contrato de Obra	SDM 2024-3653
Objeto del Contrato	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. – ZONA SUR ORIENTE"
Contratante:	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Contratista	UT ECOSEÑALIZACION 2024
Plazo de ejecución:	34 meses
Fecha de acta de Inicio:	24 de enero 2025
Fecha de Terminación:	23 de noviembre del 2027
Valor Inicial:	$18.771.473.428
Lugar de Ejecución	Bogotá D.C., Localidades: San Cristobal, Usme y Sumapaz, Corredores de Av Boyacá (entre Rio Tunjuelito y KR 9 Bis) y La Via al Llano (CL 86 SUR CON KR 11 hasta Concesión Autopista al Llano)
Interventoría:	JOYCO S.A.S BIC
Número de Contrato de Interventoría	SDM 2024-3668

Fuente: Elaboración propia

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Bogotá D.C., y se concentra en la Zona 7 Sur Oriente , conformada por las localidades : San Cristobal, Usme y Sumapaz , también se ejecutarán actividades en los corredores asignados Av Boyacá (entre Rio Tunjuelito y KR 9 Bis) y La Vía al Llano (CL 86 SUR CON KR 11 hasta Concesión Autopista al Llano) como se muestra en la siguiente figura:

Ilustración 1 Localización Zona 7



Fuente: Elaboración propia a partir de imagen en internet

Estas localidades se encuentran conformadas por las siguientes Unidades de Planificación Zonal UPZ:

Tabla 2 UPZ localidades asignadas

4. San Cristóbal	5. Usme	20. Sumapaz
32 San Blas 33 Sosiego 34. 20 de Julio 50. La Gloria 51 Los Libertadores	52 La Flora 56 Danubio 57 Gran Yomasa 58 Comuneros 59 Alfonso Lopez 60 Parque Entre Nubes	Rio Blanco Río Sumapaz

Fuente: Elaboración propia

3. PERIODO DE REPORTE

Este informe presenta el detalle de las actividades de señalización horizontal, señalización vertical e Instalación de dispositivos de tránsito y/o elementos canalizadores del tráfico, realizadas por la Unión Temporal Ecoseñalizacion 2024 en cumplimiento del Contrato SDM-2024-3653, para el periodo del 24 de septiembre al 23 de octubre de 2025.

4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO (VIGENTE/EN ACTUALIZACIÓN)

Una vez firmada el Acta de Inicio No. SDM 2024-3653 (del 24 de enero de 2025), entre la Unión Temporal Ecoseñalización 2024 y la SDM, se remitieron las pólizas emitidas por parte de la compañía de seguros Mundial de Seguros a la Entidad, conforme las exigencias establecidas en el contrato, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la SDM.

En el mes de mayo se presentaron observaciones a algunos amparos que cubren estas pólizas, las mismas fueron atendidas y se esta a la espera de la aprobación por parte de la SDM.

La ejecución de este contrato está amparada por las siguientes pólizas (las cuales se presentan en el Anexo 1. Pólizas) que cubren los respectivos riesgos.:

Tabla 3 Vigencia Pólizas CTO 2024-3563

Amparos Firma del Contrato	Porcentaje	Valor	Vigencia	
			Inicio	Vencimiento
Cumplimiento	(30% sobre el valor del contrato)	$5.631.442.029	27-12-2024	27-05-2030
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	(__% sobre el valor del anticipo)			
Calidad del Servicio Ofrecido	(30% sobre el valor del contrato)	$5.631.442.029	27-12-2024	27-05-2030
Estabilidad y Calidad de la Obra	(30% sobre el valor del contrato)	$5.631.442.029	27-12-2024	27-05-2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	(20% sobre el valor del contrato)	$3.754.294.686	27-12-2024	27-11-2030
Responsabilidad Civil Extracontractual	(30% sobre el valor del contrato)	$5.631.442.029	27-12-2024	24-11-2030

Fuente: Elaboración propia

5. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta los Identificadores de Diseño (ID) asignados, en la siguiente tabla se expone el estado de los diseños entregados para implementación:

Tabla 4 Diseños Asignados para Implementación

No	ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
1	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3	29/01/2025	USME	EJECUTADO
2	MV_05_122_1867_12	29/01/2025	USME	EJECUTADO
3	EX_05_119_1867_12	29/01/2025	USME	EJECUTADO
4	EX_05_93_1244_11	29/01/2025	USME	EJECUTADO
5	EX_05_110_1867_12	29/01/2025	USME	EJECUTADO
6	EX_05_053_1744_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
7	EX_05_108_1867_12	29/01/2025	USME	EJECUTADO
8	EX_05_003_1073_24	29/01/2025	USME	EJECUTADO
9	EX_05_113_1867_12	29/01/2025	USME	EJECUTADO
10	EX_05_005_1073_24	29/01/2025	USME	EJECUTADO
11	EX_05_004_1073_24	29/01/2025	USME	NO SE EJECUTA
12	EX_04_261_1561_10	29/01/2025	SAN CRISTOBAL	NO SE EJECUTA
13	EX_05_352_1561_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
14	EX_05_101_1244_11	29/01/2025	USME	EJECUTADO
15	EX_05_002_1073_24	29/01/2025	USME	NO SE EJECUTA
16	EX_05_006_1744_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
17	EX_05_001_1073_24	29/01/2025	USME	EJECUTADO
18	EX_05_280_1561_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
19	EX_05_007_1073_24	29/01/2025	USME	NO SE EJECUTA
20	EX_05_007_1445_14	29/01/2025	USME	NO SE EJECUTA
21	EX_05_310_1561_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
22	EX_05_307_1561_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
23	EX_05_008_1073_24	29/01/2025	USME	EJECUTADO
24	MV_20_526_943_10	29/01/2025	SUMAPAZ	NO SE EJECUTA
25	MV_20_025_670_11	29/01/2025	SUMAPAZ	NO SE EJECUTA
26	MV_20_021_670_11	29/01/2025	SUMAPAZ	NO SE EJECUTA
27	SH_SV_PUNTO4_TMSA_V1	10/02/2025	USME	EJECUTADO
28	SDM-202461204315912 Y SDM-202461204636702	14/02/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
29	SDM-202461204158462	14/02/2025	USME	EJECUTADO
30	SDM- 202461203879272	14/02/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
31	SDM- 202461204426482	14/02/2025	SUMAPAZ	EJECUTADO
32	SDM-202561200270682	14/02/2025	USME	EJECUTADO
33	SUMINISTRO 1	18/02/2025	NA	EJECUTADO
34	SDM-202461204137592	20/02/2025	USME	EJECUTADO
35	ASIGNACIÓN CP Reposición de Hitos Ciclorrutas	21/03/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO

No	ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
37	CP 202561200744162 RETIRO DE SEÑAL	8/04/2025	USME	EJECUTADO
38	CP-202561200703942	8/04/2025	USME	EJECUTADO
39	CP COLEGIO FLORENTINO Y FRANCISCO JOSE	14/04/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
40	IMPLEMENTACION PMT de EMERGENCIA AV LOS CERROS	14/04/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
41	CP Carrera 6 entre Calle 24 Sur y Av. Primero de Mayo.	15/04/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
42	CP Carrera 4 entre Av. Primero de Mayo y Calle 19A Sur Calle 19A Sur entre Carrera 6 y Carrera 5A.	15/04/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
43	CP Av. Primero de Mayo entre Carrera 9A y Carrera 1B	15/04/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
44	SIRE 5453567	6/05/2025	USME	EJECUTADO
45	CP AV BOYACA - TV 3 F (TRAMO SUR-NORTE; NORTE-SUR)	8/05/2025	USME	EJECUTADO
46	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561201777022	6/06/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
47	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561201795562	13/06/2025	USME	EJECUTADO
48	CP BIKE BOX CARACAS	14/06/2025	USME	EJECUTADO
49	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202098412	3/07/2025	USME	EJECUTADO
50	SUMINISTRO IDIPRON SI-35	7/07/2025	N/A	EJECUTADO
51	SDM-202561202230222	15/07/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
52	SUMINISTRO IDIPRON SI-35 Y DUPLEX	17/07/2025	N/A	EJECUTADO
53	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202378942	24/07/2025	USME	EJECUTADO
54	PMT DE EMERGENCIA Evento SIRE-5456812	24/07/2025	USME	EJECUTADO
55	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202286462	24/07/2025	USME	EJECUTADO
56	SUMINISTRO IDIPRON SR-28/ PLAQUETA	29/07/2025	N/A	EJECUTADO
57	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202284382	4/08/2025	USME	EJECUTADO
58	CP PASACALLES AV BOYACÁ	5/08/2025	FONTIBON	EJECUTADO
59	SUMINISTRO IDIPRON SR-17	13/08/2025	N/A	EJECUTADO
61	CP COLEGIO NUEVA ROMA	15/08/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
61	SUMINISTRO IDIPRON SI-35, SR-30	20/08/2025	N/A	EJECUTADO
62	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202379632	20/08/2025	USME	EJECUTADO


No	ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
63	CP BARRIO LA MARIA	20/08/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
64	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202439322	29/08/2025	USME	EJECUTADO
65	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202657962	29/08/2025	USME	EJECUTADO
66	EX_04_030_1561_10	2/09/2025	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
67	EX_04_051_414_11_V2	2/09/2025	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN
68	EX_04_241_1561_10_V9	2/09/2025	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN
69	EX_04_488_826_10_V7	2/09/2025	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN
70	MV_05_99_1244_11_V3	2/09/2025	USME	INSPECCIONADO
71	EX_05_213_1561_10_V5	2/09/2025	USME	EN EJECUCIÓN
72	EX_05_286_1561_10_V3	2/09/2025	USME	EN EJECUCIÓN
73	SUMINISTRO MALETINES	3/09/2025	N/A	EJECUTADO
74	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202584052 y SDM-202561202664192	4/09/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
75	CP_05_1524	9/09/2025	USME	EN EJECUCIÓN
76	SUMINISTRO IDIPRON SI-35, SR-30	9/09/2025	N/A	EJECUTADO
77	CP-05-1631	15/09/2025	USME	INSPECCIONADO
78	CP_04_1627	22/09/2025	USME	INSPECCIONADO
79	CP_04_1625	22/09/2025	USME	INSPECCIONADO
80	SUMINISTRO IDIPRON SR-06 (No 7)	25/09/2025	N/A	EJECUTADO
81	SUMINISTRO IDIPRON SI-35, SR-30 (No 8)	25/09/2025	N/A	EJECUTADO
82	PÉNDONES AK 7	25/09/2025	VARIAS	EJECUTADO
83	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561203372182	29/09/2025	USME	NO SE EJECUTA
84	CP_04_1630	30/09/2025	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
85	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561203329962 –DI -22669 - CL 111 Sur Quebrada Mediania	1/10/2025	USME	INSPECCIONADO
86	CP_05_1669	7/10/2025	USME	INSPECCIONADO
87	CP_05_1670	7/10/2025	USME	INSPECCIONADO
88	CP_05_1671	7/10/2025	USME	INSPECCIONADO
89	CP_05_1672	7/10/2025	USME	INSPECCIONADO
90	CP_05_1673	7/10/2025	USME	INSPECCIONADO
91	CP_05_1674	7/10/2025	USME	INSPECCIONADO
92	CP_05_1646	7/10/2025	USME	INSPECCIONADO
93	CP_05_1647	7/10/2025	USME	INSPECCIONADO
94	CP_05_1648	7/10/2025	USME	INSPECCIONADO
95	CP_04_1594	9/10/2025	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
96	CP_05_1690	9/10/2025	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
97	CP_ AK 10X CL 13 SUR	9/10/2025	USME	NO SE EJECUTA



No	ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
98	CP_ AUTOPISTA AL LLANO X 91 SUR	9/10/2025	USME	EJECUTADO
99	Suministro Idipron Sp-48, Sr-plaqueta (9)	9/10/2025	N/A	ASIGNADO
100	CP_05_1693	16/10/2025	USME	INSPECCIONADO
101	Suministro Idipron (10). SI-35	17/10/2025	NA	ASIGNADO
102	Ciclorruta AC75 entre AV boyacá y Kr 76	22/10/2025	ENGATIVA	NO SE EJECUTA


Fuente: Elaboración propia


6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

6.1 HORIZONTAL

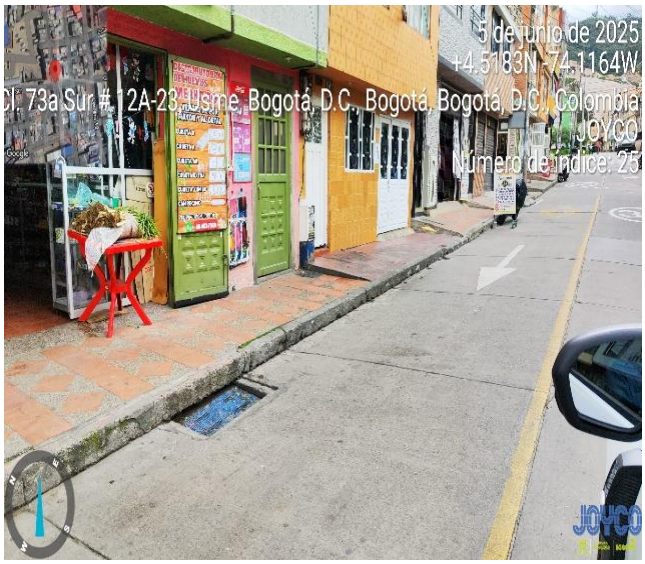EX_05_352_1561_10	
ANTES	**DESPUÉS**
CL 73A SUR KR 2A	
	
CL 72 SUR KR 10	
	

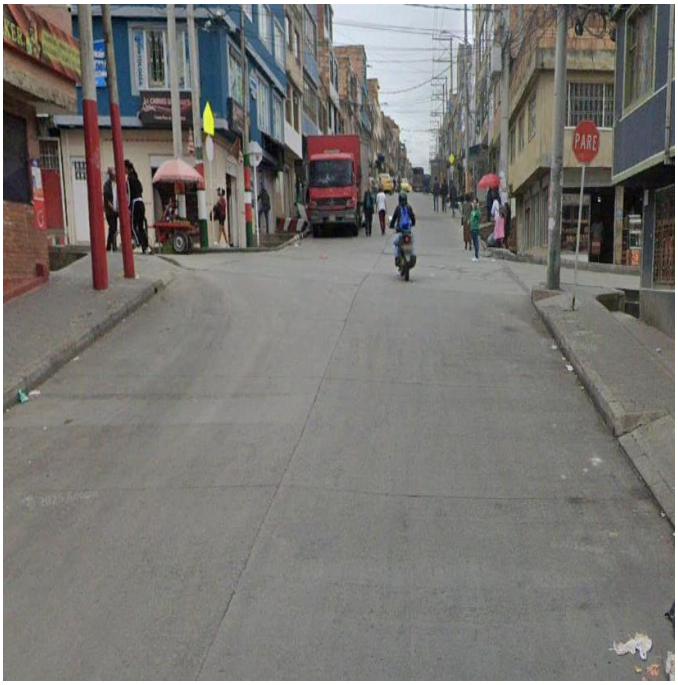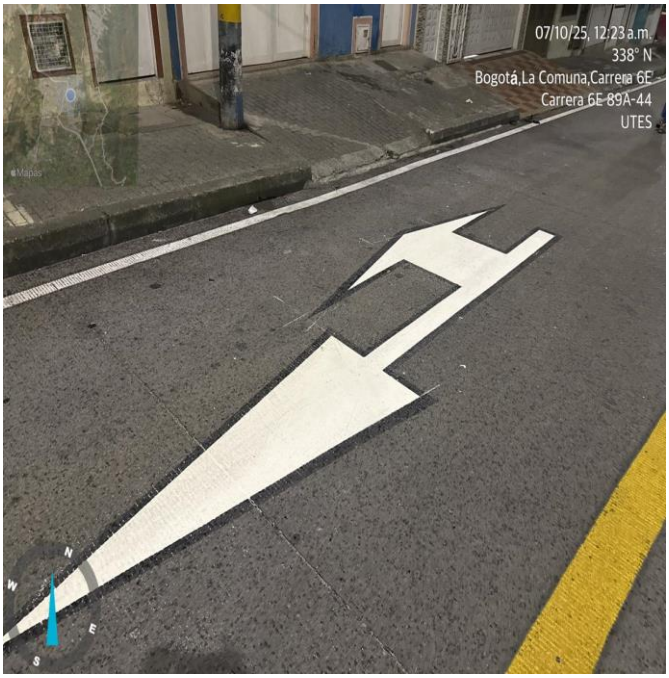
EX_05_286_156_10	
ANTES	**DESPUÉS**
KR 6 ESTE CL 89C	
	
KR 6 ESTE CL 89A	
	

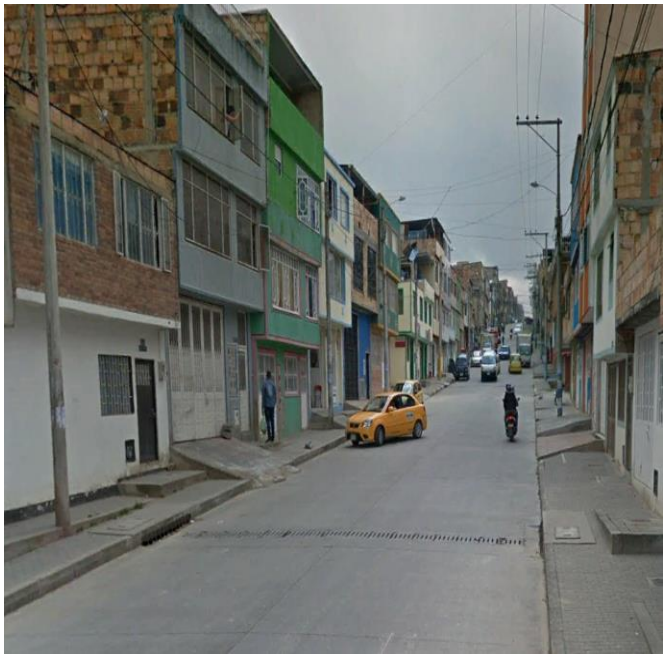KR 6 ESTE CL 89	
	
CL 88D SUR KR 7	
	

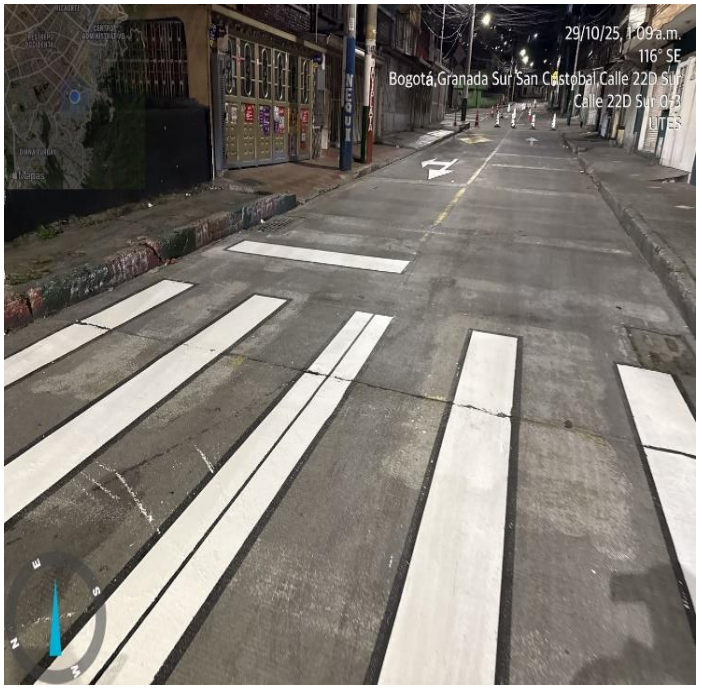EX_04_241_1561_10	
ANTES	**DESPUÉS**
CL 22D SUR KR 1	
	
CL 22D SUR KR 1	
	

KR 18 CL 24 SUR



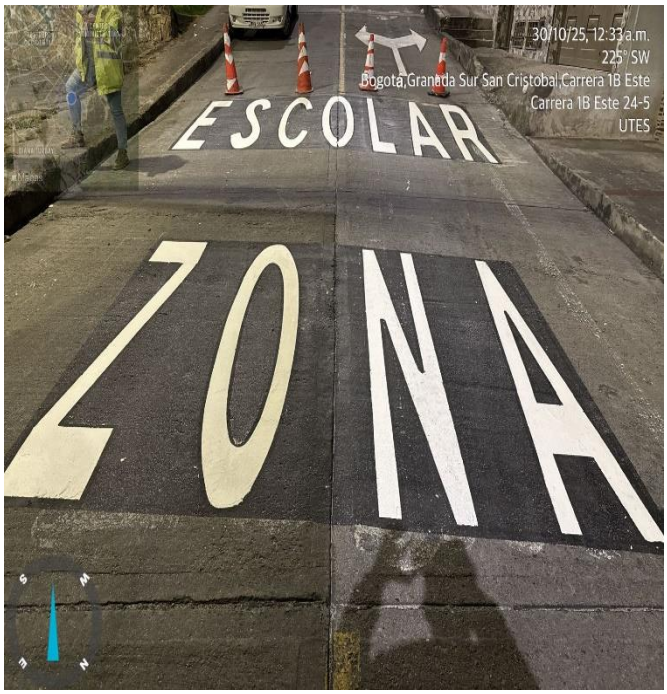


CL 22D SUR KR 1







EX_04_488_826_10	
ANTES	**DESPUÉS**
KR 7E CL 27A	
	
KR 8 ESTE CL 26	
	

CL 29 SUR KR 4

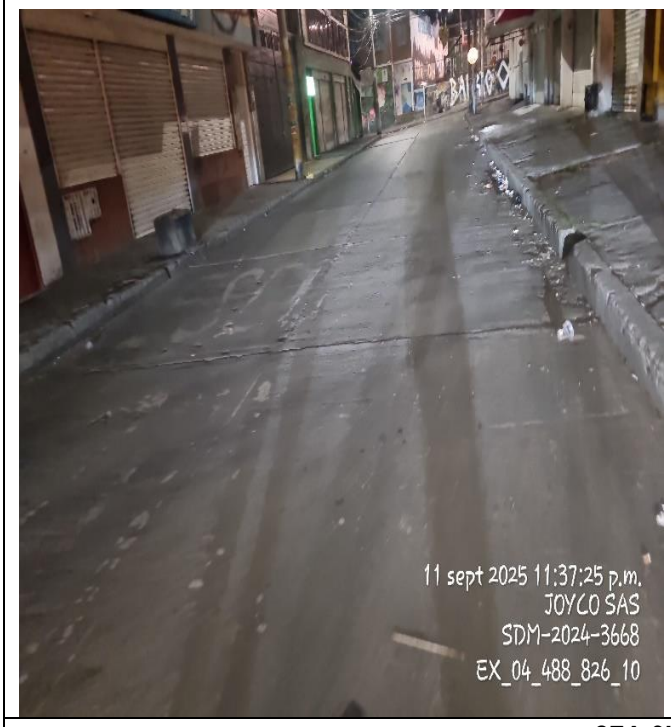

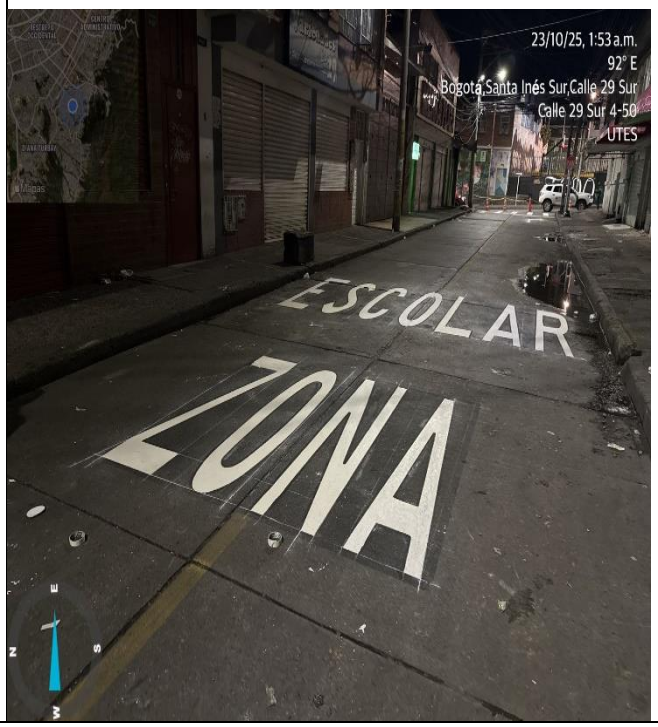

27A SUR KR 24

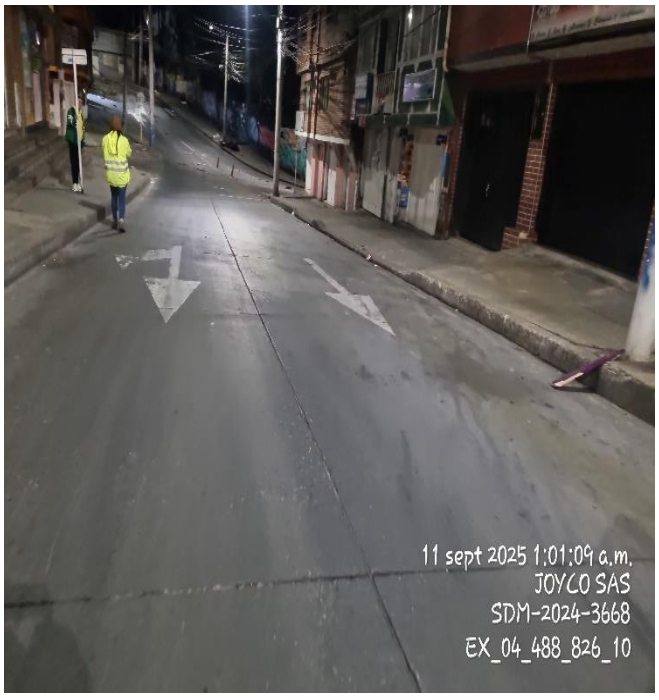



6.2 VERTICAL

CP NUEVA ROMA_EX_04_044_1561_10	
San Cristobal	
	
	




30
1/10/2025 12:04:58
47-25 Carrera 4 Este


PARE
1/10/2025 13:18:24


PARE
1/10/2025 13:58:43




30
1/10/2025 12:17:41


1/10/2025 12:10:15


1/10/2025 12:10:08
3B-94 Calle 47 Sur

CP NUEVA ROMA_EX_04_006_1561_10	
San Cristobal	
	
	




PARE




PARE
2/10/2025 10:12:08


2/10/2025 10:15:32
49-10 Carrera 4b Este
San Cristóbal


2/10/2025 10:15:40


2/10/2025 10:17:06


2/10/2025 10:17:12
48D-16 Carrera 4b Este
San Cristóbal

CP_ BARRIO_LA_MARIA_ EX_04_124_1867_12

SAN CRISTOBAL










7/10/2025 10:02:09
1A-25 Calle 9a Sur


30
7/10/2025 10:56:56


7/10/2025 9:25:36


7/10/2025 10:58:06


30
VILLA JAVIER
7/10/2025 11:00:46


VILLA JAVIER
7/10/2025 11:00:57


30
VILLA JAVIER
7/10/2025 11:06:43



7. PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

Respecto al Plan de Manejo (PMT) General, se radico en la interventoría el 17 de enero de 2025, a su vez la Interventoría remitió a la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito SPMT de la Secretaría Distrital de Movilidad con radicado SDM 202561200352442. Posteriormente la SPMT con oficio SPTM 202531200443941 del 04 de febrero de 2025, informo que "…una vez revisado el documento técnico y los esquemas típicos propuestos para el manejo de tráfico durante las actividades de demarcación e instalación de señalización vertical de la zona 7 localidades de Usme, San Cristóbal y Sumapaz,, mediante el contrato del asunto, se emite autorización a la propuesta…" e indica que la vigencia de la autorización es desde la fecha del comunicado hasta el 03 de febrero de 2026.

En el periodo de este informe del 24 de septiembre al 23 de octubre de 2025, se solicitaron y tramitaron los siguientes PMTs:

Tabla 5 PMTs solicitados cuenta 8

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
40	2/10/2025	28396	4001193	4001639	CL 27A SUR KR 3	CL 27A SUR KR 4 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28397	4001672	4001931	DG 28BIS SUR KR 1	DG 28BIS SUR KR 3A ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28398	4001718	4001540	KR 3 CL 31B SUR	KR 3 CL 30B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28399	4001113	4001045	KR 3 ESTE CL 22D SUR	KR 3 ESTE CL 22B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28400	4000955	N/A	KR 3 ESTE CL 22B SUR	KR 3 ESTE CL 22BIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28401	1004224	N/A	AUTO NORTE (AK 45) CL 127C	AUTO NORTE (AK 45) CL 127D	ANDÉNES Y CALZADA	CORREDOR	SI	3/10/2025	3/10/2025
40	2/10/2025	28707	4000644	4000933	CL 22A SUR KR 5BIS	CL 22A SUR KR 2 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28708	4000661	4000725	KR 5 CL 22A SUR	KR 5 CL 23 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28709	4000707	N/A	CL 22C SUR KR 5	CL 22C SUR 30m AL ORIENTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28710	4000932	4001071	KR 2 ESTE CL 22BIS SUR	KR 2 ESTE CL 22D SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28711	4000821	4001076	KR 1 AV PRIMERO DE MAYO (CL 22 SUR)	KR 1 CL 24 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28712	4000927	4001036	KR 1BIS CL 22A SUR	KR 1BIS CL 24 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28713	4000897	4001060	KR 1A CL 22A SUR	KR 1A CL 24A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28714	4000928	4001072	CL 22D SUR KR 1A	CL 22D SUR KR 2 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28715	4000988	4000936	KR 1 ESTE CL 22D SUR	KR 1 ESTE CL 22A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28716	4001031	4000968	KR 1A ESTE CL 22D SUR	KR 1A ESTE CL 22A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28717	4000969	N/A	CL 22B SUR KR 1 ESTE	CL 22B SUR KR 1A ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
40	2/10/2025	28718	4001117	N/A	CL 23 SUR KR 1	CL 23 SUR KR 1B ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28719	4001116	4001237	KR 1B ESTE CL 22D SUR	KR 1B ESTE CL 24A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28720	4000964	N/A	KR 1B CL 22D SUR	KR 1B CL 24 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28721	4000998	4001185	CL 24 SUR KR 1B	CL 24 SUR KR 1B ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28722	4001202	N/A	KR 1ABIS ESTE CL 24 SUR	KR 1ABIS ESTE CL 24A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28723	4000966	4001238	CL 24A SUR KR 2B	CL 24A SUR KR 1B ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28724	4001256	N/A	CL 24BIS SUR KR 1B ESTE	CL 24BIS SUR KR 2BIS ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28725	4001266	N/A	CL 24A SUR KR 1B ESTE	CL 24A SUR KR 2BIS ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28726	4001304	N/A	CL 24A SUR KR 2BIS ESTE	CL 24A SUR KR 2A ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28727	4001255	N/A	KR 2BIS ESTE CL 24BIS SUR	KR 2BIS ESTE CL 22D SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28728	4001175	4001305	TV 1 CL 24A SUR	TV 1 KR 1 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28729	4001363	4001442	CL 26 SUR KR 1 ESTE	CL 26 SUR KR 2A ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28730	4001260	4001362	KR 1A ESTE CL 24A SUR	KR 1A ESTE CL 26 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28731	4001261	N/A	CL 25 SUR TV 1	CL 25 SUR KR 1A ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28732	4001025	4001118	CL 25 SUR KR 2B	CL 25 SUR TV 1BIS	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28733	4001326	N/A	TV 1BIS CL 25 SUR	TV 1BIS CL 27 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28734	4001086	4001145	CL 26 SUR KR 2A	CL 26 SUR TV 1A	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28735	4001284	N/A	TV 1A CL 26 SUR	TV 1A CL 27 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28736	4001143	N/A	KR 2 CL 26A SUR	KR 2 CL 26 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28737	4001144	N/A	CL 26A SUR KR 2A	CL 26A SUR KR 2	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28738	4001123	N/A	KR 2A CL 27 SUR	KR 2A CL 26A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28739	4001518	50005499	CL 27 SUR KR 2A ESTE	CL 27 SUR 50m AL OCCIDENTE DE LA KR 2A	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28740	4001441	4001517	KR 2A ESTE CL 24A SUR	KR 2A ESTE CL 27 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28741	4001385	4001798	KR 1 ESTE CL 26 SUR	KR 1 ESTE CL 29A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28742	4001301	4001457	KR 1B CL 27 SUR	KR 1B CL 28 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28743	4001852	4001594	KR 1A ESTE CL 29A SUR	KR 1A ESTE CL 27A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28744	4001946	4001655	KR 2A ESTE CL 29A SUR	KR 2A ESTE CL 27A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28745	4001440	4001656	CL 27B SUR KR 1B	CL 27B SUR KR 2A ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28746	4001692	N/A	CL 27B SUR KR 2A ESTE	CL 27B SUR 20m AL ORIENTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28747	4001634	4001765	CL 28 SUR KR 1	CL 28 SUR KR 2A ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28748	4001313	4001458	CL 28 SUR KR 3	CL 28 SUR KR 1B	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
40	2/10/2025	28749	4001493	4001578	CL 28 SUR KR 1B	CL 28 SUR KR 1	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28750	4001439	N/A	KR 1A CL 27A SUR	KR 1A CL 27B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28751	4001482	N/A	KR 1BIS CL 27A SUR	KR 1BIS CL 27B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28752	4001508	N/A	KR 1 CL 27A SUR	KR 1 CL 27B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28753	4001577	4001659	KR 1 CL 27B SUR	KR 1 CL 29 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28754	4001394	N/A	KR 2BIS CL 27A SUR	KR 2BIS CL 28 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28755	4001424	N/A	KR 2 CL 27A SUR	KR 2 CL 28 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28756	4001417	N/A	CL 28B SUR KR 3	CL 28B SUR KR 2A	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28757	4001571	N/A	CL 30B SUR KR 3	CL 30B SUR KR 2B	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28758	4001618	N/A	CL 30C SUR KR 3	CL 30C SUR KR 2B	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28759	4001680	N/A	CL 31 SUR KR 3	CL 31 SUR KR 2B	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28760	5003201	5003279	TV 1A ESTE 20m AL NORTE DE LA CL 83 SUR	TV 1A ESTE 20m AL SUR DE LA CL 83 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28761	5003160	5003237	TV 1B ESTE 20m AL NORTE DE LA CL 83 SUR	TV 1B ESTE 20m AL SUR DE LA CL 83 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	3/10/2025	1/01/2026
40	2/10/2025	28762	5003127	5003203	TV 2 ESTE 20m AL NORTE DE LA CL 83 SUR	TV 2 ESTE 20m AL SUR DE LA CL 83 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	3/10/2025	1/01/2026
41	9/10/2025	29078	4000016	4000037	KR 8 CL 1	KR 8 CL 2A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29080	4007401	N/A	CL 31 SUR KR 11 ESTE	CL 31 SUR 120m AL ORIENTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29081	4002584	4007696	KR 13 ESTE 10m AL SUR DE LA DG 30BBIS SUR	KR 13 ESTE CL 20B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29082	4007439	N/A	CL 20B SUR KR 13 ESTE	CL 20B SUR KR 12G ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29083	4000627	4000615	KR 10C ESTE CL 13 SUR	KR 10C ESTE CL 11 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29084	5001894	5005202	AV VILLAVICENCIO (KR 15 ESTE) CL 74C SUR	AV VILLAVICENCIO (KR 15 ESTE) CL 91B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29431	4000130	N/A	KR 8 CL 7 SUR	KR 8 CL 8 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29433	4001960	30000507	CL 28 SUR 20m AL ORIENTE DE LA KR 7 ESTE	CL 28 SUR KR 9 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29434	4002033	N/A	KR 8 ESTE CL 28 SUR	KR 8 ESTE 40m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29435	4002123	30000506	KR 9 ESTE CL 28CBIS SUR	KR 9 ESTE CL 28 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29436	4002133	4007589	CL 28CBIS SUR KR 9 ESTE	CL 28CBIS SUR KR 8 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29437	4002084	50007938	CL 28C SUR KR 9 ESTE	CL 28C SUR KR 9ABIS ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29438	4001975	40001526	KR 9B ESTE CL 28 SUR	KR 9B ESTE CL 28C SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	10/10/2025	8/01/2026

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
41	9/10/2025	29439	4002016	4002331	KR 9C ESTE CL 28B SUR	KR 9C ESTE 30m AL SUR DE LA CL 29 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29440	4001974	N/A	CL 28B SUR KR 9B ESTE	CL 28B SUR KR 9C ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29441	4002015	N/A	CL 28C SUR KR 9C ESTE	CL 28C SUR KR 9D ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29442	4002238	4002230	CL 29 SUR KR 9A ESTE	CL 29 SUR KR 9C ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29443	4002044	4002061	CL 28G SUR KR 12C ESTE	CL 28G SUR KR 13 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29444	30000819	N/A	KR 13 ESTE CL 28G SUR	KR 13 ESTE 70m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29445	4002090	4002143	CL 28H SUR KR 12ABIS ESTE	CL 28H SUR KR 12D ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29446	4002174	N/A	KR 10 ESTE CL 29 SUR	KR 10 ESTE CL 28CBIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29447	20076235	20076238	VIA LA UNION SAN JUAN PR 06+500 "4.0050 - 74.3416"	VIA LA UNION SAN JUAN PR 12+300 "3.990 - 74.366"	ANDÉNES Y CALZADA	SUMAPAZ	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29448	20048001	20048002	VIA CABRERA SAN JUAN PR 12+500 "3.9895 - 74.3661"	VIA CABRERA SAN JUAN PR 15+100 "3.9966 - 74.3706"	ANDÉNES Y CALZADA	SUMAPAZ	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29449	20025003	20021001	VIA UNION TUNALES PR 00+00 "3.9541 - 74.3357"	VIA UNION TUNALES PR 09 + 300 "3.9895 - 74.3661"	ANDÉNES Y CALZADA	SUMAPAZ	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29450	20069001	20069009	VIA GRANADA LA UNION "3.9541 - 74.3356"	VIA GRANADA LA UNION "3.8888 - 74.3589"	ANDÉNES Y CALZADA	SUMAPAZ	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29451	20043001	20026001	VIA GRANADA CHORRERAS PR 68+700 "4.0429 - 74.3091"	VIA GRANADA CHORRERAS PR 92+200 "3.9541 - 74.3356"	ANDÉNES Y CALZADA	SUMAPAZ	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29452	5009882	50000580	ANTIGUA VIA AL LLANO "4.4989 - 74.0849"	ANTIGUA VIA AL LLANO "4.4636 - 74.0759"	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/10/2025	8/01/2026
41	9/10/2025	29453	5009851	5007964	ANTIGUA VIA AL LLANO "4.4780 - 74.0921"	ANTIGUA VIA AL LLANO "4.4757 - 74.0923"	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/10/2025	8/01/2026
43	23/10/2025	30367	4000078	4000105	KR 8 CL 2A SUR	KR 8 CL 7 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	24/10/2025	22/01/2026
43	23/10/2025	30627	4000061	4000044	KR 6 CL 1A SUR	KR 6 CL 1	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	24/10/2025	22/01/2026
EMERGENCIA	17/10/2025	2150	5005143	5005098	AUTO AL LLANO (KR 1) CL 90BBIS SUR	AUTO AL LLANO (KR 1) CL 90B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	CORREDOR	SI	17/10/2025	31/10/2025
EMERGENCIA	17/10/2025	2151	5005910	NA	AUTO AL LLANO (KR 1) CL 97A SUR	AUTO AL LLANO (KR 1) CL 97ABIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	CORREDOR	SI	17/10/2025	31/10/2025
EMERGENCIA	17/10/2025	2152	4000230	N/A	AV FERNANDO MAZUERA (KR 10) CL 13 SUR	AV FERNANDO MAZUERA (KR 10) 40m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	CORREDOR	SI	17/10/2025	31/10/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
EMERGENCIA	17/10/2025	2153	4000298	N/A	AV FERNANDO MAZUERA (KR 10) CL 17 SUR	AV FERNANDO MAZUERA (KR 10) CL 14 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	CORREDOR	SI	17/10/2025	31/10/2025

Fuente: elaboración propia

Igualmente, en el Anexo 2. se adjuntan los COI mencionados en la tabla anterior, donde se encuentra la información detallada de cada autorización.

8. ASPECTOS TÉCNICOS

8.1 MODIFICACIONES REALIZADAS

- En el periodo al que pertenece el presente informe no se realizaron modificaciones.

8.2 ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se describen las actividades ejecutadas a la fecha:

- Revisión en plataforma SIGIDU
- Se realiza la solicitud de los planes de manejo de tránsito PMT para los puntos a intervenir.
- Socialización de actividades de implementación en colegios y zonas de alto flujo peatonal.
- Implementación de señalización horizontal y vertical de acuerdo a los planos inspeccionados e instalación de dispositivos según diseños.

8.3 INSPECCIONES

- A continuación, se relacionan los diseños inspeccionados en el periodo al que hace referencia este informe (24 de agosto a 23 de septiembre de 2025)

Tabla 6 Inspecciones realizadas

ID Diseño	Fecha de Asignación	ESTADO
CP-05-1631	15/09/2025	INSPECCIONADO
CP_04_1627	22/09/2025	INSPECCIONADO
CP_04_1625	22/09/2025	INSPECCIONADO
PÉNDONES AK 7	25/09/2025	INSPECCIONADO
PMT DE EMERGENCIA SDM-202561203372182	29/09/2025	INSPECCIONADO
CP_04_1630	30/09/2025	INSPECCIONADO
PMT DE EMERGENCIA SDM-202561203329962 –DI -22669 - CL 111 Sur Quebrada Mediania	1/10/2025	INSPECCIONADO
CP_05_1669	7/10/2025	INSPECCIONADO
CP_05_1670	7/10/2025	INSPECCIONADO
CP_05_1671	7/10/2025	INSPECCIONADO
CP_05_1672	7/10/2025	INSPECCIONADO
CP_05_1673	7/10/2025	INSPECCIONADO
CP_05_1674	7/10/2025	INSPECCIONADO
CP_05_1646	7/10/2025	INSPECCIONADO
CP_05_1647	7/10/2025	INSPECCIONADO

ID Diseño	Fecha de Asignación	ESTADO
CP_05_1648	7/10/2025	INSPECCIONADO
CP_04_1594	9/10/2025	INSPECCIONADO
CP_05_1690	9/10/2025	INSPECCIONADO
CP_ AK 10X CL 13 SUR	9/10/2025	INSPECCIONADO
CP_ AUTOPISTA AL LLANO X 91 SUR	9/10/2025	INSPECCIONADO
Suministro Idipron Sp-48, Sr-plaqueta (9)	9/10/2025	INSPECCIONADO
CP_05_1693	16/10/2025	INSPECCIONADO
Suministro Idipron (10). SI-35	17/10/2025	INSPECCIONADO
Ciclorruta AC75 entre AV boyacá y Kr 76	22/10/2025	INSPECCIONADO


Fuente: Elaboración propia


En el Anexo 3 (3.1 Inspecciones) se encuentran los formatos de inspecciones.

8.4 ESTADO DEL TIEMPO

En el periodo al que hace referencia este informe (24 de septiembre a 23 de octubre de 2025) se presentaron 23 días de lluvias.

Ilustración 2 Precipitación mes de octubre

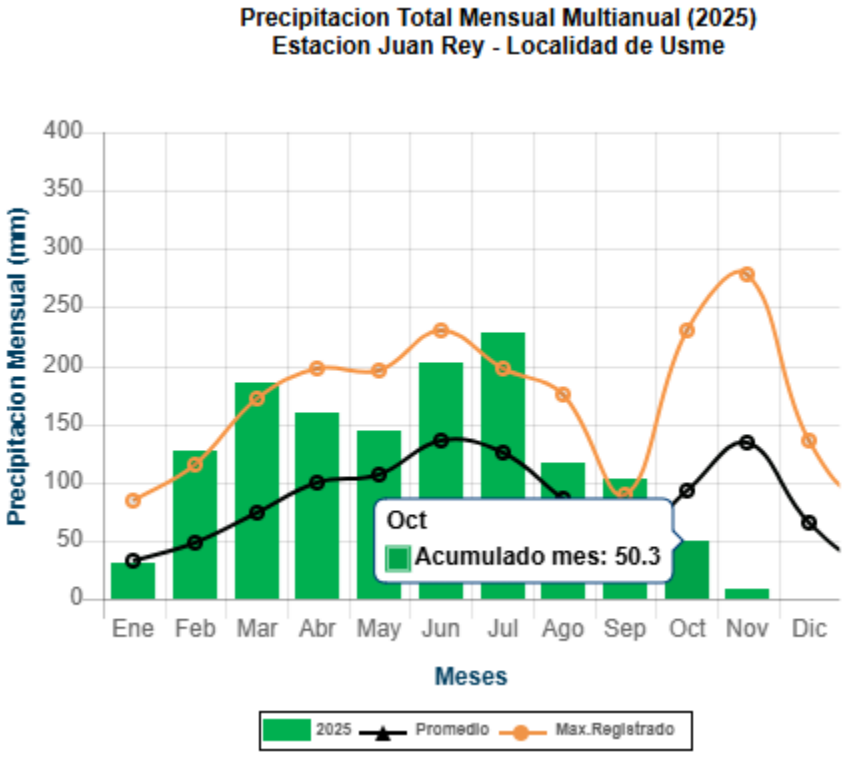

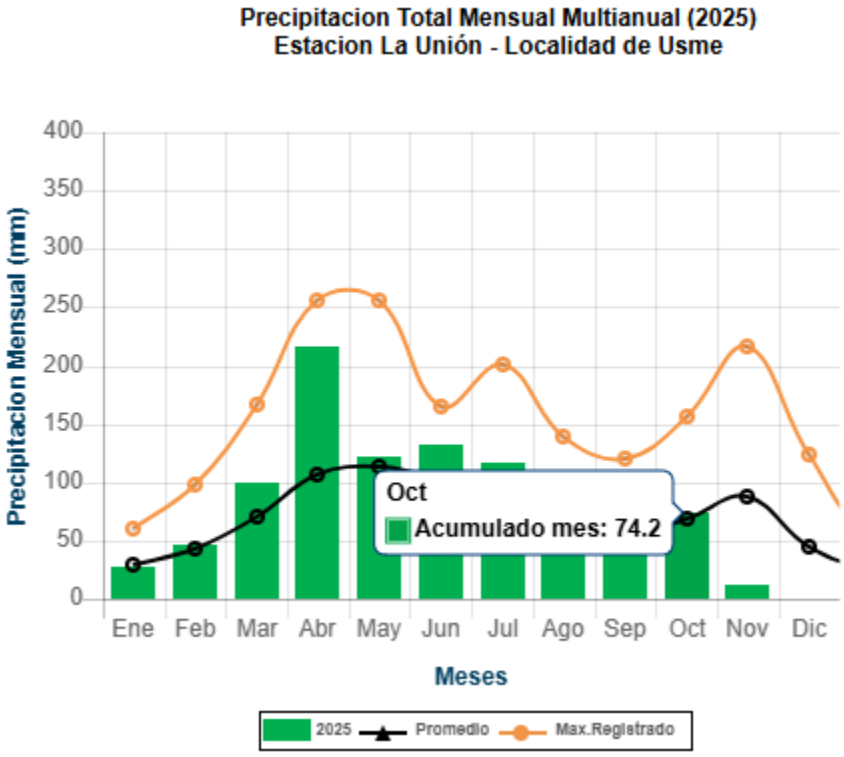
Precipitacion Total Mensual Multianual (2025)
Estacion La Unión - Localidad de Usme
Precipitacion Mensual (mm)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Oct
Acumulado mes: 74.2
Meses
2025
Promedio
Max.Registrado

9. ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A CRUCE DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

A continuación, se relacionas las actividades de consulta por diseño, en los visores y entidades correspondientes.

DISEÑO	Geoportales		ENTIDADES CONSULTADAS
	https://movilidadbogota.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=219e91e4397f4f8d99c4c1aaa66ba2c4	https://webidu.idu.gov.co/sigidu/	
EX_04_030_1561	Validación de Reserva Sub dirección de planes de manejo de Tránsito	Validación de reserva SIGIDU	-Alcaldía local -UAERM (Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial) -EAB (Empresa de Acueducto de Bogotá) -ENEL-CODENSA -IDU
EX_04_488_826_10	Validación de Reserva Sub dirección de planes de manejo de Tránsito	Validación de reserva SIGIDU	-Alcaldía local -UAERM (Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial) -EAB (Empresa de Acueducto de Bogotá) -ENEL-CODENSA -IDU
EX_04_241_1561_10	Validación de Reserva Sub dirección de planes de manejo de Tránsito	Validación de reserva SIGIDU	-Alcaldía local -UAERM (Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial) -EAB (Empresa de Acueducto de Bogotá) -ENEL-CODENSA -IDU

En el Anexo 4, se encuentran las cartas radicadas a las diferentes entidades..

10. PLAN DE CALIDAD

La información referente al Plan de Calidad se encuentra en el Anexo 5.

11. PROTOCOLO DE MANEJOS DE RESIDUOS

La información respecto al protocolo de manejos de residuos se encuentra en el Anexo 6

12. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CORREDORES

En el periodo al que se hace referencia en este informe no se ejecutaron actividades en corredores asignados.

13. REPORTE ESTADISTICO

13.1 EJECUCIÓN POR COMPONENTE

De acuerdo con la ejecución de las obras durante el periodo se tienen subdividido por componente (señalización vertical y horizontal) de la siguiente forma:

Tabla 7 Actividades por componente

Corredor / Diseños	Localidad	Señalización Vertical	% Ejecutado en el ID en Señalización vertical del periodo	Señalización Horizontal	% Ejecutado en el ID en Señalización Horizontal del periodo	Total, ejecutado en el periodo de informe
EX_05_352_1561_10	Usme	$ 19.074.359,00	16%	$ 97.543.537,71	84%	$ 116.617.896,71
Suministro Idipron 7	NA	$ 31.708.382,00	100%		0%	$ 31.708.382,00
Suministro Idipron 8 SR-06	NA	$ 1.959.396,00	100%		0%	$ 1.959.396,00
EX_05_286_1561_10	Usme		0%	$ 272.322.782	100%	$ 272.322.782
Pendones Kr 7	Usaquén Chapinero	$ 8.242.540,00	100%		0%	$ 8.242.540,00
EX_04_488_826_10	San Cristobal		0%	$ 268.402.054,00	100%	$ 268.402.054,00
CP_DE_AUTOPISTA AL LLANO	Usme		0%	$ 481.602,00	100%	$ 481.602,00
EX_04_241_1561_10	San Cristobal		0%	$ 183.146.929,00	100%	$ 183.146.929,00
CP_ BARRIO_LA_MARIA_ EX_04_124_1867_12	San Cristobal	$ 10.585.809,00	100%		0%	$ 10.585.809,00
CP NUEVA ROMA_EX_04_006_1561_10	San Cristobal	$ 9.082.922,00	100%		0%	$ 9.082.922,00
CP NUEVA ROMA_EX_04_044_1561_10	San Cristobal	$ 9.911.411,00	100%		0%	$ 9.911.411,00
TOTAL		**$ 90.564.819,00**		**$ 821.896.904,41**		**$ 912.461.723**

Fuente: Elaboración propia

El valor total ejecutado en el periodo al que hace referencia este informe es de **$912.461.723**, en la localidad de Usme se ejecutó un valor de $389.422.280 lo que corresponde al 42,68% de la ejecución total, en suministro un valor de $33.667.778 lo que corresponde a un 3,69% de la ejecución total,un 52,73% en San Cristóbal que equivale a $481.129.125 y en Usaquén y Chapinero un valor de $8.242.540, lo que representa un 0.9% de la ejecución. La implementación vertical representa un 6,24% y la demarcación horizontal un 90.1%.

13.2 ZONAS ESCOLARES

A continuación, se relacionan las instituciones beneficiadas con la intervención:

Tabla 8 Zonas Escolares Intervenidas

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
1	50005014	EX_05_119_1867_12	COLEGIO SAN GREGORIO HERNANDEZ	170
2	5002304			
1	50005014	EX_05_119_1867_12	IED COLEGIO SANTA LIBRADA	850
	5002168			
	5002154			
	5002131			
	5002117			
	5002117			
	5002087			
	5002065			
	5002064			
4	5002045			
2	5002174			
	5002169			
	5002132			
	5002324			
1	50005013	EX_05_119_1867_12	COLEGIO JUAN RULFO	175
	5002211			
	5002210			
	5002130			
	5002117			
	5002117			
1	5002162	EX_05_119_1867_12	JARDÍN SOCIAL CENTRO CRECER TEJAR	50
	5002094			
	5002084			
1	5008374	EX_05_119_1867_12	HOGAR INFANTIL BARQUITO DE PAPEL	150
1	5002574	EX_05_119_1867_12	COLEGIO ALMIRANTE PADILLA	320
	5002492			
	5002403			
2	5002660			
	5002566			
	5002565			
	5002565			
4	5002567			
1	5002171	EX_05_119_1867_12	JARDIN LOS PAYASITOS ICBF	125
2	5002391			
	5002349			
2	5002530	EX_05_119_1867_12	JARDIN INFANTIL BETANIA	120

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
	5002463			
	5002458			
	5002434			
	5002415			
2	5002502	EX_05_119_1867_12	JARDIN INFANTIL BALOO	45
	5002499			
2	5002502	EX_05_119_1867_12	COLEGIO SUMAPAZ	450
	5002499			
2	5002502	EX_05_119_1867_12	COLEGIO SAN JUAN DE LOS PASTOS	180
	5002499			
2	5002118	EX_05_119_1867_12	COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES	600
	5002118			
3	5007874	EX_05_93_1244_11		
	5001805			
	5001282			
2	5003204	EX_05_53_1744_11	JARDIN INFANTIL GRAN YOMASA	150
	5003333			
2	5003163	EX_05_53_1744_11	LICEO MAX	210
2	5003176	EX_05_53_1744_11	LICEO MARIA NELL	340
2	5003057	EX_05_53_1744_11	IED GRAN YOMASA	1630
3	5002420	EX_05_93_1244_11	COLEGIO MIRAVALLE	1500
	5002726			
	5002709			
3	5007842	EX_05_110_1867_12	COLEGIO DISTRITAL PAULO FREIRE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA ACTICULADO EDUCACIÓN SUPERIOR	3000
	5001893			
	5001856			
4	50009090			
	50009093			
3	5002441	EX_05_93_1244_11	COLEGIO CIUDAD BOLIVAR	210
3	5001360	EX_05_93_1244_11	JARDÍN INFANTIL ICBF	30
	5001353			
3	5001804	EX_05_93_1244_11	JARDIN INFANTIL MI TRIGAL	13
	5001788			
3	50009087	EX_04_262_1561_10	CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL FLORENTINO GONZALEZ	2000
5	4001107			
	4001166			
	4001254			
3	4001167	EX_04_262_1561_10	I.E.D FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE B	750
	4001407			
	4001465			
	4001464			
	4001464			
3	4001497	EX_04_241_1561_10	I.E.D FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE A	2500
	4001570			
	4001570			

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
	4001543			
4	4001604			
4	5000132	EX_05_108_1867_12	LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	300
	5000160			
	5000162			
	5000189			
4	5000132	EX_05_108_1867_12	JARDIN INFANTIL VOZ DE ALERTA	50
	5000160			
	5000162			
	5000189			
4	5000531	EX_05_110_1867_12	JARDÍN SOCIAL NEBRUSKA	215
4	5000531	EX_05_110_1867_12	I.E.D LA SALLE JUAN LUIS LONDOÑO	1410
4	5004655	EX_05_003_1073_24	COLEGIO DISTRITAL DIEGO MONTAÑA CUELLAR I.E.D	7500
	5004970			
	5004946			
	5005104			
4	5004418	EX_05_003_1073_24	COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA	2800
	5004488			
4	5004418	EX_05_003_1073_24	JARDÍN ICBF EL CISNE CANTAR	13
	5004488			
5	5001319	EX_05_93_1244_11	COLEGIO CENTRO CULTURAL	700
	5001273			
	5001378			
5	5001090	EX_05_113_1867_12	COLEGIO I.E.D LA AURORA	1500
	5001091			
	5008288			
	5000826			
	5000875			
5	5001192	EX_05_113_1867_12	JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DEL FUTURO - MI ENSUEÑO	13
	5001226			
	5001234			
5	5001031	EX_05_113_1867_13	HOGAR INFANTIL ICBF MI BELLO HOGAR	13
	5001127			
	5001142			
5	5000921	EX_05_113_1867_13	COLEGIO EDUCATIVO DISTRITAL NUEVO SAN ANDRES DE LOS SANTOS	2000
6	5000727	EX_05_113_1867_13		
	5000825	EX_05_113_1867_13		
	5000825	EX_05_113_1867_13		
	5000674	EX_05_113_1867_13		
	5000906	EX_05_113_1867_13		
5	5001021	EX_05_113_1867_13	JARDIN INFANTIL LA AURORA	100
6	5000940			
	5000940			
	50005061			

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
6	5001836 5001836 5001833	EX_05_101_1244_11	IED PROVINCIA DE QUEBEC	2500
6	5002109 5002109 5002098	EX_05_101_1244_12	COLEGIO NUEVA ESPERANZA (IED) SEDE A y SEDE B	3200
6	5002109 5002109 5002098	EX_05_101_1244_12	JARDÍN INFANTIL SOCIAL LA ESPERANZA	110
6	5003313 5003194 5003132	EX_05_005_1073_24	I.E.D COLEGIO ATABANZHA	1800
7	5005351 5005175	EX_05_307_1561_10	COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ	1385
7	5000347 5008328	EX_05_280_1561_10	JARDIN INFANTIL LA FISCALA	59
7	5000376 50007670	EX_05_280_1561_10	I.E.D FABIO LOZANO LIMONELLI	1900
7	5001827 5001826 5001917 5002110	EX_05_101_1244_11	I.E.D PROVINCIA DE QUEBEC	1080
			ICBF HOGAR COMUNITRARIO PIOLIN	12
			HCB EL NUEVO AMANECER	39
			CENTRO MARIA ADELAIDA	80
7	5002126 5009132 5002267 5002387	EX_05_101_1244_11	SOCIAL JARDÍN INFANTIL LA ESPERANZA	95
			COLEGIO NUEVA ESPERANZA	1080
8	5006413 5006843	EX_05_001_1073_24	CENTRO EDUCATIVO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE	132
8	5006673 5006721 5006736 5006763 5006709 5006765	EX_05_001_1073_24	COLEGIO DISTRITAL EDUARDO UMAÑAN MENDOZA	1740
8	5006075 5006219	EX_05_006_1744_10	JARDIN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA	90
8	5006166 5006221	EX_05_006_1744_10	COLEGIO USMINIA SEDE A	330
8	4000421 4000433 4000461 4000494 4000464	CP_BARRIO_LA_MARIA_ EX_04_124_1867_12	CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL CRECER BALCONES	60

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
8	4000421 4000433 4000461 4000494 4000464	CP_BARRIO_LA_MARIA_ EX_04_124_1867_12	CENTRO EDUCATIVO MI TALLER	50
8	4000421 4000433	CP_BARRIO_LA_MARIA_ EX_04_124_1867_12	CASA DE JUVENTUD DAMAWHA	30
8	4005329 4005164 4005064	CP_NUEVA_ROMA_EX_04_006_1561_10 CP_NUEVA_ROMA_ EX_04_044_1561_10	COLEGIO IED NUEVA ROMA	1154
8	4005561 50007877	CP_NUEVA_ROMA_EX_04_006_1561_10	JARDIN SOCIAL NUEVA ROMA	187
8	5003826 5003773 5003704 5008234	EX_05_213_1561_10	COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA	2900
8	5003704 5008234	EX_05_213_1561_10	JARDIN SOCIAL BOLONIA	160
9	5004618 5004402 5003865	EX_05_286_1561_10	JARDIN CASA LOMA	75
9	5001008	EX_05_352_1561_10	LICEO SANTA ANA DEL SUR	280
9	4002101 4002022 4001982 4002278	EX_04_488_826_10	IED TOMAS RUEDA VARGAS	766
9	4002220 4001982	EX_04_488_826_10	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES	250
9	4002001 4002022 4001982	EX_04_488_826_10	JARDIN INFANTIL CANADA SANTA INES	220
9	4000767 4000793 4000897	EX_04_241_1561_10	CENTRO DIA LA MONTAÑA DEL SABER	784
9	4001327 4001285 4001326	EX_04_241_1561_10	JARDIN INFANTIL MANITAS CREATIVAS POR LA NIÑEZ	10
TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS EN EL PROYECTO				**54740**

Fuente: Elaboración propia

14. CERTFICADOS DE CALIBRACIÓN, FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ESTADO DE LOS EQUIPOS

En el Anexo 7 se encuentra la información respecto a los certificados de calibración.

15. SEÑALIZACIÓN ENTREGADA A ALMACÉN

Para el periodo del presente informe, a continuación, se presenta el detalle de la señalización vertical implementada, dispositivos de control al tránsito implementados y entregada al almacén de la SDM.

En el Anexo 8. Acta de entrega de señalización, se presenta el comprobante de ingreso de elementos emitido por la subdirección Administrativa de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde se relaciona la señalización vertical y los dispositivos viales instalados en el periodo del 24 de septiembre al 23 de octubre de 2025:

Tabla 9 Elementos de Señalización Vertical y Dispositivos de Control Implementados

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	40,7	$ 364.850,76	$ 116.752,24	N/A	$ 481.603,00	$ 19.601.242,10
2	UND	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	98	$ 116.052,27	$ 37.136,73	98,00	$ 153.189,00	$ 15.012.522,00
3	UND	Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales o menores a 75*100 cm)	1	$ 145.683,33	$ 46.618,67	1,00	$ 192.302,00	$ 192.302,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		cumpliendo normatividad vigente.						
5	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	46	$ 283.821,21	$ 90.822,79	46,00	$ 374.644,00	$ 17.233.624,00
6	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	20	$ 449.300,00	$ 143.776,00	20,00	$ 593.076,00	$ 11.861.520,00
7		Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de	10	$ 550.444,70	$ 176.142,30	10,00	$ 726.587,00	$ 7.265.870,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.						
8	M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	0,57	$ 348.364,39	$ 111.476,61	N/A	$ 459.841,00	$ 262.109,37
9	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	6	$ 453.201,52	$ 145.024,48	6,00	$ 598.226,00	$ 3.589.356,00
10	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina	4	$ 356.399,24	$ 114.047,76	4,00	$ 470.447,00	$ 1.881.788,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.						
15	UND	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	1	$ 270.142,42	$ 86.445,58	1,00	$ 356.588,00	$ 356.588,00
17	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 ó SP-46A, material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-	4	$ 264.873,48	$ 84.759,52	4,00	$ 349.633,00	$ 1.398.532,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.						
18	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	4	$ 351.642,42	$ 112.525,58	4,00	$ 464.168,00	$ 1.856.672,00
19	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	2	$ 201.992,42	$ 64.637,58	2,00	$ 266.630,00	$ 533.260,00
26	UND	Instalación de Señales Verticales de Pedestal	4	$ 39.680,30	$ 12.697,70	N/A	$ 52.378,00	$ 209.512,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		(incluye Señales tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.						
28	UND	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	38	$ 21.279,55	$ 6.809,45	N/A	$ 28.089,00	$ 1.067.382,00
70	UND	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	327	$ 12.064,39	$ 3.860,61	327,00	$ 15.925,00	$ 5.207.475,00
73	UND	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de	7206	$ 12.179,55	$ 3.897,45	7206,00	$ 16.077,00	$ 115.850.862,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		septiembre de 2024						
TOTAL							**$ 203.380.616**	

VALOR EN LETRAS	**DOSCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIECISESIS PESOS**

N°	ID DE DISEÑO IMPLEMENTADO	TIPO DE IMPLEMENTACIÓN	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
1	EX_05_352_1561_10	HORIZONTAL VERTICAL	Usme	CL 69G SUR HASTA TV 8BIS ENTRE KR 14 Y KR 7
2	SUMINISTRO 8	VERTICAL	NA	NA
3	SUMINISTRO 9	VERTICAL	NA	NA
4	EX_05_286_1561_10	HORIZONTAL	Usme	DESDE AK 1 HASTA KR 6F E
5	PENDONES KR 7	VERTICAL	Usaquén Chapinero	KR 7 ENTRE CL 32 Y CL 127B BIS
6	EX_04_488_826_10	HORIZONTAL	San Cristobal	DESDE DG 78BIS S HASTA CL 112A S DESDE KR 3D HASTA TV 4CBIS E
7	CP BARRIO LA MARIA	VERTICAL	San Cristobal	KR 2 HASTA KR 1B ESTE ENTRE CL 9 SUR Y CL 11 SUR

N°	ID DE DISEÑO IMPLEMENTADO	TIPO DE IMPLEMENTACIÓN	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
8	CP NUEVA ROMA_EX_04_006_1561_10	VERTICAL	San Cristobal	CL 48 SUR HASTA CL 52 SUR ENTRE KR 4B Y KR 4D ESTE
9	CP NUEVA ROMA_EX_04_044_1561_10	VERTICAL	San Cristobal	KR 4A ESTE DESDE DG 50SUR HASTA CL 51A SUR

16. REPORTE DE SEÑALIZACIÓN RETIRADA EN VÍA Y ENTREGADA A ALMACÉN

En el periodo al que hace referencia este informe se realizó entrega de señales retiradas en vía, , la información se encontrará en el Anexo 9.

17. ASPECTOS VARIOS

17.1 GEOREFERENCIACIÓN

Durante el periodo de presentación del informe se realizó la entrega de Georreferenciación perteneciente a la implementación del Obra, lo siguiente es el listado de ID's entregados a fecha de corte 23 de octubre de 2025.

Tabla 10 Estado Georeferenciación

CUENTA	ID	FECHA ESTADO	ESTADO
1	EX_05_93_1244_11	6-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_05_119_1867_12	6-mar-25	APROBADO SDM
1	MV_05_122_1867_12	20-mar-25	APROBADO SDM
1	MV_AV_BOYACA_941_09	21-mar-25	APROBADO SDM
1	MV_04_230_1561_10	17-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_04_044_1561_10	6-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_04_211_1561_10	17-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_05_320_1561_10	11-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_05_341_1561_10	11-mar-25	APROBADO SDM
2	MV_05_052_1744_10 SDM-202561200270682	9-abr-25	APROBADO SDM
2	MV_AV_BOYACA_941_09	2-may-25	APROBADO SDM
2	EX_05_119_1867_12	29-abr-25	APROBADO SDM
2	MV_05_122_1867_12	5-may-25	APROBADO SDM
2	EX_05_053_1744_10	2-may-25	APROBADO SDM
2	EX_04_211_1561_10 (pasacalle SDM-202461204137592)	21-abr-25	APROBADO SDM
3	EX_04_001_1073_24	27-may-25	APROBADO SDM
3	EX_04_262_1561_10_	29-may-25	APROBADO SDM
3	EX_05_119_1867_12	29-may-25	APROBADO SDM
3	EX_05_108_1867_12	19-may-25	APROBADO SDM
3	EX_04_241_1561_10	28-may-25	APROBADO SDM
3	MV_04_511_676_09	20-may-25	APROBADO SDM
3	EX_05_053_1744_10	7-may-25	APROBADO SDM
3	EX_05_110_1867_12	21-may-25	APROBADO SDM
3	EX_05_93_1244_11_V5	5-jun-25	APROBADO SDM
3	MV_05_122_1867_12	27-may-25	APROBADO SDM
3	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3 (CP 202561200744162)	29-may-25	APROBADO SDM
4	EX_04_211_1561_10 PMT de EMERGENCIA AV LOS CERROS	25-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_04_261_1561_10 (CP_04_1049)	1-jul-25	APROBADO SDM
4	EX_04_001_1073_24	13-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_003_1073_24	13-jun-25	APROBADO SDM

CUENTA	ID	FECHA ESTADO	ESTADO
4	EX_05_110_1867_12	1-jul-25	APROBADO SDM
4	EX_05_119_1867_12	18-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_113_1867_12	20-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_053_1744_10	20-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_108_1867_12	19-jun-25	APROBADO SDM
4	MV_05_052_1744_10 PMT CAUCE SIRE 5453567	25-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_04_241_1561_10	17-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_04_262_1561_10	25-jun-25	APROBADO SDM
4	MV_05_122_1867_12	27-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_307_1561_10 CP-202561200703942	25-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_93_1244_11	20-jun-25	APROBADO SDM
5	EX_05_93_1244_11	8-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_307_1561_10 CP-202561200703942	16-jul-25	APROBADO SDM
5	MV_04_511_676_09_V11	10-jul-25	APROBADO SDM
5	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3	16-jul-25	APROBADO SDM
5	MV_05_122_1867_12_V7	24-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_04_001_1073_24_V2	11-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_04_241_1561_10	16-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_003_1073_24	29-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_108_1867_12_V6	16-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_113_1867_12	29-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_04_262_1561_10	24-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_005_1073_24	24-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_119_1867_12	14-jul-25	APROBADO SDM
5	PMT SIRE 5453778	24-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_04_264_1561_10 PMT SDM-202561201385182	18-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_04_211_1561_10 SIRE 2561201777022	18-jul-25	APROBADO SDM
5	PMT EMBALSE LA REGADERA	24-jul-25	APROBADO SDM
6	EX_05_005_1073_24	14-ago-25	APROBADO SDM
6	EX_05_113_1867_12	13-ago-25	APROBADO SDM
6	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3	13-ago-25	APROBADO SDM
6	EX_05_119_1867_12	13-ago-25	APROBADO SDM
6	EX_05_001_1073_24	15-may-25	APROBADO SDM
6	EX_05_101_1244_11	15-may-25	APROBADO SDM
6	EX_05_008_1073_24	15-ago-25	APROBADO SDM
6	EX_05_003_1073_24	13-ago-25	APROBADO SDM
6	MV_AV_CARACAS_585_24 CP_BYKE_BOX	19-ago-25	APROBADO SDM
7	MV_05_122_1867_12	19-sep-25	APROBADO SDM

CUENTA	ID	FECHA ESTADO	ESTADO
7	EX_05_213_1561_10 SDM-202561202098412	15-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_04_126_1867_12 SDM-202561202230222	15-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_101_1244_11	2-sep-25	APROBADO SDM
7	MV_AV_CARACAS_585_24 CP_BYKE_BOX	2-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_006_1561_10	10-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_001_1073_24	8-sep-25	APROBADO SDM
7	MV_AV_BOYACA_941_09	15-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_008_1073_24	8-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_307_1561_10	18-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_310_1561_10	2-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_280_1561_10	11-sep-25	APROBADO SDM
8	EX_05_001_1073_24	28-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_006_1744_10	15-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_04_124_1867_12 CP_ BARRIO_LA_MARIA	23-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_04_006_1561_10 (CP_NUEVA_ROMA)	27-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_04_044_1561_10 (CP NUEVA ROMA)	28-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_280_1561_10	15-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_008_1561_10	10-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_213_1561_10	4-nov-25	APROBADO SDM
8	EX_05_310_1561_10	10-oct-25	APROBADO SDM
8	PMT_CL_37D_S_KR_3B (SDM-202561202584052 y SDM- 202561202664192)	27-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_93_1244_11 (CP_05_124)	15-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_04_316_1561_10 (PMT SDM-202561202439322)	15-oct-25	APROBADO SDM
8	MV_05_99_1244_11 (PMT SDM-202561202657962)	15-oct-25	APROBADO SDM
8	PMT BARRIO LA FISCALA (PMT SDM- 202561202378942)	10-oct-25	APROBADO SDM
8	MV_05_052_1744_10 (PMT SDM-202561202284382 VDA LAS MARGARITAS)	28-oct-25	APROBADO SDM
8	PMT VEREDA OLARTE SDM-202561202284382	27-oct-25	APROBADO SDM
8	PMT_JUAN_REY_LA_FLORA SDM- SIRE 5456812	27-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_04_040_1561_10 SDM- 202561202286462	27-oct-25	APROBADO SDM
8	PMT_USME_SECTOR RURAL CL 137D_ KR 1 SDM-202561202379632	28-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_307_1561_10	7-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_119_1867_12	10-oct-25	APROBADO SDM
9	EX_05_352_1561_10		EN DESARROLLO
9	EX_05_286_156_10		EN DESARROLLO
9	CPS_676_MV_01_04 (pendones kr 7)		EN DESARROLLO
9	EX_04_241_1561_10		EN DESARROLLO
9	EX_04_488_826_10		EN DESARROLLO
9	CP DE VIA AL LLANO		EN DESARROLLO

CUENTA	ID	FECHA ESTADO	ESTADO
9	EX_04_124_1867_12 CP_ BARRIO_LA_MARIA		EN DESARROLLO
9	EX_04_006_1561_10 (CP_NUEVA_ROMA)		EN DESARROLLO
9	EX_04_044_1561_10 (CP NUEVA ROMA)		EN DESARROLLO

Elaboración: Fuente propia

18. RECURSOS UTILIZADOS PARA EL CONTRATO DE OBRA

18.1 PERSONAL

Tabla 11 Personal mínimo

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DEL PROYECTO	LUIS FERNANDO RUBIANO BARRERO
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO	DIANA PAOLA PARADA SIERRA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA DIURNO	VICTOR ANDRES MORENO CRISTANCHO
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO	DIEGO GUALTEROS CHAVEZ
TRABAJADOR SOCIAL	ELIANA JULIETH FAJARDO BORBÓN
PROFESIONAL STT	YULID LILIANA GELVES HERRERA
TECNÓLOGO EN GEORREFERENCIACIÓN	GIOVANNY ALEXANDER BRITO NÚÑEZ
CONDUCTOR DIURNO	WILMER SIERRA
CONDUCTOR NOCTURNO	HUGO ALEJANDRO MORENO CRISTANCHO
SECRETARIA	YOLIMA PATIÑO LOBATON
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGAUTA

Fuente: Elaboración propia

18.2 EQUIPO

Tabla 12 Equipos empleados para la ejecución de las actividades

Maquina	Serie	Tipo de Vehículo	Placa	Marca
Aplicación de pintura liquida	-	Camión	VFB357	Chevrolet
Maquina autopropulsable TITAN 1000	TAPT002	Camión	WEP027	Jac
Aplicación de plástico en frio	IAPT001	Camión	WNN061	Jac
Powrliner 8950, 2GUN Powrliner 8950, 2GUN Powrliner 8950, 2GUN	1. 1439800069 2. 1439800007 3. 1439800083	N/A	N/A	Titan
Featherlite	2001-454	N/A	N/A	ThermoMark II
Hydra M 4000, W FILTE/ (433- 801)	120700042	N/A	N/A	Titan

Fuente: Elaboración propia

18.3 INSTRUMENTOS USADOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

A continuación, se listan los instrumentos usados en los frentes de obra, para el control de calidad de la señalización implementada:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Velocímetro	1
Galgas para la verificación de espesores húmedos	1
Medidor de espesores secos para tomar lecturas de la demarcación sobre testigos	1
Retrorreflectómetro horizontal	1

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Lupa con aumento de 80X	1
Cinta métrica / Odómetro	1
Equipo para medir temperatura ambiente y de la superficie por demarcar.	1
Equipo para medir humedad relativa (Termohigrómetro)	1
Equipo para medir velocidad del viento	1
Equipo para medir punto de rocío	1

Fuente: Elaboración propia

19. VINCULACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE.

Esta información se encuentra en el Anexo 10. Gestión social.

20. VINCULACIÓN DE PORCENTAJE DE MUJERES.

Esta información se encuentra en el Anexo 10. Gestión social.

21. FACTOR SOCIAL

Esta información se encuentra en el Anexo 10. Gestión social.

22. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La información referente a la gestión de seguridad y salud en el trabajo se encuentra en el Anexo 11.

23. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS

24.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO

En el tercer mes de ejecución del contrato comprendido entre el periodo del 24 de septiembre al 23 de octubre del 2025 se realizaron actividades administrativas como:

- Revisión de documentación contractual.
- Revisión de Anexo técnico.
- Requerimientos mediante oficios.
- Respuestas a requerimientos de Secretaría Distrital de Movilidad e Interventoría,
- Asistencia a comités técnicos y mesas de trabajo y revisión de acta de comité.
- Asistencia comités de representantes legales.
- Entrega y firma de planillas de implementación señalización horizontal y vertical.
- Atención a las solicitudes de Interventoría y la Secretaría Distrital de Movilidad, en desarrollo del objeto del contrato vigilado.
- Entrega financiera del contrato de obra

24.2 ASPECTO JURIDICO

En el primer mes de ejecución del contrato comprendido entre el periodo del 24 de septiembre al 23 de octubre del 2025 se realizaron actividades jurídicas como
:

- Ejecución del Contrato de Obra dentro del plazo, montos, calidades y demás términos establecidos para el mismo.
- Solicitudes de reclamaciones por parte de la interventoría.
- No se generaron reclamaciones por parte del contratista .
- No se generaron requerimientos de suspensión o prórroga del contrato de obra.

24. PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO

Estas planillas se encuentran en el Anexo 11, Gestión SST, anexos, anexo A Seguridad Social.

25. CERTIFICACIÓN SALARIOS Y HONORARIOS

Esta certificación se encuentra en el Anexo 12 Certificación salarios y honorarios.

26. LISTADO DE PROVEEDORES

La Unión Temporal cuenta con los siguientes proveedores:

- Pintuflex :Pintura en plástico en frio metilmetacrilato (spray) :
- Ecotraffic: Pintura de plástico en frio metilmetacrilato (llana)
- Ecotraffic: Imprimante acrílico negro

27. CERTIFICACIÓN PAGOS PROVEEDORES

Esta certificación se encuentra en el Anexo 13 Certificación pago proveedores.

28. ESTADO PRESUPUESTAL

29.1 RESUMEN CUENTA 9

Tabla 13 Cantidades ejecutadas por ID

No	Corredor / Diseños	Localidad	Valor Presupuestado	Valor Ejecutado	% Ejecutado
1	EX_05_352_1561_10	Usme	$ 116.617.897,00	$ 116.617.896,71	100,00%
2	Suministro Idipron 7	NA	$ 31.708.382,00	$ 31.708.382,00	100,00%
3	Suministro Idipron 8 SR-06	NA	$ 1.959.396,00	$ 1.959.396,00	100,00%
4	EX_05_286_1561_10	Usme	$ 291.685.429,00	$ 272.322.781,70	93,36%
5	Pendones Kr 7	Usaquén Chapinero	$ 8.242.540,00	$ 8.242.540,00	100,00%
6	EX_04_488_826_10	San Cristobal	$ 333.444.873,00	$ 268.402.054,00	80,49%
7	CP_DE_AUTOPISTA AL LLANO	Usme	$ 481.602,00	$ 481.602,00	100,00%
8	EX_04_241_1561_10	San Cristobal	$ 692.913.441,00	$ 183.146.929,50	26,43%
9	CP BARRIO LA MARIA	San Cristobal	$ 107.974.699,00	$ 10.585.809,00	9,80%
10	CP NUEVA ROMA_EX_04_006_1561_10	San Cristobal	$ 146.295.788,00	$ 9.082.922,00	6,21%
11	CP NUEVA ROMA_EX_04_044_1561_10	San Cristobal		$ 9.911.411,00	6,77%
TOTAL			**$ 1.731.324.047**	**$ 912.461.724**	


GEO APROPADA C8	$	117.014.610
GEO SIN APROBAR C9	$	131.819.092
VALOR X COBRAR	**$**	**897.657.242**

En el Anexo 14 se encuentran las planillas de obra, acta parcial de obra y suministro.

29.2 AVANCE PARCIAL

A continuación , se presenta el avance parcial y acumulado respecto al mes de ejecución, en proporción con los porcentajes mínimos establecidos para ejecutar de acuerdo con lo estipulado por la interventoría, el cual representa un valor de **2,76%** del valor total del contrato, lo ejecutado en este periodo equivale al **4.78%** lo que indica que se esta por encima de la curva de ejecución en un **6,22%**

Gráfica 1 Gráfica Curva S

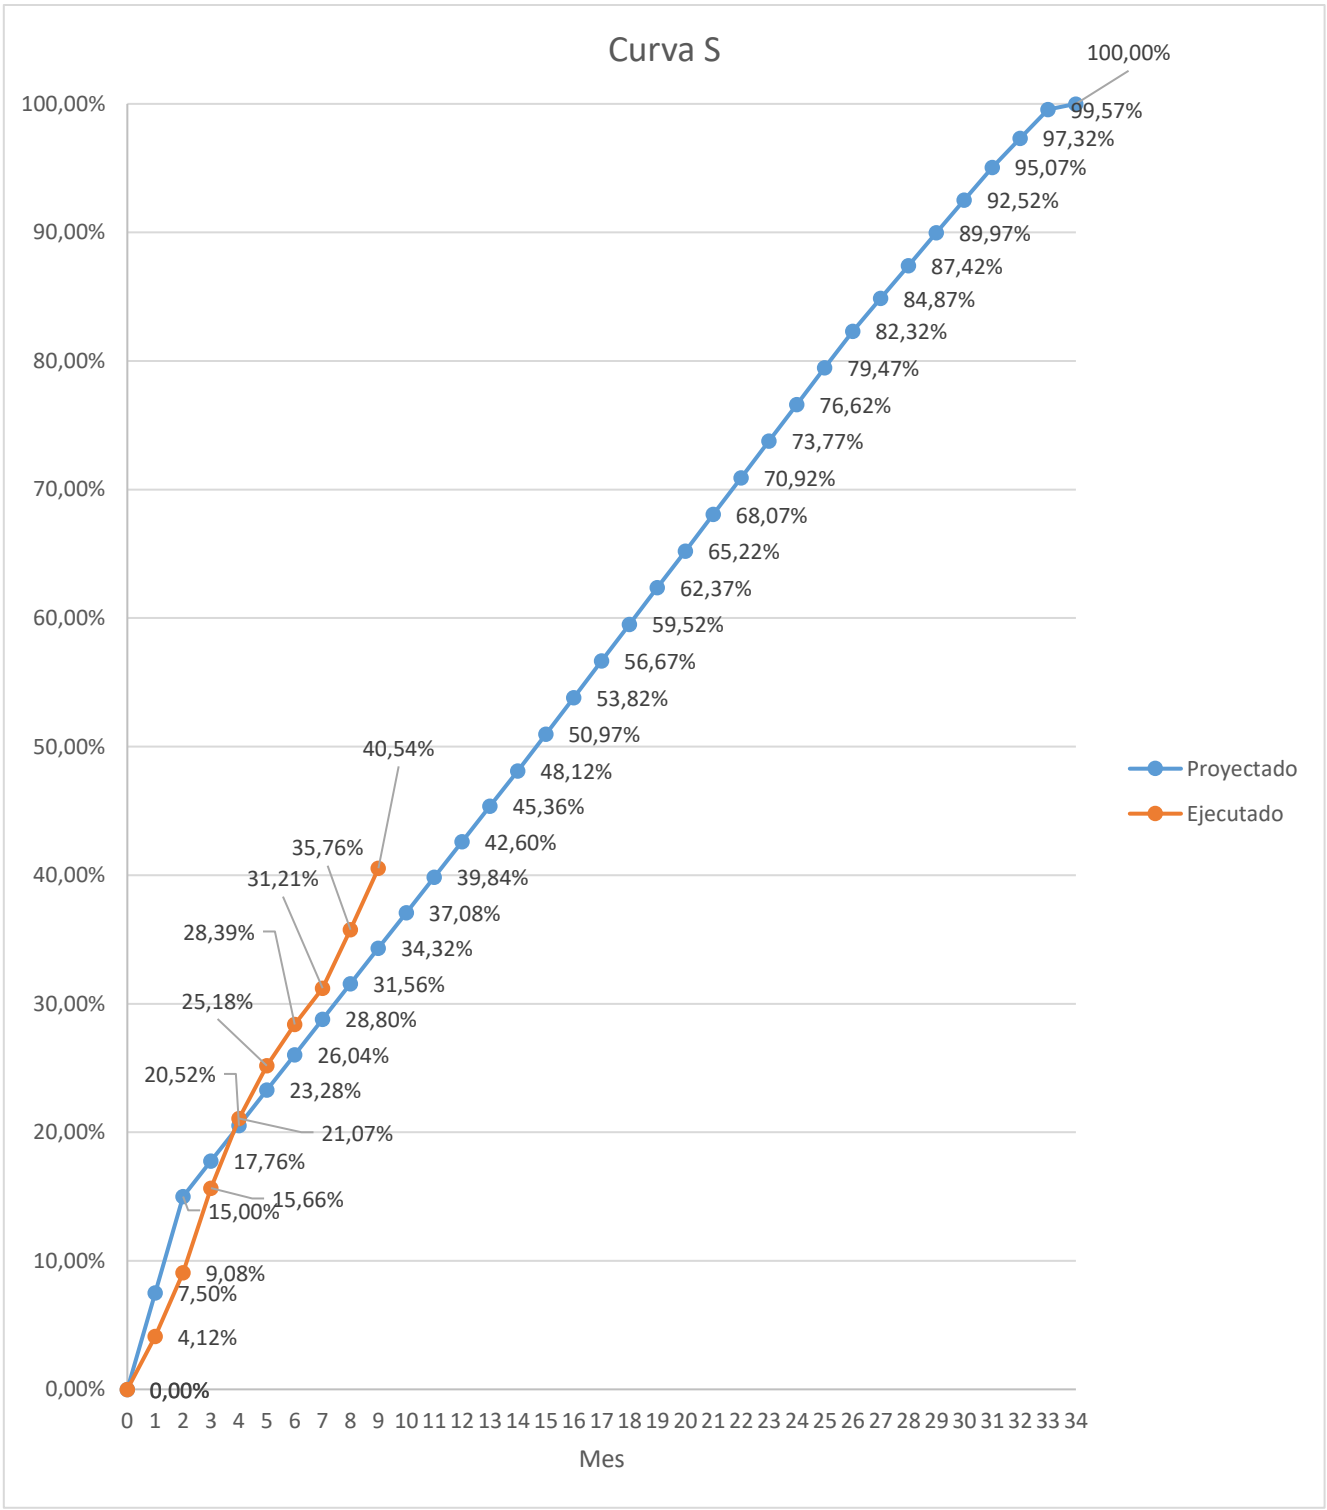

29.3 BALANCE PRESUPUESTAL

Tabla 14 Balance presupuestal

VALOR VIGENCIA 2024	$	2.815.721.000,00
VALOR VIGENCIA 2025	$	6.209.487.857,00
VALOR VIGENCIA 2026	$	6.423.895.143,00
VALOR VIGENCIA 2027	$	3.322.369.428,00
VALOR TOTAL	**$**	**18.771.473.428,00**

Pagos Efectuados	Periodo	Costos Directos	AIU	Suministro	Valor Total Acta	Retegarantía 5%	Total, a Girar	Estado
Cuenta 1	24 de febrero 23 de marzo de 2025	$ 518.247.080,00	$ 165.839.066,00	$ 88.935.514,00	$ 773.021.660,00	$ 38.651.083,00	$ 734.370.577,00	PAGO
Cuenta 1	24 de febrero 23 de marzo de 2025	$ 669.831.615,05	$ 214.346.116,81	$ 47.682.975,00	$ 931.860.707	$ 46.593.035,00	$ 885.267.671,86	PAGO
Cuenta 3	24 de marzo 23 de abril de 2025	$ 935.014.969,90	$ 299.204.790,37		$ 1.234.219.760	$ 61.710.988,00	$ 1.172.508.772,26	PAGO
Cuenta 4	24 de abril 23 de mayo de 2025	$ 770.290.040,60	$ 246.492.812,99		$ 1.016.782.854	$ 50.839.143,00	$ 965.943.710,59	PAGO
Cuenta 5	24 de mayo a 23 de junio de 2025	$ 583.227.126,05	$ 186.632.680,34		$ 769.859.806	$ 38.492.990,00	$ 731.366.816,38	PAGO
Cuenta 6	24 de junio a 23 de julio de 2025	$ 456.710.661,60	$ 146.147.411,71		$ 602.858.073	$ 30.142.904,00	$ 572.715.169,31	PAGO

Pagos Efectuados	Periodo	Costos Directos	AIU	Suministro	Valor Total Acta	Retegarantía 5%	Total, a Girar	Estado
Cuenta 7	24 de julio a 23 de agosto de 2025	$ 401.305.466,12	$ 128.417.749,16		$ 529.723.215	$ 26.486.161,00	$ 503.237.054,27	PAGO
Cuenta 8	24 de agosto a 23 de septiembre de 2025	$ 579.980.185,61	$ 185.593.659,39	$ 87.952.800,00	$ 853.526.645	$ 42.676.332,00	$ 810.850.313,00	PAGO
Cuenta 9	24 de septiembre a 23 de octubre de 2025	$ 680.043.365,15	$ 217.613.876,85		$ 897.657.242	$ 44.882.862,00	$ 852.774.380,00	EN TRAMITE
TOTAL		**$ 4.914.607.144,91**	**$ 1.572.674.286,77**		**$ 7.609.509.962,68**	**$ 380.475.498,00**	**$ 6.376.260.084,68**	

TOTAL, FACTURADO ACTA No 9	$	897.657.242
TOTAL FACTURADO , ACUMULADO	$	7.609.509.962,68
SALDO POR FACTURAR	**$**	**11.161.963.465,32**

29. PUNTAJE

Esta información se encuentra en el Anexo 15. Puntaje.

30. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se presenta un avance del 4.78% en la ejecución respecto a lo solicitado en el anexo técnico, sin embargo, se informa que en este noveno mes las condiciones climáticas no fueron favorables lo cual tiene una incidencia directa en la ejecución de actividades.

- Para la cuenta 1 se tienen 9 ID's, los 9 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 2 se tienen 6 ID's, 6 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 3 se tienen 11 ID's, 11 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 4 se tienen 15 ID's, 15 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 5 se tienen 17 ID's, 17 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 6 se tienen 9 ID's, 9 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 7 se tienen 12 ID's, 12 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 8 se tienen 21 ID's, 21 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 9 se tienen 9 ID's en desarrollo de GEORREFERENCIACIÓN

31. ANEXOS

ANEXO 1. Pólizas

ANEXO 2. Plan de Manejo de Tránsito

ANEXO 3. Aspectos Técnicos

ANEXO 4. Consultas Reservas

ANEXO 5. Plan de Calidad

ANEXO 6. Protocolo de Manejos y Residuos

ANEXO 7. Acta de entrega a almacén

ANEXO 8. Certificados de calibración

ANEXO 9. Señales retiradas en vía

ANEXO 10. Gestión social

ANEXO 11. Gestión seguridad y salud en el trabajo

ANEXO 12. Certificación honorarios y parafiscales

ANEXO 13. Certificación pago de proveedores

ANEXO 14. Balance presupuestal

ANEXO 15. Puntaje
