INFORME DE INTERVENTORÍA NO 03
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025

ID CONTRATO SECOPP II: CO1.PCCNTR.7175666

CONTRATO No: 3222 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 836 DE MARZO DE 2025: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

INTERVENTOR: CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLÍVAR.

PRESENTADO POR:

EQUIPO DE INTERVENTORIA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.1. Localización 7
2.2. Características técnicas del proyecto 7
2.2.1. Distribución de la obra 8
3. CONTRATO DE OBRA 11
3.1. Datos generales del contrato de obra 11
3.2. Aspectos financieros. 12
3.3. Actividades de obra en ejecución y por ejecutar. 13
3.4. Estados financieros del contrato de obra. 34
18 de junio de 2025: solicitud de anticipo por un valor de **$ 3,763,306,710.15** 34
3.4.1. Garantías del contrato de obra 34
3.5. Actividades realizadas. 36
3.6. Componente técnico 38
3.7. Personal del contratista 40
3.8. Maquinarias y equipos del contratista 41
3.9. Aspecto ambiental 41
3.10. Aspecto HSE 42
4. ASPECTO SOCIAL 42
5. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 43
5.1. Datos generales del contrato de interventoría 43
5.2. Aspectos financieros 44
5.3. Alcance del contrato de interventoría 45
5.4. Aspectos administrativos – contractuales de interventoría 45
5.4.1. Relación de documentos tramitados y plazos 46
5.5. Garantías del contrato de interventoría 46
6. DESARROLLO DE LA INTERVENTORÍA 47

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

6.1. Interventoría técnica 47
6.2. Actividades desarrolladas por la interventoría 48
6.3. Interventoría ambiental y salud ocupacional 49
6.4. Interventoría jurídica 50
6.5. Aspectos técnicos 51
6.6. Personal de interventoría 52
6.7. Equipos de interventoría 52
6.8. Estado financiero del contrato de interventoría 53
7. OBSERVACIONES 53
8. REGISTRO FOTOGRAFICO 54
9. BITÁCORA DE OBRA MES DE JULIO 2025. 84
10. ANEXO 1. INFORME SST. 98
11. ANEXO 2. SEGURIDAD SOCIAL EQUIPO DE CONTRATISTAS. 179
12. ANEXO 3. SEGURIDAD SOCIAL EQUIPO DE INTERVENTORIA 181
13. ANEXO 4-RESULTADOS DE LABORATORIO MUESTRAS DE CONCRETO M-1; M-2 Y M-3 A LOS 28 DÍAS, CON FECHAS DE VACIADO DE 30 Y 31 DE MAYO Y 04 DE JUNIO RESPECTIVAMENTE. 183
14. ANEXO 5-RESULTADOS DE LABORATORIO MUESTRAS DE CONCRETO M-7 Y M-8 A LOS 07 DÍAS. 184
15. ANEXO 6-RESULTADOS DE LABORATORIO MUESTRAS DE CONCRETO M-4; M-5 Y M-6. 185
16. ANEXO 7-RESULTADOS DE LABORATORIO MUESTRAS DE CONCRETO M-7; M-8 Y M-9. 186
17. ANEXO 8-RESULTADOS DE LABORATORIO MUESTRAS DE CONCRETO M-10. 187
18. ANEXO 9-RESULTADOS DE LABORATORIO MUESTRAS DE CONCRETO M-11. 188
19. CONCLUSIONES. 189

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Representación de la ubicación del proyecto..... 7
Ilustración 2: Relleno con material seleccionado Fondos de zapata de Módulo 3. 01 de julio. 54
Ilustración 3: Instalación de acero de refuerzo Zapata y columna de Muro de Cerramiento. 02 de julio. 55
Ilustración 4: Localización y replanteo Módulo 4. 02 de julio. 55
Ilustración 5: Momento HSEQ. 03 de julio. 56
Ilustración 6: Visita de Obra Equipo Especialistas de Interventoría. 03 de julio. 56
Ilustración 7: Relleno compactado y Solado Fondos de zapatas Módulo 3. 03 de julio. 57
Ilustración 8: Solado y vaciado de concreto Zapatas Muro de cerramiento. 03 de julio. 58
Ilustración 9: Vaciado de concreto Pedestales Muro de cerramiento. 04 de julio. 59
Ilustración 10: Registro de fuerte Lluvia desde las 05:00 a.m. hasta las 08:30 a.m. 05 de julio. 60
Ilustración 11: Momento HSEQ. 07 de julio. 61
Ilustración 12: Levante de muro cerramiento. 07 de julio. 61
Ilustración 13: Instalación acero de refuerzo y encofrado Zapata y pedestales Módulo 3. 07 de julio. 62
Ilustración 14: Levante de muro de Cerramiento. 08 de julio. 63
Ilustración 15: Instalación de pernos sobre pedestales Módulo 1. 09 de julio. 63
Ilustración 16: Registro de fuerte lluvia desde 15:40 hasta las 16:10. 09 de julio. 64
Ilustración 17: Vaciado de concreto Pedestales Módulo 1 y Módulo 6. 10 de julio. 65
Ilustración 18: Vaciado de concreto Zapatas Módulo 2 y Módulo 3. 10 de julio. 66
Ilustración 19: Toma de muestras de Concreto M-9. 10 de julio. 67
Ilustración 20: Vaciado de concreto Pedestales Módulo 1. 11 de julio. 68
Ilustración 21: Vaciado de concreto Zapatas Módulo 3. 11 de julio. 69
Ilustración 22: Toma de muestras de Concreto M-10. 11 de julio. 70
Ilustración 23: Momento HSEQ. 15 de julio. 71
Ilustración 24: Nivelación Excavación Vigas de cimentación Módulo 2. 15 de julio. 72
Ilustración 25: Vaciado de concreto Pedestales Módulo 1. 16 de julio 73
Ilustración 26: Vaciado de concreto Zapatas Módulo 3. 16 de julio. 74
Ilustración 27: Toma de muestras de Concreto M-11. 16 de julio. 75
Ilustración 28: Vaciado de concreto Zapatas Muro de Cerramiento. 16 de julio. 76
Ilustración 29: Vaciado de concreto Pedestales Muro de Cerramiento. 17 de julio. 77
Ilustración 30: Vaciado de concreto Viga de cimentación Muro de Cerramiento. 18 de julio. 78
Ilustración 31: Colocación de solado fondos de viga de cimentación Módulo 2. 18 de julio. 79

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

Ilustración 32: Vaciado de concreto pedestales Módulo 1; Módulo 2 y Módulo 6. 21 de julio. 80
Ilustración 33: Vaciado de concreto Viga de cimentación Módulo 1. 21 de julio. 81
Ilustración 34: Toma de muestras de Concreto M-12. 21 de julio. 82
Ilustración 35: Momento HSEQ. 22 de julio. 83

CONTENIDO DE GRAFICAS

Grafica 1: Programación vs ejecución. 39

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1: Distribución Módulos 1, 2, 3 y 5. 8
Tabla 2: Distribución Módulo 4. 8
Tabla 3: Distribución Módulo 6. 9
Tabla 4: Distribución Módulo 7. 9
Tabla 5: Distribución Zonas exteriores y urbanismo. 9
Tabla 6: Distribución Zonas de Circulación abierta, generales y patios. 9
Tabla 7: Cuadro resumen de áreas totales. 10
Tabla 8: Datos generales contrato de obra 11
Tabla 9: Aspecto financiero contrato de obra 12
Tabla 10: Actividades de Obra. 33
Tabla 11: Informe financiero contrato obra 34
Tabla 12: Pólizas de cumplimiento 35
Tabla 13: Predios, labores y operaciones 35
Tabla 14: Actividades ejecutadas hasta Julio 2025 37
Tabla 15: Avance de obra 38
Tabla 16: Personal contratista 40
Tabla 17: Maquinaria usada 41
Tabla 18: Datos generales contrato interventoría 43
Tabla 19: Aspecto financiero contra interventoría 44
Tabla 20: Plazos del contrato y relación de documentos 46
Tabla 21: Pólizas de cumplimiento de interventoría 46
Tabla 22: Aspectos técnicos, administrativos y financieros de interventoría 51
Tabla 23: Personal de interventoría 52
Tabla 24: Informe financiero contrato interventoría 53

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

El Depto. de Bolívar a través de la Secretaría de Planeación y haciendo uso de las facultades establecidas por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1150 de 2007, decreto reglamentario 1082 de 2015, ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. realizo la adjudicación del contrato **No: 3222 DE 2024, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR** al contratista CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024, por un valor total de **$ 25.088.711.401.**

Por lo anteriormente mencionado se realizaron por conducto de la mencionada dependencia los estudios previos y de costos encaminados a determinar la conveniencia y oportunidad de la contratación y a definir sus soportes técnicos, económicos y jurídicos.

De igual manera la secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar en uso de sus competencias legales, especialmente las atribuidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 381 de 2022, adjudica un contrato cuyo objeto es la **CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 836 DE MARZO DE 2025: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.**

Que revisadas las ofertas económicas por el comité evaluador manifiesta que el valor ofertado a cada grupo está acorde con las reglas fijadas en pliego de condiciones no superando el presupuesto oficial.

Como consecuencia de lo anterior, las partes quedaran así: El departamento de Bolívar como contratante y **CONSORCIO TRANFORMAR EDUCATIVO BOLÍVAR** como contratista, identificado con Nit. No. 901.928.289-3. Cuyo contrato esta por un valor de **$1.204.724.965,00**

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización

El proyecto se localiza en el Municipio de Villanueva Bolívar, departamento de Bolívar y corresponde a la CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

Longitud total de Municipio de Villanueva 225 Km2

Coordenadas: 10°26′39″N 75°16′29″O

Coordenadas de la Institución educativa técnica agropecuaria. Municipio de Villanueva - departamento de Bolívar: 10.446111, -75.2666692

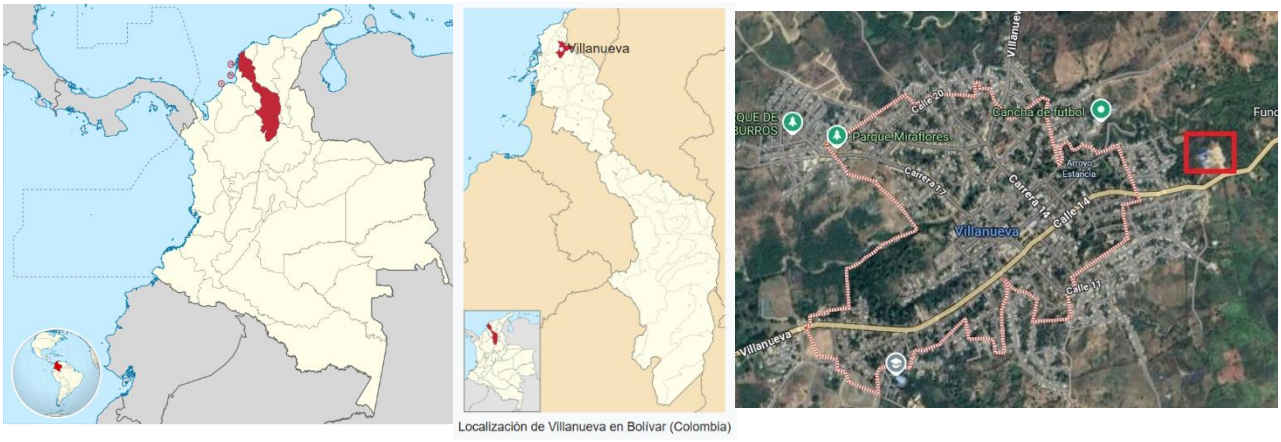


Ilustración 1: Representación de la ubicación del proyecto

2.2. Características técnicas del proyecto

El área total del lote es de 49.697 metros cuadrados, de esta área total, será intervenida un 15% la cual equivale a 7.273 metros cuadrados, esta estará distribuida en 7 módulos, una cancha multifuncional y zonas de urbanismo. El sistema constructivo de estos módulos consta de una cimentación en concreto reforzado de 4000 psi y unos pórticos en estructura

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

metálica, con cubierta termoacústica. Este proyecto contempla un diseño teniendo en cuenta la norma sismorresistente NSR-10 y cumple con todas las áreas mínimas para los espacios que van a ser construidos.

2.2.1. Distribución de la obra

Módulo 1, 2, 3 y 5: Estos módulos están diseñados para aulas de clase, tecnología e innovación y bilingüismo, además de bienestar estudiantil, los cuales tendrán de construcción de 3.050,04 m2, los cuales se reparten como se mencionan a continuación:

TIPOS DE ESPACIOS	m2	Und	M2/u	Sub total	TOTALES
AMBIENTE A AULAS					2600,16
Transicion					
Aulas preescolar	0	2	40,14	80,28	
Aulas 1º primaria	0	0	0,00	0,00	
Baños preescolar (con ducha telef)	0	2	9,86	19,72	
Baños 1º Primaria	0	1	19,27	19,27	
Deposito	0	2	5,08	10,16	
Basica primaria					
Aulas (2 a 5)	0	12	66,37	796,44	
Bateria de Baños primaria	0	2	45,47	90,94	
Secundaria					
Aulas (6 a 11)	0	21	66,37	1393,77	
Bateria de Baños	0	2	45,47	90,94	
Bateria de Baños	0	2	49,32	98,64	
AMBIENTE B (centro de recursos)					400,35
Biblioteca	0	1	206,52	206,52	
Salon ludico Infantil	0	1	96,95	96,95	
Bilinguismo	0	1	96,88	96,88	
BIENESTAR ESTUDIANTIL					49,53
Enfemeria con Baño	0	1	26,43	26,43	
Tiendas escolares	0	3	7,70	23,10	

Tabla 1: Distribución Módulos 1, 2, 3 y 5.

Módulo 4: Este módulo es exclusivo para centro de recursos, laboratorios y talleres. Área= 410,06 m^2. los cuales se reparten como se mencionan a continuación:

AMBIENTE C (Laboratorios y talleres)					410,06
Laboratorio integrado 1	0	1	92,05	92,05	
Laboratorio integrado 2	0	1	93,11	93,11	
Tecnologia e Inovacion	0	1	101,90	101,90	
Aula polivalente (Ciencia y arte)	0	1	123,00	123,00	

Tabla 2: Distribución Módulo 4.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

Módulo 6: En este módulo podemos encontrar la zona de restaurante escolar y servicios generales tales como, eléctricos, depósito de basuras y sistema de bombas hidráulicas. Área = 1022.7 m2. los cuales se reparten como se mencionan a continuación:

AMBIENTE D (Restaurante Escolar)					941,30
Comedor- Aula multiple (incluye complem	0	1	784,77	784,77	
Cocina	0	1	156,53	156,53	

SERVICIOS GENERALES					81,40
Area basuras, electricos, vestiers, etc	0	1	71,46	81,40	

Tabla 3: Distribución Módulo 6.

Módulo 7: En este módulo podemos encontrar zonas exclusivas para aulas administrativas, Área = 323.49 m2.

AREA ADMINISTRATIVA					323,49
Area administrativa	0	1	323,49	323,49	

Tabla 4: Distribución Módulo 7.

Zonas exteriores y urbanismo: cubiertas y muros. Área = 2467.1 m2.

SUB TOTAL AREA UTIL				
Muros				245,18
Circulacion cubierta 1 piso				1479,90
Circulacion cubierta 2 piso				742,02

Tabla 5: Distribución Zonas exteriores y urbanismo.

Circulación abierta, generales y patios.

CIRCULACIONES ABIERTAS GENERALES Y PATIOS					45228,70
Patios y Plazas				5209,66	
Area libres del lote y retiros				40019,04	

Tabla 6: Distribución Zonas de Circulación abierta, generales y patios.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

Cuadro resumen de áreas totales.

ELEMENTO	AREA (M2)	CANTIDAD	AREA TOTAL (M2)
AULA	72	33	2376
BAÑO AULAS	54	6	324
TECNOLOGIA E INNOVACION	99	1	99
EMISORA	9	1	9
DEPOSITO	9	1	9
BILINGUISMO	90	1	90
BIBLIOTECA	171	1	171
SALON LUDICO INFANTIL	99	1	99
OFICINA DE BIBLIOTECA	22,5	1	22,5
MATERIAL DE LECTURA	20,7	1	20,7
ENFERMERIA	27	1	27
SALA DE PROFESORES	52,3	2	104,6
BAÑO PROFESORES	24	2	48
ORIENTACION	54	1	54
RECTORIA	54	1	54
AYUDAS DIDACTICAS	24,75	1	24,75
DEPOSITO AP	7,2	2	14,4
AULA POLIVALENTE	115,2	1	115,2
LABORATORIO INTEGRAL	90	2	180
DEPOSITO LAB	3,78	4	15,12
AULA INFANTIL TIPO	49,7	2	99,4
BAÑO INFANTIL	9,66	2	19,32
COMEDOR MAS ESCENARIO	874	1	874
COCINA	189	1	189
ZONA ADMINISTRATIVA	65,625	1	65,625
PORTERIA	10,8	1	10,8
CANCHAS	465	2	930

Tabla 7: Cuadro resumen de áreas totales.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3. CONTRATO DE OBRA

3.1. Datos generales del contrato de obra

CONTRATO No.:	**3222 de 2024**
CONTRATANTE:	Gobernación de Bolívar
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
FECHA DEL CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024.
VALOR CONTRATO:	$ 25.088.711.401
FECHA DE INICIO:	12 DE MAYO DE 2025
PLAZO INICIAL:	CATORCE (14) MESES
INTERVENTORIA	CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR
SUPERVISION CONTRATO DE OBRA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – GOBERNACION DE BOLIVAR
SUPERVISION CONTRATO INTERVENTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – GOBERNACION DE BOLIVAR

Tabla 8: Datos generales contrato de obra

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.2. Aspectos financieros.

VALOR TOTAL		$ 25.088.711.401
RECURSOS		Los costos de la obra serán cubiertos por la Gobernación del Dpto. de Bolívar.
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES**	• Una primera transferencia a título de anticipo, correspondiente al 15 % del valor del contrato adjudicado, una vez se suscriba el contrato especifico, se apruebe la póliza, se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice incorporación de estos recursos en el presupuesto de la entidad ejecutora. • Una segunda transferencia, una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 30 por ciento (30%), el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. • De aquí en adelante una tercera y demás transferencias, una vez la ejecución del proyecto presente un avance físico no menor al 10 por ciento (10%), el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales.

Tabla 9: Aspecto financiero contrato de obra

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.3. Actividades de obra en ejecución y por ejecutar.

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.			
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS**
I			**CANTIDAD**
I.1	**SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA**		
I.1.1	Certificación Retie (Sobre costo Directo Costo Inst. Eléctricas)	GLB	1
I.1.2	Certificación Retilap (Sobre costo Directo Iluminación)	GLB	1
I.1.3	Tramites y diligencias para la conexión final	GLB	1
I.2	**SERVICIO AGUA POTABLE**		
I.2.1	Tramites y diligencias para la conexión final Acueducto	UND	1
I.2.2	Tramites y diligencias para la conexión final Alcantarillado	UND	1
II			
II.1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO**		
II.1.1	Localización y replanteo del Proyecto	M2	13388
II.2	**DESCAPOTE, LIMPIEZA Y CORTE**		
II.2.1	Descapote, Limpieza, cargue y retiro de sobrantes, incluye el desenraice si es necesario. Prof:0.30 mts	M2	9371.6
II.3	**CERRAMIENTO PROVISIONAL**		

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

II.3.1	Cerramiento provisional en plástico H=2.10	ML	831.25
II.4	**CAMPAMENTO PROVISIONAL**		
II.4.1	Campamento provisional, disposición y acondicionamiento de espacio para almacén de materiales, incluye su desmonte al finalizar el proyecto	MES	12.50
II.4.2	Baños provisionales	MES	12.50
II.4.3	Almacén y patio de materiales	GLB	1.00
II.5	**DEMOLICIONES EXISTENTES (PRIMERA PARTE)**		
II.5.1	Desmonte de cubiertas, puertas, ventanas y aparatos sanitarios	M2	632.00
II.5.2	Demolición de estructuras (columnas, vigas y muros)	M2	1,786.00
II.5.3	Demolición de cimientos	M2	690.00
II.6	**DEMOLICIONES EXISTENTES (SEGUNDA PARTE)**		
II.6.1	Desmonte de cubiertas, puertas, ventanas y aparatos sanitarios	M2	615.00
II.6.2	Demolición de estructuras (columnas, vigas y muros)	M2	1,765.00
II.6.3	Demolición de cimientos	M2	639.00
II.7	**PROVISIONAL SERVICIOS PUBLICOS**		
II.7.1	Provisional eléctrico (Incluye trámites ante entidad prestadora de servicios)	UND	1.00
II.7.2	Provisional hidráulico Incluye trámites ante entidad prestadora de servicios)	UND	1.00
II.7.3	Provisional alcantarillado (Incluye trámites ante entidad prestadora de servicios)	UND	1.00
III			
III.1	**EXCAVACIONES**		
III.1.1	Excavación manual y retiro de material Vigas	M3	157.64
III.1.2	Excavación manual y retiro de material Zapatas	M3	1538.25
III.1.3	Excavación mecánica y retiro de material	M3	
III.2	**RELLENOS**		
III.2.1	Relleno y compactación material seleccionado	M3	1830.11
III.2.2	Relleno piedra rajón	M3	0
III.2.3	Relleno y compactación material común	M3	120

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

III.2.4	Estabilización de taludes con geotextil	M2	217
IV			
IV.1	**ZAPATAS**		
IV.1.1	Concreto pobre de limpieza 2000 psi E: 5cm	M2	734.28
IV.1.2	concreto zapatas 4000 psi	M3	269.52
IV.1.3	Acero de refuerzo zapatas fy 60000 psi	KG	10830
IV.2	**VIGAS DE AMARRE**		
IV.2.1	Concreto pobre de limpieza 2000 psi E: 5cm	M2	604.68
IV.2.2	concreto vigas de amarre 4000 psi	M3	216.41
IV.2.3	Acero de refuerzo vigas de amarre fy 60000 psi	KG	29053
IV.3	**PEDESTALES**		
IV.3.1	concreto pedestales 4000 psi	M3	52.47
IV.3.2	Acero de refuerzo pedestales fy 60000 psi	KG	13566.67
IV.3.3	Grouting de nivelación e=5 cm	M2	71.37
V			
V.1	**SUPERFICIE EN LOSA STEEL DECK**		
V.1.1	Losa Steel deck E:15cm 4000 psi	M2	2779.276
V.2	**COLUMNAS ACERO LAMINADO (HE)**		
V.2.1	Suministro e instalación de acero laminado (S355). Incluye imprimación de secado rápido.	Kg	70312.2
V.2.2	Platina de acero laminado. Incluye imprimación de secado rápido.	Kg	6,068
V.3	**VIGAS EN ACERO LAMINADO (IPE)**		
V.3.1	Suministro e instalación de acero laminado (S355). Incluye imprimación de secado rápido.	Kg	152413.98
V.3.2	Refuerzo estructural en acero laminado (Rigidizadores y chapas). Incluye imprimación de secado rápido y soldadura.	Kg	1138.55

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

V.4	**CUBIERTA EN ACERO LAMINADO Y CONFORMADO (HEA - IPE - UPE - Z -**		
V.4.1	Suministro e instalación de acero laminado (S355). Incluye imprimación de secado rápido.	Kg	64404.45
V.4.2	Suministro e instalación de acero conformado (S355). Incluye imprimación de secado rápido.	Kg	3807.51
V.4.3	Refuerzo estructural en acero laminado (Rigidizadores y chapas). Incluye imprimación de secado rápido y soldadura.	Kg	859.6
V.5	**ESCALERA EN ACERO LAMINADO Y CONFORMADO (L - HEA - IPE - UPE)**		
V.5.1	Suministro e instalación de acero laminado (S355). Incluye imprimación de secado rápido.	Kg	6601.3
V.5.2	Refuerzo estructural en acero laminado (Rigidizadores y chapas). Incluye imprimación de secado rápido y soldadura.	Kg	3032
V,5,3	Peldaño Escaleras	UN	40
V.6	**RAMPAS EN ACERO LAMINADO**		
V.6.1	Suministro e instalación de acero laminado (S355). Incluye imprimación de secado rápido.	Kg	4698.0336
V.6.2	Refuerzo estructural en acero laminado (Rigidizadores y chapas). Incluye imprimación de secado rápido y soldadura.	Kg	72.768
V.7	**ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS EN CONCRETO**		
V.7.1	Muros en concreto 4000 psi tanque subterráneo	M3	17.25

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

V.7.2	Placa base concreto 4000 psi tanque subterráneo (Incluye cinta PVC)	M3	11.7
V.7.3	Acero de refuerzo fy 60000 psi	KG	11325
V.7.4	Losa aligerada 4000 psi tapa tanque subterráneo	M3	7.02
VI			
VI.1	**MAMPOSTERIA**		
VI.1.1	Levante Muro en bloque de concreto liso No. 5, dimensiones 12*20*30 cm	M2	4838.61
VI.1.2	Dovelas en concreto de 3000 Psi incluye acero de refuerzo y anclaje.	ML	2635
VI.1.3	Alfajía en concreto de 3000 Psi ancho=0.18 m	ML	743
VI.1.4	Grafiles para muro cada 3 hiladas	ML	3150
VI.1.5	Impermeabilizante de muros en hidrofugo	M2	9677.22
VI.1.6	Calados de 20*40 cm	M2	16.48
VI.1.7	Dintel en block número #5 en block relleno en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo	ML	
VI.2	**PAÑETES**		
VI.2.1	Pañetes interiores mortero 1:4	M2	1243.38
VI.2.2	Pañetes con mortero 1:4 impermeabilizado	M2	746.66
VI.3	**MORTEROS**		
VI.3.1	Mortero de nivelación e: 5cm	M2	665.95
VII			
VII.1	**SALIDAS TOMAS**		
VII.1.1	Salida De Tomacorrientes En Tubería Emt Y PVC De 3/4" Y Cable Hffr-Ls #12+12+12T	UND	553
VII.1.2	Salidas para tomacorrientes Trifásico 220 v	UND	9
VII.1.3	Salida De Tomacorrientes Regulado En Tubería Emt Y PVC De 3/4" Y Cable Hffr-Ls #12+12+12T	UND	160
VII.1.4	Salida 220v De Minisplit En Tubería Emt 3/4" Y Cable 2 X #12 + 12T	UND	9
VII.1.5	Salida De Ventiladores En Tuberia Emt 3/4" Y Cable Hffr-Ls #12+12+12	UND	226

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

VII.1.6	Salida De Tomacorrientes Gfci En Tubería Emt Y PVC De 3/4" Y Cable Hffr-Ls #12+12+12T	UND	16
VII.2	**BREAKER E INTERRUPTORES**		
VII.2.1	Breakers de 3x40	UND	0
VII.2.2	Breakers de 2x30	UND	0
VII.2.3	Breakers de 2x20	UND	18
VII.2.4	Breakers de 1x20	UND	373
VII.2.5	Breaker Bipolar 2X40 Amp	UND	6
VII.2.6	Breaker Tripolar 3X40 Amp (Protección)	UND	0
VII.2.7	Breaker Tripolar 3X100 Amp	UND	0
VII.2.8	Breaker Tripolar 3X50 Amp	UND	6
VII.2.9	Breaker Tripolar 3X70 Amp	UND	0
VII.2.10	Breaker Tripolar 2X70 Amp	UND	0
VII.3	**SALIDAS ALUMBRADO**		
VII.3.1	Salida De Luminaria En Tubería Emt 3/4" Y Cable Hffr-Ls #12+12+12T	UND	120
VII.4	**LUMINARIAS Y DOTACION ELECTRICA**		
VII.4.1	Luminaria Hermética Led 2X16 W	UND	0
VII.4.2	Blasto De Emergencia	UND	0
VII.4.3	Balas Panel Ld De Incrustar 6" De 12 W	UND	0
VII.4.4	Balas Panel Led De Incrustar 8" De 18 W	UND	120
VII.4.5	Luminaria 48W 60X60	UND	0
VII.4.6	Aplique De Emergencia	UND	0
VII.4.7	Reflectores 100 W	UND	0
VII.4.8	Montaje Luminarias	UND	120
VII.5	**ACOMETIDAS Y CONDUCTORES**		
VII.5.1	Acometida, 208 Vt, 2X6+6(N)+10(T) Awg Libre Halógenos	ML	0
VII.5.2	Acometida, 208 Vt, 3X2+2(N)+8(T) Awg Cable Libre Halógenos	ML	0
VII.5.3	Acometida, 208 Vt, 3X1/0+1/0(N)+8(T) Awg Libre De Halógenos	ML	0
VII.5.4	Acometida, 208 Vt, 3X4+4(N)+8T) Awg Libre Halógenos	ML	0

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

VII.5.5	Acometida 208 V 2X8+8(N)+10(T) Awg Libre De Halógenos	ML	0
VII.5.6	Acometida 208 V 2X8+8(N)+8(T) Awg Libre De Halógenos	ML	0
VII.5.7	Acometida 208 V 3X8+8(N)+8(T) Awg Libre De Halógenos	ML	0
VII.5.8	Acometida, 208 Vt, 3X4+8T) Awg Libre Halógenos	ML	0
VII.5.9	Acometida, 208 Vt, 3X6+6(N)+10(T) Awg Libre Halógenos	ML	0
VII.5.10	Acometida, 208 Vt, 3X2/0+2/0(N)+8(T) Awg Libre De Halógenos	ML	0
VII.5.11	Acometida, 208 Vt, 3X4/0+4/0(N)+6(T) Awg Libre De Halógenos	ML	
VII.5.12	Tubería Emt 3"+ Accesorios	ML	0
VII.5.13	Tubería Emt 2" + Accesorios	ML	0
VII.5.14	Elementos Conexionado E Identificación	UND	
VII.5.15	Tubería Emt 1 1/2"+ Accesorios	ML	0
VII.6	**TABLEROS**		
VII.6.1	Tablero De Distribución 42 Circuitos, Trifásico, 208 V	UND	1
VII.6.2	Tablero De Distribución 36 Circuitos, Trifásico, 208 V	UND	0
VII.6.3	Tablero De Distribución 8 Circuitos, Bifásico, 208 V	UND	8
VII.6.4	Tablero De Distribución 24 Circuitos, Trifásico, 208 V	UND	3
VII.6.5	Tablero De Distribución 12 Circuitos, Trifásico, 208 V, Cp., T-Cocina,	UND	9

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

VII.6.6	Tablero De Distribución 12 Circuitos, Bifásico, 208 V, Cp., T-R	UND	4
VII.6.7	Tablero De Distribución 30 circuitos, Trifásico, 208 V	UND	6
VII.6.8	Tablero De Distribución 18 circuitos, Trifásico, 208 V	UND	3
VII.6.9	Tablero De Distribución 18 circuitos, Bifásico, 208 V	UND	0
VII.7	**POSTES Y CANALIZACIONES**		
VII.7.1	Elementos De Conexión Crucetas Y Herrajes	UND	1
VII.7.2	Poste De 12 Mts 800 Dan	UND	1
VII.7.3	Puentes Primarias	UND	1
VII.7.4	Puesta A Tierra Pararrayos	UND	1
VII.7.5	Protecciones Y Terminales	ML	1
VII.7.6	Suministro Y Montaje De Trafo Seco Encapsulado 300 Kva13200/208-120V,	UND	1
VII.7.7	Celda De Transformador De 300 Kva	UND	1
VII.7.8	Acometida En Media Tensión En Cable Xlpe 3X# 2 15Kv	ML	60
VII.7.9	Tubería Para Acometida En Media Tensión En PVC 3"	ML	100
VII.7.10	Tubería Imc 3" Para Subir Acometida A Poste	ML	9
VII.7.11	Curva Imc De 3" Para Acometida	UND	1
VII.7.12	Curva PVC De 3" Para Acometida Subterránea	UND	2
VII.7.13	Grapa Y Cinta Bandit	ML	10
VII.7.14	Terminal Encogible Exterior	JGO	1
VII.7.15	Terminal Encogible Interior	JGO	5
VII.7.16	Acometida Trafo A Tablero General Barra De Cobre De 1000 Amp Cobre	ML	20
VII.7.17	Tablero General	GLB	1
VII.7.18	Tubería PVC 2-3" De Trafo A Tg Y Principal	MTS	150
VII.7.19	Accesorio Para La Acometida	GL	1

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

VII.7.20	Excavación (General)	M3	40
VII.7.21	Aterrizaje De La Puerta Del Cuarto Eléctrico	GL	1
VII.7.22	Celda De Medida A 13.2 Kv	UND	1
VII.7.23	Celda De Seccionador Sf6 A 13.2 Kv	UND	1
VII.7.24	Tablero De Transferencia Automática Bomba Contra Incendio	UND	1
VII.7.25	Acometida De Bomba Contraincendios En 3X4/0+ 6T En Tubería Emt De 3"	ML	201
VII.8	**TIERRAS Y OTROS**		
VII.8.1	Malla De Puesta A Tierra	UND	1
VII.8.2	Sistema De Apantallamiento-Instalación De Dps En Cada Tablero Parcial	UND	1
VII.8.3	Interconexión Cable # 1/0 Awg Thwn Desnudo Malla Tierra Cuarto Eléctrico A Pararrayo De Línea	ML	151
VII.8.4	Planta De Emergencia 60 Kva 208 V	UND	1
VII.8.5	Cabina Planta	UND	1
VII.8.6	Accesorios Planta Eléctrica	UND	1
VII.8.7	Acometida, 208 V, 3X4/0+4/0(N)+2Awg Libre Halógenos De Transferencia A Planta De Emergencia	ML	40
VII.8.8	Tubería Pvc 3"+ Accesorios	ML	40
VII.8.9	Elementos Conexionado E Identificación	UND	3
VII.8.10	Tablero General Planta	UND	1
VII.8.11	Extensión de redes de media tensión	UND	1
VIII			
VIII.1	**PUNTOS SANITARIOS Y VENTILACION**		
VIII.1.1	Puntos Desagües A.N. ø 2" (Lavamanos, Duchas, orinales y sifones piso)	UND	189
VIII.1.2	Puntos Desagües A.N. ø 4" (Inodoros)	UND	67
VIII.1.3	Tubería ventilación ø 2"	ML	240
VIII.1.4	Tubería ventilación ø 3"	ML	288
VIII.1.5	Puntos Hidráulicos A.A. ø 3/4"	UND	
VIII.2	**TUBERIA BAJANTE SANITARIA**		
VIII.2.1	Tubería Bajantes de ø 4" PVC-Sanitaria	ML	36

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

VIII.2.2	Tubería Bajantes de ø 3" PVC-Sanitaria	ML	12
VIII.3	**TUBERIA SANITARIA COLECTORES ENTERRADOS**		
VIII.3.1	Tubería Colectores Enterrados De ø2" PVC - Sanitaria	ML	438
VIII.3.2	Tubería Colectores Enterrados De ø3" PVC - Sanitaria	ML	60
VIII.3.3	Tubería Colectores Enterrados De ø4" PVC - Sanitaria	ML	402
VIII.3.4	Tubería Colectores Enterrados De ø6" PVC - Sanitaria	ML	408
VIII.3.5	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Inc. Obras Civiles	UND	
VIII.3.6	Excavación material común	M3	78.48
VIII.3.7	Relleno material seleccionado tipo zahorra	M3	78.48
VIII.4	**REGISTROS**		
VIII.4.1	Registros en Mampostería de 0.60×0.60x0.90 metros - Sanitario	UND	49
VIII.4.2	Registros en Mampostería de 0.60×0.60x0.80 metros - Eléctrico	UND	0
VIII.4.3	Registros en Mampostería de 0.80×0.80x0.80 metros - Eléctrico	UND	0
VIII.4.4	Registros en Mampostería de 1.20×1.20×0.80 metros Eléctrico	UND	0
VIII.4.5	Registros en Mampostería de 0.40×0.40×0.60 metros Eléctrico	UND	0
IX			
IX.1	**PUNTOS AGUAS LLUVIAS**		
IX.1.1	Puntos Desagües A.LL. ø 3". Incluye cúpula tragante de 3" PVC	UND	103
IX.1.2	Puntos Desagües A.LL. ø 4". Incluye cúpula tragante de 4" PVC.	UND	0

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

IX.2	**TUBERIA BAJANTE AGUAS LLUVIAS**		
IX.2.1	Tubería Bajantes de ø 4" PVC-Sanitaria	ML	180
IX.2.2	Tubería Bajantes de ø 3" PVC-Sanitaria	ML	1026
IX.3	**TUBERIA AGUAS LLUVIAS COLECTORES ENTERRADOS**		
IX.3.1	Tubería colectores Enterrados de ø3" PVC - Aguas lluvias	ML	256
IX.3.2	Tubería colectores Enterrados de ø4" PVC - Aguas lluvias	ML	32
IX.3.3	Excavación material comun	M3	144.72
IX.3.4	Relleno material seleccionado tipo zahorra	M3	144.72
IX.3.5	Cárcamo en concreto 3000 psi con rejilla en concreto reforzado	ML	
X	**REDES SUMINISTRO DE AGUA**		
X.1	**TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5-21**		
X.1.1	Puntos Hidráulicos	UND	218
X.1.2	Válvulas de compuerta ø3/4"	UND	11
X.1.3	Válvulas de compuerta ø1"	UND	27
X.1.4	Válvulas de compuerta ø1-1/2"	UND	1
X.1.5	Válvulas de compuerta ø2"	UND	0
X.1.6	Válvulas de compuerta ø4"	UND	2
X.1.7	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø1/2"	ML	120
X.1.8	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø3/4"	ML	246

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

X.1.9	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø1"	ML	36
X.1.10	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø1-1/2"	ML	84
X.1.11	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø2"	ML	
X.1.12	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø2-1/2""	ML	24
X.1.13	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø3"	ML	51
X.1.14	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø4"	ML	24
X.2	**EXCAVACIONES Y RELLENO EN RED HIDRAULICA**		
X.2.1	Excavación manual en material común	M3	0
X.2.2	Relleno material seleccionado compactado tipo zahorra	M3	0
X.3	**SISTEMA DE BOMBEO**		
X.3.1	Sistema Completo de 2 Bombas de presión constante Q = 87 Gpm H = 28 m Pot = 4 Hp Presión 20-40 psi y 2 Tanques WM-WB25 incluye accesorios y Valvuleria con tablero de control Eléctrico	UND	1
X.3.2	Prueba Hidrostática Instalación Hidráulica	UND	1
XI	**APARATOS SANITARIOS**		
XI.1	**APARATOS**		
XI.1.1	Sanitarios de Tanque	UND	64
XI.1.2	Sanitarios Discapacitados	UND	3
XI.1.3	Barra ayuda discapacitados en acero inoxidable	UND	3
XI.1.4	Lavamanos con pedestal	UND	27
XI.1.5	Grifería de Ducha	UND	4
XI.1.6	Orinal de Fluxómetro	UND	14
XI.1.7	Lavaplatos en acero inoxidable	UND	5
XI.1.8	Pocetas Laboratorio en acero inoxidable	UND	6
XI.1.9	Lava trapero en granito pulido	UND	8
XI.1.10	Llave de Chorro	UND	93
XI.1.11	Rejilla de piso de 2"	UND	144

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XI.1.12	lavamanos corrido en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo, soporte en block #5 y enchape blanco de 20x20	ML	46.6
XII	**REDES CONTRAINCENDIO**		
XII.1	**RED DE SUMINISTROS**		
XII.1.1	Tubería CPVC 4" CORZAN	ML	12
XII.1.2	Tubería CPVC 3" CORZAN	ML	354
XII.2	**GABINETES Y ACCESORIOS**		
XII.2.1	Gabinete CI clase II 0.70m x 0.70m x 0.20m	UND	10
XII.3	**EQUIPOS ESPECIALES**		
XII.3.1	Conjunto bombas Contraincendios, bomba principal 100gpm, tablero principal de control y bomba jockey	UND	1
XIII			
XIII.1	**VOZ Y DATOS**		
XIII.1.1	salidas de datos-teléfono tubería PVC 3/4"	UND	163
XIII.1.2	salidas de televisión tubería PVC 3/4"	UND	39
XIII.1.3	certificación punto de datos	UND	202
XIII.1.4	registro metálico 30x30x15 cms	UND	5
XIII.1.5	Suministro e instalación de UPS	UND	1
XIV			
XIV.1	**AIRES TIPO MINI SPLIT**		
XIV.1.1	Suministro e instalación de equipo del tipo Minisplit PISOTECHO de 5 TR R410A	UND	0
XIV.1.2	Suministro e instalación de equipo del tipo Minisplit PISOTECHO de 3 TR R410A	UND	0

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XIV.1.3	Suministro e instalación de equipo del tipo Minisplit de Pared de 2 TR - R410A-INVERTER	UND	0
XIV.2	**EXTRACCIONES**		
XIV.2.1	Sistema de ventilación mecánica para la cocina	UND	1
XIV.2.2	Extractores de baños	UND	55
XV			
XV.1	**INSTALACION DE GAS**		
XV.1.1	Tubería Pealpe ø1/2" Red Interna	ML	55
XV.1.2	Punto de gas ø1/2"	UND	15
XV.1.3	Válvulas tipo Bola Mariposa	UND	15
XV.1.4	Válvulas tipo Bola Pealpe	UND	4
XV.1.5	Pipeta 40 Lb-100 Lb	UND	2
XVI			
XVI.1	**ACABADO DE MUROS**		
XVI.1.1	Pintura Fachada (Incluye viga de borde)	M2	0
XVI.1.2	Estuco Baños, interiores vacíos internos	M2	403.5
XVI.1.3	Pintura Baños, interiores vacíos internos	M2	403.5
XVI.1.4	Enchape en cerámica blanca de 20,5x20,5 referencia:10011 de Natal Blanco de Corona h=1.20m	M2	658.79
XVI.2	**ACABADO DE PISOS**		
XVI.2.1	Lístelo en Tableta 7x25 Etrusca Moca lisa en salones	ML	0
XVI.2.2	Zócalo en Tableta 7x25 Etrusca Moca lisa salones	ML	0
XVI.2.3	Piso en concreto de 3000 psi con espesor de 10 cms con juntas y endurecedor de pisos	M2	2518.52

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XVI.2.4	Endurecedor de pisos placas SteelDeck piso 2	M2	2779.276
XVI.2.5	Sello de juntas en poliuretano para placa de concreto, incluye cordón	ML	1857.08
XVI.3	**CARPINTERIA METALICA PUERTAS**		
XVI.3.1	Suministro e instalación de puerta P1A Dim: 0,96 x 3,00 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio o apariencia Yale 90044 ó similar, Panel superior 0,90 x 0,96 mts en persiana fija en lámina cold rolled, calibre 20	UND	31
XVI.3.2	Suministro e instalación de puerta P2 Dim: 0,86 x 3,00 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio o apariencia Yale 90044 ó similar, Panel superior 0,90 x 0,96 mts en persiana fija en lámina cold rolled, calibre 20	UND	8

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XVI.3.3	Suministro e instalación de puerta P3 Dim: 0,76 x 3,00 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio o apariencia Yale 90044 ó similar, Panel superior 0,90 x 0,96 mts en persiana fija en lamina cold rolled, calibre 20	UND	3
XVI.3.4	Suministro e instalación de puerta Doble Batiente P4 Dim: 1,86 x 3,00 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio o apariencia Yale 90044 ó similar, Panel superior 0,90 x 1,86 mts en persiana fija en lámina cold rolled, calibre 20	UND	3
XVI.3.5	Suministro e instalación de puerta P5 Dim: 0,96 x 2,10 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio o apariencia Yale 90044 ó similar.	UND	18

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XVI.3.6	Suministro e instalación de puerta Doble Batiente P6 Dim: 1,66 x 3,00 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio o apariencia Yale 90044 ó similar, Panel superior 0,90 x 1,66 mts en persiana fija en lámina cold rolled, calibre 20	UND	2
XVI.3.7	Suministro e instalación de puerta cuatro cuerpos corrediza P7 Dim: 3,66 x 3,00 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio o apariencia Yale 90044 ó similar, Panel superior 0,90 x 3,66 mts en persiana fija en lámina cold rolled, calibre 20	UND	2
XVI.3.8	Puerta R2	UND	1
XVI.3.9	Puerta R1	UND	1
XVI.3.10	Suministro e instalación de puerta P1 Dim: 0,96 x 3,00 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio, Panel superior 0,90 x 0,96 mts en ventana de vidrio 4 mm color natural, paneles laterales de vidrio como muestra en el diseño	UND	43
XVI.4	**CIELOS**		
XVI.4.1	Cielo raso en drywall + pintura a 2 manos	M2	1594.1228
XVI.5	**CARPINTERIA METLICA VENTANERIA Y BARANDAS**		

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XVI.5.1	Ventana tipo V1 Dim: 5,30 x 2,10 mts, 4 cuerpos corredizos sistema 5020, 2 cuerpos fijos, vidrio 4 mm color natral, cuerpo superior en persianas de aluminio 315 color natural o similar 0,90 x 5,30 mts	UND	10
XVI.5.2	Ventana tipo V2 Dim: 7,30 x 2,10 mts, 4 cuerpos corredizos sistema 5020, 2 cuerpos fijos, vidrio 4 mm color natral, cuerpo superior en persianas de aluminio 315 color natural o similar 0,90 x 7,30 mts	UND	35
XVI.5.3	Ventana tipo V3 Dim: 1,40 x 1,03 mts, 2 Cuerpos corredizos sistema 5020, vidrio 4 mm color natral.	UND	2
XVI.5.4	Ventana tipo V4 Dim: 3,60 x 2,10 mts, 2 cuerpos corredizos sistema 5020, 2 cuerpos fijos, vidrio 4 mm color natural, cuerpo superior en persianas de aluminio 315 color natural o similar 0,90 x 3,60 mts.	UND	48
XVI.5.5	Ventana tipo V5 Dim: 1,80 x 2,10 mts, 2 cuerpos corredizos sistema 5020, vidrio 4 mm color natural, cuerpo superior en persianas de aluminio 315 color natural o similar 0,90 x 1,80 mts.	UND	29
XVI.5.6	Ventana tipo V6 Dim: 0,60 x 0,60 mts, 1 Cuerpo proyectante sistema 5020, vidrio 4 mm color natral.	UND	5

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XVI.5.7	Ventana tipo V7 Dim: 1,80 x 1,20 mts, 2 cuerpos, sistema batiente perfil 1 1/2" x 3/4" aluminio color blanco o similar, vidrio 4 mm color natral.	UND	1
XVI.5.8	Ventana tipo V7A Dim: 0,80 x 1,20 mts, 1 cuerpo, sistema batiente perfil 1 1/2" x 3/4" aluminio color blanco o similar, vidrio 4 mm color natral.	UND	1
XVI.5.9	Celosía en aluminio tipo persiana de 1.2m*3.95m	UND	16
XVII			
XVII.1	**CUBIERTAS TERMOACUSTICAS**		
XVII.1.1	Cubierta Teja ECONOROOF panelmet	M2	4086.32
XVII.1.2	Caballete externo e interno	ML	282.53
XVII.1.3	Remates laterales y esquineros de cubierta	ML	1337.12
XVII.1.4	Canal en lámina galvanizada cal 20 con soporteria metálica en ángulos 2"	ML	558.66
XVII.1.5	Soscos metálicos 4" L=30 Cms	UND	0
XVII.1.6	Rejilla tipo cúpula 4"	UND	103
XVIII			
XVIII.1	**IMPERMEBAILIZACIONES EN CALIENTE**		
XVIII.1.1	Impermeabilización con manto edil 4 mm con foil de aluminio	M2	468.68
XVIII.2	**IMPERMEABILIZACIONES EN FRIO**		
XVII.2.1	Impermeabilización de baños y zonas húmedas con cemento marino	M2	331.79
XIX			
XIX.1	**LIMPIEZA Y ASEO**		
XIX.1.1	Limpieza y aseo fino, incluye suministro de insumos	M2	7333
XIX.2	**SEÑALIZACIONES**		

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XIX.2.1	Suministro e instalación de señalizaciones y nomenclaturas	UND	155
XX			
XX.1	**ZONAS VERDES**		
XX.1.1	Jardineras muros en bloque vibrado # 4 pañetado con mortero 1:4 h= 0,60 mts	ML	63
XX.1.2	Arborización	UND	20
XX.1.3	Siembra de arena negra	M3	120
XX.2	**PISOS EXTERIORES**		
XXI.2.1	Pisos en concreto 3000 psi allanado E:10cm	M2	2188.14
XXI.2.2	Piso en Tableta 7x25 Etrusca Moca lisa zonas peatonales	M2	0
XX.3	**CANCHA MULTIPLE**		
XX.3.1	Placa en concreto allanado 3000 psi e: 10cm incluye juntas de dilatación y reforzada con malla electrosoldada 20x20 4mm	M2	571.7
XX.3.2	Pintura tráfico peatonal y deportivo	M2	571.7
XX.3.3	Pintura tráfico peatonal y deportivo	ML	176
XX.3.4	Dotación cancha múltiple (Marcos múltiples Baloncesto y Microfutbol)	UND	2
XX.4	**MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL**		

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XX.4.2	Muro cerramiento perimetral con tubería negra 2 1/2" @ 0,15 mts con tapa metálica acabado con pintura de esmalte RAL 5015 en módulos de 2,55 y altura de 1,90 mts empotrada en muro en bloque # 5 de cemento altura 0,60 mts y columnas de confinamiento según NSR 10 y módulos de muros en bloque # 5 de cemento a la vista y columnas de confinamiento longitud 2,4 mts y altura de 2,50 mts.	ML	145.7
XX.4.3	Muro cerramiento perimetral según NSR 10 muros en bloque # 5 de cemento a la vista y columnas de confinamiento longitud 2,4 mts y altura de 2,50 mts.	ML	571
XX.5	**MURO DE CONTENCION**		
XX.5.1	Excavación manual	M3	0
XX.5.2	Muro de contención de tierras de base rectilínea, con puntera y talón.	ML	0
XX.6	**PARQUEADEROS**		
XX.6.1	Pavimento en concreto rígido e=0.15 mts	M2	896.33
XX.6.2	Bordillo en concreto 3000 PSI H=0.20 mts.	m	199.27
XX.6.3	Anden en concreto e=7.5 cms	M2	0
XX.6.4	Rampas en concreto e=0.15 mts	M2	0

Tabla 10: Actividades de Obra.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.4. Estados financieros del contrato de obra.

18 de junio de 2025: solicitud de anticipo por un valor de **$ 3,763,306,710.15**

INFORME FINANIERO CONTRATO DE OBRA		
Valor actual del contrato de obra	**$ 25.088.711.401**	**100%**
Concepto	**Valor facturado**	**Porcentaje**
ACTA 1	$ 0	0%
TOTAL	$ 0	0.00%
SALDO	**$ 25.088.711.401**	**100.00%**

Tabla 11: Informe financiero contrato obra

3.4.1. Garantías del contrato de obra

El contrato obra cuenta con pólizas que garantizan el cumplimiento del contrato, el pago adecuado de salarios y prestaciones, la correcta inversión del anticipo y la estabilidad de la obra. Estas medidas aseguran la transparencia y calidad en la ejecución del proyecto, protegiendo los intereses de todas las partes involucradas.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

Póliza de cumplimiento No. 11-44-101245567
Aseguradora: Seguros del Estado S.A
Nit: 860.009.578-6

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del Contrato	12/05/2025	11/11/2026	$ 7.526.613.420,3
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/05/2025	12/07/2029	$ 1.254.435.570,05
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	12/05/2025	11/07/2026	$ 3.763.306.710,15
Estabilidad y calidad de la obra		5 años	$ 1.254.435.570,05

Tabla 12: Pólizas de cumplimiento

Póliza de cumplimiento No. 11-40-101072984
Aseguradora: Seguros del Estado S.A
Nit: 860.009.578-6

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Predios, labores y operaciones	12/05/2025	12/07/2026	$ 1.254.435.570,05
Contratistas y subcontratistas	12/05/2025	12/07/2026	$ 1.254.435.570,05
Vehículos propios y no propios	12/05/2025	12/07/2026	$ 1.254.435.570,05

Tabla 13: Predios, labores y operaciones

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.5. Actividades realizadas.

A continuación, se presenta el resumen del avance mensual del contrato de obra, el cual detalla el porcentaje de ejecución alcanzado en cada periodo reportado. Esta información permite verificar el progreso acumulado del proyecto en relación con el cronograma establecido:

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.					
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
I			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
II					
II.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO				
II.1.1	Localizacion y replanteo del Proyecto	M2	$ 6.330,77	13388	$ 84.756.338,46
II.2	DESCAPOTE, LIMPIEZA Y CORTE				
II.2.1	Descapote, Limpieza, cargue y retiro de sobrantes, incluye el desenraice si es necesario. Prof:0.30 mts	M2	$ 23.788,46	12379	$ 294.477.365,38
II.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL				
II.3.1	Cerramiento provisional en plástico H=2.10	ML	$ 28.464,62	144,5	$ 4.113.136,92
II.4	CAMPAMENTO PROVISIONAL				
II.4.1	Campamento provisional, disposicion y acondicionamiento de espacio para almacen de materiales, incluye su desmonte al finalizar el proyecto	MES	$ 942.508,46	0	$ -
II.4.2	Baños provisionales	MES	$ 910.876,15	0	$ -
II.4.3	Almacen y patio de materiales	GLB	$ 8.523.122,31	0	$ -
III					
III.1	EXCAVACIONES				
III.1.1	Excavacion manual y retiro de material Vigas	M3	$ 90.153,08	0	$ -
III.1.2	Excavacion manual y retiro de material Zapatas	M3	$ 76.810,00	1922,44	$ 147.662.616,40
III.1.3	Excavacion mecanica y retiro de material	M3	$ 88.320,77		$ -

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

III.2	**RELLENOS**				
III.2.1	Relleno y compactacion material seleccionado	M3	$ 194.793,08	515,87	$ 100.487.904,59
III.2.2	Relleno piedra rajon	M3	$ 123.653,08	0	$ -
III.2.3	Relleno y compactaciion material comun	M3	$ 75.893,08	0	$ -
IV					
IV.1	**ZAPATAS**				
IV.1.1	Concreto pobre de limpieza 2000 psi E: 5cm	M2	$ 48.628,46	607,58	$ 29.545.680,66
IV.1.2	concreto zapatas 4000 psi	M3	$ 762.907,69	121,6	$ 92.769.575,38
IV.1.3	Acero de refuerzo zapatas fy 60000 psi	KG	$ 11.073,08	8100	$ 89.691.923,08
IV.2	**VIGAS DE AMARRE**				
IV.2.1	Concreto pobre de limpieza 2000 psi E: 5cm	M2	$ 48.628,46	0	$ -
IV.2.2	concreto vigas de amarre 4000 psi	M3	$ 842.184,62	0	$ -
IV.2.3	Acero de refuerzo vigas de amarre fy 60000 psi	KG	$ 11.073,08	0	$ -
IV.3	**PEDESTALES**				
IV.3.1	concreto pedestales 4000 psi	M3	$ 861.075,38	0	$ -
IV.3.2	Acero de refuerzo pedestales fy 60000 psi	KG	$ 11.073,08	7688,84	$ 85.139.116,77

Tabla 14: Actividades ejecutadas hasta Julio 2025

Por lo anterior se discrimina las actividades realizadas en el periodo 01 – 31 de julio del 2025:

- Localización y replanteo del área a intervenir.
- Corte, relleno y nivelación de terreno natural en las áreas del módulo 3 y 4.
- Excavaciones para zapatas de modulo 3 y 4.
- Relleno con material seleccionado en excavaciones para zapatas del módulo 3 y 4
- Corte, figuración y armado de acero para zapatas y pedestales de modulo 4.
- Elaboración y colocación de solado de limpieza
- Fundida de zapatas del módulo 3
- Fundida de Pedestales del módulo 1
- Se realizo excavación para zapatas del muro de cerramiento.
- Se realizo levante en block #5 en el muro de cerramiento
- Se fundieron vigas de cimentación y columnas en el muro de cerramiento

De acuerdo con estas actividades, se muestra en la siguiente tabla el avance del contrato de obra.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

INFORME #	% PROGRAMADO	% EJECUTADO DEL PRESENTE PERIODO	% ACUMULADO MES ANTERIOR	% TOTAL ACUMULADO PROGRAMADO	% TOTAL ACUMULADO EJECUTADO
1	0,99%	1,97%	0%	0,99%	1,97%
2	1,77%	1,11%	1,97%	2,76%	3,08%
3	5,34%	2,24%	3,08%	8,10%	5,32%

Tabla 15: Avance de obra

3.6. Componente técnico


El presente informe contempla las actividades desarrollas del 01 al 31 de julio del presente año, en donde la interventoría realizó acompañamiento, verificación y supervisión al contratista CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024, en la ejecución de las actividades técnicas del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

En el desarrollo de las actividades del proyecto el residente de interventoría ha supervisado y verificado el avance de obra.

Este mes, se logró un avance del 2.24 %, esto nos ubica un 2,78% por debajo del porcentaje programado acumulado.

Actualmente, se siguen desarrollando varias actividades clave que permitirán seguir avanzando mucho más en los próximos días. Estamos enfocados en aprovechar el tiempo y mantenernos firmes en el cumplimiento de los objetivos establecidos.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

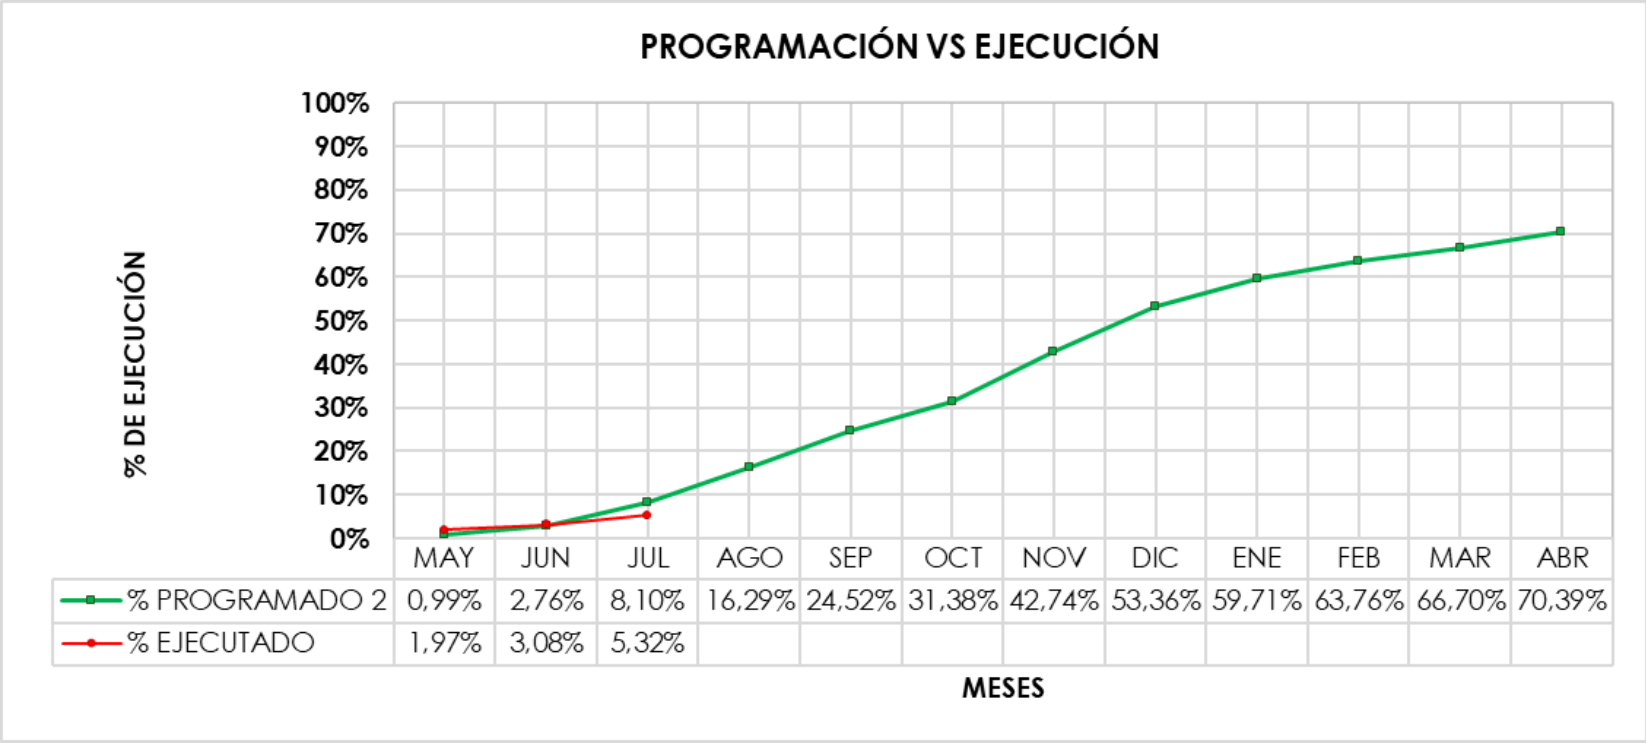

Grafica 1: Programación vs ejecución.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.7. Personal del contratista

Nombre	Cargo	Profesión
Víctor Buelvas	Director de Obra	Ingeniero Civil. Esp. En Estructuras.
Adrián Ortega	Ingeniero Residente	Ingeniero Civil
Rafael Altamiranda	Ingeniero Residente Administrativo y Esp. En Estructuras	Ingeniero Civil
Tommy España	Coordinador HSEQ	Ingeniero Industrial. Esp. En SST.
Susana Montes	Aux. HSEQ.	Técnico en seguridad industrial y salud ocupacional

CARGO	CANTIDAD (UND)
SUPERVISOR	5
AYUDANTE	16
OPERADOR DE MAQUINARIA	2

Tabla 16: Personal contratista

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

3.8. Maquinarias y equipos del contratista

MAQUINARIA/EQUIPOS	CANTIDAD (UN)
MINICARGADOR	1
RETRO EXCAVADOORA SOBRE ORUGA	1
RETRO EXCAVADOORA SOBRE LLANTA	1
MEZCLADORA	1
APISONADOR TIPO CANGURO	1
APISONADOR TIPO RANA	2
VIBRADOR DE CONCRETO	1

Tabla 17: Maquinaria usada

3.9. Aspecto ambiental

El contratista está implementando el Plan de Manejo Ambiental (PMA) como parte de sus responsabilidades ambientales en el proyecto. El PMA es un documento que establece las medidas y acciones que se deben tomar para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales asociados con las actividades de construcción. El contratista está llevando a cabo acciones como la gestión adecuada de los residuos generados durante la obra, el control de emisiones contaminantes, la protección de recursos naturales cercanos y la implementación de medidas para conservar la biodiversidad local. Además, el contratista está realizando monitoreos periódicos para evaluar el cumplimiento de las medidas establecidas en el PMA y garantizar que se estén tomando las medidas adecuadas para proteger el medio ambiente durante el desarrollo del proyecto.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

3.10. Aspecto HSE

En el presente periodo se ha desarrollado en obra el aspecto siso, haciendo entrega de los elementos de protección personal, señalización de lugares con alto grado de riesgo dentro de la obra, además colocando pare y siga (paleteros) durante el cargue y transporte con volquetas del material de excavación y demolición, y realizando el pago de la seguridad social a todos los trabajadores.

Además, para el personal de obra se realizan charlas diarias en temas de seguridad y salud en el trabajo, indicando normas básicas de seguridad industrial, normas de permanencia en obra y protocolos de bioseguridad, lineamientos frente a emergencias y salud en el trabajo.

4. ASPECTO SOCIAL

Se realizaron actividades propias de socialización con la comunidad, representantes de la veeduría y del concejo comunitario, por parte de la alcaldía, la interventoría y el contratista.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

5. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Datos generales del contrato de interventoría

CONTRATO No.	836 DE MARZO DE 2025
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE BOLIVAR
CONTRATISTA	CONSORCIO TRANSFROMAR EDUCATIVO BOLÍVAR
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER QUESADA TURIZO
OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÈCNICA AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"
FECHA DEL CONTRATO	28 DE MARZO DE 2025.
VALOR CONTRATO	$1.204.724.965.
FECHA DE INICIACIÓN	12 DE MAYO DE 2025.
PLAZO INICIAL	QUINCE MESES (15)
SUPERVISION CONTRATO DE INTERVETORÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – GOBERNACION DE BOLIVAR

Tabla 18: Datos generales contrato interventoría

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

5.2. Aspectos financieros

VALOR TOTAL	$ 1.204.724.965.	
RECURSOS	Los costos de la Interventoría serán cubiertos por la Gobernación del Departamento de Bolívar	
FORMA DE PAGO	ANTICIPO	N.A.
	PAGOS PARCIALES	**El DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR** pagará al Contratista el contrato a celebrar, a través de actas mensuales de interventoría, de manera proporcional al avance físico de las obras contempladas en el Contrato de obras al que se le va a realizar la interventoría, que deberán ser debidamente aprobadas por el supervisor del contrato y cuya sumatoria corresponderá al noventa por ciento (90 %) del valor de este. El último pago del valor del contrato corresponderá al diez por ciento (10 %) de su valor, y se hará efectivo con la presentación de las actas de recibo y de liquidación final. Cada acta mensual deberá ir acompañada de por lo menos **doce (12) fotografías**, donde se muestre el avance de cada una de las obras.

Tabla 19: Aspecto financiero contra interventoría

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

5.3. Alcance del contrato de interventoría

- Supervisión y control: El interventor puede tener la responsabilidad de supervisar y controlar el desarrollo y ejecución del proyecto, asegurándose de que se cumplan los plazos, presupuestos y estándares de calidad establecidos.
- Verificación de cumplimiento: El interventor puede estar encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, ambientales y de seguridad aplicables al proyecto.
- Coordinación de actividades: El interventor puede coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados en el proyecto, como contratistas, proveedores y personal interno de la organización.
- Informes y comunicación: El interventor puede ser responsable de generar informes periódicos sobre el avance del proyecto, así como de comunicar cualquier problema, riesgo o desviación significativa a las partes interesadas correspondientes.
- Control de costos y presupuesto: El interventor puede monitorear y controlar los costos del proyecto, revisando los presupuestos, autorizando pagos y gestionando las modificaciones presupuestarias necesarias.
- Gestión de riesgos: El interventor puede identificar y gestionar los riesgos asociados al proyecto, implementando medidas preventivas y correctivas para mitigarlos.
- Resolución de conflictos: En caso de surgir disputas o conflictos relacionados con el proyecto, el interventor puede desempeñar un papel en la resolución de estos, actuando como mediador o facilitador entre las partes involucradas.

5.4. Aspectos administrativos – contractuales de interventoría

En los aspectos administrativos el INTERVENTOR debe supervisar y controlar entre otros: el cronograma de ejecución y el desarrollo de las actividades programadas, las cantidades contratadas, los costos unitarios, alcance, y el cumplimiento de las condiciones y obligaciones contractuales de los trabajos objeto de la prestación del servicio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

5.4.1. Relación de documentos tramitados y plazos

El 12 de MAYO del 2025 se da inicio al plazo de ejecución de contrato de interventoría de obra pública.

PLAZO TOTAL	14 meses	Contrato No. 836 DE MARZO DE 2025		
ACTO	FECHA	TIEMPO		FECHA FINALIZACIÓN PROYECTADA
		ACUMULADO	QUEDAN	
Acta de Inicio	12/05/2025	426 días	407 días	12/07/2026

Tabla 20: Plazos del contrato y relación de documentos

5.5. Garantías del contrato de interventoría

El contrato de interventoría cuenta con pólizas que garantizan el cumplimiento del contrato, el pago adecuado de salarios y prestaciones y la estabilidad de la obra. Estas medidas aseguran la transparencia y calidad en la ejecución del proyecto, protegiendo los intereses de todas las partes involucradas.

Póliza de cumplimiento No. 11 – 44 – 101252615
Aseguradora: Seguros del estado
Nit: 860.009.578-6

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del Contrato	12/05/2025	12/11/2026	$120.472.496,50
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/05/2025	12/07/2029	$120.472.496,50
Calidad del servicio	12/07/2026	12/07/2031	$120.472.496,50

Tabla 21: Pólizas de cumplimiento de interventoría

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

6. DESARROLLO DE LA INTERVENTORÍA

6.1. Interventoría técnica

- Supervisión del diseño: El interventor técnico puede revisar y supervisar los planos, especificaciones y documentos técnicos relacionados con el diseño del proyecto para garantizar que cumplan con los estándares y requisitos establecidos.
- Control de calidad: El interventor técnico puede estar encargado de supervisar y asegurar la calidad de los materiales, equipos y trabajos ejecutados en el proyecto, verificando que cumplan con las especificaciones técnicas y normativas aplicables.
- Inspecciones y pruebas: El interventor técnico puede llevar a cabo inspecciones y pruebas periódicas durante la ejecución del proyecto para verificar el cumplimiento de los estándares técnicos y la correcta ejecución de los trabajos.
- Verificación de avance: El interventor técnico puede monitorear y verificar el avance de las obras o actividades técnicas del proyecto, asegurándose de que se cumplan los plazos establecidos y se realicen de acuerdo con los estándares técnicos requeridos.
- Evaluación de riesgos técnicos: El interventor técnico puede identificar y evaluar los riesgos técnicos asociados al proyecto, proponiendo medidas preventivas y correctivas para mitigarlos.
- Coordinación con contratistas y proveedores: El interventor técnico puede coordinar y colaborar estrechamente con los contratistas, proveedores y personal técnico involucrado en el proyecto, brindando orientación técnica, resolviendo consultas y asegurando el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos.
- Informes técnicos: El interventor técnico puede generar informes técnicos periódicos sobre el estado del proyecto, los avances, las desviaciones y las recomendaciones técnicas pertinentes.

Dentro del alcance del contrato de interventoría se tiene contemplado la ejecución de la INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

6.2. Actividades desarrolladas por la interventoría

La interventoría realiza las siguientes actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual:

- Supervisión del cumplimiento contractual: La interventoría se encarga de asegurar que todas las partes involucradas cumplan con los términos y condiciones establecidos en el contrato.
- Verificación del cumplimiento normativo: El interventor verifica que el proyecto cumpla con todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables, tanto en términos de diseño como de ejecución.
- Control de calidad: La interventoría se encarga de supervisar y controlar la calidad de los materiales, equipos y trabajos ejecutados en el proyecto, asegurando que se cumplan los estándares y especificaciones establecidos.
- Control de costos y presupuesto: La interventoría monitorea y controla los costos del proyecto, revisando los presupuestos, autorizando pagos y gestionando cualquier modificación presupuestaria necesaria.
- Programación y seguimiento: La interventoría se encarga de programar y hacer un seguimiento del avance del proyecto, asegurándose de que se cumplan los plazos establecidos y tomando las medidas necesarias para corregir desviaciones.
- Gestión de riesgos: La interventoría identifica y gestiona los riesgos asociados al proyecto, implementando medidas preventivas y correctivas para mitigarlos.
- Coordinación y comunicación: La interventoría se encarga de coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados en el proyecto, como contratistas, proveedores y personal interno de la organización. También mantiene una comunicación fluida con todas las partes interesadas, informando sobre el avance del proyecto y cualquier problema o desviación relevante.
- Generación de informes: La interventoría elabora informes periódicos sobre el avance del proyecto, incluyendo aspectos como el cumplimiento de objetivos, desviaciones, riesgos identificados y recomendaciones.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

6.3. Interventoría ambiental y salud ocupacional

La interventoría supervisa y controla los aspectos relacionados con el medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional en un proyecto. Estas son algunas actividades comunes que se desarrollan en la interventoría ambiental y de salud ocupacional: La interventoría vigila, exige y vela por el cumplimiento del Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del personal que viene utilizando el contratista, aportes al día, que constituyen requisito indispensable para que pueda proceder al pago alguno al contratista; e igual para el ejercicio de la Interventoría a cargo.

- Cumplimiento normativo: La interventoría se encarga de verificar el cumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas ambientales y de salud ocupacional aplicables al proyecto.
- Evaluación de impacto ambiental: La interventoría ambiental evalúa el impacto que el proyecto puede tener en el medio ambiente, identificando medidas preventivas y correctivas para minimizar dicho impacto.
- Control de emisiones y residuos: La interventoría se asegura de que se implementen adecuadas prácticas de manejo de emisiones y residuos, supervisando que se cumplan los estándares y regulaciones ambientales correspondientes.
- Monitoreo de calidad del aire, agua y suelos: La interventoría lleva a cabo monitoreos periódicos para evaluar la calidad del aire, agua y suelos, verificando que se mantengan dentro de los límites establecidos y tomando medidas correctivas si es necesario.
- Evaluación de riesgos ocupacionales: La interventoría de salud ocupacional identifica y evalúa los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores en el proyecto, proponiendo medidas preventivas y de control para minimizar dichos riesgos.
- Implementación de programas de seguridad y salud ocupacional: La interventoría se encarga de supervisar la implementación y cumplimiento de programas de seguridad y salud ocupacional, asegurando que se tomen las medidas necesarias para prevenir accidentes y enfermedades laborales.
- Capacitación y formación: La interventoría facilita capacitaciones y formación en temas ambientales y de salud ocupacional para los trabajadores, con el objetivo de mejorar su conocimiento y conciencia sobre estos aspectos.
- Inspecciones y auditorías: La interventoría realiza inspecciones y auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales y de salud ocupacional, identificando oportunidades de mejora y recomendando acciones correctivas.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

- Informes y comunicación: La interventoría genera informes periódicos sobre el desempeño ambiental y de salud ocupacional del proyecto, comunicando a las partes interesadas sobre los resultados y proponiendo acciones de mejora.

De manera permanente se verifica el estado y uso adecuado de los elementos de protección personal de acuerdo con la clasificación del riesgo y actividad realizada por los trabajadores en obra.

6.4. Interventoría jurídica

Se realizó la suscripción de pólizas del contrato de acuerdo con las fechas del acta de inicio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

6.5. Aspectos técnicos

ASPECTOS TÉCNICOS	
Gestión General	La interventoría controló y supervisó el cumplimiento de las obligaciones contractuales de orden Técnico, requeridas para el adecuado desarrollo del contrato de obra e Interventoría. Las actividades encaminadas para este fin se resumen a continuación
Contrato No. CMA-SI-002 - 2022	• Seguimiento de obra - bitácora de obra. • Revisión de los planos y diseños. • Revisión del presupuesto de obras y balance del contrato. • Control de calidad sobre los materiales y actividades a ejecutar. • Revisión y solicitud de las certificaciones de materiales previstos utilizar por el Contratista. • Verificación del personal y equipos del Contratista. • Verificación de dotación del personal que garantice la seguridad industrial
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	
Gestión General	La Interventoría controló y supervisó el cumplimiento de las obligaciones contractuales de orden Administrativo, requeridas para el adecuado desarrollo del contrato de obra e Interventoría. Las actividades encaminadas para este fin se resumen a continuación:
Contrato No. 836 DE MARZO DE 2025.	• Comunicaciones al Contratista de obra. • Ejecución del informe mensual • Coordinación de las reuniones de comités de obra y elaboración de las correspondientes actas. • Verificación de la vigencia de las pólizas que amparan el contrato. • Verificación de afiliación a la seguridad social de los trabajadores de la obra. • Seguimiento para la elaboración de actas. • Trámites para el desembolso de los recursos del contrato.
ASPECTOS FINANCIEROS	
Gestión General	La interventoría controló y supervisó el cumplimiento de las obligaciones contractuales de orden Financiero, requeridas para el adecuado desarrollo del contrato de obra e Interventoría.

Tabla 22: Aspectos técnicos, administrativos y financieros de interventoría

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

6.6. Personal de interventoría

A continuación, se detalla el Personal empleado por la interventoría en el presente mes para los trabajos de "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

NOMBRE	CARGO	PROFESIÓN
WILDER QUESADA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	INGENIERO CIVIL
KLISMAN ATENCIO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERO CIVIL

Tabla 23: Personal de interventoría

6.7. Equipos de interventoría

Para la ejecución del contrato No. 836 DE MARZO DE 2025, la Interventoría utiliza los siguientes Equipos:

- Oficina
- Equipo de Computación (Portátil)
- Equipo de Comunicaciones
- Elementos de Oficina
- Vehículos de desplazamiento

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

6.8. Estado financiero del contrato de interventoría

INFORME FINANIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA				
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA			$1.204.724.965,00	100%
ANTICIPO			$0	
CONCEPTO	**VALOR FACTURADO**	**%**	**VALOR NETO RECIBIDO**	**%**
ACTA 1	**$0**	**0%**	**$0**	**0%**
TOTAL	**$1.204.724.965,00**	**100%**	**$1.204.724.965,00**	**100%**

Tabla 24: Informe financiero contrato interventoría

7. OBSERVACIONES

Podemos observar que durante el presente mes de julio se ejecutó una cantidad de obra equivalente 2.24% de la obra con un porcentaje acumulado de 5.32 %. Las cuales al compararse con las cantidades programadas que equivalen a un 5.34% mensual y un 8.1% acumulado se puede observar que vamos abajo 3 puntos porcentuales de acuerdo con dicha programación y con los tiempos establecidos.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

8. REGISTRO FOTOGRAFICO



Ilustración 2: Relleno con material seleccionado Fondos de zapata de Módulo 3. 01 de julio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 3: Instalación de acero de refuerzo Zapata y columna de Muro de Cerramiento. 02 de julio.



Ilustración 4: Localización y replanteo Módulo 4. 02 de julio.





Ilustración 5: Momento HSEQ. 03 de julio.





Ilustración 6: Visita de Obra Equipo Especialistas de Interventoría. 03 de julio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 7: Relleno compactado y Solado Fondos de zapatas Módulo 3. 03 de julio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 8: Solado y vaciado de concreto Zapatas Muro de cerramiento. 03 de julio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 9: Vaciado de concreto Pedestales Muro de cerramiento. 04 de julio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 10: Registro de fuerte Lluvia desde las 05:00 a.m. hasta las 08:30 a.m. 05 de julio.





Ilustración 11: Momento HSEQ. 07 de julio.





Ilustración 12: Levante de muro cerramiento. 07 de julio.



Ilustración 13: Instalación acero de refuerzo y encofrado
Zapata y pedestales Módulo 3. 07 de julio.



Ilustración 14: Levante de muro de Cerramiento. 08 de julio.



Ilustración 15: Instalación de pernos sobre pedestales Módulo 1. 09 de julio.



Ilustración 16: Registro de fuerte lluvia desde 15:40 hasta las 16:10. 09 de julio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 17: Vaciado de concreto Pedestales Módulo 1 y Módulo 6. 10 de julio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 18: Vaciado de concreto Zapatas Módulo 2 y Módulo 3. 10 de julio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 19: Toma de muestras de Concreto M-9. 10 de julio.



Ilustración 20: Vaciado de concreto Pedestales Módulo 1.
11 de julio.



Ilustración 21: Vaciado de concreto Zapatas Módulo 3. 11 de julio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 22: Toma de muestras de Concreto M-10. 11 de julio.



Ilustración 23: Momento HSEQ. 15 de julio.

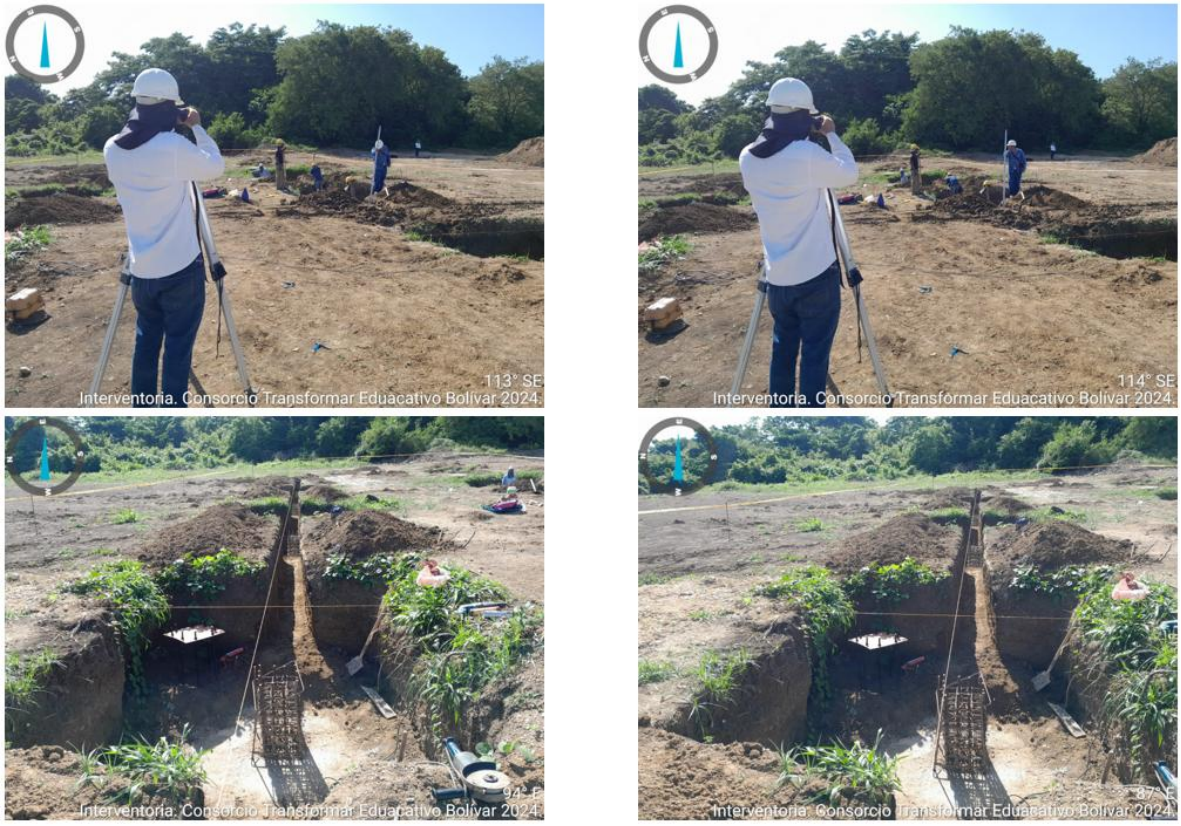


Ilustración 24: Nivelación Excavación Vigas de cimentación Módulo 2. 15 de julio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 25: Vaciado de concreto Pedestales Módulo 1.
16 de julio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 26: Vaciado de concreto Zapatas Módulo 3. 16 de julio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 27: Toma de muestras de Concreto M-11. 16 de julio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 28: Vaciado de concreto Zapatas Muro de Cerramiento. 16 de julio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 29: Vaciado de concreto Pedestales Muro de Cerramiento. 17 de julio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 30: Vaciado de concreto Viga de cimentación Muro de Cerramiento. 18 de julio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 31: Colocación de solado fondos de viga de cimentación Módulo 2. 18 de julio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 32: Vaciado de concreto pedestales Módulo 1; Módulo 2 y Módulo 6. 21 de julio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 33: Vaciado de concreto Viga de cimentación Módulo 1. 21 de julio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 34: Toma de muestras de Concreto M-12. 21 de julio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

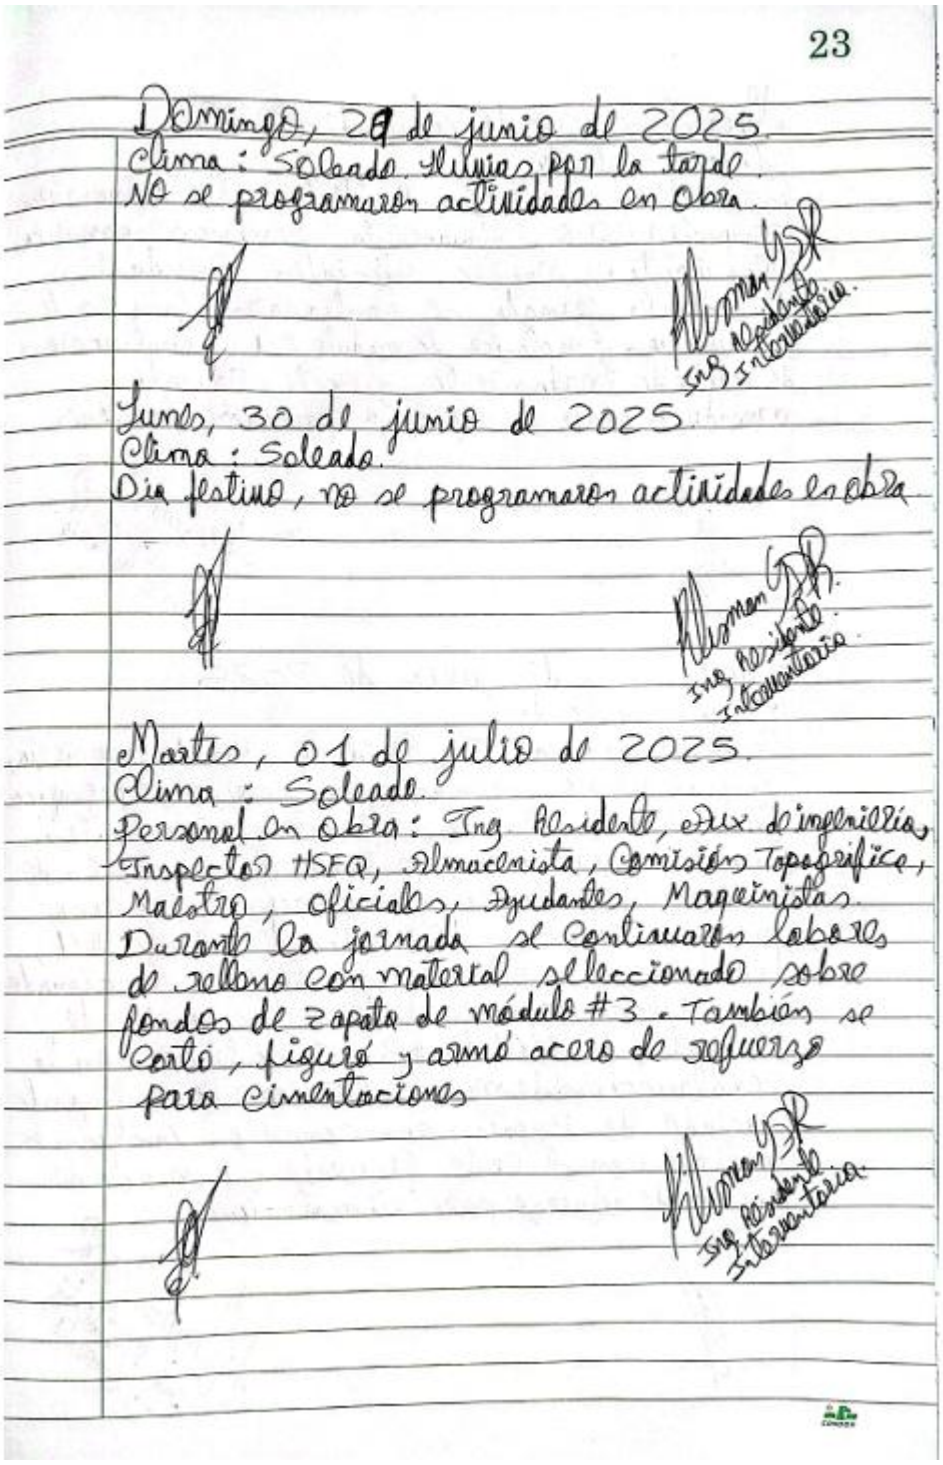


Ilustración 35: Momento HSEQ. 22 de julio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

9. BITÁCORA DE OBRA MES DE JULIO 2025.



23

Domingo, 29 de junio de 2025.
Clima: Soleado. Lluvias por la tarde.
No se programaron actividades en obra.

Ing. Residente Interventoría.

Lunes, 30 de junio de 2025.
Clima: Soleado.
Día festivo, no se programaron actividades en obra


Ing. Residente Interventoría.

Martes, 01 de julio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: Ing Residente, auxiliar de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maestro, oficiales, Ayudantes, Maquinistas.
Durante la jornada se continuaron labores de relleno con material seleccionado sobre fondos de zapata de módulo #3. También se cortó, figuró y armó acero de refuerzo para cimentaciones

Ing. Residente Interventoría.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

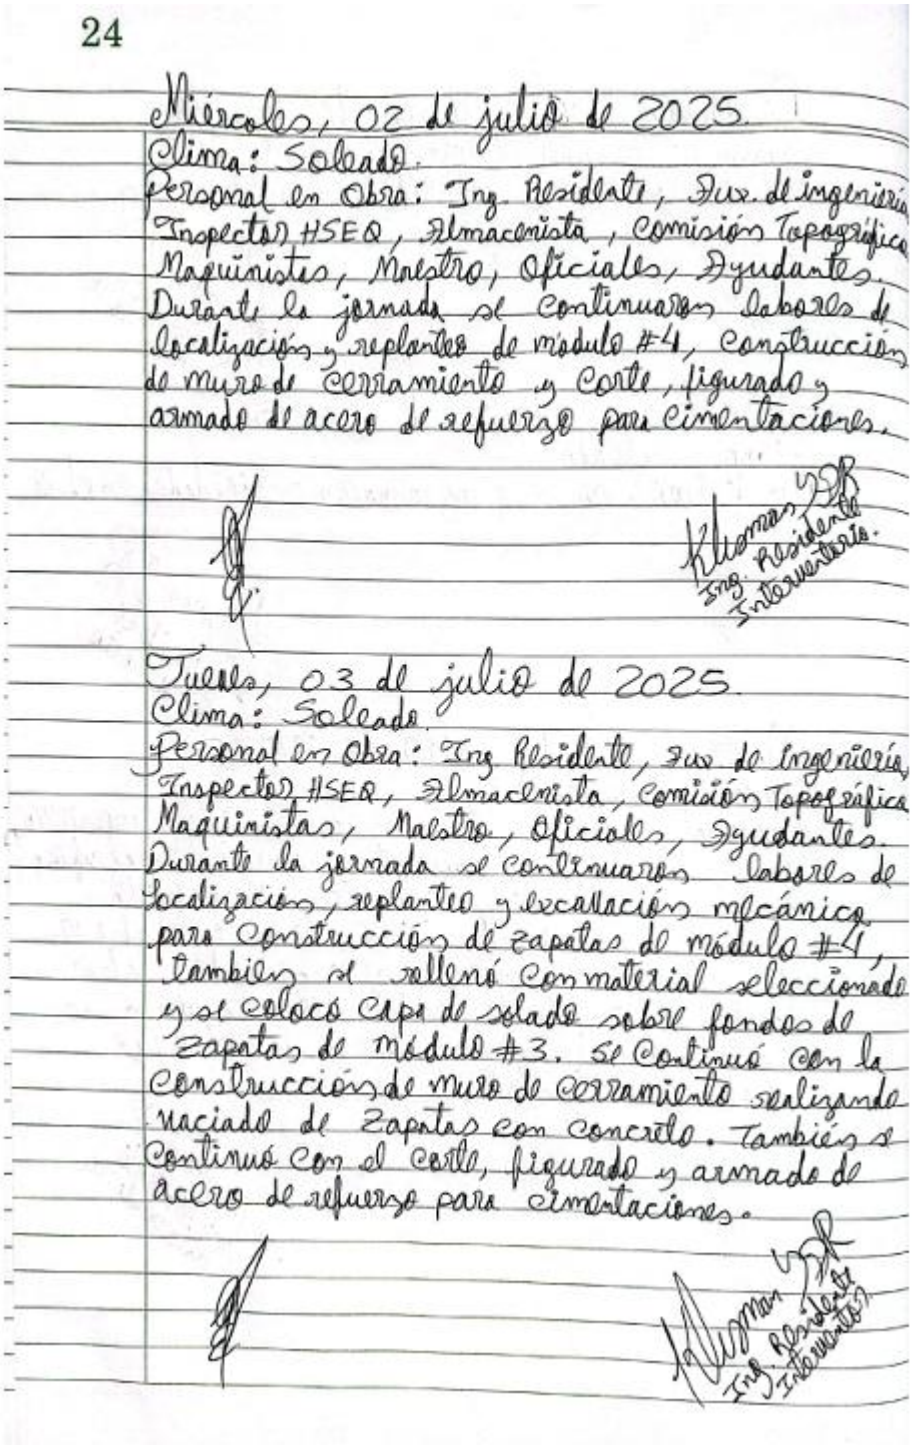

24

Miércoles, 02 de julio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron labores de localización y replanteo de módulo #4, construcción de muro de cerramiento y corte, figurado y armado de acero de refuerzo para cimentaciones.


Ing. Residente Interventoría.

Jueves, 03 de julio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron labores de localización, replanteo y excavación mecánica para construcción de zapatas de módulo #4, también se relleno con material seleccionado y se coloco capa de solado sobre fondos de zapatas de módulo #3. Se continuó con la construcción de muro de cerramiento realizando vaciado de zapatas con concreto. También se continuó con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo para cimentaciones.

Ing. Residente Interventoría

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

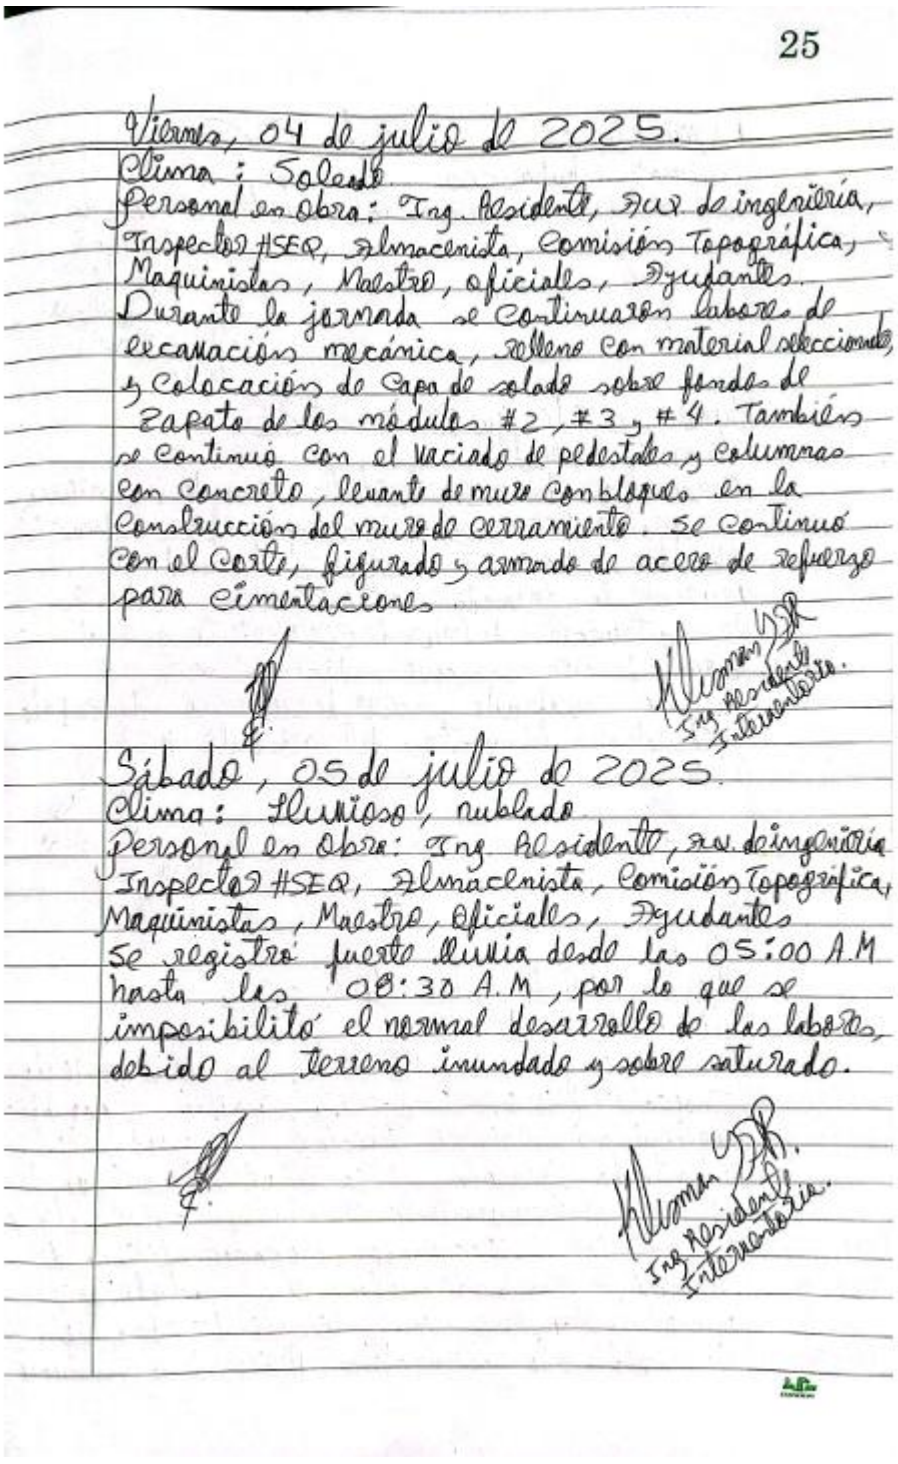

25

Viernes, 04 de julio de 2025.
Clima: Soleado
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron labores de excavación mecánica, relleno con material seleccionado y colocación de capa de solado sobre fondo de zapata de los módulos #2, #3, #4. También se continuó con el vaciado de pedestales y columnas en concreto, levante de muro con bloques en la construcción del muro de cerramiento. Se continuó con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo para cimentaciones.


Ing. Residente Interventoría.

Sábado, 05 de julio de 2025.
Clima: lluvioso, nublado
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes
Se registró fuerte lluvia desde las 05:00 A.M hasta las 08:30 A.M, por lo que se imposibilitó el normal desarrollo de las labores, debido al terreno inundado y sobre saturado.

Ing. Residente Interventoría.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

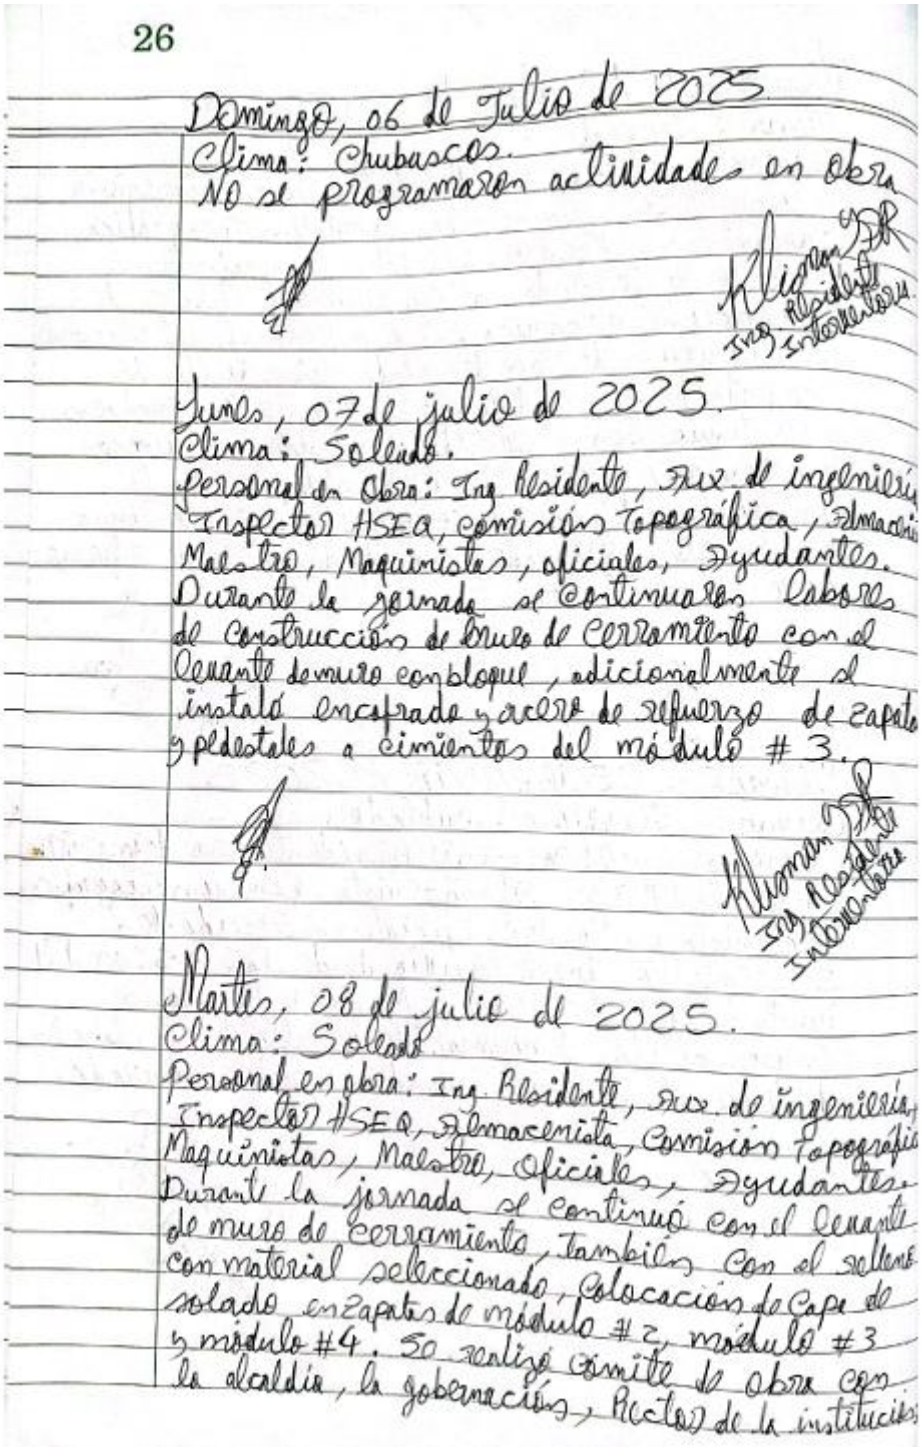

26

Domingo, 06 de Julio de 2025
Clima: Chubascos.
No se programaron actividades en obra

Ing Residente
Ing Interventoría


Lunes, 07 de julio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: Ing Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, comisión Topográfica, Almacenista, Maestro, Maquinistas, oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron labores de construcción de muro de cerramiento con el levante de muro con bloque, adicionalmente se instaló encofrado y acero de refuerzo de zapatas y pedestales a cimientos del módulo # 3.

Ing Residente
Ing Interventoría

Martes, 08 de julio de 2025.
Clima: Soleado
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuó con el levante de muro de cerramiento, también con el sellene con material seleccionado, Colocación de Capa de solado en zapatas de módulo # 2, módulo # 3 y módulo #4. Se realizó comité de obra con la alcaldía, la gobernación, Rectores de la institución

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

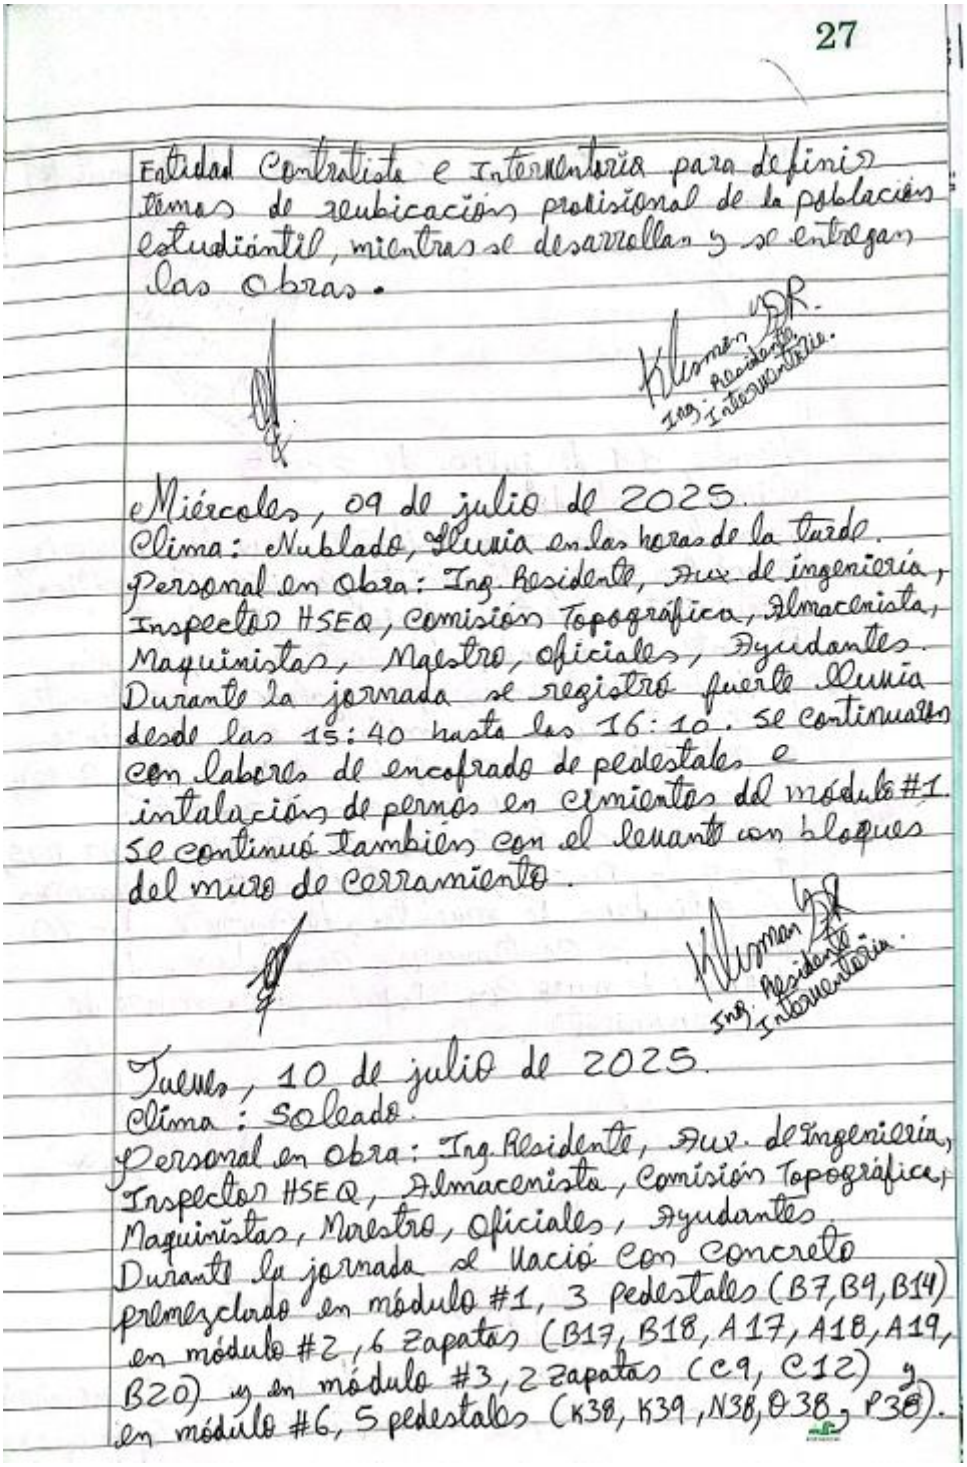

27

Entidad Contratista e Interventoría para definir temas de reubicación provisional de la población estudiantil, mientras se desarrollan y se entregan las obras.

Ing. Residente Interventoría.


Miércoles, 09 de julio de 2025.
Clima: Nublado, lluvia en las horas de la tarde.
Personal en Obra: Ing Residente, Aux de ingeniería, Inspector HSEQ, comisión Topográfica, Almacenista, Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se registró fuerte lluvia desde las 15:40 hasta las 16:10. Se continuaron con labores de encofrado de pedestales e instalación de pernos en cimientos del módulo #1. Se continuó también con el levante con bloques del muro de cerramiento.

Ing. Residente Interventoría.

Jueves, 10 de julio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de Ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se vació con concreto premezclado en módulo #1, 3 pedestales (B7, B9, B14) en módulo #2, 6 zapatas (B17, B18, A17, A18, A19, B20) y en módulo #3, 2 zapatas (C9, C12) y en módulo #6, 5 pedestales (K38, K39, N38, O38, P38).

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

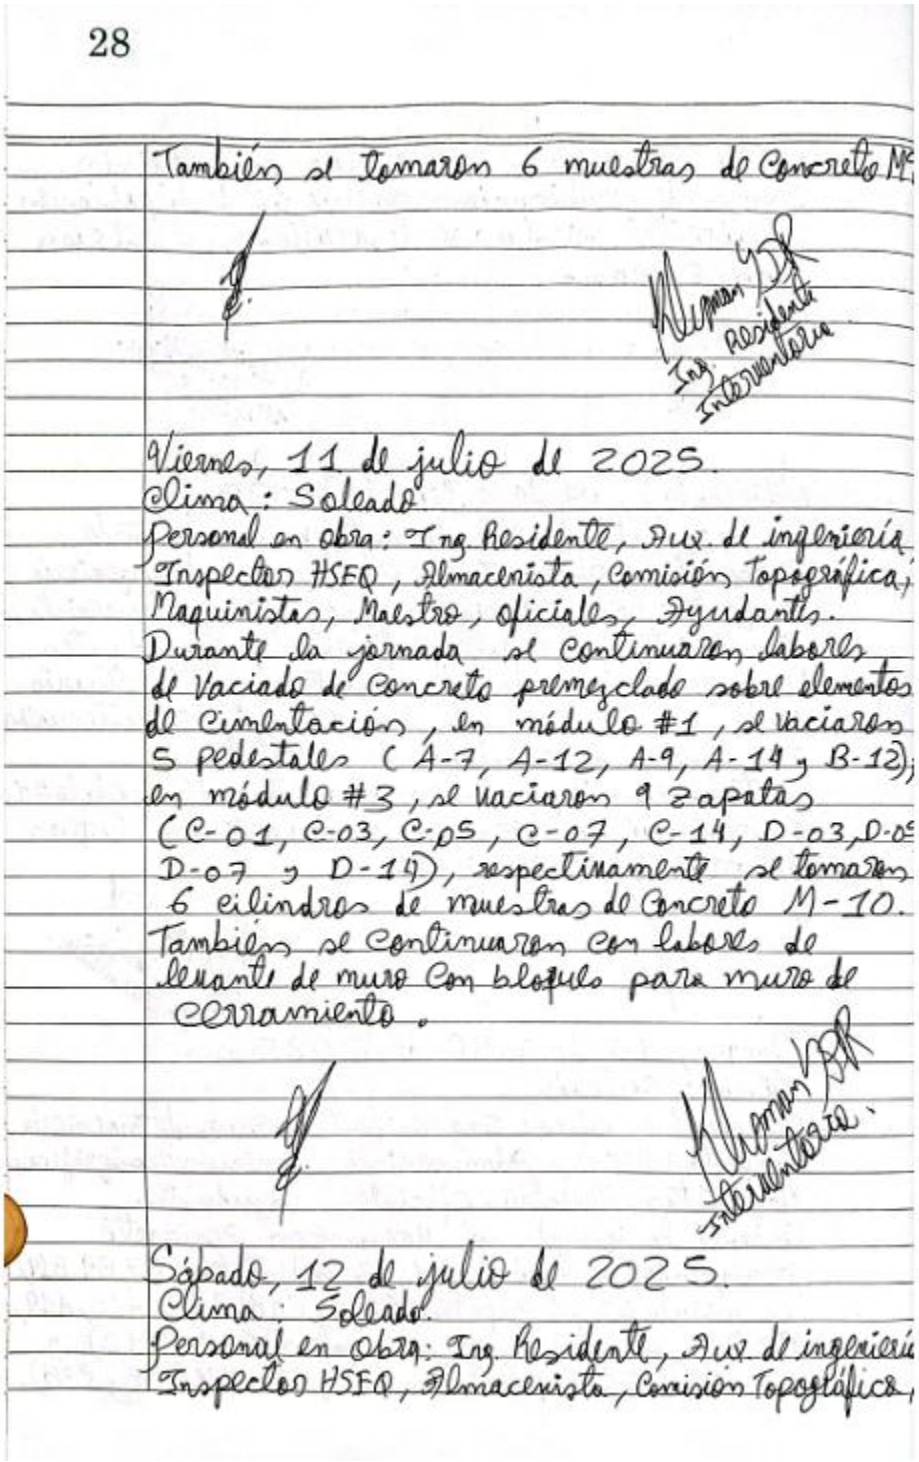

28

También se tomaron 6 muestras de Concreto M

Ing. Residente Interventoría


Viernes, 11 de julio de 2025.
Clima: Soleado
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspectores HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinistas, Maestro, oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron labores de Vaciado de Concreto premezclado sobre elementos de Cimentación, en módulo #1, se vaciaron 5 pedestales (A-7, A-12, A-9, A-14 y B-12); en módulo #3, se vaciaron 9 zapatas (C-01, C-03, C-05, C-07, C-14, D-03, D-05, D-07 y D-14), respectivamente se tomaron 6 cilindros de muestras de Concreto M-10. También se continuaron con labores de levante de muro con bloques para muro de cerramiento.

Ing. Residente Interventoría.

Sábado, 12 de julio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspectores HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica,

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

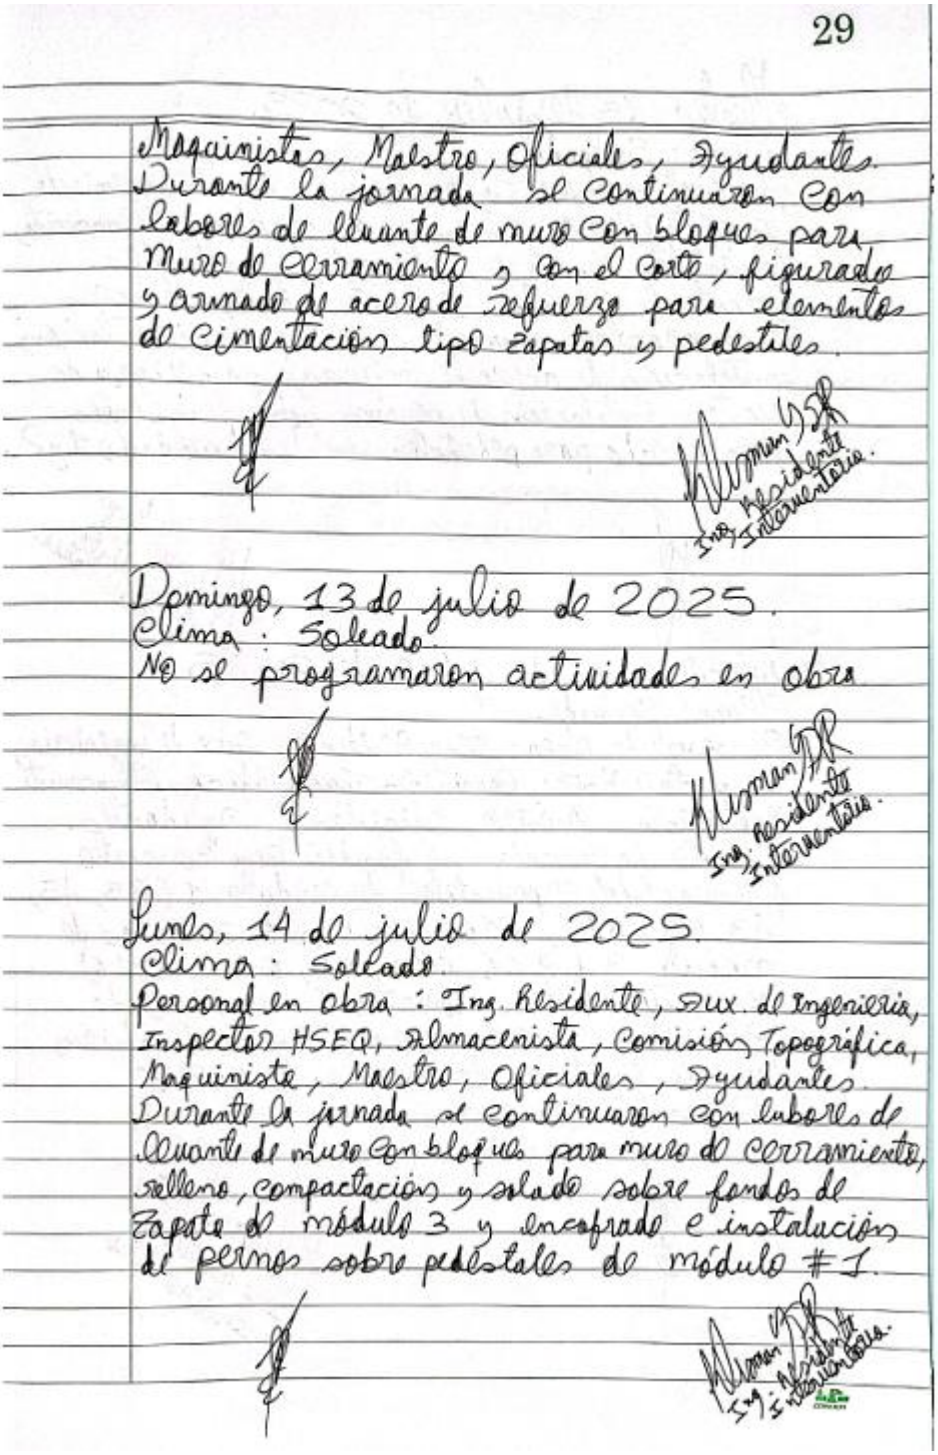

29

Maquinistas, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron con labores de levante de muro con bloques para muro de cerramiento y con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo para elementos de cimentación tipo zapatas y pedestales.

Ing. Residente Interventoría.

Domingo, 13 de julio de 2025.
Clima: Soleado.
No se programaron actividades en obra


Ing. Residente Interventoría.

Lunes, 14 de julio de 2025.
Clima: Soleado
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de Ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinista, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron con labores de levante de muro con bloques para muro de cerramiento, relleno, compactación y solado sobre fondo de zapata de módulo 3 y encofrado e instalación de pernos sobre pedestales de módulo #1.

Ing. Residente Interventoría.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

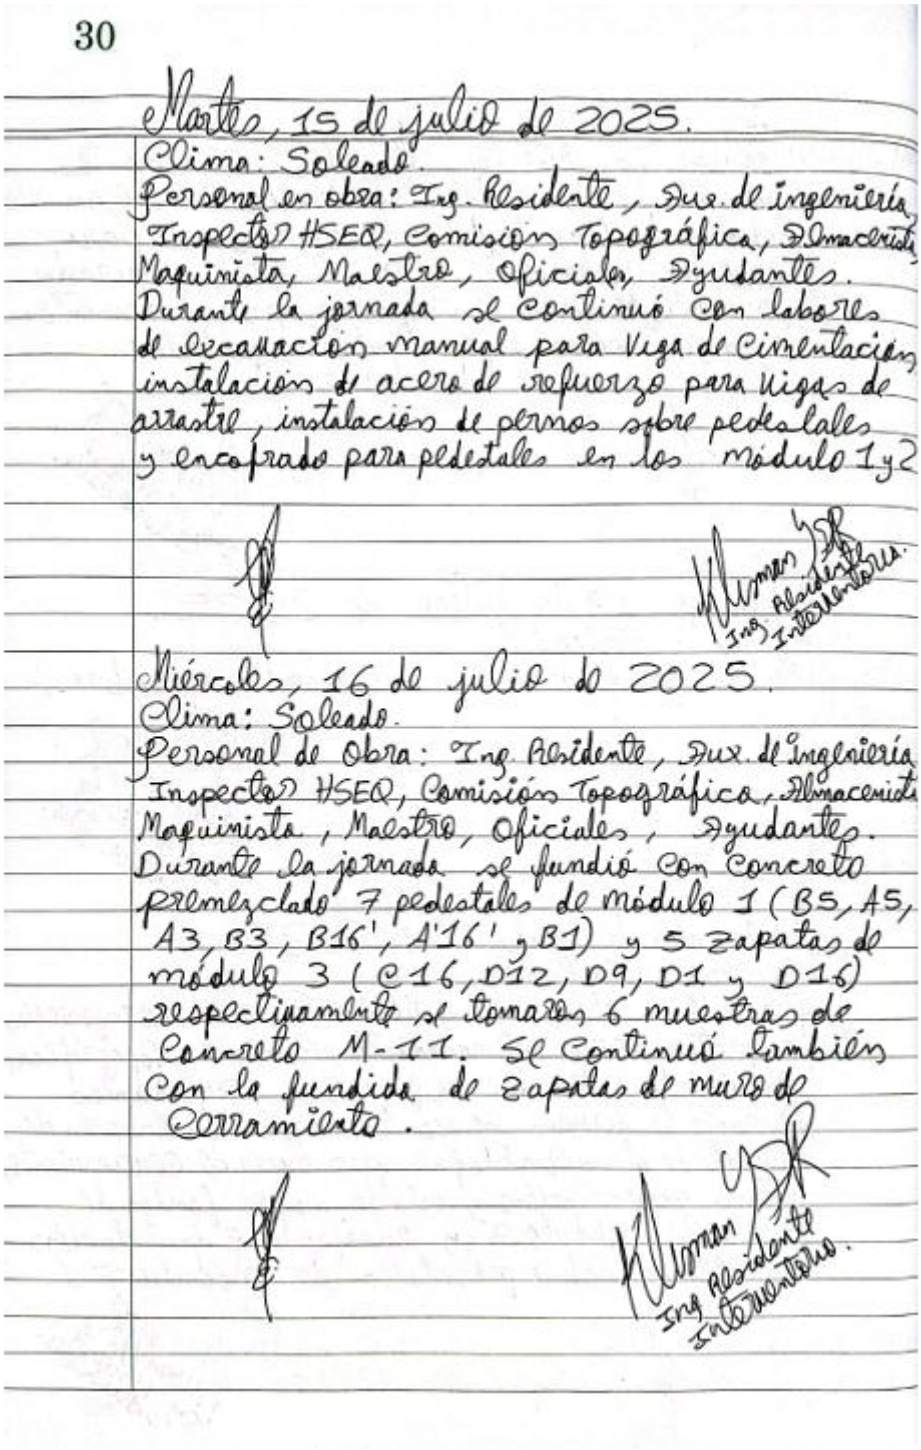

30

Martes, 15 de julio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Comisión Topográfica, Almacenista, Maquinista, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuó con labores de excavación manual para Viga de Cimentación, instalación de acero de refuerzo para vigas de arrastre, instalación de pernos sobre pedestales y encofrado para pedestales en los módulo 1 y 2


Ing. Residente Interventoría.

Miércoles, 16 de julio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal de Obra: Ing. Residente, Aux. de Ingeniería, Inspector HSEQ, Comisión Topográfica, Almacenista, Maquinista, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se fundió con concreto premezclado 7 pedestales de módulo 1 (B5, A5, A3, B3, B16', A'16', y B1) y 5 zapatas de módulo 3 (C16, D12, D9, D1 y D16) respectivamente se tomaron 6 muestras de concreto M-11. Se continuó también con la fundida de zapatas de muro de cerramiento.

Ing. Residente Interventoría.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

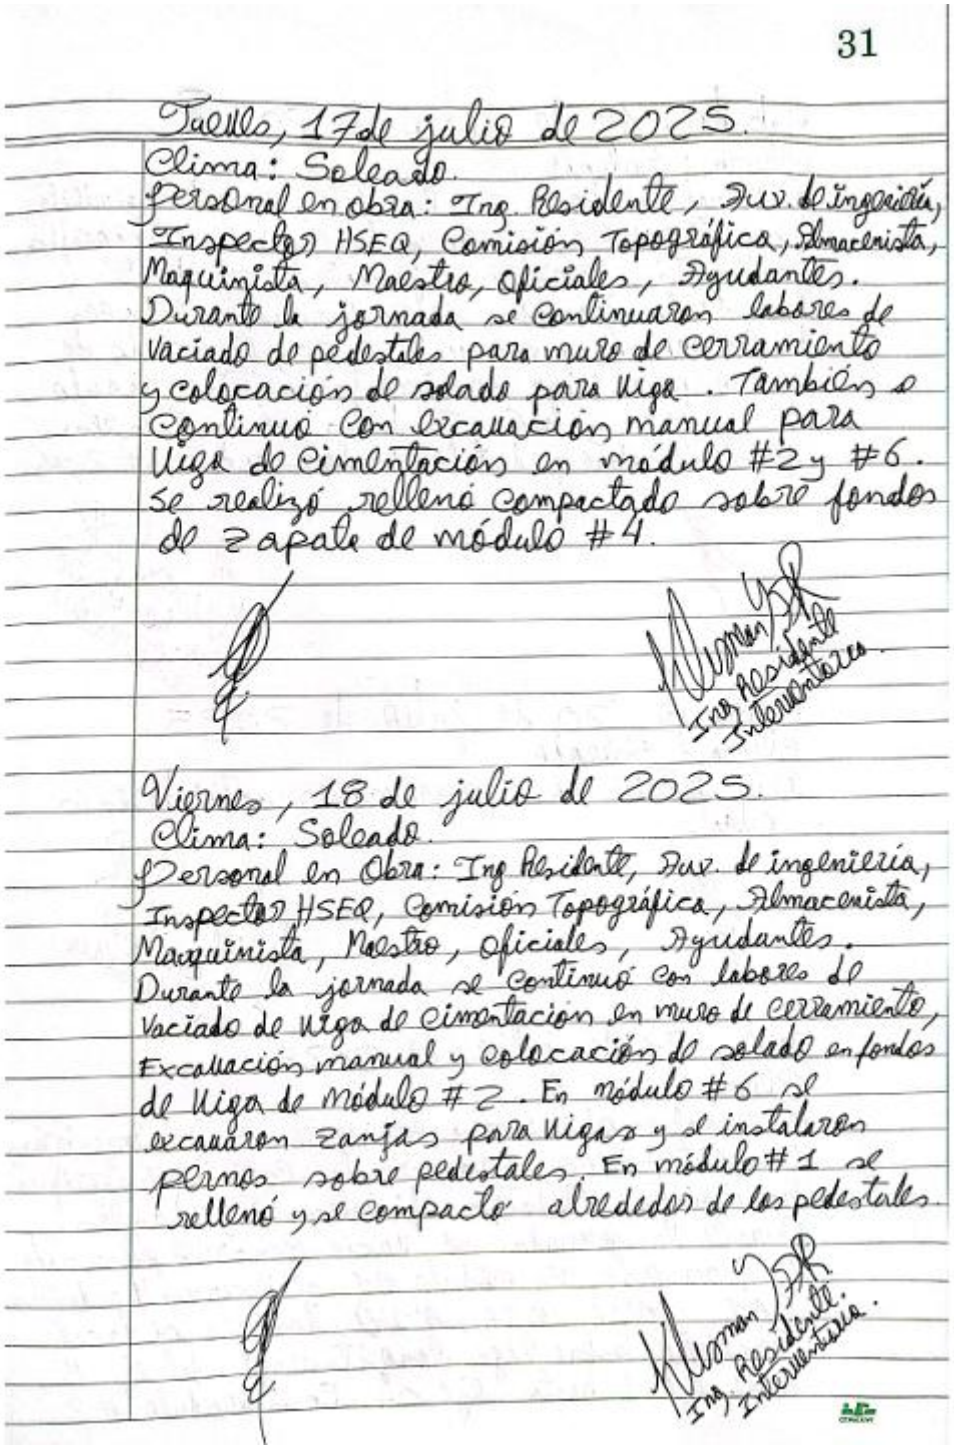

31

Tuellos, 17 de julio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Comisión Topográfica, Almacenista, Maquinista, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron labores de vaciado de pedestales para muro de cerramiento y colocación de solado para viga. También se continuó con excavación manual para viga de cimentación en módulo #2 y #6. Se realizó relleno compactado sobre fondos de zapata de módulo #4.


Ing. Residente Interventoría.

Viernes, 18 de julio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: Ing Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Comisión Topográfica, Almacenista, Maquinista, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuó con labores de Vaciado de viga de cimentación en muro de cerramiento, Excavación manual y colocación de solado en fondos de viga de módulo #2. En módulo #6 se excavaron zanjas para vigas y se instalaron pernos sobre pedestales. En módulo #1 se rellenó y se compactó alrededor de los pedestales.

Ing. Residente Interventoría.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

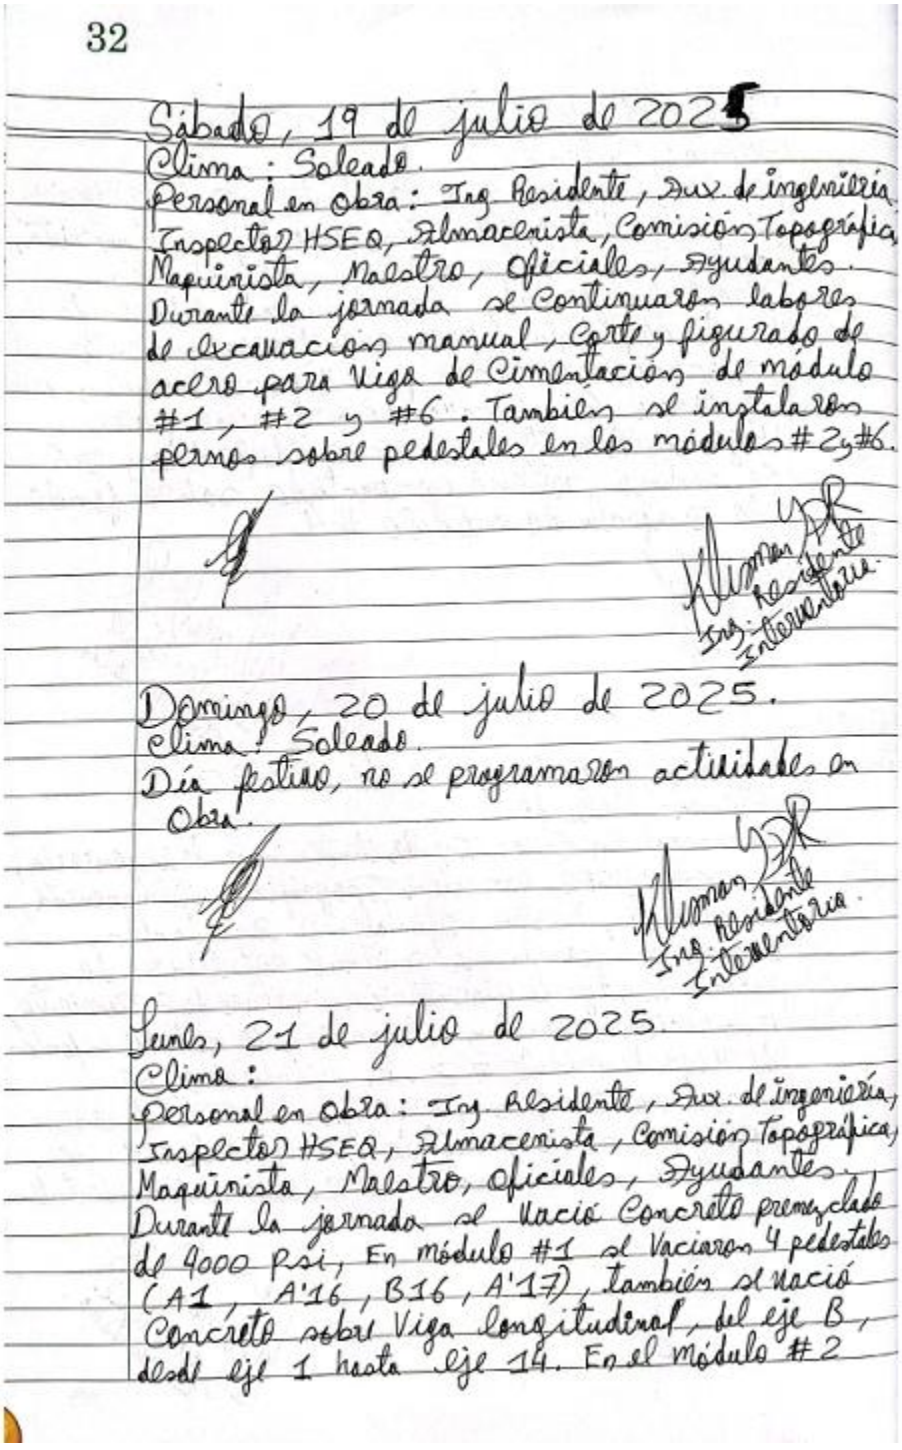

32

Sábado, 19 de julio de 2025
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinista, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron labores de excavación manual, corte y figurado de acero para viga de cimentación de módulo #1, #2 y #6. También se instalaron pernos sobre pedestales en los módulos #2 y #6.

Ing. Residente Interventoría


Domingo, 20 de julio de 2025.
Clima: Soleado.
Día festivo, no se programaron actividades en Obra.

Ing. Residente Interventoría

Lunes, 21 de julio de 2025.
Clima:
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinista, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se vació Concreto premezclado de 4000 Psi, En módulo #1 se Vaciaron 4 pedestales (A1, A'16, B16, A'17), también se vació Concreto sobre Viga longitudinal, del eje B, desde eje 1 hasta eje 14. En el módulo #2

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

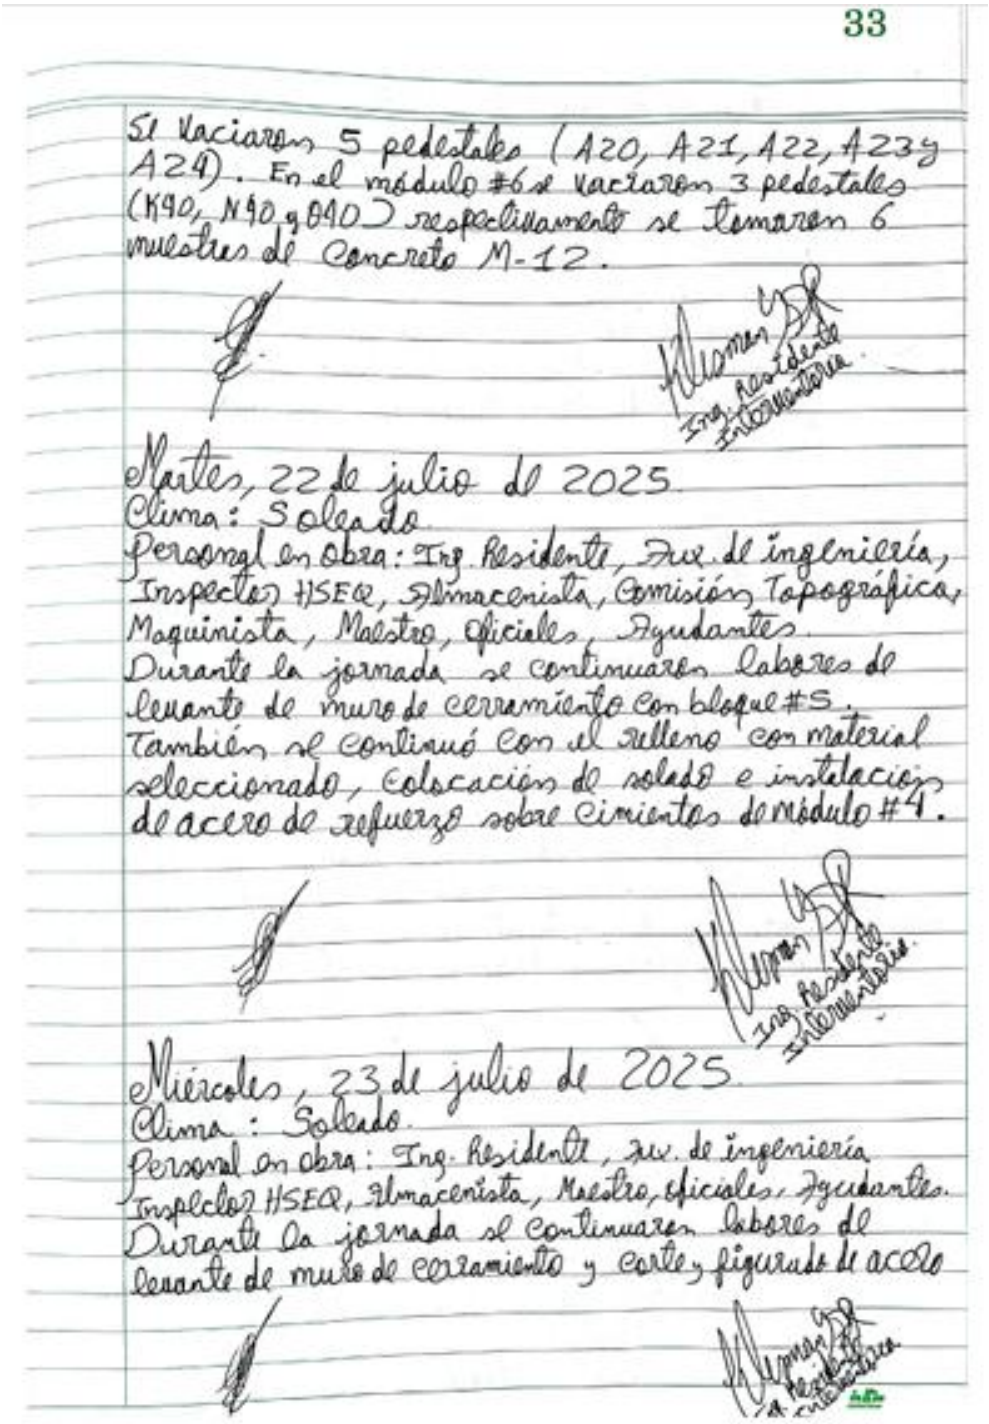

33

Se Vaciaron 5 pedestales (A20, A21, A22, A23 y A24). En el módulo #6 se vaciaron 3 pedestales (K90, N90 y O90) respectivamente se tomaron 6 muestras de Concreto M-12.

Ing. Residente Interventoría

Martes, 22 de julio de 2025
Clima: Soleado
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinista, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron labores de levante de muro de cerramiento con bloque #5. También se continuó con el relleno con material seleccionado, colocación de solado e instalación de acero de refuerzo sobre cimientos de módulo #4.


Ing. Residente Interventoría

Miércoles, 23 de julio de 2025
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería Inspector HSEQ, Almacenista, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron labores de levante de muro de cerramiento y corte y figurado de acero

Ing. Residente Interventoría

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

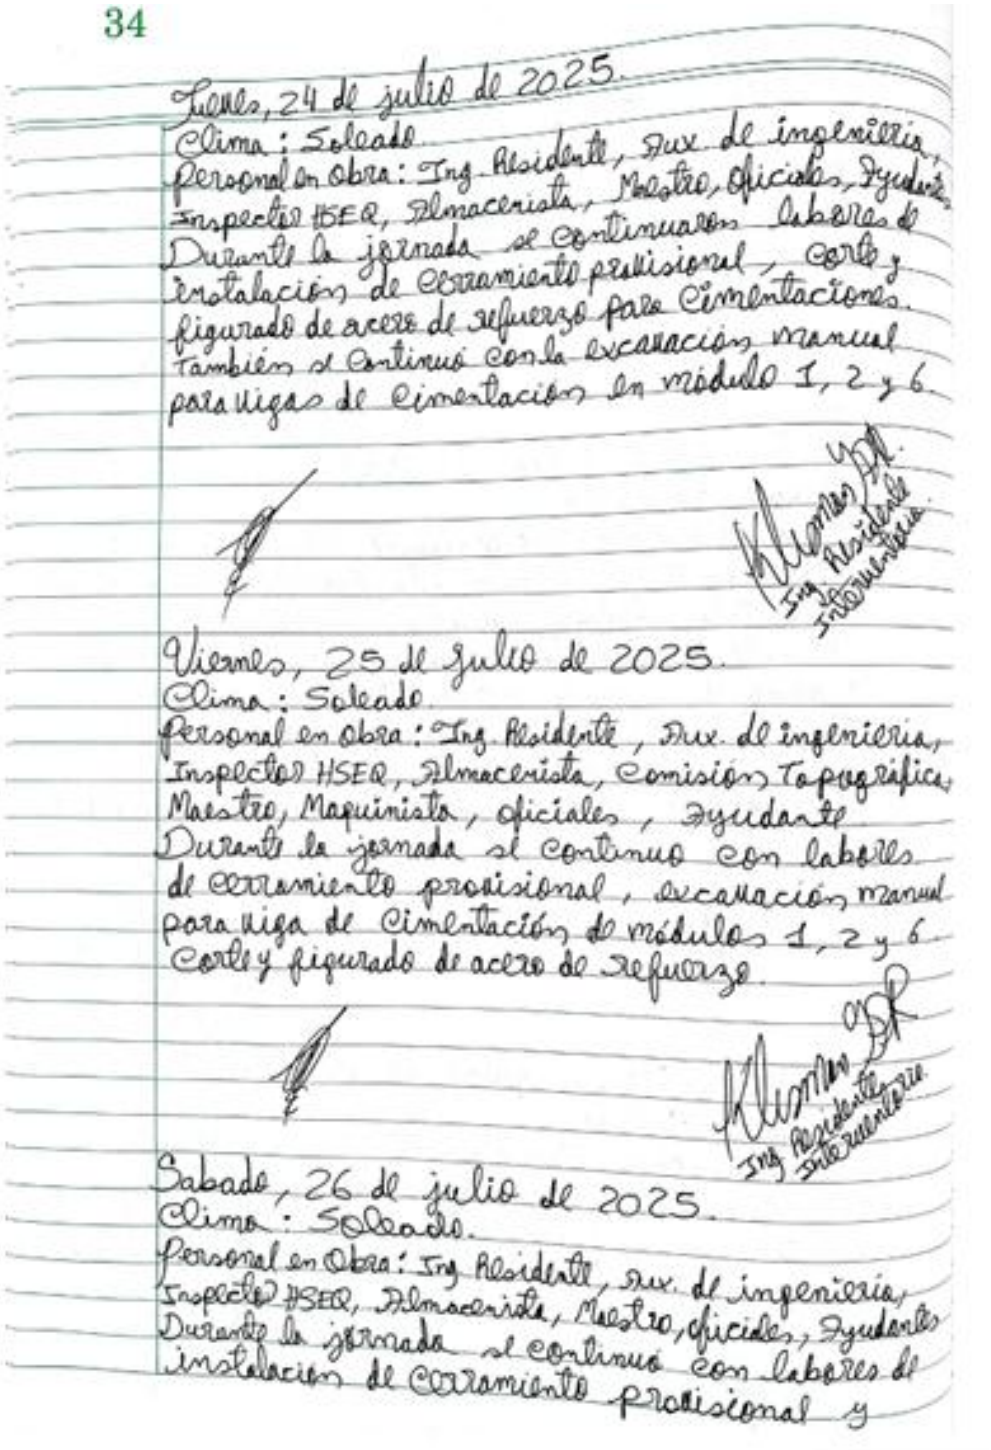

34

Lunes, 24 de julio de 2025.
Clima: Soleado
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Maestro, Oficiales, Ayudante.
Durante la jornada se continuaron labores de instalación de cerramiento provisional, corte y figurado de acero de refuerzo para cimentaciones. También se continuó con la excavación manual para vigas de cimentación en módulo 1, 2 y 6.

Ing. Residente Interventoría


Viernes, 25 de julio de 2025.
Clima: Soleado
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maestro, Maquinista, oficiales, Ayudante.
Durante la jornada se continuo con labores de cerramiento provisional, excavación manual para viga de cimentación de módulos 1, 2 y 6. Corte y figurado de acero de refuerzo.

Ing. Residente Interventoría

Sabado, 26 de julio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Maestro, Oficiales, Ayudantes
Durante la jornada se continuó con labores de instalación de cerramiento provisional y

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

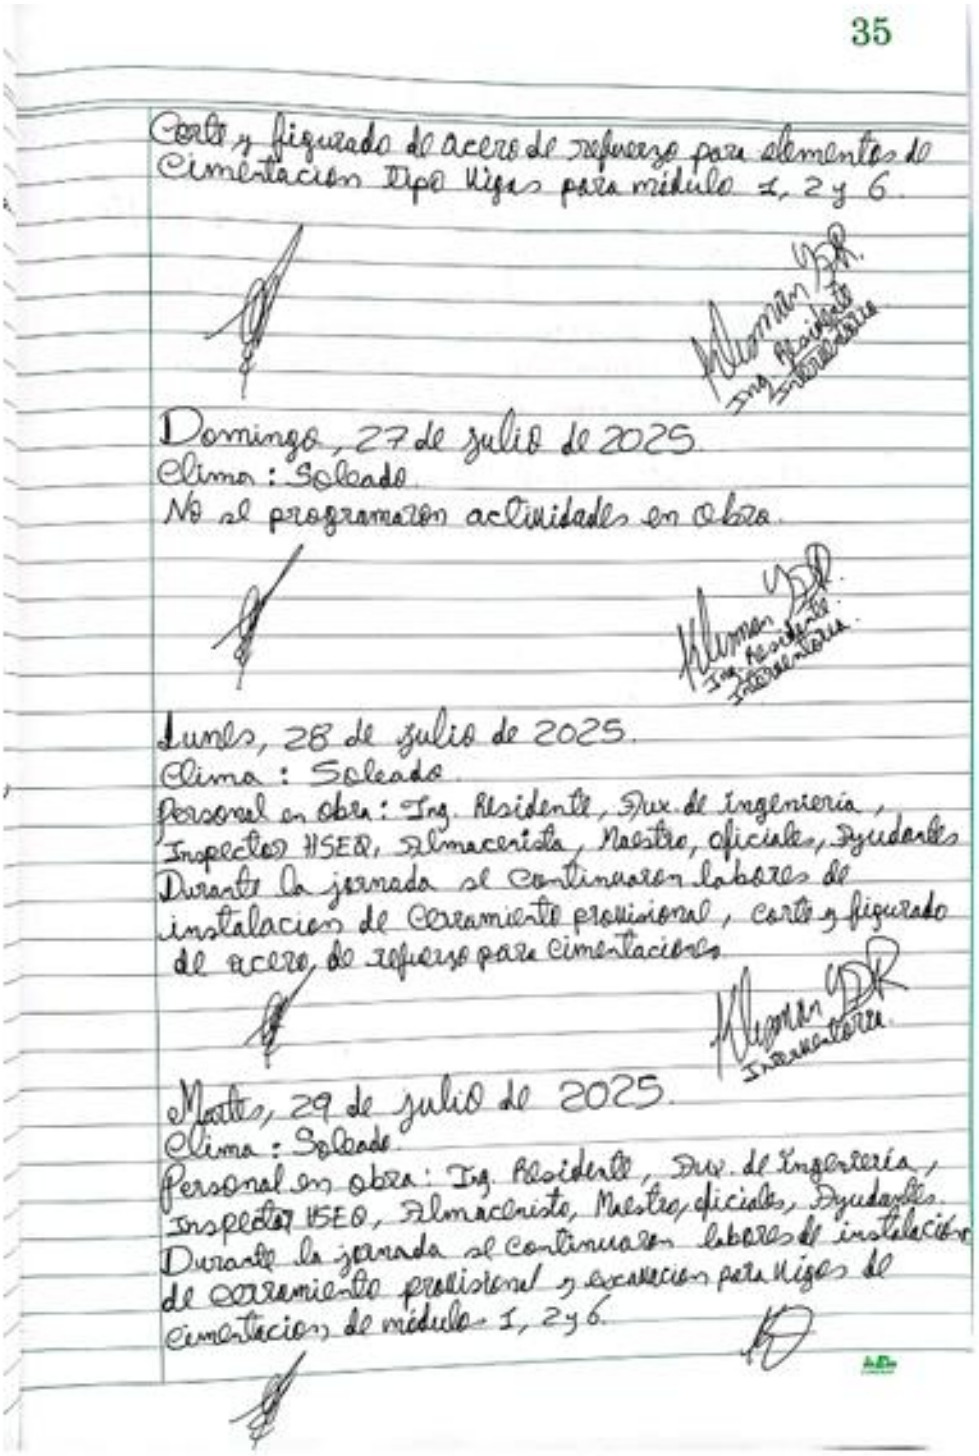

35

Corte y figurado de acero de refuerzo para elementos de cimentacion tipo Vigas para modulo 1, 2 y 6.


Domingo, 27 de julio de 2025.
Clima: Soleado.
No se programaron actividades en obra.

Lunes, 28 de julio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de Ingenieria, Inspector HSEQ, Almacenista, Maestro, oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron labores de instalacion de cerramiento provisional, corte y figurado de acero de refuerzo para cimentaciones.

Martes, 29 de julio de 2025.
Clima: Soleado
Personal en obra: Ing. Residente, Aux. de Ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Maestro, oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron labores de instalacion de cerramiento provisional y excavacion para vigas de cimentacion de modulos 1, 2 y 6.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

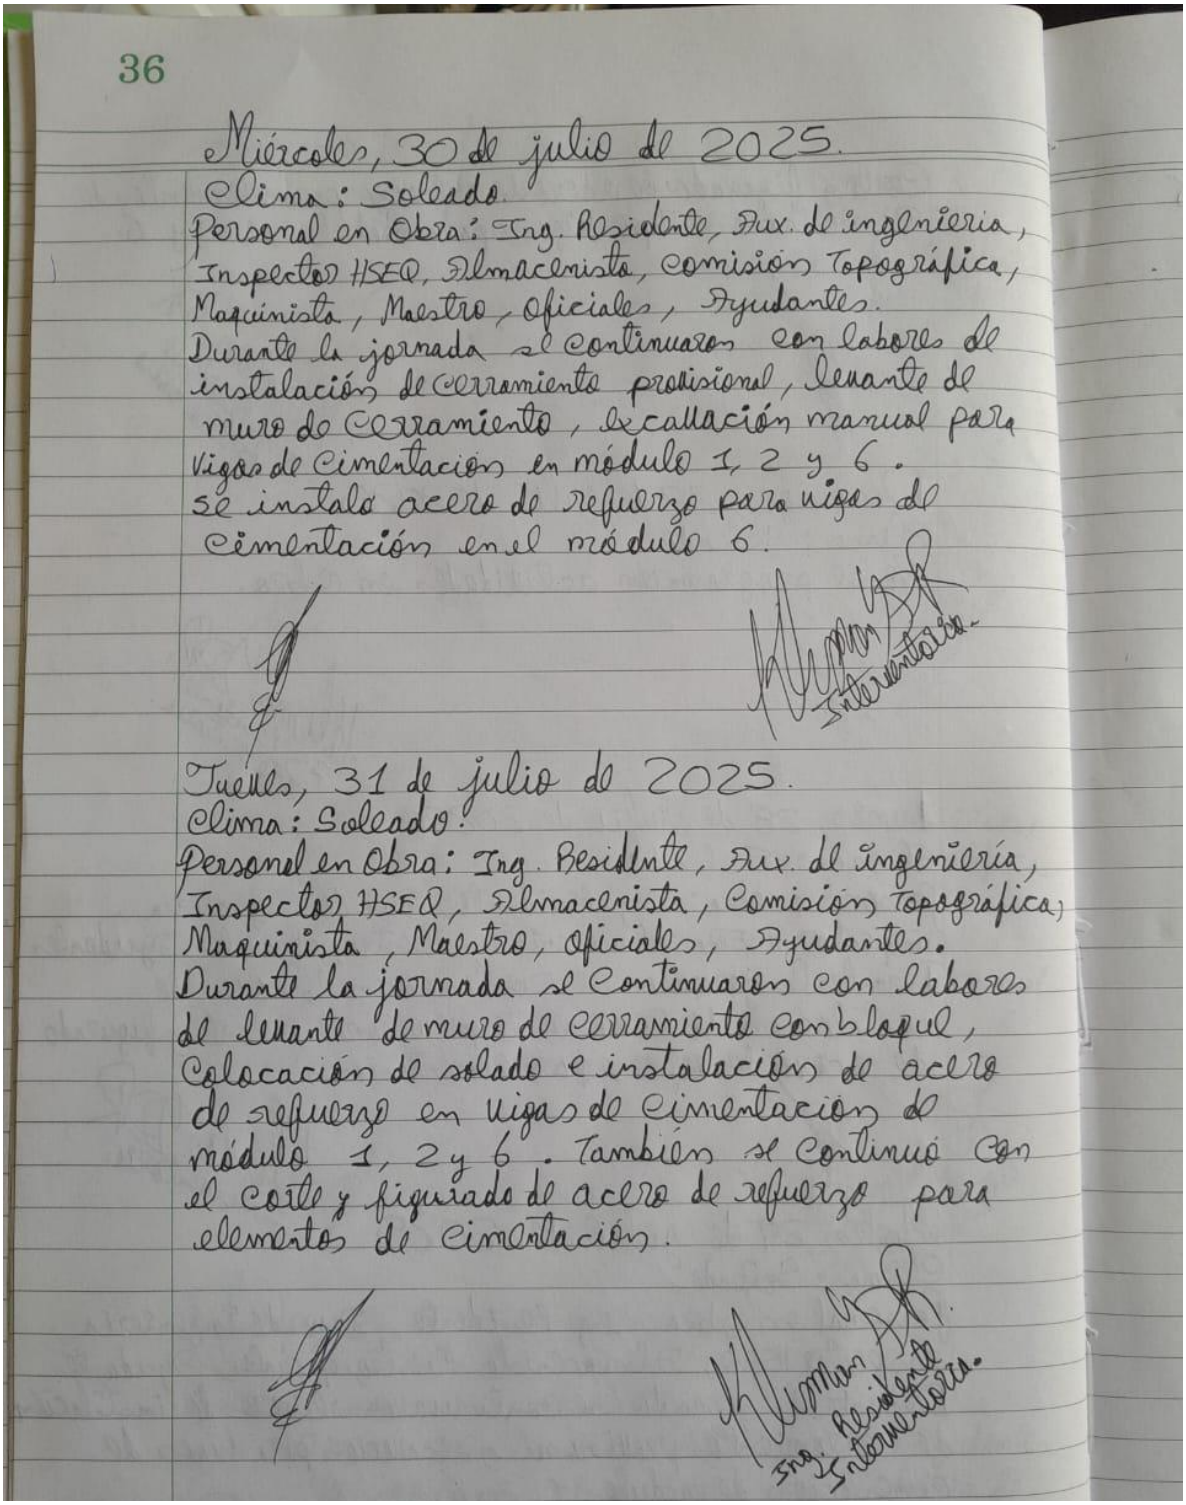

36

Miércoles, 30 de julio de 2025.
Clima: Soleado
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, comisión Topográfica, Maquinista, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron con labores de instalación de cerramiento provisional, levante de muro de cerramiento, excavación manual para vigas de cimentación en módulo 1, 2 y 6.
Se instala acero de refuerzo para vigas de cimentación en el módulo 6.

Ing. Residente Interventoría.

Jueves, 31 de julio de 2025.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: Ing. Residente, Aux. de ingeniería, Inspector HSEQ, Almacenista, Comisión Topográfica, Maquinista, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Durante la jornada se continuaron con labores de levante de muro de cerramiento con bloque, Colocación de solado e instalación de acero de refuerzo en vigas de cimentación de módulo 1, 2 y 6. También se continuó con el corte y figurado de acero de refuerzo para elementos de cimentación.

Ing. Residente Interventoría.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

10. ANEXO 1. INFORME SST.

IIIFORME MEIISUAL SST I Io. 003 JULIO

COIISORCIO TRAIISFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

1. OBJETIVO

1.1. OBJETIVO GENERAL

Consolidar y presentar los registros de supervisión, seguimiento y verificación del cumplimiento de los compromisos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo (SST) por parte del contratista CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA, en el marco del Contrato No. 3222 de 2024, para el periodo finalizado el 31 de diciembre de 2024.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Describir las actividades SST que se desarrollen durante el periodo evaluado.
- Generar registros que evidencien el cumplimiento de las actividades SST por parte del contratista y el seguimiento por parte de la interventoría.
- Verificar y asegurar el cumplimiento en su totalidad de las actividades SST, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, leyes, decretos, resoluciones, normas de seguridad y salud en el trabajo vigente para el contrato.
- Propender porque durante el desarrollo del contrato se implementes las medidas de SST por parte del contratista.
- Exigir y cumplir los lineamientos en materia ambiental que establece la CSB.
- Verificar el cumplimiento en los soportes de pago de seguridad social y nómina del personal de los contratistas.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

2. CONTRATO DE OBRA

2.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

En la tabla 1, se incluye la información general del contrato de interventoría

OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
PLAZO	CATORCE (14) MESES, Contados a partir del Acta de Inicio.
VALOR	MIL DOCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($1.204.724.965,00)
INTERVENTOR	CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR – NIT 901.928.289
INTEGRANTES	JET INGENIERIA S.A.S., CONSULTORES DE INGENIERIA UG21SL SUCURSAL EN COLOMBIA S.A.S.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

3. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1. ASPECTOS BASICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1.1. Proceso de planificación y liderazgo de la alta dirección

El CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR diseñó y estructuró el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente para el contrato de Interventoría No. 836 de marzo de 2025, con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de trabajo y preservar un estado de salud, bienestar físico, mental y social de los trabajadores, la prevención de accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

La interventoría, en su función de seguimiento a la aplicación del SGSST de los contratistas de obra CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA, Contrato No. 3222 de 2024, durante el periodo comprendido el 31 de diciembre 2024. Realizó la verificación de su implementación, a través de las medidas de seguridad establecidas para el control de los factores de riesgo presente en la ejecución del contrato de obra en el periodo del presente informe.

3.1.2. Contratación de personal

En este periodo el consorcio interventor verificó previo al ingreso del personal los soportes de afiliación del personal, los soportes de afiliación a la seguridad social, como se evidencia en el anexo 1.

Tabla 3. Personal activo Transformar Educativo Bolívar - Interventoría, julio de 2025.

Nombres y Apellidos	Cargo
Karla Duran Varela	*Ingeniero HSEQ*
Leonardo Cano Vides	*Ingeniero Residente*
Pierre Paniza Reyes	*Auxiliar HSEQ*
Will Torres Castro	*Director*
Natalia Cerda	*Trabajadora Social*

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

IIFORME MEIISUAL SST I Io. 003 JULIO COIISORCIO TRAIISFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

Tabla 4. Personal activo del Consorcio Villanueva, julio de 2025.

Nombres y Apellidos	Cargo
Adrián Ortega	*Ingeniero Residente*
Guillermo Manrique Herrera	*Ingeniero Auxiliar*
Susana Montes Pineda	*Auxiliar HSEQ*
Rafael Vivanco Cano	*Auxiliar Logístico*
Roberto Junco Rodríguez	*Vigilante*
Luis Junco Ayala	*Vigilante*
Luis Ortiz Velasco	*Oficios Varios*
José Pedroza Cera	*Vigilante*
Rafael Altamiranda González	*Director de Obra*
Derlis Jiménez Blanco	*Almacenista*

Tabla 5. Personal activo Contratistas, julio de 2025.

Nombres y Apellidos	Cargo
Luis Flecha Dix	*Conductor*
Eduardo Mena Martínez	*Topógrafo*
Holman Salas Orozco	*Operador Minicargador*
Daniel Altamar	*Conductor*
Carlos Orozco Zúñiga	*Ayudante*
Wilson Cuadro Gelvez	*Ayudante*
Mauricio Quintero Velasco	*Ayudante*
Manuel Cera Veleño	*Ayudante*
Pablo Sabalza Herrera	*Ayudante*
Oscar Torres Geliz	*Ayudante*
Jhonny Tapia Muñoz	*Ayudante*
Rafael Altamira Goenaga	*Ayudante*
Gustavo Almeida Parra	*Ayudante*
Cosme Parra Pérez	*Ayudante*
Deivis Ríos Llamas	*Ayudante*
Jesús Palacio Melgarejo	*Ayudante*
Luis Villareal Zúñiga	*Ayudante*
Marlon Reales Pérez	*Ayudante*
Jorge Polo Ligardo	*Ayudante*
Jaider Polo Liñan	*Ayudante*
Neuro Fernández Chacin	*Ayudante*
Oscar Zúñiga Cabarcas	*Ayudante*
José Fuente Otero	*Ayudante*
Luis Pertuz Cantillo	*Ayudante*

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

3.2. EJECUCION Y SEGUIMIENTO EN LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN MATERIA DE SST

3.2.1. Exámenes médicos

En verificación documental se evidenció que realizaron los exámenes médicos ocupacionales de ingreso a todo su personal. Ver anexos.

3.2.2. Ausentismo laboral

El consorcio educativo Villanueva, para el periodo del presente informe, tiene una tasa de ausentismo de 0%, debido a que no se presentó perdida de días por accidentes o enfermedades laborales, ni comunes.

EMPRESAS	DIAS PERDIDOS
CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA	0
COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURAS S.A.S.	0
CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0

3.2.3. Inducción del personal

Se evidenció que el personal contratado, realizó la inducción en materia de SST y ambiental a todo el personal que se vinculó al proyecto, dando así, las pautas de actos y condiciones seguras para llevar a cabo en la ejecución de sus tareas rutinarias, y el cumplimiento de protocolos y políticas establecidos por el consorcio ejecutor del proyecto.

3.2.4. Procedimiento de trabajo seguro

La interventoría llevó a cabo un seguimiento exhaustivo de los procedimientos de seguridad en las actividades desarrolladas durante el periodo.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

Corte y amarre de canastas para pedestales

Se ejecutó el corte de varillas de acero de refuerzo conforme a los planos estructurales, seguido del armado (amarre) de las canastas de refuerzo destinadas a los pedestales. El proceso se realizó garantizando el cumplimiento de las especificaciones de recubrimiento y las dimensiones establecidas en el diseño.

Excavación con máquina tipo "pajarita" y acopio de material

Se ejecutaron excavaciones mecánicas utilizando minicargador tipo "pajarita" para la apertura de fundaciones. El material excavado fue acopiado ordenadamente en las zonas designadas, garantizando la limpieza y organización del área de trabajo.

Cerramiento del área perimetral

Se avanzó en la ejecución del cerramiento del perímetro de la obra mediante muro en bloque y/o instalación de malla, con el objetivo de controlar el acceso y brindar seguridad al entorno del proyecto.

Excavaciones manuales para nivelación de zapatas

Se efectuaron ajustes manuales en las excavaciones existentes para asegurar que las zapatas queden a la cota establecida en planos, con base nivelada y lista para fundición.

Preparación de mezcla para solado de zapata

Se elaboró y colocó mezcla de concreto simple como solado o capa base de las zapatas, facilitando una superficie limpia, nivelada y adecuada para el posterior montaje del acero de refuerzo.

Compactación con zahorra en zapatas

Se suministró y compactó material granular tipo zahorra en el fondo de las excavaciones para zapatas, garantizando una base estable y con capacidad portante adecuada para la fundación.

Localización y trazado topográfico

Se realizaron actividades de replanteo y trazado con estación total y nivel para ubicar con precisión zapatas, ejes y estructuras, conforme a los planos del proyecto.

Encofrado de zapata y pedestales en excavaciones

Instalación de formaletas en madera o metálicas dentro de las excavaciones para moldear el concreto de zapatas y pedestales, asegurando dimensiones, alineación y verticalidad.

Instalación de hierro para columnas del área perimetral

Se posicionaron y amarraron las armaduras de acero para columnas ubicadas en el cerramiento perimetral de la obra, con separación y anclaje adecuado.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

IIFORME MEIISUAL SST I Io. 003 JULIO COIISORCIO TRAIISFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

Solado

Se llevó a cabo la actividad de solado, consistente en la colocación de una capa delgada de concreto en el fondo de las excavaciones destinadas a zapatas, losas de cimentación u otros elementos estructurales. Esta capa cumple una doble función: nivelar el terreno y proteger la armadura (refuerzo de acero) contra la corrosión y otros agentes agresivos presentes en el suelo.

La labor se ejecutó cumpliendo con todos los parámetros y condiciones de seguridad establecidos. Entre las medidas implementadas se destacan:

Corte y figurado de acero





Armado





Instalación de pernos





CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

Excavación, solado y fundición de viga de cimentación









Fundida de pedestales y zapatas







CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

IIFORME MEIISUAL SST I Io. 003 JULIO COIISORCIO TRAIISFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

Fundida de viga de cimentación y excavación de pedestales de muro de cerramiento





Retiro y traslado de material





CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONTROLES DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL MES DE JUNIO

Señalización en áreas críticas

Se implementaron medidas de señalización preventiva en zonas de riesgo, mediante la instalación de cinta de advertencia tipo "peligro" alrededor de las perforaciones generadas por actividades de excavación y las zonas de acopio de materia. Adicionalmente, se colocaron avisos visuales de advertencia orientados tanto a personal operativo como visitantes, con el propósito de mitigar el riesgo de accidentes por caídas a nivel o a diferente nivel, conforme a los lineamientos del plan de seguridad y salud en el trabajo.





Instalación de protocolo de emergencia

Se evidenció la implementación de señalización para respuesta rápida ante situaciones de emergencia.

Las señalizaciones instaladas incluyen:

- *Ruta de evacuación:* Se identificaron e instalaron señales visibles que indican el recorrido seguro hacia las salidas de emergencia, garantizando su accesibilidad y libre tránsito durante una evacuación.





CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

IIFORME MEIISUAL SST I Io. 003 JULIO COIISORCIO TRAIISFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

- *Punto de encuentro:* Se demarcó un área segura para la concentración del personal en caso de emergencia, debidamente señalizada y ubicada lejos de posibles riesgos inmediatos.



- *Botiquín de primeros auxilios:* Ubicado en un lugar visible y de fácil acceso, con señalización estandarizada. Su contenido es inspeccionado periódicamente conforme al protocolo de emergencias.





- *Extintores: Se señalizó la ubicación de los extintores portátiles mediante símbolos normalizados, asegurando que estén libres de obstáculos y en condiciones operativas.*



CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

- *Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (EPP):* En los puntos de ingreso y en frentes de trabajo activos se colocaron avisos que indican el uso obligatorio de EPP como casco, botas, chaleco reflectivo, guantes y gafas, promoviendo la cultura de autocuidado y la prevención de accidentes.



CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.2.5. Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

Como parte de la gestión preventiva en el proyecto, se evidenció que se estan llevando a cabo la ejecución de ATS Análisis de Trabajo Seguro (ATS) correspondientes a las diferentes actividades ejecutadas en obra durante el mes. Estos análisis permiten identificar los peligros asociados a cada tarea, evaluar los riesgos y definir las medidas de control necesarias para su mitigación.

Cada ATS fue elaborado previamente al inicio de la actividad y socializado con el personal operativo, garantizando que todos los trabajadores comprendieran los riesgos inherentes a su labor, así como los procedimientos seguros que debían aplicar. Esta socialización incluyó:

- Descripción de la tarea.
- Identificación de peligros.
- Medidas de prevención y control.
- Revisión del uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP).

3.2.6. Verificación controles Preoperacional de Maquinaria y Equipos

Durante el desarrollo de las actividades del mes, se verificó que se llevaron a cabo controles preoperacionales en maquinaria amarilla y los equipos utilizados en obra, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento, prevenir fallas mecánicas y evitar accidentes laborales asociados a su uso.

Estas inspecciones preoperacionales se llevaron a cabo diariamente antes del inicio de la jornada.

3.2.7. Formación, sensibilización y charlas de Seguridad

Como parte del fortalecimiento de la cultura organizacional en prevención de accidentes e incidentes, se llevó a cabo el fortalecimiento del conocimiento en materia de sst, actividades tales como; charlas, sensibilizaciones y capacitaciones dirigidas al personal operativo y administrativo en obra.





CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

Estas actividades tuvieron como objeto, sensibilizar y capacitar a los trabajadores en temas clave para la prevención de riesgos laborales, reforzar el cumplimiento de las normas de seguridad, y promover el autocuidado.

3.2.8. Pausas Activas

Se evidenció el seguimiento a la prevención de enfermedades osteomusculares, a través de la implementación de jornadas diarias en pausas activas.

Estas pausas se realizaron en jornadas de la tarde, con una duración promedio de 5 a 10 minutos, y estuvieron orientadas por el área HSEQ o personal designado. Las actividades incluyeron:

- Estiramientos musculares dirigidos a cuello, espalda, hombros, brazos y piernas.
- Movilidad articular y ejercicios de respiración.
- Breves mensajes de autocuidado, hidratación y ergonomía.

El desarrollo de estas pausas activas contribuyó a:

- Disminuir la fatiga laboral.
- Prevenir lesiones por esfuerzos repetitivos.
- Fortalecer el clima laboral y la motivación del equipo.





3.2.9. Inspecciones de Botiquín y Extintores

Se realizaron **inspecciones periódicas al botiquín de primeros auxilios y a los extintores instalados en el área de obra**, como parte de las acciones de control establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

3.2.10. Dotación de elementos de protección personal EPP

La interventoría constató que todos los contratistas aseguraron la entrega y socialización de los dispositivos de seguridad, así como su almacenamiento y uso permanente en el desarrollo de sus actividades en obra.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

4. ASPECTO AMBIENTAL

4.1. Punto de recolección y clasificación de residuos

La implementación de un punto ecológico en la obra es un paso importante hacia la gestión sostenible de residuos. Este punto ecológico permite la recolección y clasificación adecuada de residuos orgánicos e inorgánicos, lo que facilita su posterior tratamiento y disposición final. Esta implementación de prácticas de gestión de residuos sostenibles contribuye a minimizar el impacto ambiental de la obra y promover una cultura responsable ambiental entre los trabajadores y la comunidad.

El punto ecológico se encuentra debidamente señalizado y consta de recipientes diferenciados por colores, conforme al código de colores establecido en la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:

- **Verde**: Residuos orgánicos aprovechables.
- **Blanco:** Residuos aprovechables (plástico, papel, cartón, metales, vidrio).
- **Negro**: Residuos no aprovechables.



4.2. Rotulado de productos químicos y hoja de seguridad

Durante el mes de junio se realizó la verificación del cumplimiento de las medidas de **rotulado y manejo seguro de productos químicos** utilizados en el proyecto, conforme a lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), adoptado en Colombia a través del Decreto 1496 de 2018.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

IIFORME MEIISUAL SST I Io. 003 JULIO COIISORCIO TRAIISFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR

Se evidenció que todos los productos químicos presentes en obra (pegantes, pinturas, desmoldantes, combustibles, entre otros) cuentan con rótulos visibles y legibles, que indican el nombre del producto, pictogramas de peligro, advertencias de seguridad, instrucciones de manejo y recomendaciones de almacenamiento.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

ANEXOS

1. Inducción SST
2. Inspecciones SST
3. Análisis seguro de trabajo ATS
4. Inspecciones Preoperacionales vehículos
5. Inspecciones Preoperacionales maquinaria
6. Inspecciones Herramientas menores
7. Formación, capacitaciones y charlas

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-GH-002
	VERSIÓN: 01
	FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN	X	CHARLA DE 5 MINUTOS		REUNIÓN		FECHA: 8/07/2025
HORA DE INICIO: 8:00Am		HORA FINAL: 10:00Am		NOMBRE DEL INSTRUCTOR		
LUGAR: Villanueva-Bolivar obra colegio				Tommy Espitia		
TEMA: Inducción				FIRMA DEL INSTRUCTOR		
				Tommy Espitia		

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Luis Enrique ortiz velasco	1002476840	Luis ortiz velasco.
2	FELIX MURIEL	1002475597	FELIX
3	Willy Berrocal	1002476143	Willy
4	Jaider polo	1002475886	Jaider polo
5	Jorge polo	.66 32964	Jorge polo
6	GUSTAVO ALMEIDA	9.202 313	GUSTAVO
7	MARLON REALES	7960544	MARLON
8	NELSON ANTONIO	16427536	FERNANDEZ
9	oscar Torres	1.032 43.541	
10	Luis Fernando	5765059	
11	Johan TAPIA	1.052738161	LUIS
12	[illegible]	7383732	Tommy
13	Edwin CASTRO P	7959 815	Edwin
14	Ines Maria Segura C.	1091416847	Ines Maria
15	Luis Villamizar	92023/4	Luis
16	Dersis Jiménez	10497853	Dersis Jiménez
17	Adrian Ortega	1143385964	
18			
19			
20			
21			
22			
23			

Scanned with OKEN Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN	CODIGO: FOR-SST-01
	VERSIÓN: 01
	FECHA: 20/01/2025

NOMBRE: MARION BARLES — CARGO: oficial
C.C: 7960500 — FECHA: 08/07/25

1. POLÍTICAS: Seleccione con una X si es falso (F) o verdadero (V)

a) Las políticas buscan la mejora continua de la salud y seguridad. (F) o (V)
b) Garantizan condiciones de trabajo sanas y seguras que ayuden a prevenir accidentes y enfermedades (F) o (V)
c) La organización otorga herramientas para la consulta y participación de los trabajadores(F) o (V)
d) La empresa busca trabajar de un modo respetuoso con el medio ambiente (F) (V)
e) Esta prohibido el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo por parte de los empleados y contratistas, durante las horas de trabajo (F) o (V)
f) Esta permitido presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol y las drogas (F) (V)

2. SEÑALE CON UNA X LOS ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS



3. REPORTE DE ACCIDENTES

3.1. Que debe hacer en caso de un accidente:
a) Reportar a su jefe inmediato ✓
b) Reportar a la ARL
c) Hacer de cuenta que nada ocurrio. ✗
d) Ninguna de las anteriores

4. SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBERIA UTILIZAR AL REALIZAR SU LABOR



5. SELECCIONE CON UNA X QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

a) Mantener la calma y seguir las instrucciones de la brigada ✓
b) Salir corriendo
c) Seguir las instrucciones de la brigada e irnos para la casa
d) Salir con cuidado y NO regresar por ningún motivo. ✓

6. MENCIONE ALGUNOS RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO

Riesgos (Físico)
Físico

7. UNIR CON UNA FLECHA LOS TERMINOS RELACIONADOS

AFP	Entidad Promotora de Salud
ARL ✗	Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo ✗
EPS ✓	Administradora del fondo de pensiones
COPASST	Administradora del Riesgos Laborales

8. UNE CON UNA FLECHA COMO SE DEBEN DE CLASIFICAR LOS RESIDUOS.

Papel, cartón,residuos plásticos (vasos desechables, cartón liso y corrugado, papel archivo, periódico) → BLANCA
Residuos orgánicos (Residuos de comida, cáscaras) → VERDE
Residuos ordinarios (servilletas, barrido, icopor) →

9.La empresa en su mision tiene como proposito:

a)promover y fomentar oportunidades para el crecimiento local, regional y nacional, a través del trabajo conjunto con las empresas nacionales
b)garantizar soluciones y un óptimo servicio a nuestros clientes antes, durante y después finalizado el proyecto
c) mantener un equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente
d)Todas las anteriores

10. Marcar quoprincipios hacen parte del consorcio edificaciones JH.

1. Terminar el proyecto por encima de la seguridad de los trabajadores y por encima del medio ambiente
2. Degradar, falta de compromiso, retrasos constantes
3. Compromiso con el cliente, calidad, seguridad, sostenibilidad, entre otras ✓
4. Incumplimiento de normas, falta de medidas de seguridad, perdida de credibilidad

Certifico que conozco y he sido informado desde el inicio de mi labor sobre el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad industrial , programas de gestión de riesgos, Politica Integral de Gestión y Politica de No Alcohol, Drogas y Tabaco.

Declaro que he recibido la inducción para trabajar , conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas.

Para calcular la calificación final en una evaluación de 10 preguntas con una calificación máxima de 5.0, cada pregunta tendria un valor de 0.5 puntos (5/10).

FIRMA DEL TRABAJADOR
MARION BARLES

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN	CODIGO: FOR-SST-01
	VERSIÓN: 01
	FECHA: 20/01/2025

NOMBRE: Nelvo Antonio Fernandez CARGO: ayudante
C.C: 16427536 FECHA: 08/07/25

1. POLÍTICAS: Seleccione con una X si es falso (F) o verdadero (V)

a) Las políticas buscan la mejora continua de la salud y seguridad. (F) o (V)
b) Garantizan condiciones de trabajo sanas y seguras que ayuden a prevenir accidentes y enfermedades (F) o (V)
c) La organización otorga herramientas para la consulta y participación de los trabajadores(F) o (V)
d) La empresa busca trabajar de un modo respetuoso con el medio ambiente (F) o (V)
e) Esta prohibido el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo por parte de los empleados y contratistas, durante las horas de trabajo (F) o (V)
f) Esta permitido presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol y las drogas (F) o (V)

2. SEÑALE CON UNA X LOS ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS



3. REPORTE DE ACCIDENTES

3.1. Que debe hacer en caso de un accidente:
a) Reportar a su jefe inmediato. X
b) Reportar a la ARL
c) Hacer de cuenta que nada ocurrio.
d) Ninguna de las anteriores

4. SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBERIA UTILIZAR AL REALIZAR SU LABOR




5. SELECCIONE CON UNA X QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

a) Mantener la calma y seguir las instrucciones de la brigada X
b) Salir corriendo
c) Seguir las instrucciones de la brigada e irnos para la casa
d) Salir con cuidado y NO regresar por ningún motivo. X


6. MENCIONE ALGUNOS RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO

NELVO ANTONIO

7. UNIR CON UNA FLECHA LOS TERMINOS RELACIONADOS



8. UNE CON UNA FLECHA COMO SE DEBEN DE CLASIFICAR LOS RESIDUOS.



9.La empresa en su mision tiene como proposito:

a)promover y fomentar oportunidades para el crecimiento local, regional y nacional, a través del trabajo conjunto con las empresas nacionales
b)garantizar soluciones y un óptimo servicio a nuestros clientes antes, durante y después finalizado el proyecto
c) mantener un equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente
d)Todas las anteriores X

10. Marcar quoprincipios hacen parte del consorcio edificaciones JH.

1. Terminar el proyecto por encima de la seguridad de los trabajadores y por encima del medio ambiente
2. Degradar, falta de compromiso, retrasos constantes
3. Compromiso con el cliente, calidad, seguridad, sostenibilidad, entre otras X
4.Incumplimiento de normas, falta de medidas de seguridad, perdida de credibilidad

Certifico que conozco y he sido informado desde el inicio de mi labor sobre el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad industrial , programas de gestión de riesgos, Politica Integral de Gestión y Politica de No Alcohol, Drogas y Tabaco.

Declaro que he recibido la inducción para trabajar , conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas.

Para calcular la calificación final en una evaluación de 10 preguntas con una calificación máxima de 5.0, cada pregunta tendría un valor de 0.5 puntos (5/10).

FIRMA DEL TRABAJADOR

FERNANDEZ

Scanned with OKEN Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024


	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN	CODIGO: FOR-SST-01
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 20/01/2025

NOMBRE: Johan Y — CARGO: contratista
C.C: 73720732 — FECHA: 08/07/25

1. POLÍTICAS: Seleccione con una X si es falso (F) o verdadero (V)

a) Las políticas buscan la mejora continua de la salud y seguridad. (F) o (V) V
b) Garantizan condiciones de trabajo sanas y seguras que ayuden a prevenir accidentes y enfermedades (F) o (V) V
c) La organización otorga herramientas para la consulta y participación de los trabajadores(F) o (V) V
d) La empresa busca trabajar de un modo respetuoso con el medio ambiente (F) o (V) V
e) Esta prohibido el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo por parte de los empleados y contratistas, durante las horas de trabajo (F) o (V) V
f) Esta permitido presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol y las drogas (F) o (V) F


2. SEÑALE CON UNA X LOS ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS



3. REPORTE DE ACCIDENTES

3.1. Que debe hacer en caso de un accidente:
a) Reportar a su jefe inmediato.
b) Reportar a la ARL
c) Hacer de cuenta que nada ocurrio.
d) Ninguna de las anteriores

4. SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBERIA UTILIZAR AL REALIZAR SU LABOR



5. SELECCIONE CON UNA X QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

a) Mantener la calma y seguir las instrucciones de la brigada
b) Salir corriendo
c) Seguir las instrucciones de la brigada e irnos para la casa
d) Salir con cuidado y NO regresar por ningún motivo.

6. MENCIONE ALGUNOS RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO

Riesgo Químico, físico y Biológico

7. UNIR CON UNA FLECHA LOS TERMINOS RELACIONADOS

AFP	Entidad Promotora de Salud
ARL	Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
EPS	Administradora del fondo de pensiones
COPASST	Administradora del Riesgos Laborales

8. UNE CON UNA FLECHA COMO SE DEBEN DE CLASIFICAR LOS RESIDUOS.

Papel, cartón,residuos plásticos (vasos desechables, cartón liso y corrugado, papel archivo, periódico)	BLANCA
Residuos orgánicos (Residuos de comida, cáscaras)	VERDE
Residuos ordinarios (servilletas, barrido, icopor)	

9.La empresa en su mision tiene como proposito:

a)promover y fomentar oportunidades para el crecimiento local, regional y nacional, a través del trabajo conjunto con las empresas nacionales
b)garantizar soluciones y un óptimo servicio a nuestros clientes antes, durante y después finalizado el proyecto
c) mantener un equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente
d) Todas las anteriores

10. Marcar queprincipios hacen parte del consorcio edificaciones JH.

1. Terminar el proyecto por encima de la seguridad de los trabajadores y por encima del medio ambiente
2. Degradar, falta de compromiso, retrasos constantes
3. Compromiso con el cliente, calidad, seguridad, sostenibilidad, entre otras
4. Incumplimiento de normas, falta de medidas de seguridad, perdida de credibilidad

Certifico que conozco y he sido informado desde el inicio de mi labor sobre el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad industrial , programas de gestión de riesgos, Politica Integral de Gestión y Politica de No Alcohol, Drogas y Tabaco.

Declaro que he recibido la inducción para trabajar , conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas.

Para calcular la calificación final en una evaluación de 10 preguntas con una calificación máxima de 5.0, cada pregunta tendria un valor de 0.5 puntos (5/10).

FIRMA DEL TRABAJADOR

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN	CODIGO: FOR-SST-01
	VERSIÓN: 01
	FECHA: 20/01/2025

NOMBRE: Edwin C P — CARGO: Ayudante

C.C: 7959 815 — FECHA: 08/07/25

1. POLÍTICAS: Seleccione con una X si es falso (F) o verdadero (V)

a) Las políticas buscan la mejora continua de la salud y seguridad. (F) o (V)

b) Garantizan condiciones de trabajo sanas y seguras que ayuden a prevenir accidentes y enfermedades (F) o (V) V

c) La organización otorga herramientas para la consulta y participación de los trabajadores(F) o (V) V

d) La empresa busca trabajar de un modo respetuoso con el medio ambiente (F) o (V) V

e) Esta prohibido el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo por parte de los empleados y contratistas, durante las horas de trabajo (F) o (V) V

f) Esta permitido presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol y las drogas (F) o (V) F

2. SEÑALE CON UNA X LOS ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS



3. REPORTE DE ACCIDENTES

3.1. Que debe hacer en caso de un accidente:

a) Reportar a su jefe inmediato.

b) Reportar a la ARL

c) Hacer de cuenta que nada ocurrio.

d) Ninguna de las anteriores

4. SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBERIA UTILIZAR AL REALIZAR SU LABOR



5. SELECCIONE CON UNA X QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

a) Mantener la calma y seguir las instrucciones de la brigada

b) Salir corriendo

c) Seguir las instrucciones de la brigada e irnos para la casa

d) Salir con cuidado y NO regresar por ningún motivo.

6. MENCIONE ALGUNOS RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO

Riesgo Químico y Físico y Biologico

7. UNIR CON UNA FLECHA LOS TERMINOS RELACIONADOS

AFP	Entidad Promotora de Salud
ARL	Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
EPS	Administradora del fondo de pensiones
COPASST	Administradora del Riesgos Laborales

8. UNE CON UNA FLECHA COMO SE DEBEN DE CLASIFICAR LOS RESIDUOS.

Papel, cartón,residuos plásticos (vasos desechables, cartón liso y corrugado, papel archivo, periódico)	BLANCA
Residuos orgánicos (Residuos de comida, cáscaras)	VERDE
Residuos ordinarios (servilletas, barrido, icopor)	

9.La empresa en su mision tiene como proposito:

a)promover y fomentar oportunidades para el crecimiento local, regional y nacional, a través del trabajo conjunto con las empresas nacionales
b)garantizar soluciones y un óptimo servicio a nuestros clientes antes, durante y después finalizado el proyecto
c) mantener un equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente
d)Todas las anteriores

10. Marcar queprincipios hacen parte del consorcio edificaciones JH.

1. Terminar el proyecto por encima de la seguridad de los trabajadores y por encima del medio ambiente
2. Degradar, falta de compromiso, retrasos constantes
3. Compromiso con el cliente, calidad, seguridad, sostenibilidad, entre otras
4.Incumplimiento de normas, falta de medidas de seguridad, perdida de credibilidad

Certifico que conozco y he sido informado desde el inicio de mi labor sobre el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad industrial , programas de gestión de riesgos, Politica integral de Gestión y Politica de No Alcohol, Drogas y Tabaco.

Declaro que he recibido la inducción para trabajar , conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas.

Para calcular la calificación final en una evaluación de 10 preguntas con una calificación máxima de 5.0, cada pregunta tendría un valor de 0.5 puntos (5/10).

FIRMA DEL TRABAJADOR

Edwin Castro P

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN

VERSIÓN: 01

FECHA: 20/01/2025

NOMBRE: Jose Luis Acosta

CARGO: Oficial

C.C:

FECHA: 08/07/25

1. POLÍTICAS: Seleccione con una X si es falso (F) o verdadero (V)

a) Las políticas buscan la mejora continua de la salud y seguridad. (F) o (V)

b) Garantizan condiciones de trabajo sanas y seguras que ayuden a prevenir accidentes y enfermedades (F) o (V)


c) La organización otorga herramientas para la consulta y participación de los trabajadores(F) o (V)

d) La empresa busca trabajar de un modo respetuoso con el medio ambiente (F) o (V)

e) Esta prohibido el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo por parte de los empleados y contratistas, durante las horas de trabajo (F) o (V)

f) Esta permitido presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol y las drogas (F) o (V)

2. SEÑALE CON UNA X LOS ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS



3. REPORTE DE ACCIDENTES

3.1. Que debe hacer en caso de un accidente:

a) Reportar a su jefe inmediato.

b) Reportar a la ARL

c) Hacer de cuenta que nada ocurrio.

d) Ninguna de las anteriores

4. SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBERIA UTILIZAR AL REALIZAR SU LABOR



5. SELECCIONE CON UNA X QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

a) Mantener la calma y seguir las instrucciones de la brigada

b) Salir corriendo


c) Seguir las instrucciones de la brigada e irnos para la casa

d) Salir con cuidado y NO regresar por ningún motivo.


6. MENCIONE ALGUNOS RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO

Riesgo químico y Riesgo biológico

7. UNIR CON UNA FLECHA LOS TERMINOS RELACIONADOS



8. UNE CON UNA FLECHA COMO SE DEBEN DE CLASIFICAR LOS RESIDUOS.



9.La empresa en su mision tiene como proposito:

a)promover y fomentar oportunidades para el crecimiento local, regional y nacional, a través del trabajo conjunto con las empresas nacionales

b)garantizar soluciones y un óptimo servicio a nuestros clientes antes, durante y después finalizado el proyecto

c) mantener un equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente

d) Todas las anteriores

10. Marcar queprincipios hacen parte del consorcio edificaciones JH.

1. Terminar el proyecto por encima de la seguridad de los trabajadores y por encima del medio ambiente
2. Degradar, falta de compromiso, retrasos constantes
3. Compromiso con el cliente, calidad, seguridad, sostenibilidad, entre otras
4. Incumplimiento de normas, falta de medidas de seguridad, perdida de credibilidad

Certifico que conozco y he sido informado desde el inicio de mi labor sobre el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad industrial , programas de gestion de riesgos, Politica Integral de Gestión y Politica de No Alcohol, Drogas y Tabaco.

Declaro que he recibido la inducción para trabajar , conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas.

Para calcular la calificación final en una evaluación de 10 preguntas con una calificación máxima de 5.0, cada pregunta tendría un valor de 0.5 puntos (5/10).

FIRMA DEL TRABAJADOR

Scanned with OKEN Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN

CODIGO: FOR-SST-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 20/01/2025

NOMBRE: Edys Rafael Segueira Castro CARGO: ayudante
C.C: 1051469447 FECHA: 08/07/25

1. POLÍTICAS: Seleccione con una X si es falso (F) o verdadero (V)

a) Las políticas buscan la mejora continua de la salud y seguridad (F) o (V)
b) Garantizan condiciones de trabajo sanas y seguras que ayuden a prevenir accidentes y enfermedades (F) o (V)
c) La organización otorga herramientas para la consulta y participación de los trabajadores(F) o (V)
d) La empresa busca trabajar de un modo respetuoso con el medio ambiente (F) o (V)
e) Esta prohibido el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo por parte de los empleados y contratistas, durante las horas de trabajo (F) o (V)
f) Esta permitido presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol y las drogas (F) o (V)

2. SEÑALE CON UNA X LOS ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS



3. REPORTE DE ACCIDENTES

3.1. Que debe hacer en caso de un accidente:

a) Reportar a su jefe inmediato.
b) Reportar a la ARL
c) Hacer de cuenta que nada ocurrio.
d) Ninguna de las anteriores

4. SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBERIA UTILIZAR AL REALIZAR SU LABOR




5. SELECCIONE CON UNA X QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

a) Mantener la calma y seguir las instrucciones de la brigada
b) Salir corriendo
c) Seguir las instrucciones de la brigada e irnos para la casa
d) Salir con cuidado y NO regresar por ningún motivo.

6. MENCIONE ALGUNOS RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO

Riesgo físico Químico Biologico

7. UNIR CON UNA FLECHA LOS TERMINOS RELACIONADOS



8. UNE CON UNA FLECHA COMO SE DEBEN DE CLASIFICAR LOS RESIDUOS.

Papel, cartón,residuos plásticos (vasos desechables, cartón liso y corrugado, papel archivo, periódico) → BLANCA

Residuos orgánicos (Residuos de comida, cáscaras) → VERDE

Residuos ordinarios (servilletas, barrido, icopor) → NEGRA

9.La empresa en su mision tiene como proposito:

a)promover y fomentar oportunidades para el crecimiento local, regional y nacional, a través del trabajo conjunto con las empresas nacionales
b)garantizar soluciones y un óptimo servicio a nuestros clientes antes, durante y después finalizado el proyecto
c) mantener un equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente
d) Todas las anteriores

10. Marcar queprincipios hacen parte del consorcio edificaciones JH.

1. Terminar el proyecto por encima de la seguridad de los trabajadores y por encima del medio ambiente
2. Degradar, falta de compromiso, retrasos constantes
3. Compromiso con el cliente, calidad, seguridad, sostenibilidad, entre otras
4. Incumplimiento de normas, falta de medidas de seguridad, perdida de credibilidad

Certifico que conozco y he sido informado desde el inicio de mi labor sobre el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad industrial , programas de gestión de riesgos, Politica integral de Gestión y Politica de No Alcohol, Drogas y Tabaco.

Declaro que he recibido la inducción para trabajar , conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas.

Para calcular la calificación final en una evaluación de 10 preguntas con una calificación máxima de 5.0, cada pregunta tendría un valor de 0.5 puntos (5/10).

FIRMA DEL TRABAJADOR

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN

CODIGO: FOR-SST-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 20/01/2025

NOMBRE: Luis Fernando
C.C: 1.052732161
CARGO: Ayudante
FECHA: 08/07/25

1. POLÍTICAS: Seleccione con una X si es falso (F) o verdadero (V)

a) Las políticas buscan la mejora continua de la salud y seguridad. (F) o (V)
b) Garantizan condiciones de trabajo sanas y seguras que ayuden a prevenir accidentes y enfermedades (F) o (V)
c) La organización otorga herramientas para la consulta y participación de los trabajadores(F) o (V)
d) La empresa busca trabajar de un modo respetuoso con el medio ambiente (F) o (V)
e) Esta prohibido el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo por parte de los empleados y contratistas, durante las horas de trabajo (F) o (V).
f) Esta permitido presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol y las drogas (F) o (V)

2. SEÑALE CON UNA X LOS ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS



3. REPORTE DE ACCIDENTES

3.1. Que debe hacer en caso de un accidente:
a) Reportar a su jefe inmediato. X
b) Reportar a la ARL
c) Hacer de cuenta que nada ocurrio.
d) Ninguna de las anteriores

4. SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBERIA UTILIZAR AL REALIZAR SU LABOR




5. SELECCIONE CON UNA X QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

X a) Mantener la calma y seguir las instrucciones de la brigada
b) Salir corriendo
c) Seguir las instrucciones de la brigada e irnos para la casa
d) Salir con cuidado y NO regresar por ningún motivo.


6. MENCIONE ALGUNOS RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO

Riesgo Quimico. Riesgo biologico
Riesgo Fisico

7. UNIR CON UNA FLECHA LOS TERMINOS RELACIONADOS



8. UNE CON UNA FLECHA COMO SE DEBEN DE CLASIFICAR LOS RESIDUOS.



9.La empresa en su mision tiene como proposito:

a)promover y fomentar oportunidades para el crecimiento local, regional y nacional, a través del trabajo conjunto con las empresas nacionales
b)garantizar soluciones y un óptimo servicio a nuestros clientes antes, durante y después finalizado el proyecto X
c) mantener un equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente
d)Todas las anteriores +

10. Marcar queprincipios hacen parte del consorcio edificaciones JH.

1. Terminar el proyecto por encima de la seguridad de los trabajadores y por encima del medio ambiente
2. Degradar, falta de compromiso, retrasos constantes
3. Compromiso con el cliente, calidad, seguridad, sostenibilidad, entre otras
4.Incumplimiento de normas, falta de medidas de seguridad, perdida de credibilidad

Certifico que conozco y he sido informado desde el inicio de mi labor sobre el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad industrial , programas de gestión de riesgos, Politica Integral de Gestión y Politica de No Alcohol, Drogas y Tabaco.

Declaro que he recibido la inducción para trabajar , conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas.


Para calcular la calificación final en una evaluación de 10 preguntas con una calificación máxima de 5.0, cada pregunta tendria un valor de 0.5 puntos (5/10).

FIRMA DEL TRABAJADOR: Luis Fernando

Scanned with OKEN Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

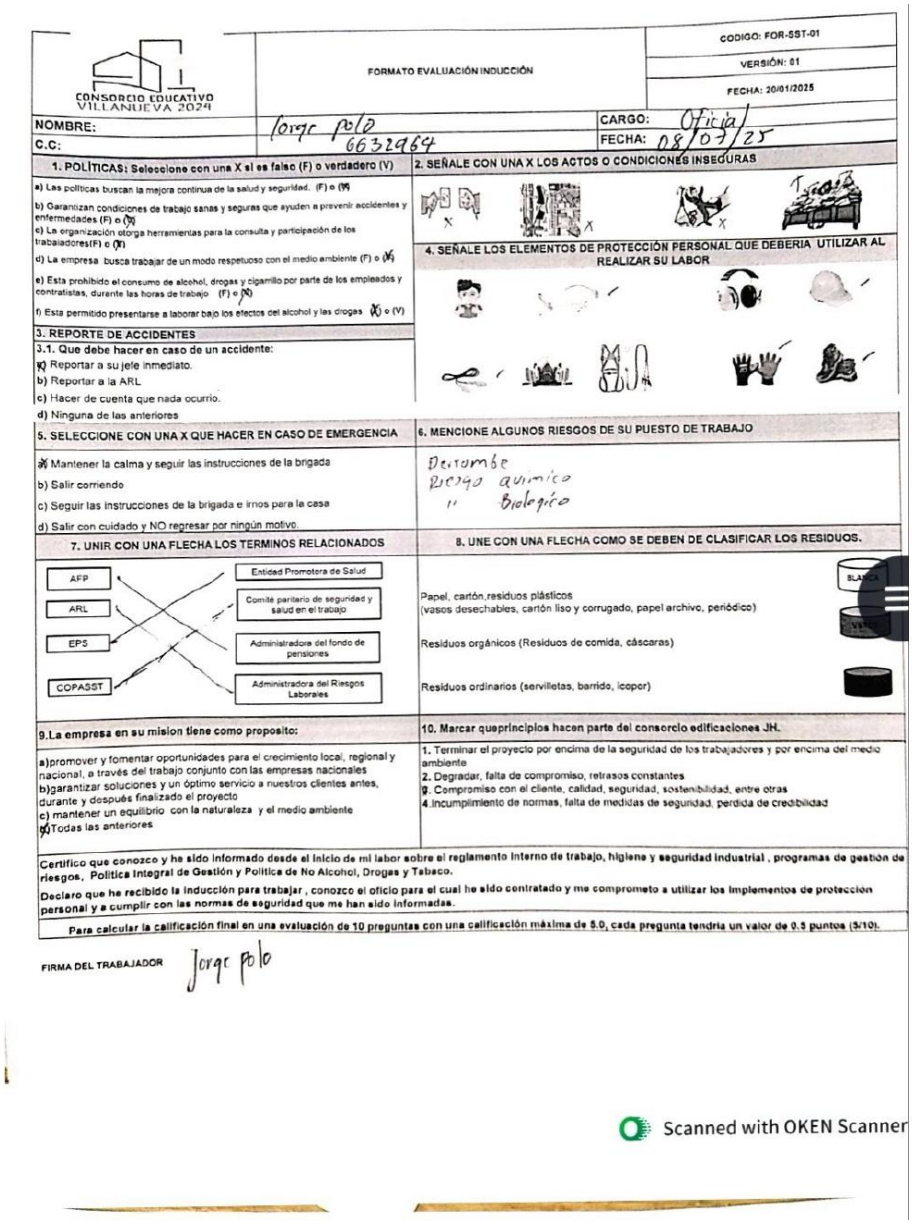

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN

CODIGO: FOR-SST-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 20/01/2025

NOMBRE: Jorge Polo
C.C: 6632964
CARGO: Oficia
FECHA: 08/07/25

1. POLÍTICAS: Seleccione con una X si es falso (F) o verdadero (V)

a) Las políticas buscan la mejora continua de la salud y seguridad. (F) o (V)
b) Garantizan condiciones de trabajo sanas y seguras que ayuden a prevenir accidentes y enfermedades (F) o (V)
c) La organización otorga herramientas para la consulta y participación de los trabajadores(F) o (V)
d) La empresa busca trabajar de un modo respetuoso con el medio ambiente (F) o (V)
e) Esta prohibido el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo por parte de los empleados y contratistas, durante las horas de trabajo (F) o (V)
f) Esta permitido presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol y las drogas (F) o (V)

2. SEÑALE CON UNA X LOS ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS

3. REPORTE DE ACCIDENTES

3.1. Que debe hacer en caso de un accidente:
a) Reportar a su jefe inmediato.
b) Reportar a la ARL
c) Hacer de cuenta que nada ocurrio.
d) Ninguna de las anteriores

4. SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBERIA UTILIZAR AL REALIZAR SU LABOR

5. SELECCIONE CON UNA X QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

a) Mantener la calma y seguir las instrucciones de la brigada
b) Salir corriendo
c) Seguir las instrucciones de la brigada e irnos para la casa
d) Salir con cuidado y NO regresar por ningún motivo.

6. MENCIONE ALGUNOS RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO

Derrumbe
Riesgo quimico
" Biologico

7. UNIR CON UNA FLECHA LOS TERMINOS RELACIONADOS

AFP — Entidad Promotora de Salud
ARL — Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
EPS — Administradora del fondo de pensiones
COPASST — Administradora del Riesgos Laborales

8. UNE CON UNA FLECHA COMO SE DEBEN DE CLASIFICAR LOS RESIDUOS.

Papel, cartón,residuos plásticos (vasos desechables, cartón liso y corrugado, papel archivo, periódico)
Residuos orgánicos (Residuos de comida, cáscaras)
Residuos ordinarios (servilletas, barrido, icopor)

9.La empresa en su mision tiene como proposito:

a)promover y fomentar oportunidades para el crecimiento local, regional y nacional, a través del trabajo conjunto con las empresas nacionales
b)garantizar soluciones y un óptimo servicio a nuestros clientes antes, durante y después finalizado el proyecto
c) mantener un equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente
d) Todas las anteriores

10. Marcar queprincipios hacen parte del consorcio edificaciones JH.

1. Terminar el proyecto por encima de la seguridad de los trabajadores y por encima del medio ambiente
2. Degradar, falta de compromiso, retrasos constantes
3. Compromiso con el cliente, calidad, seguridad, sostenibilidad, entre otras
4. Incumplimiento de normas, falta de medidas de seguridad, perdida de credibilidad

Certifico que conozco y he sido informado desde el inicio de mi labor sobre el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad industrial , programas de gestión de riesgos, Politica Integral de Gestión y Politica de No Alcohol, Drogas y Tabaco.

Declaro que he recibido la inducción para trabajar , conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas.


Para calcular la calificación final en una evaluación de 10 preguntas con una calificación máxima de 5.0, cada pregunta tendria un valor de 0.5 puntos (5/10).

FIRMA DEL TRABAJADOR Jorge Polo

Scanned with OKEN Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

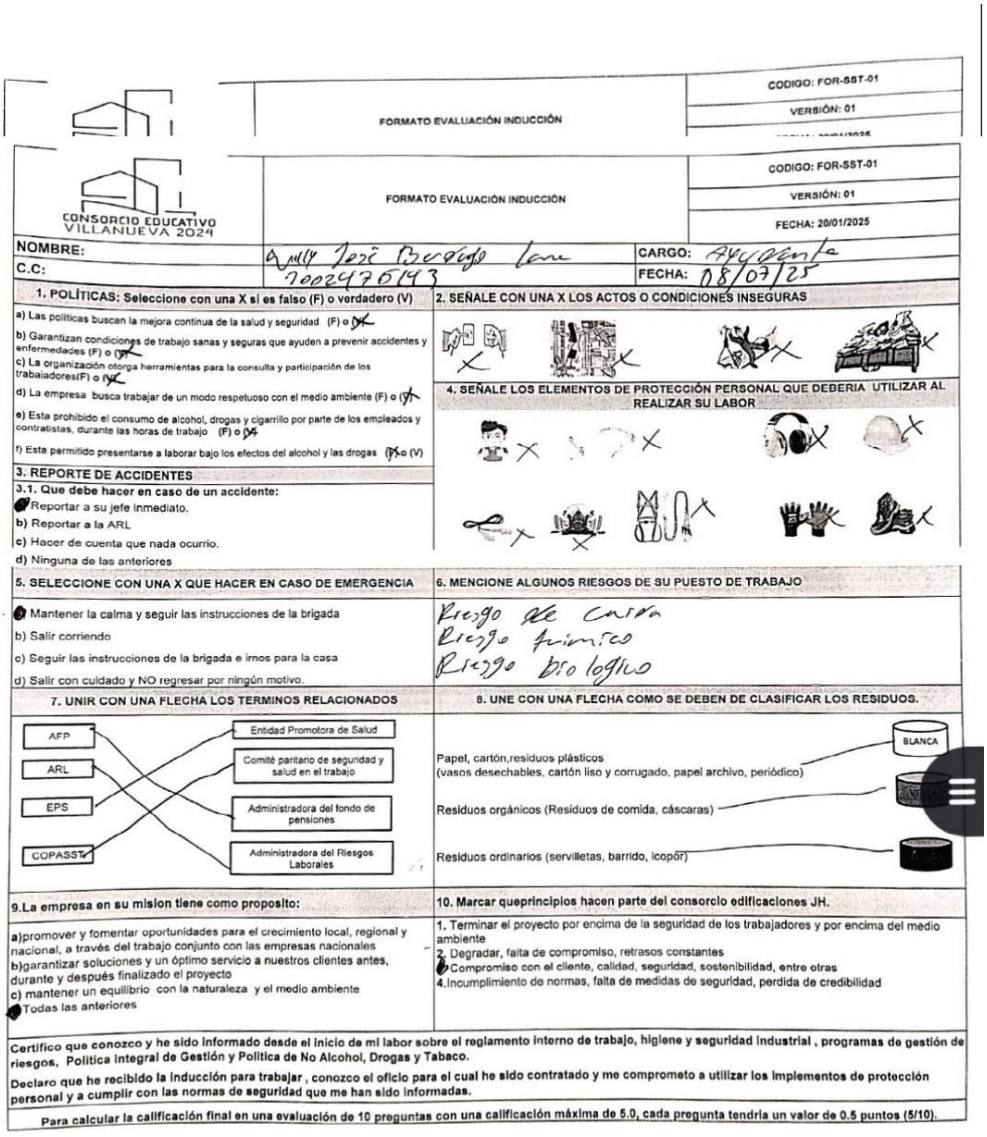

FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN

CODIGO: FOR-SST-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 20/01/2025

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

NOMBRE: Willy José Burgos Lora
C.C: 1002476143
CARGO: Auxiliar
FECHA: 08/07/25

1. POLÍTICAS: Seleccione con una X si es falso (F) o verdadero (V)

a) Las políticas buscan la mejora continua de la salud y seguridad (F) o (V) X
b) Garantizan condiciones de trabajo sanas y seguras que ayuden a prevenir accidentes y enfermedades (F) o (V) X
c) La organización otorga herramientas para la consulta y participación de los trabajadores(F) o (V) X
d) La empresa busca trabajar de un modo respetuoso con el medio ambiente (F) o (V) X
e) Esta prohibido el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo por parte de los empleados y contratistas, durante las horas de trabajo (F) o (V) X
f) Esta permitido presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol y las drogas (F) o (V)

2. SEÑALE CON UNA X LOS ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS

3. REPORTE DE ACCIDENTES

3.1. Que debe hacer en caso de un accidente:
a) Reportar a su jefe inmediato.
b) Reportar a la ARL
c) Hacer de cuenta que nada ocurrio.
d) Ninguna de las anteriores

4. SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBERIA UTILIZAR AL REALIZAR SU LABOR

5. SELECCIONE CON UNA X QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

a) Mantener la calma y seguir las instrucciones de la brigada
b) Salir corriendo
c) Seguir las instrucciones de la brigada e irnos para la casa
d) Salir con cuidado y NO regresar por ningún motivo.

6. MENCIONE ALGUNOS RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO

Riesgo de caida
Riesgo fisico
Riesgo biologico

7. UNIR CON UNA FLECHA LOS TERMINOS RELACIONADOS

AFP → Entidad Promotora de Salud
ARL → Administradora del Riesgos Laborales
EPS → Administradora del fondo de pensiones
COPASST → Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo

8. UNE CON UNA FLECHA COMO SE DEBEN DE CLASIFICAR LOS RESIDUOS.

Papel, cartón,residuos plásticos (vasos desechables, cartón liso y corrugado, papel archivo, periódico) → BLANCA
Residuos orgánicos (Residuos de comida, cáscaras) →
Residuos ordinarios (servilletas, barrido, icopor) →

9.La empresa en su mision tiene como proposito:

a)promover y fomentar oportunidades para el crecimiento local, regional y nacional, a través del trabajo conjunto con las empresas nacionales
b)garantizar soluciones y un óptimo servicio a nuestros clientes antes, durante y después finalizado el proyecto
c) mantener un equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente
d) Todas las anteriores

10. Marcar queprincipios hacen parte del consorcio edificaciones JH.

1. Terminar el proyecto por encima de la seguridad de los trabajadores y por encima del medio ambiente
2. Degradar, falta de compromiso, retrasos constantes
3. Compromiso con el cliente, calidad, seguridad, sostenibilidad, entre otras
4.Incumplimiento de normas, falta de medidas de seguridad, perdida de credibilidad

Certifico que conozco y he sido informado desde el inicio de mi labor sobre el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad industrial , programas de gestión de riesgos, Politica Integral de Gestión y Politica de No Alcohol, Drogas y Tabaco.

Declaro que he recibido la inducción para trabajar , conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas.

Para calcular la calificación final en una evaluación de 10 preguntas con una calificación máxima de 5.0, cada pregunta tendría un valor de 0.5 puntos (5/10).

FIRMA DEL TRABAJADOR
Willy José Burgos Lora

Scanned with OKEN Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN


CODIGO: FOR-SST-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 20/01/2025

NOMBRE: Jaider Polo
C.C: 1002475886
CARGO: Maestro
FECHA: 08/07/25

1. POLÍTICAS: Seleccione con una X si es falso (F) o verdadero (V)

a) Las políticas buscan la mejora continua de la salud y seguridad (F) o (X)
b) Garantizan condiciones de trabajo sanas y seguras que ayuden a prevenir accidentes y enfermedades (F) o (X)
c) La organización otorga herramientas para la consulta y participación de los trabajadores(F) o (X)
d) La empresa busca trabajar de un modo respetuoso con el medio ambiente (F) o (X)
e) Esta prohibido el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo por parte de los empleados y contratistas, durante las horas de trabajo (F) o (X)
f) Esta permitido presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol y las drogas (X) o (V)

2. SEÑALE CON UNA X LOS ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS



3. REPORTE DE ACCIDENTES

3.1. Que debe hacer en caso de un accidente:
(X) Reportar a su jefe inmediato.
b) Reportar a la ARL
c) Hacer de cuenta que nada ocurrio.
d) Ninguna de las anteriores

4. SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBERIA UTILIZAR AL REALIZAR SU LABOR



5. SELECCIONE CON UNA X QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

(X) Mantener la calma y seguir las instrucciones de la brigada
b) Salir corriendo
c) Seguir las instrucciones de la brigada e irnos para la casa
d) Salir con cuidado y NO regresar por ningún motivo.

6. MENCIONE ALGUNOS RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO

Riesgos Quimicos
Riesgos Biologicos

7. UNIR CON UNA FLECHA LOS TERMINOS RELACIONADOS

AFP	Entidad Promotora de Salud
ARL	Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
EPS	Administradora del fondo de pensiones
COPASST	Administradora del Riesgos Laborales

8. UNE CON UNA FLECHA COMO SE DEBEN DE CLASIFICAR LOS RESIDUOS.

Papel, cartón,residuos plásticos (vasos desechables, cartón liso y corrugado, papel archivo, periódico)
Residuos orgánicos (Residuos de comida, cáscaras)
Residuos ordinarios (servilletas, barrido, icopor)

9.La empresa en su mision tiene como proposito:

a)promover y fomentar oportunidades para el crecimiento local, regional y nacional, a través del trabajo conjunto con las empresas nacionales
b)garantizar soluciones y un óptimo servicio a nuestros clientes antes, durante y después finalizado el proyecto
c) mantener un equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente
(d)Todas las anteriores

10. Marcar queprincipios hacen parte del consorcio edificaciones JH.

1. Terminar el proyecto por encima de la seguridad de los trabajadores y por encima del medio ambiente
2. Degradar, falta de compromiso, retrasos constantes
(X) Compromiso con el cliente, calidad, seguridad, sostenibilidad, entre otras
4 Incumplimiento de normas, falta de medidas de seguridad, perdida de credibilidad

Certifico que conozco y he sido informado desde el inicio de mi labor sobre el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad industrial , programas de gestion de riesgos, Politica Integral de Gestión y Politica de No Alcohol, Drogas y Tabaco.

Declaro que he recibido la inducción para trabajar , conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas.


Para calcular la calificación final en una evaluación de 10 preguntas con una calificación máxima de 5.0, cada pregunta tendría un valor de 0.5 puntos (5/10).

FIRMA DEL TRABAJADOR Jaider Polo

Scanned with OKEN Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

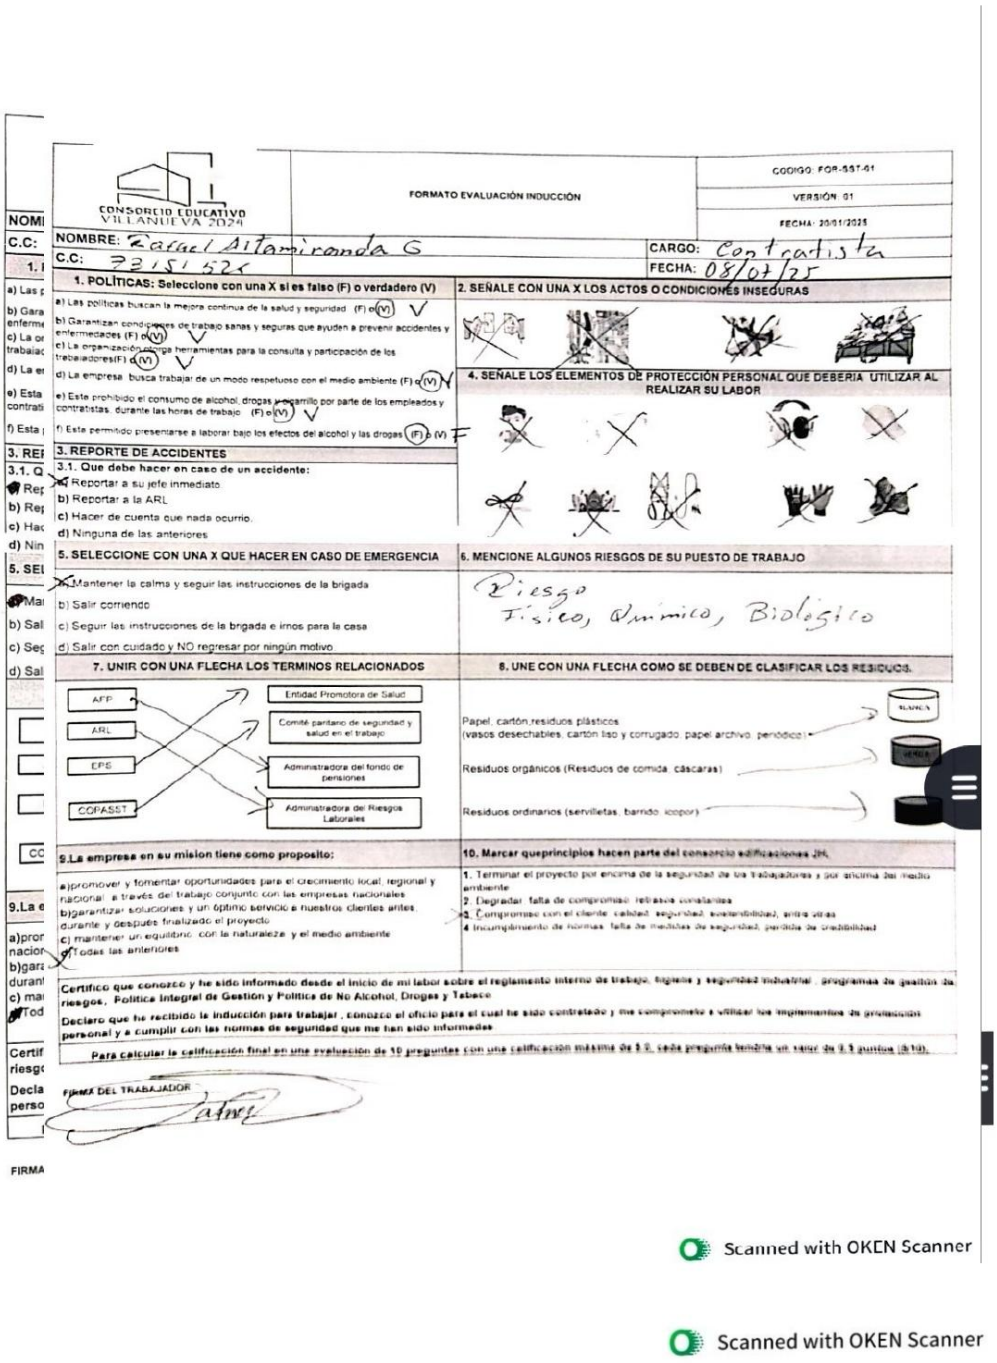

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN

CODIGO: FOR-SST-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 20/01/2025

NOMBRE: Rafael Altamiranda G
CARGO: Contratista
C.C: 72151525
FECHA: 08/07/25

1. POLÍTICAS: Seleccione con una X si es falso (F) o verdadero (V)

a) Las políticas buscan la mejora continua de la salud y seguridad (F) o (V) V
b) Garantizan condiciones de trabajo sanas y seguras que ayuden a prevenir accidentes y enfermedades (F) o (V) V
c) La organización ninguna herramientas para la consulta y participación de los trabajadores(F) o (V) V
d) La empresa busca trabajar de un modo respetuoso con el medio ambiente (F) o (V) V
e) Este prohibido el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo por parte de los empleados y contratistas, durante las horas de trabajo (F) o (V) V
f) Este permitido presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol y las drogas (F) o (V) F

2. SEÑALE CON UNA X LOS ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS

4. SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBERIA UTILIZAR AL REALIZAR SU LABOR

3. REPORTE DE ACCIDENTES

3.1. Que debe hacer en caso de un accidente:

a) Reportar a su jefe inmediato
b) Reportar a la ARL
c) Hacer de cuenta que nada ocurrio.
d) Ninguna de las anteriores

5. SELECCIONE CON UNA X QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

a) Mantener la calma y seguir las instrucciones de la brigada
b) Salir corriendo
c) Seguir las instrucciones de la brigada e irnos para la casa
d) Salir con cuidado y NO regresar por ningún motivo

6. MENCIONE ALGUNOS RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO

Riesgo Físico, Químico, Biológico

7. UNIR CON UNA FLECHA LOS TERMINOS RELACIONADOS

AFP — Entidad Promotora de Salud
ARL — Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
EPS — Administradora del fondo de pensiones
COPASST — Administradora de Riesgos Laborales

8. UNE CON UNA FLECHA COMO SE DEBEN DE CLASIFICAR LOS RESIDUOS.

Papel, cartón,residuos plásticos (vasos desechables, cartón liso y corrugado, papel archivo, periódico) — BLANCA
Residuos orgánicos (Residuos de comida, cáscaras) — VERDE
Residuos ordinarios (servilletas, barrido, icopor) — NEGRA

9.La empresa en su mision tiene como proposito:

a)promover y fomentar oportunidades para el crecimiento local, regional y nacional a través del trabajo conjunto con las empresas nacionales
b)garantizar soluciones y un óptimo servicio a nuestros clientes antes, durante y después finalizado el proyecto
c) mantener un equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente
d)Todas las anteriores

10. Marcar queprincipios hacen parte del consorcio edificaciones JH.

1. Terminar el proyecto por encima de la seguridad de los trabajadores y por encima del medio ambiente
2. Degradar, falta de compromiso, retrasos constantes
3. Compromiso con el cliente, calidad, seguridad, sostenibilidad, entre otras
4 Incumplimiento de normas, falta de medidas de seguridad, perdida de credibilidad

Certifico que conozco y he sido informado desde el inicio de mi labor sobre el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad industrial, programas de gestion de riesgos, Politica Integral de Gestion y Politica de No Alcohol, Droges y Tabaco

Declaro que he recibido la inducción para trabajar, conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas

Para calcular la calificación final en una evaluación de 10 preguntas con una calificación máxima de 5.0, cada pregunta tendrá un valor de 0.5 puntos (5/10).

FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN

CODIGO: FOR-SST-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 20/01/2025

NOMBRE: Luis Villarreal CARGO: ayudante
C.C: 9202316 FECHA: 08/07/25

1. POLÍTICAS: Seleccione con una X si es falso (F) o verdadero (V)

a) Las políticas buscan la mejora continua de la salud y seguridad. (F) o (V)
b) Garantizan condiciones de trabajo sanas y seguras que ayuden a prevenir accidentes y enfermedades (F) o (V)
c) La organización otorga herramientas para la consulta y participación de los trabajadores(F) o (V)
d) La empresa busca trabajar de un modo respetuoso con el medio ambiente (F) o (V)
e) Esta prohibido el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo por parte de los empleados y contratistas, durante las horas de trabajo (F) o (V)
f) Esta permitido presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol y las drogas (V) o (V)

2. SEÑALE CON UNA X LOS ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS



3. REPORTE DE ACCIDENTES

3.1. Que debe hacer en caso de un accidente:
X a) Reportar a su jefe inmediato.
b) Reportar a la ARL
c) Hacer de cuenta que nada ocurrio.
d) Ninguna de las anteriores

4. SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBERIA UTILIZAR AL REALIZAR SU LABOR




5. SELECCIONE CON UNA X QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

X a) Mantener la calma y seguir las instrucciones de la brigada
b) Salir corriendo
c) Seguir las instrucciones de la brigada e irnos para la casa
d) Salir con cuidado y NO regresar por ningún motivo.


6. MENCIONE ALGUNOS RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO

Riesgo Fisico Riesgo biologico
Riesgo Quimico

7. UNIR CON UNA FLECHA LOS TERMINOS RELACIONADOS



8. UNE CON UNA FLECHA COMO SE DEBEN DE CLASIFICAR LOS RESIDUOS.



9.La empresa en su mision tiene como proposito:

a)promover y fomentar oportunidades para el crecimiento local, regional y nacional, a través del trabajo conjunto con las empresas nacionales
b)garantizar soluciones y un óptimo servicio a nuestros clientes antes, durante y después finalizado el proyecto
c) mantener un equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente
X d)Todas las anteriores

10. Marcar queprincipios hacen parte del consorcio edificaciones JH.

1. Terminar el proyecto por encima de la seguridad de los trabajadores y por encima del medio ambiente
2. Degradar, falta de compromiso, retrasos constantes
X 3. Compromiso con el cliente, calidad, seguridad, sostenibilidad, entre otras
4.Incumplimiento de normas, falta de medidas de seguridad, perdida de credibilidad

Certifico que conozco y he sido informado desde el inicio de mi labor sobre el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad industrial , programas de gestión de riesgos, Politica Integral de Gestión y Politica de No Alcohol, Drogas y Tabaco.

Declaro que he recibido la inducción para trabajar , conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas.

Para calcular la calificación final en una evaluación de 10 preguntas con una calificación máxima de 5.0, cada pregunta tendría un valor de 0.5 puntos (5/10).

FIRMA DEL TRABAJADOR Luis Villarreal

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN	CODIGO: FOR-SST-01
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 20/01/2025

NOMBRE: Carlos Tejedor — CARGO: Ayudante
C.C: 7961207 — FECHA: 08/07/25

1. POLÍTICAS: Seleccione con una X si es falso (F) o verdadero (V)

a) Las políticas buscan la mejora continua de la salud y seguridad (F) o (V)
b) Garantizan condiciones de trabajo sanas y seguras que ayuden a prevenir accidentes y enfermedades (F) o (V) V
c) La organización otorga herramientas para la consulta y participación de los trabajadores(F) o (V) V
d) La empresa busca trabajar de un modo respetuoso con el medio ambiente (F) o (V)
e) Esta prohibido el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo por parte de los empleados y contratistas, durante las horas de trabajo (F) o (V)
f) Esta permitido presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol y las drogas (F) o (V)

2. SEÑALE CON UNA X LOS ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS



3. REPORTE DE ACCIDENTES

3.1. Que debe hacer en caso de un accidente:
a) Reportar a su jefe inmediato.
b) Reportar a la ARL
c) Hacer de cuenta que nada ocurrio.
d) Ninguna de las anteriores

4. SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBERIA UTILIZAR AL REALIZAR SU LABOR



5. SELECCIONE CON UNA X QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

a) Mantener la calma y seguir las instrucciones de la brigada
b) Salir corriendo
c) Seguir las instrucciones de la brigada e irnos para la casa
d) Salir con cuidado y NO regresar por ningún motivo.

6. MENCIONE ALGUNOS RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO

Riesgo ambiental fisico y biologico

7. UNIR CON UNA FLECHA LOS TERMINOS RELACIONADOS

AFP	Entidad Promotora de Salud
ARL	Comité pantario de seguridad y salud en el trabajo
EPS	Administradora del fondo de pensiones
COPASST	Administradora del Riesgos Laborales

8. UNE CON UNA FLECHA COMO SE DEBEN DE CLASIFICAR LOS RESIDUOS.

Papel, cartón,residuos plásticos (vasos desechables, cartón liso y corrugado, papel archivo, periódico)	BLANCA
Residuos orgánicos (Residuos de comida, cáscaras)	VERDE
Residuos ordinarios (servilletas, barrido, icopor)	

9.La empresa en su mision tiene como proposito:

a)promover y fomentar oportunidades para el crecimiento local, regional y nacional, a través del trabajo conjunto con las empresas nacionales
b)garantizar soluciones y un óptimo servicio a nuestros clientes antes, durante y después finalizado el proyecto
c) mantener un equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente
d)Todas las anteriores

10. Marcar queprincipios hacen parte del consorcio edificaciones JH.

1. Terminar el proyecto por encima de la seguridad de los trabajadores y por encima del medio ambiente
2. Degradar, falta de compromiso, retrasos constantes
3. Compromiso con el cliente, calidad, seguridad, sostenibilidad, entre otras
4. Incumplimiento de normas, falta de medidas de seguridad, perdida de credibilidad

Certifico que conozco y he sido informado desde el inicio de mi labor sobre el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad industrial , programas de gestión de riesgos, Politica Integral de Gestión y Politica de No Alcohol, Drogas y Tabaco.

Declaro que he recibido la inducción para trabajar , conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas.

Para calcular la calificación final en una evaluación de 10 preguntas con una calificación máxima de 5.0, cada pregunta tendria un valor de 0.5 puntos (5/10).

FIRMA DEL TRABAJADOR

Carlos

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024


FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN	CODIGO: FOR-SST-01
	VERSIÓN: 01
	FECHA: 20/01/2025

NOMBRE: OSCAR Torres G — CARGO: Ayudante
C.C: 1.032.731.541 — FECHA: 08/07/25

1. POLÍTICAS: Seleccione con una X si es falso (F) o verdadero (V)

a) Las políticas buscan la mejora continua de la salud y seguridad. (F) o (V)
b) Garantizan condiciones de trabajo sanas y seguras que ayuden a prevenir accidentes y enfermedades (F) o (V)
c) La organización otorga herramientas para la consulta y participación de los trabajadores(F) o (V)
d) La empresa busca trabajar de un modo respetuoso con el medio ambiente (F) o (V)
e) Esta prohibido el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo por parte de los empleados y contratistas, durante las horas de trabajo (F) o (V)
f) Esta permitido presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol y las drogas (F) o (V)

2. SEÑALE CON UNA X LOS ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS



3. REPORTE DE ACCIDENTES

3.1. Que debe hacer en caso de un accidente:
a) Reportar a su jefe inmediato X
b) Reportar a la ARL
c) Hacer de cuenta que nada ocurrio.
d) Ninguna de las anteriores

4. SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBERIA UTILIZAR AL REALIZAR SU LABOR



5. SELECCIONE CON UNA X QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

a) Mantener la calma y seguir las instrucciones de la brigada
b) Salir corriendo
c) Seguir las instrucciones de la brigada e irnos para la casa
d) Salir con cuidado y NO regresar por ningún motivo.

6. MENCIONE ALGUNOS RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO

Riesgo de Caida, Riesgo Quimico
Riesgo Fisico. Riesgo biologico

7. UNIR CON UNA FLECHA LOS TERMINOS RELACIONADOS

AFP	Entidad Promotora de Salud
ARL	Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
EPS	Administradora del fondo de pensiones
COPASST	Administradora del Riesgos Laborales

8. UNE CON UNA FLECHA COMO SE DEBEN DE CLASIFICAR LOS RESIDUOS.

Papel, cartón,residuos plásticos (vasos desechables, cartón liso y corrugado, papel archivo, periódico)	BLANCA
Residuos orgánicos (Residuos de comida, cáscaras)	VERDE
Residuos ordinarios (servilletas, barrido, icopor)	

9.La empresa en su mision tiene como proposito:

a)promover y fomentar oportunidades para el crecimiento local, regional y nacional, a través del trabajo conjunto con las empresas nacionales
b)garantizar soluciones y un óptimo servicio a nuestros clientes antes, durante y después finalizado el proyecto
c) mantener un equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente
d)Todas las anteriores X

10. Marcar queprinciplos hacen parte del consorcio edificaciones JH.

1. Terminar el proyecto por encima de la seguridad de los trabajadores y por encima del medio ambiente
2. Degradar, falta de compromiso, retrasos constantes
3. Compromiso con el cliente, calidad, seguridad, sostenibilidad, entre otras X
4. Incumplimiento de normas, falta de medidas de seguridad, perdida de credibilidad

Certifico que conozco y he sido informado desde el inicio de mi labor sobre el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad industrial , programas de gestión de riesgos, Politica Integral de Gestión y Politica de No Alcohol, Drogas y Tabaco.

Declaro que he recibido la inducción para trabajar , conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas.

Para calcular la calificación final en una evaluación de 10 preguntas con una calificación máxima de 5.0, cada pregunta tendria un valor de 0.5 puntos (5/10).

FIRMA DEL TRABAJADOR OSCAR Torres Gelis
1.032.731.541

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024


	FORMATO EVALUACIÓN INDUCCIÓN	CODIGO: FOR-SST-61
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 20/01/2025

NOMBRE: [illegible] CARGO: [illegible]
C.C: [illegible] FECHA: 08/07/25

1. POLÍTICAS: Seleccione con una X si es falso (F) o verdadero (V)

a) Las políticas buscan la mejora continua de la salud y seguridad (F) o (V)
b) Garantizan condiciones de trabajo sanas y seguras que ayuden a prevenir accidentes y enfermedades (F) o (V)
c) La organización ofrece herramientas para la consulta y participación de los trabajadores(F) o (V)
d) La empresa busca trabajar de un modo respetuoso con el medio ambiente (F) o (V)
e) Esta prohibido el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo por parte de los empleados y contratistas, durante las horas de trabajo (F) o (V)
f) Esta permitido presentarse a laborar bajo los efectos del alcohol y las drogas (F) o (V)

2. SEÑALE CON UNA X LOS ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS



3. REPORTE DE ACCIDENTES

3.1. Que debe hacer en caso de un accidente:
a) Reportar a su jefe inmediato. X
b) Reportar a la ARL
c) Hacer de cuenta que nada ocurrio
d) Ninguna de las anteriores

4. SEÑALE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBERIA UTILIZAR AL REALIZAR SU LABOR




5. SELECCIONE CON UNA X QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

a) Mantener la calma y seguir las instrucciones de la brigada X
b) Salir corriendo
c) Seguir las instrucciones de la brigada e irnos para la casa
d) Salir con cuidado y NO regresar por ningún motivo X

6. MENCIONE ALGUNOS RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO

Riesgos Químicos, físicos, Biológicos

7. UNIR CON UNA FLECHA LOS TERMINOS RELACIONADOS



8. UNE CON UNA FLECHA COMO SE DEBEN DE CLASIFICAR LOS RESIDUOS.



9.La empresa en su mision tiene como proposito:

a)promover y fomentar oportunidades para el crecimiento local, regional y nacional a través del trabajo conjunto con las empresas nacionales
b)garantizar soluciones y un óptimo servicio a nuestros clientes antes, durante y después finalizado el proyecto
c) mantener un equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente
d) todas las anteriores X

10. Marcar queprincipios hacen parte del consorcio edificaciones JH.

1. Terminar el proyecto por encima de la seguridad de los trabajadores y por encima del medio ambiente
2. Degradar, falta de compromiso, retrasos constantes
3. Compromiso con el cliente, calidad, seguridad, sostenibilidad, entre otras X
4. Incumplimiento de normas, falta de medidas de seguridad, perdida de credibilidad

Certifico que conozco y he sido informado desde el inicio de mi labor sobre el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad industrial, programas de gestión de riesgos, Política Integral de Gestión y Política de No Alcohol, Drogas y Tabaco

Declaro que he recibido la inducción para trabajar, conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas

Para calcular la calificación final en una evaluación de 10 preguntas con una calificación máxima de 5.0, cada pregunta tendrá un valor de 0.5 puntos (5:10).

FIRMA DEL TRABAJADOR [illegible]

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

ARL | sura

Medellín, 01 de julio de 2025

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A..

CERTIFICA:

Que MARLON REALES PEREZ identificado(a) con cédula de ciudadanía 7960544 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
Fecha inicio cobertura: 02/07/2025 **Fecha fin cobertura:** 31/07/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

ALTAMIRANDA GOENAGA RAFAEL ENRIQUE C73151526

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
4239501 - FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE HORMIGÓN, CEMENTO Y YESO, INCLUYE LA FABRICACIÓN DE COMPONENTES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS DE CEMENTO, YESO, HORMIGÓN O PIEDRA ARTIFICIAL PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O DE INGENIERÍA CIVIL; MATERIALES Y ARTÍCULOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, CEMENTO, YESO O PIEDRA ARTIFICIAL UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN COMO LOSETAS, LOSAS, BALDOSAS, LADRILLOS, PLANCHAS, LÁMINAS, TABLEROS, TUBOS, POSTES, ETC
CLASE DE RIESGO: 4 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 4.35%
CENTRO DE TRABAJO: 000000V001 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA DE VILL
CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411201
CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo 5 (6.96 %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:
C731515262518242941

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 01/07/2025 11:55 AM

Dirección IP: 200.189.27.62, 198.143.57.32, 172.16.42.57

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

ARL | sura

Medellín, 01 de julio de 2025

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A..

CERTIFICA:

Que NEURO ANTONIO FERNANDEZ CHACIN identificado(a) con cédula de ciudadanía 6198593 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 02/07/2025 **Fecha fin cobertura:** 31/07/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

ALTAMIRANDA GOENAGA RAFAEL ENRIQUE C73151526

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
4239501 - FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE HORMIGÓN, CEMENTO Y YESO, INCLUYE LA FABRICACIÓN DE COMPONENTES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS DE CEMENTO, YESO, HORMIGÓN O PIEDRA ARTIFICIAL PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O DE INGENIERÍA CIVIL; MATERIALES Y ARTÍCULOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, CEMENTO, YESO O PIEDRA ARTIFICIAL UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN COMO LOSETAS, LOSAS, BALDOSAS, LADRILLOS, PLANCHAS, LÁMINAS, TABLEROS, TUBOS, POSTES, ETC

CLASE DE RIESGO: 4 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 4.35%

CENTRO DE TRABAJO: 000000V001 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA DE VILL

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411201

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo 5 (6.96 %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:
C731515262518243009

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 01/07/2025 11.56 AM

Dirección IP: 200.189.27.62, 198.143.57.32, 172.16.42.57

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

ARL | sura

Medellín, 01 de julio de 2025

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A..

CERTIFICA:

Que OSCAR ENRIQUE TORRES GELIZ identificado(a) con cédula de ciudadanía 1052731541 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 02/07/2025 **Fecha fin cobertura:** 31/07/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

ALTAMIRANDA GOENAGA RAFAEL ENRIQUE C73151526

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
4239501 - FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE HORMIGÓN, CEMENTO Y YESO, INCLUYE LA FABRICACIÓN DE COMPONENTES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS DE CEMENTO, YESO, HORMIGÓN O PIEDRA ARTIFICIAL PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O DE INGENIERÍA CIVIL; MATERIALES Y ARTÍCULOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, CEMENTO, YESO O PIEDRA ARTIFICIAL UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN COMO LOSETAS, LOSAS, BALDOSAS, LADRILLOS, PLANCHAS, LÁMINAS, TABLEROS, TUBOS, POSTES, ETC

CLASE DE RIESGO: 4 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 4.35%

CENTRO DE TRABAJO: 000000V001 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA DE VILL

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411201

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo 5 (6.96 %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:
C731515262518242767

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 01/07/2025 11.52 AM

Dirección IP: 200.189.27.62, 198.143.57.32, 172.16.42.57

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

ARL | sura

Medellín, 01 de julio de 2025

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A..

CERTIFICA:

Que PABLO ZABALZA HERRERA identificado(a) con cédula de ciudadanía 9203235 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 02/07/2025 **Fecha fin cobertura:** 31/07/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

ALTAMIRANDA GOENAGA RAFAEL ENRIQUE C73151526

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
4239501 - FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE HORMIGÓN, CEMENTO Y YESO, INCLUYE LA FABRICACIÓN DE COMPONENTES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS DE CEMENTO, YESO, HORMIGÓN O PIEDRA ARTIFICIAL PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O DE INGENIERÍA CIVIL; MATERIALES Y ARTÍCULOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, CEMENTO, YESO O PIEDRA ARTIFICIAL UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN COMO LOSETAS, LOSAS, BALDOSAS, LADRILLOS, PLANCHAS, LÁMINAS, TABLEROS, TUBOS, POSTES, ETC

CLASE DE RIESGO: 4 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 4.35%

CENTRO DE TRABAJO: 000000V001 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA DE VILL

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411201

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo 5 (6.96 %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:
C731515262518243210

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 01/07/2025 12:00 PM


Dirección IP: 200.189.27.62, 198.143.57.32, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

ANEXO 5: INSPECCIÓN DE MAQUINARIA

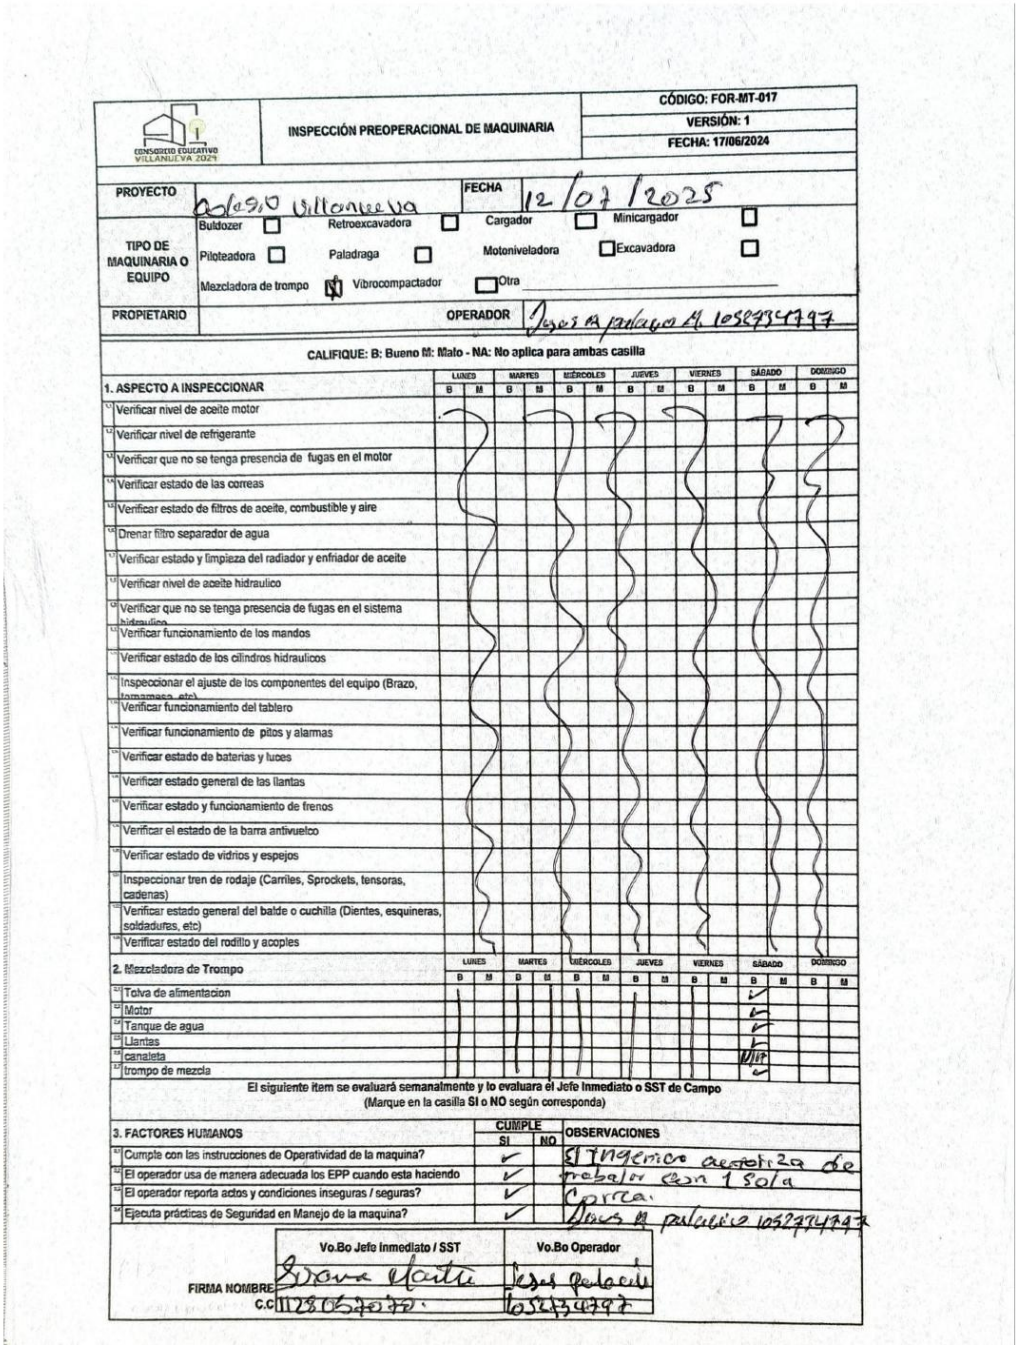

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

CÓDIGO: FOR-MT-017
VERSIÓN: 1
FECHA: 17/06/2024

PROYECTO: Sede 5,0 Villanueva — FECHA: 12/07/2025

TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO: Buldozer ☐ Retroexcavadora ☐ Cargador ☐ Minicargador ☐ Piloteadora ☐ Paladraga ☐ Motoniveladora ☐ Excavadora ☐ Mezcladora de trompo ☒ Vibrocompactador ☐ Otra ☐

PROPIETARIO — OPERADOR: Jesus M. palacio M. 1052734797

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

1. ASPECTO A INSPECCIONAR	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
1 Verificar nivel de aceite motor														
2 Verificar nivel de refrigerante														
3 Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor														
4 Verificar estado de las correas														
5 Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire														
6 Drenar filtro separador de agua														
7 Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite														
8 Verificar nivel de aceite hidraulico														
9 Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico														
10 Verificar funcionamiento de los mandos														
11 Verificar estado de los cilindros hidraulicos														
12 Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)														
13 Verificar funcionamiento del tablero														
14 Verificar funcionamiento de pitos y alarmas														
15 Verificar estado de baterias y luces														
16 Verificar estado general de las llantas														
17 Verificar estado y funcionamiento de frenos														
18 Verificar el estado de la barra antivuelco														
19 Verificar estado de vidrios y espejos														
20 Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)														
21 Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)														
22 Verificar estado del rodillo y acoples														

2. Mezcladora de Trompo	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
23 Tolva de alimentacion											✓			
24 Motor											✓			
25 Tanque de agua											✓			
26 Llantas											✓			
27 canaleta											✓			
28 trompo de mezcla											✓			

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
29 Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		El Ingeniero autoriza de trabajar con 1 sola
30 El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo	✓		Correa.
31 El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	✓		Jesus M. palacio 1052734797
32 Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST	Vo.Bo Operador
FIRMA NOMBRE	Jesus Martinez	Jesus palacio
C.C	1128057077	1052734797

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

PRE OPERACIONAL MINI CARGADOR

CÓDIGO: FOR-MT-014
VERSION: 01
FECHA: 17/07/2024

SEMANA DEL 07 AL 11 MES JULIO SERIE: PROYECTO: Villanueva

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Colegio Villanueva

OPERADOR: Hoffman Sala UBICACIÓN: Villanueva

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

ITÉM	PARÁMETRO A REVISAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras	NA		NA		NA				NA		NA			
	Direccionales traseras	NA		NA		NA				NA		NA			
	De trabajo delanteras	✓		✓		✓				✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓				✓		✓			
	De frenado	✓		✓		✓				✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓				✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓				✓		✓			
	Alarma retroceso	✓		✓		✓				✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓				✓		✓			
	Frenos de servicio	✓		✓		✓				✓		✓			
	Freno de parqueo	✓		✓		✓				✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor)	✓		✓		✓				✓		✓			
	Extintor contra incendio	NO		NO		NO				NO		NO			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓				✓		✓			
	Espejos laterales	NA		NA		NA				NA		NA			
	Espejo central convexo	NA		NA		NA				NA		✓			
	Pasamanos de acceso	✓		✓		✓				✓		✓			
	Dirección	✓		✓		✓				✓		✓			
	Batería y cables	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓				✓		✓			
	Mecanismo de giro	NA		NA		NA				NA		NA			
	Corona de tornameza en buen estado	NA		NA		NA				NA		NA			
	Mandos de avance	✓		✓		✓				✓		✓			
	Guardas	NA		NA		NA				NA		NA			
	Llantas en buen estado	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado del estibador	NA		NA		NA				NA		NA			
FIRMAS	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

OBSERVACIONES


EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE:	SI	NO	RESPONSABLE	FECHA
SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:				
REVISADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO:				
SEPARADO Y REMITIDO AL ALMACÉN:				
OTRO:				

FIRMA DEL OPERARIO QUE REPORTA LA FALLA	FIRMA DEL SUPERVISOR SST

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

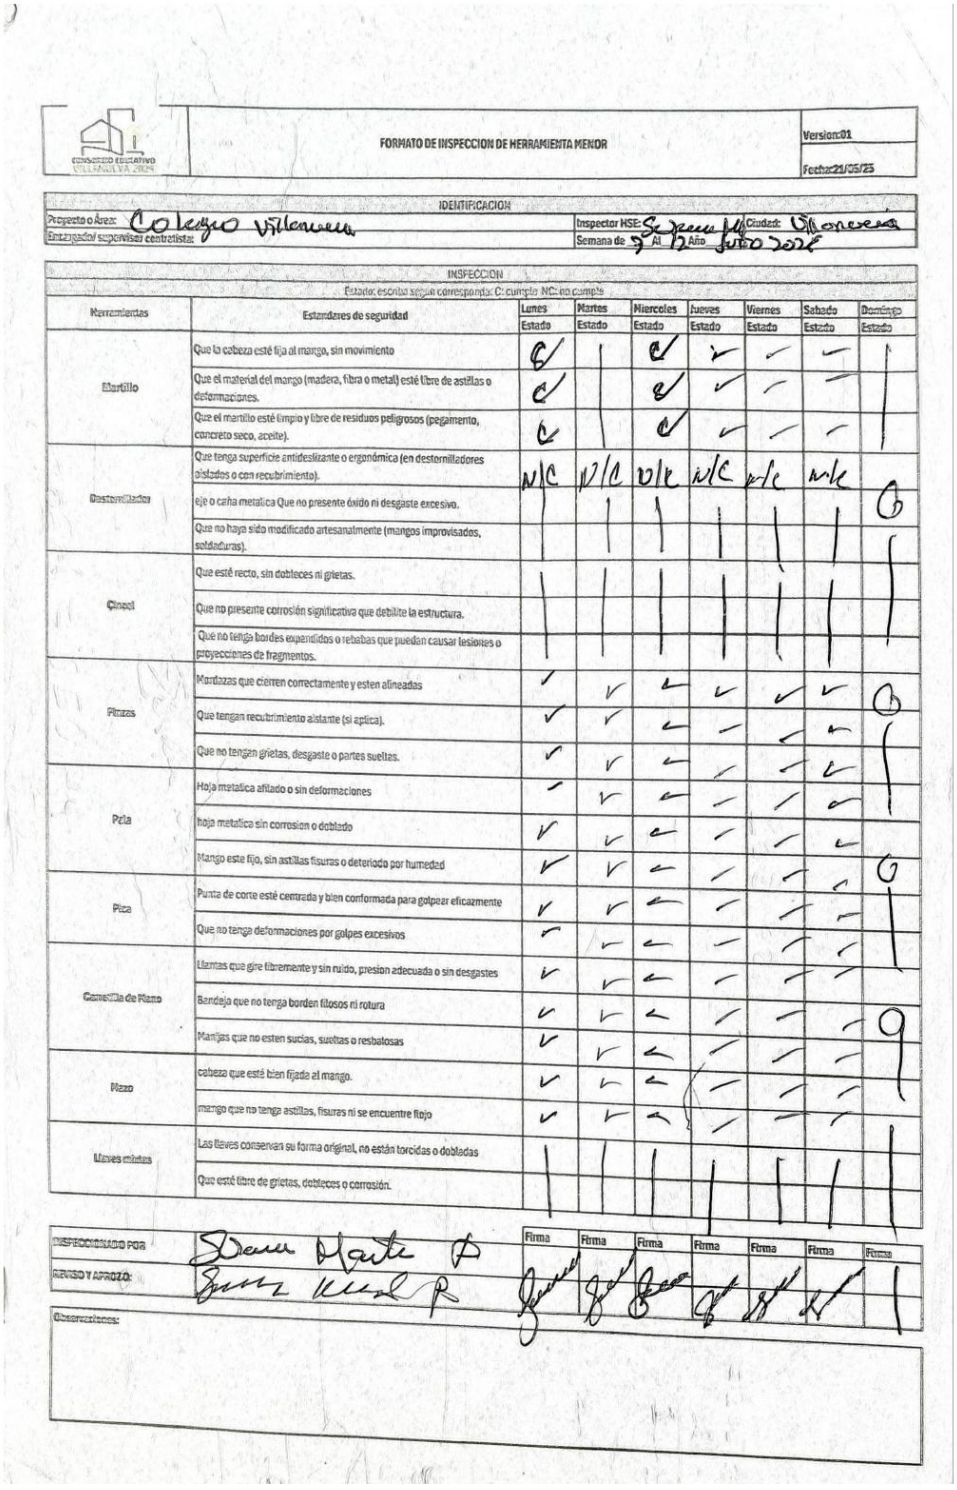

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

FORMATO DE INSPECCION DE HERRAMIENTA MENOR

Version:01
Fecha:21/05/25

IDENTIFICACION

Proyecto o Área: Colegio Villanueva — Inspector HSE: Semana Mi — Ciudad: Villanueva
Encargado/ supervisor/ contratista: — Semana de 7 Al 13 Año Julio 2025

INSPECCION

Estado: escriba según corresponda: C: cumple NC: no cumple

Herramientas	Estandares de seguridad	Lunes Estado	Martes Estado	Miercoles Estado	Jueves Estado	Viernes Estado	Sabado Estado	Domingo Estado
Martillo	Que la cabeza esté fija al mango, sin movimiento	C		C				
	Que el material del mango (madera, fibra o metal) esté libre de astillas o deformaciones.	C		C				
	Que el martillo esté limpio y libre de residuos peligrosos (pegamento, concreto seco, aceite).	C		C				
Destornilladores	Que tenga superficie antideslizante o ergonómica (en destornilladores aislados o con recubrimiento).	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	
	eje o caña metalica Que no presente óxido ni desgaste excesivo.							C
	Que no haya sido modificado artesanalmente (mangos improvisados, soldaduras).							
Cincel	Que esté recto, sin dobleces ni grietas.							
	Que no presente corrosión significativa que debilite la estructura.							
	Que no tenga bordes expandidos o rebabas que puedan causar lesiones o proyecciones de fragmentos.							
Pinzas	Mordazas que cierren correctamente y esten alineadas	C	C	C	C	C	C	C
	Que tengan recubrimiento aislante (si aplica).	C	C	C	C	C	C	
	Que no tengan grietas, desgaste o partes sueltas.	C	C	C	C	C	C	
Pala	Hoja metalica afilado o sin deformaciones	C	C	C	C	C	C	
	hoja metalica sin corrosion o doblado	C	C	C	C	C	C	
	Mango este fijo, sin astillas fisuras o deteriodo por humedad	C	C	C	C	C	C	C
Pica	Punta de corte esté centrada y bien conformada para golpear eficazmente	C	C	C	C	C	C	
	Que no tenga deformaciones por golpes excesivos	C	C	C	C	C	C	
Carretilla de Mano	Llantas que gire libremente y sin ruido, presion adecuada o sin desgastes	C	C	C	C	C	C	
	Bandeja que no tenga borden filosos ni rotura	C	C	C	C	C	C	C
	Manijas que no esten sucias, sueltas o resbalosas	C	C	C	C	C	C	
Pisao	cabeza que esté bien fijada al mango.	C	C	C	C	C	C	
	mango que no tenga astillas, fisuras ni se encuentre flojo	C	C	C	C	C	C	
Llaves mixtas	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas							
	Que esté libre de grietas, dobleces o corrosión.							

		Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
INSPECCIONADO POR	Dana Maria P							
REVISO Y APROBO:	Sara Real R							

Observaciones:

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

CÓDIGO: FOR-MT-017
VERSIÓN: 1
FECHA: 17/06/2024

PROYECTO	Colegio Villanueva	**FECHA**	07/07/2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ☐ Retroexcavadora ☒ Cargador ☐ Minicargador ☐ Piloteadora ☐ Paladraga ☐ Motoniveladora ☐ Excavadora ☐ Mezcladora de trompo ☐ Vibrocompactador ☐ Otra _____		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Cristian Berrio

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

1. ASPECTO A INSPECCIONAR	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
1.1 Verificar nivel de aceite motor	X		X											
1.2 Verificar nivel de refrigerante	X		X											
1.3 Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X		X											
1.4 Verificar estado de las correas	X		X				0		0					
1.5 Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X		X						0					
1.6 Drenar filtro separador de agua	X		X		0						0		0	
1.7 Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X		X											
1.8 Verificar nivel de aceite hidraulico	X		X											
1.9 Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	X		X											
1.10 Verificar funcionamiento de los mandos	X		X											
1.11 Verificar estado de los cilindros hidraulicos	X		X				0		0		0		0	
1.12 Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	X		X											
1.13 Verificar funcionamiento del tablero	X		X											
1.14 Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X		X											
1.15 Verificar estado de baterias y luces	X		X		0									
1.16 Verificar estado general de las llantas	X		X											
1.17 Verificar estado y funcionamiento de frenos	X		X						0		0		0	
1.18 Verificar el estado de la barra antivuelco	X		X				0							
1.19 Verificar estado de vidrios y espejos	X		X											
1.20 Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	N/A		N/A											
1.21 Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	X		X										0	
1.22 Verificar estado del rodillo y acoples	N/A		N/A											
2. Mezcladora de Trompo														
2.1 Tolva de alimentacion														
2.2 Motor														
2.3 Tanque de agua														
2.4 Llantas														
2.5 canaleta														
2.6 trompo de mezcla														

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
3.1 Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3.2 El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo	✓		
3.3 El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	✓		
3.4 Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST	Vo.Bo Operador
FIRMA NOMBRE	[illegible]	Cristian Berrio
C.C	1.7805222	1148474263

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	PREOPERACIONAL DE COMPACTADOR TIPO CANGURO	VERSIÓN 1
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha : 13/06/2025

PROYECTO U OBRA: villanueva SEMANA 07 al 12 MES: Julio AÑO: 25
EQUIPO canguro MARCA:

C: CONFORME NC: NO CONFORME

INSPECCIÓN VISUAL		APLICA SI	APLICA NO	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIERC C	MIERC NC	JUEV C	JUEV NC	VIER C	VIER NC	SAB C	SAB NC	DOM C	DOM NC
MOTOR	Verificar que se encuentre en buen estado, sin ruidos extraños ni partes sueltas			✓		✓				0						0	
ENCENDIDO	Verificar que encienda correctamente sin generar chispa ni ruidos anormales			✓		✓						0		0			
CABLE EN BUEN ESTADO Y ENCAUCHETADOS	Verificar que se encuentre en buen estado sin roturas que permitan conexión con material aislante			✓		✓		0				0				0	
CABLEADO Y CONECTORES EN BUEN ESTADO	Verificar que no existan cables pelados o conexiones sueltas, deben estar bien aislados			✓		✓				0				0			
ESTRUCTURA GENERAL DEL EQUIPO	Revisar que la carcasa esté sin fisuras, oxidación, abolladuras o tornillos sueltos			✓		✓						0				0	
SISTEMA DE ESCAPE	Verificar que no esté obstruido, sucio ni presente fugas de gases			✓		✓		0		0						0	
FUGAS DE ACEITE	Inspeccionar que no existan derrames de aceite en ninguna parte del equipo			✓		✓								0			
YOYO DE ENCENDIDO (IMPULSOR)	Verificar que el sistema de arranque manual esté operativo y sin daños			NO	NO	NO	NO										
MANILLAR Y SOPORTES	Asegurar que estén firmes, sin grietas ni elementos flojos			✓		✓		0				0				0	
ZAPATA (BASE DE GOLPEO)	Verificar que esté fija, sin desgaste excesivo o roturas			✓		✓								0			
VIBRACIÓN UNIFORME	Confirmar que durante la prueba el equipo vibre de forma uniforme, sin desviaciones			✓		✓				0							
GUARDAS DE PROTECCIÓN	Validar que estén instaladas y en buen estado			✓		✓						0				0	
TORNILLERÍA Y UNIONES	Verificar que todos los tornillos y pernos estén ajustados y completos			✓		✓								0			
TEMPERATURA	Monitorear la temperatura durante la operación para evitar sobrecalentamientos			✓		✓											

Observaciones:
se enciende por medio de cuerda ajena

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD	POR NINGUN MOTIVO PERMITA QUE LA BOMBA TRABAJE EN SECO, ESTO PUEDE GENERAR RECALENTAMINETOS Y POSIBLES INCENDIOS.
	EL TRABAJDOR SE COMPROMETE A NO RETIRAR LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA HERRAMIENTA Y REPORTAR LAS FALLAS O MANTENIMIENTOS A QUE DIERA LUGAR

PERMISO OTORGADO A:

NOMBRE y FECHA	CEDULA	FIRMA
Jesus A. Pulido M. 07/07/25	1052734797	
Jesus A. Pulido M. 08/07/25	1052734797	

VERIFICADO Y AUTORIZADO POR SST:

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	PRE - OPERACIONAL PULIDORA	CÓDIGO: FOR-MT-019
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 22/06/2024

Proyecto: Obras Villanueva Area/proceso: Viviendas de Pedestal

Mes/Año: 14 AL 29 JULIO Equipo Propio: Contratista: Daniel Otro:

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

Descripción	L	M	M	J	V	S	D
El equipo está limpio y sin residuos peligrosos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Etiquetas de advertencia visibles y legibles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Número de serie visible y sin alteraciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cable de alimentación en buen estado (sin cortes, empates ni peladuras)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Enchufe sin daños y con conexión a tierra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Interruptor de encendido/apagado funciona correctamente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Protector de disco ajustado y firme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Disco de corte/lijado en buen estado (sin grietas, astillas o desgaste excesivo)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tornillos y piezas bien ajustadas y sin holguras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
No se perciben olores extraños al encender	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Nivel de ruido normal al encender (sin vibraciones excesivas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Gafas o careta de protección facial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Guantes dieléctricos o mecánicos resistentes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tapabocas o respirador (según el material a cortar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Protectores auditivos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Botas de seguridad con punta reforzada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Área libre de materiales combustibles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Buenas condiciones de iluminación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Señalización de uso de herramientas rotativas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
INSPECCIONADO POR:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
REVISÓ Y APROBÓ:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Observaciones arrojadas por las inspecciones

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

PRE OPERACIONAL TRONZADORA

CÓDIGO: FOR-MT-015
VERSION: 01
FECHA: 17/07/2024

SEMANA DEL 14 AL 19 MES Julio 25 PROYECTO Villanueva
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Corte de hierro
OPERADOR: Jose J Fuentes 7960101

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

ITÉM	PARÁMETRO A REVISAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO	Guarda de protección del disco	✓		✓		✓				✓		✓			
	Disco apropiado rpm	✓		✓		✓				✓		✓			
	Suiche del seguro, encendido y apagado	✓		✓		✓				✓		✓			
	Instalaciones eléctricas y voltaje apropiado	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado del disco (verificar RPM, vida util, grietas)	✓		✓		✓				✓		✓			
	Cuerpo del equipo (fisuras, rupturas)	✓		✓		✓				✓		✓			
	Empuñadura libre de grasa y limpia	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de las bridas y pernos	✓		✓		✓				✓		✓			
	Sentido de rotación del disco	✓		✓		✓				✓		✓			
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Verifique que el operario este libre de, accesorios, ropa suelta y otros elementos que puedan ser atrapados por las partes móviles, área libre de obstáculos	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de los anclajes a la mesa o superficie nivelada	✓		✓		✓				✓		✓			
	El operario observa el sentido de giro y la velocidad del disco, cumple con las especificaciones del fabricante	✓		✓		✓				✓		✓			
	El operario delimita, aisla o demarca el área de trabajo para que ninguna persona este cerca a la operación que se esta realizando	✓		✓		✓				✓		✓			
EPP	El operario utiliza la protección auditiva, visual y mascarilla para partículas de polvo, guantes de seguridad, careta para partículas	✓		✓		✓				✓		✓			
UBICACIÓN															
SERIE															
FIRMAS	FIRMA OPERADOR	Jose F		Wilson		Wilson Cuadro				Wilson Cuadro					
	FIRMA SUPERVISOR SST					Derlis J.				Derlis J.					

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE:	SI	NO	RESPONSABLE	FECHA
SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:				
REVISADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO:				
SEPARADO Y REMITIDO AL ALMACÉN:				
OTRO:				

FIRMA DEL OPERARIO QUE REPORTA LA FALLA | FIRMA DEL SUPERVISOR SST

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

PRE OPERACIONAL MINI CARGADOR

CÓDIGO: FOR-MT-014
VERSION: 01
FECHA: 17/07/2024

SEMANA DEL 14 AL 19 MES Julio SERIE: PROYECTO: Villanueva

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Patio Relleno de Material

OPERADOR: Hofman UBICACIÓN: Colegio villanueva

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo - NA: No aplica para ambas casilla

ITÉM	PARÁMETRO A REVISAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Direccionales traseras	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De frenado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma retroceso	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor contra incendio	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Espejo central convexo	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Pasamanos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Corona de tornameza en buen estado	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del estibador	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
FIRMAS	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

EL EQUIPO FUE:	SI	NO	RESPONSABLE	FECHA
SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:				
REVISADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO:				
SEPARADO Y REMITIDO AL ALMACÉN:				
OTRO:				


FIRMA DEL OPERARIO QUE REPORTA LA FALLA	FIRMA DEL SUPERVISOR SST

PDF Scanner ACE Scanner

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

Análisis seguro de trabajo ATS

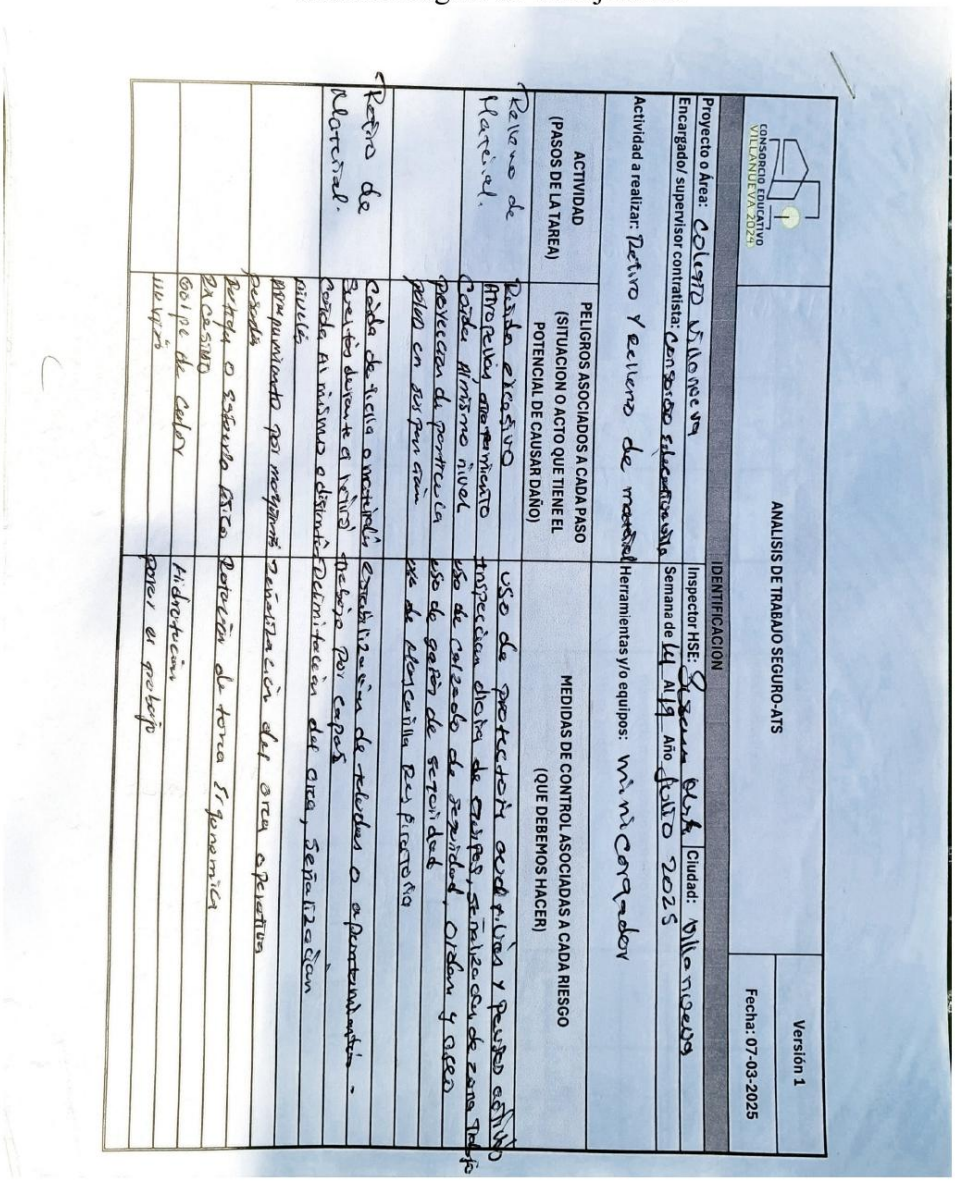

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS

Versión 1

Fecha: 07-03-2025

IDENTIFICACION

Proyecto o Área: Colegio Villanueva — Ciudad: Villanueva

Encargado/ supervisor contratista: Contratista electricista — Inspector HSE: Cristian Ruiz


Actividad a realizar: Retiro y relleno de material — Semana de 1 al 19 — Año Julio 2025

Herramientas y/o equipos: Mini cargador

ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)
Relleno de Material.	Riesgo ergonómico Atropellos y aplastamiento Caídas al mismo nivel Proyección de partículas golpes en pies y manos	Uso de protección auditiva y Pausas activas Inspección diaria de cintas, señalización de zona de trabajo Uso de calzado de seguridad, orden y aseo uso de monogafas
Retiro de Material.	Caída de tierra a nivel inferior Derrumbe durante el retiro caída al mismo o distinto nivel caídas	Estabilización de taludes o apuntalamiento - Delimitación del área, señalización
	Atrapamiento por maquinaria Perdida Retiro o esguince por torsión EXCESIVO Golpe de calor Heridas	Capacitación del área operativa Protección de torsión si ergonomica Hidratación Reposo

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

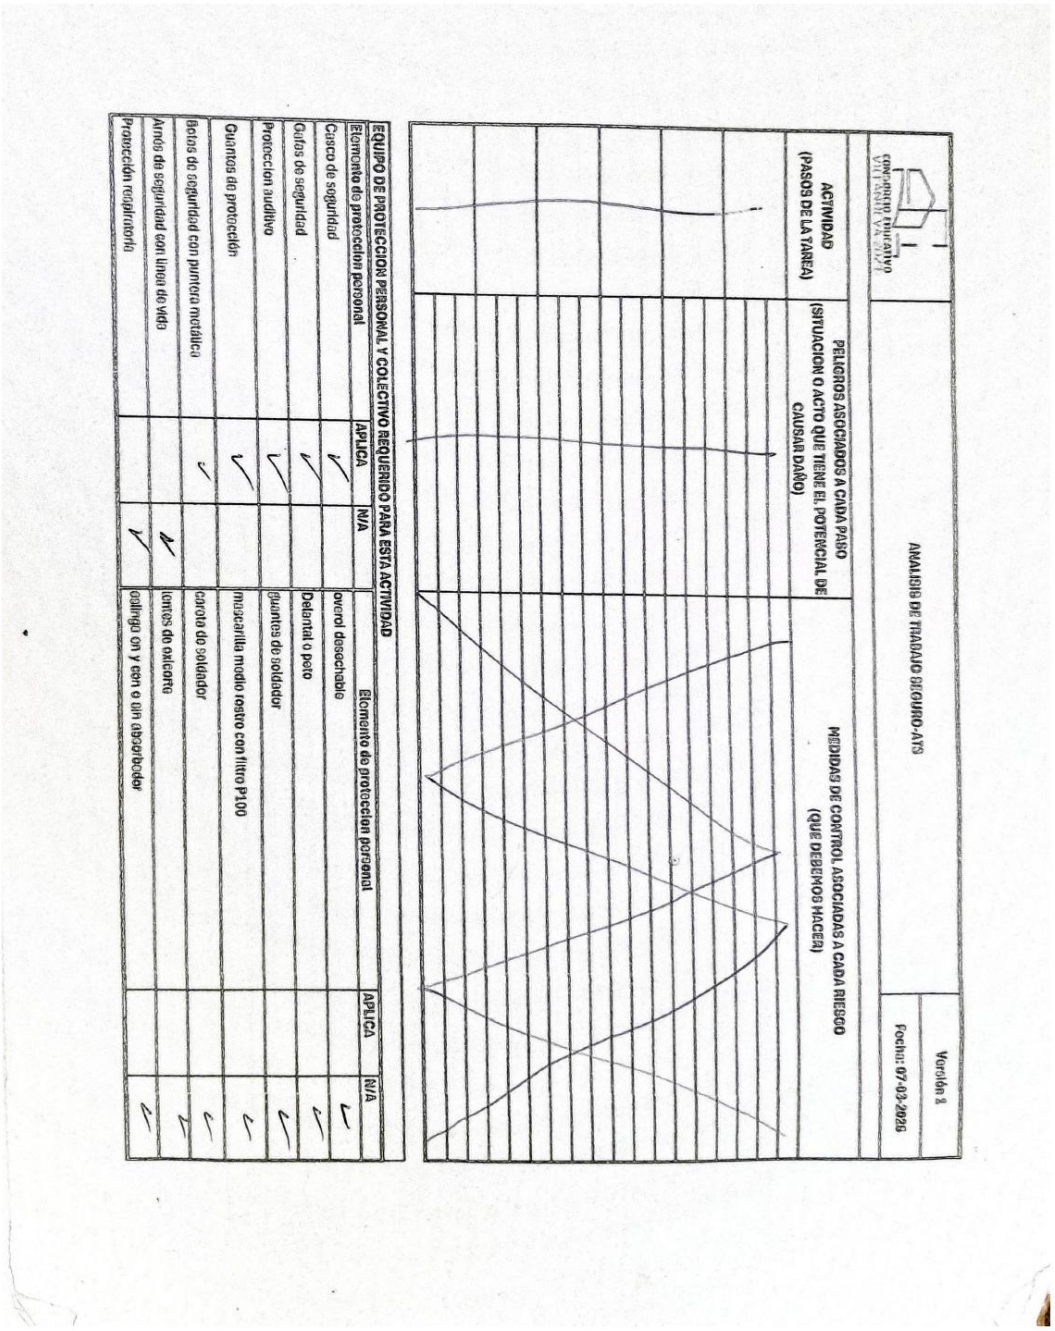

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS

Versión 1
Fecha: 07-03-2025


ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO REQUERIDO PARA ESTA ACTIVIDAD

Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A	Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A
Casco de seguridad	✓		overol desechable		✓
Gafas de seguridad	✓		Delantal o peto		✓
Proteccion auditivo	✓		guantes de soldador		✓
Guantes de proteccion	✓		mascarilla medio rostro con filtro P100		✓
Botas de seguridad con puntera metálica	✓		careta de soldador		✓
Arnés de seguridad con linea de vida		✓	lentes de oxicorte		✓
Protección respiratoria		✓	polainas en y con o sin descarbador		✓

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

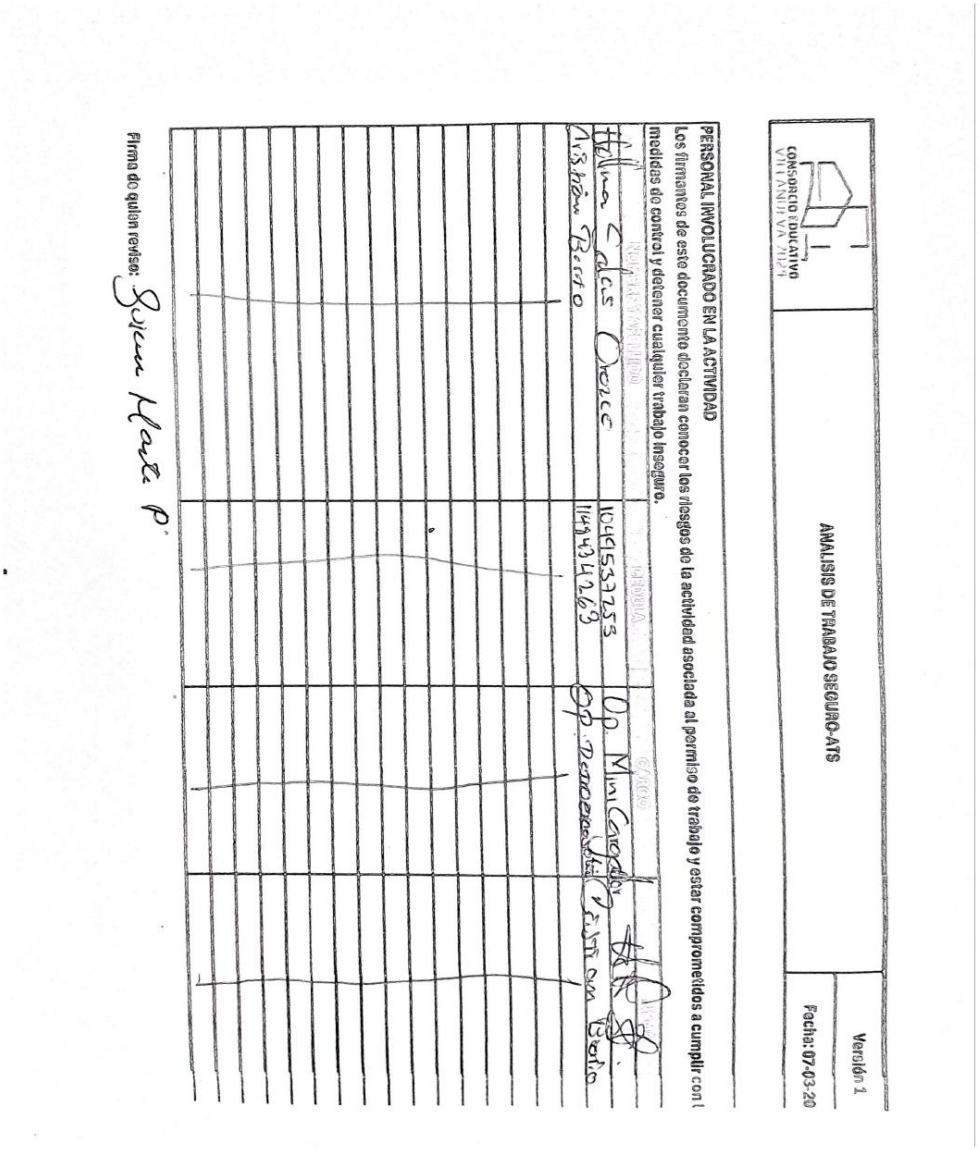

CONSORCIO EDUCATIVO BOLIVAR NUEVA ERA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS

Versión 1

Fecha: 07-03-20

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD


Los firmantes de este documento declaran conocer los riesgos de la actividad asociada al permiso de trabajo y estar comprometidos a cumplir con l
medidas de control y detener cualquier trabajo inseguro.

Hellmer Cadiz Ochoa	1004553253	Op Mini Cargador	
Arbey Jose Perez	1143942269	Op Retroexcavadora	

Firma de quien revisa: Julian Mora P.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

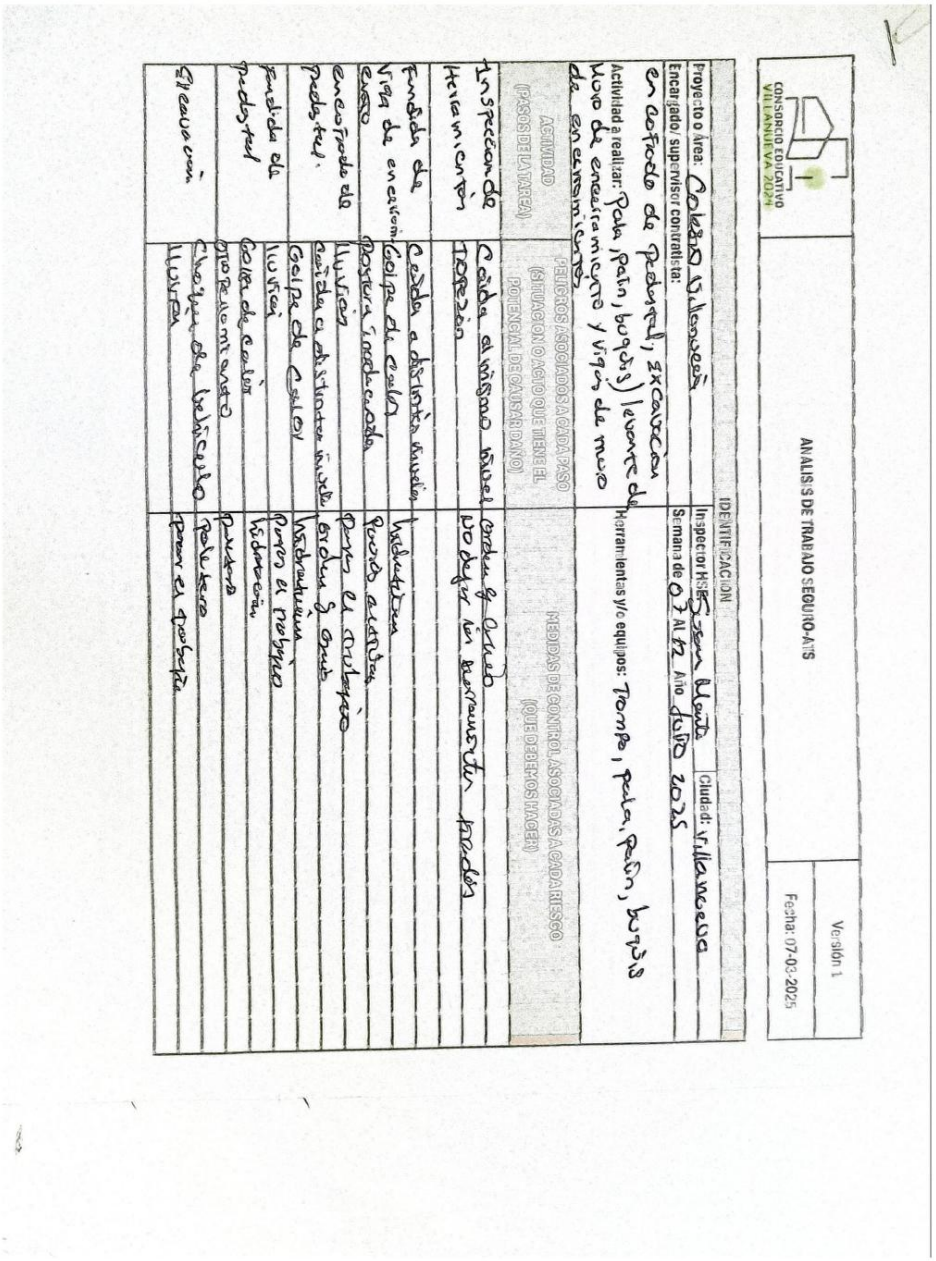

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS

Versión 1

Fecha: 07-03-2025

IDENTIFICACION

Proyecto o Área: Cobertura Mantenimiento — Ciudad: Villanueva

Encargado supervisor contratista: Inspector HSE Esteban Alonso


Actividad a realizar: Poda, Pala, Machete, Serrucho, Motosierra, Excavacion en retiro de material vegetal — Semana de 07 AL 12 Año 2025

Herramientas y/o equipos: Tijeras de poda, Pala, Machete, Serrucho, Motosierra, Botas de seguridad, Guantes de cuero, Gafas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectivo, Botiquín de primeros auxilios

ACTIVIDAD (PASO DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)
Inspeccion de Herramientas	Caida al mismo nivel, golpes por objetos en movimiento, atrapamiento	No dejar las herramientas tiradas
Fumigacion de Vias de encasquillamiento	Caida a distinto nivel, golpes por objetos, contacto con plagas	Uso de botas antideslizantes, guantes de cuero, gafas de seguridad
Retiro de material vegetal	Golpes por objetos, atrapamiento, caida a distinto nivel	Uso de casco, guantes de cuero, botas de seguridad, chaleco reflectivo
Limpieza de Cunetas	Golpes por objetos, atrapamiento, caida a distinto nivel	Uso de casco, guantes de cuero, botas de seguridad, chaleco reflectivo
Limpieza de Cunetas	Golpes por objetos, atrapamiento, caida a distinto nivel	Uso de casco, guantes de cuero, botas de seguridad, chaleco reflectivo
Limpieza de Cunetas	Golpes por objetos, atrapamiento, caida a distinto nivel	Uso de casco, guantes de cuero, botas de seguridad, chaleco reflectivo
Limpieza de Cunetas	Golpes por objetos, atrapamiento, caida a distinto nivel	Uso de casco, guantes de cuero, botas de seguridad, chaleco reflectivo
Limpieza de Cunetas	Golpes por objetos, atrapamiento, caida a distinto nivel	Uso de casco, guantes de cuero, botas de seguridad, chaleco reflectivo
Limpieza de Cunetas	Golpes por objetos, atrapamiento, caida a distinto nivel	Uso de casco, guantes de cuero, botas de seguridad, chaleco reflectivo
Limpieza de Cunetas	Golpes por objetos, atrapamiento, caida a distinto nivel	Uso de casco, guantes de cuero, botas de seguridad, chaleco reflectivo

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

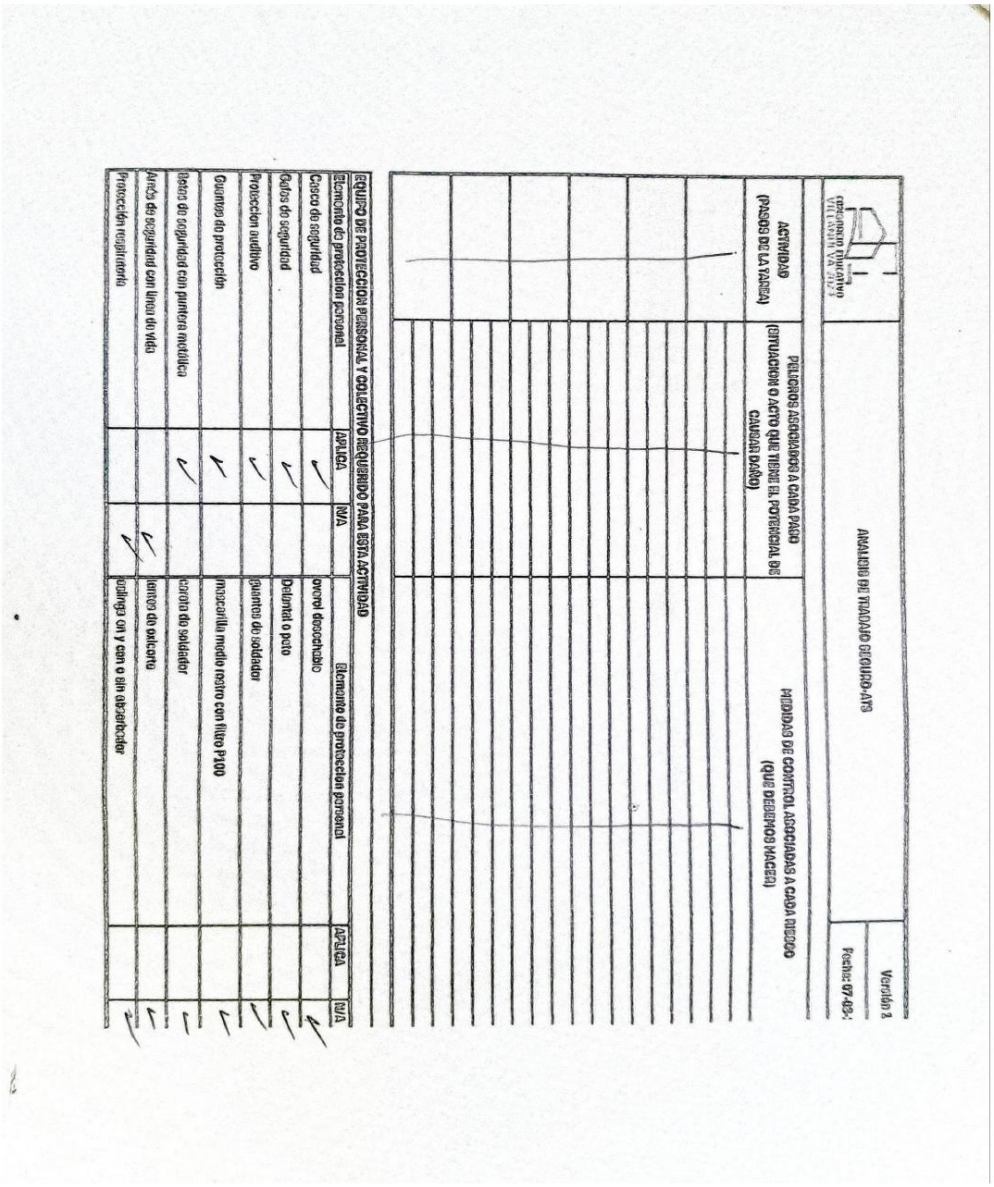

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS

Versión 1


Fecha: 07-05-

ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO REQUERIDO PARA ESTA ACTIVIDAD					
Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A	Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A
Casco de seguridad	✓		Overol desechable		✓
Gafas de seguridad	✓		Delantal o peto		✓
Proteccion auditiva	✓		guantes de soldador		✓
Guantes de proteccion	✓		mascarilla medio rostro con filtro P100		✓
Botas de seguridad con puntera metalica	✓		careta de soldador		✓
Arnés de seguridad con linea de vida		✓	lentes de policarbo		✓
Protección respiratoria		✓	polainas con y sin o sin abrefacil		✓

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

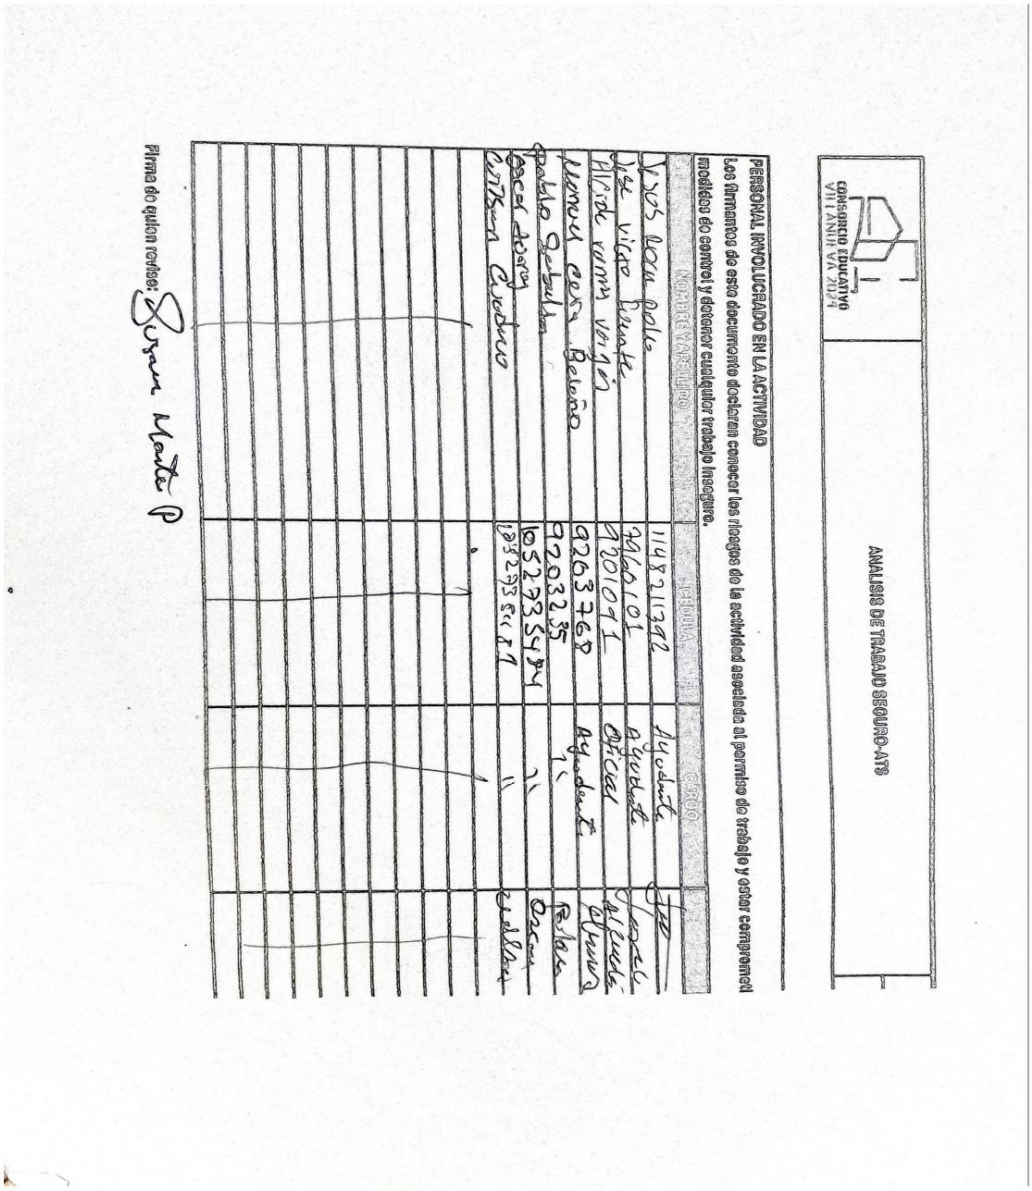

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD


Los firmantes de este documento declaran conocer los riesgos de la actividad asociada al permiso de trabajo y estar comprometi modelos de control y detonar cualquier trabajo inseguro.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	
Yesis Rosa Polo	1143211392	Ayudante	
Jose Vicente Duarte	7460101	Ayudante	
Alcides Ramos Vargas	7201071	Oficial	
Nemesio Cera Beleño	9203768	Ayudante	
Pablo Sebastian	9203235	Ayudante	
Oscar Arroyo	1052733584	Ayudante	
Carlos Cuadro	1052733511	Ayudante	

Firma de quien revisa:

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

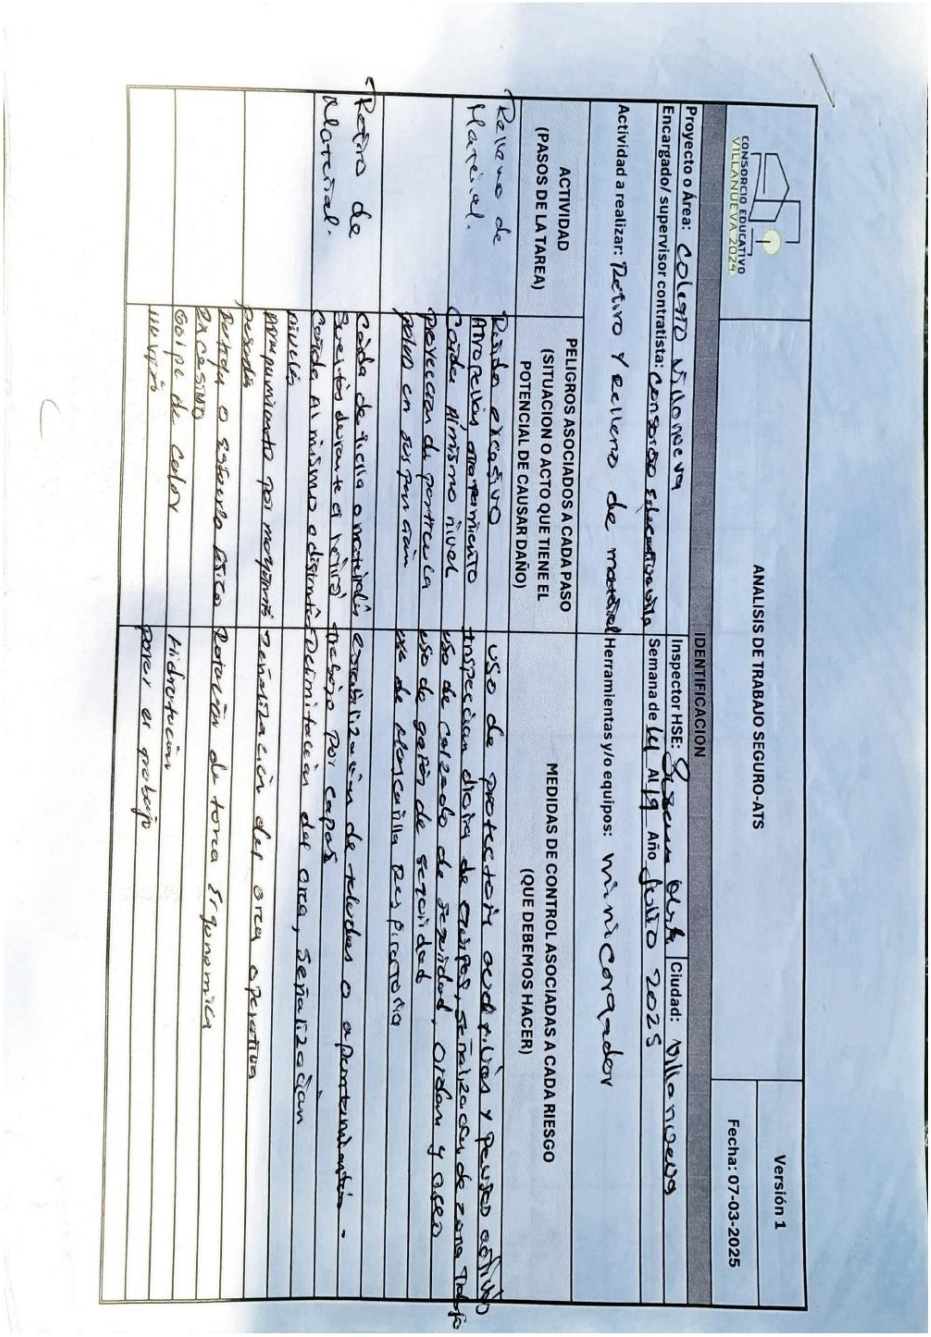

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS

Versión 1

Fecha: 07-03-2025

IDENTIFICACION

Proyecto o Área: Colegio Villanueva — Ciudad: Villanueva

Encargado/ supervisor contratista: Centro Educativo — Inspector HSE: Steven Ruiz


Actividad a realizar: Retiro y relleno de material — Semana de 14 AL 19 — Año julio 2025

Herramientas y/o equipos: Minicargador

ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)
Relleno de Material.	Riesgo eléctrico Atropellos, aplastamiento Caída mismo nivel Proyección de partículas Ruido en las operaciones	uso de protección auditiva y Pausas activas Inspección diaria de equipos, señalización de zona de trabajo uso de calzado de seguridad, orden y aseo uso de gafas de seguridad uso de silenciador en escape
Retiro de Material.	Caída de distinto o mismo nivel Golpes durante el retiro por caídas caída al mismo o distinto nivel Atrapamiento por movimientos	Estabilización de taludes o apuntalamiento. Delimitación del área de operación señalización
	Postura o esfuerzo físico Exposición a COVID Golpe de calor Hidratación	Protección de torre eléctrica Pausas activas Hidratación poner el relevo

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

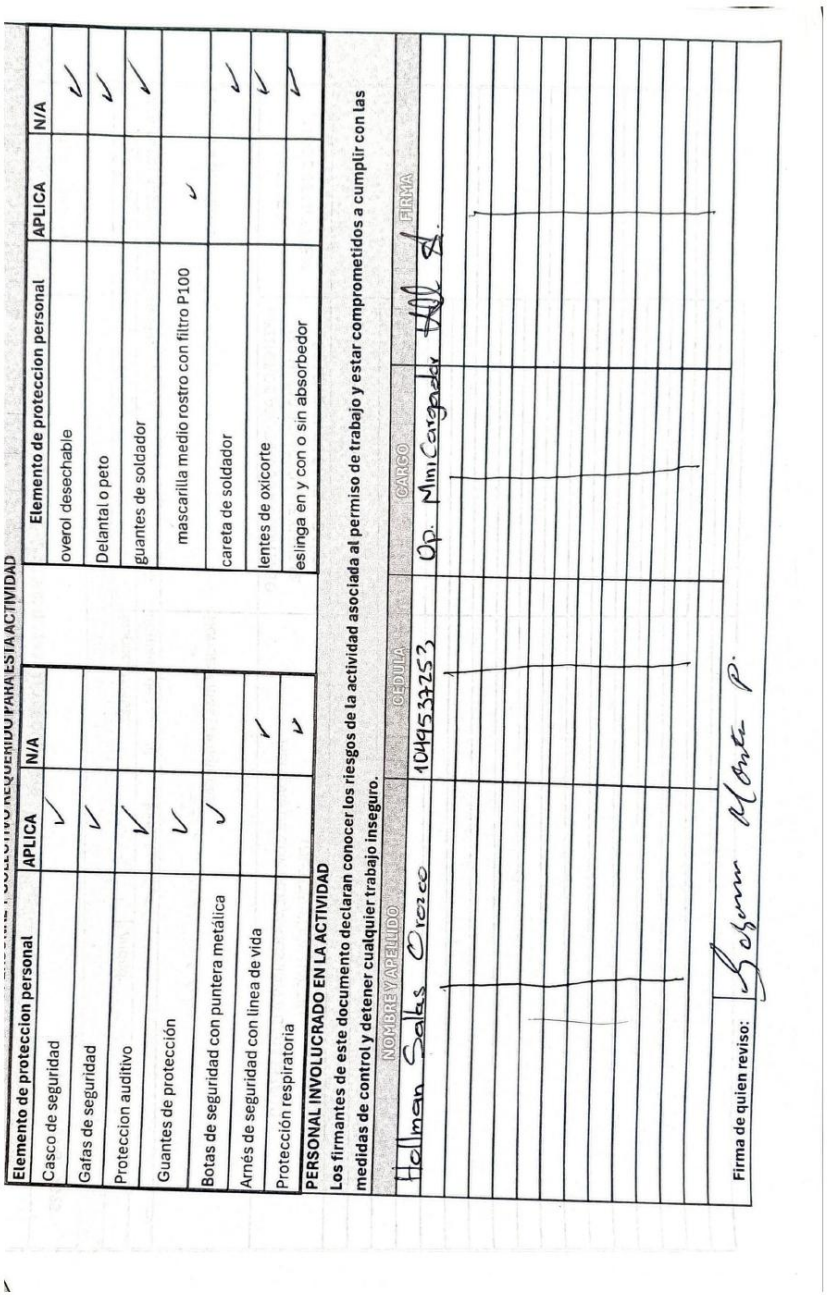


Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A
Casco de seguridad	✓	
Gafas de seguridad	✓	
Proteccion auditivo	✓	
Guantes de protección	✓	
Botas de seguridad con puntera metálica	✓	
Arnés de seguridad con linea de vida		✓
Protección respiratoria		✓

Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A
overol desechable		✓
Delantal o peto		✓
guantes de soldador		✓
mascarilla medio rostro con filtro P100	✓	
careta de soldador		✓
lentes de oxicorte		✓
eslinga en y con o sin absorbedor		✓

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

Los firmantes de este documento declaran conocer los riesgos de la actividad asociada al permiso de trabajo y estar comprometidos a cumplir con las medidas de control y detener cualquier trabajo inseguro.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FIRMA
Hellman Salas Orozco	1049533253	Op. Mini Cargador	

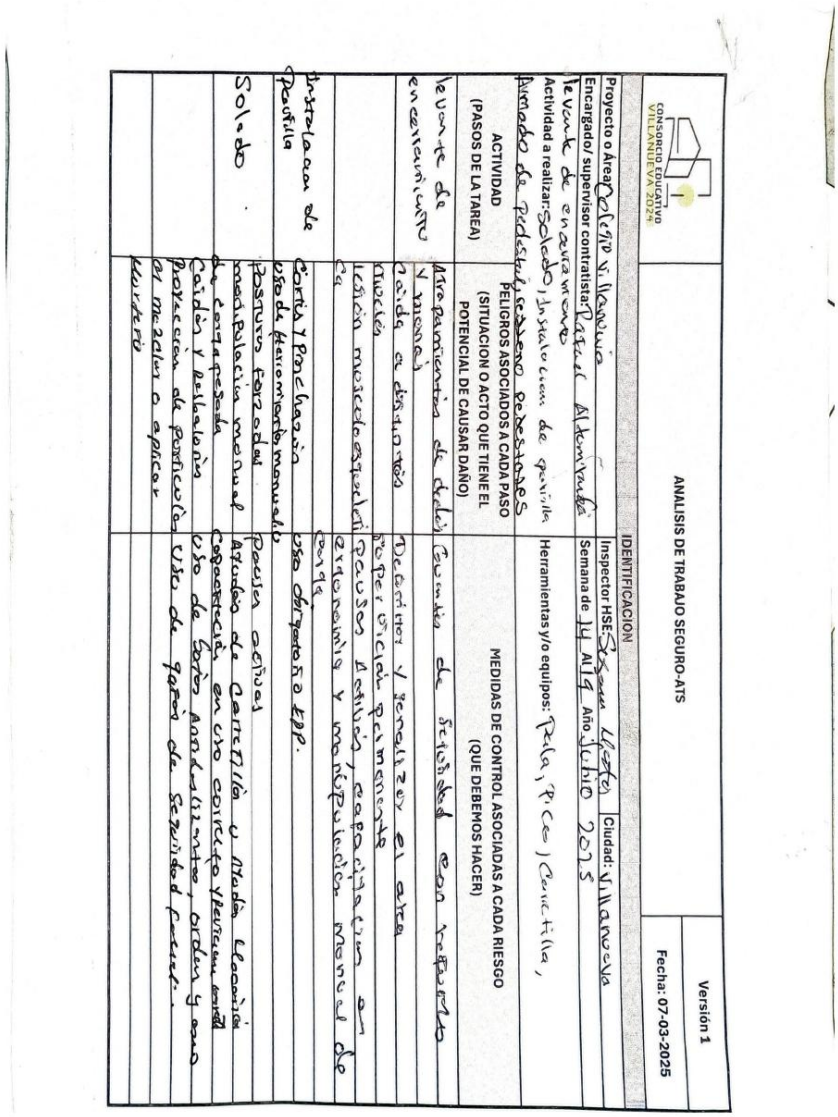

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS

Versión 1

Fecha: 07-03-2025

IDENTIFICACION

Proyecto o Area: Colegio Villanueva — Ciudad: Villanueva

Encargado/ supervisor contratista: Daniel Alderviedo — Inspector HSE: Jesus Lopez

Semana de: Jul AIA — Año: Julio 2025

Actividad a realizar: Soldado, instalaciones de gaviles

Herramientas y/o equipos: Pela, Pico y Cepillo,

Pintado de pedestales, pedestales

ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)
Verificar el encerramiento	Atrapamientos de dedos y manos	Verificar el estado del area de trabajo
	Caida de distinto nivel	Delimitar y señalizar el area
	Ruido	Uso de protección permanente
	Lesión musculoesqueletica	Pausas activas y rotación de personal
Instalacion de Cortina y Pedestal	Contacto con objetos o EPP.	Uso de guantes
Uso de herramientas manuales	Posturas forzadas	Pausas activas
Soldado	Proyección de particulas	Uso de careta y guantes
	Contacto con electricidad	Verificar el estado de los cables
	Caida y Resbalones	Uso de botas antideslizantes, orden y aseo
	Proyección de particulas	Uso de gafas de seguridad
	Al medir o aplicar pintura	

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO REQUERIDO PARA ESTA ACTIVIDAD

Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A		Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A
Casco de seguridad	✓			overol desechable		✓
Gafas de seguridad	✓			Delantal o peto		✓
Proteccion auditivo	✓			guantes de soldador		✓
Guantes de protección	✓			mascarilla medio rostro con filtro P100		✓
Botas de seguridad con puntera metálica	✓			careta de soldador		✓
Arnés de seguridad con linea de vida		✓		lentes de oxicorte		✓
Protección respiratoria		✓		eslinga en y con o sin absorbedor		✓


PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

Los firmantes de este documento declaran conocer los riesgos de la actividad asociada al permiso de trabajo y estar comprometidos a cumplir con las medidas de control y detener cualquier trabajo inseguro.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FIRMA
Wilson Cuadro Ruiz	1052733484	obrero	
Marlon Mejias Perez	7960544	obrero	MARLON
Oscar Tovar O.	1.052733.134	Obrero	
Jesus Pacheco M.	1052854797	obrero	
Edwin Mauricio Mendoza	7322044	Coordinador	
Alfredo Antonio Martinez	1042756536	[illegible]	
Jose L. Martinez	7940101	[illegible]	
Wilmer Cabo Pelaez	9203763	Obrero	
Juan V. Hoyos	9202714	Oxicorte	
Gabriel C. P.	7959815	AY	
Firma de quien reviso:	Jhon Uribe P		

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

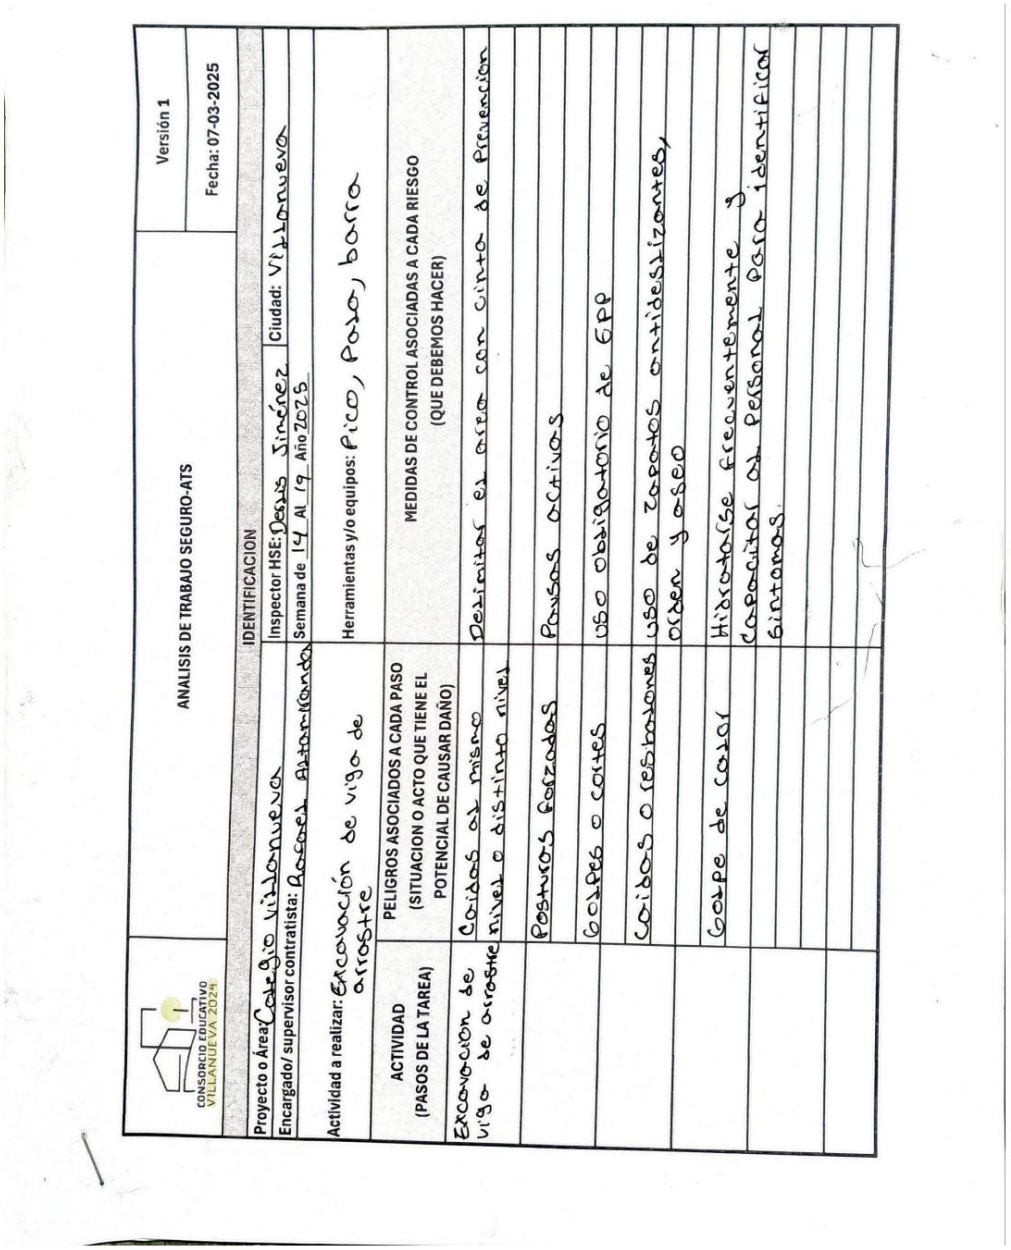

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO-ATS

Versión 1

Fecha: 07-03-2025

IDENTIFICACION

Proyecto o Área: Colegio villanueva — Inspector HSE: Jesus Jiménez — Ciudad: Villanueva


Encargado/ supervisor contratista: Rocoes Autorcondo — Semana de 14 Al 19 Año 2025

Actividad a realizar: Excavación de viga de arrostre — Herramientas y/o equipos: Pico, Pozo, barra

ACTIVIDAD (PASOS DE LA TAREA)	PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO (SITUACION O ACTO QUE TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO)	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO (QUE DEBEMOS HACER)
Excavacion de viga de arrostre	Caidas al mismo nivel o distinto nivel	Delimitar el area con cinta de Preseccion
	Posturas forzadas	Pausas activas
	Golpes o cortes	uso obligatorio de EPP
	Caidos o resbalones	uso de zapatos antideslizantes, orden y aseo
	Golpe de calor	Hidratarse frecuentemente y capacitar al personal para identificar sintomas.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

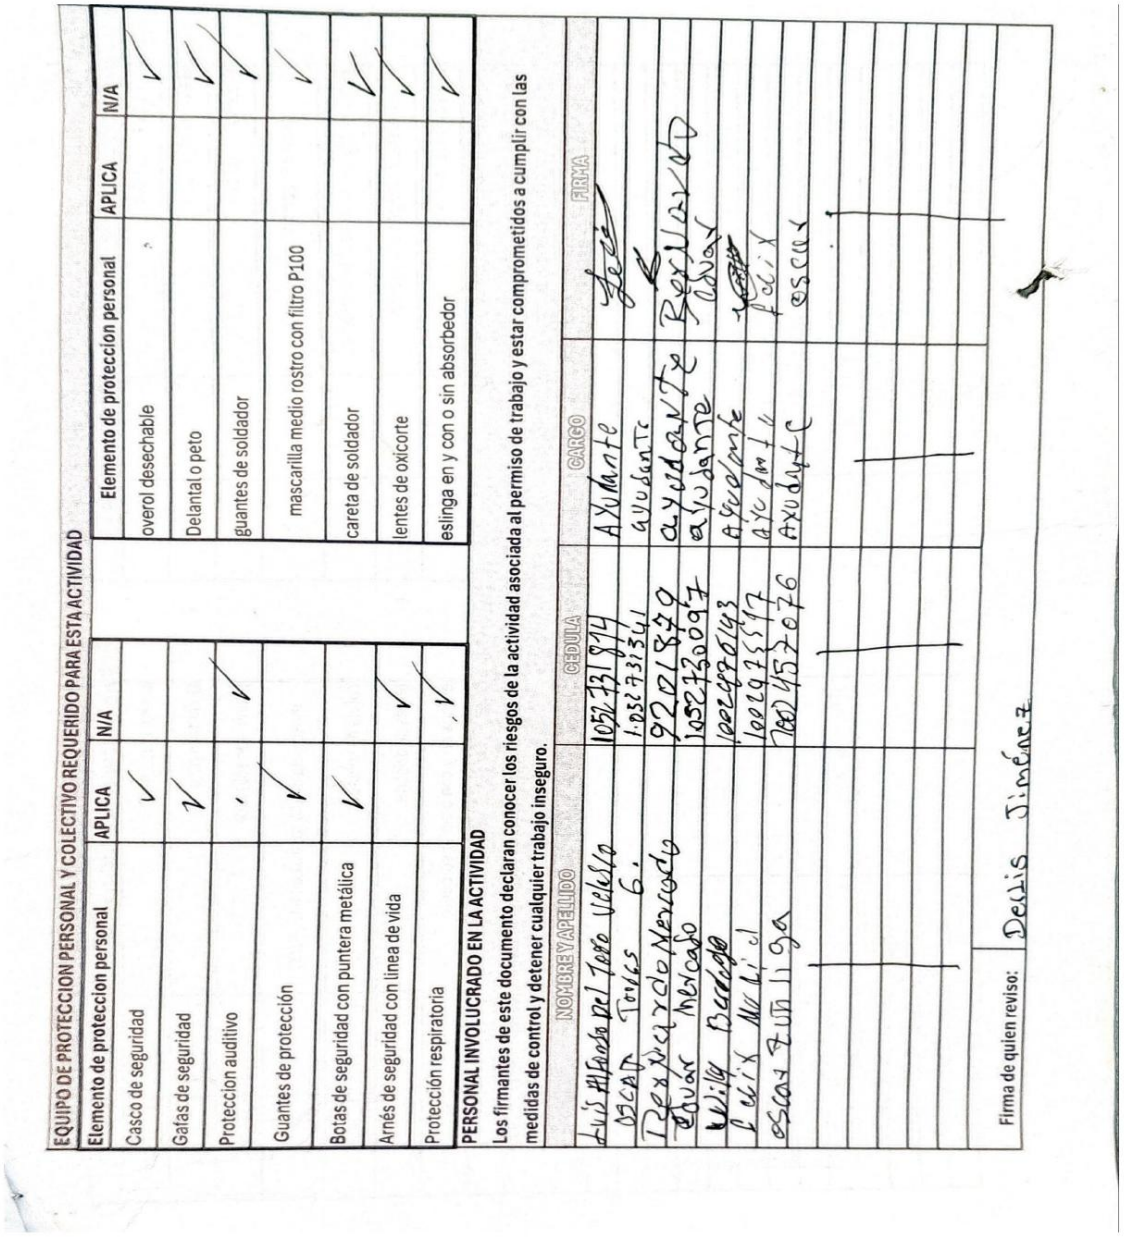

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO REQUERIDO PARA ESTA ACTIVIDAD

Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A
Casco de seguridad	✓	
Gafas de seguridad	✓	
Proteccion auditivo	✓	✓
Guantes de protección	✓	
Botas de seguridad con puntera metálica	✓	
Arnés de seguridad con línea de vida		✓
Protección respiratoria		✓

Elemento de proteccion personal	APLICA	N/A
overol desechable		✓
Delantal o peto		✓
guantes de soldador		✓
mascarilla medio rostro con filtro P100		✓
careta de soldador		✓
lentes de oxicorte		✓
eslinga en y con o sin absorbedor		✓

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

Los firmantes de este documento declaran conocer los riesgos de la actividad asociada al permiso de trabajo y estar comprometidos a cumplir con las medidas de control y detener cualquier trabajo inseguro.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FIRMA
Luis Alfredo del Toro Valdelo	1052731814	Ayudante	
OSCAR Torres G.	1.052.731.541	ayudante	
Jesus Mercado	92021879	ayudante	
Edwar Mercado	1052730097	ayudante	
Willy Barrios	1002970143	Ayudante	
Luis M.	1002975517	Ayudante	
oscar Tuñon	7801152076	Ayudante	
Firma de quien revisa:	Dennis Jiménez		

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

ONSORCIO EDUCATIVO
/ILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN | CHARLA DE 5 MINUTOS: X | REUNIÓN | FECHA: 04/07/2025

RA DE INICIO: 7:00 Am | HORA FINAL: 5:pm | NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Susana Monte


GAR: Colegio Villanueva | FIRMA DEL INSTRUCTOR: Susana Monte P.

TEMA: Inspección preoperacional de maquinaria y herramientas

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Manuel cera	9203768	Manuel
2	MARION Reales	7960 544	MARION
3	OSCAR Torres 6	1.052731541	
4	Wilson Cuadro Cortez	1052735480	
5	Luis Apolinar M.	1052734797	
6	Dervis Dias Hanans	7192742673	Dervis Dias
7	Jorge polo	6632964	Jorge polo
8	Jaidi polo	1002975866	Jaidi polo
9	gustavo Almeida	9207	
10	Bernardo Mercado	9201879	Bernardo
11	oscar Borriga	1002475076	oscar
12	Luis Villarreal	9202314	Luis V
13	Cosme PINA	9201689	Cosme
14	Jesús David	1048392	Jesús
15	Pablo Saba	9203235	
16	Alfredo Pinto	9201 090	
17	Luis Enrique Ortiz Ulloa	1024754	
18	Dervis Jiménez Blanco	1048437853	Dervis Jiménez
19		7960101	
20	NEURO ANTONIO	1064275 36	FERNANDEZ
21	Dervis Jimenez Blanco	1048437853	Dervis Jimenez
22			
23			
24			
25			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

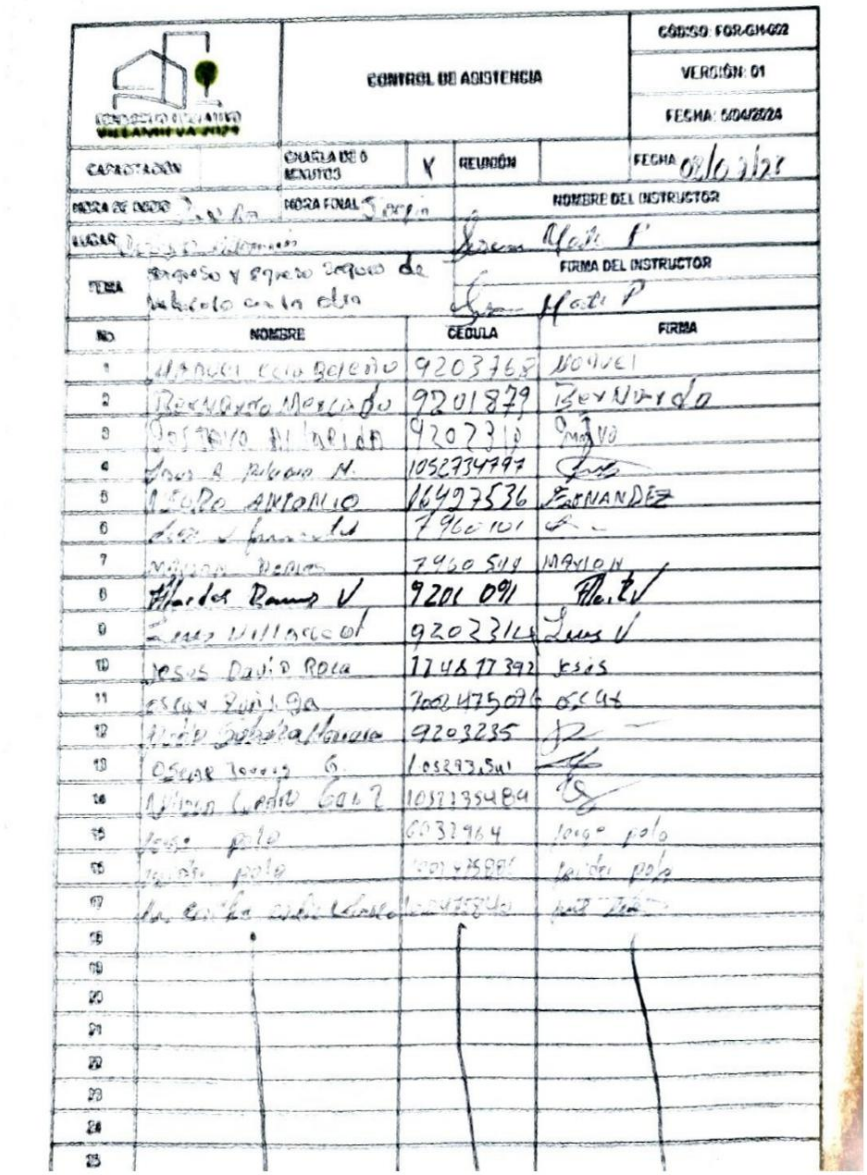

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 10/4/2024

CAPACITACIÓN | CHARLA DE 5 MINUTOS | X | REUNIÓN | FECHA 01/07/2025

HORA DE INICIO 7:00 a.m. | HORA FINAL 5:00 p.m. | NOMBRE DEL INSTRUCTOR

LUGAR Diferentes sedes | FIRMA DEL INSTRUCTOR

TEMA Ingreso y egreso segun de labores en la obra

NO	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Manuel Celis Bolaño	9203765	MANUEL
2	Bernardo Mercado	9201879	Bernardo
3	Jose Pitalua	9207310	
4	Jose A Pitalua N.	1052734797	
5	Isidro Antonio	16927536	FERNANDEZ
6		7960101	
7		7960514	MAYLON
8	Hector Ramos V	9201091	
9	Luis Villalobos	9202316	
10	Jesus David Rois	1148177392	
11		1002475096	
12		9203235	
13		1052933541	
14		1052735484	
15		6032964	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN | CHARLA DE 5 MINUTOS: X | REUNIÓN | FECHA: 9/07/25

HORA DE INICIO: 7:00 Am | HORA FINAL: 5:00 pm | NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Josean Monte P

LUGAR: Colegio Villanueva | FIRMA DEL INSTRUCTOR: Josean Monte P.

TEMA: Golpe de calor

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Manuel Cerra Beleño	9203768	Manuel
2	Pablo Sabalza Herrera	9203235	
3	Heides Ruiz V	9201 091	
4	Wilson Cuadro Galiz	1052733488	Wilson
5	Bernardo Mercado	9201879	Bernardo
6	Luis Villarreal	9202314	Luis V.
7	Jesus V Fernandez	496101	
8	Jesus David Roca	1148 72392	Jesus
9	Gustavo Almeida	9.202317	
10	Jorge polo	6632964	jorge polo
11	Jaider polo	1002475886	jaider polo
12			
13	Jesus A Palomo M.	1052734797	
14	NEURO ANTONIO	16427536	HERNANDEZ
15	MARION REALES	7960 544	MARION
16	luis emilio CHARRIS	1002475840	luis charris
17	Denis Jiménez	1048937853	Denis Jiménez
18	Eduardo mena	8167129	Eduardo mena
19	Sola Orozco	1049537253	
20	Luis Daniel Blanco	1043509878	Luis Blanco
21	Cristian Berrio	1148431120	Cristo
22	Deivis Arias	1112726263	Deivis
23			
24			
25			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN	FECHA: 10/07/25
HORA DE INICIO: 2:00 pm		HORA FINAL: 5:00 pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR	
LUGAR: Colegio Villanueva				Johana Marte P.	
TEMA: Seguridad en escaleras y caídas				FIRMA DEL INSTRUCTOR	

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	pablo Sobalza	9203235	
2	Bernardo Mercado	9201879	Bernardo
3	Luis Villarreal	9202314	Luis V
4	Gustavo Olmeda	9202313	Gustavo
5	Jesus A. palomino M.	1052734797	
6	Heiderl Ramos	9201 091	
7	Manuel Ceca Beleño	9203768	Manuel
8	Jorge polo	6692969	Jorge polo
9	Jaider polo	1002475886	Jaider polo
10	Hellman Salas Orozco	1049537253	
11	Luis Emilio Ortiz Velasco	1002475840	Luis Ortiz
12	Dersis Jiménez Blanco	1048437853	Dersis Jiménez
13	Luis Villarreal	9202314	Luis V.
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN | CHARLA DE 5 MINUTOS | V | REUNIÓN | FECHA: 11/07/2025

HORA DE INICIO: 7:00 Am | HORA FINAL: 5:00 pm | NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Liliana Montes

LUGAR: Colegio Villanueva | FIRMA DEL INSTRUCTOR

TEMA: Proteccion respiratoria

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Jose V Iguetes	7960101	
2	NEURO ANTONIO	16427536	FERNANDEZ
3	MARLON DORIOS	7960544	MARLON
4	Bernardo Mercado	9201879	Bernardo
5	GUSTAVO Almeida	9202313	
6	Manuel Cera Bolano	9203765	Manuel
7	Luis Villarreal	9202314	Luis
8	Wilson Cuadro Cadiz	1037735484	
9	Helena Salas Orozco	1049537253	
10	OSCAR ZUÑIGA	7.002452076	OSCAR
11	Luis A palacio R.	1052734797	
12	OSCAR Torres G.	1.057731501	
13	Pablo Sabalza Herrera	9203255	
14	Alcides Ramos V	9201091	
15	Johnny MARIA MUÑOZ	7922073	
16	Jose Enrique Cruz Velasco	1002455840	
17	Dennis Jiménez	1048437853	Dennis Jiménez
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA


CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 6/04/2024

CAPACITACIÓN	CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN	FECHA 12/07/25
HORA DE INICIO 7:20 Am	HORA FINAL 5:00 pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR	
LUGAR Colegio Villanueva			Susana María P.	
TEMA Acoso y conductas [illegible]			FIRMA DEL INSTRUCTOR	

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Alfredo Camilo V	9201 091	
2	Oscar Jorge G.	1052733341	
3	José V Jiménez	7960[illegible]	
4	Dino Villafuerte	9202314	
5	Jairo R. Palacio M.	1052734797	
6	Pablo Sabalza Herrera	9203255	
7	Manuel Cruz Bolaño	9203768	
8	Nelson Andrés Cadiz	1052755489	
9	Marlon Benitez	7960 544	MARLON
10	Hellman Yesid Salas O	1049537253	
11	Negro ANTONIO	16927536	FERNANDEZ
12	Luis Emilio Cruz Velasco	1002475840	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

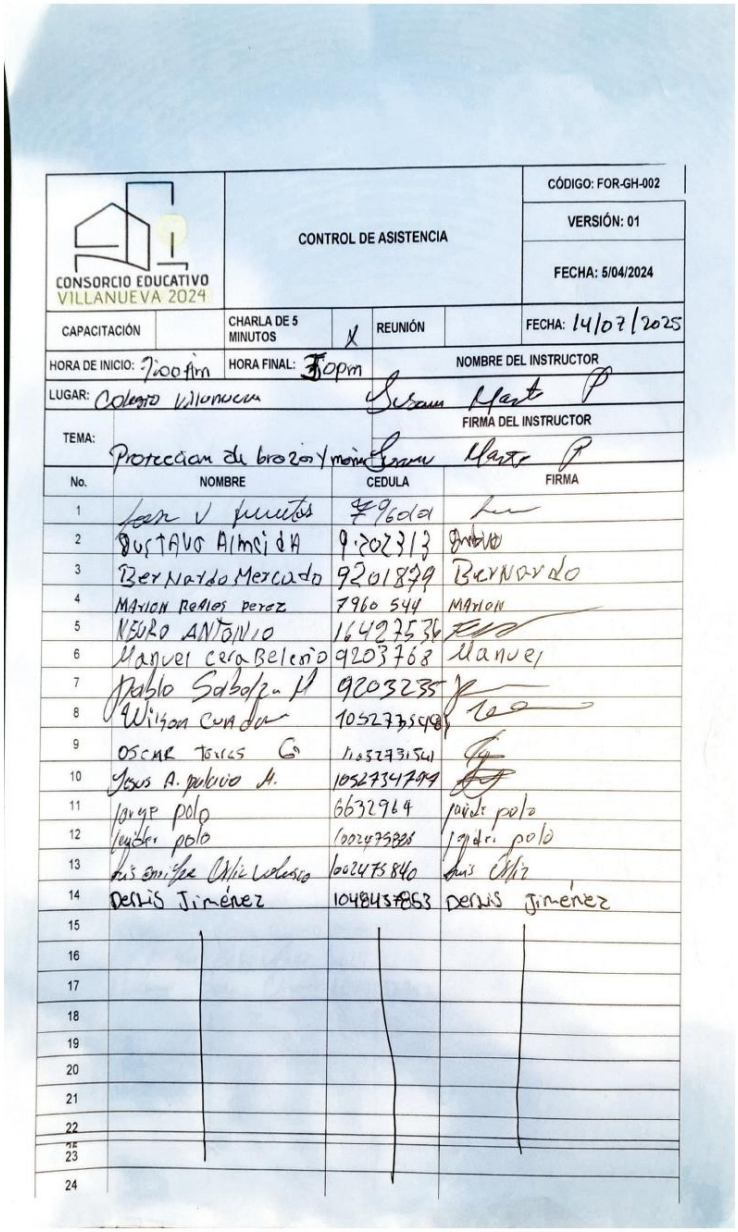

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN | CHARLA DE 5 MINUTOS: X | REUNIÓN | FECHA: 14/07/2025

HORA DE INICIO: 7:00 am | HORA FINAL: 3 opm | NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Jesus Martinez P


LUGAR: Colegio Villanueva | FIRMA DEL INSTRUCTOR: Jesus Martinez P

TEMA: Proteccion de brazos y manos

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Jesus V Fuentes	7960	
2	GUSTAVO ALMEIDA	9.202313	
3	Bernardo Mercado	9201879	BERNARDO
4	MARION REALES PEREZ	7960 544	MARION
5	NESTOR ANTONIO	1642753[illegible]	
6	Manuel Cera Belen	9203768	Manuel
7	Pablo Sabala M	9203235	
8	Wilson Cundar	1052735[illegible]	
9	OSCAR TORRES G	1052731[illegible]	
10	Jesus A. Polivio M.	1052734799	
11	Jorge polo	6632964	Jorge polo
12	Leyder polo	1002473328	Leyder polo
13	Luis Enrique Ortiz Salcedo	1002475840	Luis Ortiz
14	DENIS Jiménez	1048457853	DENIS Jiménez
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

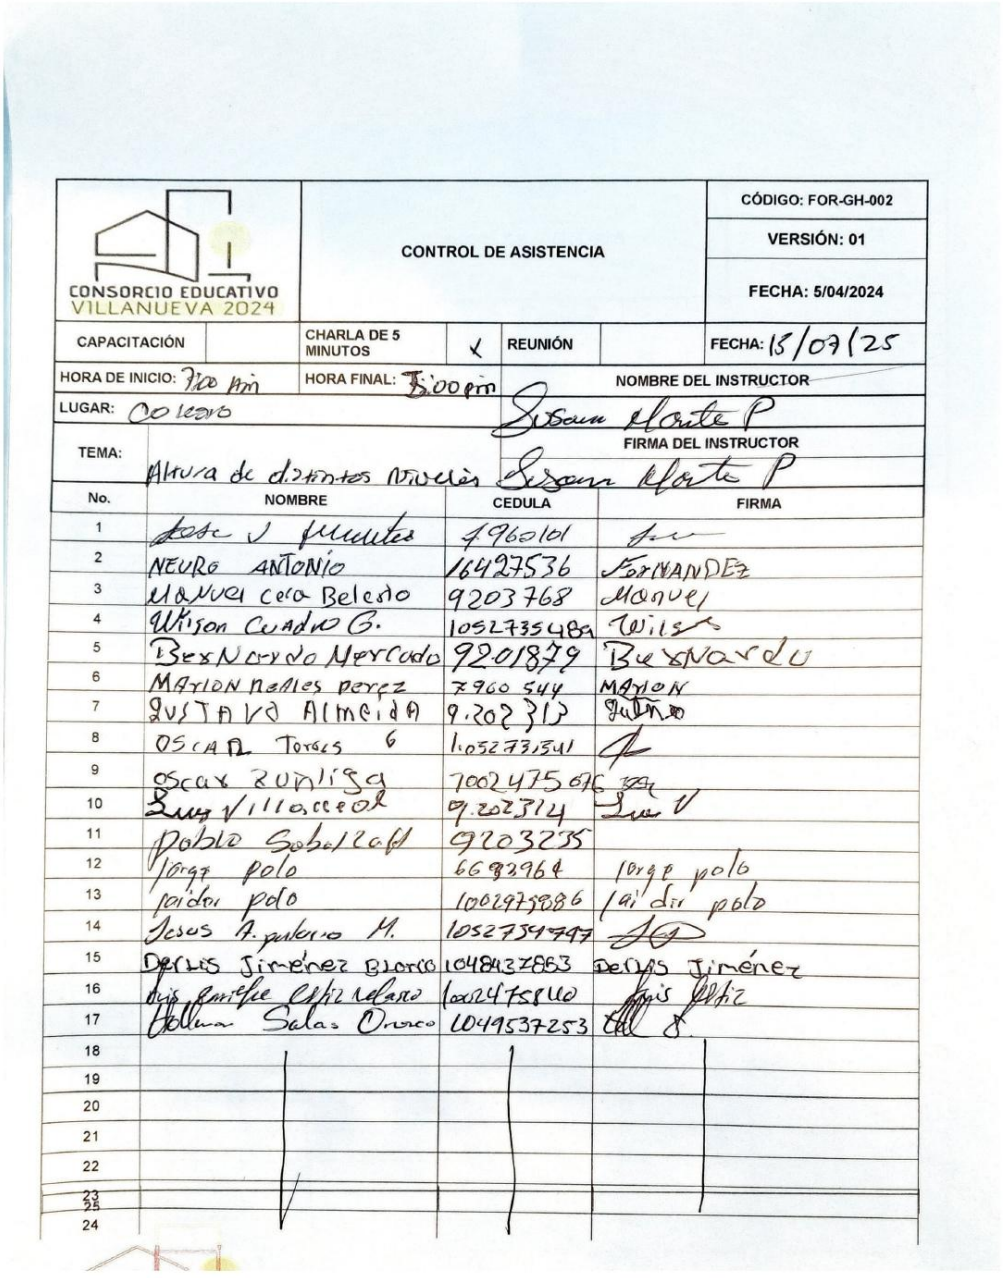

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA


CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	✓	REUNIÓN	
FECHA: 15/07/25					
HORA DE INICIO: 7:00 am		HORA FINAL: 3:00 pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Susana Marte P	
LUGAR: Colegio				FIRMA DEL INSTRUCTOR: Susana Marte P	
TEMA: Altura de distintos niveles					

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Jose J Fuentes	7960101	
2	NEURO ANTONIO	16427536	FERNANDEZ
3	MANUEL cera Beleño	9203768	Manuel
4	Wilson Cuadro G.	1052735484	Wilson
5	BerNardo Mercado	9201879	BerNardo
6	MARION Nelles perez	7960544	MARION
7	GUSTAVO ALMEIDA	9.202.313	Gustavo
8	OSCAR Torres G	1.052.731.341	
9	Oscar Zuñiga	1002475676	
10	Luis Villarreal	9.202.314	Luis V
11	Pablo Sabalsoff	9203235	
12	Jorge polo	66.923.964	Jorge polo
13	jaider polo	1002475886	jaider polo
14	Jesus A. palencia M.	1052734747	
15	Derlis Jiménez Blanco	1048437863	Derlis Jiménez
16	Luis Daniel Ortiz Alvarez	1002475840	Luis Ortiz
17	Hellman Salas Orozco	1049537253	
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

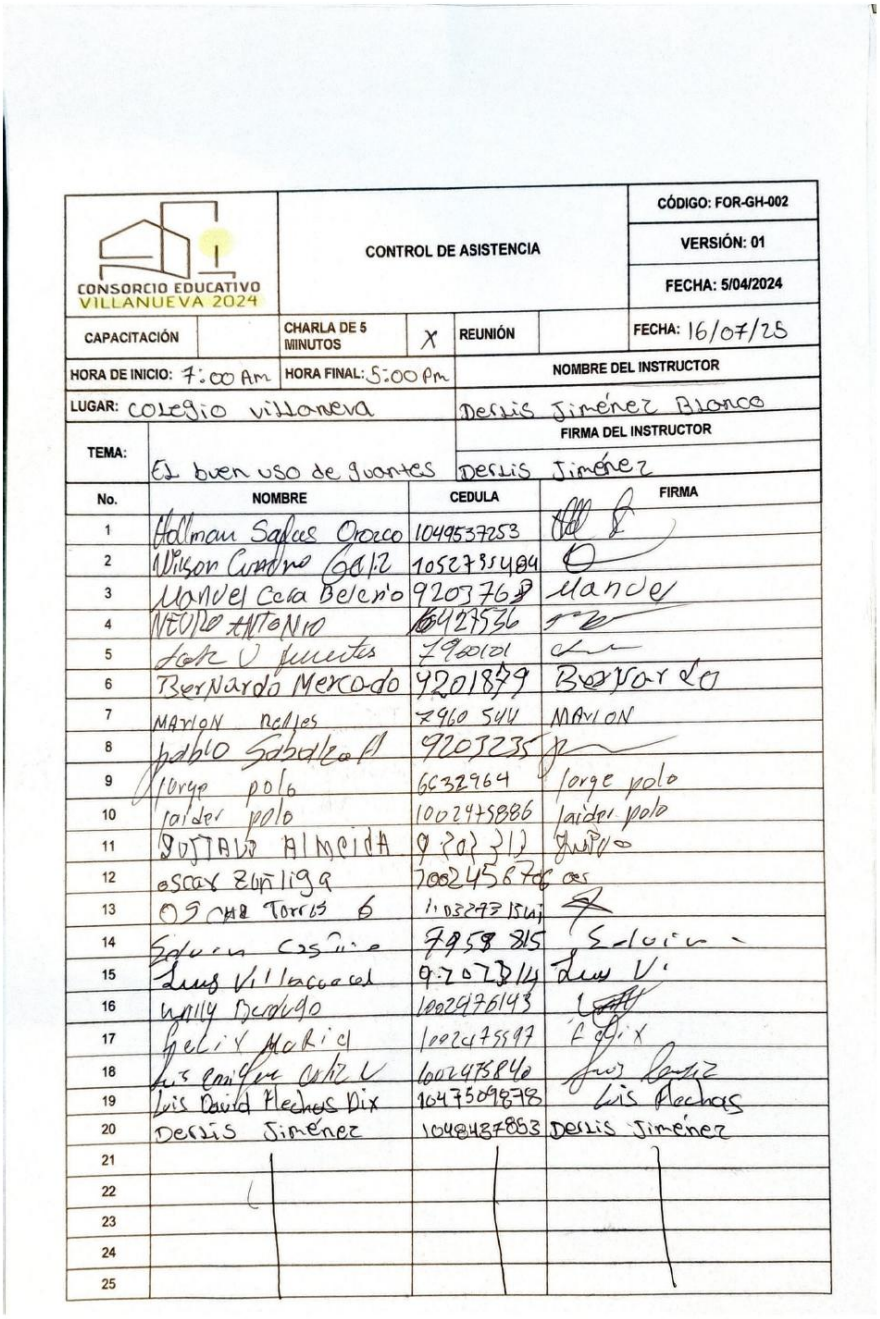

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-GH-002
	VERSIÓN: 01
	FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN | CHARLA DE 5 MINUTOS: X | REUNIÓN | FECHA: 16/07/25

HORA DE INICIO: 7:00 Am | HORA FINAL: 5:00 Pm | NOMBRE DEL INSTRUCTOR


LUGAR: Colegio villanueva | Dersis Jiménez Blanco

TEMA: El buen uso de guantes | FIRMA DEL INSTRUCTOR: Dersis Jiménez

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Hollman Safdes Orozco	1049537253	
2	Wilson Cuadro Gaviz	1052735484	
3	Manuel Cera Belen'o	9203768	Manuel
4	NEURO ANTONIO	6429536	
5	Jose V fuentes	7900101	
6	Bernardo Mercado	9201879	Bernardo
7	MARLON Nelles	7960 544	MARLON
8	pablo Sabaleta	9203235	
9	Jorge polo	6632964	Jorge polo
10	jaider polo	1002475886	jaider polo
11	DOJTALA ALMEIDA	9 20 3 11	
12	oscar Zuñiga	7002456706	os
13	OSCAR Torres G	1.03293154	
14	Eduin Cossio	7958 815	Eduin
15	Luis Villacorta	9.207.814	Luis V.
16	Wally Bendezu	1002476143	
17	Felix Mario	1002475597	Felix
18	Luis enrique ortiz V	1002475846	Luis Ortiz
19	Luis David Flechas Dix	1047509878	Luis Flechas
20	Dersis Jiménez	1048487863	Dersis Jiménez
21			
22			
23			
24			
25			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

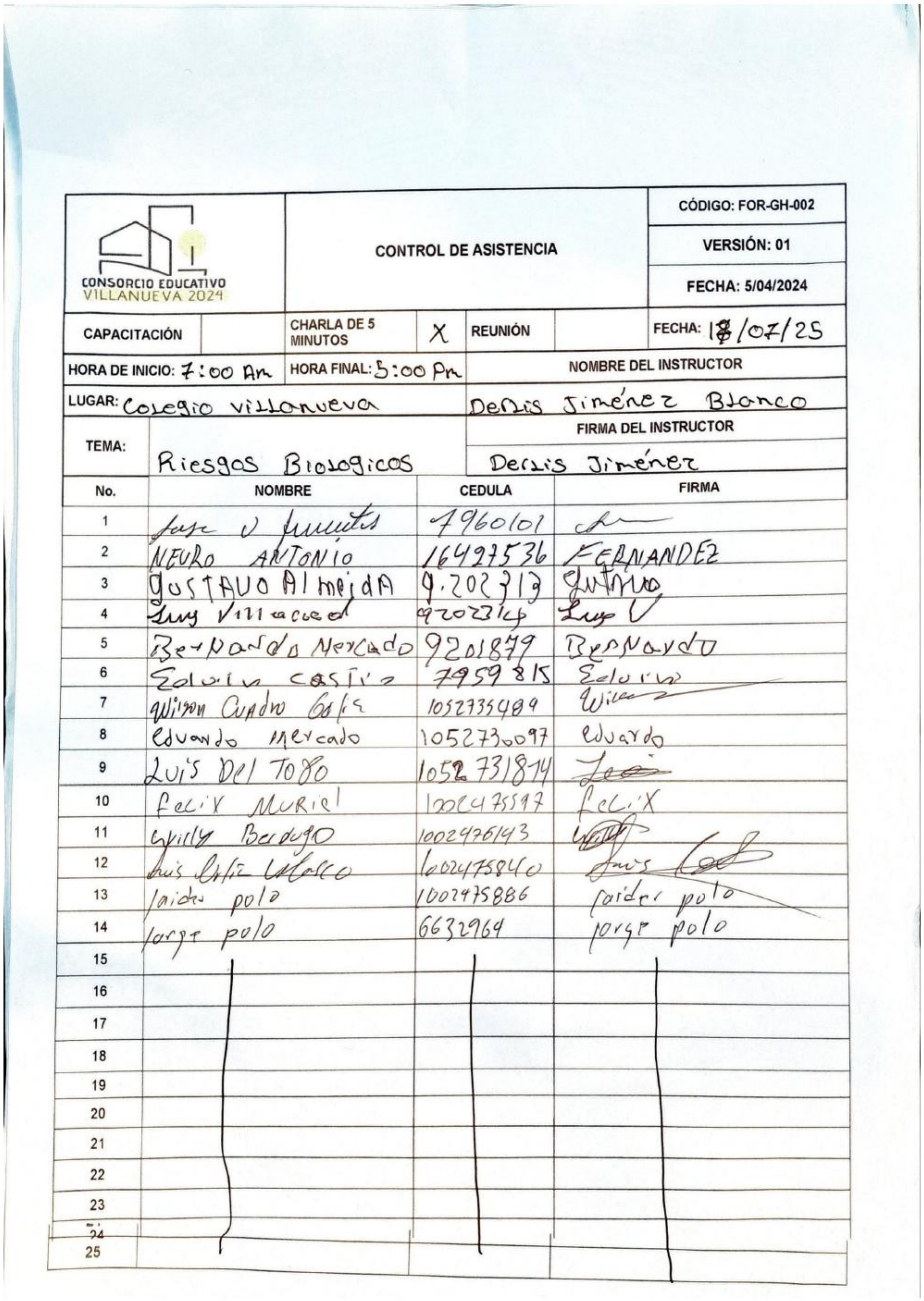

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA


CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN		FECHA: 18/07/25
HORA DE INICIO: 7:00 Am		HORA FINAL: 5:00 Pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR	
LUGAR: Colegio villanueva				Denis Jiménez Blanco	
TEMA:	Riesgos Biologicos			FIRMA DEL INSTRUCTOR	
				Denis Jiménez	

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Jose V Juncitos	7960101	
2	NEURO ANTONIO	16427536	FERNANDEZ
3	GUSTAVO Almeida	9.202.313	Gustavo
4	Luis Villacob	9202314	Luis V
5	Bernardo Mercado	9201879	Bernardo
6	Edwin castro	7959815	Edwin
7	Wilson Cuadro Cafe	1052735489	Wilson
8	Eduardo mercado	1052730097	Eduardo
9	Luis Del Toro	1052731814	Luis
10	Felix Muriel	1002475917	Felix
11	Willy Berdugo	1002476143	Willy
12	Luis Diaz Urueta	1002475840	Luis
13	Jaider polo	1002475886	Jaider polo
14	Jorge polo	6632964	Jorge polo
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

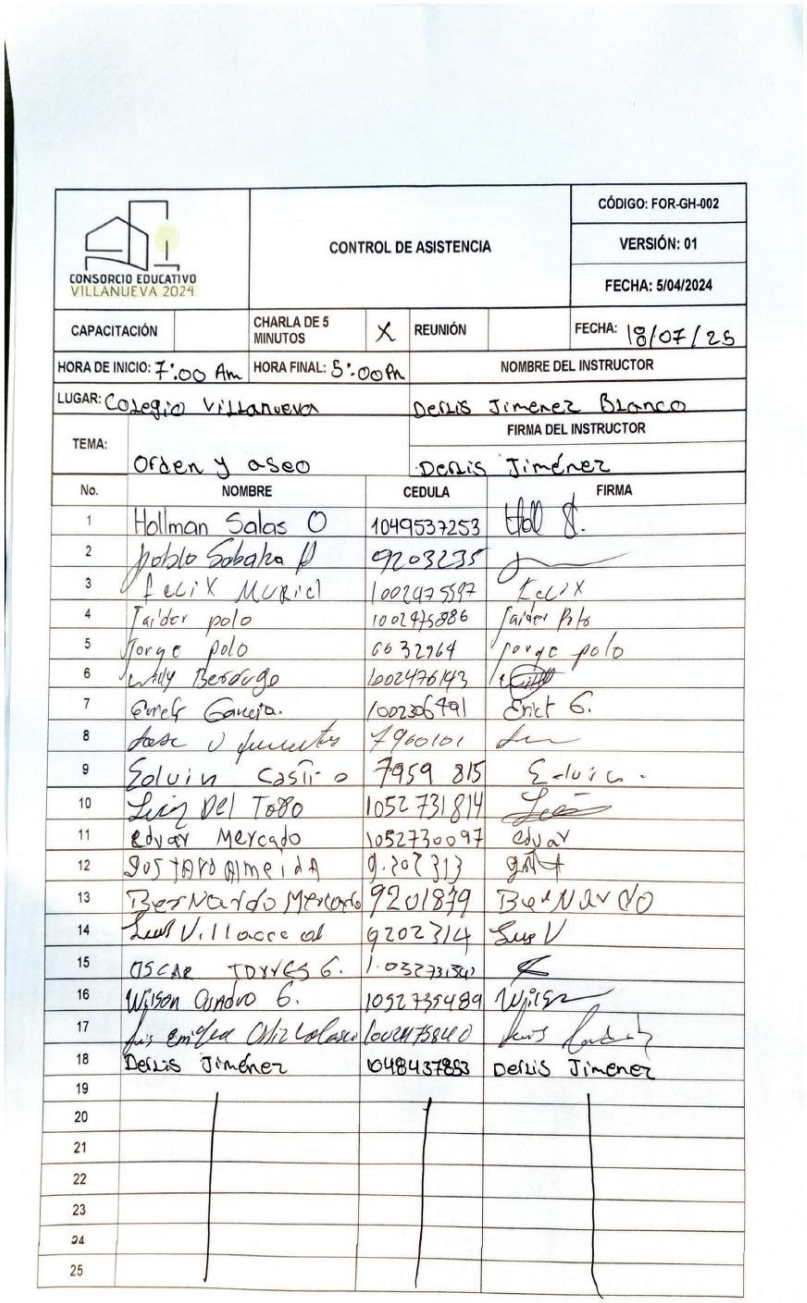

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN		FECHA: 18/07/25
HORA DE INICIO: 7:00 Am		HORA FINAL: 5:00Pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR		
LUGAR: Colegio Villanueva				Deilis Jimenez Blanco		
TEMA: Orden y aseo				FIRMA DEL INSTRUCTOR		

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Hollman Salas O	1049537253	
2	Pablo Sabalza P	92032235	
3	Felix Muriel	1002497597	Felix
4	Yaider polo	1002475886	Yaider Polo
5	Jorge polo	6032764	jorge polo
6	Willy Berrocoso	1002476143	
7	Erick Garcia.	1002365491	Erick G.
8	Jose V Jimenez	7960101	
9	Soluin Castro	7959 815	Soluin.
10	Luis Del Toro	1052 731 814	
11	Edvar Mercado	1052730097	edvar
12	Gustavo Almeida	9.207 313	
13	Bernardo Mercado	9201879	Bernardo
14	Luis V. Villacob	9202314	Luis V
15	Oscar Torres G.	1.032731540	
16	Wilson Cuadro G.	1052735489	Wilson
17	Luis Emilio Ortiz Salcedo	1002475840	
18	Deilis Jiménez	1048437853	Deilis Jimenez
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-GH-002
	VERSIÓN: 01
	FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN		FECHA: 19/07/2025
HORA DE INICIO: 7:00 Am		HORA FINAL: 12:00 Pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR		
LUGAR: Colegio villanueva				Derlis Jimenez Blanco		
TEMA: Pausas activas				FIRMA DEL INSTRUCTOR Derlis Jiménez		

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Gustavo Almeida	9-207-13	
2	Bernardo Mercado	92.01879	Bernardo
3	Luis Alfonso del Toro Velez	1.052.731.814	
4	eduar Mercado orozco	1052730097	eduar
5	Luis Villalobos	9202314	Luis V
6	oscar Torres G.	1.052.731.541	
7	pablo Sabalza Barrera	9203235	
8	Wilson Cuadro Galiz	1052735489	Wilson Cuadro
9	oscar Zuñiga	1.002.457.076	oscar
10	Cesar Cabarcas	1143378054	Cesar.
11	Jorge polo	6632964	Jorge polo
12	Yaider polo	1002478886	Yaider polo
13	Hollman Salas	1049537253	
14	Eduin C P	7959 815	Eduin.
15	Jesus J Jiménez	7960	
16	Willy Burdiga	1002476143	
17	Manuel Cera Belen	9203768	Manuel
18	Marlon Negrete	7980 544	Marlon
19	Luis Emilio Ortiz Mesa	1002475940	
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN | CHARLA DE 5 MINUTOS: X | REUNIÓN | FECHA: 7/07/2025

HORA DE INICIO: 7:00 Am | HORA FINAL: 5:00 pm | NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Susana Mestra P.

LUGAR: Colegio Villanueva

TEMA: Pausas Activas

FIRMA DEL INSTRUCTOR: Susana Mestra P.

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Manuel Celo Beleño	9205768	Manuel
2	Pablo Sabalza Barrera	9203235	
3	Alcides Rano V	9201 09	
4	OSCAR Torres G.	1052731341	
5	Wilson Cuadro Cal.2	1052733488	Wilson
6	Bernardo Mercado	9201879	Bernardo
7	Luis Villalobos	9202314	Luis V
8	José J Fuentes	7960101	
9	Jesus David Roca	1143177792	Jesus
10	GUSTAVO ALMEIDA	9202719	
11	Jorge polo	6632964	Jorge polo
12	Leider polo	1002475886	Leider polo
13	Jose A. Palomo M.	1052734797	
14	NEURO ANTONIO	16427536	FERNANDEZ
15	MARION REALES	7960 544	MARION
16	Luis Emilio Ortiz Velasco	1002475840	
17	Dennis Jiménez Blanco	1048437853	Dennis Jiménez
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA


CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN		FECHA: 08/07/25
HORA DE INICIO: 7:Am		HORA FINAL: 5:00pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR		
LUGAR: Coliseo de Villanueva				Susana Monte P		
TEMA: Pausas activas				FIRMA DEL INSTRUCTOR		
				Susana Monte P		

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Manuel Cera Beleño	9203768	Manuel
2	Bernardo Mercado	9201879	Bernardo
3	Octavio Almeida	9202316	
4	Jose A Polanco M.	1052734794	
5	Neuro Antonio	16427536	
6	Jose V Fuentes	7960101	
7	Marlon Reales	7960544	Marlon
8	Heidy Ruiz V	920. 091	Heidy Ruiz
9	Luis Villarreal	9202324	Luis
10	Jesús David Roca	7748 47397	Jesus
11	oscar Zuñiga	7.002 475 076	oscar
12	pablo Sabalcaldaran	9205235	
13	OSCAR Torres	1.052.73.541	
14	Wilson Cendales	1052 735 489	Wilson
15	Jorge polo	6632969	Jorge polo
16	Jaqueline polo	1002975886	Jaqueline polo
17	Luis Emilio Ortiz Cabrera	1002475840	
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

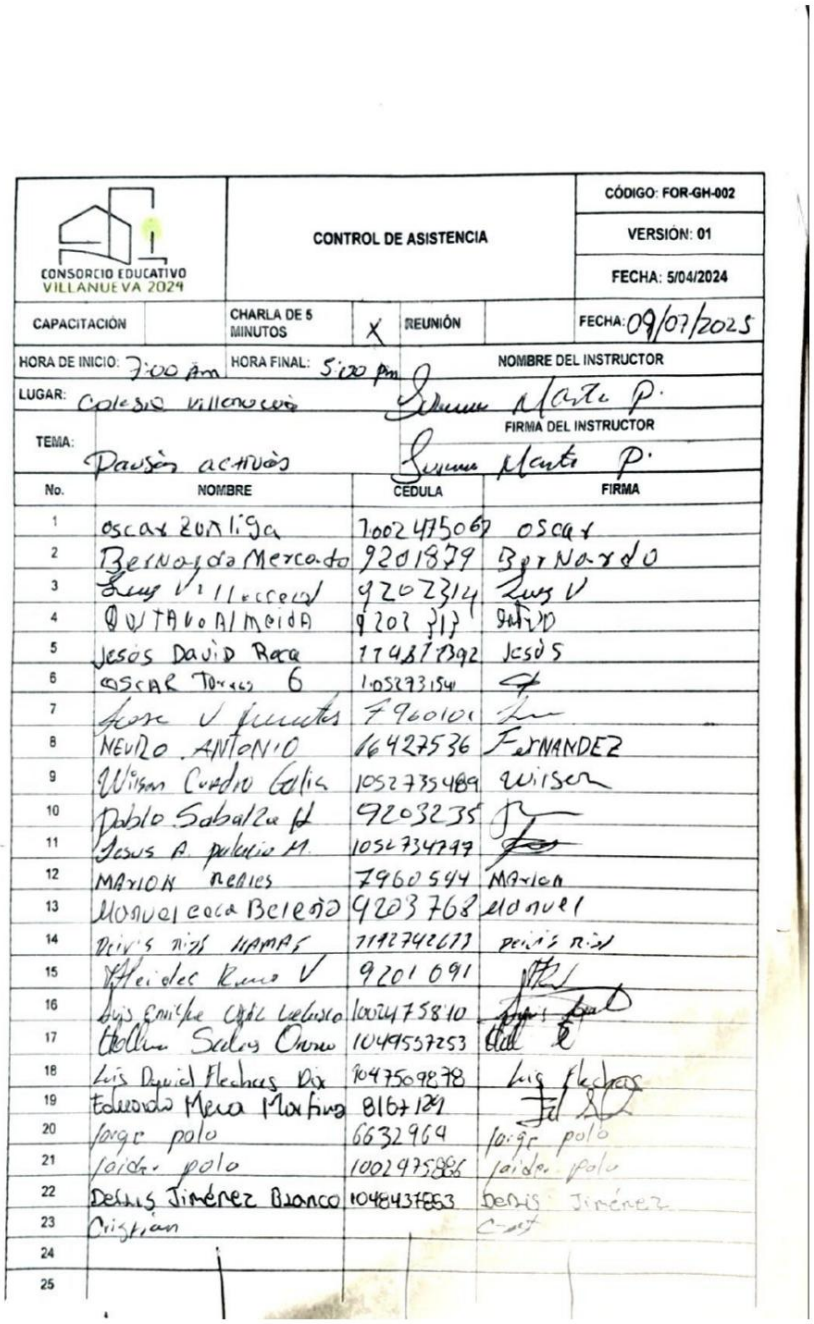

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-GH-002
	VERSIÓN: 01
	FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN		FECHA: 09/07/2025
HORA DE INICIO: 7:00 Am		HORA FINAL: 5:00 pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR		
LUGAR: Colegio Villanueva				Yuruma Maria P.		
TEMA: Pausas activas				FIRMA DEL INSTRUCTOR Yuruma Maria P.		

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	oscar zuñiga	7002475067	oscar
2	Bernarda Mercado	9201879	Bernardo
3	Luis Villarreal	9207314	Luis V
4	GUSTAVO ALMEIDA	9207317	GUSTAVO
5	Jesus David Baca	1148173892	Jesús
6	OSCAR Torres 6	1053793154	
7	Jose V fuentes	F960101	
8	NEVILO ANTONIO	16427536	FERNANDEZ
9	Wilson Cuadro Celis	1052735489	wilson
10	Pablo Sabalza M	92032355	
11	Jesus A. palacio M.	1054734797	
12	MARION REALES	7960544	MARION
13	MANUEL COCA BELEÑO	9203768	MANUEL
14	DENIS NIÑO HAMAS	1192742673	DENIS NIÑO
15	Yefferdes Ruiz V	9201091	
16	Luis Enrique Ortiz Lacouture	1002475810	
17	Wellington Sedas Chams	1049557253	
18	Luis David Fleches Diz	1047509878	Luis Fleches
19	Eduardo Meza Martinez	8167121	
20	Jorge polo	6632964	Jorge polo
21	Jaider polo	1002975886	Jaider polo
22	Denis Jiménez Blanco	1048437853	DENIS Jiménez
23	Cristian		
24			
25			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN		FECHA: 11/07/2025
HORA DE INICIO: 7:00 Am		HORA FINAL: 5 pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR	
LUGAR: Colegio villanueva				Yoscar Mauricio P.	
TEMA: Pausas Activa				FIRMA DEL INSTRUCTOR	

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Jose J Jimenez	1966[illegible]	
2	NEURO ANTONIO	16427536	
3	MARION Neales	7960 544	MARION
4	Bernardo Mercado	9201879	Bernardo
5	GUSTAVO Almeida	9207[illegible]0	GUSTAVO
6	Manuel Coco Belasto	9203760	Manuel
7	Wilson Cuadro Cruz	1052735480	
8	Helena Sofia Orozco	1049537253	
9	oscar Buñiga	7002457676	oscar
10			
11	Jesus A. polanco M.	1052794797	
12	OSCAR Torres G.	1052731500	
13	Pablo Sabalza Herrera	9203235	
14	Heriberto Perez V	9201 091	Heriberto Perez V
15	Johnny De LA HOZ MIÑO	73230732	Johnny
16	Luis Enrique Cruz Velasco	1002478540	Luis Cruz
17	Derlis Jiménez	1048487853	Derlis Jimenez
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN		FECHA: 10/07/25
HORA DE INICIO: 7:00		HORA FINAL:		NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Susana Monte P.	
LUGAR: Colegio Villanueva				FIRMA DEL INSTRUCTOR	
TEMA: Pausas Activas					

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	pablo Sabalza Herrera	9203235	
2	Bernardo Mercado	9201879	Bernardo
3	Luis Villarreal	9202314	Luis V.
4	Gustavo Almeida	9207313	
5	Jairo A. palacio M.	1052734797	
6	Heidi Lucia Vargas	9201 074	
7	Manuel Cera Belerio	9203768	elanuel
8	Jardy polo	1001475886	Jairo polo
9	Jorge polo	6632964	
10	Hollman Yesid Salas O.	1049537253	
11	Luis Enrique Ortiz Velasco	1002475840	
12	Denis Jimenez Blanco	1048437853	Denis Jiménez
13	Luis David Fiechos Dix	1047509878	Luis Fiechos
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA


CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	x	REUNIÓN	FECHA: 12/07/25
HORA DE INICIO: 7:00 am		HORA FINAL: 5 pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR	
LUGAR: Colegio Villanueva					
TEMA: Pausas activas				FIRMA DEL INSTRUCTOR	

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Heidis Ruiz V	9201 071	
2	Oscar Jaime G	1052731544	
3	Jose V Acevedo	1196044	
4	Luis Villadiego	9202314	
5	Jesus A. palacio A.	1058734797	
6	pablo Sabalza Herrera	9203835	
7	Manuel Coba Bolaño	9203768	
8	Wilson Conde Cadiz	1052735484	
9	MARION PERICES	7960 544	MARION
10	Hollman Yesid Salas O	1049537253	
11	NEVIS ANTONIO	16427536	FERNANDEZ
12	Luis Emilio Cotes Velasco	1002475840	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

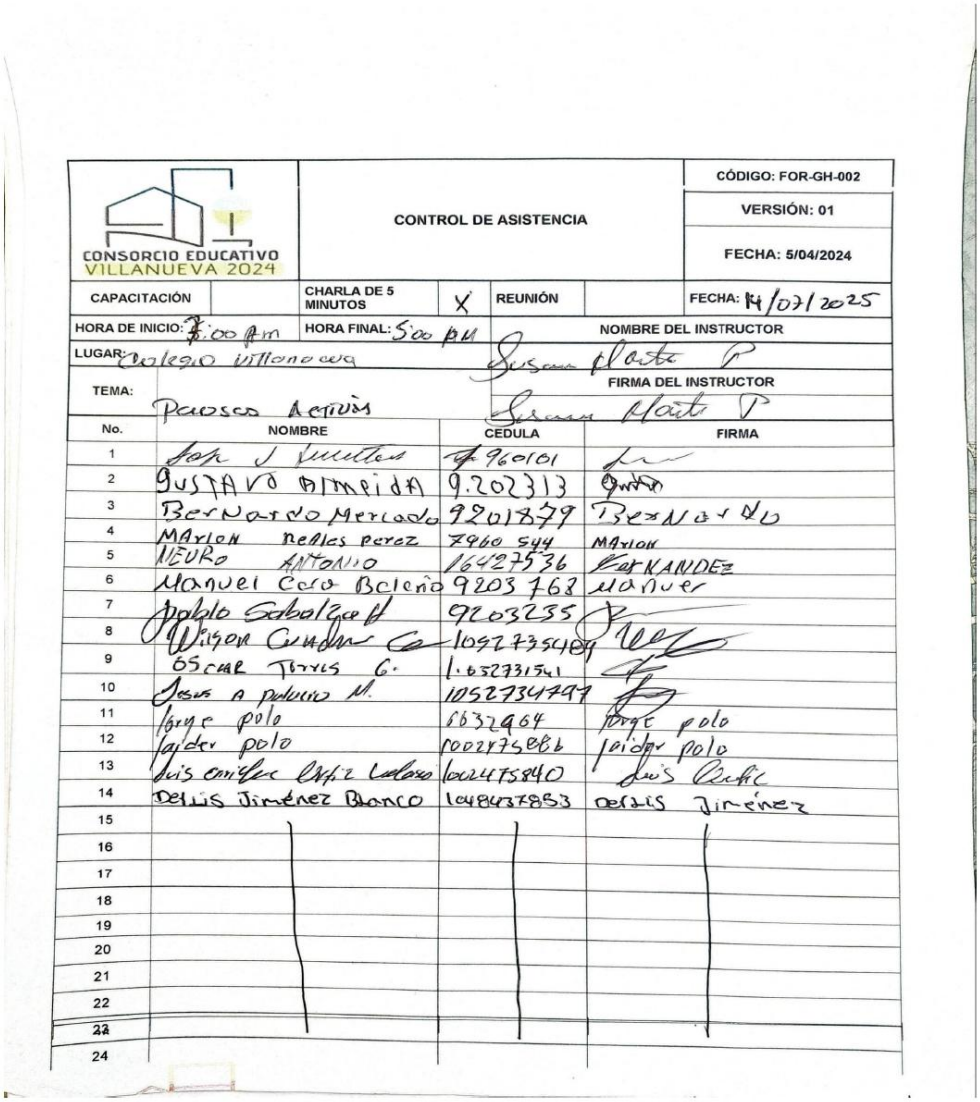

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA


CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN		FECHA: 14/07/2025
HORA DE INICIO: 7:00 Am		HORA FINAL: 5:00 PM		NOMBRE DEL INSTRUCTOR	
LUGAR: Colegio villanueva				Susana Nieto P	
TEMA: Pausas Activas				FIRMA DEL INSTRUCTOR	

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Jose J Fuentes	9960101	
2	GUSTAVO ALMEIDA	9.202313	
3	Bernardo Mercado	9201879	
4	MARION Nedics perez	7960 544	MARION
5	NEURO ANTONIO	164275 36	
6	Manuel Cera Bolaño	9203 763	
7	Pablo Sabalgaro	9203235	
8	Wilson Cuadro Co	1052735489	
9	OSCAR TORRES C.	1.052731541	
10	Jesus A polanco M.	1052734797	
11	Jorge polo	1032464	Jorge polo
12	Jaider polo	1002475886	Jaider polo
13	Luis Carlos Ortiz Cabrera	1024175840	Luis Ortiz
14	Dorlis Jiménez Blanco	1048437853	Dorlis Jiménez
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

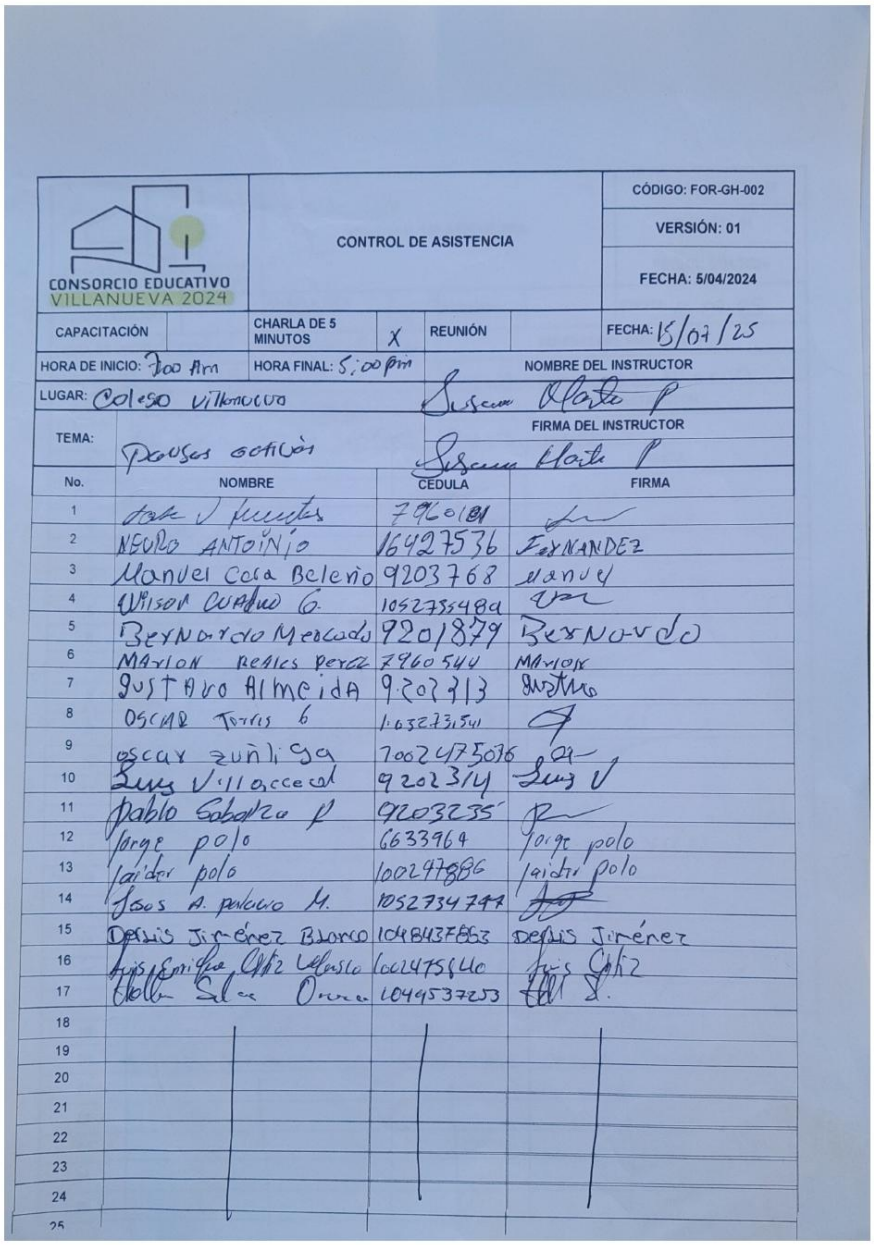

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN		FECHA: 15/07/25

HORA DE INICIO: 7:00 Am | HORA FINAL: 5:00 pm | NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Susana Maria P

LUGAR: Colegio Villanueva | FIRMA DEL INSTRUCTOR: Susana Maria P

TEMA: Pausas activas

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Maria V Fuentes	7960184	
2	NEVIS ANTONIO	16427536	FERNANDEZ
3	Manuel Cera Beleño	9203768	Manuel
4	Wilson Cuadro G.	1052735484	
5	Bernardo Mercado	9201879	Bernardo
6	MARION REALES PEREZ	7960544	MARION
7	GUSTAVO ALMEIDA	9207713	Gustavo
8	OSCAR TORRES G	1.052731541	
9	oscar zuñiga	7002475076	
10	Luis Villarreal	9202314	Luis V
11	pablo Sabalza P	9203235	
12	Jorge polo	6633964	Jorge polo
13	Jaidor polo	1002947886	Jaidor polo
14	Jose A. pulido M.	1052734747	
15	Denis Jiménez Blanco	1048437883	Denis Jiménez
16	Jose Enrique Diaz Velasco	1001475440	Jose Diaz
17	Hellen Sara Ovalle	1049537253	
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA


CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN	FECHA: 16-07-25
HORA DE INICIO: 7:00 am		HORA FINAL: 5:00 pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR	
LUGAR: Colegio Villanueva				Derlis Jiménez Blanco	
TEMA:	pausas activas El buen uso de guantes			FIRMA DEL INSTRUCTOR Derlis Jiménez	

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Jorge polo	6632964	Jorge polo
2	jaider polo	1002973886	jaider polo
3	willy Bedoya	1002476143	
4	Edwin C I	4959 815	Edwin
5	OSCAR Torres G.	1.052731.541	
6	MARION DAVIES	7960544	MARION
7	Wilson Guadro G.	1052735480	Wilson
8	Luis Villamizar	9203174	Luis
9	Manuel cera Beleño	9203768	Manuel
10	NEDRO ANTONIO	16427534	
11	Jose J fuentes	7960101	
12	Hollman Salas Orozco	1049534253	
13	Bernardo Mercado	9201879	Bernardo
14	Pablo Sabalza	9203235	
15	GUSTAVO ALMEIDA	9203716	
16	oscar zuñiga	1002475076	
17	Felix Nuñez	1002975597	
18	Luis enrique Chirinos	1002475846	
19	Luis David Flechas Dix	1049509878	Luis Flechas
20	Derlis Jiménez	1049437853	Derlis Jiménez
21			
22			
23			
24			
25			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

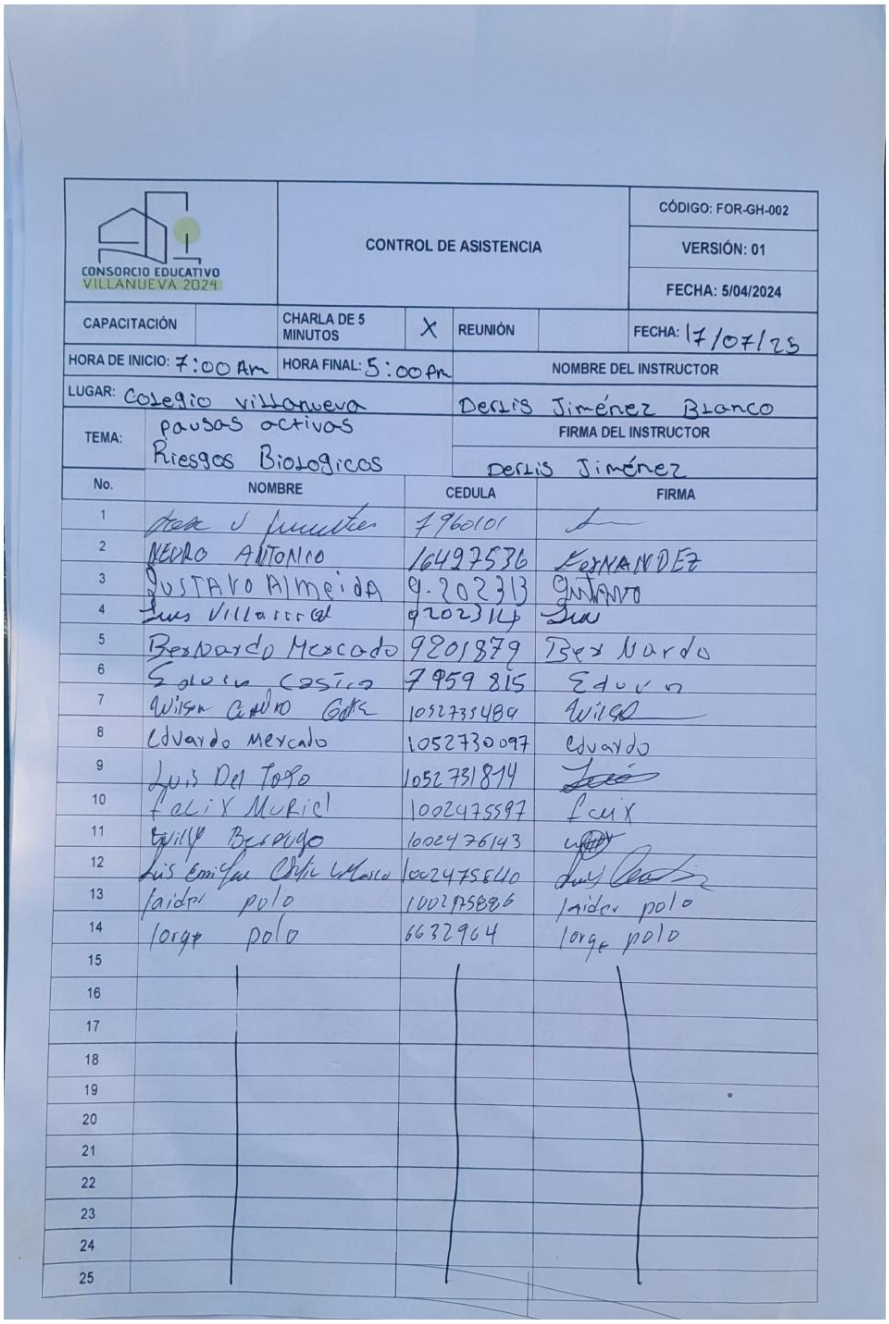

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024


CONTROL DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-GH-002
	VERSIÓN: 01
	FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN		FECHA: 17/07/25
HORA DE INICIO: 7:00 Am		HORA FINAL: 5:00 Pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR		
LUGAR: Colegio villanueva				Derlis Jiménez Blanco		
TEMA:	pausas activas Riesgos Biologicos			FIRMA DEL INSTRUCTOR		
				Derlis Jiménez		

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	[illegible]	7960101	
2	PEDRO ANTONIO	16497536	FERNANDEZ
3	GUSTAVO ALMEIDA	9.202313	GUSTAVO
4	Luis Villarreal	9202314	Luis
5	Bernardo Mercado	9201879	Bernardo
6	Eduin Cosio	7959815	Eduin
7	Wilson Camilo Cotes	1052735489	Wilson
8	Eduardo Mercado	1052730097	Eduardo
9	Luis Del Toro	1052731814	Luis
10	Felix Muriel	1002475597	Felix
11	Willy Bermudez	1002476143	Willy
12	Luis Emilio Ortiz Marin	1002475540	Luis Emilio
13	Jaider polo	1001858866	Jaider polo
14	Jorge polo	6632964	Jorge polo
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

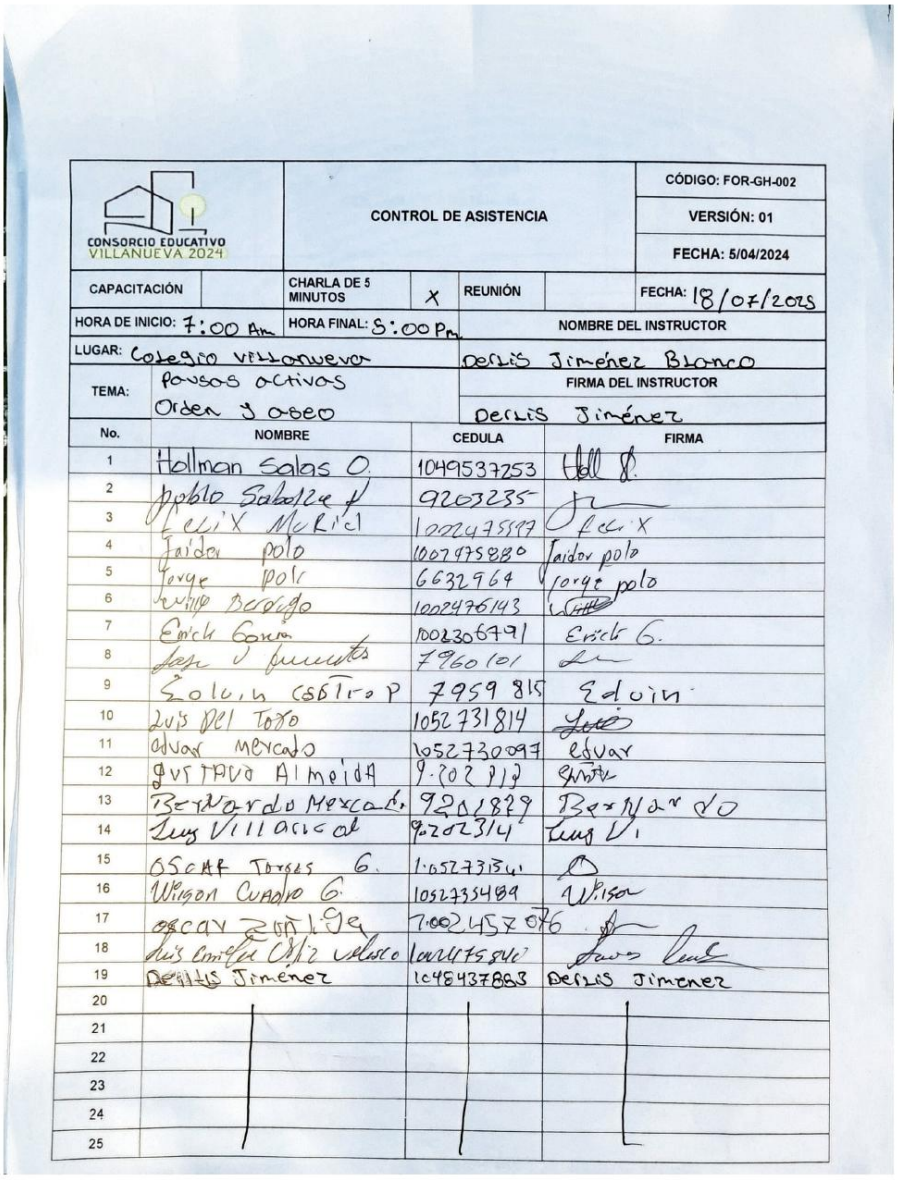

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-GH-002
	VERSIÓN: 01
	FECHA: 5/04/2024


CAPACITACIÓN		CHARLA DE 5 MINUTOS	X	REUNIÓN		FECHA: 18/07/2025
HORA DE INICIO: 7:00 Am		HORA FINAL: 5:00 Pm		NOMBRE DEL INSTRUCTOR		
LUGAR: Colegio villanueva				Derlis Jiménez Blanco		
TEMA: Pausas activas Orden y aseo				FIRMA DEL INSTRUCTOR: Derlis Jiménez		

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Hollman Salas O.	1049537753	Holl S.
2	Pablo Sabalza P	9203235	
3	Felix Merici	1002475597	Felix
4	Faider polo	1007975880	Faider polo
5	Jorge polo	6632964	Jorge polo
6	Wilmer Berrio	1002476143	
7	Erick Gomez	1002306791	Erick G.
8	Jose J Fuentes	7960101	
9	Eduin castro P	7959 815	Eduin
10	Luis Del Toro	1052731814	
11	eduar Mercado	1052730097	eduar
12	Gustavo Almeida	9.202.912	
13	Bernardo Mercado	9201879	Bernardo
14	Luis Villarreal	9202314	Luis V.
15	OSCAR Torres G.	1.052731541	
16	Wilson Cuadro G.	1052733489	Wilson
17	oscar Zapata	7.002.457.076	
18	Luis Emilio Ortiz velasco	1002475547	
19	Derlis Jiménez	1048437883	Derlis Jimenez
20			
21			
22			
23			
24			
25			

gdgd

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

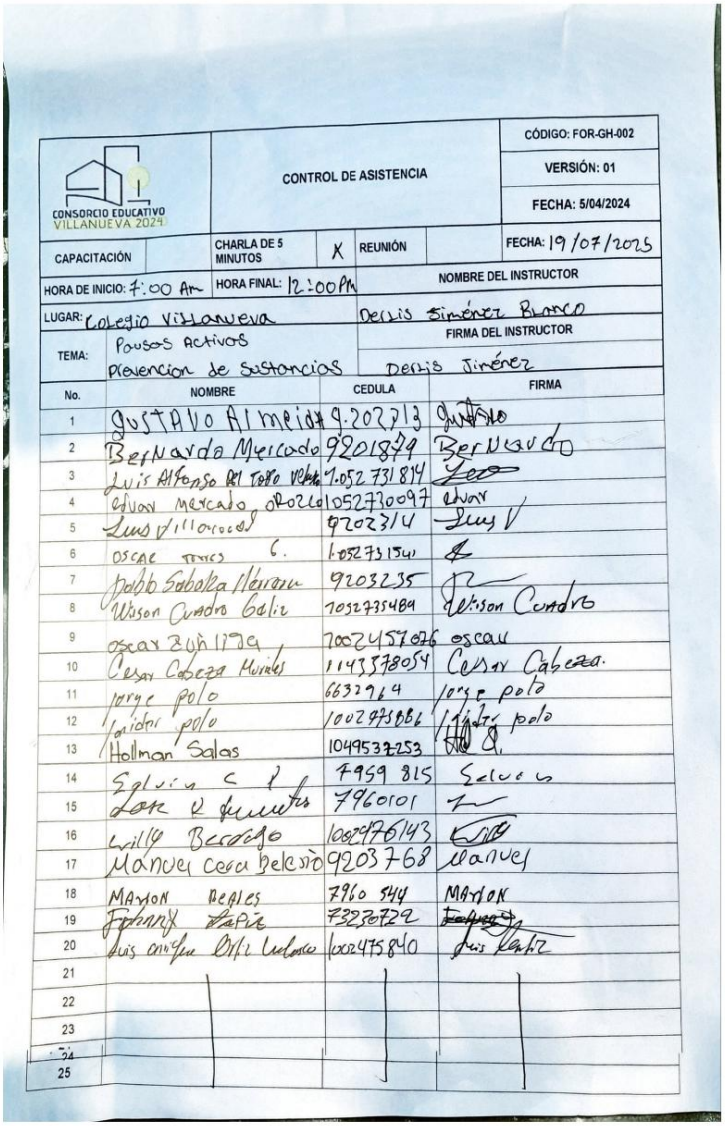

CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-GH-002
VERSIÓN: 01
FECHA: 5/04/2024

CAPACITACIÓN | CHARLA DE 5 MINUTOS | X | REUNIÓN | FECHA: 19/07/2025

HORA DE INICIO: 7:00 Am | HORA FINAL: 12:00 PM | NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Derlis Jiménez Blanco

LUGAR: Colegio Villanueva | FIRMA DEL INSTRUCTOR: Derlis Jiménez

TEMA: Pausas Activas Prevencion de Sustancias

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	GUSTAVO Almeida	9.202713	
2	Bernarda Mercado	9201879	
3	Luis Alfonso	7.052 731 814	
4	Edwin Mercado	1052730097	
5	Luis Villarreal	9202314	
6	OSCAR TENES G.	1052731541	
7	Pablo Sabalza Herrera	9203235	
8	Wilson Cuadro Galiz	1032735484	
9	oscar Buh 1179	1002455076	
10	Cesar Cabeza Morales	1143578054	
11	Jorge polo	6632764	
12	Isidro polo	1002475886	
13	Hollman Salas	1049537253	
14	Eglvia C R	7959 815	
15	Jose R Fuentes	7960101	
16	Willy Berrio	1082476143	
17	Manuel Cera Beleño	9203768	
18	MAYON REALES	7960 544	
19	Fabian Soto	73230729	
20	Luis angel Ortiz Cabarcas	1002475840	
21			
22			
23			
24			
25			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

11. ANEXO 2. SEGURIDAD SOCIAL EQUIPO DE CONTRATISTAS.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902269	3	CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Tv 58 No 15 - 107 Brr El Milagro	CARTAGENA-BOLIVAR	6657337	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	9488450235	9488450235	E	2025/07/15	2025/07/07	BANCO DE BOGOTA	0	$4,938,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	9202271	CERA JOSE																		25-14	30	$1,423,900	$227,800	ESSC07	30	$1,423,900	$178,000	CCF08	30	$1,423,900	$67,000	14-11	30	$1,423,900	$99,100	30	$1,423,900	$71,300	No	$633,200
2	CC	1048437853	JANEHEZ BERLIS	X																	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS041	25	$1,186,250	$148,300	CCF08	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	$82,600	25	$1,186,250	$59,400	No	$527,600
3	CC	1052738841	JUNCO ROBERTO	X																	230301	28	$1,328,600	$212,600	ESSC07	28	$1,328,600	$166,100	CCF08	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	$92,900	28	$1,328,600	$66,500	No	$590,900
4	CC	1053007128	MANRIQUE GUILLERMO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$250,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,000	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,000
5	CC	1128087070	MONTES SUSANA																		230301	30	$1,623,000	$259,700	EPS002	30	$1,623,000	$202,900	CCF08	30	$1,623,000	$65,000	14-11	30	$1,623,000	$113,000	30	$1,623,000	$81,200	No	$721,800
6	CC	1143385964	ORTEGA ADRIAN																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS042	30	$2,500,000	$312,500	CCF08	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$2,500,000	$125,000	No	$1,111,500
7	CC	1002475840	ORTIZ LUIS	X																	230301	22	$1,043,900	$167,100	ESSC07	22	$1,043,900	$130,500	CCF08	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$1,043,900	$52,300	No	$464,400
Total			Afiliados(7)																				$11,105,250	$1,777,000			$11,105,250	$1,388,300			$11,105,250	$444,500			$11,105,250	$773,100		$11,105,250	$555,700		$4,938,600

Página 1 de 2 2025/07/07 09:23 AM

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902269	3	CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Tv 58 No 15 - 107 Brr El Milagro	CARTAGENA-BOLIVAR	6657337	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	9488450235	9488450235	E	2025/07/15	2025/07/07	BANCO DE BOGOTA	0	$4,938,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,777,000	$0	$0	$1,777,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,549,200	$0	$0	$1,549,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$773,100	$0	$0	$773,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$773,100	$0	$0	$773,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$444,500	$0	$0	$444,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	7	$444,500	$0	$0	$444,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$1,388,300	$0	$0	$1,388,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$312,500	$0	$0	$312,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$474,600	$0	$0	$474,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$148,300	$0	$0	$148,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$202,900	$0	$0	$202,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$333,400	$0	$0	$333,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$333,400	$0	$0	$333,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$222,300	$0	$0	$222,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$222,300	$0	$0	$222,300
TOTAL				7	$4,938,600	$0	$0	$4,938,600

Página 2 de 2 2025/07/07 09:23 AM

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

12. ANEXO 3. SEGURIDAD SOCIAL EQUIPO DE INTERVENTORIA.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciúdad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901928289	3	CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 76 # 65 - 35 CE 3M	CARTAGENA-BOLIVAR	3006818556	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	9488450553	9488450553	E	2025/07/21	2025/07/07	BANCO DE BOGOTA	0	$2,846,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	tag	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1143367905	ATENCIO KLISMAN																			231001	30	$3,000,000	$480,000	CCFC55	30	$3,000,000	$375,000	CCF08	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800
2	CC	1048601909	OROZCO FABIO	X																		230301	19	$901,550	$144,300	EPS002	19	$901,550	$112,700	CCF08	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$901,550	$45,100	No	$401,100
3	CC	19023551	QUESADA WILDER																			25-14	30	$2,900,000	$400,000	EPS010	30	$2,900,000	$312,900	CCF08	30	$2,900,000	$100,000	14-11	30	$2,900,000	$174,000	30	$2,900,000	$125,000	No	$1,111,900
Total	Afiliados (3)																							$6,401,550	$1,024,300			$6,401,550	$800,200			$6,401,550	$256,100			$6,401,550	$448,600		$6,401,550	$320,200		$2,846,400

Página 1 de 2 2025/07/07 09:21 AM

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901928289	3	CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 76 # 65 - 35 CE 3M	CARTAGENA-BOLIVAR	3006818556	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	9488450553	9488450553	E	2025/07/21	2025/07/07	BANCO DE BOGOTA	0	$2,846,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$1,024,300	$0	$0	$1,024,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$480,000	$0	$0	$480,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$400,000	$0	$0	$400,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$144,300	$0	$0	$144,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$445,600	$0	$0	$445,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$445,600	$0	$0	$445,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$256,100	$0	$0	$256,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$256,100	$0	$0	$256,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$800,200	$0	$0	$800,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$375,000	$0	$0	$375,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$312,500	$0	$0	$312,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$112,700	$0	$0	$112,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$192,100	$0	$0	$192,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$192,100	$0	$0	$192,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$128,100	$0	$0	$128,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$128,100	$0	$0	$128,100
TOTAL				3	$2,846,400	$0	$0	$2,846,400

Página 2 de 2 2025/07/07 09:21 AM

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

13. ANEXO 4-RESULTADOS DE LABORATORIO MUESTRAS DE CONCRETO M-1; M-2 Y M-3 A LOS 28 DÍAS, CON FECHAS DE VACIADO DE 30 Y 31 DE MAYO Y 04 DE JUNIO RESPECTIVAMENTE.

AC INGENIERIA S.A.S.
Asesorías y Consultorías

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
Barrio la Concepcion calle 1# 101 22 - Teléfono 6816248 Cartagena de Indias D.T. - Bolívar
Celular 3012332299 - email: claudiaserrano78@hotmail.com -ingantoniocogollo@hotmail.com

ENSAYO DE RESISTENCIA DEL CONCRETO A COMPRESION: AASHTO T22 / ASTM C39

PARA:	CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR	NIT:	Dimensiones de Cilindro
OBRA:	CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA MUNICIPIO VILLANUEVA		Alto 12,00 pulg
FECHA:	sábado, 5 de julio de 2025	RESISTENCIA DE DISEÑO : HOJA: 1	Diámetro 6,00 pulg

Muestra No.	Descripción Elemento	Res. Diseño PSI	Ubicación	Slump Pulg.	Fecha Fundida	Fecha Rotura	Dias	Carga KNw	Carga Kg	Carga Libras	Res. MPa	Res. kg/cm²	Res. PSI	% diseño
1					30-may-25	06-jun-2025	7	471,30	48059	105952	25,8	263	3747	
2					30-may-25	06-jun-2025	7	483,50	49303	108695	26,5	270	3844	
3					30-may-25	27-jun-2025	28	593,90	60561	133514	32,6	332	4722	
4					30-may-25	27-jun-2025	28	585,70	59725	131671	32,1	327	4657	
5					31-may-25	07-jun-2025	7	417,70	42594	93903	22,9	233	3321	
6					31-may-25	07-jun-2025	7	415,80	42400	93476	22,8	232	3306	
7					31-may-25	28-jun-2025	28	506,70	51669	113911	27,8	283	4029	
8					31-may-25	28-jun-2025	28	516,30	52648	116069	28,3	289	4105	
9					4-jun-25	11-jun-2025	7	405,10	41309	91070	22,2	226	3221	
10					4-jun-25	11-jun-2025	7	410,70	41880	92329	22,5	230	3265	
11					4-jun-25	02-jul-2025	28	558,60	56961	125578	30,6	312	4441	
12					4-jun-25	02-jul-2025	28	545,60	55636	122656	29,9	305	4338	
13					7-jun-25	14-jun-2025	7	338,60	34528	76120	18,6	189	2692	
14					7-jun-25	14-jun-2025	7	344,50	35129	77447	18,9	193	2739	

Observaciones: _____

CLAUDIA COGOLLO SERRANO
Ingeniera Civil - Universidad Tecnologica de Bolivar

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

14. ANEXO 5-RESULTADOS DE LABORATORIO MUESTRAS DE CONCRETO M-7 Y M-8 A LOS 07 DÍAS.

AC INGENIERIA S.A.S.
Asesorías y Consultorías

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
Barrio la Concepcion calle 1# 101 22 - Teléfono 6816248 Cartagena de Indias D.T. - Bolívar
Celular 3012332299 - email: claudiaserrano78@hotmail.com -ingantoniocogollo@hotmail.com

ENSAYO DE RESISTENCIA DEL CONCRETO A COMPRESION: AASHTO T22 / ASTM C39

PARA:	CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR NIT:		Dimensiones de Cilindro
OBRA:	CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA MUNICIPIO VILLANUEVA		Alto 12,00 pulg
FECHA:	sábado, 5 de julio de 2025	RESISTENCIA DE DISEÑO : HOJA: 1	Diámetro 6,00 pulg

Muestra No.	Descripción Elemento	Res. Diseño PSI	Ubicación	Slump Pulg.	Fecha Fundida	Fecha Rotura	Dias	Carga KNw	Carga Kg	Carga Libras	Res. MPa	Res. kg/cm²	Res. PSI	% diseño
M-7					19-jun-25	26-jun-2025	7	384,40	39198	86417	21,1	215	3056	
M-7					19-jun-25	26-jun-2025	7	389,60	39728	87586	21,4	218	3098	
M-8					21-jun-25	28-jun-2025	7	516,30	52648	116069	28,3	289	4105	
M-8					21-jun-25	28-jun-2025	7	526,40	53678	118339	28,9	294	4185	

CLAUDIA COGOLLO SERRANO
Ingeniera Civil - Universidad Tecnologica de Bolivar

Observaciones: _____

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

15. ANEXO 6-RESULTADOS DE LABORATORIO MUESTRAS DE CONCRETO M-4; M-5 Y M-6.

AC INGENIERIA S.A.S.
Asesorias y Consultorias

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
Barrio la Concepcion calle 1# 101 22 - Teléfono 6816248 Cartagena de Indias D.T. - Bolívar
Celular 3012332299 - email: claudiaserrano78@hotmail.com -ingantoniocogollo@hotmail.com

ENSAYO DE RESISTENCIA DEL CONCRETO A COMPRESION: AASHTO T22 / ASTM C39

PARA:	CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR NIT:		Dimensiones de Cilindro
OBRA:	CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA MUNICIPIO VILLANUEVA		Alto 12,00 pulg
FECHA:	lunes, 21 de julio de 2025	RESISTENCIA DE DISEÑO : HOJA: 1	Diámetro 6,00 pulg

Muestra No.	Descripción Elemento	Res. Diseño PSI	Ubicación	Slump Pulg.	Fecha Fundida	Fecha Rotura	Dias	Carga KNw	Carga Kg	Carga Libras	Res. MPa	Res. kg/cm²	Res. PSI	% diseño
1					7-jun-25	05-jul-2025	28	436,50	44511	98129	23,9	244	3471	
2					7-jun-25	05-jul-2025	28	443,70	45245	99748	24,3	248	3528	
3					11-jun-25	18-jun-2025	7	583,50	59500	131176	32,0	326	4639	
4					11-jun-25	18-jun-2025	7	591,70	60337	133019	32,4	331	4705	
5					14-jun-25	12-jul-2025	28	432,60	44113	97252	23,7	242	3440	
6					14-jun-25	12-jul-2025	28	435,10	44368	97814	23,9	243	3459	

Observaciones: _____

CLAUDIA COGOLLO SERRANO
Ingeniera Civil - Universidad Tecnologica de Bolivar

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

16. ANEXO 7-RESULTADOS DE LABORATORIO MUESTRAS DE CONCRETO M-7; M-8 Y M-9.

AC INGENIERIA S.A.S.
Asesorías y Consultorías

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
Barrio la Concepcion calle 1# 101 22 - Teléfono 6816248 Cartagena de Indias D.T. - Bolivar
Celular 3012332299 - email: claudiaserrano78@hotmail.com -ingantoniocogollo@hotmail.com

ENSAYO DE RESISTENCIA DEL CONCRETO A COMPRESION: AASHTO T22 / ASTM C39

PARA:	CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR NIT:		Dimensiones de Cilindro
OBRA:	CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA MUNICIPIO VILLANUEVA		Alto 12,00 pulg
FECHA:	lunes, 21 de julio de 2025	RESISTENCIA DE DISEÑO : HOJA: 1	Diámetro 6,00 pulg

Muestra No.	Descripción Elemento	Res. Diseño PSI	Ubicación	Slump Pulg.	Fecha Fundida	Fecha Rotura	Dias	Carga KNw	Carga Kg	Carga Libras	Res. MPa	Res. kg/cm²	Res. PSI	% diseño
M-7					19-jun-25	17-jul-2025	28	506,10	51608	113776	27,7	283	4024	
M-7					19-jun-25	17-jul-2025	28	518,20	52842	116496	28,4	290	4120	
M-8					21-jun-25	19-jul-2025	28	644,10	65680	144799	35,3	360	5121	
M-8					21-jun-25	19-jul-2025	28	635,10	64762	142776	34,8	355	5050	
M-9					10-jul-25	17-jul-2025	7	439,70	44837	98848	24,1	246	3496	
M-9					10-jul-25	17-jul-2025	7	451,60	46050	101524	24,8	252	3591	

CLAUDIA COGOLLO SERRANO
Ingeniera Civil - Universidad Tecnologica de Bolivar

Observaciones: _____

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

17. ANEXO 8-RESULTADOS DE LABORATORIO MUESTRAS DE CONCRETO M-10.

AC INGENIERIA S.A.S.
Asesorías y Consultorías

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
Barrio la Concepcion calle 1# 101 22 - Teléfono 6816248 Cartagena de Indias D.T. - Bolívar
Celular 3012332299 - email: claudiaserrano78@hotmail.com -ingantoniocogollo@hotmail.com

ENSAYO DE RESISTENCIA DEL CONCRETO A COMPRESION: AASHTO T22 / ASTM C39

PARA:	CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR NIT:		Dimensiones de Cilindro
OBRA:	CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA MUNICIPIO VILLANUEVA		Alto 12,00 pulg
FECHA:	lunes, 21 de julio de 2025	RESISTENCIA DE DISEÑO : HOJA: 1	Diámetro 6,00 pulg

Muestra No.	Descripción Elemento	Res. Diseño PSI	Ubicación	Slump Pulg.	Fecha Fundida	Fecha Rotura	Dias	Carga KNw	Carga Kg	Carga Libras	Res. MPa	Res. kg/cm²	Res. PSI	% diseño
10					11-jul-25	18-jul-2025	7	367,10	37434	82527	20,1	205	2919	
10					11-jul-25	18-jul-2025	7	375,60	38301	84438	20,6	210	2986	

Observaciones: _____

CLAUDIA COGOLLO SERRANO
Ingeniera Civil - Universidad Tecnologica de Bolivar

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

18. ANEXO 9-RESULTADOS DE LABORATORIO MUESTRAS DE CONCRETO M-11.

AC INGENIERIA S.A.S.
Asesorías y Consultorías
Antonio Cogollo Ingenieros SAS Nit: 800.417.542-6

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
Barrio la Concepcion calle 1# 101 22 - Teléfono 6816248 Cartagena de Indias D.T. - Bolívar
Celular 3012332299 - email: claudiaserrano78@hotmail.com -ingantoniocogollo@hotmail.com

ENSAYO DE RESISTENCIA DEL CONCRETO A COMPRESION: AASHTO T22 / ASTM C39

PARA:	CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR NIT:		Dimensiones de Cilindro
OBRA:	CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA MUNICIPIO VILLANUEVA		Alto 12,00 pulg
FECHA:	lunes, 28 de julio de 2025	RESISTENCIA DE DISEÑO : HOJA: 1	Diámetro 6,00 pulg

Muestra No.	Descripción Elemento	Res. Diseño PSI	Ubicación	Slump Pulg.	Fecha Fundida	Fecha Rotura	Dias	Carga KNw	Carga Kg	Carga Libras	Res. MPa	Res. kg/cm²	Res. PSI	% diseño
11					16-jul-25	23-jul-2025	7	526,10	53647	118272	28,8	294	4183	
11					16-jul-25	23-jul-2025	7	538,70	54932	121105	29,5	301	4283	

Observaciones: _____

CLAUDIA COGOLLO SERRANO
Ingeniera Civil - Universidad Tecnologica de Bolivar

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

19. CONCLUSIONES.

Con corte al 31 de Julio de 2025, se evidencia un avance representativo en las actividades de cimentación, destacando la instalación de 15.788,84 kg de acero de refuerzo entre zapatas y pedestales, así como la colocación de 607,58 m² de concreto de limpieza y 121.6 m³ de concreto estructural, lo que indica que las fases de fundida de zapatas están en desarrollo. También se han ejecutado 1922 m³ de excavación y 515 m³ de relleno con material seleccionado, reflejando el inicio de las etapas de conformación y compactación. Las cantidades reflejan un progreso sostenido en la ejecución del proyecto conforme a lo programado.

El avance físico fue del 2,24 %, no superando el programado para el mismo periodo (5,34 %), lo que evidencia que no se ha cumplido con la programación proyectada para este mes, así como tampoco se cumplió con el porcentaje acumulado, por lo que se debe avanzar y reforzar las actividades con más personal con el fin de estar por encima de la programación y cumplir con los tiempos pactados. No obstante, se presenta la condición desfavorable de la lluvia que nos impide continuar con el transcurso normal de las actividades , debido a que el terreno es arcilloso y expansivo , lo que dificulta el acceso de maquinaria, además de ser un peligro para la seguridad de los trabajadores ya que al ser un terreno inestable, el personal técnico puede sufrir caídas o lesiones en las partes de su cuerpo si esta llega a ser al lado de las excavaciones las cuales suelen tener en promedio 2m de profundidad.

Adicionalmente el rendimiento del personal en la actividad de excavación de vigas de cimentación de módulos no fue el esperado, debido a que se encontró un terreno arcilloso normalmente consolidado, lo que hizo la excavación manual más lenta además de la profundidad de las excavaciones que son en promedio de 1.5 metros.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com
