La equidad es de todos · Prosperidad Social	**FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 4**

FECHA DE INFORME:	21 de noviembre de 2022		INFORME N°:	26	PERÍODO DEL	14/11/2022
			ETAPA:	CONSTRUCCION	AL	20/11/2022
N° Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS):	455 FIP DE 2021		ID DEL PROYECTO:	20210455V253743-1		
DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO		MUNICIPIO:	ORITO		
N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	**208 FIP 2019**		SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):	ÁLVARO ENRIQUE GUTIÉRREZ		

1. INFORMACIÓN GENERAL


OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	**MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CALLE 2C ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3, CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 2C Y CALLE 3A SUR ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2 DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO**		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ORITO - PUTUMAYO**	No. Beneficiarios	N/A
N° ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA (o su equivalente):	**1**	**Nota: Verificar que el Acta se encuentra suscrita por todas las partes intervinientes**	


PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)			**CONTRATO DE OBRA**		
N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente):	Z7-080		N° Y AÑO DE CONTRATO:	686- 2021	
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP.		CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ORITO	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD		CONTRATISTA:	JYP SERVICIOS SAS	
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	0		PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	0	
PLAZO CONSTRUCCIÓN:	4 MESES		PLAZO CONSTRUCCIÓN:	4 MESES	
PLAZO TOTAL INICIAL:	4 MESES		PLAZO TOTAL INICIAL:	4 MESES	
FECHA DE INICIO:	15 de febrero de 2022		FECHA DE INICIO:	15 de febrero de 2022	
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 de marzo de 2022		*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 de marzo de 2022	
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	18 de abril de 2022		*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	18 de abril de 2022	
*FECHA DE REINICIO N° 1°:	9 de mayo de 2022		*FECHA DE REINICIO N° 1°:	9 de mayo de 2022	
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	26 de mayo de 2022		*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	26 de mayo de 2022	
*FECHA DE REINICIO N° 2:	10 de junio de 2022		*FECHA DE REINICIO N° 2:	10 de junio de 2022	
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	8 de julio de 2022		*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	8 de julio de 2022	
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 5:	22 de julio de 2022		*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 5:	22 de julio de 2022	
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 6:	5 de agosto de 2022		*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 6:	5 de agosto de 2022	
*FECHA DE REINICIO N° 3:	22 de agosto de 2022		*FECHA DE REINICIO N° 3:	22 de agosto de 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de septiembre de 2022		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de septiembre de 2022	
PRORROGA:	61		PRORROGA	61	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de noviembre de 2022		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de noviembre de 2022	
PLAZO ACTUALIZADO:	181		PLAZO ACTUALIZADO:	181	
PLAZO TRANSCURRIDO:	177 EQUIVALE AL 97,79%		PLAZO TRANSCURRIDO:	177 EQUIVALE AL 97,79%	
VALOR INICIAL :	$ 88.188.950,10		VALOR INICIAL :	$ 963.507.653,00	
*VALOR ADICIÓN N° :	0		*VALOR ADICIÓN N° 1 :	$ 77.085.551,00	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 88.188.950,10		VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.040.593.204,00	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	90,23%		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	90,23%	
VALOR EJECUTADO	$ 79.573.883,12		VALOR EJECUTADO:	$ 938.938.970	
PORCENTAJE DE PAGO	0,00%		PORCENTAJE DE PAGO	51,34%	
VALOR PAGADO:	$ 0,00		VALOR PAGADO:	$ 534.223.646,00	
VALOR POR EJECUTAR:	$ 8.615.066,98		VALOR POR EJECUTAR:	$ 101.654.233,83	
SUPERVISOR DE CONVENIO O CONTRATO:	ALVARO ENRIQUE GUITIERREZ		SUPERVISOR DESIGNADO POR EL CONTRATANTE:	MARIA LUISA ESCOBAR	

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. PORCENTAJE DE AVANCE FISICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	Planeado	Ejecutado	
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	99,38%	90,23%	Avance respecto a lo programado:
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($)	$ 1.034.166.104	$ 938.938.970	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	-$ 95.227.134,00	-9,15%	90,79%

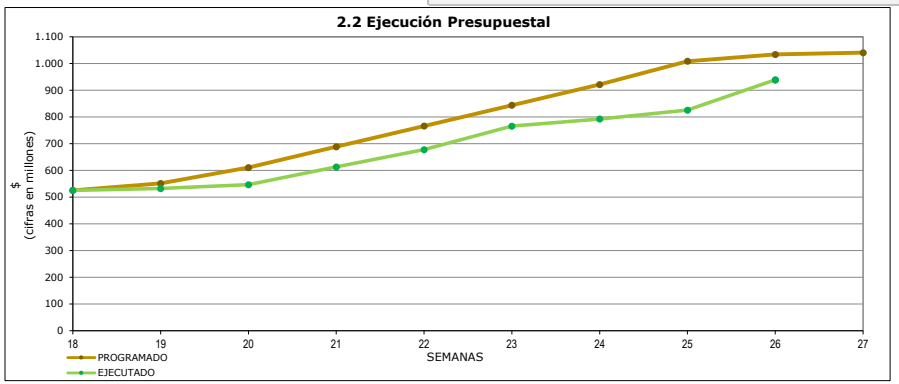

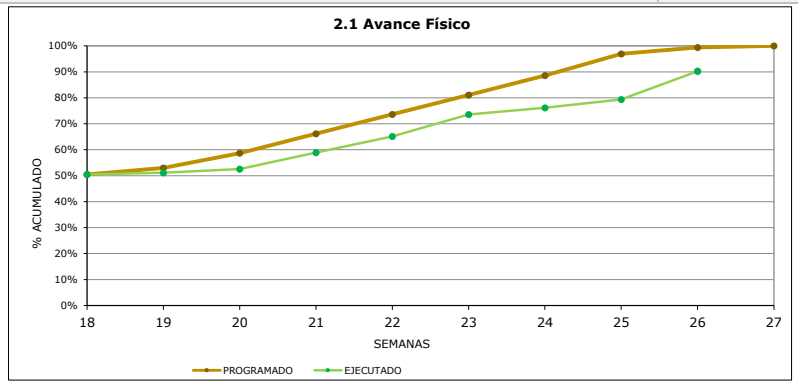

3. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS VISIBLES E INTERMEDIAS

No.	FECHA PROGRAMADA	HORA INICIO/ HORA FIN	LUGAR	FECHA REAL
1	1/04/2022	10:30am	Club 31 de marzo	24/06/2022
2	29/11/2022	3:00pm	Por definir	
3				

4. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

4.1 PROGRAMACION (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

La curva de ejecución sigue por debajo de la curva de programación, con los siguientes porcentajes: PROGRAMADO= 99,38%; EJECUTADO= 90,23%, ATRASO= -9,15%. Esto se debe al atraso en la ejecución de los siguientes ítems: pavimentos, acero de refuerzo y bordillos. La ejecución de los ítems de señalización, pese a haber iniciado la construcción de las señales verticales, aun no se han instalado.

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC.) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista dispone de los recursos requeridos calculados para cumplir las metas programadas. Deberá recuperar el tiempo perdido en la ejecución de pavimentos y señalización en la ultima semana de ejecucion.

4.3. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

De acuerdo al cumplimiento de los recursos requeridos, el contratista igualmente, está cumpliendo con la aplicación de los recursos financieros

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Los ensayos de laboratorio y demás requerimientos en cuanto a especificaciones técnicas, normas; no muestran inconvenientes en cuanto a calidad de los materiales y la calidad de las obras ejecutadas.

4.5. MANEJO AMBIENTAL

El Contratista dispone los materiales provenientes de la excavación en escombrera autorizada.

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Contratista suministró al personal técnico y operativo los elementos de protección personal y seguridad industrial.

4.7 SALUD OCUPACIONAL

El Contratista afilió a todo el personal técnico a la seguridad social y parafiscales requerido por la Ley.

4.8 ASPECTOS SOCIALES

El Contratista cuenta con el profesional social en obra, acorde a la dedicación establecida en el Contrato de Obra.

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 4**

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA
4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)	Dar termino a la ejecucion del item de pavimento (solo queda faltando 9 metros lineales, donde se ubica la alcantarilla de 24"), acero de refuerzo, bordillos y	Ejecución	JYP SERVICIOS S.A.S.	21/11/2022	24/11/2022
4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS	Disponibilidad de recursos de acuerdo a lo programado	Ejecución	JYP SERVICIOS S.A.S.	21/11/2022	24/11/2022

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No se presentan durante el periodo

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Nota: Se construyó la alcantarilla de 24" (estructura que está fuera del alcance del contrato, pero que como compromiso del ente territorial, se requería para avanzar en las obras contractuales). Esto permite terminar 14,42 metros de pavimento que faltan por ejecutar en la carrera 4.

COMPONENTE TÉCNICO: La curva de ejecución sigue por debajo de la curva de programación, con los siguientes porcentajes: PROGRAMADO= 99,38%; EJECUTADO= 86,78%, ATRASO= 12,60%. Esto se debe al atraso en la ejecución de los siguientes ítems: pavimentos, acero de refuerzo y bordillos. La ejecución de los ítems de señalización, pese a haber iniciado la construcción de las señales verticales, aun no se han instalado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA A REPORTAR:

- **CONCRETO DE 3.8 Mpa PARA PAVIMENTO:** Fundición de 80 metros (total = 94,42 metros) de pavimento en la carrera 4.

- **CONTROL DE CALIDAD:** El concreto utilizado en la fundición de pavimentos y andenes se prepara de acuerdo al diseño de mezclas . Se realiza el control de asentamiento del concreto, utilizando el cono de abrams y se toman las cilindros para las pruebas de laboratorio respectivas de concreto. Igualmente se realizan los ensayos de densidades de la sub base.
- **CONTROL DE NIVELES:** Se realizó verificación de niveles según diseño del pavimento en perfil longitudinal y transversal (bombeo), así como de andenes, teniendo como guía las estacas que el equipo topográfico deja al lado y lado de la vía cada 10 metros.

OBSERVACIONES:

Solo queda por fundir el pavimento de la carrera 4a, previa la toma de muestras para la obtención de densidades de la sub base, el cual, se realizó el sábado 12 del presente mes. En la semana 26, se construirá la alcantarilla de drenaje de 24".

-

8. ANEXOS

2.1 Copia bitácora

2.2 Acta Comité de obra

FIRMA: _____

INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)

LUIS ALVARO GUERRERO PARDO

TP No: 2520207909 CND
