La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**	**Código:** F-IP-175
		Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2021

N° Y AÑO CONVENIO	455 FIP 2021	ID PROYECTO (DPS):	20210455V253743-1
SECTOR:	VIAS Y TRANSPORTE	TIPOLOGÍA:	VIAS
DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO	MUNICIPIO:	ORITO
CONTRATO DE OBRA No.	686 DE 2021	SUPERVISOR:	MARIA LUISA ESCOBAR
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ORITO	CONTRATISTA:	JYP SERVICIOS S.A.S.
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 2C ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3, CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 2C Y CALLE 3A SUR ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2 DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIO PORVENIR, MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO.		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	208 FIP 2019
ACTA ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA N°:	Z7-080	SUPERVISOR:	CESAR ANDRES GONZALEZ RONDON
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DE OBRA			
PLAZO:	181 días	VALOR EJECUTADO:	$ 1.055.439.826
FECHA DE INICIO:	15/02/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	10/12/2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la entrega y recibo definitivo del objeto contractual el día 15 del mes de diciembre de 2022.

La Interventoría y el supervisor del contrato de obra hacen constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría a satisfacción de acuerdo con la descripción relacionada en la siguiente Tabla que incluye cantidades y precios:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ESPECIFICACIONES GENERAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PRELIMINARES				
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	2.894,75	$ 11.500,00	$ 33.289.668,70
310,1	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3/KM	41.818,58	$ 1.611,00	$ 67.369.733,19
	ESTRUCTURA PAVIMENTO RIGIDO				
350,2	SUB BASE CLASE B	M3	962,95	$ 167.600,00	$ 161.390.420,00
500,1	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO 3.8 Mpa	M3	517,70	$ 875.707,00	$ 453.350.712,02
630,4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	108,51	$ 734.971,00	$ 79.751.703,21
640,1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	2.341,53	$ 8.515,00	$ 19.938.127,95
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE VÍAS				
710,1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO	UN	18,00	$ 428.535,00	$ 7.713.630,00
700,3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	259,00	$ 42.678,00	$ 11.053.602,00
701,1	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	UN	97,00	$ 19.107,00	$ 1.853.379,00
	NO PREVISTOS				
	Demolición , adecuación y reposición de pozos colectores alcantarillado.no	UN	4,00	$ 319.489,00	$ 1.277.956,00
	Excavación Manual sin clasificar	M3	316,47	$ 26.200,00	$ 8.291.413,92
	Bordillo de concreto de 3.000 PSI de 0.36Mx 0.15M ,vaciado IN-SITU	M	856,92	$ 53.300,00	$ 45.673.836,00
	Demarcación horizontal de la calzada línea tipo I- 1 contínua y discontinua de	M	1.275,99	$ 3.026,00	$ 3.861.145,74
	Demolicion de andenes	M3	91,05	$ 39.400,00	$ 3.587.370,00
	Afirmado para andene	M3	182,64	$ 85.000,00	$ 15.524.400,00
	ITEMS NO PREVISTOS				
230,1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES e=0,25	M2	3.119,78	$ 31.039,00	$ 96.834.789,34
231,1	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS	M2	3.119,78	$ 9.562,00	$ 29.831.317,24

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 1.040.593.204**
TOTAL COSTOS DIRECTOS SIN IVA		**$ 800.456.311**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 240.136.893**
ADMINISTRACIÓN	**23%**	$ 184.104.952
IMPREVISTOS	**2%**	$ 16.009.126
UTILIDAD	**5%**	$ 40.022.816
IVA 16% SOBRE UTILIDAD	**16%**	
PGIO		$ 14.846.623
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		**1.055.439.826**

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus obligaciones frente al contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes.
Asimismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato.

Se deja constancia de la entrega de los siguientes documentos:

Planos Record	x
Pólizas actualizadas con la aprobación por parte de la Entidad Territorial	x
Documentos/manual (es) de Uso y/o Mantenimiento (según el caso)	x

Balance Final con memoria de cantidades finales	x
Otros según Pliego de Condiciones	x

Mediante la presente acta, el Interventor, hace entrega de las obras objeto del convenio No. 455 FIP 2021, suscrito entre el MUNICIPIO DE ORITO y el DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL Y EL DESARROLLO.

Firma: _____
Nombre: **ELKIN ORLANDO JIMENEZ MENA**
R.L. JYP SERVICIOS S.A.S.

Firma: _____
Nombre: **MARIA LUISA ESCOBAR**
SUPERVISOR DEL CONTRATO MUNICIPIO DE ORITO

Firma: _____
Nombre: **GIANCARLO AVENA CORRALES**
DIRECTOR INTERVENTORIA

La equidad es de todos — Prosperidad Social	**FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 4**

FECHA DE INFORME:	13 de diciembre de 2022		INFORME N°:	**27**	PERÍODO DEL	21/11/2022
			ETAPA:	CONSTRUCCION	AL	23/11/22 Y 9/12/22/ al 10/12/22
N° Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS):	455 FIP DE 2021		ID DEL PROYECTO:	20210455V253743-1		
DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO		MUNICIPIO:	ORITO		
N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	**208 FIP 2019**		SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):	ALVARO ENRIQUE GUITIERREZ		

1. INFORMACIÓN GENERAL


OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	**MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 2C ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3, CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 2C Y CALLE 3A SUR ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2 DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO**		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ORITO - PUTUMAYO**	No. Beneficiarios	N/A
N° ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA (o su equivalente):	**1**	**Nota: Verificar que el Acta se encuentra suscrita por todas las partes intervinientes**	


PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)			**CONTRATO DE OBRA**			
N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente):	Z7-080		N° Y AÑO DE CONTRATO:	686- 2021		
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP.		CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ORITO		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD		CONTRATISTA:	JYP SERVICIOS SAS		
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	0		PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	0		
PLAZO CONSTRUCCIÓN:	4 MESES		PLAZO CONSTRUCCIÓN:	4 MESES		
PLAZO TOTAL INICIAL:	4 MESES		PLAZO TOTAL INICIAL:	4 MESES		
FECHA DE INICIO:	15 de febrero de 2022		FECHA DE INICIO:	15 de febrero de 2022		
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 de marzo de 2022		*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29 de marzo de 2022		
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	18 de abril de 2022		*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	18 de abril de 2022		
*FECHA DE REINICIO N° 1°:	9 de mayo de 2022		*FECHA DE REINICIO N° 1°:	9 de mayo de 2022		
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	26 de mayo de 2022		*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	26 de mayo de 2022		
*FECHA DE REINICIO N° 2:	10 de junio de 2022		*FECHA DE REINICIO N° 2:	10 de junio de 2022		
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	8 de julio de 2022		*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	8 de julio de 2022		
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 5:	22 de julio de 2022		*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 5:	22 de julio de 2022		
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 6:	5 de agosto de 2022		*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 6:	5 de agosto de 2022		
*FECHA DE REINICIO N° 3:	22 de agosto de 2022		*FECHA DE REINICIO N° 3:	22 de agosto de 2022		
*FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de septiembre de 2022		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de septiembre de 2022		
*PRORROGA:	61		PRORROGA	61		
*FECHA DE TERMINACION:	24 de noviembre de 2022		*FECHA DE TERMINACION:	24 de noviembre de 2022		
*FECHA DE SUSPENSION:	23 de noviembre de 2022		*FECHA DE SUSPENSION 7:	23 de noviembre de 2022		
*FECHA DE SUSPENSION:	1 de diciembre de 2022		*FECHA DE SUSPENSION 8:	1 de diciembre de 2022		
*FECHA DE REINICIO:	9 de diciembre de 2022		*FECHA DE REINICIO 4:	9 de diciembre de 2022		
*FECHA DE TERMINACION:	10 de diciembre de 2022		*FECHA DE TERMINACION ATUALIZADA:	10 de diciembre de 2022		
PLAZO ACTUALIZADO:	181		PLAZO ACTUALIZADO:	181		
PLAZO TRANSCURRIDO:	181 EQUIVALE AL 100,00%		PLAZO TRANSCURRIDO:	181 EQUIVALE AL 100,00%		
VALOR INICIAL :	$ 88.188.950,10		VALOR INICIAL :	$ 978.354.276,00		
*VALOR ADICIÓN N° :	0		*VALOR ADICIÓN N° 1 :	$ 77.085.551,00		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 88.188.950,10		VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.055.439.827,00		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100,00%		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100,00%		
VALOR EJECUTADO	$ 88.188.950,10		VALOR EJECUTADO:	$ 1.055.439.827		
PORCENTAJE DE PAGO	0,00%		PORCENTAJE DE PAGO	50,62%		
VALOR PAGADO:	$ 0,00		VALOR PAGADO:	$ 534.223.646,00		
VALOR POR EJECUTAR:	$ 0,00		VALOR POR EJECUTAR:	$ 0,00		
SUPERVISOR DE CONVENIO O CONTRATO:	ALVARO ENRIQUE GUITIERREZ		SUPERVISOR DESIGNADO POR EL CONTRATANTE:	MARIA LUISA ESCOBAR		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. PORCENTAJE DE AVANCE FISICO Y EJECUCION PRESUPUESTAL

	Planeado	Ejecutado	Avance respecto a lo programado:
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	**100,00%**	**100,00%**	
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($)	$ 1.055.439.827	$ 1.055.439.827	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	$ 0,00	**0,00%**	100,00%

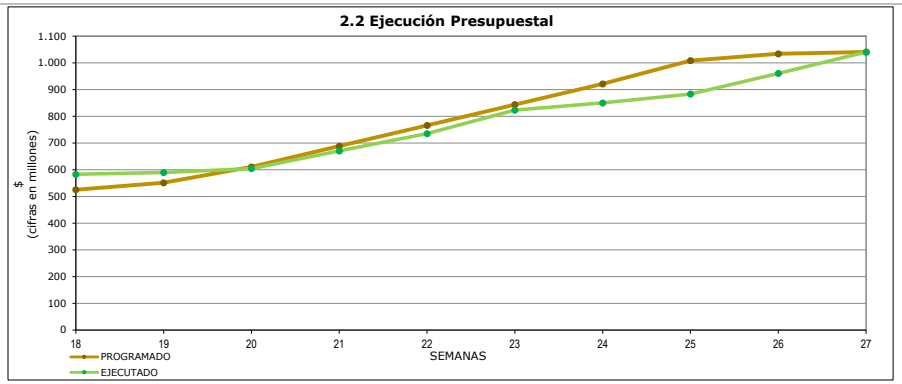

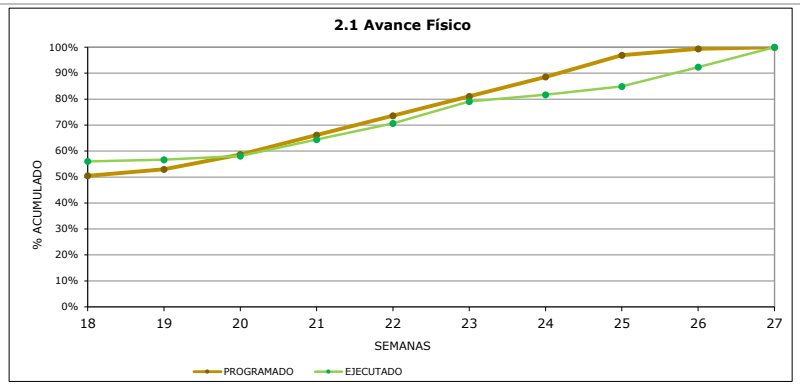

3. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS VISIBLES E INTERMEDIAS

No.	FECHA PROGRAMADA	HORA INICIO/ HORA FIN	LUGAR	FECHA REAL
1	1/04/2022	10:30am	Club 31 de marzo	24/06/2022
2	9/12/2022	POR DEFINIR		
3	POR DEFINIR			

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

4.1 PROGRAMACION (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Las intensas lluvias en las últimas semanas, causaron un desfase de la ejejcución, respecto a las metas programadas, precisando, el día 23 de noviembre, una suspensión temporal de actividades, hasta el 30 de noviembre, para reiniciar el 01 de diciembre, no obstante, las condiciones climáticas que motivaron la suspensión, persistieron, obligando a prorrogar la suspensión hasta el día 8 de diciembre. El día 9 de diciembre se reinicia la obra y el 10 de diciembre de 2022, se termina satisfactoriamente la obra, de acuerdo a las condiciones contractuales.

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACION DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista dispuso de todos los recursos requeridos, con los cuales se dio término al plazo contractual y a las condiciones del mismo.

4.3. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

La ejecución financiera fue oportuna y suficiente para cumplir a cabalidad con las metas contractuales.

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Los ensayos de laboratorio y ensayos in situ, , mostraron cumplimiento de las especificaciones técnicas y demas requerimientos técnicos.

4.5. MANEJO AMBIENTAL

Los sitios de ejecución, presentan ausencia de escombros, basura y situaciones que puedan perjudicar la estética y las condiciones ambientales del entorno.

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Contratista suministró al personal técnico y operativo los elementos de protección personal y seguridad industrial.

4.7 SALUD OCUPACIONAL

El Contratista afilió a todo el personal técnico a la seguridad social y parafiscales requerido por la Ley.

4.8 ASPECTOS SOCIALES

El Contratista mantuvo en obra, al profesional social, acorde a la dedicación establecida en el Contrato de Obra.

Se programó AV2 para el 29/11/2022, se reprogramó para el 09/12/2022, fue cancelada y queda pendiente reprogramacion.

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 4**

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA
4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)	SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA	Terminado	MUNICIPIO DE ORITO	23/11/2022	9/12/2022

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No se presentan durante el periodo

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Nota: Pese a las condiciones climáticas, que precisaron la suspension por un término de 16 días calendario, el objeto y las metas contractuales, se lograron satisfactoriamente.

COMPONENTE TÉCNICO: Debido a algunas diferencias, entre las cantidades contractuales (derivadas del balance No. 01), con respecto a las cantidades finales ejecutadas, fue necesario hacer un balance final, de acuerdo a las mayores y menores cantidades de obra ejecutadas, que permitió diligenciar el acta final de obra, la cual se cierra con el 100% del valor contractual.

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO A REPORTAR:

- **AFIRMADO PARA ANDENES:** se ejecuta el afirmado para los andenes de la carrera 4.
- **CONCRETO DE 3.8 Mpa PARA PAVIMENTO:** Terminación del pavimento en la carrera 4.
- **CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ANDENES:** Fundición de andenes en la carrera 4.
- **BORDILLO DE CONCRETO DE 3.000 PSI, VACIADO IN SITU:** Fundicion de los bardillos de la carrera 4.
- **SENALIZACION VIAL:** Demarcacion vial con pintura en frío, Senales verticales en lámina e instalación de tachas.
- **CONTROL DE CALIDAD:** El concreto utilizado en la fundición de pavimentos y andenes se prepara de acuerdo al diseño de mezclas . Se realiza el control de asentamiento del concreto, utilizando el cono de abrams y se toman las cilindros para las pruebas de laboratorio respectivas de concreto. Igualmente se realizan los ensayos de densidades de la sub base.
- **CONTROL DE NIVELES:** Se realizó verificación de niveles según diseño del pavimento en perfil longitudinal y transversal (bombeo), asi como de andenes, teniendo como guía las estacas que el equipo topográfico deja al lado y lado de la vía cada 10 metros.

OBSERVACIONES:

Las obras se terminan a satisfacción y de acuerdo a las metas contractuales.

8. ANEXOS

2.1 Copia bitácora

2.2 Acta Comité de obra

FIRMA: _____

INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
LUIS ALVARO GUERRERO PRADO
TP No: 2520207909 CND
