INFORME No 4

INTERVENTORIA CTO CIHCM 422 DE 2023 Y OBRA CTO CLPIH382 DE 2023 CORRESPONIDIENTE AL PERIODO 01 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **CIHCM422 DE** de 2023

INFORME DE INTERVENTORIA No. 4

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A TRES (03) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA SANTA MARTA, VEREDA FILO GUAYABLA Y EL CENTRO POBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GARZON – DEPARTAMENTO DEL HUILA

Objeto Contrato:

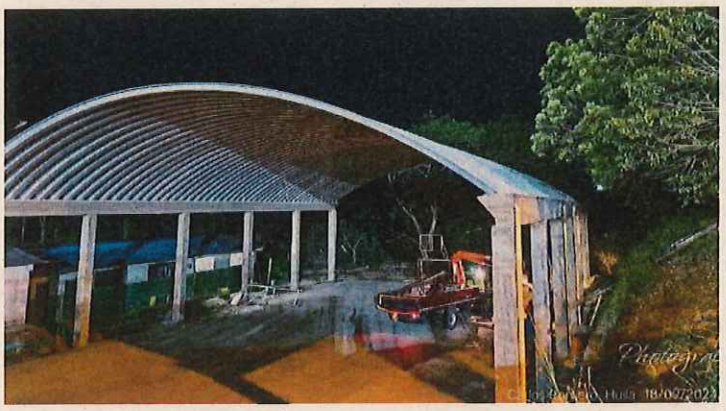

MUNICIPIO: **CENTRO POBLADO EL PARAISO – GARZON**

DEPARTAMENTO: **HUILA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM422 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO CUBO

APOYO A LA SUPERVISIÓN	ANDRES FELIPEZ MUÑOZ	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**CIHCM422**DE 2023		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A TRES (03) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA SANTA MARTA, VEREDA FILO GUAYABLA Y EL CENTRO POBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GARZON – DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PERIODO DEL INFORME**	ENTRE 01 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DE 2024
CONTRATISTA	CONSORCIOCUBO	**NIT:**	901765482-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO	**C.C:**	1.019.013.695

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	**10 DE NOVIEMBRE DE 2023**
FECHA DE INICIO (D/M/A):	**22 DE NOVIEMBRE DE 2023**
SUSPENSION No.1	27 DE DICIEMBRE DE 2023
REINICIO No.1	07 DE MAYO DE 2024
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N/A
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
VALOR INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($146.337.759,00) M/CTE.
VALOR TOTAL:	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($146.337.759,00) M/CTE.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	CLPIH382 DE 2023		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA I.E. RAMÓN ALVARADO SÁNCHEZ, SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA	RM INGENIERIA INTEGRAL S.A.S	**NIT:**	900.365.188-7
REPRESENTANTE LEGAL:	ROCIO DEL MAR OSORIO MORENO	**C.C:**	26.431.776
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	31 DE OCTUBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	22 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PLAZO INICIAL	3 MESES		
SUSPENSION No.1	27 DE DICIEMBRE DE 2023		
REINICIO No.1	07 DE MAYO DE 2024		
PLAZO TOTAL:	3 MESES		
VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE PESOS ($605.793.113,00) MCTE		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A		

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Garzón es un municipio colombiano localizado en el suroriente del departamento del Huila. Yace en el este con una región montañosa que corresponde al flanco occidental de la cordillera Oriental, y otra al oeste, plana que hace parte del valle del río Magdalena. Su extensión territorial es de 692 km², su altura es de 830 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 24 °C.

Cuenta con una población de 101.562 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2022. Es capital de la región Subcentro del departamento. Su economía se basa en la actividad agropecuaria, predominando el sector agrícola y la producción de café especial. Otros renglones como el ecoturismo y turismo religioso son importante para economía municipal. Es conocida como la Capital Diocesana del Huila por ser la primera diócesis católica de la región, también tiene como apelativo "Alma del Huila".

Garzón limita con el Municipio de Gigante, por el Sur con el Municipio de Guadalupe, al Suroeste con los Municipios de Altamira, por el oriente por el departamento del Caquetá y por el occidente con el Municipio de Agrado. Debido a su topografía, se encuentra Subdividida en distintas regiones.
Posee una Extensión de 580 KM Cuadrados que equivalen al 29% de la superficie total del Departamento del Huila

El sitio donde se desarrollara el proyecta está localizado en la institución educativa RAMON ALVARADO SANCHEZ SEDE EL PARAISO municipio de Garzón – Huila Vereda el paraíso.



Ilustración 1. Localización de Colombia en el Departamento del Huila



Ilustración 2. Localización de Municipio de Garzón – en el departamento Huila

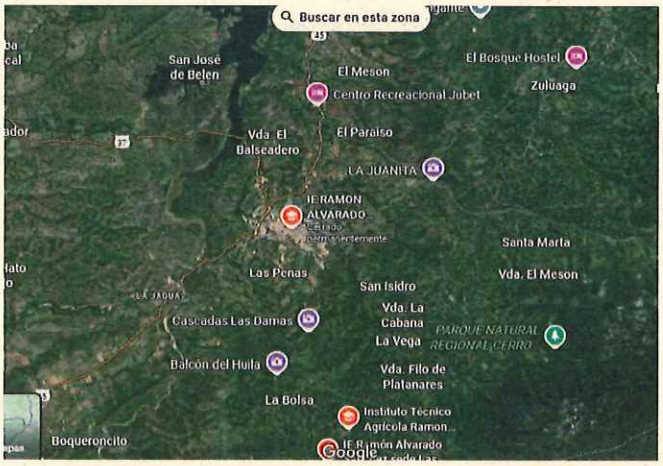


Ilustración 3. Localización de Vereda el paraíso Fuente: Google Earth



Ilustración 4. Localización de I.E RAMON ALVARADO Fuente: Google Earth

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Construcción de cubierta auto portante con iluminación para la vereda paraíso del municipio de Garzón – Huila la cual comprende de la ejecución de cimentación con sus respectivas zapatas y vigas de cimentación. Igualmente, la cubierta auto portante será soportada en 12 columnas de concreto de 3.000 psi distribuida en dos ejes (A-B). El proyecto también contará con la construcción de una viga canal que hará a su vez de conductor de aguas lluvias y soporte para la misma cubierta, según diseños entregados, además con la instalación de todas las iluminarias respectivas para un buen aprovechamiento del espacio deportivo en horas nocturnas.

La cubierta será con un sistema autoportante, sostenida con columnas en concreto de 3.00 PSI. El sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3.000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras atienden lo establecido en la NORMA SISMORESISTENTE de 2010 – NSR-10.

- ✓ ACTIVIDADES PRELIMINARES
- ✓ ESTRUCTURA EN CONCRETO
- ✓ ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA
- ✓ ACABADOS – PLACA DE CONCRETO
- ✓ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- ✓ INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- ✓ ASEO

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

Las actividades realizadas durante la ejecución del contrato correspondiente al mes Junio 2024.

CONDICIONES CONTRACTUALES			EJECUCION DE OBRA MENSUAL (JUNIO)	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR / TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			
1.1	Localización y replanteo manual	M2	0	$ -
1.2	Demolición placa maciza 0.25 m Incluye retiro	M2	0	$ -
1.3	Excavación manual y retiro de material	M3	0	$ -
1.4	Relleno en recebo compactado mecánica	M3	0	$ -
2	**CONCRETOS**			$ -
2,1	Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 p.s.i. e=0,05m	M2	0	$ -
2,2	Concreto para base de estructuras en concreto ciclópeo - 2500 PSI (175 kg/cm2) 60% concreto 2500 PSI + 40% piedra media zonga.	M3	0	$ -

2,3	Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 p.s.i	M3	0	$ -
2,4	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2	M3	0	$ -
2,5	Construcción de Columnas en Concreto de 210 KG/CM2	M3	0	$ -
2,6	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2	M3	15,74	$ 17.595.054,00
3	**ESTRUCTURA METÁLICA - CUBIERTA**			**$ 17.595.054,00**
3,1	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I.	KG	0	$ -
3,2	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	684	$ 251.348.091,00
3,3	Suministro y colocación de cubierta a base de lámina traslucida de alta resistencia en poliester reforzada con fibra de vidrio en clase 7, color opal en acabado liso	M2	0	$ -
4	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**			**$ 251.348.091,00**
4,1	Pañete sobre concreto 1:4 incluye filos y dilataciones.	M2	0	$ -
4,2	Mortero Impermeabilizado para Viga Canal	M2	67,2	$ 3.830.917,00
4,3	suministro e instalación de recubrimiento sintético pisos plexiflor o similar en resina epoxica varios colores incluye demarcación (futbol sala, baloncesto, voleibol) cuatro capas de resinas acrílicas de alta resistencia y adherencia. acabado final 5 colores	M2	0	$ -
4,4	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubería de galvanizada de 2" calibre 14 y la parte de los tableros en ángulo de 1 1/2"x1/8"; incluye anticorrosivo, wash primer y pintura en esmalte.	JUEGO	1	$ 4.416.020,00
4,5	suministro e instalación de mallas para porterías en nylon calibre no. 3 tipo cabaña.	UND	2	$ 887.479,00
4,6	suministro e instalación de aro para basquetbol; incluye malla de nylon y elementos de fijación.	UND	2	$ 274.365,00
4,7	suministro e instalación de lamina en fibra de vidrio (e= 0.15 mm - sección 120x180 cm) para canchas de basquetbol; incluye marcación y elementos de fijación	UND	2	$ 3.189.593,00
5	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**			**$ 12.598.374**
5,1	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	48	$ 6.479.555,00

5,2	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	86,5	$ 12.953.602,00
5,3	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 10", con accesorios de conexión; para salida.	ML	40,8	$ 6.200.791,00
5,4	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.80*0.80, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	3	$ 1.500.475,00
5,5	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 1*1 H: 1M, incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	1	$ 619.255,00
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**$ 27.753.678**
6.1	Medidor trifilar y acometida a red E.H.	UND	1	$ 3.043.312,00
6.2	Caja para puesta tierra de 30x30	UND	1	$ 389.839,00
6.3	Acometida tablero general TG a tableros N° 6 AWG	ML	19,8	$ 2.670.005,00
6.4	Instalacion de Tablero trifilar de 12 Circuitos	UND	1	$ 1.121.226,00
6.5	Luminaria Led tipo Indu Bay de 3 generación 220-240 V (50-60 Hz) de 185 W con 151 lm/W	UND	12	$ 29.733.819,00
6.6	Tomacorriente doble con polo a tierra	UND	1	$ 189.136,00
7	**ASEO**			**$ 37.147.337,00**
7,1	Aseo final de obra	M2	0	$ -
	LEGALIZACION RETIE - RETILAP			
		SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA		**$ 346.442.534**

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	22/11/2023	**35**		**21/02/2024**
Suspension No.1	27/12/2023			
Reinicio No.1	07/05/2024		**130**	**30/06/2024**
Suspension No.2	27/06/2024			
Terminacion				
TOTAL DIAS				

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
CONTRATO	CLPIH382	31 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA DE INICIO		22 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSION No.1	1	27 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No.1	1	07 DE MAYO DE 2024
ACTA DE SUSPENSION No.1	1	27 DE JUNIO DE 2024

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO

(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). **Obligaciones de Carácter General.**	1. Se realiza Acta de suspensión No.2 del contratista el día 26 de Junio de 2024 bajo el contrato obra No. CLPIH382-2023 2. se realiza comité de obra con el fin de verificar cantidades y estado de la obra
b). **Actividades Administrativas.**	*1. se realiza control y seguimiento del personal que ejecuto la obra en el mes de Diciembre en pagos de aportes de seguridad social y parafiscales.*


CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	*CARGO*
Ronald A. González Martinez	*Director de obra*
Carmen Elisa Cardoso	*Residente de obra*
Roció Del Mar Osorio Moreno	*Hseq*
Anacona Ortiz Oscar Marino	*Maestro*
Avila Mendoza Orlando	*Oficial*
Bernate Rozo Hernan	*Ayudante*
Bernate Rozo Lisandro	*Ayudante*
Binche Gerene Luis Hermogenes	*Ayudante*
Botina Julian Edgar	*Ayudante*
Fierro Borrero Ismael	*Ayudante*
Guevara Bernate Jonh Hamilton	*Ayudante*
Losada Ruben Dario	*Ayudante*
Mejia Dussan Carlos Miguel	*Ayudante*

	Motta Sarrias Mesias	*Ayudante*
	Rojas Rozo Jhoan Sebastian	*Ayudante*
	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	*Se realizó seguimiento de obra a los equipos presentes en el área para la ejecución de la obra. Los cuales se encuentran reportados en las inspecciones de informe HSEQ del contratista en cada periodo.* Equipo topográfico de alta precisión Herramienta menos para mínimo dos (2) cuadrillas Compresor (185-250) cfm-2 martillos Una (1) mezcladora de concreto Equipo mecánico para compactación Equipo para transporte horizontal y vertical de concreto Vibrador a gasolina Grúa Hidráulica
	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	*Se realiza entrega por parte del contratista de todos los certificados de calidad de los materiales de obra utilizados, los cuales fueron verificados en obra y se cuenta con el soporte en el dossier de calidad del contratista.*
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	*Se realiza seguimiento de pago de aportes mensual del contratista* *JUNIO2024 : Se verifican soportes de afiliacion del personal que ingresa al proyecto (ver anexo de afiliaciones del contratista)*
	La interventoría certifica que se realiza la verificación de la totalidad de las afiliaciones del personal en obra y el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional.	
c). **Actividades Operativas.**	1. Se realiza control y seguimiento de las actividades operativas del contrato y se realizan las modificaciones respectivas de acuerdo a los replanteos de obra. 2. se verifican el cumplimiento de los procedimientos de calidad del contratista y la implementación del plan de gerencia y plan de calidad asi mismo el seguimiento de estos planes. Se realiza la ejecución de los siguientes ítems durante el contrato: - Construcción de Columnas en Concreto de 210 KG/CM2 - Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2	

	- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. - Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz. - Mortero Impermeabilizado para Viga Canal - Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubería de galvanizada de 2" calibre 14 y la parte de los tableros en ángulo de 1 1/2"x1/8"; incluye anticorrosivo, wash primer y pintura en esmalte. - suministro e instalación de mallas para porterías en nylon calibre no. 3 tipo cabaña. - suministro e instalación de aro para basquetbol; incluye malla de nylon y elementos de fijación. - suministro e instalación de lamina en fibra de vidrio (e= 0.15 mm - sección 120x180 cm) para canchas de basquetbol; incluye marcación y elementos de fijación - Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias. - Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues. - Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 10", con accesorios de conexión; para salida. - Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.80*0.80, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño - Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 1*1 H: 1M, incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño - Medidor trifilar y acometida a red E.H. - Caja para puesta tierra de 30x30 - Acometida tablero general TG a tableros N° 6 AWG - Instalacion de Tablero trifilar de 12 Circuitos - Luminaria Led tipo Indu Bay de 3 generación 220-240 V (50-60 Hz) de 185 W con 151 lm/W - Tomacorriente doble con polo a tierra
d). **Actividades Logísticos.**	1. Se revisa la bitácora de obra completa. 2. Se realiza la medición de las actividades realizadas en la ejecución del contrato general
e). **Obligaciones de Carácter Ambiental.**	1. Se verifican las licencias de canteras y documentos ambientales aplicados en la ejecución del proyecto.
f). **Actividades Financieras.**	1. Se realizó el seguimiento financiero a las actividades de obra con respecto al presupuesto propuesto para el proyecto.
g). **Actividades Jurídicos.**	1. Se realiza la revisión de las pólizas del contrato y sus anexos 2. Se realizaron las pólizas de acuerdo a la emisión de otros, y actas del contrato de obra e interventoría.(ver anexo de pólizas del contrato de obra)

9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Las condiciones climáticas presentadas en los periodos de ejecución de las obras se describen a continuación:

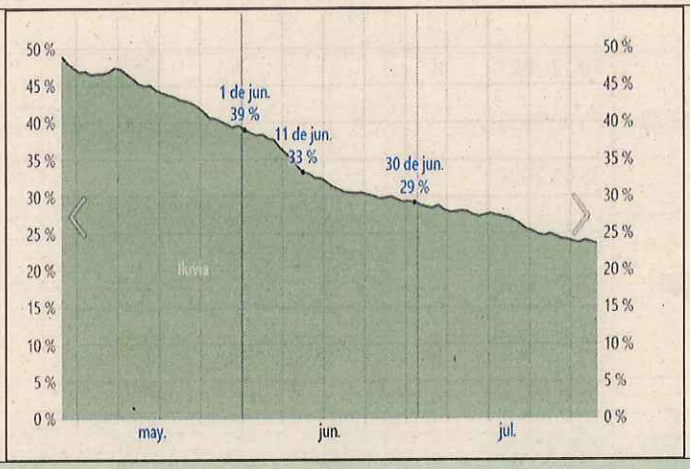

10. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
06/06/2024	OBRA	Metodología constructiva
20/06/2024	OBRA	Problemática de abastecimiento de materiales y avance de obra

11. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	3000 PSI	**7.69BL – 0.80M3 – 0.33M3 – 175LT**

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas de acuerdo a las especificaciones técnicas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio Tomadas por la interventoría

DESCRIPCIÓN	FECHA TOMA DE MUESTRA	FECHA ROTURA	EDAD DEL ENSAYO	RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE

			7	14	28			
ZAPATAS C1 Y C2	11/12/2023	18/12/2023	X			1950	2235	CUMPLE
		25/12/2023		X		2100	2692	CUMPLE
		08/01/2024			X	3000	3055	CUMPLE
COLUMNAS C1 Y C2	20/12/2023	23/12/2023	X			1950	1967	CUMPLE
		27/01/2024		X		2100	2267	CUMPLE
		17/01/2024			X	3000	3078	CUMPLE
CICLOPEO EJE A	11/05/2024	18/05/2024	X			1950	1930	CUMPLE
		25/05/2024		X		2100	2230	CUMPLE
		08/06/2024			X	3000	3050	CUMPLE
CICLOPEO EJE B	13/05/2024	20/05/2024	X			1950	1936	CUMPLE
		27/05/2024		X		2100	2684	CUMPLE
		10/06/2024			X	3000	3054	CUMPLE
ZAPATAS EJE A	21/05/2024	28/05/2024	X			1950	2235	CUMPLE
		04/06/2024		X		2100	2692	CUMPLE
		18/06/2024			X	3000	3056	CUMPLE
ZAPATAS EJE B	23/05/2024	30/05/2024	x			1950	2243	CUMPLE
		06/06/2024		X		2100	2701	CUMPLE
		20/06/2024			X	3000	3058	CUMPLE
VIGA DE CIMENTACION EJE A	28/05/2024	04/06/2024	x			1950	2249	CUMPLE
		11/06/2024		X		2100	2706	CUMPLE
		25/06/2024			X	3000	3060	CUMPLE
VIGA DE CIMENTACION EJE B	30/05/2024	07/06/2024	x			1950	2245	CUMPLE
		14/06/2024		X		2100	270	CUMPLE
		-			X	3000	-	CUMPLE
	30/05/2024	07/06/2024	x			1950	2245	CUMPLE
		14/06/2024		X		2100	270	CUMPLE

VIGA DE CIMENTACION EJE B		-			X	3000	-	-
COLUMNAS EJE A	07/06/2024	14/06/2024	x			1950	2176	CUMPLE
		21/06/2024		X		2100	2723	CUMPLE
		-			X	3000	-	-
COLUMNAS EJE B	10/06/2024	17/06/2024	x			1950	2248	CUMPLE
		25/06/2024		X		2100	2712	CUMPLE
		-			X	3000	3067	CUMPLE
VIGA CANAL EJE A	15/06/2024	22/06/2024	x			1950	2270	CUMPLE
		-		X		2100	-	-
		-			X	3000	-	-
VIGA CANAL EJE B	22/06/2024	-	x			1950	-	-
		-		X		2100	-	-
		-			X	3000	-	-

12. RELACIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD	FORMATO (Físico-Digital)
SOLICITUD DE SUSPENSION No.2	27/06//2024	DIGITAL
ACTA DE SUSPENSION No.2	27/06//2024	DIGITAL

13. PERSONAL INTERVENTORIA

NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
DARLYN JESUS PALACIOS PALACIOS	11814685	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
FRANKLIN MANUEL CATAÑO IBARRA	84031836	RESIDENTE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO

14. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LA INTERVENTORIA

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
DARLYN JESUS PALACIOS PALACIOS	$313.600	$78.400	$136.500	$78.400	0	**85661366**
FRANKLIN MANUEL CATAÑO IBARRA	$477.900	$119.500	$207.900	$119.500	0	**85661366**

15. .RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA INTERVENTORIA

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100000719	0	02-11-2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	01/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	01/02/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/02/2024	01/02/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras	01/11/2023	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	0	02-11-2023	01-11-2023	01-02-2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100000719	1 (anulado)	15-11-2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	01/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	01/02/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/02/2024	01/02/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras	01/11/2023	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)

SEGUROS MUNDIAL	CHU-100000719	1 (anulado)	15-11-2023	01/11/2023	01/02/2024

Póliza actualizada


POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100000719	2	15-11-2023	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	08/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	08/11/2023	08/02/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/02/2024	08/02/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras	08/11/2023	


POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100000719	2	15-11-2023	08/11/2023	08/02/2024


16. **PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO**

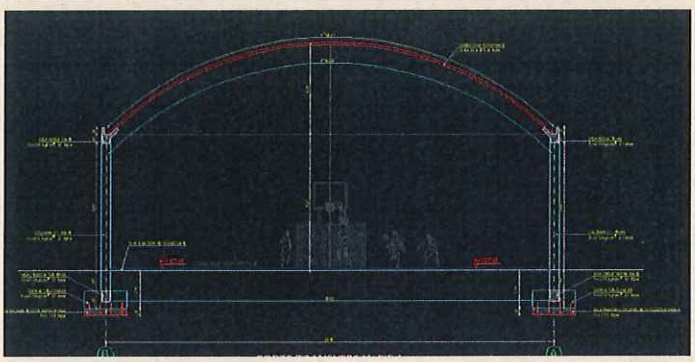


Plano No1: Detalle de columnas y arco de cubierta auto portante

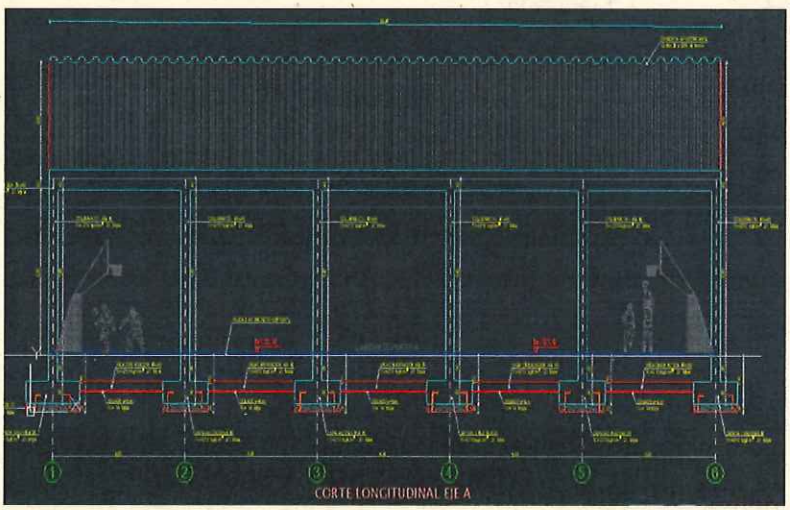

Esquema. Corte longitudinal de columnas y cubierta

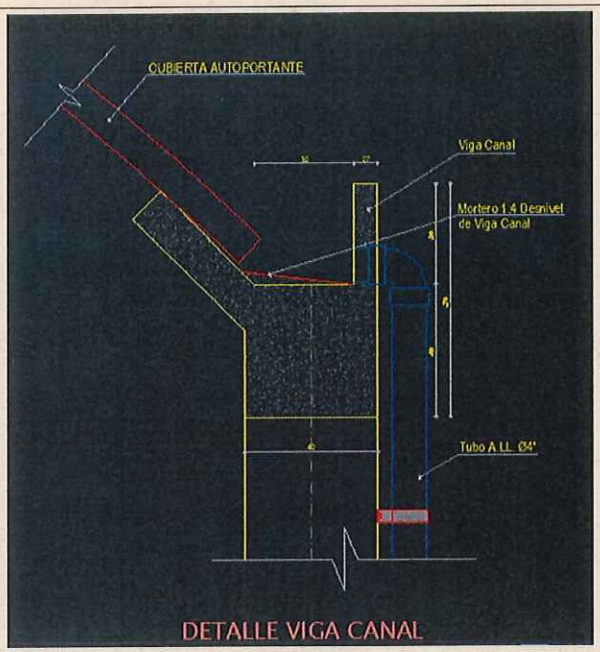

Plano 2 detalle de viga canal

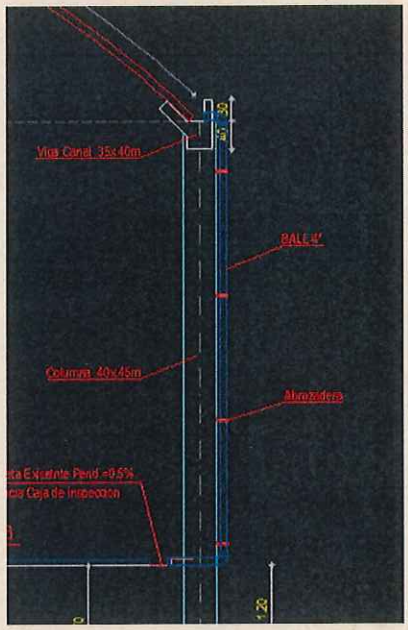

Esquema detalle de instalación de tuberia de aguas lluvias bajante 4"

ACTIVIDADES EJECUTADAS

16. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUCION DE OBRA MENSUAL (JUNIO)			EJECUCION DE OBRA ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT	VALOR / TOTAL	%	CANT	VALOR / TOTAL	%
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**										
1.1	Localización y replanteo manual	M2	1000	$ 4.497	$ 5.801.034	0,00	$ -	0,00%	754,07	$ 4.374.386,00	0,72%
1.2	Demolición placa maciza 0.25 m Incluye retiro	M2	19,2	$ 44.120	$ 1.092.770	0,00	$ -	0,00%	19,20	$ 1.092.770,00	0,18%
1.3	Excavación manual y retiro de material	M3	192,16	$ 54.711	$ 13.562.034	0,00	$ -	0,00%	198,99	$ 14.044.073,00	2,32%
1.4	Relleno en recebo compactado mecánica	M3	52,6	$ 90.595	$ 6.147.243	0,00	$ -	0,00%	52,60	$ 6.147.243,00	1,01%
2	**CONCRETOS**				**$ 26.603.081**		**$ -**			**$ 25.658.472,00**	
2,1	Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 p.s.i. e=0,05m	M2	22,50	$ 63.682	$ 1.848.357	0,00	$ -	0,00%	22,50	$ 1.848.357,00	0,31%

2,2	Concreto para base de estructuras en concreto ciclópeo - 2500 PSI (175 kg/cm2) 60% concreto 2500 PSI + 40% piedra media zonga.	M3	22,22	$ 551.445	$ 15.806.504	0,00	$ -	0,00%	14,65	$ 10.421.480,00	1,72%
2,3	Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 p.s.i	M3	7,88	$ 680.844	$ 6.920.915	0,00	$ -	0,00%	7,88	$ 6.920.915,00	1,14%
2,4	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2	M3	12,43	$ 671.301	$ 10.764.104	0,00	$ -	0,00%	7,94	$ 6.875.864,00	1,14%
2,5	Construcción de Columnas en Concreto de 210 KG/CM2	M3	9,72	$ 858.998	$ 10.770.804	0,00	$ -	0,00%	9,72	$ 10.770.804,00	1,78%
2,6	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2	M3	15,74	$ 866.555	$ 17.595.054	15,74	$ 17.595.054,00	2,90%	15,74	$ 17.595.054,00	2,90%
3	**ESTRUCTURA METÁLICA - CUBIERTA**				**$ 63.705.738**		**$ 17.595.054,00**			**$ 54.432.474,00**	
3,1	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I.	KG	5.486,59	$ 8.024	$ 56.792.943	0,00	$ -	0,00%	5.486,59	$ 56.792.943,00	9,37%

3,2	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	715,04	$ 284.859	$ 262.754.297	684,00	$ 251.348.091,00	41,49%	684,00	$ 251.348.091,00	41,49%
3,3	Suministro y colocación de cubierta a base de lámina traslucida de alta resistencia en poliester reforzada con fibra de vidrio en clase 7, color opal en acabado liso	M2	52,32	$ 232.837	$ 15.714.820	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
4	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**				**$ 335.262.060**		**$ 251.348.091,00**			**$ 308.141.034,00**	
4,1	Pañete sobre concreto 1:4 incluye filos y dilataciones.	M2	201,40	$ 31.733	$ 8.244.448	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
4,2	Mortero Impermeabilizado para Viga Canal	M2	67,20	$ 44.192	$ 3.830.917	67,20	$ 3.830.917,00	0,63%	67,20	$ 3.830.917	0,63%
4,3	suministro e instalación de recubrimiento sintético pisos plexiflor o similar en resina epoxica varios colores incluye demarcación (futbol sala, baloncesto, voleibol) cuatro capas de resinas acrílicas de alta resistencia y adherencia. acabado final 5 colores	M2	608,00	$ 107.781	$ 84.534.574	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%

4,4	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubería de galvanizada de 2" calibre 14 y la parte de los tableros en ángulo de 1 1/2"x1/8"; incluye anticorrosivo, wash primer y pintura en esmalte.	JUEGO	1,00	$ 3.423.272	$ 4.416.020	1,00	$ 4.416.020,00	0,73%	1,00	$ 4.416.020	0,73%
4,5	suministro e instalación de mallas para porterías en nylon calibre no. 3 tipo cabaña.	UND	2,00	$ 343.984	$ 887.479	2,00	$ 887.479,00	0,15%	2,00	$ 887.479	0,15%
4,6	suministro e instalación de aro para basquetbol; incluye malla de nylon y elementos de fijación.	UND	2,00	$ 106.343	$ 274.365	2,00	$ 274.365,00	0,05%	2,00	$ 274.365	
4,7	suministro e instalación de lamina en fibra de vidrio (e= 0.15 mm - sección 120x180 cm) para canchas de basquetbol; incluye marcación y elementos de fijación	UND	2,00	$ 1.236.276	$ 3.189.593	2,00	$ 3.189.593,00	0,53%	2,00	$ 3.189.593	0,53%
5	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 105.377.396**		**$ 12.598.374**			**$ 12.598.374**	
5,1	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	48,00	$ 104.644	$ 6.479.555	48,00	$ 6.479.555,00	1,07%	48,00	$ 6.479.555	1,07%
5,2	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	86,50	$ 116.087	$ 12.953.602	86,50	$ 12.953.602,00	2,14%	86,50	$ 12.953.602	2,14%
5,3	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 10", con accesorios de conexión; para salida.	ML	40,80	$ 117.814	$ 6.200.791	40,80	$ 6.200.791,00	1,02%	40,80	$ 6.200.791	1,02%
5,4	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.80*0.80, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	3,00	$ 387.720	$ 1.500.475	3,00	$ 1.500.475,00	0,25%	3,00	$ 1.500.475	0,25%


5,5	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 1*1 H: 1M, incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	1,00	$ 480.043	$ 619.255	1,00	$ 619.255,00	0,10%	1,00	$ 619.255	0,10%
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 27.753.678**		**$ 27.753.678**			**$ 27.753.678**	
6.1	Medidor trifilar y acometida a red E.H.	UND	1,00	$ 2.359.156	$ 3.043.312	1,00	$ 3.043.312,00	0,50%	1,00	$ 3.043.312,00	0,50%
6.2	Caja para puesta tierra de 30x30	UND	1,00	$ 302.200	$ 389.839	1,00	$ 389.839,00	0,06%	1,00	$ 389.839,00	0,06%
6.3	Acometida tablero general TG a tableros N° 6 AWG	ML	19,80	$ 104.534	$ 2.670.005	19,80	$ 2.670.005,00	0,44%	19,80	$ 2.670.005,00	0,44%
6.4	Instalacion de Tablero trifilar de 12 Circuitos	UND	1,00	$ 869.167	$ 1.121.226	1,00	$ 1.121.226,00	0,19%	1,00	$ 1.121.226,00	0,19%
6.5	Luminaria Led tipo Indu Bay de 3 generación 220-240 V (50-60 Hz) de 185 W con 151 lm/W	UND	12,00	$ 1.920.789	$ 29.733.819	12,00	$ 29.733.819,00	4,91%	12,00	$ 29.733.819,00	4,91%
6.6	Tomacorriente doble con polo a tierra	UND	1,00	$ 146.617	$ 189.136	1,00	$ 189.136,00	0,03%	1,00	$ 189.136,00	0,03%
7	**ASEO**				**$ 37.147.337**		**$ 37.147.337,00**			**$ 37.147.337,00**	
7,1	Aseo final de obra	M2	1000,00	$ 2.669,63	$ 3.443.824	0,00	$ -	0,00%	0,00%		0,00%
					$ 3.443.824					$ -	
	LEGALIZACION RETIE - RETILAP			$ 6.500.000,00	$ 6.500.000						
		SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA			**$ 605.793.113**		**$ 346.442.534**	**57,19%**		**$ 465.731.369,00**	**76,83%**

ING.ROCIO DE MAR OSORIO M.
R.L RM INGENIERIA INTEGRAL S.A.S
CONTRATISTA

ARQ.ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
R.L CONSORCIO CUBO
INTERVENTOORIA

17. CURVA S DEL PROYECTO

EJECUCION FISICA

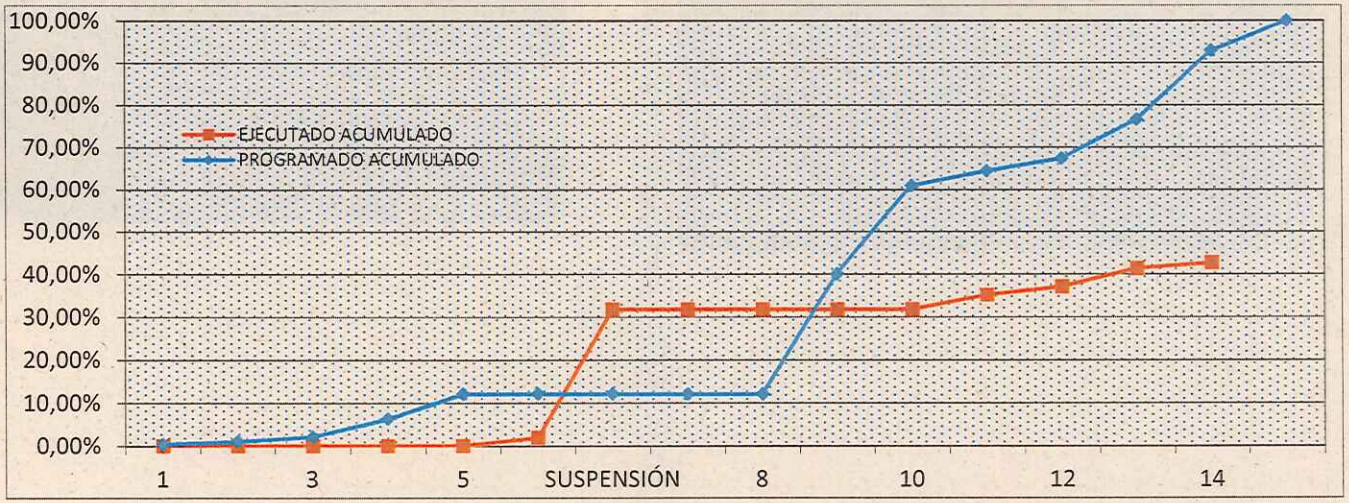

18. REGISTRO FOTOGRAFICO



05 DE JUNIO DE 2024 – Instalación de formaleta para columnas eje A



07 DE JUNIO DE 2024 – Concreto para columnas eje A






9 DE JUNIO DE 2024 – Instalación de formaleta eje B ,
10 DE JUNIO DE 2024 – Concreto para columnas eje B





12 DE JUNIO DE 2024 – Formaleta de viga canal eje A
14 DE JUNIO DE 2024 – Instalación de acero de viga canal eje A

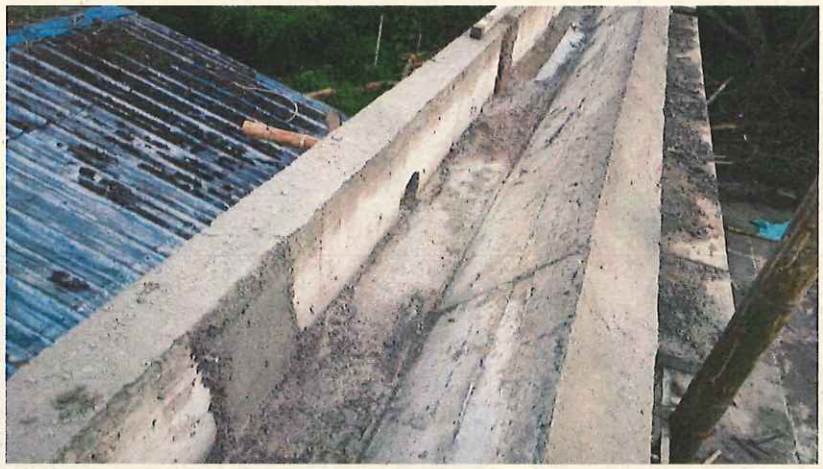

15 DE JUNIO DE 2024 - Concreto de 3000 psi para viga canal





17 DE JUNIO DE 2024 – Instalación de formaleta para viga canal eje B
19 DE JUNIO DE 2024 – Instalación de acero refuerza viga canal eje B



22 DE JUNIO DE 2024 - Concreto de viga canal eje B




9 DE JUNIO DE 2024 Medidor trifilar y acometida a red de E.H







20 DE JUNIO DE 2024 - Acometida tablero general

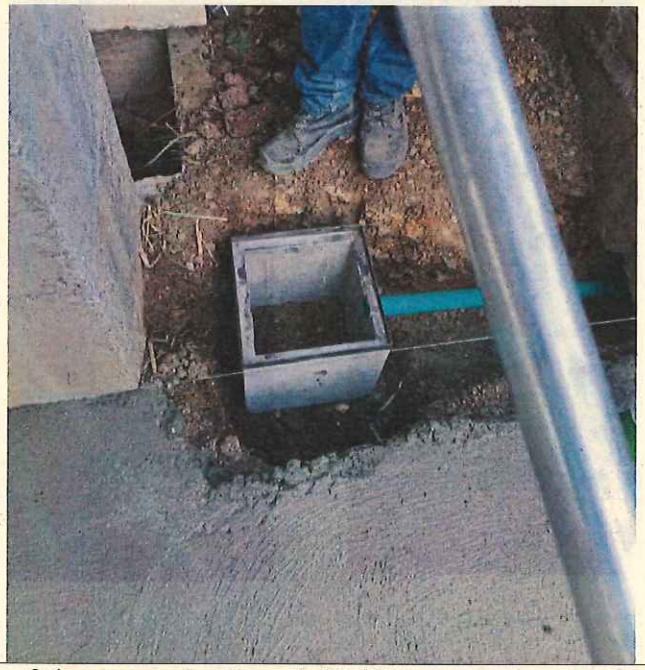


23 DE JUNIO DE 2024 – Caja para puesta a tierra de 30x30

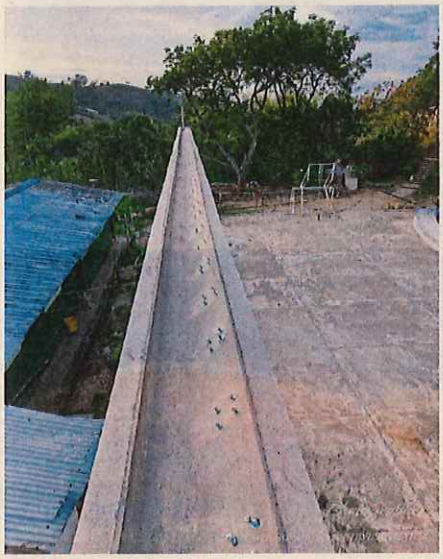




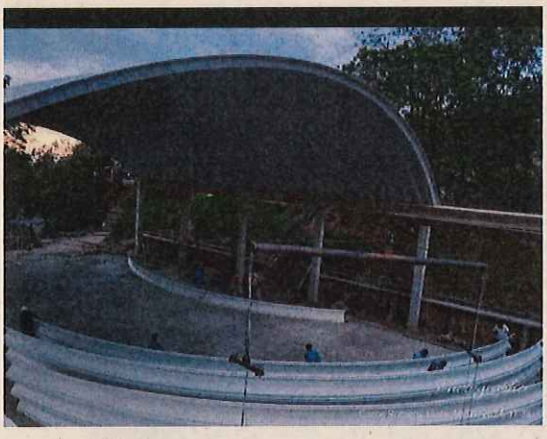

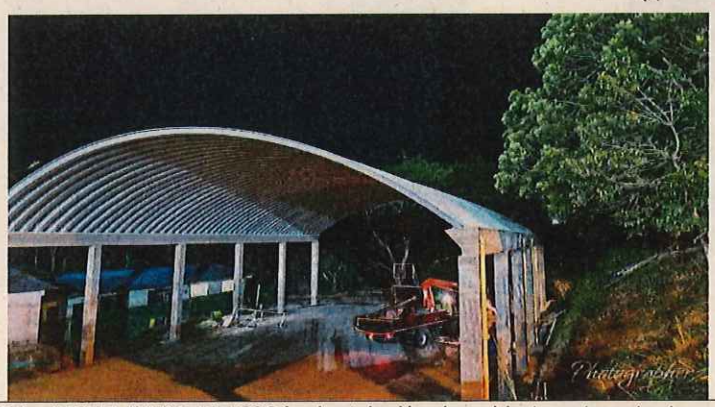



24 y 25 DE JUNIO DE 2024 – Instalación de cubierta autoportante calibre 22

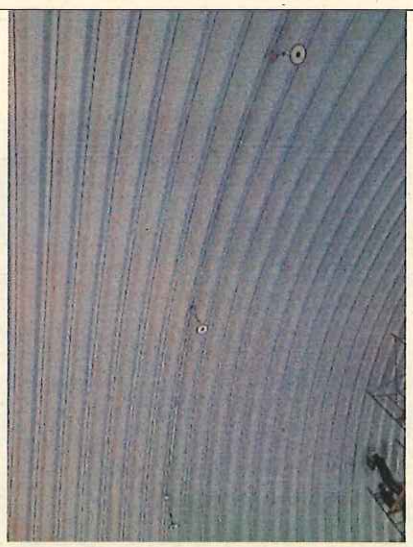




26 DE JUNIO DE 2024 - Luminaria Led tipo Indu Bay de 3 generación 220-240 V (50-60 Hz) de 185 W con 151 lm/W

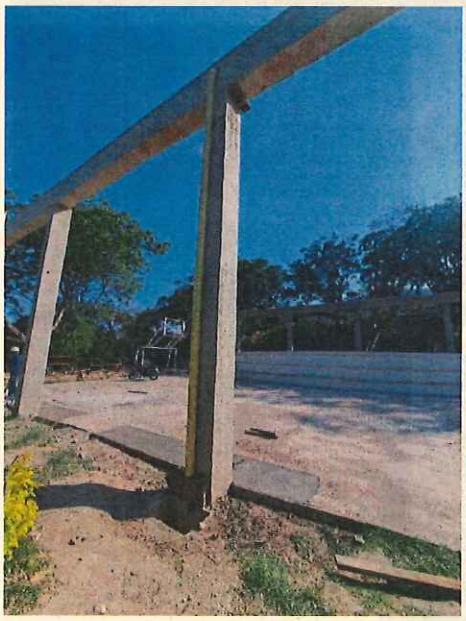

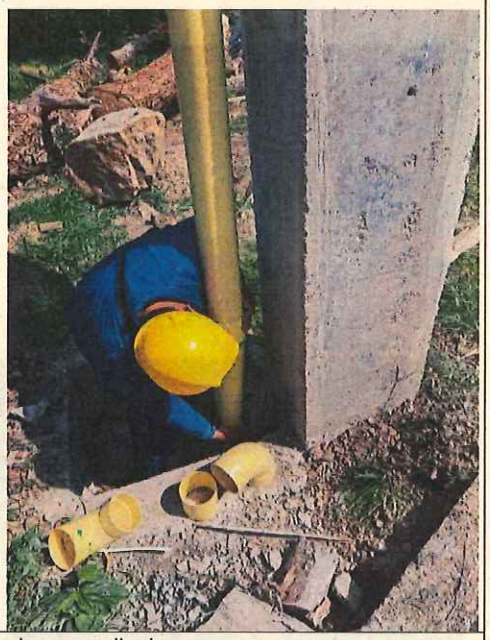

21 DE JUNIO DE 2024 – instalación de tuberia PVC 4" bajante de aguas lluvias



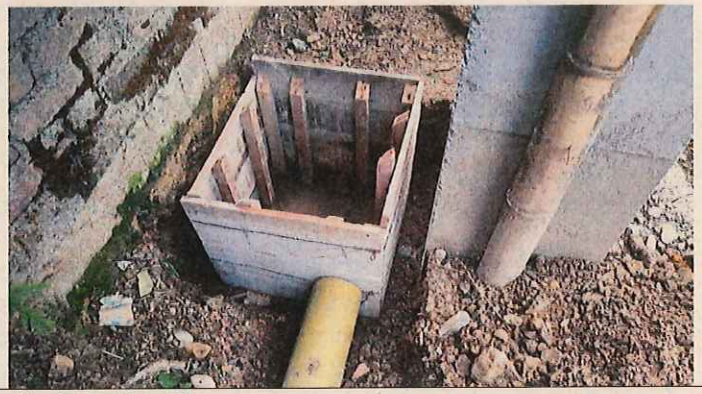

24 DE JUNIO DE 2024 – Instalación de tuberia de 6" y 10"





26 DE JUNIO DE 2024 – Construcción de cajas de inspección

19. CONCLUSIONES

- Para el presente periodo el Contratista desarrolló las siguientes actividades:
  Tomacorriente doble con polo a tierra

  - Construcción de Columnas en Concreto de 210 KG/CM2
  - Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2
  - Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I.
  - Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.
  - Mortero Impermeabilizado para Viga Canal
  - Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubería de galvanizada de 2" calibre 14 y la parte de los tableros en ángulo de 1 1/2"x1/8"; incluye anticorrosivo, wash primer y pintura en esmalte.
  - suministro e instalación de mallas para porterías en nylon calibre no. 3 tipo cabaña.
  - suministro e instalación de aro para basquetbol; incluye malla de nylon y elementos de fijación.
  - suministro e instalación de lamina en fibra de vidrio (e= 0.15 mm - sección 120x180 cm) para canchas de basquetbol; incluye marcación y elementos de fijación
  - Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.
  - Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.
  - Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 10", con accesorios de conexión; para salida.
  - Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.80*0.80, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño
  - Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 1*1 H: 1M, incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño
  - Medidor trifilar y acometida a red E.H.
  - Caja para puesta tierra de 30x30
  - Acometida tablero general TG a tableros N° 6 AWG
  - Instalacion de Tablero trifilar de 12 Circuitos
  - Luminaria Led tipo Indu Bay de 3 generación 220-240 V (50-60 Hz) de 185 W con 151 lm/W
- A fecha del presente informe no se han presentado novedades en accidentes o enfermedades laborales, por lo cual, todo el personal ha trabajado normalmente sin ningún tipo de afectaciones en salud.
- Se realiza la suspensión No.2 del contrato de obra con fecha de 27 de Junio de 2024.
- Se realiza la entrega y revisionde acta de mayores y menores cantidades de obra para el proyecto.
  - Durante el periodo del presente informe, la interventoría realizo las siguientes actividades:
  - Control permanente sobre la realización de actividades de obra física.
  - Seguimiento y control permanente a las actividades ejecutadas en obra
  - Se reporta en los informes semanales y en el mensual ejecutivo de la interventoría los avances registrados.
  - Se analizó, revisó y se conceptualizó sobre las competencias del personal profesional propuesto y la organización de cargos y funciones para el desarrollo de la obra.
  - Se realiza control de cantidades de obra y presupuesto del proyecto para llevar un control financiero continuo.
  - Verificar y controlar el estricto cumplimiento de especificaciones técnicas.
  - Registro semanal de todas las actividades ejecutadas por el contratista de obra.

- Seguimientos a los compromisos adquiridos por parte del contratista.
- Verificación del diligenciamiento del libro diario (Bitácora) de obra.
- control de calidad a los materiales provenientes de las canteras certificadas.

20. ANEXOS

- soportes de pago a aportes a seguridad social integral (eps-arp-afp). interventoría de obra
- pruebas de análisis de laboratorio interventoría
- actas de comité
- bitácora

ARQ. CAROLINA SANABRIA NIETO	(27-06-2024)	ARQ. ANDRÉS FELIPE MUÑOZ
FIRMA INTERVENTOR	**FECHA DE ENTREGA**	**VoBo SUPERVISOR**

- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP). INTERVENTORIA DE OBRA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901765482-8	CONSORCIO CUBO		cr 10 no 18 44	3208697225	cubikoint@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDERHUILA	HUILA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	12/07/2024	85661366	$4.795.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003806955	CASTELLANOS SANTOS MARIA CAMILA	1	0			S	x																230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	5	97.500	CCF32	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
2	CC	1114730637	FRANCO GELVEZ MICHAEL DOUGLAS	1	0			S	x																231001	324.000	51.900	0	0	0	0	EPS037	324.000	13.000	14-23	324.000	5	22.600	CCF32	324.000	13.000	0	0	0	0	0
3	CC	11814685	PALACIOS PALACIOS DARLYN JESUS	1	0			S	x																230201	1.960.000	313.600	0	0	0	0	EPS010	1.960.000	78.400	14-23	1.960.000	5	136.500	CCF32	1.960.000	78.400	0	0	0	0	0
4	CC	1192780595	PULGARIN COHECHA JERALDIN PIERINA	1	0			S	x																230201	1.418.667	227.000	0	0	0	0	EPS017	1.418.667	56.800	14-23	1.418.667	5	98.800	CCF32	1.418.667	56.800	0	0	0	0	0
5	CC	1221965638	MELENDEZ FERNANDEZ MELISSA ISABEL	1	0			S	x																231001	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS002	1.328.600	53.200	14-23	1.328.600	5	92.500	CCF32	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
6	CC	3102749	MEJIA MEDINA FABIO JESUS	1	0			S	x																230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	84.000	14-23	2.100.000	5	146.200	CCF32	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
7	CC	73094927	CAGUA OSPINO LUIS ALFONSO	1	0			S	x																230901	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS010	2.100.000	84.000	14-23	2.100.000	5	146.200	CCF32	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
8	CC	79267382	SANABRIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1	0			S	x																231001	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS008	1.328.600	53.200	14-23	1.328.600	5	92.500	CCF32	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
9	CC	79493953	CONTRERAS ROJAS MARCO ANTONIO	1	0			S	x																25-14	540.000	86.400	0	0	0	0	EPS005	540.000	21.600	14-23	540.000	5	37.600	CCF32	540.000	21.600	0	0	0	0	0
10	CC	84031836	CATAÑO IBARRA FRANKLIN MANUEL	1	0			S	x																231001	2.986.667	477.900	0	0	0	0	EPS008	2.986.667	119.500	14-23	2.986.667	5	207.900	CCF32	2.986.667	119.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901765482-8	CONSORCIO CUBO		cr 10 no 18 44	3208697225	cubikoint@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDERHUILA	HUILA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	12/07/2024	85661366	$4.795.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	53.200	0		0		0	0	0	0	53.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	77.600	0		0		0	0	0	0	77.600	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	256.700	0		0		0	0	0	0	256.700	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	162.400	0		0		0	0	0	0	162.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	56.800	0		0		0	0	0	0	56.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	13.000	0		0		0	0	0	0	13.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	764.600	0	0	0	0	0	0		764.600	3
230301	Porvenir	800224808-8	336.000	0	0	0	0	0	0		336.000	1
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	336.000	0	0	0	0	0	0		336.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	955.000	0	0	0	0	0	0		955.000	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	86.400	0	0	0	0	0	0		86.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.078.300				1.078.300	0	0	1.078.300			10.783	1.078.300	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	619.700	0	0	619.700	10

PAGADA

02

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901765482-8	CONSORCIO CUBO		cr 10 no 18 44	3208697225	cubikoint@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDERHUILA	HUILA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	12/07/2024	85661366	$4.795.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	619.700	619.700
Pensión	5	2.478.000	2.478.000
Riesgos Laborales	1	1.078.300	1.078.300
CCF	1	619.700	619.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	4.795.700	4.795.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

• PRUEBAS DE ANALISIS DE LABORATORIO INTERVENTORIA



Neiva, Julio 06 del 2024

Señor:
RM INGENIERIA INTEGRAL S.A.S
Ciudad

Referencia: ***Remisión resultados de laboratorio.***

Cordial Saludo.

Con el presente, me permito remitir los resultados obtenidos en los ensayos de compresión simple al concreto, con el fin de hacer el control de calidad a las obras que se construyen en cumplimiento del contrato de obra cuyo objeto es: ***MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA I.E. RAMÓN ALVARADO SÁNCHEZ, SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA.***

Atentamente,

LABINCON S.A.S.
Laboratorio de Suelos
Concretos y Pavimentos
Nit. 900456835-5

ISABEL MORENO OHARRY
GERENTE

LABINCON S.A.S.
Laboratorio de Suelos
Concretos y Pavimentos
Nit. 900456835-5

CALLE 13 # 1F – 14 LOS MARTIRES TEL: 8714009 CEL: 3163508296 - 3138667594 NEIVA (HUILA) NIT. 900456835 - 5

COMPRESION SIMPLE AL CONCRETO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA I.E. RAMÓN ALVARADO SÁNCHEZ, SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA: 06/07/2024

LOCALIZACION: CENTRO POBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA

NORMA: Invias

MUESTRA: GRAVA: 3/4 PLANTA AGREGADOS Y SERVICIOS; ARENA: PLANTA AGREGADOS Y SERVICIOS; CEMENTO:HOLCIM

ENSAYO: E-410

CONTRATISTA: RM INGENIERIA INTEGRAL S.A.S

CILINDRO No.	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA FUNDIDA	EDAD				FECHA ROTURA	RESISTENCIA OBTENIDA KN	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDO	RESISTENCIA PROYECTADA	RESISTENCIA ESPECIFICADA	SLUMP cm	OBSERVACIONES
						28									
4	VIGA CANAL EJE B	08/06/2024				X	06/07/2024	398,8	3076	215,3	102,5	X	3000	6,0	

OBSERVACIONES: Los elementos fueron tomados y traidos por el interesado al laboratorio de suelos

LABINCON S.A.S. Laboratorio de Suelos Concretos y Pavimentos Nit. 900456835-5

JEFE DE LABORATORIO

LABINCON S.A.S. Laboratorio de Suelos Concretos y Pavimentos Nit. 900



Neiva, Junio 25 del 2024

Señor:
RM INGENIERIA INTEGRAL S.A.S
Ciudad

Referencia: ***Remisión resultados de laboratorio.***

Cordial Saludo.

Con el presente, me permito remitir los resultados obtenidos en los ensayos de compresión simple al concreto, con el fin de hacer el control de calidad a las obras que se construyen en cumplimiento del contrato de obra cuyo objeto es: ***MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA I.E. RAMÓN ALVARADO SÁNCHEZ, SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA.***

Atentamente,

LABINCON S.A.S.
Laboratorio de Suelos
Concretos y Pavimentos
Nit. 900456835-5

ISABEL MORENO CHARRY
GERENTE

LABINCON S.A.S.
Laboratorio de Suelos
Concretos y Pavimentos
Nit. 900456835-5

CALLE 13 # 1F – 14 LOS MARTIRES TEL: 8714009 CEL: 3163508296 - 3138667594 NEIVA (HUILA) NIT. 900456835 - 5

COMPRESION SIMPLE AL CONCRETO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA I.E. RAMÓN ALVARADO SÁNCHEZ, SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA

LOCALIZACION: CENTRO POBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUESTRA: GRAVA: 3/4 PLANTA AGREGADOS Y SERVICIOS; ARENA: PLANTA AGREGADOS Y SERVICIOS; CEMENTO:HOLCIM

CONTRATISTA: RM INGENIERIA INTEGRAL S.A.S

FECHA: 25/06/2024

NORMA: Invias

ENSAYO: E-410

CILINDRO No.	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA FUNDIDA	EDAD				FECHA ROTURA	RESISTENCIA OBTENIDA KN	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDO	RESISTENCIA PROYECTADA	RESISTENCIA ESPECIFICADA	SLUMP cm	OBSERVACIONES
			3	7											
1	VIGA CANAL EJE A	18/06/2024	X				21/06/2024	246,7	1969	137,8	65,6	X	3000	6,0	
2		18/06/2024		X			25/06/2024	312,5	2270	158,9	75,7	X	3000	6,0	

OBSERVACIONES: Los elementos fueron tomados y traidos por el interesado al laboratorio de suelos

JEFE DE LABORATORIO

LABINCON S.A.S. Laboratorio de Suelos Concretos y Pavimentos Nit. 900456835-5

LABINCON S.A.S. Laboratorio de Suelos Concretos y Pavimentos Nit. 900456835-5

25







Neiva, Julio 02 del 2024

Señor:
RM INGENIERIA INTEGRAL S.A.S
Ciudad

Referencia: ***Remisión resultados de laboratorio.***

Cordial Saludo.

Con el presente, me permito remitir los resultados obtenidos en los ensayos de compresión simple al concreto, con el fin de hacer el control de calidad a las obras que se construyen en cumplimiento del contrato de obra cuyo objeto es: ***MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA I.E. RAMÓN ALVARADO SÁNCHEZ, SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA.***

Atentamente,

LABINCOM S.A.S.
Laboratorio de Suelos
Concretos y Pavimentos
Nit. 900456835-5

ISABEL MORENO CHARRY
GERENTE

LABINCOM S.A.S.
Laboratorio de Suelos
Concretos y Pavimentos
Nit. 900456835-5

CALLE 13 # 1F – 14 LOS MARTIRES TEL: 8714009 CEL: 3163508296 - 3138667594 NEIVA (HUILA) NIT. 900456835 - 5

28

COMPRESION SIMPLE AL CONCRETO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA I.E. RAMÓN ALVARADO SÁNCHEZ, SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA

LOCALIZACION: CENTRO POBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUESTRA: GRAVA: 3/4 PLANTA AGREGADOS Y SERVICIOS; ARENA: PLANTA AGREGADOS Y SERVICIOS; CEMENTO:HOLCIM

CONTRATISTA: RM INGENIERIA INTEGRAL S.A.S

FECHA: 02/07/2024

NORMA: Invias

ENSAYO: E-410

CILINDRO No.	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA FUNDIDA	EDAD				FECHA ROTURA	RESISTENCIA OBTENIDA KN	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDO	RESISTENCIA PROYECTADA	RESISTENCIA ESPECIFICADA	SLUMP cm	OBSERVACIONES
					14										
3	VIGA CANAL EJE A	18/06/2024			X		02/07/2024	353,3	2731	191,2	91,0	X	3000	6,0	

OBSERVACIONES: Los elementos fueron tomados y traidos por el interesado al laboratorio de suelos

LABINCON S.A.S.
Laboratorio de Suelos
Concretos y Pavimentos
Nit. 900456835-5

JEFE DE LABORATORIO

LABINCON S.A.S.
Laboratorio de Suelos
Concretos y Pavimentos
Nit. 900456835-5

LABINCON S.A.S
LABORATORIO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION

COMPRESION SIMPLE AL CONCRETO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA I.E. RAMÓN ALVARADO SÁNCHEZ, SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA

LOCALIZACION: CENTRO POBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUESTRA: GRAVA: 3/4 PLANTA AGREGADOS Y SERVICIOS; ARENA: PLANTA AGREGADOS Y SERVICIOS; CEMENTO:HOLCIM

CONTRATISTA: RM INGENIERIA INTEGRAL S.A.S

FECHA: 16/07/2024

NORMA: Invias

ENSAYO: E-410

CILINDRO No.	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA FUNDIDA	EDAD 3	7	14	28	FECHA ROTURA	RESISTENCIA OBTENIDA KN	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDO	RESISTENCIA PROYECTADA	RESISTENCIA ESPECIFICADA	SLUMP cm	OBSERVACIONES
4	VIGA CANAL EJE A	18/06/2024				X	16/07/2024	400,1	3077	215,4	102,6	X	3000	6,0	

OBSERVACIONES: Los elementos fueron tomados y traidos por el interesado al laboratorio de suelos

LABINCON S.A.S.
Laboratorio de Suelos
Concretos y Pavimentos
Nit. 900456835-5

JEFE DE LABORATORIO

LABINCON S.A.S
Laboratorio de Suelos
Concretos y Pavimentos
Nit. 900456835-5

82

- ACTAS DE COMITÉ

DATOS GENERALES

ASUNTO :	Avance de obra	**No. ACTA:**	06
FECHA:	06 de junio de 2024	**HORA INICIO**	8:00 A.M
RESPONSABLE:	ROCIO DEL MAR OSORIO MORENO	**HORA FINAL**	10:00 A.M

ORDEN DEL DÍA:

- Presentación de asistentes.
- Revisión de actividades de obra.

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ROCIO DEL MAR OSORIO MORENO- Representante Legal	CONTRATISTA	
ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO – Representante Legal	INTERVENTORIA	
FELIPE MUÑOZ – Apoyo a la supervisión	INDERHUILA	

30

DESARROLLO:

- En el desarrollo del comité de obra, se realiza la presentación formal de todas las partes presentes: la entidad contratante, el contratista de obra y la interventoría.
- Acto seguido, el arquitecto Felipe Muñoz, en representación del Inderhuila como apoyo a la supervisión, toma el uso de la palabra, saluda cordialmente a los asistentes e inicia su intervención consultando a la interventoría y al contratista sobre el estado de ejecución del contrato, con respecto al cronograma de obra y el porcentaje de avance alcanzado a la fecha.
- La arquitecta Adriana Carolina Sanabria Nieto, en su calidad de representante de la interventoría, manifiesta que el contratista ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos en el comité anterior. Así mismo, informa que actualmente se están desarrollando diversas actividades correspondientes a la etapa de cimentación y estructuras en concreto, evidenciándose un avance físico del 55%.
- Por su parte, el ingeniero Ronald Alexis González, en representación del contratista de obra, informa que el equipo de trabajo continúa operando con dos frentes de trabajo: uno orientado al componente hidrosanitario y otro a obras civiles, con el fin de abarcar dos áreas estratégicas y representativas del proyecto. Igualmente, señala que se siguen maximizando los esfuerzos para dar cumplimiento al objeto contractual y al cronograma establecido.
- Finalmente, la arquitecta Adriana Carolina Sanabria reitera la importancia de adelantar y presentar oportunamente las actividades administrativas, tales como la entrega de informes mensuales, además de mantener el ritmo de ejecución en obra. En este sentido, solicita al contratista la entrega del informe mensual correspondiente al mes de JUNIO de 2024, a más tardar durante los primeros días del mes de junio de 2024.

COMPROMISOS:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		D	M	A
Realizar informe mensual de Junio de 2024	Contratista	30/07/2024		

Siendo las 10:00 a.m. se dio por finalizada la sesión de esta reunión.

DATOS GENERALES

ASUNTO :	Problemática de abastecimiento de materiales y avance de obra	**No. ACTA:**	07
FECHA:	20 de junio de 2024	**HORA INICIO**	8:00 A.M
RESPONSABLE:	ROCIO DEL MAR OSORIO MORENO	**HORA FINAL**	10:00 A.M

ORDEN DEL DÍA:

- Presentación de asistentes.
- Problemática de abastecimiento de materiales y avance de obra

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
ROCIO DEL MAR OSORIO MORENO- Representante Legal	CONTRATISTA	
ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO – Representante Legal	INTERVENTORIA	
FELIPE MUÑOZ – Apoyo a la supervisión	INDERHUILA	

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
Neiva-Huila

DESARROLLO:

- En el desarrollo del comité de obra, se realiza la presentación formal de todas las partes presentes: la entidad contratante, el contratista de obra y la interventoría.
- Acto seguido, el arquitecto Felipe Muñoz, en representación del Inderhuila como apoyo a la supervisión, toma el uso de la palabra, saluda cordialmente a los asistentes e inicia su intervención consultando a la interventoría y al contratista sobre el estado de ejecución del contrato, con respecto al cronograma de obra y el porcentaje de avance alcanzado a la fecha.
- La arquitecta Adriana Carolina Sanabria Nieto, en su calidad de representante de la interventoría, manifiesta que el contratista ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos en el comité anterior. Así mismo, informa que actualmente se están desarrollando diversas actividades correspondientes a la etapa hidrosanitarias, eléctricas y acabados, evidenciándose un avance físico del 85%.
- Por su parte, el ingeniero Ronald Alexis González, en representación del contratista de obra, informa que actualmente se requiere un cambio de equipos para la instalación de la cubierta toda ves que el acceso es imposible equipos que actualmente no cuentan con disponibilidad para este mes para la instalación En consecuencia, señaló que no es posible dar cumplimiento al contrato mientras no se concrete la adquisición de los equipos correspondiente a la cubierta. Por lo anterior, solicitó a la interventoría y al Inderhuila evaluar la posibilidad de una suspensión del contrato, con el fin de no afectar el plazo de ejecución contractual.
- La interventoría confirmó que se han venido adelantando algunas actividades propias del contrato; sin embargo, indicó que el contratista debe remitir la documentación que soporte la solicitud de suspensión, para su respectiva revisión y aval, con miras a la elaboración del acta de justificación de la suspensión del contrato de obra.
- Finalmente, el arquitecto Felipe Muñoz resaltó la importancia de adelantar y presentar de manera oportuna las actividades administrativas necesarias para formalizar el proceso de suspensión contractual.
- Siendo así, se da por finalizado el comité, cuyo objeto principal era presentar el reinicio de actividades del proyecto.

COMPROMISOS:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		D	M	A
Remitir información de solicitud de suspensión No. 2	Contratista	26/06/2024		

Siendo las 10:00 a.m. se dio por finalizada la sesión de esta reunión.

- BITACORA DE OBRA

Sabado 1 de Junio de 2024
Clima= Soleado.
Personal = Residente de obra e interventoria, Hseq. maestro y obreros.
Actividades= Se continua con la fundicion de viga de cimentacion y se continua con la fundicion de columnas en concreto.

R. obra

V/B
R. Interventoria

Lunes 03 de Junio de 2024
Clima= Soleado
Personal = Residente de obra e interventoria, Hseq maestro y obreros
Actividades= Se continua con la fundicion de columnas en concreto
Se inicia la instalacion de los juegos de cancha de futbol.

R. obra

V/B
R. Interventoria

Martes	04 de Junio de 2024 Clima = Soleado Personal = Residente de obra e interventor h seg, maestro y obrerar Actividades = Se continua - con la inst de la concha Multifuncional e instalación avo e instalación de mallas. asi mismo se continua con la ~~inst~~ fundi de concreto para columnas. R. obra V/B R. Interventor
Miercoles	05 de Junio de 2024 Clima = Soleado Personal = Residente de obra e interventoria, h maestro. y obrerar Actividades = Se continua con la Fundicion d columnar en concreto. R. obra V/B R. Interventor

Jueves 06 de Junio de 2024

Clima = Soleado

Personal = Residente de obra e interventoria, hseq, maestro y obrero

Actividades = Se continua con la fundicion de columnar en concreto y se inicia con la construccion de cajillas de inspeccion hidrosanitarias, asi mismo se continua con la excavacion para la acometida electrica.

R. obra

R. Interventoria

Viernes 07 de junio de 2024

Clima = Nublado

Personal = Residente de obra e'interventoria, hseq maestro. y obreros

Actividades = Se continua con la fundicion de columnar en concreto.

Se continua con la construccion de cajillas hidrosanitarias y la excavacion de acometida electricas

Se realiza la instalación de la formaleta para la fundición de viga canal.

R. obra

Vbv
R. Interventoría

Sabado 08 de Junio de 2024
Clima= Soleado
Personal = Residente de obra e interventoría, hseq, maestro, obreros
Actividades= Se continua con el armado de acero y formaleta para la viga canal y se continua con la fundición de canaleta para columnas

M

R. obra

Vbv
R. Interventoría

Lunes 10 de Junio de 2024
Clima = Nublado
Personal= Residente de obra e interventoría, h

maestro, obrero
Actividades= Se continua con la fundición de columnar en concreto. Se continua con el armado de la losa para la viga canal, así mismo se continua con la excavación para la acometida electrica y la construcción de cajillar de inspección

R. obra

R. Interventoría

Martes 11 de Julio de 2024
Clima= Soleado
Personal= Residente de obra e interventoria, inspector maestro de obra, obreros
Actividades= Se continua con la fundición de columnar en concreto, armado de formaleta y acero de refuerzo para la viga canal.

R. obra

R. Interventoría

Miercoles	12 de Junio de 2024
	Clima = Nublado
	Personal = Residente de obra e interventoría, maestro, obreros
	Actividades: Se continua con el armado de formaleta para la viga canal a creal:a la instalación de la tubería de 4" y la construcción de caja para ubicar a trena en la parte electr.
	R. obra — R. Interventoría
Jueves	13 de Junio de 2024
	Clima = Soleado
	Personal = residente de obra e interventoría, maestro obreros
	Actividades: Se continua con la instalación de tubería de 4" en PVC, y se continua con la instalación de medidor trifasico, en la zona aprobada para la acometida electrica

Se continua cargando de formaleta para la viga canal, se realiza el retiro de formaleta, para las columnas.

R. obra

V/B
R. Interventoria

Viernes 14 de Junio de 2024
clima = Nublado
Personal = residente de obra, e interventoria, hseq, maestros, obreros.
Actividades = Se da inicio a la fundición de concreto para viga canal en el eje A.

R. obra

V/B
R. Interventoria

Sabado 15 de Junio de 2024
Clima = Soleado
Personal = Residente de obra. e interventoria, hseq, maestro, oberos,
Actividades = Se continua la fundición de viga canal en el eje A.

	Se continua con la instalacion de tubo PVC ϕ11.
	R. obra — Ver R. Interventoria
Lunes	17 de Junio de 2024
	Clima = Soleado
	Personal = Residente de obra e interventoria, hseq, maestros, obreros
	Actividades = Se continua con el armado y figurado de acero y de formaleta para la viga eje B, se continua con la fundición de concreto la viga cand eje A
Mi J.	Se realiza la instalacion de bajantes en el A.. Sistema de ϕ11
	R. obra — Ver R. Interventoria

Martes	18 de junio de 2024 Clima = Soleado Personal: Residente de obra e interventoria, hseq, maestros y obreros Actividades: Se continua con el armado de formaleta e instalación de acero para la viga canal eje B. Se continua con la instalación de bajantes para aguas lluvias en tubería de 4" PVC Se continua con la instalación de tablero trifasico para la parte electrica R. obra R. Interventoria
Miercoles	19 de junio de 2024 Clima = Soleado Personal = Residente de obra e interventoria hseq, maestros, obreros Actividades: Se da inicio a la fundición de concreto para viga canal eje B, se inicia con el muñeteo impermeabilizante en mortero para viga canal en el eje A.

Se continua con los bajante en tubería pvc.
Se continua con la instalación de tubería pvc" de 10" para conexión de salida.

R. obra

V°B°
R. Interventoría

J Jueves 20 de Junio de 2024
Clima= Soleado
Personal= Residente de obra e interventoría, maestro y oficiales
M Actividades= Se continua con el impermeabilizante para viga canal eje A.
Se continua con la instalación de tubería de 10" en PVC
así mismo se continua con la redacción la cometida electrica para su conexión.

R. obra

V°B°
R. Interventoría

Viernes	21 de Junio de 2024 Clima = Soleado Personal = Residente de obra e interventoria, hseq maestro, obreros. Actividades = Se continua con la fundición de concreto en viga canal eje B. Se continua con la instalación de tubería PVC de 4" para bajante de aguas lluvias. Se continua con la instalación de tubería para la parte electrica R. obra R. Interventoria
Sabado	22 de Junio de 2024 Clima = Nublado Personal = Residente de obra, e interventoria, hseq maestro, obreros Actividades = Se realiza la fundición de concreto de la viga canal eje B. Se continua con la instalación de tubería PVC de 4"

Se continua con la instalacion de medidor electrico trifilar.

R. Obra

V.B.
R. Interventoria

Lunes
24 de Junio de 2024
Clima= Soleado
Personal= Residente de obra e interventoria, maestro y obrera
Actividades= Se continua con la instalacion de medidor trifilar electrico.
Se realiza la desintalacion de formaleta metalica para la viga canal eje B
Se da inicio a la instalacion de cubierta

R. Obra

V.B.
R. Interventoria

Martes 25 de junio de 2024
Clima= Nublado
Personal = Residente de obra. e interventoria, hseq, maestro y obreros
Actividades= Se da inicio a la aplicacion de mortero impermeabilizante para viga canal ge B.
Se continua con la instalación de la cobierta

R. obra R. Interventoria

Miercoles 26 de junio de 2024
Clima= Nublado
Personal= Residente de obra. e interventoria, hseq maestro. y obreros
Actividades: Se continua con la aplicacion de mortero impermeabilizante para viga canal ge B.
Se finaliza la instalación de cobierta

R. obra R. Interventoria

Jueves 27 de Julio de 2015
Clima= Nublado
Personal= Residente de obra e interventoría maestro, obrero
Actividades= se continua y finaliza la instalación de mortero impermeabilizante en la viga cena se finalización de tablero y medidor trifásico de pate electrico.
Se realiza la suspensión del contrato

R. obra — R. Interventoría

Lunes 28 de Julio de 2015
Clima= Nublado
Personal= Residente de obra e interventoría, maestro, obrero, Director de obra e interventoría
Actividades= Se da inicio a la pintura de cancha con pinturas epóxica en rayas según diseño

R. Interventoría

Marler 29 de Julio de 2025
Clima= Nublado
Personal = Director de obra e interventoria, residente de obra e interventoria, hseq, maestro, obreros
Actividades= Se continua con la pintura de la cancha en 5 colores con pintura epoxica.

D. obra D. Int.
R obra R. Interventoria

Miercoles 30 de Julio de 2025
Clima= Nublado
Personal= Residente de obra e interventoria, hseq, mae. MO; obrera
Actividades: Se finaliza la pintura de la cancha en 5 colores con pintura epoxica. Se realiza la instalación de las luminaria led tipo Indo bay.

R obra R. Interventoria

Jueves 31 de Julio de 2025

Clima= Nublado

Personal de Obra- Director de obra e interventor residente de obra e interventor, hseq, maestro obras

Actividades= Se finaliza la instalacion lamparas led para la cubierta

Se realiza el greo general del proyecto.

Se da o el recibo de obra a la interventoria se da cierre de procesos y entrega de obra a la misma.

D. obra

D. Just

D. obra

R. Interventoria
