PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 8 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 8 (Consecutivo) **DEL** 24/11/2025 (dd-mm-aa) **AL** 30/11/2025 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 58 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO CAPITAL LM	**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL	**RL de Interventoría**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155343	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
Valor Inicial :	$ 2.220.672.788,00	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES	**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	3/10/2025	**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026	**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	6,92%	16,63%	Obra Física Ejecutada (%)	9,09%	11,84%
Valor de la Obra	$ 153.779.759,81	$ 369.407.087,53	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 201.887.361,96	$ 262.955.863,63

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	9,71%	2,75%	-4,79%
Durante el periodo	6,92%	9,09%	
Acumulado actual	16,63%	11,84%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	64,55%	63,48%	1,07%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	6,25%	10,90%	-4,65%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	8,00%	4,00%	4,00%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	0,00%	0,00%	0,00%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0,00%	0,00%	0,00%
1407	LOS MÁRTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	0,00%	0,00%	0,00%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	0,00%	0,00%	0,00%
ADVO	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	12,37%	16,33%	-3,96%

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.220.672.788,00
VALOR PARCIAL 1		
VALOR PARCIAL 2		
TOTAL VALOR FACTURADO	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 2.220.672.788,00	$ 2.220.672.788,00


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 0,00	$ 0,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	16,63%	11,84%	-4,79%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	58	-2,78

CURVA S

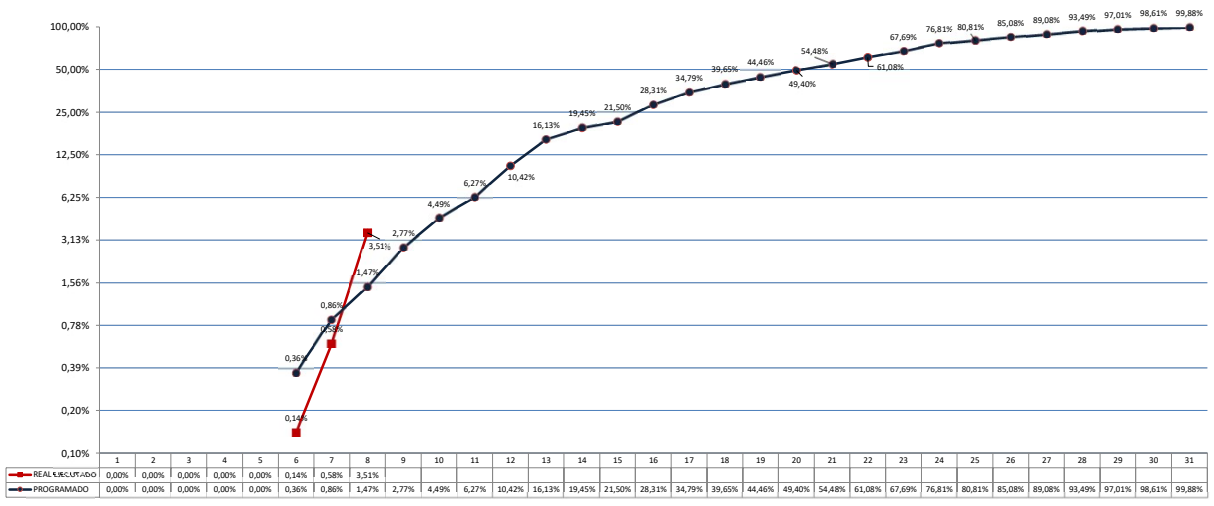

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 8 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 8 (Consecutivo) **DEL** 24/11/2025 (dd-mm-aa) **AL** 30/11/2025 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 58 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo en curso se obtuvo la aprobación por parte de la supervisión para el alistamiento de la placa. No obstante, se presentaron precipitaciones que incidieron parcialmente en el desarrollo de las actividades, por lo cual se realizaron labores de evacuación de aguas lluvias en la zona intervenida. En consecuencia, se continuó con la instalación de maestras guía para el correcto nivelado y preparación de la placa de cubierta, se realizó el tratamiento de fisuras con sika flex y la instalacion de malla electrosoldada de 5mm. Posteriormente, se ejecutó la fundida del alistado en la cubierta y se realizó el corte controlado de la placa mediante pulidora, con el fin de generar la apertura destinada a la instalación de la escalera tipo gato, levante de mamposteria en ladrillo tolete zona de ubicacion de escalera de gato, Sin embargo, se evidencia un atraso del 2,00% % con respecto a la programación establecida por el contratista de obra.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se otorgó la aprobación a la documentación personal operativo que adelantará las actividades en la sede y se valida instalación de señalización SST, diligenciamiento de permisos de trabajo en caliente y ATS, se evidenció la realización de charlas de autocuidado dirigidas al personal operativo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente periodo se ha ejecutado las actividades alistado en placa de cubierta y corte de placa con pulidora.

5. Generales: Se lleva a cabo el comité de obra N.2 solicitado por la supervisión; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).

6. Aspectos ambientales: Se realiza recorrido en el frente, Ingreso material el día 27 de noviembre, el cual fue acopiado y utilizado adecuadamente, se recomendó al contratista implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana en curso se realiza la localizacion y replanteo del sitio a intervenir en área de primeria infancia.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado NO se dio inicio a actividades en la sede relacionado con SST. En consecuencia, no se generaron acciones operativas, inspecciones ni intervenciones en campo asociadas a este componente, limitándose la gestión del periodo a actividades administrativas y de seguimiento.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

5. Generales: El contratista está gestionando la afiliación del personal y reuniendo los documentos necesarios para dar inicio a la obra. Se lleva a cabo el comité de obra N.2 solicitado por la supervisión; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).

6. Aspectos ambientales: Durante el periodo NO se dio inicio de actividades en la sede relacionado con aspectos ambientales.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana en curso NO se inician actividades en la sede.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado NO se dio inicio a actividades en la sede relacionado con SST. En consecuencia, no se generaron acciones operativas, inspecciones ni intervenciones en campo asociadas a este componente, limitándose la gestión del periodo a actividades administrativas y de seguimiento.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

5. Generales: A la fecha NO se reportan procesos constructivos en el frente. Se lleva a cabo el comité de obra N.2 solicitado por la supervisión; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión); Se aprueba una reprogramación de obra por parte de la supervisión con la actualización de las fechas reales de las aperturas

6. Aspectos ambientales: Durante el periodo NO se dio inicio de actividades en la sede relacionado con aspectos ambientales.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana en curso NO se inician actividades en la sede.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado NO se dio inicio a actividades en la sede relacionado con SST. En consecuencia, no se generaron acciones operativas, inspecciones ni intervenciones en campo asociadas a este componente, limitándose la gestión del periodo a actividades administrativas y de seguimiento.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

5. Generales: El contratista está gestionando la afiliación del personal y reuniendo los documentos necesarios para dar inicio a la obra; Se lleva a cabo el comité de obra N.2 solicitado por la supervisión; este cuenta con la participación del Supervisor

6. Aspectos ambientales: Durante el periodo NO se dio inicio de actividades en la sede relacionado con aspectos ambientales.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana en curso NO se inician actividades en la sede.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado NO se dio inicio a actividades en la sede relacionado con SST. En consecuencia, no se generaron acciones operativas, inspecciones ni intervenciones en campo asociadas a este componente, limitándose la gestión del periodo a actividades administrativas y de seguimiento.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

5. Generales: El contratista está gestionando la afiliación del personal y reuniendo los documentos necesarios para dar inicio a la obra; Se lleva a cabo el comité de obra N.2 solicitado por la supervisión; este cuenta con la participación del Supervisor

6. Aspectos ambientales: Durante el periodo NO se dio inicio de actividades en la sede relacionado con aspectos ambientales.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana en curso NO se inician actividades en la sede.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado NO se dio inicio a actividades en la sede relacionado con SST. En consecuencia, no se generaron acciones operativas, inspecciones ni intervenciones en campo asociadas a este componente, limitándose la gestión del periodo a actividades administrativas y de seguimiento.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

5. Generales: El contratista está gestionando la afiliación del personal y reuniendo los documentos necesarios para dar inicio a la obra; Se lleva a cabo el comité de obra N.2 solicitado por la supervisión; este cuenta con la participación del Supervisor.

6. Aspectos ambientales: Durante el periodo NO se dio inicio de actividades en la sede relacionado con aspectos ambientales.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana en curso NO se inician actividades en la sede.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado NO se dio inicio a actividades en la sede relacionado con SST. En consecuencia, no se generaron acciones operativas, inspecciones ni intervenciones en campo asociadas a este componente, limitándose la gestión del periodo a actividades administrativas y de seguimiento.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

5. Generales: El contratista está gestionando la afiliación del personal y reuniendo los documentos necesarios para dar inicio a la obra; Se lleva a cabo el comité de obra N.2 solicitado por la supervisión; este cuenta con la participación del Supervisor

6. Aspectos ambientales: Durante el periodo NO se dio inicio de actividades en la sede relacionado con aspectos ambientales.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 8 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 8 (Consecutivo) **DEL** 24/11/2025 (dd-mm-aa) **AL** 30/11/2025 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 58 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana en curso se ejecutaron actividades de remoción de pintura en muros, correspondientes al acabado color azul, en las fachadas frontal, lateral y posterior. Se reitera que esta actividad corresponde a un NP (No Previsto), al no encontrarse contemplada dentro del alcance inicial del contrato. Adicionalmente, se evidenció el suministro e instalación del baño portátil en el área de obra.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se otorgó la aprobación a la documentación personal operativo que adelantará las actividades en la sede y se valida instalación de señalización SST, diligenciamiento de permisos de trabajo en alturas y ATS, se evidenció la realización de charlas de autocuidado y respeto dirigidas al personal operativo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

5. Generales: Se lleva a cabo el comité de obra N.2 solicitado por la supervisión; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión); Se aprueba una reprogramación de obra por parte de la supervisión con la actualización de las fechas reales de las aperturas

6. Aspectos ambientales: Se realiza recorrido en el frente, el contratista implementa una unidad sanitaria al igual se recomendó al contratista implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ARQ. JOSÉ VICTOR MARQUEZ HOYOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	sem 1	3-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
2	sem 2	13-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
3	sem 3	20-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
4	sem 4	27-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
5	sem 5	3-nov-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
6	sem 6	10-nov-25	$ 7.797.219,11	0,36%	0,14%	$ 2.928.781,00	$ 4.868.438,11	0,36%	$ 7.797.219,11	0,14%	$2.928.781,00
7	sem 7	17-nov-25	$ 10.669.135,31	0,50%	0,44%	$ 9.531.581,00	$ 1.137.554,31	0,86%	$ 18.466.354,42	0,58%	$12.460.362,00
8	sem 8	24-nov-25	$ 12.978.424,89	0,60%	2,93%	$ 62.953.997,00	-$ 49.975.572,11	1,47%	$ 31.444.779,31	3,51%	$75.414.359,00
9	sem 9	1-dic-25	$ 28.006.979,91	1,31%	0,00%		$ 28.006.979,91	2,77%	$ 59.451.759,22		$75.414.359,00
10	sem 10	8-dic-25	$ 36.812.247,87	1,72%	0,00%		$ 36.812.247,87	4,49%	$ 96.264.007,09		$75.414.359,00
11	sem 11	15-dic-25	$ 38.379.452,27	1,79%	0,00%		$ 38.379.452,27	6,27%	$ 134.643.459,36		$75.414.359,00
12	sem 12	22-dic-25	$ 88.841.280,63	4,14%	0,00%		$ 88.841.280,63	10,42%	$ 223.484.739,99		$75.414.359,00
13	sem 13	29-dic-25	$ 122.594.810,52	5,71%	0,00%		$ 122.594.810,52	16,13%	$ 346.079.550,51		$75.414.359,00
14	sem 14	5-ene-26	$ 71.168.804,87	3,32%	0,00%		$ 71.168.804,87	19,45%	$ 417.248.355,38		$75.414.359,00
15	sem 15	12-ene-26	$ 44.042.064,93	2,05%	0,00%		$ 44.042.064,93	21,50%	$ 461.290.420,31		$75.414.359,00
16	sem 16	19-ene-26	$ 146.069.718,11	6,81%	0,00%		$ 146.069.718,11	28,31%	$ 607.360.138,42		$75.414.359,00
17	sem 17	26-ene-26	$ 139.176.465,48	6,49%	0,00%		$ 139.176.465,48	34,79%	$ 746.536.603,90		$75.414.359,00
18	sem 18	2-feb-26	$ 104.287.650,61	4,86%	0,00%		$ 104.287.650,61	39,65%	$ 850.824.254,51		$75.414.359,00
19	sem 19	9-feb-26	$ 103.217.358,77	4,81%	0,00%		$ 103.217.358,77	44,46%	$ 954.041.613,28		$75.414.359,00
20	sem 20	16-feb-26	$ 106.018.979,79	4,94%	0,00%		$ 106.018.979,79	49,40%	$ 1.060.060.593,07		$75.414.359,00
21	sem 21	23-feb-26	$ 108.890.772,44	5,07%	0,00%		$ 108.890.772,44	54,48%	$ 1.168.951.365,51		$75.414.359,00
22	sem 22	2-mar-26	$ 141.591.914,58	6,60%	0,00%		$ 141.591.914,58	61,08%	$ 1.310.543.280,09		$75.414.359,00
23	sem 23	9-mar-26	$ 141.821.022,58	6,61%	0,00%		$ 141.821.022,58	67,69%	$ 1.452.364.302,67		$75.414.359,00
24	sem 24	16-mar-26	$ 195.783.357,18	9,12%	0,00%		$ 195.783.357,18	76,81%	$ 1.648.147.659,85		$75.414.359,00
25	sem 25	23-mar-26	$ 85.857.460,32	4,00%	0,00%		$ 85.857.460,32	80,81%	$ 1.734.005.120,17		$75.414.359,00
26	sem 26	30-mar-26	$ 91.520.588,00	4,27%	0,00%		$ 91.520.588,00	85,08%	$ 1.825.525.708,17		$75.414.359,00
27	sem 27	6-abr-26	$ 85.894.033,40	4,00%	0,00%		$ 85.894.033,40	89,08%	$ 1.911.419.741,57		$75.414.359,00
28	sem 28	13-abr-26	$ 94.703.170,29	4,41%	0,00%		$ 94.703.170,29	93,49%	$ 2.006.122.911,86		$75.414.359,00
29	sem 29	20-abr-26	$ 75.414.814,61	3,51%	0,00%		$ 75.414.814,61	97,01%	$ 2.081.537.726,47		$75.414.359,00
30	sem 30	27-abr-26	$ 34.437.205,81	1,60%	0,00%		$ 34.437.205,81	98,61%	$ 2.115.974.932,28		$75.414.359,00
31	sem 31	6-may-26	$ 27.177.033,39	1,27%	0,00%		$ 27.177.033,39	99,88%	$ 2.143.151.965,67		$75.414.359,00
32	sem 32	13-may-26	$ 2.608.584,00	0,12%	0,00%		$ 2.608.584,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$75.414.359,00
33	sem 33	20-may-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$75.414.359,00
34	sem 34	27-may-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$75.414.359,00
35	sem 35	3-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$75.414.359,00
36	sem 36	10-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$75.414.359,00
37	sem 37	17-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$75.414.359,00
38	sem 38	24-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$75.414.359,00
39	sem 39	1-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$75.414.359,00
40	sem 40	8-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$75.414.359,00
41	sem 41	15-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$75.414.359,00
42	sem 42	22-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$75.414.359,00
43	sem 43	29-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	**100,00%**	$ **2.145.760.549,67**		
			$ 2.145.760.549,67	**100,00%**	**3,51%**						

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 8 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 8 (Consecutivo) **DEL** 24/11/2025 (dd-mm-aa) **AL** 30/11/2025 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 58 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A



Evacuacion de aguas lluvias



Corte con pulidora en placa de Cubierta



fabricación y colocación de maestras guías para el nivelado de placa



fabricación y colocación de maestras guías para el nivelado de placa



Levante de mamposteria en ladrillo tolete



instalacion de malla electrosoldada

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 8 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 8 (Consecutivo) **DEL** 24/11/2025 (dd-mm-aa) **AL** 30/11/2025 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 58 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A



tratamiento de Fisuras en placa superior



tratamiento de Fisuras en placa superior



Alistado de placa superior área de comedor



Alistado de placa superior área de comedor



Alistado de placa superior área de comedor



Alistado de placa superior área de comedor

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 8 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 8 (Consecutivo) **DEL** 24/11/2025 (dd-mm-aa) **AL** 30/11/2025 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 58 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO OTIC CALLE 63




Remocion de pintura fachada lateral derecha



Remocion de pintura fachada principal



Remocion de pintura fachada posterior

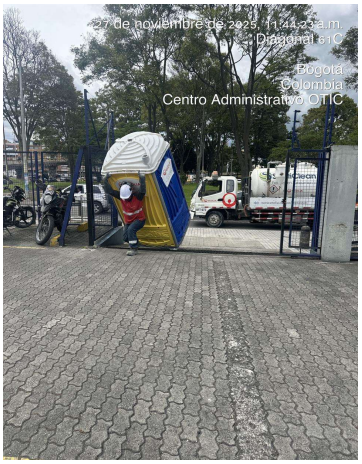

suministro de baño portatil



Instalación de baño portatil
