FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO FO-EO-13	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica** _____

SEMANA N. 31 **DEL** 22/09/2025 **AL** 28/09/2025

CONTRATO No **FDLSC-CIN-1145-2024**
(Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO FDLSC-COP-1137-2024
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS JOT **NIT** 901.898.190-3
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra

INTERVENTOR ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS **NIT** 900.573.269-7
(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION FDLSC DANIELA VANESA CAMPO GRANADOS
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	5 (Día)	**DE**	FEBRERO (Mes)	**DE**	2025 (Año)
FECHA DE SUSPENCIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	**DE**	MARZO (Mes)	**DE**	2025 (Año)
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO	11 (Día)	**DE**	ABRIL (Mes)	**DE**	2025 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	11 (Día)	**DE**	OCTUBRE (Mes)	**DE**	2025 (Año)

Contrato de Obra		**Contrato de Interventoría**	
Valor Inicial	$ 5.765.124.928,00	Valor Inicial	$ 671.576.745,00
Valor Actualizado	$ 5.765.124.928,00	Valor Actualizado	$ 671.576.745,00
No. de empleos generados	19	No. De empleos generados	16

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	5,000%	22,014%	Trabajo Ejecutado	0,500%	22,014%
Valor del Trabajo Programado	$ 288.256.246,00	$ 1.252.242.782,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 28.825.624,00	$ 1.252.242.782,00
ETAPA DE PLANIFICACION	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0%	100%	Trabajo Ejecutado	0%	100%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 76.806.327,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 76.806.327,00
ETAPA DE OBRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	5,00%	22,014%	Trabajo Ejecutado	0,500%	22,014%
Valor del Trabajo Programado	$ 288.256.246,00	$ 1.252.242.782,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 28.825.624,00	$ 1.252.242.782,00

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
CIV 1	1,000%	0,000%	1,000%	CERRAMIENTO, EXCAVACIONES - MANEJO DE TUBERIA
CIV 3	10%	8%	2%	INSTALACION DE SUMIDEROS Y CAJEO
CIV 5	15%	15%	0%	INSTALACION DE BORDILLOS Y ENTREGA DE SUBRASANTE
CIV 4	2%	0%	2%	PENDIENTE INGRESO DE PERSONAL
CIV 6	15%	12%	3%	INSTALACION GEOCELDA - COMPACTACION Y ENTREGA DE SUBRASANTE

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
APERTURA DE LOS CIV 1-3B-5-4-6			**50**	**10**	**20**	**10**

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO FO-EO-13	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica** _____

SEMANA N. **31** **DEL** 22/09/2025 **AL** 28/09/2025

CONTRATO No **FDLSC-CIN-1145-2024**
(Numero de Contrato)

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

CIV 3B:
Actividades: Excavación sumidero, Excavacion Manual realce para cono y instalación de sumideros

CIV 5:
Actividades: Fundida de 30 cubos, Amarré de acero para parrilla de refuerzo y fundida, Cortes y dilataciones, textura ideal, cerramiento de los individuos ambientales, Orden y aseo

CIV 1:
Actividades: Construcción de caja de inspección, Ubicación de niveles, Replanteo de caja

CIV. 4
actividades: Excavación mecánica, instalación soldado

CIV 6
actividades: Espera puesta de personal

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO FO-EO-13	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica** _____

SEMANA N. 31 **DEL** 22/09/2025 **AL** 28/09/2025

CONTRATO No **FDLSC-CIN-1145-2024**
(Numero de Contrato)

4. REGISTRO FOTOGRAFICO
















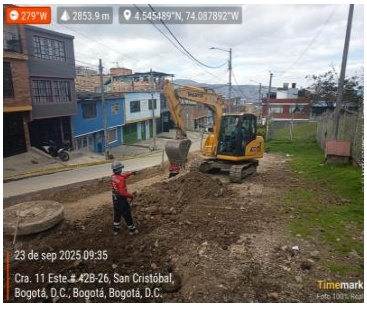



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

28 (Día en letras) VENTI OC (Día en números) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) GERMAN ANDRES PEÑA SUPELANO

Director de Interventoría.

ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS
