
CONSORCIO JUDICIAL SUCRE

901.984.201-4

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÙN ACTIVIDADES
CONTRATO: C01.PCCNTR 8257714

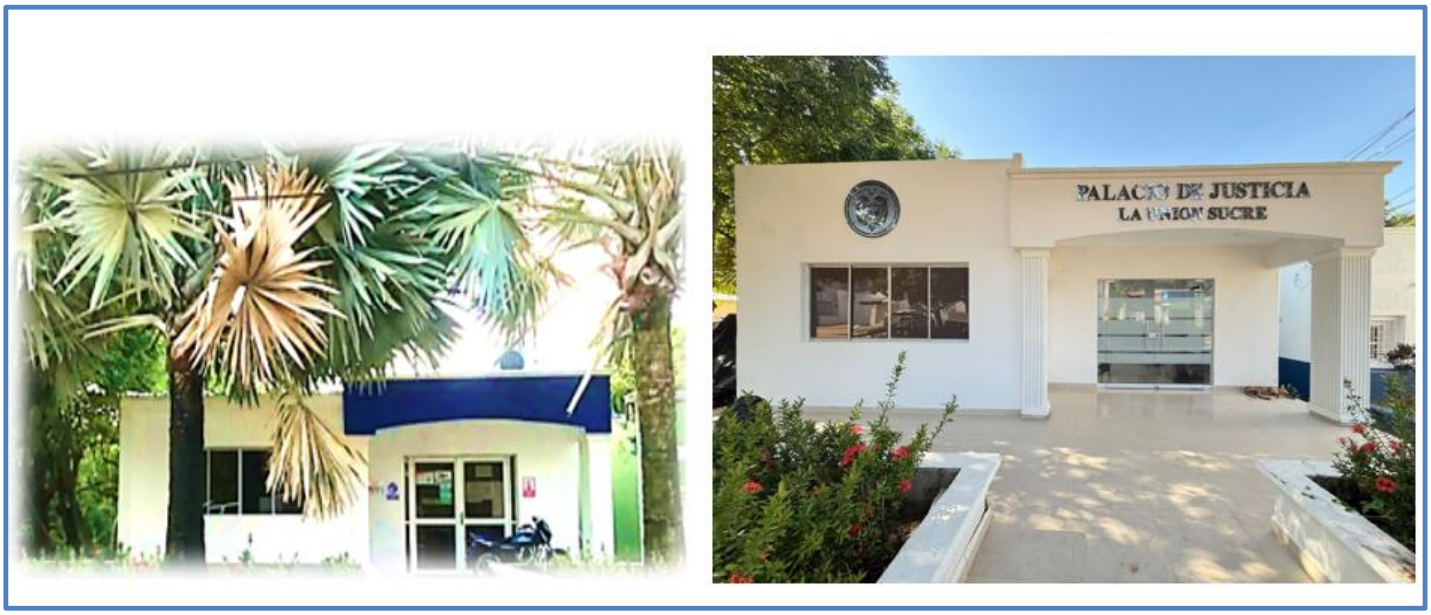

INFORME MENSUAL #3

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.

CONSORCIO JUDICIAL SUCRE
Contratista

Ing. Jair Ricardo Manjarrez Cuesta Representante Legal.

Noviembre de 2025.

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÙN ACTIVIDADES
CONTRATO: C01.PCCNTR 8257714

1 INTRODUCCION

El presente informe describe los pormenores ejecutados dentro del alcance del contrato No **CO1.PCCNTR.8257714,** celebrado entre el Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo - sucre. Nit. 800.165.944-8. y CONSORCIO JUDICIAL SUCRE**,** Conformado por: GRUPO EMPRESARIAL JEIKA INVERSIONES Y CONSTRUCCION SAS; Nit. 901730067-3; 10% y JAIR RICARDO MANJARREZ CUESTA; Nit. 84083215-8; 90% cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.**

Se dio inicio a las actividades de mantenimiento y adecuaciones programados por la Administración Judicial, priorizando necesidades apremiantes, que darán solución a ciertos problemas que existen en la sede, para garantizar el normal funcionamiento de las instalaciones y evitar el riesgo y seguridad de los empleados de las instalaciones y sus visitantes.

El presente informe describe el avance de la ejecución de las actividades establecidas en el contrato, garantizando que todas las obras y servicios fueron realizados conforme a lo pactado y a satisfacción de la entidad contratante.

2 OBJETIVO


Ejecutar las actividades de mantenimiento y adecuaciones locativas complementarias en la Sede Judicial del Municipio de La Unión, Sucre, garantizando la estabilidad estructural, el mejoramiento de las condiciones físicas, funcionales y de seguridad del inmueble, contribuyendo al adecuado funcionamiento de la administración de justicia y al cumplimiento de los objetivos institucionales trazados por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Intervenir los muros de cerramiento y demás elementos estructurales del área posterior, mediante actividades de reforzamiento y reconstrucción, con el fin de restablecer su integridad, estabilidad y vida útil.
- Ejecutar las adecuaciones en cimentación y mejoramiento del suelo, para asegurar la capacidad portante requerida y garantizar el comportamiento adecuado del nuevo cerramiento perimetral.
- Instalar protectores en acero inoxidable para ventanas y puertas, así como la cerca eléctrica perimetral, con el propósito de reforzar las condiciones de seguridad de los bienes, usuarios y servidores judiciales.
- Realizar las mejoras necesarias en los acabados finales del área intervenida, garantizando un adecuado desempeño estético, funcional y locativo conforme a los lineamientos de conservación de la infraestructura judicial.
- Documentar, reportar y soportar técnicamente cada una de las actividades ejecutadas, mediante informes periódicos, registros fotográficos, memorias de cálculo, procedimientos constructivos y demás evidencias requeridas por la interventoría.
- Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, técnicas, ambientales, laborales y de seguridad, asegurando que la ejecución de la obra se realice bajo parámetros de calidad, oportunidad y seguridad para trabajadores y usuarios.

3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

Las obras propuestas se ubican en el Municipio de La Unión, en el departamento de Sucre, específicamente en la Calle 14 No 8A-103.

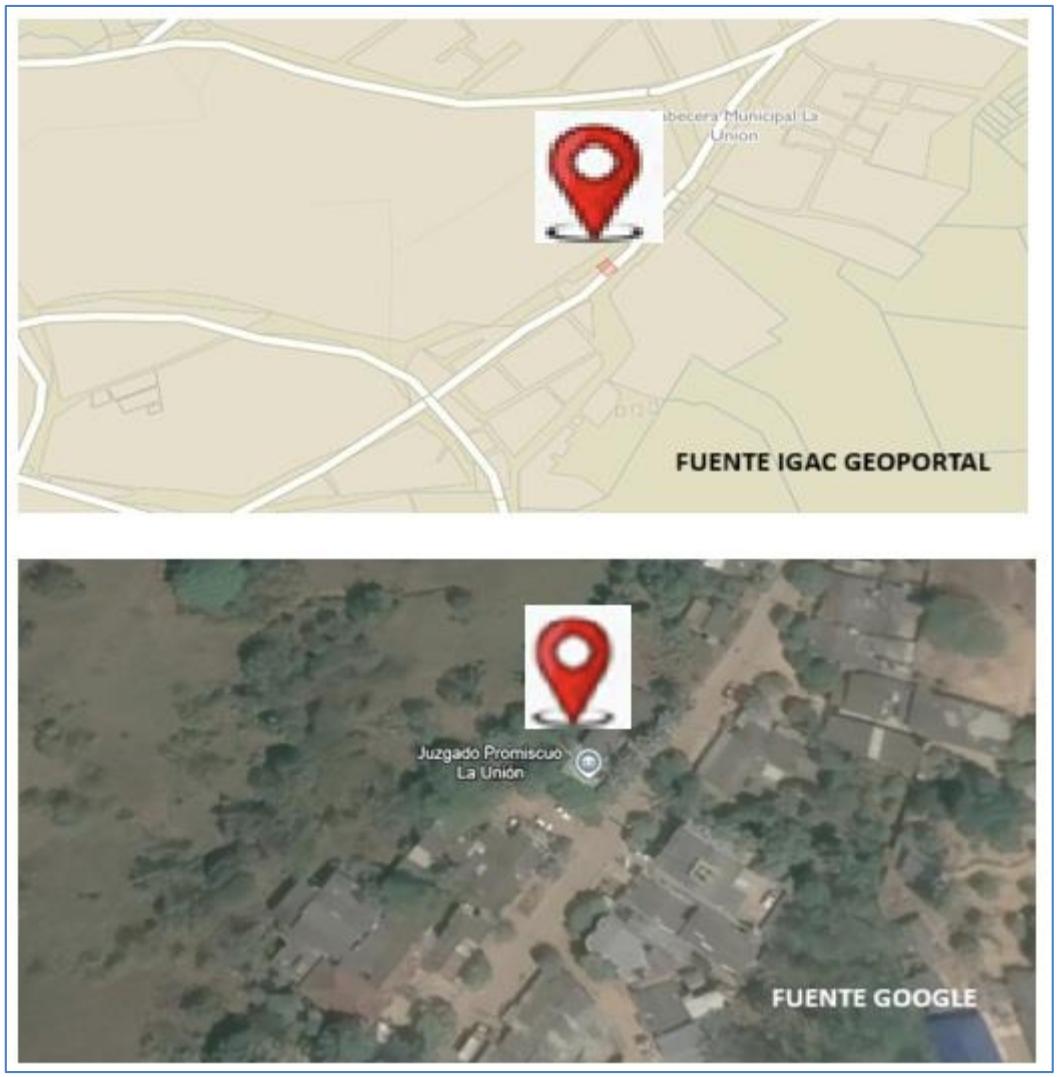

4 RESUMEN DEL CONTRATO

CONTRATO NO.	: SAMC 06 DE 2025 (ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8257714)
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: SELECCIÓN ABREVIADA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	: SAMC 06 DE 2025
OBJETO	: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE"
CONTRATANTE	: NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE. NIT. 800.165.944-8.
CONTRATISTA	: CONSORCIO JUDICIAL SUCRE Conformado por: GRUPO EMPRESARIAL JEIKA INVERSIONES Y CONSTRUCCION SAS; Nit. 901730067-3; 10% y JAIR RICARDO MANJARREZ CUESTA; Nit. 84083215-8; 90%.
VALOR DEL CONTRATO	: DOSCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($207.255.227,00).
FECHA DE APROBACIÓN DE CONTRATO	: CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	: DIECISÉIS (16) DE SEPTIEMBRE DE 2025
CDP	: No. 1425, fecha de expedición: 27/05/2025
RPC	: No. 2425, fecha de expedición: 16/09/2025

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÙN ACTIVIDADES
CONTRATO: C01.PCCNTR 8257714

PLAZO	: DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	: DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	: DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	: DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE 2025

4.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En el tiempo transcurrido desde que se dio inicio al contrato hasta la fecha de entrega del presente informe, se desarrollaron actividades programadas, donde se presentaron los avances en las actividades con el personal profesional, técnico y auxiliar requerido, contando con el seguimiento de la supervisión y sin afectar el desarrollo de las actividades normales de la entidad.

Es de anotar que el suscrito en su condición de contratista hizo presencia permanente en las instalaciones para garantizar el desarrollo normal y avance de las acciones sin contratiempos.

Las intervenciones comprendieron actividades de mantenimiento, suministro e instalación de equipos, adecuaciones y mejoras para garantizar el buen desempeño de la edificación.

4.2 MATERIALES Y EQUIPOS

El contratista dispuso los materiales requeridos para garantizar el buen desarrollo de las actividades programadas y se dispuso de las herramientas necesarias a la hora de ejecutar cada ítem contratado.

5 PRESUPUESTO CONTRATADO

5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO

ITEM	DESCIPCIÒN	UND	CANTD	V. UNITARIO	V.TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,01	Trazado y replanteo	m2	131,54	$ 3.466,00	$ 455.918,00
1,02	Realización de tala de árboles, compensación y reforestación	Und	1	$ 611.100,00	$ 611.100,00
1,03	Demolición de muro perimetral	m3	33,4	$ 42.386,00	$ 1.415.692,00
1,04	Retiro a disposición final de material de demolición	m3	43,42	$ 12.138,00	$ 527.032,00
1,05	Suministro e instalación de cerramiento en tela verde y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	ml	41,75	$ 35.919,00	$ 1.499.618,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2,01	Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro)	m3	12,24	$ 53.710,00	$ 657.410,00
2,02	Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro) < 0,50 mts	ml	37,00	$ 14.175,00	$ 524.475,00
2,03	Suministro e instalación de relleno con material seleccionado suelto	m3	141,37	$ 122.959,00	$ 17.382.960,00
3	**IDENTIFICACION INSTITUCIONAL**				
3,01	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable brillante con corte láser color a elección h: 20 cm y escudo en acero inoxidable en contraste satinado d: 80 cm	UND	1,00	$ 9.188.395,00	$ 9.188.395,00
4	**CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL**				
4,01	Suministro, corte, figurado e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi	kg	2240,36	$ 8.404,00	$ 18.827.985,00
4,02	Suministro y colocación de solado en concreto pobre de 17,5 MPa (2500 PSI) hecho en obra	m2	7,20	$ 47.791,00	$ 344.095,00
4,03	Suministro y colocación de concreto de 24 MPa (3,500 psi)	m3	1,80	$ 514.600,00	$ 926.280,00
4,04	Suministro y colocación de concreto de 21 mpa para columnas y vigas (3,000 psi)	m3	12,53	$ 482.837,00	$ 6.049.948,00
4,05	Sobrecimiento en bloque estructural e=0,15mts	ml	46,60	$ 62.993,00	$ 2.935.474,00
4,06	Suministro e instalación de levante de muro en bloque e = 0,15 mts	m2	139,80	$ 90.705,00	$ 12.680.559,00
4,07	Suministro e instalación de pañete para muros	m2	139,80	$ 36.853,00	$ 5.152.049,00
5	**TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA**				
4,01	Suministro, corte, figurado e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi	kg	563,45	$ 8.404,00	$ 4.735.224,00
4,03	Suministro y colocación de concreto de 24 mpa (3,500 psi)	m3	5,52	$ 514.600,00	$ 2.840.592,00

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÙN ACTIVIDADES
CONTRATO: C01.PCCNTR 8257714

5,01	Suministro y colocación de concreto de 28 mpa (4,000 psi)	m3	2,03	$ 550.099,00	$ 1.115.601,00
5,02	Suministro e instalación de tapa en concreto de 21mpa (3000 psi) con bordes en ángulo de 2"x2" y reforzado con varillas de 3/8" de medidas 0,6mx0,6m, incluye ganchos de apertura.	und	1,00	$ 504.021,00	$ 504.021,00
5,03	Pañete impermeabilizado dosificación 1:4	m2	245,00	$ 42.353,00	$ 10.376.485,00
5,04	Caseta para electrobomba de 0,6H x 0,6L x 0,6B dimensiones internas (incluye placa en concreto 3000 psi e = 8 cm y protector metalico y sistema de seguridad cadena y candado)	GBL	1,00	$ 746.466,00	$ 746.466,00
5,05	Suministro e instalación de electrobomba de 1 Caballo	und	1,00	$ 942.816,00	$ 942.816,00
5,06	suministro e isntalacion de tubería pvc de 1/2" (incluye accesorios)	mL	22,00	$ 13.979,00	$ 307.538,00
5,07	suministro e instalacion de tuberia pvc de 3/4" (inc. accesorios)	mL	26,00	$ 16.727,00	$ 434.902,00
5,08	Suministro e instalación de sika waterbar/cinta pvc o-22 sellar e impermeabilizar juntas en tanques	mL	12,00	$ 100.375,00	$ 1.204.500,00
5,09	Suministro e instalación de interruptor flotador eléctrico	UND	1,00	$ 175.018,00	$ 175.018,00
6	**CARPINTERIA METALICA**				
6,01	Suministro e instalación de protectores para ventanas en acero inoxidable en tubería de 1” y ½”.	m2	13,44	$ 537.097,00	$ 7.221.054,00
6,02	Suministro e instalacion de vinilo esmerilado para puertas y ventanas	m2	14,30	$ 54.138,00	$ 773.914,00
6,03	Suministro e instalación de cortina tipo panel japonés con corredera horizontal, incluye accesorios de instalación y herrajes. hmax: 1.50 mts aproximadamente	m2	13	$ 200.700,00	$ 2.609.100,00
6,04	Suministro e instalación de rejas para patio en tubería de 1 pulgada en acero inoxidable REF. 304	m2	16	$ 568.491,00	$ 9.095.856,00
6,05	Suministro e instalacion de puerta de acceso en vidrio templado 2,30x2,20 incluye bisagra y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye desmonte de puerta existente y disposicion final.	m2	5,06	$ 560.843,00	$ 2.837.866,00
7	**CERRAMIENTO ELECTRICO**				
7,01	Suministro e instalación de kit solar para cerca eléctrica	und	1	$ 3.995.240,00	$ 3.995.240,00
7,02	Suministro e instalación de postes para cerca eléctrica. Incluye anclado de postes y aisladores para el cable	und	20	$ 577.160,85	$ 11.543.217,00
7,03	Cable para cercado eléctrico de 4 líneas	m	40	$ 16.481,85	$ 659.274,00
8	**SISTEMA ELÉCTRICO REGULADO**				
8,01	Suministro e instalación de tablero bypass de 40 A, con luz indicadora de la posición	und	1	$ 3.308.769,98	$ 3.308.769,98

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÙN ACTIVIDADES
CONTRATO: C01.PCCNTR 8257714

	(Red o UPS).				
8,02	Suministro e instalación de breaker enchufable de 2 x 40 A	und	2	$ 103.111,05	$ 206.222,10
8,03	Suministro e instalación de breaker enchufable de 1 x 15 A	und	3	$ 52.905,30	$ 158.715,90
8,04	Suministro e instalación de coraza liquid tight de 1" para conectar la entrada y salida de la UPS, conexionado del tablero regulado. Debe incluir acoples para conexión y correcta instalación.	m	12	$ 29.852,55	$ 358.230,60
8,05	Suministro e Instalación de ducto para salida 220 V desde el tablero hasta caja de conexión. Incluye regata, resane y acabado con pintura tipo 1 desde el tablero hasta el cuarto técnico.	m	10	$ 39.893,00	$ 398.930,00
8,06	Suministro e instalación de cable de cobre calibre #8 AWG THWN-2	m	22	$ 39.534,81	$ 869.765,82
8,07	Suministro e instalación de borna para ponchar de cobre calibre #8 AWG THWN-2	und	16	$ 11.869,20	$ 189.907,20
8,08	Suministro e instalación de caja de paso y conexiones	und	1	$ 104.229,30	$ 104.229,30
8,09	Instalación de tablero de 8 circuitos para el sistema regulado	und	1	$ 206.755,50	$ 206.755,50
8,10	Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente doble regulado a 120 V, hasta 3 m. Incluye tomacorriente, conectores y demás elementos necesarios para su correcta instalación en canaleta metálica de 10 cm.	und	8	$ 113.477,18	$ 907.817,40
8,11	Suministro e instalación de alimentador en cable 3* # 12 AWG	m	59	$ 20.476,00	$ 1.208.084,00
8,12	Suministro e instalación de tubo PVC SCH 40 de 1/2" para alimentador en cable 3* # 12 AWG	m	33	$ 13.563,00	$ 447.579,00
8,13	Suministro e instalación de tubo PVC de 1/2" incrustado para alimentador en cable 3* # 12 AWG. Incluye regata, resane y acabado con pintura tipo 1	m	24	$ 31.769,00	$ 762.456,00
8,14	Suministro e instalación de salida para toma de electrobomba de 1 hp. Incluye tablero con protección térmica y control para los niveles	und	1	$ 2.271.236,00	$ 2.271.236,00
8,15	Suministro e instalación de puente para equipotencialización a la puesta a tierra en cable calibre # 8 AWG en el tablero principal	und	1	$ 27.380,85	$ 27.380,85
	TOTAL, COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**$ 153.749.233,00**
	ADMINISTRACIÒN		**26,85%**		**$ 41.282.929,00**
	IMPREVISTOS		**2,0%**		**$ 3.074.985,00**
	UTILIDAD		**5,0%**		**$ 7.687.462,00**
	IVA SOBRE UTILIDAD		**19,0%**		**$ 1.460.618,00**
	TOTAL, OFERTA ECONOMICA				**$ 207.255.227,00**

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÙN ACTIVIDADES
CONTRATO: C01.PCCNTR 8257714

5.2 ALCANCES EJECUTADOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	ACTIVIDAD EJECUTADA	FECHA DE EJECUCIÒN
1.01	Trazado y Replanteo.	M2	SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE PLANOS, ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES Y DE INSTALACIONES PARA IDENTIFICAR TODOS LOS PUNTOS, LÍNEAS Y COTAS A REPLANTEAR. SE HIZO EL RECONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA VERIFICAR SU ESTADO, OBSTÁCULOS EXISTENTES Y POSIBLES DIFICULTADES. MARCADO DE EJES Y LINDEROS, LOCALIZACIÓN, ALINEACIÓN, UBICACIÓN Y MARCADO EN EL TERRENO DE LOS EJES PRINCIPALES, PARALELOS Y PERPENDICULARES SEÑALADOS EN EL PLANO DEL PROYECTO, ASÍ COMO LOS LINDEROS DEL MISMO. TRABAJOS DE NIVELACIÓN PARA CONOCER LA DIFERENCIA DE ALTURAS DE UNO O VARIOS PUNTOS CON RESPECTO A UNO CONOCIDO.	EJECUTADO ENTRE NOV 01/2025 HASTA NOV 30/2025
1.02	Realización de tala de árboles, compensación y reforestación.	UND	SE REALIZÓ UNA PREPARACIÓN PREVIA PARA CERCIRARNOS DE QUE LA ACTIVIDAD SE LLEVARA A CABO DE MANERA SEGURA Y SIN CAUSAR DAÑOS A PERSONAS NI A LA PROPIEDAD.PRIMERAMENTE SE HIZO EL CORTE Y ACOPIO DE LAS RAMAS LARGAS CON AYUDA DE HERRAMIENTAS MENORES (MACHETES Y BARRAS). Y CON AYUDA DE MOTOSIERRA EL CORTE DEL TONCO PRINCIPAL. COMO COMPENSACIÓN SE HIZO LA PLATACIÓN DIEZ (10) ARBOLES NATIVOS DE LA REGION, LOS CUALES FUERON SEMBRADOS Y DONADOS AL MUNICIPIO DE LA UNIÓN SUCRE, ESPECIFICAMENTE EN LA ZONA PERIMETRAL DE LA CANCHA SINTETICA DE BARRIO SANTO DOMINGO.	EJECUTADO ENTRE SEP25/2025 HASTA OCT 31/2025
1.03	Demolición de muro perimetral.	M3	DEMOLICIÓN DE MURO PERIMETRAL, REALIZADO DE FORMA MANUAL Y UTILIZACIÓN DE ROTOMARTILLO PARA ELEMENTOS COMO VIGAS Y COLUMNETAS A LAISTA	EJECUTADO ENTRE SEP25/2025 HASTA OCT 31/2025
1.04	Retiro a disposición final de material de demolición	M3	SE ACOPIÓ TO EL MATERIAL DEMOLIDO, LUEGO SE RETIRÓ CON VALDES Y SACOS, TODO ESTO TRANSITORIAMENTE CON AYUDAS DE MOTO CARRO HASTA EL PUNTO DE RECIBIMIENTO DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO UNIÓN AAA.	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÙN ACTIVIDADES
CONTRATO: C01.PCCNTR 8257714

1.05	Suministro e instalación de cerramiento en tela verde y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	ML	SE REALIZÓ CERRAMIENTO CONVENCIONAL CON TELA VERDE DE 2 MTS DE ALTURA APUNTALADO CADA 3 METROS CON LISTONES DE MADERA	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025
3.01	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable brillante con corte laser color a elección h: 20cm y escudo de acero inoxidable en contraste satinado d; 80cm.	UND	SE REALIZÓ CERRAMIENTO CONVENCIONAL CON TELA VERDE DE 2 MTS DE ALTURA APUNTALADO CADA 3 METROS CON LISTONES DE MADERA	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025
4.01	Suministro, corte, figurado e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi	KG	SE HIZO EL CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA EL TANQUE CONFORME A LO ESPECIFICADO EN EL PLANO, LUEGO SE INSTALO EN DOS FASES: FASE 1 ACERO DE LOSA INFERIOR Y MUROS FASE 2 ACERO DE LOSA SUPERIOR	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025
5(4.01)	Suministro, corte, figurado e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi	KG	SE HIZO EL CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA MUROS, INCLUYENDO: ACERO PARA ZAPATAS, ACERO PARA COLUMNAS, ACERO PARA VIGAS.	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025
4.02	Suministro y colocación de solado en concreto pobre de 17,5 MPa (2500 PSI) hecho en obra	M2	SE REALIZÓ LA FUNDIDA DE CONCRETO POBRE PARA SOLADO FONDO DE TANQUE	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025
5 (4.03)	Suministro y colocación de concreto de 24 MPa (3,500 psi)	M3	SE REALIZÓ FUNDIDA DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO CON EUCON IM 200 PARA: LOSA FONDO DE TANQUE (2.03M3), FUNDIDA DE CONCRETO MUROS (4.97M3), FUNDIDA DE CONCRETO LOSA SUPERIOR (2.03M3) Y CONCRETO PARA CUÑAS (0.82M3).	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025
5 (4.04)	Suministro y colocación de concreto de 24 MPa (3,000 psi)	M3	SE REALIZÓ FUNDIDA DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO CON EUCON IM 200 PARA: LOSA FONDO DE TANQUE (2.03M3), FUNDIDA DE CONCRETO MUROS (4.97M3), FUNDIDA DE CONCRETO LOSA SUPERIOR (2.03M3) Y CONCRETO PARA CUÑAS (0.82M3).	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÙN ACTIVIDADES
CONTRATO: C01.PCCNTR 8257714

5.01	Suministro y colocación de concreto de 28 mpa (4,000 psi)	M3	SE REALIZÓ FUNDIDA DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO CON EUCON IM 200 PARA: LOSA FONDO DE TANQUE (2.03M3), FUNDIDA DE CONCRETO MUROS (4.97M3), FUNDIDA DE CONCRETO LOSA SUPERIOR (2.03M3) Y CONCRETO PARA CUÑAS (0.82M3).	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025
5.02	Suministro e instalación de tapa en concreto de 21mpa (3000 psi) con bordes en ángulo de 2"x2" y reforzado con varillas de 3/8" de medidas 0,6mx0,6m, incluye ganchos de apertura.	UND	SE FABRICÓ EL MARCO REFOZADO, CON VARILLAS 3/8, SE RELLENÓ CONCRETO DE 3000 PSI, POSTERIORMENTE SE HIZO LA DEBIDA INSTALACIÓN DE LA TAPA	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025
5.03	Pañete impermeabilizado dosificación 1:4	M2	SE HIZO LA INSTALACIÓN DEL PAÑETE IMPERMEABILADO SIKA 1 UNIVERSAL TANTO PARA MUROS COMO PARA LOSA FONDO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO.ADICINALEMTE A ESTO SE APLICO MORTERO PLANISEAL 68, 2 CAPAS ANTES DE PAÑETAR Y 2 CAPAS DESPUES DE PAÑETAR	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025
5.08	Suministro e instalación de sika waterbar/cinta pvc o-22 sellar e impermeabilizar juntas en tanques	ML	ANTES DE FUNDIR LA LOSA INFERIOR DEL TANQUE SE INSTALO LA CINTA DE JUNTAS, OBSERVAR EN REGISTRO FOTOGRAFICO	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025
6.01	Suministro e instalación de protectores para ventanas en acero inoxidable en tubería de 1” y ½”.	M2	SE HIZO LA INSTALACIÓN DE PROTECTORES PARA TODAS LAS VENTANAS INVENTARIADAS	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025
6.02	Suministro e instalación de vinilo esmerilado para puertas y ventanas	M2	SE INSTALÓ VINILO ESMERILADO PARA PUERTAS Y VENTANAS	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025
6.04	Suministro e instalación de rejas para patio en tubería de 1 pulgada en acero inoxidable REF. 304	M2	SE INSTALÒ PUERTA TRASERA CON TUBERIA CUADRADA DE 1 PULGADA EN ACERO INOXIDABLE, LA PUERTA ES CORREDISA Y POSSE UN PASADOR DE SEGURIDAD	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÙN ACTIVIDADES
CONTRATO: C01.PCCNTR 8257714

6.05	Suministro e instalación de puerta de acceso en vidrio templado 2,30x2,20 incluye bisagra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, incluye desmonte de puerta existente y disposición final.	UND	SE RETIRÓ LA PUERTA EXISTENTE Y LUEGO SE INSTALÓ LA PUERTA PRINCIPAL DE LAS INSTALACIONES	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025
8.02	Suministro e instalación de breaker enchufable de 2 x 40 A	UND	SE INSTALÓ 2 BREAKERS	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025
8.03	Suministro e instalación de breaker enchufable de 1 x 15 A	UND	SE INSTALÓ 3 BREAKERS	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025
8.05	Suministro e Instalación de ducto para salida 220 V desde el tablero hasta caja de conexión. Incluye regata, resane y acabado con pintura tipo 1 desde el tablero hasta el cuarto técnico.	m	SE HIZO LA INSTALACIÓN DE DUCTO, CON REGATAS Y POSTERIOR RESANE.	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025
8.06	Suministro e instalación de cable de cobre calibre #8 AWG THWN-2	m	SE INSTALÓ EL CABLE EN COBRE DE CALIBRE #8	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025
8.08	Suministro e instalación de caja de paso y conexiones	UND	SE INSTALÓ CAJA DE PASO Y SUS CONEXIONES	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025
8.09	Instalación de tablero de 8 circuitos para el sistema regulado	UND	SE INSTALÓ CAJA DE PASO Y SUS CONEXIONES	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÙN ACTIVIDADES
CONTRATO: C01.PCCNTR 8257714

8.11	Suministro e instalación de alimentador en cable 3* # 12 AWG	m	SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE #3	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025
8.12	Suministro e instalación de tubo PVC SCH 40 de 1/2" para alimentador en cable 3* # 12 AWG	m	SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 1/2" PARA ALIEMNTADOR EN CABLE #12	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025
8.13	Suministro e instalación de tubo PVC de 1/2" incrustado para alimentador en cable 3* # 12 AWG. Incluye regata, resane y acabado con pintura tipo 1	m	SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 1/2" PARA ALIEMNTADOR EN CABLE #12 CON REGATAS Y POSTERIOR RESANE	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025
8.15	Suministro e instalación de puente para equipotencialización a la puesta a tierra en cable calibre # 8 AWG en el tablero principal	UND	SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE PUENTE PARA EQUIPOTENCIALIZACIÓN	EJECUTADO ENTRE SEP18/2025 HASTA NOV 30/2025

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÙN ACTIVIDADES
CONTRATO: C01.PCCNTR 8257714

CONTRATO No :	**CO1.PCCNTR.8257714**

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.

CUADRO COMPARATIVO (CONDICIONES ORIGINALES VS CONDICIONES REALES EJECUTADAS)

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VLR TOTAL	CANT	Valor	%
1.01	Trazado y Replanteo.	M2	131.54	$ 3,466	$ 455,918	131.54	$ 455,918	100%
1.02	Realización de tala de árboles, compensación y reforestación.	UND	1	$ 611,100	$ 611,100	1	$ 611,100	100%
1.03	Demolición de muro perimetral.	M3	33.4	$ 42,386	$ 1,415,692	28.68	$ 1,022,774	100%
1.04	Retiro a disposición final de material de demolición	M3	43.42	$ 12,138	$ 527,032	43.42	$ 527,032	100%
1.05	Suministro e instalación de cerramiento en tela verde y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	ML	41.75	$ 35,919	$ 1,499,618	41.75	$ 1,499,618	100%
3.01	Suministro e instalación de logo institucional em letras de acero inoxidable brillante con corte laser color a elección h: 20cm y escudo de acero inoxidable en contraste satinado d; 80cm.	UND	1	$ 9.188.395	$ 9.188.395	1	$ 9.188.395	100%
5 (4.01)	Suministro, corte, figurado e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi	KG	563.45	$ 8,404	$ 4,735,224.00	563.45	$ 4,735,224	100%
4.02	Suministro y colocación de solado en concreto pobre de 17,5 MPa (2500 PSI) hecho en obra	M2	7.2	$ 47,791	$ 344,095	7.2	$ 344,095	100%
5.01	Suministro y colocación de concreto de 28 mpa (4,000 psi)	M3	2.03	$ 550,099	$ 1,115,601	2.03	$ 1,115,601	100%
5.02	Suministro e instalación de tapa en concreto de 21mpa (3000 psi) con bordes en ángulo de 2"x2" y reforzado con varillas de 3/8" de medidas 0,6mx0,6m, incluye ganchos de apertura.	UND	1	$ 504,021	$ 504,021	1	$ 504,021	100%
5.03	Pañete impermeabilizado dosificación 1:4	M2	245	$ 42,353	$ 10,376,485	70.6	$ 2,754,639	100%
5.08	Suministro e instalación de sika waterbar/cinta pvc o-22 sellar e impermeabilizar juntas en tanques	ML	12	$ 100,375	$ 1,204,500	12	$ 1,204,500	100%
6.01	Suministro e instalación de protectores para ventanas en acero inoxidable en tubería de 1" y ½".	M2	13.44	$ 537,097	$ 7,221,054	13.44	$ 7,221,054	100%
6.04	Suministro e instalación de rejas para patio en tubería de 1 pulgada en acero inoxidable REF. 304	M2	16	$ 586,491	$ 9,095,856	4.62	$ 2,626,428	100%
6.05	Suministro e instalación de puerta de acceso en vidrio templado 2,30x2,20 incluye bisagra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, incluye desmonte de puerta existente y disposición final.	M2	5.06	$ 560,843	$ 2,837,866	5.06	$ 2,837,866	100%

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÙN ACTIVIDADES
CONTRATO: C01.PCCNTR 8257714

8.02	Suministro e instalación de breaker enchufable de 2 x 40 A	UND	2	$ 105.660	$ 211.320	2	$ 211,320	100%
8.03	Suministro e instalación de breaker enchufable de 1 x 15 A	UND	3	$ 54.180	$ 162.540	3	$ 162,540	100%
8.05	Suministro e Instalación de ducto para salida 220 V desde el tablero hasta caja de conexión. Incluye regata, resane y acabado con pintura tipo 1 desde el tablero hasta el cuarto técnico.	m	10	$ 40.910	$ 409.100	10	$ 409,100	100%
8.06	Suministro e instalación de cable de cobre calibre #8 AWG THWN-2	m	22	$ 40.546	$ 892.012	22	$ 892,012	100%
8.08	Suministro e instalación de caja de paso y conexiones	UND	1	$ 106.725	$ 106.725	1	$ 106,725	100%
8.09	Instalación de tablero de 8 circuitos para el sistema regulado	UND	1	$ 211.853	$ 211.853	1	$ 211,853	100%
8.11	Suministro e instalación de alimentador en cable 3* # 12 AWG	m	59	$ 20.476	$ 1.208.084	59	$ 1,208,084	100%
8.12	Suministro e instalación de tubo PVC SCH 40 de 1/2" para alimentador en cable 3* # 12 AWG	m	33	$ 13.563	$ 447.579	33	$ 447,579	100%
8.13	Suministro e instalación de tubo PVC de 1/2" incrustado para alimentador en cable 3* # 12 AWG. Incluye regata, resane y acabado con pintura tipo 1	m	24	$ 31.769	$ 762.456	24	$ 762,456	100%
8.15	Suministro e instalación de puente para equipotencialización a la puesta a tierra en cable calibre # 8 AWG en el tablero principal	UND	1	$ 28.094	$ 28.094	1	$ 28,094	100%

6 ASPECTOS FINANCIEROS

El estado financiero se puede analizar de la siguiente manera:

El valor del presente total es:

SUBTOTAL		$41.513.313
28,85%	ADMO	$11.146.324
2%	IPREV	$830.266
5%	UTDAD	$2.075.666
19%	IVA UT	$394.376
SUMA		**$55.959.945**

- La obra ejecutada corresponde al **27%** en lo que compete a ítems ejecutado contratados, pero en realidad a la fecha de cierre del presente informe , pero se requiere de un nuevo balance para atender alcances mayores y menores e ítems no previstos que fueron resultado de replanteo del proyecto por condiciones diferentes encontrados en estudio de suelos y se reitera que se van ejecutar excavaciones bajo agua a diferentes profundidades para alcanzar cotas de cimentación sugerida en ajuste estructural, como también un mayor refuerzo de equipos especiales tipo rotomartillos para demoliciones con de zapatas , vigas de cimentación existente, actividades que se complementarían con las tareas de evacuación permanente de aguas y control de erosiones.

A continuación, se realiza un balance de la ejecución del contrato y se presenta valor total de acta parcial a cobrar a la fecha.

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR	% ACTA
VALOR CONTRATO CO1.PCCNTR.8257714	$ 207.255.227		
VALOR EJECUTADO DESE SEPT18		$ 55.496.105	27%
POR EJECUTAR		$151.295.732	73%
SALDO TOTAL POR CANCELAR		$ 55.959.495	

7 CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el Consorcio JUDICIAL SUCRE se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales. (ver Anexos).

8 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se deja constancia que el contrato **CO1.PCCNTR.8257714**, se encuentra en ejecución cumplimiento a las obligaciones contractuales.

Las actividades correspondientes al contrato que fueron ejecutadas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y revisadas por el ingeniero de apoyo técnico del contrato.

El contratista ejecutó las actividades de manera eficiente, empleando varias cuadrillas que trabajan diferentes actividades de manera simultánea, sin afectar el normal desarrollo de las actividades de los funcionarios.

9 GARANTIAS Y SU VIGENCIA

Garantías Actualizadas según Acta de inicio contrato de fecha 18 de septiembre de 2025.

- **Póliza No. 11-44-101263887-Anexo 2.-Cumplimiento**.

- ✓ Cumplimiento, Vigencia desde 18 de septiembre de 2025 hasta 17 de noviembre de 2026 (Suma asegurada $41.451.045,4).
- ✓ Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Vigencia desde 18 de septiembre de 2025 hasta 17 de noviembre de 2028 (Suma asegurada $31.088.284,05).
- ✓ Estabilidad y Calidad de Obra, Vigencia Se ampara cinco años desde 18 de septiembre de 2025 (Suma asegurada $62.176.568,10).

- **Póliza No. 11-40-101082499 -Anexo 3.-Responsabilidad Civil Extracontractual.**

✓ Predios, labores y operaciones, Vigencia desde 18 de septiembre de 2025 hasta 17 de noviembre de 2025 (Suma asegurada $284.700.000).
✓ Contratistas y subcontratistas, Vigencia desde 18 de septiembre de 2025 hasta 17 de noviembre de 2025 (Suma asegurada $284.700.000).
✓ Vehículos propios y no propios, Vigencia desde 18 de septiembre de 2025 hasta 17 de noviembre de 2025 (Suma asegurada $284.700.000).

Las pólizas se encuentran actualizadas y ajustadas según el acta de inicio tal y como se puede verificar en Secop 2.

10 TRAZABILIDAD DEL CONTRATO

No.	Descripción	Fecha	Motivación
1	Oficio CJS_RJS_8257714 _2025_008	01/10/2025	**S**olicitud de servicio de vigilancia
2	Oficio CJS_RJS_8257714 _2025_012	07/10/2025	Suministro De Información De Logo Institucional.
3	OFICIO No. 002 – SUPERVISIÓN	15/10/2025	Información Condiciones mínimas de informes
4	Solicitud de revisión de planos eléctricos y aprobación	22/10/2025	Se informa que hay congruencia en planos eléctricos y se da la aprobación respectiva para su construcción.
5	oficio CJS_RJS_8257714_2025 _017	24/10/2025	Solicitud de ingreso de personal
6	oficio CJS_RJS_8257714_2025 _020	30/10/2025	Solicitud de ingreso de personal actividades eléctricas

7	Reiteración De Asistencia A Reunión Y Definición De Acciones Frente A Condiciones Presentadas En Obra.	31/10/2025	En el marco de la ejecución mantenimiento y las adecuaciones locativas del Palacio de Justicia, nos permitimos reiterar la importancia de confirmar la asistencia a la reunión programada para el día martes 4 de noviembre del presente año, la cual tiene como propósito analizar la situación actual del proyecto y definir acciones urgentes frente a las condiciones del terreno y los ajustes técnicos requeridos. Como es de su conocimiento, en la zona donde se construye el muro perimetral se han presentado condiciones en el terreno que difieren de las inicialmente estimadas en la fase de diseño, principalmente por la presencia de un nivel freático alto y filtraciones constantes en las excavaciones. A pesar bombeo continuo, los niveles de agua permanecen constantes, impidiendo el avance constructivo de la cimentación según los diseños ajustados por la supervisión.

11 CONCLUSIONES


- ✓ Todas las actividades descritas pese a los inconvenientes se cumplieron a cabalidad.
- ✓ Se cumplieron los requisitos técnicos y de calidad definidos en los términos del contrato en las actividades de tanque subterráneo.
- ✓ El ítem 2.01 excavación manual en material común no aplica, puesto que en el desarrollo de las actividades se encontró hemos encontrado que el material excavado, es material saturado con altas condiciones de humedad, en capas superficial existe material revuelto con residuos de escombros y raíces de árboles antiguos, además a determina profundidad existe alta filtración de agua al momento de realizar cada perforación.
- ✓ Se requiere para el próximo periodo, la aprobación de un balance general, el cual ya fue entregado a la interventoría para su revisión.
- ✓ Se reitera que para el próximo informe y poder reflejar las condiciones reales del proyecto en su avance, en su planeación, en su desarrollo, en su definición constructiva se revise y apruebe el balance general que permita palpar la mejor realidad acorde a las condiciones complejas en la que se ejecuta este proyecto.

- ✓ Se hace necesario la solicitud de prórroga del proyecto para cumplir con los nuevos objetivos del proyecto.
- ✓ Al cierre del presente informe, se solicitó a las partes involucradas una respuesta definitiva y congruente con la realidad sin ocasionar más perjuicio al contratista.

ANEXOS

- **REGISTRO FOTOGRAFICO**
- **PROGRAMACIÒN Y FLUJO**
- **INFORME SST Y SUS ANEXOS**
- **PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL**

Atentamente,




JAIR RICARDO MANJARREZ CUESTA
C.C. 84.083.215 de Riohacha
Representante Legal
CONSORCIO JUDICIAL SUCRE

ANEXOS.

-REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL.

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

TRAZADO Y REPLANTEO

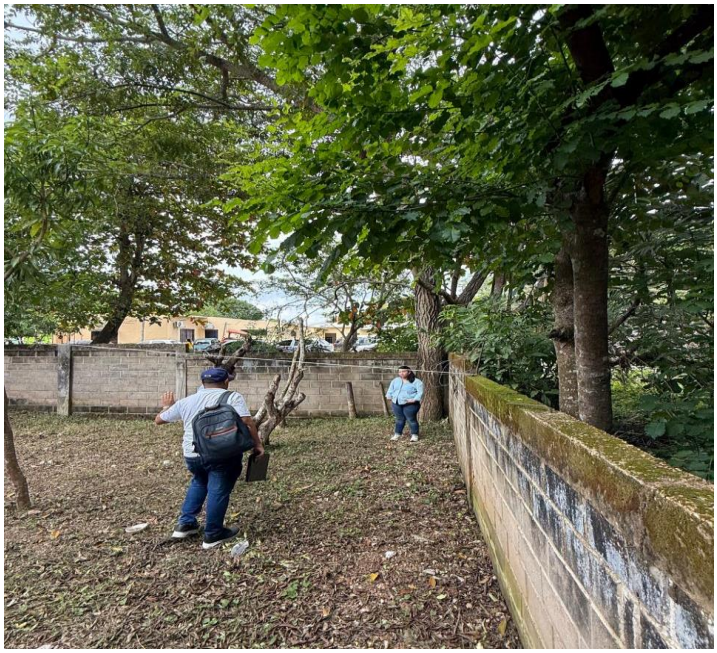

K



LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REVISIÓN DE LINDEROS





MARCADO DE EJES Y SEÑALIZACIÓN

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

TRABAJOS DE TALA DE ARBOLES, COMPENSACION Y REFORESTACION



VERIFICACIÒN DE ESPACIOS PARA TALA DE ARBOL



CORTE DE RAMAS PRINCIPALES



CORTE DE TRONCO DE ARBOL







CORTE Y ACOPIO DE TRONCOS Y RAMAS PRINCIPALES

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

TRABAJOS DE TALA DE ARBOLES, COMPENSACION Y REFORESTACION



EXCAVACIÓN PARA PLANTACIÓN DE ARBOLES




EXCAVACIÓN PARA PLANTACIÓN DE ARBOLES




EXCAVACIÓN PARA PLANTACIÓN DE ARBOLES



EXCAVACIÓN PARA PLANTACIÓN DE ARBOLES

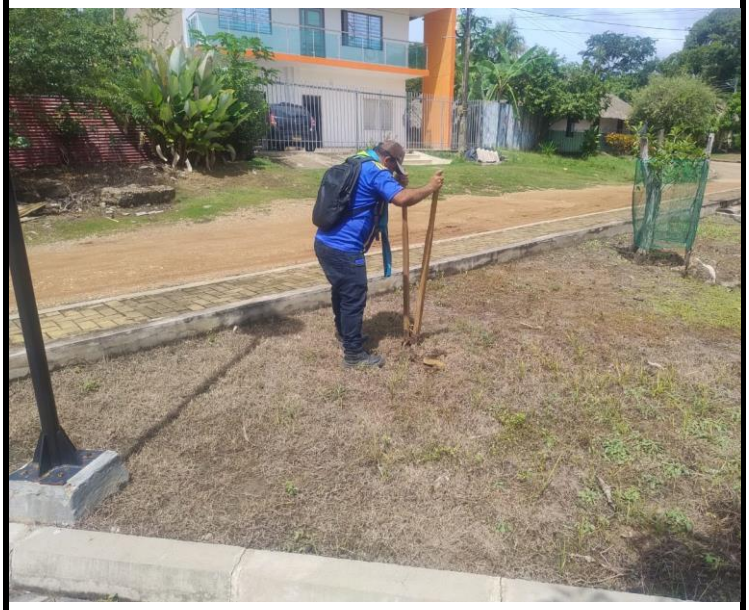

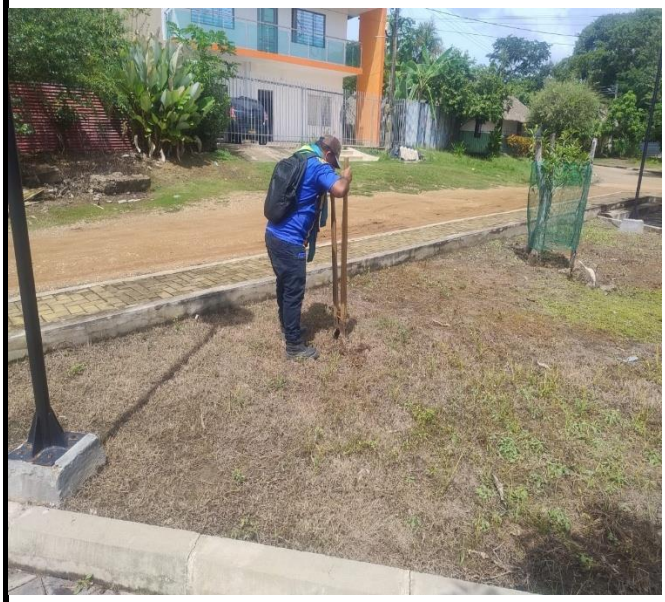

EXACAVACIÓN PARA PLANTACIÓN DE ARBOLES

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

TRABAJOS DE TALA DE ARBOLES, COMPENSACION Y REFORESTACION



PLANTACIÓN DE ARBOL N° 1



PLANTACIÓN DE ARBL N° 2





SIEMBRA DE ARBOL N°3 Y N4





SIEMBRA DE ARBOL N° 5 Y N°6

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

TRABAJOS DE TALA DE ARBOLES, COMPENSACION Y REFORESTACION



PLANTACIÓN DE ARBOL N° 7



PLANTACIÓN DE ARBL N° 8





SIEMBRA DE ARBOL N°9 Y N10

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL



DEMOLICIÓN DE MURO PERIMETRAL PARTE TRACERA



DEMOLICIÓN DE MURO





ACOPIO DE ESCOMBROS Y PROTECCIÓN DE MURO

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL



DEMOLICIÓN DE MURO PERIMETRAL PARTE TRACERA



DEMOLICIÓN DE MURO





DEMOLICIÓN DE MURO

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL



DEMOLICIÓN DE MURO PERIMETRAL PARTE TRACERA



DEMOLICIÓN DE MURO





DEMOLICIÓN DE MURO

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

RETIRO A DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE DEMOLICION



CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS



CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN TELA VERDE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN



CERRAMIENTO EN TELA VERDE



CERRAMIENTO EN TELA VERDE



CERRAMIENTO EN TELA VERDE



CERRAMIENTO EN TELA VERDE

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGO INSTITUCIONAL EN LETRAS DE ACERO INOXIDABLE BRILLANTE CON CORTE LÁSER COLOR A ELECCIÓN H: 20 CM Y ESCUDO EN ACERO INOXIDABLE EN CONTRASTE SATINADO D: 80 CM



INSTALACIÓN DE LOGO INSTITUCIONAL



INSTALACIÓN DE LOGO INSTITUCIONAL





INSTALCIÓN DE LOGO INSTITUCIONAL

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI.



SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO



SUMINISTRO, CORTE Y FIGURADO DE ACERO





SUMINISTRO, CORTE Y FIGURADO DE ACERO

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI.



INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA FONDO



INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA FONDO





INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA FONDO

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI.



INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZOS PARA MUROS



INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA MUROS





INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA MUROS

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI.



INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA SUPERIOR



INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA SUPERIOR





INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA SUPERIOR

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI.



INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA SUPERIOR



INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA SUPERIOR





INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA SUPERIOR

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 17,5 MPA (2500 PSI) HECHO EN OBRA



SOLADO FONDO TANQUE



SOLADO FONDO TANQUE





SOLADO FONDO TANQUE

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 28 MPA (4,000 PSI)



FUNDIDA CONCRETO LOSA FONDO



FUNDIDA CONCRETO LOSA FONDO





FUNDIDA CONCRETO LOSA FONDO

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 28 MPA (4,000 PSI)



FUNDIDA CONCRETO MUROS TANQUE



FUNDIDA CONCRETO MUROS TANQUE





FUNDIDA CONCRETO MUROS TANQUE

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 28 MPA (4,000 PSI)



FUNDIDA CONCRETO LOSA SUPERIOR TANQUE



FUNDIDA CONCRETO LOSA SUPERIOR TANQUE





FUNDIDA CONCRETO LOSA SUPERIOR TANQUE

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN CONCRETO DE 21MPA (3000 PSI) CON BORDES EN ANGULO DE 2"X2" Y REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" DE MEDIDAS 0,6MX0,6M, INCLUYE GANCHOS DE APERTURA.



INSTALACIÓN TAPA TANQUE



INSTALACIÓN TAPA TANQUE





INSTALACIÓN TAPA TANQUE

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

PAÑETE IMPERMEABILIZADO DOSIFICACIÓN 1:4



IMPERMEABILIZACIÓN CON PLANISEAL 68



PAÑETE PARA MUROS TANQUE





PAÑETE PARA MUROS TANQUE, IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 UNIVERSAL

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTORES PARA VENTANAS EN ACERO INOXIDABLE EN TUBERÍA DE 1" Y ½".



INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE VENTANA BAÑOS



INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE VENTANA ESTAR





INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE VENTANA CUARTO DE ARCHIVO Y ESTAR

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		


SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES PARA VENTANAS EN ACERO INOXIDABLE EN TUBERÍA DE 1" Y ½".




INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE VENTANA ESTAR



INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE VENTANA OFICINA PRINCIPAL

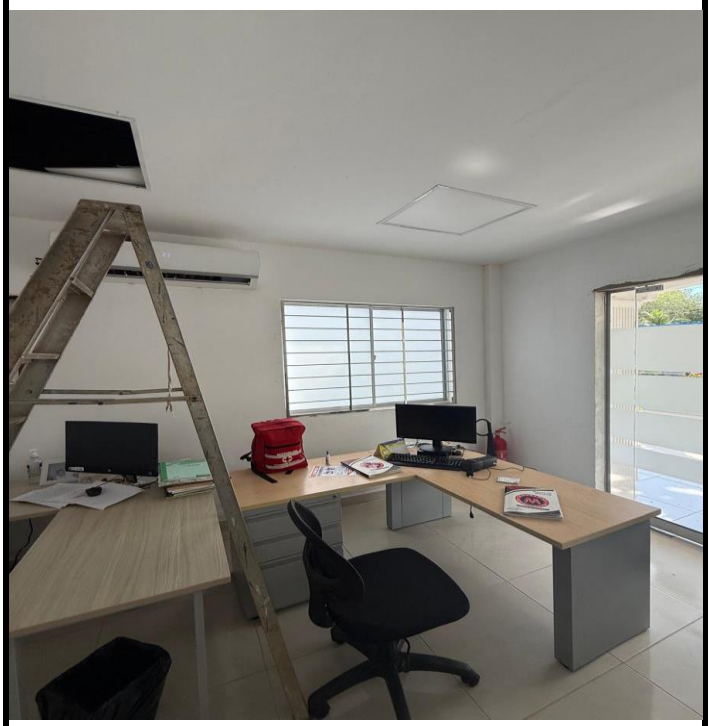

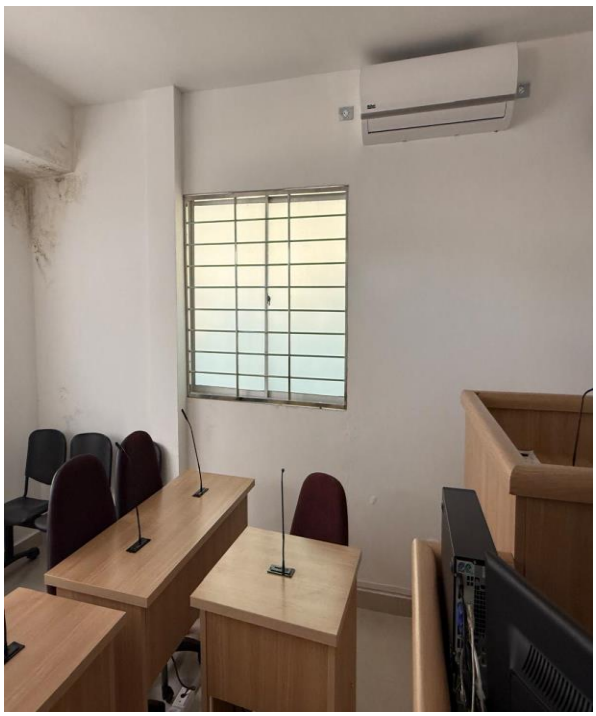

INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE VENTANA SALA DE AUDIENCIA

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS PARA PATIO EN TUBERIA DE 1 PULGADA EN ACERO INOXIDABLE REF. 304



INSTALACIÓN REJA PATIO



INSTALACIÓN REJA PATIO





INSTALACIÓN REJA PATIO

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO TEMPLADO 2,30X2,20 INCLUYE BISAGRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE DESMONTE DE PUERTA EXISTENTE Y DISPOSICIÓN FINAL.



INSTALACIÓN PUERTA PRINCIPAL



INSTALACIÓN PUERTA PRINCIPAL






INSTALACIÓN PUERTA PRINCIPAL

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

SISTEMA ELECTRICO REGULADO.



INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO

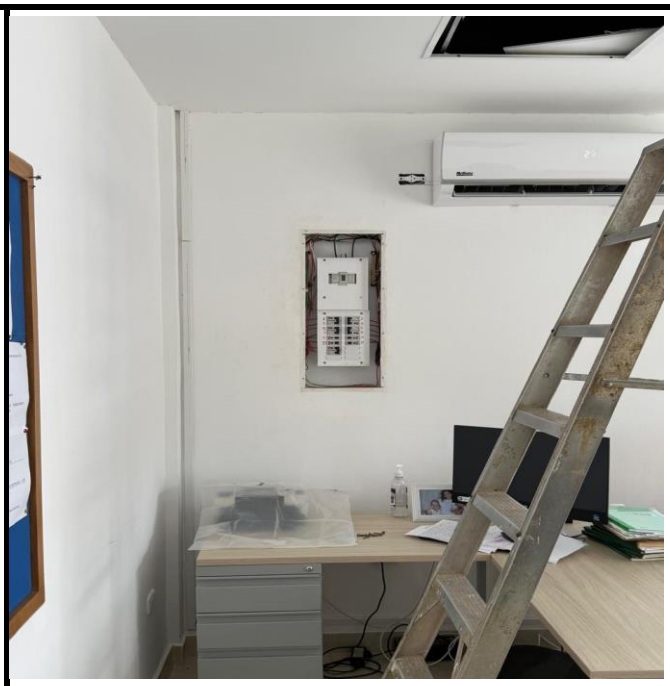

INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO






INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		


SISTEMA ELECTRICO REGULADO.

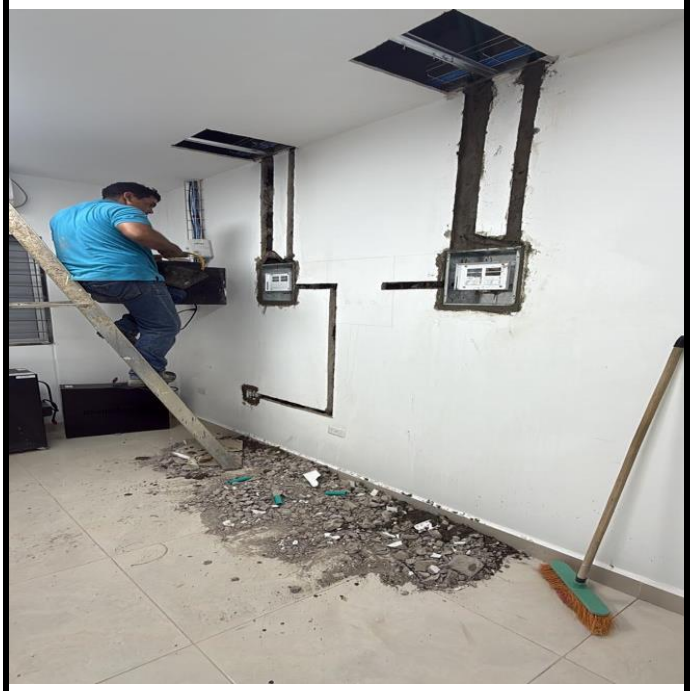

INSTALACION SISTEMA REGULADO



INSTALACION SISTEMA REGULADO

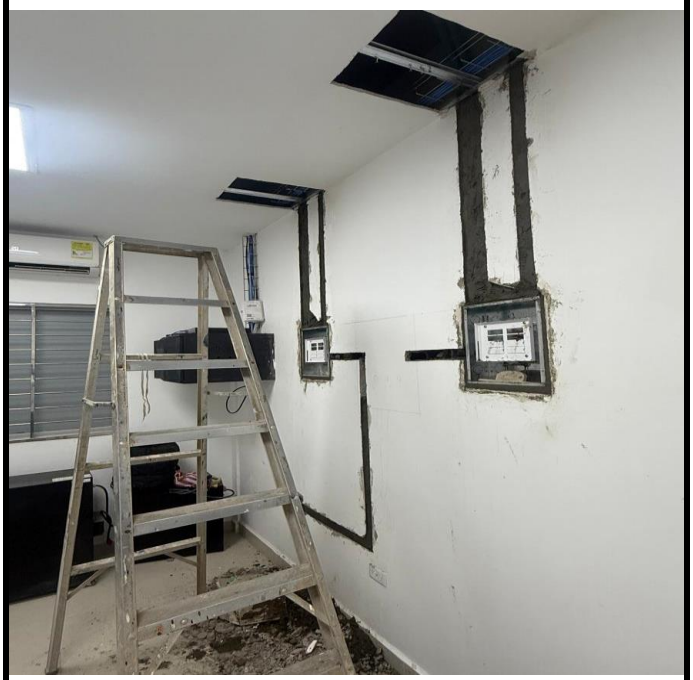




INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

SISTEMA ELÉCTRICO REGULADO.

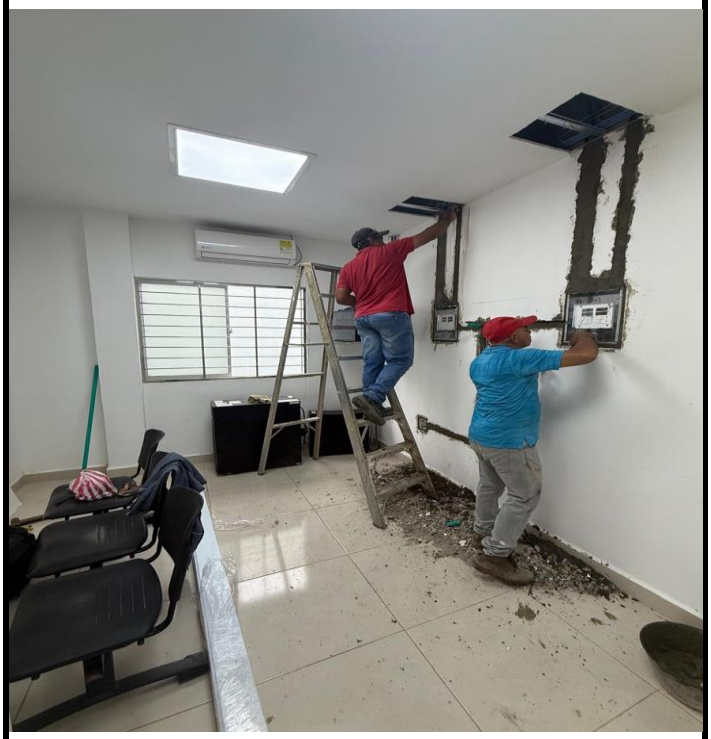

INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO



INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO





INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		


SISTEMA ELÉCTRICO REGULADO.




INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO



INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO

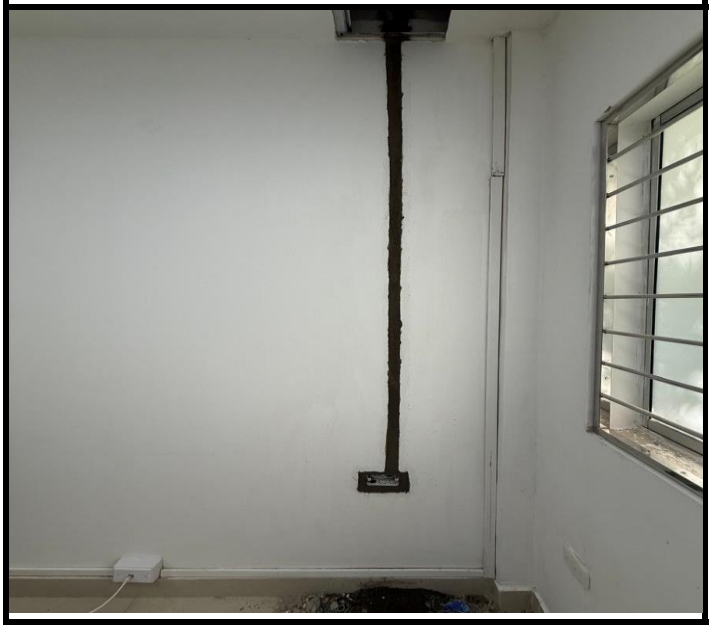

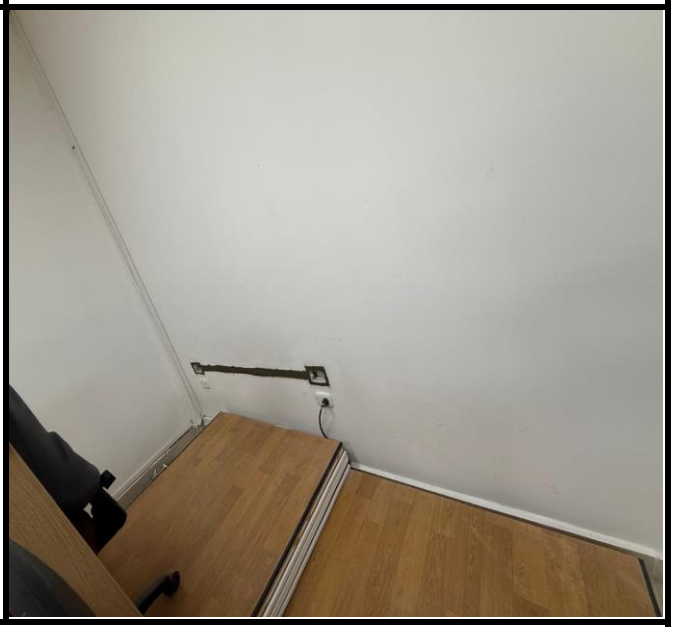

INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

SISTEMA ELECTRICO REGULADO.



INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO



INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO







INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

SISTEMA ELECTRICO REGULADO.

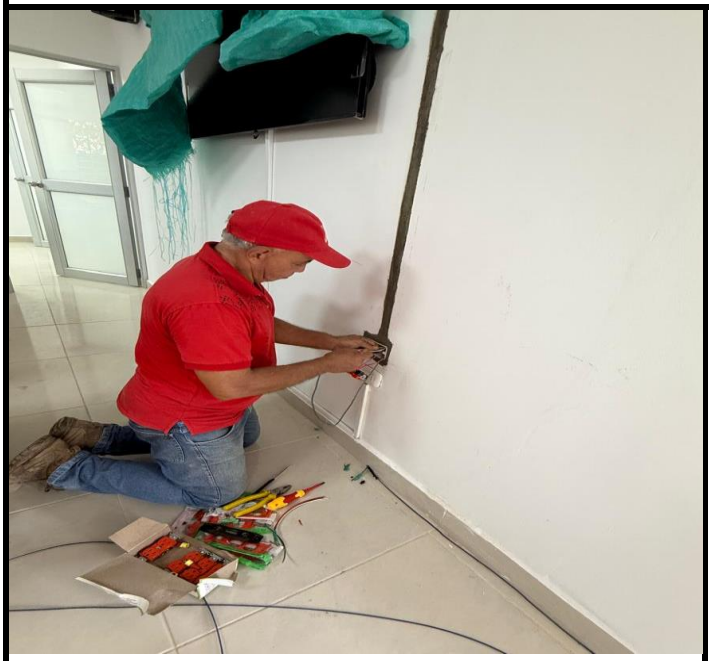

INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO

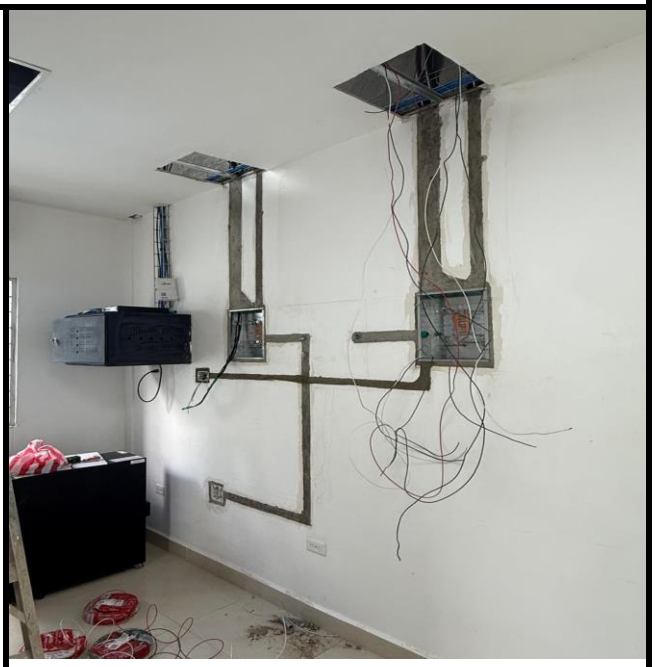

INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO





INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

SISTEMA ELECTRICO REGULADO.



INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO



INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO





INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		

SISTEMA ELECTRICO REGULADO.



INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO



INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO





INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8257714			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE 2025	**SUPERVISOR:**	Ramón Andrés López Camargo
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		


SISTEMA ELECTRICO REGULADO.




INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO



INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO

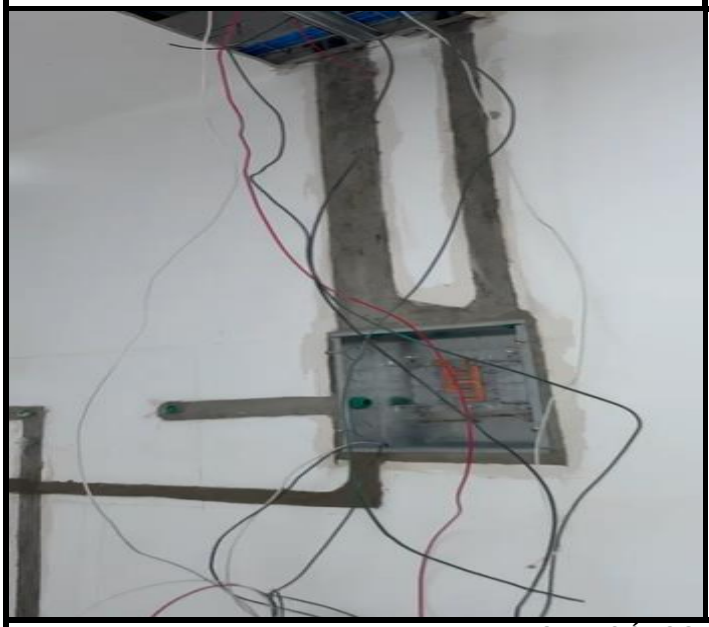

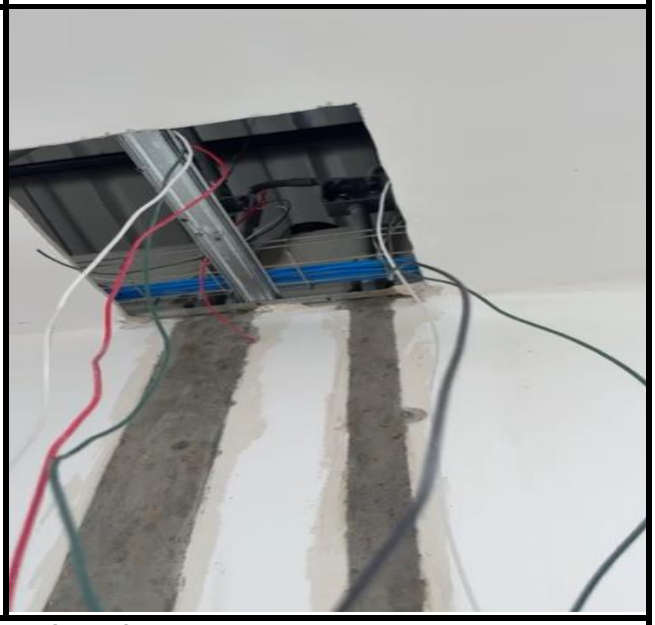

INSTALACIÓN SISTEMA REGULADO
