MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.


BALANCE


BALANCE N1

REV. Nº1

FECHA: OCT-2025

CAPITULO	PRELIMINARES	FECHA	15/10/2025
ITEM	Trazado y replanteo	UND	M2

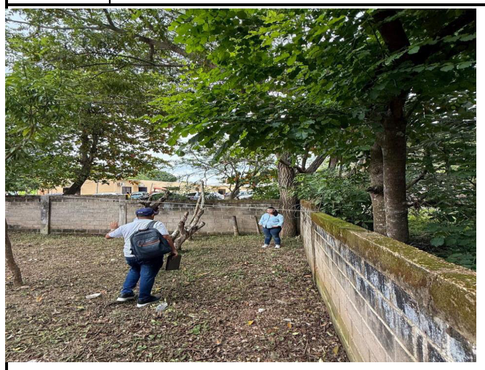

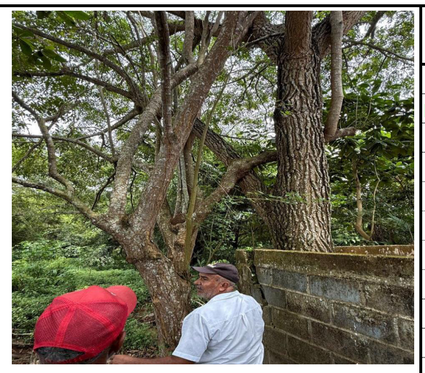





DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 1.01									
PERIMETRO	13,15	10,00		131,54				1,00	131,54
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**131,54**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. Nº1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	PRELIMINARES	**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Realizacion de tala de arboles, compensacion y reforestacion	**UND**	UND





DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 1.02									
ARBOL						1,00		1,00	1,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**1,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.

BALANCE

BALANCE N1

PAGINA 1 DE 1

REV. Nº1

FECHA: OCT-2025

CAPITULO	PRELIMINARES	FECHA	15/10/2025
ITEM	Demolicion de muro perimetral	UND	M3









DESCRIPCION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO	No. ELEM	MEDIDA TOTAL
ITEM 1.03									
COLUMNA	0,20	0,20	4,50		0,18			7,00	1,26
COLUMNA	0,26	0,26	4,50		0,30			3,00	0,91
MURO	30,69	0,15	4,20		19,33			1,00	19,33
VIGA CIMIENTO	33,00	0,30	0,30		2,97			1,00	2,97
ZAPATAS	0,80	0,80	0,30		0,19			9,00	1,73
VIGA CORONA	33,00	0,25	0,30		2,48			1,00	2,48
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**28,68**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. Nº1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	PRELIMINARES	FECHA	15/10/2025
ITEM	Retiro a disposicion final de material de demolicion	UND	M3









DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 1.04									
COLUMNA	0,20	0,20	4,50		0,27			7,00	1,89
COLUMNA	0,26	0,26	4,50		0,46			3,00	1,37
MURO	24,00	0,15	4,12		22,22			1,00	22,22
VIGA CIMIENTO	32,61	0,30	0,30		4,40			1,00	4,40
ZAPATAS	0,80	0,80	0,30		0,29			9,00	2,59
VIGA CORONA	33,00	0,25	0,30		3,71			1,00	3,71
SUMA									36,19
F. EXPANS	1,20								43,42
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**43,42**

36,19

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	PRELIMINARES	**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalacion de cerramiento en tela verde y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion	**UND**	ML










DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 1.01									
PERIMETRO	41,75							1,00	41,75
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**41,75**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. Nº1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL	**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable brillante con corte láser color a elección h: 20 cm y escudo en acero inoxidable en contraste satinado d: 80 cm	**UND**	UND

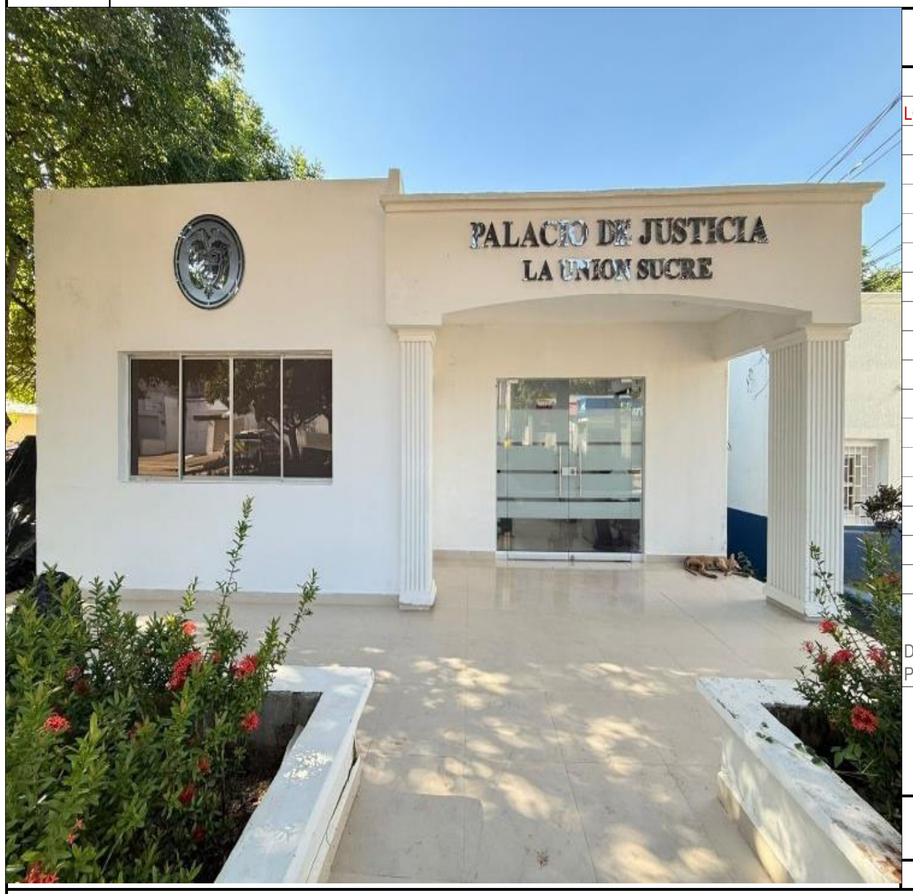

DESCRIPCION	DIMENSIONES							**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**	**UNIDAD**	**PESO**		
ITEM 3.01									
LOGO EN ACERO INIXIDABLE						1,00		1,00	1,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**1,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. Nº1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL	**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro y colocación de solado en concreto pobre de 17,5 MPa (2500 PSI) hecho en obra	**UND**	M2



DESCRIPCION	DIMENSIONES							**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**	**UNIDAD**	**PESO**		
ITEM 4.02									
SOLADO PARA TANQUE	2,60	2,78		7,23				1,00	7,23
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**7,2**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA 1 DE 1 REV. Nº1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA		FECHA DE CORTE					20/12/2023
ITEM	Suministro, corte, figurado e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi						UND	KG









DESCRIPCION	DIMENSIONES						No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	DIAMETRO	PESO(KG/M)	# ELEMENTOS	CANTIDAD	UNIDAD		
BASTONES MUROS Y LOSAS	2,80	1/2"	0,9960	174,00			1,00	485,25
BASTONES CUÑAS	1,28	3/8"	0,5710	107,00			1,00	78,20

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. Nº1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro y colocación de concreto de 28 mpa (4,000 psi)		**UND**	M3



DESCRIPCION	DIMENSIONES							**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**	**UNIDAD**	**PESO**		
ITEM 5.01									
CONCRETO LOSA INFERIOR	2,60	2,60	0,30		2,03			1,00	2,03
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**2,03**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. Nº1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalación de tapa en concreto de 21mpa (3000 psi) con bordes en ángulo de 2"x2" y reforzado con varillas de 3/8" de medidas 0,6mx0,6m, incluye ganchos de apertura.		**UND**	und





DESCRIPCION	DIMENSIONES							**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**	**UNIDAD**	**PESO**		
ITEM 5.02									
TAPA TANQUE						1,00		1,00	1,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**1,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria


	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Pañete impermeabilizado dosificación 1:4		**UND**	M2







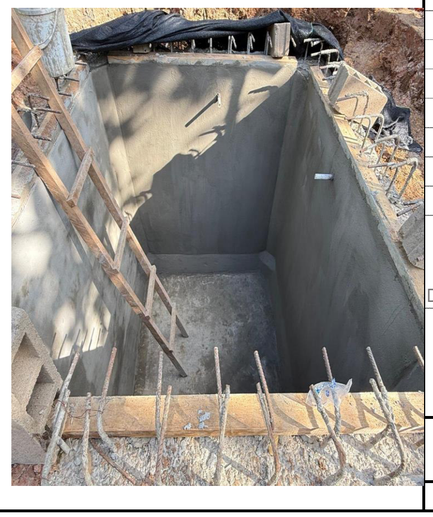

DESCRIPCION	DIMENSIONES							**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**	**UNIDAD**	**PESO**		
ITEM 5.03									
MUROS CARA INTERIOR A 3 MANOS		2,30	2,00	13,80				4,00	55,20
LOSA CARA INTERIOR A 3 MANOS	2,56	2,00		15,36				1,00	15,36
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**70,56**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalación de sika waterbar/cinta pvc o-22 sellar e impermeabilizar juntas en tanques		**UND**	ML



DESCRIPCION	DIMENSIONES							**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**	**UNIDAD**	**PESO**		
ITEM 5.08									
CINTA PVC	12,00					1,00		1,00	12,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**12,00**

Contratista-de Obra


VoBo Interventoria


	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalación de protectores para ventanas en acero inoxidable en tubería de 1" y ½".		**UND**	M2





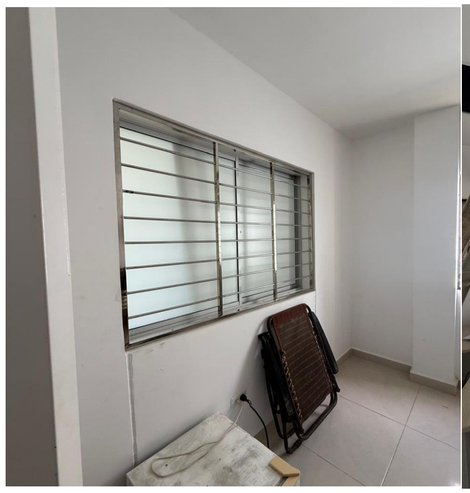

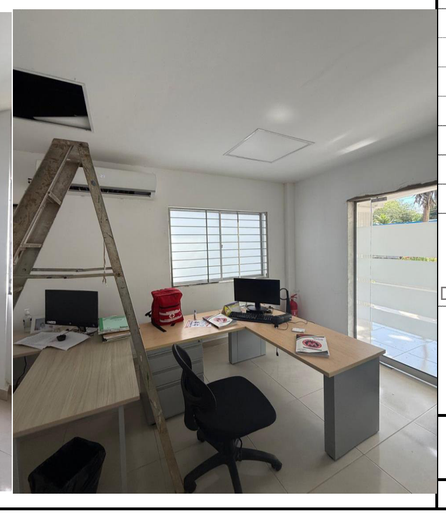

DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 6.01									
PROTECTOR VENTANA 1	2,60	1,19		3,09				1,00	3,09
PROTECTOR VENTANA 2	1,20	1,51		1,81				1,00	1,81
PROTECTOR VENTANA 3	1,36	1,16		1,58				1,00	1,58
PROTECTOR VENTANA 4	1,50	1,20		1,80				1,00	1,80
PROTECTOR VENTANA 5	1,51	1,16		1,75				1,00	1,75
PROTECTOR VENTANA 6	1,44	1,14		1,64				1,00	1,64
PROTECTOR VENTANA 7	1,52	1,16		1,76				1,00	1,76
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**13,44**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalación de rejas para patio en tubería de 1 pulgada en acero inoxidable REF. 304		**UND**	M2



DESCRIPCION	DIMENSIONES							**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**	**UNIDAD**	**PESO**		
ITEM 6.04									
REJA PATIO	2,04	2,27		4,62				1,00	4,62
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**4,62**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalacion de puerta de acceso en vidrio templado 2,30x2,20 incluye bisagra y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye desmonte de puerta existente y disposicion final.		**UND**	M2



DESCRIPCION	DIMENSIONES							**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**	**UNIDAD**	**PESO**		
ITEM 6.05									
PUERTA DE ACCESO	2,30	2,20		5,06				1,00	5,06
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**5,06**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	SISTEMA ELECTRICO REGULADO		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalación de breaker enchufable de 2 x 40 A		**UND**	UND



DESCRIPCION	DIMENSIONES							**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**	**UNIDAD**	**PESO**		
ITEM 8.02									
BREAKERS						1,00		2,00	2,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**2,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	SISTEMA ELECTRICO REGULADO		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalación de breaker enchufable de 1 x 15 A		**UND**	UND



DESCRIPCION	DIMENSIONES							**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**	**UNIDAD**	**PESO**		
ITEM 8.03									
BREAKERS						1,00		3,00	3,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**3,00**


Contratista-de Obra

VoBo Interventoria


	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	SISTEMA ELECTRICO REGULADO		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e Instalación de ducto para salida 220 V desde el tablero hasta caja de conexión. Incluye regata, resane y acabado con pintura tipo 1 desde el tablero hasta el cuarto técnico.		**UND**	m



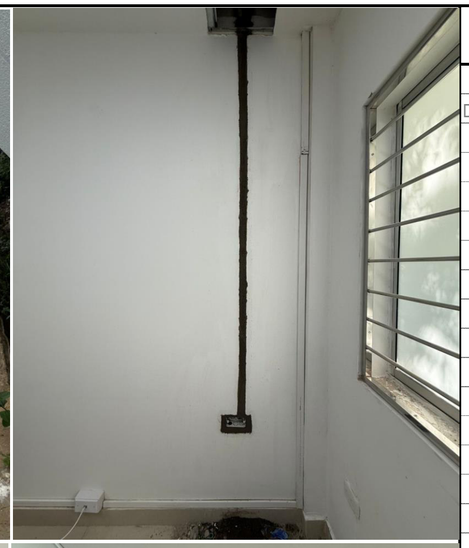



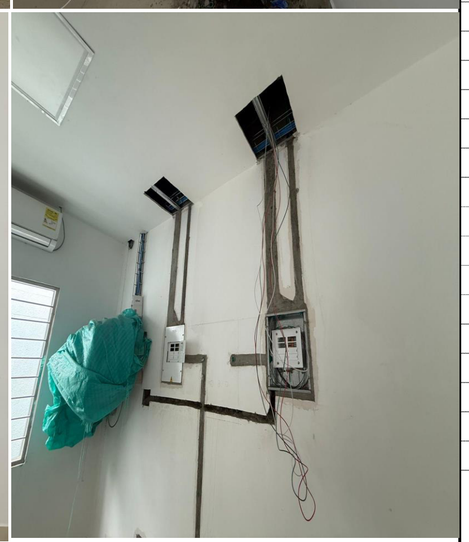

DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 8.05									
DUCTO	10,00							1,00	10,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	SISTEMA ELECTRICO REGULADO			**FECHA**				15/10/2025			
ITEM	Suministro e Instalación de ducto para salida 220 V desde el tablero hasta caja de conexión. Incluye regata, resane y acabado con pintura tipo 1 desde el tablero hasta el cuarto técnico.								**UND**	m	
			TOTAL								**10,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	SISTEMA ELECTRICO REGULADO		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalación de cable de cobre calibre #8 AWG THWN-2		**UND**	m




DESCRIPCION	DIMENSIONES							**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**	**UNIDAD**	**PESO**		
ITEM 8.06									
CABLE #8	22,00							1,00	22,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**22,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	SISTEMA ELECTRICO REGULADO		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalación de caja de paso y conexiones		**UND**	UND

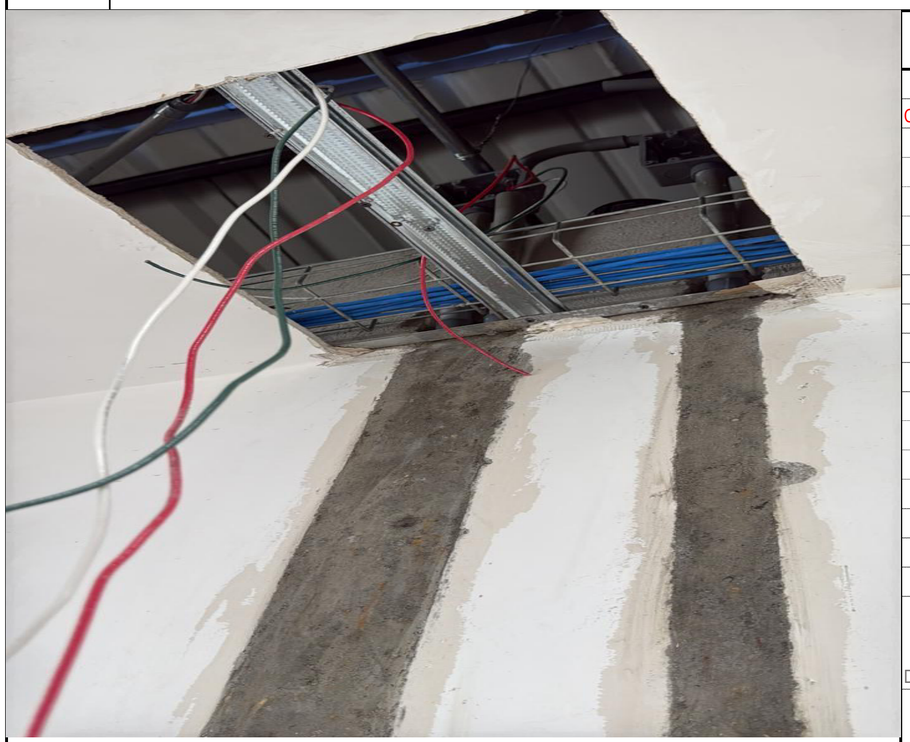

DESCRIPCION	DIMENSIONES							**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**	**UNIDAD**	**PESO**		
ITEM 8.08									
CAJA DE PASO						1,00		1,00	1,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**1,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	SISTEMA ELECTRICO REGULADO		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Instalación de tablero de 8 circuitos para el sistema regulado		**UND**	UND



DESCRIPCION	DIMENSIONES							**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**	**UNIDAD**	**PESO**		
ITEM 8.09									
TABLERO 8 CIRC						1,00		1,00	1,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**1,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	SISTEMA ELECTRICO REGULADO		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalación de alimentador en cable 3* # 12 AWG		**UND**	m



DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 8.11									
ALIMENTADOR EN 3* #12 AWG	59,00							1,00	59,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**59,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	SISTEMA ELECTRICO REGULADO		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalación de tubo PVC SCH 40 de 1/2" para alimentador en cable 3* # 12 AWG		**UND**	m



DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 8.12									
TUBERIA PVC SCH40	59,00							1,00	59,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**59,00**


Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	SISTEMA ELECTRICO REGULADO		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalación de tubo PVC de 1/2" incrustado para alimentador en cable 3* # 12 AWG. Incluye regata, resane y acabado con pintura tipo 1		**UND**	m



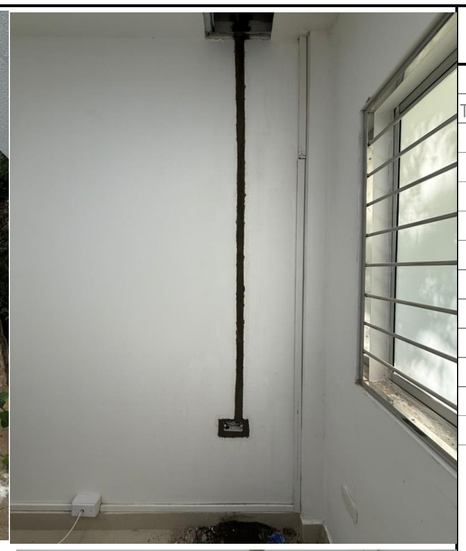





DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 8.13									
TUBO PVC DE 1/2"	60,00							1,00	60,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**60,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	SISTEMA ELECTRICO REGULADO		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalación de puente para equipotencialización a la puesta a tierra en cable calibre # 8 AWG en el tablero principal		**UND**	UND





DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 8.15									
PUENTE PARA EQUIPOTENCIALIZACIÓN						1,00		1,00	1,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**1,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria
