AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
09/09/2024

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-04
No. CARPETA:	14
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024** REHABILITACION DE 10,72 KM DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y LA CONSTRUCCION DE CINCO PUENTES EN LA VEREDA SANTA HELENA LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA META. **CONTRATO 588 24 PY 266-25 MENSUAL 3 C2-2 C14**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
70.	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA -REGISTRO FOTOGRAFICO DETALLADO	2179-2208
71.	CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y RADICADA	2209-2267
74.	ACTA DE COMITÉ	2268-2282
75.	LABORATORIOS	2283-2295
76.	INFORME AMBIENTAL	2296-2310
77.	INFORME SST – INTERVENTORIA – INFORME PMT INTERVENTORIA	2311-2340
78.	ACTA ENSAYOS DE LABORATORIO	2341-2351
79.	CONTROL DE SEGURIDADINDUSTRIAL	2352-2355
80.	ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL	2356-2359
81.	ACTA CONTROL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	2360-2374
82.	BITACORA MES DE OCTUBRE 2025	2375-2415
83.	INFORMES QUINCENALES INTERVENTORIA	2416-2423

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	588 24 PY 266-25 MENSUAL 3 C2-2 C14

Firma		Firma	
Nombre:	EDUARDO MARTINEZ TARACHE	Nombre:	ING. JUAN CAMILO POSADA VARELA
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR INTERVENTORIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

112-ECP-FR-017-V06 INFORME MENSUAL INTERVENTORIA - OBRA

URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 5C
VILLAVICENCIO-META
consorciointervialcubarral@gmail.com

2179.

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

INFORME: MENSUAL DE INTERVENTORÍA
Periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025
Fecha de Presentación: 20/11/2025

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO 558 DE 2024	
OBJETO CONTRATO:	REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.
VALOR DEL CONTRATO:	$8.801.405.003,00
VALOR ACTUALIZADO:	$8.801.405.003,00
OBJETO PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META.
VALOR DEL PROYECTO:	$4.995.820.538,00
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y PUENTES NIT: 901.901.935-6
CORREO ELECTRÓNICO:	cviasypuentes@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	04/08/2025
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
TIEMPO:	12 MESES
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	03/08/2026
12 meses	Días

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	04/08/2025
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

21/80

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	03/02/2026
6 meses	Dias

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	169 DE 2025
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024 NIT: 901.930.634-8
OBJETO CONTRATO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META
CORREO ELECTRONICO:	consorciointervialcubarral@gmail.com


CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR	JHON JAIRO IBARRA CAICEDO
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	560 DE 2024 561 DE 2024
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	ALEX FERNANDO MORA CASTRO WILMAN ARNALDO FUENTES BOHORQUEZ

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	CUBARRAL - META	**VEREDA:**	N/A
CORREGIMIENTO:	N/A	**BARRIO:**	VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META
COMUNA:	N/A		
COORDENADAS:	3.7919° N, –73.8413° O A 60 km de Villavicencio Meta		

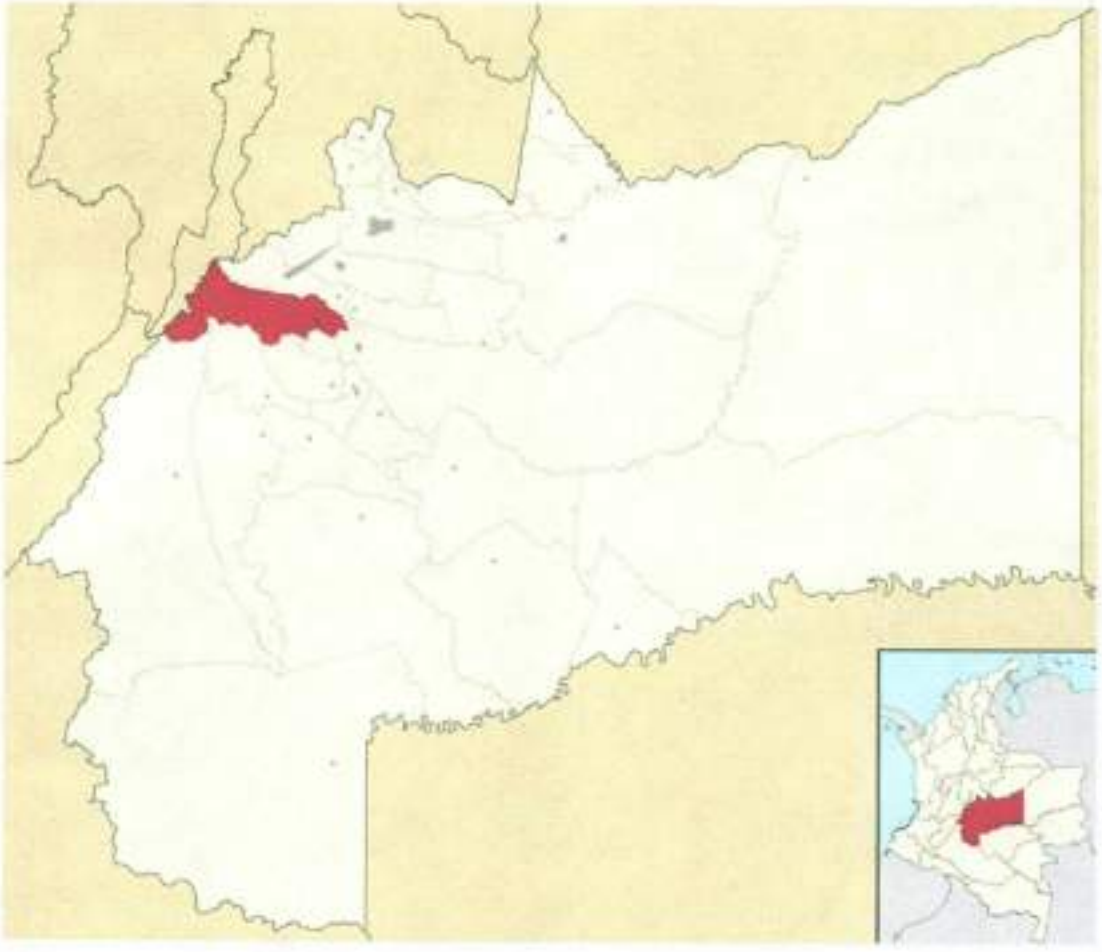

2182

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO DE OBRA

Avance fisico

AVANCE FISICO				
ITEM	ACTIVIDADES	AVANCE MENSUAL PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025		
		CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
15.1	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	210,13 M3	$ 26.896.640,00	7,04 %
15.3	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2	8.683,60 M2	$ 36.471.120,00	14,61 %
15.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	651,27 M3	$ 846.651.000,00	21,81 %
15.5	SELLO DE ARENA-ASFALTO CON EMULSIÓN CRR-2	6.355,05 M2	$ 66.728.025,00	100 %
	PRESUPUESTO PAGA		$ 2.500.095,00	19,83%
	PRESUPUESTO PMT		$ 11.275.551,00	19,83%
		VALOR TOTAL	**$ 990.522.431,00**	**19.83%**

PERIODO	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
PERIODO 1 (AGOST-25)	11.03 %	$ 551.130.974	11.03%	$ 551.130.974	39.36 %	$1.966.325.868	39.36%	$1.966.325.868
PERIODO 2 (SEPT-25)	13.96 %	$ 698.220.623	25.01%	$ 1.249.351.597	28.76 %	$1.436.732.387	68.12%	$3.403.058.255
PERIODO 3 (OCT -25)	14.85 %	$ 741.772.233	39.86%	$ 1.991.123.830	19.83 %	$ 990.522.431	87.95%	$ 4.393.824.163
PERIODO 4 (NOVI-25)	16.90 %	$ 844.623.894	56.76%	$ 2.835.747.723				
PERIODO 5 (DICIEM-25)	24.65 %	$ 1.231.415.970	81.41%	$ 4.067.163.694				
PERIODO 6 (ENERO -25)	18.00 %	$ 899.385.128	99.41%	$ 4.966.548.821				
PERIODO 7 (FEBRERO-26)	0.59%	$ 29.271.716	100%	$ 4.995.820.538				

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

Grafica Avance Físico



2. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos elaborados por la interventoría sobre el desarrollo de la obra, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

Correspondencia enviada.

FECHA	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
7/10/2025	INTERVIAL-169-052.	Intervial-169-052. Remisión de informes quincenales con corte al 30 de septiembre de 2025 y anexo corrección informe puentes – granada, meta con corte al 15 de sep. 2025.	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024	Jhon Caicedo Supervisor AIM
20/10/2025	INTERVIAL-169-053.	Observaciones revisión informe No. 1 periodo del 04 al **31 de agosto de 2025.**	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024	CONSORCIO VIAS Y PUENTES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2180

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

20/10/2025	INTERVIAL-169-054.	Observaciones revisión informe No. 1 periodo del 04 al 31 de agosto de 2025.	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024	CONSORCIO VIAS Y PUENTES
24/10/2025	INTERVIAL-2025-055	Remisión de informes quincenales con corte al 15 de octubre de 2025	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024	Jhon Caicedo Supervisor AIM
24/10/2025	INTERVIAL-2025-056	INTERVIAL-169-056. Respuesta a oficios Nos. 110-07-01-437-2025, 110-07-01-467-2025, 110-07-01-489-2025 y 110-07-01-523-2025. Presentación de informes mensuales correspondientes al período de agosto de 2025.	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024	Jhon Caicedo Supervisor AIM
24/10/2025	INTERVIAL-2025-057	INTERVIAL-169-057. REMISIÓN PLANOS FINALES GRANADA	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024	Jhon Caicedo Supervisor AIM
27/10/2025	NTERVIAL-169-058	Observaciones revisión informe No. 2 periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025.	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024	CONSORCIO VIAS Y PUENTES
27/10/2025	INTERVIAL-169-059	Observaciones revisión informe No. 2 periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025.	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024	CONSORCIO VIAS Y PUENTES
29/10/2025	INTERVIAL-169-060	**INTERVIAL-169-060. NOTIFICACIÓN – INCUMPLIMEINTO, SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL AGOSTO DE 2025**	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024	CONSORCIO VIAS Y PUENTES
31/10/2025	INTERVIAL-169-061	**INTERVIAL-169-061. OBSERVACIONES ACTA PARCIAL NO.1 CUBARRAL.**	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024	CONSORCIO VIAS Y PUENTES

Correspondencia recibida.

FECHA	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
1/10/2025	CVYP-003-2025	Entrega Documentos - Pago acta parcial No 01 según lista de chequeo (Formato 112-ECP-FR-173-V0S).	CONSORCIO VIAS Y PUENTES	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024
3/10/2025	CVYP-003-2025	Observaciones Mesa de Trabajó Virtual sobre Orden de Operación No 01 por concepto de primer desembolso del contrato fiduciario 126673.	CONSORCIO VIAS Y PUENTES	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024
15/10/2025	CVYP-005-2025	Entrega documentos - Informe Mensual Mes Septiembre 2025 (formato 112-ECP-FR-169 V4)	CONSORCIO VIAS Y PUENTES	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2185

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

24/10/2025	CVYP-008-2025	Entrega Documentos - Pago acta parcial No 01 según lista de chequeo. (Formato 112-ECP-FR-173-V0S).	CONSORCIO VIAS Y PUENTES	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024
29/10/2025	CVYP-009-2025	Respuesta oficio INTERVIAL-169-053 "Observaciones revisión informe No . 1 periodo del 04 al 31 de agosto de 2025"	CONSORCIO VIAS Y PUENTES	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024
07/10/2025	110-07-01-489-2025	Reiteración de solicitud de radicación de informe de interventoría y seguimiento al contrato de obra mediante oficio 110-467-2025-proyecto BPIN 2024005500266.	AIM	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024
23/10/2025	110-07-01-523-2025	Inicio de solicitud de presunto incumplimiento del contrato de interventoría 169 de 2025- Reiteración de solicitud de radicación de informe de interventoría y seguimiento al contrato de obra -oficio 110-07-01-489-2025-proyecto BPIN 2024005500266.	AIM	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

COMITÉS		
FECHA	**ASUNTO**	**ASISTENTES**
16 OCTUBRE DE 2025	COMITÉ DE SEGUIMIENTO APOYO A LA SUPERVISIÓN	APOYOS A LA SUPERVISIÓN / AIM
		CONTRATISTA DE OBRA / CONSORCIO VIAS Y PUENTES
		CONTRATISTA DE INTERVENTORIA / CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024
28 OCTUBRE DE 2025	COMITÉ DE SEGUIMIENTO CTO OBRA E INTERVENTORIA	SUPERSIVOR DEL CONTRATO / AIM
		APOYOS A LA SUPERVISIÓN / AIM
		CONTRATISTA DE OBRA / CONSORCIO VIAS Y PUENTES
		CONTRATISTA DE INTERVENTORIA / CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

3. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

Durante este periodo no se identificaron incidencias ni dificultades que impacten el desarrollo del proyecto.

4. GESTIÓN TECNICA DE LA INTERVENTORIA

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
	El director de interventoría supervisa el cumplimiento general del proyecto, asegurando que todas las actividades

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

286

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ejecutadas por el contratista se realicen conforme a los términos contractuales. Realiza el seguimiento de las actividades programadas versus la ejecución en obra, así mismo informa el avance de obra a la entidad contratante. Es el encargado de la gestión documental entre las partes con relación al Contratista de obra y la entidad contratante.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	El residente de interventoría se encarga de llevar el registro diario de obra, bitácora, cantidades ejecutadas, registro del clima, entre otros aspectos relevantes del proyecto en el día a día. Se encarga de revisar el cronograma de ejecución diario del contratista de obra, velando por el cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada una de las actividades ejecutadas. El residente de interventoría se encarga de realizar el informe quincenal y mensual de obra, de acuerdo a las directrices de la entidad contractual.
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	El profesional SST inicio el seguimiento de toda la gestión documental del personal en obra, verificando el cumplimiento en todo lo relacionado con exámenes médicos ocupacionales, hojas de vida de personal, afiliación a la seguridad social, entregas de EPP¨S y dotación, dándole cumplimiento al sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, (SG-SST) al decreto 1072 del 2025.
TOPOGRAFO ISNPECTOR	Durante las actividades en campo se contó con el acompañamiento del topógrafo, quien adelanto el seguimiento necesario para el control de las cantidades ejecutadas.
CADENERO	El cadenero se encargó de realizar el apoyo al topógrafo en la toma de los puntos de referencia.
CONDUCTOR	Durante las actividades en campo se contó con el acompañamiento del conductor, quien brindó apoyo logístico en el desplazamiento del personal y en las labores de coordinación requeridas para el desarrollo de las actividades programadas.
SECRETARIA	Durante el desarrollo de las actividades se contó con el acompañamiento de la secretaria, brindando apoyo en la

22187

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

	gestión administrativa y organización de la información relacionada con el proyecto.

5. ESTADO DEL TIEMPO

Frecuencia.

ESTADO	N° DE DIAS
NUBLADO	1
TORMENTA	0
LLUVIOSO	4
SOLEADO	26

OBSERVACIONES: Durante el mes de octubre se presentaron condiciones climáticas favorables, con precipitaciones mínimas que no generaron afectaciones en la ejecución ni en el cronograma de las actividades programadas.

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. NORMAS TÉCNICAS CITADAS EN EL PROCESO

NORMA	APLICACIÓN	RESULTADO
INVIAS - 2022, ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. INVIAS – 2022, NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS	Capitulo 3, 4, 7 y 9.	SEGUIMIENTO EN OBRA
ESPECIFICACIONES TECNICAS - AIM	11010102 11040102 11040104 11040107 11040117 11060203 11060207	SEGUIMIENTO EN OBRA
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 1076 DEL 2015.	Artículo 2.2.1.1.1.1 prevención de la contaminación.	SEGUIMIENTO EN OBRA
DECRETO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1072 DEL 2015.	Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.1	SEGUIMIENTO EN OBRA

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2188

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

De acuerdo con las actividades ejecutadas durante el presente periodo, se evidencia el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la correcta aplicación de los procedimientos establecidos en el proceso constructivo. No obstante, la Interventoría verificará la toma, el registro y los resultados de los ensayos realizados a los materiales empleados en obra, con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad. Dichos registros son de conocimiento de la Interventoría de acuerdo a la revisión periódica en los informes mensuales.

Adicionalmente, esta Interventoría procederá a realizar tomas de muestras aleatorias en colaboración con el laboratorio **NHSQ INGENIERIA S.A.S**, con el propósito de corroborar la calidad de los trabajos ejecutados y proceder a su recepción a satisfacción, según los criterios técnicos establecidos en la norma Invias para mezcla Asfáltica MDC-19. (se anexan resultados de laboratorio).

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS.

El contratista realiza la actividad de acuerdo al sistema de coordenadas magna sirgas / Colombia Bogotá CTM 12, el cual corresponde al sistema empleado en el levantamiento topográfico de los diseños y/o documentos técnicos del proyecto.

FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO.

Se realiza la actividad sobre el área limpia y en un espesor máximo de 5cm de acuerdo a los documentos técnicos del proyecto. El material extraído como resultado del fresado se transporta y se acopia en los sitios autorizados por la administración municipal.

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2

De acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y de la norma Invias 2012, se verifica el cumplimento de la actividad, evidenciando la limpieza de la superficie mediante el barrido con barredora mecánica, seguido del soplete con aire comprimido y observando que la superficie está totalmente seca.

Finalmente, el CONTRATISTA realiza la imprimación de manera uniforme tanto longitudinal como transversal con carrotanque irrigador.

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN

El contratista suministra, conforme a las jornadas programadas, el transporte de la mezcla asfáltica en doble troques desde la planta Gravicon, ubicada en la vereda El Rosario del

2189

municipio de Acacías – Meta, realizando un recorrido aproximado de 35 km hasta el sitio del proyecto.

La extensión de la mezcla se ejecuta de manera uniforme, siguiendo el procedimiento establecido, mediante el uso de un vibrocompactador de cilindro con peso superior a 5 toneladas para la compactación inicial, y posteriormente se realiza el sellado con vibrocompactador neumático.

SELLO DE ARENA-ASFALTO CON EMULSIÓN CRR-2

Se ejecuta la actividad correspondiente al sello de arena-asfalto, utilizando emulsión asfáltica, aplicada de manera uniforme sobre la superficie previamente limpia y libre de material suelto. Posteriormente, se realiza la distribución de arena limpia y seca, asegurando una cobertura homogénea y adecuada adherencia de los materiales. El proceso garantiza la impermeabilización de la capa asfáltica, mejora la resistencia al deslizamiento y contribuye a la protección y durabilidad del pavimento.

4. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	NORMA
Riego de liga	Articulo 421-22
Mezclas Asfálticas en caliente Granulometría Estabilidad mínima Compactación Flujo Relación estabilidad / flujo Vacios con aire Vacios llenos de asfalto	Articulo 450-22
Fresado de pavimento Asfaltico	Articulo 460-22

NOTA: De acuerdo con la revisión de los ensayos de laboratorio presentados por el Contratista CONSORCIO VÍAS Y PUENTES, se efectuó la verificación del control de calidad de la mezcla asfáltica tipo MDC-19, correspondiente a las cinco (5) jornadas de producción y colocación comprendidas entre el 01 y el 30 de octubre de 2025.

Los resultados y registros se encuentran anexos en el informe mensual de obra y se analizaron en función de los criterios de aceptación establecidos en las Especificaciones INVIAS 2013, artículo 450-13, y la fórmula de trabajo del diseño Marshall aprobada para el proyecto.

Los resultados de los ensayos de control de calidad correspondientes al periodo evaluado indican que la mezcla asfáltica tipo MDC-19 cumple en general con los criterios de aceptación establecidos en las Especificaciones INVIAS 2013 y en la fórmula de trabajo aprobada para el proyecto.

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

5. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SGSST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
03/10/2025	Cambiando los malos hábitos	Se observa una actitud favorable por parte del personal, demostrando disposición y apertura para participar y atender la charla.
10/10/2025	El significado de la seguridad	La seguridad consiste en anticipar riesgos, implementar medidas preventivas y actuar de manera responsable para proteger a las personas, los bienes y el entorno.
14/10/2025	Prevención de accidentes para los controladores de tráfico	Se observa que la prevención de accidentes en los controladores de tráfico depende de la aplicación constante de procedimientos seguros, la vigilancia permanente del entorno y el cumplimiento riguroso de las normas operativas para minimizar riesgos durante sus funciones.
15/10/2025	Prevención al trabajar alrededor de vehículos	Para prevenir incidentes al trabajar alrededor de vehículos, es necesario identificar las zonas de riesgo, establecer rutas seguras de desplazamiento, mantener contacto visual con los operadores y aplicar de manera estricta los procedimientos de señalización y comunicación antes de aproximarse o realizar cualquier maniobra.
17/10/2025	Prevención de caídas a nivel	Identificar y corregir irregularidades visibles en áreas de riesgo y caminar con atención, adoptando una postura segura durante los desplazamientos.

NOTA: Se verifica el soporte de las actividades STT realizadas en obra.

6. GESTIÓN SOCIAL

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	20
Empleos directos generados:	6
Empleos indirectos generados:	14

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2191

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

Actores por ámbito contextual – Local

Teniendo en cuenta factores como el demográfico, de bienestar, de vivienda, educación y salud, los cuales ayudarán a determinar las características propias de la población.

EMPLEO	CANTIDAD
Población Urbana y/o Rural	6
Agrícola	0
Ganadero	0
Escolar	0
Comercial	0
Hoteles	0

7. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Manejo integral de residuos sólidos	100%	Se utiliza un punto ecológico/centro de acopio para el almacenamiento temporal. Los residuos se recogen en bolsas según el código de colores.
Manejo Integral de Materiales de Construcción	100%	Material proveniente de plantas con licencia; cargue y descargue controlado para evitar arrastre fuera de los límites; cumple con medidas del PAGA
Explotación fuentes de Materiales	100%	Se utilizan materiales de fuentes autorizadas y certificadas por AIM; control en transporte y uso conforme a los lineamientos ambientales.
Manejo Integral de Aguas y Residuos Líquidos	100%	Unidades sanitarias portátiles con mantenimiento y recolección periódica por proveedor autorizado; agua para consumo humano cumple normativa.
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio temporal	100%	Campamento con punto ecológico y sistema de clasificación por código de colores; inspección ambiental periódica de las instalaciones hidrosanitarias.
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	100%	El Consorcio cuenta con medidas ambientales y de seguridad para la movilización de maquinaria, incluyendo señalización preventiva. Es importante la verificación de que las volquetas tengan su certificado de emisión de gases, control de ruido, señales luminosas,
Plan de Gestión Social	100%	El proyecto cuenta con canales de comunicación para atender a la comunidad

2492

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

		(teléfono, correo electrónico, e ingeniero residente). Se realizó una socialización del contrato de obra con la comunidad. Se realizó convocatoria de oferta laboral por medio de COFREM para contratar mano de obra loca

Anexo: Formato 112-ECP-FR-020-ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Nota: se evidencia en la obra la disposición de los residuos sólidos, la disponibilidad de las unidades sanitarias y la capacitación al personal.

C. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO DE OBRA

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS:

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la **CLAUSULA 18** en la cual establece las garantías exigidas y sus respectivas características:

- CUMPLIMIENTOS GENERAL: 10% del Valor del Contrato
- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES: 5% del Valor Contrato

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2193

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

- BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: 100% del Anticipo
- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: 10% del Valor del Contrato
- RCE: 500 SMMLV

SEGÚN FIRMA CONTRATO: De conformidad con lo establecido en la **CLAUSULA 18** GARANTIAS se destacan los siguientes aspectos:

- NUMERAL 18.1 GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO *Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (15) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad.*

- NUMERAL 18.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un periodo de Garantía de 5 años contados a partir de la fecha del recibo definitivo de las obras.

- NUMERAL 18.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL *EXTRACONTRACTUAL En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope* máximo *del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

A continuación, se relaciona las pólizas 82196, suscritas y debidamente aprobadas según la minuta del contrato, mediante la cual se ampara el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones propias y directas del contrato 558 de 2024

POLIZAS PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	85196
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	24706
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	14/02/2025
COMPAÑIA DE SEGUROS	BERKLEY

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2024	30/04/2026	$ 880,140,500.30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	30/12/2024	30/04/2026	$ 2,640,421,500.90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	30/12/2024	31/12/2028	$ 440,070,250.15
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/12/2025	30/12/2030	$ 880,140,500.30
AMPAROS BÁSICOS	30/12/2024	30/12/2025	$ 650,000,000.00

POLIZAS DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2190

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	85196
ANEXO N°	1
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	24706
ANEXO N°	1
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	26/08/2025
COMPAÑÍA DE SEGUROS	BERKLEY

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/08/2025	04/12/2026	$ 880,140,500.30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	04/08/2025	04/12/2026	$ 2,640,421,500.90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	04/08/2025	04/08/2029	$ 440,070,250.15
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	04/08/2025	03/08/2031	$ 880,140,500.30
AMPAROS BÁSICOS	04/08/2025	04/08/2026	$ 711,750,000.00

D. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
1	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTALES			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 01 / OCTUBRE / 2025 AL 31 / OCTUBRE / 2025

Avance fisico ejecutado **87.95%** y avance financiero ejecutado **0.00%**

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2195

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

E. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CARPETA ASFALTICA	EJECUTADO	%
15.1	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO.	210,13 M3	7,04%







OBSERVACIONES: se ejecuto la actividad de fresar la carpeta existente en un ancho de calzada de 6.80m con un espesor máximo de 0.05m hasta la abscisa K4+300.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2196

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CARPETA ASFALTICA	EJECUTADO	%
15.3	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2	8683,60 M2	14,61%









OBSERVACIONES: La actividad se ejecuta una vez la superficie se encuentra completamente limpia; para ello, el contratista emplea aire comprimido con el fin de eliminar polvo y material suelto. Posteriormente, se realiza el riego de la emulsión asfáltica por aspersión, aplicándola de manera uniforme tanto en el sentido transversal como longitudinal del carril intervenido.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2197

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CARPETA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
15.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	651,27 M3	21,81%









OBSERVACIONES: Durante la ejecución se efectuó la instalación de la mezcla asfáltica tipo **MDC-19**, interviniendo un carril por día para mantener la movilidad vehicular de forma alterna. El laboratorio de apoyo a la Interventoría realizó la toma de muestras correspondientes para el control y verificación de la calidad del material utilizado.

2198

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	PRELIMINARES	**EJECUTADO**	**%**
15.5	SELLO DE ARENA-ASFALTO CON EMULSIÓN CRR-2	6355,05 M2	100%



OBSERVACIONES: se realizó la actividad entre las abscisas k6+881 al k5+581 con una longitud de 1300 metros lineales, de acuerdo a los lineamientos técnicos del proyecto.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2199

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	IMPLEMENTACION DEL PAGA	EJECUTADO	%
	UNIDADES SANITARIAS	2	N/A
N/A			
	OBSERVACIONES: se observan dos unidades sanitarias.		

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2200

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	IMPLEMENTACION DEL PMT	EJECUTADO	%
	SEÑALIZACIÓN	N/A	N/A
N/A			
	 		
	OBSERVACIONES: se realiza constantemente la movilización del PMT de acuerdo a las actividades diarias en el proyecto.		

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2201

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

F. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

La Interventoria ha verificado y certificado el avance de obra acumulado correspondiente al informe mensual N.°03, con corte al 31 de octubre de 2025. Durante este periodo se registra la rehabilitación de 5,12 km de la vía que conduce desde Cubarral hasta el cruce con la vía nacional, iniciando en la estación de servicio Terpel (k10+720) y finalizando en el k4+300.

El trazado presenta un tramo discontinuo de 1.300 metros lineales, correspondiente al sello de arena-asfalto. En el periodo se obtuvo un avance ejecutado del **19,83%,** alcanzando un avance acumulado del **87,95%** del proyecto, frente a un avance programado del **39.86%**.

Esta interventoria certifica el avance de obra del proyecto con **BPIN No. 2024005500266**:

REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META.

CONTRATO No.	PROYECTO No.	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	% PROGRAMADO
558 DE 2024	2024005500266	$4.995.820.538	$ 4.393.824.163	87,95%	39.86%

G. ANEXOS

El informe contiene los siguientes soportes documentales:

- Registro fotográfico detallado.
- Correspondencia generada entre el contratista – Interventor – supervisor – entidad contratante.
- Comités de obra.
- Concepto de gestión de Interventoria - laboratorios.
- Informe ejecutivo de Interventoria Ambiental.
- Informe ejecutivo de Interventoria SST.
- Informe ejecutivo de Interventoria PMT.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los **20** dias del mes **noviembre** del **2025**.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22202

INFORME MENSUAL N° 03

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500266

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los **20** días del mes **noviembre** del **2025**.

Firma

JUAN CAMILO POSADA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° M. P.: 63202-294712 CND

Firma

GISELLE HERRERA ALVAREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° M. P.:25202-198320 CND

Firma V°B°

JHON JAIRO IBARRA CAICEDO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA N. 169 DE 2025
N° M. P.: 25202-395211CND

Firma V°B°

ALEX FERNANDO MORA CASTRO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° M. P.: 25202-285560 CND

Firma V°B°

WILMAN A. FUENTES BOHORQUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° M. P.: 25202-206431 CND

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2203

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DETALLADO

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 5C
VILLAVICENCIO-META
consorciointervialcubarral@gmail.com

2204





TOMA DE MUESTRA DE ASFALTO – LABORATORIO NHSQ





TOMA DE MUESTRA DE ASFALTO – LABORATORIO NHSQ

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024



ITEM 15.3 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2



ITEM 15.3 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2

URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 5C
VILLAVICENCIO-META
consorciointervialcubarral@gmail.com
Cel.: (+57) 300 3475090

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024



ITEM 15.4 COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MEZCLA MDC-19



ITEM 15.4 COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MEZCLA MDC-19

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024



ITEM 15.5 SELLO DE ARENA – ASFALTO CON EMULSION CRR-2



ITEM 15.5 SELLO DE ARENA – ASFALTO CON EMULSION CRR-2

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 5C
VILLAVICENCIO-META
consorciointervialcuberral@gmail.com

2209

CONSORCIO VIAS Y PUENTES

NIT 901.901.935 - 6

Villavicencio, 01 de Octubre de 2025

Correspondencia Enviada
Fecha: 01/10/2025
Radicado: CVYP-003-2025
Contrato: 558 Vías y Puentes.
Proyecto: Cubarral

Señores
CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024
Ing. Ros Aneth Angarita Gómez
Representante Legal
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública No 558 de 2024
Objeto: "REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META".

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META

Asunto: Entrega Documentos – Pago acta parcial No 01 según lista de chequeo (Formato 112-ECP-FR-173-V05).

Respetados Señores,

Por medio de la presente y actuando en calidad de Especialista de Proyectos del **CONSORCIO VIAS Y PUENTES** encargado de la ejecución del contrato 558 de 2024 cuyo objeto es: **"REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.**

Me permito remitir para su respectivo trámite los documentos requeridos en la lista de chequeo para el Pago acta parcial No 01 según lista de chequeo (Formato 112-ECP-FR-173 V05)., así:

1. Lista de Chequeo pago de Anticipo (Formato 112-ECP-FR-173-V05).

2. Se hará entrega de la facturas emitidas por la empresa ECOBRAS SA para realizar el giro del anticipo

Se anexan los siguientes documentos:

- Copia Contrato
- Facturas Emitidas por la Empresa ECOBRAS SA
- Certificación Bancaria del sub contratista
- Rut

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

ING. OSCAR FERNANDO VELEZ RIOS
ESPECIALISTA DE PROYECTO
CONSORCIO VIAS Y PUENTES

221

CONSORCIO VIAS Y PUENTES

NIT 901.901.935 - 6

Villavicencio, 03 de Octubre de 2025

Correspondencia Enviada
Fecha: 03/10/2025
Radicado: CVYP-003-2025
Contrato: 558 Vias y Puentes.
Proyecto: Cubarral

Señores
CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024
Ing. Ros Aneth Angarita Gómez
Representante Legal
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública No 558 de 2024
Objeto: "REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META".

Proyecto: **BPIN 2024005500266** MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META

Asunto: Observaciones Mesa de Trabajó Virtual sobre Orden de Operación No 01 por concepto de primer desembolso del contrato fiduciario 126673.

Respetados Señores,

Por medio de la presente y actuando en calidad de Especialista de Proyectos del **CONSORCIO VIAS Y PUENTES** encargado de la ejecución del contrato 558 de 2024 cuyo objeto es: **"REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.**

4-04-25. 12:14 Pm 3/10/25

Mediante la mesa de trabajo realizada el 1 de octubre de 2025 de forma virtual se acoge a las siguientes observaciones:

1. Modificar el tiempo de ejecución del contrato entre el CONSORCIO VIAS Y PUENTES y la empresa ECOBRAS SA

2. Plan de Cobros Obra (Formato 112-ECP-FR-009)
3. Acta pago de obra (Formato 112-ECP-FR-029)
4. Memoria de cálculo obra (Formato 112-ECP-FR-027)
5. Informe de obra (Formato 112-ECP-FR-013)
6. Bitácora de obra (Formato 112-ECP-FR-022)
7. Informe plan de inversión anticipo obra (Formato 112-ECP-FR-030)
8. Factura
9. Certificado cuenta bancaria
10. Copia de tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios de contadores de obra
11. Acta resumen de ensayos y pruebas de laboratorio obra (Formato 112-ECP-FR-018)
12. Acta relación personal obra (Formato 112-ECP-FR-008)
13. Acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscal obra (Formato 112-ECP-FR-021)
14. Certificado donde indique cual es el porcentaje (%) y el valor ejecutado del proyecto en cada municipio
15. Verificación en SIGA: Acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscal obra 112-ECP-FR-021.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

ING. OSCAR FERNANDO VELEZ RIOS
ESPECIALISTA DE PROYECTO
CONSORCIO VIAS Y PUENTES

CONSORCIO VIAS Y PUENTES

NIT 901.901.935 - 6

Villavicencio, 15 de octubre de 2025

Correspondencia Enviada
Fecha 15/10/2025
Radicado: CVYP-005-2025
Contrato: 558 Vias y Puentes.
Proyecto: Cubarral
BPIN 2024005500266

Señores
CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024
Ing. Ros Aneth Angarita Gómez
Representante legal

Referencia: Contrato de obra pública No 558 de 2024
Objeto: "REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META".

Proyecto: **BPIN 2024005500266** MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META

Asunto: Entrega documentos – Informe Mensual Mes Septiembre 2025 (formato 112-ECP-FR-169 V4)

Cordial saludo,

Por medio de la presente y actuando en calidad de Especialista de Proyectos del **CONSORCIO VIAS Y PUENTES** encargado de la ejecución del contrato 558 de 2024, proyecto **BPIN 2024005500266** cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META".**

Me permito remitir para su respectivo trámite los documentos requeridos en la lista de chequeo para informes mensuales, conforme al formato 112-ECP-FR-169, así:

1. Lista de chequeo contrato de Obra Informes Mensuales (formato 112-ECP-FR-169)
2. Informe de Obra (formato 112-ECP-FR-169) con anexos.
3. Entrega de Dotación y/o Elementos de Protección Personal (formato 112-ECP-FR-015)
4. Implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
5. Informe Implementación Plan Manejo Ambiental (formato 112-ECP-FR-016)

2214

6. Acta Relación de Personal (formato 112-ECP-FR-008) con Anexos
7. Acta Resumen Ensayos de Laboratorios de Obra (formato 112-ECP-FR-018)
8. Acta Control y Seguimiento de Seguridad Social y Parafiscales (formato 112-ECP-FR-021) con anexos
9. Copia de la Bitácora de Obra mes de Septiembre de 2025

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

ING. OSCAR FERNANDO VELEZ RIOS
ESPECIALISTA DE PROYECTOS
CONSORCIO VIAS Y PUENTES

CONSORCIO VIAS Y PUENTES

NIT 901.901.935 - 6

Villavicencio, 24 de Octubre de 2025

Correspondencia Enviada
Fecha: 24/10/2025
Radicado: CVYP-008-2025
Contrato: 558 Vías y Puentes.
Proyecto: Cubarral
BPIN 2024005500266

Señores
CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024
Ing. Ros Aneth Angarita Gómez
Representante Legal
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública No 558 de 2024
Objeto: "REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META".

Proyecto: **BPIN 2024005500266** MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META

Asunto: Entrega Documentos – Pago acta parcial No 01 según lista de chequeo (Formato 112-ECP-FR-173-V05).

Respetados Señores,

Por medio de la presente y actuando en calidad de Especialista de Proyectos del **CONSORCIO VIAS Y PUENTES** encargado de la ejecución del contrato 558 de 2024, proyecto **BPIN 2024005500266** cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META".**

Me permito remitir para su respectivo trámite los documentos requeridos en la lista de chequeo para el Pago acta parcial No 01 según lista de chequeo (Formato 112-ECP-FR-173 V05)., así:

1. Lista de Chequeo pago de Anticipo (Formato 112-ECP-FR-173-V05).

2. Plan de Cobros Obra (Formato 112-ECP-FR-009)
3. Acta pago de obra (Formato 112-ECP-FR-029)
4. Memoria de cálculo obra (Formato 112-ECP-FR-027)
5. Informe de obra (Formato 112-ECP-FR-013)
6. Bitácora de obra (Formato 112-ECP-FR-022)
7. Informe plan de inversión anticipo obra (Formato 112-ECP-FR-030)
8. Factura
9. Certificado cuenta bancaria
10. Copia de tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios de contadores de obra
11. Acta resumen de ensayos y pruebas de laboratorio obra (Formato 112-ECP-FR-018)
12. Acta relación personal obra (Formato 112-ECP-FR-008)
13. Acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscal obra (Formato 112-ECP-FR-021)
14. Certificado donde indique cual es el porcentaje (%) y el valor ejecutado del proyecto en cada municipio
15. Verificación en SIGA: Acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscal obra 112-ECP-FR-021.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

ING. OSCAR FERNANDO VELEZ RIOS
ESPECIALISTA DE PROYECTO
CONSORCIO VIAS Y PUENTES

CONSORCIO VIAS Y PUENTES

NIT 901.901.935 - 6

Villavicencio, 29 de Octubre de 2025

Correspondencia Enviada
Fecha: 29/10/2025
Radicado: CVYP-009-2025
Contrato: 558 Vías y Puentes.
Proyecto: Cubarral
BPIN 2024005500266

Señores
CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024
Ing. Ros Aneth Angarita Gómez
Representante Legal
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública No 558 de 2024
Objeto: "REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META".

Proyecto: **BPIN 2024005500266** MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META

Asunto: Respuesta oficio INTERVIAL-169-053 "Observaciones revisión informe No. 1 periodo del 04 al 31 de agosto de 2025"

Recibido
30/10/2025
8:13 am

Respetados Señores,

Por medio de la presente y actuando en calidad de Especialista de Proyectos del **CONSORCIO VIAS Y PUENTES** encargado de la ejecución del contrato 558 de 2024, proyecto **BPIN 2024005500266** cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META".**

Me permito dar respuesta al oficio INTERVIAL-169-053 "Observaciones revisión informe No. 1 periodo del 04 al 31 de agosto de 2025", recibido el 20 de Octubre de 2025, para lo cual hacemos entrega del informe con las respectivas correcciones:

OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Observación 1
El encabezado del informe relaciona el número del contrato, se solicita corregir el año.

Respuesta
El CONSORCIO VIAS Y PUENTES acoge la observación y procede a corregir año relacionado en el encabezado

Observación 2
Las casillas que no sean diligenciadas, se recomiendan colocar no aplica

Respuesta
El CONSORCIO VIAS Y PUENTES acoge la observación y procede a realizar corrección

Observación 3
En el capítulo de control y avance, se debe relacionar el avance que reportó la Interventoría para el 30 de Agosto.

Respuesta
El CONSORCIO VIAS Y PUENTES acoge la observación y procede a realizar el ajuste conforme a la información de la interventoría en el avance de obra

Observación 4
En la relación de correspondencia enviada y recibida, se solicita al contratista relacionar solo la correspondencia del proyecto de Cubarral o correspondencia a fin con el contrato en general. Eliminar lo correspondiente al proyecto de Granada.

Respuesta
EL CONSORCIO VIAS Y PUENTES acoge la observación y procede a organizar la relación de correspondencia, dejando únicamente la correspondiente al proyecto de Cubarral y eliminando la del proyecto de Granada.

Observación 5
Se solicita al contratista relacionar los comités de obra de acuerdo al periodo que reportan.

Respuesta
EL CONSORCIO VIAS Y PUENTES acoge la observación y procede a relacionar los comités de obra correspondientes al periodo de reporte establecido.

Observación 6
En el informe se enuncia CARGUES AL SISTEMA SIGA, sin embargo, no complementan lo correspondiente a este.

Respuesta
EL CONSORCIO VIAS Y PUENTES acoge la observación y procederá a complementar la información adjuntando un pantallazo de los cargues al sistema SIGA a la fecha conforme a lo requerido.

Observación 7
Revisar los días de lluvia de acuerdo al registro de la bitácora, para el mes de agosto se registran 6 días y en el informe relacionan 5.

Respuesta
EL CONSORCIO VIAS Y PUENTES acoge la observación y procederá a verificar y corregir el registro de días de lluvia en concordancia con la bitácora oficial.

Observación 8
Como recomendación en el proceso constructivo de las actividades ejecutadas se indican labores que no tienen alcance en el contrato, se solicita revisar cuidadosamente estas descripciones.

Respuesta
EL CONSORCIO VIAS Y PUENTES acoge la observación y procederá a verificar las actividades descritas, ajustando el informe a las labores que se encuentran dentro del alcance contractual.

Observación 9
Se solicita complementar el cuadro relacionando los ensayos que aplican para la rodadura asfáltica e indicar la norma.

Respuesta
EL CONSORCIO VIAS Y PUENTES acoge la observación y procederá a incluir los ensayos correspondientes a la rodadura asfáltica junto con la norma aplicable en el cuadro respectivo.

Observación 10
Se evidencian firmas pendientes por parte de los profesionales de obra.

Respuesta
EL CONSORCIO VIAS Y PUENTES acoge la observación y procede a gestionar la recolección de las firmas faltantes por parte de los profesionales responsables.

Observación 11

En el informe de implementación del plan de manejo ambiental formato 112-ECP-FR-016, se solicita al contratista verificar el diligenciamiento de los programas ambientales en el caso de:

- **Manejo integral de residuos sólidos versus el soporte en el informe ambiental.**
- **Explotación de fuentes de materiales versus el soporte en el informe ambiental.**
- **Programa de higiene y salud ocupacional, si aplica.**

Respuesta

EL CONSORCIO VIAS Y PUENTES procede a revisar y complementar la información de los programas ambientales mencionados, garantizando su adecuado diligenciamiento y soporte documental.

Observación 12

Se solicita diligenciar las casillas del formato 112-ECP-FR-016 SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

Respuesta

EL CONSORCIO VIAS Y PUENTES acoge la observación y procede a completar las casillas faltantes del formato, incluyendo la información de los sitios de disposición final de sobrantes.

Observación13

Aclarar el anexo sobre el reporte de ensayo No. AMC-269089, correspondiente al componente ambiental.

Respuesta

EL CONSORCIO VIAS Y PUENTES se permite informar que el ensayo AMC-269089 es el resultado físico químicos del agua que consume el personal de obra durante la jornada laboral garantizando un agua potable.

OBSERVACIONES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA MEZCLA ASFALTICA

Observación 14

De acuerdo a las jornadas de trabajo, en el periodo de agosto, se solicita anexar los ensayos correspondientes de los dias 29 y 30, en los cuales hubo instalación de mezcla asfáltica.

Respuesta

EL CONSORCIO VIAS Y PUENTES procederá a anexar los ensayos de control de calidad

realizados los días 29 y 30 de agosto, correspondientes a la instalación de la mezcla asfáltica.

Observación 15
Se solicita anexar el certificado del cemento asfáltico.

Respuesta
EL CONSORCIO VIAS Y PUENTES procederá a anexar el certificado de conformidad del cemento asfáltico utilizado durante el periodo reportado.

Observación 16
Anexar el diseño de mezcla – Marshall.

Respuesta
EL CONSORCIO VIAS Y PUENTES acoge la observación y procede a anexar el diseño de mezcla tipo Marshall correspondiente a la mezcla asfáltica empleada en la ejecución de las actividades.

OBSERVACIONES TÉCNICAS – INFORMES SST

Observación 17
Se considera indispensable la presentación de informes mensuales de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) ante la Interventoría, con una estructura técnica estandarizada que permita documentar de manera detallada, clara y verificable las actividades ejecutadas en campo.

Respuesta
EL CONSORCIO VIAS Y PUENTES se acoge a la observación, pero deja la salvedad que el informe solicitado no fue requerido sino hasta la presente revisión del informe mensual por lo cual procederá a estructurar los informes mensuales de SST.

Es necesario se nos entregue la estructura con la que debe contar el informe estandarizado para una mayor claridad

Observación18
En los informes presentados para la AIM se evidencia la falta de la planilla de seguridad social del profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Sr. Martín Clavijo, quien figura en la tabla de personal profesional asignado a los frentes de obra de Cubarral.

Respuesta
EL CONSORCIO VIAS Y PUENTES acoge la observación y procede a anexar la planilla de

seguridad social del profesional en SST correspondiente al periodo evaluado, asegurando la trazabilidad y cumplimiento laboral.

Observación 19
Respecto al Plan de Manejo de Tráfico (PMT), se considera indispensable que el informe incluya una descripción detallada sobre su implementación y despliegue en campo, especificando la ubicación, características técnicas y condiciones de instalación de la señalización vial. Asimismo, se requiere el soporte documental correspondiente, mediante evidencias fotográficas, que permitan verificar la correcta instalación y funcionamiento del PMT en los distintos tramos de obra.

Respuesta
EL CONSORCIO VIAS Y PUENTES acoge la observación y procede a fortalecer el informe del PMT, incluyendo el registro fotográfico como se acordó en la reunión telefónica sobre el PMT.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

ING. OSCAR FERNANDO VELEZ RIOS
ESPECIALISTA DE PROYECTO
CONSORCIO VIAS Y PUENTES

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220647-5

Villavicencio, 07 de octubre de 2025

110-07-01-489-2025

Ingeniera
ROSANETH ANGARITA GOMEZ
Representante Legal - Consorcio Intervial Cubarral 2024
Diagonal 3 No. 883 – 02 torre 4 apartamento 11-02
Celular: 3003475090
Correo electrónico: consorciointervialcubarral@gmail.com
Ciudad

Asunto: Reiteración de solicitud de radicación de informe de interventoría y seguimiento al contrato de obra mediante oficio 110-07-01-467-2025 – Proyecto BPIN 2024005500266.

Referencia: Proyecto: Control mediante interventoría para el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la rehabilitación de 10,72 km de la vía secundaria que conduce de la vía nacional al casco urbano del municipio de Cubarral Meta.

Cordial saludo,

En atención al oficio No. **110-07-01-467-2025** de fecha 25 de septiembre de 2025, mediante el cual se reiteró la radicación del informe mensual de interventoría correspondiente al mes de agosto de 2025, me permito reiterar formalmente dicho requerimiento, toda vez que a la fecha no se ha recibido respuesta oficial ni se ha efectuado la radicación física ni digital del informe en las oficinas de la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM).

Es importante señalar que, a la fecha de la presente reiteración, han transcurrido veintiocho (28) días calendario desde el plazo establecido para la entrega de los informes correspondientes al Periodo No. 01, cuyo compromiso inicial de radicación estaba fijado para el 10 de septiembre de 2025.

Asimismo, restan tres (3) días para el vencimiento del plazo establecido para la entrega de los informes mensuales del Periodo No. 02, sin que hasta el momento se evidencie gestión alguna por parte de la interventoría orientada a requerir formalmente al contratista de obra la entrega oportuna de la información técnica, administrativa y financiera necesaria para la consolidación de los informes de seguimiento.

De conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoría y Supervisión AIM, numeral 13.2.3, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en la cláusula décima del Contrato de Interventoría No. 169 de 2025, la interventoría tiene la obligación de presentar los informes quincenales y mensuales de seguimiento al contrato de obra, dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, tanto en medio físico

debidamente foliado como en medio digital (PDF y editable), asegurando la trazabilidad, control y seguimiento técnico de la ejecución contractual.

La no entrega oportuna de los informes de interventoría constituye un incumplimiento parcial a las obligaciones contractuales relacionadas con la supervisión técnica, administrativa y financiera de la obra, generando retrasos en la evaluación de avances, en la validación de pagos y en la consolidación de la información institucional requerida por la AIM y los órganos de control.

Por lo anterior, se requiere dar cumplimiento inmediato a esta obligación, remitiendo y radicando el informe pendiente dentro de un plazo no superior a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el presente oficio.

En caso de persistir la omisión, esta Supervisión se verá en la necesidad de elevar informe al área jurídica de la AIM, para la valoración de las acciones contractuales pertinentes por presunto incumplimiento, conforme a las cláusulas sancionatorias y resolutorias establecidas en el contrato y en la normativa vigente.

Se solicita además que, en lo sucesivo, los informes quincenales y mensuales sean entregados dentro de los plazos establecidos, acompañados de los formatos institucionales debidamente diligenciados y firmados, a fin de garantizar el flujo normal del proceso de seguimiento y control contractual.

Agradeciendo su atención y esperando una respuesta inmediata,

Firma _____
Nombre: **JHON JAIRO IBARRA CAICEDO**
Supervisor del contrato de interventoría consorcio intervial Cubarral 2024
Correo: jhon.caicedo@aim-meta.gov.co
Teléfono: 3102924800

Elaboro:

Firma _____
Nombre: Alex Fernando Mora Castro
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CTO. No. 560 de 2024

Firma _____
Nombre: Wilman A. Fuentes Bohórquez
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CTO. No. 561 de 2024

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220642-5

Villavicencio, 23 de octubre de 2025

110-07-01-523-2025

Ingeniera
ROSANETH ANGARITA GOMEZ
Representante Legal - Consorcio Intervial Cubarral 2024
Diagonal 3 No. 883 – 02 torre 4 apartamento 11-02
Celular: 3003475090
Correo electrónico: consorciointervialcubarral@gmail.com
Ciudad

Asunto: Inicio de solicitud de presunto incumplimiento del contrato de interventoría 169 de 2025 - Reiteración de solicitud de radicación de informe de interventoría y seguimiento al contrato de obra – Oficio 110-07-01-489-2025 – Proyecto BPIN 2024005500266.

Referencia: Proyecto: Control mediante interventoría para el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la rehabilitación de 10,72 km de la vía secundaria que conduce de la vía nacional al casco urbano del municipio de Cubarral Meta.

Cordial saludo,

En seguimiento al oficio No. **110-07-01-489-2025** del 7 de octubre de 2025, mediante el cual esta Supervisión reiteró la solicitud de radicación del informe mensual de interventoría correspondiente al mes de agosto de 2025, me permito manifestar que a la fecha no se ha recibido respuesta oficial ni se evidencia la entrega física o digital del informe requerido, incumpliendo nuevamente con los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y en el contrato vigente.

Es importante señalar que han transcurrido cuarenta y tres (43) días calendario desde el vencimiento del plazo para la entrega del informe del Periodo No. 01, cuyo compromiso inicial de radicación estaba fijado para el 10 de septiembre de 2025. A la vez, el proyecto se aproxima al cumplimiento de tres (3) meses desde la suscripción del Acta de Inicio (04 de agosto de 2025), sin que la interventoría haya presentado los informes que permitan reflejar de manera formal el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico de la ejecución contractual.

Resulta preocupante que, pese a las reiteraciones efectuadas, no se haya recibido comunicación oficial ni gestión documentada por parte de la interventoría, situación que vulnera lo dispuesto en la cláusula décima del Contrato de Interventoría No. 169 de 2025 y en el numeral 13.2.3 del Manual de Interventoría y Supervisión AIM, los cuales obligan a la interventoría a mantener informada a la entidad contratante mediante la entrega oportuna y completa de los informes quincenales y mensuales.

Dicha omisión constituye un incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato, que impide el ejercicio de control y seguimiento institucional, y afecta directamente la trazabilidad del proyecto, el registro de avances en la plataforma SIGA y la validación de los informes técnicos y financieros requeridos por la entidad.

En virtud de lo anterior, y ante la ausencia de respuesta y entrega de los productos contractuales, esta Supervisión se ve en la obligación de dar inicio al trámite administrativo por presunto incumplimiento contractual, conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículo 83, el Manual de Interventoría y Supervisión AIM, y las cláusulas sancionatorias y resolutorias del contrato de interventoría No. 169 de 2025.

Finalmente, se solicita a la interventoría dar cumplimiento inmediato a la entrega de los informes pendientes y remitir comunicación formal que justifique la demora, a fin de evitar la adopción de medidas correctivas adicionales.

Agradeciendo su atención y esperando una respuesta inmediata,

Firma _____
Nombre: **JHON JAIRO IBARRA CAICEDO**
Supervisor del contrato de interventoría consorcio intervial Cubarral 2024
Correo: jhon.caicedo@aim-meta.gov.co
Teléfono: 3102924800

Elaboro:

Firma _____
Nombre: Alex Fernando Mora Castro
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CTO. No. 560 de 2024

Firma _____
Nombre: Wilman A. Fuentes Bohórquez
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CTO. No. 561 de 2024

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

CORRESPONDENCIA RADICADA

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 5C
VILLAVICENCIO-META
consorciointervialcubarral@gmail.com

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

Villavicencio, 7 de octubre de 2025

Señores:

INTERVIAL-2025-052

JHON CAICEDO
Supervisor
Jhon.caicedo@aim-meta.gov.co

Ciudad.

Referencia: CONTRATO 169 DE 2025 - CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.

Asunto: INTERVIAL-169-052. REMISIÓN DE INFORMES QUINCENALES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y ANEXO CORRECIÓN INFORME PUENTES – GRANADA, META CON CORTE AL 15 DE SEP 2025.

Cordial saludo,

En el marco del contrato de obra cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META", y en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, nos permitimos remitir los informes quincenales elaborados con corte al 30 de septiembre de 2025 , discriminados de la siguiente manera:

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 5C
VILLAVICENCIO-META
consorciointervialcubarral@gmail.com
Cel.: (+57) 300 3475090

- Proyecto Vía – Cubarral, Meta (BPIN 2024005500266): Informe N.° 4, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 y el 30 de septiembre de 2025.
- Proyecto Construcción de Puentes – Granada, Meta (BPIN 2024005500267): Informe N.° 4, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 y el 30 de septiembre de 2025.

Adicionalmente, se anexa el informe quincenal con corte al 15 de septiembre de 2025, correspondiente al Proyecto Construcción de Puentes – Granada, Meta (BPIN 2024005500267), el cual reemplaza el previamente remitido a la entidad debido a un error de digitación que produjo algunas variaciones en los valores financieros. Este ajuste fue efectuado con el propósito de corregir las inconsistencias derivadas de un error humano, garantizando la precisión y veracidad de la información reportada.

Sin otro particular, quedamos atentos a las observaciones o requerimientos adicionales que se consideran pertinentes.

Cordialmente,

ROSANETH ANGARITA GOMEZ
C.C. No. 1.018.497.426 de Bogotá
R/L CONSORCIO

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

Villavicencio, 20 de octubre de 2025

Señores:

INTERVIAL-2025-053

CONSORCIO VIAS Y PUENTES
Contratista de Obra
admoncviasypuentes2025@gmail.com

Ciudad.

Referencia: CONTRATO 169 DE 2025 - CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.

Asunto: INTERVIAL-169-053. Observaciones revisión informe No. 1 periodo del 04 al 31 de agosto de 2025.

Cordial saludo,

En el marco del PROYECTO **BPIN 2024005500266** cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META", y en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, nos permitimos remitir las observaciones correspondientes al Informe Mensual No. 1, del mes de agosto de 2025.

Las observaciones se presentan de conformidad con la revisión técnica, administrativa y documental efectuada sobre el informe radicado por el contratista de obra, bajo el comunicado CVYP-001-2025, con el fin de garantizar la trazabilidad y cumplimiento de los compromisos establecidos en el contrato.

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL

- El encabezado del informe relaciona el numero del contrato, se solicita corregir el año.
- Las casillas que no sean diligenciadas, se recomienda colocar no aplica
- En el capitulo de control y avance, se debe relacionar el avance que reportó la Interventoría para el 30 de Agosto.
- En la relación de correspondencia enviada y recibida, se solicita al contratista relacionar solo la correspondencia del proyecto de Cubarral o correspondencia a fin con el contrato en general. Eliminar lo correspondiente al proyecto de Granada.
- Se solicita al contratista relacionar los comités de obra de acuerdo al periodo que reportan.
- En el informe se enuncia CARGUES AL SISTEMA SIGA, sin embargo, no complementan lo correspondiente a este.
- Revisar los días de lluvia de acuerdo al registro de la bitácora, para el mes de agosto se registran 6 días y en el informe relacionan 5.
- En relación al espesor del fresado se indica un espesor aprobado por la Interventoría, sin embargo, en campo se han evidenciado algunos tramos que técnicamente no se pudieron fresar en ese espesor, debido a la falta de espesor de carpeta por el mismo deterioro de la misma.
- Como recomendación en el proceso constructivo de las actividades ejecutadas se indican labores que no tienen alcance en el contrato, se solicita revisar cuidadosamente estas descripciones.
- Se solicita complementar el cuadro relacionando los ensayos que aplican para la rodadura asfáltica e indicar la norma.
- Se evidencian firmas pendientes por parte de los profesionales de obra.
- En el informe de implementación del plan de manejo ambiental formato 112-ECP-FR-016, se solicita al contratista verificar el diligenciamiento de los programas ambientales en el caso de:
  - Manejo integral de residuos sólidos versus el soporte en el informe ambiental.
  - Explotación de fuentes de materiales versus el soporte en el informe ambiental.
  - Programa de higiene y salud ocupacional. SI APLICA
- Se solicita diligenciar las casillas del formato 112-ECP-FR-016 SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES
- Aclarar el anexo sobre el reporte de ensayo No. AMC-269089, correspondiente al componente ambiental.

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

2232

OBSERVACIONES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA MEZCLA ASFALTICA

- De acuerdo a las jornadas de trabajo, en el periodo de agosto, se solicita anexar los ensayos correspondientes de los dias 29 y 30, en los cuales hubo instalación de mezcla asfáltica.
- Se solicita anexar el certificado del cemento asfaltico.
- De acuerdo al avance del periodo y de la calidad del producto terminado, se solicitan los ensayos correspondientes; compactación, espesor, planicidad, etc.
- Anexar el diseño de mezcla - Marshall

OBSERVACIONES TÉCNICAS – INFORMES SST

Se considera indispensable la presentación de informes mensuales de Seguridad y Salud en el Trabajo **(SST)** ante la Interventoria, con una estructura técnica estandarizada, que permita documentar de manera detallada, clara y verificable las actividades ejecutadas en campo.

Estos informes deben estar alineados con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo **(SG-SST)**, así como con el alcance y requerimientos contractuales del proyecto, garantizando el seguimiento efectivo de las condiciones de seguridad, el cumplimiento normativo y la trazabilidad de la gestión preventiva durante la ejecución de la obra.

Se hace especial énfasis en que todas las actividades deben estar debidamente documentadas y soportadas con evidencias verificables (fotográficas, registros, formatos diligenciados, entre otros), conforme a la normatividad vigente en materia de SST y a los compromisos contractuales establecidos.

- **Planilla de SS Profesional SST**

Adicionalmente, se evidencia en los informes presentados para la AIM la planilla de seguridad social del profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Sr. Martin Clavijo, quien figura en la tabla de personal profesional asignado a los frentes de obra de **Cubarral**.

Es importante visualizar la trazabilidad y control en el cumplimiento de sus funciones, dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo **(SG-SST)** y a las obligaciones legales en materia laboral.

- **PMT**

Respecto al Plan de Manejo de Tráfico **(PMT)**, se considera indispensable que el informe incluya una descripción detallada sobre su implementación y despliegue en

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

campo, especificando la ubicación, características técnicas y condiciones de instalación de la señalización vial. Asimismo, se requiere el soporte documental correspondiente, mediante evidencias fotográficas, que permitan verificar la correcta instalación y funcionamiento del **PMT** en los distintos tramos de obra, asegurando así una adecuada gestión del tránsito y la seguridad vial durante la ejecución del proyecto.

El cumplimiento riguroso de esta estructura contribuirá a una adecuada trazabilidad de las acciones implementadas en el marco del SG-SST y permitirá a la interventoría ejercer un control técnico efectivo sobre los aspectos relacionados con la seguridad y salud de los trabajadores en el desarrollo del proyecto.

Agradecemos su colaboración

Cordialmente,

ROSANETH ANGARITA GOMEZ
C.C. No. 1.018.497.426 de Bogotá
R/L CONSORCIO

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

Villavicencio, 20 de octubre de 2025

Señores:

INTERVIAL-2025-054

CONSORCIO VIAS Y PUENTES
Contratista de Obra
admoncviasypuentes2025@gmail.com

Ciudad.

Referencia: CONTRATO 169 DE 2025 - CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.

Asunto: INTERVIAL-169-054. Observaciones revisión informe No. 1 período del 04 al 31 de agosto de 2025.

Cordial saludo,

En el marco del PROYECTO **BPIN 2024005500267** cuyo objeto es la "MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META", ", y en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, nos permitimos remitir las observaciones correspondientes al Informe Mensual No. 1, del mes de agosto de 2025.

Las observaciones se presentan de conformidad con la revisión técnica, administrativa y documental efectuada sobre el informe radicado por el contratista de obra, bajo el comunicado CVYP-001-2025, con el fin de garantizar la trazabilidad y cumplimiento de los compromisos establecidos en el contrato.

OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL

- Se debe incluir la lista de chequeo diligenciada con los datos del contrato y el proyecto al cual corresponde la información que se reporta.

URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 5C
VILLAVICENCIO-META
consorciointervialcubarral@gmail.com
Cel.: (+57) 300 3475090

2235

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

- El encabezado del informe relaciona el numero del contrato, se solicita corregir el año.
- Las casillas que no sean diligenciadas, se recomienda colocar no aplica
- En el capítulo de control y avance, se debe relacionar el avance que reportó la Interventoría para el 30 de Agosto.
- En la relación de correspondencia enviada y recibida, se solicita al contratista relacionar solo la correspondencia del proyecto de Cubarral o correspondencia a fin con el contrato en general. Eliminar lo correspondiente al proyecto de Granada.
- Se solicita al contratista relacionar los comités de obra de acuerdo al periodo que reportan.
- En el informe se enuncia CARGUES AL SISTEMA SIGA, sin embargo, no complementan lo corresponde a este.
- Revisar el registro de los días de lluvia de acuerdo al registro de la bitácora, debe ser coherente con las jornadas de trabajo.
- Se solicita complementar el cuadro relacionando con los ensayos que aplican para las actividades del proyecto.
- Se evidencian firmas pendientes por parte de los profesionales de obra.
- En el informe de implementación del plan de manejo ambiental formato 112-ECP-FR-016, se solicita al contratista verificar el diligenciamiento de los programas ambientales en el caso de:
  - Manejo integral de residuos sólidos versus el soporte en el informe ambiental.
  - Programa de higiene y salud ocupacional. SI APLICA
- Se solicita diligenciar las casillas del formato 112-ECP-FR-016 SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES
- Se solicita diligenciar la bitácora de acuerdo a los enunciados o componentes de la misma, se evidencian varios días sin el registro y adicional se deben incluir las demás actividades reportadas por la Interventoría. Localización, campamento, transporte de escombros, manejo de aguas con motobomba.

OBSERVACIONES TÉCNICAS – INFORMES SST

Se considera indispensable la importancia en todas las actividades relacionadas con la gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo **(SST)** deben estar debidamente documentadas y respaldadas mediante evidencias verificables, tales como registros fotográficos, formatos diligenciados, reportes técnicos y demás soportes pertinentes, en concordancia con la normativa vigente en materia de SST y los compromisos contractuales asumidos por el contratista.

- **Planilla de Seguridad Social**

Adicionalmente, en los informes presentados para la AIM se identificó la falta de planilla de seguridad social del profesional en **SST, Sr. Martín Clavijo**, quien aparece registrado en la tabla de personal profesional asignado al frente de obra del municipio de **Granada**.

Es importante evidencia la trazabilidad y control sobre el cumplimiento de sus funciones, lo cual constituye el cumplimiento frente a los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo **(SG-SST)** y a las obligaciones legales en materia laboral, lo que debe ser atendido de manera inmediata por el contratista.

- PMT

Respecto al Plan de Manejo de Tráfico **(PMT)**, se considera indispensable que el informe incluya una descripción técnica detallada de su implementación en campo, que contemple la ubicación, especificaciones técnicas y condiciones de instalación de la señalización vial y demás elementos de control del tránsito.

Esta información debe reflejar el despliegue real de las medidas adoptadas, en concordancia con el diseño aprobado y los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.
Asimismo, es obligatorio adjuntar el soporte documental correspondiente, incluyendo evidencias fotográficas que permitan a la Interventoría constatar la correcta instalación, funcionamiento y mantenimiento del **PMT** de obra.

El cumplimiento riguroso de esta estructura no solo asegura la trazabilidad de las acciones ejecutadas en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo **(SG-SST)**, sino que también fortalece el control técnico por parte de la Interventoría, permitiendo evaluar de forma objetiva y sistemática el grado de cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos en materia de seguridad vial y prevención de riesgos laborales en el entorno de obra.

Agradecemos su colaboración

Cordialmente,

ROSANETH ANGARITA GOMEZ
C.C. No. 1.018.497.426 de Bogotá
R/L CONSORCIO

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

Villavicencio, 24 de octubre de 2025

Señores:

INTERVIAL-2025-055

JHON CAICEDO
Supervisor
Jhon.caicedo@aim-meta.gov.co

3810-25
24-octubre-2025
2:02 pm
Maria Beltran

Ciudad.

Referencia: CONTRATO 169 DE 2025 - CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.

Asunto: INTERVIAL-169-055. REMISIÓN DE INFORMES QUINCENALES CON CORTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025.

Cordial saludo,

En el marco contrato cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META." y en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, nos permitimos remitir los informes quincenales elaborados con corte al 15 de octubre de 2025, discriminados de la siguiente manera:

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

- Proyecto Vía – Cubarral, Meta (BPIN 2024005500266): Informe N.° 5, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 15 de octubre de 2025.
- Proyecto Construcción de Puentes – Granada, Meta (BPIN 2024005500267): Informe N.° 5, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 15 de octubre de 2025.

Sin otro particular, quedamos atentos a las observaciones o requerimientos adicionales que se consideran pertinentes.

Cordialmente,

ROSANETH ANGARITA GOMEZ
C.C. No. 1.018.497.426 de Bogotá
R/L CONSORCIO

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA

112-ECP-FR-222-V04
09/09/2024

CONTRATO Nº	558 DE 2024	PROYECTO Nº	20240051560268

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº	109 DE 2025
INTERVENTORÍA:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.
CORREO ELECTRONICO:	consorciointerventoria@gmail.com

SEMANAS NUMERO:	9.00	Del:	1/10/2025	Al:	15/10/2025
Tiempo transcurrido desde la inversión del contrato:			72	Días	

	QUINCENAL	ACUMULADO		QUINCENAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5.70%	31.71%	Obra Física Ejecutada (%)	16.53%	86.67%
Valor de la Obra programada:	$ 234.735.038,00	$ 1.594.089.934	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 925.991.667,00	$ 4.329.688.048,00

PROYECTO CONTRATO DE OBRA:		PROYECTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
VALOR INICIAL:	$ 4.995.800.538,00	VALOR INICIAL:	$ 463.569.418,00
VALOR ADICIONAL:	N/A	VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.995.800.538,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 463.569.418,00
PLAZO INICIAL:	5/08/2025	PLAZO INICIAL:	5/08/2025
FECHA DE INICIACIÓN:	lunes, 4 de agosto de 2025	FECHA DE INICIACIÓN:	lunes, 4 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	martes, 3 de febrero de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	martes, 3 de febrero de 2026
PRORROGA:	N/A	PRORROGA:	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A	PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A	FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	martes, 3 de febrero de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	martes, 3 de febrero de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

En este periodo el CONSORCIO VIAS Y PUENTES, terminó la instalación de malla dobles en cabecera MDC-12, con un espesor de 7.5cm a excepción del kcms 12, el cual se instaló en un espesor de 10cm, el trayecto instalado en su totalidad es de 5.12km. Trazado que corresponde a los sectores desde el K16+720 EDS TERPEL al K0+979.7 entrada en la etapa 5 (urbanización SANTA MONICA y el sector desde el K3+127 Finca la floresta hasta el K4+500 frente el vivero.

Se realizó la temperatura de llegada, de extendido y compactación de la mezcla por parte del contratista de obra e interventoría, observando el cumplimiento de las Especificaciones técnicas del proyecto y de la norma INVIAS-2013.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO DE VIAS

SELLO DE ARENA ASFALTO CON EMULSIÓN CRR-2

IMPLEMENTACIÓN DEL PMT.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Al corte de este informe, y pasados 72 días de ejecución, la relación entre avance físico ejecutado (86.67%) y programado (31.71%) evidencia un margen favorable de 54.96 %

signo de una gestión que ha superpasado las expectativas iniciales de programación. El avance logrado incluye habilitación de taludes con carpeta asfáltica y la adecuada

ejecución de procesos constructivos, alineados con el cronograma contractual y con los calendarios de calidad exigidos.

En este periodo se tomaron muestras de la mezcla por parte de la interventoría con el apoyo del laboratorio INVISO. Como parte de la validación del cumplimiento contractual.

AFECTACIONES CLIMATOLOGICAS

Durante el desarrollo de las actividades se presentaron lluvias leves

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

2240

CONTRATO Nº	938 DE 2024	PROYECTO Nº	3624000000266

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Durante la presente quincena, el proyecto reportó un avance físico ejecutado del 16.03% frente a un 6.70% programado para el periodo, lo que evidencia una ejecución superior a la programada en 11.83 puntos porcentuales. En el acumulado del contrato, se registra un avance ejecutado del 86.07% sobre una programación acumulada del 31.71%, lo que demuestra eficiencia y proactividad en la gestión del contrato y en la planificación de las actividades de obra. A nivel financiero, el valor de la obra ejecutada a la fecha asciende a $4.329.886.049 superando ampliamente el valor programado de $2.745.581.413,83. Esta relación positiva refleja el compromiso del contratista y la supervisión de interventoría en el cumplimiento y avance de los ítems contractuales, facilitando la optimización de recursos y la gestión eficiente de los frentes de trabajo.	Firma Nombre: JUAN DIEGO FORERO Nº Matrícula Profesional: 63202-294712 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

2291

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ADENDA Nº		ADICIÓN DE OBRA			PROYECTO Nº			ADJUDICACIÓN							
Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA Acta de Modificación No. ____ de fecha: _____	VALOR TOTAL	VALOR ADJUDICADO							
								ACTUAL INTERVENTORÍA		PRESUPUESTO ALTO		VIGILANCIA			
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%	
1.1	PRELIMINARES														
1.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO VIAL	KM	10.11	$ 3.000.000	$ 30.331.313,40	0,00	$ -	0,00	$ -	10,11	$ 30.331.313	10,11	$ 30.331.313	100,00%	
	SUBTOTAL				$ 30.331.313,40		$ -		$ -		$ 30.331.313,40		$ 30.331.313,40		
1.2	DEMOLICIONES														
1.2.1	DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M2	0,00	$ 241.280	$ 212.641,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	
	SUBTOTAL				$ 212.641,60		$ -		$ -		$ -		$ -		
1.3	EXCAVACIONES														
1.3.1	EXCAVACION MASIVA EN TERRENO NATURAL H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 48.000	$ 5.568.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	
	SUBTOTAL				$ 5.568.640,00		$ -		$ -		$ -		$ -		
1.4	BASES, SUBBASES Y CAPAS GRANULARES														
1.4.1	BASE GRANULAR PARA ARCHEO	M3	28,00	$ 144.000	$ 4.036.719,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	
1.4.2	SUBBASE GRANULAR PARA ARCHEO	M3	28,00	$ 111.000	$ 3.111.923,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%	
	SUBTOTAL				$ 7.148.642,00		$ -		$ -		$ -		$ -		
1.5	PAVIMENTOS FLEXIBLES														
1.5.1	PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	0.000,00	$ 41.100	$ 201.140.723,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7.152,11	$ 113.124.921	7.152,11	$ 113.124.921	56,27%	
1.5.2	PRIMER DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (GALON)	M2	700,00	$ 8.000	$ 500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	
1.5.3	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2	GL	10.412,00	$ 2.200	$ 100.512.344,00	0,00	$ -	0,00	$ -	46.223,64	$ 148.963.500	46.223,64	$ 148.963.500	18,42%	
1.5.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO LOCALIZACION Y COMPACTACION	M3	2.560,00	$ 501.000	$ 1.283.057.115,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2.560,00	$ 1.283.057.115	2.560,00	$ 1.283.057.115	31,81%	
1.5.5	RELLENO MINERAL ASFALTO CON EMULSION CRR-2	M2	4.000,00	$ 9.000	$ 36.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	
	SUBTOTAL				$ 1.621.310.181,00		$ -		$ -		$ 1.545.274.536,00		$ 1.545.274.536,00		
1.6	SEÑALIZACION														
1.6.1	LINEA DE DEMARCACION VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO DE 2 A 10 CM INCLUYE SUMINISTRO, RECORRIDO MANUAL Y APLICACION CON EQUIPO	ML	22.700,00	$ 4.000	$ 101.307.174,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	
1.6.2	DEFENSAS METALICAS SENCILLAS, SUMINISTRO E INSTALACION	UND	2.420,00	$ 11.000	$ 26.994.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	
	SUBTOTAL				$ 128.301.174,00		$ -		$ -		$ -		$ -		
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 1.788.827.186,00		$ -		$ -		$ 2.289.111.010,00		$ 2.289.111.010,00		
	ADMINISTRACION (20%)				$ 357.765.397,20						$ 457.822.202,00		$ 457.822.202,00		
	IMPREVISTOS (1%)				$ 17.888.269,86						$ 22.891.110,10		$ 22.891.110,10		
	UTILIDAD (4%)				$ 142.906.295,49						$ 182.888.880,80		$ 182.888.880,80		
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 518.559.962,55		$ -		$ -	40,42%	$ 663.602.193,00	29,00%	$ 663.602.193,00		
	PRESUPUESTO OFICIAL				$ 2.307.387.148,55						$ 2.952.713.203,00		$ 2.952.713.203,00		
	PRESUPUESTO PAVI				$ 2.307.387.148,55						$ 2.952.713.203,00		$ 2.952.713.203,00		
	VALOR TOTAL OBRA				$ 2.307.387.148,55		$ -		$ -		$ 2.952.713.203,00		$ 2.952.713.203,00		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2242

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA

112-ECP-FR-222-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	**558 DE 2024**	**PROYECTO N°**	**38240005380267**

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	169 DE 2025
INTERVENTORIA:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURIDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.
CORREO ELECTRONICO:	consorciointerventoriacubarral@gmail.com

SEMANAS NUMERO:	9 60	Del:	1/10/2025	Al:	15/10/2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:			72	Dias	

	QUINCENAL	ACUMULADO		QUINCENAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3.40%	18.31%	Obra Física Ejecutada (%)	1.55%	10.68%
Valor de la Obra programada:	$ 129 542 728.00	$ 620 078 689	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 59 060 575.00	$ 406 632 438.00

PROYECTO CONTRATO DE OBRA:		PROYECTO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
VALOR INICIAL:	$ 3 805 584 465.00	**VALOR INICIAL:**	$ 388 565 091.00
VALOR ADICIONAL:	N/A	**VALOR ADICIONAL:**	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3 805 584 465.00	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 388 565 091.00
PLAZO INICIAL:	DOCE 12 MESES	**PLAZO INICIAL:**	DOCE 12 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	lunes, 4 de agosto de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	lunes, 4 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	lunes, 3 de agosto de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	lunes, 3 de agosto de 2026
PRORROGA:	N/A	**PRORROGA:**	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A	**PLAZO ACTUALIZADO:**	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	lunes, 3 de agosto de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	lunes, 3 de agosto de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Las actividades desarrolladas durante el presente periodo comprendieron, en primera instancia, la superación de la contingencia generada por el desbordamiento del río, el cual afectó el frente de trabajo e implicó la ejecución de labores no previstas dentro de la programación inicial. Entre estas se destacan la limpieza y recuperación del acero de refuerzo del estribo y las aletas margen derecha, la excavación nuevamente del área intervenida y el rearmado del acero estructural.

Posteriormente, se adelantaron las actividades correspondientes a la limpieza del área de fundida, la ejecución del concreto de solado y la fundida de la caeza del muro principal y las aletas, empleando concreto con una resistencia de diseño de 4000 PSI, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGNIENTE PERIODO

Para el siguiente periodo se tiene programada la ejecución del armado del acero de refuerzo longitudinal correspondiente a los muros de las aletas y el estribo principal. Una vez finalizada esta actividad, se procederá con el encamisado y encofrado de los elementos estructurales, con el fin de dejar todo dispuesto para la posterior fundida del concreto, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la secuencia constructiva establecida.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato presenta un desarrollo técnico y administrativo riguroso, respaldado por una trazabilidad y control documental; sin embargo, el avance físico acumulado del 10.68% se encuentra ligeramente inferior al 18.31% programado, lo que refleja un retraso significativo de 5.62%, principalmente atribuido a condiciones climáticas adversas como lluvias intensas y el desbordamiento del caño milagros en el sitio de obra, que han afectado la continuidad operativa, generando reprogramaciones internas y dificultando la ejecución de actividades de mayor impacto económico; en consecuencia, es imprescindible fortalecer la coordinación, optimizar las estrategias de mitigación, y priorizar la implementación de correctivos urgentes, a fin de recuperar el ritmo proyectado del contrato, minimizar el efecto acumulado del atraso y asegurar un desarrollo contractual sostenible en los próximos periodos.

AFECTACIONES CLIMATOLOGICAS

Como consecuencia de la inundación ocasionada por el desbordamiento del caño Milagros, se presentaron afectaciones en la zona de trabajo que generaron retrasos en la programación de las actividades constructivas. El aumento del nivel del agua produjo el arrastre de material y la acumulación de sedimentos sobre los elementos ya armados, situación que obligó a detener temporalmente las labores para realizar la limpieza y recuperación del área.

Fue necesario desmontar parcialmente el acero de refuerzo previamente instalado, efectuar la remoción del material colmatado y proceder nuevamente con el armado, garantizando las condiciones técnicas y de seguridad requeridas para la posterior fundida de los elementos estructurales. Estas acciones ocasionaron una reprogramación de las actividades hasta restablecer un entorno adecuado para la continuidad de los trabajos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

2243

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	1924005580267

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
El avance físico acumulado, correspondiente al 10.69%, se significativamente inferior respecto al 16.31% programado, reflejando un desfase de 5.62%. Este atraso encuentra su causa principal en las afectaciones climáticas, como la presencia de lluvias intensas y el desbordamiento de caños, que han dificultado la secuencia lógica de las actividades. Cabe resaltar que la diferencia en los valores financieros ejecutados también denota que los actividades de mayor impacto económico aún no se han podido desarrollar de acuerdo al tramo previsto. Es fundamental reforzar los controles operativos y la coordinación interinstitucional para recuperar el ritmo y minimizar el efecto acumulado de estos atrasos en los periodos sucesivos.	Firma: Nombre: JUAN CARLOS [illegible] GRADA N° Matrícula Profesional: 63202-264710 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

2244

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

AVANCE FINANCIERO DE OBRA



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2205

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

Villavicencio, 24 de octubre de 2025

Señores:

INTERVIAL-2025-056

JHON CAICEDO
Supervisor
Jhon.caicedo@aim-meta.gov.co

3809-25
24 octubre-2025
2:00 pm 5 carpetas
María Beltrán

Ciudad.

Referencia: CONTRATO 169 DE 2025 - CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.

Asunto: INTERVIAL-169-056. Respuesta a oficios Nos. 110-07-01-437-2025, 110-07-01-467-2025, 110-07-01-489-2025 y 110-07-01-523-2025. Presentación de informes mensuales correspondientes al período de agosto de 2025.

Cordial saludo,

En el marco contrato cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.", y en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, por medio del presente comunicado, se procede a dar respuesta a los oficios del presente asunto, mediante los cuales se ha requerido la radicación de los informes mensuales de interventoría correspondientes al mes de agosto de 2025, y simultáneamente efectúa la entrega formal de la documentación solicitada.

Conforme a lo descrito en el oficio No. 110-07-01-489-2025 remitido por la entidad, en donde describe, que, *El Contrato de Interventoría No. 169 de 2025 establece en su cláusula décima las obligaciones de presentación de informes quincenales y mensuales dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, conforme a lo establecido en el Manual de Interventoría y Supervisión AIM.* Esta Interventoría reconoce la importancia del cumplimiento oportuno de

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

dicha obligación, en la medida en que los informes de seguimiento constituyen herramientas fundamentales para garantizar la trazabilidad, el control técnico y la supervisión efectiva de la ejecución del contrato de obra. Sin embargo, consideramos necesario poner en conocimiento de esa Supervisión las circunstancias técnicas y operativas que han determinado el cronograma de entrega de los productos contractuales solicitados.

La ejecución de proyectos de infraestructura pública configura una cadena de responsabilidades interdependientes entre el contratista de obra, la interventoría y la entidad contratante. El proceso de consolidación de informes mensuales de interventoría depende directamente de la entrega oportuna y completa de la información por parte del contratista de obra, la cual constituye el insumo indispensable para que esta Interventoría pueda realizar su labor de revisión, verificación y control técnico.

Conforme a lo establecido en el formato 112-ECP-FR-177 (Lista de Chequeo Contrato de Interventoría Informes Mensuales), el contratista de obra tenía la obligación de entregar la totalidad de la información correspondiente al mes de agosto de 2025 a más tardar el día 5 de septiembre de 2025. Dicha fecha límite no fue cumplida por el CONSORCIO VÍAS Y PUENTES, generando un desfase en el cronograma de revisión y consolidación por parte de la interventoría.

Ante esta situación, esta Interventoría procedió a realizar requerimiento formal mediante comunicado INTERVIAL-2025-049 de fecha 18 de septiembre de 2025, solicitando la entrega inmediata de la documentación requerida. Una vez recibida la información por parte del contratista de obra, bajo el comunicado CVYP-001-2025, se inició el proceso de revisión técnica exhaustiva, el cual comprende la verificación de aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos de múltiples formatos oficiales de la entidad, así como la validación de información en todas las áreas involucradas dentro del contrato.

Es importante señalar que la revisión técnica de la documentación presentada por el contratista requiere de un detallado y minucioso, considerando el análisis del volumen considerable de información, la complejidad técnica de los proyectos de rehabilitación vial y construcción de puentes, y la necesidad de garantizar la calidad y veracidad de los datos reportados. Como resultado del proceso de revisión, esta Interventoría identificó observaciones técnicas, inconsistencias en la información presentada y aspectos susceptibles de mejora en la documentación del contratista de obra.

En cumplimiento de nuestra función de control y vigilancia, se procedió a comunicar formalmente dichas observaciones mediante los oficios INTERVIAL-2025-053 e INTERVIAL-2025-054, solicitándole al contratista subsanar las deficiencias identificadas. A la fecha de expedición del presente comunicado, el contratista de obra se encuentra en proceso de subsanación de las observaciones formuladas por esta Interventoría, circunstancia que ha incidido directamente en el cronograma de consolidación definitiva de los informes mensuales.

No obstante, lo anterior, esta Interventoría ha mantenido un cumplimiento progresivo de sus obligaciones de reporte y seguimiento. Se han elaborado y radicado oportunamente los informes quincenales correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025, mediante los

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

comunicados INTERVIAL-2025-050, INTERVIAL-2025-052 e INTERVIAL-2025-055, en respuesta a los oficios 110-07-01-0432 y 110-07-01-438-2025 de la entidad contratante. Dichos informes contienen información financiera, porcentajes de avance de obra comparados con lo programado según cronograma contractual, registro fotográfico del desarrollo de las actividades, descripción de condiciones climáticas que han afectado la ejecución, y conclusiones técnicas sobre las actividades realizadas.

Además, en atención a los múltiples requerimientos formulados por esta Supervisión y considerando la premura manifestada por la entidad contratante, esta Interventoría ha procedido a radicar el informe mensual del formato 112-ECP-FR-017 de manera anticipada, aun cuando este constituye un componente integral de la carpeta completa que debe ser entregada por el contratista de obra según la lista de chequeo establecida. Esta decisión fue adoptada como muestra de nuestra disposición de colaboración y compromiso con la gestión contractual.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se adjunta al presente la siguiente documentación correspondiente a los dos proyectos objeto del Contrato de Interventoría No. 169 de 2025:

BPIN 2024005500266 - CUBARRAL VÍA

Informe mensual de gestión de interventoría, período del 1 al 31 de agosto de 2025, conforme al formato 112-ECP-FR-177:

- Informe de Gestión Interventoria - Formato 112-ECP-FR-051
- Acta Relación de Interventoria Personal - Formato 112-ECP-FR-047
- Acta Control y Seguimiento Seguridad Social e Interventoría Parafiscal - Formato 112-ECP-FR-052
- Entrega de Dotación y/o Elementos Protección Personal - Formato 112-ECP-FR-015
- Acta Aprobación Cambio Personal Interventoria - Formato 112-ECP-FR-061

Informe mensual de interventoría obra, período del 1 al 31 de agosto de 2025:

- Informe de Interventoría Obra - Formato 112-ECP-FR-017
- Informes quincenales correspondientes al mes de agosto de 2025

BPIN 2024005500267 - GRANADA PUENTES

Informe mensual de gestión de interventoría, período del 1 al 31 de agosto de 2025, conforme al formato 112-ECP-FR-177:

- Informe de Gestión Interventoria - Formato 112-ECP-FR-051
- Informe de la gestión realizada por cada especialista, debidamente firmado por el profesional
- Acta Relación de Interventoria Personal - Formato 112-ECP-FR-047

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

- Acta Control y Seguimiento Seguridad Social e Interventoría Parafiscal - Formato 112-ECP-FR-052
- Entrega de Dotación y/o Elementos Protección Personal - Formato 112-ECP-FR-015

Informe mensual de interventoría obra, período del 1 al 31 de agosto de 2025:

- Informe de Interventoría Obra - Formato 112-ECP-FR-017
- Informes quincenales correspondientes al mes de agosto de 2025

Correspondencia enviada y recibida.

Con relación al oficio No. 110-07-01-523-2025 del 23 de octubre de 2025, mediante el cual se manifiesta el inicio de solicitud de presunto incumplimiento del contrato de intervención 169 de 2025, nos permitimos exponer las siguientes consideraciones. Las circunstancias técnicas y operativas descritas en el presente documento evidencian que el desfase en la entrega de los informes mensuales obedece a factores externos relacionados con el cumplimiento del contratista de obra, y no a una omisión deliberada o negligencia por parte de esta Interventoría.

La responsabilidad de la intervención en el marco de la contratación estatal está condicionada a la demostración de culpa grave o dolo en el incumplimiento de sus funciones de vigilancia y control. En el presente caso, esta Interventoría ha cumplido diligentemente con su obligación de informar a través de los informes quincenales, las comunicaciones dirigidas al contratista de obra solicitando la entrega oportuna de información, y los oficios de observaciones técnicas que evidencian el ejercicio constante de nuestras funciones de control y seguimiento.

Cualquier evaluación sobre el cumplimiento contractual debe considerar la existencia de causas justificadas, el análisis de proporcionalidad de las medidas a adoptar, y la conducta procesal del contratista durante la ejecución contractual. Las actuaciones de esta Interventoría han estado permanentemente orientadas por el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como se evidencia en la entrega de los informes quincenales, la comunicación constante con la supervisión, y la presentación de la radicación de los informes mensuales solicitados.

El CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024 reitera su compromiso con el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Interventoría No. 169 de 2025, y manifiesta su voluntad de continuar ejerciendo las funciones de control, vigilancia y seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre los contratos de obra a su carga, con la diligencia, profesionalismo y rigurosidad técnica que caracteriza nuestra gestión.

Esta Interventoría se compromete a agilizar el proceso de revisión de las subsanaciones una vez sean presentadas por el contratista de obra ya radicar la documentación restante dentro de los plazos que técnicamente resulten viables, considerando la complejidad inherente a la revisión minuciosa que exigen los estándares de calidad establecidos por la entidad contratante. Asimismo, implementaremos mecanismos de seguimiento reforzados para garantizar que en los períodos siguientes se mantenga la estricta observancia de los cronogramas de entrega establecidos contractualmente.

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

Reiteramos nuestra disposición para mantener los canales de comunicación abiertos para cualquier aclaración, ampliación o información adicional que la entidad contratante considere pertinente solicitar en relación con la ejecución del Contrato de Interventoria No. 169 de 2025.

Sin otro particular, y agradeciendo la atención dispensada al comunicado presente, quedamos atentos a las observaciones o requerimientos adicionales que se estiman pertinentes.

Cordialmente,

ROSANETH ANGARITA GOMEZ
C.C. No. 1.018.497.426 de Bogotá
R/L CONSORCIO

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

Villavicencio, 24 de octubre de 2025

Señores:

INTERVIAL-2025-057

CONSORCIO VIAS Y PUENTES
Contratista de Obra
admoncviasypuentes2025@gmail.com

Ciudad.

Referencia: CONTRATO 169 DE 2025 - CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.

Asunto: INTERVIAL-169-057. REMISIÓN PLANOS FINALES GRANADA

Cordial saludo,

En el marco proyecto cuyo objeto es la "LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.", y en cumplimiento de las obligaciones contractuales y los acuerdos establecidos, nos permitimos remitir la siguiente documentación.

La presente entrega corresponde a los planos finales de cuatro (4) de las estructuras. Dichos planos se entregan conforme a la última documentación técnica remitida por la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM) y según lo acordado por las partes en las mesas de trabajo previas.

Se adjuntan las siguientes carpetas digitales:

01-PUENTE GRANADA 1 (K1+990) (2)

02.PUENTE GRANADA 2 (K4+150) (1)

03. PUENTE GRANADA 3 (K4+290) (2)

04.PUENTE GRANADA 4 (K5+600) (1)

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

Cada carpeta contiene los archivos fuente en formato Revit (.rvt), los planos en formato PDF y las tablas de despiece de aceros en formato Excel para los cuatro (4) puentes listados.

Agradecemos la revisión de la información anexa. Quedamos atentos a cualquier solicitud, observación o requerimiento que estimen pertinente, con el fin de gestionar lo correspondiente ante la Entidad Contratante.

Cordialmente,

ROSANETH ANGARITA GOMEZ
C.C. No. 1.018.497.426 de Bogotá
R/L CONSORCIO

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 5C
VILLAVICENCIO-META
consorciointervialcubarral@gmail.com
Cel.: (+57) 300 3475090

2257

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

Villavicencio, 27 de octubre de 2025

Señores:

INTERVIAL-2025-058

CONSORCIO VIAS Y PUENTES
Contratista de Obra
admonconviasypuentes2025@gmail.com

Ciudad.

Referencia: CONTRATO 169 DE 2025 - CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.

Asunto: **INTERVIAL-169-058** Observaciones revisión informe No. 2 periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025.

Cordial saludo,

En el marco del PROYECTO **BPIN 2024005500266** cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META", y en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, nos permitimos remitir las observaciones correspondientes al Informe Mensual No. 2, del mes de septiembre de 2025.

Las observaciones se presentan de conformidad con la revisión técnica, administrativa y documental efectuada sobre el informe radicado por el contratista de obra, bajo el comunicado CVYP-005-2025 del 15 de octubre de 2025, con el fin de garantizar la trazabilidad y cumplimiento de los compromisos establecidos en el contrato.

OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL

- El encabezado del informe relaciona el numero del contrato, se solicita corregir el año y el consecutivo correspondiente al informe No.2.
- Las casillas que no sean diligenciadas, se recomiendan colocar no aplica, N/A.
- De acuerdo a lo programado se evidencia que el tiempo de ejecución del proyecto corresponde a seis (6) meses, se solicita corregir en el cuadro donde se registra el tiempo de inicio y terminación del proyecto.
- Se recomienda en mesa técnica en conjunto con la Interventoria, revisar el avance de obra para el periodo de septiembre y lo correspondiente a lo programado del proyecto.

URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 5C
VILLAVICENCIO-META
consorciointervialcubarral@gmail.com
Cel.: (+57) 300 3475090

2253

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

- En la relación de correspondencia enviada y recibida, se solicita al contratista relacionar solo la correspondencia del proyecto de Cubarral o correspondencia a fin con el contrato en general. Eliminar lo correspondiente al proyecto de Granada.
- Se solicita al contratista relacionar los comités de obra de acuerdo al periodo que reportan.
- En el informe se enuncia CARGUES AL SISTEMA SIGA, sin embargo, no complementan lo corresponde a este en relación a la descripción del párrafo.
- En el capitulo de problemas presentados, se relaciona la problemática del cierre de la vía Bogotá – Villavicencio, teniendo en cuenta que incidió en suspensión de jornadas de trabajo por la falta de abastecimiento del cemento asfaltico y así se registró en bitácora.
- Revisar la concordancia de la información en la página 7 y 8 con relación al registro del clima.
- En relación al espesor del fresado se indica un espesor aprobado por la Interventoria, sin embargo, en campo se han evidenciado algunos tramos que técnicamente no se pudieron fresar en ese espesor, debido a la falta de espesor de carpeta por el mismo deterioro de la misma.
- Con respecto a las abscisas del fresado en la pagina 11, se solicita actualizar de acuerdo al avance del periodo y lo consignado en bitácora.
- Se solicita complementar el cuadro relacionando los ensayos que aplican para la rodadura asfáltica e indicar la norma.
- En el capitulo 4, MANEJO AMBIENTAL, se solicita retirar las acciones de control de emisión de polvo y material particulado y protección de cuerpos de agua y drenaje.
- Se solicita en el cuadro resumen de la implementación del PAGA, en la casilla OBSERVACIÓN/ACCIÓN, indicar a manera de resumen la acción que se implementó en el periodo. Como Nota debajo del cuadro se recomienda mencionar que cada unas de esas acciones, esta soportada en el informe.
- Se solicita incluir la fecha de aprobación de las pólizas iniciales 14/02/2025.
- Se solicita diligenciar las casillas del formato 112-ECP-FR-016 SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES
- Se solicita anexar el certificado de calibración de la estación topográfica, teniendo en cuenta que en campo se evidenció el levantamiento topográfico del avance con dicho equipo.

OBSERVACIONES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA MEZCLA ASFALTICA

- En el diseño Marshall, se especifica que el cemento Asfaltico es (60/70) Apiay Ecopetrol, sin embargo, para el periodo que se reporta, la Interventoría tiene conocimiento del uso del cemento Asfaltico de Barrancabermeja, se solicita aclarar o en su defecto presentar el diseño Marshall con este tipo de cemento Asfaltico.
- Se solicita anexar el certificado del cemento asfaltico.
- Se solicita el certificado de la emulsión asfáltica CRR-2

- Los ensayos de calidad de la mezcla asfáltica están de acuerdo a las jornadas de trabajo, sin embargo, se solicita al Contratista mejorar la presentación o impresión de los ensayos, no esta legible y se dificultad la revisión.
- De acuerdo al avance del periodo y de la calidad del producto terminado, se solicitan los ensayos correspondientes; compactación y verificación del espesor etc.
- Se solicita el certificado del laboratorio o el documento que acredite la trazabilidad de su operación.

OBSERVACIONES DE CONTROL SST

- Corroborar la información contenida en las planillas de seguridad social frente al acta de relación de personal vinculado al proyecto, garantizando coherencia y actualización de los datos.
- En la tabla correspondiente a la relación de actividades realizadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se deberá completar la casilla de observaciones con la información pertinente.
- Incluir el informe técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) como soporte documental para verificación por la interventoría.
- Adjuntar soporte fotográfico que evidencie:
    - La entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) y dotación al personal.
    - La realización de inspecciones preoperacionales a la maquinaria utilizada en obra.
    - Evidencias fotográficas de la Señalización o PMT, en los diferentes tramos a intervenir.

Se solicita al Contratista mejorar la presentación o impresión de algunos formatos de las preoperacionales, no está legible y se dificultad la revisión.

Sin otro particular, agradecemos su valiosa colaboración y disposición para atender las solicitudes presentadas

Cordialmente,

ROSANETH ANGARITA GOMEZ
C.C. No. 1.018.497.426 de Bogotá
R/L CONSORCIO

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

Villavicencio, 27 de octubre de 2025

Señores:

INTERVIAL-2025-059

CONSORCIO VIAS Y PUENTES
Contratista de Obra
admoncviasypuentes2025@gmail.com

Ciudad.

Referencia: CONTRATO 169 DE 2025 - CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.

Asunto: INTERVIAL-169-059 Observaciones revisión informe No. 2 periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025.

Cordial saludo,

En el marco del PROYECTO **BPIN 2024005500267** cuyo objeto es la "MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META", y en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, nos permitimos remitir las observaciones correspondientes al Informe Mensual No. 2, del mes de septiembre de 2025.

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

Las observaciones se presentan de conformidad con la revisión técnica, administrativa y documental efectuada sobre el informe radicado por el contratista de obra, bajo el comunicado CVYP-005-2025 del 15 de octubre de 2025, con el fin de garantizar la trazabilidad y cumplimiento de los compromisos establecidos en el contrato.

OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL

- El encabezado del informe relaciona el número del contrato, se solicita corregir el año y corregir el periodo del informe.
- Las casillas que no sean diligenciadas, se recomiendan colocar no aplica N/A.
- Se recomienda en mesa técnica en conjunto con la Interventoria, revisar el avance de obra para el periodo de septiembre y lo correspondiente a lo programado del proyecto.
- Se solicita al contratista relacionar los comités de obra de acuerdo al periodo que reportan.
- En el informe se enuncia CARGUES AL SISTEMA SIGA, sin embargo, no complementan lo corresponde a este en relación a la descripción del párrafo.
- Revisar el registro de los días de lluvia de acuerdo a la tabla pagina 11 versus el resumen de la tabla de la página 12.
- Actualizar las observaciones con respecto al clima de acuerdo a lo indicado en bitácora y en el capítulo de problemas presentados, pagina 12.
- Se evidencian firmas pendientes por parte de los profesionales de obra, ingeniera ambiental, contador, director, etc.
- Se solicita en el cuadro resumen de la implementación del PAGA, en la casilla OBSERVACIÓN/ACCIÓN, indicar a manera de resumen la acción que se implementó en el periodo. Como Nota, debajo del cuadro se recomienda mencionar que cada una de esas acciones, esta soportada en el informe.
- Se solicita incluir la fecha de aprobación de las pólizas iniciales 14/02/2025.
- Se solicita diligenciar la bitácora de acuerdo a los componentes de la misma, especialmente el registro del ESTADO DEL CLIMA, teniendo en cuenta que afecta directamente el desarrollo de las actividades
- Se adjuntan ensayos de laboratorio sin la firma, por favor entregar estos documentos debidamente aprobados y firmados por el laboratorio que presta el servicio al Consorcio ISYS.

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

OBSERVACIONES DE CONTROL SST

- Corroborar la información contenida en las planillas de seguridad social frente al acta de relación de personal vinculado al proyecto, garantizando coherencia y actualización de los datos.
- En la tabla correspondiente a la relación de actividades realizadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se deberá completar la casilla de observaciones con la información pertinente.
- Incluir el informe técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) como soporte documental para verificación por la interventoria.

Sin otro particular, agradecemos su valiosa colaboración y disposición para atender las solicitudes presentadas

Cordialmente,

ROSANETH ANGARITA GOMEZ
C.C. No. 1.018.497.426 de Bogotá
R/L CONSORCIO

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 5C
VILLAVICENCIO-META
consorciointervialcubarral@gmail.com
Cel.: (+57) 300 3475090

2259

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

Villavicencio, 29 de octubre de 2025

Señores:

INTERVIAL-2025-060

CONSORCIO VIAS Y PUENTES
Contratista de Obra
admoncviasypuentes2025@gmail.com

Ciudad.

Referencia: CONTRATO 169 DE 2025 - CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.

Asunto: INTERVIAL-169-060. NOTIFICACIÓN – INCUMPLIMEINTO, SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL AGOSTO DE 2025

Cordial saludo,

En el marco del contrato de obra cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META", y en cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, nos permitimos notificar formalmente el **incumplimiento en la entrega del informe mensual correspondiente al mes de agosto de 2025**, conforme a lo establecido en el Comité de Obra llevado a cabo el día 28 de octubre de 2025.

Conforme al Acta del Comité de Obra, el Contratista de Obra adquirió el compromiso de entregar el informe mensual del mes de agosto de 2025 el día de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025. A la fecha y hora de expedición del presente oficio, esta interventoría no ha recibido la documentación mencionada, configurándose así un **incumplimiento de las obligaciones contractuales** establecidas.

URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 5C
VILLAVICENCIO-META
consorciointervialcubarral@gmail.com
Cel.: (+57) 300 3475090

2259

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

Como consecuencia directa de este incumplimiento, el compromiso de la interventoría de pronunciarse sobre la revisión, verificación y radicación del informe de obra, que estaba programado para el día viernes 31 de octubre de 2025, se **reprograma para el día lunes 3 de noviembre de 2025**, afectando el cronograma de revisión y aprobación de la documentación en mención.

Es importante recordar que en el comité de obra referido se estableció como nuevo compromiso que la entrega de los informes mensuales debe realizarse durante los **primeros cinco (5) días hábiles de cada mes**, y la interventoría dispone de **cinco (5) días hábiles adicionales** para pronunciarse sobre los mismos. En caso de requerir subsanaciones, el contratista cuenta con **dos (2) días hábiles adicionales** para realizar las correcciones necesarias.

El incumplimiento en la entrega oportuna de informes mensuales de avance de obra constituye el desconocimiento de una obligación contractual que afecta el seguimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto, además de retrasar los procesos de verificación y aprobación por parte de la interventoría y la supervisión del contrato.

Por lo anterior, se solicita de manera urgente al Contratista de Obra:

1. Realizar la entrega inmediata del informe mensual correspondiente al mes de agosto de 2025, de conformidad con las subsanaciones a las observaciones de los dos proyectos en ejecución, presentadas bajo los comunicados **INTERVIAL-2025-053 y INTERVIAL-2025-054** del 20 de octubre de 2025, así como los requisitos técnicos y formatos establecidos.

2. Presentar las justificaciones técnicas y/o administrativas que ocasionaron el retraso en la entrega del documento dentro del plazo acordado.

3. Establecer acciones correctivas y preventivas para garantizar que esta situación no se repita en futuras entregas de informes mensuales.

Sin otro particular, agradecemos su valiosa colaboración y disposición para atender las solicitudes presentadas

Cordialmente,

ROSANETH ANGARITA GOMEZ
C.C. No. 1.018.497.426 de Bogotá
R/L CONSORCIO

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

Villavicencio, 31 de octubre de 2025

Señores:

INTERVIAL-2025-061

CONSORCIO VIAS Y PUENTES
Contratista de Obra
admoncviasypuentes2025@gmail.com

Ciudad.

Referencia: CONTRATO 169 DE 2025 - CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.

Asunto: INTERVIAL-169-061. OBSERVACIONES ACTA PARCIAL NO.1 CUBARRAL.

Cordial saludo,

En el marco del contrato de obra cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META", y en cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, nos permitimos remitir las observaciones correspondientes al Acta Parcial No. 1, relacionada con las actividades ejecutadas en el municipio de Cubarral, Meta, durante el periodo comprendido entre el 4 de agosto y el 15 de octubre de 2025.

Las observaciones se presentan de conformidad con la revisión técnica, administrativa y documental efectuada sobre el acta radicada por el contratista de obra, bajo el comunicado CVYP-008-2025 del 24 de octubre de 2025, con el fin de garantizar la trazabilidad y cumplimiento de los compromisos establecidos en el contrato.

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

OBSERVACIONES

De acuerdo con los informes correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2025, presentados por el contratista de obra mediante los comunicados CVYP-001-2025 (agosto) y CVYP-005-2025 (septiembre), así como las observaciones emitidas por esta interventoría a través de los comunicados INTERVIAL-2025-053 (agosto) e INTERVIAL-2025-058 (septiembre), y considerando que la documentación anexada al Acta Parcial N.° 1 incluye la información previamente mencionada en dichos informes, los cuales contienen inconsistencias, se reiteran y formulan las siguientes observaciones:

INFORME OBRA (agosto 2025):

OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL

- Las casillas que no sean diligenciadas, se recomienda colocar no aplica
- En el capítulo de control y avance, se debe relacionar el avance que reportó la Interventoría para el 30 de Agosto.
- En la relación de correspondencia enviada y recibida, se solicita al contratista relacionar solo la correspondencia del proyecto de Cubarral o correspondencia a fin con el contrato en general. Eliminar lo correspondiente al proyecto de Granada.
- Se solicita al contratista relacionar los comités de obra de acuerdo al periodo que reportan.
- En el informe se enuncia CARGUES AL SISTEMA SIGA, sin embargo, no complementan lo correspondiente a este.
- Revisar los días de lluvia de acuerdo al registro de la bitácora, para el mes de agosto se registran 6 días y en el informe relacionan 5.
- En relación al espesor del fresado se indica un espesor aprobado por la Interventoría, sin embargo, en campo se han evidenciado algunos tramos que técnicamente no se pudieron fresar en ese espesor, debido a la falta de espesor de carpeta por el mismo deterioro de la misma.
- Como recomendación en el proceso constructivo de las actividades ejecutadas se indican labores que no tienen alcance en el contrato, se solicita revisar cuidadosamente estas descripciones.
- Se solicita complementar el cuadro relacionando los ensayos que aplican para la rodadura asfáltica e indicar la norma.
- Se evidencian firmas pendientes por parte de los profesionales de obra.
- En el informe de implementación del plan de manejo ambiental formato 112-ECP-FR-016, se solicita al contratista verificar el diligenciamiento de los programas ambientales en el caso de:
  - Manejo integral de residuos sólidos versus el soporte en el informe ambiental.
  - Explotación de fuentes de materiales versus el soporte en el informe ambiental.
  - Programa de higiene y salud ocupacional. SI APLICA
- Se solicita diligenciar las casillas del formato 112-ECP-FR-016 SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES

- Aclarar el anexo sobre el reporte de ensayo No. AMC-269089, correspondiente al componente ambiental.

OBSERVACIONES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA MEZCLA ASFALTICA

- De acuerdo a las jornadas de trabajo, en el periodo de agosto, se solicita anexar los ensayos correspondientes de los días 29 y 30, en los cuales hubo instalación de mezcla asfáltica.
- Se solicita anexar el certificado del cemento asfaltico.
- De acuerdo al avance del periodo y de la calidad del producto terminado, se solicitan los ensayos correspondientes; compactación, espesor, planicidad, etc.
- Anexar el diseño de mezcla - Marshall

OBSERVACIONES TÉCNICAS – INFORMES SST

Se considera indispensable la presentación de informes mensuales de Seguridad y Salud en el Trabajo **(SST)** ante la Interventoria, con una estructura técnica estandarizada, que permita documentar de manera detallada, clara y verificable las actividades ejecutadas en campo.

Estos informes deben estar alineados con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo **(SG-SST)**, así como con el alcance y requerimientos contractuales del proyecto, garantizando el seguimiento efectivo de las condiciones de seguridad, el cumplimiento normativo y la trazabilidad de la gestión preventiva durante la ejecución de la obra.

Se hace especial énfasis en que todas las actividades deben estar debidamente documentadas y soportadas con evidencias verificables (fotográficas, registros, formatos diligenciados, entre otros), conforme a la normatividad vigente en materia de SST y a los compromisos contractuales establecidos.

- **Planilla de SS Profesional SST**

Adicionalmente, se evidencia en los informes presentados para la AIM la planilla de seguridad social del profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Sr. Martín Clavijo, quien figura en la tabla de personal profesional asignado a los frentes de obra de **Cubarral**.

Es importante visualizar la trazabilidad y control en el cumplimiento de sus funciones, dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo **(SG-SST)** y a las obligaciones legales en materia laboral.

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

- **PMT**

Respecto al Plan de Manejo de Tráfico **(PMT)**, se considera indispensable que el informe incluya una descripción detallada sobre su implementación y despliegue en campo, especificando la ubicación, características técnicas y condiciones de instalación de la señalización vial. Asimismo, se requiere el soporte documental correspondiente, mediante evidencias fotográficas, que permitan verificar la correcta instalación y funcionamiento del **PMT** en los distintos tramos de obra, asegurando así una adecuada gestión del tránsito y la seguridad vial durante la ejecución del proyecto.

INFORME OBRA (septiembre 2025):

OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL

- Las casillas que no sean diligenciadas, se recomiendan colocar no aplica, N/A.
- De acuerdo a lo programado se evidencia que el tiempo de ejecución del proyecto corresponde a seis (6) meses, se solicita corregir en el cuadro donde se registra el tiempo de inicio y terminación del proyecto.
- Se recomienda en mesa técnica en conjunto con la Interventoría, revisar el avance de obra para el periodo de septiembre y lo correspondiente a lo programado del proyecto.
- En la relación de correspondencia enviada y recibida, se solicita al contratista relacionar solo la correspondencia del proyecto de Cubarral o correspondencia a fin con el contrato en general. Eliminar lo correspondiente al proyecto de Granada.
- Se solicita al contratista relacionar los comités de obra de acuerdo al periodo que reportan.
- En el informe se enuncia CARGUES AL SISTEMA SIGA, sin embargo, no complementan lo corresponde a este en relación a la descripción del párrafo.
- En el capitulo de problemas presentados, se relaciona la problemática del cierre de la vía Bogotá – Villavicencio, teniendo en cuenta que incidió en suspensión de jornadas de trabajo por la falta de abastecimiento del cemento asfaltico y así se registró en bitácora.
- Revisar la concordancia de la información en la página 7 y 8 con relación al registro del clima.
- En relación al espesor del fresado se indica un espesor aprobado por la Interventoría, sin embargo, en campo se han evidenciado algunos tramos que técnicamente no se pudieron fresar en ese espesor, debido a la falta de espesor de carpeta por el mismo deterioro de la misma.
- Con respecto a las abscisas del fresado en la pagina 11, se solicita actualizar de acuerdo al avance del periodo y lo consignado en bitácora.
- Se solicita complementar el cuadro relacionando los ensayos que aplican para la rodadura asfáltica e indicar la norma.
- En el capitulo 4, MANEJO AMBIENTAL, se solicita retirar las acciones de control de emisión de polvo y material particulado y protección de cuerpos de agua y drenaje.
- Se solicita en el cuadro resumen de la implementación del PAGA, en la casilla OBSERVACIÓN/ACCIÓN, indicar a manera de resumen la acción que se implementó

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

en el periodo. Como Nota debajo del cuadro se recomienda mencionar que cada unas de esas acciones, esta soportada en el informe.

- Se solicita incluir la fecha de aprobación de las pólizas iniciales 14/02/2025.
- Se solicita diligenciar las casillas del formato 112-ECP-FR-016 SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES
- Se solicita anexar el certificado de calibración de la estación topográfica, teniendo en cuenta que en campo se evidenció el levantamiento topográfico del avance con dicho equipo.

OBSERVACIONES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA MEZCLA ASFALTICA

- En el diseño Marshall, se especifica que el cemento Asfaltico es (60/70) Apiay Ecopetrol, sin embargo, para el periodo que se reporta, la Interventoría tiene conocimiento del uso del cemento Asfaltico de Barrancabermeja, se solicita aclarar o en su defecto presentar el diseño Marshall con este tipo de cemento Asfaltico.
- Se solicita anexar el certificado del cemento asfaltico.
- Se solicita el certificado de la emulsión asfáltica CRR-2
- Los ensayos de calidad de la mezcla asfáltica están de acuerdo a las jornadas de trabajo, sin embargo, se solicita al Contratista mejorar la presentación o impresión de los ensayos, no esta legible y se dificultad la revisión.
- De acuerdo al avance del periodo y de la calidad del producto terminado, se solicitan los ensayos correspondientes; compactación y verificación del espesor etc.
- Se solicita el certificado del laboratorio o el documento que acredite la trazabilidad de su operación.

OBSERVACIONES DE CONTROL SST

- Corroborar la información contenida en las planillas de seguridad social frente al acta de relación de personal vinculado al proyecto, garantizando coherencia y actualización de los datos.
- En la tabla correspondiente a la relación de actividades realizadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se deberá completar la casilla de observaciones con la información pertinente.
- Incluir el informe técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) como soporte documental para verificación por la interventoría.
- Adjuntar soporte fotográfico que evidencie:

- La entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) y dotación al personal.
- La realización de inspecciones preoperacionales a la maquinaria utilizada en obra.
- Evidencias fotográficas de la Señalización o PMT, en los diferentes tramos a intervenir.

Se solicita al Contratista mejorar la presentación o impresión de algunos formatos de las preoperacionales, no está legible y se dificultad la revisión.

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

En complemento a lo anteriormente expuesto, y conforme a la revisión documental y técnica realizada, se formulan las siguientes observaciones:

- En el plan de cobros, la carpeta impide la visualización completa del formato, debido a que este fue impreso con márgenes que obstaculizan la correcta lectura y verificación de su diligenciamiento.
- Corregir en la memoria de cálculo del ítem 15.1 el nombre del capítulo, a fin de garantizar coherencia con la estructura contractual y técnica del proyecto.
- Revisar y ajustar, de manera general, el abscisado en las memorias de cálculo, ya que en algunos partes no corresponde con la información técnica presentada.
- Se le solicita al contratista los certificados de calibración de la estación topográfica utilizada en campo.
- Se le solicita al contratista de obra anexar los planos "record" elaborados conforme al levantamiento topográfico y a la ejecución real de las actividades de obra a la fecha del presente cobro, con el propósito de verificar y validar el avance físico reportado, atendiendo el alto porcentaje de ejecución alcanzado.

  Cabe resaltar que el avance registrado para el presente cobro corresponde aproximadamente al 86% del total del proyecto, acercándose al 90%, lo cual evidencia el estado avanzado en la ejecución contractual y fundamenta la solicitud de los planos "record". En este sentido, se requiere la entrega oportuna de dichos documentos, conforme a lo dispuesto en las obligaciones contractuales, con el fin de garantizar el correcto cierre técnico y documental del contrato.
- Se le solicita al contratista los certificados de calibración de los equipos de medición de temperatura utilizadas para la mezcla asfáltica.
- Verificar y armonizar la información relacionada con el personal, conforme a lo establecido en el desglose del P.A.G.A., la planilla de pago y el personal reportado en campo, toda vez que se evidencian inconsistencias, especialmente en el caso del profesional SISO.
- Los formatos de inspección a equipos, algunos no cuentan con firmas y otros son imposibles de visualizar.

Por otra parte, y con base en la revisión del informe ambiental y sus anexos, se formulan los siguientes comentarios técnicos:

- Los informes carecen de información básica del proyecto como, por ejemplo: localización, relación de permisos y/o trámites adelantados ante entidades, Descripción del proyecto.

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

- La información reportada de implementación de cada uno de los programas debe ser detallada describiendo cada una de las acciones realizadas, durante periodo informado, además debe venir con un soporte y/o evidencia fotográfica.

- La forma de redacción del informe debe ser verbos pasados, con el fin de evidenciar el cumplimiento de las acciones los tiempos establecidos del periodo informado.

- El informe debe tener conclusiones, donde se especifique si se cumplió con las actividades planeadas y cuál fue el avance de los programas.

- Relacionar el avance de la ejecución del presupuesto del PAGA.

- Las fotografías deben tener título o deben reflejar la acción antes descrita, preferiblemente con marca de agua de fecha y hora.

Sin otro particular, agradecemos su valiosa colaboración y disposición para atender las solicitudes presentadas

Cordialmente,

ROSANETH ANGARITA GOMEZ
C.C. No. 1.018.497.426 de Bogotá
R/L CONSORCIO

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

ACTAS DE COMITÉ

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 5C
VILLAVICENCIO-META
consorciointervialcubarral@gmail.com

2268

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	6	16	10	2025	9:00a.m	11:00a.m

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

☐Gestión Gerencial	☒Ejecución y control de proyectos	☐Gestión de Talento Humano
☐Gestión Estratégica	☐Gestión Jurídica	☐Gestión de Evaluación y Control
☐Gestión de Proyectos	☐Gestión Documental	☐Tecnología de la Información
☐Gestión de Contratación	☐Gestión Financiera	☐ Gestión Logística

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

☒Obra	☐Convenio Solidario	☐Mínima Cuantía
☒Interventoría	☐Convenio Interadministrativo	☐Urgencia Manifiesta
☐Prestación de Servicios	☐Consultoría	☐Contratación Directa

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO
N°: 558 de 2024 OBRA
N°:169 de 2025 INTERVENTORIA

PROYECTO N°: 2024005500266

OBJETO:

REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS Y PUENTES
CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
JHON JAIRO IBARRA CAICEDO	SUPERVISIÓN	AIM
ALEX FERNANDO MORA CASTRO	APOYO TÉCNICO AIM	AIM
WILMAN A. FUENTES BOHORQUEZ	APOYO A LA SUPERVISIÓN	AIM
FERNANDO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO VÍAS PUENTES

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

2269

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	6	16	10	2025	9:00 a.m	11:00 a.m

EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO VÍAS PUENTES
JUAN CAMILO POSADA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CUBARARL 2024
YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CUBARARL 2024

III. OBJETIVO

Realizar control y verificación en campo de las actividades ejecutadas desde la abscisa K10+720 al K61+881 y K3+581 al K4+300.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1			
2			
3			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

2270

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	6	16	10	2025	9:00 a.m	11:00 a.m

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Se inicia recorrido en la abscisa K4+300 al K5+581 observando que el contratista ya termino la instalación de mezcla Asfaltica MDC-19.

En el tramo K6+881 al K10+920 también se observa la instalación completa de carpeta Asfaltica en un ancho de calzada de 6,80m.

El contratista de obra informa que iniciará actividades del sello de fisuras entre las abscisas K6+881 al K5+581, el cual corresponde aproximadamente a 1300m.

Se observa al personal con la debida dotación cuadrilla de Asfalto y vialistas en el tramo del sello de fisuras.

Adicional se presenta ante el equipo de la Gobernación y el Gerente del AIM el avance del proyecto, destacando que esta terminada la Instalación de la mezcla Asfaltica contratada en el proyecto.

El Alcalde del municipio de Cubarral, da las gracias a la Gobernación y solicita se estudie la posibilidad de adicionar recursos al proyecto para fresar e instalar carpeta Asfaltica en el tramo sin

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

2291

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	16	16	10	2025	9:00 a.m	11:00 a.m

Intervención que corresponda a 4,3Km aproximadamente, por lo cual el Gerente del AIM da la directriz al contratista de obra e Interventoría de presentar una propuesta solidad y coherente de las actividades y cantidades pendientes por incluir a fin de Estudiar y evaluar la viabilidad de un adicional en este proyecto.

Se da por terminado el recorrido en la vía, siendo las 11:00 a.m del día 16 de octubre de 2025.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

2272

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	\	16	10	2025	9:00 a.m	11:00 a.m

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1			
2			
3			

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

2273

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio		16	10	2025	9:00 a.m	11:00 a.m

VII. PRÓXIMA REUNIÓN
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR:
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN:

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	FIRMA
Eduardo Martínez	
Carlos F Padilla	
Wilmar Fuentes Bellmonte	
Cabella Herrera Alcaraz	
Alex Fernando Mora Castro	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

2274

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

REGISTRO DE ASISTENCIA

102-SIG-FR-007-V04
23/08/2024

Objetivo:			
Fecha:		Hora de Inicio:	
Lugar:		Hora de Terminación:	

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREA/EMPRESA/SECTOR/ MUNICIPIO/BARRIO	Nº CELULAR	EMAIL O DIRECCIÓN	FIRMA
	Eduardo Martinez	Guamito	3102239178	Proyectos@	Eduardo M
	Cristian F Padilla	Interventoria	1748913	Interventoria6.6gmail.com	Cris
	Ronald Tellez	Fortalecimiento Institucional	3102300756	interventoriael@gmail.com	
	Alex Fernando Nova C	Apoyo Supervision	3105140515	Interventoriasdelameta@ya	
	WILMAN FUENTES B.	APOYO SUPERVISION	313 422 1979	wilmanfuentes.b6@gmail.com	
	Jose Angelo Canon Rente	Consorcio Infraval Cobra	3162345399	canonrente@Gmail.com	
	IVAN PULIDO VARGAS	CONSORCIO VP	311-5134378	ivanpulidovargas@yahoo.es	Ivan Pulido Vargas
	Estelle Herrera Alvarez	consorcio interval	3202066243	ivanpulidovargas@gmail.com	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 Piso 8
CC Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

ACTAS DE COMITÉ

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 5C
VILLAVICENCIO-META
consorciointervialcubarral@gmail.com

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio		28	10	2025	3:30pm	

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

☐Gestión Gerencial	☒Ejecución y control de proyectos	☐Gestión de Talento Humano
☐Gestión Estratégica	☐Gestión Jurídica	☐Gestión de Evaluación y Control
☐Gestión de Proyectos	☐Gestión Documental	☐Tecnología de la Información
☐Gestión de Contratación	☐Gestión Financiera	☐ Gestión Logística

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

☐Obra	☐Convenio Solidario	☐Mínima Cuantía
☐Interventoría	☐Convenio Interadministrativo	☐Urgencia Manifiesta
☐Prestación de Servicios	☐Consultoría	☐Contratación Directa

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°:	PROYECTO N°: 2024005500266

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL. META

CONTRATISTA:

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Wilmar Fuentes	Apoyo a la supervi	AIM
Alex Fernando Mora	Apoyo a la supervi	AIM
Oscar Velez	Coordinador obra	Contratista de obra
Juan Camilo Pinzón	Director de interven	Interventoría
JHON Ibarra	Supervisor	AIM

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

22747

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA

III. OBJETIVO

Seguimiento a la ejecución y control del proyecto y estudio de informes mensuales de obra e interventoría

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1			
2			
3			
4			
5			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Se inicia el comite de obra. sobre las 3:30pm en la sala de juntas de la Agencia para la infraestructura del meta, con el acompañamiento de la interventoria contratista, equipo de supervisión del AIM, supervisor del AIM.

El ingeniero JHON Julio supervisor del contrato de interventoría manifiesta que la convocatoria del comite obedece al seguimiento de entregas mensuales de los informes de obra e interventoria.

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA

El contratista de obra establece el compromiso de subsanar el informe mensual No1 del mes de agosto a la interventoría el miercoles 29 de octubre de 2025, la interventoria se pronuncia sobre la verificación del informe de obra el viernes 31 de octubre de 2025.

La interventoría en comite socializa el esquema de lo que se ha ejecutado a la fecha de un total de 5,12 KM de MDC-19.

K10+720 a K9+340 = 1380 m e=0,075m
K9+340 a K7+600 = 1740 m e=0,10m
K7+600 a K6+881 = 719 m e=0,075m
K5+581 a K4+300 = 1281 m e=0,075m

por el apoyo a la supervisión Wilmar Fuentes se socializan las observaciones punto a punto detallando las observaciones y se establece el nuevo compromiso de la entrega de los informes los primeros (5)días de cada mes hábil y la interventoría se pronuncia a los (3) tres días hábiles + 2 días más por el contratista para subsanar el caso que se presenten observaciones.

El contratista manifiesta la inconformidad de la comunidad de dejar (interventoria) intervenir varios (all) puentes de manera simultanea

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

2279

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA

Se encuentra en intervención el puente 3 frente al puente 1 se tienen avances en demoliciones, el contratista tiene 4 bombas de 3" la cimentación del puente 1 tiene varios metros adicionales de profundidad.
Se da cierre al comité de obra con los compromisos que se establecen a continuación.

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	subsanar informe mensual por contratista.	Contratista	29 de octubre de 2025
2	verificación de subsanación interventoria a obra	Interventoria	31 de octubre de 2025
3	entrega de soportes de informe de seguimiento	Interventoria	29 de octubre de 2025
4			
5			
6			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

2280

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA

VII. PRÓXIMA REUNIÓN
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR:
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN:

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	**FIRMA**

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

2281

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

REGISTRO DE ASISTENCIA

102-SIG-FR-007-V04
23/08/2024

Objetivo:	Comité Obra JSB-2024		
Fecha:	29 de Octubre 2025	**Hora de inicio:**	3:00 pm
Lugar:	AIM	**Hora de Terminación:**	

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREA/EMPRESA/SECTOR/ MUNICIPIO/BARRIO	Nº CELULAR	EMAIL O DIRECCIÓN	FIRMA
1.	Wilmon A. Fuentes	Apoyo AIM	3134225929	wilmon.fuentes@gmail.com	
2.	Gustavo Betancur L	Apoyo AIM	3113467755	jonar720hotmail.com	
3	Rosa Fabiola Muñoz C.	Interventoría	3102307556.	fabiola.1491@hotmail.es	
4	Jhon Jairo Irrava	AIM	3102924860		
5	Alex Fernando Mora C.	Apoyo AIM	3103140315	[illegible]	
6	Juan Camilo Parra	Interventoría	3003195090		
7	Omar Fernando Vélez	Contratista	3142258535	adonaroviboy@yahoo.es egmail.com	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 Piso 8
CC Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2282

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

LABORATORIOS

URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 5C
VILLAVICENCIO-META
consorciointervialcubarral@gmail.com

12283

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

INFORME DE GESTION INTERVENTORIA No. 3

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 169 DE 2025

CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META

CONTRATO DE OBRA No: 558 DE 2024

PROYECTO No: 2024005500266

REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META.

PERIODO: 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2025
CUBARRAL - META

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 5C
VILLAVICENCIO-META
consorciointervialcubarral@gmail.com
Cel.: (+57) 300 3475090

2284

ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA MEZCLA ASFÁLTICA

MDC-19

Norma de referencia: Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS – 2013.

---

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la revisión de los ensayos de laboratorio presentados por el Contratista **CONSORCIO VÍAS Y PUENTES**, se efectuó la verificación del control de calidad de la mezcla asfáltica tipo MDC-19, correspondiente a las cinco (5) jornadas de producción y colocación comprendidas entre el 01 y el 30 de octubre de 2025.

Los resultados y registros se encuentran anexos en el informe mensual de obra y se analizaron en función de los criterios de aceptación establecidos en las Especificaciones INVIAS 2013, artículo 450-13, y la fórmula de trabajo del diseño Marshall aprobada para el proyecto.

---

2. RESULTADOS DE ENSAYOS Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

2.1 GRANULOMETRIA

Se registran las granulometrías del material pétreo, procedente de la planta Rio Guayuriba, de acuerdo con las jornadas laboradas en el periodo, evidenciando el cumplimiento del material en cada uno de los tamices desde el tamiz ¾" hasta el tamiz No. 200 de acuerdo con la tabla 450-6 FRANJAS GRANULOMETRICAS, ART. 450-13.

2.2 CONTENIDO DE ASFALTO

Todas las muestras cumplen el contenido de asfalto y están dentro de la tolerancia que exige la especificación (0.3%) de acuerdo con la fórmula de trabajo del diseño.

2.3 VACIOS CON AIRE (Va)

El reporte de calidad de mezcla incluye el registro de la gravedad especifica bulk, y se observa que, en todos los reportes de las jornadas presentadas, está cumpliendo el criterio de aceptación para una capa de rodadura y un nivel de tránsito NT3.

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

2.4 ESTABILIDAD (N)

En todos los ensayos realizados, la estabilidad obtenida supera el 90% del valor de referencia correspondiente a la mezcla del diseño Marshall (18.580 N), cumpliendo con el requisito mínimo exigido.

2.5 FLUJO (mm)

El flujo medido en las probetas esta entre el 80% y 120% del valor obtenido en la fórmula de trabajo "DISEÑO MARSHALL" y de acuerdo con los criterios establecidos en la especificación INVIAS, ARTICULO 450-13 tabla 450-10.

2.6 RELACION ESTABILIDAD / FLUJO (KN/mm)

Todos los registros del control de calidad de la mezcla, con relación a este ensayo están cumpliendo el criterio de aceptación de la norma.

2.7 CEMENTO ASFALTICO

El material bituminoso empleado en la mezcla corresponde a un cemento asfáltico 60/70 – Apiay, conforme al diseño original del método Marshall. Sin embargo, durante el periodo evaluado se utilizó cemento asfáltico proveniente de Barrancabermeja, lo cual difiere de la fuente empleada en la elaboración del diseño de la mezcla, originalmente realizado con material producido por Apiay – Ecopetrol.

3. CONCLUSIONES

Los resultados de los ensayos de control de calidad correspondientes al periodo evaluado indican que la mezcla asfáltica tipo MDC-19 cumple en general con los criterios de aceptación establecidos en las Especificaciones INVIAS 2013 y en la fórmula de trabajo aprobada para el proyecto.

YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° M. P.:25202-198320 CND

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA

112-ECP-FR-018-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024500500266
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACION DE 10,72 KM DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META".		
OBJETO DEL PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y PUENTES R/L RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA		
NIT:	NIT: 901.901.935 - 6		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	599 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024 NIT: 901.930.634-6 R/L ROSANETH ANGARITA GOMEZ		

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Fecha	Ensayo realizado por C / I*	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Resultados: Rango Cumplimiento	Resultados: Porcentaje Obtenido %	Análisis de Resultados: Cumple S/N	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
15/10/2025	C	Mezcla Densa en Caliente MDC-19	Análisis Granulométrico 1 1/2	Cubarral K4+300	NHSQ INGENIERIA SAS	E-782	100 - 100	100%	S	
			Análisis Granulométrico 1"			E-782	100 - 100	100%	S	
			Análisis Granulométrico 3/4"			E-782	100 - 100	100%	S	
			Análisis Granulométrico 1/2"			E-782	80 - 95	90%	S	
			Análisis Granulométrico 3/8"			E-782	70 - 88	81%	S	
			Análisis Granulométrico #4			E-782	49 - 65	55%	S	
			Análisis Granulométrico #10			E-782	29 - 45	41%	S	
			Análisis Granulométrico #40			E-782	14 - 25	21%	S	
			Análisis Granulométrico #80			E-782	8 - 17	9%	S	
			Análisis Granulométrico #200			E-782	4 - 8	5%	S	
			Análisis Granulométrico pasa 200			E-782	—	0%	S	
			Estabilidad			E-749	9000 (N)	11228		El resultado cumple con la norma, pero no cumple con el valor del diseño Marshall.
			Extracción Cuantitativa de asfalto			E-732	4.7% - 5.3%	5.6%		El porcentaje de asfalto en la muestra está 0.3% por encima de la tolerancia de acuerdo a la formula de trabajo 5%
			Flujo			E-749	2.0 - 3.5	3.3	S	
			Vacios en lo agregados minerales			E-736	≥ 15%	16.0	S	
			Vacios llenos de Asfalto (VFA)			E-799	65% - 75%	73.9	S	
			Gravedad Especifica Máx. (RICE)			E-735	----	2.46	S	
			Vacios de Aire			E-736	4 - 6	4.2	S	
			Relación Estabilidad / Flujo			E-748	3.0 - 6.0	3.5	S	

* Contratista / Interventor

Se anexan los soportes de las diferentes pruebas y ensayos de laboratorio

COMENTARIOS DEL ESPECIALISTA AL RESULTADO DE LOS ENSAYOS: Con base en los resultados de los ensayos de laboratorio realizados sobre la mezcla asfáltica tipo MDC-19, se evidencia que el contenido de asfalto excede los límites de tolerancia establecidos en la fórmula de trabajo y que el valor de estabilidad Marshall obtenido (11.228 N) se encuentra por debajo del valor de diseño (16.500 N).

Firma
ROSANETH ANGARITA GOMEZ
**REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 09/1037-0517182 CND

Firma
JUAN CAMILO POSADA VARELA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 83202-294712 CND

Firma
YEMLY GISELLE HERRERA ALVAREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-196320 CND

** Nota: En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros : Representante Legal o Apoderado
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2257

NHSQ SAS INGENIERIA NIT: 901047361-5	CONSECUTIVO: ASF-034-V0599-25 PAGINAS: 1 DE 8	

RESULTADOS DE LAS MUESTRAS DE ASFALTO (MDC-19)

Este documento no debe ser modificado, copiado o difundido por ningún medio a persona alguna no autorizada sin el permiso o aprobación del propietario. El solicitante o usuario será responsable por cualquier uso indebido. Este documento no es válido sin la firma y sello en original.

DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	FECHA DE ENTREGA:
META	CUBARRAL	20/OCTUBRE/2025

SOLICITANTE:	PROYECTO:
CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024 NIT: 901930634-8	REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META.

ELABORÓ:	REVISÓ	APROBÓ:
ING. ANA LILIANA PAN U. Analista Especialista Especialista en Vias y Transporte	**ING. HAIVER DAVID OLIVO M.** Coord. de Ingenieria y laboratorio Especialista en Estructuras	NHSQ SAS INGENIERIA NIT: 901047361-5 **ING. HAIVER DAVID OLIVO M.** Coord. de Ingenieria y laboratorio Especialista en Estructuras

LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS ORIGINAL

2288

Villavicencio, 20 de octubre de 2025

Señores:
CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024
NIT: 901930634-8
Ciudad.

Ref. REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META.
Tema: Resultados de las muestras de asfalto (MDC-19).

Cordial saludo,

Por medio del presente informe nos permitimos dar a conocer los resultados de los ensayos que se le realizaron a la muestra de la mezcla densa en caliente (MDC-19) recolectada y trasportada a nuestras instalaciones el día 15 de octubre del presente año. Todo esto de acuerdo con los requerimientos exigidos por la norma INVIAS -22.

En la tabla 1 se indica la cantidad de muestras que se recolectaron por jornada de trabajo, fecha y la ubicación.

Tabla 1. Cantidad de muestras para granulometría y extracción de asfalto

FECHA	MUESTRAS (und)	UBICACIÓN
15/10/25	1	KD4+340

En la tabla 2 se relaciona los ensayos que se efectuaron a las muestras de asfalto y la cantidad de muestras ensayadas.

Tabla 2. Ensayos efectuados a las muestras de asfalto

ENSAYOS		NORMA	CANTIDAD (und)
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS		I.N.V. E – 782 – 13	1
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS EN CALIENTE PARA PAVIMENTOS		I.N.V. E – 732 – 13	1
RESISTENCIA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL	ESTABILIDAD	I.N.V. E – 748 – 13	4
	FLUJO		4
PORCENTAJE DE VACÍOS DE AIRE EN MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS		I.N.V. E – 736 – 13	4
VACÍOS LLENOS DE ASFALTO (VFA)		I.N.V. E – 799 – 13	4
RELACIÓN ESTABILIDAD/FLUJO		I.N.V. E – 748 – 13	4
VACÍOS EN LOS AGREGADOS MINERALES (VMA)		I.N.V. E – 799 – 13	4
GRAVEDAD ESPECIFICA MÁXIMA (RICE)		I.N.V E – 735 – 13	1

RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados obtenidos fueron comparados con los ensayos de laboratorio entregado por la empresa que se encarga de la elaboración de la mezcla.

Tabla 3. Resultados ensayos de laboratorio (Muestra1)

PARÁMETRO O ENSAYO		ESPECIFICACIÓN INVIAS – NT3 ART. 450	PROMEDIO DE RESULTADOS OBTENIDOS			
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS I.N.V. E–782–13		VER CURVA	VER CURVA GRADACIÓN DE LA MUESTRA # 1	—	—	—
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS EN CALIENTE PARA PAVIMENTOS I.N.V. E–732–13		5.0% ±0.3	PROMEDIO % 5.6%	—	—	—
RESISTENCIA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL I.N.V. E – 748 – 13	ESTABILIDAD	9000 (N)	11226	—	—	—
	FLUJO	2.0 mm-3.5 mm	3.3	—	—	—
VACÍOS DE AIRE EN MEZCLAS ASFÁLTICAS I.N.V. E – 736 –13		4% A 6%	4.2	—	—	—
VACÍOS EN LOS AGREGADOS MINERALES EN MEZCLAS ASFÁLTICAS I.N.V. E – 736 –13		≥ 15%	16.0	—	—	—
VACÍOS LLENOS DE ASFALTO (VFA) I.N.V. E–799–13		65%-75%	73.9	—	—	—
RELACIÓN ESTABILIDAD / FLUJO (kN/mm) I.N.V. E–748–13		3kN/mm-6kN/mm	3.5	—	—	—
GRAVEDAD ESPECIFICA MÁXIMA (RICE) I.N.V. E–735–13		——	2.481	—	—	—

*El material fue identificado, recolectado y transportado a nuestras instalaciones por ustedes

El presente informe consta de ocho (08) páginas y no debe reproducirse sin la aprobación por escrito del laboratorio, los resultados contenidos en él se relacionan únicamente a las muestras ensayadas.

Espero que todas las labores realizadas sean de su entera satisfacción, cualquier inquietud no dude en comunicarse con nosotros.

Recuerde que usted es lo más importante para nuestra empresa.

Atentamente,

NHSQ GAS INGENIERIA
Ing. HAIVER DAVID OLIVO M.
Especialista en Estructuras
Nit. 901.047.361-5
Coord. de Ingeniería y Laboratorio
NHSQ INGENIERIA S.A.S

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
ORIGINAL

2290

Anexo 1. Resultados de laboratorio

NHSQ INGENIERIA

NIT: 901306734-6

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

INFORME DE RESULTADOS

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 282 - 13	10/03/2025	FLAB-072-V1


PROYECTO:	REHABILITACION DE 10,72 KM. DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META	FUENTE DE MATERIAL:	ECOBRAS
DIRIGIDO A:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024	DESTINO:	MDC-19
NIT:	901306634-8	CONSEC. DE INFORME:	ASF-034-V0599-25
MUNICIPIO:	CUBARRAL	FECHA DE RECEPCIÓN:	15-oct-25
DEPARTAMENTO:	META	FECHA DE ENSAYO:	17-oct-25
TIPO DE MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA (MDC-19) (MUESTRA 1) (15-10-25) (604+340)	FECHA DE EMISIÓN:	20-oct-25

CONDICIONES AMBIENTALES:				EQUIPOS UTILIZADOS:			
TEMPERATURA °C:	26	HUMEDAD RELATIVA %:	74	HORNO Nº:	EQ-001	BALANZA Nº	EQ-029

Nº DE RECIPIENTE:	0
MASA DEL RECIPIENTE	0,0 g
MASA INICIAL SECA + RECIPIENTE	1824,0 g
MASA INICIAL SECA	1824,0 g
MASA FINAL SECA	1823,0 g

RESULTADOS								
NORMA	MODULO DE FINURA	TAMAÑO MAXIMO DEL MATERIAL		TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DEL MATERIAL		D10 (mm)	—
ART-450-22						D30 (mm)	—
BANDA GRANULOMETRICA	4,1	Pulg	mm	Pulg	mm	D60 (mm)	—
MDC-19		3/4"	19,0	1/2"	12,5	Cu	—
						Cc	—

TAMIZ		MASA RETENIDA (g)	PORCENTAJE RETENIDO (%)	PORCENTAJE RETENIDO ACUMULADO (%)	PORCENTAJE PASA (%)	PARAMETROS DE LA NORMA	
Pulgadas	mm					INFERIOR	SUPERIOR
2"	50.0	0,0	0,00%	0,00	100%	100%	100%
1 1/2"	37.5	0,0	0,00%	0,00	100%	100%	100%
1"	25.0	0,0	0,00%	0,00	100%	100%	100%
3/4"	19.0	0,0	0,00%	0,00	100%	100%	100%
1/2"	12.5	178,3	9,78%	9,78	90%	80%	95%
3/8"	9.5	164,5	9,02%	18,80	81%	70%	88%
Nº4	4.75	471,5	25,86%	44,67	55%	49%	65%
Nº10	2.00	268,7	14,74%	59,41	41%	29%	45%
Nº40	0.425	361,0	19,80%	79,21	21%	14%	29%
Nº80	0.18	223,0	12,23%	91,44	9%	8%	17%
Nº200	0.075	62,8	3,44%	94,89	5%	4%	8%
	FONDO	93,2	5,11%	100,00	0%	CALCULO ERROR	0,05%
	TOTAL	1823,0	100,00%			GRADO DE ACEPTACIÓN	< 0,2%

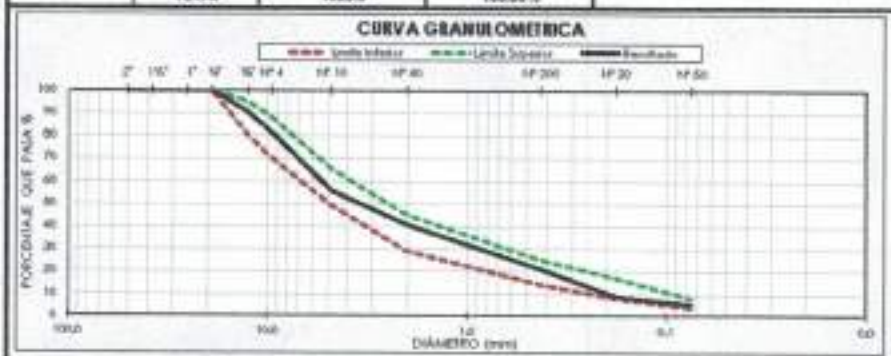



OBSERVACIONES:

EJECUTÓ	REVISÓ Y APROBÓ
DANIEL ALEXANDER QUINTERO MORALES	Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Laboratorista	Coordinador de Ingeniería y Laboratorio
PROCESÓ	
Ing. ANA LILIANA PAN URIBIOLA	
Analista Especialista	

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO EN EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. BIC Y VIGENTE EN EL MOMENTO.
* LA TOMA DE MUESTRA Y LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DE LA MISMA, FUERON SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE POR LO CUAL EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE LA VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE EN ESTE INFORME.
* ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
* ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
* EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. NO EMITE OPINIONES NI INTERPRETACIONES EN SUS INFORMES.

2292

NHSQ INGENIERIA

NIT: 901067261-6

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

INFORME DE RESULTADOS

EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 732 - 13	10/03/2025	F-LAB-017-V9

PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META	**FUENTE DE MATERIAL:**	ECOBRAS
DIRIGIDO A:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024	**DESTINO:**	MDC-19
NIT:	901190634-5	**CONSEC. DE INFORME:**	ASF-034-V05/19-25
MUNICIPIO:	CUBARRAL	**FECHA DE RECEPCIÓN:**	15-oct-25
DEPARTAMENTO:	META	**FECHA DE ENSAYO:**	17-oct-25
TIPO DE MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA (MDC-19) (MUESTRA 1) (15-10-25) (604+340)	**FECHA DE EMISIÓN:**	20-oct-25

CONDICIONES AMBIENTALES:				EQUIPOS UTILIZADOS:			
TEMPERATURA °C:	28	**HUMEDAD RELATIVA %:**	76	**HORNO N°:**	EQ-001	**BALANZA N°**	EQ-029

DATOS DEL ENSAYO		TAMAÑO DE LA MUESTRA (TABLA 732-1 DE LA NORMA DE REFERENCIA)		
MÉTODO DE ENSAYO:	A	TAMAÑO NOMINAL MÁXIMO DEL AGREGADO		MASA MÍNIMA DE LA MUESTRA
REACTIVO O SOLVENTE UTILIZADO:	GASOLINA	mm	**PG.**	kg
HUMEDAD		4,75	**N°. 4**	0,5
VOLUMEN DE AGUA EN LA TRAMPA (A):	0,0 ml	9,50	**3/8"**	1,0
MASA DE LA MUESTRA (B):	1933,9 g	12,50	**1/2"**	1,5
AGUA, % EN MASA:	0,00 g	19,00	**3/4"**	2,0
VOLUMEN DE DISUELTE EN LA TRAMPA (C):	0,0 ml	25,00	**1"**	3,0
Gs DEL DISUELTE A 25° C (77° F) (D):	0,74	37,50	**1-1/2"**	4,0
MASA DE LA MUESTRA (E):	1933,9 g	Cuando la masa del espécimen de ensaye exceda la capacidad del equipo empleado (para un método particular), se puede dividir y ensayar en porciones apropiadas, combinando luego adecuadamente los resultados para el cálculo del contenido de asfalto.		
DISTILADO VOLÁTIL, % EN MASA:	0,00 g			

CONTENIDO DE ASFALTO	
N° DE RECIPIENTE:	9
MASA DEL RECIPIENTE:	0,0 g
MASA DE LA PORCIÓN DE ENSAYO (W_S):	1933,9 g
MASA DEL AGUA EN LA PORCIÓN DE ENSAYO (W_W):	0,0 g
MASA DEL AGREGADO MINERAL EXTRAÍDO (W_A):	1834,0 g
MASA DEL MATERIAL MINERAL EN EL EXTRACTO (W_E):	0,0 g
CONTENIDO DE ASFALTO:	**5,48 %**

CANTIDAD DE MATERIAL MINERAL EN EL EXTRACTO	
MÉTODO DE ENSAYO:	MÉTODO DE LA CENIZA
MASA DEL RECIPIENTE:	0,0 g
CENIZA EN ALÍCUOTA (G):	0,0 g
VOLUMEN TOTAL (V_T):	500,0 ml
VOLUMEN LUEGO DE REMOVER LA ALÍCUOTA (V_A):	0,0 ml
MASA DEL MATERIAL MINERAL EN EL EXTRACTO (W_E):	0,0 g

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		REVISÓ Y APROBÓ
DANIEL ALEXANDER QUINTERO MORALES		
Laboratorista		
PROCESÓ		
Ing. ANA LILIANA PAN URIBIOLA		**Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO**
Analista Especialista		Coordinador de Ingeniería y Laboratorio

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO EN EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. BIC EVALUADA POR EL CLIENTE.
* LA TOMA DE MUESTRA Y LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DE LA MISMA, FUERON SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, POR LO CUAL EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE LA VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN DADA POR EL CLIENTE EN ESTE INFORME.
* ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
* ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S.
* EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO EMITIRÁ OPINIONES NI INTERPRETACIONES EN SUS INFORMES.

2293

NHSQ ecos INGENIERIA

NIT: 901307261-6

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

INFORME DE RESULTADOS

PESO ESPECIFICO APARENTE Y PESO UNITARIO, ANÁLISIS VOLUMÉTRICO, CONTENIDO DE ASFALTO, DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLA ASFÁLTICA.

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 733, 748, 736 Y 799 - 13	10/03/2025	F-LAB-016-VB

PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META.	**FUENTE DE MATERIAL:**	ECOBRAS
DIRIGIDO A:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024	**DESTINO:**	MDC-19
NIT:	901930634-8	**CONSEC. DE INFORME:**	ASF-034-V0599-25
MUNICIPIO:	CUBARRAL	**FECHA DE RECEPCIÓN:**	15-oct25
DEPARTAMENTO:	META	**FECHA DE ENSAYO:**	17-oct25
TIPO DE MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA (MDC-19) (MUESTRA 1) (15-10-25) (KD4+040)	**FECHA DE EMISIÓN:**	20-oct25

CONDICIONES AMBIENTALES:				**EQUIPOS UTILIZADOS:**			
TEMPERATURA °C:		**HUMEDAD RELATIVA %:**		**HORNO N°:**		**BALANZA N°:**	

DATOS DE LA MUESTRA	**LOCALIZACIÓN**						**PROMEDIO**
	PORCENTAJE DE ASFALTO						
	FECHA DE TOMA						
	BRIQUETA N°	**1**	**2**	**3**	**4**		
MASA DE LAS BRIQUETAS (g)	**AL AIRE**	1231.1	1233.9	1235.3	1227.0		**1231.8**
	INMERSIÓN	716.6	711.2	713.8	712.9		**713.6**
	SSS AL AIRE	1234.5	1235.3	1239.4	1229.3		**1232.6**
PESO ESPECIFICO (g/cm³)	**BULK**	2.377	2.381	2.376	2.376		**2.378**
	MASA UNITARIA	2.370	2.374	2.370	2.369		**2.371**
	TEORICO MÁXIMO	2.481	2.481	2.481	2.481		**2.481**
VOLUMEN TOTAL (%)	**AGREGADOS MINERALES**	83.98	84.11	83.96	83.94		**84.00**
	ASFALTO	11.65	11.67	11.65	11.65		**11.65**
VACIOS CON AIRE (%)	**VACÍOS EN LOS AGREGADOS MINERALES (VMA)**	16.0	15.9	16.0	16.1		**16.0**
	VACÍOS CON AIRE (Va)	4.2	4.1	4.2	4.2		**4.2**
	VACIOS LLENOS DE ASFALTO (VFA)	73.8	74.2	73.7	73.9		**73.9**
ESPESOR DE BRIQUETAS (mm)		64	64	63	64		**63.7**
RESISTENCIA DE LA MEZCLA	**ESTABILIDAD (kN)**	11.49	11.46	11.38	11.49		**11.5**
	FACTOR CORRECCIÓN	1.00	0.96	1.00	0.96		**1.0**
	ESTABILIDAD CORREGIDA (N)	11490	11002	11380	11030		**11326**
	FLUJO (mm)	3.23	3.26	3.24	3.30		**3.3**
	FLUJO (pg*100)	13.11	13.2	12.8	13.0		**13.0**
	RELACIÓN E/F (KN/mm)	3.6	3.4	3.5	3.5		**3.5**

OBSERVACIONES:

EJECUTÓ		**REVISÓ Y APROBÓ**
DANIEL ALEXANDER QUINTERO MORALES		
Laboratorista		
PROCESÓ		Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Ing. ANA LILIANA PAN URRIOLA		Coordinador de Ingeniería y Laboratorio
Analista Especialista		

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO EN EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. SEDE VILLAVICENCIO.
* LA TOMA DE MUESTRA Y LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DE LA MISMA, FUERON SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, POR LO CUAL EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE LA VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN DADA POR EL CLIENTE EN ESTE INFORME.
* ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
* ESTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
* EL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S. NO EMITIRÁ OPINIONES NI INTERPRETACIONES EN SUS INFORMES.

294

NHSQ INGENIERIA

NIT: 901047361-5

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

INFORME DE RESULTADOS

GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA DE LA MEZCLA ASFALTICA PARA PAVIMENTOS

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 735 - 13	10/03/2025	F-LAB-03-V8

PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE 30,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META			**CONSEC. DE INFORME:**	ASF-034-V0699-25
DIRIGIDO A:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024	**NIT:**	901930634-8	**FECHA DE RECEPCIÓN:**	15-oct-25
MUNICIPIO:	CUBARRAL	**DEPEPARTAMENTO:**	META	**FECHA DE ENSAYO:**	17-oct-25
TIPO DE MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA (MDC-19) (MUESTRA 1) (15-10-25) (0.04+340)	**FUENTE DE MATERIAL:**	ECOBRAS	**FECHA DE EMISIÓN:**	20-oct-25

	PROCENTAJE DE ASFALTO (%)	5.7	--	--	--	--
	NÚMERO DE LA MUESTRA	1	--	--	--	--
A	MASA EN EL AIRE DE LA MUESTRA SECA, (g)	1599.7	-	-	-	-
B	MASA DEL PICNOMETRO SUMERGIDO EN AGUA, (g)	-	-	-	-	-
C	MASA DEL RECIPIENTE CON LA MUESTRA, SUMERGIDO EN AGUA, (g)	-	-	-	-	-
D	MASA DE LA TAPA MAS EL PICNOMETRO LLENO CON AGUA A 25ºC, (77ºF), (g)	9192.0	-	-	-	-
E	MASA DEL PICNOMETRO CON LA TAPA, EL AGUA Y LA MUESTRA A 25ºC, (77ºF), (g)	10147.0	-	-	-	-
F	MASA DE LA PLACA DE VIDRIO MAS EL FRASCO LLENO CON AGUA A 25ºC, (77ºF), (g)	-	-	-	-	-
G	MASA DEL FRASCO CON LA PLACA, EL AGUA Y LA MUESTRA A 25ºC, (77ºF), (g)	-	-	-	-	-

$Gmm = \frac{A}{A-(C-B)}$	DETERMINACIÓN EN EL CASO DE PESADOS DENTRO DEL AGUA (MUESTRA EN EL PICNÓMETRO)	-	-	-	-	-
$Gmm = \frac{A}{A+D-E}$	DETERMINACIÓN EN EL CASO DE PESADOS EN EL AIRE (MUESTRA EN EL PICNÓMETRO)	**2.481**	--	--	--	--
$Gmm = \frac{A}{A+F-G}$	DETERMINACIÓN CON EL MATRAZ	-	-	-	-	-

NOTA: SI LA MUESTRA SE ENSAYÓ EN VARIAS PORCIONES, SE INFORMA LA GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA PROMEDIO PONDERADA DE TODAS LAS PORCIONES ENSAYADAS.

OBSERVACIONES:

EJECUTÓ	REVISÓ Y AVALÓ
DANIEL ALEXANDER QUINTERO MORALES	
Laboratorista	
PROCESO	
Ing. ANA ULIANA PAN URRIOLA	Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Analista Especialista	Coordinador de Ingeniería y Laboratorio

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA O MEZCLA ANALIZADA EN EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S., SEDE VILLAVICENCIO.
* LA TOMA DE MUESTRAS Y LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DE LA MISMA, FUERON SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE; POR LO CUAL EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE LA VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN DADA POR EL CLIENTE EN ESTE INFORME.
* ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
* ESTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERIA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S.
* EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO EMITIRA OPINIONES NI INTERPRETACIONES EN LOS INFORMES.

"FIN DEL INFORME"

2025

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

INFORME AMBIENTAL

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 3

AMBIENTAL

BPIN – 2024005500266_CUBARRAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 169-2025

OBJETO DEL CONTRATO

CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO VIAS Y PUENTES

ENTIDAD CONTRATANTE

AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL META

PERIODO:

01 de octubre de 2025 al 31 de octubre 2025

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 5C
VILLAVICENCIO-META
consorciointervialcubarral@gmail.com

Contenido

1. INTRODUCCIÓN. 3
2. OBJETIVO: 3
2.1 OBJETIVO ESPECÍFICOS: 4
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 4
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 5
5. CONCLUSIÓN: 14

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Programa Capacitaciones. 5
Ilustración 2 Manejo de materiales de construcción. 7
Ilustración 3 Señalización 8
Ilustración 4 UNIDADES SANITARIAS 11
Ilustración 5 Manejo de maquinaria y equipos 12
Ilustración 6 Inspección a equipo y maquinaria 12

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

1. INTRODUCCIÓN.

Con el propósito de realizar seguimiento y control establecido en el Programa de adaptación a la guía ambiental PAGA propuestos y manejados por el Contratista, el contrato de interventoría No.169-2025 cuyo objeto es "CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META" con el propósito de dar cumplimiento a las acciones establecidas en este contrato la INTERVENTORIA relaciona las acciones realizadas por el contratista para el periodo informado.

Para el presente informe mensual No 3 corresponde al avance físico y financiero a fecha del 01 de octubre de 2025 al 31 de octubre 2025, se relaciona las actividades ambientales ejecutadas durante el desarrollo del proyecto, MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META" con el propósito de verificar y realizar seguimiento a cada una de las actividades llevadas a cabo por el CONSORCIO VIAS Y PUENTES.

2. OBJETIVO:

Con el propósito de mantener informado a la Agencia de Infraestructura del Meta del desarrollo de las actividades contractuales y las acciones ejecutadas por el CONTRATISTA CONSORCIO VIAS Y PUENTES que lleva a cabo la obra MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META" la interventoría asegura la sostenibilidad ambiental del proyecto, cumpliendo con las normativas vigentes y promoviendo prácticas de gestión ambiental responsables y eficaces por parte del contratista


CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

2.1 OBJETIVO ESPECÍFICOS:

- ✓ Informar de las acciones implementadas por el contratista, en cuanto al PAGA.
- ✓ Ejercer control y vigilancia del cumplimiento de las acciones, realizadas por el contratista en las diferentes etapas del proyecto.
- ✓ Velar por el cumplimiento de las normativas ambientales aplicables al proyecto, asegurando que todas las actividades de construcción estén alineadas con los estándares legales.
- ✓ Realizar seguimiento a los permisos y/o autorizaciones requeridas en el proyecto.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se localiza en la variante sector santa helena, los mangos y patio bonito del Municipio de Granada.

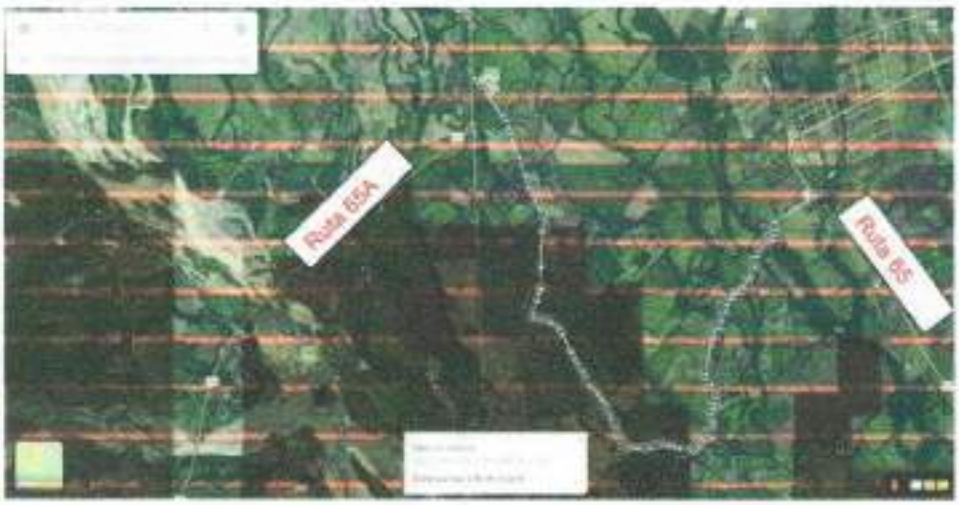

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	DAGA – 1.2 -02
1. CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA	

ACCIONES EJECUTADAS:

El contratista reporta como acciones ejecutadas para este periodo:
Para el presente periodo el contratista informo que adelantado actividades de educación ambiental con charlas al personal de obra, las cuales reposan en listas de asistencia en el informe del componente SST, sin embargo, al revisar la información del listado de asistencia no reportan temas ambientales.

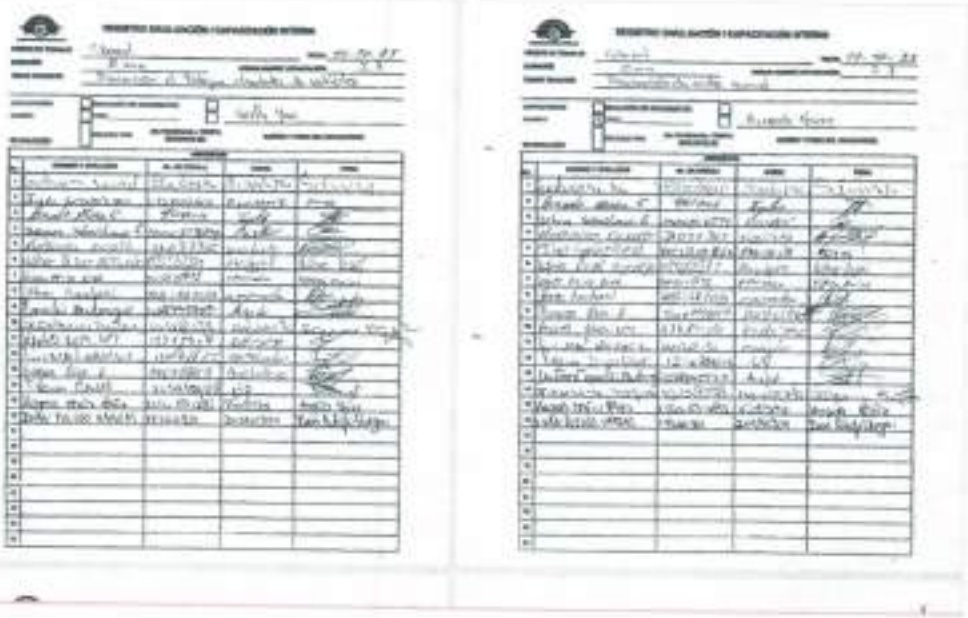


Ilustración 1 Programa Capacitaciones.

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	DAGA – 1.3 -03
1.2 CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS LEGALES	

ACCIONES EJECUTADAS:

El contratista reporta como acciones ejecutadas para este periodo:

La interventoría Intervial Cubarral, realiza seguimiento al reporte de cumplimiento de las acciones desarrolladas por el contratista.

1. El contratista adjunta los permisos y/o autorizaciones para la ejecución del desarrollo del proyecto.
2. Se continúa implementando PMT con las acciones propuestas en el mismo.
3. La contratista adjunta Certificado de registro minero RUCOM de la empresa GRAVAS Y CONCRETOS.

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	PAC – 2.1 -04
MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	

ACCIONES EJECUTADAS:

El contratista reporta como acciones ejecutadas para este periodo, las cuales fueron supervisadas por la interventoría:

El contratista viene realiza la compra de materiales pétreos en lugares autorizados GRAVAS Y CONCRETOS y con su respectiva licencia ambiental, asegurándose que las volquetas que descargan el material estén totalmente cubiertas, evitando cualquier tipo de derrame de material y generación de polución.

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024



Ilustración 2 Manejo de materiales de construcción.

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	PAC – 2.3 -06
SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRAS Y SEÑALIZACIÓN	

ACCIONES EJECUTADAS:

El contratista reporta como acciones ejecutadas para este periodo, las cuales fueron supervisadas por la interventoría:

El contratista continúa suministrando la instalación de señalización de carácter preventiva e informativa, en zonas estratégicas del proyecto delimitando la zona y los frentes de trabajo para reducir el riesgo de e incidentes - accidentes, teniendo en cuenta las diferentes actividades constructivas programadas en la zona de influencia del proyecto.

a continuación, se evidencia registro fotográfico de los antes descrito:



Ilustración 3 Señalización

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	PAC – 2.3 -07
MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	
ACCIONES EJECUTADAS:	

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

El contratista reporta como acciones ejecutadas para este periodo, las cuales fueron supervisadas por la interventoría:

Para el presente periodo el contratista, informo que todo el material sobrante de la actividad de fresado fue dispuesto en sitio autorizado por AIM en el predio el PORVENIR para su posterior reutilización por parte de la comunidad en mantenimientos viales existentes de la zona de influencia del proyecto.



PROGRAMA 3. PROGRAMA DE DIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	**PBSE – 4.2 -12**
RECUPERACIÓN DE AREAS AFECTADAS	
ACCIONES EJECUTADAS:	

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

El contratista refiere que estas actividades de recuperación de zonas afectadas se llevarán a cabo en la etapa final del proyecto, según como lo esté establecido en el documento y contractualmente, actualmente no se realizo la intervención ni afectación de ecosistemas ni zonas de interés ambiental.

PROGRAMA 4. PROGRAMA MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES	PMIT – 5.1 -15
INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO.	

ACCIONES EJECUTADAS:

La interventoría verifica que el CONTRATISTA, almacena temporalmente utilizando un punto ecológico que funciona también como centro de acopio, ubicado estratégicamente.

En cuanto a los residuos generados en cada tramo de la obra del área intervenida, se sigue contando con bolsas según el código de colores y los residuos generados en cada área, los cuales se disponen en ellas y una vez cuenten con su capacidad de almacenamiento temporal, son llevadas al punto de acopio debidamente acondicionado, para prevenir derrames, que puedan generar afectaciones ambientales o accidentes laborales. La disposición final la realiza la empresa de recolección municipal de Cubarral.

El agua para consumo humano del personal cuenta con los parámetros establecidos por la normatividad vigente realizada en laboratorio AVALAB a favor de la empresa AGUA MIA DEL LLANO.

El contratista cuenta con unidades sanitarias para la debida recolección y disposición final de los residuos líquidos de origen domestico generados por las unidades sanitarias portátiles (USP) ubicadas dentro del proyecto, para el presente mes no reporta remisiones ni certificados.

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024



Ilustración 4 UNIDADES SANITARIAS

PROGRAMA 4. PROGRAMA MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES **MANEJO DE MAQUINARIA EQUIPO Y VEHICULOS**	**PMIT – 5.3 -17**

ACCIONES EJECUTADAS:

El Consorcio VIAS Y PUENTES, lleva a cabo medidas ambientales y de seguridad para la conservación del área intervenida en cuanto a la movilización de maquinaria, teniendo en cuenta también los factores de señalización preventiva con el objetivo de evitar accidentes o daños a infraestructura a causa de dicha movilización y derrames en suelo por donde transitan en la obra.

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024



Ilustración 5 Manejo de maquinaria y equipos

La interventoría verifica desde área ambiental la importancia, de verificar que la maquinaria y equipos cuenten con su certificado de emisión de gases al día, control de ruido, y señales luminosas, alarma de reversa, seguros, etc la evidencia de los anterior reposa documentación en físico y se realiza con el área SST.





2308

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

PROGRAMA 5. PROGRAMA GESTIÓN SOCIAL ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	PGS – 6.1 -18

ACCIONES EJECUTADAS:

El contratista cuenta con canales de comunicación, como lo son línea telefónica (3158660074), correo electrónico el cual (admonviasypuentes2025@gmail.com) o podrá dirige a Ing. de residente de obra el cual esta permanente en obra en donde la comunidad podrá dirigirse en caso tal que tenga alguna duda, sugerencia, queja o reclamo y deberá ser atendida en los tiempos de ley.

Durante este periodo no se realizaron PQR

PROGRAMA 5. PROGRAMA GESTIÓN SOCIAL INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	PGS – 6.2 -19

ACCIONES EJECUTADAS:

Para el presente periodo el contratista no ninguna actividad de divulgación de información con la comunidad, de igual manera siempre se estuvo presto atender cualquier necesidad de la comunidad.

PROGRAMA 5. PROGRAMA GESTIÓN SOCIAL CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA	PGS – 6.6-23

ACCIONES EJECUTADAS:

El contratista con el propósito de asegurar las acciones propuestas para esta ficha, realizo las siguientes acciones:

Se realizó convocatoria de oferta laboral con bolsa de empleo COFREM, a fin de brindar trabajo a las personas oriundas o residentes del municipio de Cubarral, Meta, siendo las mismas priorizadas.

5. **CONCLUSIÓN:**

Se solicita al contratista CONSORCIO VIAS Y PUENTES, presente de manera completa y detallada la información correspondiente a cada uno de los programas implementados en el Plan de Gestión Ambiental (PAGA) durante el periodo reportado. Dicha información debe incluir los respectivos soportes técnicos y certificados que respalden las acciones ejecutadas, permitiendo evidenciar el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos.

Con el fin de asegurar la continuidad y efectividad de las medidas de manejo ambiental durante el próximo mes, resulta indispensable la implementación oportuna de los programas previstos. Estas acciones son esenciales para mitigar los impactos ambientales generados por las actividades constructivas del proyecto y garantizar el desempeño ambiental adecuado conforme a los lineamientos del PAGA.

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

INFORME SST - INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 5C
VILLAVICENCIO-META
consorciointervialcubarral@gmail.com

2311

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 169 de 2025

OBJETO CONTRATO:

CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.

OBJETO DEL PROYECTO

BPIN 2024005500266 "CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA.NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS Y PUENTES 2024

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBR DE 2025

Contenido

Introducción 3

Actividades Realizadas del mes de octubre 2025 por la Interventoría,Consorcio Intervial Cubarral 2024 3

Conclusiones 8

Evidencias fotográficas 9

Introducción

En cumplimiento de las obligaciones establecidas con el contratista y en concordancia con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la Interventoría **CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024** se encuentra ejecutando el Contrato de Interventoría N° 169 DE 2025, que tiene como objeto **CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META**, desarrolló durante el mes de octubre de 2025 las actividades de seguimiento, control y verificación relacionadas con la gestión de SST del proyecto, conforme al cronograma definido en el plan de trabajo anual.

Durante el periodo reportado, la interventoría efectuó visitas técnicas periódicas a los frentes de obra, con el propósito de verificar la implementación de las medidas preventivas y correctivas, así como el cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST por parte del contratista.

Actividades Realizadas del mes de octubre 2025 por la Interventoría, Consorcio Intervial Cubarral 2024

Las principales acciones desarrolladas incluyeron:

- **Revisión documental** de los reportes de inspecciones de seguridad, análisis de trabajo seguro (ATS) y registros de capacitaciones ejecutadas por el contratista.

- **Inspecciones en campo** para evaluar las condiciones de orden, aseo, señalización, control de riesgos físicos, mecánicos y locativos.
- **Verificación del uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP)** y de la disponibilidad de equipos de emergencia en los diferentes frentes de trabajo.
- **Seguimiento a los hallazgos y acciones correctivas** derivados de observaciones previas y de los reportes de incidentes y casi accidentes.
- **Revisión de indicadores de gestión en SST**, con el fin de evaluar el desempeño del contratista frente a las metas establecidas.

En el marco de las funciones de interventoría y en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), durante el mes de septiembre de 2025 se desarrollaron actividades de seguimiento, control y verificación al cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y contractuales en materia de SST por parte del contratista del Contrato de Obra N.° 588-2024. cuyo objeto del contrato es la **"REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META**· Como resultado del seguimiento efectuado, se evidenció cumplimiento favorable en los siguientes aspectos:

- **Gestión documental del SG-SST:** Se verificó la existencia, actualización y disponibilidad de los documentos que conforman el Sistema, tales como la política de SST, matriz de peligros, plan anual de trabajo, registros de capacitación y reportes de inspección.
- **Dotación y entrega de Elementos de Protección Personal (EPP):** Se constató que el contratista mantiene un adecuado control en la entrega, reposición y uso de los EPP, garantizando su correspondencia con los riesgos identificados en cada frente de trabajo.

- **Afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social:** Se verificó que el personal vinculado al contrato se encuentra debidamente afiliado a EPS, ARL, AFP y Caja de Compensación, cumpliendo con los montos de cotización exigidos por la normatividad vigente.
- **Atención de emergencias:** Se comprobó la implementación y disponibilidad del kit de primeros auxilios, que incluye camilla tipo férula espinal larga, botiquín dotado y extintor multipropósito, en condiciones adecuadas y accesibles.
- **Cumplimiento normativo:** Se evidenció que las actividades ejecutadas cumplen con los estándares mínimos de seguridad establecidos en la legislación vigente (Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y demás normas aplicables).
- **Inducción y reinducción del personal:** Se verificó que todo el personal que ingresa al proyecto recibe la correspondiente inducción en SST, quedando los registros debidamente documentados.
- **Verificación del pago y reporte de aportes a seguridad social:** A través de los soportes documentales, se comprobó la realización oportuna de los aportes y pagos al Sistema General de Seguridad Social durante los periodos correspondientes.
- **Monitoreo permanente del contratista:** Se evidenció la ejecución de actividades de seguimiento y control en campo, incluyendo inspecciones periódicas y supervisión del cumplimiento de los protocolos de seguridad.
- **Evaluaciones médicas ocupacionales:** Se verificó que los trabajadores cuentan con sus evaluaciones médicas de ingreso, periódicas y de egreso, conforme a lo exigido por la normatividad.
- **Capacitaciones y formación en SST:** Se constató el cumplimiento del cronograma de capacitaciones, enfocadas en prevención de riesgos, trabajo en alturas, manipulación de herramientas y primeros auxilios, entre otros temas relevantes.

- **Inspecciones en campo:** Durante las visitas a los frentes de trabajo se verificó el cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos en el SG-SST, incluyendo señalización, orden, aseo, control de acceso y condiciones locativas.
- **Comunicación interna en SST:** Se observó la difusión de comunicados, boletines y avisos informativos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, dirigidos a todo el personal.
- **Cumplimiento del plan mensual de trabajo:** Se constató el desarrollo de las actividades planificadas dentro del cronograma establecido en el plan anual del SG-SST.

La **Interventoría CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024**, en el ejercicio de sus funciones de supervisión técnica, administrativa, financiera, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizó la evaluó la gestión en SST desarrollada por el Contratista **CONSORCIO VÍAS Y PUENTES**, en el marco del **Contrato N.° 558 de 2024**, cuyo objeto corresponde a la rehabilitación de 10,72 km de la vía secundaria que conecta la vía nacional con el casco urbano del municipio de Cubarral, departamento del Meta.

Esta evaluación tuvo como propósito verificar el cumplimiento de los lineamientos normativos, contractuales y técnicos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo **(SG-SST)**, así como valorar la eficacia de las medidas preventivas y de control implementadas por el contratista en las diferentes etapas constructivas del proyecto.

La interventoría efectuó el seguimiento mediante revisión documental, visitas técnicas de campo, entrevistas al personal operativo y verificaciones directas de condiciones de trabajo, enfocando la gestión en la identificación de riesgos críticos,

la observancia de los estándares mínimos de seguridad y el aseguramiento de la integridad física y mental de los trabajadores.

El desarrollo de esta evaluación permitió determinar el grado de cumplimiento del contratista frente a la normatividad vigente en SST (Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y demás disposiciones aplicables), evidenciando el compromiso institucional hacia la prevención de accidentes laborales, la promoción de ambientes de trabajo seguros y la mejora continua del desempeño en seguridad y salud ocupacional.

De esta manera, la interventoría dio cumplimiento a su función de control y aseguramiento del cumplimiento normativo y contractual en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando la mejora continua y la prevención de incidentes.

Conclusiones

La Interventoria **CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024** cumplió durante el mes de octubre de 2025 con las actividades de seguimiento, control y verificación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a lo establecido en el plan de trabajo anual.

El seguimiento permitió evidenciar el cumplimiento del contratista en los aspectos normativos y contractuales del **SG-SST**, destacándose la adecuada gestión documental, la entrega de EPP, la afiliación del personal al Sistema General de Seguridad Social y la ejecución de capacitaciones.

La interventoria reafirma su compromiso con la prevención de riesgos laborales y la mejora continua de las condiciones de trabajo, garantizando que las actividades del proyecto se desarrollen bajo estándares de seguridad y salud en el trabajo acordes con la normatividad vigente.

Evidencias fotográficas



Fotografia 1. Charlas de SST



Fotografia 2. Charlas de SST



Fotografia 4. Recorrido con las directrices y la entidad contratante



Fotografia 5. Acompañamiento en los tramos de la obra



Fotografía 6. Acompañamiento a las áreas de trabajo



Fotografía 7. apoyo del laboratorio de suelos NHSQ INGENIERÍA S.A.S.



Fotografía 8. verificación de la mezcla asfáltica tipo MDC-19 instalada



Fotografía 9. Toma de temperatura mezcla asfáltica instalada



Fotografía 10. SELLO DE FISURAS ARENA-ASFALTO CON EMULSIÓN CRR-2



Fotografía 11. SELLO DE ARENA-ASFALTO CON EMULSIÓN CRR-2



Fotografía 12. Visita de entes de gobierno



Fotografía 13. participación en visitas de obra, comités técnicos.

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

INFORME PMT - INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 5C
VILLAVICENCIO-META
consorciointervialcubarral@gmail.com

2322

INFORME MENSUAL PMT DE INTERVENTORÍA N.° 03

OCTUBRE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 169 de 2025

OBJETO CONTRATO:

CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.

OBJETO DEL PROYECTO:

BPIN 2024005500266 "CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META



URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 5C
VILLAVICENCIO-META
consorciointervialcubarral@gmail.com
Cel.: (+57) 300 3475090

2324

Contenido

Introducción 2
finalidad del contrato y proyecto de interventoría 3
Alcance del contrato 4
Alcance del proyecto 4
Objetivo General 4
Objetivo SG-SST 5
Localización del proyecto 5
PRESUPUESTO PMT 6
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO – PMT 6
Conclusión 13
Evidencia fotográfica 14

Introducción

El **CONSORCIO INTERVIAL CUBARAL 2024** y como representante legal de este **ROSANETH ANGARITA GOMEZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.018.497.426 de Bogotá D.C., se encuentra ejecutando el Contrato de Interventoría N° 169 DE 2025, que tiene como objeto **CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META.**

Se abre proceso de contratación No. LP-AIM-CO-005-2024 con el siguiente objeto rehabilitación de 10,72 km de la vía secundaria que conduce de la vía nacional al casco urbano del Municipio de Cubarral, Meta, el cual describe la problemática del municipio de Cubarral, en la actualidad se ha visto afectada en el aumento de la tasa de accidentalidad debido a las malas condiciones en las que se encuentra actualmente la vía secundaria que conduce de la vía nacional al casco urbano del municipio. Como solución a esta problemática, la AIM con documentos técnicos correspondientes, formuló y estructuró un proyecto mediante las siguientes alternativas de solución: mejorar la capa de rodadura de la vía, mediante el retiro y reemplazo parcial de las áreas de pavimento que se encuentren deterioradas y que afecten la capa asfáltica

Para dicho proceso se une esfuerzos de las empresas ECOBRAS S.A. y GRAVICON S.A. creando el CONSORCIO VIAS Y PUENTES para al contrato 558 de 2024.

finalidad del contrato y proyecto de interventoría

La finalidad del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 169 DE 2025** que tiene por objeto **"EL CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META"." por un valor de ($852.131.497.00.)** OCHOCIENTOS CINCUETA Y DOS MILLONES, CIENTO TREINTTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE; y, como objeto del proyecto con **BPIN 2024005500266 "EL CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META."** Por un valor de **($ 463.566.416,00.)** CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIESICEIS PESOS M/CTE. Además, de acuerdo con la naturaleza del contrato y con el fin de proteger el patrimonio del municipio de un eventual incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato o de su cumplimiento defectuoso por parte del contratista, es poder conminarlo cuando éste suministre un bien o servicio de mala calidad no atendiendo las condiciones pactadas en el contrato.

Alcance del contrato

De acuerdo al presupuesto oficial del Contrato de Obra **N° 588 DE 2024** se prevé desarrollar la **"REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META"**. por un valor del contrato OCHO MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES, CUATROCIENTOS CINCO MIL TRES PESOS M/CTE, **($ $8.801.405.003,00),** el cual debe el cual debe cumplirse acorde a los diseños contractualmente aprobados.

Alcance del proyecto

De acuerdo al presupuesto oficial del proyecto de obra **con BPIN 2024005500266** se prevé desarrollar la **"REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META** por un valor de (**$4.995.820.538,00).** CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUNIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE, el cual debe cumplirse acorde a los diseños contractualmente aprobados.

Objetivo General

Mitigar el impacto causado o generado por el desarrollo de las actividades que se ejecutarán en el proyecto de objetivo "rehabilitación de 10,72 km de la vía secundaria que conduce de la vía nacional al casco urbano del Municipio de Cubarral, Meta.

Objetivo SG-SST

Implementar medidas preventivas y correctivas que reduzcan los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente durante la ejecución de las obras de rehabilitación vial, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de SG- SST.

Localización del proyecto

El proyecto está ubicado en la vía secundaria que conduce de la via nacional al casco urbano del municipio de Cubarral, como de las vías terciarias que comunica la vereda Santa Helena, Los Mangos y Patio Bonito se encuentra en malas condiciones de transpirabilidad.



Ubicación del municipio y localidad de Cubarral en el departamento del Meta de Colombia.



Ilustración 1 Localización de los Municipio

PRESUPUESTO PMT

La asignación del presupuesto de **($56.889.761).** CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE, para la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito **(PMT)** se sustenta en el principio de eficiencia y eficacia del gasto público, En este sentido, el presente presupuesto, actúa conforme a la norma, asegurando la viabilidad técnica, financiera y operativa del PMT.

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO – PMT

El **CONSORCIO VÍAS Y PUENTES 2024**, contratista de obra del **Contrato N.° 558 de 2024**, presentó a la Interventoría el Plan de Manejo de Tránsito **(PMT)**, el cual fue previamente aprobado por la Secretaría de Tránsito Municipal.

Este plan fue formulado con base en los lineamientos y directrices técnicas aplicables al tipo de proyecto a ejecutar, con el objetivo de prevenir, mitigar o minimizar los impactos que puedan derivarse de la ejecución de las obras, especialmente en lo relacionado con la movilidad y seguridad vial.

Durante la construcción de las obras de pavimentación, se contempla la realización de cierres temporales por tramos, los cuales deberán ser socializados con anticipación a la comunidad. Esta socialización debe incluir información clara sobre la ubicación, extensión y duración de los cierres, con el fin de garantizar una adecuada planeación y aceptación por parte de los actores viales.

Asimismo, el uso de señalización preventiva será de obligatorio cumplimiento. Esta señalización deberá permanecer visible y en condiciones adecuadas durante todo el tiempo que dure la intervención del tramo, incluyendo aquellas zonas donde se realice fresado o queden condiciones transitorias que representen riesgos para la seguridad vial.

Cabe destacar que el PMT está sujeto a modificaciones en función de requerimientos técnicos, sociales, ambientales o logísticos que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto. Cualquier ajuste deberá contar con la debida justificación y aprobación por parte de las autoridades competentes

Durante la ejecución de los trabajos en la vía se dispuso de los siguientes Elementos de señalización Preventiva y Reglamentaria para minimizar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, de acuerdo al esquema Típico 12 del manual de señalización Vial 2015.

Dos (2) Señal de Fin de Obra SIO-03
Dos (2) Señales de Auxiliar de Tránsito SPO-03
Dos (2) Señales Trabajos en la Vía SPO-01

Dos (2) Maquinaria en Vía
Dos (2) Angostamiento derecha e izquierda
Dos (2) Señal velocidad máxima SR-30

De acuerdo a las condiciones actuales de la obra se están instalando las señales de forma móviles en la zona de intervención, durante la ejecución no se contempla trabajos nocturnos por lo cual no se incluyen dispositivos reflectivos.

Señales preventivas e informativas






circulación. El texto de la señal deberá mencionar el (los) carril(es) inhabilitado(s) para el servicio. Por ejemplo: "CARRIL CENTRAL CERRADO"	
SIO-05. DESVÍO Esta señal se empleará para advertir a los usuarios de las vías, la proximidad a un sitio en el cual se desvía la circulación del tránsito. Deberá indicarse la distancia a la cual se encuentra el desvío.	SIO-05 DESVÍO A 100 m

Barricadas

Las barricadas estarán formadas por bandas o listones horizontales, con una longitud entre 2,0 m y 2,4 m y una altura de 0,20 m, separada por espacios iguales a sus alturas. Las bandas serán fijadas a postes firmemente hincados cuando sean fijadas para obras de larga duración y sobre caballetes cuando sean portátiles para obras de corta duración. La altura de cada barricada deberá ser de 1,50 m como

mínimo. En la Las franjas de las barreras serán de colores alternados blanco y naranja, con una inclinación hacia el piso de 45 grados en la dirección del paso de los vehículos.

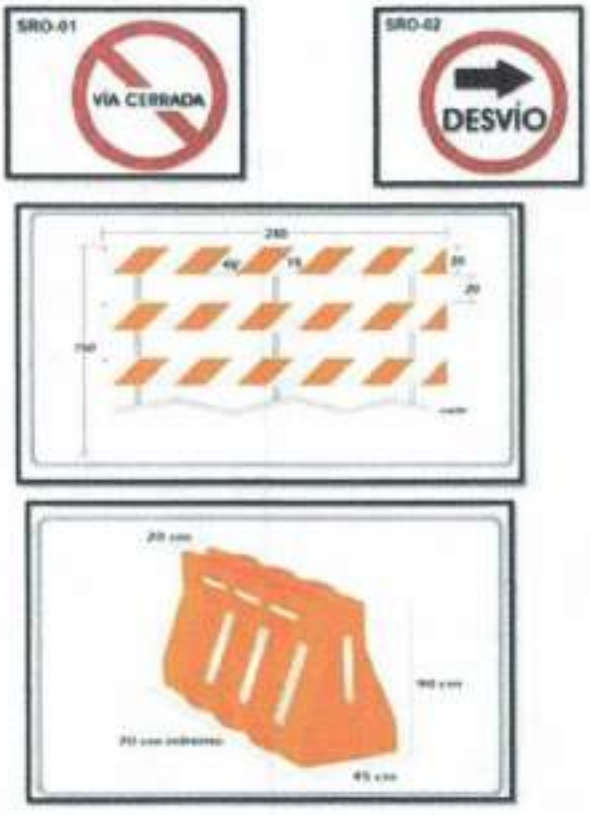






Delineadores tubulares compuestos

Estos dispositivos de canalización vehicular y peatonal serán fabricados en material plástico anaranjado. Las características del material serán similares a las descritas en los conos.

Estos elementos tendrán una altura no menor a 0,70 m y un diámetro no menor a 7 cm, ni mayor a 10 cm.

Deberán contar con tres bandas de 7,5 cm, separadas entre sí no menos de 10 cm, elaboradas en lámina reflectiva blanca Tipo II o Tipo IV. En su parte inferior serán anclados a una base que garantice su estabilidad, la cual podrá contar con un lastre que contenga materiales deformables (que no sea concreto ni piedras) y que le proporcione estabilidad en su posición vertical.

Figura 4-11 Conos

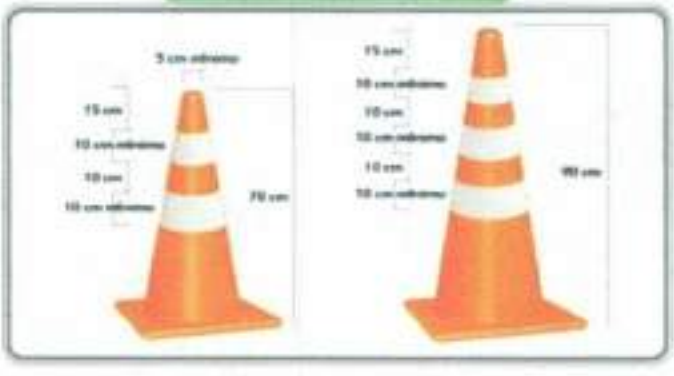

Control PARE-SIGA



Ilustración 5. Operación del sistema Pare/ Siga

***Ilustración** 4. PARE—SIGA*

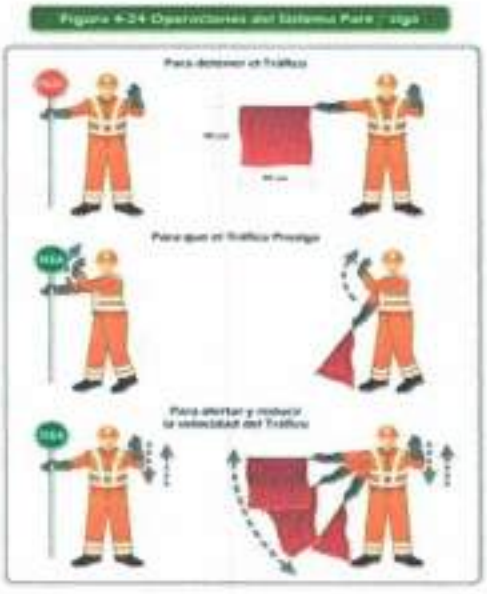
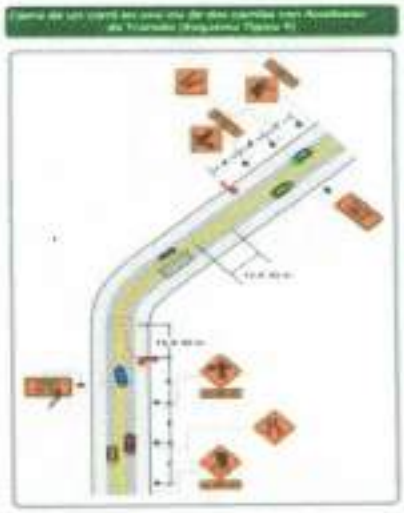
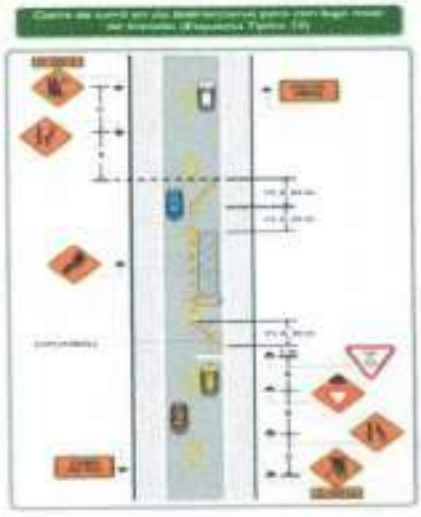


Ilustración 4. Cierre de una vía de dos carriles con auxiliares de transito	*Ilustración 3. Cierre de un carril en vía bidireccional*
	

Cierre de carril en vía bidireccional, pero con bajo nivel de tránsito (esquema típico 10). Este esquema se puede utilizar como alternativa al esquema 9 cuando se den las condiciones siguientes:

- El volumen de tráfico es tal que existen lagunas suficientes para el tránsito vehicular que debe rendir el derecho de paso.
- Los conductores de ambas direcciones puedan ver el tráfico que se le acerca en la dirección contraria más allá del lugar de tra

Conclusión

Con base en el acompañamiento técnico y las verificaciones efectuadas durante el mes de octubre de 2025, la Interventoría **CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024** concluye que el contratista **CONSORCIO VÍAS Y PUENTES 2024** dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo **(SG-SST)**, así como a las disposiciones técnicas y operativas del Plan de Manejo de Tránsito **(PMT)** aprobadas para la ejecución del proyecto.

Las actividades desarrolladas se ejecutaron de acuerdo con los procedimientos operativos, protocolos de seguridad y normas técnicas aplicables, garantizando la integridad física del personal, la seguridad vial de los usuarios y la adecuada gestión de los riesgos laborales y de tránsito asociados a la obra.

Asimismo, se evidenció una implementación eficaz de los controles preventivos y correctivos, la actualización oportuna de la señalización vial temporal, y la aplicación de medidas de control jerárquico para minimizar la exposición a peligros identificados.

Evidencia fotográfica Señalización



Fotografía 1. Cierre de via en un solo sentido



Fotografía 2. Cierre de via en un solo sentido



Fotografía 3. Delineadores tubulares



Fotografía 4. Cierre en un solo carrl



Fotografía 5. Señal PARE/ SIGA



Fotografía 6. Delineadores tubulares



Fotografía 7. Señalización informativa



Fotografía 8. Desvio PARE / SIGA



Fotografía 9. Desvio PARE / SIGA



Fotografía 10. Delineadores tubulares

ACTA DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Formato 112-ECP-FR-018

VILLAVICENCIO: Cra. 32 No 38-70 Of. 1302 — Ed. Romarco
Cel. 3158660074
e-mail: admoncviasypuentes2025@gmail.com

ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005500284
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META"		
OBJETO DEL PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y PUENTES R/L RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA		
NIT:	NIT: 901.901.935 - 6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	169 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024 NIT: 901.930.634-8 R/L ROSANETH ANGARITA GOMEZ		

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Fecha	Ensayo realizado por C / I*	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Resultados		Análisis de Resultados	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
							Rango Cumplimiento	Porcentaje Obtenido %	Cumple S/N	
2/10/2025	C	Mezcla Densa en Caliente MDC-19	Estabilidad	San Luis de Cubarral	ECOBRAS S.A	E-748	16.72 - 23.23	16,79	S	
			Analisis Granulometrico 1 1/2			E-782	100 - 100	100,00%	S	
			Analisis Granulometrico 1"			E-782	100 - 100	100,00%	S	
			Analisis Granulometrico 3/4"			E-782	100 - 100	100,00%	S	
			Analisis Granulometrico 1/2"			E-782	80 - 95	86,50%	S	
			Analisis Granulometrico 3/8"			E-782	70 - 88	78,70%	S	
			Analisis Granulometrico #4			E-782	49 - 65	49,00%	S	
			Analisis Granulometrico #10			E-782	29 - 45	36,70%	S	
			Analisis Granulometrico #40			E-782	14 - 25	20,20%	S	
			Analisis Granulometrico #80			E-782	8 - 17	9,90%	S	
			Analisis Granulometrico #200			E-782	4 - 8	5,20%	S	
			Analisis Granulometrico pasa 200			E-782		0,00%	S	
			Extraccion Cuantitativa de asfalto			E-732	4.7% - 5.3%	5,10%	S	
			Bulk			E-733		2,371	S	
			Flujo			E-749	2.0 - 3.5	3,30	S	
			Gravedad Especifica			E-735		2,491	S	
			Vacios de Aire			E-736	4 - 6	4,80	S	
			Relación Estabilidad / Flujo				3.0 - 6.0	5,03	S	

* Contratista / Interventor

Se anexan los soportes de las diferentes pruebas y ensayos de laboratorio

COMENTARIOS DEL ESPECIALISTA AL RESULTADO DE LOS ENSAYOS:

Firma
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE
**DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-102862 CND

Firma
Nombre: JUAN CAMILO POSADA VARELA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 63202-294712 CND

Firma
Nombre: DIEGO ALEXANDER DUQUE
ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS
N° Matricula Profesional: 25202-156824 CND

** Nota: En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros : Representante Legal o Apoderado
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ECOBRAS S.A.
Compra, Construcciones y Obras S.A.
Ingenieros Contratista

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS EN MEZCLAS EN CALIENTE INV E-
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS EN CALIENTE PARA PAVIMENTO INV E
GRAVEDAD ESPECÍFICA Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES SATURADOS Y SUPERFICIE SECA INV E -733
PORCENTAJE DE VACIOS DE AIRE EN MEZCLAS ARFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS INV E- 736
RESISTENCIA DE MEZCLAS ARFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL INV E-748
GRAVEDAD MAXIMA DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PAVIMENTOS INV E- 735

CLIENTE:	CONSORCIO VIAS Y PUENTE	FECHA DE TOMA:	2-oct-25
OBRA:	MEJORAMIENTO VIA A CUSIARRAL	FECHA DE ENSAYO:	3-oct-25
LOCALIZACIÓN:	CUSIARRAL - META	HORA:	7:30 a. m.
TIPO DE MEZCLA:	MDC-19 / NIVEL DE TRÁFICO: NT3	REMISIÓN:	23103

CURVA GRANULOMETRICA (NORMA INV 782)

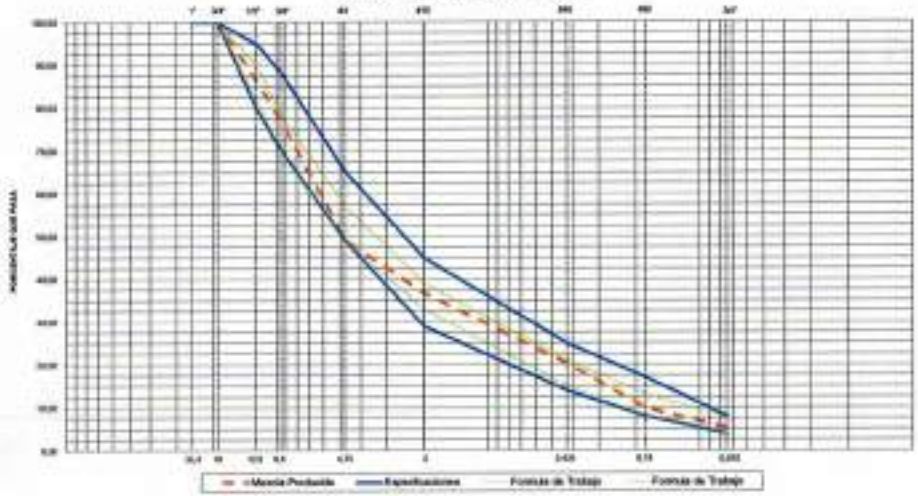

Peso seco antes de lavar (g)	2399,8	Peso seco después de lavar (g)	2274,8	Cumple Franja (SI/N):	SI	Cumple Tolerancia (SI/N):	SI

TAMIZ		PESO RETENIDO	% RETENIDO	% RETENIDO ACUMULADO	% PASA	ESPECIFICACIÓN		VALIDAMOS RESPECTO A FORMULA DE TRABAJO	
No.	mm								
1 ½"	37,5	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100,0	100,0
1"	25	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100,0	100,0
3/4"	19,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100,0	100,0
1/2"	12,5	324,6	13,5	13,5	86,5	80	95	92,0	86,5
3/8"	9,5	234,5	9,8	23,3	76,7	70	88	79,0	76,8
4	4,75	664,7	27,7	51,0	49,0	49	65	49,0	57,8
10	2,00	285,8	12,0	63,3	36,7	29	45	33,0	36,8
40	0,425	394,6	16,4	79,8	20,2	14	25	15,2	21,8
80	0,180	248,3	10,3	90,1	9,9	8	17	8,0	13,8
200	0,075	112,1	4,7	94,8	5,2	4	8	4,0	7,8
PASA 200	0,075	125,2	5,2	100,0	0,0				

EXTRACCIÓN DE ASFALTO

PESO MUESTRA INICIAL	2528,8	g
PESO MUESTRA FINAL	2399,8	g
% DE ASFALTO	5,1%	

ESPECIFICACIÓN

Tolerancia ±	0,3%	
% de asfalto de diseño (%)	5,0%	
Rango de % de asfalto (%)	4,7%	5,3%

g Asfalto:	1,020
g Agregados:	2,689
Rice (g/cm³):	2,491

% asfalto de diseño:	5,0%
T° de compactacion:	140

ESTABILIDAD ET (N):	18.500
FLUJO FT (cm):	3,3

MUESTRA No	% ASFALTO	PESO DE BRIQUETA (g)			VOLUMEN (cm3)	PESO ESPECÍFICO (g/cm³)			VOLUMEN EN % TOTAL				% VACÍOS DE AGREGADOS MINERALES	% ASFALTO EFECTIVO DE PESO TOTAL	% VACÍOS LLENOS DE ASFALTO	RELACIÓN LLENANTE - LIGANTE	ESTABILIDAD (N)		FLUJO (mm)	RELACIÓN ET/FT (N/mm)
		EN EL AIRE	EN AGUA	SSS		BULK	MÁXIMO TEÓRICO	MÁXIMO MEDIDO	AGREGADO	VACÍOS CON AIRE	ASFALTO EFECTIVO	ASFALTO ABSORBIDO					MEDIDA	CORREGIDA		
1	5,1%	1202,7	689,4	1206,8	587,5	2,370	2,482	2,491	69,858	4,857	4,953	0,190	16,342	4,671	70,268	1,050	15.50	15.92	3,18	5,04
2		1197,3	683,5	1200,8	587,3	2,380				5,255							16.91	17.38	3,24	5,36
3		1202,2	689,5	1205,8	586,3	2,374				4,697							16.93	17.40	3,59	4,86
4		1202,8	689,4	1205,3	585,9	2,379				4,536							16.90	16.62	3,37	4,97
		PROMEDIO:				2,371	2,5	2,491	69,7	4,9	4,95	0,16	16,34	4,97	70,4	1,09	16,31	16,70	3,3	5,03
		ESPECIFICACIÓN:		MIN						4			15		65	0,8	9,00	10,72	2,0	3,0
				MAX						6			-		78	1,2	23,23	23,23	3,5	6,0

Observaciones:

Laboratorista Oscar Leonardo Hernandez
REALIZÓ

Laura Lorenzo
Ing. Laura Lorenzo
APROBÓ

Rev.01 V2 08-2020

362

ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA

CONTRATO N°	868 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005000266
OBJETO DEL CONTRATO:	"REHABILITACION DE 10,72 KM DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META"		
OBJETO DEL PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y PUENTES R/L RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA		
NIT:	NIT. 901.901.935 - 6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	169 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024 NIT. 901.930.634-8 R/L ROSANETH ANGARITA GOMEZ		

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Fecha	Ensayo realizado por C / I*	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Resultados		Análisis de Resultados	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
							Rango Cumplimiento	Porcentaje Obtenido %	Cumple S/N	
3/10/2025	C	Mezcla Densa en Caliente MDC-19	Estabilidad	San Luis de Cubarral	ECOBRAS S.A	E-748	16.72 - 23.23	16,77	S	
			Analisis Granulometrico 1 1/2			E-782	100 - 100	100,00%	S	
			Analisis Granulometrico 1"			E-782	100 - 100	100,00%	S	
			Analisis Granulometrico 3/4"			E-782	100 - 100	100,00%	S	
			Analisis Granulometrico 1/2"			E-782	80 - 95	87,90%	S	
			Analisis Granulometrico 3/8"			E-782	70 - 88	75,90%	S	
			Analisis Granulometrico #4			E-782	49 - 65	50,20%	S	
			Analisis Granulometrico #10			E-782	29 - 45	37,20%	S	
			Analisis Granulometrico #40			E-782	14 - 25	20,80%	S	
			Analisis Granulometrico #80			E-782	8 - 17	11,30%	S	
			Analisis Granulometrico #200			E-782	4 - 8	5,30%	S	
			Analisis Granulometrico pasa 200			E-782		0,00%	S	
			Extraccion Cuantitativa de asfalto			E-732	4.7% - 5.3%	4,90%	S	
			Bulk			E-733		2,349	S	
			Flujo			E-748	2.0 - 3.5	3,30	S	
			Gravedad Especifica			E-735		2,491	S	
			Vacios de Aire			E-736	4 - 6	5,70	S	
			Relación Estabilidad / Flujo				3.0 - 6.0	5,12	S	

* Contratista / Interventor

Se anexan los soportes de las diferentes pruebas y ensayos de laboratorio

COMENTARIOS DEL ESPECIALISTA AL RESULTADO DE LOS ENSAYOS:

Firma
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE
**DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-102882 CND

Firma
Nombre: JUAN CAMILO POSADA VARELA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 63202-294712 CND

Firma
Nombre: DIEGO ALEXANDER DUQUE
ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS
N° Matrícula Profesional: 25202-156824 CND

** Nota: En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros : Representante Legal o Apoderado
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


pag 2

ECOBRAS S.A.
Ingenieros Contratista

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS EN MEZCLAS EN CALIENTE INV E- 782
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS EN CALIENTE PARA PAVIMENTO INV E-
GRAVEDAD ESPECIFI[illegible] Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES EMPLEANDO [illegible] MENOS SATURADOS
Y SUPERFICIE SECA INV E -733
POROSNTAJE DE VACIOS DE AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS INV E- 736
RESISTENCIA DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL INV E- 748
GRAVEDAD MAXIMA DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PAVIMENTOS INV E- 735

CLIENTE:	CONSORCIO VIAS Y PUENTE			FECHA DE TOMA:	3-oct-25
OBRA:	MEJORAMIENTO VIA A CUBARRAL			FECHA DE ENSAYO:	4-oct-25
LOCALIZACIÓN:	CUBARRAL - META			HORA:	7:11 a.m.
TIPO DE MEZCLA:	MDC-19	NIVEL DE TRÁFICO:	NT3	REMISIÓN:	29193

CURVA GRANULOMETRICA (NORMA INV 782)

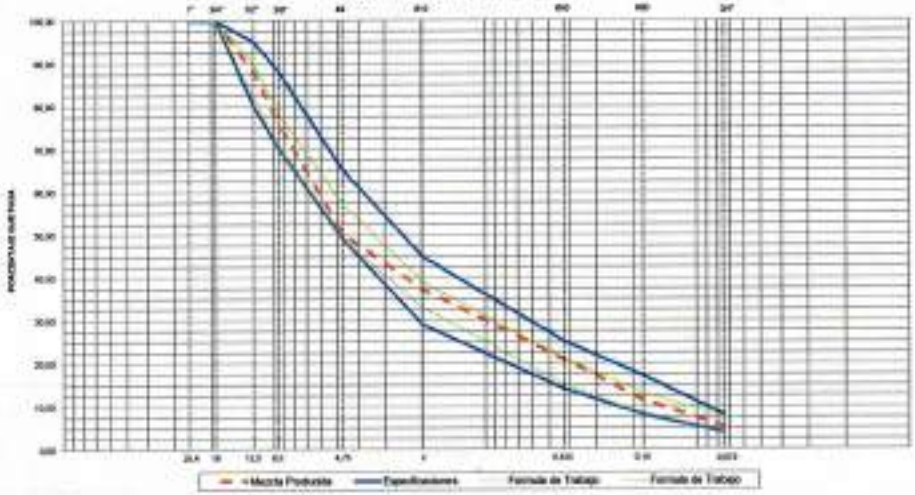

Peso seco antes de lavar (g)		2568,5	Peso seco después de lavar (g)		2433,6	Cumple Franja (SI/NI):	SI	Cumple tolerancia (SI/NI):	SI
TAMIZ		PESO RETENIDO	% RETENIDO	% RETENIDO ACUMULADO	% PASA	ESPECIFICACIÓN		TOLERANCIA RESPECTO A FORMULA DE TRABAJO	
No.	mm								
1 1/2"	37,5	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100,0	100,0
1"	25	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100,0	100,0
3/4"	19,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100,0	100,0
1/2"	12,5	310,3	12,1	12,1	87,9	80	95	82,9	90,6
3/8"	9,5	399,0	15,5	27,6	72,4	70	88	70,0	78,9
4	4,75	659,6	25,7	53,3	46,7	49	65	49,0	57,8
10	2,00	333,0	13,0	66,3	33,7	29	45	33,0	39,8
40	0,425	423,1	16,5	82,8	17,2	14	25	15,0	21,5
80	0,180	243,7	9,5	92,3	7,7	8	17	8,9	13,8
200	0,075	154,9	6,0	98,3	1,7	4	8	4,9	7,6
PASA 200	0,075	134,9	5,3	100,0	0,0				

EXTRACCIÓN DE ASFALTO

PESO MUESTRA INICIAL	2701,4	g
PESO MUESTRA FINAL	2568,5	g
% DE ASFALTO	4,9%	

ESPECIFICACIÓN

Tolerancia ±	0,3%	
% de asfalto de diseño (%)	5,0%	
Rango de % de asfalto (%)	4,7%	5,3%

ρ Asfalto	1,020
ρ Agregados	2,569
Rice (g/cm³)	2,491

% asfalto de diseño:	5,0%
Nº de compactadores	140

ESTABILIDAD ET (N)	18.593
FLUJO FT (mm)	3,3

MUESTRA No	% ASFALTO	PESO DE BRIQUETA (g)			VOLUMEN (cm³)	PESO ESPECÍFICO (g/cm³)			VOLUMEN EN % TOTAL				% VACIOS DE AGREGADOS MINERALES	% ASFALTO EFECTIVO DE PESO TOTAL	% VACÍOS LLENOS DE ASFALTO	RELACIÓN LLENANTE - LIGANTE	ESTABILIDAD (N)		FLUJO (mm)	RELACIÓN ET/FT (N/mm)
		SECA AIRE	SECA AGUA	SSS AIRE		BULK	MEZCLA TEÓRICA	MEZCLA MEDIDA	AGREGADO	VACIOS CON AIRE	ASFALTO EFECTIVO	ASFALTO ABSORBIDO					MEDIDA	CORREGIDA		
1	4,9%	1212,7	698,0	1215,7	515,7	2,352	2,469	2,491	83,058	5,580	4,682	0,040	16,942	4,667	66,952	1,076	16,83	16,82	3,22	5,22
2		1209,5	696,4	1212,5	514,1	2,351				5,540							16,77	16,85	3,37	5,00
3		1208,6	691,2	1207,4	516,2	2,337				6,182							16,70	16,57	3,27	5,10
4		1210,4	696,2	1212,4	514,2	2,354				5,530							16,88	16,76	3,25	5,16
PROMEDIO:						2,349	2,5	2,491	83,1	5,7	4,68	0,04	16,94	4,89	66,4	1,07	16,75	16,77	3,3	5,12
ESPECIFICACIÓN:																				
	MIN									4			15		65	0,8	9,90	16,72	2,0	3,0
	MAX									6			-		75	1,2	23,23	23,23	3,5	6,0

Observaciones:

Laboratorista Oscar Leonardo Hernandez
REALIZÓ

Ing. Laura Lorenzo
APROBÓ

ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA

112-ECP-FR-018-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	**558 DE 2024**	**PROYECTO N°**	**BPIN 2024005500288**

OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACION DE 10,72 KM DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META"
OBJETO DEL PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META"
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y PUENTES R/L RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA
NIT:	NIT: 901.901.935 - 6
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	169 DE 2025
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024 NIT: 901.930.634-8 R/L ROSANETH ANGARITA GOMEZ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Fecha	Ensayo realizado por	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Resultados		Análisis de Resultados	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
	C / I*						Rango Cumplimiento	Porcentaje Obtenido %	Cumple S/N	
9/10/2025	C	Mezcla Densa en Caliente MDC-19	Estabilidad	San Luis de Cubarral	ECOBRAS S.A	E-748	16,72 - 23,23	16,73	S	
			Analisis Granulometrico 1 1/2			E-782	100 - 100	100,00%	S	
			Analisis Granulometrico 1"			E-782	100 - 100	100,00%	S	
			Analisis Granulometrico 3/4"			E-782	100 - 100	100,00%	S	
			Analisis Granulometrico 1/2"			E-782	80 - 95	87,60%	S	
			Analisis Granulometrico 3/8"			E-782	70 - 88	77,90%	S	
			Analisis Granulometrico #4			E-782	49 - 65	51,40%	S	
			Analisis Granulometrico #10			E-782	29 - 45	37,80%	S	
			Analisis Granulometrico #40			E-782	14 - 25	20,30%	S	
			Analisis Granulometrico #80			E-782	8 - 17	9,30%	S	
			Analisis Granulometrico #200			E-782	4 - 8	4,60%	S	
			Analisis Granulometrico pasa 200			E-782		0,00%	S	
			Extraccion Cuantitativa de asfalto			E-732	4,7% - 5,3%	4,90%	S	
			Bulk			E-733		2,363	S	
			Flujo			E-748	2,0 - 3,5	3,50	S	
			Gravedad Especifica			E-735		2,495	S	
			Vacios de Aire			E-736	4 - 6	5,30	S	
			Relación Estabilidad / Flujo				3,0 - 6,0	4,82	S	

* Contratista / Interventor
Se anexan los soportes de las diferentes pruebas y ensayos de laboratorio

COMENTARIOS DEL ESPECIALISTA AL RESULTADO DE LOS ENSAYOS:

Firma
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE
**DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-102862 CND

Firma
Nombre: JUAN CAMILO POSADA VARELA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 63202-294712 CND

Firma
Nombre: DIEGO ALEXANDER DUQUE
ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS
N° Matricula Profesional: 25202-156624 CND

** Nota: En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros : Representante Legal o Apoderado
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


2346

ECOBRAS S.A.
Ingenieros Contratista

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS EN MEZCLAS EN CALIENTE INV E- 782
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS EN CALIENTE PARA PAVIMENTO INV E-
GRAVEDAD ESPECÍFICA Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES SATURADOS Y SUPERFICIE SECA INV E -733
PORCENTAJE DE VACIOS DE AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS INV E- 736
RESISTENCIA DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL INV E- 748
GRAVEDAD MAXIMA DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PAVIMENTOS INV E- 735

CLIENTE:	CONSORCIO VIAS Y PUENTE			FECHA DE TOMA:	9-oct-23
OBRA:	MEJORAMIENTO VIA A CUBARRAL			FECHA DE ENSAYO:	10-oct-23
LOCALIZACIÓN:	CUBARRAL - META			HORA:	9:25 a. m.
TIPO DE MEZCLA:	MDC-19	NIVEL DE TRÁFICO:	NT3	REMISIÓN:	23174

CURVA GRANULOMETRICA (NORMA INV 782)

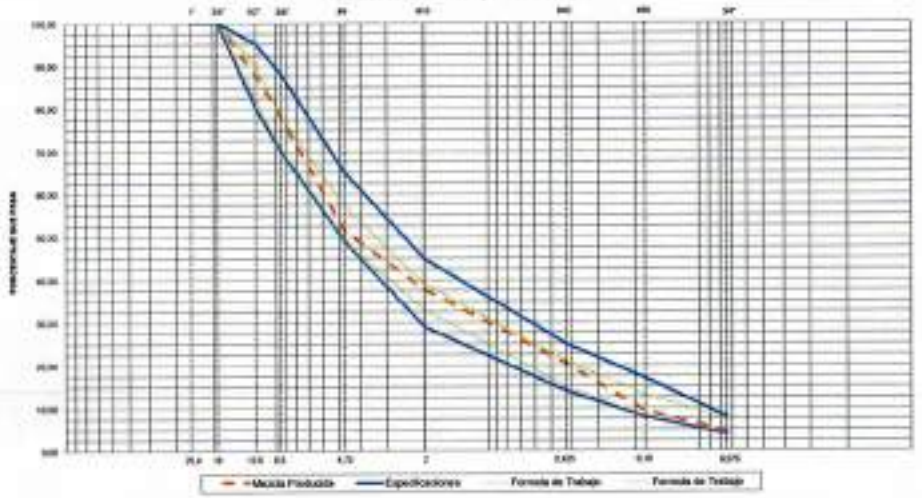

Peso seco antes de lavar (g)		2481,0	Peso seco después de lavar (g)		2385,7	Cumple Franja (SI/NO)	SI	Cumple tolerancia (SI/NO)	SI
TAMIZ		PESO RETENIDO	%RETENIDO	%RETENIDO ACUMULADO	% PASA	ESPECIFICACIÓN		TOLERANCIA RESPECTO A FORMULA DE TRABAJO	
No.	(mm)								
1 1/2"	37,5	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	106,0	100,0
1"	25	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	106,0	100,0
3/4"	19,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	106,0	100,0
1/2"	12,5	307,7	12,4	12,4	87,6	90	95	62,0	90,0
3/8"	9,5	241,3	9,7	22,1	77,9	70	88	70,0	76,0
4	4,75	657,8	26,5	48,6	51,4	49	65	49,0	57,0
10	2,00	336,7	13,6	62,2	37,8	29	45	33,0	39,0
40	0,425	433,7	17,5	79,7	20,3	14	25	15,0	21,0
80	0,180	272,7	11,0	90,7	9,3	8	17	8,0	13,0
200	0,075	118,8	4,7	95,4	4,6	4	8	4,0	7,6
PASA 200	0,075	115,3	4,6	100,0	0,0				

EXTRACCIÓN DE ASFALTO

PESO MUESTRA INICIAL	2508,9	g
PESO MUESTRA FINAL	2481,0	g
% DE ASFALTO	4,9%	

ESPECIFICACIÓN

Tolerancia ±	0,3%	
% de asfalto de diseño (%)	5,0%	
Rango de % de asfalto (%)	4,7%	5,3%

g Asfalto:	1,020
g Agregados:	2,589
Rice (g/cm³)	2,495

% asfalto de diseño:	5,0%
T° de compactación:	140

ESTABILIDAD ET (N):	18.550
FLUJO FT (mm)	3,3

MUESTRA No	% ASFALTO	PESO DE BRIQUETA (g)			VOLUMEN (cm3)	PESO ESPECÍFICO (g/cm³)			VOLUMEN EN % TOTAL				% VACÍOS DE AGREGADOS MINERALES	% ASFALTO EFECTIVO DE PESO TOTAL	% RACIÓN LLENOS DE ASFALTO	RELACIÓN LLENANTE - LIGANTE	ESTABILIDAD (N)		FLUJO (mm)	RELACIÓN ESTIF (kN/mm)
		SECO AIRE	EN AGUA	SSS AIRE		SSS	MEZCLA TEÓRICO	MEZCLA MEDIDO	ABSORBIDO	VACIOS CON AIRE	ASFALTO EFECTIVO	ASFALTO ABSORBIDO					MEDIDA	CORREGIDA		
1	4,9%	1210,5	695,2	1211,4	515,1	2,359	2,489	2,495	83,560	5,451	4,811	0,099	16,440	4,922	67,759	0,964	16,30	16,43	3,40	4,83
2		1212,4	696,0	1214,6	518,7	2,351				5,772							16,02	16,51	3,56	4,64
3		1204,2	690,4	1205,8	507,4	2,373				4,590							16,97	17,44	3,62	4,82
4		1208,8	699,7	1209,8	510,2	2,368				5,090							16,25	16,54	3,30	5,01
PROMEDIO:						2,363	2,5	2,495	83,6	5,3	4,81	0,10	16,44	4,82	67,8	0,96	16,51	16,73	3,5	4,82
ESPECIFICACIÓN:						MIN				4			15		65	0,6	6,00	16,72	2,0	3,0
						MAX				6			-		75	1,2	23,23	23,23	3,5	6,0

Observaciones:

Laboratorista Oscar Leonardo Hernandez
REALIZÓ

Ing. Laura Lorenzo
APROBÓ

ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA

112-ECP-FR-018-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	668 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024006500268
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACION DE 10,72 KM DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META"		
OBJETO DEL PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y PUENTES R/L RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA		
NIT:	NIT: 901.901.935 - 6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	169 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024 NIT: 901.930.634-8 R/L ROSANETH ANGARITA GOMEZ		

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Fecha	Ensayo realizado por C / I*	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Resultados		Análisis de Resultados	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
							Rango Cumplimiento	Porcentaje Obtenido %	Cumple S/N	
10/10/2025	C	Mezcla Densa en Caliente MDC-19	Estabilidad	San Luis de Cubarral	ECOBRAS S.A	E-748	16.72 - 23.23	16,95	S	
			Analisis Granulometrico 1 1/2			E-782	100 - 100	100,00%	S	
			Analisis Granulometrico 1"			E-782	100 - 100	100,00%	S	
			Analisis Granulometrico 3/4"			E-782	100 - 100	100,00%	S	
			Analisis Granulometrico 1/2"			E-782	80 - 95	88,00%	S	
			Analisis Granulometrico 3/8"			E-782	70 - 88	77,50%	S	
			Analisis Granulometrico #4			E-782	49 - 65	53,20%	S	
			Analisis Granulometrico #10			E-782	29 - 45	36,30%	S	
			Analisis Granulometrico #40			E-782	14 - 25	19,50%	S	
			Analisis Granulometrico #80			E-782	8 - 17	9,10%	S	
			Analisis Granulometrico #200			E-782	4 - 8	4,20%	S	
			Analisis Granulometrico pasa 200			E-782		0,00%	S	
			Extraccion Cuantitativa de asfalto			E-732	4.7% - 5.3%	4,90%	S	
			Bulk			E-733		2,370	S	
			Flujo			E-748	2.0 - 3.5	3,40	S	
			Gravedad Especifica			E-735		2,495	S	
			Vacios de Aire			E-736	4 - 6	5,00	S	
			Relación Estabilidad / Flujo				3.0 - 6.0	5,04	S	

* Contratista / Interventor
Se anexan los soportes de las diferentes pruebas y ensayos de laboratorio

COMENTARIOS DEL ESPECIALISTA AL RESULTADO DE LOS ENSAYOS:

Firma
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE
**DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-102862 CND

Firma
Nombre: JUAN CAMILO POSADA VARELA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 63202-294712 CND

Firma
Nombre: DIEGO ALEXANDER DUQUE
ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS
N° Matricula Profesional: 25202-196824 CND

** Nota: En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros : Representante Legal o Apoderado
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ECOBRAS S.A.
Ingenieros Contratista

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS EN MEZCLAS EN CALIENTE INV E-
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS EN CALIENTE PARA PAVIMENTO INV E
GRAVEDAD ESPECÍF[illegible]K Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES EMPLEANDO [illegible]MENES SATURADOS
Y SUPERFICIE SECA INV E -733
PORCENTAJE DE VACIOS DE AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS INV E- 736
RESISTENCIA DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL INV E- 748
GRAVEDAD MAXIMA DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PAVIMENTOS INV E- 735

CLIENTE:	CONSORCIO VIAS Y PUENTE	FECHA DE TOMA:	10-oct-20
OBRA:	MEJORAMIENTO VIA A CUBARRAL	FECHA DE ENSAYO:	11-oct-20
LOCALIZACIÓN:	CUBARRAL - META	HORA:	8:33 a. m.
TIPO DE MEZCLA:	MDC-19 / NIVEL DE TRÁFICO: MT3	REMISIÓN:	23178

CURVA GRANULOMETRICA (NORMA INV 782)

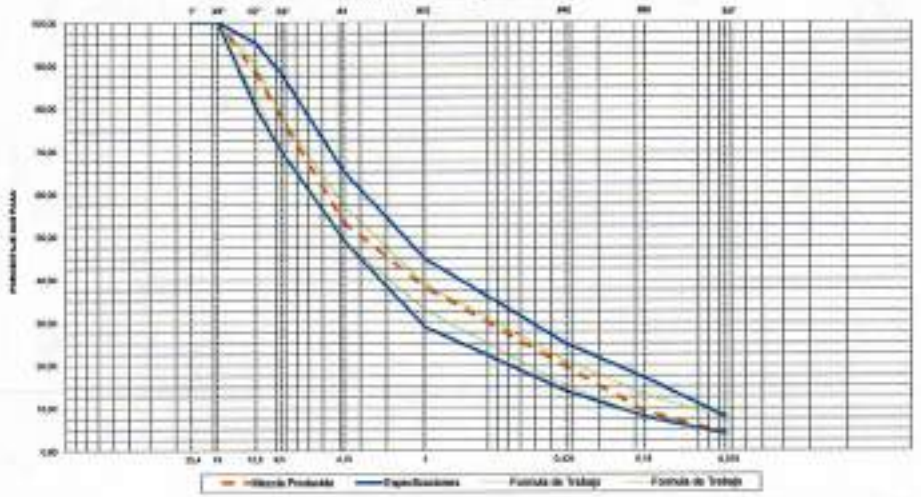

Peso seco antes de lavar (g)	2536,6	Peso seco después de lavar (g)	2429,6	Cumple Pasa (SI/N)	SI	Cumple tolerancia (SI/N)	SI

TAMIZ		PESO RETENIDO	% RETENIDO	% RETENIDO ACUMULADO	% PASA	ESPECIFICACIÓN		TOLERANCIA RESPECTO A FORMULA DE TRABAJO	
No.	mm								
1 1/2"	37,5	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	106,0	100,0
1"	25	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	106,0	100,0
3/4"	19,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	106,0	100,0
1/2"	12,5	304,8	12,0	12,0	88,0	80	95	82,0	90,0
3/8"	9,5	268,7	10,5	22,5	77,5	70	88	70,0	78,8
4	4,75	817,2	24,3	46,8	53,2	49	65	49,0	57,5
10	2,00	377,2	14,9	61,7	38,3	29	45	33,0	36,5
40	0,425	476,1	18,6	80,5	19,5	14	35	13,0	21,5
80	0,180	263,8	10,4	90,9	9,1	8	17	8,0	13,5
200	0,075	124,8	4,9	95,8	4,2	4	8	4,0	7,0
PASA 200	0,075	107,0	4,2	100,0	0,0				

EXTRACCIÓN DE ASFALTO

PESO MUESTRA INICIAL	2567,4	g
PESO MUESTRA FINAL	2539,6	g
% DE ASFALTO	4,0%	

ESPECIFICACIÓN

Tolerancia ±	0,3%	
% de asfalto de diseño (%)	5,0%	
Rango de % de asfalto (%)	4,7%	5,3%

g Asfalto:	1,020
g Agregados	2,609
Pbe (g/cm³)	2,495

% asfalto de diseño	5,0%
T° de compactación	140

ESTABILIDAD ET (N):	16 580
FLUJO FT (mm):	3,3

MUESTRA No	% ASFALTO	PESO DE BRIQUETA (g)			VOLUMEN (cm³)	PESO ESPECÍFICO (g/cm³)			VOLUMEN EN % TOTAL				% VACÍOS DE AGREGADOS MINERALES	% ASFALTO EFECTIVO DE PESO TOTAL	% VACÍOS LLENOS DE ASFALTO	RELACIÓN LLENANTE - LIGANTE	ESTABILIDAD (N)		FLUJO (mm)	RELACIÓN ESTF (kN/mm)
		EN EL AIRE	EN AGUA	SSS		BULK	MÁXIMO TEÓRICO	MÁXIMO MEDIDO	AGREGADO	VACÍOS CON AIRE	ASFALTO EFECTIVO	ASFALTO ABSORBIDO					MEDIDA	CORREGIDA		
1	4,9%	1251,4	708,5	1213,3	512,8	2,382	2,480	2,495	63,816	5,331	4,811	0,047	16,185	4,822	69,045	0,675	16,39	16,94	3,39	4,92
2		1235,1	708,1	1206,8	506,7	2,378				4,669							16,85	17,35	3,29	5,27
3		1232,9	698,4	1203,8	505,5	2,380				4,609							16,90	17,57	3,49	5,03
4		1219,0	703,3	1210,3	516,0	2,360				5,411							16,36	16,34	3,32	4,92
PROMEDIO:						2,379	2,5	2,495	63,8	5,0	4,81	0,10	16,19	4,82	69,0	0,67	16,63	16,95	3,4	5,04
ESPECIFICACIÓN:																				
	MIN									4			15		65	0,8	9,00	16,72	2,0	3,5
	MAX									6			-		75	1,2	23,23	23,23	3,5	6,0

Observaciones:

Laboratorista Oscar Leonardo Hernandez
REALIZÓ

Laura Lorenzo R.
Ing. Laura Lorenzo
APROBÓ

Rv.03 03-08-2018

2149

ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA

112-ECP-FR-018-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	**558 DE 2024**	**PROYECTO N°**	**BPIN 2024005500266**
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META"		
OBJETO DEL PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y PUENTES R/L RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA		
NIT:	NIT: 901.901.935 - 6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	169 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024 NIT: 901.930.634-8 R/L ROSANETH ANGARITA GOMEZ		

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Fecha	Ensayo realizado por: C / I*	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Resultados: Rango Cumplimiento	Resultados: Porcentaje Obtenido %	Análisis de Resultados: Cumple S/N	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
15/10/2025	C	Mezcla Densa en Caliente MDC-19	Estabilidad	San Luis de Cubarral	ECOBRAS S.A	E-748	16,72 - 23,23	16,95	S	
			Analisis Granulometrico 1 1/2			E-782	100 - 100	100,00%	S	
			Analisis Granulometrico 1"			E-782	100 - 100	100,00%	S	
			Analisis Granulometrico 3/4"			E-782	100 - 100	100,00%	S	
			Analisis Granulometrico 1/2"			E-782	90 - 95	88,20%	S	
			Analisis Granulometrico 3/8"			E-782	70 - 88	79,10%	S	
			Analisis Granulometrico #4			E-782	49 - 65	52,40%	S	
			Analisis Granulometrico #10			E-782	29 - 45	36,90%	S	
			Analisis Granulometrico #40			E-782	14 - 25	19,50%	S	
			Analisis Granulometrico #80			E-782	8 - 17	8,40%	S	
			Analisis Granulometrico #200			E-782	4 - 8	4,00%	S	
			Analisis Granulometrico pase 200			E-782		0,00%	S	
			Extraccion Cuantitativa de asfalto			E-732	4,7% - 5,3%	4,90%	S	
			Bulk			E-733		2,359	S	
			Flujo			E-748	2,0 - 3,5	3,50	S	
			Gravedad Especifica			E-735		2,490	S	
			Vacios de Aire			E-736	4 - 6	5,30	S	
			Relación Estabilidad / Flujo				3,0 - 6,0	4,85	S	

* Contratista / Interventor
Se anexan los soportes de las diferentes pruebas y ensayos de laboratorio

COMENTARIOS DEL ESPECIALISTA AL RESULTADO DE LOS ENSAYOS:

Firma
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE
**DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-102862 CND

Firma
Nombre: JUAN CAMILO POSADA VARELA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 63202-294712 CND

Firma
Nombre: DIEGO ALEXANDER DUQUE
ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS
N° Matrícula Profesional: 25202-156824 CND

** Nota: En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros: Representante Legal o Apoderado
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


2350

ECOBRAS S.A.
Ingenieros Contratista

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS EN MEZCLAS EN CALIENTE INV E-
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS EN CALIENTE PARA PAVIMENTO INV E-
GRAVEDAD ESPECIFICA [illegible] Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES EMPLEANDO [illegible]MENES SATURADOS Y SUPERFICIE SECA INV E -733
PORCENTAJE DE VACIOS DE AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS INV E- 736
RESISTENCIA DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL INV E- 748
GRAVEDAD MAXIMA DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PAVIMENTOS INV E- 735

CLIENTE:	CONSORCIO VIAS Y PUENTE	FECHA DE TOMA:	15-oct-25
OBRA:	MEJORAMIENTO VIA A CUBARRAL	FECHA DE ENSAYO:	16-oct-25
LOCALIZACIÓN:	CUBARRAL - META	HORA:	7:10 a. m.
TIPO DE MEZCLA:	MDC-19 / NIVEL DE TRÁFICO: HT2	REMISIÓN:	25/66

CURVA GRANULOMETRICA (NORMA INV 783)

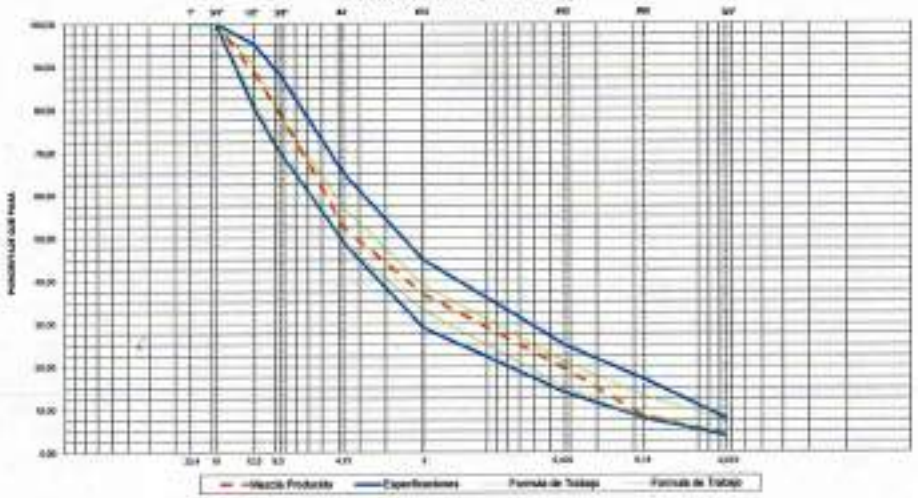

Peso seco antes de lavar (g)	2612,6	Peso seco después de lavar (g)		2611,1	Cumple Franja (S/N)	M	Cumple tolerancia (S/N)	M
TAMIZ		PESO RETENIDO	% RETENIDO	% RETENIDO ACUMULADO	% PASA	ESPECIFICACIÓN		TOLERANCIA RESPECTO A FORMULA DE TRABAJO
No.	mm							
1 ½"	37,5	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100,0	100,0
1"	25	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100,0	100,0
3/4"	19,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100,0	100,0
½"	12,5	395,7	11,8	11,8	88,2	80	85	82,0	90,0
3/8"	9,5	328,3	9,1	20,9	79,1	70	88	70,0	78,8
4	4,75	671,0	25,7	47,6	52,4	49	65	49,0	57,8
10	2,00	381,0	15,0	63,1	36,9	29	45	33,0	38,8
40	0,425	436,8	17,4	80,5	19,6	14	25	15,0	21,8
80	0,180	278,9	11,1	91,6	8,4	8	17	8,0	13,8
200	0,075	109,8	4,4	96,0	4,0	4	8	4,0	7,8
PASA 200	0,075	101,5	4,0	100,0	0,0				

EXTRACCIÓN DE ASFALTO

PESO MUESTRA INICIAL	2642,6	g
PESO MUESTRA FINAL	2513,6	g
% DE ASFALTO	4,9%	

ESPECIFICACIÓN

Tolerancia ±	0,3%	
% de asfalto de diseño (%)	5,0%	
Rango de % de asfalto (%)	4,7%	5,3%

g Asfalto:	1,000
g Agregados:	2,689
Rice (g/cm³):	2,490

% asfalto de diseño:	5,0%
1° de compactacion:	140

ESTABILIDAD ET (N)	16.580
FLUJO FT (mm):	3,3

MUESTRA No.	% ASFALTO	PESO DE BRIQUETA (g)			VOLUMEN (cm³)	PESO ESPECIFICO (g/cm³)			VOLUMEN EN % TOTAL				% VACIOS DE AGREGADOS MINERALES	% ASFALTO EFECTIVO DE PESO TOTAL	% VACIOS LLENOS DE ASFALTO	RELACIÓN LLENANTE - LIGANTE	ESTABILIDAD (N)		FLUJO (mm)	RELACIÓN ESTFT (kN/mm)
		EN EL AIRE	EN AGUA	ABIERTA		BULK	MÁXIMA TEÓRICA	MÁXIMA MEDIDA	AGREGADO	VACIOS CON AIRE	ASFALTO EFECTIVO	ASFALTO ABSORBIDO					MEDIDA	CORREGIDA		
1	4,9%	1211,5	698,1	1213,7	514,6	2,354	2,469	2,490	63,433	5,462	4,889	0,022	16,597	4,901	68,240	0,824	16,92	16,97	3,55	4,78
2		1213,4	698,7	1215,5	515,8	2,349				5,703							16,88	16,73	3,50	4,78
3		1205,9	698,1	1207,4	509,3	2,368				4,900							16,43	16,77	3,43	4,89
4		1207,0	698,7	1208,1	510,4	2,365				5,020							16,66	17,19	3,47	4,95
PROMEDIO:						2,359	2,5	2,490	63,4	5,3	4,90	0,02	16,60	4,90	68,2	0,82	16,76	16,92	3,5	4,85
ESPECIFICACIÓN:						MIN				4			15		65	0,6	9,06	16,72	2,0	2,0
						MAX				6			-		75	1,2	22,23	22,23	3,5	6,0

Observaciones:

Laboratorista Oscar Leonardo Hernandez
REALIZÓ

Ing. Laura Lorenzo
APROBÓ

No.49 V3-09-2019

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

FORMATO CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL – 112-ECP-FR-019_V05

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 5C
VILLAVICENCIO-META
consorciointervialcubarral@gmail.com
Cel.: (+57) 300 3475090

2352

CONTRATO Nº	189 DE 2023	**PROYECTO Nº**	2021-500-1000-2000
OBJETO DEL PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META.		
CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº	189 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024 NIT: 901.990.634-6		
FECHA DE INSPECCIÓN:	27/11/2024 AL 28/11/2024	Nº DE TRABAJADORES:	20

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SST

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes riesgos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ITEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(+ 30 días) ARP, EPS y AFP	X				
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana de Junio), y capacitación	X				
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de: (Herramientas, EPP)	X				
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades.	X				
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa	X				
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.).	X				
7	Se poseen procedimientos de trabajo , en el cual encuentren identificadas las actividades críticas con sus riesgos y controles.		X			
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades críticas y en general que corresponden al alcance de la actividad desarrollada		X			
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo.(divulgación de procedimientos)	X				
	SUBTOTAL	70	10	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- HA)	89%				

ITEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.	X				
11	Las unidades sanitarias fijas ó portátiles están limpias.	X				
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final	X				
13	Está demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.		X			
14	El material, equipos y herramientas están organizado.	X				
15	El material de descapote se acopia y se protege	X				
16	La bodega de almacenamiento esta en orden y aseo					X
	SUBTOTAL	30	5	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-HA)	92%				

ITEM	GESTIÓN DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)					X
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos lineas, señalización, se tiene entibado o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica					X
19	Herramientas y/o vecindarios en áreas vecinas, que generen algun tipo de riesgo al personal.					X
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garantizen la comunicación integral en caso de necesitarse.	X				
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)					X
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Hélice, resguardos, etc.)					X
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados					X
	SUBTOTAL	10	0	0	0	6
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-HA)	100%				

ITEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor	X				
35	El personal cuenta con dotación adecuada	X				
36	Cascos de seguridad con ratchet para trabajos en alturas	X				
37	Se cuenta con barbuquejo	X				
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada	X				
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada	X				
40	Protección respiratoria adecuada para la labor.		X			
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado	X				
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras	X				
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.	X				
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para exposición según necesidad	X				
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.		X			
	SUBTOTAL	100	10	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-HA)	92%				

ITEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores, Ver registro (Registro expedido por medico especialista en S.O)	X				
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	X				
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Artículo 21 de la Ley 50 de 1990.	X				
	SUBTOTAL	30	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-HA)	100%				

ITEM	SEÑALIZACIÓN	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.			X		
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vías, etc.	X				
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pilas					X
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo	X				
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención	X				
	SUBTOTAL	20	0	3	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-HA)	83%				

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2353

CONTRATO Nº	169 DE 2023	**PROYECTO Nº**	20240050050268
OBJETO DEL PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	169 DE 2020		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024 NIT: 901.830.634-6		
FECHA DE INSPECCIÓN:	27/5/2025 AL 19/6/2025	Nº DE TRABAJADORES:	28

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SSO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ITEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACION A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
24	Están las Eslingas en óptimo estado de funcionamiento y cuentan con etiqueta de capacidad de carga y características del fabricante					X
25	Se cuenta con Plan de izaje y tiene todos los riesgos asociados a la labor, cuenta con cálculos según norma (capacidades, puntos de apoyo ASME B30.9).					X
26	El personal que realiza la labor se encuentra certificado (operador, supervisor del izaje, Operador).					X
27	Se señaliza y demarca la carga					X
	SUBTOTAL	0	0	3	0	4
	Valor : % Obtenido (A+B+C)/(46-NA)					

ITEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACION A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
54	Se cuenta con elementos de protección pasiva, equipos certificados y cumplen con especificaciones técnicas. (escaleras, andamios, pasarelas,etc).					X
55	Se cuenta con los elementos y equipos de protección personal de acuerdo al trabajo a realizar (arnés, cuerdas, eslingas, conectores) y se tienen las fichas de inspección de cada uno. (Ver registro)					X
56	Se cuenta con kit y plan de rescate para trabajos en altura específico para la labor					X
57	Se cuenta con el coordinador certificado para trabajo seguro en alturas					X
58	Se cuenta con el rescatista certificado para trabajo seguro en alturas					X
	SUBTOTAL	0	0	0	0	5
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(46-NA)					

ITEM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	10	5	3	0	N.A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.	X				
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes.	X				
30	Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización	X				
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro					X
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado	X				
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico.	X				
	SUBTOTAL	50	0	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	100%				

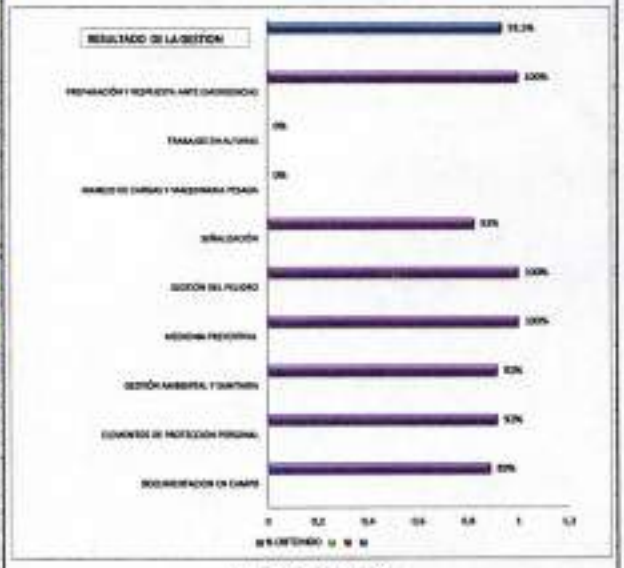


GRAFICO DE GESTION SSO

GESTION EN CAMPO

	COMPONENTES	% OBTENIDO	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACION EN CAMPO	89%	70	10	0	0	0
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	92%	100	10	0	0	0
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	92%	90	5	0	0	1
4	MEDICINA PREVENTIVA	100%	30	0	0	0	0
5	GESTIÓN DEL PELIGRO	100%	10	0	0	0	0
6	SEÑALIZACIÓN	83%	30	0	3	0	1
7	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA		0	0	0	0	4
8	TRABAJOS EN ALTURAS		0	0	0	0	5
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	100%	50	0	0	0	1
RESULTADO DE AUDITORIA GESTIÓN EN CAMPO			380	25	3	0	12
ALTO	MEDIO	BAJO	93,5%				
9							

2354

CONTRATO Nº	189 DE 2023	**PROYECTO Nº**	2024001000284
OBJETO DEL PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 15.72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META		
CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº	169 DE 2023		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024 NIT: 901.830.634-8		
FECHA DE INSPECCIÓN:	27/09/2024 AL 28/09/24	Nº DE TRABAJADORES:	20

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SST

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ITEM	DOCUMENTACIÓN BÁSICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN					ITEM	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E			A	B	C	D	E
		10	5	3	0	NA			10	5	3	0	NA

OBSERVACIONES

ITEM RELACIONADO	RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
	SIN EVENTUALIDADES.	

OBSERVACIONES GENERALES

Firma
Nombre: RAFAEL [illegible]
RESIDENTE DE OBRA
Nº Matrícula Profesional: 25202-29062 CND

Firma
Nombre: YULITZA RAMIREZ
PROFESIONAL SG-SST OBRA
Nº L.S.O: 6299 DE 2020

Firma
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Nº Matrícula Profesional: 25202-[illegible] CND

Firma
Nombre: ATAHUAL GOMEZ ZARATE
PROFESIONAL EN SGSST INTERVENTORIA
Nº L.S.O: 4021 DE 2016

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL - 112-ECP-FR-020

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

CONTRATO N°	658-2024	PROYECTO N°	BPIN 2024065000366

OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS Y PUENTES NIT: 901.901.935-8 R/L Rafael Fernando Baquero Medina
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	169-2025
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024 NIT: 901.930.034-8 R/L Rosareth Angarita Gómez
FECHA DE INSPECCIÓN:	31/10/2025

SUELO

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitación Personal	X		SI	4.6	Ampliar evidencias y/o soportes
	Separación y clasificación	X		SI	4.6	
	Disposición Final	X		SI	4.6	
	Programación de retiro	X		SI	4.6	
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas	X		SI	4.6	
	Limpieza interna y externa de la obra	X		SI	6	
	Almacenamiento de materiales y combustibles	X		SI	4.6	
	Cerramiento	X		SI	4.6	
	Manejo de Vegetacion	X		SI	4.6	
	Estabilidad de Taludes			NA	0	
Calificación:	Buena: 4.6 - 6 Aceptable: 2.6 - 4.5	Deficiente: 0 - 2.5		SUMATORIA	42.8	
				PROMEDIO	4.28	

AGUA

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal	X		SI	4.6	
	Manejo Escorrentia			NA	0.25	
	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.	X		SI	5	
	Medidas de contingencia	X		SI	5	
	Zonas de trabajo secas			NA	0.25	
	Manejo nivel freático			NA	0.25	
	Separación y clasificación de vertimientos	X		SI	6	
	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)	X		SI	6	El contratista cuenta con UNS portatiles, con empresa autorizada.
Calificación:	Buena: 4.6 - 6 Aceptable: 2.6 - 4.5	Deficiente: 0 - 2.5		SUMATORIA	27.35	
				PROMEDIO	3.038888889	

RESOLUCIONES	NUMERO	
CONCESIÓN DE AGUAS	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCE	N/A	

AIRE

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	Capacitación Personal	X		SI	4.6	Ampliar evidencias y/o soportes
	Humedecimiento de áreas de trabajo	X		SI	4.6	
	Cubrimiento de acopios de materiales	X		SI	4.6	
	Uso de mallas protectoras		X	NO	2.5	
	No exceder volumenes del volco de los camiones	X		SI	4.6	
	Olores desagradables			SI	4.6	
	Aseo Interno y externo de la obra	X		SI	4.6	
	Uso de equipos en buen estado	X		SI	4.6	
	Apantallamiento sonoro del área			NA	0.25	
	Planificación de horarios de trabajo	X		SI	4.6	
	Medidas de Contingencia	X		SI	4.6	
Calificación:	Buena: 4.6 - 6 Aceptable: 2.6 - 4.5	Deficiente: 0 - 2.5		SUMATORIA	44.15	
				PROMEDIO	4.013636364	

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN

CONTRATO Nº	556-2024		PROYECTO Nº	BPIN 2024000500266	
CUIDADOS AMBIENTALES	Programa de manejo y almacenamiento de materiales	X	SI	5	
	Almacenamiento adecuado de combustibles	X	SI	5	
	Localización y señalización en el Campamento	X	SI	5	
	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros	X	SI	5	
	Obras de contención		N/A	0.25	
	Capacitación del Personal	X	SI	5	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	25.25	
			PROMEDIO	4.208333333	

SEÑALIZACIÓN						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	Capacitación Personal	X		SI	6	
	Demarcación del perimetro		X	SI	0	
	Zonificación de la obra		X	SI	0	
	Lona de Cerramiento		X	SI	0	
	Cinta de Reflectiva	X		SI	6	
	Señales Informativas y preventivas	X		SI	6	
	Uso de Paleteros		X	NO	0	
	Iluminación Nocturna		X	NO	4.5	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	46.5		
			PROMEDIO	5.8125		

GESTIÓN SOCIAL						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Capacitación Personal	X		SI	5	
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	5	
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	5	
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	5	
	Programa de información a a la comunidad	X		SI	5	
	Socializaciones	X		SI	5	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	30		
			PROMEDIO	5		

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Capacitación del Personal	X		SI	4.6	
	Mantenimiento Preventivo	X		N/A	5	
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	4.6	
	Ficha de control de actividades	X		SI	5	
	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X		SI	4.6	
	Elementos de protección personal	X		SI	4.6	
	Extintores	X		SI	4.6	
	Medidas de Contingencia	X		SI	4.5	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	37.5		
			PROMEDIO	4.6875		

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	Capacitación del Personal	X		SI	6	
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	6	
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	6	
	Ficha de control de actividades	X		SI	6	
	Uso de equipos en buen estado,	X		SI	6	
	Elementos de protección personal	X		SI	6	
	Extintores	X		SI	6	
	Medidas de Contingencia	X		SI	6	
	Volumen de material (m3)	X		SI	4.6	
	Volumen de excavacion (m3)	X		SI	6	
	Volumen de demolicion (m3)	X		SI	6	
	Volumen de tierra (m3)			N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	64.6		
			PROMEDIO	5.383333333		

CONTRATO N°	668-2024	PROYECTO N°	BPIN 2024000500266
DOCUMENTACIÓN		NUMERO	
REGISTRO PROVEEDOR:			
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN ESCOMBRERA:		BIOAGRICOLA DEL LLANO E.S.P.	

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACIÓN		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	Capacitación Personal			N/A	2.5	
	Dotación de elementos de protección personal			N/A	2.5	
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional			N/A	2.5	
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos			N/A	2.5	
	Programa de información a o la comunidad			N/A	2.5	
	Socializaciones			N/A	2.5	
	Arboles talados			N/A	2.5	
	Arboles podados			N/A	2.5	
	Arboles bloqueados			N/A	2.5	
	Arboles sembrados			N/A	2.5	
Calificación:	Buena: 4.6 - 5 Aceptable: 2.6 - 4.5 Deficiente: 0 - 2.5			SUMATORIA	25	
				PROMEDIO	2.5	

RESULTADO DE LA GESTION EN CAMPO	PUNTAJE	%	RESULTADO
	38.92419192	51.2	Aceptable

OBSERVACIONES GENERALES
s importante que el CONTRATISTA evidencie de manera detallada las acciones realizadas en cada uno de los programas del documento PAGA, con sus soportes

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **viernes, 31 de octubre de 2025**

Firma
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 2520219820 CND

Firma
Nombre CHRISTIAN FERNANDO PADILLA SANDOVAL
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25260-252466 CND

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ACTA CONTROL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Formato 112-ECP-FR-021

VILLAVICENCIO: Cra. 32 No 38-70 Of. 1302 — Ed. Romarco
Cel. 3158660074
e-mail: admoncviasypuentes2025@gmail.com

2360

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V05
09/09/2024

CONTRATO Nº	658 DE 2024	**PROYECTO Nº**	BPIN 2024005930266

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y PUENTES
NIT:	901.901.935 - 6
CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº	169 DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

NUMERO DE PLANILLA:	7983378164				**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:**		2025-10		a		2025-11			
					SALUD		PENSIÓN							
Nombre personal	**Cargo y/o oficio**	**cedula**	**sueldo**	**Dias Cotizados**	**EPS**	**VALOR**	**PENSION**	**VALOR**	**Valor Riesgos profesionales**	**I.C.B.F.**	**SENA**	**caja de compensación**	**Total a pagar**
Brayan Peña	Auxiliero	1.006.775.847	$ 1.660.900,00	30	Coljacopi	$ 74.100,00	Porvenir	$ 317.000,00	$ 140.200,00	$ -	$ -	$ 74.100,00	$ 906.100,00
Luis Angel Narvaez	Conductor	1.006.868.315	$ 1.762.900,00	30	Famisanar	$ 81.900,00	Porvenir	$ 351.400,00	$ 129.000,00	$ -	$ -	$ 81.900,00	$ 944.000,00
Ignacio Rojas	Ayudante de cuadrilla	10.188.138	$ 1.423.900,00	30	Salud Total	$ 71.800,00	Colpensiones	$ 285.400,00	$ 142.300,00	$ -	$ -	$ 81.800,00	$ 801.300,00
Wilmer Rojas	Ayudante de cuadrilla	1.123.562.371	$ 1.423.900,00	30	Nueva EPS	$ 71.400,00	Protección	$ 285.400,00	$ 124.200,00	$ -	$ -	$ 71.400,00	$ 802.400,00
Juan Sebastian Bella	Ayudante de cuadrilla	1.123.809.684	$ 1.423.900,00	30	Sanitas	$ 71.100,00	Porvenir	$ 284.100,00	$ 123.000,00	$ -	$ -	$ 71.100,00	$ 849.900,00
Fabian Ortiz	Operador	1.234.756.118	$ 1.660.900,00	30	Salud Total	$ 91.500,00	Porvenir	$ 366.000,00	$ 159.200,00	$ -	$ -	$ 91.500,00	$ 708.600,00
Andres Camilo Ramirez	Rastrillero	1.234.761.031	$ 1.660.900,00	30	Nueva EPS	$ 74.900,00	Porvenir	$ 321.700,00	$ 130.200,00	$ -	$ -	$ 74.900,00	$ 601.700,00
Camilo Buitrago	Ayudante de cuadrilla	1.234.761.727	$ 1.423.500,00	30	Sanitas	$ 72.900,00	Porvenir	$ 291.600,00	$ 119.000,00	$ -	$ -	$ 88.400,00	$ 682.100,00
Jose Matias	Operador	17.344.538	$ 1.660.900,00	30	Nueva EPS	$ 88.300,00	Colpensiones	$ 353.200,00	$ 153.700,00	$ -	$ -	$ 88.300,00	$ 683.800,00
Henry Gonzalez	Ayudante de cuadrilla	17.380.168	$ 1.660.900,00	30	Famisanar	$ 71.600,00	Porvenir	$ 286.400,00	$ 124.600,00	$ -	$ -	$ 71.600,00	$ 884.300,00
Armando Moreno	Inspector de cuadrilla	86.041.016	$ 3.379.800,00	30	Sanitas	$ 135.200,00	Colpensiones	$ 540.800,00	$ 235.200,00	$ -	$ -	$ 135.200,00	$ 1.646.200,00
Jose Fenley Ortiz	Operador	86.054.672	$ 2.193.900,00	30	Sanitas	$ 193.100,00	Protección	$ 412.400,00	$ 196.500,00	$ -	$ -	$ 193.100,00	$ 815.100,00
Eduardo Martinez	Director	86.057.208	$ 11.235.300,00	30	Sanitas	$ 449.400,00	Colpensiones	$ 1.918.000,00	$ 782.000,00	$ -	$ -	$ 449.400,00	$ 3.890.800,00
Jhon Cardenas	Operador	86.254.208	$ 1.660.900,00	30	Nueva EPS	$ 93.000,00	Protección	$ 371.700,00	$ 161.700,00	$ -	$ -	$ 93.000,00	$ 719.400,00
Rafael Fernando Bolaños Medina	Ingeniero Residente	17.328.108	$ 15.480.800,00	30	Sanitas	$ 2.047.800,00	Colpensiones	$ 2.785.200,00					$ 4.833.000,00
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												Total	$ 17.037.900,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoría o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 1/11/2025

Firma
Nombre: RAFAEL FERNANDO BOLAÑOS MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Firma
Nombre: Ing. EDUARDO MARTINEZ TARACHE
DIRECTOR DE OBRA
Nº Matrícula Profesional: 25202-102862 CND

Firma
Nombre: ADA LYRETH CRUZ
CONTADOR DE CONTRATISTA
Nº Matrícula Profesional: 220[illegible]-T

Firma
Nombre: ROSANETH ANGARITA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma
Nombre: Ing. JUAN CAMILO OSPINA VARELA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nº Matrícula Profesional: 03202-294712 CND

Firma
Nombre: ERIKA TATIANA PINEDA
CONTADOR DE INTERVENTORIA
Nº Matrícula Profesional: 160184-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1927

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800674462
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ECODIBAG S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 32 38 15 OFICINA 13 ED	TELÉFONO:	6716106
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79033781664	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN S/PENS:	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			20251104	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			180745915

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CM001	CM001- PROTECCION	13	$ 3.842.700	$ 0	$ 0	$ 38.600	$ 38.600	$ 0	$ 0	$ 8.021.300	$ 0	$ 8.021.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	17	$ 5.170.900	$ 0	$ 0	$ 138.200	$ 138.200	$ 0	$ 0	$ 8.953.300	$ 0	$ 8.953.300
23-0001	23-0001-COLSANITAS	1	$ 532.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 532.300	$ 0	$ 532.300
CM001	CM001-PORVENIR	36	$ 4.284.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.284.200	$ 0	$ 4.284.200
SUBTOTALES:										$ 29.971.100	$ 0	$ 29.971.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC56	CCFC56- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 74.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.100	$ 0	$ 0	$ 74.100
EPS018	CAJA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	13		$ 0		$ 0		$ 0	$ 960.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 960.200	$ 0	$ 0	$ 960.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	24		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.708.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.708.900	$ 0	$ 0	$ 1.708.900
EPS007	EPS007-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 649.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 649.700	$ 0	$ 0	$ 649.700
EPS040	NUEVA EPS CM	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 217.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.700	$ 0	$ 0	$ 217.700
EPS041	EPS041 FAMISANAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 659.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 659.200	$ 0	$ 0	$ 659.200
EPS034	EPS034-CAPITAL SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 5.700
SUBTOTALES:													$ 7.344.600	$ 0	$ 0	$ 7.344.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A CARGO RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-1	14-1-SEGUROS BOLIVAR S.A.	64		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.227.900	$ 7.227.900	$ 0	$ 0	$ 7.227.900
SUBTOTALES:									$ 7.227.900	$ 0	$ 0	$ 7.227.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COMFAMA META	60	$ 4.671.500	$ 0	$ 4.671.500
CCF23	CCF23-COLSUBSIDIO	3	$ 511.500	$ 0	$ 511.500
SUBTOTALES:			$ 5.183.000	$ 0	$ 5.183.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	899078482
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ECOBRAS S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 32 38 55 OFICINA 13 02	TELÉFONO:	6710189
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	3-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades legisladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		N
APORTANTE CONSIGNADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7965378184	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOR
PERIODO COTIZACIÓN SISTEMA:	MES	mmdaa AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mmdaa AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaammdd):		2026/01/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		165214915

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | NOVEDADES | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	8909184621
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ECOPETROL S.A.
CIUDAD/DEPARTAMENTO:		VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO: META
DIRECCIÓN:	CRA 33	38 70 OFICINA 1310	TELÉFONO: 6713199
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE: 3-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:			PRIVADA: ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:			UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			N

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7883378104	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	Inicio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES (anterior) AÑO (año)
CÓDIGO SUCURSAL:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			20251104	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1902745815

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	8000794002
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CODENSA S.A.
DEPARTAMENTO/MUNICIPIO:		DEPARTAMENTO:	META
DIRECCION:	VILLAVICENCIO CRA.32 38-70 OFICINA 10 02	TELEFONO:	6715199
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:		UNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			S

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79033791164	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO LIQUIDACIÓN SISTEMA:	MES	octubre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DIAS DE MORA:			0		
FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1002793810

DATOS DEL COTIZANTE | **NOVEDADES** | **LIQUIDACIÓN DECLARA APORTES**

#	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO	SUBTIPO	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC	[illegible]	DEPEND		$ 4.434.000	FIJO			30													
2	CC	[illegible]	DEPEND		$ 2.033.000	FIJO			30													
3	CC	[illegible]	DEPEND		$ 1.070.000	FIJO			30											14.67		
4	CC	[illegible]	DEPEND		$ 1.070.000	FIJO			30											01.13		
5	CC	[illegible]	DEPEND		$ 1.070.000	FIJO			30						X							
6	CC	[illegible]	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			30													
7	CC	[illegible]	DEPEND		$ 1.752.000	FIJO			30													
8	CC	[illegible]	DEPEND		$ 1.423.000	FIJO			30													
9	CC	[illegible]	DEPEND		$ 2.188.432	FIJO			30						X							
10	CC	[illegible]	DEPEND		$ 3.378.000	FIJO			30													
11	CC	[illegible]	DEPEND		$ 1.607.280	FIJO			30						X							
12	CC	[illegible]	DEPEND		$ 2.577.273	FIJO			30						X							
13	CC	[illegible]	DEPEND		$ 11.235.000	FIJO			30											11.235.000		
14	CC	[illegible]	DEPEND		$ 1.667.350	FIJO			30						X							
15	CC	[illegible]	DEPEND		$ 2.438.381	FIJO			30						X							
16	CC	[illegible]	DEPEND		$ 2.558.864	FIJO			30						X							
17	CC	[illegible]	DEPEND		$ 2.328.617	FIJO			30						X							
18	CC	[illegible]	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			30													
19	CC	[illegible]	DEPEND		$ 2.044.986	FIJO			30						X							

#	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
	PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINCULT
	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTES	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.434.000	$ 708.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 708.000	P5607-NUEVA EPS	30	$ 4.434.000	$ 177.400	$ 0	$ 177.400	4-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.434.000	1	$ 88.700	$ 4.434.000	CCF34-COFREM META	$ 177.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	23-01-PORVENIR	30	$ 2.033.000	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 325.000	P5606-SANITAS S.A.	30	$ 2.033.000	$ 81.400	$ 0	$ 81.400	4-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.033.000	1	$ 10.150	$ 2.033.000	CCF34-COFREM META	$ 81.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 999.400	$ 159.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.900	P5606-SANITAS S.A.	30	$ 999.400	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	4-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 999.400		$ 0	$ 999.400	CCF34-COFREM META	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.473.000	$ 395.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 395.600	P5606-SANITAS S.A.	30	$ 2.473.000	$ 98.900	$ 0	$ 98.900	4-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.473.000		$ 0	$ 2.473.000	CCF34-COFREM META	$ 34.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.744.000	$ 279.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 279.200	P5606-SANITAS S.A.	30	$ 1.744.000	$ 69.800	$ 0	$ 69.800	4-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.744.000	1	$ 8.360	$ 1.744.000	CCF34-COFREM META	$ 21.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	28-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	P5207-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	4-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 68.300	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 17.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	23-01-PROTECCION	30	$ 1.752.000	$ 280.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.400	C34-CAJACOPI CAJA DE SERVICIOS S.DE SALUD	30	$ 1.752.000	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	4-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.752.000	1	$ 8.350	$ 1.752.000	CCF32-1.752.000 COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	28-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.000	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	P5606-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.000	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	4-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.000	1	$ 17.000	$ 1.423.000	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.188.432	$ 350.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 350.200	P5606-SANITAS S.A.	30	$ 2.188.432	$ 87.600	$ 0	$ 87.600	4-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.188.432	1	$ 152.400	$ 2.188.432	CCF34-COFREM META	$ 87.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.378.000	$ 540.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 540.700	P5606-SANITAS S.A.	30	$ 3.378.000	$ 135.200	$ 0	$ 135.200	4-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.378.000	1	$ 0	$ 3.378.000	CCF34-COFREM META	$ 135.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	23-01-PORVENIR	30	$ 1.607.280	$ 264.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 264.900	P5607-SALUD TOTAL	30	$ 1.607.280	$ 73.000	$ 0	$ 73.000	4-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.607.280	1	$ 121.900	$ 1.607.280	CCF34-COFREM META	$ 73.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	23-01-PROTECCION	30	$ 2.577.273	$ 412.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 412.400	P5606-SANITAS S.A.	30	$ 2.577.273	$ 103.100	$ 0	$ 103.100	4-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.577.273	1	$ 0	$ 2.577.273	CCF34-COFREM META	$ 103.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	25-14 COLPENSIONES	30	$ 11.235.000	$ 1.797.600	$ 89.800	$ 89.800	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.977.200	P5606-SANITAS S.A.	30	$ 11.235.000	$ 449.400	$ 0	$ 449.400	4-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 11.235.000	1	$ 783.000	$ 11.235.000	CCF32-11.235.000 COLSUBSIDIO	$ 449.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	23-01-PORVENIR	30	$ 1.667.350	$ 266.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 266.800	P5202-SANITAS S.A.	30	$ 1.667.350	$ 66.800	$ 0	$ 66.800	4-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.667.350	1	$ 126.400	$ 1.667.350	CCF34-COFREM META	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.438.381	$ 390.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 390.200	P5202-SALUD TOTAL	30	$ 2.438.381	$ 97.600	$ 0	$ 97.600	4-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.438.381	1	$ 185.000	$ 2.438.381	CCF34-COFREM META	$ 97.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	23-01-PROTECCION	30	$ 2.558.864	$ 441.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 441.100	P5202-SANITAS S.A.	30	$ 2.558.864	$ 110.300	$ 0	$ 110.300	4-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.558.864	1	$ 181.900	$ 2.558.864	CCF34-COFREM META	$ 110.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	23-01-PROTECCION	30	$ 2.328.617	$ 404.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 404.900	P5202-SALUD TOTAL	30	$ 2.328.617	$ 93.300	$ 0	$ 93.300	4-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.328.617	1	$ 176.000	$ 2.328.617	CCF34-COFREM META	$ 101.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	23201-PROTECCION	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	P5011-FAMISANAR	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	4-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.000.000	1	$ 270.400	$ 4.000.000	CCF34-COFREM META	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC	[illegible]	DEPEND		$ 2.044.986	FIJO			30						X							
	23-01-PORVENIR	30	$ 1.955.272	$ 312.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 312.900	P5202-SANITAS S.A.	30	$ 1.955.272	$ 78.300	$ 0	$ 78.300	4-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.955.272	1	$ 156.100	$ 1.955.272	CCF34-COFREM META	$ 106.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla Pagada
SOI

2 2 6

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830078562
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ECOPETROL S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 22 38 70 OFICINA 13 62	TELÉFONO:	6710100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	0-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades regulatorias y fiscalizadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			N

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		70833781		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERÍODO COTIZACIÓN ETROS	MES	octubre AÑO	2025	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			160274915

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL **META**
NIT. 900220547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005506266
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y PUENTES		
NIT:	901.901.935 - 6		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	169 DE 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024		

NUMERO DE PLANILLA:	9494713608						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de octubre de 2025		a 31 de octubre de 2025	
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensacion	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
Diego Alexander Duque	Especialista en Pavimentos	86.075.526	$ 1.425.500,00	30	Famisanar	$ 178.000,00	Porvenir	$ 227.800,00	$ 86.100,00	$ -	$ -	$ -	$ 504.900,00
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												Total	$ 504.900,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoría o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia firman aquellos que firman la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 1/11/2025

Firma:
Nombre: RAFAEL FERNANDO [illegible]
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre: Ing. EDUARDO MARTINEZ TARACHE
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-102982 CND

Firma:
Nombre: ALBA YINETH CRUZ
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 220301-T

Firma:
Nombre: ROSARITH ANGARITA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Ing. JUAN CAMILO ROSADA VARELA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 63202-294712 CND

Firma:
Nombre: ERIKA TATIANA PINEDA
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 180184-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86075526		DUQUE VARGAS DIEGO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 15 n. 40 01 of 902	VILLAVICENCIO-META	6833789	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	93725983	9494713505	Y	2025/11/10	2025/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	8	$507,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
1	CC 86075526	DUQUE DIEGO		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total	Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86075526		DUQUE VARGAS DIEGO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 15 n. 40 01 of 902	VILLAVICENCIO-META	6833789	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	93725983	9494713505	Y	2025/11/10	2025/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	8	$507,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$500	$0	$99,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$99,100	$500	$0	$99,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$900	$0	$178,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$900	$0	$178,900
TOTAL				1	$504,900	$2,600	$0	$507,500

CONTRATO Nº	558 DE 2024	PROYECTO Nº	BPIN 2024000500266

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y PUENTES
NIT:	901.931.935 - 6
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	559 DE 2025
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

NUMERO DE PLANILLA:	7593423586						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:				2025-10	a	2025-11
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
Yiber Gilberto Arias Díaz	Operario	1.006.667.791	$ 2.800.000,00	30	Nueva Eps	$ 88.200,00	Porvenir	$ 375.500,00	$ 163.400,00	$ -	$ -	$ 93.900,00	$ 731.900,00
Ivan Pulido Vargas	Inspector de obra	17.344.081	$ 3.800.000,00	10	Caja Copi	$ 72.000,00	Colpensiones	$ 268.000,00	$ 125.300,00	$ -	$ -	$ 72.000,00	$ 537.300,00
Eduard Andres Valandia Carrasco	Ayudante de obra	1.006.962.330	$ 1.423.500,00	4	Nueva Eps	$ 19.500,00	Protección	$ 77.900,00	$ 33.900,00	$ -	$ -	$ 19.500,00	$ 150.800,00
Angela Maria Pulla Cruz	Auxiliar Vial	1.124.191.483	$ 1.423.500,00	15	Sanitas	$ 62.200,00	Colpensiones	$ 248.500,00	$ 108.100,00	$ -	$ -	$ 62.200,00	$ 481.000,00
Daniel Alexis Murcia Ramos	Ayudante de obra	17.623.931	$ 1.423.500,00	4	Nueva Eps	$ 14.100,00	Porvenir	$ 56.300,00	$ 24.500,00	$ -	$ -	$ 14.100,00	$ 109.000,00
Luz Adriana Duarte Moreno	Auxiliar Vial	51.937.385	$ 1.423.500,00	15	Salud Total	$ 80.500,00	Porvenir	$ 321.500,00	$ 140.000,00	$ -	$ -	$ 80.500,00	$ 622.500,00
Ricardo Tover Riaño	Auxiliar Vial	79.126.916	$ 1.423.500,00	17	Nueva Eps	$ 132.900,00	Colpensiones	$ 531.600,00	$ 231.200,00	$ -	$ -	$ 132.900,00	$ 1.029.600,00
Oscar Fernando Velez	Ing. Civil	86.070.780	$ 2.500.000,00	30	Sanitas	$ 100.000,00	Porvenir	$ 400.000,00	$ 174.000,00	$ -	$ -	$ 100.000,00	$ 774.000,00
Cristian David Vasquez Bustos	Ayudante de obra	1.075.704.393	$ 1.423.500,00	4	Nueva Eps	$ 92.400,00	Porvenir	$ 369.500,00	$ 160.700,00	$ -	$ -	$ 92.400,00	$ 715.000,00
Maveny Yorlina Alvarez Ramirez	Profesional SISO	1.122.141.683	$ 1.423.500,00	30	Sanitas	$ 55.000,00	Porvenir	$ 220.200,00	$ 95.800,00	$ -	$ -	$ 55.000,00	$ 426.000,00
												Total	$ 4.438.800,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoría o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 31/11/2025

Firma:
Nombre: RAFAEL FERNANDO PRADO [illegible]
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre: Ing. EDUARDO MARTINEZ TARACHE
DIRECTOR DE OBRA
Nº Matrícula Profesional: 25202-102862 CND

Firma:
Nombre: ANA VALETH CRUZ
CONTADOR DE CONTRATISTA
Nº Matrícula Profesional: 222[illegible]-T

Firma:
Nombre: ROSANETH ARGUETA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Ing. JUAN CAMILO POSADA VARELA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Nº Matrícula Profesional: 63202-294712 CND

Firma:
Nombre: ERIKA TATIANA PINEDA
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
Nº Matrícula Profesional: 180184-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2369

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900901935
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAS Y PUENTES META
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CALLE 32 38 79 ED ROMARCO OF 1302	TELÉFONO:	6710100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A (MENOS DE 200 COTIZANTES)
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE CONSIGNADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	7993425106		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	mm/aaaa AÑO	3026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mm/aaaa AÑO	3026
FECHA DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			3026/11/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1602029928

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25007	25007- PROTECCION	1	$ 77.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.000	$ 0	$ 77.000
25001	25001-PORVENIR	11	$ 4.034.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.034.000	$ 0	$ 4.034.000
25-10	25-10 COLPENSIONES	3	$ 894.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 894.800	$ 0	$ 894.800
SUBTOTALES										$ 5.005.700	$ 0	$ 5.005.700

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	RECIPROCIDAD POR INCAPACIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	RECIPROCIDAD POR INCAPACIDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AGREG	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AGREG	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTE	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-Famisanar	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 95.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.000	$ 0	$ 0	$ 95.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.800	$ 0	$ 0	$ 200.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.100	$ 0	$ 0	$ 109.100
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 122.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.100	$ 0	$ 0	$ 122.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 411.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.200	$ 0	$ 0	$ 411.200
EPS008	EPS008-SALUD TOTAL EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 73.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.000	$ 0	$ 0	$ 73.000
EPS034	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 241.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.800	$ 0	$ 0	$ 241.800
SUBTOTALES													$ 1.260.000	$ 0	$ 0	$ 1.260.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A CARGO RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTE	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.119.200	$ 2.119.200	$ 0	$ 0	$ 2.119.200
SUBTOTALES									$ 2.119.200	$ 0	$ 0	$ 2.119.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COMFEM META	10	$ 1.200.000	$ 0	$ 1.200.000
SUBTOTALES			$ 1.200.000	$ 0	$ 1.200.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | DEVENGADO SGSSI: PENSIÓN (ADMIN, IBC, COTIZACIÓN, FSP SUBSISTENCIA, FSP SOLIDARIDAD, APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR, APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO, INDICADOR PAMPA ESPECIAL, TOTAL APORTE) | SALUD (ADMIN, IBC, COTIZACIÓN, VALOR AGREG, TOTAL APORTE) | IRP (ADMIN, IBC, CENTRO DE TRABAJO, TOTAL APORTE) | PARAFISCALES (CCF: IBC, ADMIN, TOTAL APORTES; SENA: TOTAL APORTES; ICBF: TOTAL APORTES; ESAP/ESE: TOTAL APORTES; MINEDU: TOTAL APORTES)

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	DÍAS COTIZADOS	HORAS TRABAJADAS	IBC	DÍAS INCAPACIDAD	DÍAS LICENCIA MATERNIDAD	DÍAS VACACIONES	DÍAS LICENCIA REMUNERADA	DÍAS LICENCIA NO REMUNERADA	DÍAS SUSPENSIÓN TEMPORAL	DÍAS HUELGA LEGAL	DÍAS AUSENTISMO	DÍAS TRASLADO	DÍAS VARIACIÓN TRANSITORIA	DÍAS	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR PAMPA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AGREG	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
1	CC 1000000001	MARTINEZ RIO DANIEL MILENA DAYAN	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO	30		$ 3.400.000											30	23CI01-PORVENIR	M	$ 3.400.000	$ 306.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 306.000	37-SALUD TOTAL	M	$ 3.400.000	$ 136.000	$ 0	$ 136.000	24-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	M	$ 3.400.000		$ 341.000	30	$ 3.400.000	03-CCF34-COMFEM META	$ 136.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1000000002	LOPEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO	30		$ 3.500.000											30	23CI01-PORVENIR	M	$ 3.500.000	$ 315.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 315.000	37-NUEVA EPS CM	M	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	24-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	M	$ 3.500.000		$ 385.000	30	$ 3.500.000	03-CCF34-COMFEM META	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1000000003	MELENDEZ CAMARGO EDWING MARINO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO	30	80	$ 1.423.500											30	25CI01-PROTECCION	M	$ 1.423.500	$ 77.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 77.000	37-NUEVA EPS	M	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	24-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	M	$ 1.423.500		$ 140.000	30	$ 1.423.500	03-CCF34-COMFEM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1000000004	VARGAS GUEVARA DIEGO ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO	30	80	$ 1.423.500											30	23CI01-PORVENIR	M	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 56.940	37-NUEVA EPS CM	M	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	24-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	M	$ 1.423.500		$ 140.000	30	$ 1.423.500	03-CCF34-COMFEM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1000000005	CEDEL RAMIREZ DANIELA SOFIA	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO	30		$ 3.500.000											30	25CI01-PORVENIR	M	$ 3.500.000	$ 262.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 262.500	25007-PROTECCION	M	$ 3.500.000	$ 98.000	$ 0	$ 98.000	24-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	M	$ 3.500.000		$ 350.000	30	$ 3.500.000	03-CCF34-COMFEM META	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900390359
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAS Y PUENTES
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CALLE 33 39 RIOS ROMERO OF 1303	TELÉFONO:	6710104
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	9-AHE APORTANTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	5-MENOS DE 200 COTIZANTES
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			S

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		70834231	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN (FIN):	MES	octubre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/04	NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN		98283928

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | DÍAS PENSIÓN | DÍAS SALUD | DÍAS ARL | DÍAS CCF | DÍAS ICBF | DÍAS SENA | HORAS LABORADAS | HORAS EXTRAS DIURNAS | HORAS EXTRAS NOCTURNAS | HORAS RECARGO NOCTURNO | HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVOS | HORAS RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO | HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVOS NOCTURNAS | HORAS RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO NOCTURNO | VACACIONES COMUNES | VACACIONES COMPENSADAS | INCAPACIDAD GENERAL | LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD | INCAPACIDAD LABORAL | LICENCIA NO REMUNERADA/SUSPENSIÓN TEMPORAL | AFP | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | RETENCIÓN TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADMIN | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTES | IBC | ADMIN | CCF TOTAL APORTES | SENA TOTAL APORTES | ICBF TOTAL APORTES | ESAP TOTAL APORTES | MINEDU TOTAL APORTES |
|---|---|---|---|---|---

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**558 DE 2024**	**PROYECTO N°**	**BPIN 2024000500206**

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y PUENTES
NIT:	901.901.935 - 6
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	169 DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

NUMERO DE PLANILLA:	**6403552920**						**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:**			2025-10	a	2025-11	
Nombre personal	**Cargo y/o oficio**	**cedula**	**sueldo**	**Dias Cotizados**	**SALUD**		**PENSIÓN**		**Valor Riesgos profesionales**	**I.C.B.F.**	**SENA**	**caja de compensacion**	**Total a pagar**
					EPS	**VALOR**	**PENSION**	**VALOR**					
Evit Liliana Martinez	Ambiental	1.121.842.823	$ 1.423.500,00	30	Nueva EPS	$ 225.500,00	Porvenir	$ 288.000,00	$ 126.300,00	$ -	$ -	$ -	$ 638.300,00
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												Total	$ 638.300,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoría o supervisión y se anexan a la presente acta

Para constancia de lo anterior, firmamos presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 1/15/2025

Firma:
Nombre: RAFAEL FERNANDO BARQUERO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre: Ing. EDUARDO MARTINEZ TARACHE
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-152992 CND

Firma:
Nombre: ALBA [illegible]
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 22[illegible]-T

Firma:
Nombre: ROSARETH MARGARITA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Ing. JUAN CAMILO POSADA VARELA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 03202-294712 CND

Firma:
Nombre: ERIKA TATIANA PINEDA
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 180184-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2392

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121840823		MARTINEZ TARACHE EVA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 34 No 44-45	VILLAVICENCIO-META	6620228	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	589020057	94935515 18	I	2025/11/10	2025/10/30	NEQUI	0	$638,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,800,000	$388,000			$1,800,000	$325,000			$0	$0			$1,800,000	$135,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,800,000	$388,000			$1,800,000	$325,000			$0	$0			$1,800,000	$135,300		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,800,000	$388,000			$1,800,000	$325,000			$0	$0			$1,800,000	$135,300		$0	$0
1	CC	1121840823	MARTINEZ EVA	23001	30	$1,800,000	$388,000	EPSO44	30	$1,800,000	$325,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$135,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,800,000	$388,000			$1,800,000	$325,000			$0	$0			$1,800,000	$135,300		$0	$0

2025/10/30 02:08 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121843823		MARTINEZ TARACHE EVA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 34 No 46-45	VILLAVICENCIO-META	6628278	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	108930557	94935519	I	2025/11/10	2025/10/30	NEQUI	0	$638,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PORVENIR	23301	800,224,808	8	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,300	$0	$0	$125,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$125,300	$0	$0	$125,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$638,300	$0	$0	$638,300

2025/10/30 02:08 PM

COPIA BITACORA MES DE OCTUBRE 2025

VILLAVICENCIO: Cra. 32 No 38-70 Of. 1302 — Ed. Romarco
Cel. 3158660074
e-mail: admoncviasypuentes2025@gmail.com

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	02	oct	2025	8:00 a.m	6:00 P.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	538 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005508268
CONTRATO INTERVENTORIA N°	169 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	X			Buen clima
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO Ing. Fau	1	✓		Finisher	1	
OFICIAL				Vibrocompactador	1	Maquina N°4
OPERARIO	5	✓		Vibro neumatico	1	
AYUDANTE	12	✓		mixer Inquicker	1	en buen
CELADOR	1	✓		camioneta (1 4x4	1	
TOPÓGRAFO	1	✓		compresor	1	Estado
CADENERO				cargotunque	1	
OTRO Vialistas	2	✓				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Imprimación	M2	carril regenerado		✓	✓
Mezcla densa	M3	carril izquierdo K57+337 - K4+620		✓	✓
PMT					
Levantamiento Topografico	km	realizar levantamiento al tramo de sello figuras		✓	✓

2376

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	02	oct	2025	8:00 a.m	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

La Interventoría realiza toma de muestras de la mezcla Asfaltica con el apoyo del laboratorio KHSQ Ingeniería S.A.S.

El día de ayer 01 de octubre, NO se realizaron actividades

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	
Nombre: RAFAEL FERNANO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20202-26062 CND	
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 252021-08320 CND	
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-102862 CND	
Nombre: JUAN CAMILO POSADA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-284712 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@alm-meta.gov.co
https://alm-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	03	Oct	2025	8:00 a.m	6:00 P.M

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
CONTRATO OBRA N°	550 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024805580266
CONTRATO INTERVENTORIA N°	169 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Buen clima
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO Ins. graw	1	✓		finisher	1	
OFICIAL				Vibro compactador	1	Maquinaria
OPERARIO	5	✓		Vibro neumatico	1	
AYUDANTE	12	✓		camion Pipiador	1	en buen
CELADOR	1	✓		camioneta 4x4	1	
TOPÓGRAFO	1	✓		compactor	1	Estado
JARDINERO				carrotanque	1	
OTRO Fialistas	2	✓				

ASPECTOS TECNICOS					
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Imprimación	M2	Carril derecho		✓	✓
Mezcla densa	M3	carril derecho KM 7+210 – KM 7+726		✓	✓
PMT				✓	✓
Levantamiento	km	tramo sello fisuras		✓	✓

2271

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	03	oct	2025	8:00 a.m	6:00 P.m

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza instalación de mezcla Asfaltica MDC-19

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	
Nombre: RAFAEL FERNANO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-28092 CND	
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 252021-88320 CND	
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-102662 CND	
Nombre: JUAN CAMILO POSADA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 63202-294712 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

2379

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	09	octubre	2025	8:00 a.m	4:30 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024035500256
CONTRATO INTERVENTORIA N°	169 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Buen clima
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO Ing. JAY	1	✓		Finisher	1	
OFICIAL				carrotanque	1	
OPERARIO	4	✓		camion Afrigadora	1	
AYUDANTE	10	✓		Vibrocompactador	1	
CELADOR	1	✓		Vibro neumatico	1	
TOPÓGRAFO				Minicargador	1	
CADENERO				camioneta 4x4	1	
OTRO Vialistas	2	✓		compresor	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SINO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SINO)
Imprimación CRR-2	M^2	eje: Izquierdo K		✓	✓
Instalación Mezcla	M^3	carril Izquierdo K44680 - K4+657,7		✓	✓
PMT				✓	✓

2380

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	09	oct	2025	8:00 a.m	4:30 P.M

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El consorcio retoma actividades el dia de hoy con la instalación de mezcla Asfaltica MDC-19 carril izquierdo sentido vial central el cruce.

Informan del retiro de la cuadrilla de fresado, los cuales trabajarón hasta el dia Sabado 4 de octubre /2025.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAFAEL FERNANO SAGUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-26062 CND	
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 252021-08330 CND	
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-102662 CND	
Nombre: JUAN CAMILO POSADA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 63202-284712 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

2381

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	10	octubre	2025	8:00 a.m	4:20 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	998 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005500286
CONTRATO INTERVENTORIA N°	199 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se presentaron lluvias a partir de las 3:30 p.m
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		Buen clima
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO Insp. pav	1	✓		Finisher	1	Maquinaria en
OFICIAL			EPP	Motocompactador	1	
OPERARIO	5	✓	completo	Vibro Neumatico	1	buen estado
AYUDANTE	9	✓		compresor	1	
CELADOR				camioneta 4x4	1	
TOPÓGRAFO	1	✓		Camión Rociador	1	
CADENERO				Motoniveladora	1	
OTRO Valistas	4	✓				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Imprimación	M2	carril derecho KM+726 - KM+428.		✓	✓
Mezcla densa	M3	carril derecho KM+726 - KM+428.		✓	✓
PMT				✓	✓

2382

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	10	octubre	2025	8:00 a.m	4:30 p.m

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza imprimación sobre el canal a trabajar y antes de la instalación de mezcla se realiza vertico de mezcla, se observa visita de parte del supervisor del contrato de dom

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAFAEL FERNANO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-26082 CND	
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 252021-98320 CND	
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-102982 CND	
Nombre: JUAN CAMILO POSADA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 63252-284712 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

25893

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	14	Octubre	2025	10:00 a.m	

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005000266
CONTRATO INTERVENTORIA N°	189 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Buen clima
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO Insp. Resp	1	✓		Carrotanque	1	
OFICIAL				camioneta 4x4	1	En buen
OPERARIO	3	✓		Minicargador	1	Estado la
AYUDANTE	10	✓		volqueta	1	maquinaria y
CELADOR	1	✓				
TOPÓGRAFO	1	✓		Para compactador	1	Equipos.
CADENERO						
OTRO Vialistas	2	✓				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
		No se realizaron actividades contractuales.			

2384

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	14	octubre	2025	10:00 a.m	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
El contratista informa que el corte de energia en la planta de Acacias - Meta por temas de lluvia fuerte el dia	no hará instalación de mezcla debido lunes festivo 13-oct.

OBSERVACIONES GENERALES

Realizan actividad de limpieza de huecos o baches en la vía, para luego rellenar con material fresado y compactar se inicia desde K3+400 hacia el K0+000 el cruce de Cubarral.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAFAEL FERNANDO BADUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-29092 CND	
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 252021-98320 CND	
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-103862 CND	
Nombre: JUAN CAMILO POSADA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 68202-284712 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

2 B F 5

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	15	oct	2025	8:30 a.m	

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	058 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005500266
CONTRATO INTERVENTORIA N°	169 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Buen clima
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO Ingeniero	1	✓	Personal estable con el contrato completo	Finisher	1	Equipos en Buen Estado
OFICIAL				Vibro compactador	1	
OPERARIO	5	✓		Vibro neumatico	1	
AYUDANTE	9	✓		carro-tanque	1	
CELADOR	1	✓		camioneta 4x4	1	
TOPÓGRAFO	1	✓		compresor	1	
CADENERO				camion grapador	1	
OTRO Viaticos	2	✓				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Imprimación	M2	carril izquierdo K4+657,7 - K4+300		✓	✓
Mezcla densa	M3	carril izquierdo K4+657,7 - K4+300		✓	✓
PMT				✓	✓
Mezcla densa	M3	carril derecho K4+428 -			
Imprimación	M2	carril derecho K4+428 - K4+300		✓	✓

2365

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	15	Oct	2025	6:30 a.m	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se observa un cruce de tubería transversal K4+419 que instalo la comunidad y esta presentando al momento de circular el trafico hundimiento (deformación), por lo cual se realiza el llamado a la comunidad para subsanar la problematica. Frente a Villa Hilera - Fernando Acosta.

Se toman muestras de la mezcla Asfaltica por parte del laboratorio de la Interventoría.

Se realiza instalación de mezcla en los dos carriles con el propósito de terminar toda la instalación de MDC-19 hasta la abscisa K9+300

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	
Nombre: RAFAEL FERNANO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-28082 CND	
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 252021-68320 CND	
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-102882 CND	
Nombre: JUAN CAMILO POSADA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 65202-294712 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

2397

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	16	10	2025	7:00 AM	4:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005930286
CONTRATO INTERVENTORIA N°	169 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Buen clima
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	✓				
OFICIAL						
OPERARIO	3	✓				
AYUDANTE	6	✓				
CELADOR	1					
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO Viaristas	2	✓				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Sello arena-Asfalto		Abscisa K5+521 al K6+881		✓	✓

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2388

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	16	10	2025	7:00 AM	4:00 PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inicia con el sellado de fisuras entre las abscisas K5+581 al K6+881 en el carril derecho.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAFAEL FERNANO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-29082 CND	
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 252021-96320 CND	
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25200-102962 CND	
Nombre: JUAN CAMILO POSADA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-294712 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2289

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	17	10	2025	7:00 AM	4:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	533 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005500266
CONTRATO INTERVENTORIA N°	169 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Buen clima
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	✓				
OFICIAL						
OPERARIO	3	✓				
AYUDANTE	6	✓				
CELADOR	1	✓				
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2	✓				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Sello Bueno - Asfalto				✓	✓

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

239 D

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	17	10	2025	3:00 PM	4:00 PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza limpieza de las fisuras antes de continuar con el sellado.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAFAEL FERNANO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-25082 CND	
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 252021-98320 CND	
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-102862 CND	
Nombre: JUAN CAMILO POSADA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-294712 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

239.1

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	13	10	2025	7:00 AM	12:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	538 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005500268
CONTRATO INTERVENTORIA N°	169 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Buen clima
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	✓				
OFICIAL						
OPERARIO	3	✓				
AYUDANTE	6	✓				
CELADOR	1	✓				
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2	✓				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Sello Arena- Asfalto		Abscisa K51581 al		✓	✓
		K61881			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2392

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	17	10	2023	7:00 AM	12:00 PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se continua con el Sellado de fisual entre las abscisas K5+581 al K6+881 en el carril izquierdo y se termina dicho tramo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAFAEL FERNANO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-26082 CND	
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 252021-98320 CND	
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-102882 CND	
Nombre: JUAN CAMILO POSADA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-294712 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2393

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	20	10	2025	7:00 AM	4:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	553 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005000266
CONTRATO INTERVENTORIA N°	169 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Buen clima
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
		No se realiza			
		item contractual			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactanos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2394

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	20	10	2025	7:00 AM	4:00 PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza la limpeza y verificación de la carpeta aplicada sobre alguna imperfección.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAFAEL FERNANO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-28082 CND	
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 252021-88320 CND	
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-102882 CND	
Nombre: JUAN CAMILO POSADA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-294712 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2395

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	21	10	2025	7:00 AM	4:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	538 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024035000256
CONTRATO INTERVENTORIA N°	169 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Buen clima
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
		No se realizan			
		items contractuales.			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2396

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	21	10	2025	7:00 AM	4:00PM

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realizan trabajos de oficina con los ajustes a planos y cantidades de obra ejecutada.

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAFAEL FERNANO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-29382 CND	
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 252021-88320 CND	
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-102862 CND	
Nombre: JUAN CAMILO POSADA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-294712 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	22	10	2025	7:00 AM	4:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	658 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005508266
CONTRATO INTERVENTORIA N°	109 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Buen clima
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
		No se realizan			
		items contractuales			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2398

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	22	10	2025	7:00 AM	4:00 PM

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se continua con los trabajos de oficina.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAFAEL FERNANO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-29382 CND	
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 252021-98320 CND	
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-102842 CND	
Nombre: JUAN CAMILO POSADA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 63202-294712 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactanos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2399

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	23	10	2025	7:00 AM	4:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005580266
CONTRATO INTERVENTORIA N°	189 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		Buen clima
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
		No se realizan			
		Items contractuales			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2400

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	23	10	2025	9:00 AM	4:00 PM

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza trabajo de oficina con la interventoria con la finalidad de unificar la información

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAFAEL FERNANO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-26082 CND	
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 252021-66320 CND	
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-102662 CND	
Nombre: JUAN CAMILO POSADA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-284712 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2401

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	24	10	2024	9:00 AM	4:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005500296
CONTRATO INTERVENTORIA N°	169 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Buen clima
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	V		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
		NO se realizan			
		Items contractuales			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2402

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	24	10	2025	7:00 AM	4:00 PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza trabajo de oficina con la interventoria con la finalidad de unificar la información.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAFAEL FERNANO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-29082 CND	
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 252021-98320 CND	
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-102862 CND	
Nombre: JUAN CAMILO POSADA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-294712 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registrar observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2403

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	25	10	2025	7:00 AM	12:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005500266
CONTRATO INTERVENTORIA N°	169 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Buen clima.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
		No se realizan			
		Items contractuales			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2404

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	25	10	2023	7:000 AM	12:00 PM

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza trabajo de oficina con la interventoria con la finalidad de unificar la información.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAFAEL FERNANO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-25082 CND	
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 253021-98320 CND	
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-102862 CND	
Nombre: JUAN CAMILO POSADA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-234712 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactanos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2405

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	27	10	2025	7:00 AM	4:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005503296
CONTRATO INTERVENTORIA N°	169 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Buen clima
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
		No se realizan			
		ítems contractuales			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2406

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	23	10	2025	9:00 AM	4:00 PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza trabajo de oficina con la interventoria con la finalidad de chequear informacion

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAFAEL FERNANO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-26062 CND	
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 252021-98320 CND	
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-122662 CND	
Nombre: JUAN CAMILO POSADA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-234712 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2407

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	28	10	2025	7:00 AM	4:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005503296
CONTRATO INTERVENTORIA N°	169 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Bien clima
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
		NO se realizan			
		items contractuales.			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2408

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	29	10	2025	7:00 AM	4:00 PM

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza trabajo de oficina con la interventoria con la finalidad de unificar informacion.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAFAEL FERNANO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-29082 CND	
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 252021-98320 CND	
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-102862 CND	
Nombre: JUAN CAMILO POSADA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-294712 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	24	10	2023	7:00 A.M.	4:00 P.M.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005503266
CONTRATO INTERVENTORIA N°	169 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Buen clima
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
		No se realizan			
		Items contractuales.			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2470

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	24	10	2023	9:00 AM	4:00 PM

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza trabajo de oficina con la interventoria con la finalidad de unificar la información.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	
Nombre: RAFAEL FERNANO BADUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-29082 CND	
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 252021-98320 CND	
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-102862 CND	
Nombre: JUAN CAMILO POSADA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-254712 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactanos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2411

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	30	12	2025	7:00 AM	4:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	550 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005500296
CONTRATO INTERVENTORIA N°	169 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Buen clima
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
		No se realizan			
		Items contractuales.			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2412

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	30	10	2025	7:00 AM	11:00 AM

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza trabajo de oficina con la interventoria con la finalidad de unificar la información.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAFAEL FERNANO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-29082 CND	
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 252021-98335 CND	
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-102982 CND	
Nombre: JUAN CAMILO POSADA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-294712 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otros entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2473

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	27	10	2023	7:00 AM	4:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024000500266
CONTRATO INTERVENTORIA N°	169 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Buen Clima
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de atraso por lluvia				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
		No se realizan			
		Items contractuales			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2414

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL, - META	31	10	2025	7:00 AM	4:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005530268
CONTRATO INTERVENTORIA N°	169 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META"		
TIEMPO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Buen clima
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
ORLADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SINO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SINO)
		No se realizan			
		Items contractuales.			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

245

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN LUIS DE CUBARRAL - META	31	10	2025	9:00 AM	4:00 PM

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza trabajo de oficina con la interventoria con la finalidad de unificar la información.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAFAEL FERNANO BAQUERO MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-26082 CND	
Nombre: YENLY GISELLE HERRERA ALVAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 252021-98320 CND	
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-102882 CND	
Nombre: JUAN CAMILO POSADA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-294712 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2416

CONSORCIO
INTERVIAL CUBARRAL
2024

CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

112-ECP-FR-222-V04 INFORMES QUINCENALES INTERVENTORIA

URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 5C
VILLAVICENCIO-META
consorciointervialcubarral@gmail.com

2417

CONTRATO Nº	556 DE 2024	PROYECTO Nº	20240655062000
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	599 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10.72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.		
CORREO ELECTRONICO:	consorciointerviascubarral@gmail.com		

SEMANAS NUMERO: 9.60 Del: 1/10/2025 Al: 13/10/2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 72 Días

	QUINCENAL	ACUMULADO		QUINCENAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	6.70%	31.71%	Obra Física Ejecutada (%)	18.53%	86.67%
Valor de la Obra programada:	$ 334 735 936.00	$ 1 584 986 634	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 925 551 887.00	$ 4 329 680 048.00

PROYECTO CONTRATO DE OBRA:		PROYECTO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
VALOR INICIAL:	$ 4 995 925 536.00	VALOR INICIAL:	$ 483 066 416.00
VALOR ADICIONAL:	N/A	VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$ 4 995 925 536.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 483 066 416.00
PLAZO INICIAL:	260 6 MESES	PLAZO INICIAL:	5035 6 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	lunes, 4 de agosto de 2025	FECHA DE INICIACIÓN:	lunes, 4 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	martes, 3 de febrero de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	martes, 3 de febrero de 2026
PRORROGA:	N/A	PRORROGA:	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A	PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A	FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	martes, 3 de febrero de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	martes, 3 de febrero de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

En este periodo el CONSORCIO VIAS Y PUENTES, termina la instalación de mezcla densa en caliente MDC-19, con un espesor de 7.5cm a excepción del tramo 10, el cual se instaló en un espesor de 10cm, el trayecto instalado en su totalidad es de 5.12km. Tramo que corresponde a los sectores desde el K10+726 EDS TERPEL al K5+679.7 entrada en la etapa 5 Urbanización SANTA MONICA y el sector desde el K5+577 Finca la floresta hasta el K4+300 frente al vivero.

Se verificó la temperatura de llegada, de extendido y compactación de la mezcla por parte del contratista de obra e interventoría, observando el cumplimiento de las Especificaciones técnicas del proyecto y de la norma INVIAS-2013.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO DE VIAS

SELLO DE ARENA-ASFALTO CON EMULSIÓN CRR-2

IMPLEMENTACIÓN DEL PMT

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Al corte de este informe, y pasados 72 días de ejecución, la relación entre avance físico ejecutado (86.67%) y programado (31.71%) evidencia un margen favorable de 54.96 %.

Lejos de una gestión que ha subrepasado las expectativas iniciales de programación. El alcance logrado incluye habilitación de tramos con carpeta asfáltica y la adecuada

ejecución de procesos constructivos, alineados con el cronograma contractual y con los estándares de calidad exigidos.

En este periodo se tomaron muestras de la mezcla por parte de la Interventoría con el apoyo del laboratorio NIVSQ. Como parte de la validación del cumplimiento contractual.

AFECTACIONES CLIMATOLOGICAS

Durante el desarrollo de las actividades se presentaron lluvias leves

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

2418

CONTRATO Nº	550 DE 2024	PROYECTO Nº	2024065900064

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Durante la presente quincena, el proyecto reportó un avance físico ejecutado del 16.53% frente a un 6.70% programado para el periodo, lo que evidencia una ejecución superior a la programada en 11.83 puntos porcentuales. En el acumulado del contrato, se registra un avance ejecutado del 66.67% sobre una programación acumulada del 31.71%, lo que demuestra eficiencia y proactividad en la gestión del contrato y en la planificación de las actividades de obra. A nivel financiero, el valor de la obra ejecutada a la fecha asciende a $4.329.668.840 superando ampliamente el valor programado de $2.745.581.413,63. Esta relación positiva refleja el compromiso del contratista y la supervisión de interventoría en el cumplimiento y avance de los ítems contractuales, facilitando la optimización de recursos y la gestión eficiente de los frentes de trabajo.	Firma Nombre: JHON CAMILO POSADA Nº Matrícula Profesional: (63202-294712 CND)

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO Nº					PROYECTO Nº											
Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	ACTAS ANTERIORES		CANTIDAD ACTA		ACUMULADO		
								CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	PRELIMINARES													
1.1	DEMOLICIÓN, RASPADO Y REPARADO DEFINITIVO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PROFUNDIDAD PARCIAL Y FRESADO	KM	10.00	$ 9.845.147	$ 98.451.470	0.00	$ -	0.00	$ -	10.00	$ 98.451.470	10.00	$ 98.451.470	100%
	SUBTOTAL				$ 98.451.470		$ -		$ -		$ 98.451.470		$ 98.451.470	
2	EXCAVACIONES													
2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO	M3	0.00	$ 891.000	$ 242.647.20	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0%
	SUBTOTAL				$ 242.647.200		$ -		$ -		$ -		$ -	
3	EXCAVACIONES													
3.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO — Y CARGUE	M3	50.00	$ 68.000	$ 3.398.401.20	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0%
	SUBTOTAL				$ 3.398.401.20		$ -		$ -		$ -		$ -	
4	MOVIMIENTO GENERALES													
4.1	BASE GRANULAR PARA BACHEO	M3	24.00	$ 140.000	$ 4.488.775.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0%
4.2	SUBBASE GRANULAR PARA BACHEO	M3	28.00	$ 127.400	$ 3.565.000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0%
	SUBTOTAL				$ 7.987.935.00		$ -		$ -		$ -		$ -	
5	MATERIAL ASFÁLTICO													
5.1	PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3	2.562.00	$ 97.700	$ 251.748.750.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.762.74	$ 172.224.501	1.762.74	$ 172.224.501	68.42%
5.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	100.00	$ 0.000	$ 859.534.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
5.3	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	33.450.00	$ 0.000	$ 130.512.550.00	0.00	$ -	0.00	$ -	49.533.94	$ 193.408.866	49.533.94	$ 193.408.866	76.82%
5.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 EXCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	2.562.00	$ 997.000	$ 2.553.457.176.40	0.00	$ -	0.00	$ -	2.563.42	$ 2.555.424.540	2.563.42	$ 2.555.424.540	33.31%
5.5	EJECUCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CONVENCIONAL DRN-3	M2	0.000.00	$ 0.000	$ 33.537.153.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
	SUBTOTAL				$ 2.987.329.231.00		$ -		$ -		$ 2.980.074.908.00		$ 2.980.074.908.00	
6	SEÑALIZACIÓN													
6.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRÍLICA EN FRÍO (INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO)	ML	22.000.00	$ 4.000	$ 147.397.716.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
6.2	CINTA REFLECTIVA DIRECCIONAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0.000.00	$ 0.000	$ 49.162.105.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
	SUBTOTAL				$ 196.783.338.00		$ -		$ -		$ -		$ -	
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 3.190.581.158.00		$ -		$ -		$ 3.238.111.918.00		$ 3.238.111.918.00	
	IMPREVISTOS (3%)				$ 207.162.251.50						$ 447.368.605.00		$ 447.368.605.00	
	INTERVENTORÍA (1%)				$ 67.905.472.58						$ 32.561.115.00		$ 32.561.115.00	
	UTILIDAD (3%)				$ 159.101.458.00					58.41%	$ 130.964.491.00	58.41%	$ 130.964.491.00	
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 1.166.768.918.00		$ -		$ -		$ 1.418.124.371.00		$ 1.418.124.371.00	
	PRESUPUESTO TIPO				$ 14.918.000.00						$ 10.011.000.00		$ 10.011.000.00	
	PRESUPUESTO PMT				$ 56.000.781.42						$ 66.000.000.00		$ 66.000.000.00	
	VALOR TOTAL OBRA				$ 4.995.000.000.00		$ -		$ -		$ 4.320.000.000.00		$ 4.320.000.000.00	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2420

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA

112-ECP-FR-222-V04
09/09/2024

CONTRATO Nº	558 DE 2024	PROYECTO Nº	3224005500255

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	169 DE 2025
INTERVENTORÍA:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.
CORREO ELECTRONICO:	consorciointervialcubarral@gmail.com

SEMANAS NUMERO:	11.73	Del:	10/10/2025	Al:	31/10/2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:			88	Días	

	QUINCENAL	ACUMULADO		QUINCENAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	8.15%	39.85%	Obra Física Ejecutada (%)	1.35%	37.99%
Valor de la Obra programada:	$ 457 037 196.00	$ 1 991 123 830	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 67 666 326	$ 4 584 236 591

PROYECTO CONTRATO DE OBRA:		PROYECTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
VALOR INICIAL:	$ 4 995 820 538.00	VALOR INICIAL:	$ 483 566 416.00
VALOR ADICIONAL:	N/A	VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$ 4 995 820 538.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 483 566 416.00
PLAZO INICIAL:	SEIS 6 MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS 6 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	lunes, 4 de agosto de 2025	FECHA DE INICIACIÓN:	lunes, 4 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	martes, 3 de febrero de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	martes, 3 de febrero de 2026
PRORROGA:	N/A	PRORROGA:	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A	PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A	FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	martes, 3 de febrero de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	martes, 3 de febrero de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Durante el presente periodo quincenal del mes de octubre, se culminaron las labores de instalación de la mezcla densa en caliente tipo MDC-19, correspondiente a un trazado total de 5.12 km, comprendido entre las abscisas K10+720 – K9+881 y el tramo K5+581 – K4+300.

Las actividades se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la Norma INVIAS – Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras (Sección 450-13 Mezclas Asfálticas en Caliente), verificando el cumplimiento de los parámetros de espesor, compactación, temperatura de colocación y granulometría mediante los respectivos ensayos de control de calidad en campo y laboratorio.

Adicionalmente, se intervino la actividad de sello de fisuras, conforme a lo establecido contractualmente y según los lineamientos de la Norma INVIAS – Sección 470-05 Sellado de Grietas y Fisuras, en una longitud aproximada de 1.300 m, localizada frente a la Escuela San Miguel.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

El día 16 de octubre del presente año, durante la visita técnica realizada por el equipo de la Gobernación y el Garante del AIM, se solicitó al contratista de obra y al equipo de interventoría presentar una propuesta sólida e integral, que contemple la evaluación de las cantidades de obra y las actividades necesarias para la intervención del tramo que contractualmente está replanteado en los documentos técnicos para hecho aproximadamente 4,3 km, con el fin de realizar una intervención de reemplazo total de la carpeta asfáltica.

En atención a esta solicitud, se está evaluando y consolidando la información técnica y económica correspondiente, con el fin de presentarla ante la supervisión para su revisión y validación. Razón por la cual no se contempla la ejecución de ninguna actividad.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Al corte del presente informe, y transcurridos diez meses desde el inicio del periodo evaluado, la relación entre el avance físico ejecutado (37.99%) y el programado (39.85%) evidencia un margen favorable de 48.10%, lo que refleja una gestión eficiente que ha superado las expectativas iniciales de programación.

El alcance logrado durante este periodo incluye la habilitación de tramos con carpeta asfáltica, así como la ejecución adecuada de los procesos constructivos, en concordancia con el cronograma contractual y los estándares de calidad establecidos.

Asimismo, durante este periodo la Interventoría, con el apoyo del laboratorio NHSQ, realizó la toma de muestras de la mezcla asfáltica como parte del proceso de validación del

AFECTACIONES CLIMATOLOGICAS

Durante el desarrollo de las labores, no se presentaron inconvenientes ni condiciones climatológicas adversas que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

2421

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA

112-ECP-FR-222-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	668 DE 2024	PROYECTO N°	2024865500268

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Durante la presente quincena, el proyecto reportó un avance físico ejecutado del **1.35%** frente a un 8.15% programado para el periodo, lo que evidencia una ejecución menor a la programada en - 6.80%, debido a que se esta realizando el sello de fisuras como actividad principal. En el acumulado del contrato, se registra un avance ejecutado del **87.96%** sobre una programación acumulada del 39.08%, lo que demuestra eficiencia y proactividad en la gestión del contrato y en la planificación de las actividades de obra. A nivel financiero, el valor de la obra ejecutada a la fecha asciende a **$4.394.238.581** superando ampliamente el valor programado de **$1.991.123.829** Esta relación positiva refleja el compromiso del contratista y la supervisión de interventoría en el cumplimiento y avance de los hitos contractuales, facilitando la optimización de recursos y la gestión eficiente de los frentes de trabajo.	Firma Nombre: **JUAN CARLO POSADA** N° Matrícula Profesional: 05202-294712 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

CONTRATO Nº	556 DE 2024	PROYECTO Nº	25500000001000

Nº ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta de Modificación No. ____ de fecha ____)		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
11	PRELIMINARES													
11.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO VIAS INCLUYE EQUIPO AUTOMATICO DE PRECISIÓN,CARTERA Y PLANOS	KM	10.72	$ 5.022.127	$ 53.837.313,84	0.00	$ -	0.00	$ -	10.72	$ 53.837.313	10.72	$ 53.837.313	100%
	SUBTOTAL				$ 53.837.313,84		$ -		$ -		$ 53.837.313,00		$ 53.837.313,00	
12	DEMOLICIONES													
12.1	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M3	0.00	$ 331.865	$ 212.047,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0%
	SUBTOTAL				$ 212.047,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
13	EXCAVACIONES													
13.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO TIPO 1 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	90.40	$ 59.337	$ 5.558.641,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0%
	SUBTOTAL				$ 5.558.641,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
14	MATERIAL GRANULAR													
14.1	BASE GRANULAR PARA MACHO	M3	25.20	$ 140.638	$ 4.668.779,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0%
14.2	SUBBASE GRANULAR PARA MACHO	M3	28.30	$ 137.463	$ 3.883.053,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0%
	SUBTOTAL				$ 7.551.832,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
15	MATERIAL GRANULAR													
15.1	RIEGO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3	2.985.60	$ 97.710	$ 291.748.153,00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.739.60	$ 170.022.943	1.739.60	$ 170.022.943	58.27%
15.2	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	187.70	$ 4.590	$ 859.624,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
15.3	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2	M3	59.402.80	$ 3.208	$ 190.572.044,00	0.00	$ -	0.00	$ -	49.609.04	$ 148.400.509	49.609.04	$ 148.400.509	50.85%
15.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	2.985.60	$ 992.368	$ 2.963.897.176,00	0.00	$ -	0.00	$ -	2.985.62	$ 2.963.430.985	2.985.62	$ 2.963.430.985	97.31%
15.5	SELLO DE ARENA-ASFALTO CON EMULSIÓN CSS-1	M2	4.350.00	$ 8.836	$ 30.007.424,00	0.00	$ -	0.00	$ -	8.555.06	$ 88.007.424	8.555.06	$ 88.007.424	100.00%
	SUBTOTAL				$ 3.457.229.221,00		$ -		$ -		$ 3.283.860.279,00		$ 3.283.860.279,00	
16	SEÑALIZACIÓN													
16.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO (VIAL E=0.12 M, INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACION CON EQUIPO.	ML	32.150.00	$ 4.589	$ 147.597.710,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
16.2	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	4.000.00	$ 12.981	$ 45.485.490,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
	SUBTOTAL				$ 193.783.200,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 3.705.947.158,00		$ -		$ -		$ 3.337.717.592,00		$ 3.337.717.592,00	
	ADMINISTRACIÓN (20%)				$ 677.102.201,00						$ 660.006.972,00		$ 660.006.972,00	
	IMPREVISTOS (1%)				$ 37.605.472,00						$ 33.077.176,00		$ 33.077.176,00	
	UTILIDAD (4%)				$ 150.421.888,00					97.80%	$ 132.308.703,00	97.80%	$ 132.308.703,00	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 1.165.199.919,00		$ -		$ -		$ 1.025.393.451,00		$ 1.025.393.451,00	
	PRESUPUESTO PASA				$ 12.614.000,00						$ 11.094.013,00		$ 11.094.013,00	
	PRESUPUESTO PAT				$ 39.999.791,00						$ 32.034.545,00		$ 30.000.000,00	
	VALOR TOTAL OBRA				$ 4.999.420.868,00		$ -		$ -		$ 4.294.239.601,00		$ 4.294.239.601,00	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

24/23
