“EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, el cual incluye apropiación de los diseños existentes, diagnóstico, estudios y diseños para conservación, mantenimientos, rehabilitación, reconstrucción, acciones de movilidad, atención de emergencias y las demás actividades que se detallan en los anexos técnicos.”

INFORME TÉCNICO MENSUAL No 06

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2020

INTERVENTORÍA & CONSTRUCIVILES

CONTRATO No. 242 DE 2019

BOGOTÁ D. C.

NOVIEMBRE DE 2020

CONTENIDO

1. INFORME EJECUTIVO 5
2. INTRODUCCIÓN ..... **¡Error! Marcador no definido.**
3. ROLES DEL PROYECTO 9
4. ANTECEDENTES 10
5. ACTIVIDADES GENERALES 12
6. GENERALIDADES DEL CONTRATO 14
6.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA 14
6.2. CONTRATO DE OBRA 15
7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 15
7.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO 16
8. IDENTIFICACIÓN DE LOS SEGMENTOS VIALES 17
8.1. LISTADO INICIAL PRIORIZACIÓN DE LA ALCALDÍA 17
8.2. LISTADO INICIAL PRIORIZACIÓN DE LA ALCALDIA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
9. ACTIVIDADES INTERVENTORIA TECNICA 19
9.1. TRAMO 1: ..... **¡Error! Marcador no definido.**
9.2. TRAMO 2: ..... **¡Error! Marcador no definido.**
9.3. TRAMO 3: ..... **¡Error! Marcador no definido.**
10. FACTURACIÓN 31
11. ALCANCE 31

12. OBJETIVOS DE LA CALIDAD..... 31

13. CONCLUSIONES 32

1. INTRODUCCION

El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos (FDLBU), con el objeto de procurar que el mejoramiento de la red vial del distrito mediante el mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de las vías locales, sea realizado teniendo en cuenta las especificaciones y normatividad existente, ha celebrado el Contrato de Consultoría No. 242 de 2019, cuyo objeto es "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS", que busca contribuir con el desarrollo social de la localidad y su movilidad, realizando la supervisión y medición de las obras, calidad de los materiales, garantía de las actividades entre otras, y cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra.

La interventoría ha hecho acompañamiento al contratista CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020, con el fin de dar cumplimiento al Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019 cuyo objeto es "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS (CTO 241-2019).

Este informe tecnico contiene los diferentes aspectos del resultado de las actividades de iniciación, planificación, ejecución, supervisión y control, del periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre de 2020, del contrato de Consultoría No. 242 de 2019 entre el FDLBU e INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.

2. GENERALIDADES

El FDLBU con el objetivo de fortalecer la red vial del distrito por medio del mantenimiento, rehabilitación y/o reconstrucción de las vías de la localidad, y mediante el desarrollo del proceso licitatorio celebró el contrato de Obra Pública No. 241 de 2019, que tiene como objeto ***EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS (CTO 241-2019).***

GENERALIDADES CONTRATO 241 DE 2020					
OBJETO DEL CONTRATO					
"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.					
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO	241 de 2019				
CONSTRUCTOR	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020				
INTERVENTOR	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS.				
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN FDLBU	ARQUITECTO JAVIER ROJAS				
VALOR INICIALCONTRATO OBRA	$ 7.770.000.000				
VALOR ADICION No.1 CONTRATO OBRA	$3.885.000.000				
VALOR TOTAL CONTRATO OBRA	$ 11.585.000.000				
VALOR INICIALCONTRATO INTERVENTORIA	$766.436.856				
VALOR ADICION No.1 CONTRATO INTERVENTORIA	$386.702.232				
VALOR TOTAL CONTRATO INTERVENTORIA	$ 1.153.139.088				
DURACIÓN INICIAL	8 MESES				
PRORROGA No. 1	4 MESES				
DURACION TOTAL	12 MESES				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	2	**DE**	MARZO	**DE**	2020
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	1	**DE**	NOVIEM	**DE**	2020

			BRE		
FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN 1*	24	**DE**	MARZO	**DE**	2020
FECHA DE TERMINACION SUSPENSIÒN 1	16	**DE**	JUNIO	**DE**	2020
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DESPUES SUPENSIÒN 1	23	**DE**	ENERO	**DE**	2021
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DESPUES PRORROGA No 1	22	**DE**	MAYO	**DE**	2021

3. ROLES DEL PROYECTO

En la siguiente tabla se describen los participantes en la ejecución del proyecto, tanto de la parte de contratista, como de la interventoría y la Supervisión, “Ejecución de las obras de la malla vial local de Barrios Unidos .

Personal profesional

Cargo	Nombre	Responsabilidad
Supervisor del Proyecto	**Dr. Antonio Carrillo** Alcalde Local de Barrios Unidos	Supervisión por parte del FDLBU a los contratos de obra e Interventoría.
Apoyo a la supervisión	**Arq. Javier Rojas**	Apoyo a la supervisión por parte del FDLBU al contrato de Interventoría.
Director de	**Ing. Carlos Arámbula.**	Director de interventoría

interventoría		
Residente de Interventoría	**Ing. Juan Pablo Lemus.**	Residente de la Interventoría.
Director de Obra COP 241 de 2019	**Ing. Ivan Pardo**	Dirección de la ejecución de la Obra.
Residente de obra COP 241 de 2019	**Ing. Manuel Ruiz**	Residente de obra.

4. ANTECEDENTES

La Alcaldía local de Barrios Unidos, con el objetivo de fortalecer la red vial del distrito mediante el mantenimiento de las vías de la localidad, ha realizado el contrato No 241 de 2019, el cual busca priorizar e intervenir las vías de la localidad de Santa Fe y cuyo contratista es el **CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020.**

Se estableció además el contrato No.242 de 2019 firmado entre Interventoría y Construciviles SAS y el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos y cuyo objeto es "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, el cual incluye apropiación de los diseños existentes, diagnóstico, estudios y

diseños para conservación, mantenimientos, rehabilitación, reconstrucción, acciones de movilidad, atención de emergencias y las demás actividades que se detallan en los anexos técnicos."

El plazo para la ejecución del contrato se contará a partir del día siguiente a la fecha de suscripción del Acta de Iniciación del mismo, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos. Para este contrato queda establecido un plazo inicial de 8 meses.

Para el presente periodo dentro de las labores de ejecución del contrato en curso, se inició con la localización de los segmentos viales los cuales fueron priorizados por la alcaldía local de Barrios Unidos. Cabe destacar que dentro del proceso de intervención habrá un control permanente por parte de la **INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS.**

5. ACTIVIDADES GENERALES

Controlar: Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, consistente en una vigilancia planeada, en tal forma que se ejecute de manera permanente sobre todas y cada una de las etapas en las cuales se desarrolla el cumplimiento de la respectiva relación contractual, con el fin de establecer si dicha ejecución se ajusta a lo acordado, vale decir, a lo ofrecido por las partes.

Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el interventor pide al contratista oportunamente, que subsane de manera inmediata, incorrecciones, que no afectan la validez del contrato o la ejecución del mismo. Esta facultad la ejerce cuando solicita la imposición de una sanción por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado, sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual, entre otros temas.

Exigir: En la medida en que la función de interventoría encuentre que, en el desarrollo de la relación contractual, no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas contractuales, adquiere la obligación de exigir a la parte morosa, la satisfacción de las exigencias contractuales, utilizando como instrumentos, el contenido del acuerdo de voluntades, y las garantías ofrecidas para respaldar el cumplimiento del contrato.

Colaborar: La interventoría debe comunicar a los contratistas que su propósito es el de prestar toda la colaboración que sea necesaria para el éxito de la empresa propuesta, colaboración que no debe ser confundida con permisividad. Colaborar es trabajar con los demás para lograr el fin común.

Absolver: Muchas relaciones contractuales se desvían de los objetivos propuestos, por falta de comunicación entre las partes. El contratista, con un equivocado concepto de independencia, o la administración, desentendida del desarrollo de la obra o servicio, generan a veces con éstas actitudes perjuicios para el contrato. Una interventoría que

aplique el principio de la inmediación, obligatoriamente se convierte en un factor de consulta y en un elemento que absuelve las dudas y dificultades que conlleva la ejecución de todo contrato.

Verificar: Las acciones que se han enunciado, deben culminar en la verificación de la realización del objeto contratado. Esto implica la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solución de los problemas y la absolución de las dudas, todo dentro de un criterio de colaboración, que a la postre habrá de traducirse en el éxito de la empresa en la cual se han comprometido la administración y los particulares.

Prevenir: El control no está destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, y en realidad, es más fácil evitar que éstas ocurran. La interventoría no es una función pasiva, limitada a observar la ejecución de un contrato y a informar sobre los errores cometidos por la contraparte. Si se acepta el concepto consistente en que el fin es común, en beneficio de la sociedad, se entenderá que el mayor aporte de esta función es la corrección de conceptos erróneos, impidiendo así que su aplicación se traduzca en desviaciones del objeto del contrato, o en el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. La interventoría debe extender su función de prevención hacia ambos aspectos, porque de lo contrario, estaría atentando contra los principios rectores de la función pública y de la ley de contratación estatal.

Aprobar: El personal propuesto por el contratista para le etapa de obra, las obras ejecutadas, las modificaciones realizadas en obra, las decisiones tomadas en comité, los planos record entregados por el contratista, y en general todas las acciones derivadas de la ejecución del contrato de obra.

6. GENERALIDADES DEL CONTRATO

En las tablas siguientes se encuentra la información detallada del contrato de interventoría y de obra.CONTRATO DE INTERVENTORIA

	Contrato Interventoría No. 242 de 2019
OBJETO	*"EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, el cual incluye apropiación de los diseños existentes, diagnóstico, estudios y diseños para conservación, mantenimientos, rehabilitación, reconstrucción, acciones de movilidad, atención de emergencias y las demás actividades que se detallan en los anexos técnicos."*
Contratista	*CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020*
Plazo inicial	Ocho (8) meses
Prorroga No. 1	Cuatro (4) meses
Plazo total	Doce (12) meses
Fecha de inicio de contrato	02 de marzo de 2019
Fecha de terminación inicial	01 de noviembre de 2020
Fecha de Suspension No. 1	24 de marzo de 2020
Fecha de Reinicio No. 1	16 de junio de 2020
Fecha de Terminación Inicial	23 de enero de 2021
Fecha de Terminación Prorroga 1	22 de mayo de 2021
Valor del Contrato	$766.436.856
Valor Adicion No.1	$386.702.232
Valor Total	$ 1.153.139.088
Interventoría	Interventoría y Construciviles SAS

6.1. CONTRATO DE OBRA

	Contrato Interventoría No. 242 de 2019
OBJETO	*""EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.*
Plazo inicial	Ocho (8) meses
Prorroga No. 1	Cuatro (4) meses
Plazo total	Doce (12) meses
Fecha de inicio de contrato	02 de marzo de 2019
Fecha de terminación inicial	01 de noviembre de 2020
Fecha de Suspension No. 1	24 de marzo de 2020
Fecha de Reinicio No. 1	16 de junio de 2020
Fecha de Terminación	23 de enero de 2021
Fecha de Terminación Prorroga 1	22 de mayo de 2021
Valor del Contrato	$ 7.770.000.000
Valor Adicion No.1	$3.885.000.000
Valor Total	$ 11.585.000.000
Apoyo Técnico de la Supervisión FDLBU	ARQUITECTO JAVIER ROJAS

6.2. RESUMEN DE GARANTIAS

A continuación se listan las garantías suscritas para el contrato de obra, aprobadas por la supervisión, suscritas con la aseguradora Equidad Seguros

N° DE POLIZA	AA010565 – AA010566		
Cumplimiento del Contrato	$ 2.331.000.000	14/01/2020	14/03/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	$ 777.000.000	14/01/2020	14/09/2023
Estabilidad y Calidad De Obra	$ 2.331.000.000	14/03/2021	14/03/2026
Predios labores y operaciones	$ 438.901.500	14/01/2020	14/03/2021

N° DE POLIZA	AA010565 – AA010566		
Cumplimiento del Contrato	$ 2.331.000.000	02/03/2020	14/03/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	$ 777.000.000	02/03/2020	14/09/2023
Estabilidad y Calidad De Obra	$ 2.331.000.000	14/03/2021	14/03/2026
Predios labores y operaciones	$ 438.901.500	02/03/2020	14/03/2021

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Barrios Unidos es la localidad número 12 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra en el norte de la ciudad, limita por el norte con la localidad de Suba, por el sur con la localidad de Teusaquillo, por el oriente con la localidad de Chapinero, y por el occidente con las localidades de Engativa y Suba. Cuenta con una superficie de 11,9 Km2, y su pablacion asciende a los 300.000 habitantes.



Figura 2. Localización localidad de Barrios Unidos.

8. IDENTIFICACIÓN DE LOS SEGMENTOS VIALES

Figura 1. Mapa localidades de Bogotá D.C. 2019 (http://www.bogota.gov.co/localidades/mapa)

El proyecto inicialmente comprende el un listado de 66 segmentos de viales priorizados por parte del Fondo de Desarrollo Local de Barrios unidos (FDLBU), con base en el diagnostico preliminar y el estado y deterioro de las vías de la malla local, en diferentes zonas; para brindar una mejor movilidad a los habitantes de los diferentes barrios que componen la localidad.

8.1. LISTADO INICIAL PRIORIZACIÓN DE LA ALCALDÍA

NUMERO	CIV	EJE VIAL	DESDE	HASTA
1	12001648	Calle 75 A	Carrera 28	carrera 28 A
2	12001288	Carrera 28	Calle 83 BIS	Calle 84
3	12001302	Carrera 28	Calle 80	Calle 83 BIS
4	12001171	CALLE 84	Carrera 28	Carrera 28 B
5	12001180	CALLE 84	Carrear 27	Carrera 28
6	12000073	Carrera 67 A	Calle 95	Calle 100
7	12000753	Calle 73	Carrera 65	Carrera 65 B
8	12002465	Calle 63 F	Carrera 28	Carrera 28 A
9	12001804	Carrera 56 B	Calle 67 A	Calle 67 A BIS
10	12001759	Carrera 56 B	Calle 67 A BIS	Diagonal 67 B
11	12000914	Calle 67 D Bis	Carrera 66 A	Carrera 67

12	12001480	Carrera 62	Calle 66 C	Calle 67
13	12002585	Carrera 14 A	Calle 67	CALLE 68
14	12002610	Carrera 14 A Bis	Calle 66	Calle 67
15	12002503	Calle 63 F	Av. Carrera 24	Carrera 25
16	12002501	Calle 63 F	Carrera 25	Carrera 25 Bis
17	12002511	Calle 64	Carrera 22	Carrera 23
18	12002500	Carrera 25	Calle 63 F	Calle 64
19	12000106	Calle 97 A	carrera 58	carrera 60
20	12000110	Calle 97 A	Tranv 55	Carrera 58
21	12000147	Carrera 58	Calle 97	Calle 97 A
22	12002104	Calle 71 B	Carrera 26	Carrera 27
23	12002311	Calle 64 A	Carrera 28 b	Carrera 30
24	12002780	Carrera 21	Av. Calle 63	Calle 63A
25	12003160	Carrera 62	Calle 64	Calle 66C
26	12001447	Carrera 62	Calle 67	Calle 67A
27	12002120	KR 52	CL 64A	CL 65
28	12000448	CL 91A	KR 58	KR 59
29	12000201	CL 94	KR 64	KR 65
30	12002284	Calle 71	Carrera 19	Carrera 20
31	12001752	Carrera 50	Calle 71 A	Calle 71 C
32	12001704	Carrera 51	Calle 71 A	Calle 71 C
33	12001761	Carrera 51	Diagonal 71 BIS	Calle 71 A
34	12001762	Diagonal 71 BIS	Carrera 51	Carrera 52
35	12001849	Diagonal 71 BIS	Carrera 50	Carrera 51
36	12002699	Carrera 36 A	Calle 63	Calle 63 A
37	12002606	Calle 63 B	Carrera 35	Carrera 36
38	12002639	Carrera 36 A	Calle 63 A	Calle 63 B
39	12002614	Calle 63 B	Carrera 30	Carrera 35
40	12002593	Carrera 36 A	Calle 63 B	Calle 63 B Bis
41	12002560	Carrera 36 A	Calle 63 B Bis	Calle 63 C
42	12002645	Calle 63 A	Carrera 36 A	Carrera 36
43	12002644	Carrera 36	Calle 63 B	Calle 63 A
44	12002536	Carrera 36 A	Calle 63 C	Calle 63 G
45	12000837	Calle 79	Carrera 55 A	Carrera 55 B
46	12000436	CALLE 93	CRA47	CRA47A
47	12000423	CALLE 93	CRA 49	CRA 49A
48	12000744	CALLE 72 A	CRA 65B	CRA66
49	12000853	Calle 75	CARRERA 61	CARRERA 62
50	12002216	CL 70	KR 25	KR 26
51	12002244	CL 70	KR 24	KR 25
52	12000855	CL 67 F	KR 66 A	KR 67
53	12000874	CL 67 D BIS	KR 67	AV. KR 68
54	12001962	KR 27	CL 73 BIS	CL 74
55	12000093	KR 65 A	CL 96	CL 97
56	12000072	CL 97	KR 64	KR 65
57	12000088	CL 97 A	KR 61	KR 61 BIS
58	12000098	CL 97 A	KR 60	KR 60D
59	12000078	CL 97 A	KR 61 A	KR 61 BIS
60	12001501	CL 70 C	KR 56 B	KR 57
61	12001439	CL 78	KR 28 A	KR 28 B
62	12001473	CL 78	KR 28	KR 28A
63	12001504	CL 78	KR 27B	KR 28
64	12001518	CL 78	KR 27 A	KR 27 B

65	12002418	CL 66 A	KR 23	KR 22
66	12002481	CL 64	KR 23	KR 24

9. ACTIVIDADES INTERVENTORIA TECNICA

Para el periodo de análisis del presente informe se realizaron las actividades propias de la ejecución de obra, se dio continuidad al cronograma de ejecución de obra, se dio cumplimiento a los requerimientos de los protocolos aprobados de bioseguridad debido a la situación de salud publica ocacionada por el virus COVID-19, adicionalmente se adelantaron las siguientes actividades durante la vigencia del presente informe:

- Revision, ajuste y aprobación de los estudios y diseños de los CIV a intervenir.
- Elaboración el alcance, la metodología, el enfoque, y el Plan de Calidad,
- Elaboración del cronograma detallado del contrato.
- Levantamiento de topografía e implentacion de cotas de diseño
- Elaboración del presupuesto para la ejecución de las obras conforme a los diagnosticos y diseños realizados.
- Participarcipacion de los Comités de obra citados por la supervisión del contrato o interventoría.
-

9.1. ACTIVIDADES DE OBRA

Para este perriodo de ejecución se dio inicio a las activiades propias de obra de los CIV priorizados, después de tener autorización y aprobación del PMT, a continuación se listan los CIV intervenidos y las actividades realizadas:

CIV 12001804 Carrera 56B entre Calle 67ª y Calle 67b.

Para este periodo de ejecución se culmino con la instalación de la totalidad de la longitud la via del sardinel prefabricado, se culmino con extendido y compactación de la estrcutura del material granualar, según las especificicaciones de diseño.

Se realizo la demolision de concreto correspondiente al espacio publico, de la misma forma se construyeron las cajas de inspección y conexión domiciliarios de aguas servidas, dando paso a la conformación de la estructura del espacio publico, se nivelraon los medidores del acueducto, se culmino el fundiddo de la placa de concreto estampado MR41 y la instalación de la capa de rodadura de MDC-12 del costado Occidental.



Ilustración 3. CIV 12001804



CIV 12001759 Carrera 56B entre Calle 67B y Diagonal 67B

Para este periodo de ejecución, al igual que en el CIV12001804, vecino a este, se culmino con la instalación de la totalidad de la longitud la via del sardinel prefabricado, se culmino con extendido y compactación de la estrcutura del material granualar, según las especificicaciones de diseño.

Se realizo la demolision de concreto correspondiente al espacio publico, de la misma forma se construyeron las cajas de inspección y conexión domiciliarios de aguas servidas, dando paso a la conformación de la estructura del espacio publico, se nivelraon los medidores del acueducto, se culmino el fundiddo de la placa de concreto estampado MR41 y la instalación de la capa de rodadura de MDC-12 del costado Occidental.

CIV 12001180 Calle 84 entre Carrera 28 y Carrera 27ª (Reconstrucción)

Para el periodo de análisis se realiza la demolición de la totalidad de la carpeta asfáltica, se realizó la excavación manual de inspección de redes existentes. se realizó la excavación de la caja profunda de la vía, posteriormente se procedio con el mejoramiento de la subrasante de la estructura propuesto para este CIV, el proceso de mejoramiento de la subrasante con geo celda y para la totalidad del segmento vial y su nivelación con material granular tipo subbase clase C. una vez finalizado se continuo la demolición e instalación de sardinel, igualmente se realizo el proceso de mezcla e instalación de material reciclado bituminoso, diseñado para la estructura de este CIV, esta instalación se da en dos capas de compactación.













CIV 12001171 Calle 84 entre Carrera 28 y Carrera 28Bª (Reconstrucción))

Para el periodo de análisis se realiza el proceso de mezcla, extendido y compactación del material reciclado bituminoso, según las especificaciones de diseño, de inmediato se dio continuidad con la instalación de la carpeta asfáltica grano de caucho, terminando de esta forma la intervención de este CIV.









CIV 12001180 Calle 84 entre Carrera 28 y Carrera 27ª (Reconstrucción)

Para el periodo de análisis se finaliza la demolición e instalación de sardinel con su respectiva franja de ajuste, igualmente se realiza el proceso de mezcla e instalación de material reciclado bituminoso, una vez finalizado este proceso se realizó la instalación de la carpeta asfáltica en grano caucho para toda la vía, con esto se da por finalizado el CIV









CIV 12002418 Calle 66A entre Carrera 22 y Carrera 23 (Reconstrucción)

Para el periodo de análisis se realiza la demolición de la totalidad de la carpeta asfáltica, se realizó la excavación manual de inspección y localizacion de redes tipo apique. Se autoriza la actualización de redes por el acueducto según diseño existente.







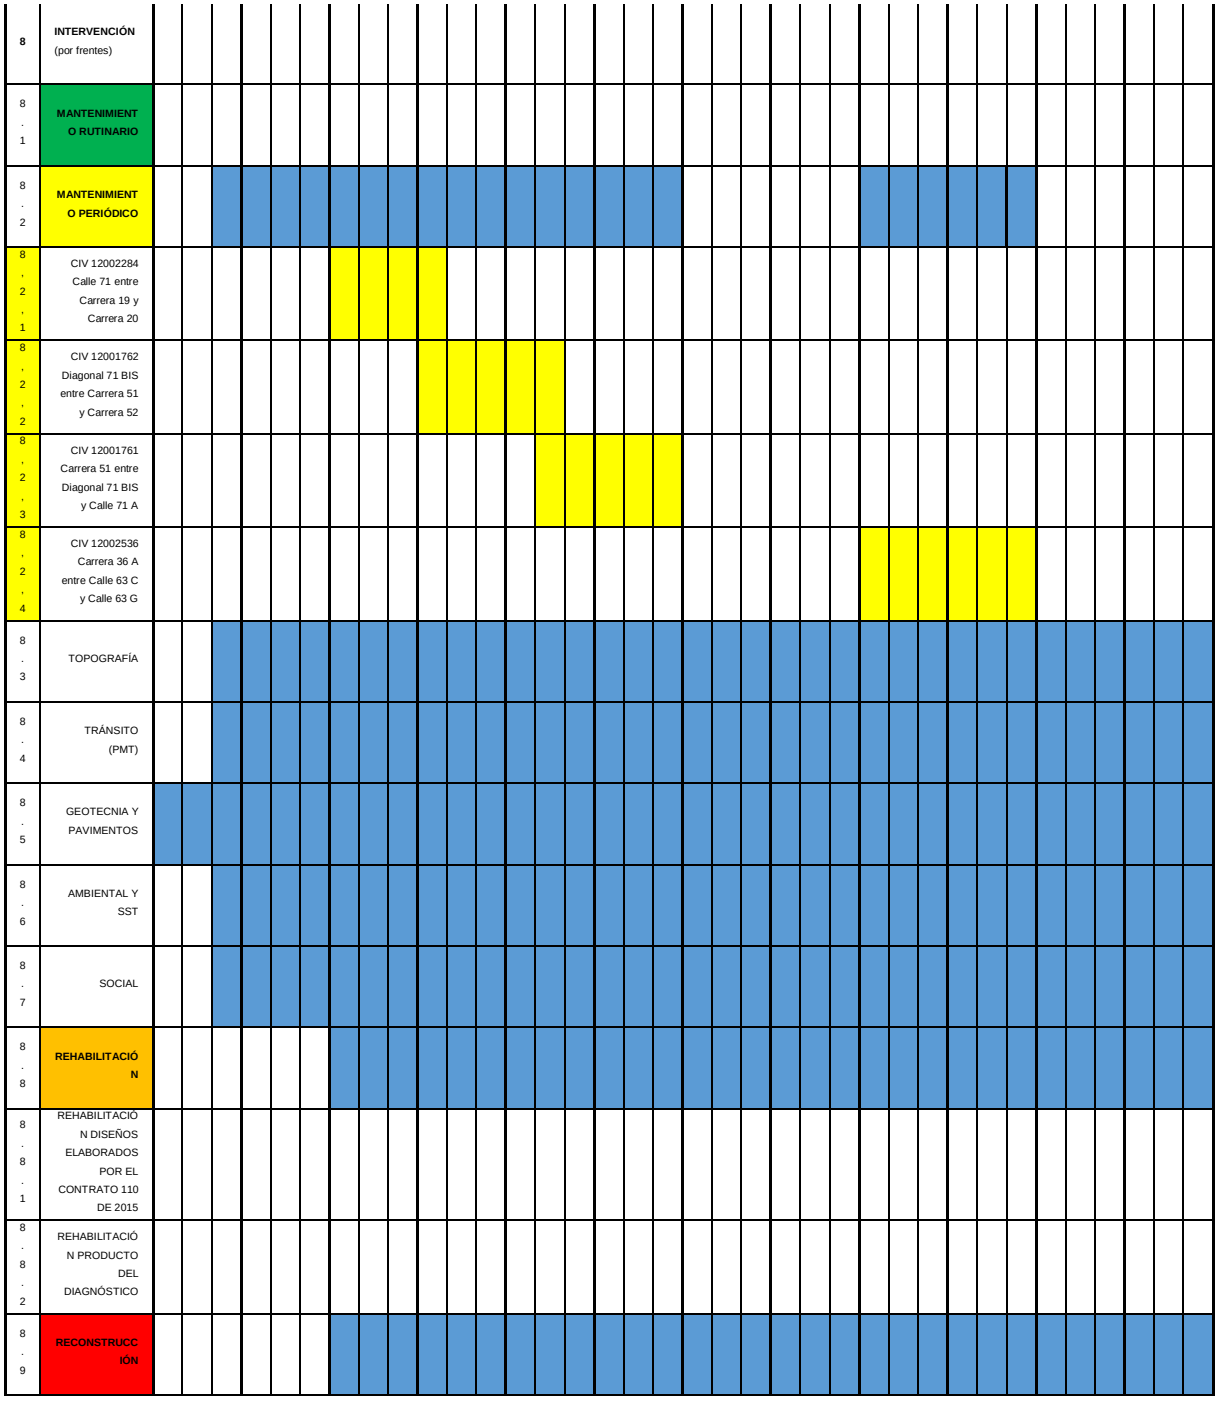


10. CRONOGRAMA ACTUALIZADO

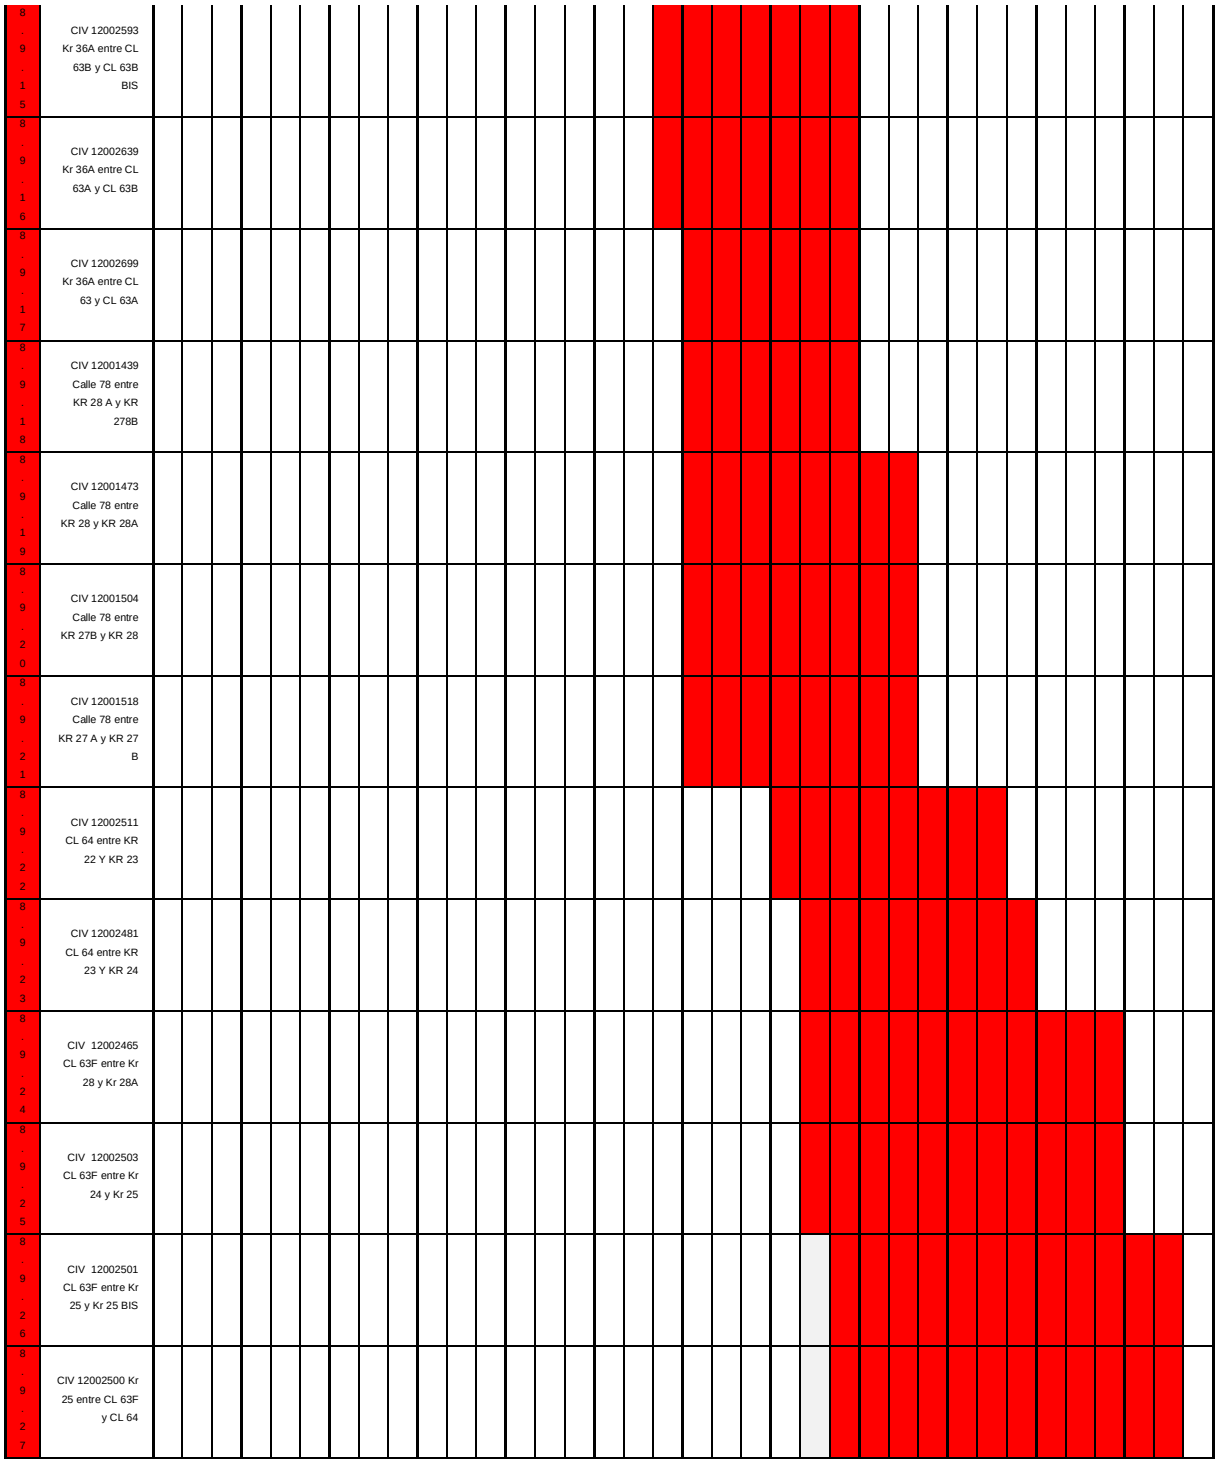
Se revisa el cronograma actualizado de las actividades presentado por el contratista.

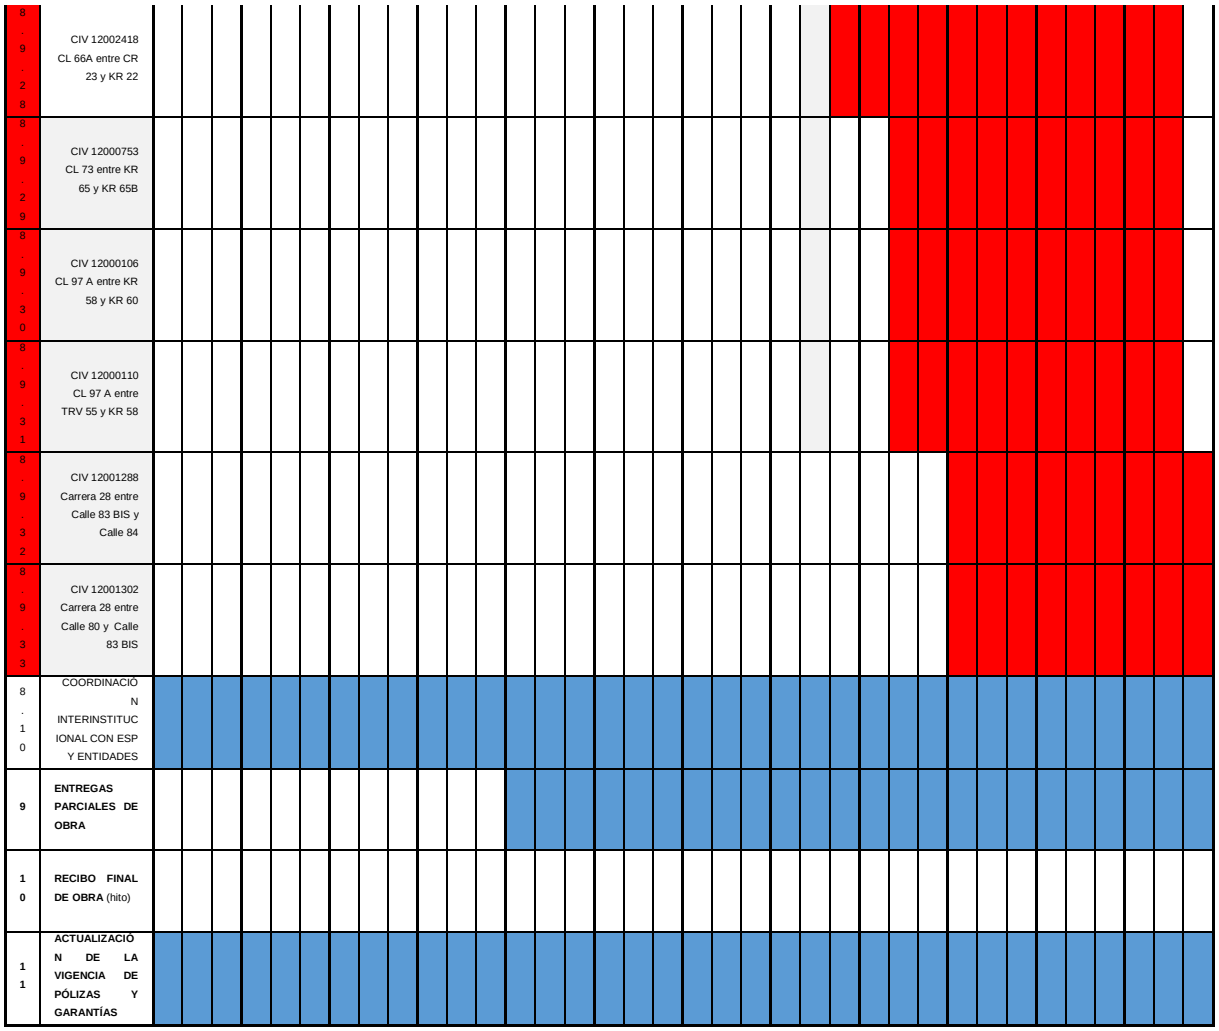
ÍTEM	ACTIVIDAD	DURACIÓN CONTRATO																						ADICIÓN											
		1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
1	**INICIO** (hito)																																		
2	**ELABORACIÓN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**																																		
3	**APROPIACIÓN DE DISEÑOS**																																		
3.1	APROPIACIÓN DE LOS DISEÑOS ELABORADOS CON EL CONTRATO 110 DE 2015																																		
3.2	AJUSTES A LOS DISEÑOS (En caso de requerirse)																																		
4	**DIAGNÓSTICO**																																		
4.1	ELABORACIÓN DE FICHAS DE DIAGNÓSTICO POR CIV																																		
5	**ESTUDIOS**																																		

5.1	ENSAYOS DE LABORATORIO																																	
5.2	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN																																	
6	**DISEÑOS POR COMPONENTES**																																	
6.1	TOPOGRAFÍA																																	
6.2	TRÁNSITO																																	
6.3	DISEÑO GEOMÉTRICO																																	
6.4	URBANISMO																																	
6.5	REDES HIDRÁULICAS																																	
6.6	REDES SECAS																																	
6.7	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS																																	
6.8	ESTRUCTURAS																																	
6.9	AMBIENTAL Y SST																																	
6.10	SOCIAL																																	
6.11	COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL																																	
	(ENTIDADES Y ESP)																																	
6.12	APROBACIONES POR LAS ESP Y ENTIDADES DISTRITALES																																	
7	**ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DETALLADO**																																	


8 INTERVENCIÓN (por frentes)
8.1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
8.2 MANTENIMIENTO PERIÓDICO
8.2.1 CIV 12002284 Calle 71 entre Carrera 19 y Carrera 20
8.2.2 CIV 12001762 Diagonal 71 BIS entre Carrera 51 y Carrera 52
8.2.3 CIV 12001761 Carrera 51 entre Diagonal 71 BIS y Calle 71 A
8.2.4 CIV 12002536 Carrera 36 A entre Calle 63 C y Calle 63 G
8.3 TOPOGRAFÍA
8.4 TRÁNSITO (PMT)
8.5 GEOTECNIA Y PAVIMENTOS
8.6 AMBIENTAL Y SST
8.7 SOCIAL
8.8 REHABILITACIÓN
8.8.1 REHABILITACIÓN DISEÑOS ELABORADOS POR EL CONTRATO 110 DE 2015
8.8.2 REHABILITACIÓN PRODUCTO DEL DIAGNÓSTICO
8.9 RECONSTRUCCIÓN

| | | |


8.9.15 CIV 12002593 Kr 36A entre CL 63B y CL 63B BIS
8.9.16 CIV 12002639 Kr 36A entre CL 63A y CL 63B
8.9.17 CIV 12002699 Kr 36A entre CL 63 y CL 63A
8.9.18 CIV 12001439 Calle 78 entre KR 28 A y KR 278B
8.9.19 CIV 12001473 Calle 78 entre KR 28 y KR 28A
8.9.20 CIV 12001504 Calle 78 entre KR 27B y KR 28
8.9.21 CIV 12001518 Calle 78 entre KR 27 A y KR 27 B
8.9.22 CIV 12002511 CL 64 entre KR 22 Y KR 23
8.9.23 CIV 12002481 CL 64 entre KR 23 Y KR 24
8.9.24 CIV 12002465 CL 63F entre Kr 28 y Kr 28A
8.9.25 CIV 12002503 CL 63F entre Kr 24 y Kr 25
8.9.26 CIV 12002501 CL 63F entre Kr 25 y Kr 25 BIS
8.9.27 CIV 12002500 Kr 25 entre CL 63F y CL 64



8.9.28	CIV 12002418 CL 66A entre CR 23 y KR 22
8.9.29	CIV 12000753 CL 73 entre KR 65 y KR 65B
8.9.30	CIV 12000106 CL 97 A entre KR 58 y KR 60
8.9.31	CIV 12000110 CL 97 A entre TRV 55 y KR 58
8.9.32	CIV 12001288 Carrera 28 entre Calle 83 BIS y Calle 84
8.9.33	CIV 12001302 Carrera 28 entre Calle 80 y Calle 83 BIS
8.10	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ESP Y ENTIDADES
9	**ENTREGAS PARCIALES DE OBRA**
10	**RECIBO FINAL DE OBRA** (hito)
11	**ACTUALIZACIÓN DE LA VIGENCIA DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS**

11. FACTURACIÓN

Para este periodo, el contratista presenta el acta parcial No. 3, dejando el siguiente balance del contrato, el porcentaje de ejecución corresponde a 31,16%

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DE CONTRATO	$ 7.770.000.000	
VALOR ADICION No.1	$ 3.885.000.000	
VALOR EJECUTADO ACTA No.1		$ 892.068.794
VALOR EJECUTADO ACTA No.2		$ 807.254.710
VALOR EJECUTADO ACTA No.3		$ 968.891.149
VALOR EJECUTADO ACTA No.4		$ 1.012.647.782
VALOR POR EJECUTAR		$ 7.974.137.565
SUMAS IGUALES	$ 11.585.000.000	$ 11.585.000.000

12. ALCANCE

Los alcances de la Interventoría son garantizar el cumplimiento de las actividades contratadas para el contrato de obra No. 241 de 2019 entre la Alcaldía Local Barrios Unidos y el contratista Consorcio Barrios Unidos 2020.

13. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Los objetivos de calidad que abarcan el proyecto están planteados de la siguiente forma:

- Realizar el proceso de recopilación y extracción de información para así mismo ofrecer una Interventoría oportuna y eficaz.

- Generar una mejora continua en los procesos de planificación, control y vigilancia de las obras de la malla vial.
- Elaborar diagnósticos de las zonas, adicionalmente la ejecución específica del mantenimiento y recuperación de las vías.
- Llevar un control minucioso del presupuesto determinado para el proyecto.

14. CONCLUSIONES

Para este perido de ejecucion se identificaron las siguientes conclusiones.

- Es absolutamente imperativo el cumplimiento de los protocolos de bio seguridad, cumpliendo con los requerimentos del gobierno nacional, frente a la emergencia sanitaria Covid-19
- Todos y cada uno de los diagnosticos deben ser presentados, verificados, avalados y aprobados por la supervisión y la interventoría
- Actuelmente se encuantra en tramite la aprobación del PMT de 3 CIV

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
1	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	3
Retroescavadoras	1
Compactadoras	0
Cargadores	
Finisher	
fresadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
tuberia 8"	m	-
tuberia12"	m	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	HDG456	15	INTERNO
	VDG563	15	INTERNO
	HCD767	15	INTERNO
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-			
-			
-			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza el fresado de la carpeta asfaltica desde la abscisa k0+73 a la k0+00, se prosede hacer apiques para verificacion de redes para evitar afectaciones.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

2

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
2	10	2020	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELO NORTE	CIV		
NOMENCLATURA	calle 70C	DESDE	CARRERA 56	HASTA	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	3
Retroescavadoras	1
Compactadoras	0
Cargadores	
Finisher	
fresadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
		-
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	HDG456	30	CEMEX
	VDG563	30	CEMEX
	HCD767	30	CEMEX
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE REALIZA LA EXCAVACION MECANICA Y MANUAL PARA LA CAJA DE ESTRUCTURA, PARA LA CONSTRUCCION DE 2 POSOS DE INSPECCION Y RED DE TUBERIAS AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
3	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
TUBERIA 8"	M	7.58
TUBERIA 12"	M	9.05
B200	M3	15
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
B200	HDG456	15	CANTERA
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE REALIZA LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 8 Y 12 ",K0+01 CON CONECCION DE POSO A POSO, SE CONSTRUYEN LOS POSOS DE INSPECCION Y SE HACE EL RECUBRIMIENTO CON MATERIAL TIPO B400 Y B200. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS ABSCISAS K0+00 A LA K0+13

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
5	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	3
Retroescavadoras	1
Compactadoras	0
Cargadores	
Finisher	
fresadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
MANGUERAS 3/4"	M	18
UNIVERSALES		4
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	HDG456	15	CEMEX
	VDG563	15	CEMEX
	HCD767	15	CEMEX
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINUAN LAS EXCAVACIONES MECANICAS Y MANUALES PARA CAJA DE ESTRUCTURA E INSTALACION DE TUBERIA , SE AFECTARON MANGUERAS DE AGUA POTABLE LAS CUALES FUERON REPARASAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS ABSCISAS K0+12 A LA K0+23

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
6	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	3
Retroescavadoras	1
Compactadoras	0
Cargadores	
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
TRITURADO	M3	15
B400	M3	30
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	HDG456	30	CEMEX
	VDG563	30	CEMEX
	HCD767	30	CEMEX
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
B400	HDG456	15	CANTERA
B400	VDG563	15	CANTERA
TRITURADO	HCD767	15	CANTERA
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE REALIZA EXCAVACION MECANICA Y MANUAL PARA ESTRUCTURA DE LA VIA Y PARA LA INSTALACION DE TUBERIA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DESDE LA ABSCISA K0+23 A LA K0+40

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
7	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	3
Retroescavadoras	1
Compactadoras	0
Cargadores	
Finisher	
fresadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
TUBERIA 12"	M	26.6
TRITURADO PARA CAMA TUBERIA	M3	2
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	HDG456	15	CEMEX
	VDG563	15	CEMEX
	HCD767	30	CEMEX
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION MECANICA Y MANUAL PARA LA ESTRUCTURA Y LA REDES DE ALCANTARILLADO DESDE LA ABSCISA K0+23 A LA K0+40. SE DA INICIO A LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 12" ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN LAS ABSCISAS SE DEJA CON ATRAQUES.K0+13 A K0+40

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
8	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	3
Retroescavadoras	1
Compactadoras	0
Cargadores	
Finisher	
fresadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
TUBERIA 8" PARA DOMICILIARIAS	M	54.9
TUBERIA 8" RED PRINCIPAL	M	26.6
TRITURADO PARA CAMA DE TUBERIA	M3	3.9
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE REALIZA LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE AGUAS RESIDUALES 4 ACOMETIDAS LAS CUALES VAN EN UN DIAMETRO DE 8" ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LAS ABSCISAS K0+10 A LA K0+40.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
9	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	3
Retroescavadoras	1
Compactadoras	0
Cargadores	
Finisher	
fresadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
B 400 PARA REDES	M3	28.06
MANGUERA 3/4" ACOMETIDA	M3	9
UNIVERSALES	-	2
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	HDG456	15	CEMEX
	VDG563	15	CEMEX
	HCD767	15	CEMEX
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	HDG456	15	CANTERA
-	VDG563	15	CANTERA
-	HCD767	15	CANTERA
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DESPUES DE HACER LAS CONEXCIONES DE LAS DOMICILIARIAS SE PROSEDE HACER EL RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA DE 8 Y 12 "DE LA RED PRINCIPAL. ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN LAS ABSCISAS K0+00 A LA K0+40

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
10	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	3
Retroescavadoras	1
Compactadoras	0
Cargadores	
Finisher	
fresadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
tuberia 8"	m	17
triturado para cama de tuberia.	m3	1.2
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	HDG456	45	CEMEX
	VDG563	45	CEMEX
	HCD767	30	CEMEX
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	HDG456	15	CANTERA
-	VDG563	15	CANTERA
-	HCD767	15	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se continua con la excavacion mecanica para la rehabilitacion de la via y el cambio de tuberia, se hace la instalacion de 18 m de tuberia, estas actividades se realizan en las abcisas k0+40 a k0+58.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
13	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	3
Retroescavadoras	1
Compactadoras	0
Cargadores	
Finisher	
fresadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
tuberia 12" red aguas lluvias	m	17
triturado	m3	1.2
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	HDG456	15	CEMEX
	VDG563	15	CEMEX
	HCD767	15	CEMEX
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	HDG456	15	CANTERA
-	VDG563	15	CANTERA
-	HCD767	15	CANTERA
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	3
Retroescavadoras	1
Compactadoras	0
Cargadores	
Finisher	
fresadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
		-
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	HDG456	15	CEMEX
	VDG563	15	CEMEX
	HCD767	15	CEMEX
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	HDG456	15	CANTERA
-	VDG563	15	CANTERA
-	HCD767	15	CANTERA
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
15	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	3
Retroescavadoras	1
Compactadoras	0
Cargadores	
Finisher	
fresadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
B400	M3	15
tuberia de 6" domiciliarias	m	25
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	HDG456	15	CEMEX
	VDG563	15	CEMEX
	HCD767	15	CEMEX
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
B400	HDG456	15	CANTERA
-	VDG563	15	CANTERA
-	HCD767	15	CANTERA
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se terminan las actividades de excavacion mecanica de la caja de estructura, teniendo en cuenta que el material existente es arcilla se generan sobre excavaciones aproximadas de 5 cm, se evidencia falla estructural en el eje de la via la cual sera intervenida a una profundidad debajko de sub sarzante de 30cm los cuales seran recuperados con material tipo SBG-C. - se seraliza la exzcavacion maual y mecanica para la cosntruccion de pozo de inspeccion. actividades realizadas en las abscisas k0+69 a k0+71

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
16	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	3
Retroescavadoras	1
Compactadoras	0
Cargadores	
Finisher	
fresadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
tuberia 9" para domiciliarias	m	36
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	HDG456	15	CEMEX
	VDG563	15	CEMEX
	HCD767	15	CEMEX
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza recubrimiento con material b400 para tuberia coneccion pozo cruce a pozo k0+61, se compacta con canguro y se continuan con la instalacion de tuberia domiciliaria de 6" actividades que se realizan en las abscisas k0+40 a k0+70.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
17	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	3
Retroescavadoras	1
Compactadoras	0
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
tuberia 6"	m	12
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

M41:AD52MIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	HDG456	15	CEMEX
	VDG563	15	CEMEX
	HCD767	15	CEMEX
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la reconstruccion de un pozo de ispeccion, se continua con las actividades de instalacion de tuberia para red domiciliaria los empates se realizan con sillas yee. Estas actiividades se realizan en las abscisas k0+50n a k0+70, se hace la excavacion del fallo encontrado donde estaba la tuberia qye fue cambiada, la cual tenia fugas generando demaciada plasticidad de la arcilla alli encontro estas actividades se vieron realizadas desde la abscisa k0+10 a k0+72.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
19	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	0
Retroescavadoras	0
Compactadoras	0
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
carcamos muros para red domiciliaria 6"	m	30
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
CARGUE DE ESCOMBROS							
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se termina la instalacion de red domiciliaria con los empates con silla yee, se prosede hacer la construccion de los muros de carcamos de proteccion para esta misma red actividades realizadas en las abscisas k0+05 a k0+40

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
20	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
arena para redes	m3	15
construccion muros carcamos	m	16
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	HDG456	15	CEMEX
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
arena para redes	HDG456	15	CANTERA
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se continua con las actividades de construccion de los muros del carcamo de proteccion para la red domiciliaria de 6" 16 m" - se hace el relleno con arena de 30 m de carcamo y se compacta de forma manual para no afectar la tuberia. Estas actividades se realizan en las abscisas k0+05 a la k0+40

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
21	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
muros carcamo	m	16
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se adelantan actividadesde cosntruccion de muros para los carcamos de proteccion de red domiciliaria de 6". - se hace el respectivo recubrimiento con arena para redes y se compacta de forma manual para no afectar la tuberia, estas actividades se desarrollaron desde la absisa k0+30 a k0+70.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

22

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
22	10	2020	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
construccion carcamos	m	22
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
CARGUE DE ESCOMBROS							
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se termina con la actividad de construccion de los muros de los carcamos y se continua con los rellenos con material arena para redes, se compacta de forma manual para evitar daños en la tuberia,- se hace figurado de parrillas para las tapas de los carcamos. estas actividades se realizaron en las abscisas k0+05 a k0+70.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
23	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
concreto	m3	4
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
CARGUE DE ESCOMBROS							
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la fundida de las tapas de los carcamos las cuales llevan parrilla simple y manijas con hierro, dilatadas a 1.5m de longitus . Estas actividades se realizaron desde las abscisas k0+05 a k0+70.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
24	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
		-
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
CARGUE DE ESCOMBROS	HDG456	15	CEMEX				
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza limpieza de escombros producto de las actividades que se han desarrollado, se revidsan los niveles donde se evidencia sobre excavacion de 0.6cm los cuales se renivelaran con material tipo sbg-c estas actividades se realizaron en las abscisas k0+00 a k0+70.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
26	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	3
Retroescavadoras	1
Compactadoras	0
Cargadores	
Finisher	
fresadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
sbg.c	m3	45
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	HDG456	15	CANTERA
-	VDG563	15	CANTERA
-	HCD767	15	CANTERA
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza el suministro e instalacion de sbg-c para renivelacion de la sub brazante y mejoramiento de fallo longitudinal donde se encontraba la tuberia antigul. Estas actividades se relizaron en las abscisas k0+05 a k0+71.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
27	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	1
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
geo textil	m2	570.9
geo celda	m2	570.9
sbg-c	m3	199
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
SBG-C	HDG456	45	CANTERA
SBG-C	VDG563	30	CANTERA
SBG-C	HCD767	30	CANTERA
SBG-C	OPL245	30	CANTERA
SBG-C	DHN231	30	CANTERA
SBG-C	QSA362	30	CANTERA
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la instalacion del geo textil y la geo celda, se prosede hacer el relleno de la geop celda con material tipo sbg-c , se humecta y se compacta. Se realiza de manera manual la excavacion para los sumideros sl100 estas actividades se realizan en las abscisas k0+05 hasta k0+72

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
28	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
concreto	m3	3.5
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	4	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

secontinua con el seriado de la capa de SBG-C y se da inicio a la construccion de los sumideros donde se hace la instalacion de las parrillas estructurales para refuerzo, formaleteado y fundida.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
29	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
geo textil con descuento	m2	78
geo celda con descuento	m2	78
sbg	m3	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	4	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	HDG456	15	CEMEX
	VDG563	15	CEMEX
	HCD767	15	CEMEX
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
sbg-c	HDG456	15	CANTERA
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

el contratista realiza las actividades enfocadas sobre las abscisas k0+75 donde se realizan excavaciones de forma manual para la estructura en este punto, se instala geo textil y la geo malla. Se hace el recubrimiento de 40 cm de sbg-c. no se generan afectaciones.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
30	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70C	**DESDE**	CARRERA 56	**HASTA**	carrera 57

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2-
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
		-
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	HDG456	15	CEMEX
	VDG563	15	CEMEX
	HCD767	15	CEMEX
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realizan actividades de excavacion manual, figurado de hierro y formaleteado para la construccion de 2 sumideros sobre la abscisa k0+70 y k0+62. no se oresentan afectaciones

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
1	10	2020	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	POLO	**CIV**	12001171- 12001180	
NOMENCLATURA	CALLE 84	**DESDE**	CARRERA 27	**HASTA**	CARRERA 28 y CARRERA 28B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
rajon	m3	18
b200	m3	3.7
geotextil	m2	37.5
mbr	m3	9
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la intervencion de la mitad del cruce de la calle 84 con carrera 28 donde se emplea la estructura completa hasta el MBR para habilitar trafico.
Dichas actividades se realizan en las abscisas K0*50 a la K0+55.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
2	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	POLO	**CIV**	12001171- 12001180	
NOMENCLATURA	CALLE 84	**DESDE**	CARRERA 27	**HASTA**	CARRERA 28 y CARRERA 28B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
		-
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

durante el dia el contratista realiza actividades de excavacion mecanica y manual en el cruce de la calle 84 entre carrera 28 donde se instalara la tuberia para la red de aguar reciduales y la estrcutura cabe destacar que debido a la precencia de ,as redes el trabajo se hace de forma manual para no generar daños. estas actividades se llevan a cabo en las abscisas K0+55 a K0+60

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
3	10	2020	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	POLO	**CIV**	12001171- 12001180	
NOMENCLATURA	CALLE 84	**DESDE**	CARRERA 27	**HASTA**	CARRERA 28 y CARRERA 28B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
tuberia sumidero	m	20.3
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la demolicion de un poso y se continua con las actividadesa de excavacion manual y mecanica para redes en las abscisas k0+55 a k0+60 se hace la instalacion de tuberia para los sumideros.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
5	10	2020	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	POLO	**CIV**	12001171- 12001180	
NOMENCLATURA	CALLE 84	**DESDE**	CARRERA 27	**HASTA**	CARRERA 28 y CARRERA 28B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
		-
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la excavacion manual y construccion de poso de inspeccion en la abscisa k0+58.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
6	10	2020	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	POLO	**CIV**	12001171- 12001180	
NOMENCLATURA	CALLE 84	**DESDE**	CARRERA 27	**HASTA**	CARRERA 28 y CARRERA 28B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
tuberia 10" para red alcantarillado	m	10
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la excavacion mecanica y manual para redes, se realiza la instalacion de la tuberia de red de alcantarillado de 10" en las abscisas k0+55.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
7	10	2020	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	POLO	**CIV**	12001171- 12001180	
NOMENCLATURA	CALLE 84	**DESDE**	CARRERA 27	**HASTA**	CARRERA 28 y CARRERA 28B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
		-
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la construccion de los muros de carcamos de proteccion para las redes presentes en el cruce en la abscisa k0+55 y se realiza la demolicion de 70 m lineales de sardinel.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
8	10	2020	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	POLO	**CIV**	12001171- 12001180	
NOMENCLATURA	CALLE 84	**DESDE**	CARRERA 27	**HASTA**	CARRERA 28 y CARRERA 28B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
		-
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se continuan con las actividades de construccion de carcamos en las abscisas k0+55 y el alistamiento de los niveles para la instalacion de los sardineles en las abscisas k0+60 a k1+20 costado sur.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
9	10	2020	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	POLO	**CIV**	12001171- 12001180	
NOMENCLATURA	CALLE 84	**DESDE**	CARRERA 27	**HASTA**	CARRERA 28 y CARRERA 28B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
sardinel y bordillo	ml	30
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza el recubrimiento de redes con arena para hacer fundida de tapas de los carcamos, se hace la instalacion de 30 metros lineales de sardinel y bordillo en las abscisas k0+90 a k1+20.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
10	10	2020		
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN	REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	POLO	**CIV**	12001171- 12001180	
NOMENCLATURA	CALLE 84	**DESDE**	CARRERA 27	**HASTA**	CARRERA 28 y CARRERA 28B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
		-
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	opl298	30	cemex
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la excavacion manual para la instalacion de formaletas y hierro para la construccion de los sumideros ubicados en las absisas k0+62 a los 2 costados, se funden las tapas de los carcamos de las redes del cruce en las abscisas k0+55.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
13	10	2020		
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	POLO	**CIV**	12001171- 12001180	
NOMENCLATURA	CALLE 84	**DESDE**	CARRERA 27	**HASTA**	CARRERA 28 y CARRERA 28B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
cemento	m3	1.5
sardinel	m	50
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la instalacion de los hierros de refuerzo para los sumideros y se hacen los cajones, se hace fundido de sumideros en las abscisas k0+64 y se continua con las actividades de demolicion e instalacion de sardinel.en las abscisas k0+60 a k0+90.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**	
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
14	10	2020		
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	POLO	**CIV**	12001171- 12001180	
NOMENCLATURA	CALLE 84	**DESDE**	CARRERA 27	**HASTA**	CARRERA 28 y CARRERA 28B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
geo celda cruce		28
geo textil cruce	m2	28
gbg-c	m3	40
	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realliza renivelacion de la subrazante y se compacta manualmente, se prosede a instalar el geo textil y la geo mallla para continuamente hacer el respectivo lleno con material de cantera tipo sbg-c. Se continua con las actividades de demolicion de sardinel e instalacion del nuevo. se hace limpiexa de escombro, actividades realizadas dentro de las abscisas k0+55 a k1+20.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
15	10	2020		
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN	REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	POLO	**CIV**	12001171- 12001180	
NOMENCLATURA	CALLE 84	**DESDE**	CARRERA 27	**HASTA**	CARRERA 28 y CARRERA 28B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	8
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
sardinel y bordillo	m	60
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se termina la actividad de instalacion de sardinel y bordillos, se hace el desencofrado de los sumideros y se hace el mezclado del mbr para el cruce en la abscisa k0+55,

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
16	10	2020	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	POLO	**CIV**	12001171- 12001180	
NOMENCLATURA	CALLE 84	**DESDE**	CARRERA 27	**HASTA**	CARRERA 28 y CARRERA 28B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
mbr	m3	30
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	ops249	m3	maquinas amarillas
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se hace mezclado de mbr para realizar seriado de la via en las abscisas k0+55 a k1+20. se retira el escombro acumulado.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**	
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
19	10	2020		
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	POLO	**CIV**	12001171- 12001180	
NOMENCLATURA	CALLE 84	**DESDE**	CARRERA 27	**HASTA**	CARRERA 28 y CARRERA 28B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
		-
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	opl244	45	maquinas
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

el contratista realiza jornada de limpieza sobre la estructura, se definen los cortes y se hace una humectacion, estas actividades se realizan desde las abscisas k0+00 a la k1+20.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**	
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
20	10	2020		
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	POLO	**CIV**	12001171- 12001180	
NOMENCLATURA	CALLE 84	**DESDE**	CARRERA 27	**HASTA**	CARRERA 28 y CARRERA 28B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
		-
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
densidades	1	k1+15
densidades	1	k0+85
densidades	1	k0+70
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realizan las pruebas de laboratorio para las densidades de la estructura del MBR las cuales arrojaron resultados superiones a 98%

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
23	10	2020		
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN	REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	POLO	**CIV**	12001171- 12001180	
NOMENCLATURA	CALLE 84	**DESDE**	CARRERA 27	**HASTA**	CARRERA 28 y CARRERA 28B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
		-
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

el contratista adelanta segunda limpieza de superficie, se realiza humectacion, se deja lista para hacer la imp´rimacion.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**	
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
24	10	2020		
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	POLO	**CIV**	12001171- 12001180	
NOMENCLATURA	CALLE 84	**DESDE**	CARRERA 27	**HASTA**	CARRERA 28 y CARRERA 28B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	10
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	1
Volquetas dobletroques	9
Retroescavadoras	
Compactadoras	3
Cargadores	1
Finisher	1
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
asfalto grano de caucho compacto	m3	110.7
imprimacion con liga asfaltica	m2	919.6
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	caucho
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
sop254	170°	140°
-	-	-
opl259	174°	138°

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	4	CÁRCAMOS	-
POZOS	6	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la imprimacion, porterior a esto se da inicio a la instalacion de la mezcla asfaltica teniendo en cuenta los espesores, de la k0+00 a la k0+55 carpeta asfaltica de 11 cm y de la k0+55 a la k1+120 una carpeta asfaltica de 12cm.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
26	10	2020	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	POLO	**CIV**	12001171- 12001180	
NOMENCLATURA	CALLE 84	**DESDE**	CARRERA 27	**HASTA**	CARRERA 28 y CARRERA 28B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
concreto	m3	.5
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la reconstruccion total de las placas de los andenes que fueron afectadas por las actividades ejecutadas en este segmento vial.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ
