INFORME EJECUTIVO
CORTE DE OBRA No 1



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA

CONSORCIO SEDEROS PEATONALES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1820-2025

PERIODO DEL 5 DE AGOSTO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2
INTRODUCCIÓN 3
1. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 3
2. DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4
3. NOVEDADES DE LOS CONTRATOS 4
4. LOCALIZACION DEL PROYECTO 6
5. ALCANCE DEL PROYECTO 7
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 9
7. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA 10
8. SEGUIMIENTO FINANCIERO 11
9. REGISTRO FOTOGRAFICO 13
10. CONCLUSIONES 15

INTRODUCCIÓN

La Gobernación del Amazonas, dentro del plan desarrollo ”AMAZONAS PARA LA VIDA”, busca dentro de los programas de transporte, mejorar y ampliar la red de infraestructura vial dentro de las comunidades indígenas del Amazonas, en sectores corregimentales que están en constante dinámica de desarrollo socio económico y no cuentan con vías habilitadas para la movilidad y tránsito, además de liderar los procesos de construcción de nuevas vías a la deteriorada red vial departamental en coordinación con las entidades competentes, como es el FONDO SUBSIDIO DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA FSSG vigencia 2024.

El proyecto se conforma con DOS tramos de vías que van a generar UNA nueva vía de movilidad peatonal vial en el corregimiento de la Chorrera, con un alcance total incluyendo las losas de giro vial de 1724 ml x 2.86 de ancho (con canaletas en concreto), y además todas estas nuevas vías concurren con otras vías construidas con recursos del FONDO SUBSIDIO DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA en vigencia anteriores.

El proyecto está situado en la cabecera corregimental la Chorrera – Departamento de Amazonas, , en el extremo sureste del territorio colombiano. Sus coordenadas geográficas son 4° 12' 54" de latitud sur y 69° 56' 28" de longitud oeste, con una altitud aproximada de 90 metros sobre el nivel del mar. La temperatura media en esta zona se mantiene alrededor de los 29 °C.

Específicamente el proyecto se encuentra localizado en el corregimiento de Chorrera, en las coordenadas geográficas 1°26´34.11” S y a 72°47´21.60” O.

1. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE:	OBRA
CONTRATO No.:	1868-2025
CONTRATISTA:	VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S. Nit: 900.560.635-3 Representante Legal: Karen Dayana Caicedo Patiño
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	5/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*):	CINCO (5) MESES

CONTRATO DE:	OBRA
PLAZO TRANSCURRIDO:	OCHENTA Y OCHO (88) DIAS
VALOR INICIAL:	$ 4.574.004.535,19
VALOR ADICIONES:	N/A
ANTICIPO:	$ 2.287.002.267,60
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones***):**	$ 4.574.004.535,19

2. DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**
CONTRATO No.:	1820-2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	5/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas***):**	CINCO (5) MESES
PLAZO TRANSCURRIDO:	OCHENTA Y OCHO (88) DIAS
VALOR INICIAL:	$ 276.631.970,97
VALOR ADICIONES:	N/A
ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones***):**	$ 276.631.970,97

3. NOVEDADES DE LOS CONTRATOS

NOVEDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA				
MODIFICATORIO 1				Aclaración clausula 17 anexo 5 garantía de cumplimiento,

NOVEDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA				
MODIFICATORIO 2				Se aclara clausula 2 número del contrato el cual es 1820-2025
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	***Desde***	***Hasta***	
		N/A	*N/A*	*N/A*
	Prórroga a la suspensión No.	*N/A*	*N/A*	*N/A*
	Reinicio No. 1	*N/A*		*N/A*
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	*N/A*			
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	*N/A*		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N/A			
ADICIONES	Adición No 1	*N/A*		
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A			

NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
MODIFICATORIO 1				Se realiza la aclaración de la cláusula 7 rubro presupuestal.
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	***Desde***	***Hasta***	***Comité técnico / fiduciario donde se aprueba***
		N/A	*N/A*	*N/A*

NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
	Prórroga a la suspensión No.	*N/A*	*N/A*	*N/A*
	Reinicio No. 1	*N/A*		*N/A*
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	*N/A*			
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	*N/A*		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N/A			
ADICIONES	Adición No 1	*N/A*		
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A			

4. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Específicamente, el proyecto se encuentra localizado en la Cabecera Corregimental de Chorrera del departamento del Amazonas.

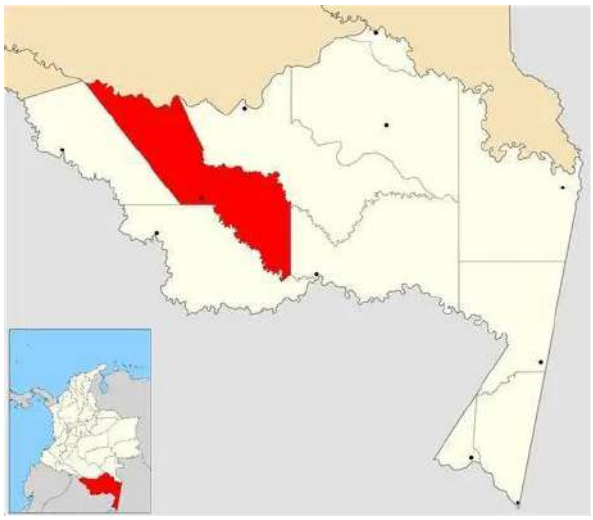


Figura 1. Localización del proyecto corregimiento la Chorrera – Amazonas

5. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un sendero peatonal en la Cabecera Corregimental de Chorrera del departamento del Amazonas por medio de la Gobernación del Amazona, el cual
tiene como objeto “CONSTRUCCIÓN SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA”, este tiene como fin garantizar a la comunidad un espacio digno para transitar a las distintas partes del corregimiento, de igual manera mejorar la calidad de vida de esta comunidad y así mismo esto garantizará un mejoramiento en la comercialización de los productos.



Figura 2. Alcance del proyecto

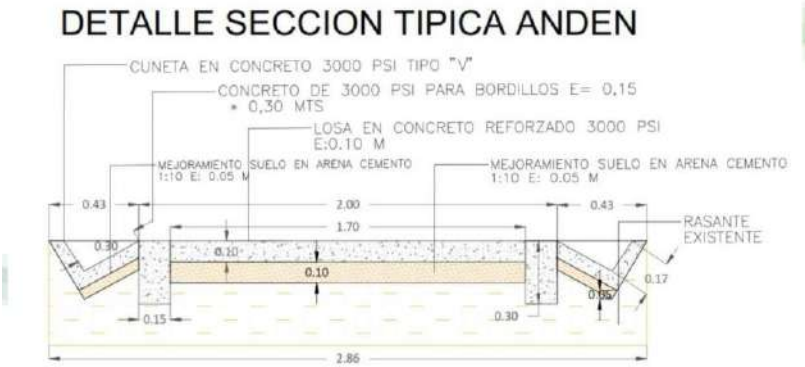




Figura 3. Detalle sección típica

ACTIVIDADES	COSTOS	PORCENTAJE
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	$ 50.921.089,62	1,11%
DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS EXISTENTE	$ 39.418.490,92	0,86%
EXCAVACIÓN MANUAL MENOR A 0,50 MTS CON RETIRO DE ESCOMBROS	$ 69.967.685,52	1,53%
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL PARA ANDENES	$ 78.704.362,00	1,72%
BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	$ 755.553.424,65	16,52%
ACERO DE AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA #5	$ 227.147.168,89	4,97%
CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDENES	$ 927.033.233,27	20,27%
ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR - INCLUYE SELLANTE ACRÍLICO (LUSTRE)	$ 379.357.917,04	8,29%
CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	$ 1.012.041.116,62	22,13%
CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	$ 1.009.220.525,87	22,06%
DILATACIÓN DE PAVIMENTO (INCLUYE CORTES)	$ 24.639.520,79	0,54%
TOTAL	**$ 4.574.004.535,19**	**100,00%**

Tabla 1. Alcance del proyecto.

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Periodo 1 – Agosto de 2025

Durante este periodo se desarrollaron principalmente actividades preliminares y de alistamiento del proyecto, orientadas a garantizar el inicio adecuado de la obra. El contratista realizó la logística para el suministro y acopio de materiales, instalación de la valla informativa del proyecto y conformación de frentes de trabajo. Se ejecutaron levantamientos topográficos, localización y replanteo de los tramos a intervenir, los cuales fueron verificados y validados por la interventoría. No se ejecutaron actividades constructivas de obra civil, registrándose un avance físico inicial mínimo asociado al replanteo.

Periodo 2 – Septiembre de 2025

En este periodo se iniciaron las actividades constructivas, concentradas en la excavación manual, conformación y mejoramiento del terreno, retiro de material no apto y trabajos de nivelación y compactación en los tramos definidos. Se avanzó en la base estabilizada en arena–cemento y continuaron las labores de replanteo topográfico en campo. Se identificaron zonas con suelos no portantes que requirieron excavaciones adicionales, situación controlada y validada por la interventoría. El avance físico fue progresivo y acorde con las actividades programadas para esta etapa inicial de obra.

Periodo 3 – Octubre de 2025

Durante este periodo se ejecutaron actividades estructurales del sendero peatonal, incluyendo continuación de localización y replanteo, excavación manual, en esta actividad se continuo evidenciando la presencia de fallos en el terreno que debieron ser extraídos por el contratista debidamente cuantificado entre las partes, nivelación y compactación, base estabilizada en suelo cemento, el alistamiento e instalación de formaletas, amarre e instalación de acero de refuerzo, colocación de malla electrosoldada, y vaciado de concreto de 3.000 psi para placas, bordillos y cunetas. Se realizaron trabajos de acabado superficial, cortes de dilatación, sellado y protección del concreto, así como demolición de estructuras existentes en algunos tramos. El avance se concentró en varios frentes entre las abscisas iniciales del proyecto, evidenciando un progreso significativo en la construcción del sendero.

Periodo 4 – Noviembre de 2025

Durante este periodo se continua ejecutando actividades estructurales del sendero peatonal, incluyendo localización y replanteo, excavación manual, en esta actividad se continuo evidenciando la presencia de fallos en el terreno que debieron ser extraídos por el contratista debidamente cuantificado entre las partes, nivelación y compactación, base estabilizada en suelo cemento, el alistamiento e instalación de formaletas, amarre e

instalación de acero de refuerzo, colocación de malla electrosoldada, y vaciado de concreto de 3.000 psi para placas, bordillos y cunetas. Se realizaron trabajos de acabado superficial, cortes de dilatación, sellado y protección del concreto, así como demolición de estructuras existentes en algunos tramos. El avance se concentró en varios frentes entre las abscisas iniciales del proyecto, evidenciando un progreso significativo en la construcción del sendero.

Periodo 5 - del 1 al 10 de diciembre de 2025.

Durante este periodo se continua ejecutando actividades estructurales del sendero peatonal, incluyendo localización y replanteo, excavación manual, en esta actividad se continuo evidenciando la presencia de fallos en el terreno que debieron ser extraídos por el contratista debidamente cuantificado entre las partes, nivelación y compactación, base estabilizada en suelo cemento, el alistamiento e instalación de formaletas, amarre e instalación de acero de refuerzo, colocación de malla electrosoldada, y vaciado de concreto de 3.000 psi para placas, bordillos y cunetas. Se realizaron trabajos de acabado superficial, cortes de dilatación, sellado y protección del concreto, así como demolición de estructuras existentes en algunos tramos.

7. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA

Durante los periodos comprendidos entre agosto y noviembre de 2025, la Interventoría, realizó el seguimiento integral a la ejecución del proyecto.

En el mes de agosto de 2025 (Informe Mensual No. 1), se registra un avance físico inicial del 0,03%, sin ejecución financiera directa de obra, con desembolsos del anticipo debidamente revisados y aprobados por la interventoría.

Durante el mes de septiembre de 2025 (Informe Mensual No. 2), se alcanzó un avance físico acumulado del 3,34%, presentando una variación mínima frente al cronograma contractual, sin afectación significativa de la ruta crítica.

En el mes de octubre de 2025 (Informe Mensual No. 3), se evidenció un avance físico acumulado del 20,12% frente a un avance programado del 21,5 %. El leve atraso se atribuye a condiciones climáticas adversas, dificultades en el suministro de materiales y mayores profundidades de excavación, situaciones debidamente evaluadas por la interventoría.

En el mes de noviembre de 2025 (Informe Mensual No. 4), se evidenció un avance físico acumulado del 40.22% frente a un avance programado del 60.22%. Atraso se atribuye a condiciones climáticas adversas, que han dificultado la extracción y acopio de material (grava y arena) dados los altos niveles del rio, las mayores profundidades de excavación debido a fallos encontrados en el terreno que han debido ser retirado requiriendo

estabilización de subrasante con suelo -cemento, situaciones que han afectado el normal desarrollo de actividades generando tiempo, actividades no previstas y mayores cantidades de obra en la ejecución contractual.

Del 1 al 10 de diciembre de 2025, se evidenció un avance físico acumulado del 47.22% frente a un avance programado del 70.19%. Atraso que va en aumento se atribuye a condiciones climáticas adversas, que han dificultado la extracción y acopio de material (grava y arena) dados los altos niveles del rio, las mayores profundidades de excavación debido a fallos encontrados en el terreno que han debido ser retirado requiriendo estabilización de subrasante con suelo -cemento, situaciones que han afectado el normal desarrollo de actividades generando tiempo, actividades no previstas y mayores cantidades de obra en la ejecución contractual. Para lo cual el contratista presenta el balance contractual y solicitud de adición y prorroga al contrato de obra, que se encuentra en revisión y ajuste entre contratista e interventoría. El contratista en comité del 26 de noviembre de 2025, planteo la solicitud de suspensión temporal al contrato de obra para evaluación de la interventoría y la entidad.

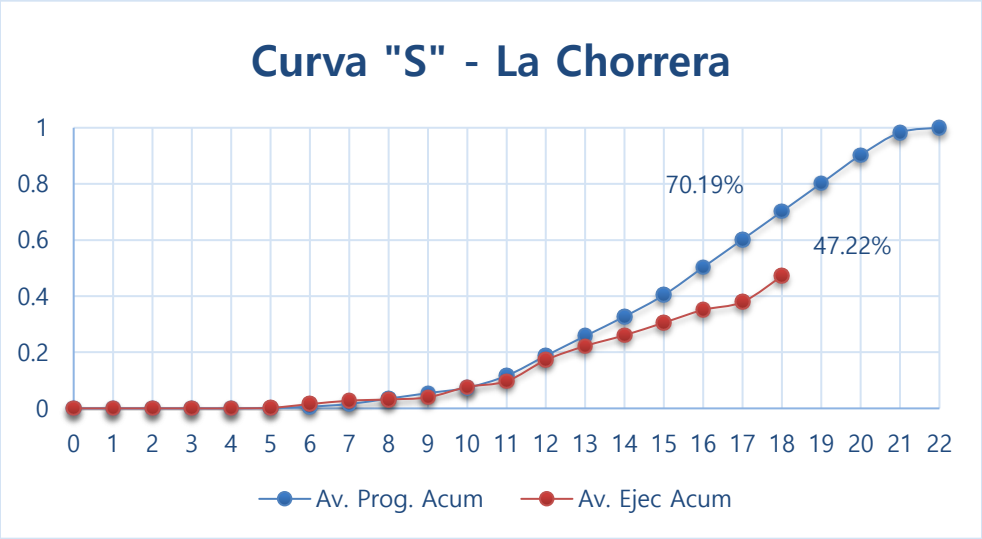


Figura 4. Curva “S”

8. SEGUIMIENTO FINANCIERO

A la fecha, no se han presentado pagos de actas parciales, sin embargo, de acuerdo con la forma de pago del contrato se cuenta con el anticipo correspondiente al 50% del valor contractual, el cual fue por la suma de $ 2.287.002.267.

Durante el mes de octubre de 2025, se aprobó por parte de Interventoría los pagos con recursos de anticipo de acuerdo con los siguientes rubros que hacen parte del plan de inversión de anticipo v2 aprobado por la interventoría:

Aprobacion	Fecha	DESEMBOLSO	Costo de Mano de Obra	Compra de materiales	Maquinaria y Equipos	Transportes	Valor Total
		Valor Base	$ 265,478,911.00	$ 1,177,531,171.40	$ 110,612,965.60	**$ 733,379,219.00**	$ 2,287,002,267.00
OP_671023	28/08/2025	Desembolso 1		$ 544,000,000.00			
OP_671053	28/08/2025	Desembolso 2		$ 152,686,150.50			
OP_674774	5/09/2025	Desembolso 3			$ 50,800,000.00		
OP_674956	6/09/2025	Desembolso 4		$ 10,654,131.00			
OP_674965	6/09/2025	Desembolso 5				$ 11,880,000.00	
OP674970	6/09/2025	Desembolso 6				$ 13,037,500.00	
OP_674967	6/09/2025	Desembolso 7		$ 133,772,535.97			
OP_674971	6/09/2025	Desembolso 8				$ 450,000.00	
OP_674972	6/09/2025	Desembolso 9	$ 3,905,800.00				
OP_674973	6/09/2025	Desembolso 10		$ 44,029,440.00			
OP_674974	6/09/2025	Desembolso 11				$ 110,075,000.00	
OP_675649	9/09/2025	Desembolso 12	$ 12,005,800.00				
OP_675650	9/09/2025	Desembolso 13				$ 4,504,500.00	
OP_677980	15/09/2025	Desembolso 14			$ 1,792,965.60		
OP_677996	15/09/2025	Desembolso 15			$ 38,887,125.08		
OP_677997	15/09/2025	Desembolso 16				$ 14,745,000.00	
OP_677984	15/09/2025	Desembolso 17		$ 12,410,677.00			
OP_677992	15/09/2025	Desembolso 18		$ 1,414,920.00			
OP_688224	8/10/2025	Desembolso 19				$ 59,400,000.00	
OP_688225	8/10/2025	Desembolso 20		$ 63,181,121.25			
OP_688227	8/10/2025	Desembolso 21				$ 2,049,300.00	
OP_688229	8/10/2025	Desembolso 22				$ 2,376,000.00	
OP_690640	15/10/2025	Desembolso 23			$ 19,132,874.92		
OP_688230	8/10/2025	Desembolso 24				$ 52,845,250.00	
OP_690641	15/10/2025	Desembolso 25		$ 1,834,932.00			
OP_690642	15/10/2025	Desembolso 26				$ 32,357,250.00	
OP_690644	15/10/2025	Desembolso 27		$ 7,151,695.00			
OP_692322	20/10/2025	Desembolso 28				$ 27,019,732.00	
OP_693189	21/10/2025	Desembolso 29		$ 6,285,500.00			
OP_693487	22/10/2025	Desembolso 30				$ 10,679,500.00	
OP_693495	22/10/2025	Desembolso 31				$ 33,327,687.00	
OP_695837	28/10/2025	Desembolso 32	$ 5,000,000.00				
OP_695844	28/10/2025	Desembolso 33	$ 49,286,411.00				
OP_700728	10/11/2025	Desembolso 34				$ 103,206,724.00	
OP_700732	10/11/2025	Desembolso 35				$ 181,170,000.00	
OP_700734	10/11/2025	Desembolso 36				$ 23,687,775.00	
OP_700738	10/11/2025	Desembolso 37				$ 2,970,000.00	
OP_716235	29/11/2025	Desembolso 38	$ 90,079,176.00				
OP_716232	29/11/2025	Desembolso 39				$ 2,970,000.00	
OP_716235	13/12/2025	Desembolso 40				$ 23,994,600.00	
OP_716232	13/12/2025	Desembolso 41	$ 98,859,478.00				
		ALOR DESEMBOLSAD	$ 259,136,665.00	$ 977,421,102.72	$ 110,612,965.60	$ 712,745,818.00	$ 2,059,916,551.32
		SALDOS	$ 6,342,246.00	$ 200,110,068.68	$ 0.00	$ 20,633,401.00	$ 227,085,715.68

9. REGISTRO FOTOGRAFICO























Panorámica del avance



Panorámica del avance

10. CONCLUSIONES

- La interventoría realizó de manera permanente y oportuna el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico al contrato de obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante los periodos evaluados.
- El proyecto presenta un avance físico progresivo, con ejecución efectiva de actividades preliminares, de conformación del terreno y de construcción estructural del sendero peatonal, evidenciando el paso ordenado de las etapas iniciales hacia actividades de mayor complejidad técnica.
- Las variaciones frente al cronograma registradas en algunos periodos en el mes de noviembre iniciaron afectaciones críticas de la ruta del proyecto y se encuentran sustentadas en condiciones externas, tales como factores climáticos, dificultades en el suministro de materiales locales y condiciones geotécnicas no previstas, debidamente identificadas y controladas.
- El uso de los recursos del anticipo ha sido verificado por la interventoría, evidenciando su destinación a actividades propias del objeto contractual, conforme al plan de inversión aprobado.
- No se han identificado incumplimientos graves de carácter contractual; sin embargo, se han presentado mayores cantidades de obra y condiciones de terreno que requieren seguimiento permanente para su adecuada gestión técnica y presupuestal.

Atentamente,

Boris Nicolás Cassab Barreto
Representante Legal Interventoría

Elaboró: AMBP - Revisó y aprobó: BCB

BITACORA

DE OBRA

"SENDERO PEATONAL-VÍA-

- Centro de La Chorrera a Puerto Vegsan.

Inicio: 05 de Agosto de 2025

"Corregimiento de La Chorrera, Amazonas.

Powered by CamScanner

Obra: 'SENDERO PEATONAL- CENTRO CHORRO- VEGSAN'

Acta de Inicio: 05 de agosto de 2025

Fecha: 06 de Agosto de 2025

CLIMA: Mayo. te Nublado.

Personal: Residente de Obra (1); Topógrafo (1); Comisión Top. (1).

Equipos: Estación Total, GPS; CTS-112R4_marca: CHCNAV, ser: H07540. Bas. Nivel Mecánico de Posición: mod. AT-B4_TOPCON: S. RX7135

7:00 AM Inicio de las actividades preliminares, de Topografía y localización. Se realiza levantamiento del "PLANO TOPOGRAFICO REAL", ésta toma permite realizar los ajustes de diseño; Uso de Eq. GPS: se localizan los Del#1,2 así las Medidas y Niveles. (COTAS)

7:30 AM A partir de los primeros ptos DECA △ y Las placas del IGAC, Col; se instalan los 'potos Fijos con Estacas de 40-50 cm, Hitos y puntos fijos. Se inicia la localización del prime sector referenciando el punto cero (0) en el centro urbano - frente a la planta eléctrica. "Se procesan los primeros (lecturas y CARTERA"

8:00 AM 'Previo': la actividad de bosqueda y corte de varas y estacas.
- Se referencian y ubican en el plano los postes de red eléctrica, los potos de desagues, cajas o elementos de "refl: urbanos".

9:00 AM
- Se evidencia la localización de la placa del IGAC = GPS 01; con fecha de Octubre de 2023, GEOINGLOBES.SAS: 0, empotrada en placa de cemento; en KO +185, Norte de la vía.

10:00 AM
- Se localiza el Delta △1 en, N: 9841045.90, E: 746146.85 y Z: 418.000. △ Del 2, N: 9841082.12; E: 746053,70; Z: 421,959.
- Se localizan los Postes en: KO +15; +16; +146, +76, +694, KO +134; +165; +234, +272; +310, +374; +404; +431; +460; +502

Ub. Postes 50 cm, Estacas: Potos en: KO + 0,0; + 96; +1.195; + 272, +258, +3 485 + 420; + 464;

15:00 H Avance y localización de Deltas 3 - , Hitos KM

- De acuerdo con la toma y hallazgo de Datos, el Topógrafo observa y recomienda ajustar los diseños a la "topo REAL".
- Se detecta en sitio que dos postes en KO + 76 y KO + 502 están dentro del área aferente de la vía (geometría).

16:00
- Se ubican las boca calles del primer tramo.

Powered by CamScanner

17:00	La comisión Topografía en sitio realiza la Toma y localiza
18:00	sobre el perfil de diseño y los puntos altos, bajos y cambios de pendiente. "La geometria debe ajustarse al terreno".

firmas: × Res de Obra × Topógrafo × Res Interventoria
V.Bo. Ar. OSCAR CANO.

Fecha: 07 de Agosto de 2025
PERSONAL: Topografo (1). Comisión Topografica (1);
Equipos: Estación Total

7:00 AM - 9:00 AM	Actividad en sitio, Toma de Levantamiento topográfico, Inicio de actividades con CLIMA "Mayormente Nublado" Se localizan puntos de inicio en planta segun el diseño geometrico
11:00 AM	Levantamiento Topográfico Inicial de las medidas de planos y niveles de la geometria. 'Levantamiento de ajuste'
2:00 pm	Se localizan los puntos geometricos de diseño y se organizan los niveles, según se requiera menos material de relleno y conformación de suelo y rasante.
5:00 pm	Se instalan los puntos DELTA & 3, 4 y 5. El levantamiento topográfico, obliga a realizar unos pequeños ajustes de implantación. Desplazando entre 10 cm - 15 cm para respetar la existencia de postes y pozos.

- Se localizan las boca-calles existentes, asi como las estructuras de antejardin o fachadas - Paramentos - en el plano se suministra el intorno de, estacas (cant.: 50 un) en obra.
- Se inspecciona que la existencia y ubicación los postes de la energia, donde en KO + 76 obliga a un pequeño quiebre en la geometria.
- Se localizan desagues principales y puntos de nivel y pendiente
- Se localiza con la inspección en cada boca-calle, un (1) pozo de alcantarillado, circulares y diametro = 60 cm.

Powered by CamScanner

Fecha: Del viernes 08 de agosto 2025 al domingo 10 de agosto 2025

Clima: Nublado Lluvioso: T° 22°C. (31°

Personal: Residente de obra (1), Topógrafo (2), Comisión Topo (1),

Equipos: Estación Total GPS-CTS-112R4. Nivel Mecánico de Pe. AT34 Topcon.

Actividad:

7:00 Am Se toman y levantan medidas y niveles de los puntos de arranque en KØ+0; avanzando a KØ+360. o"Se comparan líneas y topografía real.

oSe realiza la actividad de Levantamiento topográfico avanzando sobre la abscisa KØ+540 a 700 localizando un puente de Madera.

9:00 Am o'Entre las KØ+629 y 650 se genera un corte, empate del puente.

o Se ubican los Delta # 7, 8, 9, 10 y 11.

o En KØ+560 se localiza un tanque en concreto. D = 3×4×2 = 24 m³ con tapa. Parte del sistema de agua potable.

11:00 Am Se levantan la medidas y niveles con precisión, realizando la toma de cartera" oEn DEL Δ10, KØ+574: Boca Calle en 'Y'.


Se localiza una segunda (2a) placa del IGAC, Referenciada por un mojon de concreto. a la altura del Delta Δ13 Diesiseis. a ±50 ML hacia el sur de la via; cerca de la base del Monumento en Concreto.

Se realiza el levantamiento en la zona más alta del trazado, ubicando con precisión y ajuste el trayecto de vía que se deriva y comunica el acceso del Colegio Internado, sobre Ab. KØ+860.

*Se detectan entre Ab KØ+640 a 732, Mayores volúmenes de suelo y posible excavacion en talud. El suelo presenta una abundante capa vegetal, con pastos, arbustos y raices.

En KØ+260 y KØ+280, se evidencia que existen zanjas de drenajes de aguas lluvias y algunos fallos o grietas por escorrentia de agua.

'Se destaca en el perfil de via en KØ+230 - 260 que el trazado vial se encuentra más o menos 1,50 Mt por debajo de la calzada y su paramento a 4,00 ML



oLa topografia del area de suelo de sustentacion en KØ+280 se Reduce,

oSe encuentran dos cajas de paso en concreto pobre. y Tuberia sanitaria PVC-corrugada @6". a 10 cm. de prof. "La existencia de tales tuberias y desagues condiciona el área disponible de suelo.

× Res de Obra × Res. Interventoria × Insp. Interv

OSCAR RAMOS

Powered by CamScanner

Fecha: Sábado 09 de Agosto de 2025

Personal: Topógrafo (1); Comisión Topo (1); Residente de obra (1)
Estacion Total.

6:00 AM
7:00 AM
Se inicia actividad sobre las abscisas Ko + 800, 840; Donde se ubica el punto de intersección de las vias que conducen al colegio Internado y hacia las veredas San Francisco y Santa María, (otros)

Jornada AM
"La Topografia en el sector de Ko + 1+030 - Ko+1+040, la ubicación de una cancha de futbol a una distancia de ±50 m - DELTA Δ 18.2:459.45
Se encuentra en la topografia de la abscisa Ko +940, que los suelos muestran una gruesa capa vegetal antes de encontrar suelo firme

8:00 AM
-9:00 AM
'Se reporta que la conformación geológica del lugar, difiere del diagnostico o por lo menos es en mayor proporción la cantidad de arena (lavada) - depositada en el área de la via; producto de movimientos de suelo y lluvias fuertes 'se encuentra una gran erosión' y fallos de terreno. 'En el sector la capa vegetal y d = espesor del DESCAPOTE y EXCAVACIÓN. ¡Revisar!

10:00 AM
Se reporta la reunión con la comunidad de capitanía, actuando como proveedor del constructor y en gestión de venta-compra Negosiación (de compra) por metro cúbico (m^3) de material de río,
•Se encuentra la oferta de: a) Arena blanca - amarilla - ro
•Se encuentra la oferta de grawilla d = 1/2" - 3/4", 1/4 - 1", 2"
. Asisten acompañados del gestor social; de la coperación de la cancha, y como anfitriones: el cacique o lider el Sr Angel; Todos los

Jornada PM
asistentes y asociados de la comunidad, padres y madres de familia; los representantes profesionales de VIETTA - constructora de ejecución de la obra." Tomando veceria y acuerdo entre las partes, director David Rozo; Topografo, Hugo Sancha, y todos los interesados, el suministro del material de Rio,

2:00 PM
"Incluyendo la extracción y deposito en la playa de la comunidad respectiva sobre el Igará - Paraná.
"Se concertan allí un trato verbal donde la constructora VIETTA hace una oferta económica final según lo conversado en el sitio con los presentes -: V. B: OSCAR CANOS

Firmas:

× Residente de Obra.

× Res. Interventoria.

Fecha: Lunes 11 de agosto de 2025.

personal: Residente de obra (1); Topógrafo (1); Comisión (1).

Equipos: Estación total.

Actividad:

7:00 - 9:00 am Se instalan los puntos de Levantamiento topográfico en planta y niveles. Inst DELTA'S Δ 11; 12, 13, 14. 'Se Marca Con Estación #2 La Topografía del Lugar podría describirse entre KO+850 y KO+950 como entre Zanjones. Serpenteando entre montículos de tierras y arenitas, cubiertas de vegetación, pastos, palmas, y algunos ogoajaleo, donde la capa de arena suelta y humos es mayor.
La toma de cartera precisa medidas de zonas bajas y referencia la línea encorte de diseño. 'Se evalúan volúmenes de movimiento.

11:00 AM ○ Se localiza y ubica la boca calle al colegio Internado; KO+1+140
'Se localizan los Deltas Δ 15, 16, 17, 18, 'En el avance se detectan algunos arbustos y raíces que superan la cota dentro del área.

2:00 PM Se determinara que tipo de extracción debe desarrollarse: KO+1+200
'Se hace constar de la gestión y compra de los materiales locales.
*El residente de obra cotita en el sitio todos los materiales existentes ...
> Se realizan en campo las tomas demuestras de suelo profundo realizado por una comisión especial del laboratorio, de nombre de la ciudad de Leticia, amazonas

× Res. de Obra

× Res Interventoría

× V.o Bo. Arq. OSCAR CANOS

Fecha: Martes 12 de agosto de 2025.

Personal: Residente de Obra (1); Topógrafo (1); comisión (1), Inspector social (1)

Reporte: > El personal profesional y técnico se ha instalado y en comisión actua representando al Contratista- Ejecutor VIETTA. sas, ha desarrollado una primera Etapa de Topografía. Esta se dispone y viaja a los consultorios locales de VIETTA sas. en Leticia, Am.

Powered by CamScanner

Fecha: Miercoles 12 al Mt 26 de agosto de 2025.

Personal: Profesionales de Ingenieria Vietta.(3); Topografo(1). Res Obra (1); tecnicos Laboratoristas (2)

Actividad: "Las actividades permanecen en Stand-by, El personal se desplaza a realizar las compras, y Logistica de entrega de Materiales e insumos que no se encuentran en el Corregimiento y su Comercio.

*"Observación" Las compras de los siguientes materiales serán realizadas en las localidades de la Chorrera, seran: 1) Arena amarilla, 2) Gravilla -= 3/4", en Mayor proporción, 3) Maderas varias.

*De igual manera gran parte del personal convocado es local, aún su Mano de Obra no Calificada. Sin embargo el constructor suministra personal de mayor calificación adicionalmente.

· Los materiales principales que se deben suministrar desde la Ciudad de Leticia, Tabatinga son: 1) Cemento, 2) Aceros 3) Los minerales, rojo y cello, el desmoldante, y otros insumos. especiales o para acabados. 4) Insumos: Moldes plasticos, etc. 5) Materiales para cellos y juntas, 6) Los equipos de construccion, Maquinarias, Plantas, electrica, 7) Herramientas, 8) Epp, etc.

* Se evidencia la complejidad y dificultad para adquirir materiales basicos de Ferreteria e insumos menores (no existen). Por tal se requiere realizar las compras, fletes y tresiegos para acceso y suministro de gran porcentaje de los materiales,

· Se generan las compras de los equipos y Máquinas de Mezcla, las herramientas y equipos entre otros insumos. para la obra, y se contrata el flete de transporte en Barcos.

· Se envian por barco y en diferentes fletes, segun la capacidad de carga.

x Resi de Obra

x Res. de Interventoria

x Topógrafo

OSCAR CANOS. 80.452.805
x Inspector Interventoria

Powered by CamScanner

Miercoles 27 de Agosto de 2025

Clima: Mayormente nublado.

Personal: Residente de Obra(1); Topógrafo(1), Comisión Topo(1); Res. Interventoria(1).

Equipos: Estación Total GPS -
Prisma "Certificado Bogotá y Medellín."

Actividad
7:00 am
8:00 am
Jornada AM
10:00
11:00
Jornada PM
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm

'Se instala nuevamente la Comisión Topográfica en cabeza del Topógrafo, Landfugo Sanches, y los residentes de obra.
'La información de Cartera Topográfica REAL y ajustada, se se utiliza en campo para ejecutar la Actividad de Replanteo.
La Localización y Replanteo se fijan y anclan a los DELTAS Á
- Actividad de Búsqueda y corte-suministro de estacas de madera para los puntos y Abscisas. / Niveles = 1 x 50 cm.
- Habiendo suministrado las partes prefabricadas, Se Inicia La Instalación de la Valla pública de Información! 'Esta se soporta sobre tres torres (cerchas) Metálicas, empotrado al suelo. Se instala el Baner sobre la lámina metálica y se ubica en la estructura a 4,00 m de altura, Junto al despacho del Corregidor.
- Se realiza la búsqueda, ubicación y cotización del arriendo de áreas para bodegas, cubierta y protegida de la humedad, para depósito y seguridad. 'Se espera la llegada del material.
- Se confirman despachos desde Leticia. (cemento y acero)

Firmas
x Residente de obra
x Res. de Interventoria

Fecha: Jueves 28 al Sabado 30 de agosto
Personal: Residente de obra(1); Topógrafo(1); Comisión (1)
Equipos: Estación Total GPS -

Actividad:
- Se realiza la actividad de búsqueda y corte de estacas de madera, para su uso como puntos de referencia y Nivel.
La cantidad de estacas es = 1 / mL. = 1840 mL = 1840 un.
Se suministran en sitio los materiales e insumos iniciales suficientes para el inicio de obra y replanteo de la geometria y diseño, a cargo de los residentes de obra.

Powered by CamScanner

9:00a "Aunque la interventoria no reconoce el acopio de materiales como avance de obra, se realizan labores de construcción de cajones de madera y hojas de palma, para el acopio temporal de arena, en áreas cercanas al punto de desembarque.

* • Los proveedores de arena amplian su volúmen de oferta,
• Se reporta la realización de algunas reuniones locales en sectores donde se convoca a la acción comunal. Se realiza la socialización del proyecto; su programa y presupuesto. Exponiendo las caracteristicas y datos principales del proyecto Se resuelven dudas y hacen observaciones.
Es de anotar que las comunidades que han dado mayor atención al proyecto son las más cercanas a los puestos y áreas beneficiadas, siendo Capitania y Vagsan. De alli los caracas o lideres y un grupo de hombres trabajan ya en la explotación y acopio de volumenes de arena amarilla.
• Se instaura una comisión que representa a la comunidad para efectos de los tratos y firmas de pagos y acuerdos.

Firmas

× Res de Obra	× Res. Interventoria.
× V.B. Topógrafo	× VoBo. Insp. Interventoria

Fecha: Lunes 01 de Septiembre de 2025
Personal. Residente Obra; Res. Interventoria, Topografo(1), comisión(1)
- Personal mano de obra - ayudantes preliminares (3).
Equipos: Estación Total GPS. × Nivel Méc.
> Se adelanta la actividad de despeje y descapote de las áreas de trabajo. Se ejecuta roseria y limpieza a mano y con machete, del follaje y arbustos que se encuentran dentro del área de via. En ancho de 9,00 mts.
• Se ubican y aseguran las marcas y estacones de los Deltas & Iniciales. Se marcan las áreas a despejar

- A partir del Delta Δ10, se encuentra el límite del casco urbano (a ±500 mt) desde allí se intensifica el trabajo de despeje y limpieza de la vegetación no necesaria.
- La comisión topográfica replantea las medidas y niveles de Implantación, sobre la topografía. Primero del área central del Corregimiento." Para estas actividades se ha visitado la oficina del corregidor y Afitce, para solicitar su concentimiento y apoyo en la logística y labor. Así, se adelanta la gestión y coordinación en sitio, para determinar los espacios necesarios gestionando arriendo en casas de la comunidad.
- El Sr Corregidor apoya con la disposición de algunos espacios posibles para bodegas. Lugares que suman más de 50 m^2.
- Se llegan a algunos acuerdos para disponer de los espacios para acopio y seguridad de materiales e insumos. para lo cual se espera el acceso por río y barco del suministro. que se estima para las próximas fecha hábiles según trasiego.

Powered by CamScanner

	03 DE SEPTIEMBRE 2025
CLIMA	Parcialmente nublado
PERSONAL	Topográfo, Director de la empresa constructora Ingeniero David Rozo, maestro, residente interventoria, 1 ayudante)
ACTIVIDADES	charla de socialización informativa Recorrido técnico e inspección total de la obra, recibiendo las directrices del director de la obra Ing. David Rozo

* Res. de obra

* Res. Interventoria.

* V.B. Topografo

VoBo. Insp. Interventoria

04 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Topografo, maestro de obra, interventor residente, 4 ayudantes, ingeniero residente

ACTIVIDADES: Se recibio el suministro del material en el muelle hacia la bodega, drooomper, cemento, herramental.
Reunion con la comunidad de VEGSAN

* Res. de obra

* Res. Interventoria.

* V.B. Topografo.

* V.B. Insp. interventoria.

Powered by CamScanner

	05 DE SEPTIEMBRE 2025
CLIMA	Soleado
PERSONAL	Topografo, maestro de obra, residente de interventoria, 4 ayudantes Ingeniero residente
MAQUINARIA	
ACTIVIDADES	Se recibió el material en la embarcación y se subio a la bodega

Res. dr obra.

Res. Interventoria

V.B Topografo

V.B. Insp. Interventoria.

Powered by CamScanner

06 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SÁBADO

CLIMA: Soleado - lluvia intensa 3:20 a 3:40 con brisa de lluvia hasta las 4:20 p.m.

PERSONAL: Topografo, maestro de obra, residente de interventoria, 12 ayudantes, Ingeniero residente

MAQUINARIA: Dropper, rancas

ACTIVIDADES: Trasiego de materiales de acero y cemento desde las embarcaciones hacia las bodegas, acopio de varas para encerramiento de K+0 - K+80 Replanteo topográfico

* Res. de obra:

* Res. Interventoria,

* V.B. Topografo

JBO Ocaños

* V.B. Insp. interventoria.

Powered by CamScanner

02 DE SEPTIEMBRE DE 2023 = DOMINGO

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Topografo, maestro de obra, residente de interventoria, 16 ayudantes, Ingeniero residente

MAQUINARIA: Drocmpux, 2 ranas

ACTIVIDADES: Demolicion de placa existente de 10 centimetros de espesor, retiro de escombros, y acopio para estabilizar el camino.
Adecuacion de la ruta para que la drocmpux transitara sin problemas
Replanteo topografico de cotas y alineamiento de Kt00 - Kt80
Excavación manual de Kt0 - kt30

Res. de obra.

Res. Interventoria.

V.B. Topografo

V.B. Insp. interventoria.

	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CLIMA	Parcialmente nublado y soleado
PERSONAL	Topografo, maestro de obra, residente de interventoria, 11 ayudantes, Ingeniero residente
MAQUINARIA	Drompper, rana, trompo
ACTIVIDADES	Trasiego de material de la embarcación a la bodega con el personal excavación, nivelacion y perfilación del terreno Instalación de arena cemento de 10 centimetros de espesor desde K+0 - K+60 Demolición de anden K+90 - K+140, los escombros se utilizo para estabilizar el camino Excavación manual del K+30 - K+90

* Res. de obra.

* Res. Interventoria

* V.B. Topografo

* V.B. Insp. Interventoria.

Powered by CamScanner

9 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CLIMA: Soleado leve - Nublado de 4:00 a 4:15 p.m

PERSONAL: Topógrafo, maestro de obra, Inspector de obra, residente interventoria 16 ayudantes, ingeniero residente

MAQUINARIA: Dvoamper, trompo, rana

ACTIVIDADES: Instalación de arena-cemento de 10 centimetros de espesor desde K+60 - K+90, nivelación manual, localización y replanteo
Demolición de anden K+140 - K+190 y los escombros se utilizo para estabilizar el camino
Replanteo topografico de cotas y alineamiento desde K+120 - K+180

* Re do obra.

* Res. Interventoria.

* V.B. Topografo

* V.B. Insp. interventoria.

Powered by CamScanner

10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Topógrafo, maestro de obra, inspector de obra, residente de interventoria, 16 ayudantes
Ingeniero residente

MAQUINARIA: Droomper, rana

ACTIVIDADES: Descapote, excavación, conformación del terreno, nivelación manual localización y replanteo desde K+579 - K+627

* Res de Obra

* Res. interventoria.

* V.B. Topografo

* V.B. insp. interventoria.

Powered by CamScanner

	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CLIMA	soleado
PERSONAL	Topógrafo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, 16 ayudantes Ingeniero residente
MAQUINARIA	Droomper, ranas
ACTIVIDADES	Excavación superficial menos de 50 centímetros, corte de talud, nivelación de la rasante Instalación de arena cemento de 10 centímetros de espesor desde K+579 - K+627 Se visito la comunidad de VEGSAN con el fin de verificar la arena que tenían extraída para la obra Entregamos 300 lonas para la gravilla

* Res. de obra.

* Res interventoria.

* V.B. Topografo

* V.B. insp. interventoria.

Powered by CamScanner

	12- SETTIEMBRE DE 2025
CLIMA	Llovizna leve Fuerte lluvia 9:20 - 12:45 p.m
PERSONAL	Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, 18 ayudantes
MAQUINARIA	Droomper, ranas
ACTIVIDADES	Estabilización de la tierra con arena desde K+100 - K+180 Descapote desde el puente K+640 - K+690 Replanteo - Elaboración de 2 puertas para proteger el material en bodega corte de varilla para fleyes

* Res. de obra.

* Res. interventoría.

* V.B. Topografo

* V.B. insp. interventoría.

Powered by CamScanner

13 DE SEPTIEMBRE DE 2025 = SABADO

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, Ingeniero residente

MAQUINARIA: Bbomper, ranas, trompo

ACTIVIDADES:
Demolición de placa existente
Recolección de escombros
Excavación, nivelación manual
Instalación de arena-cemento de 10 centimetros de espesor

* Res. de obra.

* Res. interventoría.

* V.B. Topografo

* V.B. insp. interventoría.

Powered by CamScanner

	14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 = DOMINGO
CLIMA	Soleado
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente Ingeniero residente
MAQUINARIA	
ACTIVIDADES	Se hace excavación desde K+640 - K+690

* Res. de obra.


* Res. interventoría.

* V.B. Topografo

* V.B. insp. interventoría.

Powered by CamScanner

	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CLIMA	Soleado
PERSONAL	Topógrafo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente Ingeniero residente
MAQUINARIA	
ACTIVIDADES	Se realiza excavación Estabilización del terreno con arena
IMPREVISTO	Droomper fuera de servicio

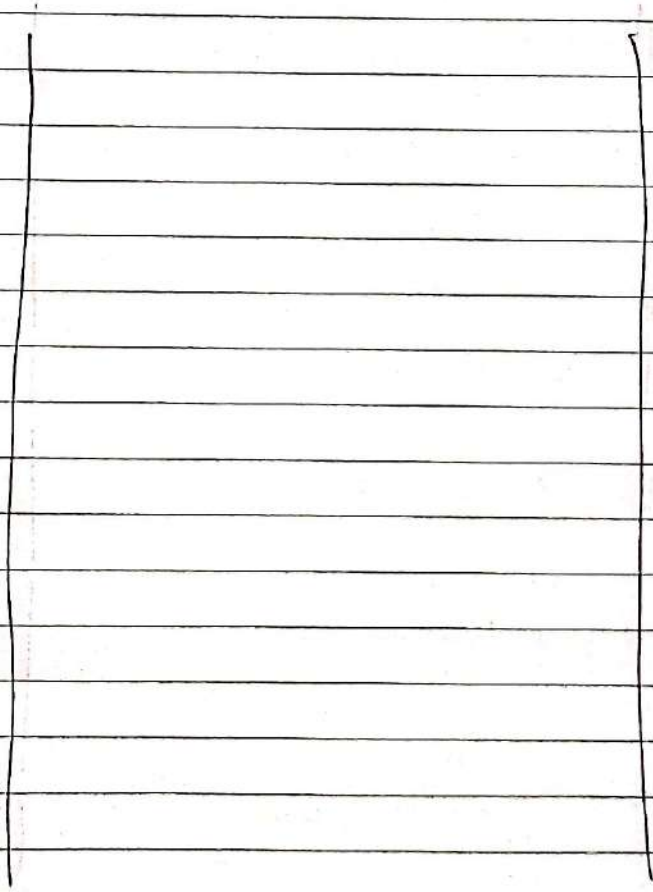

* Res. de obra.

* Res. interventoría.

* V.B. Topografo

* V.B. insp. interventoría.

Powered by CamScanner

	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CLIMA	Soleado, 3:20 fuerte lluvia, 5:00 p.m llovizna
PERSONAL	Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente Ingeniero residente
ACTIVIDADES	Excavación con el fin de darle solución a los manaderos de agua K+640 – K+690
IMPREVISTO	Dromper fuera de servicio por motor de arranque No hay gravilla


* Res. de obra

* Res. interventoria

* V.B. Topografo

* V.B. insp. interventoria.

	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CLIMA	Soleado
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente Ingeniero residente
ACTIVIDADES	Excavación profunda para darle solución a los diferentes nacederos de agua, replanteo topográfico, acopio de material
IMPREVISTO	Droamper fuera de servicio No hay gravilla

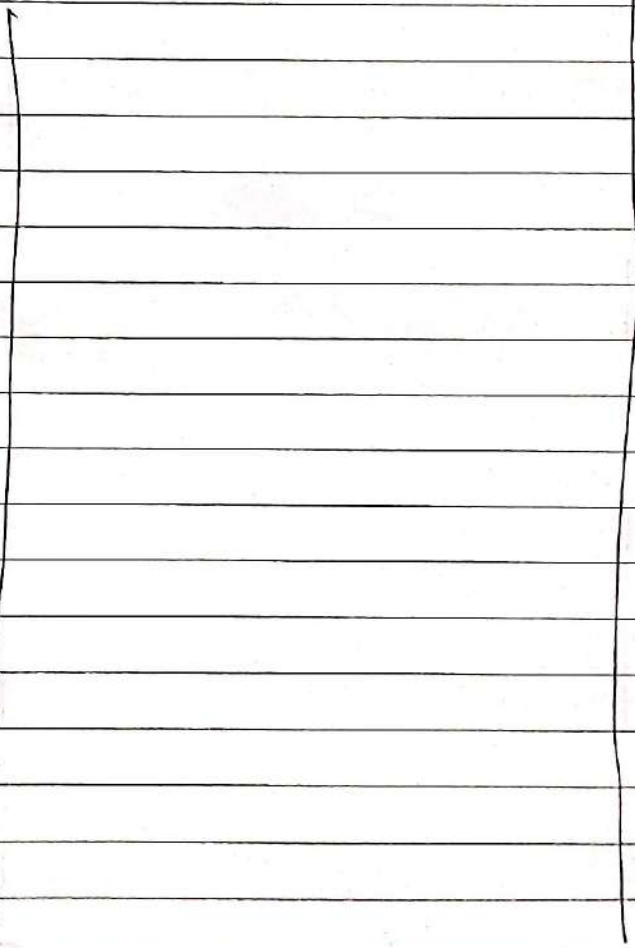

* Res. de obra

* Res. Interventoría

* V.B. Topografo

* V.B. insp. interventoría

	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CLIMA	Soleado
PERSONAL	Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente Ingeniero residente
ACTIVIDADES	Perfilación en K+640 - K+690, conformación del terreno Descarga del material, corte de talud, nivelación de la rasante
IMPREVISTOS	Dromyer fuera de servicio por motor de arranque No hay gravilla

* Rvs. de Obra.

* Rvs. interventoria.

* V.B. Topografo.

* V.B. insp. interventoria.

	19 DE SEPTIEMBRE
CLIMA	Soleado
PERSONAL	Topógrafo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente Ingeniero residente
MAQUINARIA	Rana
ACTIVIDADES	Descargue del material (malla electrosoldada y cemento) - Replanteo topográfico, descapote y excavación - Corte y nivelación de la rasante K+900 - K+1.000
IMPREVISTOS	Dromper fuera de servicio Por factores ambientales y el alto nivel del río, no se permite extraer la gravilla

* Res. de obra.

* Res. interventoría.

* V.B. Topógrafo

* V.B. Insp. interventoría.

Powered by CamScanner

20 DE SEPTIEMBRE DE 2025 = SÁBADO

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente
Ingeniero residente

MAQUINARIA: Rana

ACTIVIDADES: Zarandeo de arena, organización de las bodegas 1, 2 y 3
Descapote desde K+880 - K+990, trasiego de arena de VEGSAM

IMPREVISTO: Drompur fuera de servicio
No hay gravilla por los fenómenos naturales del río

* Res. de obra.

* Res. interventoría

* V.B. Topografo

* V.B. Insp. Interventoría.

	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 = DOMINGO
CLIMA	Soleado
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, Ingeniero residente
MAQUINARIA	Ramas
ACTIVIDADES	Excavado y nivelación del terreno desde K+990 - K+1060
IMPREVISTO	Dromper fuera de servicio No hay grúa por fenómenos naturales

Res. de obra.

Res. interventoría.

V.B. Topografo

V.B. insp. interventoría.

Powered by CamScanner

	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CLIMA	Soleado
PERSONAL	Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, 20 ayudantes, ingeniero residente
MAQUINARIA	Pala
ACTIVIDADES	Descapote, relleno y compactación desde K+910 – K+940 borde derecho Construcción de 3 filtros francés de piedra y geotextil K+630
IMPREVISTO	Dumper fuera de servicio No hay gravilla

* Res. de obra.

* Res. interventoria.

* V.B. Topografo

* V.B. insp. interventoria.

Powered by CamScanner

	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CLIMA	Soleado
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente 23 ayudantes., ingeniero residente
MAQUINARIA	Rana
ACTIVIDADES	Excavación desde K+840 – K+990 Nivelación del terreno
IMPREVISTOS	Droomper fuera de servicio No hay gravilla Rana en regular estado

Res. de obra.

Res. interventoría

V.B. Topografo

V.B. resp. interventoría.

Powered by CamScanner

	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CLIMA	Soleado
PERSONAL	Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, 21 ayudantes, Ingeniero residente
MAQUINARIA	Bagal
ACTIVIDADES	Zarandeo de arena, excavación Kt 1030 - Kt 1.180 Excavación en los fallos naturales desde Kt 880 - Kt 910 Trabajo en la construccion de filtros Kt 630
IMPREVISTO	Droompur, fuera de servicio No hay gravilla

* Res. de obra

* Res. interventoría

* V.B Topografo

* V.B Insp. interventoría

Powered by CamScanner

25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CLIMA	Nublado - lluvias esporádicas
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente 21 ayudantes, ingeniero residente
MAQUINARI	1 rana
ACTIVIDADES	Corte de talud y excavación de terreno Kt1080 - kt 1140 Excavaciones varias, Excavación y conformacion y relleno del suelo en el encuentro con el puente Kt632 Replanteo topográfico con instalación de niveles de referencia con hilos Excavación manual donde detectando fallas profundas con arenas y raices Se cortaron los troncos para hacer fleje, zarandeo de arena
IMPREVISTO	Drenaje fuera de servicio No hay gravilla

Res. de obra

Res. Interventoría.

V.B. Topografo

V.B. Insp. Interventoría

26 DE SEPTIEMBRE

CLIMA: Mayormente nublado 22° C Viento: 6K/h

PERSONAL: Arquitecto - Residente interventoria, Topográfo, Inspector de obra maestro, 19 ayudantes., Residente de obra

MAQUINARIA Volqueta droomper thwales, fuera de servicio, se espera hoy la llegada del respuesto-motor de arranque en el vuelo SATENA

Ranas: se realizo el mantenimiento a las ranas: Valbolina, cauchos, tornillos y ajustes generales

07:00 AM Entrega de Elementos de protección Personal (EPP) como Cascos botas, guantes, camibuso

01:30 AM charla informativa Ambiental, trabajo, salud, sigundad, Orden y aseo de los escombros y residuos

ACTIVIDAD - Maestro, inspector de obra, residente de interventoria, residente de obra, topográfo realizamos recorrido de inspección de medidas y niveles del replanteo topográfico sobre las abscisas K+900 - K+1.180

- Excavación y relleno para mejoramiento del suelo
- Los fallos de los suelos y brotes de agua subterraneo sobre la línea de la vía, se procedio a rellenar con arena y cemento
- Construcción de filtros frances de piedra envuelta en geotextil negro, se corteron varillas de .30 para flejes

IMPREVISTO No tenemos gravilla

* Res. de obra


* Res. interventoria

* V.B. Topografo

* V.B Insp. interventoria.

27 DE SEPTIEMBRE

CLIMA	Soleado
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, un oficial y 20 ayudantes.
MAQUINARIA	Droomper, planta eléctrica, rana, demoledor, bomba sumergible
09:00 AM	Se inicio las labores
ACTIVIDAD	Movimiento de piedras desde K+1.150 - K+1.180 Relleno y estabilización del terreno desde K+620 - K+670 Demolición de placa y excavación desde K+170 - K+190 Se elaboraron filtros
IMPREVISTO	No tenemos gravilla

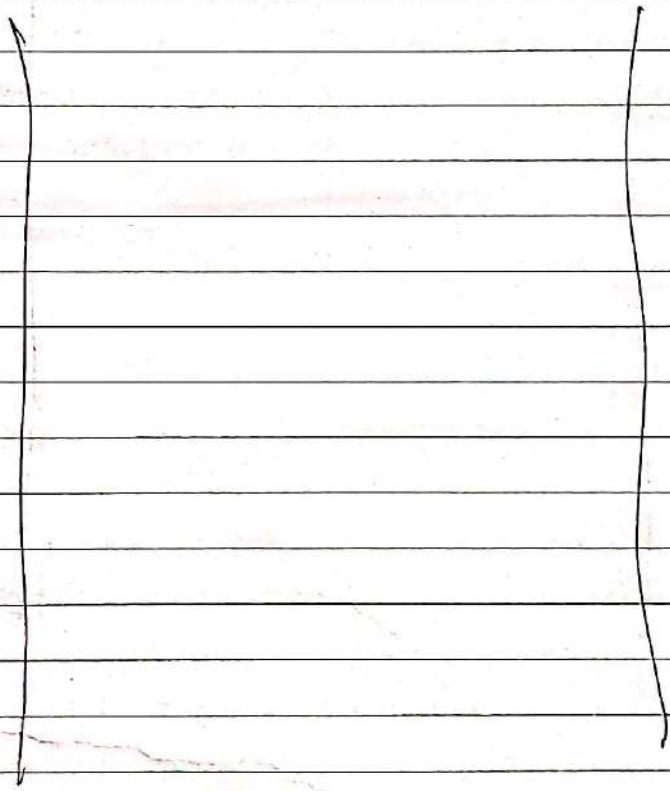

* Res. de Obra.

* Res. Interventoría.

* V.B. Topografo

* V.B. Insp. Interventoría.

Powered by CamScanner

28 DE SEPTIEMBRE

CLIMA	Día soleado – lluvia moderada en la tarde 2:50 p-m
PERSONAL	Topografía, maestro de obra, inspector de obra, un oficial, 10 ayudantes, ingeniero residente
MAQUINARIA	Trompo, rana,
09:00 AM	Inicio de actividades
ACTIVIDADES	Excavación, estabilización del terreno, perfilación, arena cemento K+170 – K+185, se hicieron canastos para los bordillos
IMPREVISTOS	No hay gravilla, esperando el servicio de la comunidad

Ros de obra

Ros. instrumentista

V.B. topografo

V.B. Insp. instrumentista

29 DE SEPTIEMBRE

CLIMA: Nublado - lluvia moderada 13:00-13:30 x 15:00-15:30

PERSONAL: Topografo, maestro de obra, inspector de obra, un oficial, 19 ayudantes Ingeniero residente

MAQUINARIA: Demolebor, Drooper, planta eléctrica, tronsadora

07:00 Inicio de labores en la obra en desarrollo

IMPREVISTOS: ta esenses de gravilla

ACTIVIDADES: Demolición de placa, recolección escombros para mejorar la vía del drooper K+360 - K+370

- Excavación para adecuación de tubería K+616 - K+625 (puente de madera)
- Excavación boca calle
- corte de hierro para flejes
- elaboración de flejes
- Elaboración de canastas para bordillo

Res. de obra

Rsd. interventoría


V.B. Topografo

V.B. OBCANS

V.B. insp. interventoría

30 DE SEPTIEMBRE

CLIMA	Nublado - lluvia fuerte de 1:30 a 2:35 p.m llovió de 3:00 -
PERSONAL	Topógrafo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, oficial, 22 ayudantes
MAQUINARIA	Dragamper, rana, planta eléctrica, trompo, bomba sumergible
ACTIVIDADES	Se instalo aproximadamente 10 centimetros de espesor desde Kt 629 hasta Kt 660.
IMPREVISTOS	No tenemos la gravilla en acopio para trabajar y continuar con el proyecto de los anclajes por fenomeno natural del rio

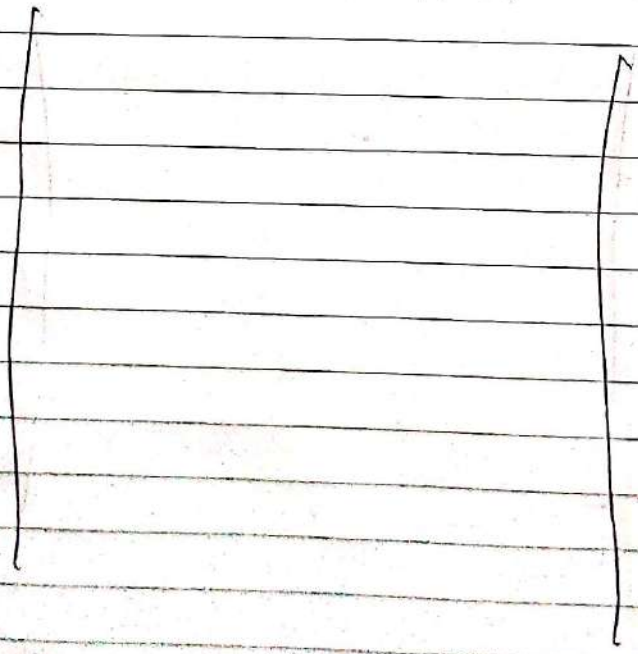

Ing. Resid. de obra

Participantes

Ing. Resid. interventoría

V.B. Topografo

Yolanda Orozco

Ing. V.B. interventoría

01 DE OCTUBRE DE 2025

CLIMA: Soleado - lluvia leve 2:15 -

PERSONAL: Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, oficial, 22 ayudantes

MAQUILLARIA: Droomper, vanas, planta eléctrica, trompo, bomba sumergible, dendedor

ACTIVIDADES: Se instalo arena cemento de 10 centimetros de espesor desde K+660 - K+732
Demolición viga de 5.x.20x.20, 2 pedestales de .80x.20x.20
Demolición de andenes, recolección de escombros y la utilizamos para mejorar la via para el droomper
Excavación K+640 - K+670, figurado de hierro

IMPREVISTOS: No tenemos gravilla, pero ya se han visto el interes de la gente en extraer el material

Res. de obra.

Jan Carlos Cifuentes P
Res. interventoría.

V. B. Topografo

Vobo Oficios
V.B insp. interventoría

	02 DE OCTUBRE DE 2021
CLIMA	Soleado
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 1 oficial, 22 ayudantes
MAQUINARIA	Dromper, rana, cortador de concreto, trompo
ACTIVIDADES	Se realizo la excavación desde K+341 - K+370 Excavación de fallos, relleno y adecuación de canal desde K+290 - K+3.. Se instalo arena cemento desde K+732 - K+773 de 10 centimetros de espesor
IMPREVISTOS	No hay gravilla, pero ya se esta solucionando esta situación Cortador de concreto en mal estado


Ing. Residente de obra

Ing. Residente interventoría

V.B. topógrafo

V.B. insp. interventoría

	03-10-2025
CLIMA:	Nublado-soleado
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente ingeniero residente, 1 oficial, 21 ayudantes, 3 vigilantes
MAQUINARIA	Droomper, rana,
ACTIVIDADES	Elaboración de canastas para los bordillos Nivelación y compactación K+310 - K+320 Nivelación y compactación K+340 - K+370 Descapote y excavación: K+460 - K+475 Nivelación y compactación K+773-
IMPREVISTOS	Las ranas en regular estado por falta de polea o cuerda le corta concreto en reunión por estar fuera de servicio

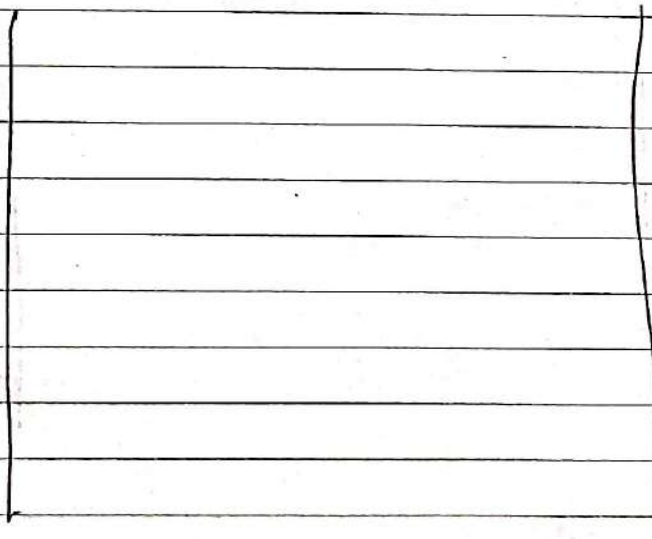

Rvs. de obra.

Dantoto. Cifuentes P

Ros. interventoría


V.B. Topografo

Jobo Canal

V.B. Insp. interventoría

04 DE OCTUBRE DE 2025 = SÁBADO

CLIMA	Llovizna - soleado
PERSONAL	Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 1 oficial, 1 paletero, 18 ayudantes y 3 vigilantes
MAQUINARIA	Drocompac, rana, trompo
ACTIVIDADES	Se instalo arena cemento de 10 centimetros de espesor desde KO+773 - KO+843, se utilizaron 43 bultos de cemento Figurado y armado de hierro

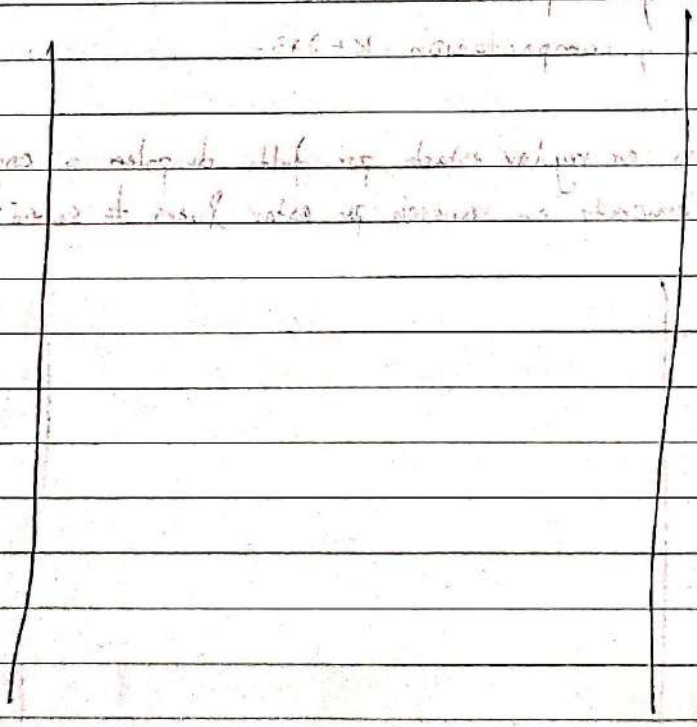

* Res. de obra

* Resi. interventoria

* V.B. Topografo

* V.B. insp. interventoria


05 DE OCTUBRE DE 2025 = DOMINGO

CLIMA Soleado

PERSONAL Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 6 ayudantes y 3 vigilantes

MAQUINARIA

ACTIVIDADES Figurado y armado de hierros
Hidratación a la arena cemento K0+773 - K0+843

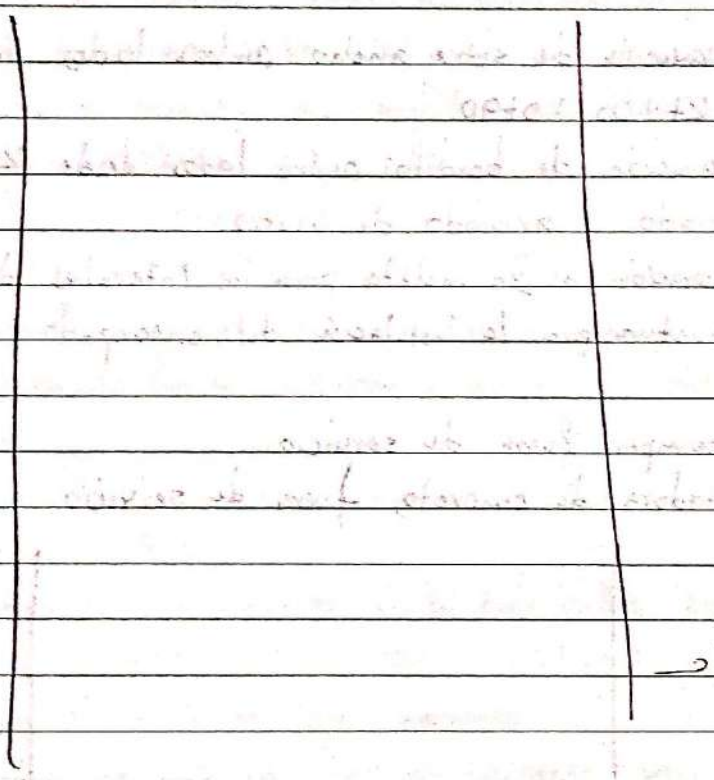

Res. de obra.

Cristobal C. Fuentes P
Res. interventoria.

V.B. topografo

V.B. Ramos
V.B. insp. interventoria

06 DE OCTUBRE DE 2025

CLIMA	Lluvia - soleado. llovizna de 1:30 - 1:50 p.m
PERSONAL	Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente. 1 oficial, 1 paletero, 18 Ayudantes y 3 vigilantes
MAQUINARIA	Droomper, transadora
ACTIVIDADES	Excavación de sobre ancho ambos lados desde K0+00 a K1+00 - K0+90 Excavación de bordillos ambos lados desde K0+00 - K0+K0+60 Figurado y armado de hierro Elaboración de formaleta para los laterales de los andenes Estructura para la instalación del encarpado
IMPREVISTOS	Droomper fuera de servicio Cortadora de concreto, fuera de servicio

Res. de Obra

Jan Carlos Cifuentes P
Res. Interventoria

V.B. Topografo

Jose Osorio
V.B. Insp. Interventoria.

	07 DE OCTUBRE DE 2025
CLIMA	Soleado
PERSONAL	Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 1 oficial, 1 paletera, 21 ayudantes
MAQUINARIA	Transobra, rana y trompo
ACTIVIDADES	- Excavación manual sobre ancho de .60 de ambos lados desde K0+90 a K0+185 - Instalación de canastas de bordillo ambos lados desde K0+00 a K0+70 - Instalación de malla electrosoldada del K0+00 a K0+70 - Figurado y armado de hierro (Elaboración de canastas para bordillo, corte de hierro y alambre negro) - Elaboración de formaletas para asegurar las laterales de los andenes - Instalación de formaletas para fundir la placa desde K0+00 a K0+70 - Se instalo avena cemento en la boca calles entre K0+90 a K0+100, K0+190 a K0+200 y K0+140 a K0+150, se utilizaron 5 bultos de cemento - Elaboración de las paredites en concreto para levantar las mallas electrosoldadas, se utilizaron 2 bultos de cemento - Excavación manual de bordillos del K0+60 a K0+90
IMPREVISTOS	Droompen, fuera de servicio
	Visita la obra, la Arquitecta Alejandra de la gobernación departamento de amazonas
	Jan Carlos Cifuentes P Res. Obra Res. Interventoría
	V.B. Topografo V.B. Insp. Interventoría

	08 DE OCTUBRE DE 2025
CLIMA	Soleado
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 1 oficial, 1 paletera, 19 ayudantes
MAQUINARIA	Trompo
ACTIVIDADES	Excavación manual de bordillos, ambos lados de: K0+90 a K0+85 Instalación de panelitas en concreto desde K0+00 a K0+70 Figurado y armado de hierro Celaboración de canastas para bordillos Elaboración de las panelitas en concreto para levantar las mallas electrosoldada, se utilizaron 2 bultos de cemento
IMPREVISTOS	Dromper, fuera de servicio

Res. de Obra

Res. interventoría

V.B. Topografo

V.B. Insp. interventoría

09 DE OCTUBRE DE 2025

CLIMA	Nublado, llovizna
PERSONAL	Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 1 oficial, 1 paletera, 20 ayudantes
MAQUINARIA	2 trompos, vibrador de concreto
ACTIVIDADES	Instalación en concreto de 3.000 PSI de placa y bordillos desde K0+00 a K0+66, se utilizaron 163 bultos de cemento Acabado y estampado con mineral rojo con desmoldante, un cuñete, desde K0+00 a K0+66, se utilizaron 16 bolsas de mineral rojo Figurado y armado de hierro Celaboración de canastas para bordillo Elaboración de las panelitas en concreto para levantar las mallas electrosoldadas, se utilizaron 2 bultos de cemento Trasiego de la gravilla de capitanía hasta el sitio de trabajo
IMPREVISTOS	Drooper, fuera de servicio

Res. de obra

Res. interventoría

V.B Topografo

V.B. Insp. interventoría

10 DE OCTUBRE DE 2025

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 1 oficial, 1 paletera, 22 ayudantes.

MAQUINARIA: Cortadora de concreto, trompo

ACTIVIDADES:
- Instalación de canastas de bordillo, ambos lados, desde K0+66 a K0+140
- Instalación de malla electrosoldada desde K0+66 a K0+140
- Figurado y armado de hierro Celaboración de canastas para bordillos
- Trasiego de la gravilla de captamá hasta la obra o sitio de trabajo
- Realización de los cortes en la placa de las dilataciones de los andenes cada 2 metros, desde K0+00 a K0+66
- Instalación de platinas para fundir las cunetas, lado derecho desde K0+00 a K0+46 y lado izquierdo desde K0+00 a K0+12
- Instalación de las formaletas en madera desde K0+66 a K0+140.

IMPREVISTOS: Droomper, fuera de servicio

* Res. de obra

* Res. interventoría

* V.B. Topografo

* V.B insp. interventoría

	11 DE OCTUBRE DE 2025
CLIMA	Llovizna - Soleado
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 1 oficial, 1 paleteva, 22 ayudantes
MAQUINARIA	2 Trompos, vibrador de concreto
ACTIVIDADES	Instalación en concreto de 3.000 PSI de placa y bordillos desde K0+66 a K0+139.40, se utilizaron 168 bultos de cemento - Acabado y estampado con mineral rojo con desmoldante 1 cuñete y medio, desde K0+66 a K0+139.40, se utilizaron 18.5 bolsas de mineral rojo - Figurado y armado de hierro (elaboración de canastas para bordillo) - Elaboración de panelitas en concreto para levantar las mallas eletrosoldada, se utilizaron 2 bultos de cemento - Trasiego de la gravilla de capitanía hasta el sitio de trabajo u obra
IMPREVISTOS	Dumper, fuera de servicio

Ra. de obra.

Ra. interventoría.

V.B. topografo.

V.B. insp. interventoría

	12 DE OCTUBRE 2025 DOMINGO
CLIMA	Soleado
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 11 ayudantes
MAQUINARIA	cortadora de concreto
ACTIVIDADES	Realización de los cortes en la placa de las dilataciones de los andenes cada 2 metros, desde K0+66 a K0+139.40 Se quitaron las formaletas en madera de las placas de los andenes y limpieza de las mismas desde K0+66 a K0+139.40
IMPREVISTO	Dvoomper; fuera de servicio

Res. de obra.

Carlos Cifuentes P
Res interventoría.

V.B. Topografo

Jaime Orozco
V.B. Insp. interventoría.

	13 DE OCTUBRE DE 2025
CLIMA	Lluvia, llovizna, soleado
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, oficial, paletera, 22 ayudantes
MAQUINARIA	Trompos
ACTIVIDADES	- Excavación de cuneta, ambos lados desde K0+00 a K0+66 - Instalación de concreto de 3000 PSI en las cunetas, ambos lados, derecho 18 e izquierdo 16 unidades, se utilizaron 24 bultos y medio de cemento. - Instalación de malla electrosoldada para la fundición de las cunetas, ambos lados, derecho 18 e izquierdo 16 unidades - Instalación de las formaletas en madera con aceite quemado para la fundición de las cunetas, ambos lados, derecho 18 e izquierdo 16 unidades - Figurado y armado de hierro (elaboración de canastas para bordillos) - Trasiego de la gravilla y arena de capitanía hasta el sitio de trabajo - Instalación de las platinas, ambos lados, derecho 72 e izquierdo 64 - Elaboración de las panelitas en concreto para levantar la malla electrosoldada, se utilizo medio bolto de cemento
IMPREVISTOS	Droomper, fuera de servicio

Res. de obra.

Carlos C. Fuentes P
Res. interventoría

V.B. Topografo

V.B. insp. interventoría

Powered by CamScanner

	14 DE OCTUBRE DE 2025
CLIMA	Nublado-soleado-lluvia de 3:11 a 3:40 p.m
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 1 oficial, una paletera, 22 ayudantes
MAQUINARIA	Trompos, vibrador de concreto
ACTIVIDADES	Instalación de canastas de bordillos, ambos lados desde K0+139.40 a K0+170 - Instalación de malla electrosoldada desde K0+139.40 a K0+170 - Instalación de concreto de 3000 PSI en las cunetas, ambos lados, derecho 12 e izquierda 15 unidades, se utilizaron 22 bultos de cemento - Instalación de concreto de 3000 PSI de boca calle ambos lados del K0+00 a K0+02 - Instalación de malla electrosoldada para la fundición de cuneta, ambos lados, derecho 12 e izquierda 15 unidades - Instalación de las formaletas de madera con aceite quemado para la fundición de las cunetas, ambos lados, derecho 14 e izquierda 15 unidades - Figurado y armado de hierro (elaboración de canastas para bordillo - Trasiego de la gravilla de capitanía hasta el sitio de trabajo - Instalación de las platinas, ambos lados, derecho 27 e izquierda 37
IMPREVISTOS	Droompe, fuera de servicio

* Res. de obra

Juan Carlos Cifuentes P

* Res. interventoría

* V.B. Topografo

* V.B. Insp. interventoría

	15 DE OCTUBRE DE 2025
CLIMA	Soleado
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 1 oficial, 1 paletera, 22 ayudantes
MAQUINARIA	Trompo
ACTIVIDADES	- Instalación de canastas de bordillos, ambos lados desde K0+190 a K0+190 - Instalación de malla electrosoldada desde K0+170 a K0+182 - Instalación de concreto de 3.000 PSI en las cunetas, ambos lados, derecho 10 e izquierda 12 unidades, se utilizaron 21 bultos de cemento - Instalación de concreto de 3000 PSI de boca calle del K0+68 a K0+70 - Instalación de malla electrosoldada para fundición de cuneta, ambos lados desde K0+66 a K0+140 - Instalación de las formaletas con aceite quemado para la fundición de las cunetas, ambos lados desde K0+66 a K0+140 - Trasiego de la gravilla de capitanía hasta el sitio de trabajo - Instalación de arena cemento en las cunetas desde K0+66 a K0+140, se utilizó 5 bultos de cemento
IMPREVISTOS	Dumper, fuera de servicio

Juan Carlos Cifuentes P

Res. de obra. | Res. interventoría.

V.B. topografo | V.B. insp. - interventoría.

16 DE OCTUBRE DE 2025

CLIMA	Soleado, lluvia de 11:12 a 12:30 y de 1:30 a 4:55 pm
PERSONAL	Topógrafo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 1 oficial, 1 paletera, 22 ayudantes
MAQUINARIA	Trompos, vibrador de concreto
ACTIVIDADES	Relleno de bordillos de las cunetas, ambos lados desde Kot 00 a Kot 66 - Instalación en concreto de 3000 PSI de placa y bordillo desde Kot 140 a Kot 170, se utilizaron 67 bultos de cemento - Acabado y estampado con mineral rojo con desmoldante, un cuñate, desde Kot 140 a Kot 170, se utilizaron 8 bolsas de mineral rojo - Trasiego de la gravilla de capitanía hasta el sitio de trabajo - Figurado y armado de hierro (corte y elaboración de pleges) - Desencofrado de las cunetas, ambos lados, derecho 10 e izquierda 12 unidades
IMPREVISTOS	Dragomper, fuera de servicio

* Res. de obra.

Jan Carlos Cifuentes P

* Res. interventoría.

* V.B. Topografo

* V.B. insp. interventoría.

17 DE OCTUBRE DE 2025

CLIMA	Nublado, llovizna desde la 1:30 a 2:30 pm
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 1 oficial, 1 paletera
MAQUINARIA	Trompos, cortador de concreto
ACTIVIDADES	a) Instalación de concreto de 3000 PSI en las cunetas, ambos lados, derecha 13 e izquierda 12 unidades, se utilizó 21 bultos de cemento b) Instalación de platinas desde Kot140 a Kot 170 c) Excavación de cuneta, ambos lados desde Kot 140 a Kot 170 d) Instalación de arena cemento en las cunetas, desde Kot 140 a Kot 170 e) Trasiego de la gravilla de capitanía hasta el sitio de trabajo f) Figurado y armado de hierro (corte y elaboración de fleyes) g) Realización de los cortes en la placa de las dilataciones en los andenes, desde Kot 140 a Kot 170
INTERVISTOS	Droomper, fuera de servicio

* Res. de obra.

* Res. interventoría.

* V.B. Topografo

* V.B. insp. interventoría

	18 DE OCTUBRE DE 2025 - SABADO
CLIMA	Nublado
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, Ingeniero residente, 1 oficial, 1 paletera, 22 ayudantes
MAQUINARIA	Trompos, vibrador de concreto
ACTIVIDADES	a) Instalación de concreto de 3000 PSI en las cunetas, ambos lados, derecho 11 e izquierda 12 unidades, se utilizaron 14 bultos de cemento b) Instalación en concreto de 3000 PSI de placa y bordillos desde K0+170 a K0+187.60, se utilizaron 41 bultos de cemento c) Acabado y estampado con mineral rojo con desmoldante, 1 cuñete desde K0+170 a K0+187.60, se utilizaron 2 bolsas de mineral rojo d) Instalación de malla electrosoldada desde K0+170 a K0+190 e) Traslado de gravilla y arena de capitanía hasta el sitio de trabajo f) Relleno de los bordillos de las cunetas, ambos lados desde K0+66 a K0+110
IMPREVISTOS	Dragamper, fuera de servicio

Res. de obra

Res. interventoría

V.B. topografo

V.B. insp. interventoría

19 DE OCTUBRE DE 2025 - DOMINGO

CLIMA: Nublado, lluvia desde las 12:20 p.m

PERSONAL: Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 6 ayudantes

MAQUINARIA: Trompo, vibrador de concreto

ACTIVIDADES:
a) Desencofrado de cunetas, ambos lados, derecho 11 e izquierda 12 unidades
b) Realización de los cortes en la placa de las dilataciones en los andenes cada 2 metros desde K0+170 a K0+181.60
c) Instalación de platinas desde K0+170 a K0+181.60
d) Trasiego de gravilla y arena de capitanía hasta el sitio de trabajo
e) Descargue a hombro, los bultos de cemento desde el puerto hasta el centro de acopio a unos 7 metros de altura.
f) se retiraron las formaletas en madera de las placas de los andenes y limpieza de los mismos
g) Elaboración de 2 descoles de agua lluvia

IMPREVISTOS: Drooomper, fuera de servicio

Res. de obra.

Juan Carlos C. Fuentes P
Res. interventoría.

V.B. Topografo

JOB Ocampo
V.B. Insp. interventoría.

	20 DE OCTUBRE DE 2025
CLIMA	Nublado y soleado
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor vesidente, ingeniero vesidente, 1 oficial, 1 paletera, 22 ayudantes
MAQUINARIA	Trompo, vibrador de concreto, rana
ACTIVIDADES	a) Lavado con detergente y se instalo el sellante en la placa de los andenes desde KOt 66 a KOt 90 b) Instalación de concreto de 3000 PSI en las cunetas, ambos lados, derecho 12 e izquierda 10 unidades, se utilizó el mismo cemento de las placas c) Instalación en concreto de 3000 PSI de placa y bordillos desde Kot 187.60 a KO+ 197.60, se utilizaron 37 bultos de cemento d) Acabado y estampado con mineral con desmoldante en cuarto de cuñete, desde KOt 187.60 a KOt 197.60, se utilizaron 3 bolsas de mineral rojo e) Instalación de arena cemento en las cunetas, ambos lados, derecho 17 e izquierda 13, se utilizó 3 bultos de cemento f) Trasiego de gravilla y arena de capitanía hasta el sitio de trabajo g) Descargue a hombro de bultos de cemento desde el puerto hasta el centro de acopio a unos 7 metros de altura aproximadamente
IMPREVISTOS	Droomper, fuera de servicio

* Res. de Obra.

* Res.

* V.B. TOPOGRAFO

* V.B. Insp. interventoria.

	21 DE OCTUBRE DE 2025
CLIMA	Soleado - lluvia a las 5 p.m
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 1 oficial, 1 paletera, 2 ayudantes
MAQUINARIA	Trompo, vibrador de concreto, rana
ACTIVIDADES	a) Se instalo sellante en la placa de los andenes desde KOT00 a KOT90 a dos manos, se utilizó 3 baldes b) Instalación de concreto de 3000 PSI en las cunetas, ambos lados, derecho 10 e izquierda 8 unidades, se utilizó 15 bultos y medio de cemento c) Instalación de concreto de 3000 PSI en la boca calle KOT96 a KOT98, KOT102 a KOT106, se utilizó 4 bultos de cemento y media bolsa de mineral rojo d) Instalación de concreto de 3000 PSI, acceso centro de salud KOT150 a KOT152, se utilizó 6 bultos de cemento y media bolsa de mineral rojo. e) Acabado y estampado con mineral rojo, con desmoldante, medio cuñete, desde KOT96 a KOT98, KOT102 a KOT106, y de KOT150 a KOT152, se utilizó 3 bolsas de mineral rojo f) Desencofrado de las cunetas y limpieza de las mismas g) Relleno de los bordillos de las cunetas, ambos lados, desde KOT110 a KOT150 h) Realización de los cortes en la placa de las dilataciones de los andenes cada 3 metros, desde KOT181.60 a KOT197.60 i) Trasiego de la grailla y arena de capitanía hasta el sitio de trabajo j) Instalación de lona verde desde KOT197.60 a KOT252
IMPREVISTO	Dvampor, fuera de servicio

Powered by CamScanner

22-DE OCTUBRE DE 2025

CLIMA: Soleado, lluvia desde las 12:40 a 2:10 pm

PERSONAL: Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 1 oficial, 1 paletera, 28 ayudantes

MAQUINARIA: Trompos, vibrador de concreto, cortador de concreto

ACTIVIDADES:
a) Instación de concreto de 3000 PSI en las cunetas, ambos lados; derecho 8 e izquierda 5 unidades, se utilizó 7 bultos y medio de cemento
b) Instalación de concreto de 3000 PSI en las boca calle, ambos lados KOt193 a KOt195, se utilizó 4 bultos de cemento
c) Acabado y estampado con mineral rojo con desmoldante, un octavo de cuñete, ambos lados desde KOt193 a KOt195, se utilizó un cuarto de mineral rojo.
d) Demolición de placa en concreto existente, su refuerzo, espesor de .10 a .15 aproximadamente, incluye cargue y retiro de escombros, desde KOt197.60 a KOt252, encerrado del área de trabajo
e) Trasiego de gravilla y arena de capitanía hasta el sitio de trabajo
f) Instalación de lona verde desde KOt252 a Kot 320

IMPREVISTOS: Droomper, fuera de servicio
Contenedores de concreto

Res. de obra.

Res. Interventoría.

V.B. topografo

V.B. Insp. interventoría.

23 DE OCTUBRE DE 2025

CLIMA: soleado, lluvia de 12:40 a 2:10 pm y de 3:05 a 3:15 p.m

PERSONAL: Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 1 oficial, 1 paletera, 32 ayudantes

MAQUINARIA: Trompos, rana, vibrador de concreto

ACTIVIDADES:
a) Excavación y nivelación manual desde KOT 197.60 a KOT 232
b) Instalación de concreto en zonas afectadas por la obra, ambos lados de la vía, se utilizó un bulto de cemento
c) Demolición de placa en concreto existente, sin refuerzo, espesor de .10 a .15 aproximadamente, incluye cargue y retiro de escombros y acopio para estabilizar la vía desde KOT 232 a KOT 275
d) Relleno de los bordillos de las cunetas, ambos lados, desde KOT 150 a KOT 197.60
e) Trasiego de gravilla y arena de capitanía hasta el sitio de la obra
f) Figurado y armado de hierro (elaboración de flejes y canastas para bordillo
g) Desencofrado de las cunetas y limpieza de las mismas
h) Instalación de arena cemento de .10 centimetros de espesor desde KOT 197.60 a KOT 212, se utilizó 7 bultos de cemento

IMPREVISTOS: Droomper, fuera de servicio

Visita del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la obra I C B F

Juan Carlos Cifuentes P
Res. Interventoria
Vo Bo Ocaños
V.B. Ingv. Interventoria.

Res. de obra.
V°B°. Topografo

Powered by CamScanner

24 DE OCTUBRE DE 2025

CLIMA	Nublado, soleado y fuerte lluvia de 1:45 a 2:30 pm
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 1 oficial, 1 paletera 34 ayudantes
MAQUINARIA	Trompos y ranas
ACTIVIDADES	a) Demolición de placa en concreto existente, sin refuerzo, espesor de 10 a 15 aproximadamente, incluye y cargue, retiro de escombros y acopio para estabilizar la vía desde K0+275 a K0+320 b) se lavo con detergente las placas de los andenes desde K0+90 a K0+197.60 c) Instalación de arena cemento de 10 centimetros de espesor desde K0+212 a K0+252, se utilizó 36 bultos de cemento d) Trasiego de la gravilla y arena de capitanía al sitio de la obra e) Figurado y armado de hierro (elaboración de flejes y cuantas para bordillos)
IMPREVISTOS	Drenpper, fuera de servicio

Res. de obra.

V.B. Topografo

Jan Carlos Cifuentes P

Res. Interventoría

Vo Bo Ocampo

V.B. Insp. Interventoría

25 DE OCTUBRE DE 2025 - SÁBADO

CLIMA: Soleado, lluvia de 12:00 m a 12:20 pm

PERSONAL: Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 1 oficial, 1 paletera, 3 ayudantes

MAQUINARIA: Trompos, ranas

ACTIVIDADES:
* Demolición de placa en concreto existente, sin refuerzo, espesor de .10 a .15 aproximadamente, incluye cargue, retiro de escombros y acopio para estabilizar la vía desde KOT 275 a KOT 340
* Excavación y nivelación manual desde KOT 275 a KOT 340
* Instalación de arena cemento de 10 centímetros de espesor desde KOT 252 a KOT 340, se utilizó 48 bultos de cemento
* Trasnego de gravilla y arena de capitanía hasta el sitio de la obra
* Figurado y armado de hierro (elaboración de llejas y canastas para bordillo)

IMPREVISTOS: Drooniper, fuera de servicio

Res de obra

Res. Interventoría.

V.B. topografo

V.B. Insp Interventoría.

26 DE OCTUBRE DE 2021 - DOMINGO

CLIMA	Soleado - fuerte lluvia
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, Ingeniero residente, 7 ayudantes
MAQUINARIA	
ACTIVIDADES	Excavación de sobre ancho, lado derecho desde Km 200 a Km 210 de los andenes
IMPREVISTOS	Dvdomper fuera de servicio

Res de obra.

V.B. topografo

Carlos C. Fuentes P
Res. interventoria.

V.B. Obras
V.B. Insp. interventoria.

27 DE OCTUBRE DE 2025

CLIMA: Nublado - llovizna

PERSONAL: Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor, residente, ingeniero residente, 1 oficial, 1 paletera, 34 ayudantes

MAQUINARIA:

ACTIVIDADES:
- Excavación manual de sobre ancho de la placa de los andenes, ambos lados, desde K0+197.60 a K0+275
- Excavación manual de los bordillos, ambos lados, desde K0+197.60 a K0+246
- Instalación de canastas de bordillo, ambos lados desde K0+197.60 a K0+246
- Instalación de malla electrosoldada, incluye limpieza de las placas en arena cemento, desde K0+197.60 a K0+246
- Figurado y armado de hierro Colaboración de fleyes y canastas para bordillos
- Instalación de formaletas en madera para fundir la placa de andenes y bordillos, desde K0+197.60 a K0+235
- Construcción de una caja de inspección para recolectar las aguas lluvias de .60x.60.40 en la abscisa K0+275, se utilizó 2 bultos de cemento
- Instalación de un tubo de 6" de 3 metros para el descole de aguas lluvias en la abscisa K0+256

IMPREVISTOS: Dvodumper, Retera de servicio

Juan Carlos Cifuentes P
* Res. interventoria

* Res. obra

Jota Osorio
* V.B. insp. interventoria

* V.B. Topografo

Powered by CamScanner

	28 DE OCTUBRE DE 2025
CLIMA	Soleado, lloviznó a las 12:10 p.m
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 1 oficial, 1 paletera, 34 ayudantes
MAQUINARIA	Trompos, vibrador de concreto
ACTIVIDADES	* Instalación de concreto de 3000 PSI de placa y bordillos desde KOt 197.60 a KOt 246, se utilizó 90 bultos de cemento * Acabado y estampado con mineral con desmoldante, un cuñete y un cuarto, desde KOt 197.60 a KOt 246; se utilizó 10 y medio de bolsas de mineral rojo * Instalación de formaletas de madera para la fundición de las placas de andenes y bordillos, desde KOt 235 a KOt 246 * Figurado y armado de hierro (elaboración de flejes y cuadros para bordillos) * Trasiego de los materiales existentes de la bodega de abajo a la sede corregimental
IMPREVISTOS	Droomper, fuera de servicio Falta de material en el sitio de la obra

Res. de obra

Santiago Cifuentes P

Res. interventoría

V.B. Topografo

V.B. Insp. interventoría

29 DE OCTUBRE DE 2025

CLIMA Soleado-lluvia de 3:35 a 4:00 p.m

PERSONAL Topografo, maestro de obra, inspector de obra, Interventor residente, Ingeniero residente, 1 oficial, 1 paletera, 34 ayudantes

MAQUINARIA Cortadora de concreto, Trompos

ACTIVIDADES
* Desmoldado de las placas de andenes, desde KOt 197.60 a KOt 246
* Excavación manual de la placa de los andenes, ambos lados, desde KOt 250 a KOt 370
* Instalación de malla electrosoldada, incluye limpieza de las placas en arena cemento, desde KOt 246 a KOt 294
* Demolición de placa en concreto existente, sin refuerzo, espesor de .10 a .15 aproximadamente, incluye cargue y retiro de escombros y acopio para estabilizar la vía, desde KOt 370 a KOt 432
* Realización de los cortes en las placas de las dilataciones en los andenes cada 2 metros desde KOt 197.60 a KOt 246
* Excavación manual de los bordillos, ambos lados desde KOt 260 a KOt 370
* Instalación de canastas de bordillo, ambos lados desde KOt 246 a KOt 370
* Instalación de las formaletas en madera para la fundición de las placas de andenes y bordillos, desde KOt 246 a KOt 294
* Instalación de platinas desde KOt 197.60 a KOt 246
* Instalación de un tubo de 6" de 3 metros para el descole de aguas lluvias en la abscisa KOt 330
* Instalación de malla electrosoldada para la fundición de las cunetas, ambos lados, derecho 10 a izquierda 10
* Instalación de concreto de 3000 PSI en las cunetas, ambos lados, derecho 10 a izquierda 10 unidades, se utilizó 10 bolsas de cemento

Powered by CamScanner

* Excavación manual de cunetas, a ambos lados, desde KOt 197.60 a KOt 246
* Instalación de arena cemento para la fundición de las cunetas desde 197.60 a KOt 246, se utilizó 3 bultos de cemento

IMPREVISTOS

Dmomper, fuera de servicio
Escasez de material en el sitio de la obra

* Res. de obra

* Res interventoría.

* V.B. topógrafo

* V.B. insp. interventoría.

	30 DE OCTUBRE DE 2025
CLIMA	Soleado
PERSONAL	Topografo, maestro de obra, inspector de obra, Interventor residente, ingeniero residente, 1 oficial, 1 paletera, 2 ayudantes
MAQUINARIA	Transador, trompos
ACTIVIDADES	* Se instaló sellante en la placa de los andenes desde KOT 90 a KOT 199.60 a dos manos * Instalación de malla electrosoldada para la fundición de las cunetas, ambos lados, derecha 11 e izquierda 11 unidades * Instalación de concreto de 3000 PSI en las cunetas, ambos lados, derecho 11 e izquierda 11 unidades, se utilizó 13 bultos de cemento * Figurado y armado de hierro Colaboración de fleyes y canastas para bordillos * Traslado de la gravilla a hombro de capitanía hasta el sitio de la obra * Instalación de las formaletas en madera de las cunetas con aceite quemado, ambos lados derecho 11 e izquierda 11 unidades * Desencofrado de las cunetas, ambos lados, derecho 10 e izquierda 10 unidades
IMPREVISTOS	Dudomper, fuera de servicio Escasez de material en el sitio de la obra

Res de obra.

Juan Carlos Cifuentes P
Res interventoría.

V.B. Topografo

V.B. Osmos
V.B. insp. interventoría.

Powered by CamScanner

	31 DE OCTUBRE DE 2025
CLIMA	soleado
PERSONAL	Topografía, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 1 oficial, 1 paletera, 3& ayudantes
MAQUINARIA	Trompos, vibrador de concreto
ACTIVIDADES	* Instalación de malla electrosoldada, para fundir las placas de los andenes, incluye limpieza de las placas de arena cemento, desde KOT 298 a KOT 350 * Trasiego de arena a hombro de capitanía hasta el sitio de la obra * Instalación en concreto de 3000 PSI de placa y bordillo, desde KOT 246 a KOT 300, se utilizó 116 bultos de cemento * Acabado y estampado con mineral rojo con desmoldante, un balde y un cuarto, desde KOT 246 a KOT 300, se utilizó 13 bolsas y medio de pigmento rojo * Figurado y armado de hierro Colaboración de flejes y canastas para bordillos * Trasiego de bultos de cemento a hombro del muelle hasta el sitio de trabajo * Desencofrado de las cunetas, ambos lados, derecho 11 e izquierda 11 unidades * Instalación de las formaletas en madera para la fundición de la placa de andenes y bordillos, desde KOT 298 a KOT 350
IMPREVISTOS	Droomper, fuera de servicio Excesos de material en el sitio de la obra

* Res. de obra

* V.B. Topógrafo

Juan Carlos Cifuentes P

* Res. interventoría.

* V.B. Ingr. Interventoría.

	01 DE NOVIEMBRE DE 2025 - SABADO
CLIMA	Soleado, lluvia de 11:15 a 11:22, lluvia de 12:10 a 2:20
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 1 oficial, 1 paletero, 34 ayudantes
MAQUINARIA	Trompos, cortador de concreto
ACTIVIDADES	* Instalación de platinas desde KOt246 a KOt300 * Excavación manual de cunetas, ambos lados, desde KOt246 a KOt300 * Instalación de las formaletas en madera de las cunetas con aceite quemado, ambos lados, derecha 14 e izquierda 13 unidades * Instalación de arena cemento para la fundición de las cunetas desde KOt246 a KOt300, se utilizó 2 bultos y medio de cemento * Instalación de malla electrosoldada para la fundición de las cunetas, ambos lados, derecha 14 e izquierda 13 unidades * Trasiego de arena y gravilla a hombro de capitanía hasta el sitio de la obra * Realización de los cortes en la placa de las dilataciones en los andenes cada 2 metros desde KOt246 a KOt300
IMPREVISTOS	Dromper, fuera de servicio Escasez de material en el sitio de la obra

Res. de obra.

Res. interventoría.

V.B. Topógrafo

V.B. insp. interventoría

	02 DE NOVIEMBRE DE 2025 - DOMINGO
CLIMA	Soleado, lluvia
PERSONAL	Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 10 ayudantes
MAQUINARIA	Trompo
ACTIVIDADES	Instalación de concreto de 3000 PSI en las cunetas, ambos lados, derecha 14 e izquierda 13 unidades, se utilizó 17 bultos y medio de cemento
IMPREVISTOS	Drooupar, fuera de servicio exceso de material en el sitio de la obra

Res. de obra.

Res. interventoria.

V.B. Topografo

V.B. Insp. interventoria.

	03 DE NOVIEMBRE DE 2025
CLIMA	Soleado, lluvia de 1:35 pm a 1:45 pm y de 2:30 a 3:30 pm
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, ayudantes 31
MAQUINARIA	Trompo
ACTIVIDADES	* Instalación de concreto de 3000 PSI en las cunetas, ambos lados, derecha 15 e izquierda 14, se utilizó 18 bultos de cemento * Desmoldado de las cunetas, ambos lados, derecha 15 e izquierda 14 unidades * Instalación de las formaletas en madera con aceite quemado para la fundición de las cunetas, ambos lados, derecha 15 e izquierda 14 * Retiro de las platinas desde Kot 246 a 300 * Relleno de los bordillos de las cunetas, ambos lados, desde Kot 197.60 a Kot 340 * Instalación de malla electrosoldada para la fundición de las placas de los andenes, incluye limpieza de las placas en arena cemento, desde Kot 350 a kot 390 * Trasiego de gravilla a hombro desde capitanía al sitio de la obra
IMPREVISTOS	Dragoneo, fuera de servicio Escasez de material en el sitio de la obra
	Carlos Cifuentes P * Res. de obra. * Res. interventoría.
	Oliveros * V. B. Topografo * V. B. insp. interventoría

	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
CLIMA	Soleado, lluvia 1:15 a 1:30 p.m
PERSONAL	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 29 ayudantes
MAQUINARIA	
ACTIVIDADES	* Desenconfrado de las cunetas ambos lados, derecha 15 e izquierda 14 unidades * elaboración de 2 descoles de aguas lluvias, ambos lados en la abscisa K0+252 * Trasiego de gravilla a hombro desde capitanía al sitio de la obra * Instalación de las formaletas en madera para la fundición de las placas de anclajes y bordillos, desde K0+300 a K0+390 * Trasiego de cemento a hombro, desde el muelle al sitio de trabajo
IMPREVISTOS	Droomgen, fuera de servicio Escasez de material en el sitio de la obra

Res. de obra.

Res. interventoria.

V.o B. Topografo.

V.o B. insp. interventoria

	5 DE NOVIEMBRE DE 2025
CLIMA	Soleado
PERSONAL	Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente,
MAQUINARIA	Trompo, vibrador de concreto
ACTIVIDADES	* Instalación de concreto de 3000 PSI en placa y bordillo desde K0+300 a K0+350. se utilizó 140 bultos de cemento * Acabado y estampado con mineral rojo con desmoldante, se utilizó 2 baldes desde K0+300 a K0+350, se utilizó 11 bolsas y medio de pigmento rojo * Trasiego de gravilla y arena desde capitanía hasta el sitio de la obra a hombro.
IMPREVISTOS	Drompeo, fuera de servicio Escasez de material en el sitio de la obra

Res. de obra.

Juan Carlos Cifuentes P
Res. interventoria

V.B. Topografo

OLEANO
V.B. insp. interventoria.

	6 DE NOVIEMBRE DE 2025
CLIMA	Soleado, lluvias durante la noche.
Personal.	Topográfo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 31 ayudantes., 3 vigilantes.
Maquinaria.	Trompo, 2 ranas, cortadora.
ACTIVIDADES	A. Excavación Kot 390 a Kot 423 B. Perfilación Kot 390 a Kot 423 C. Chequeo niveles por topofrafia D. Arena Cemento Kot 390 a Kot 418 se usaron 16 bultos y componer cunetas. E. Embellecimiento y pintura Kot 200 a Kot 230
IMPREVISTOS	Droomper, fuera de servicio Excasez de material en el sitio de la obra.

Res. de obra

Juan Carlos Cifuentes P
Res. Interventoria.


V.B. Topógrafo

V.B. Insp interventoria.

Powered by CamScanner

07 DE NOVIEMBRE DE 2025.

CLIMA	soleado.
PERSONAL	Topografo, maestro de obra, inspector de obra interventor residente, ingeniero residente, 28 ayudantes 3 vigilantes.
Maquinaria.	Trompo.
ACTIVIDADES.	A. Excavación Kot 390 a Kot 423 (cuneta). B. Perfilación Kot 390 a Kot 423 (cuneta). C. Arena cemento Kot 300 a Kot 345 cunetas, y se fundieron 36 cunetas, entre derecho e izquierda, se usaron 31 bultos tanto para la base de arena cemento, como para la fundición. E. Embellecimiento y pintura Kot 200 a Kot 230.
IMPREVISTOS.	Droomper, fuera de servicio. Escasez de material en el sitio de la obra.

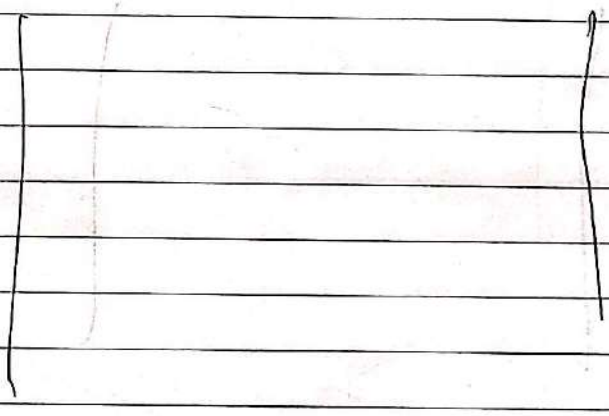

Res. de obra

Juan Carlos Cifuentes P
Res interventoria

V.B. Topografo

V.B. Insp. interventoria

Powered by CamScanner

8 DE NOVIEMBRE 2025- Sabado.

CLIMA. Soleado.

PERSONAL. Topografo, maestro de obra, inspector de obra. interventor residente, ingeniero residente, 28 ayudantes, 3 vigilantes.

MAQUINARIA. Trompo.

ACTIVIDADES.
* Fundicion anden desde KOT 395 a KOT 390 Se utilizo 87 bultos de cemento.
* trasiego de cemento a hombro desde el muelle al sitio de la obra.
* Acabado de instalacion de sellando desde KOT 200 a KOT 230.

IMPREVISTOS. Droomper, Fuera de servicios.
Excasez de material en el sitio de la obra.

Res. de obra

* Ing. Carlos Cifuentes P
* Res. interventoria.

* V.B. Topografo

OMAR MO
* V.B. Insp. interventoria

	09 de Noviembre 2025 - Domingo.
CLIMA	SOLEADO.
PERSONAL.	Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 5 ayudantes 3 vigilantes.
MAQUINARIA.	
ACTIVIDAD.	Realización de los cortes en la placa de las dilataciones en los andenes cada 2 mts desde. KOt 345 a KOt 390.
	Descofrado de formaletas de andenes desde KOt 345 a KOt 390.
IMPREVISTOS	Droomper fuera de servicio. Excasez de material en el sitio de la obra.

Res. de obra.

Carlos Cifuentes P
Res. interventoria.

V.B. Topografo

V.B. insp. interventoria.

10 de Noviembre de 2025.

CLIMA. Nublado, lluvia de 7:45 am a 9 am, 12:00pm a 1:25 pm.

PERSONAL Tópografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 30 ayudantes, 3 vigilantes.

MAQUINA. Trompo

ACTIVIDAD.
* Instalacion de los formales en madera con aceite quemado para la fundicion de los cunetas, ambos lados, derecha 24 e izquierda 14 unidades, se utilizaron 24 bultos de cemento.
* Fundicion de una caja de inspeccion para la recoleccion de aguas lluvias en la abscisa Km 300.
* Demolicion de placa en concreto existente, sin refuerzo, espesor de 10 a 15 aproximadamente, desde Km 445 a Km 500
* Relleno de los bordillos de las cunetas ambos lados desde Km 300 a Km 345
* Trasiego de Cemento a hombro desde el muelle al sitio de la obra.

IMPREVISTOS Droomper Fuera de servicio
Excesó de material en el sitio de la obra.

* Res. de obra.

Juan Carlos Cifuentes P
* Res. interventoria.

* V.B. Topografo

Oscares
* V.B. Insp. interventoria.

	11 de Noviembre de 2025.
CLIMA	soleado.
PERSONAL.	Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 32 ayudantes. 3 vigilantes
Maquina.	Trompo.
ACTIVIDAD.	* instalación de concreto de 3000 psi en las cunetas, ambos lados, derecha a e izquierda 9, Se usaron 22 bultos y medio de cemento. * Instalación de concreto de 3000 psi en los boco calle, ambos lados Kot 352, Se utilizo 4 bultos de cemento. * Acabado y estampado con mineral rojo con desmoldante, Se uso 1/8 de cuneta, ambos lados., Se utilizo 1/4 de mineral rojo. • construccion de un desagüe de aguas lluvias en la abscisa Kot 294, Se utilizo 2 bultos de cemento. * Instalación de un tubo novaford de 4", para desagüe, ubicacion abscisa Kot 402. * Demolición de placas en concreto existente, sin refuerzo, espesor de 10.a 16 aproximadamente, incluye cargue y retiro de escombro y acopio- para estabilizar la via, desde Kot 445 a Kot 500. * Construcción de una caja de inspeccion para recolectar los aguas lluvias en la abscisa Kot 352 * instalacion de dos descoles, en la abscisa Kot 348. * Trasiego de cemento a hombro desde el muelle al sitio de la obra.
IMPREVISTOS.	Droomper Fuera de Servicio Excosez de material en el sitio de la obra.

Powered by CamScanner



Juan Carlos Cifuentes P

* Res de obra.
* Res. interventoria.



OLCANOS

* V.o B. Topografo
* V.o B. Insp. interventoria.

12 de Noviembre. de 2025.

CLIMA. Soleado.

PERSONAL. Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 35 ayudante, 3 vigilantes.

MAQUINA. Trompo., Pana.

ACTIVIDAD.
* instalacion de anoncamento desde Kot 420 a Kot 495
* Lavado de andenes con jabon
* Relleno de bordillos
* Escavacion y nivelacion terreno.
* Fundicion de 2 posocalbs, se utilizaron 5 bultos de cemento.

Imprevistos
* Droomper fuera de servicio
excaser de material en el sitio de la obra.



Juan Carlos Cifuentes P

* Res. de obra.
* Res. interventoria.



OLCANOS

* V.B. Topografo
* V.B. Insp. interventoria.

Powered by CamScanner

	13 de Noviembre de 2025.
CLIMA.	Soleado - lluvia 7:20 AM - 7:45 am.
PERSONAL	Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 37 ayudantes, 3 vigilantes.
MAQUINA.	Trompo, Rana.
ACTIVIDAD	* Instalacion arano cemento desde K0+5. a K0+595, Se usaron 35 bultos. * Instalacion de Solador K0+200 a K0+352. * Trasiego de malla electrosoldada, desde bodega Corregimiento a punto obra K0+390. * Trasiego de 61 bultos de cemento a hombro desde el muelle a punto K0+550 * Figurado y armado de Flejes, Se uso 91 varillas 3/8 * armado de caja para acopio material (capitania). * instalacion de malla electrosoldada. desde K0+390 a K0+440.
IMPREVISTOS.	* Dromper fuera de servicios * Excesos de material en el sitio de la obra.
	Residente de obra.
	V.B. Topografo
	Residente interventoria.
	V.B. Insp. interventoria.

14 de noviembre de 2025.

CLIMA. SOLEADO.

PERSONAL. Topografo, maestro de obra., inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 37 ayudante, 3 vigilante. y 1 paletera.

MAQUINA. Trompo.

ACTIVIDAD.
* Continuacion de instalacion mo. a electrosoldada
* Excavacion de cunetas bordillo desde K0+423 a K0+550,
* Fundicion e instalacion de aguna comuneta. para fundir placa anden, se utilizo 66 bultos y medio., desde K0+390 a K0+423
* Estampado con mineral rojo, Se utilizo 8 bultos de pitmento.
* Actividad de TRASIEGO de gravilla y arena, a hombro M.O.

IMPREVISTOS.
* Droomper Fuera de Servicio
* Excasez de material en el sitio de la obra.
* se realiza comite tecnico de avance y estado de la obra: se
* Se utiliza la fuerza de veinte(20) hombres para trasiedo de la Arena y Gravilla. Desde el Puerto de Capitania a 500 ML: pend 35%

* Res. de obra

* Res. interventoria.

* V.B. Topografo

* V.B. Insp. interventoria.

	15 de noviembre 2025. (sabado).
CLIMA.	LLUVIOSO. Todo el dia.
PERSONAL.	Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 21 ayudantes, 3 vigilantes, 1 paletera.
MAQUINA.	cortadora.
ACTIVIDAD.	* DESENCOFRA E INSTALACION DE PLATINAS. 0 * INSTALACION DE CANASTOS DE BORDILLO. * CORTE DE ANDEN CADA 2 MTS. * FIGURADO DE HIERRO Y ARMADO DE FLEJES PARA CANASTA DE BORDILLO.
IMPREVISTOS.	* DROMPER FUERA DE SERVICIO * EXCESO DE MATERIAL EN EL SITIO DE LA OBRA. * Res. de obra. — * Res. Interventoria. * V.B. Topografo — * V.B. Insp. interventoria.
	16 de noviembre 2025.
CLIMA.	SOLEADO.
PERSONAL	Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 18 ayudantes, 3 vigilante,

Powered by CamScanner

MAQUINA: TROMPO. vibro compactador, Bomba é;

ACTIVIDAD:
* Inspección de Medidas, niveles y colocación de acero de refuerzo
* Fundicion de cunetas ambos lados DERECHA a e izquierdo 9.
* instalacion de malla electrosoldada.
* SE realizo Comité de Obra. VIETTA Co / CONSORCIO S.P.25

IMPUESTOS:
* Droomper fuera de Servicio
* Excesos de material en el sitio de la obra.

Ing. Residente de obra. — Ing. Residente Interventoria

V.B. Topografo — V.B. Insp. Interventoria

17 de NOVIEMBRE 2025.

CLIMA: soleado.

PERSONAL: Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 36 ayudantes, 3 vigilantes, 1 pañetero.

MAQUINA: TROMPO.; vibro compactador, planta electrica a combustible. Moto-bomba é;

ACTIVIDAD:
* instalación de formaleta y fundicion de anden desde K0+423 a K0+480 estampado con mineral rojo. Se utilizo 10 bolsas de pigmento. (57,23 m).
* instalación de canasta de bordillo e instalacion de malla electrosoldada.
* Trasiego de cemento a hombro desde


El muelle en punto KO+550 de la obra.

IMPREVISTOS
* Excavaciones en zanja-Bordillos. en KO+500-545. Dos líneas.
* Droomper fuera de sitio
* Excavac de material en el sitio de la obra.



* Res. de obra.

Juan Carlos Cifuentes P
* Resi interventoría.



* V.B. Topografo

Oficinas
* V.B. Insp. Interventoría.

MARTES 18 de Noviembre 2025.

CLIMA. SOLEADO.

PERSONAL. Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 35 ayudantes, 3 vigilantes, 1 paletera.



MAQUINA. Trompo, cortadora concreto, vibrador de concreto. Planta eléctrica, Moto-Bomba 1 hp, Tronsadora,

ACTIVIDAD.
* Fundición de cunetas derecho a izquierda a.
Se gastaron 12 bultos y medio.
* Trasiego de malla desde capitanía.
* instalacion de formaleta para fundicion andenes, y fundicion de andenes y bordillos. Se utilizo 64 bultos y medio.
* Trasiego de cemento en moto, desde capitanía a sitio de la obra.
* Se realiza trasiego de cemento x 2 Bultos en Motocicleta. aprox 90 bultos al dia. En Campamento. Deta #16. KO+800
* Trasiego Color rojo mineral x Bulto 20kg. x 400 blt. a bodega 3.

Powered by CamScanner

* IMPREVISTOS	* Droomper Furo de servicio.
	* Excasez de material en el sitio de la obra.
F	* El motocarro que nos esta suministrando Material se varo.
	Carlos. C. Fuentes P
II	* Res. de obra. * Res. interventoria.
	OTCANOS
	* V.B. Topografo * V.B. Insp. Interventoria
	19 de Noviembre de 2025.
CLIMA.	SOLEADO.
PERSONAL.	Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 32 ayudantes, 3 vigilantes, 1 palestora.
MAQUINA.	TROMPO.
Y	
ACTIVIDAD.	* Instalacion de platinos o instalacion de anna comunto, su uso 1 bulto y medio. de comuntos. K0+300 A 545
	* Corte de la via peatonal, cada 2 mts.
O	* Trasiego de malla electrosoldada,
	* Excavacion manual
E	* Fundicion de cunetas ambos bordes se gastaron 12 bultos y medio. derecha 10 o izquierda 10.
	* Instalación estructoras de Cobierta Temporal en Madera y Plastico.
EMPREVISTOS	Droompor Furo de servicio.
	Excasez de material en el sitio di la obra
	* La jornada presenta horas extras por curado del concreto.

Powered by CamScanner

	Juan Carlos Cifuentes P
✱ Res. de obra	✱ Res. interventoria.
	OTTONIEL
✱ V.B. topografo	✱ V.B. insp. interventoria.
20 de Noviembre de 2025.	
CLIMA.	SOLEADO.
PERSONAL	Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 32 ayudantes, 3 vigilantes, 1 pobtura.
MAQUINA	Trompo, vibrador de concreto.
ACTIVIDAD.	*Activ. Desencofrado del tramo de placa fundida. 1 ✱ Nivelacion de pbtinos ✱ trasiego de material arena y grava a hombro desde capitania a sitio de la obra. ✱ fundicion via peatonal, se utilizo 50 bultos de cemento, 7 bultos pigmento rojo y 3/4 de bolde. desmoldante. ✱ trasiego y suministro de Arena x Bulto / hombro 410 = 6m³ dia.
IMPREVISTOS.	Rompor fuera de servicio. excesos de material en el sitio de la obra.
	Juan Carlos Cifuentes P
✱ Res. de obra	✱ Res. interventoria.
	OTTONIEL
✱ V.B. Topografo	✱ V.B. insp interventoria

Powered by CamScanner

21 de Noviembre de 2025.

CLIMA. SOLEADO.

PERSONAL. Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 28 ayudantes, 3 vigilantes, 1 paletera.

MAQUINA. * TROMPO, vibrador de concreto, cortadora de concreto. Moto-Bomba 7HP,
* Resanco forado de formaletas y platinas anclaje, Corte de via peatonal cada 2mts.
* Fundicion via peatonal desde K0+540 a K0+590, se utilizo 41 bultos de cemento, y 3 bultos y medio de pigmento rojo.
* Instalacion de malla electrosoldada desde AD11 a AD16.

IMPREVISTOS. Romper fura de tuberia existente, excavacion de material en el sitio de la obra.

Carlos Cifuentes P
* Res. de obra. * Res. interventoria

OSCAR
* V.B. Topografo * V.B. Insp. interventoria

y mantenimiento de zanjas y excavaciones, que a causa de la lluvia ha generado. Afectando algunos acabados.
* Actividad de ...ción de formaleta de madera para placa. Se ejecuta área entre K0+640 a K0+666.

22 de noviembre de 2025 = Sabado.

CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL: Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 23 ayudantes, 3 vigilantes, 1 pobletera.

MAQUINA: Trompo de mezcla, planta eléctrica, vibro compactador

ACTIVIDAD.
* Trasiego de material grauilla a hombro de de capitania a sitio de la obra.
* Desencofrado cunetas. e instalacion de formaleta para cunetas.

IMPREVISTOS. Droomper Furo de arreglo
excavación de material en el sitio de la obra.

Ing. Carlos C. Fuentes P
* Res. de obra.
* Res. interventoria.

Oscanos
* V.B. Topografo
* V.B. insp. interventoria.

23 de noviembre 2025 - Domingo

CLIMA: SOLEANDO.

PERSONAL: Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 7 ayudantes, 3 vigilantes.

ACTIVIDA.: *Traslado de material arena y grava hasta capitonia a sitio de la obra.
*Instalacion de cubierta temporal en plastico madera. Korsa

IMPREVISTOS: Rompor tuvo de servicio
Excesos de material en el sitio de la obra.

Juan Carlos Cifuentes P.

* Res. de obra. ** Res. interventoria

Oneanos

* V.B. Topografo ** V.B. Insp. interventoria.

24 de noviembre 2025 - Lunes

CLIMA: mayormente nublado

PERSONAL: Topógrafo(1); residente de obra(1); maestro de obra(1), almacenista(1); Ayudantes de obra; 3 vigilantes nocturnos

Equipos: Nivel de presicion, planta eléctrica; Trompo de mezcla, vibro comp.;

ACTIVIDAD. 6:30 AM: * Se realiza reunión del grupo de personal de mano de obra con fines y tramites informativos, de control, instrucción y capacitación general sobre el uso de EPP y otros

-temas de registro y toma de datos con firmas de asistencia del personal a manera de record, no sin haberse realizado de tal.

7 * Se realiza la actividad de trasiego a hombro del personal M.O. y en costal, el material de relleno, gravilla y arena. D: 500 ML. P: 35 K. Se transporta un total al día = m3

* Se Mezcla e instala base de Ar. Concreto: Cuneta: K0+432 - 500

* Se realiza trasiego de concreto de Capitanía a K0+800. se realiza en moto x 2 Bto (3 hombres) = Btos / día.

14:30h * Mezcla con trompo a 1 Bto : 9 Gr : 7 Ar : 18 Lt H2O Concreto con ref. 3000 psi. * PRUEBA ASENTAMIENTO = 3".

* La instalación de base A-C. en Cuneta, Completado, * Se ve afectado por la lluvia. Aunque la excavación prevee un drenaje auxiliar el nivel de la escorrentia de los lotes superiores en el área de trabajo, inundación gran cantidad de agua lluvia.

* Instalación de mezcla de concreto en Cunetas 1a Sec. trinchera entre Abscisa K0+432 A K0+500. Las horas de curado para concreto y acabado de cuneta se extienden en extras: 10:00 AM

* Se reporta 'lluvia fuerte' durante las 15h y las 17:40h.

* Para mezclas e instalación, se reporta un gasto T: Bto Cem.

* Se utilizan un Total de = 7,5 m3 de gravilla, y un total al día de : 5,5 m3 de arena.

* Se evidencia e inspecciona la construcción de las boca calle y Boca-de cunetas, según diseño y bombeo del agua lluvia; incluye adecuación de cajas de paso o Box C. para drenaje de canal.

Imprevistos * Varias de las máquinas de obra, presentan a la fecha aún averias mecánicas/DIFICIL ACCESO DE REPUESTOS así, la Draga, la volqueta Dumper La moto carga con fractura; y las reparaciones

Juan Carlos Cifuentes P

* RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

* V.Bo Topógrafo - Residente -

V.Bo Inspector

V.Bo Interventoria

25 de noviembre - Martes

CLIMA: Parcialmente nublado * "Se registran lluvias y llovizna fuertes y constantes, que generan inundación o escorrentia.

PERSONAL: Residente de Obra Ing, Topógrafo(1); Maestro de obra (1); Ayudantes (30); Almacenista; Residente de Interventoria.

ACTIVIDAD * Se realiza Trasiego de material de río, Gravilla y Arena. desde el Pto Capitania. a Delta #16. 300 ML. pend 35%. / a hombro MO. Se transp. y suministra 9 m³ Gravilla y 7 m³ Arena.

* Trasiego de cemento a pie de mezcla. ± 100 bot. KO+545.

* Instalación de acero de Ref. en CUNETA: EN KO+432 A 500 TRINCHERA

* Instalación de platinas metálicas para cuneta. Formaleta.

* Se realiza inspección de interventoría; de las medidas, de anchos, largos, espesores y otros detalles. 'observaciones in situ'.

10.00AM * Instalación de concreto en cunetas. Segunda Trinchera; en avance de KO + 432 A KO + 500. Por las dos lineas laterales.

* Se realiza prueba de campo de "ACENTAMIENTO DE MEZCLA"; Se inspecciona así, las cantidades y la dosificación de la mezcla en sitio; Cemento 1 Bl / 9 Gr / 7 Ar Se mezclan Un (1) Bulto + Nueve baldes (9) Gravilla + Siete (7) Arena.

* La medida del acentamiento es = 3,2". OK.

* Se re

26 de Noviembre 2025.

CLIMA: Soleado.

PERSONAL: Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 36 ayudantes, 3 vigilantes.

MAQUINARIA *

ACTIVIDAD.	* Corte de anden (vía peatonal) cada 2 mts * Descapote formole anden * Trasiego de material comunto. de puerto de capitania a sitio de la obra. * Relleno de cunetas y estabilizacion de de terreno. * instalacion de arena comunto cuneta, se utiliza 1 bulto de comunto
IMPREVISTOS.	* Romper tura de servicio. * Excavacion de material en el sitio de la obra.
	Ing Carlos C Fuentes P * Res de obra. * Res. interventoria.
	* V.B. Topografo * V.B. insp. interventoria.
	27 de Noviembre 2025.
CLIMA	soleado
PERSONAL.	topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 35 ayudantes, 3 vigilantes.
MAQUINA	* Trompo.
ACTIVIDAD.	* Trasiego de material (grevilla) a hombro desde puerto de capitania a sitio de la obra. * Relleno de bordillo.

	* Fundicion andon de : a K0+700 se gastaro 12 bultos de cemento.
IMPREVISTOS.	* Droomper fura de servicio * Excasez de material en el sitio de la obra.
	* Res. de obra. — * Res. Interventoria, Jan Carlos C. Fuentes P
	* V.B. Topografo — * V.B. Insp Interventoria, Oscar Hernandez
	28 de Noviembre 2025.
CLIMA	Nublado.
PERSONAL	Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 35. ayudantes, 3 vigilantes.
MAQUINA.	Trompo.
Actividad	* Trasiego de material cemento. * Fundicion de 11 cuneta, se ut.1.20 6 bultos de cemento. y 1 bulto para. arena cemento.
IMPREVISTOS.	* Droomper fura de servicio. * Excasez de material en el sitio de la obra.

	✱ Res. de obra. — ✱ Jan Carlos Cifuentes P. Res. interventoría.
	✱ V.B. Topografo — ✱ Oscar Heredia V.B. Insp. interventoría.
	29 de Noviembre 2025.- Sabado.
CLIMA.	Soleado.
PERSONAL.	Topografo, maestro de obra, inspector de obra, interventor residente, ingeniero residente, 55 ayudante, 3 vigilante..
MAQUINA.	
ACTIVIDAD.	✱ Desencofrado cuneta. ✱ instalación de malla electrosoldada y canasta de cuneta. ✱ Trasiego de material arena a hombro. ✱ Relleno de cuneta y limpieza del terreno. ✱ Descargue de material arena, embarcación punto de acopio.(capitanía)
IMPREVISTOS	✱ Droomper, fuera de servicio ✱ Excesos de material de en el sitio de la obra.
	✱ Res. de obra. — ✱ Jan Carlos Cifuentes P. Res. Interventorio.
	✱ V.B Topografo — ✱ Oscar Heredia V.B. Insp interventoría.

Powered by CamScanner

	30 de Noviembre 2025. = Domingo
CLIMA.	Soleado.
PERSONAL.	Topogra, maestro de obra, inspector de Obra, interventor residente, ingeniero residente, 8 ayudantes, 3 vigilantes, 1 paletero.
MAQUINA.	
ACTIVIDAD.	* Fundicion de 11 anotes, se usaron a bultos de concreto. * Instalacion de malla electro soldada y cerrada de bordillo.
IMPREVISTO.	* Romper fuera de Servicio. * Excavacion de material, en el sitio de la obra
	Juan Carlos Cifuentes P * Res. de Obra. * Res. Interventoria
	Oscar Cardos * V.B Topografo * V.B. Insp. interventoria

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS

ACTA No. 1 **TIPO DE CONTRATO:** OBRA.

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA

CONTRATISTA : VIETTA CONSTRUCCIONES SAS **CONTRATO No.** CONTRATO DE OBRA 1868 de 2025.

INTERVENTOR: CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025 **CONTRATO No.** CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1820 de 2025.

Mediante la presente Acta, David Leonardo Rozo Gasca Director de Obra del contratista y Boris Nicolas Cassab Barreto Director de Interventoría dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el dia 02 del mes de diciembre del año 2025, en las condiciones que se detallan a continuación:

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1,0	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	4.931,00	10.326,73	50.921.089,62		-25,18	-	-260.026,98	4.905,82	50.661.062,64
2,0	DEMOLICIÓN MANUAL DE EXTRUCTURAS EXISTENTE	M3	114,00	345.776,24	39.418.490,92		-27,43	-	-9.484.642,16	86,57	29.933.848,77
3,0	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M3	449,00	155.830,03	69.967.685,52	570,23		88.858.960,61	-	1.019,23	158.826.646,13
4,0	NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ANDENES	M2	4.931,00	15.961,14	78.704.362,00		-2.239,57	-	-35.746.081,53	2.691,43	42.958.280,47
5,0	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	367,00	2.058.728,68	755.553.424,65	-35,50		-73.084.868,05	-	331,50	682.468.556,60
6,0	ACERO DE AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA #5	KL	5.875,00	38.663,35	227.147.168,89	-691,22		-26.724.879,33	-	5.183,78	200.422.289,56
7,0	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDENES	M3	293,00	3.163.935,95	927.033.233,27	-3,05		-9.650.081,02	-	289,95	917.383.152,25
8,0	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3.448,00	110.022,60	379.357.917,04		156,07	-	17.171.226,83	3.604,07	396.529.143,87
9,0	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3.448,00	293.515,41	1.012.041.116,62		170,05	-	49.912.294,63	3.618,05	1.061.953.411,25
10,0	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	ML	3.483,00	289.756,11	1.009.220.525,87		-6,58	-	-1.906.595,19	3.476,42	1.007.313.930,68
11,0	DILATACIÓN DE PAVIMENTO (INCLUYE CORTES)	ML	1.724,00	14.292,07	24.639.520,79		64,00	-	914.692,19	1.788,00	25.554.212,97
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**4.574.004.535,19**			**-20.600.867,79**	**20.600.867,79**		**4.574.004.535,19**

DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS **-0,00**

NOTA : La Interventoría aprueba y valida el balance de mayores y menores cantidades actualizadas y los ítems no previstos de la presente acta

EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: David Leonardo Rozo Gasca
DIRECTOR DE OBRA

APROBADO POR EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: Boris Nicolas Cassab
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
